FECHA 4/ago/2025
(Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES   DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA   SEMANA No.: 31 del 28/07/2025 al 3/08/2025 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JESUS ALONSO MEJIA   GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. NELSON MANUEL ROJAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA VÍA BLANQUITA - FRONTINO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA AVANZA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mejoramiento y mantenimiento de aproximadamente 1.4 km de la vía la Blanquita - Frontino.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Obras de mejoramiento en aproximadamente 1,4 km, por medio de intervenciones en la estructura de la vía, entre el punto 1: Abscisa K19+500; Coordenadas: 6.7482N, -76.2901E, acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra para la atención de mayores metas físicas en el corredor. Incluyendo la realización de obras de drenaje y la implementación de una correcta gestión ambiental y social sostenible.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS CM 24		
INTEGRANTES:	MR GROUP COL SAS (90%) Y COL PETROLEUM SERVICES SAS (10%)		
CONTRATO No.	4137 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 3.359.649.945,00
FECHA DE INICIO:	9/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 3.359.649.945,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/08/2025		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SAS		
INTEGRANTES:	N.A		
CONTRATO No.	4144 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 449.999.999,00
FECHA DE INICIO:	9/12/2024	VALOR ADICIONES:	$ 90.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 539.999.999,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	24/08/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025		
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 3.359.649.945			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1.118.235.073,00			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2.241.414.872			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 449.999.999	$ 90.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 260.619.520			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 189.380.479	$ 90.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 3.019.431.104,02	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2.111.112.267,20	69,92%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.221.238.965,00	73,56%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 110.126.697,80	3,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 9.520.015,00	2,80%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2.308.376.373,70	68,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.230.758.986,00	66,40%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (77.617.387,70)	-2,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 318.422.782,68	10,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 38.863.006,00	1,29%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI: x NO:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Junio
VALOR FACTURA: $ 505.389.012,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 477.614.727,66	88,45%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 416.958.331,62	77,21%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.327.127,73	2,96%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.357.254,83	4,30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI: NO: X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: Mayo
VALOR FACTURA: $ 103.748.614,90

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: La interventoría cuenta con el personal técnico requerido para la revisión de la documentación entregada por el consorcio contratista. Así como recursos físicos tales como oficina y vehículos. La inversión ejecutada reportada corresponde a los insumos avalados por la supervisión pero no representan la inversión total real ejecutada por INGEOCIM S.A.S la cual es superior.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 603.886.220,80
Amortizado $	$ 603.886.220,80
Saldo $	$ -

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	N.A
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 88,00%   Avance o Atraso Físico % -8,00%
Meta Física Ejecutada % 80%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**	**Vigencia ____**	**Vigencia (n)**	**Avance Físico**	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Estudios y diseños	GLB	1			Prog	50,00%	50		1	100,0%
					Ejec	0,5%	0,5		1	100,0%
Desmonte y limpieza	Ha	2			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec					
Excavación en material común de la explanación y canales	M3	2331			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,45		0,95	95,00%
Terraplenes	M3				Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec					
Conformación de la calzada	M2	4614			Prog	0,5	0,25		0,75	75,0%
					Ejec	0,5	0,15		0,65	65,0%
Afirmado	M3	1075			Prog	0,5	0,25		0,75	75,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Subbase granular clase C	M3	747			Prog	0,5	0,25		0,75	75,0%
					Ejec	0,5	0,15		0,65	65,0%
Pavimento en concreto rígido MR 3.8 Mpa	M3	830			Prog	0,5	0,1		0,6	60,0%
					Ejec	0,28			0,28	28,0%
Excavaciones varias sin clasificar	M3	951			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Concreto resistencia 21Mpa	M3	99			Prog	0,5	0,34		0,84	84,0%
					Ejec	0,5			0,5	50,0%
Concreto resistencia 14Mpa	M3	30			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Acero de refuerzo Fy=420 Mpa	Kg	13372			Prog	0,5	0,33		0,83	83,0%
					Ejec	0,5	0,03		0,53	53,0%
Tubería en concreto reforzado resistencia F'c 21Mpa de 900mm de	Ml	44			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Excavaciones en material comun seco a mano	M3	1,46			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Demolición de estructuras	M3	24,85			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Remoción de alcantarillas	ml	44			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Rellenos para estructuras con material granular SBG	M3	167,6			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Material granular drenante	M3	180			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora 420 E	1	2
Vibrocompactador	1	1
Total		3

Geodren circular	ml	300			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Enrocado de protección	M3	25,8			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Transporte de materiales provenientes de la explanación	M3-km	228968			Prog	0,5	0,17		0,67	67,0%
					Ejec	0,5	0,46		0,96	96,0%
Mejoramiento con geocelda	M2	901			Prog	0,5	0,5		1	100,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%
Rellenos para estructuras con suelo	M3	299			Prog	0,5	0,2		0,7	70,0%
					Ejec	0,5	0,5		1	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Desde la K0+150 a la K0+1000 MD
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2: Desde la K0+150 a la K0+1000 MI

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Trituradora Estyma - Plata en Uramita
PERMISO MINERO: SI x NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI x NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: se observa la llegada de material tipo arena y gravilla para la preparación en obra de concreto de 14 Mpa para atraques y solados. Así como concreto de 21 Mpa para muros de encole en alcantarilla y de material granular para relleno de filtro.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	x	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	x	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	x	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	x	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	x	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	x	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	x	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	x	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: El consorcio Contratista presentó el PAGA en su versión 2 la cual fue aprobada por esta interventoría.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	22	10
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	22	10
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 32

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realizó la socialización inicial con la comunidad el día 31 de enero de 2025 en el sector de la Blanquita corregimiento de Murri. Se realizó reunión informativa con la comunidad el día 28 de marzo de 2025. Se realizó socialización con la comunidad el día 17 de mayo.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: No se tiene estimado adquisición de predios.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Se está a la espera del informe por parte del consorcio contratista. En campo se reutilizará material RCD disgregada debidamente con lo que se mitigará los impactos que estos pudieran generar.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza instalación de subbase granular y concreto tpo MR

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con instalación de subbase granular y concreto tipo MR.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

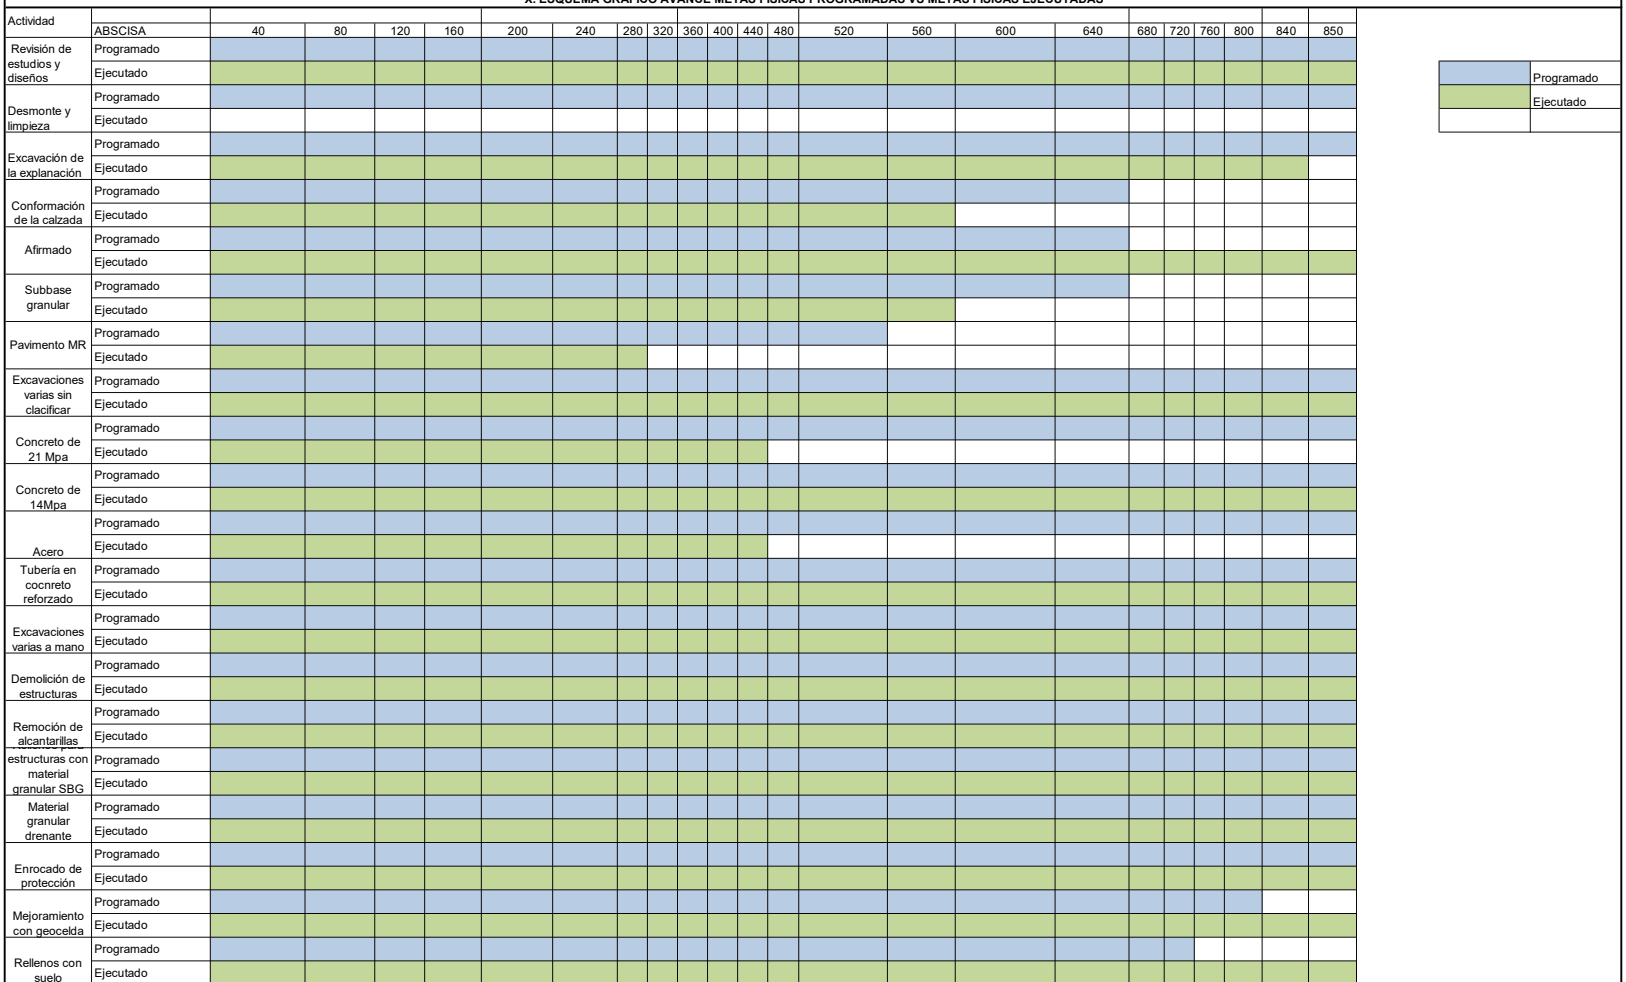

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Acopio de material tipo subbase



Concreto MR



Instalación de formaleta para losas de MR



Instalación de formaleta para losas de MR



Instalación de subbase granular



Concreto MR 3.8

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Realizar seguimiento a la revisión y ajuste del balance de obra.
* Revisar, verificar y aprobar si es el caso la documentación entregada por el consorcio contratista.
* Atender las reuniones, comités y/o solicitudes presentadas por la Supervisión.
* Requerir al consorcio Contratista por el cumplimiento de sus obligaciones.
* Seguimiento a las actividades en campo.
* Realizar seguimiento al trámite para la aprobación de los ítems no previstos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN CARLOS PINEDA SUÁREZ - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Matrícula Profesional No.: 17202 - 46452 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.
