

Id	EDT		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo	CRTR
1	1		**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLAZA DE MER- CADO, EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRA- TIVO No. ICCU 623 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL INSTI- TUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA**	**147.5 días?**	**19 ago '25**	**17 ene '26**			**$ 367,864,858.16**	**$ 308,363,997.79**
2	1.1	✓	Inicio	0 días	19 ago '25	19 ago '25			$ 0.00	$ 0.00
3	**1.2**	✓	**PRELIMINARES**	**34.25 días**	**19 ago '25**	**22 sep '25**			**$ 11,323,353.28**	**$ 11,323,353.28**
4	1.2.1	✓	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	8 días	19 ago '25	27 ago '25	ML	140.00	$ 5,420,282.00	$ 5,420,282.00
5	1.2.2	✓	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	1 día	1 sep '25	1 sep '25	M2	100.05	$ 1,422,067.47	$ 1,422,067.47
6	1.2.3	✓	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.25 M	4 días	3 sep '25	6 sep '25	M2	0.00	$ 0.00	$ 0.00
7	1.2.4	✓	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	5 días	8 sep '25	12 sep '25	M2	19.42	$ 1,540,107.76	$ 1,540,107.76
8	1.2.5	✓	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	5 días	27 ago '25	31 ago '25	UN	16.00	$ 415,619.68	$ 415,619.68
9	1.2.6	✓	DESMONTE VENTANAS	1 día	1 sep '25	1 sep '25	M2	28.72	$ 647,737.27	$ 647,737.27
10	1.2.7	✓	DEMOLICIÓN ADOQUÍN SOBRE ARENA, H=0.15 m	12 días	3 sep '25	13 sep '25	M2	49.28	$ 888,694.81	$ 888,694.81
11	1.2.8	✓	RETIRO DE SOBRAN- TES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CAR- GUE)	7 días	16 sep '25	22 sep '25	M3	68.43	$ 988,844.29	$ 988,844.29
12	1.2.9	✓	FIN PRELIMINARES	0 días	22 sep '25	22 sep '25			$ 0.00	$ 0.00
13	**1.3**	✓	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**9.63 días**	**22 sep '25**	**1 oct '25**			**$ 0.00**	**$ 0.00**
14	1.3.1	✓	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASI- FICAR (INCLUYE RE- TIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	6 días	22 sep '25	27 sep '25	M3	0	$ 0.00	$ 0.00
15	1.3.2	✓	BASE GRANULAR BASE GRANULAR (NORMA IN- VIAS 330)	2 días	29 sep '25	30 sep '25	M3	0	$ 0.00	$ 0.00
16	1.3.3	✓	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRAN- TES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	1 día	27 sep '25	27 sep '25	M3	0	$ 0.00	$ 0.00
17	1.3.4	✓	FIN EXCAVACIONES Y RELLENOS	0 días	1 oct '25	1 oct '25			$ 0.00	$ 0.00
18	**1.4**	✓	**CIMIENTOS**	**2 días**	**1 oct '25**	**3 oct '25**			**$ 0.00**	**$ 0.00**
19	1.4.1	✓	BASE ARENA CEMENTO 1:20	2 días	1 oct '25	3 oct '25	M3	0	$ 0.00	$ 0.00
20	1.4.2	✓	FIN CIMIENTOS	0 días	3 oct '25	3 oct '25			$ 0.00	$ 0.00
21	**1.5**	✓	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**	**2.63 días**	**3 oct '25**	**6 oct '25**			**$ 0.00**	**$ 0.00**
22	1.5.1	✓	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	2 días	3 oct '25	4 oct '25	UN	0	$ 0.00	$ 0.00
23	1.5.2	✓	FIN DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS	0 días	6 oct '25	6 oct '25			$ 0.00	$ 0.00
24	**1.6**	✓	**MAMPOSTERIA**	**5 días**	**3 oct '25**	**8 oct '25**			**$ 0.00**	**$ 0.00**
25	1.6.1	✓	MURO LADRILLO REFI-	5 días	3 oct '25	8 oct '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
26	1.6.2	✓	FIN MAMPOSTERIA	0 días	8 oct '25	8 oct '25			$ 0.00	$ 0.00
27	**1.7**	✓	**PAÑETES REVOQUE Y REPELLOS**	**16 días**	**8 oct '25**	**25 oct '25**	**M2**		**$ 7,600,819.31**	**$ 7,600,819.31**
28	1.7.1	✓	ENTRAMADO MADERA CIELO RASO	2 días	8 oct '25	10 oct '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
29	1.7.2	✓	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	14 días	10 oct '25	25 oct '25	M2	183.63	$ 7,600,819.31	$ 7,600,819.31
30	1.7.3	✓	FIN PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS	0 días	25 oct '25	25 oct '25			$ 0.00	$ 0.00
31	**1.8**	✓	**CUBIERTAS**	**15 días**	**25 oct '25**	**8 nov '25**			**$ 2,983,888.42**	**$ 2,983,888.42**
32	1.8.1	✓	TEJA DE BARRO	12 días	28 oct '25	8 nov '25	M2	26.33	$ 2,983,888.42	$ 2,983,888.42
33	1.8.2	✓	ESTRUCTURA DE MA- DERA PARA TEJA DE BARRO	3 días	25 oct '25	27 oct '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
34	1.8.3	✓	FIN CUBIERTAS	0 días	8 nov '25	8 nov '25			$ 0.00	$ 0.00
35	**1.9**	✓	**CARPINTERIA EN MADERA**	**5 días**	**8 nov '25**	**13 nov '25**			**$ 210,189.21**	**$ 210,189.21**
36	1.9.1	✓	CERRADURA DE EN- TRADA PRINCIPAL	1 día	8 nov '25	8 nov '25	UN	1	$ 210,189.21	$ 210,189.21
37	1.9.2	✓	VIDRIO TEMPLADO PU- LIDO 10 MM	5 días	8 nov '25	13 nov '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
38	1.9.3	✓	VIDRIO TRANSPARENTE 4 MM	1 día	8 nov '25	8 nov '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
39	1.9.4	✓	FIN CARPINTERIA EN MADERA	0 días	13 nov '25	13 nov '25			$ 0.00	$ 0.00
40	**1.10**	✓	**CARPINTERIA METALICA**	**51 días**	**6 oct '25**	**27 nov '25**			**$ 922,320.42**	**$ 922,320.42**
41	1.10.1	✓	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18- 0.8	5 días	8 nov '25	13 nov '25	UN	1	$ 285,186.58	$ 285,186.58
42	1.10.2	✓	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	1 día	6 oct '25	6 oct '25	UN	2	$ 637,133.84	$ 637,133.84
43	1.10.3	✓	PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. AN- TICORROSIVO	7 días	13 nov '25	20 nov '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
44	1.10.4	✓	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICORROSIVO	5 días	20 nov '25	25 nov '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
45	1.10.5	✓	TAPA SHUT EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18	1 día	6 oct '25	6 oct '25	UN	0	$ 0.00	$ 0.00
46	1.10.6	✓	FIN CARPINTERIA METALICA	0 días	26 nov '25	26 nov '25			$ 0.00	$ 0.00
47	**1.11**	✓	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**5 días**	**8 nov '25**	**13 nov '25**			**$ 0.00**	**$ 0.00**
48	1.11.1	✓	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	1 día	10 nov '25	10 nov '25	UN	0	$ 0.00	$ 0.00
49	1.11.2	✓	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	1 día	10 nov '25	10 nov '25	UN	0	$ 0.00	$ 0.00
50	1.11.3	✓	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	1 día	11 nov '25	12 nov '25	UN	0	$ 0.00	$ 0.00
51	1.11.4	✓	TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"	1 día	8 nov '25	8 nov '25	ML	0	$ 0.00	$ 0.00
52	1.11.5	✓	LÍNEA A TIERRA TA- BLERO GENERAL (VARI- LLA COOPER WELL)	1 día	12 nov '25	13 nov '25	UN	0	$ 0.00	$ 0.00
53	1.11.6	✓	FIN INSTALACIONES ELECTRICAS	0 días	13 nov '25	13 nov '25			$ 0.00	$ 0.00
54	**1.12**	✓	**PISOS BASES**	**2 días**	**13 nov '25**	**15 nov '25**			**$ 0.00**	**$ 0.00**
55	1.12.1	✓	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 2500 PSI	2 días	13 nov '25	15 nov '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
56	1.12.2	✓	FIN PISOS BASES	0 días	15 nov '25	15 nov '25			$ 0.00	$ 0.00
57	**1.13**	✓	**PISOS Y ENCHAPES**	**23.22 días**	**15 nov '25**	**9 dic '25**			**$ 82,579,065.24**	**$ 82,579,065.24**
58	1.13.1	✓	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CA- LIDAD PRIMERA	12 días	26 nov '25	6 dic '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
59	1.13.2	✓	ADOQUIN CONCRETO 8CM	13 días	15 nov '25	28 nov '25	M2	637.62	$ 82,579,065.24	$ 82,579,065.24
60	1.13.3	✓	CERÁMICA PISO TRÁ- FICO 5, CALIDAD PRIMERA	6 días	26 nov '25	1 dic '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
61	1.13.4	✓	FIN PISOS Y ENCHAPES	0 días	9 dic '25	9 dic '25			$ 0.00	$ 0.00
62	**1.14**	✓	**CIELO RASO**	**7 días**	**9 dic '25**	**15 dic '25**			**$ 0.00**	**$ 0.00**
63	1.14.1	✓	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	7 días	9 dic '25	15 dic '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
64	1.14.2	✓	FIN CIELO RASO	0 días	15 dic '25	15 dic '25			$ 0.00	$ 0.00
65	**1.15**	✓	**APARATOS SANITARIOS**	**1.66 días**	**15 dic '25**	**16 dic '25**			**$ 652,172.15**	**$ 652,172.15**
66	1.15.1	✓	SUMINISTRO E INSTA- LACIÓN LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE 120 X 60 cm (INCLUYE AC- CESORIOS Y GRIFERÍA)	1 día	15 dic '25	15 dic '25	UN	1	$ 652,172.15	$ 652,172.15
67	1.15.2	✓	FIN APARATOS SANITARIOS	0 días	16 dic '25	16 dic '25			$ 0.00	$ 0.00
68	**1.16**		**ACABADOS**	**81 días**	**8 oct '25**	**30 dic '25**			**$ 1,346,600.02**	**$ 1,346,600.02**
69	1.16.1	✓	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMI- LAR	8 días	8 oct '25	17 oct '25	M2	80.62	$ 1,346,600.02	$ 1,346,600.02
70	1.16.2		ESTUCO Y VINILO 3 MA- NOS	14 días	15 dic '25	29 dic '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
71	1.16.3	✓	PINTURA EPÓXICA	3 días	16 dic '25	19 dic '25	M2	0	$ 0.00	$ 0.00
72	1.16.4		FIN ACABADOS	0 días	31 dic '25	31 dic '25			$ 0.00	$ 0.00
73	**1.17**		**INSTALACIONES RED,VOZ Y DATOS**	**8 días**	**31 dic '25**	**9 ene '26**			**$ 0.00**	**$ 0.00**
74	1.17.1		CANALETA PLÁSTICA 40X80 MM	8 días	31 dic '25	9 ene '26	ML	0	$ 0.00	$ 0.00
75	1.17.2		FIN INSTALACION RED,VOZ Y DATOS	0 días	9 ene '26	9 ene '26			$ 0.00	$ 0.00
76	**1.18**		**OBRAS EXTERIORES**	**12 días**	**3 ene '26**	**17 ene '26**			**$ 54,216,925.98**	**$ 0.00**

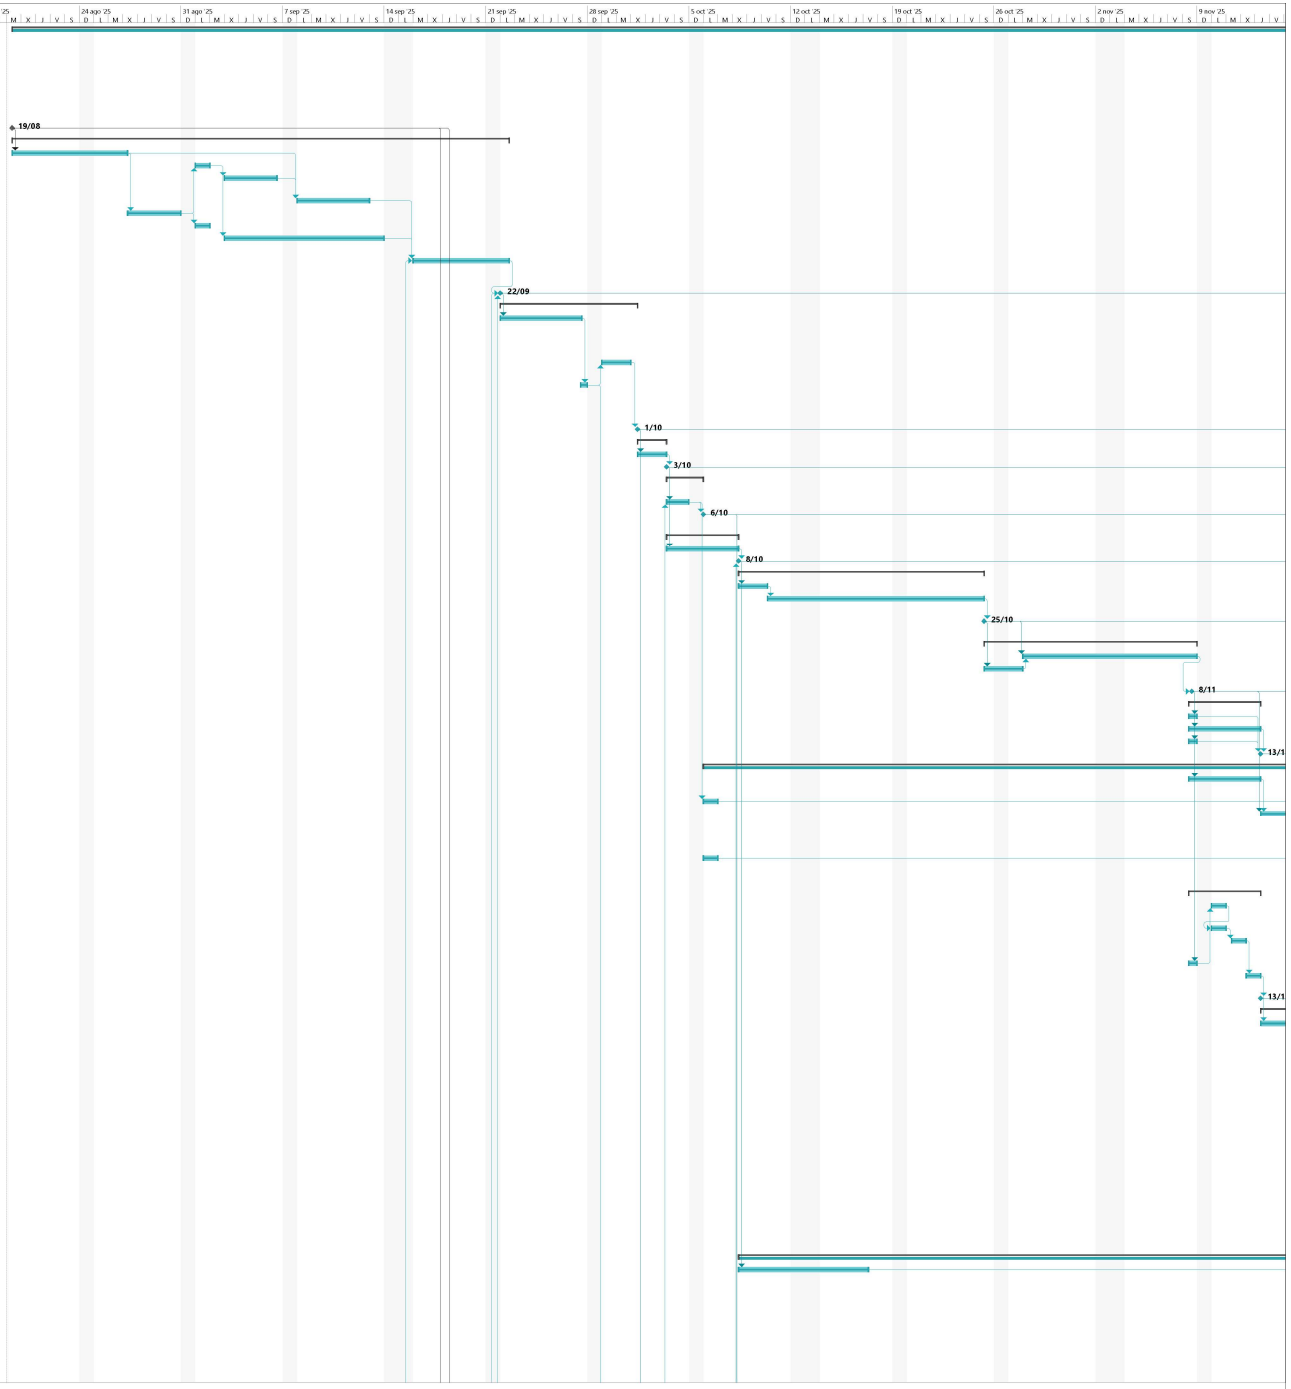


Proyecto: Programacion contra
Fecha: 12 feb '26


Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo	CRTR
77	1.18.2	BOLARDO M-60 CON- CRETO	3 días	3 ene '26	7 ene '26	UN	14	$ 4,072,398.82	$ 0.00
78	1.18.2	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BAR- CELONA	2 días	7 ene '26	9 ene '26	UN	7	$ 9,991,231.32	$ 0.00
79	1.18.3	CICLOPARQUEADERO M101 TIPO 2	1 día	9 ene '26	10 ene '26	UN	3	$ 3,303,560.40	$ 0.00
80	1.18.4	BANCA EN MADERA M- 59	2 días	10 ene '26	13 ene '26	UN	9	$ 8,306,306.19	$ 0.00
81	1.18.5	PROTECTOR DE ÁRBOL CIRCULAR M-60	1 día	13 ene '26	14 ene '26	UN	5	$ 4,923,879.45	$ 0.00
82	1.18.6	POSTE HISTÓRICO M- 131	2 días	14 ene '26	16 ene '26	UN	2	$ 21,830,327.40	$ 0.00
83	1.18.7	BANCA EN CONCRETO M-40	1 día	16 ene '26	17 ene '26	UN	5	$ 1,789,222.40	$ 0.00
84	1.18.8	FIN OBRAS EXTERIORES	0 días	17 ene '26	17 ene '26		0	$ 0.00	$ 0.00
85	**1.19**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**183.88 días**	**18 sep '25**	**23 mar '26**		0	**$ 206,029,524....**	**$ 200,745,589.74**
86	1.19.1	DEMOLICIÓN PLACA MESÓN	1 día	22 sep '25	22 sep '25	M2	6.95	$ 256,941.57	$ 256,941.57
87	1.19.2	DESMONTE DE LAVAPLATOS	1 día	18 sep '25	18 sep '25	UN	10.00	$ 518,460.60	$ 518,460.60
88	1.19.3	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	1 día	18 sep '25	19 sep '25	UN	4.00	$ 186,843.72	$ 186,843.72
89	1.19.4	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	1 día	22 sep '25	22 sep '25	UN	1.00	$ 278,521.95	$ 278,521.95
90	1.19.5	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	3 días	23 sep '25	26 sep '25	M2	93.62	$ 2,837,408.40	$ 2,837,408.40
91	1.19.6	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	2 días	27 sep '25	29 sep '25	M2	72.55	$ 1,531,953.31	$ 1,531,953.31
92	1.19.7	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS HIDRÁULICOS	1 día	25 sep '25	26 sep '25	UN	14.00	$ 1,533,468.72	$ 1,533,468.72
93	1.19.8	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS SANITARIOS	1 día	25 sep '25	26 sep '25	UN	4.00	$ 486,811.92	$ 486,811.92
94	1.19.9	DESMONTE Y RETIRO DE PUNTOS ELECTRICOS	1 día	25 sep '25	26 sep '25	UN	37.00	$ 1,524,427.38	$ 1,524,427.38
95	1.19.10	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	1 día	29 sep '25	29 sep '25	UN	10.00	$ 1,382,202.50	$ 1,382,202.50
96	1.19.11	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	1 día	29 sep '25	29 sep '25	UN	9.00	$ 1,297,631.79	$ 1,297,631.79
97	1.19.12	SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 2"	1 día	29 sep '25	29 sep '25	UN	10.00	$ 1,221,538.50	$ 1,221,538.50
98	1.19.13	MURO EN BLOQUE N° 5 E=0.12 M (LINEAL)	3 días	1 oct '25	4 oct '25	ML	22.30	$ 1,136,088.00	$ 1,136,088.00
99	1.19.14	PLACA BASE CONCRETO 0.10M 3000 PSI	2 días	8 oct '25	10 oct '25	M2	49.28	$ 6,646,170.90	$ 6,646,170.90
100	1.19.15	ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04	2 días	11 oct '25	14 oct '25	M2	97.16	$ 5,010,097.18	$ 5,010,097.18
101	1.19.16	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL D15 M	2 días	14 oct '25	16 oct '25	M2	45.62	$ 7,552,597.55	$ 7,552,597.55
102	1.19.17	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M (LINEAL)	2 días	17 oct '25	18 oct '25	ML	32.50	$ 3,425,883.83	$ 3,425,883.83
103	1.19.18	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E= 1.5 CM (LINEAL)	1 día	20 oct '25	20 oct '25	ML	77.50	$ 2,149,629.13	$ 2,149,629.13
104	1.19.19	COLUMNETA 3000 PSI	2 días	6 oct '25	7 oct '25	ML	23.20	$ 3,501,353.74	$ 3,501,353.74
105	1.19.20	ACERO FIGURADO 6000 PSI	2 días	4 oct '25	6 oct '25	KG	129.05	$ 1,364,484.82	$ 1,364,484.82
106	1.19.21	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	1 día	1 oct '25	2 oct '25	KG	66.04	$ 918,761.92	$ 918,761.92
107	1.19.22	DOVELA. GROUTING 3000 PSI	2 días	17 oct '25	18 oct '25	ML	36.00	$ 346,076.64	$ 346,076.64
108	1.19.23	VIGUETA DE AMARRE	2 días	29 sep '25	30 sep '25	ML	16.34	$ 1,899,176.96	$ 1,899,176.96
109	1.19.24	VIGUETA AEREA	3 días	6 oct '25	8 oct '25	ML	16.34	$ 2,674,799.18	$ 2,674,799.18
110	1.19.25	FILOS O DILATACIONES S/MURO	2 días	14 oct '25	16 oct '25	ML	149.68	$ 2,323,596.40	$ 2,323,596.40
111	1.19.26	CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	5 días	20 oct '25	24 oct '25	M2	67.09	$ 7,495,049.60	$ 7,495,049.60
112	1.19.27	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	1 día	26 nov '25	27 nov '25	ML	5.64	$ 32,930.27	$ 32,930.27
113	1.19.28	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	1 día	27 nov '25	28 nov '25	M2	2.32	$ 70,067.80	$ 70,067.80
114	1.19.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO	5 días	25 oct '25	29 oct '25	M2	171.61	$ 6,356,045.20	$ 6,356,045.20
115	1.19.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO ACRILICO (LINEAL)	2 días	29 oct '25	30 oct '25	ML	40.00	$ 1,001,756.00	$ 1,001,756.00
116	1.19.31	VINILO ANTISEPTICO 2 MANOS	1 día	20 oct '25	20 oct '25	M2	171.61	$ 6,464,003.02	$ 6,464,003.02
117	1.19.32	VINILO ANTISEPTICO 2 MANOS (LINEAL)	1 día	18 sep '25	18 sep '25	ML	40.00	$ 1,075,278.40	$ 1,075,278.40
118	1.19.33	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA	6 días	16 oct '25	22 oct '25	M2	31.21	$ 5,638,249.73	$ 5,638,249.73
119	1.19.34	BALDOSA CERÁMICA PARED CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	2 días	23 oct '25	25 oct '25	ML	3.16	$ 323,481.11	$ 323,481.11
120	1.19.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO	5 días	25 oct '25	29 oct '25	M2	92.00	$ 23,334,993.53	$ 23,334,993.53
121	1.19.36	LAVADA DE FACHADA	5 días	16 oct '25	21 oct '25	M2	145.68	$ 1,861,729.80	$ 1,861,729.80
122	1.19.37	ANCLAJE 1/2" L=15 cm	5 días	22 oct '25	26 oct '25	UN	66.00	$ 1,910,619.48	$ 1,910,619.48
123	1.19.38	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS	3 días	27 oct '25	29 oct '25	UN	1.00	$ 184,553.46	$ 184,553.46
124	1.19.39	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	7 días	30 oct '25	6 nov '25	M2	71.00	$ 5,526,421.32	$ 5,526,421.32
125	1.19.40	MESONES EN CONCRETO 2500 PSI. E=0.1 M (INCLUYE REFUERZO)	2 días	18 oct '25	20 oct '25	M2	11.16	$ 2,115,060.93	$ 2,115,060.93
126	1.19.41	ACABADO EN MICROCEMENTO PARA MESONES	1 día	20 oct '25	20 oct '25	M2	11.16	$ 2,892,342.44	$ 2,892,342.44
127	1.19.42	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	2 días	18 oct '25	20 oct '25	UN	20.00	$ 3,035,778.20	$ 3,035,778.20
128	1.19.43	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE GFCI CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	2 días	20 oct '25	21 oct '25	UN	11.00	$ 2,144,289.84	$ 2,144,289.84
129	1.19.44	SALIDA PARA ILUMINACION INCLUYE INTERRUPTOR SENCILLO CON POLO A TIERRA 120V INCLUYE 3 METROS DE TUBERÍA CONDUIT 1/2" Y 3X#12 LIBRE DE HALOGENOS	2 días	20 oct '25	21 oct '25	UN	12.00	$ 1,668,139.20	$ 1,668,139.20
130	1.19.45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 24W	2 días	22 oct '25	24 oct '25	UN	2.00	$ 212,491.44	$ 212,491.44
131	1.19.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LED PANEL SQ 40W	2 días	25 oct '25	26 oct '25	UN	12.00	$ 1,942,332.00	$ 1,942,332.00
132	1.19.47	LISTON M.H. PINO ROMERON (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	5 días	28 oct '25	1 nov '25	M2	20.26	$ 4,050,954.99	$ 4,050,954.99
133	1.19.48	LISTON M.H. PINO ROMERON LINEAL (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)	5 días	4 nov '25	8 nov '25	ML	28.10	$ 3,724,892.16	$ 3,724,892.16
134	1.19.49	VENTANA EN ALUMINIO CORREDIZA	3 días	20 oct '25	22 oct '25	M2	44.13	$ 22,430,526.90	$ 22,430,526.90
135	1.19.50	REMATES BOCEL WING ALUMINIO	3 días	20 oct '25	22 oct '25	ML	46.45	$ 914,012.91	$ 914,012.91
136	1.19.51	VIDRIO LAMINADO 3+3	5 días	24 oct '25	28 oct '25	M2	60.70	$ 27,580,888.94	$ 27,580,888.94
137	1.19.52	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	3 días	24 oct '25	26 oct '25	M2	2.32	$ 685,805.46	$ 685,805.46
138	1.19.53	PASE MURO PARA CONEXION DE GAS	1 día	20 oct '25	20 oct '25	UN	8.00	$ 602,851.76	$ 602,851.76
139	1.19.54	RESTAURACION Y ADECUACION DE ESTRUCTURA DE MADERA PARA CUBIERTA	3 días	22 oct '25	25 oct '25	M2	26.33	$ 4,133,175.71	$ 4,133,175.71
140	1.19.55	RETIRO DE MANTO EN ASFALTO EXISTENTE	2 días	25 oct '25	26 oct '25	M2	26.33	$ 3,000,454.37	$ 3,000,454.37

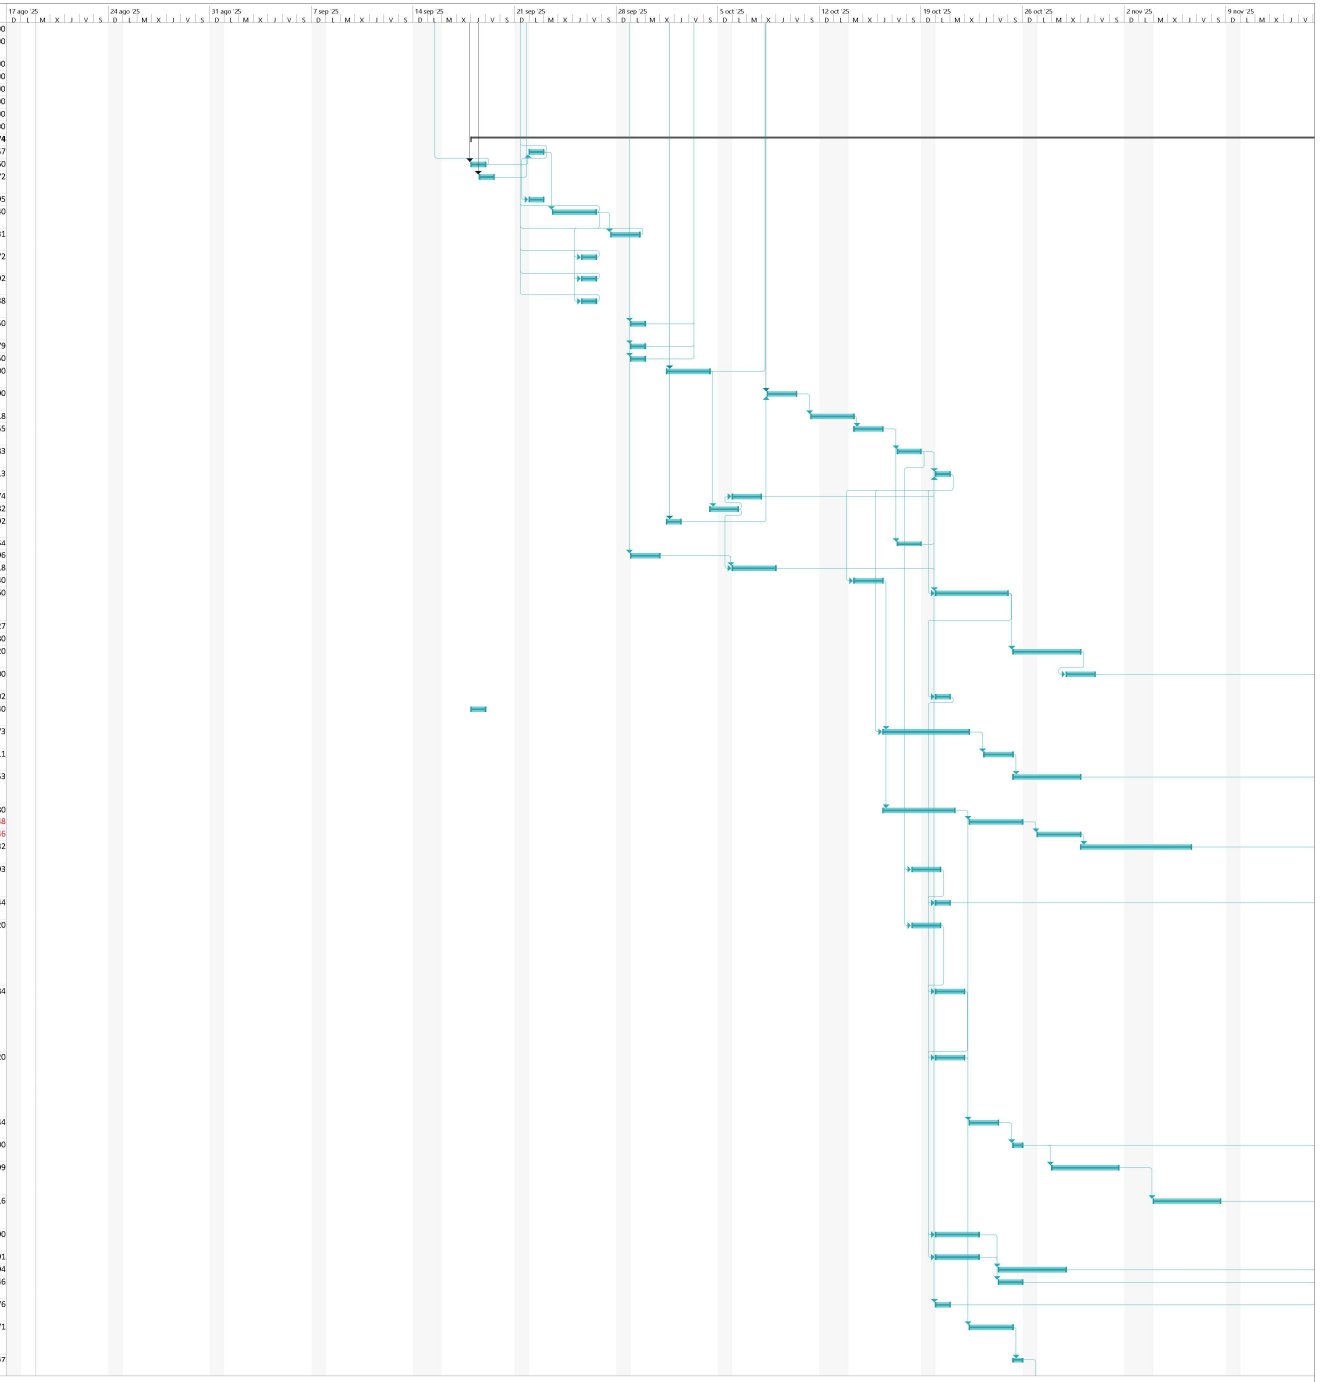


Id	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Unidad	Cantidad	Costo	CRTR
141	1.19.5	AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA TEJA DE BARRO CON MEMBRANA ASFALTICA	2 días	27 oct '25	28 oct '25	M2	26.33	$ 6,331,487.16	$ 6,331,487.16
142	1.19.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA SISTEMA RETRACTIL SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO INC. ANTICORROSIVO	1 día?	25 feb '26	25 feb '26	M2	35.72	$ 1,809,274.81	$ 0.00
143	1.19.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA DE PISO PORCELANATO TRAFICO PESADO	3 días	27 feb '26	28 feb '26	ML	123.30	$ 80,209.64	$ 0.00
144	1.19.5	SUMINISTRO DE MEDIDOR DE AGUA POTABLE	1 día	28 feb '26	28 feb '26	UN	1.00	$ 178,890.32	$ 0.00
145	1.19.6	DEMOLICION DE CAÑUELA	2 días	28 feb '26	3 mar '26	ML	10.00	$ 54,124.35	$ 0.00
146	1.19.6	CÁRCAMO PARA AGUAS LLUVIAS	5 días	4 mar '26	9 mar '26	ML	17.00	$ 348,038.39	$ 0.00
147	1.19.6	REJILLA METALICA EN ANGULO DE 1" Y 1/8", CON MARCO EN ANGULO DE 1 1/4" Y 1/8", Y CONTRA MARCO EN ANGULO DE 1/4" Y 1/8"	2 días	10 mar '26	12 mar '26	ML	17.00	$ 329,862.61	$ 0.00
148	1.19.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 100 X 51 ACERO INOXIDABLE PARA EL KIOSCO. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	1 día	12 mar '26	13 mar '26	UN	1.00	$ 1,258,461.96	$ 0.00
149	1.19.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS PARA EMPOTRAR DOBLE TANQUE 80X43 ACERO INOXIDABLE PARA LOCALES DE COMIDA. INCLUYE REJILLA Y GRIFERIA.	3 días	13 mar '26	16 mar '26	UN	8.00	$ 1,014,273.96	$ 0.00
150	1.19.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SIFONES EN Y	2 días	17 mar '26	19 mar '26	UN	9.00	$ 111,825.07	$ 0.00
151	1.19.6	CAÑUELA EN CONCRETO 2500 PSI 0.30 X 0.12	4 días	19 mar '26	23 mar '26	ML	10.00	$ 98,973.28	$ 0.00
152	1.19.6	FIN ITEMS NO PREVISTOS	0 días	23 mar '26	23 mar '26			$ 0.00	$ 0.00
153	1.20	FIN	0 días	23 mar '26	23 mar '26			$ 0.00	$ 0.00

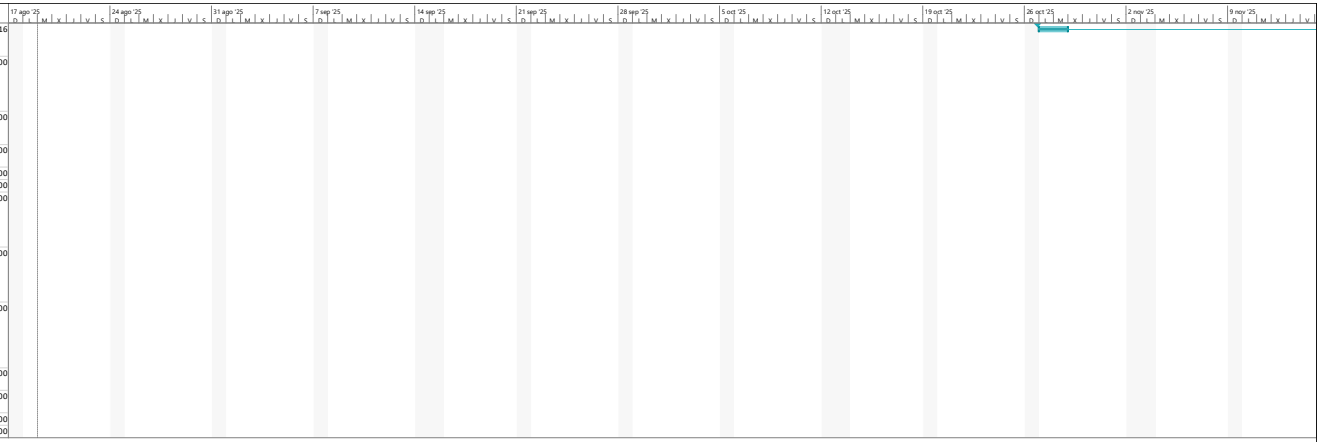

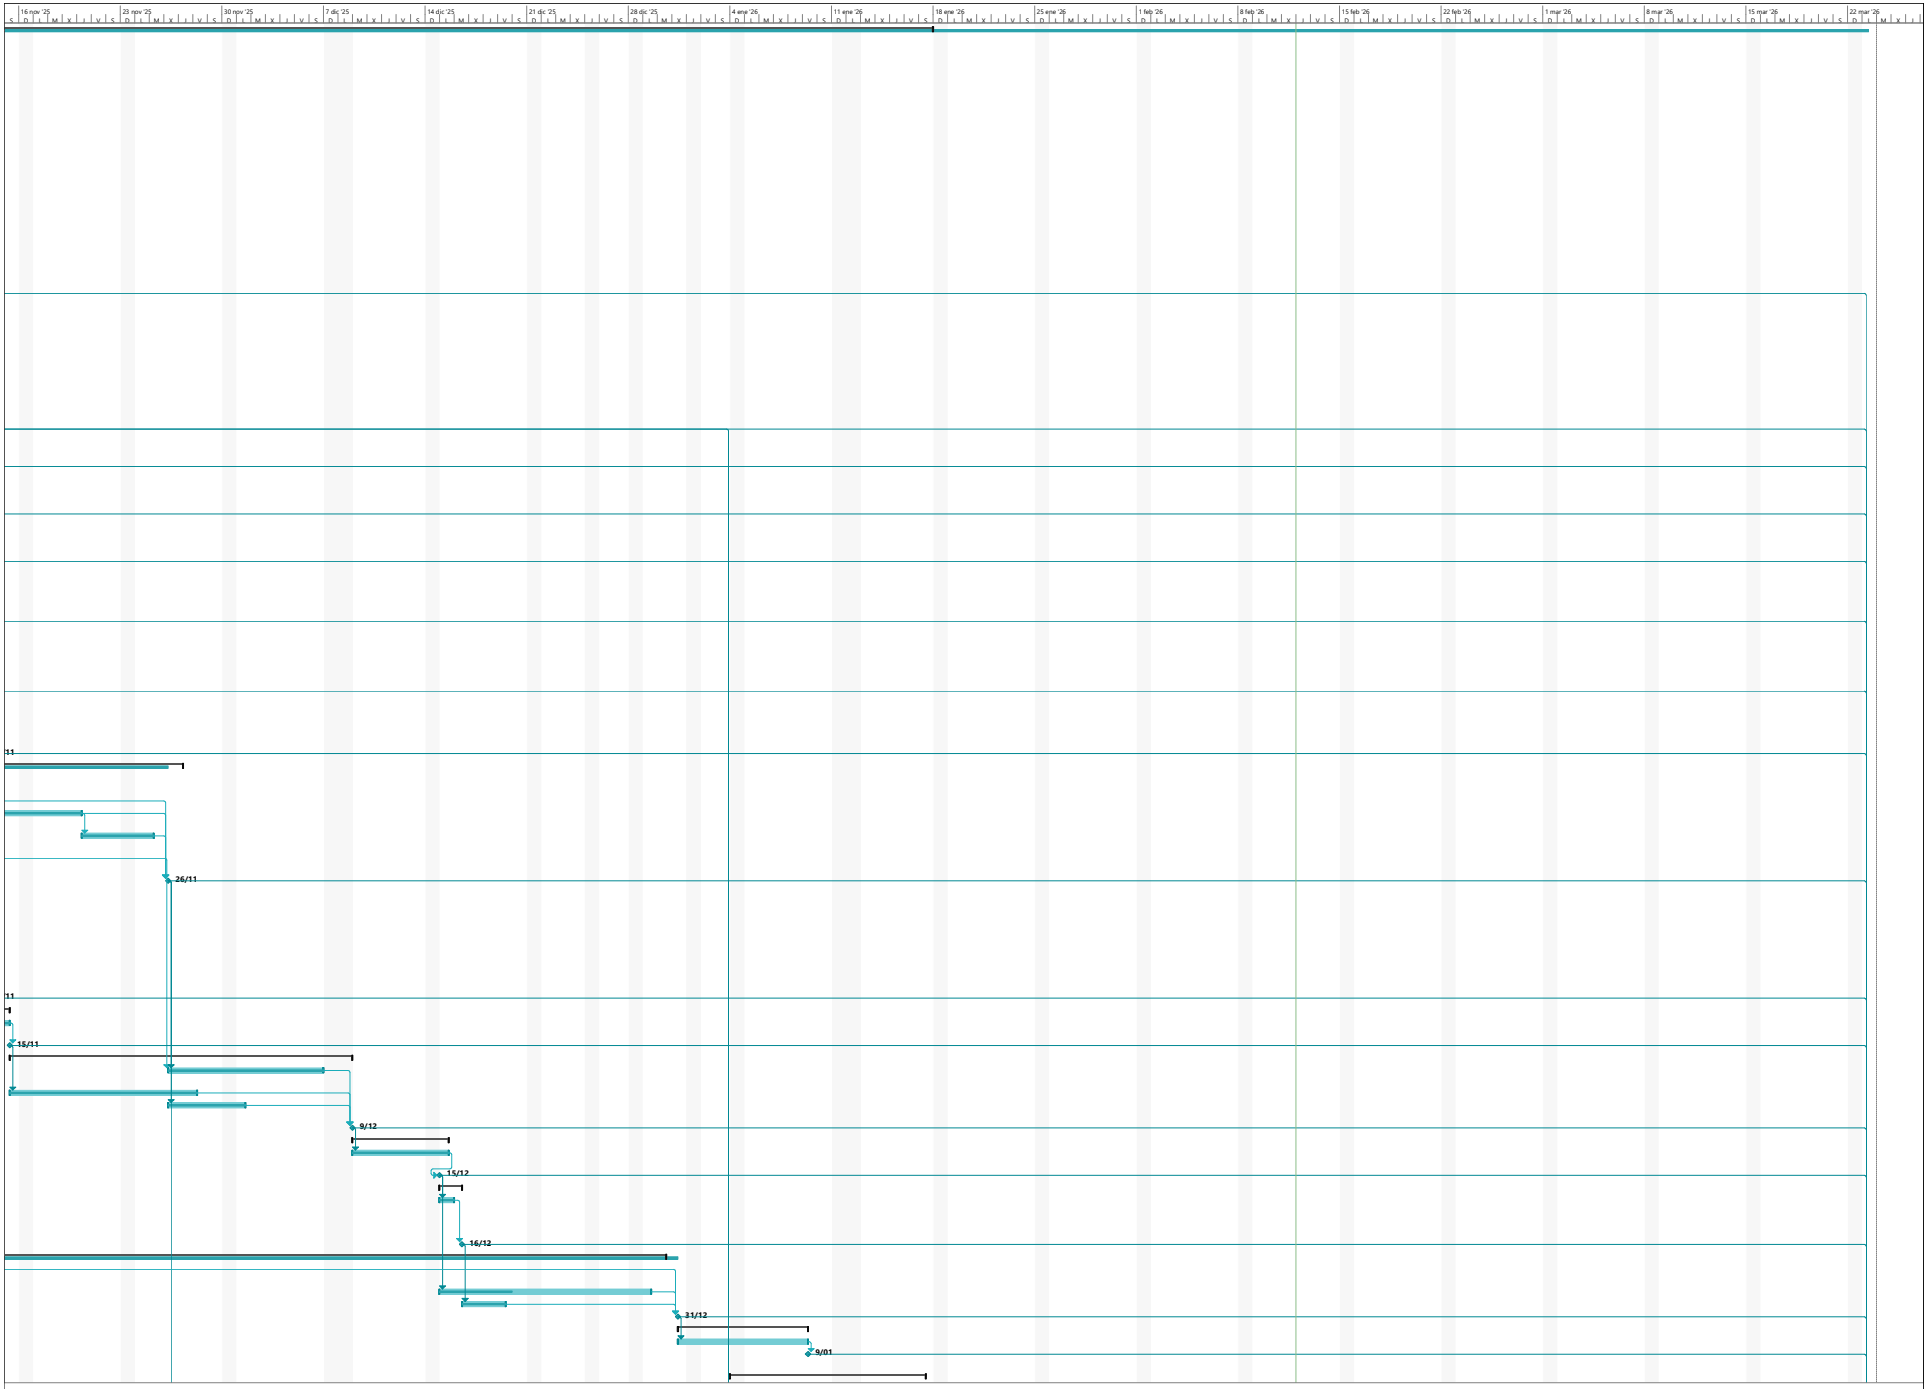


Proyecto: Programacion contra
Fecha: 12 feb '26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

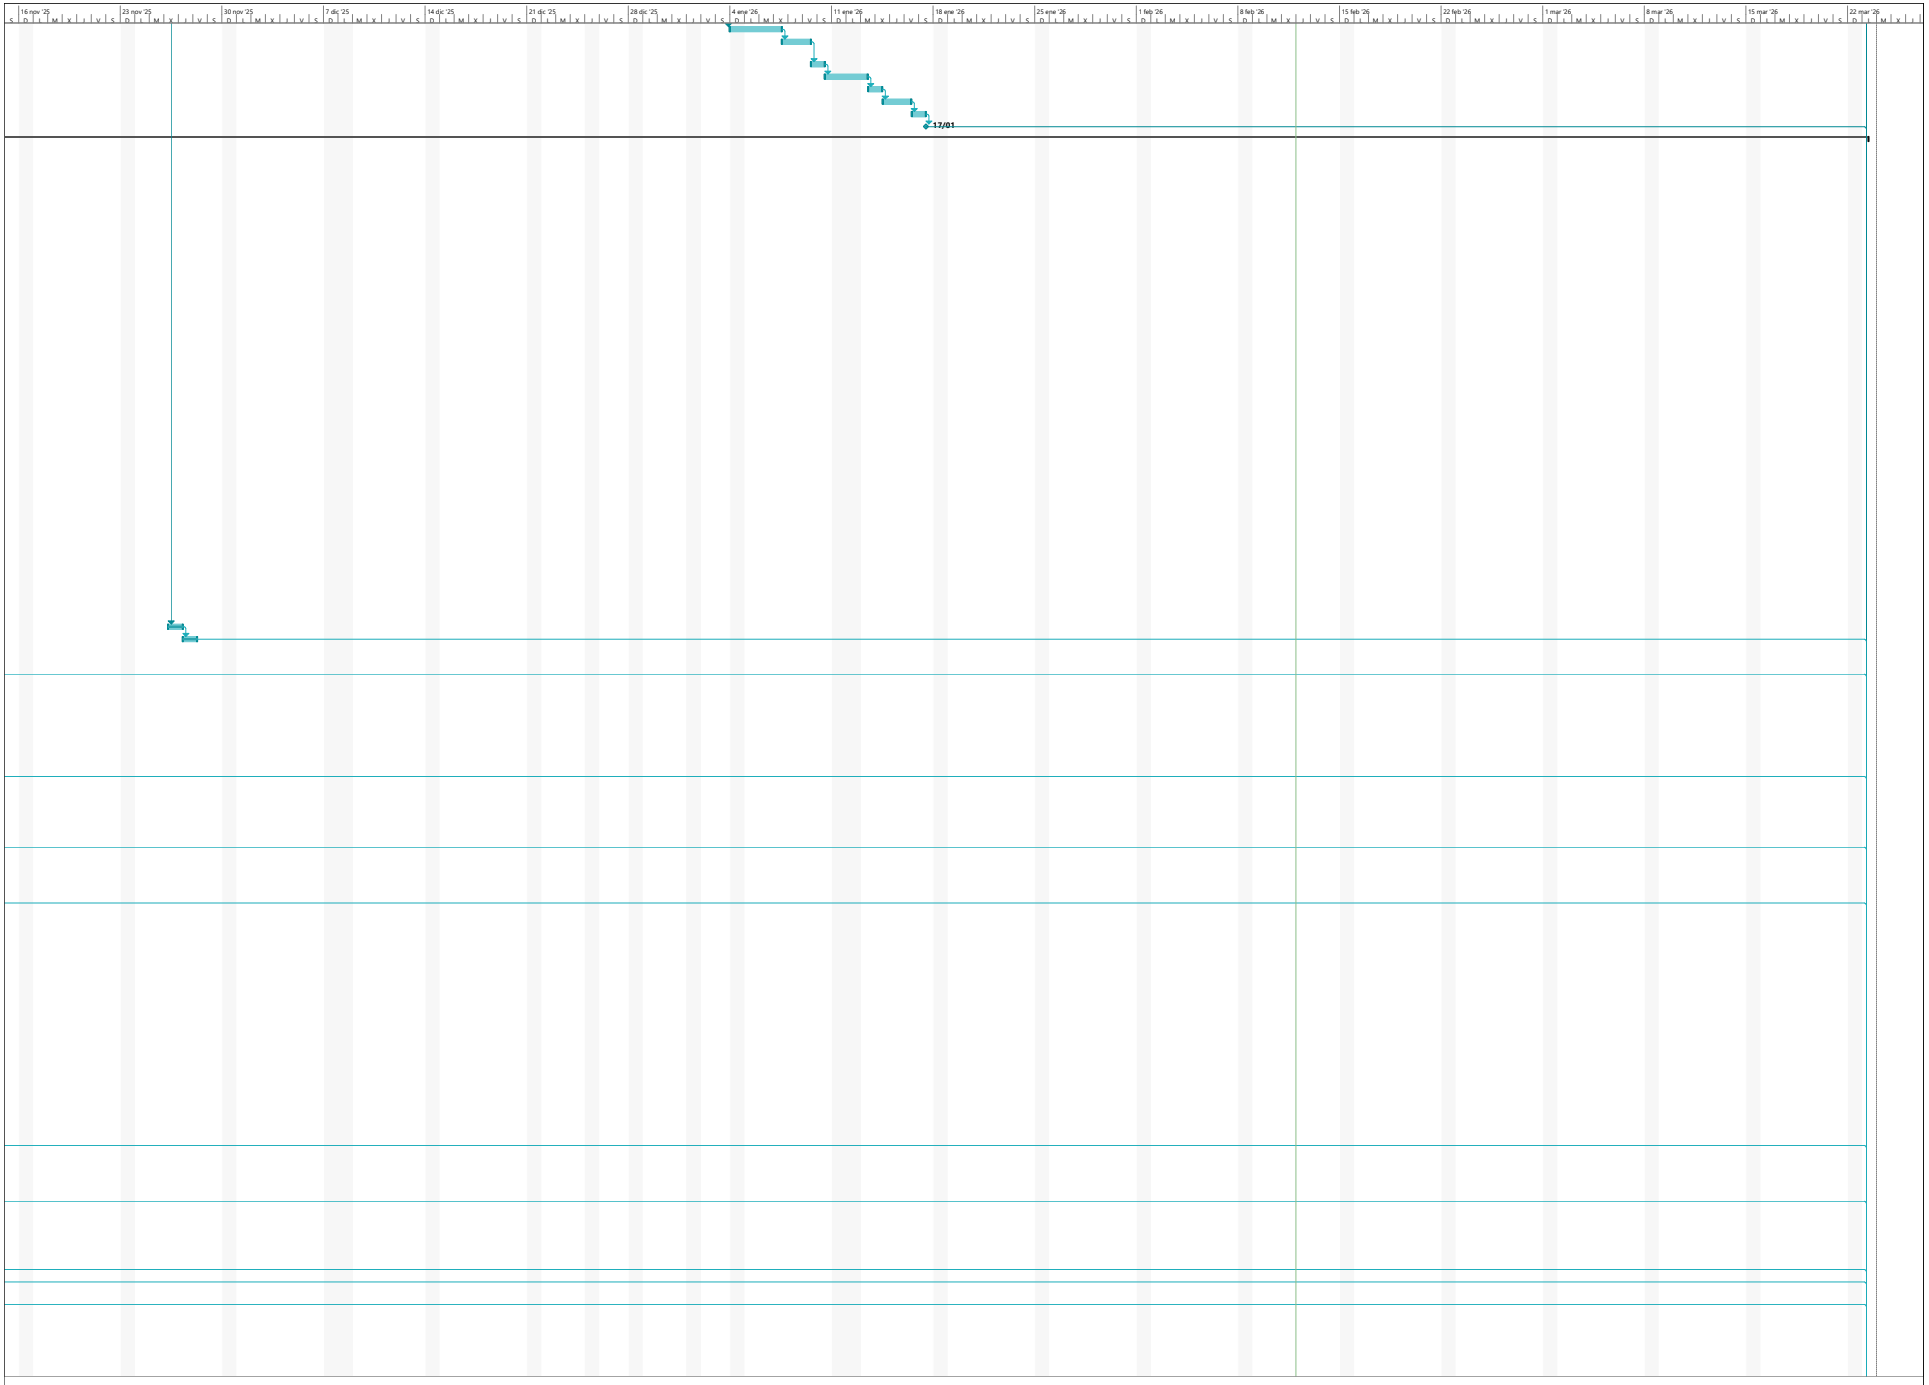

Proyecto: Programacion contra
Fecha: 12 feb '26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso

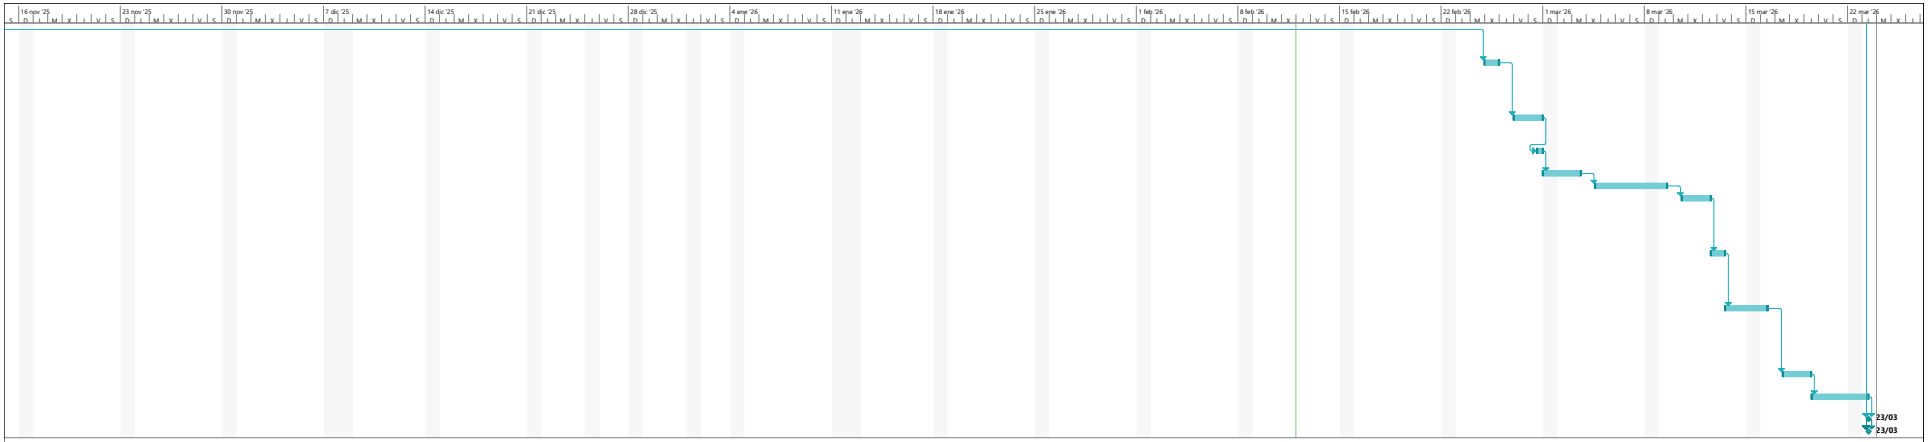

Proyecto: Programacion contra
Fecha: 12 feb '26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
