
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo de tarea	Fin de tarea	Predeceso	Sucesoras	Costo
1		**SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL TAMO VÍA 55BY14 CRUCE RUTA 5502- OICATA- CHIVATA EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CO1.PCCNTR.8562435/3827 DE 2025, CUYO OBJETO ES "PARA EL APOYO AL MEJORAMIENTO MANTENIMEINTO Y**	**90 días**	**día 0**	**día 90**			**$7.878.499,00**
2		INICIO DEL PROYECTO	0 días	día 0	día 0		4	$0,00
3		**REALIZAR MANTENIMIENTO PAVIMENTO FLEXIBLE**	**90 días**	**día 0**	**día 90**			**$5.201.394,00**
4		INICIO DE CAPITULO	0 días	día 0	día 0	2	5	$0,00
5		APERTURA MECANICA DE CAJA Y RETIRO DE SOBRANTES. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	0,41 días	día 0	día 0,410416	4	6	$251.673,00
6		FRESADO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ESPESOR DE 10 CM. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	8 días	día 0,4104166	día 8,410416	5	15	$13.518,00
7		REPOSICIÓN, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL DE BASE GRANULAR PARA REPARCHEO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	8 días	día 24,410416	día 32,41041	14	8	$126.949,00
8		IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA TIPO CRR-1 O SIMILAR	8 días	día 32,410416	día 40,41041	7	9;16	$5.831,00
9		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA PARCHEO (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM) (**)	8 días	día 40,410416	día 48,41041	8	11	$1.373.141,00
10		LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES,INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM).	12 días	día 64,410416	día 76,41041	13	12	$1.459.535,00
11		RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 O SIMILAR	8 días	día 48,410	día 56,41	9	13	$6.783,00
12		LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIAMETRO MENOR O IGUAL A 36", INCLUYE RECTIFICACION DE DESCOLES CON RETIRO DE SOBRANTES Y OBSTACULOS. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM).	12 días	día 76,410416	día 88,41041	10	17	$391.629,00
13		LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS CON RECTIFICACION DE SALIDAS Y DESCOLES,INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA ZONA DE VIA (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM).	8 días	día 56,410416	día 64,41041	11	10	$6.771,00
14		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	8 días	día 16,410416	día 24,41041	15	7	$120.190,00
15		SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM) (**)	8 días	día 8,4104166	día 16,41041	6	14	$126.616,00
16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC- 19. INCLUYE BARRIDO, SOPLADO, SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	8 días	día 40,410416	día 48,41041	8	17	$1.318.758,00
17		FINAL DE CAPITULO	0 días	día 90	día 90	12;16	26	$0,00
18		**SUMINISTRO DE MATERIALES**	**90 días**	**día 0**	**día 90**			**$2.677.105,00**
19		INICIO DE CAPITULO	0 días	día 0	día 0		20;21;22	$0,00
20		SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC- 10. INCLUYE SUMINISTRO (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	90 días	día 0	día 90	19	25	$1.263.274,00
21		SUMINISTRO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE MDC- 19. INCLUYE SUMINISTRO (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM) NORMA INVIAS (**).	90 días	día 0	día 90	19	25	$1.176.834,00
22		SUMINISTRO DE SUBBASE GRANULAR	90 días	día 0	día 90	19	25	$105.853,00
23		SUMINISTRO DE BASE GRANULAR	90 días	día 0	día 90	19	25	$113.217,00
24		SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CRR1 O SIMILAR	90 días	día 0	día 90	19	25	$17.927,00
25		FINAL DE CAPITULO	0 días	día 90	día 90	20;21;22;2	26	$0,00
26		FINAL DE PROYECTO	0 días	día 90	día 90	25;17		$0,00

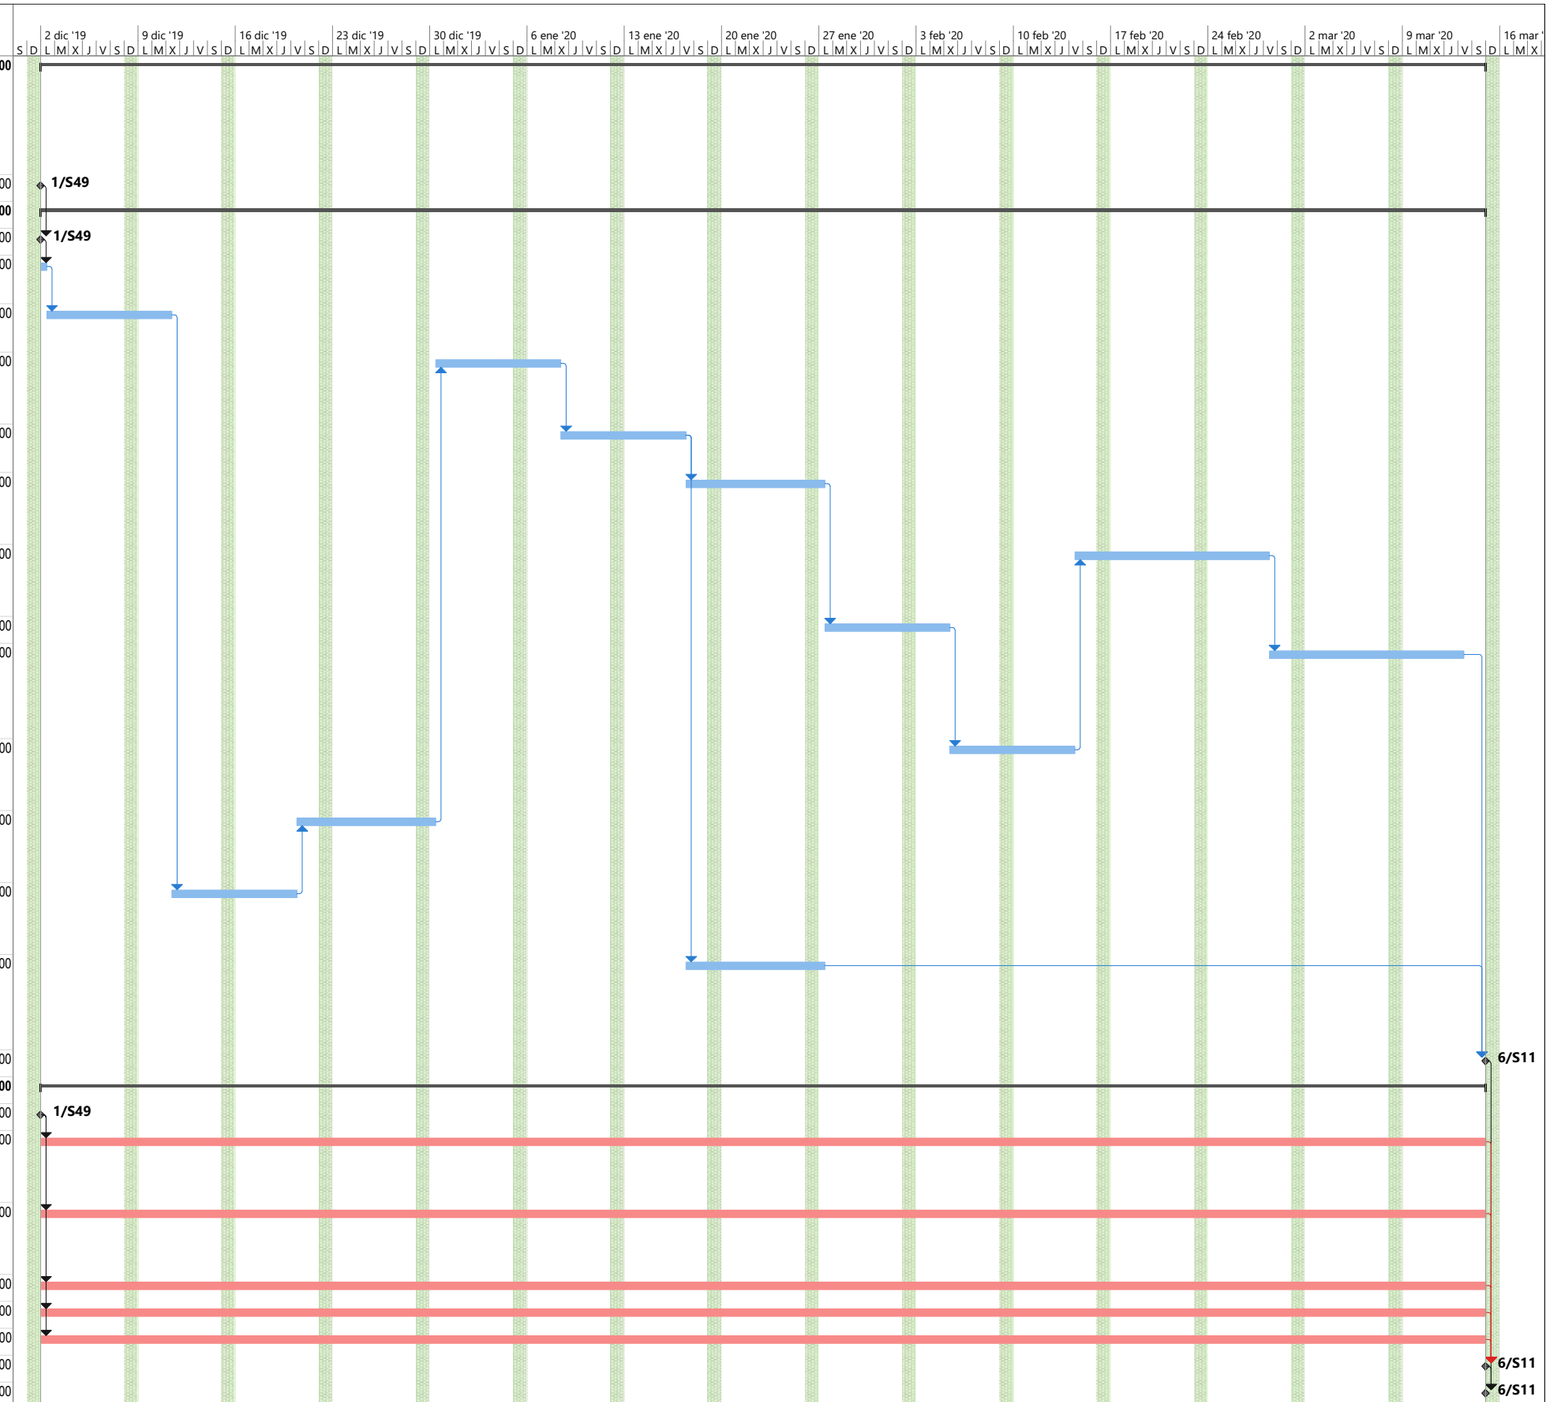

Proyecto: 1). Diagrama de Gant
Fecha: mié 25/02/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
