
PROGRAMACION MODIFICATORIO 03 PLAZA CAMPESINA

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras
1			**PLAZA DE MERCADO - CAJICÁ**	**jue 23/01/25**	**lun 22/12/25**	**253 días?**	
2		**1**	**PRELIMINAR**	**jue 23/01/25**	**vie 7/03/25**	**38 días**	
3		1,01	CAMPAMENTO 18 M2	mar 4/02/25	jue 6/02/25	3 días	4
4		1,02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON ELEMENTOS DE PRESICIÓN	jue 23/01/25	lun 3/02/25	10 días	
5		1,03	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	mié 19/02/25	vie 7/03/25	15 días	69CC+10 días;3
6		**2**	**CIMIENTOS**	**sáb 7/06/25**	**vie 4/07/25**	**22 días**	
7		2,01	VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	vie 20/06/25	vie 4/07/25	11 días	14FC-6 días
8		2,02	ZAPATAS EN CONCRETO 3000PSI	sáb 7/06/25	jue 19/06/25	11 días	16FC-6 días
9		**3**	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS**	**jue 23/01/25**	**mar 24/06/25**	**101 días**	
10		3,01	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
11		3,02	CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
12		3,03	CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80	vie 20/06/25	mar 24/06/25	3 días	70FC+27 días
13		**4**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**sáb 5/04/25**	**lun 3/11/25**	**150 días**	
14		4,01	COLUMNAS 3000 PSI	vie 13/06/25	vie 27/06/25	12 días	8FC-6 días
15		4,02	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	vie 11/04/25	mié 23/04/25	9 días	18FC-6 días
16		4,03	ACERO FIGURADO 60000 PSI	jue 24/04/25	vie 13/06/25	18 días	15
17		4,04	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	mar 14/10/25	lun 3/11/25	18 días	72;39
18		4,05	BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PSI	sáb 5/04/25	sáb 19/04/25	11 días	70FC-10 días
19		**5**	**MAMPOSTERÍA**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
20		5,01	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
21		5,02	ANCLAJE 1/2 L=50CM	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
22		5,03	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO 0.12 M	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
23		5,04	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO E=0.12 M (LINEAL)	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
24		**6**	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
25		6,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
26		6,02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
27		**7**	**CUBIERTAS**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
28		7,01	MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, TRES CAPAS	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
29		**8**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
30		8,01	CAJA CONTADOR DE AGUA	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
31		**9**	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO**	**jue 23/01/25**	**mié 10/09/25**	**165 días**	
32		9,01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
33		9,02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
34		9,03	RED SUMINISTRO PVC 1	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
35		9,04	RED SUMINISTRO PVC 1/2	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
36		9,05	RED SUMINISTRO PVC 3/4	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
37		9,06	RED SANITARIA PVC-S 2	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
38		9,07	RED SANITARIA PVC-S 4	vie 22/08/25	mar 2/09/25	10 días	12;73
39		9,08	RED SANITARIA PVC-S 6	mié 3/09/25	mié 10/09/25	7 días	38
40		9,09	REVENTILACIÓN 2	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
41		9,10	REJILLA METÁLICA TRADICIONAL 3X2 SOSCO	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
42			**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
43		**10**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
44		10,01	TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
45		10,02	TUBERÍA PVC CONDUIT 1	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
46		10,03	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	

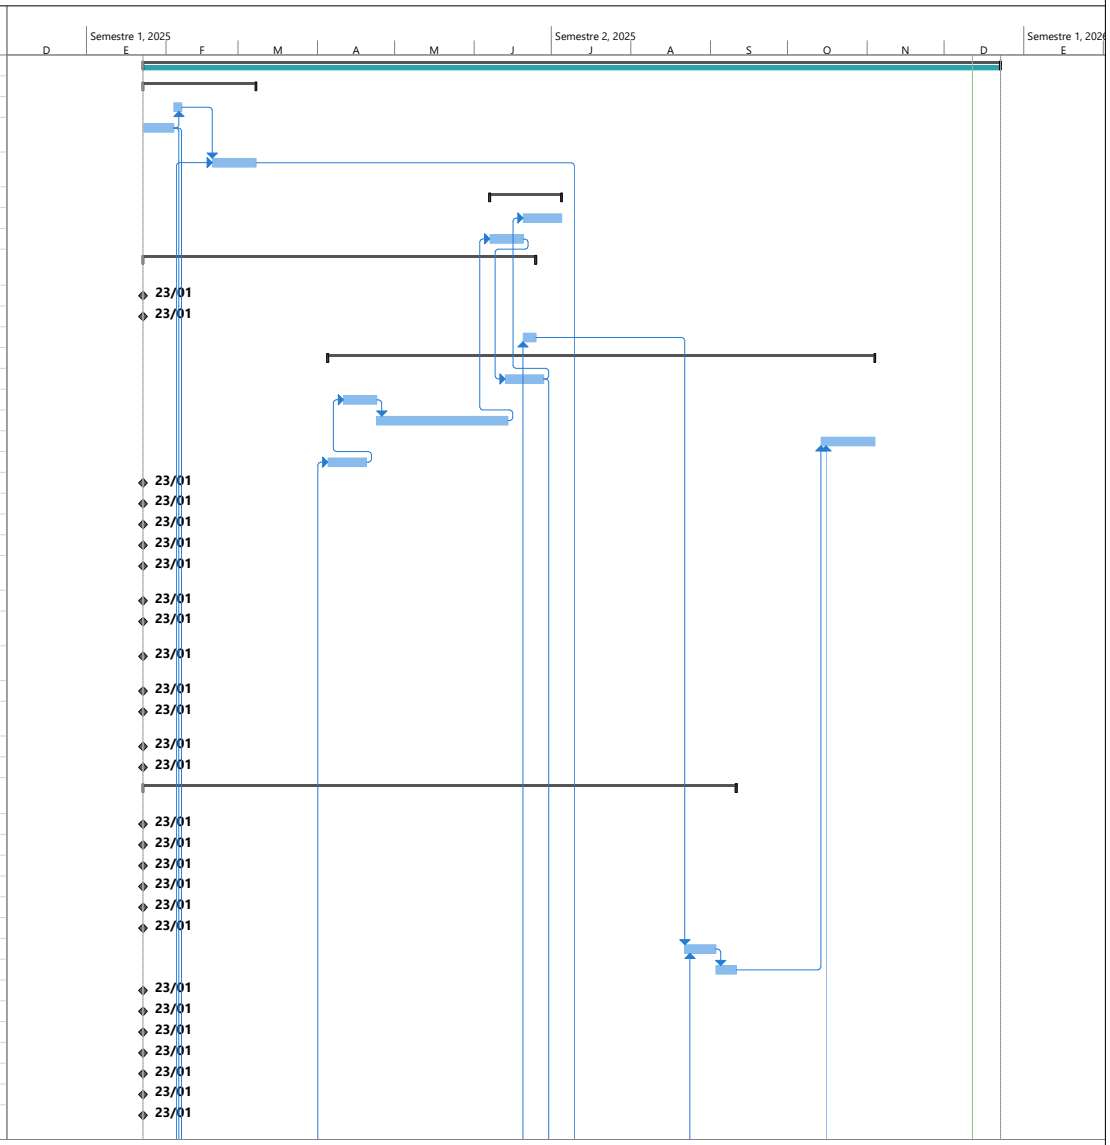


Proyecto: PLAZA CAMPESINA
Fecha: 07/02/2025

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

Julio Roberto Montenegro Salcedo
R/L UNION TEMPORALPLAZA CAMPESINA
NIT: 901.896.775-2

PROGRAMACION MODIFICATORIO 03 PLAZA CAMPESINA

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras
47		10,04	SALIDA TOMA DOBLE PVC GFCI	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
48		10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 120X30 DE 45 W	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
49		10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALÓGENOS 4 No	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
50		10,07	ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DOBLE ACCI	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
51		10,08	PANEL DE CONTROL INTELIGENTE CON PUERTO ETHERNET	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
52		11	**DETECCIÓN DE INCENDIO**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
53		11,01	SALIDA DETECTOR FOTOELÉCTRICO. INCLUYE TUBERÍA IMC 3/4. CABLE 2X18 FPLR, CAJAS Y APARATO.	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
54		11,02	SALIDA SIRENA CON ESTROBO. INCLUYE TUBERÍA IMC 3/4. CABLE 2X18 FPLR, CAJAS Y	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
55		11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE INCENDIO SEGÚN ESPECIFICACIONES. INCLUYE CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA.	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
56		12	**APANTALLAMIENTO**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**1 día**	
57		12,01	PUNTA CAPTORA EN ALUMINIO 0.6MTS	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
58		12,02	GRAPA BIMETÁLICA DE PARA APANTALLAMIENT	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
59		12,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE EN COBRE 2/0 PARA ANILLO PERIMETRAL	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
60		13	**PISOS BASES**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
61		13,01	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
62		14	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
63		14,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
64		14,02	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
65		14,03	GUARDAESCOBA EN GRANITO	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
66		14,04	TAPA REGISTRO 20X20	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
67		14,05	MEDIA CAÑA EN GRANITO	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
68		15	**URBANISMO**	**vie 7/02/25**	**lun 13/10/25**	**180 días**	
69		15,01	EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	vie 7/02/25	mar 1/04/25	45 días	4;138
70		15,02	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	lun 17/02/25	mié 16/04/25	50 días	69CC+8 días
71		15,03	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	jue 10/07/25	sáb 26/07/25	15 días	70;5;147
72		15,04	SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	vie 22/08/25	lun 13/10/25	45 días	73CC+20 días
73		15,05	BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	lun 28/07/25	jue 21/08/25	20 días	71;152
74		15,06	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	lun 17/02/25	mié 16/04/25	50 días	70FF
75		16	**INSTALACIONES RED GASES**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
76		16,01	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO 1/2 SCH 40 (INCLUYE ACCESORIOS)	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
77		16,02	TUBERÍA DE POLIETILENO 1/2 (INCLUYE ACCESORIOS)	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
78		16,03	VÁLVULA DE BOLA GAS 1/2	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
79		16,04	VÁLVULA POLIETILENO GAS 1/2	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
80		16,05	ESTACIONES REGULADORAS	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
81		17	**INSTALACIONES RED VOZ Y DATOS**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
82		17,01	SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
83		17,02	SALIDA DE DATOS COMPLETA (INCLUYE FACE PLATE Y MARCACIÓN)	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	

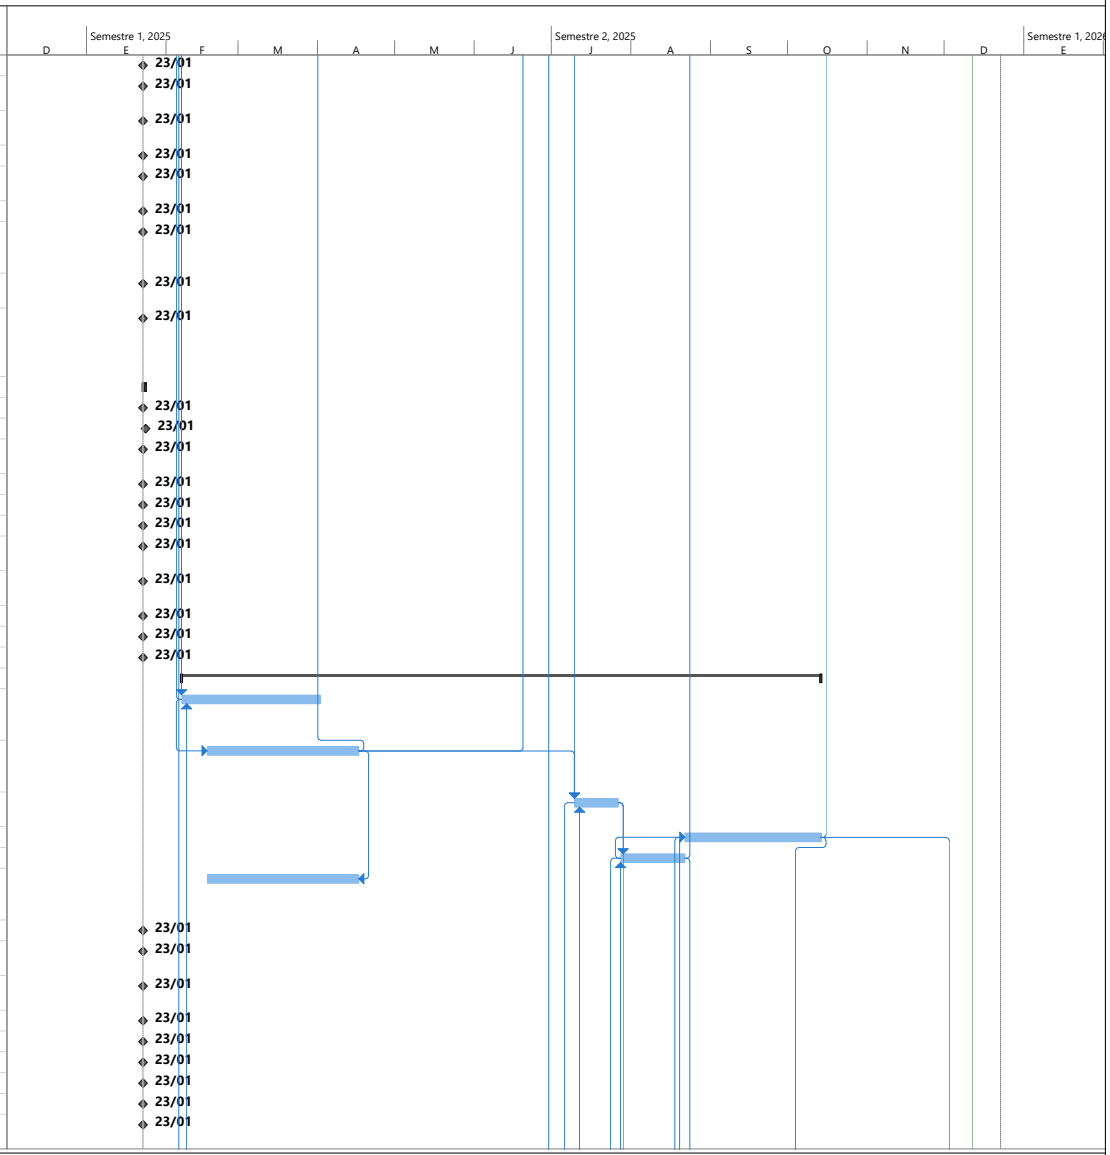


Proyecto: PLAZA CAMPESINA
Fecha: 07/02/2025

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

Julio Roberto Montenegro Salcedo
R/L UNION TEMPORALPLAZA CAMPESINA
NIT: 901.896.775-2

PROGRAMACION MODIFICATORIO 03 PLAZA CAMPESINA

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras
84		17,03	CANALETA PLÁSTICA 20X12 MM	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
85		17,04	SWITCH 10/100/1000 24 PUERTOS	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
86		**18**	**ANDENES Y SARDINELES**	**jue 23/01/25**	**sáb 29/11/25**	**234 días**	
87			ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM 2	mié 27/08/25	sáb 29/11/25	82 días	
88		18,02	ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
89		18,03	SARDINEL PREFABRICADO A-10	mié 3/09/25	jue 25/09/25	20 días	72CC+10 días
90		18,04	BORDILLO PREFABRICADO A-80	jue 20/11/25	mar 25/11/25	5 días	139
91		**19**	**SEÑALIZACIÓN**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
92		19,01	LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FF	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
93		19,02	SEÑALES DE TRÁNSITO INFORMATIVAS (1.4 X 0.95 M)	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
94		**20**	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**	**jue 23/01/25**	**mar 16/12/25**	**248 días**	
95		20,01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRF	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
96		20,02	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
97		20,03	CONCRETO PARA PAVIMENTO RÍGIDO MR- 41, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNIÓN	mié 3/12/25	mar 16/12/25	12 días	72FC+43 días
98		**21**	**OBRAS DE ARTE**	**jue 23/01/25**	**jue 23/01/25**	**0 días**	
99		21,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2500 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
100		**22**	**ITEMS**	**jue 23/01/25**	**lun 13/10/25**	**193 días**	
101		22,01	PLACA BASE CONCRETO 0.15 3000 PSI	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
102		22,02	ESTRUCTURA METALICA ASTM A500 GR C	vie 22/08/25	lun 13/10/25	45 días	72CC;148
103		22,03	MESÓN EN ACERO INOXIDABLLE, ENTREPAÑOS SUPERIOR E INFRERIOR ACERO INOXIDABLE (SEGÚN DETALLE	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
104		22,04	AFINADO IMPERMEABILIZADO CUBIERTAS PLANAS EN MORTERO 1:4 E=0.03 M	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
105		22,05	PT-03 MARCO METÁLICO, 3 HOJAS ENTAMBORADAS EN LAMINA METALICA ACABADO COLOR VERDE ILUSTRE CON REJILLA FIJA REF. ALN-315. EN LÁMINA METÁLICA. DEBE CUMPLIR NORMA NSR10.	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
106		22,06	BALDOSA TIPO CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA EXTERIORES	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
107		22,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA EN TEJIDO EN POLIESTER RECUBRIMIENTO CON PVC	sáb 4/10/25	sáb 4/10/25	0 días	102FC-8 días
108		22,08	Suministro e instalación de barandas en tuberia AN tubería de 50mm y 40mm según diseño. Incluye anticorrosivo y pintura	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
109		22,09	ENTREPISO LÁMINA COLABORANTE 2, CAL 20, H=10 CM, CONCRETO DE 3000 PSI	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
110		22,10	SOPORTE TIPO PERA 3/4	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
111		22,11	SOPORTE TIPO PERA 1/2	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
112		22,12	ACCESORIO RANURADO 1 1/2	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
113		22,13	ACOPLE RANURADO 1 1/2	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
114		22,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA ROJA ACERO NEGRO SCH 10 1 1/4	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
115		22,15	ACCESORIO RANURADO 1 1/4	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
116		22,16	ACOPLE RANURADO 1 1/4	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
117		22,17	SUMIDERO PREFABRICADO SL-100	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
118		22,18	EMPRADIZACIÓN (INCLUYE 10 CM DE TIERRA NEGRA)	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
119		22,19	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO A B-20	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
120		22,20	SUMINISTRAR E INSTALAR LUMINARIAS ALUTRAFIC ALURBAN DE 35W.	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	

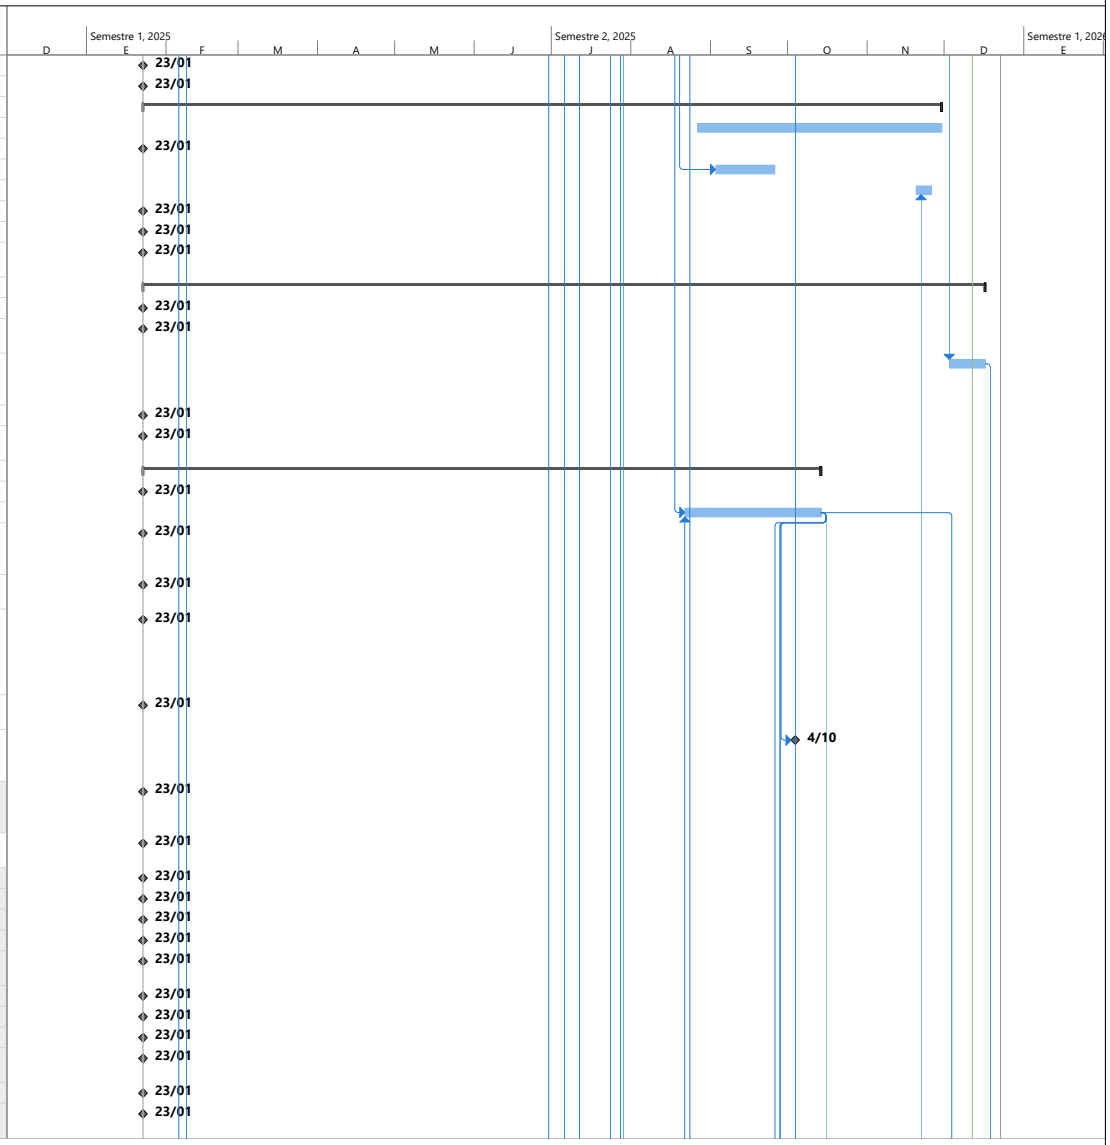


Proyecto: PLAZA CAMPESINA
Fecha: 07/02/2025

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

Julio Roberto Montenegro Salcedo
R/L UNION TEMPORALPLAZA CAMPESINA
NIT: 901.896.775-2

PROGRAMACION MODIFICATORIO 03 PLAZA CAMPESINA

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras
121		22,21	SUMINISTRAR, INSTALAR Y DERIVAR PARCIAL TRIFASICA EN DUCTO PVC DE 3" CON DUCTO DE RESERVA DEL MISMO DIAMETRO, CON CABLE DE ALUMINIO AISLADO 3X6 AWG	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
122		22,22	SUMINISTRAR E INSTALAR MATERIAL PARA LA CONTRUCCION DE CAJA TIPO NORMA CS274 PARA DERIVACION ELECTRICA DE LUMINARIAS	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
123		22,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES METALICOS DE 6 METROS	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
124		**23**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**jue 23/01/25**	**mié 17/12/25**	**249 días**	
125		23,01	SALIDA TOMA MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA EN MURO O PISO. CABLE Cu 2No.12+1No.12T, INCLUYE TUBO PVC, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS NEMA, DESDE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
126		23,02	TUBERÍA PVC CONDUIT 2 INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
127		23,03	SALIDA ILUMINACIÓN CABLE Cu 3X12 AWG EN EMT , INCLUYE TUBO EMT, CAJAS INYECTADAS EN ALUMINIO 5800/2400,, HASTA 5 M INCLUYE TODOS TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN.	jue 23/10/25	jue 11/12/25	43 días	
128		23,04	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO, CABLE CU 2NO.12+1NO.12T CU LIBRE DE HALOGENOS LSZH INCLUYE APARATO Y TODOS LOS ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
129		23,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE NORMAL CON POLO A TIERRA, INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS TIPO CUCHILLA 3M O SIMILAR, MARCACIÓN EN ACRÍLICO FONDO NEGRO LETRA BLNCA 2X1CM, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN Y FUNC	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
130		23,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI (CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO DE FALLA A TIERRA PARA ZONAS HÚMEDAS), INCLUYE CONECTORES CERTIFICADOS TIPO CUCHILLA 3M O SIMILAR, MARCACIÓN EN ACRÍLICO FONDO NEGRO LETRA BLNCA 2X1CM, Y DEMÁS ELEMENTOS Y ACCESOR	vie 21/11/25	vie 28/11/25	7 días	131
131		23,07	SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INPECCIÓN NORMA CODENSA CS-274	vie 17/10/25	jue 20/11/25	30 días	
132		23,08	RAMAL EN 2X#4 + #8 AWG EN TUBERIA PVC 1 RIGIDA	mié 15/10/25	vie 21/11/25	33 días	
133		23,09	RAMAL EN 2X#10 + #12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4 RIGIDA	sáb 22/11/25	sáb 22/11/25	0 días	
134		23,10	RAMAL EN 2X#8 + #12 AWG EN TUBERIA PVC 3/4 RIGIDA	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
135		23,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS MONOFASICO INCLUYE 12 BREAKER TIPO RIEL	jue 23/01/25	jue 23/01/25	0 días	
136		23,12	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS WALL PACK DE 38 W	jue 11/12/25	mié 17/12/25	6 días	
137		**24**	**ITEMS NO PREVISTOS**	jue 23/01/25	lun 22/12/25	253 días?	
138		INP1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	mar 4/02/25	jue 6/02/25	3 días	4
139		INP2	BORDILLO DE 10X20 CM FUNIDIO EN CONCRETO DE 2500 PSI	mié 8/10/25	mié 19/11/25	37 días	72FC-5 días
140		INP3	TEJA TERMOACUSTICA	mar 30/09/25	lun 13/10/25	11.5 días	102FC-12 días

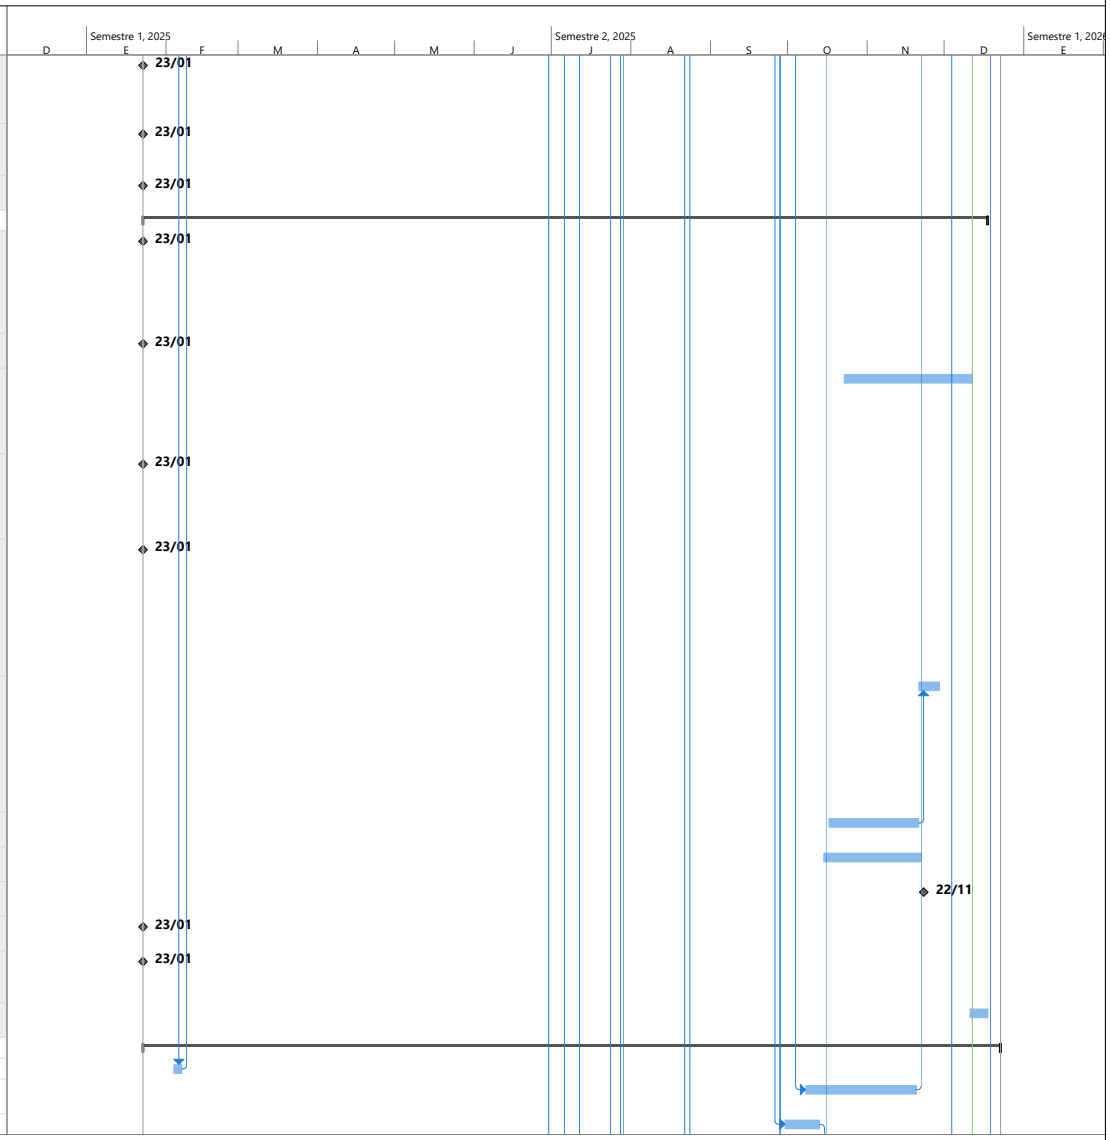


Proyecto: PLAZA CAMPESINA
Fecha: 07/02/2025

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual		
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso			

Julio Roberto Montenegro Salcedo
R/L UNION TEMPORALPLAZA CAMPESINA
NIT: 901.896.775-2

PROGRAMACION MODIFICATORIO 03 PLAZA CAMPESINA

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras
141		INP4	CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA	lun 13/10/25	mié 15/10/25	2 días	140
142		INP5	SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAMA DE ARENA LAVADA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUPERFICIES	mié 17/12/25	vie 19/12/25	3 días	97
143		INP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANAL EN LAMINA CAL. 18 Ds 0.60 m	jue 2/10/25	vie 10/10/25	8 días	102FC-10 días
144		INP7	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	lun 28/07/25	mar 5/08/25	8 días	71
145		INP8	RAJON PARA MEJORAMIENTO DE LA SUB RASANTE	lun 28/07/25	mié 27/08/25	25 días	73CC
146		INP9	FILTRO DE DRENAJE DE 0,6 X 1,0 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PERFORADA D=4", GRAVA COMUN 1/2" Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB: ENTRE	vie 22/08/25	lun 8/09/25	15 días	73
147		INP10	DEMOLICION PLACA DE PISO 0,15 M	sáb 5/07/25	mié 9/07/25	4 días	148
148		INP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIO DE ANCLAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CIMENTACIÓN (PEDESTALES)	sáb 28/06/25	vie 4/07/25	5 días	14
149		INP12	PLACA BASE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E:0,15 M DILATADA CADA 2,5 MTS EN X y Y CON SELLADOR POLIURETANO ELASTOMERICO, INCLUYE CORTE DE LOSA Y CORDON DE YUMBOLO EN LAS DILATACIONES	jue 4/12/25	mié 17/12/25	12 días	102FC-8 días
150		INP13	MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M	jue 2/10/25	sáb 1/11/25	27 días	102FC-10 días
151		INP14	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	lun 3/11/25	lun 15/12/25	37 días	150
152		INP15	CERCA EN TEJA DE ZINC H=2.14 M	jue 10/07/25	vie 18/07/25	8 días	71CC
153		INP 16	CERCA EN TEJA DE ZINC H=2.14 M	jue 23/01/25	mié 29/01/26	días	
154		INP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA DE SUPLEMENTO PARA ANCLAJE DE CUBIERTA	jue 23/01/25	jue 23/01/25	1 día?	
155		INP 18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	mar 14/10/25	sáb 25/10/25	11 días?	102
156		INP 19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LONA RECUBIERTA BLACKOUT INCLUYE TENSORES Y ACCESORIOS DE FIJACION	vie 17/10/25	lun 20/10/25	3 días	155CC+3 días
157		INP 20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DE CONEXIÓN DE ESTRUCTURA METALICA PARA MEMBRANA	**vie 17/10/25**	**mié 22/10/25**	**5 días**	**156CC**
158		INP 21	MESON EN CONCRETO 0.60M 3000 PSI DILATADO Y QUEMADO CON SIKAFLOOR, INCLUYE REFUERZO E=0.08	jue 23/10/25	vie 14/11/25	20 días	157
159		INP 22	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M	lun 13/10/25	jue 23/10/25	9 días	158CF
160		INP 23	DOVELA, GROUTING 3000 PSI INCLUYE ANCLAJE DE MEDIA L=1.00 M	jue 23/10/25	jue 30/10/25	7 días	159
161		INP 24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT EMT GALVANIZADA 1/2".	mar 21/10/25	jue 6/11/25	15 días	156
162		INP 25	RAMAL EN 2X#10 + #12 AWG	vie 7/11/25	jue 27/11/25	18 días	161
163		INP 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA	mar 21/10/25	vie 24/10/25	4 días	156
164		INP 27	SUMINISTRO E INSTALACIION DE ALAMBRON 8 MM PARA APANTALLAMIENTO . INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN	vie 7/11/25	sáb 8/11/25	2 días	161
165		INP 28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (VARILLA COOPER WELL)	sáb 25/10/25	lun 27/10/25	2 días	163
166		INP 29	PLACA BASE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E:0,15 M	jue 4/12/25	mié 17/12/25	12 días	149CC
167		INP 30	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE	jue 18/12/25	lun 22/12/25	4 días	166

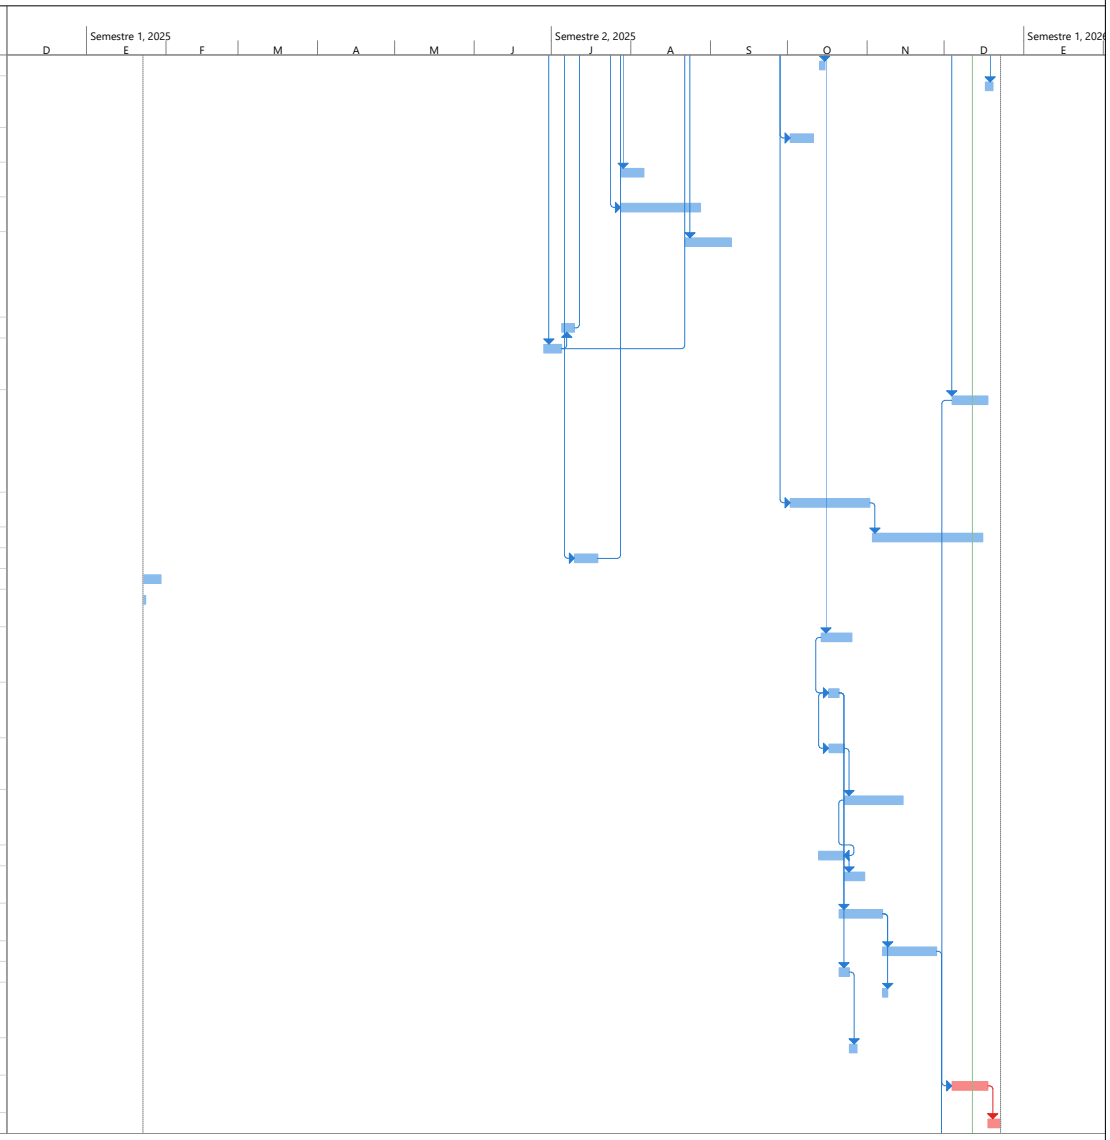


Proyecto: PLAZA CAMPESINA
Fecha: 07/02/2025

Tarea · Resumen del proyecto · Tarea manual · solo el comienzo · Fecha límite · Progreso manual
División · Tarea inactiva · solo duración · solo fin · Tareas críticas
Hito · Hito inactivo · Informe de resumen manual · Tareas externas · División crítica
Resumen · Resumen inactivo · Resumen manual · Hito externo · Progreso

Julio Roberto Montenegro Salcedo
R/L UNION TEMPORALPLAZA CAMPESINA
NIT: 901.896.775-2

PROGRAMACION MODIFICATORIO 03 PLAZA CAMPESINA

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	Predecesoras
168		INP 31	SUMINISTRO DE TACO TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 30A	vie 28/11/25	sáb 29/11/25	2 días	162



Proyecto: PLAZA CAMPESINA
Fecha: 07/02/2025

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite	Progreso manual				
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Tareas críticas					
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	División crítica					
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	Progreso					

Julio Roberto Montenegro Salcedo
R/L UNION TEMPORALPLAZA CAMPESINA
NIT: 901.896.775-2
