

CORTE - BLOQUE TIPO 3



FACHADA TRANSVERSAL

PLANTA - BLOQUE TIPO 3

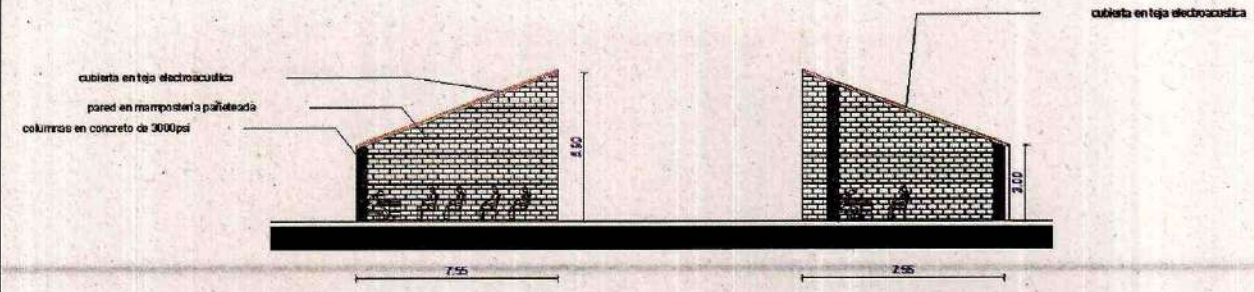

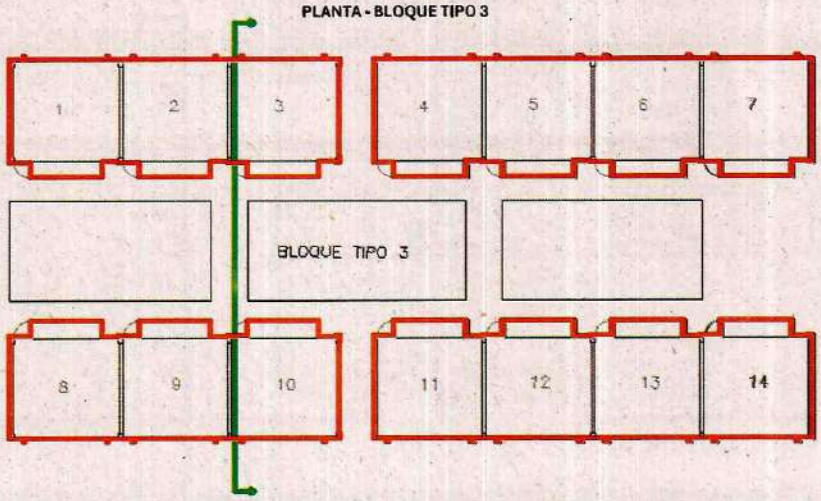





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-



2144/12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	PINTURA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	6,01	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)			UNIDAD	M2
DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ALTO (M)	KG/M	M2
MUROS FACHADA		58,67		5,00		293,35
MUROS PATIO INTERNO		67,00		2,85		190,95
					SUB TOTAL	484,30

GRAFICA

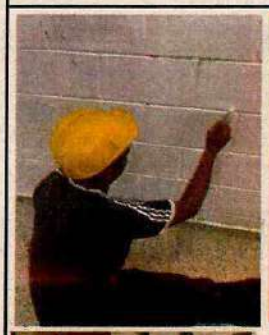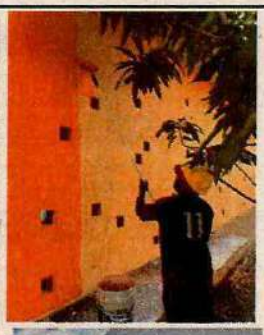





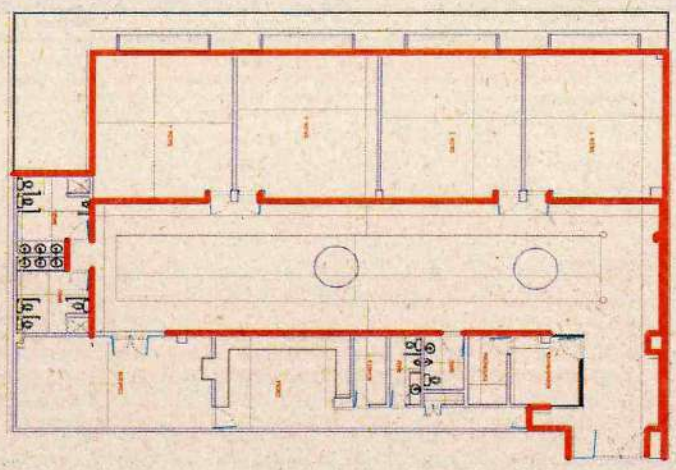CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	PINTURA			UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	6,02	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)		UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DESCRIPCIÓN	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BLOQUE TIPO 1	36,00	4,45	FILETES VERTICALES			160,20
	6,00	74,10	VIGAS PRINCIPALES			444,60
	6,00	94,05	LOSA FACHADA			564,30
	1,00	555,65	CERRAMIENTO EN MALLA			555,65
BLOQUE ADMINISTRATIVO	24,00	4,45	ELEMENTOS VERT.			106,80
	3,00	29,00	VIGAS PRINCIPALES			87,00
	3,00	23,30	LOSA FACHADA			69,90
BLOQUE MULTIPLE	27,00	4,45	ELEMENTOS VERT.			120,15
	3,00	52,00	VIGAS PRINCIPALES			156,00
	3,00	76,20	LOSA FACHADA			228,60
BLOQUE TIPO 3	128,00	4,45	ELEMENTOS VERT.			569,60
	3,00	253,00	VIGAS PRINCIPALES			759,00
	3,00	286,60	LOSA FACHADA			859,80
					SUB TOTAL	4.681,60

GRAFICA


2145/12

PLANTA - BLOQUE TIPO 1

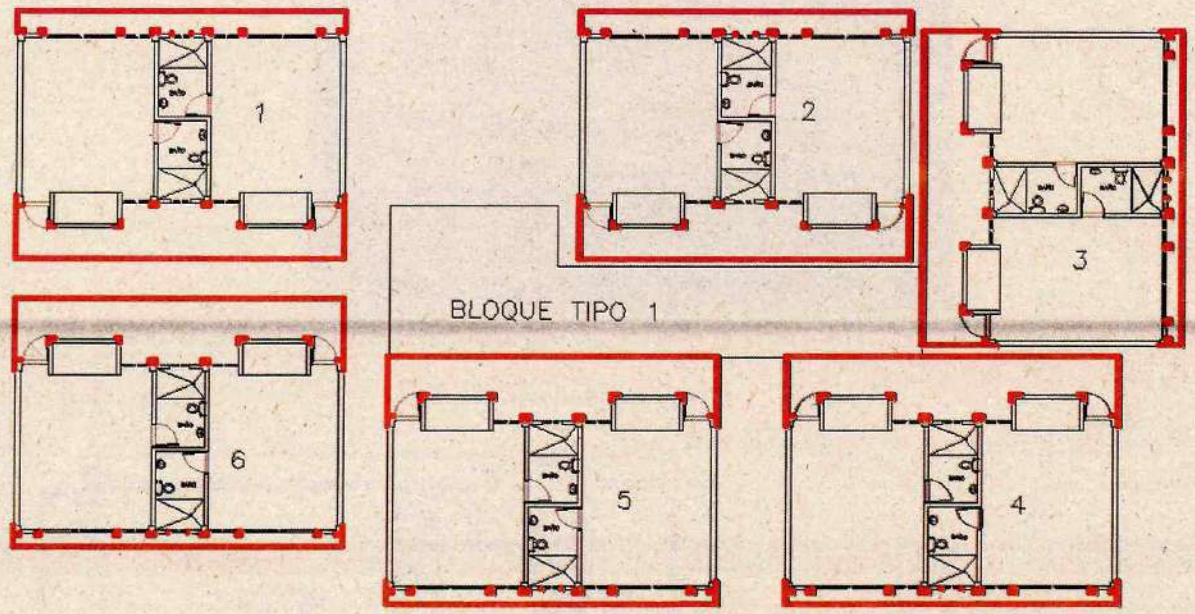




PLANTA - BLOQUE ADMINISTRATIVO

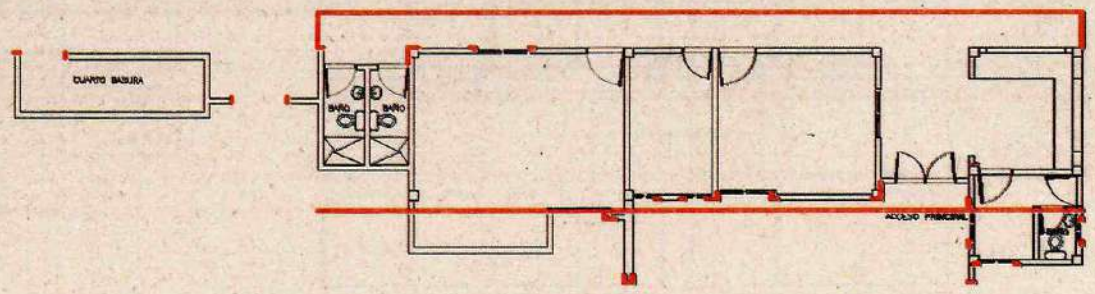




PLANTA - BLOQUE MULTIPLE

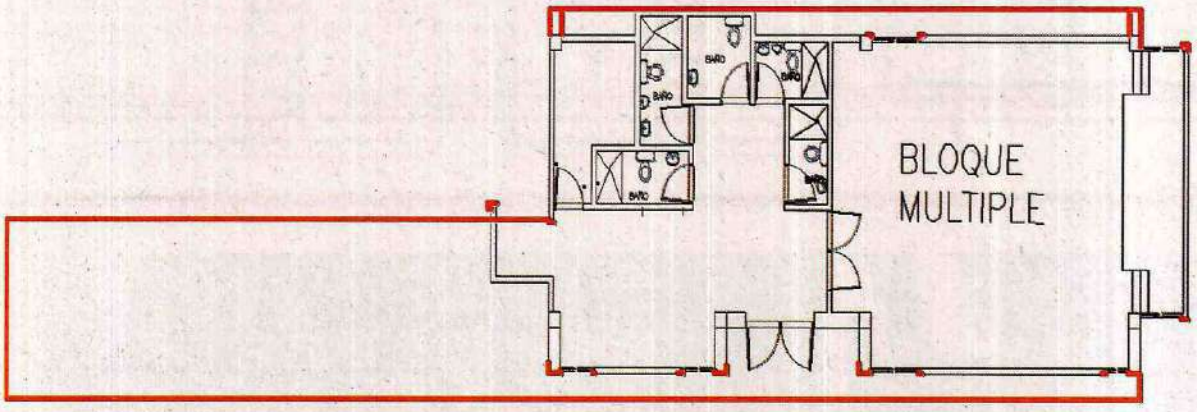



PLANTA - BLOQUE TIPO 3

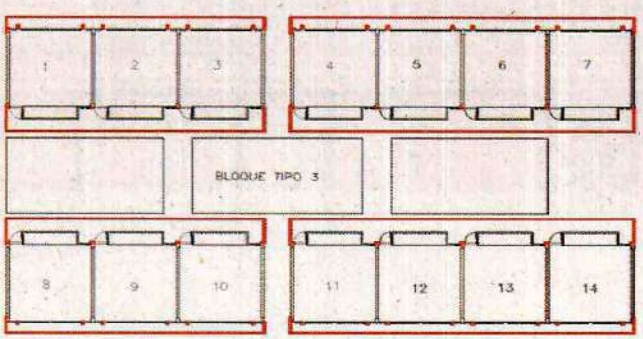







2146/R







CONTRATISTA			INTERVENTOR	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra		NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA			FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	PINTURA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	6,02	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)			UNIDAD	M

DESCRIPCION	ELEMENTO	LONGITUD (M)	CANTIDAD CARAS (UND)	ALTO (M)	KG/M	M
FACHADAS		6,50	1,00			6,50
		2,76	3,00			8,28
		28,50	2,00			57,00
		1,35	3,00			4,05
		0,80	2,00			1,60
		1,00	2,00			2,00
		2,75	1,00			2,75
		1,50	2,00			3,00
		2,25	2,00			4,50
		1,45	2,00			2,90
		2,70	1,00			2,70
		4,30	1,00			4,30
		1,20	3,00			3,60
		4,20	1,00			4,20
		10,20	4,00			40,80
FACHADA ZONA COMUN	VENTANAS	2,0	12,00			24,00
FRONTONES DE CUBIERTA		17,90	1,00			17,90
		17,90	1,00			17,90
						0,00
					SUB TOTAL	207,98

GRAFICA

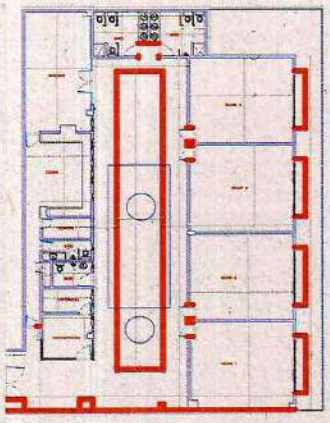





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision

2147/2

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PINTURA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	6,03	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	UNIDAD	M2

DESCRIPCION		LONGITUD (M)		ALTO (M)	CANTIDAD (UND)	M2
INTERIOR						
BLOQUE TIPO 1	PERIMETRO (DOS AULAS ADOSADAS):	35,70		4,80	6,00	1.028,16
	BAÑOS INTERNOS	19,80		2,65	6,00	314,82
	MENOS PUERTAS	1,00		2,00	-12,00	- 24,00
	MENOS VANO BAÑOS	0,90		2,00	-12,00	- 21,60
	MENOS VENTANAS	2,62		1,46	-12,00	- 45,90
	MENOS VENTANAS	1,10		1,46	-24,00	- 38,37
	MENOS VENTANAS	0,70		0,30	-12,00	- 2,52
	MENOS PERSIANAS	2,62		0,63	-12,00	- 19,81
BLOQUE MULTIPLE	PERIMETRO:	120,19		3,00	1,00	360,57
	MENOS PUERTAS	1,00		3,00	1,00	3,00
	MENOS PUERTAS	1,30		2,00	-2,00	- 5,20
	MENOS PUERTAS	2,05		2,00	-3,00	- 12,30
	MENOS PUERTAS	2,65		2,00	-1,00	- 5,30
	MENOS PUERTAS	0,85		2,00	-1,00	- 1,70
	MENOS PUERTAS	0,95		2,00	-1,00	- 1,90
	MENOS PUERTAS	1,00		2,00	-1,00	- 2,00
	MENOS PUERTAS	0,90		2,00	-3,00	- 5,40
	MENOS VENTANAS	1,30		1,10	-2,00	- 2,86
	MENOS VENTANAS	1,45		1,50	-2,00	- 4,35
	MENOS VENTANAS	0,75		1,50	-2,00	- 2,25
BLOQUE TIPO 3	PERIMETRO INTERNO AULAS:	27,40		3,01	14,00	1.154,97
	MENOS PUERTAS	1,00		2,00	-14,00	- 28,00
	MENOS VENTANAS	2,30		1,45	-28,00	- 93,38
	MENOS VENTANAS	1,00		1,50	-14,00	- 21,00
	MENOS PERSIANAS	4,75		0,62	-14,00	- 41,23
					SUB TOTAL	2.482,45


GRAFICA

CORTE - BLOQUE TIPO 1



FACHADA HORIZONTAL

PLANTA BLOQUE TIPO 1

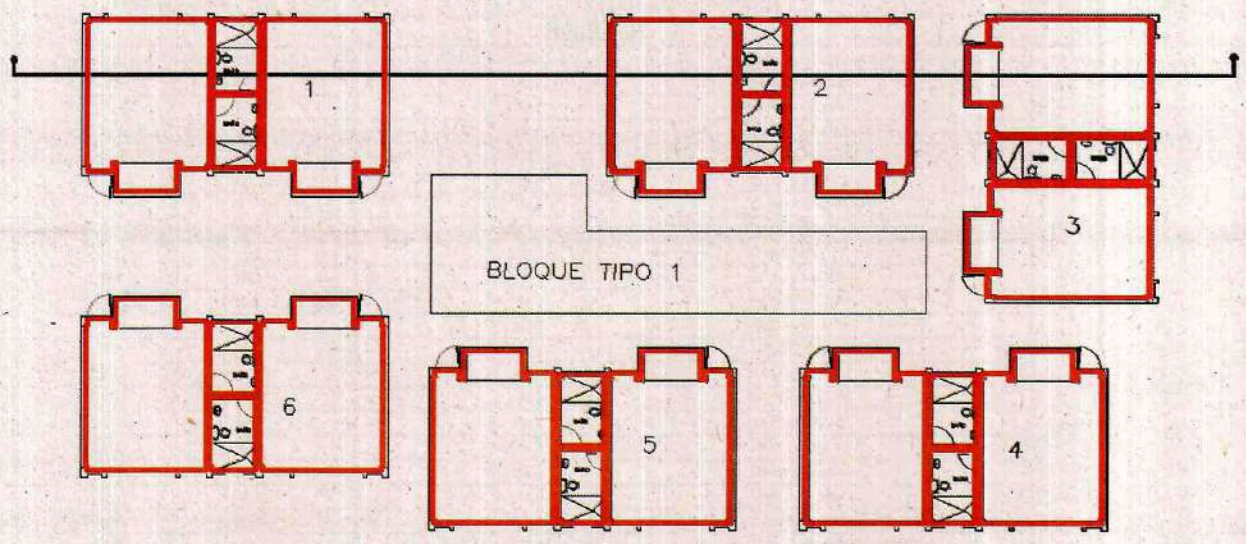








2148/12

CORTE - BLOQUE MULTIPLE

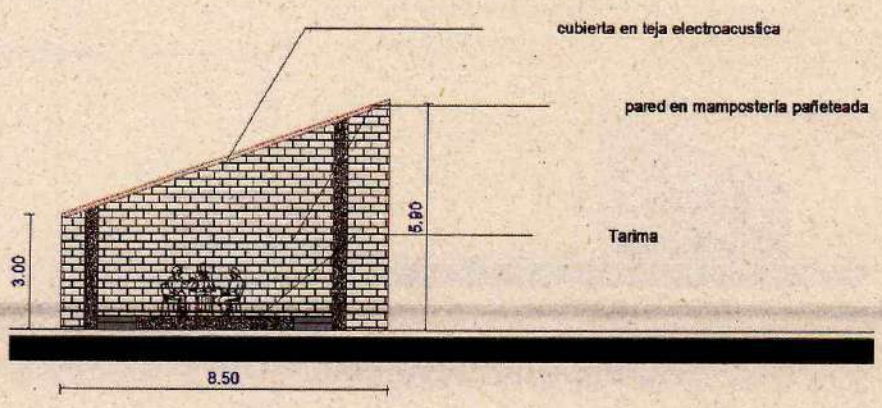

PLANTA - BLOQUE MULTIPLE

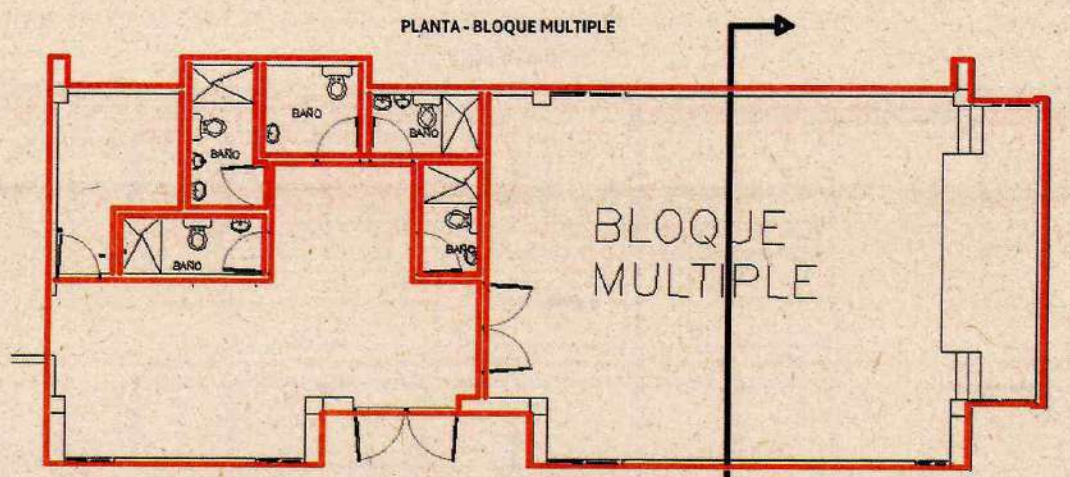


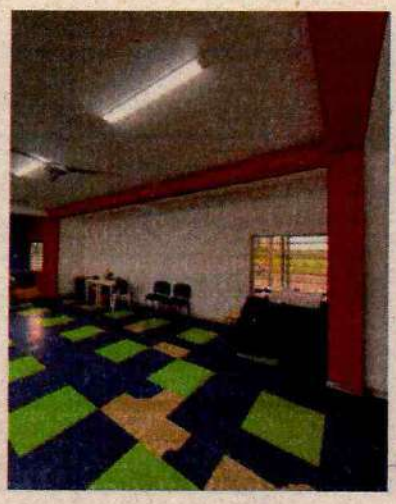






CORTE - BLOQUE TIPO 3

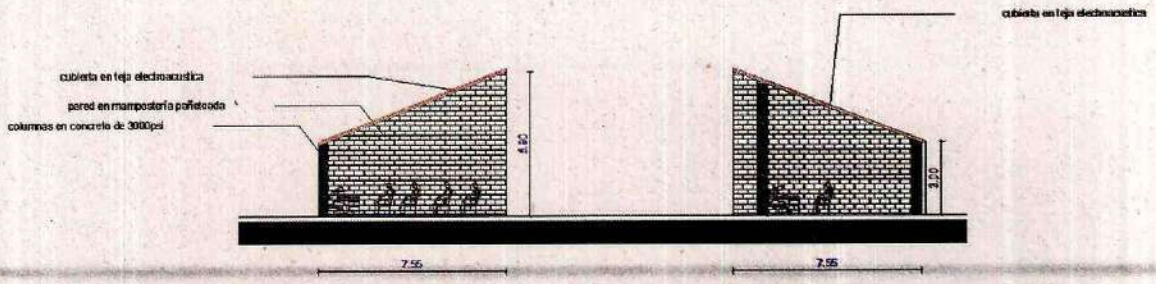

FACHADA TRANSVERSAL

PLANTA - BLOQUE TIPO 3

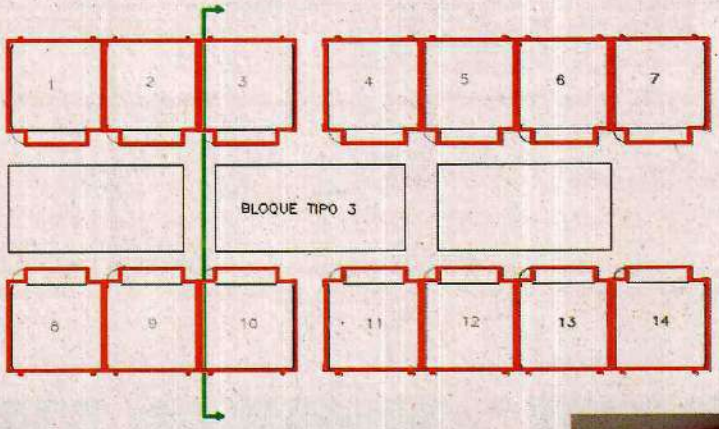







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2149/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No:	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PINTURA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	4,03	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
AULAS	4,0	5,70			3,40	77,52
	-4,0	3,90			1,05	- 16,38
	8,0	5,90			3,16	149,15
	4,0	7,20			2,85	82,08
	-4,0	1,00			2,40	- 9,60
BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS	1,0	3,60			3,20	11,52
	1,0	14,30			0,70	10,01
	1,0	3,50			3,20	11,20
	1,0	13,80			0,70	9,66
COMEDOR	1,0	8,50			3,30	28,05
	1,0	7,80			2,80	21,84
	-1,0	1,00			1,10	- 1,10
	-1,0	1,00			2,40	- 2,40
	1,0	4,00			3,05	12,20
	1,0	4,30			3,10	13,33
	-1,0	1,00			2,40	- 2,40
COCINA	1,0	5,90			1,00	5,90
	1,0	4,30			1,35	5,81
	-1,0	1,02			0,50	- 0,51
	-1,0	1,00			0,60	- 0,60
	1,0	6,70			1,50	10,05
	1,0	5,00			1,30	6,50
	1,0	1,90			1,30	2,47
	-1,0	1,00			0,60	- 0,60
	-1,0	0,70			0,60	- 0,42
	1,0	3,00			1,55	4,65
	1,0	3,00			1,35	4,05
	1,0	1,45			1,40	2,03
	-1,0	0,70			0,60	- 0,42
	1,0	1,45			1,00	1,45
BAÑO - PASILLO	1,0	3,00			3,30	9,90
	1,0	3,00			1,50	4,50
	1,0	1,35			1,40	1,89
	-1,0	0,70			0,60	- 0,42
	1,0	1,35			2,80	3,78
ZONA DE LABORES	1,0	4,80			0,85	4,08
	1,0	0,60			1,80	1,08
	-1,0	0,75			0,60	- 0,45
BAÑO - ZONA COMUN	1,0	1,80			3,30	5,94
	1,0	2,30			3,30	7,59
	1,0	2,30			1,50	3,45
	1,0	1,80			1,00	1,80
	-1,0	1,05			0,60	- 0,63
ENFERMERIA	2,0	3,00			3,40	20,40
	1,0	1,68			3,25	5,46
	-1,0	1,00			2,40	- 2,40
	1,0	1,68			2,90	4,87
OFICINA ADMINISTRATIVA	1,0	6,25			2,80	17,50
	-1,0	1,00			2,40	- 2,40
PASILLO	1,0	6,65			3,35	22,28
	1,0	6,65			3,48	23,14
	-1,0	0,75			2,40	- 1,80
	-1,0	0,70			2,40	- 1,68
	1,0	1,20			3,15	3,78
	-2,0	1,00			2,40	- 4,80
	1,0	1,20			3,55	4,26
					SUB TOTAL	566,16

GRAFICA

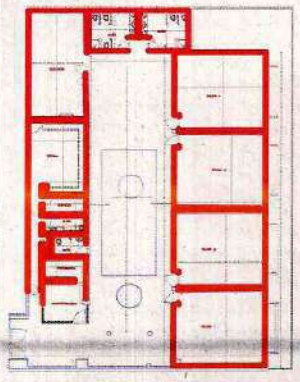

















CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2150/12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	PINTURA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	6,04	PINTURA LINEAL TIPO 1 (2 MANOS)	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DESCRIPCIÓN	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BLOQUE TIPO 1	24,00	4,45	FILETES VERTICALES			106,80
	6,00	123,60	VIGAS PRINCIPALES			741,60
BLOQUE MULTIPLE	30,00	4,45	ELEMENTOS VERT.			133,50
	3,00	90,59	VIGAS PRINCIPALES			271,77
BLOQUE TIPO 3	140,00	4,45	ELEMENTOS VERT.			623,00
	3,00	900,72	VIGAS PRINCIPALES			2.702,16
					SUB TOTAL	4.578,83

GRÁFICA


PLANTA BLOQUE TIPO 1

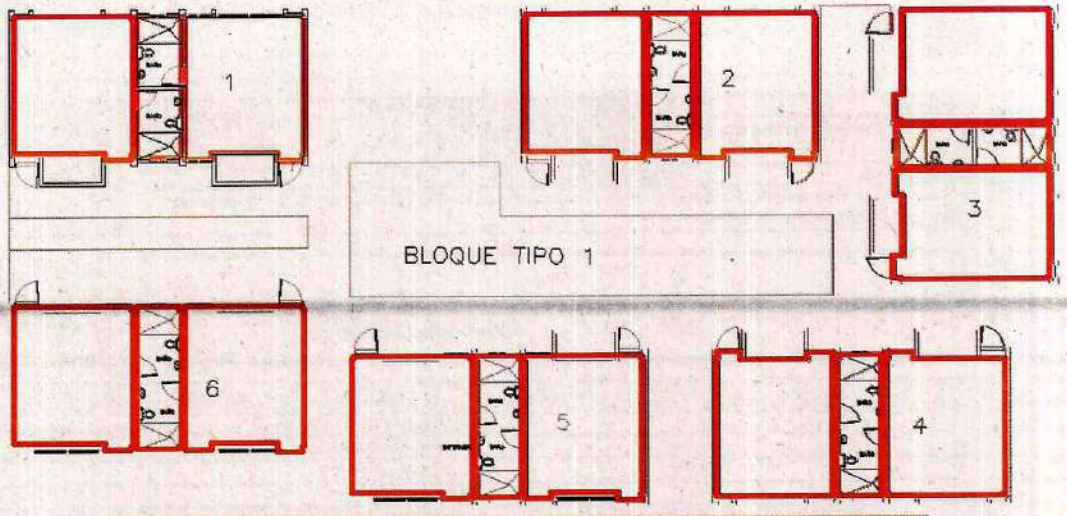






PLANTA - BLOQUE MULTIPLE

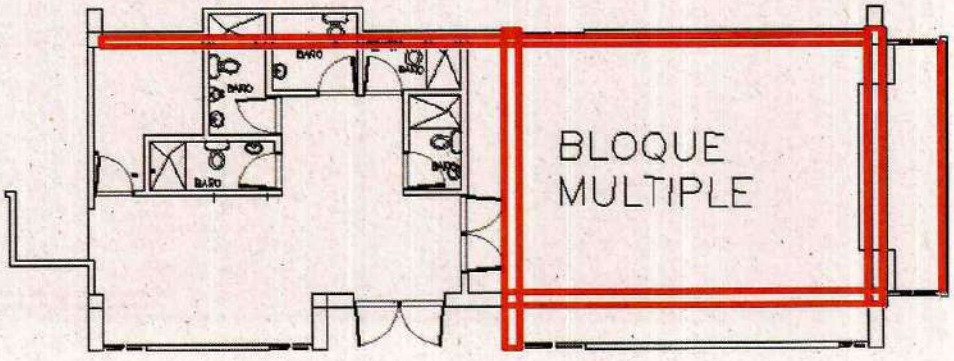

2151/12

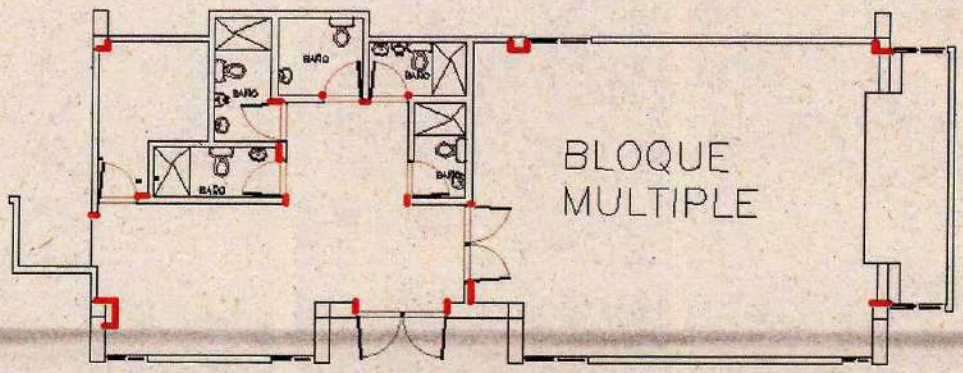










PLANTA - BLOQUE TIPO 3

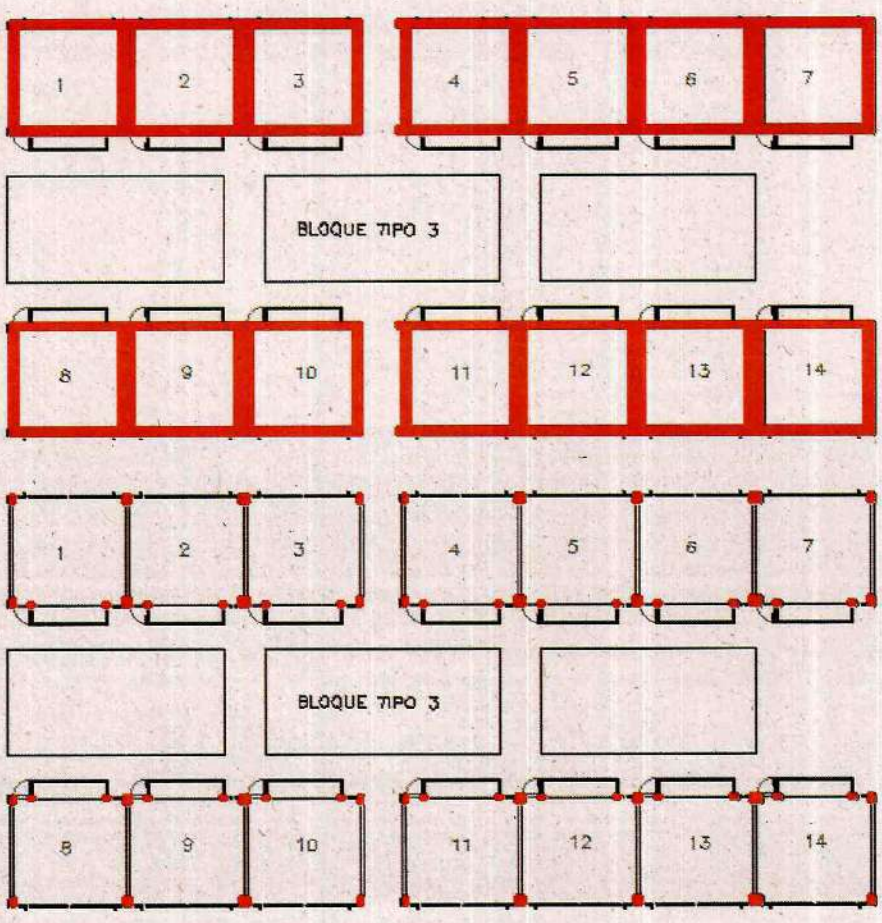

2152/2

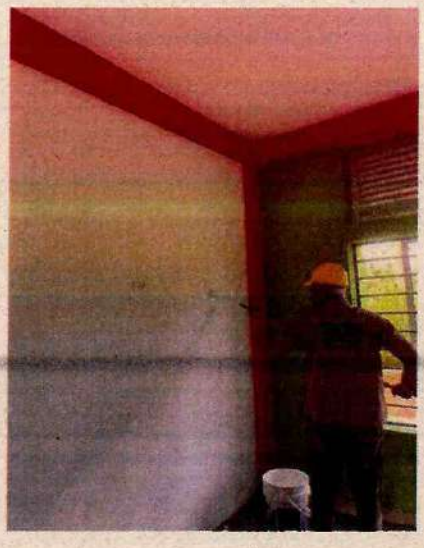



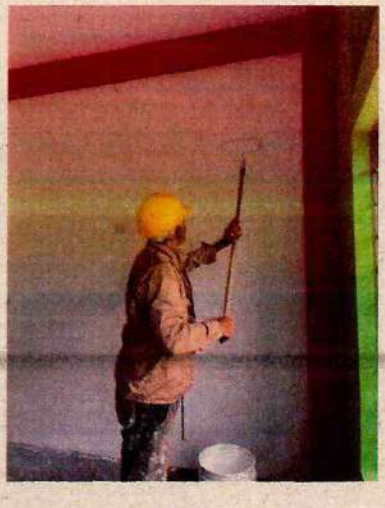

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	8/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	PINTURA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	6,04	PINTURA LINEAL TIPO 1 (2 MANOS)			UNIDAD	M

DESCRIPCION	ELEMENTO	CANTIDAD DE CARAS (UND)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	LONGITUD (M)	M
AULAS	COLUMNAS	8,0			3,40	27,20
	VIGAS	8,0			5,70	45,60
	COLUMNAS	8,0			3,90	31,20
	LOSA	8,0			1,05	8,40
	VIGAS	16,0			5,90	94,40
	VIGAS	4,0			4,30	17,20
	VIGAS	4,0			5,80	23,20
BAÑOS NIÑOS Y NIÑAS	FILOS	3,0			14,30	42,90
	FILO	2,0			1,00	2,00
	FILOS	1,0			10,00	10,00
	FILOS	3,0			13,80	41,40
COMEDOR		5,0			2,80	14,00
		2,0			7,80	15,60
		5,0			4,00	20,00
COCINA		3,0			5,90	17,70
		1,0			6,70	6,70
		1,0			5,00	5,00
		1,0			1,30	1,30
		2,0			1,20	2,40
		1,0			6,00	6,00
		3,0			2,75	8,25
		3,0			1,45	4,35
		2,0			1,00	2,00
		1,0			0,60	0,60
OFICINA ADMINISTRATIVA	COLUMNA	3,0			2,80	8,40
	BORDILLO SUPERIOR	1,0			2,65	2,65
	BORDILLO INFERIOR	1,0			4,60	4,60
ENFERMERIA	VIGA	2,0			1,68	3,36
PASILLO	VIGA	1,0			6,70	6,70
	VIGA	1,0			1,20	1,20
BAÑO - PASILLO	FILO	2,0			3,00	6,00
	FILO	1,0			0,60	0,60
	FILO	3,0			1,35	4,05
BAÑO - ZONA COMUN	FILO ENCHAPE	2,0			2,30	4,60
	VIGA	3,0			1,80	5,40
					SUB TOTAL	494,96

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2153/12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	12. PAÑETE		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	8,01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
COMEDOR	1,00	2,23			2,45	5,46
MENOS VANO	1,00	1,10			1,00	-1,10
FRONTONES DE CUBIERTA	2,00	17,90			0,40	14,32
	2,00	17,90			0,20	7,16
					SUB TOTAL	25,84


GRAFICA



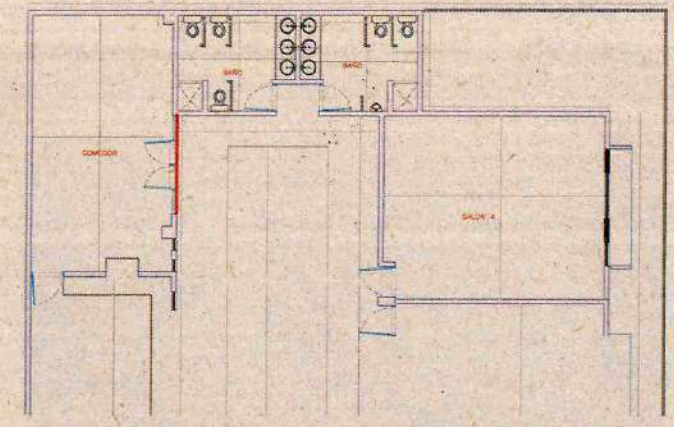





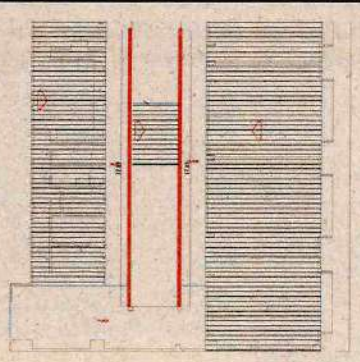

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	8.PAÑETE	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	8,01 PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	PERIMETRO (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
BAÑO-GARITA		4,54			1,80	8,17
BAÑO-COORDINACION		6,54			1,80	11,77
BAÑO-ZONA DE LAVADO		8,02			1,80	14,44
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		7,96			1,80	14,33
BAÑO COMEDOR		17,69			1,80	31,84
BAÑOS ADMINISTRACION		15,68			1,80	28,22
BAÑO ENFERMERIA		6,18			1,80	11,12
BAÑOS SALA CUNA		21,32			1,80	38,38
BAÑO-AULA 1		9,90			1,80	17,82
BAÑO-AULA 2		9,90			1,80	17,82
BAÑO AULA 3		9,90			1,80	17,82
BAÑO AULA 4		9,90			1,80	17,82
BATERIA SANITARIA		26,61			1,80	47,90
BAÑO COCINETA SALA CUNA		9,06			1,80	16,31
					SUB TOTAL	

GRAFICA







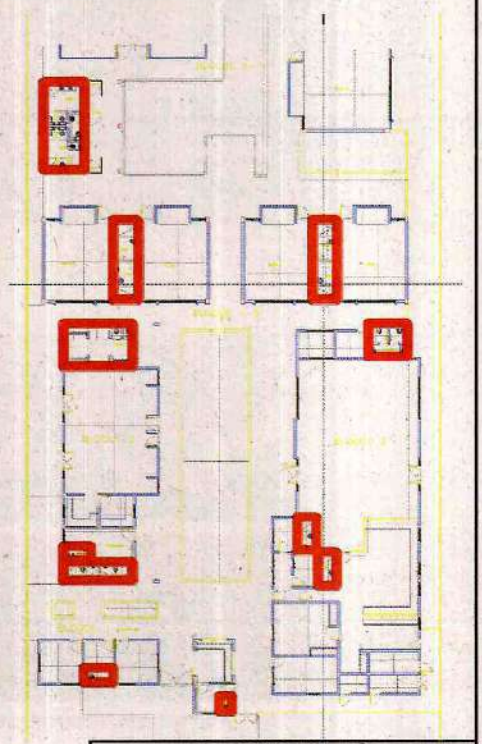

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2154/n

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERÍCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,02 PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA	1,00					1,00
BAÑO-COORDINACION	1,00					1,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO	1,00					1,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO	1,00					1,00
BAÑO COMEDOR	2,00					2,00
BAÑOS ADMINISTRACION	2,00					2,00
BAÑO ENFERMERIA	1,00					1,00
BAÑOS SALA CUNA	4,00					4,00
BAÑO-AULA 1	1,00					1,00
BAÑO-AULA 2	1,00					1,00
BAÑO AULA 3	1,00					1,00
BAÑO AULA 4	1,00					1,00
BATERIA SANITARIA	7,00					7,00
					SUB TOTAL	24,00

GRAFICA














CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2155/2

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS .	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,03 PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UNIDAD	UND


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA	1,00					1,00
BAÑO-COORDINACION	1,00					1,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO	2,00					2,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO	2,00					2,00
BAÑO COMEDOR	1,00					1,00
BAÑOS ADMINISTRACION	4,00					4,00
BAÑO ENFERMERIA	1,00					1,00
BAÑOS SALA CUNA	3,00					3,00
BAÑO-AULA 1	2,00					2,00
BAÑO-AULA 2	2,00					2,00
BAÑO AULA 3	2,00					2,00
BAÑO AULA 4	2,00					2,00
BATERIA SANITARIA	5,00					5,00
					SUB TOTAL	28,00

GRAFICA








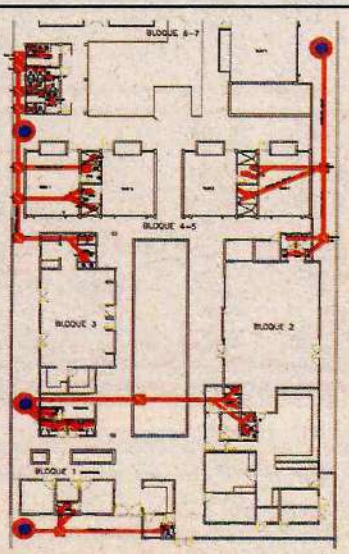








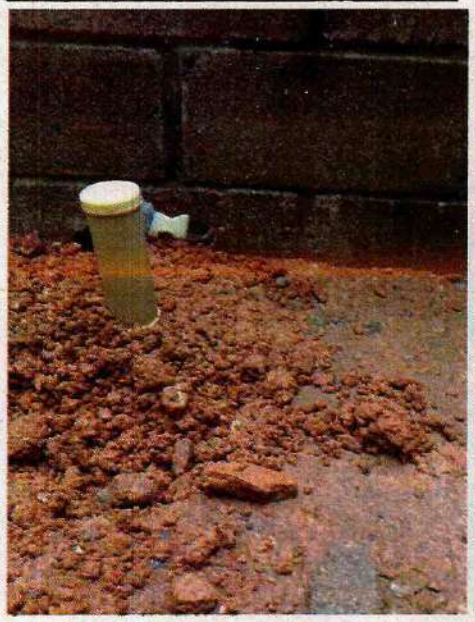

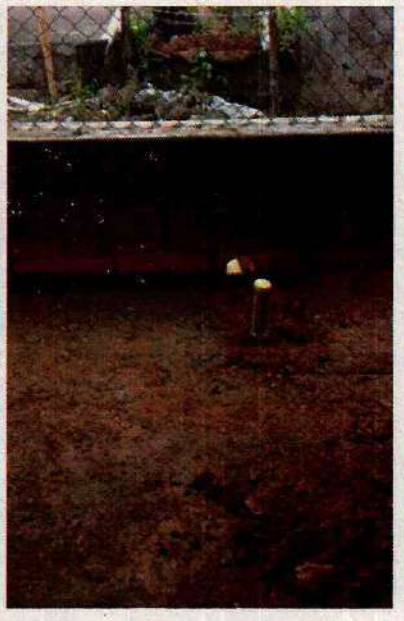



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2156/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,04 PUNTO SANITARIO DE 4"	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA	1,00					1,00
BAÑO-COORDINACION	1,00					1,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO	1,00					1,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO	1,00					1,00
BAÑO COMEDOR	2,00					2,00
BAÑOS ADMINISTRACION	2,00					2,00
BAÑO ENFERMERIA	1,00					1,00
BAÑOS SALA CUNA	2,00					2,00
BAÑO-AULA 1	1,00					1,00
BAÑO-AULA 2	1,00					1,00
BAÑO AULA 3	1,00					1,00
BAÑO AULA 4	1,00					1,00
BATERIA SANITARIA	6,00					6,00
					SUB TOTAL	21,00


GRAFICA

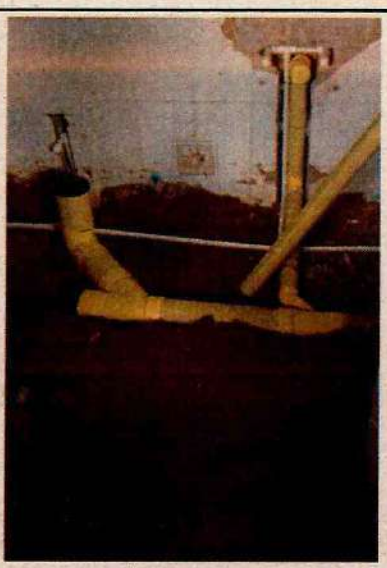



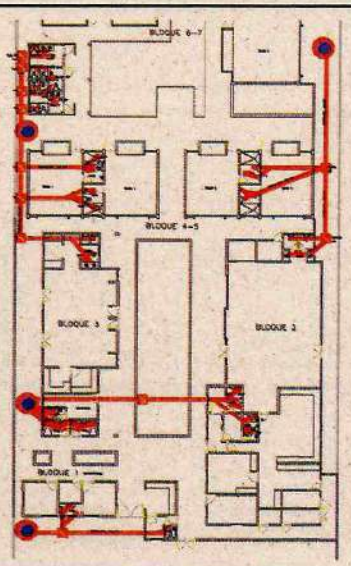



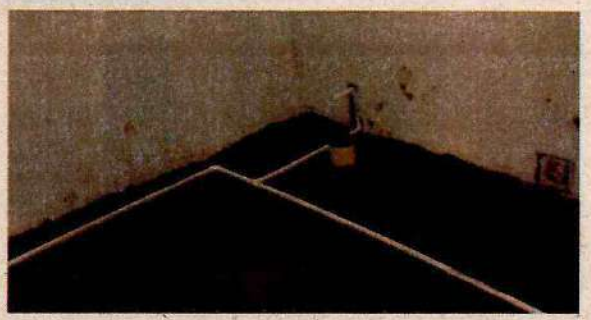







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2157/12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,05 S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BAÑO-GARITA		1,81				1,81
BAÑO-COORDINACION		2,74				2,74
BAÑO-ZONA DE LAVADO		3,30				3,30
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		1,83				1,83
BAÑO COMEDOR		4,34				4,34
BAÑOS ADMINISTRACION		7,46				7,46
BAÑO ENFERMERIA		2,77				2,77
BAÑOS SALA CUNA		5,22				5,22
BAÑO-AULA 1		3,24				3,24
BAÑO-AULA 2		5,37				5,37
BAÑO AULA 3		2,55				2,55
BAÑO AULA 4		1,68				1,68
BATERIA SANITARIA		10,63				10,63
					SUB TOTAL	52,94

GRAFICA






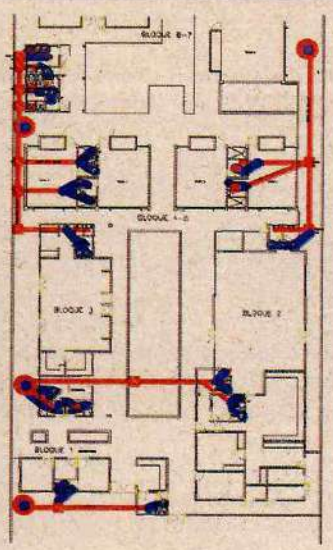





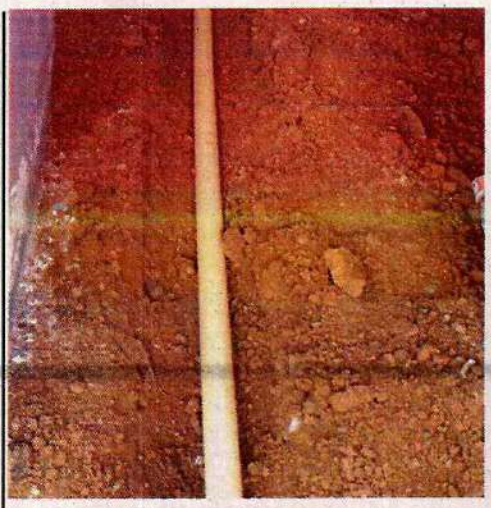



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA .	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2158/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,06 S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BAÑO-GARITA		9,73				9,73
BAÑO-COORDINACION		4,67				4,67
BAÑO-ZONA DE LAVADO		4,66				4,66
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		18,83				18,83
BAÑO COMEDOR		10,21				10,21
BAÑOS ADMINISTRACION		5,00				5,00
BAÑO ENFERMERIA		1,20				1,20
BAÑOS SALA CUNA		10,61				10,61
BAÑO-AULA 1		10,10				10,10
BAÑO-AULA 2		9,44				9,44
BAÑO AULA 3		17,78				17,78
BAÑO AULA 4		8,10				8,10
BATERIA SANITARIA		16,00				16,00
					SUB TOTAL	126,33

GRAFICA

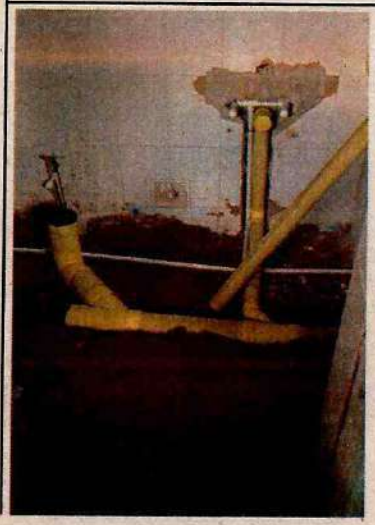

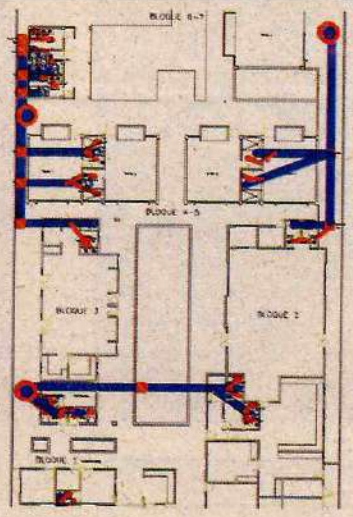









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2159/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERIA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,07 S/I YEE DE 4" PVC-S	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		1,00				1,00
BATERIA SANITARIA	6,00	1,00				1,00
					SUB TOTAL	2,00

GRAFICA

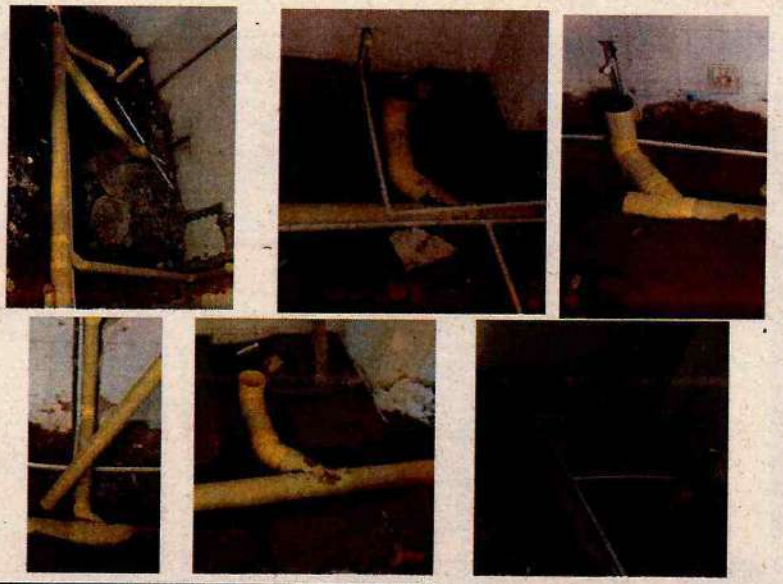

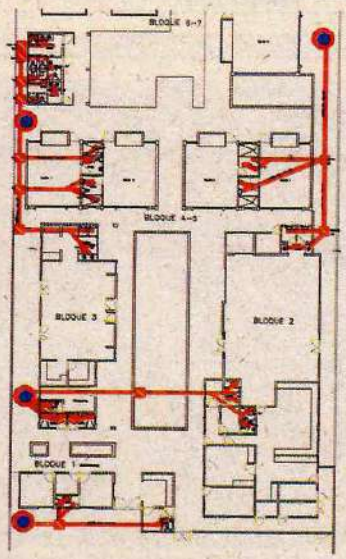

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	9. RED DE DESAGUES				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,08	S/I YEE DE 2" PVC-S			UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA		1,00				1,00
BAÑO COMEDOR		1,00				1,00
BAÑO ENFERMERIA		1,00				1,00
BAÑOS SALA CUNA		2,00				2,00
BATERIA SANITARIA	6,00	4,00				4,00
					SUB TOTAL	9,00

GRAFICA





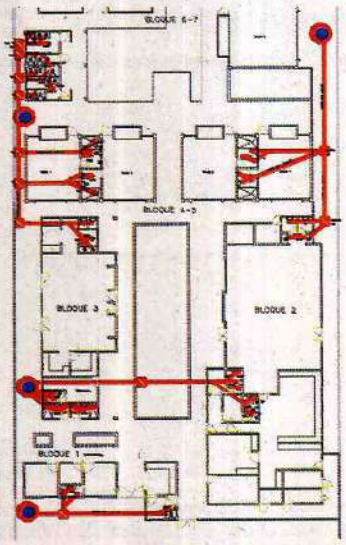





2160/e





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024		FECHA	6/05/2025
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	9. RED DE DESAGUES		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,09	S/I YEE DE 4X2" PVC-S	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA		1,00				1,00
BAÑO-COORDINACION		2,00				2,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO		3,00				3,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		2,00				2,00
BAÑOS SALA CUNA		1,00				1,00
BAÑO-AULA 1		2,00				2,00
BAÑO-AULA 2		2,00				2,00
BAÑO AULA 3		1,00				1,00
BAÑO AULA 4		1,00				1,00
BATERIA SANITARIA		1,00				1,00
					SUB TOTAL	16,00

GRAFICA





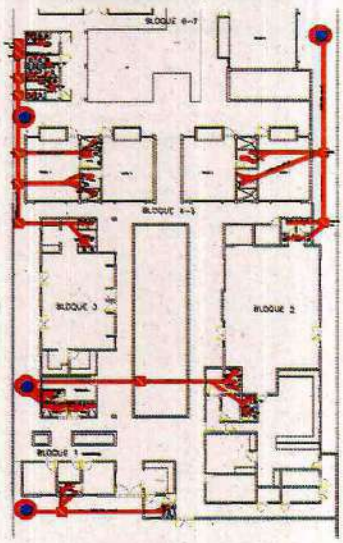

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2161/12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,10 S/I CODO DE 4"X45° PVC-S	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA		1,00				1,00
BAÑO-COORDINACION		1,00				1,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO		1,00				1,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		1,00				1,00
BAÑO COMEDOR		2,00				2,00
BAÑOS ADMINISTRACION		3,00				3,00
BAÑO ENFERMERIA		1,00				1,00
BAÑOS SALA CUNA		2,00				2,00
BAÑO-AULA 1		1,00				1,00
BAÑO-AULA 2		1,00				1,00
BAÑO AULA 3		1,00				1,00
BAÑO AULA 4	1,00	1,00				1,00
BATERIA SANITARIA	6,00	8,00				8,00
					SUB TOTAL	24,00

GRAFICA



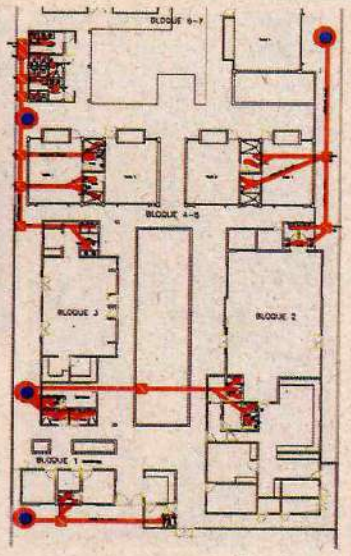



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,11 S/I CODO DE 2"X45° PVC-S	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA		3,00				3,00
BAÑO-COORDINACION		3,00				3,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO		4,00				4,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		4,00				4,00
BAÑO COMEDOR		5,00				5,00
BAÑOS ADMINISTRACION		11,00				11,00
BAÑO ENFERMERIA		3,00				3,00
BAÑOS SALA CUNA		5,00				5,00
BAÑO-AULA 1		4,00				4,00
BAÑO-AULA 2		4,00				4,00
BAÑO AULA 3		3,00				3,00
BAÑO AULA 4	1,00	3,00				3,00
BATERIA SANITARIA	6,00	14,00				14,00
					SUB TOTAL	66,00


GRAFICA









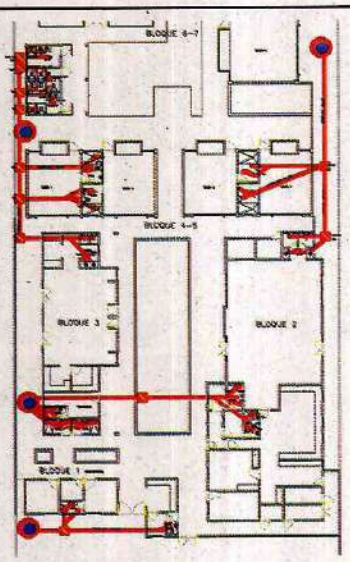

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2162/R

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,12 S/I UNION DE 4" PVC-S	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	LONGITUD (M)	UNIDAD	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA	9,73	2,00				2,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO	18,83	4,00				4,00
BAÑO COMEDOR	10,21	2,00				2,00
BAÑOS SALA CUNA	10,61	2,00				2,00
BAÑO-AULA 1	10,10	2,00				2,00
BAÑO-AULA 2	9,44	2,00				2,00
BAÑO AULA 3	17,78	3,00				3,00
BAÑO AULA 4	8,10	2,00				2,00
BATERIA SANITARIA	16,00	3,00				3,00
					SUB TOTAL	22,00

GRAFICA



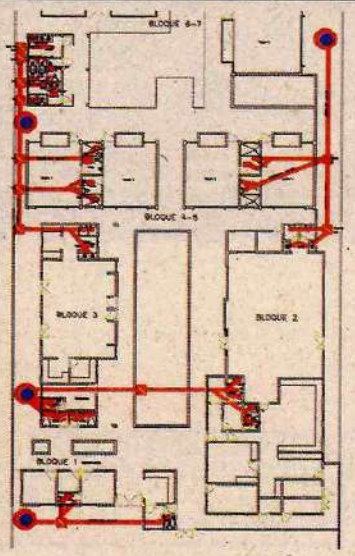

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	9. RED DE DESAGUES	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	9,13 S/I UNION DE 2" PVC-S	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	LONGITUD (M)	UNIDAD	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS ADMINISTRACION	7,46	2,00				2,00
BATERIA SANITARIA	10,63	2,00				2,00
					SUB TOTAL	4,00

GRAFICA



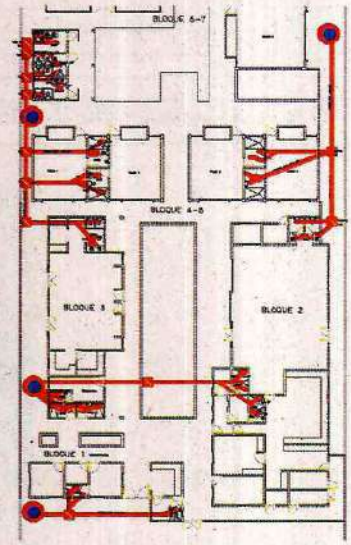

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2163/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,04	S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERIA PUSH	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO NIÑOS	1,0					1,00
BAÑO ALMACEN	1,0					1,00
					SUB TOTAL	2,00

GRAFICA

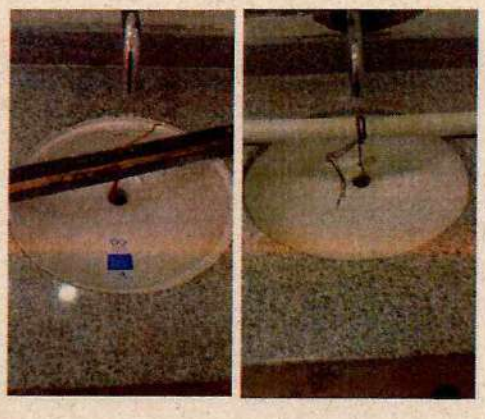

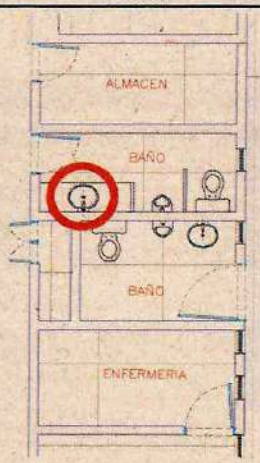



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,06	S/I DE GRIFERIA TELEDUCHA. INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO NIÑOS	2,0					2,00
					SUB TOTAL	2,00

GRAFICA







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2164/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,07 S/I DE GRIFERIA PARA APARATOS SANITARIOS (INODOROS)	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS NIÑOS/AS	5,0					5,00
					SUB TOTAL	5,00

GRAFICA

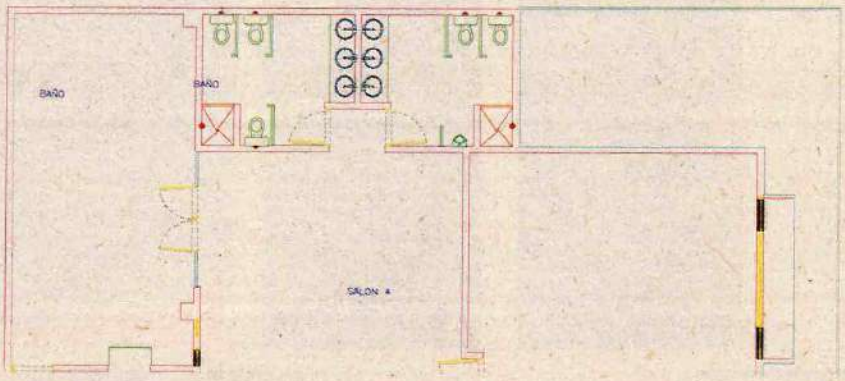



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,08	S/I DE TAPA Y ASIENTO PARA SANITARIO	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS NIÑOS/AS	5,0					5,00
					SUB TOTAL	5,00

GRAFICA

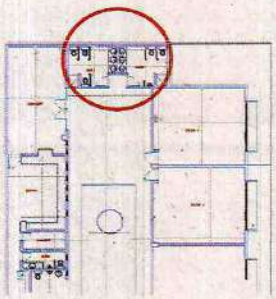







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba - Director de interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision

2165/R


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,10	S/I DE VALVULA PUSH ANTIVANDALICA PARA SANITARIOS Y ORINALES	UNIDAD	UND


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS BLOQUE COMEDOR	4,0					4,00
BATERIA SANITARIA	1,0					1,00
					SUB TOTAL	5,00

GRAFICA

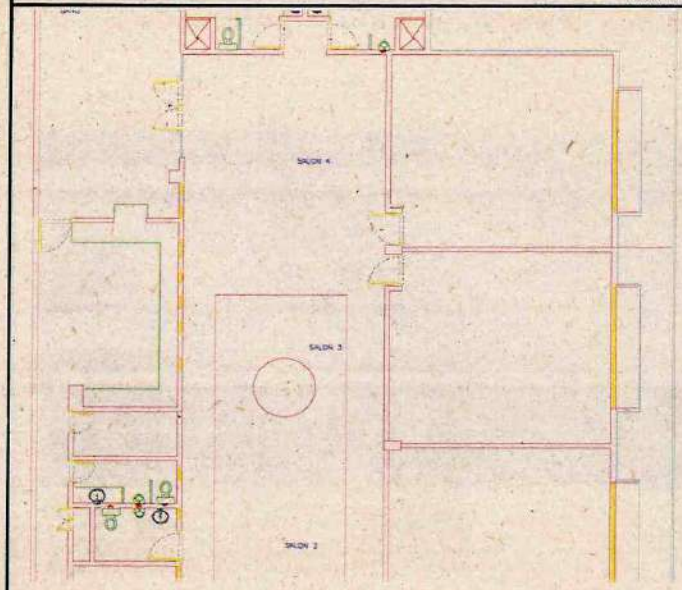





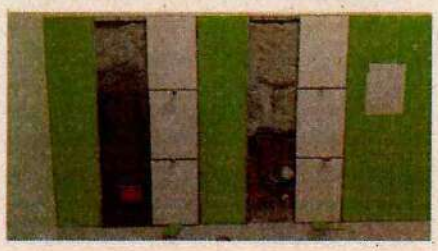

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	10,11	S/I DE GRIFERÍA Y VALVULA PUSH PARA LAVAMANOS			UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑOS NIÑOS/AS	6,0					6,00
BAÑOS BLOQUE COMEDOR	1,0					1,00
					SUB TOTAL	7,00

GRAFICA

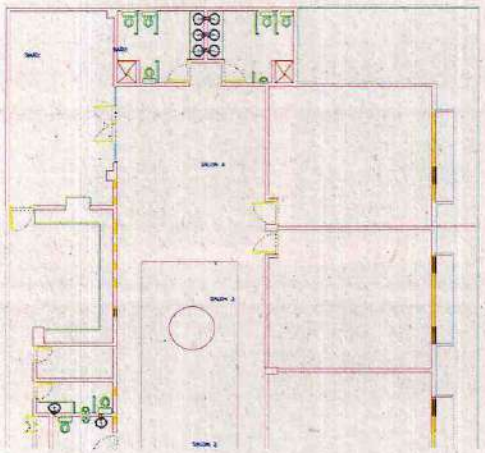



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2166/2


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,01	S/I DE TOMACORRIENTE A 110V NORMAL . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UNIDAD	UND


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	29,0					29,00
						-
						-
					SUB TOTAL	29,00

GRAFICA

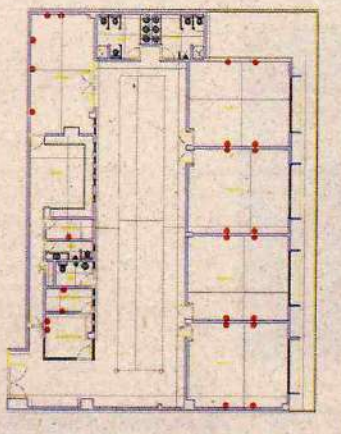



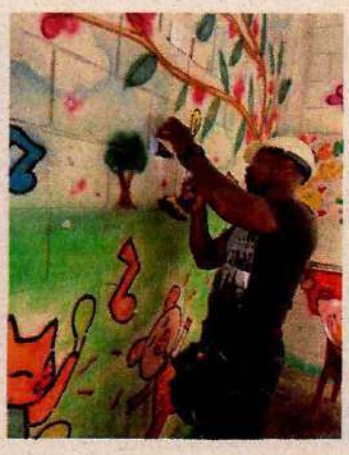























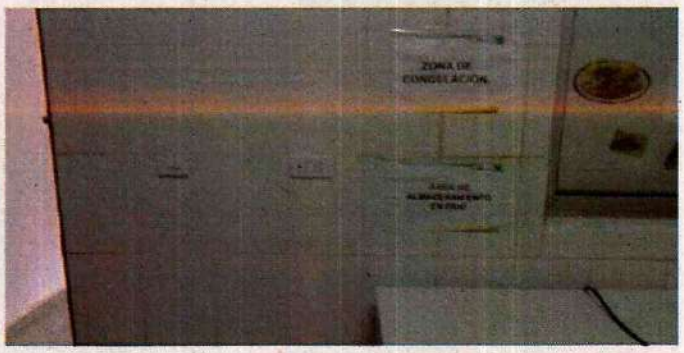CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2167/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ÍTEM	11.02	S/I DE TOMACORRIENTE A 220V CON TOMA MIRADA CHINA . INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
ADMINISTRACION	1,0					1,00
						-
						-
					SUB TOTAL	1,00

GRAFICA

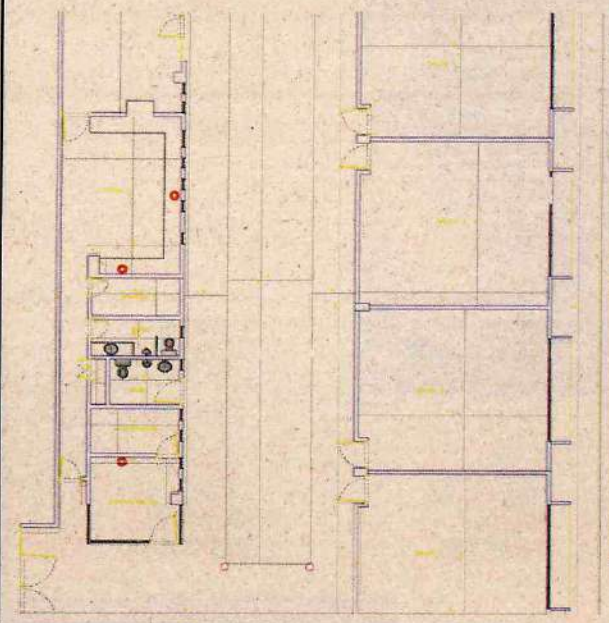

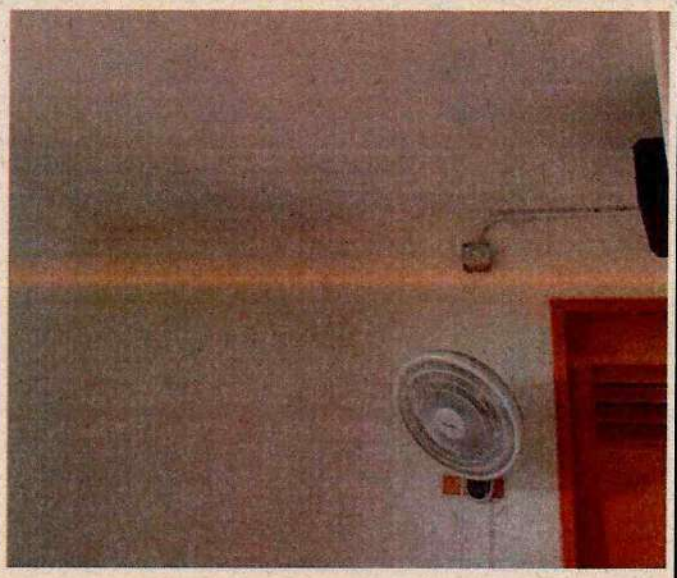

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,03 S/I DE SWICHE SENCILLO .	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	8,0					8,00
						-
						-
					SUB TOTAL	8,00

GRAFICA

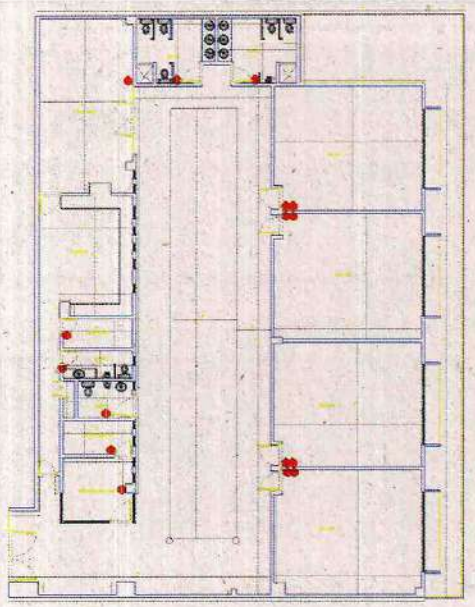



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2168/R


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No.:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,04	S/I DE SWICHE DÓBLE.	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	18,0					18,00
						-
					SUBTOTAL	18,00

GRAFICA

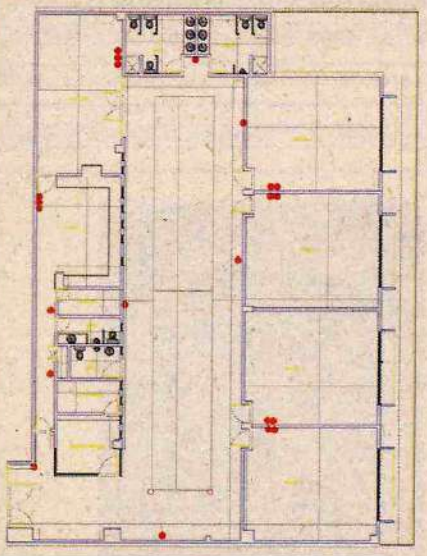



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	8/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 24W INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	4,0					4,00
						-
						-
					SUB TOTAL	4,00

GRAFICA

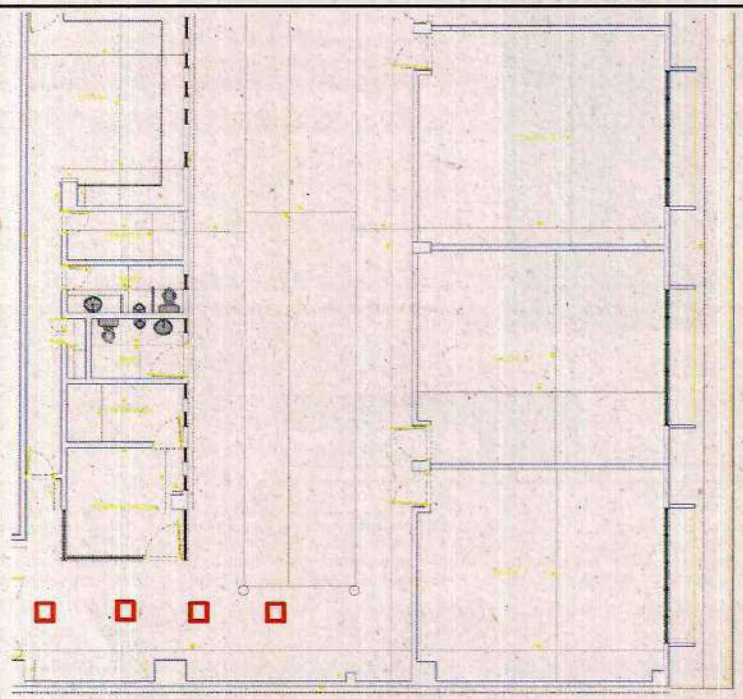



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2169/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	8,0					8,00
						-
						-
					SUB TOTAL	8,00

GRAFICA

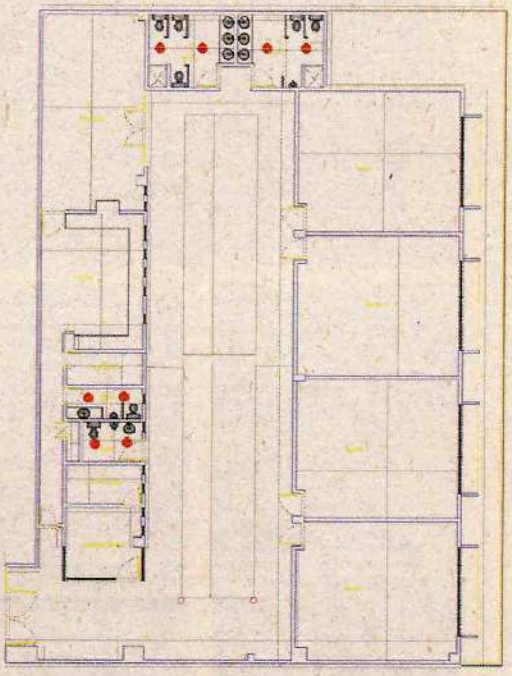



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	ELECTRICO	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,08 TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI 20 AMP USO INTERIOR/EXTERIOR	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	6,0					6,00
						-
						-
					SUB TOTAL	6,00

GRAFICA

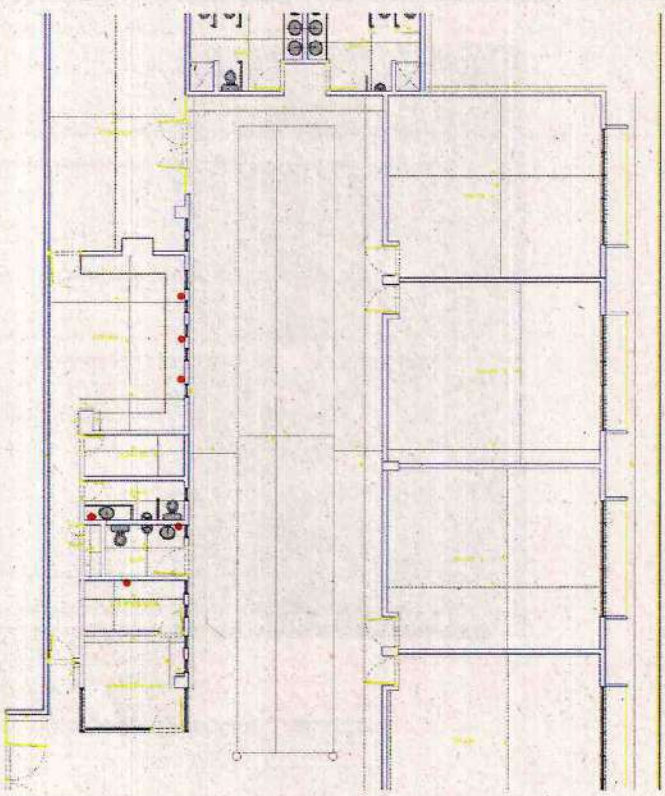

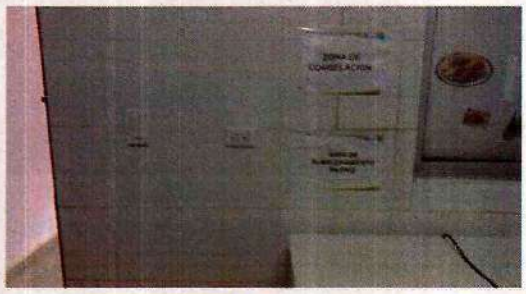





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision

2170/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,09	FOCO REFLECTOR LED EXTERIOR 50W	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	4,0					4,00
						-
						-
					SUB TOTAL	4,00

GRAFICA

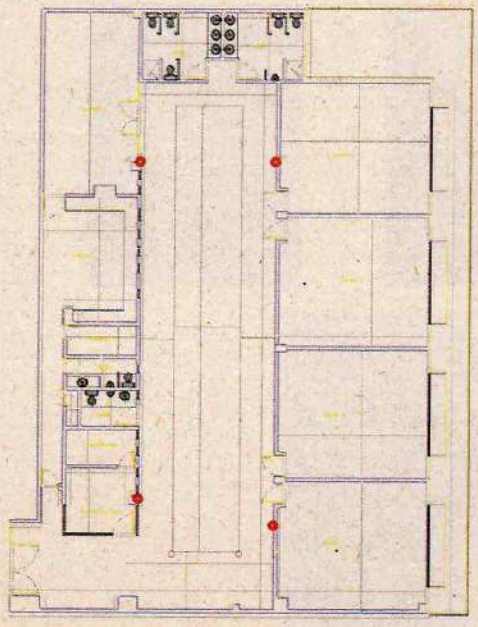

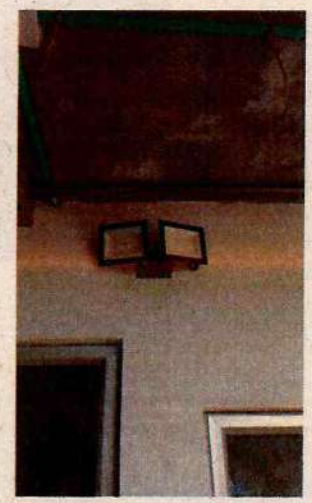



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	


Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	11,10	REUBICACION DE TOMA CORRIENTE			UNIDAD	UND
DESCRIPCION	CANTIDAD	PERIMETRO (M)	LARGO (M)	ANCHO (M)	AREA (M2)	UND
CDI VILLA CIELO	40,00					40,00
					SUB TOTAL	40,00

GRAFICA

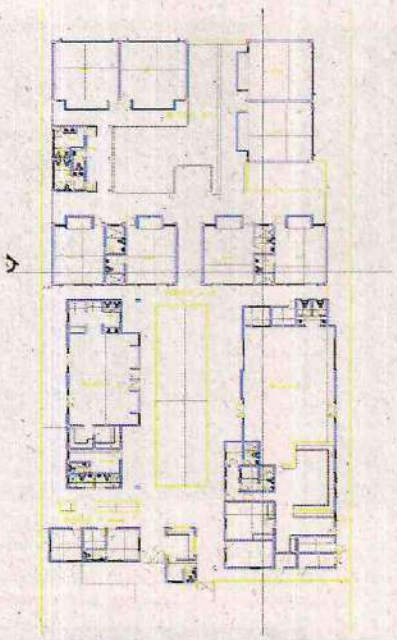







CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2171/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	11,16	S/I DE VENTILADOR TIPO KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BLOQUE TIPO 1	24,0					24,00
BLOQUE TIPO 3	28,0					28,00
					SUB TOTAL	52,00

GRAFICA

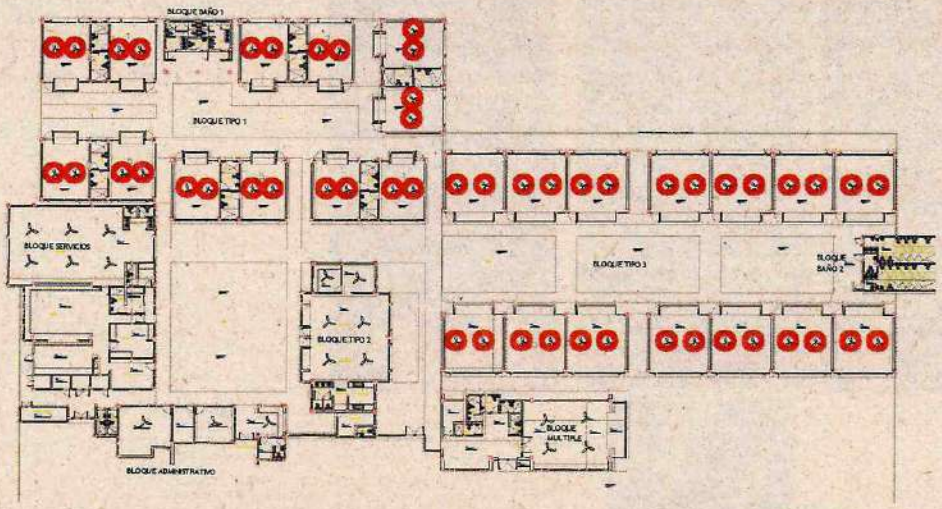









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR TIPO KDK O,SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	UND


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	16,0					16,00
						-
						-
					SUB TOTAL	16,00

GRAFICA







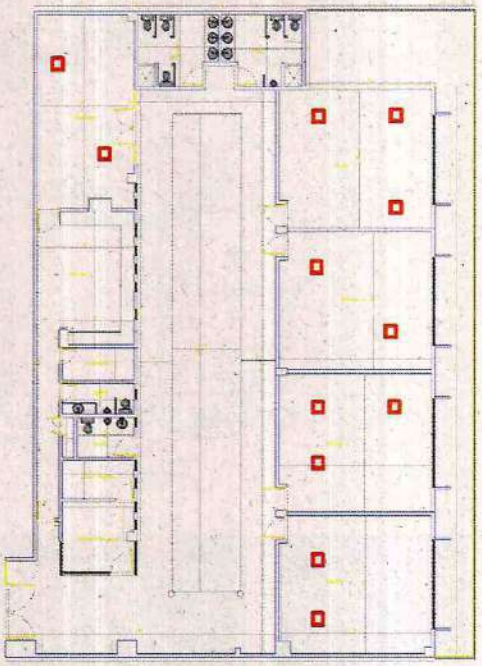



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2172/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,21 BOMBILLA SUPERLED DE 50W, LUZ BLANCA, 6500K	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	5,0					5,00
						-
						-
					SUB TOTAL	5,00

GRAFICA

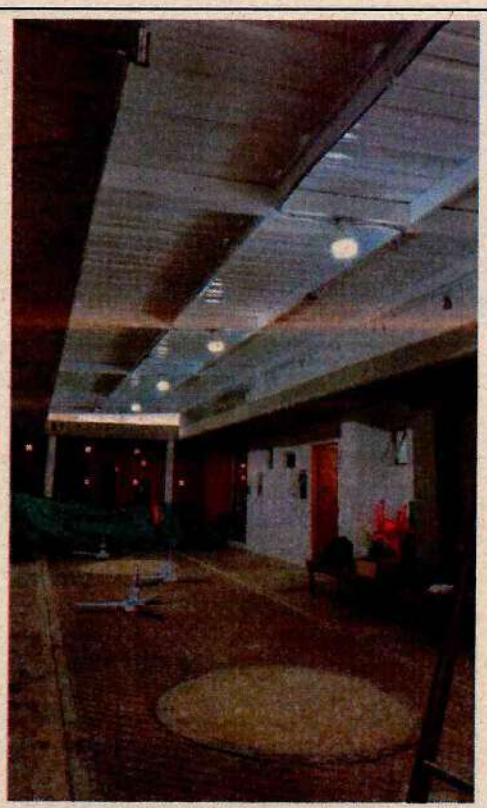

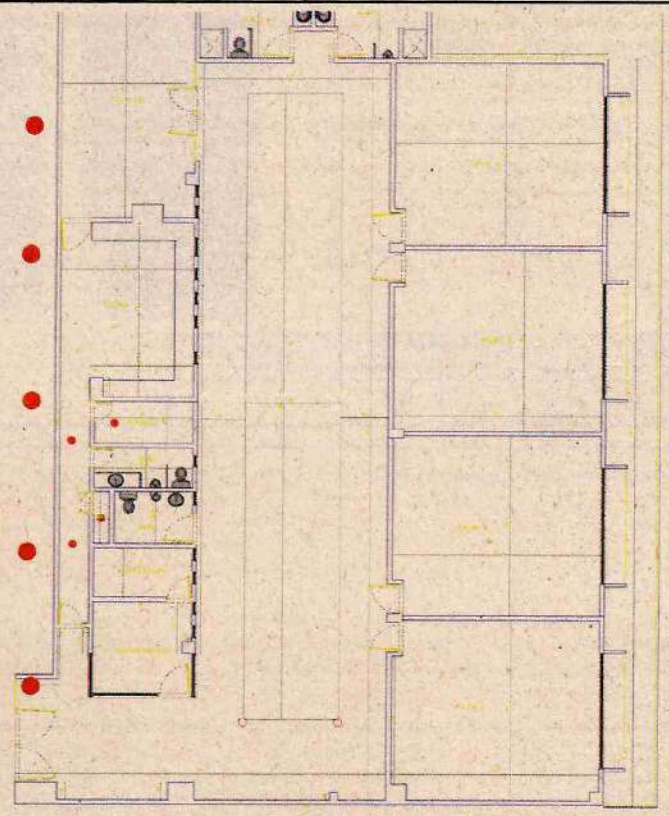

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELECTRICO	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,23 LAMPARA LED T8 2X10W 6400K COLOR BLANCO	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	38,0					38,00
						-
						-
					SUB TOTAL	38,00

GRAFICA









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2173/12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	ELECTRICO	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,24 MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
CDI VALLEJO	9,0					9,00
						-
						-
					SUB TOTAL	9,00

GRAFICA



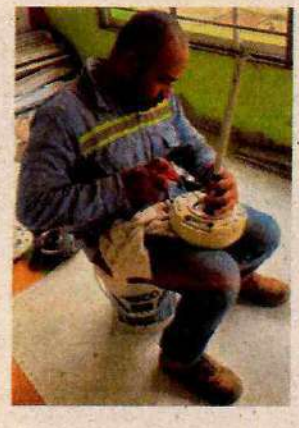

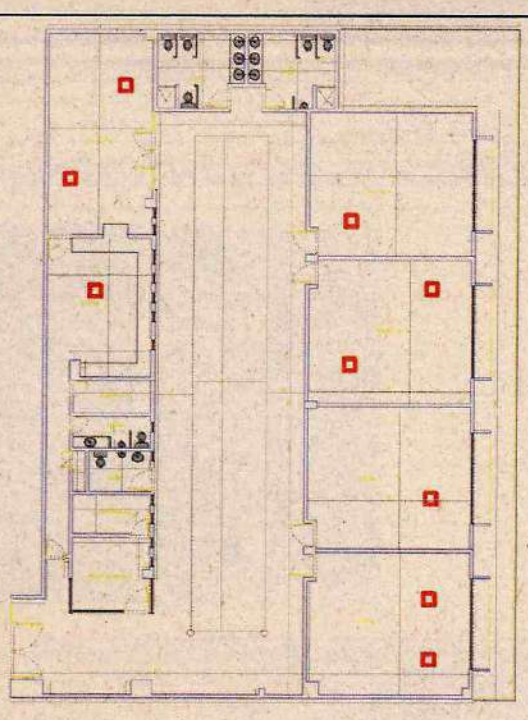

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ELETRICO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	11,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE VENTILADOR CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
AULAS	8,0					8,00
CUBIERTA ZONA COMUN	5,0					5,00
						-
					SUB TOTAL	13,00

GRAFICA

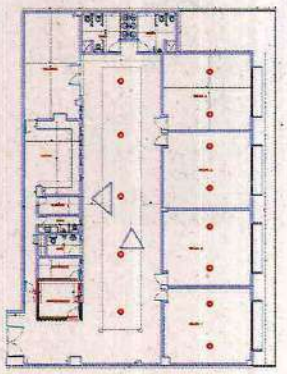

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2174/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	12. RED DE ACUEDUCTOS Y ABASTOS	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	12,01 PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO-GARITA		2,00				2,00
BAÑO-COORDINACION		2,00				2,00
BAÑO-ZONA DE LAVADO		3,00				3,00
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO		3,00				3,00
BAÑO COMEDOR		4,00				4,00
BAÑOS ADMINISTRACION		6,00				6,00
BAÑO ENFERMERIA		2,00				2,00
BAÑOS SALA CUNA		6,00				6,00
BAÑO-AULA 1		3,00				3,00
BAÑO-AULA 2		3,00				3,00
BAÑO AULA 3		3,00				3,00
BAÑO AULA 4		3,00				3,00
BATERIA SANITARIA		13,00				13,00
					SUB TOTAL	53,00


GRAFICA

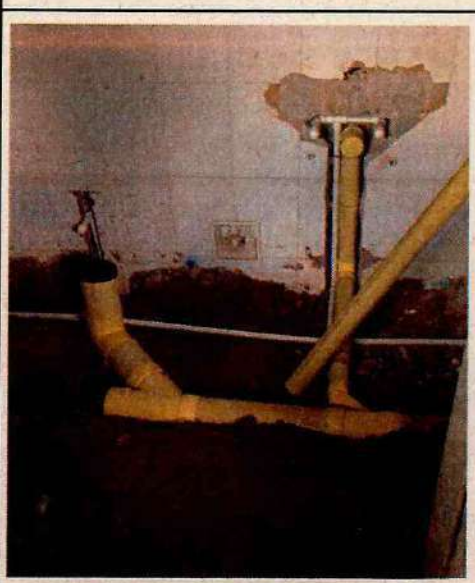




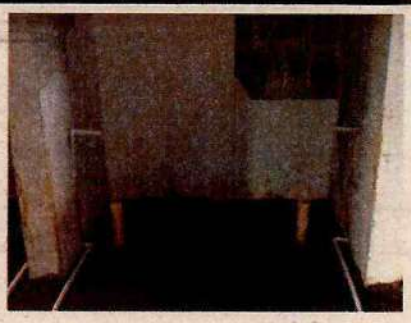



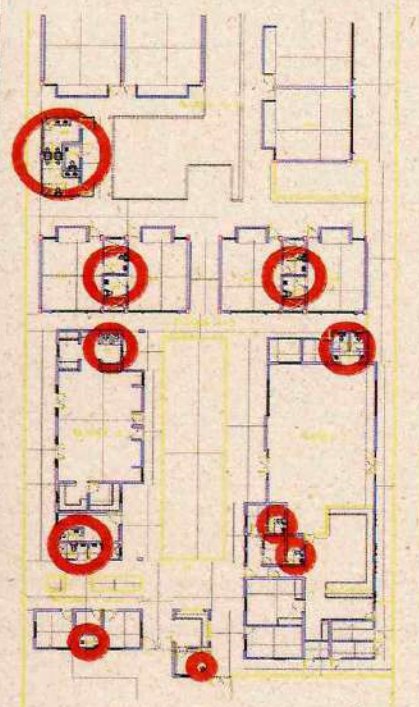









CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2175/2

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERIÇA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	12. RED DE ACUEDUCTOS Y ABASTOS	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	12,02 TUBERIA 1/2" RDE 13,5, INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BAÑO-GARITA			2,95			2,95
BAÑO-COORDINACION			9,98			9,98
BAÑO-ZONA DE LAVADO			4,64			4,64
BAÑO 2-ZONA DE LAVADO			5,94			5,94
BAÑO COMEDOR			9,82			9,82
BAÑOS ADMINISTRACION			6,76			6,76
BAÑO ENFERMERIA			5,09			5,09
BAÑOS SALA CUNA			14,86			14,86
BAÑO-AULA 1			5,46			5,46
BAÑO-AULA 2			5,46			5,46
BAÑO AULA 3			5,46			5,46
BAÑO AULA 4			5,46			5,46
BATERIA SANITARIA			19,75			19,75
					SUB TOTAL	101,63

GRAFICA



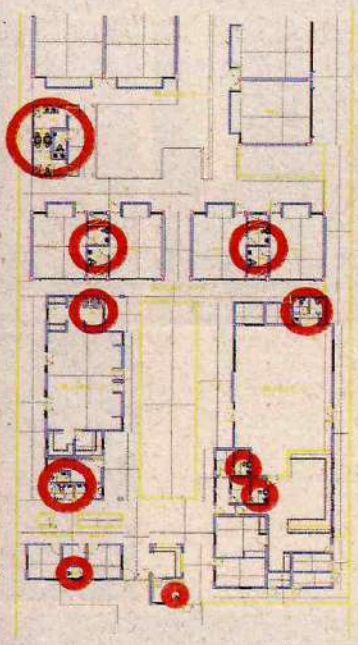

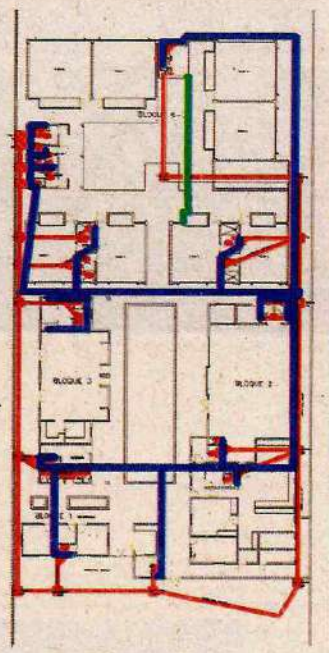













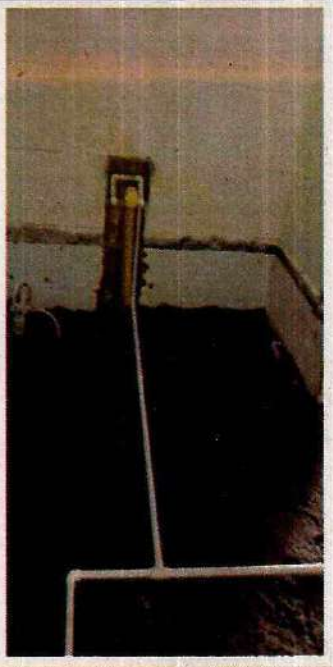





2176/12

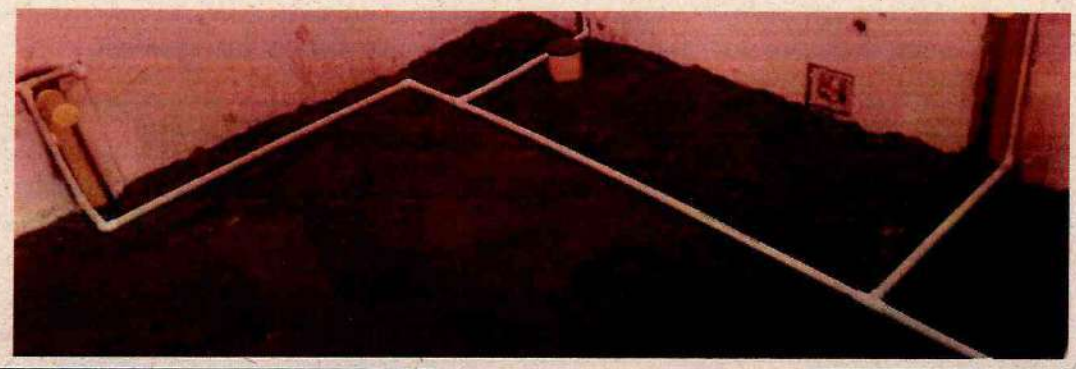

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024		FECHA	6/05/2025
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	12. RED DE ACUEDUCTOS Y ABASTOS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	12,03	TUBERIA DE 1" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
BAÑO-GARITA			10,49			10,49
BAÑO-COORDINACION			8,32			8,32
BAÑO-ZONA DE LAVADO			39,88			39,88
BAÑO COMEDOR			1,00			1,00
BAÑOS ADMINISTRACION			3,76			3,76
BAÑO ENFERMERIA			1,50			1,50
BAÑOS SALA CUNA			1,00			1,00
BAÑO-AULA S			24,38			24,38
BATERIA SANITARIA			11,50			11,50
					SUB TOTAL	101,83

GRAFICA





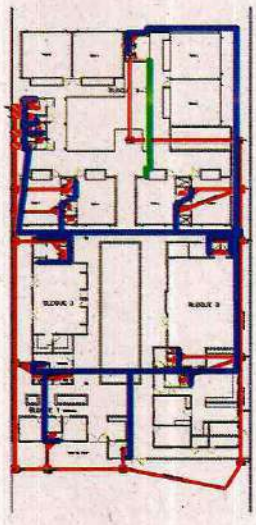

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2177/12



	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	13,02	MANTENIMIENTO PUERTAS Y MARCOS METALICOS, INCLUYE ALARGAMIENTO DE MARCOS, LIJADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LADOS (UND)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
GARITA DE VIGILANCIA	2,00	2,00		0,85	2,15	7,31
BAÑO-GARITA	1,00	2,00		0,75	2,15	3,23
ENTRADA	1,00	2,00		2,50	2,80	14,00
COORDINACION	1,00	2,00		1,00	2,15	4,30
BAÑO-COORDINACION	1,00	2,00		0,80	2,15	3,44
ARCHIVO	1,00	2,00		0,80	2,15	3,44
PSICOLOGIA	1,00	2,00		1,00	2,15	4,30
BODEGA	1,00	2,00		0,80	2,15	3,44
CUARTO ELECTRICO	1,00	2,00		0,90	2,15	3,87
CUARTO DE RESIDUOS	2,00	2,00		1,00	2,15	8,60
BODEGA 2	1,00	2,00		1,00	2,15	4,30
COCINA	2,00	2,00		0,85	2,15	7,31
ZONA DE LAVADO	3,00	2,00		0,97	2,15	12,47
					SUB TOTAL	80,01

GRAFICA

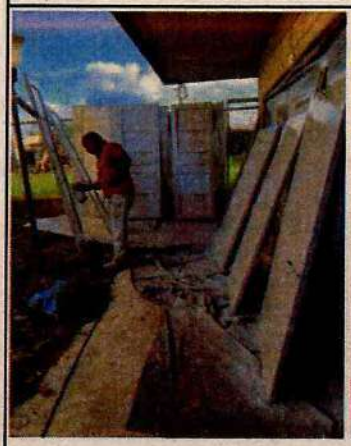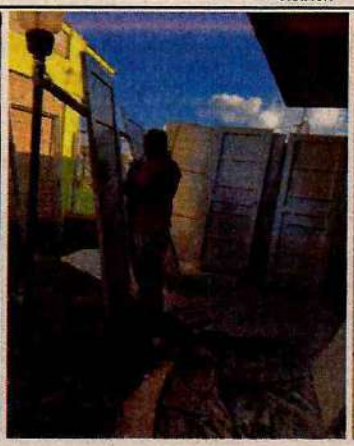

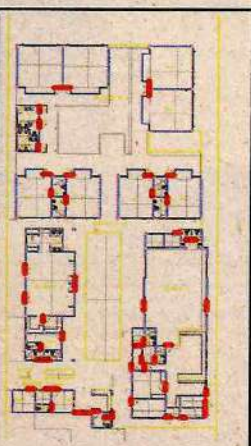CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	CARPINTERIA METALICA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	13,05	S/I VENTANA EN VIDRIO. INCLUYE MARCO.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
COMEDOR	2,0			1,00	1,20	2,40
						-
						-
					SUB TOTAL	2,40

GRAFICA





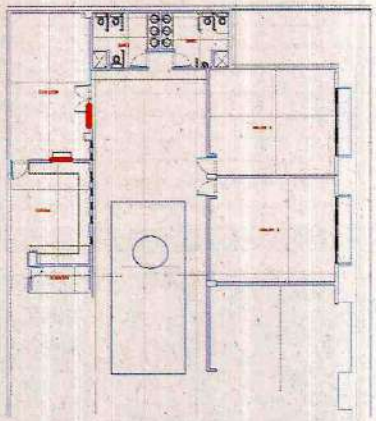

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2178/2


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA.					


CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	13,07 MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS, INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ANCHO (M)	ALTO (M)	LADOS	M2
BLOQUE TIPO 1	PUERTAS DE 1.0m X 2.0m	12,00	1,00	2,00	2,00	48,00
	PUERTAS DE 0.90m X 2.0m	15,00	0,90	2,00	2,00	54,00
BLOQUE MULTIPLE	PUERTAS DE 2.10 X 2.0m	1,00	2,10	2,00	2,00	8,40
	PUERTAS DE 1.9m X 2.0m	1,00	1,90	2,00	2,00	7,60
	PUERTAS DE 0.90m X 2.0m	6,00	0,90	2,00	2,00	21,60
BLOQUE TIPO 3	PUERTAS DE 1.0m X 2.0m	14,00	1,00	2,00	2,00	56,00
					SUB TOTAL	195,60

PLANO

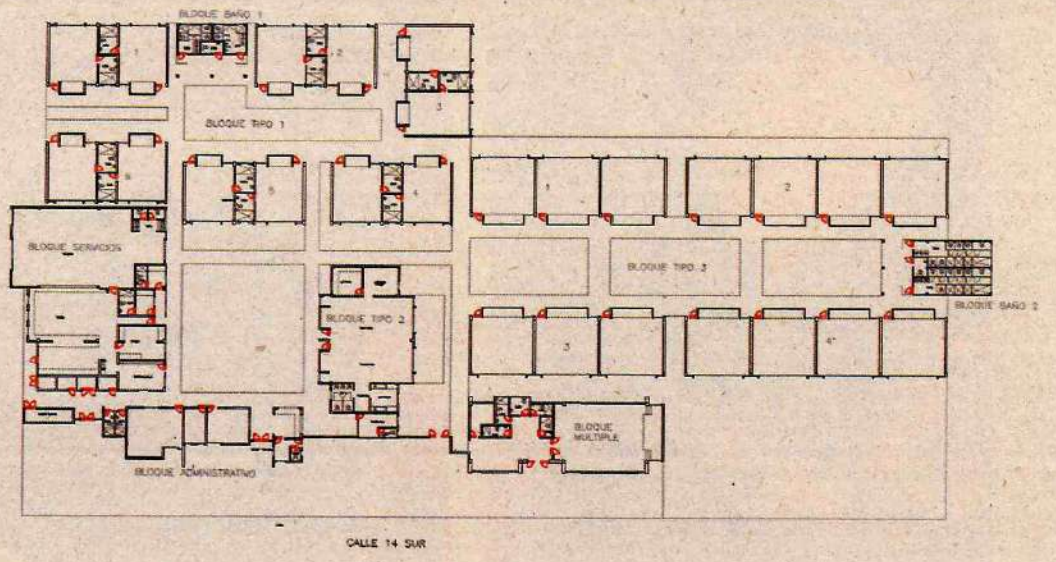

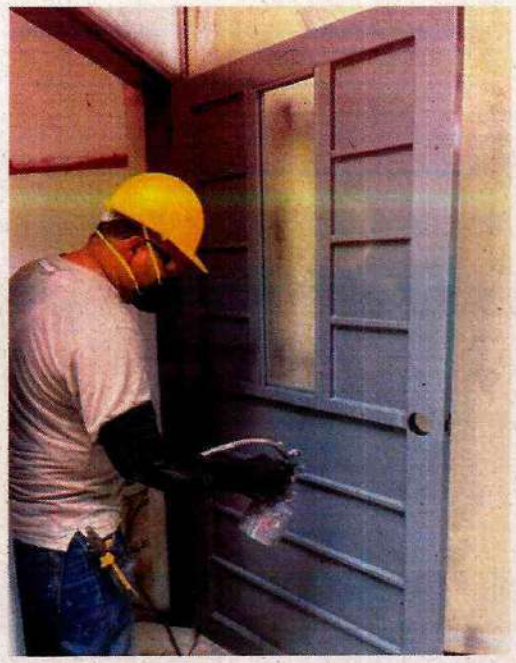

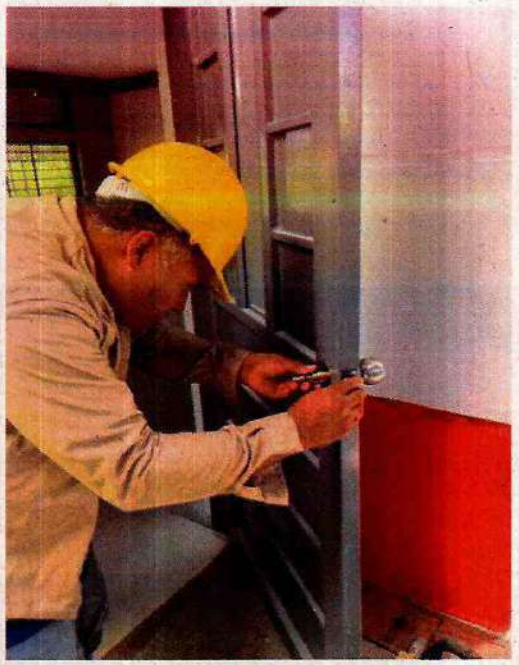

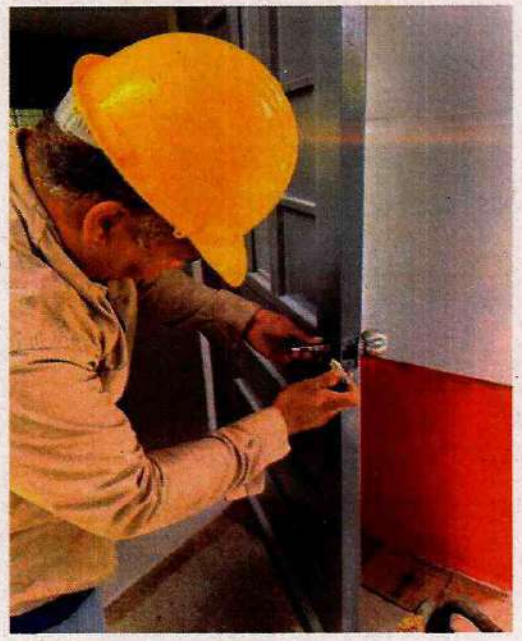



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2179/12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	13,07 MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS, INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ANCHO (M)	ALTO (M)	LADOS	M2
AULAS		4,0	1,0	2,40	2,00	19,20
BAÑOS NIÑOS		2,0	1,0	2,40	2,00	9,60
COCINA		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
ALMACEN		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
BAÑO - ALMACEN		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
ZONA DE LABORES		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
ENFERMERIA		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
PASILLO		1,0	1,0	2,40	2,00	4,80
					SUB TOTAL	57,60

GRAFICA







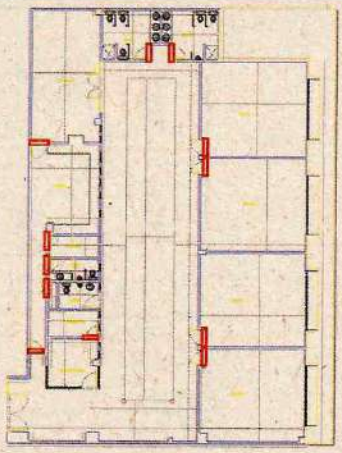

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	13,08	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VIDRIO Y ALUMINIO NATURAL.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ANCHO (M)	ALTO (M)	LADOS	M2
BLOQUE TIPO 1	VENTANAS DE 1.45m X 2.80m	12,00	2,80	1,45	1,00	48,72
	VENTANAS DE 1.45m X 1.10m	24,00	1,10	1,45	1,00	38,28
	VENTANAS DE 1.90m X 0.50m	2,00	1,90	0,50	1,00	1,90
	VENTANAS DE 0.75m X 0.50m	12,00	0,75	0,50	1,00	4,50
BLOQUE MULTIPLE	VENTANAS DE 1.10m X 1.30m	2,00	1,30	1,10	1,00	2,86
	VENTANAS DE 1.50m X 1.50m	2,00	1,50	1,50	1,00	4,50
	VENTANAS DE 1.00m X 1.50m	2,00	1,00	1,50	1,00	3,00
	VENTANAS DE 0.70m X 0.50m	1,00	0,70	0,50	1,00	0,35
BLOQUE TIPO 3	VENTANAS DE 1.45m X 4.90m	14,00	4,90	1,45	1,00	99,47
	VENTANAS DE 1.45m X 1.00m	14,00	1,00	1,45	1,00	20,30
		120,00			SUB TOTAL	223,88

PLANO

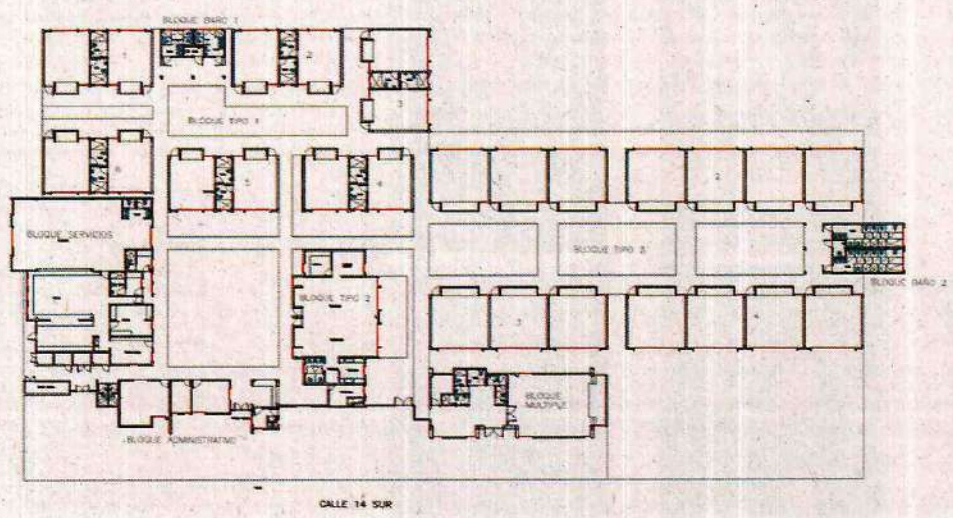

2180/12





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	13,08	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VIDRIO Y ALUMINIO NATURAL.			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
VENTANAS AULAS	4,0	3,9			1,05	16,38
VENTANAS BAÑO, ALMACEN	10,0	0,6			0,40	2,40
VENTANA COCINA	1,0	1,2			0,60	0,72
					SUB TOTAL	19,50

GRAFICA



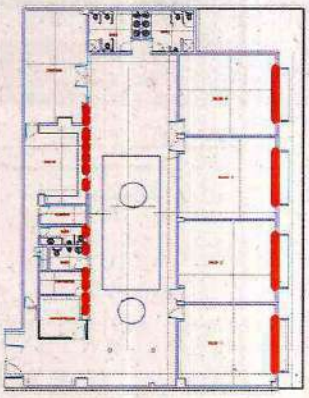CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision

2181/2


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1	

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA	FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024		
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	13,09	MANTENIMIENTO DE VENTANAS TIPO PERSIANAS EN ALUMINIO NATURAL.	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ANCHO (M)	ALTO (M)	LADOS	M2
BLOQUE TIPO 1	VENTANAS DE 0.65m X 2.80m	12,00	2,80	0,65	2,00	43,68
	VENTANAS DE 0.85m X 4.80m	12,00	4,50	0,85	2,00	91,80
BLOQUE MULTIPLE	VENTANAS DE 3.20m X 1.00m	5,00	3,20	1,00	2,00	32,00
BLOQUE TIPO 3	VENTANAS DE 0.75m X 4.90m	14,00	4,90	0,75	2,00	102,90
	VENTANAS DE 0.75m X 3.00m	28,00	3,00	0,75	2,00	126,00
		84,00			SUB TOTAL	396,38


PLANO

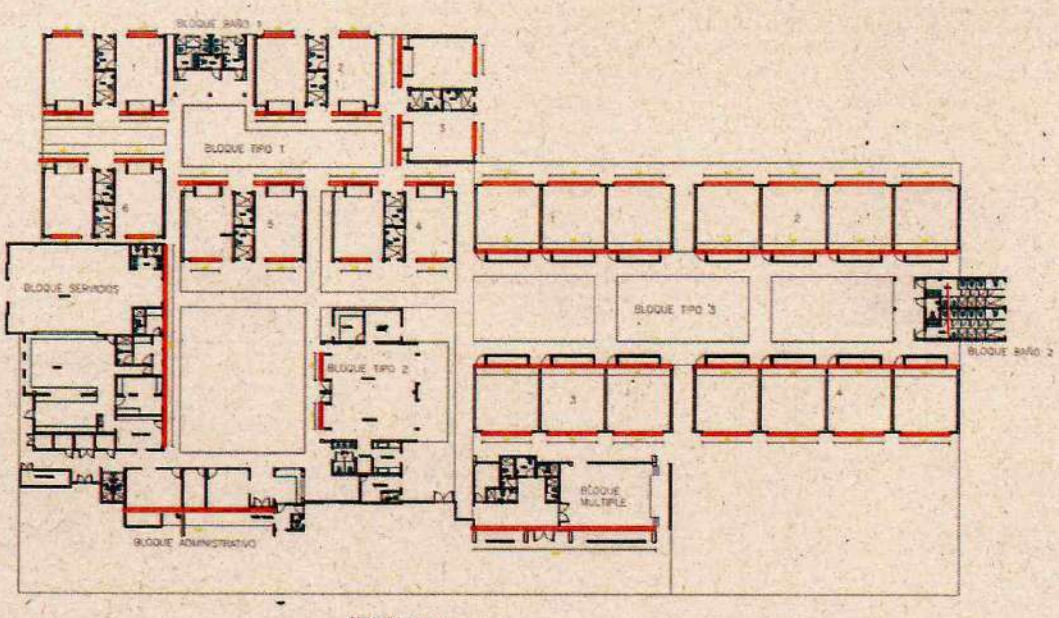

CALLE 14 SUR





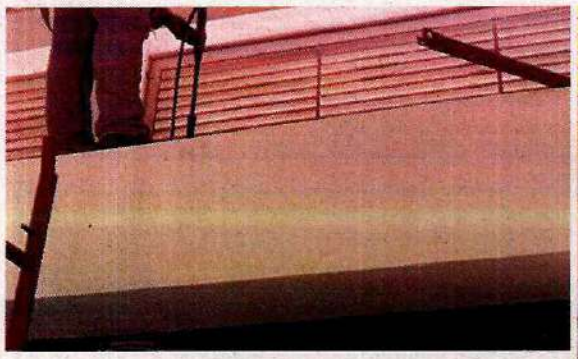



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a La Supervision-

2182/R



	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	PUERTAS				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	13,11	S/I PUERTA BATIENTE TIPO P2 - METALICA (0,9MX2,40M)			UNIDAD	UND
DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
BAÑO ZONA COMUN	1,0					1,00
COMEDOR	1,0					1,00
					SUB TOTAL	2,00

GRAFICA

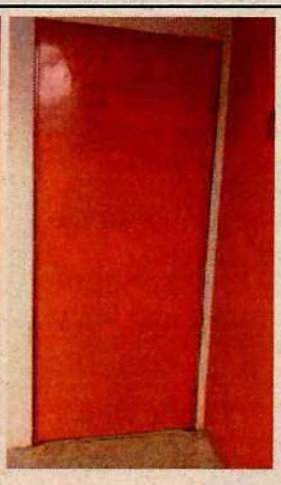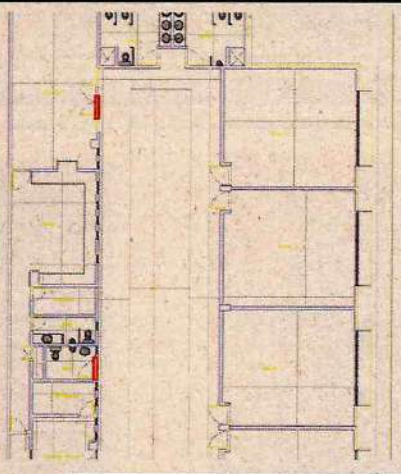

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	13,12	S/I CERROJO TIPO LLAVE-MARIPOSA PARA PUERTAS			UNIDAD	UND


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
AULAS	4,0					4,00
COCINA	1,0					1,00
ALMACEN	1,0					1,00
BAÑO - ALMACEN	1,0					1,00
ZONA DE LABORES	1,0					1,00
ENFERMERIA	1,0					1,00
PASILLO	1,0					1,00
					SUB TOTAL	10,00

GRAFICA







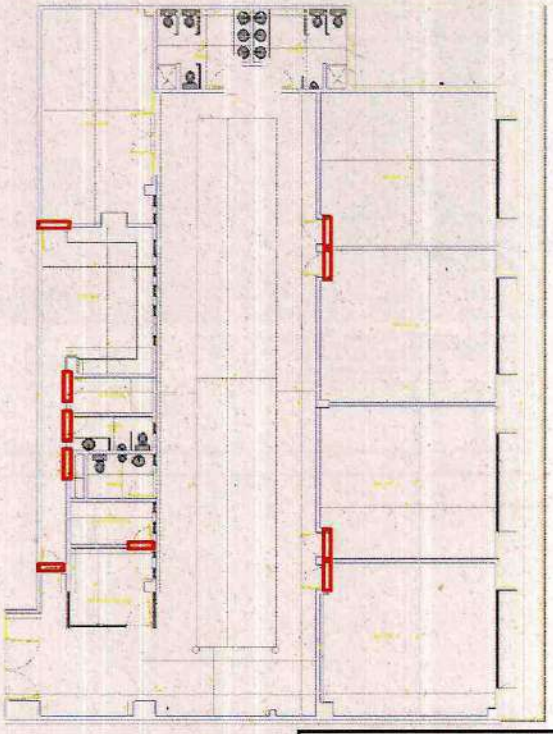

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2183/2


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA	FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024		
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024		
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA				

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	14,01	EXCAVACIÓN MANUAL	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	CANTIDAD		LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M3
CUNETA			150,00	0,50	0,40	30,00
					SUB TOTAL	30,00

GRAFICA

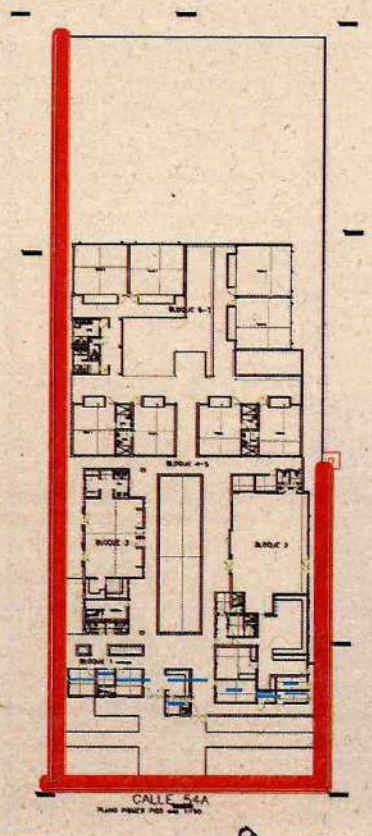

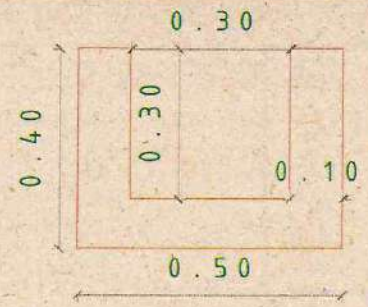



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	14,02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	PORCENTAJE DE EXPANSION (%)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M3
CUNETA		150,00	1,30	0,50	0,40	39,00
					SUB TOTAL	39,00

GRAFICA

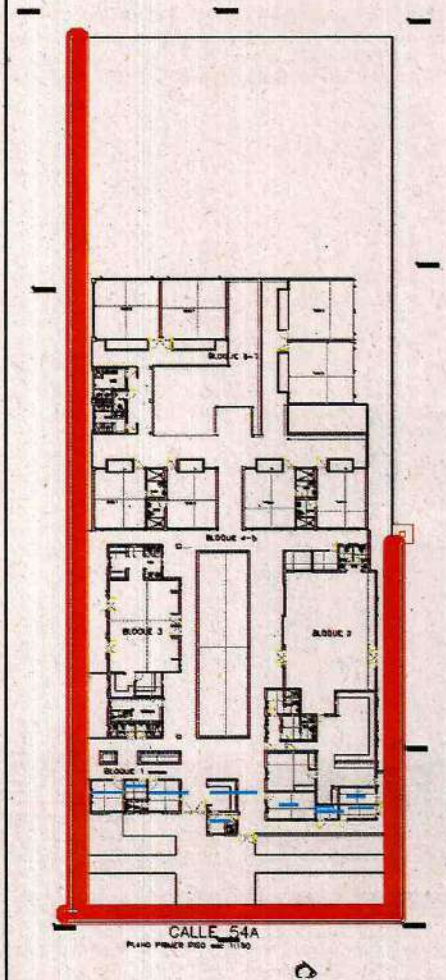

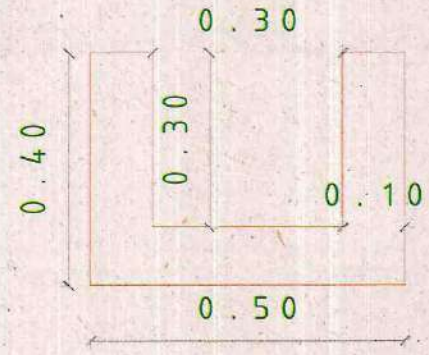



CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

2184/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	14,03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	PORCENTAJE DE EXPANSION (%)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M3
CUNETA		150,00		0,50	0,10	7,50
					SUB TOTAL	7,50

GRAFICA

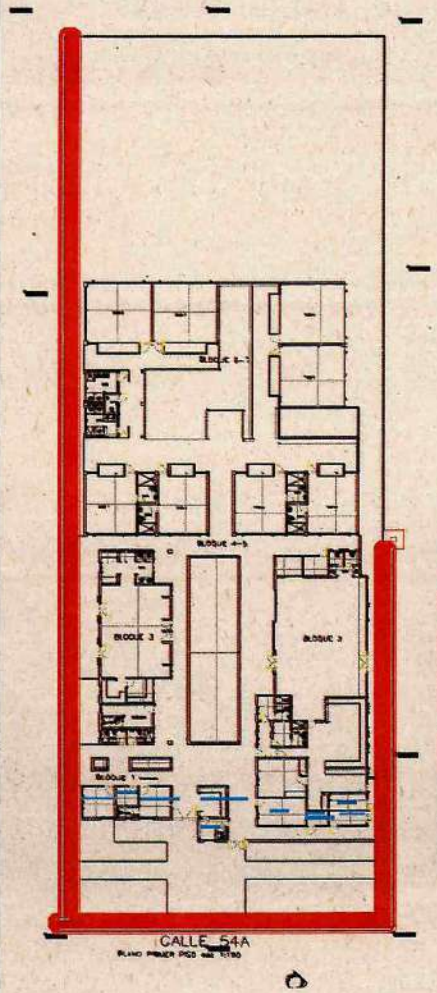

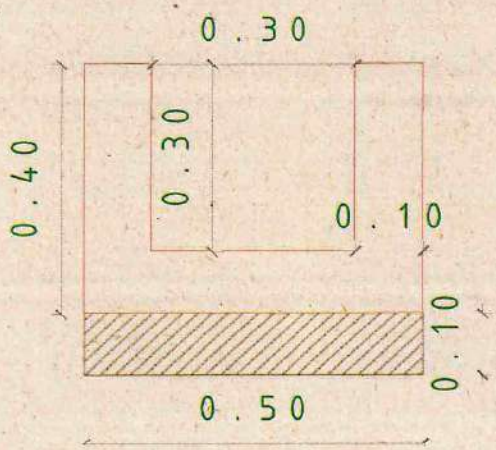





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2185/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	14,04	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA			UNIDAD	KG


DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	KG/M	ANCHO (M)	ALTO (M)	KG
ACERO LONGITUDINAL	8,00	150,00	0,56			672,00
ACERO TRANSVERSAL	1.001,00	1,00	0,56			560,56
ACERO TAPA CUNETA ENTRADA LONGITUDINAL	4,00	8,00				0,00
ACERO TAPA CUNETA ENTRADA TRANSVERSAL	54,00	0,50				0,00
					SUB TOTAL	1.232,56

GRAFICA

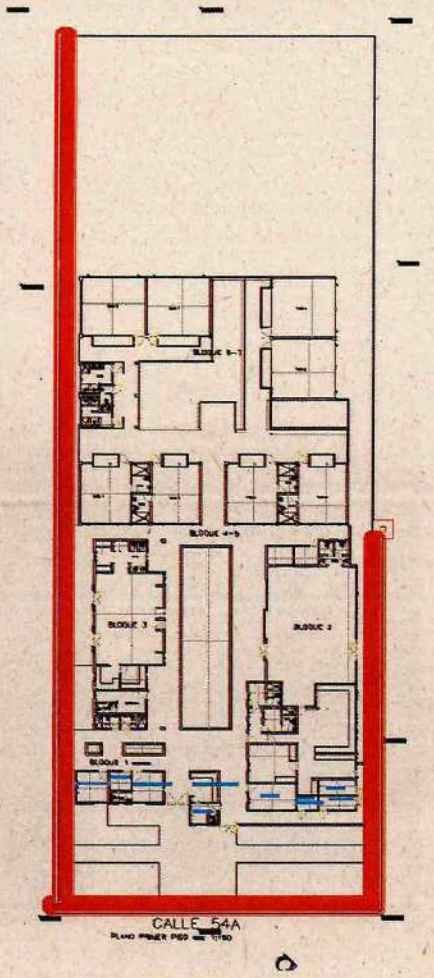

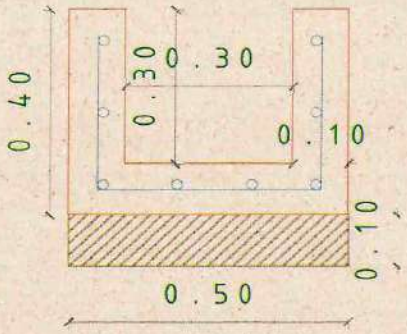



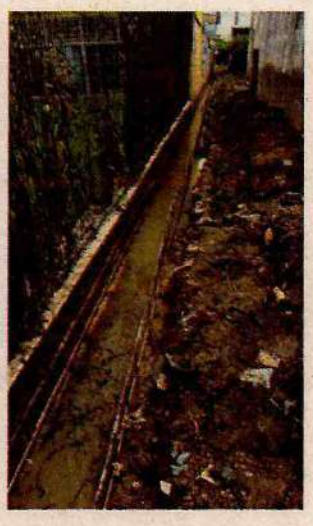

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2186/2


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1	


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	PUERTAS Y VENTANAS	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VILLA CIELO
ITEM	14,05 — CUNETA DE CONCRETO DE 3000 PSI VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	UNIDAD	M3

DESCRIPCION	LONGITUD (M)	ESPESOR (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	AREA (M2)	M3
CUNETA EN CONCRETO	150,00	0,10	0,30	0,30	0,11	16,50
TAPA CUNETA ENTREDA		0,10	0,50			-
					SUB TOTAL	16,50

GRAFICA

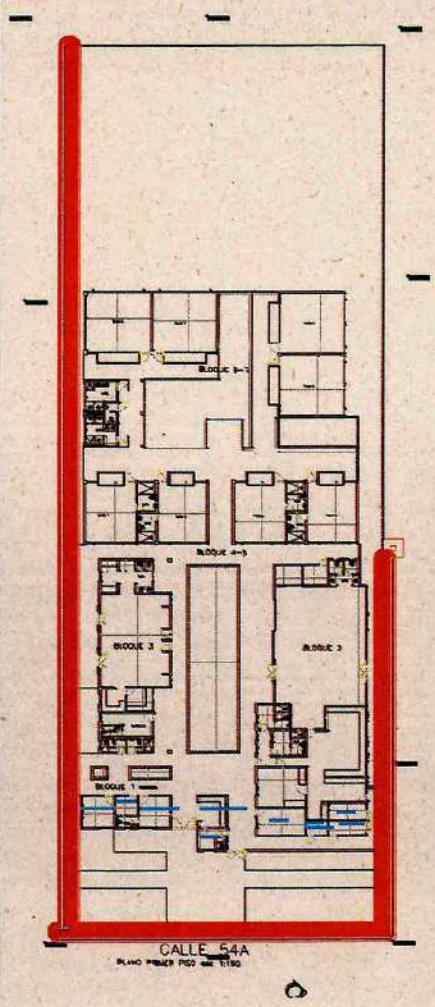

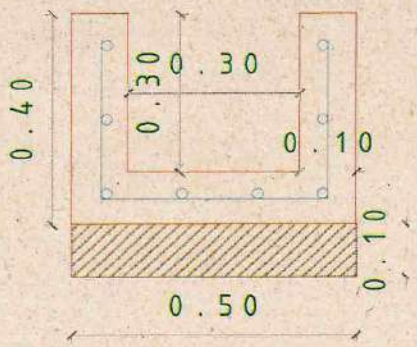





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2187/12


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	CIELO RASO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	15,01	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE PINTURA A 3 MANOS	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	ÁREA (M2)	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
BLOQUE BAÑO 1	21,02					21,02
BLOQUE MULTIPLE	130,87					130,87
BLOQUE TIPO 3	44,40					44,40
					SUB TOTAL	196,29

GRAFICA

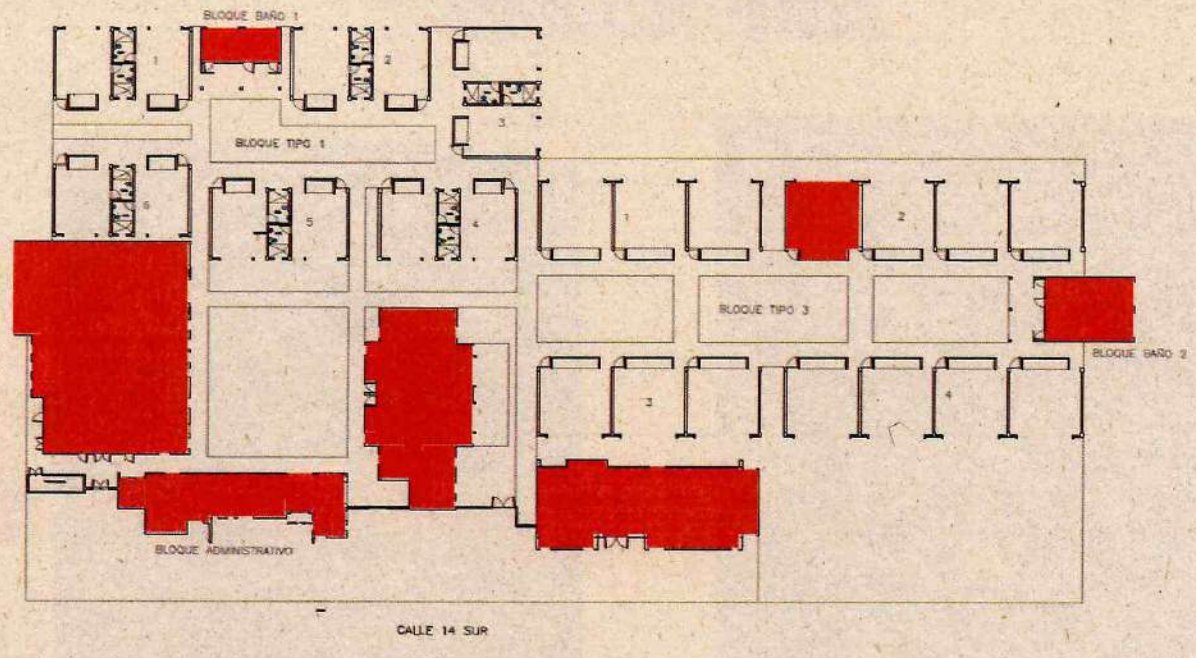

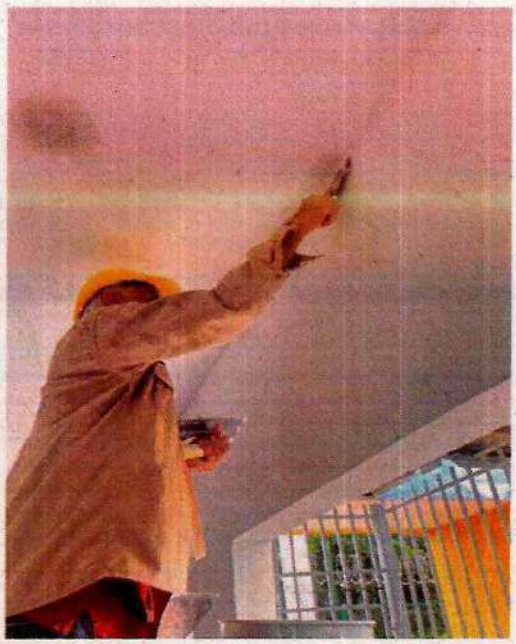

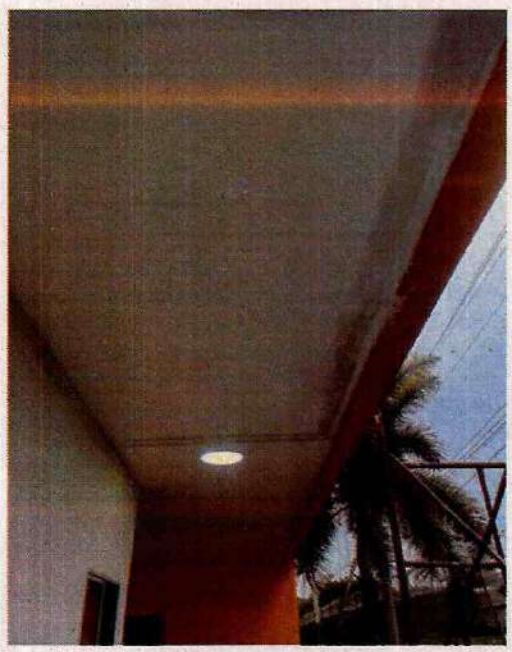

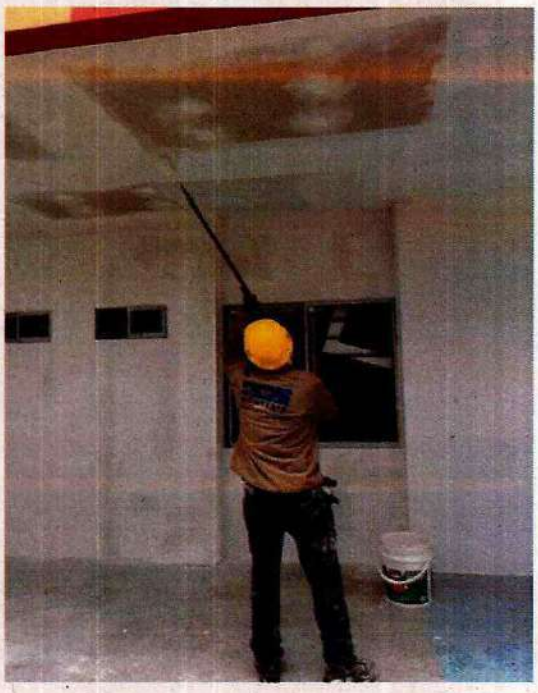


CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoría
FIRMA	


Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2188/R

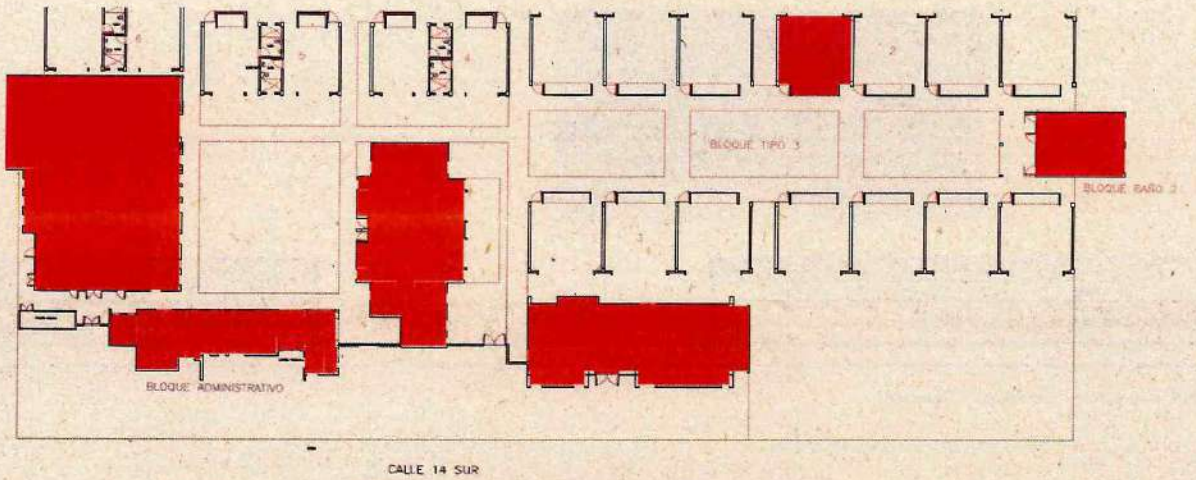
BLOQUE TIPO 3
BLOQUE BAÑO 2
BLOQUE ADMINISTRATIVO
CALLE 14 SUR






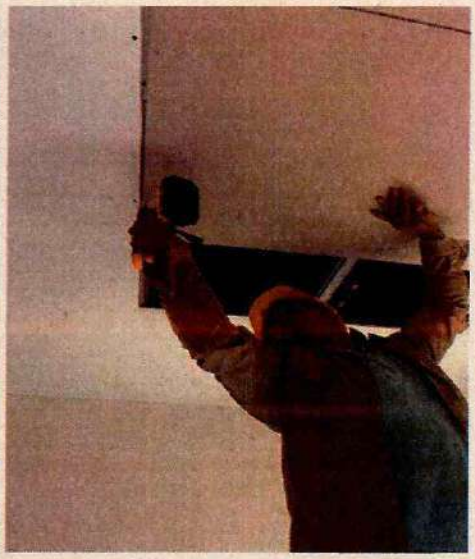





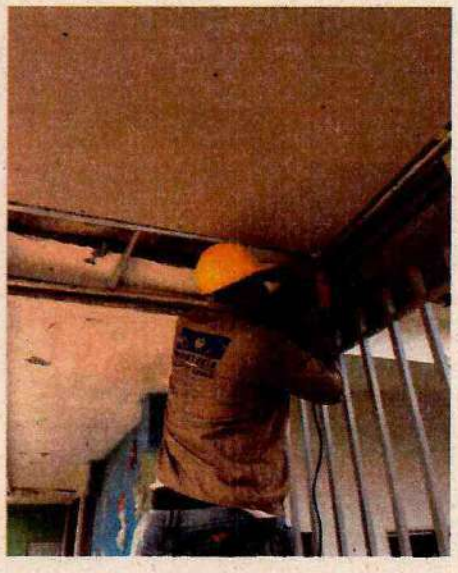





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andres Villalba- Dir. Interventoria
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2189/12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	CIELO RASO				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	15,03	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
OFICINA	1,0	3,17		3,05		9,67
						-
					SUB TOTAL	9,67

GRAFICA



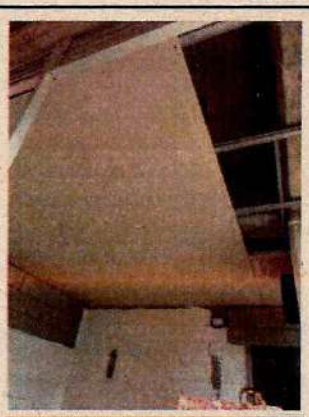

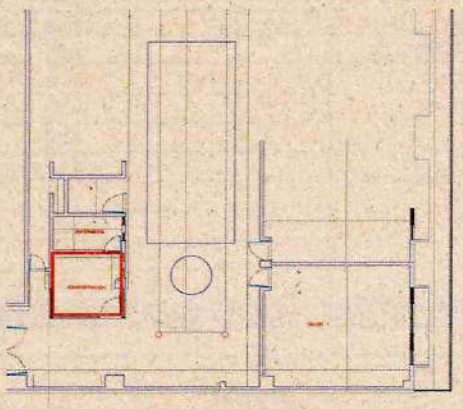





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	CIELO RASO	UNIDAD INTERVENIDA	CDI EL RECUERDO
ITEM	15,03 S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	LONGITUD (M)	ESPESOR(M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	CANTIDAD	M2
BLOQUE ADMINISTRATIVO	3,10			2,10	1,00	6,51
	0,90			2,60	1,00	2,34
	1,00			1,00	1,00	1,00
	1,60			1,15	1,00	1,84
	5,00			1,75	1,00	8,75
	2,25			2,00	1,00	4,50
AREA DE RESIDUOS	5,78			1,80	1,00	10,40
BLOQUE MULTIPLE	2,20			1,40	1,00	3,08
	2,00			2,00	1,00	4,00
	3,10			1,80	1,00	5,58
	5,89			1,20	1,00	7,07
	0,80			2,05	1,00	1,64
	1,20			0,60	1,00	0,72
	1,00			0,70	3,00	2,10
	3,00			0,30	2,00	1,80
					SUB TOTAL	61,33

GRAFICA



2190/12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CORDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	MUROS Y CONFINAMIENTO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	16,02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0,12MX0,20MX0,40M (R-10 MPA) CON PEGA DE MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO	UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
COMEDOR		2,30			1,30	2,99
					SUB TOTAL	2,99

GRAFICA



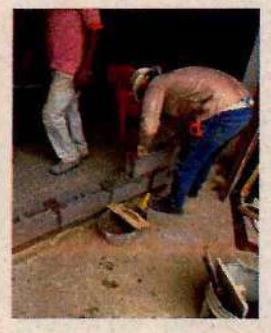

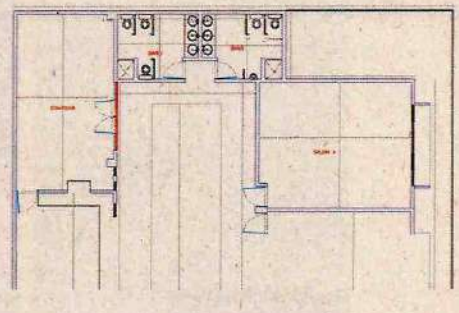

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1


DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					


CAPITULO	MUROS Y CONFINAMIENTO		UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	16,01	VIGA DINTEL DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0,20M	UNIDAD	M

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M
COMEDOR	1,00	3,27				3,27
APOYO CUBIERTA ZONA COMUN	2,00	18,00				36,00
					SUB TOTAL	39,27

GRAFICA



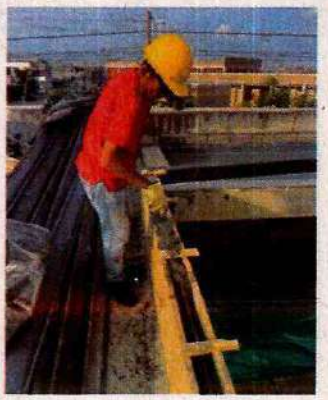

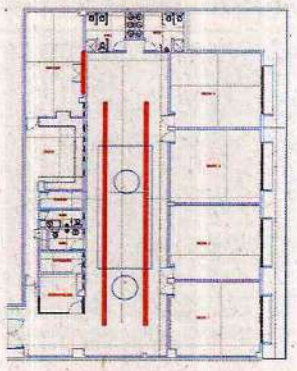

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2191/12

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA		FECHA	6/05/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024			
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA					

CAPITULO	CARPINTERIA METALICA	UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	16,03 LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10X20X40	UNIDAD	M2


DESCRIPCION	CANTIDAD	CANT AULAS	LONGITUD (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	M2
CALADOS INFERIORES DE AULAS	13,0	4,00		0,13	0,13	0,88
SOPORTE CUBIERTA ZONA COMUN	2,0		10,00		0,30	6,00
						-
					SUB TOTAL	6,88


GRAFICA







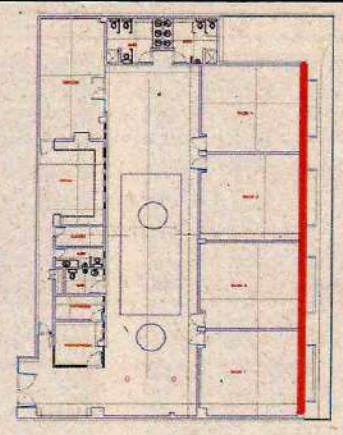

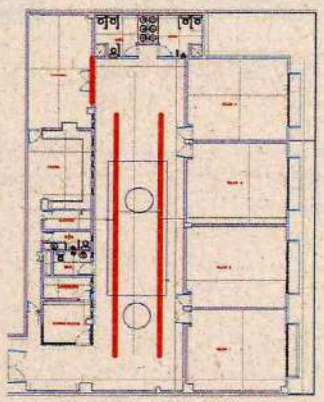

CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-


	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	4/03/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	CARPINTERIA METALICA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	17,01	REJILLA DE 0,30X1,70 EN PLATINA 1X3/16 Y ANGULO DE 1 1/2 @ 2CM			UNIDAD	UND

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	UND
COCINA	2,0					2,00
						-
						-
					SUB TOTAL	2,00

GRAFICA

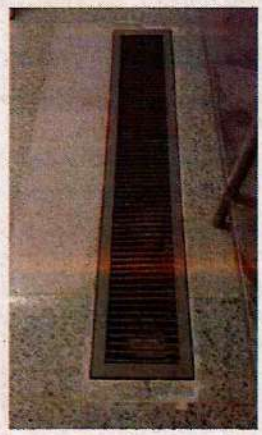





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisó: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

2192

	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Página 1 de 1

DEPARTAMENTO:	CÓRDOBA	MUNICIPIO:	MONTERÍA			FECHA	4/03/2025
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A SAS	CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024				
INTERVENTOR:	BUSERCO SAS	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024				
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA FISICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA						


CAPITULO	11. CARPINTERIA EN MADERA				UNIDAD INTERVENIDA	CDI VALLEJO
ITEM	18,01	S/I ENTREPAÑOS EN MADERA PARA ORGANIZADORES EN AULAS DE CLASES			UNIDAD	M2

DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD (M)	DIAMETRO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	Area (m2)
AULA 1	1,00	4,30			2,00	8,60
AULA 2	1,00	4,23			2,00	8,46
AULA 3	1,00	4,13			2,00	8,26
AULA 4	1,00	4,31			2,00	8,62
AULA 5	1,00	3,00			2,00	6,00
					SUB TOTAL	39,94

GRAFICA





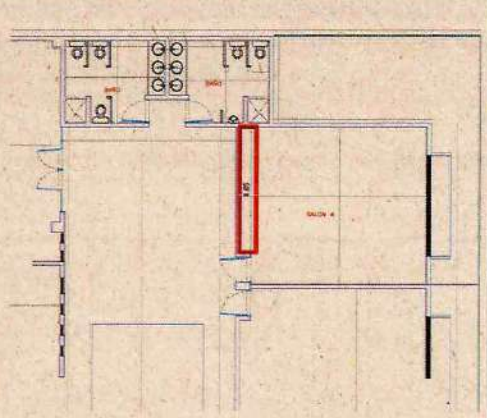





CONTRATISTA	
NOMBRE	Mario Petro Reyes - Director de Obra
FIRMA	

INTERVENTOR	
NOMBRE	Andrés Villalba - Director de Interventoría
FIRMA	

Revisò: Rodrigo Moreno Paez - Apoyo a la Supervision-

INFORMES SEMANALES

2193

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	14	4	2025	SEMANA No.:	1	DEL:	7-abr-25	AL:	13-abr-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA				
OBJETO:	DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P.Y A S.A.S.			CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S			
REP. LEGAL:	JULIAN GOMEZ MURILLO			REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA			
CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024	VALOR INICIAL:	$ 2.545.193.168,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 172.486.542,00	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -	
PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 2.545.193.168,00	PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 172.486.542,00	
SUSPENSIÓN 1:	N/A			SUSPENSIÓN 1:	N/A			
REINICIO 1:	N/A			REINICIO 1:	N/A			

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%		$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:		$ -
PARCIAL 1:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0,00%	
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJECUTADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1.01	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES DE CONCRETO. INCLUYE RETIRO.	M2	$ 29.871,00	1373,79	$ 41.036.481,00
1.02	DESMONTE DE CUBIERTA. INCLUYE RETIRO.	M2	$ 38.896,00	163,48	$ 6.358.718,00
1.03	REMOCION DE PINTURA	M2	$ 10.999,00	1962,50	$ 21.585.538,00
1.05	DEMOLICION DE MUROS E=0.15MTS/0.20MTS INCLUYE RETIRO	M2	$ 44.902,00	24,35	$ 1.093.059,00
1.06	DESCAPOTE A MAQUINA H=0.50 M	M2	$ 2.305,00	775,95	$ 1.788.565,00
1.07	DESCAPOTE MANUAL	M2	$ 7.823,00	224,17	$ 1.753.682,00
1.08	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	$ 36.307,00	429,37	$ 15.589.137,00
1.09	MANTENIMIENTO DE PROTECTORES DE VENTANAS. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M2	$ 111.571,00	293,02	$ 32.692.534,00
1.10	DESMONTE DE PUERTA METALICAS O DE MADERA. INCLUYE RETIRO.	M2	$ 20.933,00	138,30	$ 2.895.034,00
1.11	DESMONTE DE APARATO SANITARIO - POSETA - LAVAPLATOS	UND	$ 69.020,00	41,00	$ 2.829.820,00
1.13	MANTENIMIENTO DE MALLA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M2	$ 161.563,00	596,70	$ 96.404.642,00
1.15	DESMONTE CIELO RASO. INCLUYE RETIRO	M2	$ 30.190,00	71,00	$ 2.143.490,00
1.16	MANTENIMIENTO DE JUNTAS Y ENCHAPES DE PISO Y MUROS. INCLUYE RETIRO Y APLICACION DE BOQUILLA EN JUNTAS, LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MAQUINA A PRESION.	M2	$ 39.226,00	207,47	$ 8.136.218,00
1.17	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE APARATOS SANITARIOS. INCLUYE DESISTALACION E INSTALACION, LIMPIEZA DE MANCHAS CON PRODUCTOS ESPECIALIZADOS Y MAQUINA A PRESION.	UND	$ 214.423,00	16,00	$ 3.430.768,00
1.18	MANTENIMIENTO Y PODA DE ZONAS VERDES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 9.870,00	55,94	$ 552.126,00
1.19	DEMOLICION E INSTALACION DE CERAMICA EN GRANITO MARMOLIZADO	M2	$ 120.880,00	1,00	$ 120.880,00
1.20	MANTENIMIENTO DE GABINETE DE RED CONTRA INCENDIO	UND	$ 190.459,00	1,00	$ 190.459,00
1.21	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA. INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M	$ 32.521,00	717,99	$ 23.349.753,00
2.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA	M3	$ 158.202,00	360,00	$ 56.952.720,00
8.01	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	$ 44.560,00	25,84	$ 1.151.430,00
16.01	VIGA DINTEL DE 0,12M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) CON 2 VARILLAS DE 1/2 Y ESTRIBOS 1/4 @0,20M	M	$ 110.227,00	39,27	$ 4.328.614,00
16.02	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL DE 0,12MX0,20MX0,40M (R-10 MPA) CON PEGA DE MORTERO 1:3. INCLUYE REFUERZO	M2	$ 191.093,00	2,99	$ 571.368,00
16.03	LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE MACIZO DE 10X20X40	M2	$ 127.477,00	6,88	$ 877.042,00
				COSTO TOTAL OBRAS	$ 325.827.080,00
				PGIO	$ 3.258.270,75
				COSTO TOTAL OBRAS	$ 329.085.350,75

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	0,00%	0,00%	-12,07%
DURANTE EL PERIODO	25,00%	12,93%	
ACUMULADO ACTUAL	25,00%	12,93%	



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

SE TOMAN MUESTRAS PARA DENSIDADES DE MATERIAL DE RELLENO, ASÍ COMO EL CONTROL DE MEDICIONES Y TOMA DE CANTIDADES SEGÚN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN DIAS DE LA SEMANA, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE EL SUMINISTRO Y BUENA INSTALACION DE ELEMENTOS CONSIGNADOS EN LOS PRESUPUESTOS PARA LA OPTIMA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO TOMA DE EVIDENCIAS Y VERIFICACION DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIALMENTE EN AQUELLOS QUE NO PRESENTAN ACABADO SUPERFICIAL.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROCEDERÁ EN MAYOR ACTIVIDAD TODAS AQUELLOS TRABAJOS RELACIONADOS CON PRELEIMINARES SEGUN EL CENTRO A INTERVENIR, CDI RECUERDO PRINCIPALMENTE DONDE SE DERROLLAN ACTIVIDADES DE REMOCION DE ACABADOS DE MURO EN FACHADAS E INTERIORES, DE IGUAL FORMA ACTIVIDADES CUYO CONTENIDO CONTENGA INSTALACIONES H&H (PREELIMINARES, INSTALACIONES, PUNTOS ETC.) ASI COMO EN CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y MTERIAL DE DEMOLICION PARA DESPEJE DE AREAS DE TRABAJO.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VII. FIRMAS

BUSERCO S.A.S	RODRIGO MORENO PAZ
R.L. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORO	REVISÓ

2194

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	21	4	2025	SEMANA No.:	2	DEL:	14-abr-25	AL:	20-abr-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.			CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S		
REP. LEGAL:	JULIAN GOMEZ MURILLO			REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		
CONTRATO No:	LP-SIM-030-2024	VALOR INICIAL:	$ 2.545.193.168,00	CONTRATO No:	CMA-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 172.486.542,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	N/A			PRORROGA 1:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 2.545.193.168,00	SUSPENSIÓN 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 172.486.542,00
REINICIO 1:	N/A			REINICIO 1:	N/A		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%:		$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:		$ -
PARCIAL 1:	$ -				
PARCIAL 2:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0,00%	
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJECUTADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1.03	REMOCION DE PINTURA	M2	$ 10.999,00	1500,00	$ 16.498.500,00
2.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO EXTENDIDO A MAQUINA	M3	$ 158.202,00	315,08	$ 49.846.256,00
3.01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 181.972,00	150,00	$ 27.295.800,00
4.01	IMPERMEABILIZACION DE VIGA CANAL O LOSA SUPERIOR	M2	$ 57.066,00	789,32	$ 45.038.599,00
4.02	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTETICO	KG	$ 24.585,00	300,00	$ 7.375.500,00
4.03	S/I DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA BLANCA E=2,5MM	M2	$ 139.134,00	72,00	$ 10.017.648,00
4.04	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE DESAGUE DE AGUA LLUVIA. INCLUYE SONDEO	M	$ 32.156,00	66,50	$ 2.138.374,00
4.07	LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y CUBIERTA METALICA EN ACERO LAMINADO.	M2	$ 32.811,00	976,24	$ 32.031.411,00
4.08	IMPERMEABILIZACION DE REDOBLON	M	$ 38.173,00	210,86	$ 8.018.620,00
5.01	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	M2	$ 31.930,00	580,00	$ 18.519.400,00
12.01	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	$ 45.145,00	53,00	$ 2.392.685,00
12.02	TUBERIA 1/2" RDE 13,5. INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 14.604,00	101,63	$ 1.484.205,00
12.03	TUBERIA DE 1" RDE 21. INCLUYE ACCESORIOS	M	$ 25.703,00	101,63	$ 2.611.336,00
14.01	EXCAVACION MANUAL	M3	$ 115.106,00	30,00	$ 3.453.180,00
14.02	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE, CON ACARREO LIBRE	M3	$ 36.307,00	39,00	$ 1.415.973,00
14.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 181.972,00	7,50	$ 1.364.790,00
14.04	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	$ 11.544,00	1232,56	$ 14.228.673,00
14.05	CUNETA DE CONCRETO DE 3000 PSI VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3	$ 1.312.124,00	16,50	$ 21.650.046,00
15.01	MANTENIMIENTO DE CIELO RASO EN DRYWALL, INCLUYE PINTURA A 3 MANOS	M2	$ 40.661,00	196,29	$ 8.020.606,00
15.03	S/I CIELO RASO DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS	M2	$ 130.065,00	71,00	$ 9.234.615,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
				COSTO TOTAL OBRAS:	$ 282.642.247,00
				PGIO:	$ 2.826.422,47
				COSTO TOTAL OBRAS:	$ 285.468.669,47

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	25,00%	12,93%	-20,85%
DURANTE EL PERIODO	20,00%	11,22%	
ACUMULADO ACTUAL	45,00%	24,15%	



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

SE TOMAN MUESTRAS DE CILINDROS DE CONCRETO DE LA ACTIVIDAD DE FUNDIDA DE CUNETAS, TAMBIEN CONTROL (CERTIFICACION) DE SUMINISTRO DE MATERIALES EN ACERO COMO PERFILES METALICOS PARA CUBIERTA, Y OTROS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CON BASE EN LOS MATERIALES CONSIGNADOS EN APU PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO, ASI COMO REVISION Y VERIFICACIÓN DE MEDIDA Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROYECTA LA INSTALACION DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ACOMETIDAS H&H EN LAS UNDS DE CDI VILLA CIELO, ASI COMO ACTIVIDADES DE ACABADOS EN FACHADAS EN EL CENTRO EL RECUERDO Y EL MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (VENTANAS Y PUERTAS) RESPECTO A REMOCION DE PINTURA, NUEVA PINTURA INCLUYE ANTICORRSIVO, INSTALACION DE HERRAJES E INSTALACION DE ESTOS ELEMENTOS EN SUS RESPECTIVOS VANOS.

VI. REGISTRO FOTOGRAFICO



VII. FIRMAS

BUSERCO S.A.S	RODRIGO MORENO PAZ
R.L. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORO	REVISO

2195

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	28	4	2025	SEMANA No.:	3	DEL	21-abr-25	AL	27-abr-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			OBJETO:	INTERVENTORÍA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	IBÉRICA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.			CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S		
REP. LEGAL:	JULIAN GOMEZ MURILLO			REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		
CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024	VALOR INICIAL:	$ 2.545.193.188,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 172.486.542,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 2.545.193.188,00	PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 172.486.542,00
SUSPENSION 1:	N/A			SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A			REINICIO 1:	N/A		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO			PORCENTAJE%		$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:			TOTAL PAGADO:	$	-
PARCIAL 1:	$ -				
PARCIAL 2:	$ -		% AVANCE FINANCIERO:	0,00%	
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FISICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJECUTADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
1,03	REMOCION DE PINTURA	M2	$ 10.869,00	2435,01	$ 26.782.675,00
3,01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$ 181.872,00	292,85	$ 53.290.500,00
3,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION Y SELLO.	M2	$ 194.618,00	499,73	$ 97.256.453,00
3,03	PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION, SELLOS Y ENDURECEDOR	M2	$ 234.432,00	150,00	$ 35.164.800,00
4,02	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA CUBIERTA EN PERFIL PHR, PINTADA CON BASE ANTICORROSIVA Y ACABADO ESMALTE SINTETICO	KG	$ 24.585,00	270,24	$ 6.643.850,00
5,01	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	M2	$ 31.930,00	630,00	$ 20.115.900,00
5,01	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	$ 29.433,00	1900,00	$ 47.092.800,00
5,02	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M	$ 14.792,00	2500,00	$ 36.980.000,00
5,03	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	M2	$ 23.635,00	1700,00	$ 40.179.500,00
5,04	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	M	$ 12.191,00	3000,00	$ 36.573.000,00
9,02	PUNTO SANITARIO DE 2" - PARED	UND	$ 59.500,00	24,00	$ 1.428.000,00
9,03	PUNTO SANITARIO DE 2" - PISO	UND	$ 62.291,00	28,00	$ 1.744.148,00
9,04	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	$ 139.780,00	21,00	$ 2.935.380,00
9,05	S/I TUBERIA SANITARIA DE 2"	M	$ 41.369,00	52,94	$ 2.190.075,00
9,06	S/I TUBERIA SANITARIA DE 4"	M	$ 66.359,00	126,33	$ 8.383.132,00
9,07	S/I YEE DE 4" PVC-S	UND	$ 66.385,00	2,00	$ 120.770,00
9,08	S/I YEE DE 2" PVC-S	UND	$ 25.891,00	9,00	$ 233.019,00
9,09	S/I YEE DE 4X2" PVC-S	UND	$ 54.085,00	16,00	$ 865.360,00
9,1	S/I CODO DE 4"X45° PVC-S	UND	$ 41.316,00	24,00	$ 991.584,00
9,11	S/I CODO DE 2"X45° PVC-S	UND	$ 20.304,00	66,00	$ 1.340.064,00
9,12	S/I UNIÓN DE 4" PVC-S	UND	$ 30.578,00	22,00	$ 672.572,00
9,13	S/I UNIÓN DE 2" PVC-S	UND	$ 18.316,00	4,00	$ 73.264,00
13,02	MANTENIMIENTO PUERTAS Y MARCOS METALICOS, INCLUYE ALARGAMIENTO DE MARCOS, LIJADA, ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M2	$ 214.010,00	80,01	$ 17.122.940,00
13,05	S/I VENTANA EN VIDRIO, INCLUYE MARCO	M2	$ 365.206,00	2,40	$ 876.494,00
13,07	MANTENIMIENTO PUERTAS METALICAS, INCLUYE PULIDO CON LIJA, APLICACION DE ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE.	M2	$ 181.353,00	253,20	$ 45.918.580,00
13,08	MANTENIMIENTO VENTANAS EN VIDRIO Y ALUMINIO NATURAL	M2	$ 163.850,00	243,38	$ 39.877.813,00
13,09	MANTENIMIENTO DE VENTANAS TIPO PERSIANAS EN ALUMINIO NATURAL	M2	$ 21.350,00	396,38	$ 8.462.713,00
13,11	S/I PUERTA BATIENTE TIPO P2 - METALICA (0,9MX2,40M)	UND	$ 574.993,00	2,00	$ 1.149.786,00
13,12	S/I CERROJO TIPO LLAVE-MARIPOSA PARA PUERTAS	UND	$ 108.785,00	10,00	$ 1.087.850,00
					$ -
				COSTO TOTAL OBRAS	$ 535.553.122,00
				PGIO	$ 9.355.531,22
				COSTO TOTAL OBRAS	$ 540.908.653,22

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	45,00%	24,15%	-14,60%
DURANTE EL PERIODO	15,00%	21,25%	
ACUMULADO ACTUAL	60,00%	45,40%	



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

SE TOMAN MUESTRAS PARA DENSIDADES DE MATERIAL DE RELLENO Y MUESTRAS DE CILINDROS DE CONCRETO DE LA ACTIVIDAD DE FUNDIDA DE PLACAS DE PISOS EN CDI VILLA CIELO, TAMBIEN CONTROL (CERTIFICACION) DE SUMINISTRO DE MATERIALES EN ACERO COMO PERFILES METALICOS PARA CUBIERTA, Y OTROS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CON BASE EN LOS MATERIALES CONSIGNADOS EN APU PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO, ASI COMO REVISION DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE ACABADOS DE FACHADA EN CDI EL RECUERDO.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

SE PROYECTA LA INSTALACION DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES CONCRETOS EN LOSAS DE PISO EN CDI VILLA CIELO, INSTALACION DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES A ACOMETIDAS H&H EN LAS UNDS DE CDI VILLA CIELO Y EL RECUERDO, ASI COMO VERIFICACION DE SUMINISTROS EN EL COMPONENTE ELECTRICO Y SU INSTALACION EN LA ACOMETIDA.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VII. FIRMAS

BUSERCO S.A.S	RODRIGO MORENO PAZ
R.L. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	APOYO A LA SUPERVISIÓN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORO	REVISO

2196

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE 2
	VERSIÓN	1	
INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039	

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	5	5	2025	SEMANA No.:	4	DEL	28-abr-25	AL 4-may-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	IBERICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.			CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S		
REP. LEGAL:	JULIAN GOMEZ MURILLO			REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		
CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024	VALOR INICIAL:	$ 2.545.193.168,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 172.486.542,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 2.545.193.168,00	PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 172.486.542,00
SUSPENSIÓN 1:	N/A			SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A			REINICIO 1:	N/A		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%		$	-
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:		$	-
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0,00%		
PARCIAL 2:	$ -				
PARCIAL 3:	$ -				
FINAL:	$ -				

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJECUTADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
3,02	PLACA EN CONCRETO 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACION Y SELLO.	M2	$ 194.618,00	400,90	$ 78.002.894,00
3,03	PLACA EN CONCRETO ACABADO PULIDO DE 21 MPA, E=0,10M, INCLUYE MALLA, JUNTA DILATACIÓN, SELLOS Y EDURECEDOR	M2	$ 234.432,00	133,89	$ 31.386.100,00
5,01	ESTUCO ACRILICO PARA INTERIOR Y EXTERIOR	M2	$ 31.930,00	479,74	$ 15.318.098,00
6,01	PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M2	$ 29.433,00	1427,77	$ 42.023.554,00
6,02	PINTURA LINEAL PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	M	$ 14.792,00	2389,58	$ 35.346.987,00
6,03	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	M2	$ 23.836,00	1348,61	$ 31.974.397,00
6,04	PINTURA LINEAL VINILO TIPO 1 (2 MANOS)	M	$ 12.191,00	2073,79	$ 25.281.574,00
11,01	S/I DE TOMACORRIENTE A 110V NORMAL. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	$ 63.665,00	29,00	$ 1.846.285,00
11,02	S/I DE TOMACORRIENTE A 220V CON TOMA MIRADA CHINA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	$ 168.016,00	1,00	$ 168.016,00
11,03	S/I DE SWICHE SENCILLO.	UND	$ 51.340,00	8,00	$ 410.720,00
11,04	S/I DE SWICHE DOBLE	UND	$ 58.484,00	18,00	$ 1.052.712,00
11,05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 24W. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 207.786,00	4,00	$ 831.144,00
11,06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA OJO DE BUEY LED 12W DE 5" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS	UND	$ 193.768,00	8,00	$ 1.550.144,00
11,07	S/I DE LAMPARA LED T8 HERMETICA 2X18W COLOR BLANCO	UND	$ 227.480,00	0,00	$ -
11,08	TOMA CORRIENTE DOBLE GFCI 20 AMP USO INTERIOR/EXTERIOR	UND	$ 70.802,00	6,00	$ 424.812,00
11,09	POCO REFLECTOR LED EXTERIOR 50W	UND	$ 106.345,00	4,00	$ 425.380,00
11,10	REUBICACION DE TOMA CORRIENTE	UND	$ 178.963,00	40,00	$ 7.158.520,00
11,16	S/I DE VENTILADOR TIPO KDK O SIMILAR Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UND	$ 1.107.715,00	68,00	$ 75.324.620,00
11,21	S/I DE BOMBILLA SUPERLED DE 50W, LUZ BLANCA, 6500K	UND	$ 55.442,00	5,00	$ 277.210,00
11,23	LAMPARA LED T8 2X10W 6400K COLOR BLANCO	UND	$ 85.251,00	38,00	$ 2.479.538,00
11,24	MANTENIMIENTO DE VENTILADOR DE TECHO	UND	$ 116.396,00	9,00	$ 1.047.564,00
11,25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE VENTILADOR CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, LEV REF 5320 BLANCO, 125V Y SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R, CERTIFICACIÓN RETIE Y PRUEBAS DE CONFORMIDAD UL. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2",CONDUCTORES DE COBRE 12 Libre de Halogenos, OBRA CIVIL, Y DEMÁS ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	UND	$ 510.124,00	13,00	$ 6.631.612,00
					$ -
				COSTO TOTAL OBRAS	$ 359.083.561,00
				PGIO	$ 3.588.635,61
				COSTO TOTAL OBRAS	$ 362.452.196,61

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	60,00%	45,40%	-30,36%
DURANTE EL PERIODO	30,00%	14,24%	
ACUMULADO ACTUAL	90,00%	59,64%	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE 2
	VERSIÓN	1	
INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039	

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS DE CONCRETO DE LA ACTIVIDAD DE FUNDIDA DE PLACAS DE PISOS EN CDI VILLA CIELO, TAMBIEN CONTROL (CERTIFICACION) DE SUMINISTRO DE MATERIALES EN ACERO COMO PERFILES METALICOS PARA CUBIERTA, Y OTROS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS CON BASE EN LOS MATERIALES CONSIGNADOS EN APU PARA LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO. EN ESTA SEMANA EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE ELECTRICO SE VERIFICÓ TANTO SUS SUMINISTROS COMO SU INSTALACION QUE SEA CON LOS PROCESOS REQUERIDOS.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

SE PLANEA LA INSTALACION DE ELEMENTOS DE ACOMETIDAS H&H EN CDI VALLEJO, ASÍ COMO LE VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTAS INSTALACIONES.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







VII. FIRMAS

BUSERCO S.A.S R.L ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA ELABORO	RODRIGO MORENO PAZ APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA REVISO

	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA DE PRESENTACIÓN:	6	5	2025	SEMANA No.:	5	DEL	5-may-25	AL	6-may-25

CONTRATO DE OBRA				CONTRATO DE INTERVENTORIA			
OBJETO:	DIAGNOSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.			OBJETO:	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CONTRATISTA:	IBÉRICA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES P Y A S.A.S.			CONTRATISTA:	BUSERCO S.A.S		
REP. LEGAL:	JULIAN GOMEZ MURILLO			REP. LEGAL:	ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA		
CONTRATO No.	LP-SIM-030-2024	VALOR INICIAL:	$ 2.545.193.168,00	CONTRATO No.	CMA-SIM-035-2024	VALOR INICIAL:	$ 172.486.542,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -	PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES	ADICIONES:	$ -
PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 2.545.193.168,00	PRORROGA 1:	N/A	VALOR TOTAL	$ 172.486.542,00
SUSPENSIÓN 1:	N/A			SUSPENSIÓN 1:	N/A		
REINICIO 1:	N/A			REINICIO 1:	N/A		

II. AVANCE FINANCIERO DE LA OBRA

ANTICIPO		PORCENTAJE%	$ -
RESUMEN ACTAS PAGADAS:		TOTAL PAGADO:	$ -
PARCIAL 1:	$ -	% AVANCE FINANCIERO:	0,00%
PARCIAL 2:	$ -		
PARCIAL 3:	$ -		
FINAL:	$ -		

III. AVANCE FÍSICO

ACTIVIDADES ACUMULADAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DEL REPORTE DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	EJECUTADO		
			VALOR UNITARIO	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR EJECUTADO
10.04	S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR EN PORCELANA SANITARIA INCLUYE GRIFERIA PUSH	UND	$ 1.243.928,00	2,00	$ 2.487.856,00
10.06	S/I DE GRIFERIA TELEDUCHA, INCLUYE ACCESORIOS	UND	$ 162.740,00	2,00	$ 325.480,00
10.07	S/I DE GRIFERIA PARA APARATOS SANITARIOS (INODOROS, ORINALES, LAVAMANOS) Y DUCHAS.	UND	$ 110.852,00	5,00	$ 554.260,00
10.08	S/I DE TAPA Y ASIENTO PARA SANITARIO	UND	$ 243.306,00	5,00	$ 1.216.530,00
10.10	S/I DE VALVULA PUSH ANTIVANDALICA PARA SANITARIOS Y ORINALES	UND	$ 1.522.169,00	5,00	$ 7.610.845,00
10.11	S/I DE GRIFERIA Y VALVULA PUSH PARA LAVAMANOS	UND	$ 1.342.893,00	7,00	$ 9.400.251,00
17.01	REJILLA DE 0,30X1,70 EN PLATINA 1X3/16 Y ANGULO DE 1 1/2 @ 2CM	UND	$ 845.013,00	2,00	$ 1.290.026,00
18.01	S/I ENTREPAÑOS EN MADERA PARA ORGANIZADORES EN AULAS DE CLASES FONDO = 50 CM	M2	$ 415.041,00	39,94	$ 16.575.736,00
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
					$ -
			COSTO TOTAL OBRAS		$ 39.461.986,00
			PGIO		$ 394.619,86
			COSTO TOTAL OBRAS		$ 39.856.605,86

AVANCE FISICO A LA FECHA:

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	90,00%	59,64%	-38,80%
DURANTE EL PERIODO	10,00%	1,57%	
ACUMULADO ACTUAL	100,00%	61,20%	



	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	PÁGINA	1	DE	2
		VERSIÓN	1		
	INFORMES SEMANAL DE OBRA	CODIGO DEL PROCESO:	SI-SUP-F-039		

IV. ENSAYOS, MEDICIONES Y DEMAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD

SE VERIFICO CALIDAD DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y PROCESOS DE INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS EN BATERIAS DE BAÑOS.

V. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

POSTERIOR A ESTA SEMANA NO EXISTEN ACTIVIDADES POR SUSPENSION DEL CONTRATO.

VI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




VII. FIRMAS

BUSERCO S.A.S	RODRIGO MORENO PAZ
R.L. ANDRES FELIPE BUELVAS SERPA	APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
ELABORO	REVISO

Nº INFORME	1	FECHA INFORME:	09/ABRIL/2025
TIPO DE INFORME:		CONCRETO RÍGIDO	
PROYECTO:	DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA FÍSICA DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.		
CLIENTE:	CLIENTE:	IBÉRICA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES P&A SAS	
	DIRECCIÓN:	MONTERÍA - CÓRDOBA	

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	MOTIVO DEL CAMBIO	RUTA DE ATENCIÓN A OBSERVACIONES	FECHA DEL CAMBIO

REVISADO	VERIFICADO	VALIDADO
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA
081037-0502188 COR LIC. PROFESIONAL	081037-0502188 COR LIC. PROFESIONAL	22202-360842 COR LIC. PROFESIONAL
CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ NOMBRE	CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ NOMBRE	JESUS DAVID PIZARRO FERNANDEZ NOMBRE
INGENIERO CIVIL PROFESION/ESPECIALIDAD	INGENIERO CIVIL PROFESION/ESPECIALIDAD	INGENIERO CIVIL PROFESION/ESPECIALIDAD

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

TABLA DE CONTENIDO

ÍNDICE DE TABLAS ____ 3

1. INTRODUCCIÓN ____ 4
2. OBJETIVO GENERAL ____ 5
   2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ____ 5
3. METODOLOGÍA DEL DISEÑO ____ 6
4. ESPECIFICACIÓN DE MEZCLA ____ 6
5. MATERIALES PARA EL DISEÑO ____ 7
6. CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS PETREOS ____ 7
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ____ 8
8. LIMITACIONES ____ 9

ANEXOS ____ 10

INGELABCON S.A.S.
Confiabilidad en nuestros resultados

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Requisitos especificación de mezcla 6
Tabla 2. Materiales para ejecución del diseño de mezcla 7
Tabla 3. Características de los agregados pétreos..... 7

INGELABCON S.A.S.
Confiabilidad en nuestros resultados

Los informes presentados por la empresa INGELABCON S.A.S., son realizados bajo el alcance de la presente consultoría, los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.
