
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	% completado	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1		**CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA MAGDALENA**	**0%**	**529 días**	**lun 22/04/24**	**jue 30/04/26**		
2		**INICIO DEL CONTRATO**	0%	0 días	lun 22/04/24	lun 22/04/24		4;5;6;59FC+115 d
3		**GESTIONES PARA INICIO DE ACTIVIDADES DE OBRA**	**0%**	**26 días**	**lun 22/04/24**	**lun 27/05/24**		**8**
4		ACTAS DE VECINDAD	0%	26 días	lun 22/04/24	lun 27/05/24	2	
5		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0%	26 días	lun 22/04/24	lun 27/05/24	2	
6		PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	0%	26 días	lun 22/04/24	lun 27/05/24	2	
7		**CANCHA DE FUTBOL No 2**	**0%**	**264 días**	**mar 28/05/24**	**vie 30/05/25**		**220**
8		Muros de contención	0%	110 días	mar 28/05/24	lun 28/10/24	3	9;12FC+70 días;23
9		Mamposteria colegio preescolar	0%	40 días	mar 29/10/24	lun 23/12/24	8	10
10		Carcamo costado sur	0%	50 días	mar 24/12/24	lun 3/03/25	9	11FC+5 días
11		Construcción de filtro	0%	15 días	mar 11/03/25	lun 31/03/25	10FC+5 días	18
12		Mamposteria	0%	50 días	mar 4/02/25	lun 14/04/25	8FC+70 días	14FC-10 días;15C
13		Columnetas	0%	13 días	mar 15/04/25	jue 1/05/25	14CC+10 días	17CC
14		Cerramiento en malla electrosoldada	0%	38 días	mar 1/04/25	jue 22/05/25	12FC-10 días	13CC+10 días;20
15		Alfajías	0%	37 días	mar 1/04/25	mié 21/05/25	12CC+40 días	20
16		Pañete impermeabilizado	0%	48 días	mar 18/03/25	jue 22/05/25	12CC+30 días	20
17		Relleno con arena de alta especificación	0%	11 días	mar 15/04/25	mar 29/04/25	12FC-4 días;13CC	19;97CC+3 días
18		Tapas de carcamo	0%	7 días	jue 22/05/25	vie 30/05/25	19FC+15 días;11	20
19		Porterias	0%	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	17	18FC+15 días;20
20		***Fin cancha No 2***	***0%***	***0 días***	***vie 30/05/25***	***vie 30/05/25***	***19;18;16;15;14***	
21		**MODULO DE SERVICIO Y RIN DE BOXEO**	**0%**	**403 días**	**mar 15/10/24**	**jue 30/04/26**		**220**
22		**MODULO DE SERVICIO**	**0%**	**403 días**	**mar 15/10/24**	**jue 30/04/26**		**48**
23		Excavación	0%	40 días	mar 15/10/24	lun 9/12/24	8FC-10 días	24
24		Cimentación	0%	30 días	mar 10/12/24	lun 20/01/25	23	25;29FC+35 días;3
25		Estructura	0%	32 días	mar 21/01/25	mié 5/03/25	24	29FC+35 días;30F
26		Impermeabilización de cubierta	0%	10 días	jue 19/06/25	mié 2/07/25	28FC+7 días	35
27		Placa de contrapiso	0%	7 días	lun 12/05/25	mar 20/05/25	29CC+12 días;30C	28CC+3 días
28		Mamposteria	0%	18 días	jue 15/05/25	lun 9/06/25	27CC+3 días	26FC+7 días;31
29		Redes hidrosanitarias	0%	50 días	jue 24/04/25	mié 2/07/25	24FC+35 días;25F	27CC+12 días
30		Sistema eléctrico	0%	266 días	jue 24/04/25	jue 30/04/26	24FC+35 días;25F	27CC+12 días;35
31		Acabados	0%	70 días	mar 10/06/25	lun 15/09/25	28	32FC-30 días;33F
32		Puertas y ventanas	0%	7 días	mar 5/08/25	mié 13/08/25	31FC-30 días	
33		Inatalacion de lavamanos y aparatos sanitarios	0%	12 días	vie 20/03/26	lun 6/04/26	31FC+133 días	35
34		Divisiones de baños	0%	20 días	vie 20/03/26	jue 16/04/26	31FC+133 días	
35		***Fin modulo de servicio***	***0%***	***0 días***	***jue 30/04/26***	***jue 30/04/26***	***33;26;30***	
36		**RIN DE BOXEO**	**0%**	**279 días**	**mar 1/04/25**	**vie 24/04/26**		**48**
37		Cimentación	0%	5 días	mar 1/04/25	lun 7/04/25	8FC+110 días	38CC;39
38		Pisos estampados	0%	17 días	mar 1/04/25	mié 23/04/25	37CC	45FC+70 días
39		Mamposteria	0%	10 días	mar 8/04/25	lun 21/04/25	37	41;40FC+50 días;4
40		Ring de boxeo (Postes)	0%	30 días	mar 1/07/25	lun 11/08/25	39FC+50 días	43
41		Graderias	0%	20 días	mar 22/04/25	lun 19/05/25	39	43
42		Cubierta (Incluye cimentación)	0%	50 días	lun 16/02/26	vie 24/04/26	39CC+224 días	43;46FC-6 días
43		***Fin rin de boxeo***	***0%***	***0 días***	***vie 24/04/26***	***vie 24/04/26***	***42;40;41***	
44		**URBANISMO MODULO DE SERVICIO Y BOXEO**	**0%**	**196 días**	**jue 31/07/25**	**jue 30/04/26**		**48**
45		Pisos estampados	0%	5 días	jue 31/07/25	mié 6/08/25	38FC+70 días	47
46		Reparación de pisos estampados cimentación de cubierta	0%	10 días	vie 17/04/26	jue 30/04/26	42FC-6 días	
47		***Fin urbanismo modulo de servicio***	0%	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25	45	
48		***Fin Modulo de servicio y rin de boxeo***	***0%***	***0 días***	***jue 30/04/26***	***jue 30/04/26***	***22;36;44***	
49		**PISTA DE PATINAJE**	**0%**	**147 días**	**lun 30/09/24**	**mar 22/04/25**		**220**
50		**OVALO CENTRAL**	**0%**	**131 días**	**lun 30/09/24**	**lun 31/03/25**		**74**
51		Carcamo de aguas lluvias central	0%	15 días	vie 8/11/24	jue 28/11/24	52CC+29 días	
52		Relleno	0%	60 días	lun 30/09/24	vie 20/12/24	2FC+115 días	51CC+29 días;53
53		Asfalto	0%	13 días	lun 23/12/24	mié 8/01/25	52	54FC+15 días;60
54		Acabado - Recubrimiento	0%	38 días	jue 30/01/25	lun 24/03/25	53FC+15 días	55
55		Demarcación	0%	5 días	mar 25/03/25	lun 31/03/25	54	56
56		***Fin Ovalo Central***	0%	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	55	
57		**OVALO EXTERNO - CALZADA DE VELOCIAD**	**0%**	**137 días**	**lun 30/09/24**	**mar 8/04/25**		**74**
58		Vigas de confinamiento	0%	18 días	mar 5/11/24	jue 28/11/24	59CC+26 días	
59		Relleno	0%	65 días	lun 30/09/24	vie 27/12/24	2FC+115 días	58CC+26 días;60
60		Asfalto	0%	5 días	jue 9/01/25	mié 15/01/25	59;53	61FC+15 días;63F
61		Acabado - Recubrimiento	0%	32 días	jue 6/02/25	vie 21/03/25	60FC+15 días	62
62		Demarcación	0%	5 días	lun 24/03/25	vie 28/03/25	61	65
63		Cerramiento - Pasamanos	0%	20 días	jue 6/02/25	mié 5/03/25	60FC+15 días	64;67
64		Policarbonato	0%	7 días	jue 6/03/25	vie 14/03/25	63	67
65		Pasamanos anden en voladizo	0%	7 días	lun 31/03/25	mar 8/04/25	62;66	67
66		Anden perimetral exterior	0%	15 días	jue 16/01/25	mié 5/02/25	60	65
67		***Fin Ovalo Externo***	0%	0 días	mar 8/04/25	mar 8/04/25	63;64;65	
68		**URBANISMO**	**0%**	**69 días**	**jue 16/01/25**	**mar 22/04/25**		**74**
69		Zonas duras	0%	33 días	jue 13/02/25	lun 31/03/25	70;71	72FC+4 días;73;76
70		Carcamos laterales	0%	20 días	jue 16/01/25	mié 12/02/25	60	69;71FF
71		Contenedores de raiz	0%	10 días	jue 30/01/25	mié 12/02/25	70FF	69
72		Tapas de carcamos	0%	12 días	lun 7/04/25	mar 22/04/25	69FC+4 días	73
73		***Fin Urbanismo***	0%	0 días	mar 22/04/25	mar 22/04/25	69;72	
74		***Fin pista de patinaje***	0%	0 días	mar 22/04/25	mar 22/04/25	50;57;68	
75		**ACCESO COLEGIO A POLIDEPORTIVO**	**0%**	**124 días**	**vie 21/03/25**	**mié 10/09/25**		**220**
76		Excavaciones	0%	7 días	vie 21/03/25	lun 31/03/25	69FC-7 días	77;84;86
77		Muros de contención	0%	10 días	mar 1/04/25	lun 14/04/25	76	78
78		Relleno en material seleccionado	0%	16 días	mar 15/04/25	mar 6/05/25	77	79CC+7 días;80;83
79		Vigas de cimiento	0%	12 días	jue 24/04/25	vie 9/05/25	78CC+7 días	81
80		Bordillos	0%	7 días	mié 7/05/25	jue 15/05/25	78	
81		Pisos estampados	0%	8 días	lun 12/05/25	mié 21/05/25	79	82CC+3 días
82		Rampas	0%	4 días	jue 15/05/25	mar 20/05/25	81CC+3 días	85
83		Escalera rampa	0%	96 días	mié 30/04/25	mié 10/09/25	78FC-5 días	87
84		Mamposteria	0%	30 días	mar 1/04/25	lun 12/05/25	76	86
85		Pasamanos	0%	7 días	mié 21/05/25	jue 29/05/25	82	87
86		Cerramiento en malla electrosoldada	0%	8 días	mar 13/05/25	jue 22/05/25	84;76	87
87		***Fin Acceso colegio a polideportivo***	0%	0 días	mié 10/09/25	mié 10/09/25	85;86;83	
88		**CANCHA DE FUTBOL No 1**	**0%**	**316 días**	**lun 22/04/24**	**lun 7/07/25**		**220**
89		**CANCHA DE FUTBOL No 1**	**0%**	**218 días**	**mar 27/08/24**	**jue 26/06/25**		
90		Cimentación de mamposteria	0%	20 días	mar 27/08/24	lun 23/09/24	2FC+91 días	91
91		Mamposteria	0%	47 días	mar 24/09/24	mié 27/11/24	90	96FC-10 días;93;9
92		Columnetas	0%	56 días	jue 10/04/25	jue 26/06/25	95CC+7 días	96FF
93		Pañete impermeabilizado	0%	106 días	jue 28/11/24	jue 24/04/25	91	99
94		Filtro	0%	18 días	jue 6/02/25	lun 3/03/25	91FC+50 días	97FF
95		Cerramiento en malla electrosoldada	0%	58 días	mar 1/04/25	jue 19/06/25	91FC+88 días	92CC+7 días
96		Alfajías	0%	116 días	jue 16/01/25	jue 26/06/25	91FC-10 días;92FF	99
97		Relleno con arena de alta especificación	0%	8 días	vie 18/04/25	mar 29/04/25	17CC+3 días;94FF	98
98		Porterias	0%	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	97	99
99		***Fin cancha de futbol***	***0%***	***0 días***	***jue 26/06/25***	***jue 26/06/25***	***98;93;96***	
100		**GRADERIAS**	**0%**	**150 días**	**mar 3/12/24**	**lun 30/06/25**		
101		Cimentación	0%	30 días	mar 3/12/24	lun 13/01/25	91FC+3 días	102FC+55 días
102		Gradas	0%	15 días	mar 1/04/25	lun 21/04/25	101FC+55 días	103;105FC+35 día
103		Estructura de cubierta	0%	50 días	mar 22/04/25	lun 30/06/25	102	104FC-5 días;106
104		Pasamanos	0%	5 días	mar 24/06/25	lun 30/06/25	103FC-5 días	106
105		Bodegas bajo graderias	0%	12 días	mar 10/06/25	mié 25/06/25	102FC+35 días	106
106		***Fin Graderias***	***0%***	***0 días***	***lun 30/06/25***	***lun 30/06/25***	***103;104;105***	
107		**URBANISMO - CANCHA No 1**	**0%**	**65 días**	**mar 8/04/25**	**lun 7/07/25**		
108		Rellenos en material seleccionado	0%	55 días	mar 8/04/25	lun 23/06/25	102CC+5 días	109CC+12 días;11
109		Carcamo	0%	12 días	jue 24/04/25	vie 9/05/25	108CC+12 días	112
110		Pisos estampados	0%	50 días	mié 23/04/25	mar 1/07/25	108CC+11 días	111;112
111		Rampas	0%	4 días	mié 2/07/25	lun 7/07/25	110	112
112		***Fin urbanismo***	***0%***	***0 días***	***lun 7/07/25***	***lun 7/07/25***	***110;111;109***	
113		***Fin cancha de futbol No 1***	**0%**	**0 días**	**lun 22/04/24**	**lun 22/04/24**		
114		**ESTADIO DE BEISBOL**	**0%**	**396 días**	**mar 22/10/24**	**mar 28/04/26**		**220**
115		**TERCERA BASE**	**0%**	**396 días**	**mar 22/10/24**	**mar 28/04/26**		**193**
116		**GRADERIAS TERCERA BASE**	**0%**	**365 días**	**mié 13/11/24**	**mar 7/04/26**		
117		Cimentación	0%	30 días	mié 13/11/24	mar 24/12/24	136	118FC+75 días;12
118		Graderias	0%	20 días	mié 9/04/25	mar 6/05/25	117FC+75 días	119FC+15 días
119		Estructura metálica	0%	35 días	mié 28/05/25	mar 15/07/25	118FC+15 días	120;121FC+185 d
120		Cubierta	0%	5 días	mié 16/07/25	mar 22/07/25	119	123
121		Pasamanos	0%	5 días	mié 1/04/26	mar 7/04/26	119FC+185 días	123
122		Kioscos bajo graderias	0%	25 días	mié 6/08/25	mar 9/09/25	119FC+15 días	
123		***Fin graderias tercera base***	0%	0 días	mar 7/04/26	mar 7/04/26	119;120;121	
124		**Baños Dogout y Kiosco**	**0%**	**300 días**	**mié 5/03/25**	**mar 28/04/26**		
125		Cimentación	0%	20 días	mié 5/03/25	mar 1/04/25	117FC+50 días	130
126		Instalaciones hidrosanitarias	0%	39 días	mié 2/07/25	lun 25/08/25	130FC+40 días	128CC+25 días
127		Instalaciones electricas	0%	215 días	mié 2/07/25	mar 28/04/26	130FC+40 días	
128		Placa de contrapiso	0%	7 días	mié 6/08/25	jue 14/08/25	126CC+25 días	129
129		Mamaposteria	0%	15 días	vie 15/08/25	jue 4/09/25	128	131;132FC+15 día
130		Estructura	0%	25 días	mié 2/04/25	mar 6/05/25	125	126FC+40 días;12
131		Impermeabilización de cubiertas	0%	5 días	vie 5/09/25	jue 11/09/25	129	133
132		Acabados	0%	45 días	vie 26/09/25	jue 27/11/25	129FC+15 días	133
133		***Fin baños, dogout y kiosco***	0%	0 días	jue 27/11/25	jue 27/11/25	131;132	140
134		**ZONA DE BATEO**	**0%**	**375 días**	**mar 22/10/24**	**lun 30/03/26**		
135		Cimentación Vigas perimetrales	0%	8 días	mar 22/10/24	jue 31/10/24	2CC+131 días	136
136		Losa de contrapiso	0%	8 días	vie 1/11/24	mar 12/11/24	135	138FC+239 días;1
137		Pasto sintetico	0%	10 días	mar 17/03/26	lun 30/03/26	138FC+80 días	139
138		Cerramiento postes y malla	0%	30 días	mar 14/10/25	lun 24/11/25	136FC+239 días	137FC+80 días;13
139		***Fin zona de bateo***	0%	0 días	lun 30/03/26	lun 30/03/26	137;138	140
140		***Fin Tercera base***	***0%***	***0 días***	***lun 30/03/26***	***lun 30/03/26***	***12;133;139***	
141		**PRIMERA BASE**	**0%**	**347 días**	**mié 25/12/24**	**jue 23/04/26**		**193**
142		**GRADERIAS PRIMERA BASE**	**0%**	**342 días**	**mié 25/12/24**	**jue 16/04/26**		**167**
143		Cimentación	0%	30 días	mié 25/12/24	mar 4/02/25	117	144
144		Muro de contención	0%	50 días	mié 5/02/25	mar 15/04/25	143	145CC+25 días;15
145		Graderias	0%	30 días	mié 12/03/25	mar 22/04/25	144CC+25 días	146FC+15 días;14
146		Estructura metálica	0%	35 días	mié 14/05/25	mar 1/07/25	145FC+15 días	147;148FC+195 d
147		Cubierta	0%	5 días	mié 2/07/25	mar 8/07/25	146	150
148		Pasamanos	0%	12 días	mié 1/04/26	jue 16/04/26	146FC+195 días	150
149		Kioscos bajo graderias	0%	25 días	mié 13/08/25	mar 16/09/25	145FC+80 días	150
150		***Fin graderias primera base***	***0%***	***0 días***	***jue 16/04/26***	***jue 16/04/26***	***147;148;149***	***167***
151		**Baños Dogout y Kiosco**	**0%**	**287 días**	**mié 19/03/25**	**jue 23/04/26**		
152		Cimentación	0%	20 días	mié 19/03/25	mar 15/04/25	144FC-20 días	157CC+10 días
153		Instalaciones hidrosanitarias	0%	39 días	mié 25/06/25	lun 18/08/25	157FC+28 días	155CC+45 días
154		Instalaciones electricas	0%	215 días	vie 27/06/25	jue 23/04/26	157FC+30 días	
155		Placa de contrapiso	0%	10 días	mié 27/08/25	mar 9/09/25	153CC+45 días	156
156		Mamaposteria	0%	15 días	mié 10/09/25	mar 30/09/25	155	158;159FC+10 día
157		Estructura	0%	32 días	mié 2/04/25	jue 15/05/25	152CC+10 días	153FC+28 días;15
158		Impermeabilización de cubiertas	0%	5 días	mié 1/10/25	mar 7/10/25	156	160
159		Acabados	0%	25 días	mié 15/10/25	mar 18/11/25	156FC+10 días	160
160		***Fin baños, dogout y Kiosko***	***0%***	***0 días***	***mar 18/11/25***	***mar 18/11/25***	***158;159***	***167***
161		**ZONA DE BATEO**	**0%**	**325 días**	**mar 14/01/25**	**lun 13/04/26**		
162		Cimentación Vigas perimetrales	0%	10 días	mar 14/01/25	lun 27/01/25	136FC+44 días	163
163		Losa de contrapiso	0%	10 días	mar 28/01/25	lun 10/02/25	162	165FC+170 días
164		Pasto sintetico	0%	10 días	mar 31/03/26	lun 13/04/26	165FC+95 días	166
165		Cerramiento postes y malla	0%	30 días	mar 7/10/25	lun 17/11/25	163FC+170 días	164FC+95 días
166		***Fin zona de bateo***	0%	0 días	lun 13/04/26	lun 13/04/26	164	
167		***Fin primera base***	***0%***	***0 días***	***jue 16/04/26***	***jue 16/04/26***	***142;150;160***	
168		**LOBBY**	**0%**	**93 días**	**vie 15/08/25**	**mar 23/12/25**		**193**
169		Cimentación	0%	12 días	vie 15/08/25	lun 1/09/25	157FC+65 días	170
170		Estructura	0%	22 días	mar 2/09/25	mié 1/10/25	169	171
171		Mamposteria	0%	7 días	jue 2/10/25	vie 10/10/25	170	173;174;176;175
172		Puerta de acceso	0%	5 días	mié 17/12/25	mar 23/12/25	173FC+17 días	
173		Acabados	0%	30 días	lun 13/10/25	vie 21/11/25	171	172FC+17 días;17
174		Escaleras	0%	30 días	lun 13/10/25	vie 21/11/25	171	177
175		Rampa	0%	15 días	lun 13/10/25	vie 31/10/25	171	177
176		Zonas duras	0%	30 días	lun 13/10/25	vie 21/11/25	171	177
177		***Fin lobby***	***0%***	***0 días***	***vie 21/11/25***	***vie 21/11/25***	***173;174;175;176***	
178		**ZONA DE JUEGO**	**0%**	**246 días**	**vie 16/05/25**	**vie 24/04/26**		**193**
179		Excavaciones	0%	35 días	vie 16/05/25	jue 3/07/25	157	216FC+120 días;1
180		Rellenos	0%	45 días	vie 16/05/25	jue 17/07/25	157	182CC+15 días;18
181		Sistema de drenaje y sistema de riego	0%	160 días	vie 11/07/25	jue 19/02/26	180FC-5 días	182CC+50 días
182		Siembra de grama	0%	55 días	vie 19/09/25	jue 4/12/25	181CC+50 días;18	183FC+95 días
183		Demarcaciones	0%	6 días	vie 17/04/26	vie 24/04/26	182FC+95 días	184
184		***Fin zona de juego***	***0%***	***0 días***	***vie 24/04/26***	***vie 24/04/26***	***183***	
185		**URBANISMO**	**0%**	**141 días**	**vie 22/08/25**	**vie 6/03/26**		**193**
186		Mamposteria	0%	20 días	vie 22/08/25	jue 18/09/25	179FC+35 días	191CC+45 días;18
187		Columnetas	0%	20 días	mar 18/11/25	lun 15/12/25	186FC+42 días	188;189;190FC+4
188		Alfajías	0%	7 días	mar 16/12/25	mié 24/12/25	187	192
189		Pañetes impermeabilizados	0%	15 días	mar 16/12/25	lun 5/01/26	187	
190		Cerramiento en malla electrosoldada	0%	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	187FC+49 días	192
191		Zonas duras	0%	37 días	vie 24/10/25	lun 15/12/25	186CC+45 días	192
192		***Fin Urbanismo***	***0%***	***0 días***	***vie 6/03/26***	***vie 6/03/26***	***188;190;191***	
193		***Fin estadio de beisbol***	**0%**	**0 días**	**mar 28/04/26**	**mar 28/04/26**	**115;141;168;178;**	
194		**URBANISMOS EXTERIORES**	**0%**	**297 días**	**mar 4/03/25**	**mié 22/04/26**		**220**
195		**Calle 36B**	**0%**	**38 días**	**mar 4/03/25**	**jue 24/04/25**		
196		Andenes y bordillos	0%	38 días	mar 4/03/25	jue 24/04/25	12CC+20 días	197CC+29 días;19
197		Pisos estampados	0%	9 días	lun 14/04/25	jue 24/04/25	196CC+29 días	200
198		Escaleras y rampas	0%	8 días	mar 15/04/25	jue 24/04/25	196CC+30 días	199FF;204CC+3 d
199		Pasamanos	0%	4 días	lun 21/04/25	jue 24/04/25	198FF	200
200		***Fin Urbanismo Calle 36B***	0%	0 días	jue 24/04/25	jue 24/04/25	196;197;198;199	
201		**Carrera 7C**	**0%**	**28 días**	**mar 18/03/25**	**jue 24/04/25**		
202		Andenes y bordillos	0%	28 días	mar 18/03/25	jue 24/04/25	196CC+10 días	203CC;207CC+40
203		Pisos estampados	0%	8 días	mar 18/03/25	jue 27/03/25	202CC	
204		Escaleras y rampas	0%	5 días	vie 18/04/25	jue 24/04/25	198CC+3 días	205
205		***Fin Urbanismo Carrera 7C***	0%	0 días	jue 24/04/25	jue 24/04/25	202;204	
206		**Calle 38B**	**0%**	**245 días**	**mar 13/05/25**	**lun 20/04/26**		
207		Andenes y bordillos (Tramo 1)	0%	60 días	mar 13/05/25	lun 4/08/25	202CC+40 días	209CC+100 días;2
208		Andenes y bordillos (Tramo 2)	0%	20 días	mar 10/03/26	lun 6/04/26	207FC+155 días	
209		Pisos estampados	0%	30 días	mar 30/09/25	lun 10/11/25	207CC+100 días	211CC+10 días;21
210		Pavimentos	0%	17 días	mar 29/07/25	mié 20/08/25	207CC+55 días	213FC+150 días
211		Casetas de ventas	0%	30 días	mar 14/10/25	lun 24/11/25	209CC+10 días	212FC+80 días
212		Acabados casetas de venta	0%	25 días	mar 17/03/26	lun 20/04/26	211FC+80 días	
213		Escaleras y rampas	0%	13 días	jue 19/03/26	lun 6/04/26	210FC+150 días	214
214		***Fin Urbanismo Calle 38B***	0%	0 días	lun 6/04/26	lun 6/04/26	207;209;213	
215		**Carrera 6B**	**0%**	**89 días**	**vie 19/12/25**	**mié 22/04/26**		
216		Andenes y bordillos (Tramo 1)	0%	35 días	vie 19/12/25	jue 5/02/26	179FC+120 días	218;219;217FC+2
217		Andenes y bordillos (Tramo 2)	0%	25 días	vie 6/03/26	jue 9/04/26	216FC+20 días	218;219
218		Escaleras y rampas	0%	9 días	vie 10/04/26	mié 22/04/26	216;217	219
219		***Fin Urbanismo Carrera 6B***	0%	0 días	mié 22/04/26	mié 22/04/26	216;218;217	
220		**Fin de la obra**	0%	0 días	jue 30/04/26	jue 30/04/26	7;21;49;75;88;114	

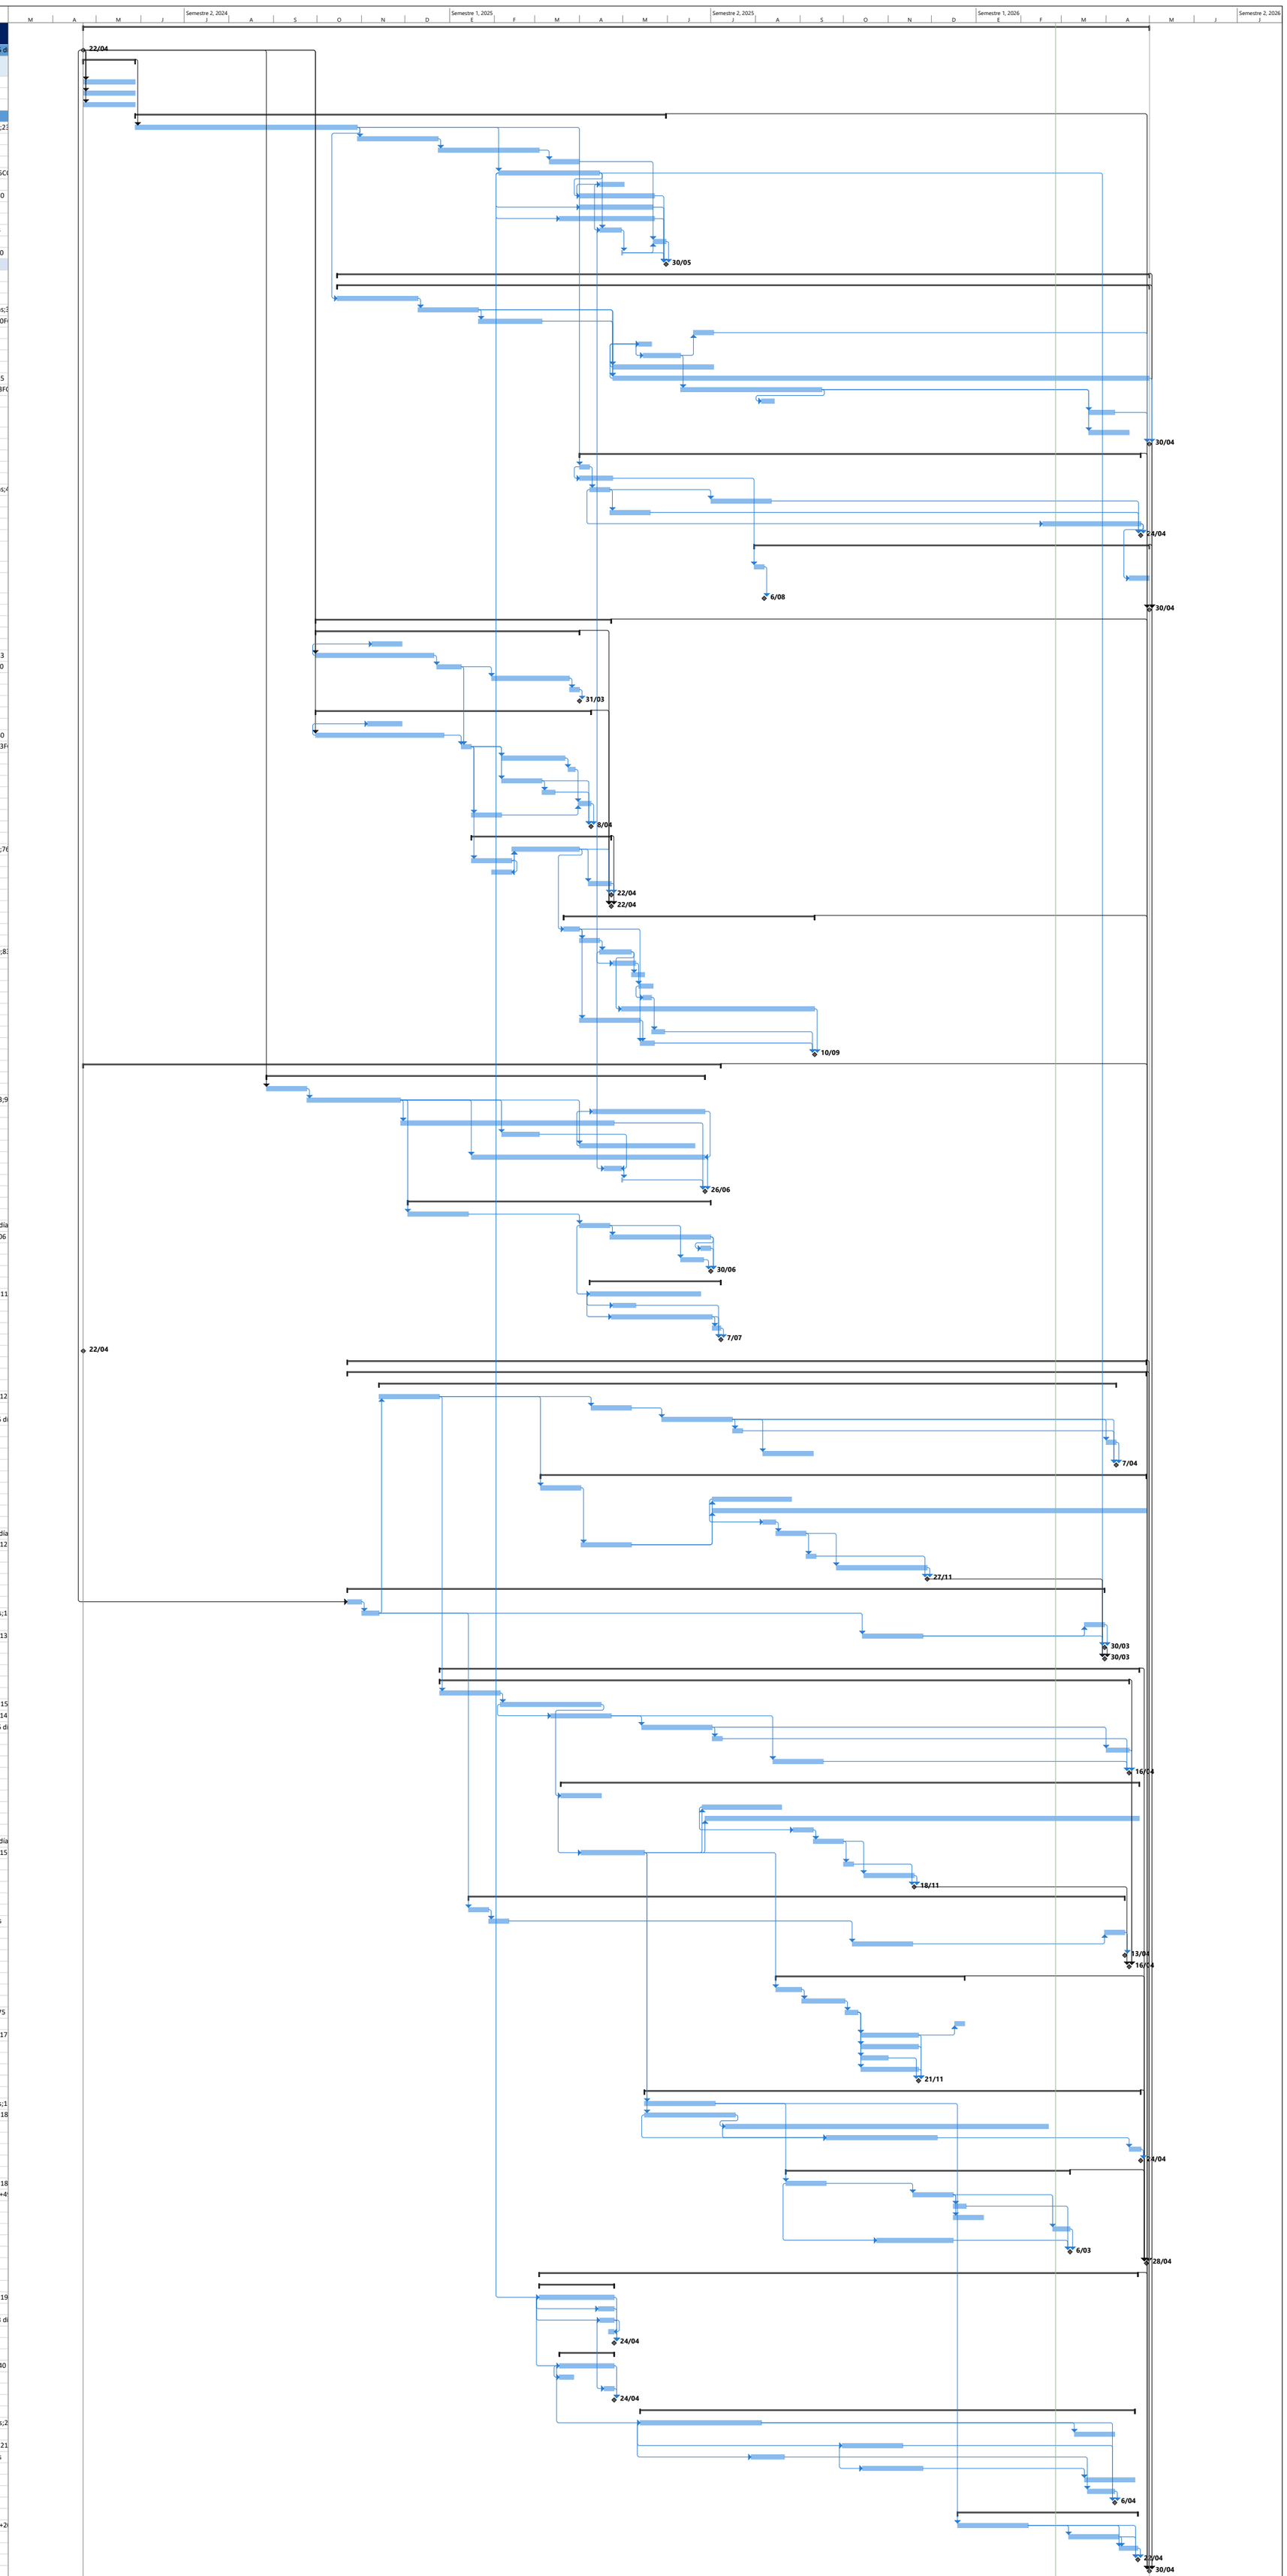

Proyecto: Cronograma Polidep
Fecha: mié 25/02/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Progreso
