| ITEM | ACTIVIDAD | U.M. | CANT. CONTRACTUAL | CANT. EJECUTADA | CANT. ACUMULADA | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | PTO | 106.00 | 42.40 | 10.60 | 50% |
| **6.0** | **APARTAMENTO FISCAL** | | | | | |
| **6.1** | **PRELIMINARES** | | | | | |
| 6.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 116,33 | | 116,33 | 100% |
| **6.2** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | |
| 6.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 91,73 | | 91,73 | 100% |
| 6.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | M3 | 78.44 | | 78.44 | 100% |
| 6.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | 729.49 | | 729.49 | 100% |
| 6.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3/KM | 330.23 | | 330.23 | 100% |
| **6.3** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | |
| 6.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 1.26 | | 1.26 | 100% |
| 6.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 13.29 | | 13.29 | 100% |
| 6.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 8.68 | | 8.68 | 100% |
| 6.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 6.92 | | 6.92 | 100% |
| 6.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 10.21 | | 10.21 | 100% |
| 6.3.6 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 7.70 | | 7.70 | 100% |

| ITEM | ACTIVIDAD | U.M. | CANT. CONTRACTUAL | CANT. EJECUTADA | CANT. ACUMULADA | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3.8 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 256.00 | **102.40** | 153.60 | 100% |
| 6.3.9 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | M3 | 57.68 | | 57.68 | 100% |
| **6.4** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | | | | |
| 6.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 4221.20 | | 4221.20 | 100% |
| 6.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 692.70 | | 692.70 | 100% |
| 6.4.3 | *ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM* A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 256.80 | | 256.80 | 100% |
| 6.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | M2 | 76.96 | | 76.96 | 100% |
| **6.9** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | | | | | |
| 6.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 125.06 | | 62.53 | 50% |
| 6.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | M2 | 280.98 | | 42.147 | 15% |
| 6.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 1.24 | **0.248** | 0.992 | 100% |
| 6.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 172.45 | **68.98** | 103.47 | 100% |
| 6.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 240.00 | **144.00** | 96.00 | 100% |
| 6.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | M2 | 63.34 | **15.835** | | 25% |
| 6.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | M2 | 67.20 | **40.32** | | 60% |
| **6.6** | **PINTURA** | | | | | |

| ITEM | ACTIVIDAD | U.M. | CANT. CONTRACTUAL | CANT. EJECUTADA | CANT. ACUMULADA | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | M2 | 172.45 | 86.225 | | 50% |
| 6.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | M2 | 316.21 | 158.105 | | 50% |
| 6.7 | CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS | | | | | |
| 6.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM, EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | UN | 5.00 | 0.75 | | 15% |
| 6.9 | RED HIDRÁULICA | | | | | |
| 6.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 14.09 | | 14.09 | 100% |
| 6.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 18.00 | | 18.00 | 100% |
| 6.9.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | | 2.00 | 100% |
| 6.9.6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6.00 | | 6.00 | 100% |
| 6.9.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | | 4.00 | 100% |
| 6.9.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | | 4.00 | 100% |
| 6.9.9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | | 2.00 | 100% |
| 6.9.10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 100% |
| 6.10 | RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS | | | | | |
| 6.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 15.43 | | 15.43 | 100% |
| 6.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 23.00 | | 23.00 | 100% |

| ITEM | ACTIVIDAD | U.M. | CANT. CONTRACTUAL | CANT. EJECUTADA | CANT. ACUMULADA | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 8.52 | | 8.52 | 100% |
| 6.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | | 3.00 | 100% |
| 6.10.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | | 2.00 | 100% |
| 6.10.6 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 100% |
| 6.10.7 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | | 4.00 | 100% |
| 6.10.8 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 5.00 | | 5.00 | 100% |
| **6.11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | | | | |
| 6.11.1 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | PTO | 12.00 | **3.00** | | 25% |
| **7.0** | **GARITAS Y SHUT DE BASURAS** | | | | | |
| **7.1.** | **PRELIMINARES** | | | | | |
| 7.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | M2 | 40.60 | | 40.60 | 100% |
| **7.2** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | |
| 7.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 54.75 | | 54.75 | 100% |
| 7.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3 SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | M3 | 39.35 | | 39.35 | 100% |
| 7.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | 365.96 | | 365.96 | 100% |
| 7.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3/KM | 197.10 | | 197.10 | 100% |
| **7.3** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | |
| 7.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 2.64 | | 2.64 | 100% |
| 7.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 7.78 | | 7.78 | 100% |

| ITEM | ACTIVIDAD | U.M. | CANT. CONTRACTUAL | CANT. EJECUTADA | CANT. ACUMULADA | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 2.68 | | 2.68 | 100% |
| 7.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 5.26 | **0.526** | 4.34 | 100% |
| 7.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 21.20 | **8.48** | 12.72 | 100% |
| 7.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 2.38 | **0.238** | 2.142 | 100% |
| 7.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 6.80 | **3.06** | 3.74 | 100% |
| 7.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 3.55 | **1.5975** | 1.9525 | 100% |
| 7.3.9 | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0.47 | **0.47** | | 100% |
| 7.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 224.00 | **179.20** | | 80% |
| 7.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | M2 | 22.10 | **15.47** | 6.63 | 100% |
| **7.4** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | | | | |
| 7.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 5500.51 | **550.051** | 4950.459 | 100% |
| 7.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 274.18 | **27.418** | 246.762 | 100% |
| 7.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 74.98 | **52.486** | 22.494 | 100% |
| 7.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | M2 | 30.21 | **21.147** | 9.063 | 100% |

| ITEM | ACTIVIDAD | U.M. | CANT. CONTRACTUAL | CANT. EJECUTADA | CANT. ACUMULADA | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | **MAMPOSTERIA, PISOSY AFINADOS** | | | | | |
| 7.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 75.04 | **67.536** | 7..504 | 100% |
| 7.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | M2 | 84.04 | **84.04** | | 100% |
| 7.5.3 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0.46 | **0.46** | | 100% |
| 7.5.4 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 137.92 | **137.92** | | 100% |
| 7.5.5 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 210.56 | **210.56** | | 100% |
| 7.5.6 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. *BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON* ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | *M2* | *20.96* | **6.288** | | 30% |
| 7.6 | **PINTURA** | | | | | |
| 7.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | M2 | 137.92 | **68.96** | | 50% |
| 7.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | M2 | 210.56 | **52.64** | | 25% |
| 7.7 | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | | | | | |
| 7.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | M2 | 6.56 | **7.504** | | 25% |
| 7.8 | **RED HIDRÁULICA** | | | | | |
| 7.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 4.50 | | 4.50 | 100% |
| 7.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6.00 | | 6.00 | 100% |
| 7.8.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 16.85 | | 16.85 | 100% |
| 7.8.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 8.00 | | 8.00 | 100% |
| 7.8.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 100% |
| 7.8.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | | 4.00 | 100% |
| 7.8.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | *UN* | *1.00* | | *1.00* | 100% |

| ITEM | ACTIVIDAD | U.M. | CANT. CONTRACTUAL | CANT. EJECUTADA | CANT. ACUMULADA | % EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9 | RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS | | | | | |
| 7.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 7.50 | | 7.50 | 100% |
| 7.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6.00 | | 6.00 | 100% |
| 7.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 14.65 | | 14.65 | 100% |
| 7.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | | 4.00 | 100% |
| 7.9.5 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 100% |
| 7.9.6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 100% |
| 7.9.7 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 100% |
| 7.9.8 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | | 1.00 | 100% |
| 8.0 | URBANISMO Y PAISAJISMO | | | | | |
| 8.1 | PRELIMINARES | | | | | |
| 8.1.1 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | M2 | 2843.66 | | 1279.647 | 45% |
| 8.2 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | |
| 8.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 1308.72 | | 65.436 | 5% |
| 8.10 | RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS | | | | | |
| 8.10.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160 MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | ML | 120.39 | | 120.39 | 100% |

## AVANCE FISICO de INTERVENTORÍA

Para el Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023 se relaciona a continuación, como actividades desarrolladas en el periodo de 11 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024, se presenta avance del **60,26%** por la ejecución de obra, las mismas se encuentran revisadas y avaladas por el cuerpo especializado de profesionales de Interventoría.

| FECHA | PORCENTAJE EJECUTADO | EJECUTADO ACUMULADO | PORCENTAJE POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|
| 11 DE DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2023 | 1.10 | 1.10 | 98.90% |
| 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024 | 1.94 | 3.04 | 96.96% |
| 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024 | 5.34 | 8.38 | 91.62% |
| 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024 | 10.57% | 18.94% | 81.06% |
| 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024 | 6.81% | 25.75% | 74.25% |
| 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 | 13.71% | 38.59% | 61.41% |
| 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2024 | 11.03% | 49.61% | 50.39% |
| 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2024 | 10,65% | 60,26% | 39,74% |

**Nota**: El avance porcentual se actualiza considerando que, a la fecha presente, debe calcularse en función del valor total inicial del proyecto para la Etapa II – Ejecución de obra, que corresponde a la suma de $11.912.622.964.00.

## 5.1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se ha realizado Modificatoria al Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023, ya que La Contratista Consorcio Interpolicía 2023, se encuentra ceñida a las actividades iniciales del contrato.

Para este contrato de no se estipula de manera contractual. desembolso de Anticipo que permita establecer un avance financiero del valor total del contrato, los recursos financieros iniciales corren por cuenta de La Contratista de Interventoría.

De la actualización que presentó el Contratista a su contrato de obra, se derivada al proceso de Interventoría un adicional en tiempo y costo que será presentando como condiciones finales bajo modificatoria.

A continuación, se presenta la PROPUESTA ECONOMICA del Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023.

| OBJETO DEL PROYECTO | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. PERSONAL OFRECIDO - FASE II EJECUCIÓN DE OBRA | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION | CARGO | DEDICACION (Hombre-mes) | NUMERO DE PERSONAS | TIEMPO EN MESES | HONORARIOS | VALOR TOTAL |
| A | PRESUPUESTO DE INTERVENTORÍA - FASE II EJECUCIÓN DE OBRA | | | | | | |
| 1 | ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA. | DIRECTOR DE INTERVENTORIA | 60,00% | 1,00 | 10,00 | $ 8.550.000,00 | $ 51.300.000,00 |
| 2 | ARQUITECTO y/o INGENIERO CIVIL - RESIDENTE DE INTERVENTORÍA. | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | 100,00% | 1,00 | 10,00 | $ 6.900.000,00 | $ 69.000.000,00 |
| 3 | INGENIEROELECTRICO y/o ELECTRICISTA y/o MECÁNICO | INGENIEROELECTRICO y/o ELECTRICISTA y/o MECÁNICO | 30,00% | 1,00 | 10,00 | $ 7.800.000,00 | $ 23.400.000,00 |
| 4 | INGENIERO AMBIENTAL | INGENIERO AMBIENTAL | 30,00% | 1,00 | 10,00 | $ 7.400.000,00 | $ 22.200.000,00 |
| 5 | PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL y/o INGENIERO INDUSTRIAL o INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL y/o INGENIERO INDUSTRIAL o INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 100,00% | 1,00 | 10,00 | $ 5.100.000,00 | $ 51.000.000,00 |
| 6 | INGENIERO TOPOGRÁFICO | INGENIERO TOPOGRÁFICO | 20,00% | 1,00 | 10,00 | $ 6.500.000,00 | $ 13.000.000,00 |
| 7 | ARQUITECTO - ESPECIALISTA BIOCLIMÁTICO | ARQUITECTO - ESPECIALISTA BIOCLIMÁTICO | 20,00% | 1,00 | 10,00 | $ 6.500.000,00 | $ 13.000.000,00 |
| 8 | INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAL | INGENIERO CIVIL - ESTRUCTURAL | 20,00% | 1,00 | 10,00 | $ 6.600.000,00 | $ 13.200.000,00 |
| 9 | INGENIERO CIVIL - GEOTECNISTA | INGENIERO CIVIL - GEOTECNISTA | 15,00% | 1,00 | 10,00 | $ 6.700.000,00 | $ 10.050.000,00 |
| 10 | INGENIERO CIVIL - HIDROSANITARIO | INGENIERO CIVIL - HIDROSANITARIO | 20,00% | 1,00 | 10,00 | $ 6.600.000,00 | $ 13.200.000,00 |
| B | PERSONAL TECNICO Y/O BACHILLER | | | | | | |
| 1 | SECRETARIA | SECRETARIA | 50% | 1,00 | 5,00 | $ 2.500.000,00 | $ 6.250.000,00 |
| 2 | CONDUCTOR | CONDUCTOR | 21% | 1,00 | 5,00 | $ 2.350.000,00 | $ 2.445.293,41 |
| 3 | AUXILIAR RESIDENTE | AUXILIAR RESIDENTE | 50% | 1,00 | 5,00 | $ 2.958.385,45 | $ 7.395.963,64 |
| 4 | AUXILIAR SST | AUXILIAR SST | 100% | 1,00 | 5,00 | $ 2.250.000,00 | $ 11.250.000,00 |
| 5 | AUXILIAR CONTABLE | AUXILIAR CONTABLE | 40% | 1,00 | 3,00 | $ 2.500.000,00 | $ 3.000.000,00 |
| | | | | | | | |
| A+B | | | | | | SUBTOTAL PERSONAL | $ 309.691.257,04 |
| | | | | | | FACTOR MULTIPLICADOR (6) | 2,10 |
| C | SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A+B)*FM | | | | | | $650.351.639,79 |
| | | | | | | | |
| | 2. COSTOS DIRECTOS - FASE II EJECUCIÓN DE OBRA | | | | | | |
| ITEM | TIPO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | VALOR MES | VALOR TOTAL | |
| 1 | Alquiler Vehiculo - Transporte Adminstrativo Campero, Pick-Up, Camioneta (2018-2020). | | MES | 5,00 | 9.700.000,00 | 48.500.000,00 | |
| 2 | Combustible Vehiculo - Campero Pick-Up Camioneta (2018-2020). | | MES | 5,00 | 650.000,00 | 3.250.000,00 | |
| 3 | Jurídicas, Contables, Administrativa y Social | | MES | 5,00 | 6.500.000,00 | 32.500.000,00 | |
| 4 | Ensayos de calidad - laboratorios | | MES | 3,00 | 4.500.000,00 | 13.500.000,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Arriendo oficina, aseo y servicios públicos (luz, agua e internet) | | MES | 10,00 | 2.750.000,00 | 27.500.000,00 |
| 6 | Alquiler de equipos de computo muebles y equipos de oficina | | MES | 10,00 | 2.550.000,00 | 25.500.000,00 |
| 7 | Transporte de Equipos y Materiales de ensayos | | MES | 3,00 | 2.600.000,00 | 7.800.000,00 |
| 8 | Edición de informes, impresión, registro fotográfico, papelería, fotocopias, ploter, planos y otros | | MES | 10,00 | 3.300.000,00 | 33.000.000,00 |
| 9 | Alquiler de equipo de equipos de topografía, GPS | | MES | 2,00 | 4.500.000,00 | 9.000.000,00 |
| D | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | | $200.550.000,00 |
| E | TOTAL COSTOS DE LA INTERVENTORIA - FASE II EJECUCIÓN DE OBRA (C+D) | | | | | $850.901.639,79 |
| F | IVA19% | | | | | $161.671.312,00 |
| | VALOR TOTAL - FASE II EJECUCIÓN DE OBRA (AJUSTADO AL PESO) | | | | | $1.012.572.952,00 |
| | VALOR EN LETRAS: MIL DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE | | | | | |

| "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - DEPARTAMENTO DE META" | | |
|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **V. PARCIAL** |
| 1 | VALOR PRESUPUESTO INTERVENTORÍA A ESTUDIOS Y DISEÑOS | $ 397.813.951,00 |
| 2 | VALOR PRESUPUESTO INTERVENTORÍA OBRA | $ 1.012.572.952,00 |
| **TOTAL, PRESUPUESTO INTERVENTORÍA A ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA** | | **$ 1.410.386.903,00** |

## 5.2. CONTROL PRESUPUESTAL INTERVENTORÍA.

A La fecha La Interventoría Consorcio Interpolicía 2023, realizo el cobro de Acta Parcial No2 a la secretaria de Infraestructura. Tal como quedó establecido en la forma de pago según la minuta del Contrato de Obra N° 374 DE 2023 en su FORMA DE PAGO el municipio pagara al contratista el valor total del contrato hasta acumular el NOVENTA POR CIENTO (90%) del contrato mediante la presentación de actas de cobro parcial, las cuales deben ser refrendados por el contratista, el interventor y el secretario de infraestructura, dichas actas corresponden al avance de obra del objeto contractual y deberá presentarse al municipio. Dado que el Contrato de Interventoría N° 374 DE 2023 en su CLAUSULA 4 FORMA DE PAGO no contempla la entrega de recursos correspondientes a pago de anticipo.

## 5.3. ACTAS GENERADAS

El presente Contrato de Interventoría N° 374 de 2023 tiene acta de inicio firmada entre la Entidad Contratante e Interventoría en fecha veintisiete (27) de abril de 2023 iniciando con un

plazo contractual de Doce (12) meses y con fecha de terminación del día veinticuatro (24) de marzo del 2024, el cual cuenta con un presupuesto de$ 1.410.386.903,00 para la ejecución de dicho contrato.

El Contrato de Interventoría N° 374 de 2023, hace entrega del acta de cobro parcial, como aprobación y aval para el cobro de la primera fase, como ejecución de actividades cumplidas, la misma es firmada entre la Entidad Contratante e Interventoría en fecha diecisiete (17) de julio de 2023, se presenta un porcentaje de ejecución del 28.21%, que dentro del presupuesto de Interventoría representa un monto de $ 397.813.951,00 siendo totalidad de la fase de consultoría.

### 5.4. CONTROL DE SEGUIMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se evidencia las actividades que se entregaron ante la supervisión en el periodo comprendido del 11 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 31 DE JULIO DE 2024, dichas actividades son descritas así:

- ✓ Se realizó socialización del proyecto ante la nueva gestión de gobierno en el municipio de Acacías, y se realizó visita por parte del alcalde y el nuevo secretario de Infraestructura para verificar avance al desarrollo de actividades de obra.



**Socialización y visita en obra.**

- ✓ Verificación de los documentos correspondientes a Parafiscales y Seguridad Social de Obra.

- ✓ Verificación de la cota y niveles.



**Verificación de niveles.**

- ✓ Verificación de las actividades de preliminares, (campamento, cerramiento, baños y logística de obra).



***Adecuaciones del campamento de obra.***

- ✓ Verificación al acondicionamiento de terreno, del manejo de preoperacionales de maquinaria amarilla y del sistema de seguridad en obra.



**Maquinaria amarilla de obra.**

✓ Se realiza el chequeo de los ejes y escuadras del bloque administrativo.




**Chequeo de ejes y escuadra.**

- ✓ Comité de obra técnico para el desarrollo de las actividades de excavación, niveles de altura del proyecto, figuración y pedido de acero, inicio de actividades de cimentación, programación de actividades y organización de los frentes de trabajo.

- ✓ Se realizo acta de comité virtual de seguimiento por parte del Min. Del interior.

- ✓ Se realizo comité presencial de seguimiento en las oficinas del ministerio del interior en la ciudad de Bogotá, al cual asistieron por interventoría el ingeniero Juan camilo Posada, contratista de obra el ingeniero Andrés Martino Pérez y el alcalde del municipio de Acacias, CR. ® Carlos Julio Plata Becerra

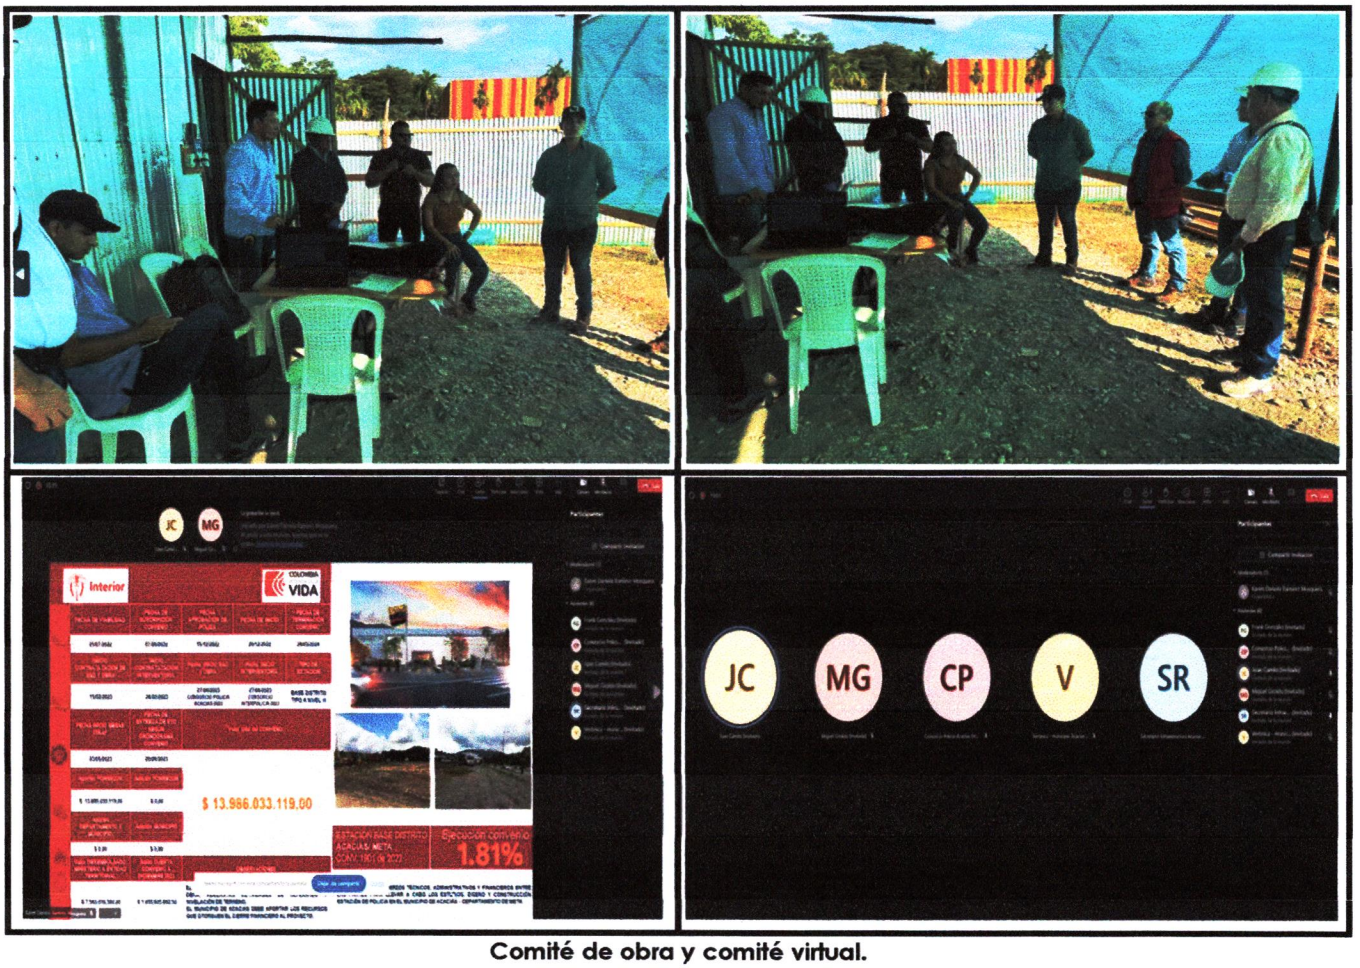


**Comité de obra y comité virtual.**

- ✓ Acompañamiento en el comité desarrollado por la empresa concretera para los requerimientos necesarios para el suministro del material.




El Contratista el primer periodo de ejecución ha presentado desarrollo de las actividades alusivas al contrato de obra, lo que se permite indicar que el avance de obra se contempla en un **1.94%** cumpliendo con las especificaciones determinadas dentro del cronograma de actividades.




✓ Chequeo de acero de zapatas y pedestales en modulo 1 administrativo.






✓ Verificación de vaciado de concreto en las diferente módulos del proyecto










✓ verificación de ejes, niveles y aceros en los distintos módulos del proyecto.

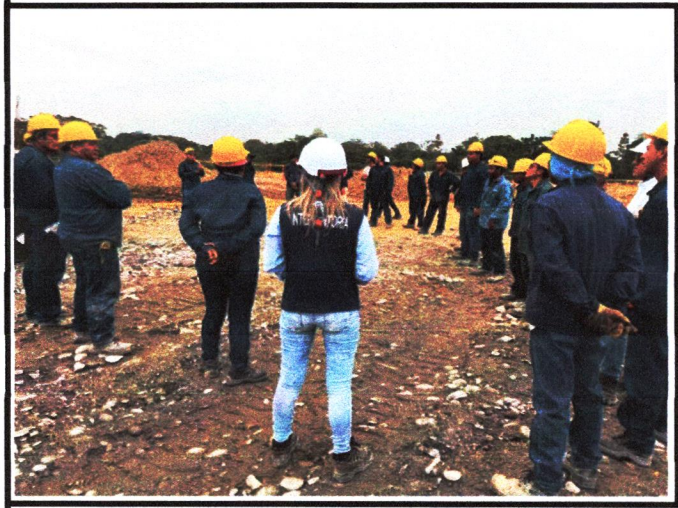



✓ Acompañamiento en las charlas de seguridad y salud en el trabajo.




✓ Verificacion y acompañamiento en excavaciones y fundida de pedestales.



✓ Chequeo y verificacion de niveles de excavaciones en modulos de armerillo y alojamientos.



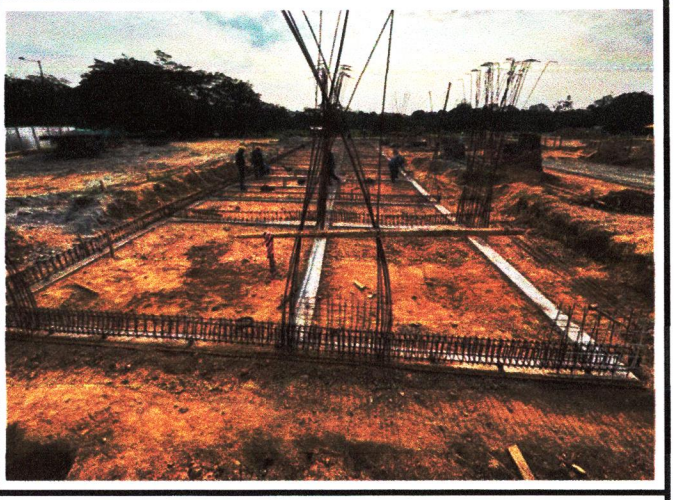


✓ verificación y chequeo de acero en vigas de cimentación módulo de administración





✓ Visita por parte del ministerio del interior

El Contratista para el segundo periodo de ejecución ha presentado desarrollo de las actividades alusivas al contrato de obra, lo que se permite indicar que el avance de obra se contempla en un **5.34%** cumpliendo con las especificaciones determinadas dentro del cronograma de actividades.

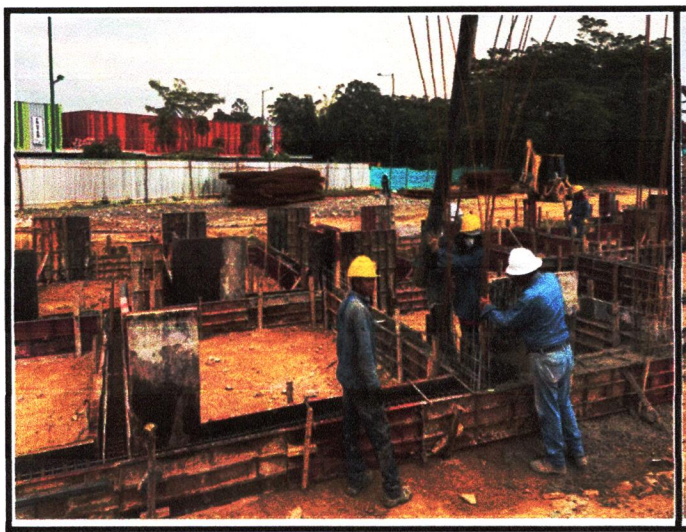




✓ Acompañamiento de fundida de vigas de cimentación modulo administrativo y armarillo.





✓ Visita en obra por parte del alcalde.

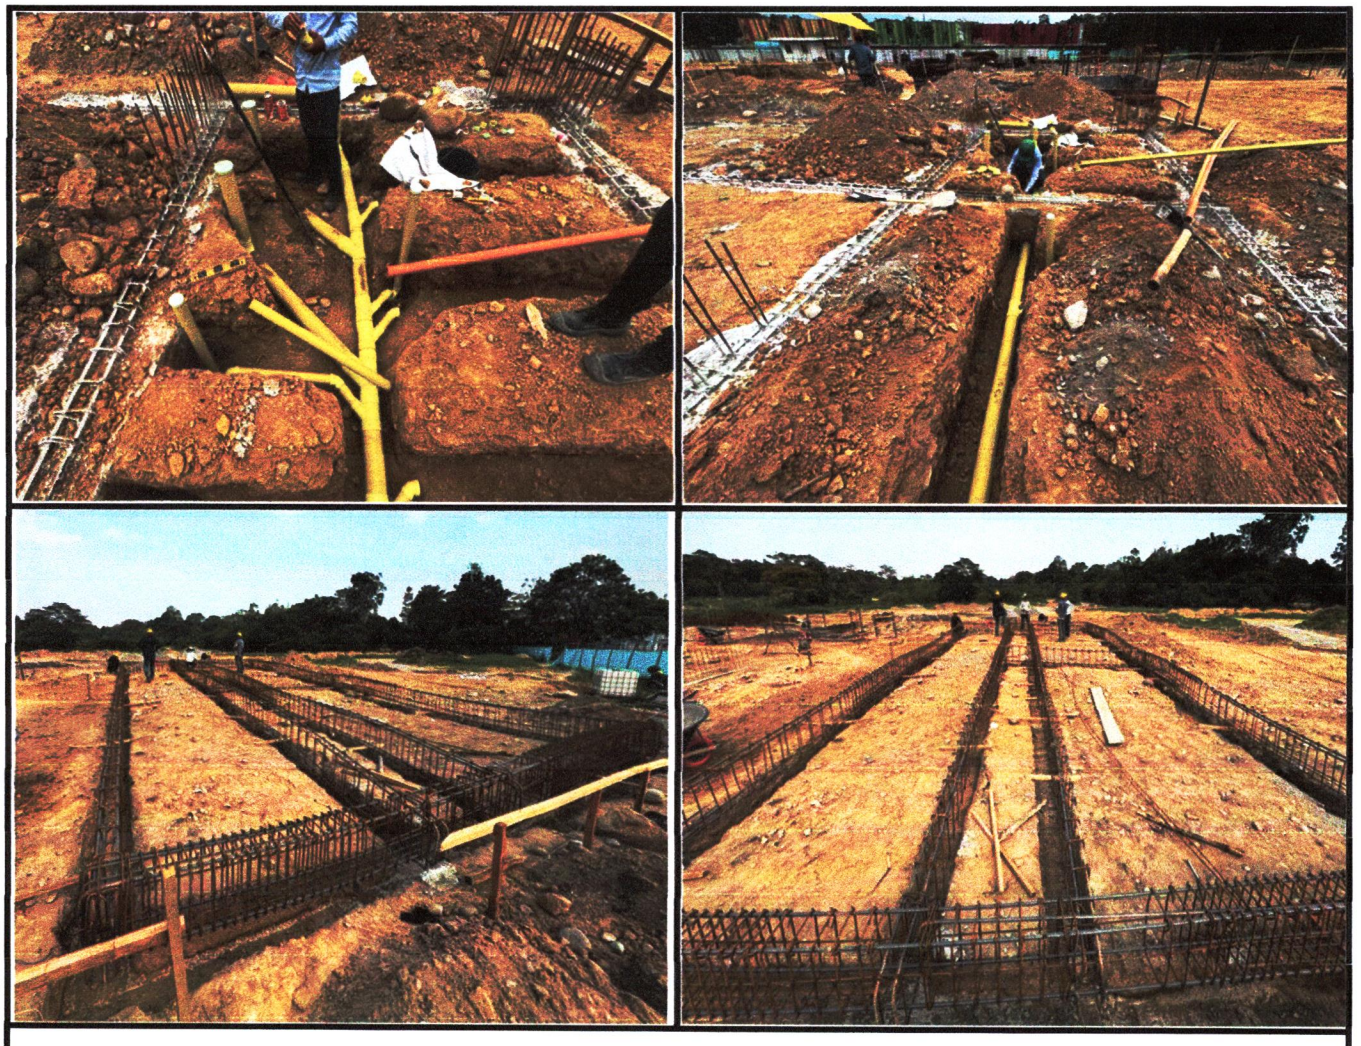


✓ Acompañamiento y verificación en instalaciones sanitarias y amarre de acero.





✓ Acompañamiento y revisión de niveles de pantallas para posteriormente fundidas.



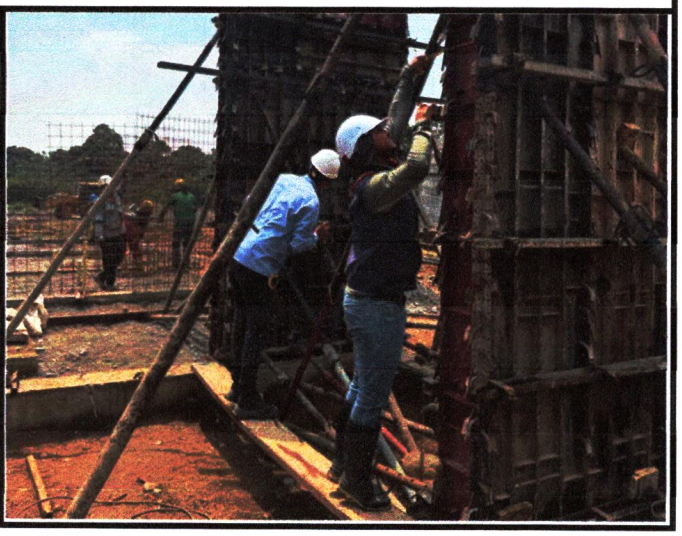






✓ Verificacion y acompañamiento plomo de pantallas y fundidas de pantallas y placas contrapiso.








✓ Acompañamiento y chequeo de cada una de las actividades realizadas por el contratista de obra.

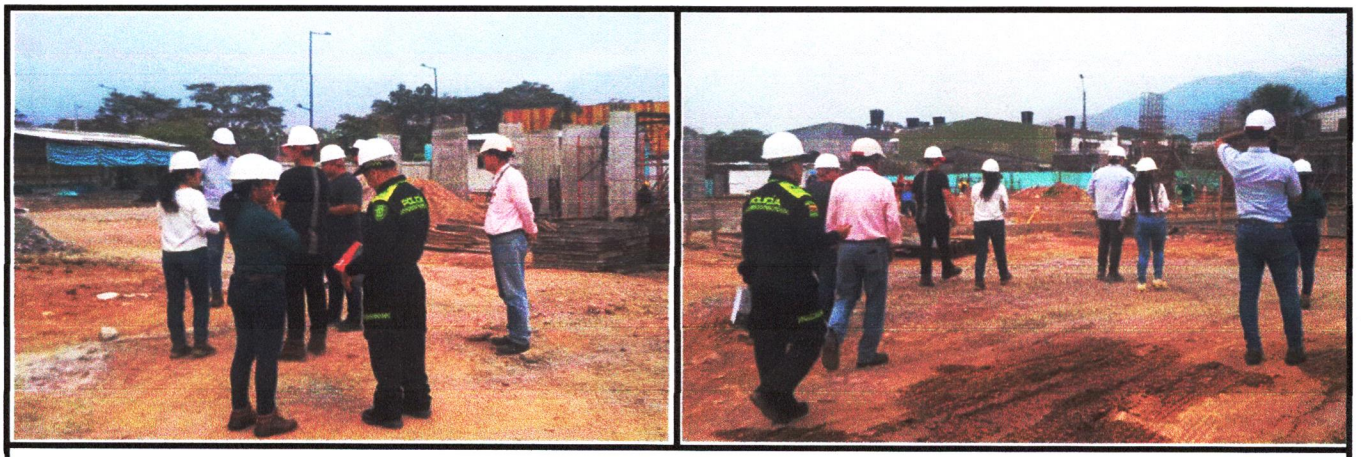

✓ Visita por parte del ministerio del interior

El Contratista para el tercer periodo de ejecución ha presentado desarrollo de las actividades alusivas al contrato de obra, lo que se permite indicar que el avance de obra se contempla en un **10.57%** cumpliendo con las especificaciones determinadas dentro del cronograma de actividades.

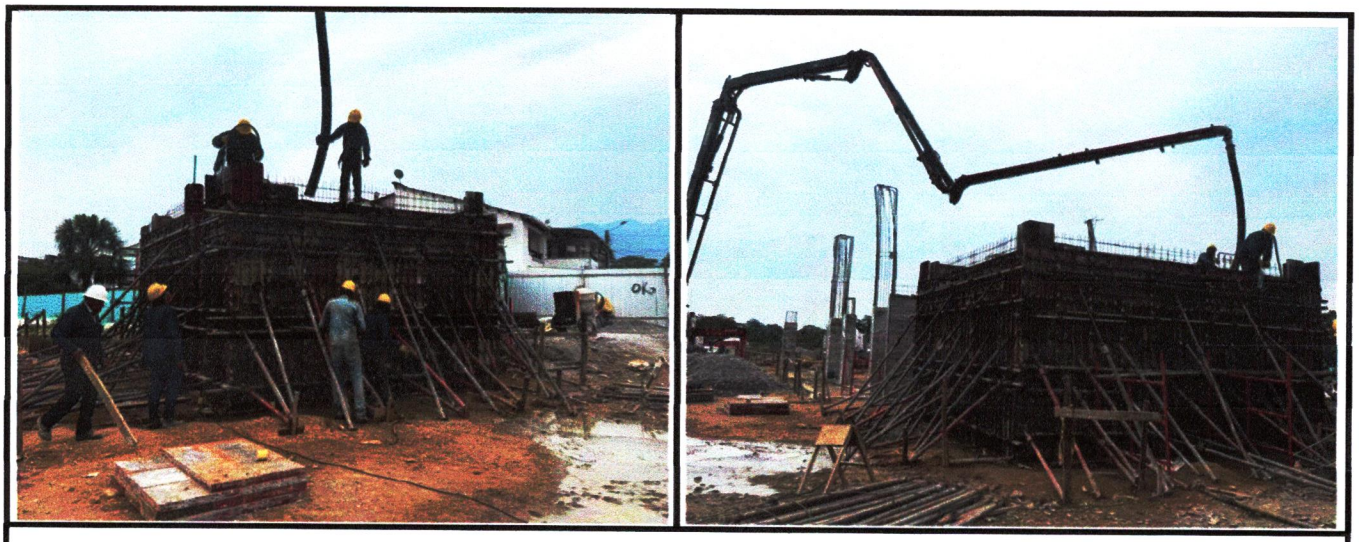


✓ Acompañamiento de fundida de muros de modulo 3 Armerillo.






✓ Acompañamiento de las charlas SST y Ambiental.

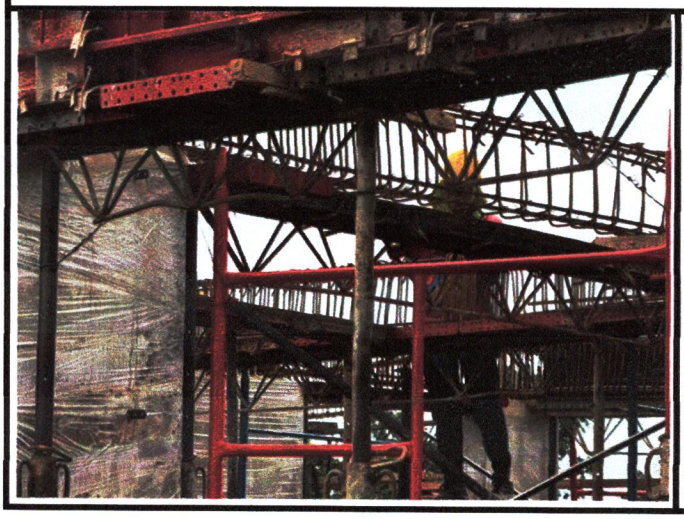






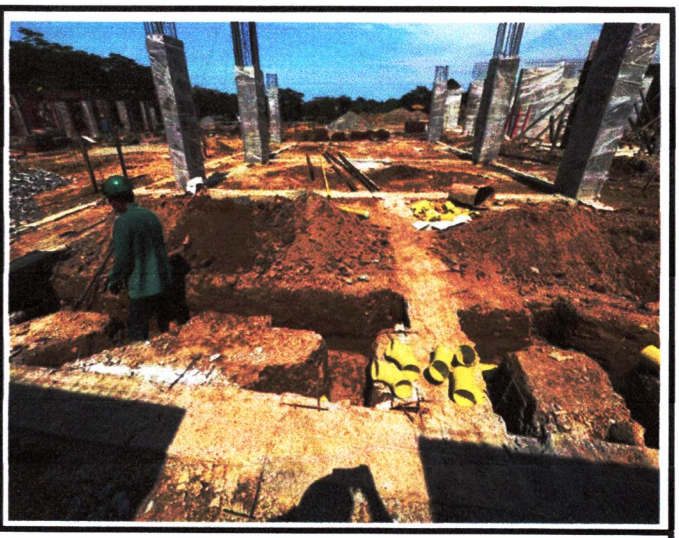

✓ Acompañamiento y verificación en instalaciones sanitarias y amarre de acero en vigas aéreas.

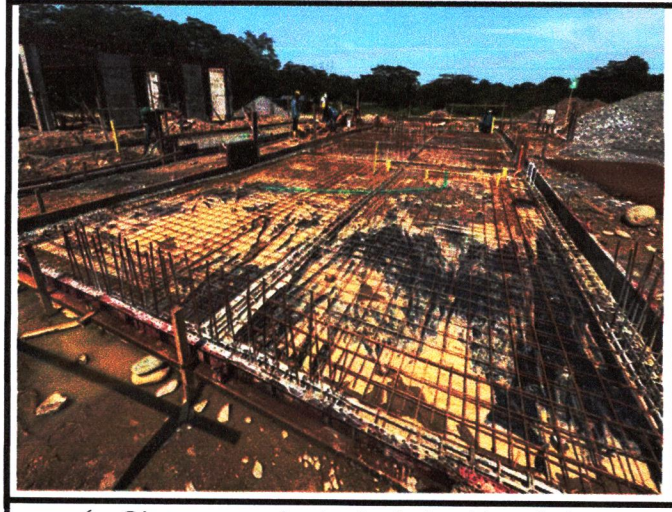



✓ Chequeo de la instalación del plástico y malla de aterrizaje del transformador en modulo 2.



✓ Verificacion y acompañamiento fundidas de pantallas y placas contrapiso.



- ✓ Acompañamiento y chequeo de cada una de las actividades realizadas por el contratista de obra.






- ✓ Visita por parte del ministerio del interior

El Contratista en este quinto periodo de ejecución ha presentado desarrollo de las actividades alusivas al contrato de obra, lo que se permite indicar que el avance de obra se contempla en un **25.75%** cumpliendo con las especificaciones determinadas dentro del cronograma de actividades.





- ✓ Acompañamiento de fundida de muros de garitas.

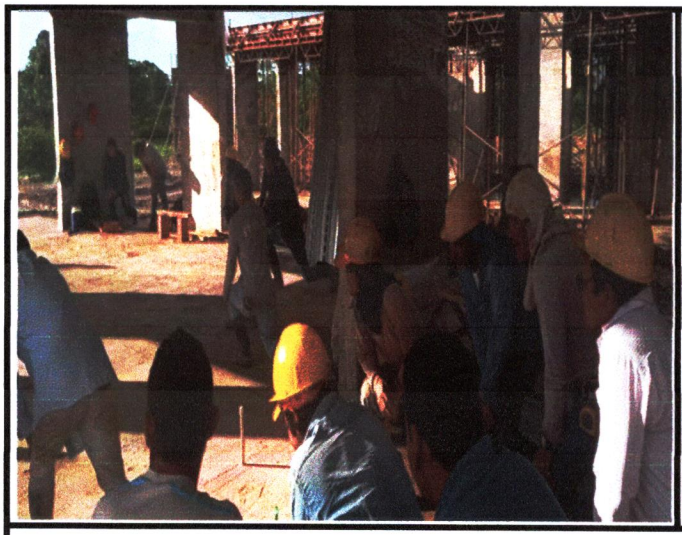




✓ Acompañamiento de las charlas SST y Ambiental.







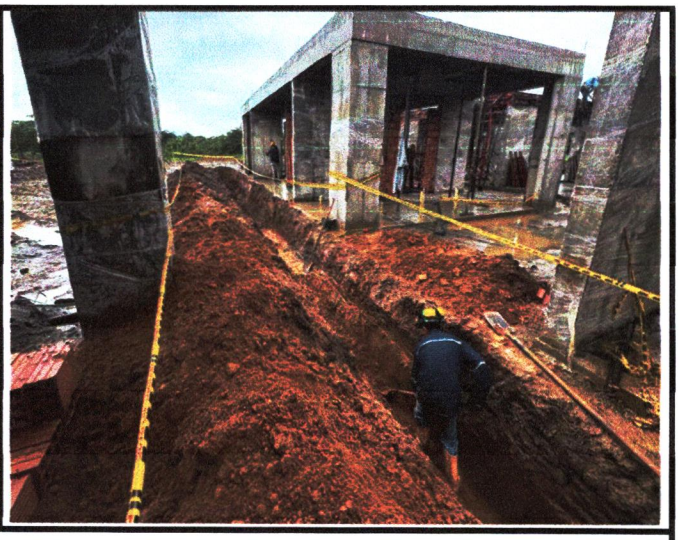

✓ Acompañamiento y verificación en excavaciones para redes sanitarias y electricas.






✓ Acompañamiento en vaciado de concreto en placas entre piso de modulo 1 y 4.



- ✓ Verificacion y acompañamiento en mamposteria modulos de alojamientos, social, administrativa y apartamento fiscal.




✓ Acompañamiento y chequeo de armado y vaciado de concreto en placa entrepiso modulo 7 alojamientos.

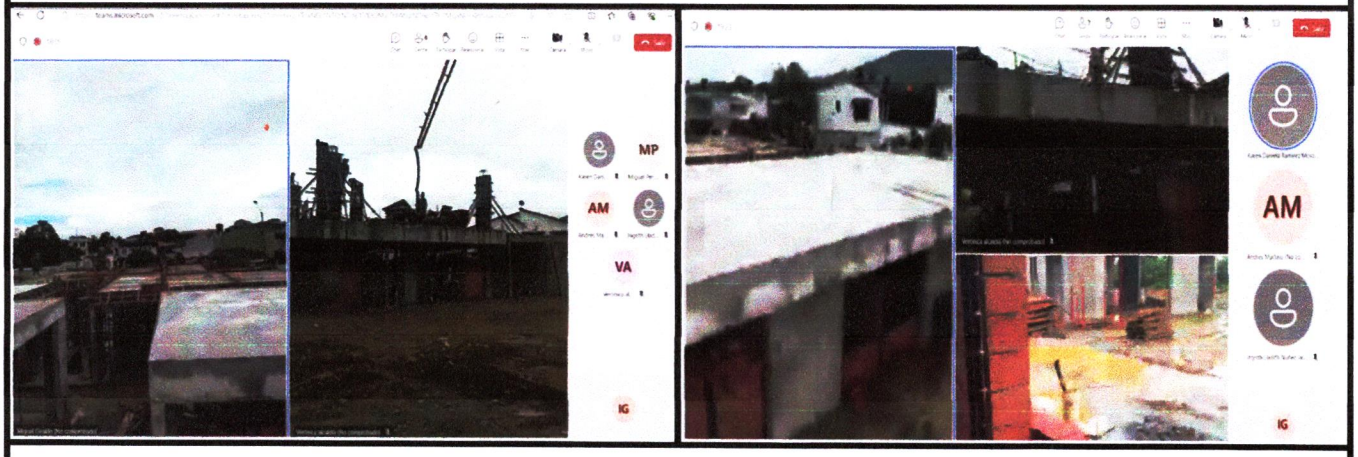


✓ Comité virtual por parte del ministerio del interior

El Contratista en este sexto periodo de ejecución ha presentado desarrollo de las actividades alusivas al contrato de obra, lo que se permite indicar que el avance de obra se contempla en un **38.59%** cumpliendo con las especificaciones determinadas dentro del cronograma de actividades.

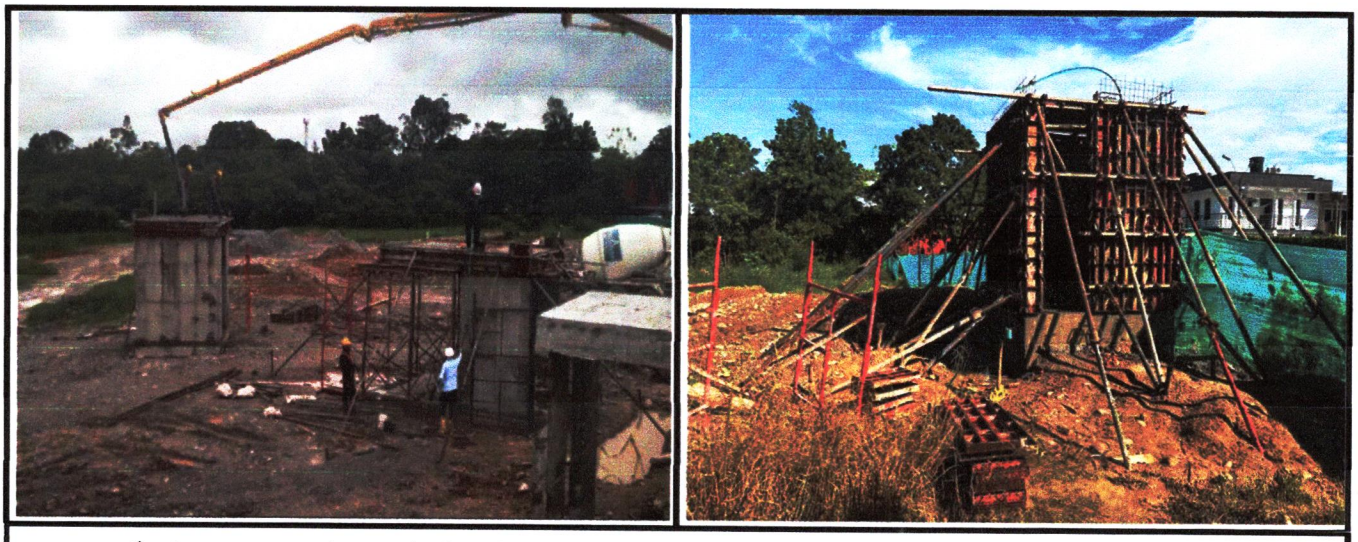


✓ Acompañamiento de fundida de placas de cubierta y muros de garitas y shut de basuras





✓ Acompañamiento de las charlas SST y Ambiental y fumigación en obra.



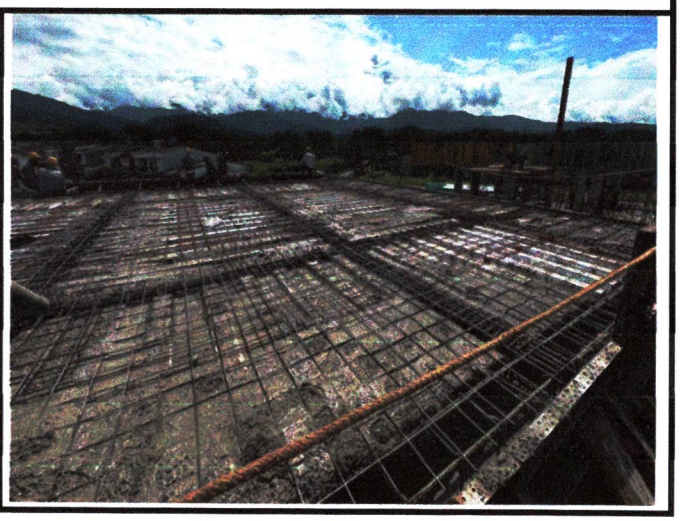






✓ Acompañamiento en vaciado de concreto en placa de cubierta modulo 4 social.



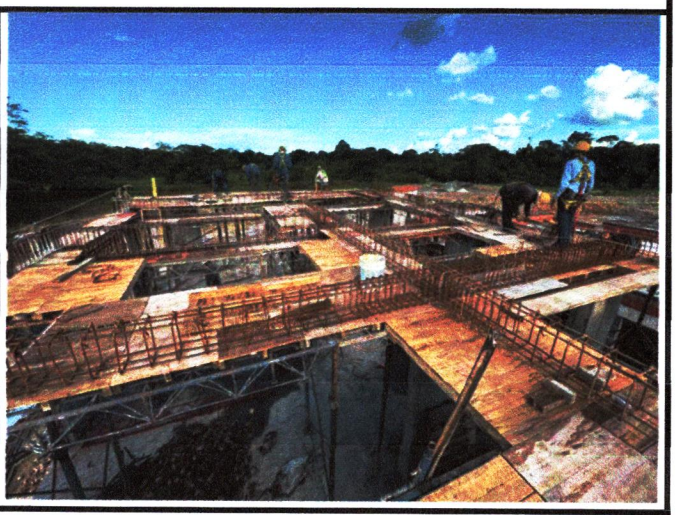


✓ Armado de vigas y placa de cubierta modulo 1 administrativo.




✓ Verificacion y acompañamiento en mamposteria modulos de alojamientos, social, administrativa y apartamento fiscal.



✓ Acompañamiento y chequeo de armado de acero y vaciado de concreto en garitas.

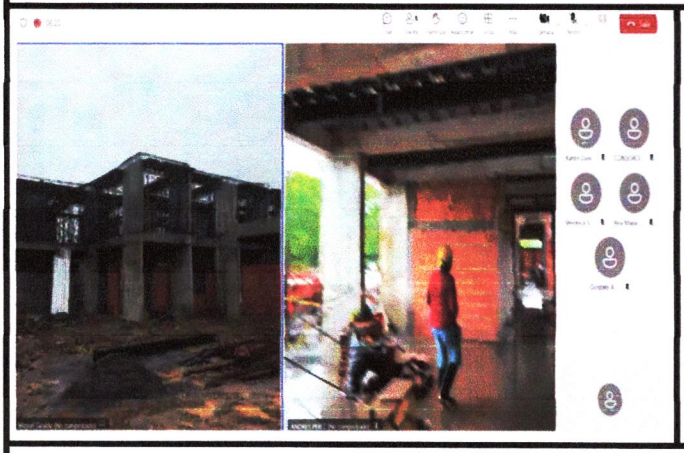


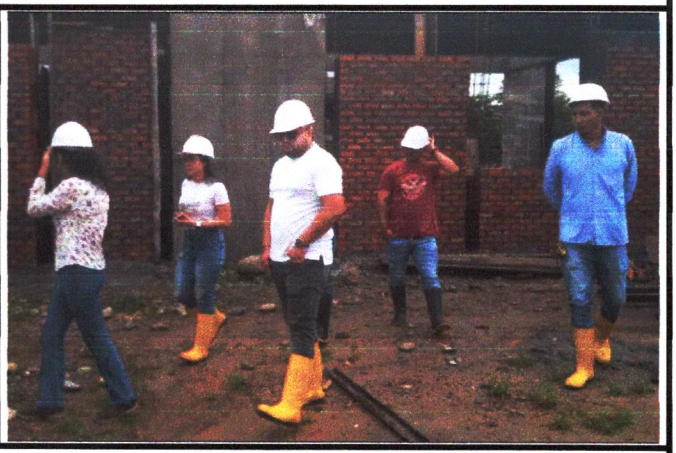

✓ Comité virtual y visita en obra por parte del ministerio del interior

El Contratista en este séptimo periodo de ejecución ha presentado desarrollo de las actividades alusivas al contrato de obra, lo que se permite indicar que el avance de obra se contempla en un **49.61%.**



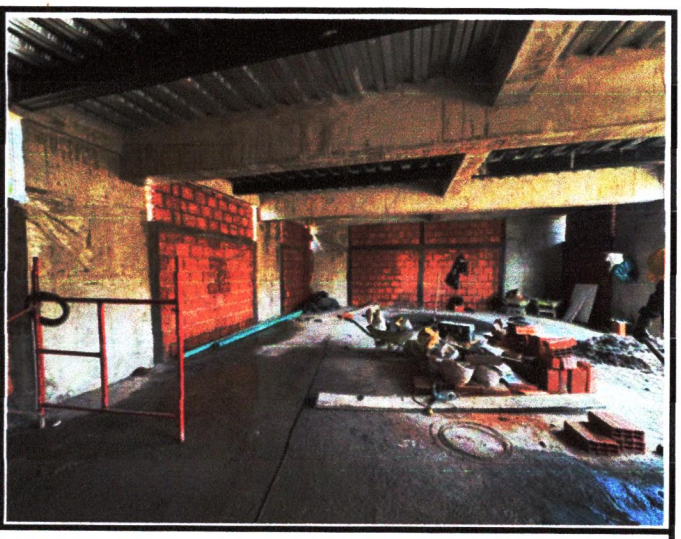

✓ Acompañamiento en armado de estructura para placa de cubierta y mampostería modulo 1





✓ Acompañamiento de las charlas SST y Ambiental










✓ Acompañamiento en vaciado de concreto en placa de cubierta modulo 1 administrativo.









- ✓ Verificación y acompañamiento en mampostería módulos de alojamientos, social, administrativa, apartamento fiscal y zona de servicios y celdas.

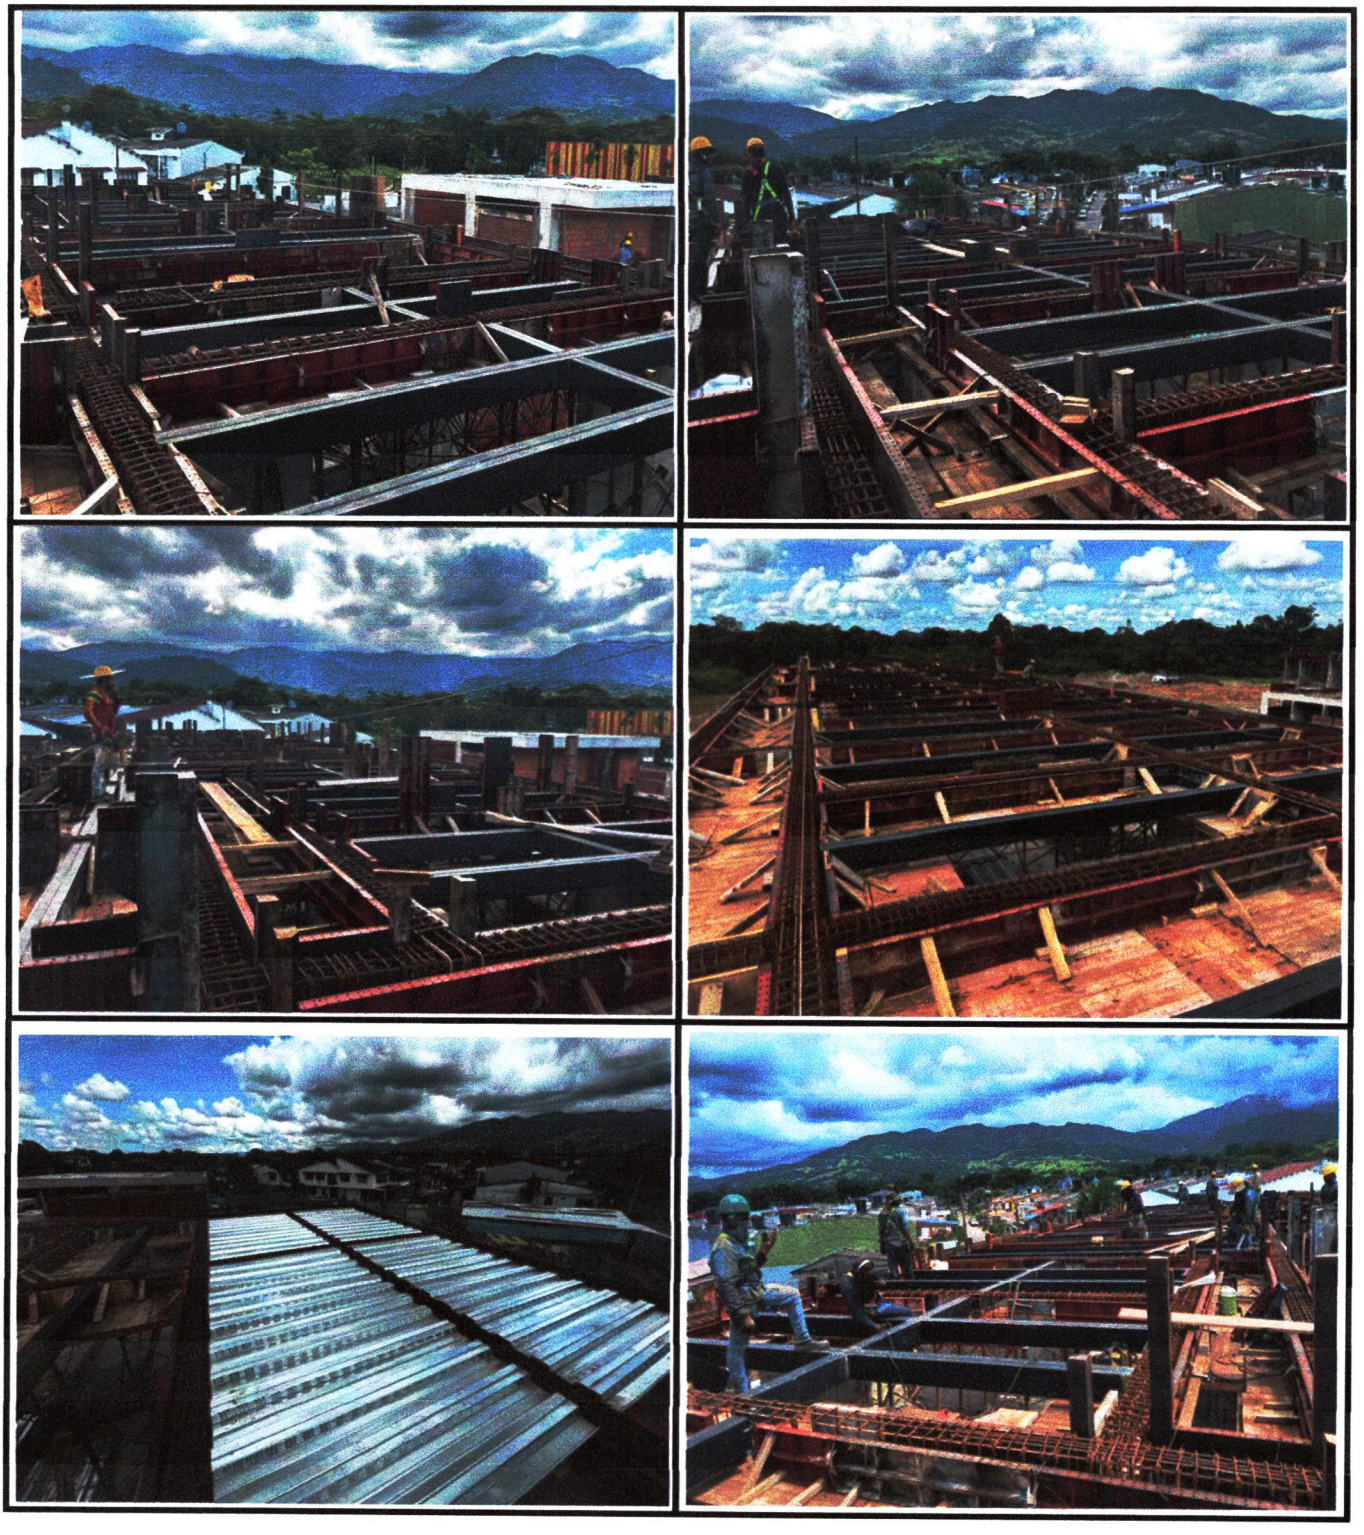

- ✓ Acompañamiento y chequeo de armado de placas de cubiertas mdulos 1 y 7.

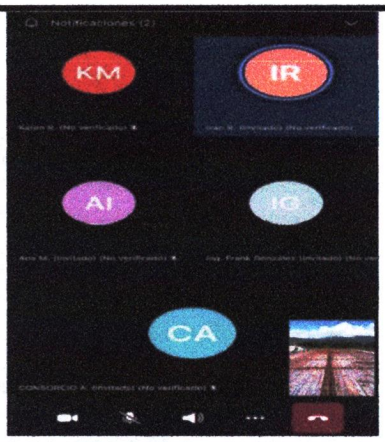


- ✓ Comité virtual por parte del ministerio del interior

El Contratista en este séptimo periodo de ejecución ha presentado desarrollo de las actividades alusivas al contrato de obra, lo que se permite indicar que el avance de obra se contempla en un **60,26%.**

**MES 1 – DICIEMBRE 2023:**

| % EJECUTADO MENSUAL | % PROGRAMADO MENSUAL |
|---|---|
| 1.10% | 1.10% |

**MES 2 – ENERO 2024:**

| % EJECUTADO MENSUAL | % PROGRAMADO MENSUAL |
|---|---|
| 1.94% | 3.04% |

**MES 3 – FEBRERO 2024:**

| % EJECUTADO MENSUAL | % PROGRAMADO MENSUAL |
|---|---|
| 5.34% | 8.38% |

MES 4 – MARZO 2024:

| % EJECUTADO MENSUAL | % PROGRAMADO MENSUAL |
|---|---|
| 10.57% | 18.95% |

MES 5 – ABRIL 2024:

| % EJECUTADO MENSUAL | % PROGRAMADO MENSUAL |
|---|---|
| 5.93% | 24.87% |

MES 6 – MAYO 2024:

| % EJECUTADO MENSUAL | % PROGRAMADO MENSUAL |
|---|---|
| 13.71% | 38.58% |


MES 7 – JUNIO 2024:

| % EJECUTADO MENSUAL | % PROGRAMADO MENSUAL |
|---|---|
| 11.03% | 49.61% |

MES 8 – JULIO 2024:

| % EJECUTADO MENSUAL | % PROGRAMADO MENSUAL |
|---|---|
| 10,65% | 60,26% |

PROGRAMADO VS EJECUTADO DE OBRA DISTRITO ACACÍAS CONTRATO N°: 377 DE 2023

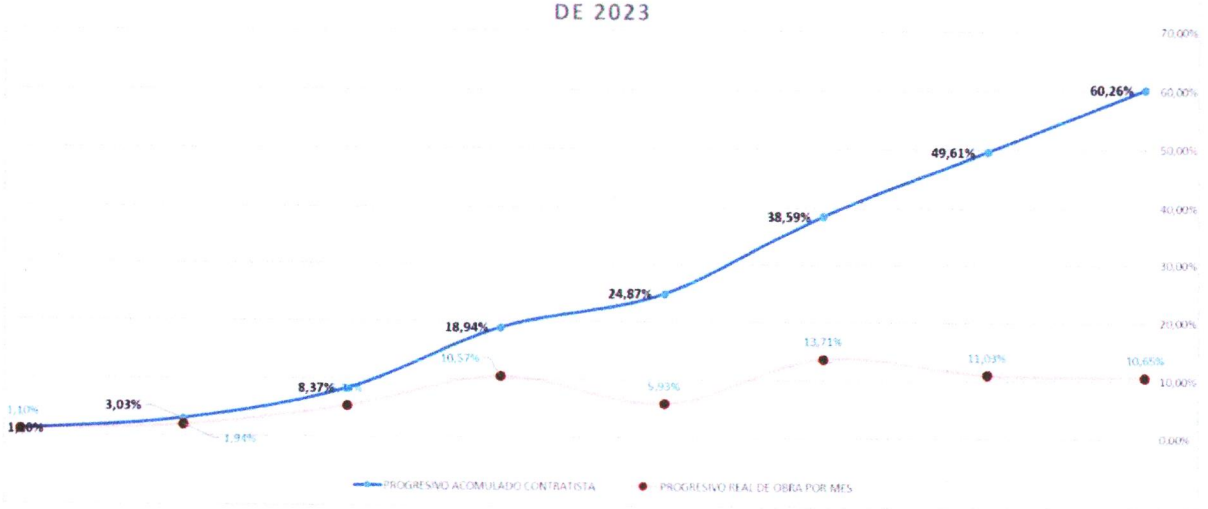

| EJECUCION DEL CONTRATO MES: | dic-23 | ene-24 | feb-24 | mar-24 | abr-24 | may-24 | jun-24 | jul-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESIVO REAL DE OBRA POR MES | 1,10% | 1,94% | 5,34% | 10,57% | 5,93% | 13,71% | 11,03% | 10,65% |
| PROGRESIVO ACOMULADO CONTRATISTA | 1,10% | 3,03% | 8,37% | 18,94% | 24,87% | 38,59% | 49,61% | 60,26% |

Según lo anterior el contratista de obra presenta un desarrollo financiero progresivo, por lo cual ha tenido un avance físico del **60,26%** el cual estipula a un monto de **$7.178.115.158,26** en el que se evidencia según la tabla los porcentajes ejecutados mes a mes desde diciembre de 2023 a julio de 2024.

## 6. CONCLUSIONES

- La Contratista CONSORCIO POLICÍA-ACACIAS 2023, Inicia actividades de obra en fecha 11 de diciembre de 2023.

- El avance porcentual se actualiza en un **60,26%** el cual representa el monto de: SIETE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON VEINTISÉIS PESOS M/CTE (**$ 7.178.115.158,26**).

- Actualmente la obra se encuentra en un tiempo por ejecución contractual de tres meses para la fecha de finalización, la cual se tiene prevista para el 12 de noviembre del 2024. Para la fecha el contratista de obra presenta una solicitud de adición presupuestal por actividades que se encuentran de manera predecesoras a las actividades contractuales, cabe resaltar que la primera solicitud de adición presupuestal se realizó desde la Fase I estudios y diseños, como un reajuste a los precios del municipio.

FIRMA: _____

JUAN CAMILO POSADA VARELA

**REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERPOLICÍA 2023**

ALCALDÍA DE ACACÍAS

# ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **A** | **FASE I** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | ESTUDIOS Y DISEÑOS | GL | 1 | $ 662,923,252.00 | $ 662,923,252.00 | 1.00 | $ 662,923,252.00 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 662,923,252.00 | 0.00 | $ - |
| | **TOTAL COSTO FASE I: ESUDIOS Y DISEÑOS** | | | | **$ 662,923,252.00** | | **$ 662,923,252.00** | | **$ -** | | **$ 662,923,252.00** | | **$ -** |
| **B** | **FASE II** | | | | | | | | | | | | |
| **1.00** | **ZONA ADMINISTRATIVA** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 419.22 | $ 6,620.62 | $ 2,775,496.32 | 419.22 | $ 2,775,496.32 | 0.00 | $ - | 419.22 | $ 2,775,496.32 | 0.00 | $ - |
| **1.2** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1** | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 467.90 | $ 113,807.32 | $ 53,250,445.03 | 467.90 | $ 53,250,445.03 | 0.00 | $ - | 467.90 | $ 53,250,445.03 | 0.00 | $ - |
| **1.2.2** | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | M3 | 395.06 | $ 48,905.05 | $ 19,320,429.05 | 395.06 | $ 19,320,429.05 | 0.00 | $ - | 395.06 | $ 19,320,429.05 | 0.00 | $ - |
| **1.2.3** | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | 3674.06 | $ 2,028.72 | $ 7,453,639.00 | 3674.06 | $ 7,453,639.00 | 0.00 | $ - | 3674.06 | $ 7,453,639.00 | 0.00 | $ - |
| **1.2.4** | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3/KM | 1684.44 | $ 2,028.72 | $ 3,417,257.12 | 1684.44 | $ 3,417,257.12 | 0.00 | $ - | 1684.44 | $ 3,417,257.12 | 0.00 | $ - |
| **1.3** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1** | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 12.40 | $ 800,447.03 | $ 9,925,543.17 | 12.40 | $ 9,925,543.17 | 0.00 | $ - | 12.40 | $ 9,925,543.17 | 0.00 | $ - |
| **1.3.2** | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 64.74 | $ 1,375,792.04 | $ 89,068,776.67 | 58.69 | $ 80,745,234.83 | 6.05 | $ 8,323,541.84 | 64.74 | $ 89,068,776.67 | 0.00 | $ - |
| **1.3.3** | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 7.33 | $ 3,129,144.81 | $ 22,936,631.46 | 7.33 | $ 22,936,631.46 | 0.00 | $ - | 7.33 | $ 22,936,631.46 | 0.00 | $ - |
| **1.3.4** | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 30.04 | $ 1,461,468.24 | $ 43,902,505.93 | 30.04 | $ 43,902,505.93 | 0.00 | $ - | 30.04 | $ 43,902,505.93 | 0.00 | $ - |
| **1.3.5** | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 63.98 | $ 1,944,132.62 | $ 124,385,605.03 | 36.58 | $ 71,116,371.24 | 27.40 | $ 53,269,233.79 | 63.98 | $ 124,385,605.03 | 0.00 | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **1.3.6** | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 33.57 | $ 1,349,337.03 | $ 45,297,244.10 | 0.00 | $ - | 33.57 | $ 45,297,244.10 | 33.57 | $ 45,297,244.10 | 0.00 | $ - |
| **1.3.7** | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 81.49 | $ 1,901,669.30 | $ 154,967,031.26 | 0.00 | $ - | 81.49 | $ 154,967,031.26 | 81.49 | $ 154,967,031.26 | 0.00 | $ - |
| **1.3.8** | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 84.43 | $ 1,507,757.43 | $ 127,299,959.81 | 0.00 | $ - | 84.43 | $ 127,299,959.81 | 84.43 | $ 127,299,959.81 | 0.00 | $ - |
| **1.3.9** | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0.57 | $ 1,647,821.03 | $ 939,257.99 | 0.00 | $ - | 0.57 | $ 939,257.99 | 0.57 | $ 939,257.99 | 0.00 | $ - |
| **1.3.10** | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0.48 | $ 2,447,331.03 | $ 1,174,718.89 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.48 | $ 1,174,718.89 |
| **1.3.11** | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1696.00 | $ 36,756.54 | $ 62,339,091.84 | 0.00 | $ - | 1696.00 | $ 62,339,091.84 | 1696.00 | $ 62,339,091.84 | 0.00 | $ - |
| **1.3.12** | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | M2 | 335.67 | $ 8,223.01 | $ 2,760,217.77 | 0.00 | $ - | 335.67 | $ 2,760,217.77 | 335.67 | $ 2,760,217.77 | 0.00 | $ - |
| **1.4** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.1** | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 43703.02 | $ 11,120.63 | $ 486,005,115.30 | 22605.53 | $ 251,387,735.08 | 21097.49 | $ 234,617,380.22 | 43703.02 | $ 486,005,115.30 | 0.00 | $ - |
| **1.4.2** | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 3818.46 | $ 11,967.06 | $ 45,695,739.93 | 2943.70 | $ 35,227,434.52 | 874.76 | $ 10,468,305.41 | 3818.46 | $ 45,695,739.93 | 0.00 | $ - |
| **1.4.3** | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 4256.38 | $ 30,075.87 | $ 128,014,331.55 | 0.00 | $ - | 4256.38 | $ 128,014,331.55 | 4256.38 | $ 128,014,331.55 | 0.00 | $ - |
| **1.4.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | M2 | 844.32 | $ 79,462.54 | $ 67,091,811.77 | 0.00 | $ - | 844.32 | $ 67,091,811.77 | 844.32 | $ 67,091,811.77 | 0.00 | $ - |
| **1.5** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.1** | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 602.92 | $ 70,554.51 | $ 42,538,725.17 | 0.00 | $ - | 602.92 | $ 42,538,725.17 | 602.92 | $ 42,538,725.17 | 0.00 | $ - |
| **1.5.2** | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | M2 | 512.35 | $ 95,254.64 | $ 48,803,714.80 | 0.00 | $ - | 512.35 | $ 48,803,714.80 | 512.35 | $ 48,803,714.80 | 0.00 | $ - |
| **1.5.3** | MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA | M2 | 64.33 | $ 214,942.04 | $ 13,827,221.43 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 64.33 | $ 13,827,221.43 |
| **1.5.4** | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 17.41 | $ 2,232,938.39 | $ 38,875,457.37 | 0.00 | $ - | 17.41 | $ 38,875,457.37 | 17.41 | $ 38,875,457.37 | 0.00 | $ - |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 1.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 1422.07 | $ 32,858.77 | $ 46,727,471.05 | 0.00 | $ - | 1279.86 | $ 42,054,625.37 | 1279.86 | $ 42,054,625.37 | 142.21 | $ 4,672,845.68 |
| 1.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 856.79 | $ 45,008.72 | $ 38,563,021.21 | 0.00 | $ - | 728.27 | $ 32,778,500.51 | 728.27 | $ 32,778,500.51 | 128.52 | $ 5,784,520.69 |
| 1.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | M2 | 665.86 | $ 301,432.09 | $ 200,711,571.45 | 0.00 | $ - | 166.47 | $ 50,179,400.02 | 166.47 | $ 50,179,400.02 | 499.39 | $ 150,532,171.43 |
| 1.5.8 | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | M2 | 10.59 | $ 179,351.23 | $ 1,899,329.53 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 10.59 | $ 1,899,329.53 |
| 1.5.9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | ML | 425.63 | $ 40,554.38 | $ 17,261,160.76 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 425.63 | $ 17,261,160.76 |
| 1.5.10 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | M2 | 43.28 | $ 99,112.92 | $ 4,289,607.18 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 43.28 | $ 4,289,607.18 |
| 1.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | M2 | 462.02 | $ 138,203.99 | $ 63,853,007.46 | 0.00 | $ - | 231.01 | $ 31,926,503.73 | 231.01 | $ 31,926,503.73 | 231.01 | $ 31,926,503.73 |
| 1.5.12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | ML | 79.33 | $ 166,028.35 | $ 13,171,029.01 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 79.33 | $ 13,171,029.01 |
| 1.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | M2 | 709.14 | $ 43,609.40 | $ 30,925,169.92 | 0.00 | $ - | 109.37 | $ 4,769,560.08 | 109.37 | $ 4,769,560.08 | 599.77 | $ 26,155,609.84 |
| 1.6 | PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 856.79 | $ 18,207.57 | $ 15,600,063.90 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 856.79 | $ 15,600,063.90 |
| 1.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 1435.30 | $ 15,401.75 | $ 22,106,131.78 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1435.30 | $ 22,106,131.78 |
| 1.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | M2 | 1435.30 | $ 27,009.33 | $ 38,766,491.35 | 0.00 | $ - | 574.12 | $ 15,506,596.54 | 574.12 | $ 15,506,596.54 | 861.18 | $ 23,259,894.81 |
| 1.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | M2 | 856.79 | $ 48,260.08 | $ 41,348,753.94 | 0.00 | $ - | 342.72 | $ 16,539,694.62 | 342.72 | $ 16,539,694.62 | 514.07 | $ 24,809,059.33 |
| 1.7 | CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 8.00 | $ 197,050.30 | $ 1,576,402.40 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 1,576,402.40 |
| 1.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS. | UN | 1.00 | $ 389,442.06 | $ 389,442.06 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 389,442.06 |
| 1.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR HIDRAULICO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, DOS PARADAS, PUERTAS AUTOMATICAS APERTURA CENTRAL, CAPACIDAD DE 500 KG. | UN | 1.00 | $ 192,744,562.50 | $ 192,744,562.50 | 0.00 | $ - | 0.75 | $ 144,558,421.88 | 0.75 | $ 144,558,421.88 | 0.25 | $ 48,186,140.63 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 1.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD 3000 LIBRAS DE PRESION Y 3 MICRAS | M2 | 185.06 | $ 1,592,133.62 | $ 294,640,247.72 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 185.06 | $ 294,640,247.72 |
| 1.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | UN | 20.00 | $ 2,274,416.18 | $ 45,488,323.60 | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 13,646,497.08 | 6.00 | $ 13,646,497.08 | 14.00 | $ 31,841,826.52 |
| 1.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3" | M2 | 3.50 | $ 520,844.37 | $ 1,822,955.30 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.50 | $ 1,822,955.30 |
| 1.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM | M2 | 46.53 | $ 358,378.07 | $ 16,675,331.60 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 46.53 | $ 16,675,331.60 |
| 1.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | UND | 1.00 | $ 29,023,312.50 | $ 29,023,312.50 | 0.00 | $ - | 0.90 | $ 26,120,981.25 | 0.90 | $ 26,120,981.25 | 0.10 | $ 2,902,331.25 |
| 1.7.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | M2 | 12.51 | $ 2,455,818.75 | $ 30,722,292.56 | 0.00 | $ - | 3.75 | $ 9,209,320.31 | 3.75 | $ 9,209,320.31 | 8.76 | $ 21,512,972.25 |
| 1.7.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES). | UN | 8.00 | $ 6,704,307.78 | $ 53,634,462.24 | 0.00 | $ - | 2.40 | $ 16,090,338.67 | 2.40 | $ 16,090,338.67 | 5.60 | $ 37,544,123.57 |
| 1.7.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR. | UN | 2.00 | $ 1,610,618.22 | $ 3,221,236.44 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 3,221,236.44 |
| 1.7.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML | 4.40 | $ 2,244,953.23 | $ 9,877,794.21 | 0.00 | $ - | 3.52 | $ 7,902,235.37 | 3.52 | $ 7,902,235.37 | 0.88 | $ 1,975,558.84 |
| 1.8 | CIELO RASO | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA | M2 | 41.58 | $ 126,307.83 | $ 5,251,879.57 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 41.58 | $ 5,251,879.57 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 1.9 | RED HIDRÁULICA | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 217.23 | $ 15,380.00 | $ 3,340,997.40 | 0.00 | $ - | 217.23 | $ 3,340,997.40 | 217.23 | $ 3,340,997.40 | 0.00 | $ - |
| 1.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 54.00 | $ 3,142.03 | $ 169,669.62 | 0.00 | $ - | 54.00 | $ 169,669.62 | 54.00 | $ 169,669.62 | 0.00 | $ - |
| 1.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 30.03 | $ 18,697.31 | $ 561,480.22 | 0.00 | $ - | 30.03 | $ 561,480.22 | 30.03 | $ 561,480.22 | 0.00 | $ - |
| 1.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 42.00 | $ 4,429.50 | $ 186,039.00 | 0.00 | $ - | 42.00 | $ 186,039.00 | 42.00 | $ 186,039.00 | 0.00 | $ - |
| 1.9.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | $ 38,807.45 | $ 116,422.35 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 116,422.35 | 3.00 | $ 116,422.35 | 0.00 | $ - |
| 1.9.6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 25.00 | $ 68,128.10 | $ 1,703,202.50 | 0.00 | $ - | 25.00 | $ 1,703,202.50 | 25.00 | $ 1,703,202.50 | 0.00 | $ - |
| 1.9.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 17.00 | $ 10,381.65 | $ 176,488.05 | 0.00 | $ - | 17.00 | $ 176,488.05 | 17.00 | $ 176,488.05 | 0.00 | $ - |
| 1.9.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 8.00 | $ 12,890.76 | $ 103,126.08 | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 103,126.08 | 8.00 | $ 103,126.08 | 0.00 | $ - |
| 1.9.9 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 10.00 | $ 24,273.15 | $ 242,731.50 | 0.00 | $ - | 10.00 | $ 242,731.50 | 10.00 | $ 242,731.50 | 0.00 | $ - |
| 1.9.10 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 5.00 | $ 56,740.10 | $ 283,700.50 | 0.00 | $ - | 5.00 | $ 283,700.50 | 5.00 | $ 283,700.50 | 0.00 | $ - |
| 1.10 | RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 54.17 | $ 29,977.33 | $ 1,623,871.97 | 27.22 | $ 815,982.92 | 26.95 | $ 807,889.04 | 54.17 | $ 1,623,871.97 | 0.00 | $ - |
| 1.10.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 77.00 | $ 14,062.80 | $ 1,082,835.60 | 47.00 | $ 660,951.60 | 30.00 | $ 421,884.00 | 77.00 | $ 1,082,835.60 | 0.00 | $ - |
| 1.10.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 45.26 | $ 60,418.42 | $ 2,734,537.69 | 27.86 | $ 1,683,257.18 | 17.40 | $ 1,051,280.51 | 45.26 | $ 2,734,537.69 | 0.00 | $ - |
| 1.10.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 57.00 | $ 43,221.47 | $ 2,463,623.79 | 30.00 | $ 1,296,644.10 | 27.00 | $ 1,166,979.69 | 57.00 | $ 2,463,623.79 | 0.00 | $ - |
| 1.10.5 | TUBERÍA PVCL 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 36.12 | $ 22,375.92 | $ 808,218.23 | 20.24 | $ 452,888.62 | 15.88 | $ 355,329.61 | 36.12 | $ 808,218.23 | 0.00 | $ - |
| 1.10.6 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 28,809.14 | $ 28,809.14 | 1.00 | $ 28,809.14 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 28,809.14 | 0.00 | $ - |
| 1.10.7 | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | $ 76,309.56 | $ 305,238.24 | 2.00 | $ 152,619.12 | 2.00 | $ 152,619.12 | 4.00 | $ 305,238.24 | 0.00 | $ - |
| 1.10.8 | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 7.00 | $ 105,537.31 | $ 738,761.17 | 5.00 | $ 527,686.55 | 2.00 | $ 211,074.62 | 7.00 | $ 738,761.17 | 0.00 | $ - |
| 1.10.9 | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 44,074.51 | $ 44,074.51 | 1.00 | $ 44,074.51 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 44,074.51 | 0.00 | $ - |
| 1.10.10 | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 13.00 | $ 34,548.91 | $ 449,135.83 | 7.00 | $ 241,842.37 | 6.00 | $ 207,293.46 | 13.00 | $ 449,135.83 | 0.00 | $ - |
| 1.10.11 | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 19.00 | $ 88,484.78 | $ 1,681,210.82 | 15.00 | $ 1,327,271.70 | 4.00 | $ 353,939.12 | 19.00 | $ 1,681,210.82 | 0.00 | $ - |
| 1.10.12 | SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR | UN | 10.00 | $ 1,729,150.39 | $ 17,291,503.90 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 10.00 | $ 17,291,503.90 |
| 1.10.13 | SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA | UN | 1.00 | $ 1,104,284.21 | $ 1,104,284.21 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,104,284.21 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **1.10.14** | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS | UN | 11.00 | $ 1,003,134.51 | $ 11,034,479.61 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 11.00 | $ 11,034,479.61 |
| **1.10.15** | ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO | UN | 2.00 | $ 1,188,491.00 | $ 2,376,982.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 2,376,982.00 |
| **1.10.16** | LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 321,535.80 | $ 321,535.80 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 321,535.80 |
| **1.10.17** | REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS | UN | 12.00 | $ 27,185.67 | $ 326,228.04 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 12.00 | $ 326,228.04 |
| **1.11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | | | | | | | | | | | |
| **1.11.1** | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | PTO | 130.00 | $ 208,006.25 | $ 27,040,812.50 | 0.00 | $ - | 65.00 | $ 13,520,406.25 | 65.00 | $ 13,520,406.25 | 65.00 | $ 13,520,406.25 |
| **1.11.2** | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 163.00 | $ 349,013.38 | $ 56,889,180.94 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 163.00 | $ 56,889,180.94 |
| **1.11.3** | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 8.00 | $ 212,049.81 | $ 1,696,398.48 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 1,696,398.48 |
| **1.11.4** | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 21.00 | $ 219,888.57 | $ 4,617,659.97 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 21.00 | $ 4,617,659.97 |
| **1.11.5** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W DL UNV | UN | 77.00 | $ 312,412.99 | $ 24,055,800.23 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 77.00 | $ 24,055,800.23 |
| **1.11.6** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W NW | UN | 37.00 | $ 1,016,343.49 | $ 37,604,709.13 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 37.00 | $ 37,604,709.13 |
| **1.11.7** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL SOBREPONER RD 24W DL MV SP | UN | 30.00 | $ 131,256.49 | $ 3,937,694.70 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 30.00 | $ 3,937,694.70 |
| **1.11.8** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V | UN | 19.00 | $ 131,256.49 | $ 2,493,873.31 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 19.00 | $ 2,493,873.31 |
| **1.11.9** | SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 6.00 | $ 277,923.70 | $ 1,667,542.20 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 1,667,542.20 |
| **1.11.10** | TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE –1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X50 -3 BREAKER INDUSTRIAL 3X80A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 8,917,034.23 | $ 8,917,034.23 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 8,917,034.23 |
| **1.11.11** | ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 46.00 | $ 239,118.65 | $ 10,999,457.90 | 0.00 | $ - | 29.90 | $ 7,149,647.64 | 29.90 | $ 7,149,647.64 | 16.10 | $ 3,849,810.27 |
| **1.11.12** | ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 12.00 | $ 164,110.19 | $ 1,969,322.28 | 0.00 | $ - | 1.20 | $ 196,932.23 | 1.20 | $ 196,932.23 | 10.80 | $ 1,772,390.05 |
| **1.11.13** | LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3 | UN | 18.00 | $ 400,297.99 | $ 7,205,363.82 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 18.00 | $ 7,205,363.82 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 1.12 | VOZ Y DATOS | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.1 | SALIDA PARA TOMA REGULADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 58.00 | $ 150,495.44 | $ 8,728,735.52 | 0.00 | $ - | 5.80 | $ 872,873.55 | 5.80 | $ 872,873.55 | 52.20 | $ 7,855,861.97 |
| 1.12.2 | BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE COMUNICACIONES SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 65.00 | $ 190,651.74 | $ 12,392,363.10 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 65.00 | $ 12,392,363.10 |
| 1.12.3 | BANDEJA PORTACABLE DE 0,20 CM PARA SALIDAS DE FUERZA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 51.00 | $ 220,788.18 | $ 11,260,197.18 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 51.00 | $ 11,260,197.18 |
| 1.12.4 | TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 162.00 | $ 84,951.49 | $ 13,762,141.38 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 162.00 | $ 13,762,141.38 |
| 1.12.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS | ML | 2030.00 | $ 10,648.57 | $ 21,616,597.10 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2030.00 | $ 21,616,597.10 |
| 1.12.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZULCAPA 2 | UND | 60.00 | $ 198,845.58 | $ 11,930,734.80 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 60.00 | $ 11,930,734.80 |
| 1.12.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 7ft (2 metros), CATEGORIA 6A - AZUL | UND | 60.00 | $ 127,927.36 | $ 7,675,641.60 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 60.00 | $ 7,675,641.60 |
| 1.12.8 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE RACK PARA RED DE VOZ Y DATOS | UND | 1.00 | $ 48,012,289.65 | $ 48,012,289.65 | 0.00 | $ - | 0.50 | $ 24,006,144.83 | 0.50 | $ 24,006,144.83 | 0.50 | $ 24,006,144.83 |
| 1.12.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIBRA OPTICA TIPO EXTERIOR 12 HILOS | ML | 170.00 | $ 44,271.62 | $ 7,526,175.40 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 170.00 | $ 7,526,175.40 |
| 1.12.10 | FUSION DE FIBRA OPTICA - HILO A HILO | UND | 1.00 | $ 49,802.32 | $ 49,802.32 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 49,802.32 |
| 1.12.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE UPS DE 20 KVA, AUTOREDUNDANTE, AUTONIMIA DE 5 MINUTOS A PLENA DE CARGA. INCLUYE PUESTA EN MARCHA. | UND | 1.00 | $ 65,391,397.53 | $ 65,391,397.53 | 0.00 | $ - | 0.50 | $ 32,695,698.77 | 0.50 | $ 32,695,698.77 | 0.50 | $ 32,695,698.77 |
| 1.12.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ Y DATOS. INCLUYE ACCESORIOS | UND | 60.00 | $ 686,131.78 | $ 41,167,906.80 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 60.00 | $ 41,167,906.80 |
| 1.12.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - ROJOCAPA 2 | UND | 60.00 | $ 198,845.58 | $ 11,930,734.80 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 60.00 | $ 11,930,734.80 |
| 1.12.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE CABLE HDMI | UND | 1.00 | $ 753,031.10 | $ 753,031.10 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 753,031.10 |
| 1.13 | SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS - SDI | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL DE INCENDIO INTELIGENTE O CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS VS4-G-SP, CLASE A O B , CAPACIDAD HASTA 250 DISPOSITIVOS Y DE 6 KM EN EL LAZO DE COMUNICACIÓN | UND | 1.00 | $ 18,346,634.37 | $ 18,346,634.37 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 18,346,634.37 |
| 1.13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN FUENTE DE PODER DE RESPALDO REMOTA (BOOSTER) 6.5A 120VAC | UND | 1.00 | $ 3,454,594.52 | $ 3,454,594.52 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 3,454,594.52 |
| 1.13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE HUMO ÓPTICO DIRECCIONABLE INTELIGENTE | UND | 109.00 | $ 364,492.28 | $ 39,729,658.52 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 109.00 | $ 39,729,658.52 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **1.13.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DETECTOR DE TEMPERATURA DIRECCIONABLE Y/O FUEGO INTELIGENTE DE TEMPERATURA FIJA | UND | 5.00 | $ 260,527.15 | $ 1,302,635.75 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 5.00 | $ 1,302,635.75 |
| **1.13.5** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DETECTOR DE HUMO ÓPTICO | UND | 7.00 | $ 130,040.64 | $ 910,284.48 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 7.00 | $ 910,284.48 |
| **1.13.6** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA DE FUEGO DOBLE ACCIÓN - DIRECCIONABLE | UND | 11.00 | $ 453,051.47 | $ 4,983,566.17 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 11.00 | $ 4,983,566.17 |
| **1.13.7** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE RELEVO DE CONTROL PARA PANEL INTELIGENTE DE INCENDIO | UND | 6.00 | $ 371,671.12 | $ 2,230,026.72 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 2,230,026.72 |
| **1.13.8** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO DE CONTROL ENTRADA SIMPLE, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE | UND | 5.00 | $ 426,666.24 | $ 2,133,331.20 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 5.00 | $ 2,133,331.20 |
| **1.13.9** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MÓDULO MONITOREO DE UNA ENTRADA, DIRECCIONABLE ANALÓGICO INTELIGENTE, CONEXIÓN DE ALARMA TIPO CLASE B | UND | 3.00 | $ 284,755.78 | $ 854,267.34 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 854,267.34 |
| **1.13.10** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTACIÓN DE EMERGENCIA TIPO BOTÓN DE ENCLAVAMIENTO, COLOR ROJO CON CUBIERTA TRANSPARENTE | UND | 2.00 | $ 448,459.19 | $ 896,918.38 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 896,918.38 |
| **1.13.11** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PROTECTOR DE ESPACIADOR PARA ESTACIÓN DE INCENDIO (STOPPER) | UND | 11.00 | $ 920,317.66 | $ 10,123,494.26 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 11.00 | $ 10,123,494.26 |
| **1.13.12** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA DE MURO ROJO, TEMPORAL MULTI-CANDELA | UND | 19.00 | $ 474,656.05 | $ 9,018,464.95 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 19.00 | $ 9,018,464.95 |
| **1.13.13** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANUNCIADOR REMOTO LCD | UND | 1.00 | $ 3,671,890.74 | $ 3,671,890.74 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 3,671,890.74 |
| **1.13.14** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X16 | ML | 836.65 | $ 17,493.01 | $ 14,635,526.82 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 836.65 | $ 14,635,526.82 |
| **1.13.15** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE COBRE FPLR PARA REDES DETECCIÓN DE INCENDIOS 2X14 SIN BLINDAJE | ML | 592.63 | $ 21,738.53 | $ 12,882,905.03 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 592.63 | $ 12,882,905.03 |
| **1.13.16** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE DE DATOS APANTALLADO RS-485 | ML | 100.00 | $ 41,757.97 | $ 4,175,797.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 100.00 | $ 4,175,797.00 |
| **1.13.17** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO DOBLE 5H | UND | 30.00 | $ 106,826.00 | $ 3,204,780.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 30.00 | $ 3,204,780.00 |
| **1.13.18** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJA RAWELT 2400 FONDO SENCILLO 5H | UND | 233.00 | $ 73,375.48 | $ 17,096,486.84 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 233.00 | $ 17,096,486.84 |
| **1.13.19** | TUBO EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 844.68 | $ 73,978.85 | $ 62,488,455.02 | 0.00 | $ - | 253.40 | $ 18,746,240.59 | 253.40 | $ 18,746,240.59 | 591.28 | $ 43,742,214.43 |
| **1.13.20** | TUBO EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 56.50 | $ 84,951.49 | $ 4,799,759.19 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 56.50 | $ 4,799,759.19 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **1.13.21** | TUBERÍA CONDUIT PVC 1" SUMINISTR E INSTALACIÓN | ML | 122.90 | $ 51,796.40 | $ 6,365,777.56 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 122.90 | $ 6,365,777.56 |
| **1.13.22** | ADAPTADOR EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 500.00 | $ 9,771.85 | $ 4,885,925.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 500.00 | $ 4,885,925.00 |
| **1.13.23** | ADAPTADOR EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 30.00 | $ 10,850.92 | $ 325,527.60 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 30.00 | $ 325,527.60 |
| **1.13.24** | ADAPTADOR CONDUIT PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 24.00 | $ 7,829.51 | $ 187,908.24 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 24.00 | $ 187,908.24 |
| **1.13.25** | UNION EMT 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 200.00 | $ 9,771.85 | $ 1,954,370.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 200.00 | $ 1,954,370.00 |
| **1.13.26** | UNION EMT 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 20.00 | $ 10,850.92 | $ 217,018.40 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 20.00 | $ 217,018.40 |
| **1.13.27** | ABRAZADERA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 1500.00 | $ 10,113.37 | $ 15,170,055.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1500.00 | $ 15,170,055.00 |
| **1.13.28** | ABRAZADERA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UND | 150.00 | $ 11,829.99 | $ 1,774,498.50 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 150.00 | $ 1,774,498.50 |
| **1.13.29** | VARILLA ROSCADA 3/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 150.00 | $ 8,951.76 | $ 1,342,764.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 150.00 | $ 1,342,764.00 |
| **1.13.30** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA PARA CAJA TIPO RADWELL 2400 | UND | 263.00 | $ 14,303.96 | $ 3,761,941.48 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 263.00 | $ 3,761,941.48 |
| **1.13.31** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RIEL CHANEL 2X4X3 MT PERFORADO | ML | 60.00 | $ 54,367.61 | $ 3,262,056.60 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 60.00 | $ 3,262,056.60 |
| **1.13.32** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BATERIA 12V/7Ah, DE ÁCIDO-PLOMO REGULADAS POR VÁLVULA | UND | 6.00 | $ 270,457.99 | $ 1,622,747.94 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 1,622,747.94 |
| **1.13.33** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE ESTÁNDAR PARA DETECTOR DE HUMO | UND | 117.00 | $ 45,346.56 | $ 5,305,547.52 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 117.00 | $ 5,305,547.52 |
| **1.14** | **SISTEMAS DE VENTILACION MECÁNICA - HVAC** | | | | | | | | | | | | |
| **1.14.1** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 58.00 | $ 121,030.32 | $ 7,019,758.56 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 58.00 | $ 7,019,758.56 |
| **1.14.2** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 78.00 | $ 144,619.63 | $ 11,280,331.14 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 78.00 | $ 11,280,331.14 |
| **1.14.3** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/2" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 69.00 | $ 183,935.17 | $ 12,691,526.73 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 69.00 | $ 12,691,526.73 |
| **1.14.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 37.00 | $ 235,045.33 | $ 8,696,677.21 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 37.00 | $ 8,696,677.21 |
| **1.14.5** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 28.00 | $ 278,292.42 | $ 7,792,187.76 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 28.00 | $ 7,792,187.76 |
| **1.14.6** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø7/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 19.00 | $ 329,402.60 | $ 6,258,649.40 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 19.00 | $ 6,258,649.40 |
| **1.14.7** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO K AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1 3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 17.00 | $ 639,995.24 | $ 10,879,919.08 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 17.00 | $ 10,879,919.08 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **1.14.8** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIÓN TUBERÍA DE COBRE | UND | 1.00 | $ 10,335,720.16 | $ 10,335,720.16 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 10,335,720.16 |
| **1.14.9** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL PARA SISTEMAS DE REFRIGERANTE VARIABLE. NO INCLUYE CANALIZACIÓN | ML | 174.00 | $ 57,412.31 | $ 9,989,741.94 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 174.00 | $ 9,989,741.94 |
| **1.14.10** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø1/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 286.00 | $ 96,444.21 | $ 27,583,044.06 | 0.00 | $ - | 85.80 | $ 8,274,913.22 | 85.80 | $ 8,274,913.22 | 200.20 | $ 19,308,130.84 |
| **1.14.11** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 331.00 | $ 111,356.09 | $ 36,858,865.79 | 0.00 | $ - | 99.30 | $ 11,057,659.74 | 99.30 | $ 11,057,659.74 | 231.70 | $ 25,801,206.05 |
| **1.14.12** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø5/8" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 20.00 | $ 168,518.24 | $ 3,370,364.80 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 20.00 | $ 3,370,364.80 |
| **1.14.13** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE COBRE TIPO L AISLADA TÉRMICAMENTE Ø3/4" SOPORTADA CON RIEL CHANEL | ML | 26.00 | $ 195,856.65 | $ 5,092,272.90 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 26.00 | $ 5,092,272.90 |
| **1.14.14** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA EMT 3/4" (INTERIOR) | ML | 430.00 | $ 62,619.59 | $ 26,926,423.70 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 430.00 | $ 26,926,423.70 |
| **1.14.15** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALIZACIÓN PARA CABLEADO EN TUBERÍA METÁLICA IMC 3/4" (EXTERIOR) | ML | 87.00 | $ 83,492.28 | $ 7,263,828.36 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 87.00 | $ 7,263,828.36 |
| **1.14.16** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X14 | ML | 285.00 | $ 44,095.08 | $ 12,567,097.80 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 285.00 | $ 12,567,097.80 |
| **1.14.17** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO DE CONTROL 4X12 | ML | 46.00 | $ 54,802.77 | $ 2,520,927.42 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 46.00 | $ 2,520,927.42 |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO ZONA ADMINISTRATIVA** | | | | **$ 3,835,191,756.69** | | **$ 608,690,750.56** | | **$ 1,565,020,643.33** | | **$ 2,173,711,393.90** | | **$ 1,661,480,362.83** |
| **2.00** | **ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1** | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 186.94 | $ 6,620.62 | $ 1,237,658.70 | 186.94 | $ 1,237,658.70 | 0.00 | $ - | 186.94 | $ 1,237,658.70 | 0.00 | $ - |
| **#######** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1** | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 149.63 | $ 113,807.32 | $ 17,028,989.29 | 149.63 | $ 17,028,989.29 | 0.00 | $ - | 149.63 | $ 17,028,989.29 | 0.00 | $ - |
| **2.2.2** | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | M3 | 125.79 | $ 48,905.05 | $ 6,151,766.24 | 125.79 | $ 6,151,766.24 | 0.00 | $ - | 125.79 | $ 6,151,766.24 | 0.00 | $ - |
| **2.2.3** | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | 1169.85 | $ 2,028.72 | $ 2,373,298.09 | 1169.85 | $ 2,373,298.09 | 0.00 | $ - | 1169.85 | $ 2,373,298.09 | 0.00 | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **2.2.4** | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3/KM | 538.67 | $ 2,028.72 | $ 1,092,810.60 | 538.67 | $ 1,092,810.60 | 0.00 | $ - | 538.67 | $ 1,092,810.60 | 0.00 | $ - |
| **2.3** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| **2.3.1** | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 2.04 | $ 800,447.03 | $ 1,632,911.94 | 2.04 | $ 1,632,911.94 | 0.00 | $ - | 2.04 | $ 1,632,911.94 | 0.00 | $ - |
| **2.3.2** | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 20.43 | $ 1,461,468.24 | $ 29,857,796.14 | 20.43 | $ 29,857,796.14 | 0.00 | $ - | 20.43 | $ 29,857,796.14 | 0.00 | $ - |
| **2.3.3** | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 20.86 | $ 1,944,132.62 | $ 40,554,606.45 | 0.00 | $ - | 20.86 | $ 40,554,606.45 | 20.86 | $ 40,554,606.45 | 0.00 | $ - |
| **2.3.4** | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 17.53 | $ 1,349,337.03 | $ 23,653,878.14 | 0.00 | $ - | 17.53 | $ 23,653,878.14 | 17.53 | $ 23,653,878.14 | 0.00 | $ - |
| **2.3.5** | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 15.27 | $ 1,901,669.30 | $ 29,038,490.21 | 0.00 | $ - | 15.27 | $ 29,038,490.21 | 15.27 | $ 29,038,490.21 | 0.00 | $ - |
| **2.3.6** | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 15.15 | $ 1,507,757.43 | $ 22,842,525.06 | 0.00 | $ - | 15.15 | $ 22,842,525.06 | 15.15 | $ 22,842,525.06 | 0.00 | $ - |
| **2.3.7** | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0.05 | $ 2,447,331.03 | $ 122,366.55 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.05 | $ 122,366.55 |
| **2.3.8** | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 240.00 | $ 36,756.54 | $ 8,821,569.60 | 0.00 | $ - | 240.00 | $ 8,821,569.60 | 240.00 | $ 8,821,569.60 | 0.00 | $ - |
| **2.3.9** | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | M2 | 146.10 | $ 8,223.01 | $ 1,201,381.76 | 0.00 | $ - | 146.10 | $ 1,201,381.76 | 146.10 | $ 1,201,381.76 | 0.00 | $ - |
| **2.4** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.1** | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 8338.00 | $ 11,120.63 | $ 92,723,812.94 | 2956.56 | $ 32,878,809.83 | 5381.44 | $ 59,845,003.11 | 8338.00 | $ 92,723,812.94 | 0.00 | $ - |
| **2.4.2** | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 1955.40 | $ 11,967.06 | $ 23,400,389.12 | 1617.00 | $ 19,350,736.02 | 338.40 | $ 4,049,653.10 | 1955.40 | $ 23,400,389.12 | 0.00 | $ - |
| **2.4.3** | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 584.85 | $ 30,075.87 | $ 17,589,872.57 | 0.00 | $ - | 584.85 | $ 17,589,872.57 | 584.85 | $ 17,589,872.57 | 0.00 | $ - |
| **2.4.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | M2 | 151.52 | $ 79,462.54 | $ 12,040,164.06 | 0.00 | $ - | 151.52 | $ 12,040,164.06 | 151.52 | $ 12,040,164.06 | 0.00 | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **2.5** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2.5.1** | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 272.36 | $ 70,554.51 | $ 19,216,226.34 | 0.00 | $ - | 272.36 | $ 19,216,226.34 | 272.36 | $ 19,216,226.34 | 0.00 | $ - |
| **2.5.2** | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | M2 | 378.50 | $ 95,254.64 | $ 36,053,881.24 | 0.00 | $ - | 378.50 | $ 36,053,881.24 | 378.50 | $ 36,053,881.24 | 0.00 | $ - |
| **2.5.3** | MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA | M2 | 24.40 | $ 214,942.04 | $ 5,244,585.78 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 24.40 | $ 5,244,585.78 |
| **2.5.4** | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 3.17 | $ 2,232,938.39 | $ 7,078,414.70 | 0.00 | $ - | 3.17 | $ 7,078,414.70 | 3.17 | $ 7,078,414.70 | 0.00 | $ - |
| **2.5.5** | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 393.47 | $ 32,858.77 | $ 12,928,940.23 | 0.00 | $ - | 393.47 | $ 12,928,940.23 | 393.47 | $ 12,928,940.23 | 0.00 | $ - |
| **2.5.6** | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 546.00 | $ 45,008.72 | $ 24,574,761.12 | 0.00 | $ - | 546.00 | $ 24,574,761.12 | 546.00 | $ 24,574,761.12 | 0.00 | $ - |
| **2.5.7** | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | M2 | 128.02 | $ 301,432.09 | $ 38,589,336.16 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 128.02 | $ 38,589,336.16 |
| **2.5.8** | CERAMICA LISO 0.25X0.40 PARA MUROS | M2 | 7.26 | $ 179,351.23 | $ 1,302,089.93 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 7.26 | $ 1,302,089.93 |
| **2.5.9** | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | ML | 121.02 | $ 40,554.38 | $ 4,907,891.07 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 121.02 | $ 4,907,891.07 |
| **2.5.10** | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | M2 | 2.56 | $ 99,112.92 | $ 253,729.08 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.56 | $ 253,729.08 |
| **2.5.11** | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | M2 | 151.52 | $ 138,203.99 | $ 20,940,668.56 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 151.52 | $ 20,940,668.56 |
| **2.5.12** | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | ML | 7.26 | $ 166,028.35 | $ 1,205,365.82 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 7.26 | $ 1,205,365.82 |
| **2.5.13** | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | M2 | 130.58 | $ 43,609.40 | $ 5,694,515.45 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 130.58 | $ 5,694,515.45 |
| **2.6** | **PINTURA** | | | | | | | | | | | | |
| **2.6.1** | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 546.00 | $ 18,207.57 | $ 9,941,333.22 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 546.00 | $ 9,941,333.22 |
| **2.6.2** | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 393.89 | $ 15,401.75 | $ 6,066,595.31 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 393.89 | $ 6,066,595.31 |
| **2.6.3** | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | M2 | 393.89 | $ 27,009.33 | $ 10,638,704.99 | 0.00 | $ - | 196.95 | $ 5,319,487.54 | 196.95 | $ 5,319,487.54 | 196.94 | $ 5,319,217.45 |
| **2.6.4** | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | M2 | 546.00 | $ 48,260.08 | $ 26,350,003.68 | 0.00 | $ - | 54.60 | $ 2,635,000.37 | 54.60 | $ 2,635,000.37 | 491.40 | $ 23,715,003.31 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **2.7** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2.7.1** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | UN | 2.00 | $ 2,274,416.18 | $ 4,548,832.36 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 4,548,832.36 |
| **2.7.2** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | M2 | 22.96 | $ 2,455,818.75 | $ 56,385,598.50 | 0.00 | $ - | 4.59 | $ 11,272,208.06 | 4.59 | $ 11,272,208.06 | 18.37 | $ 45,113,390.44 |
| **2.7.3** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18 | M2 | 18.80 | $ 180,406.40 | $ 3,391,640.32 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 18.80 | $ 3,391,640.32 |
| **2.7.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML | 4.45 | $ 2,244,953.23 | $ 9,990,041.87 | 0.00 | $ - | 2.23 | $ 5,006,245.70 | 2.23 | $ 5,006,245.70 | 2.22 | $ 4,983,796.17 |
| **2.8** | **CIELO RASO** | | | | | | | | | | | | |
| **2.8.1** | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA | M2 | 2.56 | $ 126,307.83 | $ 323,348.04 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.56 | $ 323,348.04 |
| **2.9** | **RED HIDRÁULICA** | | | | | | | | | | | | |
| **2.9.1** | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 3.45 | $ 15,380.00 | $ 53,061.00 | 0.00 | $ - | 3.45 | $ 53,061.00 | 3.45 | $ 53,061.00 | 0.00 | $ - |
| **2.9.2** | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | $ 3,142.03 | $ 12,568.12 | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 12,568.12 | 4.00 | $ 12,568.12 | 0.00 | $ - |
| **2.9.3** | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 5.65 | $ 18,697.31 | $ 105,639.80 | 0.00 | $ - | 5.65 | $ 105,639.80 | 5.65 | $ 105,639.80 | 0.00 | $ - |
| **2.9.4** | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 8.00 | $ 4,429.50 | $ 35,436.00 | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 35,436.00 | 8.00 | $ 35,436.00 | 0.00 | $ - |
| **2.9.5** | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | $ 68,128.10 | $ 272,512.40 | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 272,512.40 | 4.00 | $ 272,512.40 | 0.00 | $ - |
| **2.9.6** | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | $ 10,381.65 | $ 31,144.95 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 31,144.95 | 3.00 | $ 31,144.95 | 0.00 | $ - |
| **2.9.7** | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 24,273.15 | $ 48,546.30 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 48,546.30 | 2.00 | $ 48,546.30 | 0.00 | $ - |
| **2.9.8** | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 56,740.10 | $ 56,740.10 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 56,740.10 | 1.00 | $ 56,740.10 | 0.00 | $ - |
| **2.1** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | | | | | | | | | | | |
| **2.10.1** | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 3.60 | $ 29,977.33 | $ 107,918.39 | 0.00 | $ - | 3.60 | $ 107,918.39 | 3.60 | $ 107,918.39 | 0.00 | $ - |
| **2.10.2** | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 5.00 | $ 14,062.80 | $ 70,314.00 | 0.00 | $ - | 5.00 | $ 70,314.00 | 5.00 | $ 70,314.00 | 0.00 | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **2.10.3** | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 3.85 | $ 60,418.42 | $ 232,610.92 | 0.00 | $ - | 3.85 | $ 232,610.92 | 3.85 | $ 232,610.92 | 0.00 | $ - |
| **2.10.4** | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 43,221.47 | $ 86,442.94 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 86,442.94 | 2.00 | $ 86,442.94 | 0.00 | $ - |
| **2.10.5** | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 28,809.14 | $ 28,809.14 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 28,809.14 | 1.00 | $ 28,809.14 | 0.00 | $ - |
| **2.10.6** | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 76,309.56 | $ 76,309.56 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 76,309.56 | 1.00 | $ 76,309.56 | 0.00 | $ - |
| **2.10.7** | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 105,537.31 | $ 105,537.31 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 105,537.31 | 1.00 | $ 105,537.31 | 0.00 | $ - |
| **2.10.8** | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 44,074.51 | $ 44,074.51 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 44,074.51 | 1.00 | $ 44,074.51 | 0.00 | $ - |
| **2.10.9** | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 34,548.91 | $ 69,097.82 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 69,097.82 | 2.00 | $ 69,097.82 | 0.00 | $ - |
| **2.10.10** | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | $ 88,484.78 | $ 265,454.34 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 265,454.34 | 3.00 | $ 265,454.34 | 0.00 | $ - |
| **2.10.11** | SANITARIO ACERO INOXIDABLE AC-SA304 INCLUYE ACCESORIOS | UN | 1.00 | $ 1,288,300.04 | $ 1,288,300.04 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,288,300.04 |
| **2.10.12** | GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMNOS T AC-65106 DOCOL | UN | 1.00 | $ 473,277.05 | $ 473,277.05 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 473,277.05 |
| **2.10.13** | LAVAMANOS ACERO INOXIDABLE AC-LA304 INCLUYE ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 4,579,356.06 | $ 4,579,356.06 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 4,579,356.06 |
| **2.10.14** | ORINAL ACERO INOXIDABLE AC-OA304 INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 1.00 | $ 4,002,559.44 | $ 4,002,559.44 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 4,002,559.44 |
| **2.10.15** | REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS | UN | 2.00 | $ 27,185.67 | $ 54,371.34 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 54,371.34 |
| **2.10.16** | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL | UN | 1.00 | $ 198,265.60 | $ 198,265.60 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 198,265.60 |
| **2.11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | | | | | | | | | | | |
| **2.11.1** | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | PTO | 18.00 | $ 208,006.25 | $ 3,744,112.50 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 18.00 | $ 3,744,112.50 |
| **2.11.2** | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 2.00 | $ 212,049.81 | $ 424,099.62 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 424,099.62 |
| **2.11.3** | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 1.00 | $ 219,888.57 | $ 219,888.57 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 219,888.57 |
| **2.11.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W | UN | 15.00 | $ 312,412.99 | $ 4,686,194.85 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 15.00 | $ 4,686,194.85 |
| **2.11.5** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W | UN | 8.00 | $ 1,016,343.49 | $ 8,130,747.92 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 8,130,747.92 |
| **2.11.6** | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 1,097,150.02 | $ 1,097,150.02 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,097,150.02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **2.11.7** | TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS INCLUYE (-1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X500A AJUSTABLE–-1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE-4 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60A-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X40A AJUSTABLE-2 BREAKER INDUSTRIAL 3X30A AJUSTABLE-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 75,909,306.97 | $ 75,909,306.97 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 75,909,306.97 |
| **2.11.8** | GABINETE EQUIPO DE MEDIDA INDIRECTA PARA GABINETE PRINCIPAL, COMPUESTO POR GABINETE METÁLICO HOMOLOGADO CON ESPACIO PARA ALBERGAR (1) MEDIDOR ELECTRÓNICO , (3) TRANSFORMADORES DE CORRIENTE, (3) TRANSFORMADORES DE POTENCIA . SUMINISTRO E INSTALACION | UN | 1.00 | $ 17,053,674.24 | $ 17,053,674.24 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 17,053,674.24 |
| **2.11.9** | LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3 | UN | 8.00 | $ 400,297.99 | $ 3,202,383.92 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 3,202,383.92 |
| **2.11.10** | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 27.00 | $ 349,013.38 | $ 9,423,361.26 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 27.00 | $ 9,423,361.26 |
| **2.11.11** | TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA. INCLUYE (1 COFRE 150X110X40 CM CON FRENTE MUERTO –1 BREAKER PRINCIPAL 3X300A AJUSTABLE –1 BARRAJE 3F+N+T 1000 AMP -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X300A -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X60 -2 BREAKER INDUSTRIAL 3X70A-CABLEADO, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 22,216,275.73 | $ 22,216,275.73 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 22,216,275.73 |
| **2.11.12** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V | UN | 3.00 | $ 204,900.82 | $ 614,702.46 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 614,702.46 |
| **2.12** | **MEDIA TENSIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| **2.12.1** | ESTRUCTURA LA218 RED COMPACTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA. | UN | 1.00 | $ 3,262,152.21 | $ 3,262,152.21 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 3,262,152.21 |
| **2.12.2** | POSTE DE CONCRETO EXTRA REFORZADO DE 12 M X 1050 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN | UN | 1.00 | $ 2,224,205.67 | $ 2,224,205.67 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 2,224,205.67 |
| **2.12.3** | CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN EN M.T. Y B.T. NORMA CS-276 CODENSA | UN | 1.00 | $ 2,341,423.22 | $ 2,341,423.22 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 2,341,423.22 | 1.00 | $ 2,341,423.22 | 0.00 | $ - |
| **2.12.4** | BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 3" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 910,860.63 | $ 910,860.63 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 910,860.63 |
| **2.12.5** | BAJANTE CON TUBO CONDUIT METALICO 1" L=6M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 115,093.20 | $ 115,093.20 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 115,093.20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **2.12.6** | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE. | ML | 213.00 | $ 35,311.46 | $ 7,521,340.98 | 0.00 | $ - | 213.00 | $ 7,521,340.98 | 213.00 | $ 7,521,340.98 | 0.00 | $ - |
| **2.12.7** | CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA | UN | 12.00 | $ 1,397,796.63 | $ 16,773,559.56 | 0.00 | $ - | 7.20 | $ 10,064,135.74 | 7.20 | $ 10,064,135.74 | 4.80 | $ 6,709,423.82 |
| **2.12.8** | CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG | ML | 216.00 | $ 236,542.68 | $ 51,093,218.88 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 216.00 | $ 51,093,218.88 |
| **2.12.9** | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 kVA TIPO SECO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 201,616,678.06 | $ 201,616,678.06 | 0.00 | $ - | 0.50 | $ 100,808,339.03 | 0.50 | $ 100,808,339.03 | 0.50 | $ 100,808,339.03 |
| **2.12.10** | MANIOBRA EN LINEA VIVA | HR | 1.00 | $ 1,270,189.32 | $ 1,270,189.32 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,270,189.32 |
| **2.12.11** | CABLE SEMIAISLADO 3 NO. 2 PARA RED COMPACTA EN 15 KV | ML | 108.00 | $ 68,606.10 | $ 7,409,458.80 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 108.00 | $ 7,409,458.80 |
| **2.12.12** | ESTRUCTURA LA462 CIRCUITO CON RED COMPACTA DE MT INSTALACIÓN DE SEPARADORES 15 kV EN VANO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA | UN | 8.00 | $ 452,058.48 | $ 3,616,467.84 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 3,616,467.84 |
| **2.12.13** | ESTRUCTURA LA464 RED COMPACTA 11,4 kV. FINAL DE CIRCUITO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA | UN | 2.00 | $ 1,185,596.81 | $ 2,371,193.62 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 2,371,193.62 |
| **2.12.14** | POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE 12 M X 750 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN | UN | 1.00 | $ 1,702,659.09 | $ 1,702,659.09 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,702,659.09 |
| **2.12.15** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 DUCTOS DE 4" PVC TP | ML | 300.00 | $ 270,907.77 | $ 81,272,331.00 | 0.00 | $ - | 300.00 | $ 81,272,331.00 | 300.00 | $ 81,272,331.00 | 0.00 | $ - |
| **2.12.16** | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL | M3 | 96.00 | $ 40,520.24 | $ 3,889,943.04 | 0.00 | $ - | 96.00 | $ 3,889,943.04 | 96.00 | $ 3,889,943.04 | 0.00 | $ - |
| **2.12.17** | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 120.00 | $ 113,807.32 | $ 13,656,878.40 | 0.00 | $ - | 120.00 | $ 13,656,878.40 | 120.00 | $ 13,656,878.40 | 0.00 | $ - |
| **2.12.18** | SUMINISTRO, TENDIDO, TENSIONADO Y AMARRE DE CABLE MENSAJERO DE ACERO 3/8" | ML | 103.50 | $ 11,995.62 | $ 1,241,546.67 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 103.50 | $ 1,241,546.67 |
| **2.12.19** | PRUEBA VLF CABLE DE MEDIA TENSION | UN | 1.00 | $ 5,090,710.36 | $ 5,090,710.36 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 5,090,710.36 |
| **2.12.20** | ESTRUCTURA LA461 RED COMPACTA 11,4 KV CIRCUITO TANGENCIAL CON ÁNGULOS HASTA DE 6°. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA | UN | 1.00 | $ 950,760.46 | $ 950,760.46 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 950,760.46 |
| **2.12.21** | ESTRUCTURA TIPO 730 NORMA ICEL DERIVACIÓN TRIFÁSICA CON CORTACIRCUITO SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA | UN | 1.00 | $ 1,970,395.52 | $ 1,970,395.52 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,970,395.52 |
| **2.12.22** | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS | ML | 324.00 | $ 6,648.51 | $ 2,154,117.24 | 0.00 | $ - | 324.00 | $ 2,154,117.24 | 324.00 | $ 2,154,117.24 | 0.00 | $ - |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | FECHA DE TERMINACION | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **2.13** | **BAJA TENSIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| **2.13.1** | CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE. | ML | 200.00 | $ 35,311.46 | $ 7,062,292.00 | 0.00 | $ - | 200.00 | $ 7,062,292.00 | 200.00 | $ 7,062,292.00 | 0.00 | $ - |
| **2.13.2** | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO. | UN | 10.00 | $ 737,526.75 | $ 7,375,267.50 | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 4,425,160.50 | 6.00 | $ 4,425,160.50 | 4.00 | $ 2,950,107.00 |
| **2.13.3** | ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 112.00 | $ 402,920.12 | $ 45,127,053.44 | 0.00 | $ - | 100.80 | $ 40,614,348.10 | 100.80 | $ 40,614,348.10 | 11.20 | $ 4,512,705.34 |
| **2.13.4** | ACOMETIDA PARCIAL 4No8+1No 8 T DUCTO PVC 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 105.00 | $ 113,322.28 | $ 11,898,839.40 | 0.00 | $ - | 94.50 | $ 10,708,955.46 | 94.50 | $ 10,708,955.46 | 10.50 | $ 1,189,883.94 |
| **2.13.5** | ACOMETIDA PARCIAL 4 No4 +1 No 6 DUCTO 1-1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 166.00 | $ 239,118.65 | $ 39,693,695.90 | 0.00 | $ - | 149.40 | $ 35,724,326.31 | 149.40 | $ 35,724,326.31 | 16.60 | $ 3,969,369.59 |
| **2.13.6** | ACOMETIDA PARCIAL 3No1/0+1No2+1No8 DUCTO 1 1/2" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 190.00 | $ 401,205.40 | $ 76,229,026.00 | 0.00 | $ - | 171.00 | $ 68,606,123.40 | 171.00 | $ 68,606,123.40 | 19.00 | $ 7,622,902.60 |
| **2.13.7** | ACOMETIDA PARCIAL 4No6+1No 6 T DUCTO PVC 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 90.00 | $ 164,110.19 | $ 14,769,917.10 | 0.00 | $ - | 76.50 | $ 12,554,429.54 | 76.50 | $ 12,554,429.54 | 13.50 | $ 2,215,487.57 |
| **2.13.8** | LUMINARIA LED SOLAR INTEGRADA S40 NW | UN | 38.00 | $ 1,667,698.57 | $ 63,372,545.66 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 38.00 | $ 63,372,545.66 |
| **2.13.9** | MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 14.00 | $ 3,428,295.98 | $ 47,996,143.72 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 14.00 | $ 47,996,143.72 |
| **2.13.10** | MÁSTIL DOBLE METÁLICO GALVANIZADO DE 6 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 12.00 | $ 3,997,259.22 | $ 47,967,110.64 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 12.00 | $ 47,967,110.64 |
| **2.13.11** | ACOMETIDA PARCIAL 3No4/0+1No2/0+1No6 DUCTO PVC 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 40.00 | $ 341,132.88 | $ 13,645,315.20 | 0.00 | $ - | 24.00 | $ 8,187,189.12 | 24.00 | $ 8,187,189.12 | 16.00 | $ 5,458,126.08 |
| **2.14** | **SISTEMA DE RESPALDO** | | | | | | | | | | | | |
| **2.14.1** | TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA CON ENCLAVAMIENTO MECÁNICO SISTEMA DE INCENDIOS, CON INTERRUPTORES EN CAJA MOLDEADA TRIFÁSICOS DE 500A, A 208 V | UN | 1.00 | $ 71,256,980.10 | $ 71,256,980.10 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 71,256,980.10 |
| **2.14.2** | SUMINISTRO PLANTA ELÉCTRICA DE DE 135 KVA CON MOTOR Y GENERADOR, INCLUYE CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE CAMISAS MOTOR, CAMPANA PARA EXOSTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 301,821,590.42 | $ 301,821,590.42 | 0.00 | $ - | 0.20 | $ 60,364,318.08 | 0.20 | $ 60,364,318.08 | 0.80 | $ 241,457,272.34 |
| **2.15** | **SISTEMA DE APANTALLAMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| **2.15.1** | TERMINAL DE CAPTACIÓN AL 0,6m ALTURA | UN | 26.00 | $ 342,267.77 | $ 8,898,962.02 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 26.00 | $ 8,898,962.02 |
| **2.15.2** | ALAMBRÓN AL 8mm DIÁMETRO PARA ANILLO PERIMETRAL, BAJANTES | ML | 400.00 | $ 23,246.39 | $ 9,298,556.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 400.00 | $ 9,298,556.00 |
| **2.15.3** | AISLADORES PARA ANILLO DE ALAMBRÓN PERIMETRAL | UN | 318.00 | $ 26,483.56 | $ 8,421,772.08 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 318.00 | $ 8,421,772.08 |
| **2.15.4** | TUBERÍA PVC 1" PARA BAJANTES ALAMBRÓN | ML | 14.00 | $ 25,589.91 | $ 358,258.74 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 14.00 | $ 358,258.74 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **2.15.5** | CONECTOR MECÁNICO AL-AL PARA UNIÓN DE TRAMOS ALAMBRÓN | UN | 14.00 | $ 45,459.75 | $ 636,436.50 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 14.00 | $ 636,436.50 |
| **2.15.6** | CONECTOR FLEXIBLE AL - AL | UN | 14.00 | $ 27,814.71 | $ 389,405.94 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 14.00 | $ 389,405.94 |
| **2.15.7** | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M EN MAMPOSTERÍA LADRILLO TOLETE COMÚN. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN. | UN | 12.00 | $ 455,237.18 | $ 5,462,846.16 | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 2,731,423.08 | 6.00 | $ 2,731,423.08 | 6.00 | $ 2,731,423.08 |
| **2.15.8** | CABLE DE COBRE CU 2/0 PARA APANTALLAMIENTO E INTERCONEXIONES | ML | 310.00 | $ 113,950.81 | $ 35,324,751.10 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 310.00 | $ 35,324,751.10 |
| **2.15.9** | CONECTOR BIMETÁLICO CU-AL | UN | 14.00 | $ 56,097.96 | $ 785,371.44 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 14.00 | $ 785,371.44 |
| **2.15.10** | ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA CU 2,4M LONGITUD (INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA) | UN | 14.00 | $ 625,108.97 | $ 8,751,525.58 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 14.00 | $ 8,751,525.58 |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO ZONA DE SERVICIOS Y CELDAS** | | | | **$ 2,035,009,882.83** | | **$ 111,604,776.85** | | **$ 818,111,601.20** | | **$ 929,716,378.05** | | **$ 1,105,293,504.79** |
| **3.00** | **ZONA SOCIAL** | | | | | | | | | | | | |
| **3.10** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1** | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 186.81 | $ 6,620.62 | $ 1,236,798.02 | 186.81 | $ 1,236,798.02 | 0.00 | $ - | 186.81 | $ 1,236,798.02 | 0.00 | $ - |
| **3.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.1** | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 180.00 | $ 113,807.32 | $ 20,485,317.60 | 180.00 | $ 20,485,317.60 | 0.00 | $ - | 180.00 | $ 20,485,317.60 | 0.00 | $ - |
| **3.2.2** | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | M3 | 156.36 | $ 48,905.05 | $ 7,646,793.62 | 156.36 | $ 7,646,793.62 | 0.00 | $ - | 156.36 | $ 7,646,793.62 | 0.00 | $ - |
| **3.2.3** | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | 1454.15 | $ 2,028.72 | $ 2,950,063.19 | 1454.15 | $ 2,950,063.19 | 0.00 | $ - | 1454.15 | $ 2,950,063.19 | 0.00 | $ - |
| **3.2.4** | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3/KM | 648.00 | $ 2,028.72 | $ 1,314,610.56 | 648.00 | $ 1,314,610.56 | 0.00 | $ - | 648.00 | $ 1,314,610.56 | 0.00 | $ - |
| **3.30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.1** | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 3.19 | $ 800,447.03 | $ 2,553,426.03 | 3.17 | $ 2,537,417.09 | 0.02 | $ 16,008.94 | 3.19 | $ 2,553,426.03 | 0.00 | $ - |
| **3.3.2** | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 16.25 | $ 1,375,792.04 | $ 22,351,117.48 | 16.25 | $ 22,351,117.48 | 0.00 | $ - | 16.25 | $ 22,351,117.48 | 0.00 | $ - |
| **3.3.3** | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 2.07 | $ 3,129,144.81 | $ 6,477,329.76 | 2.00 | $ 6,258,289.62 | 0.07 | $ 219,040.14 | 2.07 | $ 6,477,329.76 | 0.00 | $ - |
| **3.3.4** | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 13.38 | $ 1,461,468.24 | $ 19,554,445.05 | 13.38 | $ 19,554,445.05 | 0.00 | $ - | 13.38 | $ 19,554,445.05 | 0.00 | $ - |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 3.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 11.56 | $ 1,944,132.62 | $ 22,474,173.09 | 6.42 | $ 12,481,331.42 | 5.14 | $ 9,992,841.67 | 11.56 | $ 22,474,173.09 | 0.00 | $ - |
| 3.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 15.34 | $ 1,349,337.03 | $ 20,698,830.04 | 0.00 | $ - | 15.34 | $ 20,698,830.04 | 15.34 | $ 20,698,830.04 | 0.00 | $ - |
| 3.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 46.16 | $ 1,901,669.30 | $ 87,781,054.89 | 0.00 | $ - | 46.16 | $ 87,781,054.89 | 46.16 | $ 87,781,054.89 | 0.00 | $ - |
| 3.3.8 | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 27.37 | $ 1,507,757.43 | $ 41,267,320.86 | 0.00 | $ - | 27.37 | $ 41,267,320.86 | 27.37 | $ 41,267,320.86 | 0.00 | $ - |
| 3.3.9 | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0.37 | $ 2,447,331.03 | $ 905,512.48 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.37 | $ 905,512.48 |
| 3.3.10 | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 608.00 | $ 36,756.54 | $ 22,347,976.32 | 0.00 | $ - | 608.00 | $ 22,347,976.32 | 608.00 | $ 22,347,976.32 | 0.00 | $ - |
| 3.3.11 | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | M2 | 153.37 | $ 8,223.01 | $ 1,261,163.04 | 0.00 | $ - | 153.37 | $ 1,261,163.04 | 153.37 | $ 1,261,163.04 | 0.00 | $ - |
| 3.40 | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 18214.68 | $ 11,120.63 | $ 202,558,716.85 | 8980.27 | $ 99,866,259.97 | 9234.41 | $ 102,692,456.88 | 18214.68 | $ 202,558,716.85 | 0.00 | $ - |
| 3.4.2 | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 1562.84 | $ 11,967.06 | $ 18,702,600.05 | 0.00 | $ - | 1562.84 | $ 18,702,600.05 | 1562.84 | $ 18,702,600.05 | 0.00 | $ - |
| 3.4.3 | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 1285.15 | $ 30,075.87 | $ 38,652,004.33 | 0.00 | $ - | 1285.15 | $ 38,652,004.33 | 1285.15 | $ 38,652,004.33 | 0.00 | $ - |
| 3.4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | M2 | 273.65 | $ 79,462.54 | $ 21,744,924.07 | 0.00 | $ - | 273.65 | $ 21,744,924.07 | 273.65 | $ 21,744,924.07 | 0.00 | $ - |
| 3.50 | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | | | | | | | | | | | | |
| 3.5.1 | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 389.86 | $ 70,554.51 | $ 27,506,381.27 | 0.00 | $ - | 389.86 | $ 27,506,381.27 | 389.86 | $ 27,506,381.27 | 0.00 | $ - |
| 3.5.2 | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | M2 | 227.93 | $ 95,254.64 | $ 21,711,390.10 | 0.00 | $ - | 227.93 | $ 21,711,390.10 | 227.93 | $ 21,711,390.10 | 0.00 | $ - |
| 3.5.3 | MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA | M2 | 63.22 | $ 214,942.04 | $ 13,588,635.77 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 63.22 | $ 13,588,635.77 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 3.5.4 | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 1.38 | $ 2,232,938.39 | $ 3,081,454.98 | 0.00 | $ - | 1.38 | $ 3,081,454.98 | 1.38 | $ 3,081,454.98 | 0.00 | $ - |
| 3.5.5 | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 410.61 | $ 32,858.77 | $ 13,492,139.55 | 0.00 | $ - | 410.61 | $ 13,492,139.55 | 410.61 | $ 13,492,139.55 | 0.00 | $ - |
| 3.5.6 | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 428.24 | $ 45,008.72 | $ 19,274,534.25 | 0.00 | $ - | 406.83 | $ 18,310,897.56 | 406.83 | $ 18,310,897.56 | 21.41 | $ 963,636.70 |
| 3.5.7 | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | M2 | 289.79 | $ 301,432.09 | $ 87,352,005.36 | 0.00 | $ - | 28.98 | $ 8,735,501.97 | 28.98 | $ 8,735,501.97 | 260.81 | $ 78,616,503.39 |
| 3.5.8 | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | M2 | 3.00 | $ 179,351.23 | $ 538,053.69 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 538,053.69 |
| 3.5.9 | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | ML | 146.38 | $ 40,554.38 | $ 5,936,350.14 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 146.38 | $ 5,936,350.14 |
| 3.5.10 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | M2 | 4.70 | $ 99,112.92 | $ 465,830.72 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 4.70 | $ 465,830.72 |
| 3.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | M2 | 98.68 | $ 138,203.99 | $ 13,637,969.73 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 98.68 | $ 13,637,969.73 |
| 3.5.12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | ML | 19.75 | $ 166,028.35 | $ 3,279,059.91 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 19.75 | $ 3,279,059.91 |
| 3.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | M2 | 294.49 | $ 43,609.40 | $ 12,842,532.21 | 0.00 | $ - | 29.45 | $ 1,284,296.83 | 29.45 | $ 1,284,296.83 | 265.04 | $ 11,558,235.38 |
| 3.60 | PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 428.24 | $ 18,207.57 | $ 7,797,209.78 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 428.24 | $ 7,797,209.78 |
| 3.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 410.61 | $ 15,401.75 | $ 6,324,112.57 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 410.61 | $ 6,324,112.57 |
| 3.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | M2 | 410.61 | $ 27,009.33 | $ 11,090,300.99 | 0.00 | $ - | 82.12 | $ 2,218,006.18 | 82.12 | $ 2,218,006.18 | 328.49 | $ 8,872,294.81 |
| 3.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | M2 | 428.24 | $ 48,260.08 | $ 20,666,896.66 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 428.24 | $ 20,666,896.66 |
| 3.70 | CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 1.26 | $ 197,050.30 | $ 248,283.38 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.26 | $ 248,283.38 |
| 3.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD 3000 LIBRAS DE PRESION Y 3 MICRAS | M2 | 6.15 | $ 1,592,133.62 | $ 9,791,621.76 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 6.15 | $ 9,791,621.76 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 3.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | UND | 6.00 | $ 2,274,416.18 | $ 13,646,497.08 | 0.00 | $ - | 0.60 | $ 1,364,649.71 | 0.60 | $ 1,364,649.71 | 5.40 | $ 12,281,847.37 |
| 3.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM | M2 | 1.50 | $ 358,378.07 | $ 537,567.11 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.50 | $ 537,567.11 |
| 3.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | UN | 1.00 | $ 29,023,312.50 | $ 29,023,312.50 | 0.00 | $ - | 0.80 | $ 23,218,650.00 | 0.80 | $ 23,218,650.00 | 0.20 | $ 5,804,662.50 |
| 3.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | M2 | 3.28 | $ 2,455,818.75 | $ 8,055,085.50 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.28 | $ 8,055,085.50 |
| 3.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML | 7.20 | $ 2,244,953.23 | $ 16,163,663.26 | 0.00 | $ - | 5.76 | $ 12,930,930.60 | 5.76 | $ 12,930,930.60 | 1.44 | $ 3,232,732.65 |
| 3.80 | CIELO RASO | | | | | $ 9.00 | | | | | | | |
| 3.8.1 | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA | M2 | 22.40 | $ 126,307.83 | $ 2,829,295.39 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 22.40 | $ 2,829,295.39 |
| 3.90 | RED HIDRÁULICA | | | | | | | | | | | | |
| 3.9.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 26.62 | $ 15,380.00 | $ 409,415.60 | 0.00 | $ - | 26.62 | $ 409,415.60 | 26.62 | $ 409,415.60 | 0.00 | $ - |
| 3.9.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 29.00 | $ 3,142.03 | $ 91,118.87 | 0.00 | $ - | 29.00 | $ 91,118.87 | 29.00 | $ 91,118.87 | 0.00 | $ - |
| 3.9.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 12.10 | $ 18,697.31 | $ 226,237.45 | 0.00 | $ - | 12.10 | $ 226,237.45 | 12.10 | $ 226,237.45 | 0.00 | $ - |
| 3.9.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 20.00 | $ 4,429.50 | $ 88,590.00 | 0.00 | $ - | 20.00 | $ 88,590.00 | 20.00 | $ 88,590.00 | 0.00 | $ - |
| 3.9.5 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | $ 38,807.45 | $ 116,422.35 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 116,422.35 | 3.00 | $ 116,422.35 | 0.00 | $ - |
| 3.9.6 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 13.00 | $ 68,128.10 | $ 885,665.30 | 0.00 | $ - | 13.00 | $ 885,665.30 | 13.00 | $ 885,665.30 | 0.00 | $ - |
| 3.9.7 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 7.00 | $ 10,381.65 | $ 72,671.55 | 0.00 | $ - | 7.00 | $ 72,671.55 | 7.00 | $ 72,671.55 | 0.00 | $ - |
| 3.9.8 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6.00 | $ 12,890.76 | $ 77,344.56 | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 77,344.56 | 6.00 | $ 77,344.56 | 0.00 | $ - |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **3.9.9** | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | $ 24,273.15 | $ 72,819.45 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 72,819.45 | 3.00 | $ 72,819.45 | 0.00 | $ - |
| **3.9.10** | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | $ 56,740.10 | $ 170,220.30 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 170,220.30 | 3.00 | $ 170,220.30 | 0.00 | $ - |
| **3.10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | | | | | | | | | | | |
| **3.10.1** | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 41.10 | $ 29,977.33 | $ 1,232,068.26 | 0.00 | $ - | 41.10 | $ 1,232,068.26 | 41.10 | $ 1,232,068.26 | 0.00 | $ - |
| **3.10.2** | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 42.00 | $ 14,062.80 | $ 590,637.60 | 0.00 | $ - | 42.00 | $ 590,637.60 | 42.00 | $ 590,637.60 | 0.00 | $ - |
| **3.10.3** | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 20.40 | $ 60,418.42 | $ 1,232,535.77 | 0.00 | $ - | 20.40 | $ 1,232,535.77 | 20.40 | $ 1,232,535.77 | 0.00 | $ - |
| **3.10.4** | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 21.00 | $ 43,221.47 | $ 907,650.87 | 0.00 | $ - | 21.00 | $ 907,650.87 | 21.00 | $ 907,650.87 | 0.00 | $ - |
| **3.10.5** | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 76,309.56 | $ 152,619.12 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 152,619.12 | 2.00 | $ 152,619.12 | 0.00 | $ - |
| **3.10.6** | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 105,537.31 | $ 211,074.62 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 211,074.62 | 2.00 | $ 211,074.62 | 0.00 | $ - |
| **3.10.7** | BUJE SANITARIO DE 4"X2" SOLDADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 17.00 | $ 44,074.51 | $ 749,266.67 | 0.00 | $ - | 17.00 | $ 749,266.67 | 17.00 | $ 749,266.67 | 0.00 | $ - |
| **3.10.8** | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 8.00 | $ 34,548.91 | $ 276,391.28 | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 276,391.28 | 8.00 | $ 276,391.28 | 0.00 | $ - |
| **3.10.9** | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 16.00 | $ 88,484.78 | $ 1,415,756.48 | 0.00 | $ - | 16.00 | $ 1,415,756.48 | 16.00 | $ 1,415,756.48 | 0.00 | $ - |
| **3.10.10** | SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR | UN | 2.00 | $ 1,729,150.39 | $ 3,458,300.78 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 3,458,300.78 |
| **3.10.11** | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS | UN | 2.00 | $ 1,003,134.51 | $ 2,006,269.02 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 2,006,269.02 |
| **3.10.12** | ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO | UN | 1.00 | $ 1,188,491.00 | $ 1,188,491.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,188,491.00 |
| **3.10.13** | LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | $ 321,535.80 | $ 1,286,143.20 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 1,286,143.20 |
| **3.10.14** | REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS | UN | 8.00 | $ 27,185.67 | $ 217,485.36 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 217,485.36 |
| **3.11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | | | | | | | | | | | |
| **3.11.1** | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | PTO | 28.00 | $ 208,006.25 | $ 5,824,175.00 | 0.00 | $ - | 8.40 | $ 1,747,252.50 | 8.40 | $ 1,747,252.50 | 19.60 | $ 4,076,922.50 |
| **3.11.2** | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 6.00 | $ 212,049.81 | $ 1,272,298.86 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 1,272,298.86 |
| **3.11.3** | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 1.00 | $ 219,888.57 | $ 219,888.57 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 219,888.57 |
| **3.11.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W NW | UN | 35.00 | $ 1,016,343.49 | $ 35,572,022.15 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 35.00 | $ 35,572,022.15 |
| **3.11.5** | LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3 | UN | 4.00 | $ 400,297.99 | $ 1,601,191.96 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 1,601,191.96 |
| **3.11.6** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V | UN | 25.00 | $ 131,256.49 | $ 3,281,412.25 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 25.00 | $ 3,281,412.25 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 3.11.7 | TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR. INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 2,799,430.28 | $ 2,799,430.28 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 2,799,430.28 |
| 3.11.8 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 59.00 | $ 349,013.38 | $ 20,591,789.42 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 59.00 | $ 20,591,789.42 |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO ZONA SOCIAL** | | | | **$ 1,000,141,764.94** | | **$ 196,682,443.62** | | **$ 509,956,278.58** | | **$ 706,638,722.20** | | **$ 293,503,042.74** |
| 4.00 | **ZONA ARMERILLO** | | | | | | | | | | | | |
| 4.10 | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 55.12 | $ 6,620.62 | $ 364,928.57 | 55.12 | $ 364,928.57 | 0.00 | $ - | 55.12 | $ 364,928.57 | 0.00 | $ - |
| 4.20 | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 46.43 | $ 113,807.32 | $ 5,284,073.87 | 46.43 | $ 5,284,073.87 | 0.00 | $ - | 46.43 | $ 5,284,073.87 | 0.00 | $ - |
| 4.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | M3 | 38.41 | $ 48,905.05 | $ 1,878,442.97 | 38.41 | $ 1,878,442.97 | 0.00 | $ - | 38.41 | $ 1,878,442.97 | 0.00 | $ - |
| 4.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | 357.21 | $ 2,028.72 | $ 724,679.07 | 357.21 | $ 724,679.07 | 0.00 | $ - | 357.21 | $ 724,679.07 | 0.00 | $ - |
| 4.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3/KM | 167.15 | $ 2,028.72 | $ 339,100.55 | 167.15 | $ 339,100.55 | 0.00 | $ - | 167.15 | $ 339,100.55 | 0.00 | $ - |
| 4.30 | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 0.73 | $ 800,447.03 | $ 584,326.33 | 0.73 | $ 584,326.33 | 0.00 | $ - | 0.73 | $ 584,326.33 | 0.00 | $ - |
| 4.3.2 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 7.28 | $ 1,461,468.24 | $ 10,639,488.79 | 7.28 | $ 10,639,488.79 | 0.00 | $ - | 7.28 | $ 10,639,488.79 | 0.00 | $ - |
| 4.3.3 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 12.90 | $ 1,944,132.62 | $ 25,079,310.80 | 12.90 | $ 25,079,310.80 | 0.00 | $ - | 12.90 | $ 25,079,310.80 | 0.00 | $ - |
| 4.3.4 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 5.05 | $ 1,349,337.03 | $ 6,814,152.00 | 0.00 | $ - | 5.05 | $ 6,814,152.00 | 5.05 | $ 6,814,152.00 | 0.00 | $ - |
| 4.3.5 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 5.28 | $ 1,901,669.30 | $ 10,040,813.90 | 0.00 | $ - | 5.28 | $ 10,040,813.90 | 5.28 | $ 10,040,813.90 | 0.00 | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **4.3.6** | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 5.66 | $ 1,507,757.43 | $ 8,533,907.05 | 0.00 | $ - | 5.66 | $ 8,533,907.05 | 5.66 | $ 8,533,907.05 | 0.00 | $ - |
| **4.3.7** | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 104.00 | $ 36,756.54 | $ 3,822,680.16 | 0.00 | $ - | 104.00 | $ 3,822,680.16 | 104.00 | $ 3,822,680.16 | 0.00 | $ - |
| **4.3.8** | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | M2 | 42.07 | $ 8,223.01 | $ 345,942.03 | 0.00 | $ - | 42.07 | $ 345,942.03 | 42.07 | $ 345,942.03 | 0.00 | $ - |
| **4.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | | | | | | | | | | | |
| **4.4.1** | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 5220.00 | $ 11,120.63 | $ 58,049,688.60 | 2069.42 | $ 23,013,254.13 | 3150.58 | $ 35,036,434.47 | 5220.00 | $ 58,049,688.60 | 0.00 | $ - |
| **4.4.2** | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 506.70 | $ 11,967.06 | $ 6,063,709.30 | 506.40 | $ 6,060,119.18 | 0.30 | $ 3,590.12 | 506.70 | $ 6,063,709.30 | 0.00 | $ - |
| **4.4.3** | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 1437.24 | $ 30,075.87 | $ 43,226,243.40 | 0.00 | $ - | 1437.24 | $ 43,226,243.40 | 1437.24 | $ 43,226,243.40 | 0.00 | $ - |
| **4.4.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | M2 | 56.63 | $ 79,462.54 | $ 4,499,963.64 | 0.00 | $ - | 56.63 | $ 4,499,963.64 | 56.63 | $ 4,499,963.64 | 0.00 | $ - |
| **4.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | | | | | | | | | | | | |
| **4.5.1** | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 78.65 | $ 70,554.51 | $ 5,549,112.21 | 0.00 | $ - | 78.65 | $ 5,549,112.21 | 78.65 | $ 5,549,112.21 | 0.00 | $ - |
| **4.5.2** | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | M2 | 164.61 | $ 95,254.64 | $ 15,679,866.29 | 0.00 | $ - | 164.41 | $ 15,660,815.36 | 164.41 | $ 15,660,815.36 | 0.20 | $ 19,050.93 |
| **4.5.3** | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0.74 | $ 2,232,938.39 | $ 1,652,374.41 | 0.00 | $ - | 0.74 | $ 1,652,374.41 | 0.74 | $ 1,652,374.41 | 0.00 | $ - |
| **4.5.4** | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 137.42 | $ 32,858.77 | $ 4,515,452.17 | 0.00 | $ - | 137.42 | $ 4,515,452.17 | 137.42 | $ 4,515,452.17 | 0.00 | $ - |
| **4.5.5** | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 208.89 | $ 45,008.72 | $ 9,401,871.52 | 0.00 | $ - | 208.89 | $ 9,401,871.52 | 208.89 | $ 9,401,871.52 | 0.00 | $ - |
| **4.5.6** | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | M2 | 44.76 | $ 301,432.09 | $ 13,492,100.35 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 44.76 | $ 13,492,100.35 |
| **4.5.7** | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | M2 | 6.10 | $ 179,351.23 | $ 1,094,042.50 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 6.10 | $ 1,094,042.50 |
| **4.5.8** | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | ML | 51.10 | $ 40,554.38 | $ 2,072,328.82 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 51.10 | $ 2,072,328.82 |
| **4.5.9** | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | M2 | 4.20 | $ 99,112.92 | $ 416,274.26 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 4.20 | $ 416,274.26 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **4.5.10** | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | M2 | 56.63 | $ 138,203.99 | $ 7,826,491.95 | 0.00 | $ - | 28.32 | $ 3,913,937.00 | 28.32 | $ 3,913,937.00 | 28.31 | $ 3,912,554.96 |
| **4.5.11** | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | ML | 7.67 | $ 166,028.35 | $ 1,273,437.44 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 7.67 | $ 1,273,437.44 |
| **4.5.12** | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | M2 | 48.96 | $ 43,609.40 | $ 2,135,116.22 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 48.96 | $ 2,135,116.22 |
| **4.60** | **PINTURA** | | | | | | | | | | | | |
| **4.6.1** | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 208.89 | $ 18,207.57 | $ 3,803,379.30 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 208.89 | $ 3,803,379.30 |
| **4.6.2** | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 137.42 | $ 15,401.75 | $ 2,116,508.49 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 137.42 | $ 2,116,508.49 |
| **4.6.3** | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | M2 | 137.42 | $ 27,009.33 | $ 3,711,622.13 | 0.00 | $ - | 68.71 | $ 1,855,811.06 | 68.71 | $ 1,855,811.06 | 68.71 | $ 1,855,811.06 |
| **4.6.4** | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | M2 | 208.89 | $ 48,260.08 | $ 10,081,048.11 | 0.00 | $ - | 52.23 | $ 2,520,623.98 | 52.23 | $ 2,520,623.98 | 156.66 | $ 7,560,424.13 |
| **4.70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **4.7.1** | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 1.00 | $ 197,050.30 | $ 197,050.30 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 197,050.30 |
| **4.7.2** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | UN | 4.00 | $ 2,274,416.18 | $ 9,097,664.72 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 9,097,664.72 |
| **4.7.3** | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA METÁLICA ABATIBLE EN DOS SECCIONES, APERTURA UNICA DESDE EL INTERIOR, ESPECIAL PARA CUARTO DE ARMAS | UN | 1.00 | $ 11,518,898.47 | $ 11,518,898.47 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 11,518,898.47 |
| **4.7.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTRACTOR INDUSTRIAL DE PARED 47.5X47.5 CM | UN | 1.00 | $ 2,321,237.30 | $ 2,321,237.30 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 2,321,237.30 |
| **4.7.5** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML | 4.30 | $ 2,244,953.23 | $ 9,653,298.89 | 0.00 | $ - | 2.58 | $ 5,791,979.33 | 2.58 | $ 5,791,979.33 | 1.72 | $ 3,861,319.56 |
| **4.80** | **RED HIDRÁULICA** | | | | | | | | | | | | |
| **4.8.1** | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 5.17 | $ 15,380.00 | $ 79,514.60 | 0.00 | $ - | 5.17 | $ 79,514.60 | 5.17 | $ 79,514.60 | 0.00 | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **4.8.2** | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 9.00 | $ 3,142.03 | $ 28,278.27 | 0.00 | $ - | 9.00 | $ 28,278.27 | 9.00 | $ 28,278.27 | 0.00 | $ - |
| **4.8.3** | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 38,807.45 | $ 38,807.45 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 38,807.45 | 1.00 | $ 38,807.45 | 0.00 | $ - |
| **4.8.4** | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 68,128.10 | $ 136,256.20 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 136,256.20 | 2.00 | $ 136,256.20 | 0.00 | $ - |
| **4.8.5** | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 12,890.76 | $ 25,781.52 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 25,781.52 | 2.00 | $ 25,781.52 | 0.00 | $ - |
| **4.90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | | | | | | | | | | | |
| **4.9.1** | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 8.60 | $ 29,977.33 | $ 257,805.04 | 8.60 | $ 257,805.04 | 0.00 | $ - | 8.60 | $ 257,805.04 | 0.00 | $ - |
| **4.9.2** | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 10.00 | $ 14,062.80 | $ 140,628.00 | 10.00 | $ 140,628.00 | 0.00 | $ - | 10.00 | $ 140,628.00 | 0.00 | $ - |
| **4.9.3** | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 6.00 | $ 60,418.42 | $ 362,510.52 | 6.00 | $ 362,510.52 | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 362,510.52 | 0.00 | $ - |
| **4.9.4** | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 43,221.47 | $ 86,442.94 | 2.00 | $ 86,442.94 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 86,442.94 | 0.00 | $ - |
| **4.9.5** | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 76,309.56 | $ 76,309.56 | 1.00 | $ 76,309.56 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 76,309.56 | 0.00 | $ - |
| **4.9.6** | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 105,537.31 | $ 105,537.31 | 1.00 | $ 105,537.31 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 105,537.31 | 0.00 | $ - |
| **4.9.7** | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 34,548.91 | $ 69,097.82 | 2.00 | $ 69,097.82 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 69,097.82 | 0.00 | $ - |
| **4.9.8** | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | $ 88,484.78 | $ 265,454.34 | 3.00 | $ 265,454.34 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 265,454.34 | 0.00 | $ - |
| **4.9.9** | SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR | UN | 1.00 | $ 1,729,150.39 | $ 1,729,150.39 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,729,150.39 |
| **4.9.10** | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS | UN | 1.00 | $ 1,003,134.51 | $ 1,003,134.51 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,003,134.51 |
| **4.9.11** | REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS | UN | 2.00 | $ 27,185.67 | $ 54,371.34 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 54,371.34 |
| **4.10** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | | | | | | | | | | | |
| **4.10.1** | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | PTO | 4.00 | $ 208,006.25 | $ 832,025.00 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 416,012.50 | 2.00 | $ 416,012.50 | 2.00 | $ 416,012.50 |
| **4.10.2** | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 1.00 | $ 212,049.81 | $ 212,049.81 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 212,049.81 |
| **4.10.3** | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 2.00 | $ 219,888.57 | $ 439,777.14 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 439,777.14 |
| **4.10.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 40W DL UNV | UN | 8.00 | $ 312,412.99 | $ 2,499,303.92 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 2,499,303.92 |
| **4.10.5** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W NW | UN | 2.00 | $ 1,016,343.49 | $ 2,032,686.98 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 2,032,686.98 |
| **4.10.6** | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 1,097,150.02 | $ 1,097,150.02 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,097,150.02 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 4.10.7 | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 10.00 | $ 349,013.38 | $ 3,490,133.80 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 10.00 | $ 3,490,133.80 |
| | | | | TOTAL COSTO DIRECTO ZONA ARMERILLO | $ 318,962,833.36 | | $ 75,331,509.79 | | $ 163,910,354.35 | | $ 239,241,864.14 | | $ 79,720,969.22 |
| 5.00 | ZONA ALOJAMIENTOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.10 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 786.13 | $ 6,620.62 | $ 5,204,668.00 | 786.13 | $ 5,204,668.00 | 0.00 | $ - | 786.13 | $ 5,204,668.00 | 0.00 | $ - |
| 5.20 | EXCAVACIONES Y RELLENOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 1016.88 | $ 113,807.32 | $ 115,728,387.56 | 1016.88 | $ 115,728,387.56 | 0.00 | $ - | 1016.88 | $ 115,728,387.56 | 0.00 | $ - |
| 5.2.2 | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | M3 | 779.54 | $ 48,905.05 | $ 38,123,442.68 | 779.54 | $ 38,123,442.68 | 0.00 | $ - | 779.54 | $ 38,123,442.68 | 0.00 | $ - |
| 5.2.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | 7249.72 | $ 2,028.72 | $ 14,707,651.96 | 7249.72 | $ 14,707,651.96 | 0.00 | $ - | 7249.72 | $ 14,707,651.96 | 0.00 | $ - |
| 5.2.4 | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3/KM | 3660.77 | $ 2,028.72 | $ 7,426,677.31 | 3660.77 | $ 7,426,677.31 | 0.00 | $ - | 3660.77 | $ 7,426,677.31 | 0.00 | $ - |
| 5.30 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO | | | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 23.32 | $ 800,447.03 | $ 18,666,424.74 | 23.32 | $ 18,666,424.74 | 0.00 | $ - | 23.32 | $ 18,666,424.74 | 0.00 | $ - |
| 5.3.2 | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 123.25 | $ 1,375,792.04 | $ 169,566,368.93 | 117.19 | $ 161,229,069.17 | 6.06 | $ 8,337,299.76 | 123.25 | $ 169,566,368.93 | 0.00 | $ - |
| 5.3.3 | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 13.55 | $ 3,129,144.81 | $ 42,399,912.18 | 13.55 | $ 42,399,912.18 | 0.00 | $ - | 13.55 | $ 42,399,912.18 | 0.00 | $ - |
| 5.3.4 | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 54.63 | $ 1,461,468.24 | $ 79,840,009.95 | 54.63 | $ 79,840,009.95 | 0.00 | $ - | 54.63 | $ 79,840,009.95 | 0.00 | $ - |
| 5.3.5 | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 93.67 | $ 1,944,132.62 | $ 182,106,902.52 | 58.35 | $ 113,440,138.38 | 35.32 | $ 68,666,764.14 | 93.67 | $ 182,106,902.52 | 0.00 | $ - |
| 5.3.6 | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 56.02 | $ 1,349,337.03 | $ 75,589,860.42 | 16.34 | $ 22,048,167.07 | 39.68 | $ 53,541,693.35 | 56.02 | $ 75,589,860.42 | 0.00 | $ - |
| 5.3.7 | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 95.32 | $ 1,901,669.30 | $ 181,267,117.68 | 0.00 | $ - | 95.32 | $ 181,267,117.68 | 95.32 | $ 181,267,117.68 | 0.00 | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **5.3.8** | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 107.92 | $ 1,507,757.43 | $ 162,717,181.85 | 0.00 | $ - | 107.92 | $ 162,717,181.85 | 107.92 | $ 162,717,181.85 | 0.00 | $ - |
| **5.3.9** | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 2.82 | $ 2,447,331.03 | $ 6,901,473.50 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.82 | $ 6,901,473.50 |
| **5.3.10** | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3280.00 | $ 36,756.54 | $ 120,561,451.20 | 0.00 | $ - | 3280.00 | $ 120,561,451.20 | 3280.00 | $ 120,561,451.20 | 0.00 | $ - |
| **5.3.11** | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | M2 | 531.19 | $ 8,223.01 | $ 4,367,980.68 | 0.00 | $ - | 531.19 | $ 4,367,980.68 | 531.19 | $ 4,367,980.68 | 0.00 | $ - |
| **5.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | | | | $ - | | | | | | | |
| **5.4.1** | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 47301.57 | $ 11,120.63 | $ 526,023,258.39 | 22436.52 | $ 249,508,237.41 | 24865.05 | $ 276,515,020.98 | 47301.57 | $ 526,023,258.39 | 0.00 | $ - |
| **5.4.2** | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 4898.53 | $ 11,967.06 | $ 58,621,002.42 | 4842.20 | $ 57,946,897.93 | 56.33 | $ 674,104.49 | 4898.53 | $ 58,621,002.42 | 0.00 | $ - |
| **5.4.3** | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 4272.91 | $ 30,075.87 | $ 128,511,485.68 | 0.00 | $ - | 4272.91 | $ 128,511,485.68 | 4272.91 | $ 128,511,485.68 | 0.00 | $ - |
| **5.4.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | M2 | 1079.18 | $ 79,462.54 | $ 85,754,383.92 | 0.00 | $ - | 1079.18 | $ 85,754,383.92 | 1079.18 | $ 85,754,383.92 | 0.00 | $ - |
| **5.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | | | | | | | | | | | | |
| **5.5.1** | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 936.65 | $ 70,554.51 | $ 66,084,881.79 | 0.00 | $ - | 936.65 | $ 66,084,881.79 | 936.65 | $ 66,084,881.79 | 0.00 | $ - |
| **5.5.2** | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | M2 | 686.70 | $ 95,254.64 | $ 65,411,361.29 | 0.00 | $ - | 686.70 | $ 65,411,361.29 | 686.70 | $ 65,411,361.29 | 0.00 | $ - |
| **5.5.3** | MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA | M2 | 328.86 | $ 214,942.04 | $ 70,685,839.27 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 328.86 | $ 70,685,839.27 |
| **5.5.4** | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 17.76 | $ 2,232,938.39 | $ 39,656,985.81 | 0.00 | $ - | 17.76 | $ 39,656,985.81 | 17.76 | $ 39,656,985.81 | 0.00 | $ - |
| **5.5.5** | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 2185.89 | $ 32,858.77 | $ 71,825,656.76 | 0.00 | $ - | 1967.30 | $ 64,643,058.22 | 1967.30 | $ 64,643,058.22 | 218.59 | $ 7,182,598.53 |
| **5.5.6** | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 1755.68 | $ 45,008.72 | $ 79,020,909.53 | 0.00 | $ - | 1580.11 | $ 71,118,728.56 | 1580.11 | $ 71,118,728.56 | 175.57 | $ 7,902,180.97 |
| **5.5.7** | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | M2 | 557.25 | $ 301,432.09 | $ 167,973,032.15 | 0.00 | $ - | 83.59 | $ 25,196,708.40 | 83.59 | $ 25,196,708.40 | 473.66 | $ 142,776,323.75 |
| **5.5.8** | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | M2 | 126.00 | $ 179,351.23 | $ 22,598,254.98 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 126.00 | $ 22,598,254.98 |
| **5.5.9** | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | ML | 362.21 | $ 40,554.38 | $ 14,689,201.98 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 362.21 | $ 14,689,201.98 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 5.5.10 | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | M2 | 226.91 | $ 99,112.92 | $ 22,489,712.68 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 226.91 | $ 22,489,712.68 |
| 5.5.11 | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | M2 | 654.65 | $ 138,203.99 | $ 90,475,242.05 | 0.00 | $ - | 327.33 | $ 45,238,312.05 | 327.33 | $ 45,238,312.05 | 327.32 | $ 45,236,930.01 |
| 5.5.12 | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | ML | 243.60 | $ 166,028.35 | $ 40,444,506.06 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 243.60 | $ 40,444,506.06 |
| 5.5.13 | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | M2 | 784.16 | $ 43,609.40 | $ 34,196,747.10 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 784.16 | $ 34,196,747.10 |
| 5.60 | PINTURA | | | | | | | | | | | | |
| 5.6.1 | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 2201.01 | $ 18,207.57 | $ 40,075,043.65 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2201.01 | $ 40,075,043.65 |
| 5.6.2 | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 1786.97 | $ 15,401.75 | $ 27,522,465.20 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1786.97 | $ 27,522,465.20 |
| 5.6.3 | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | M2 | 1786.97 | $ 27,009.33 | $ 48,264,862.43 | 0.00 | $ - | 893.49 | $ 24,132,566.26 | 893.49 | $ 24,132,566.26 | 893.48 | $ 24,132,296.17 |
| 5.6.4 | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | M2 | 2185.89 | $ 48,260.08 | $ 105,491,226.27 | 0.00 | $ - | 546.47 | $ 26,372,685.92 | 546.47 | $ 26,372,685.92 | 1639.42 | $ 79,118,540.35 |
| 5.70 | CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.7.1 | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 47.00 | $ 197,050.30 | $ 9,261,364.10 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 47.00 | $ 9,261,364.10 |
| 5.7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | UN | 36.00 | $ 2,274,416.18 | $ 81,878,982.48 | 0.00 | $ - | 3.60 | $ 8,187,898.25 | 3.60 | $ 8,187,898.25 | 32.40 | $ 73,691,084.23 |
| 5.7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM | M2 | 58.80 | $ 358,378.07 | $ 21,072,630.52 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 58.80 | $ 21,072,630.52 |
| 5.7.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA METALICA | UND | 2.00 | $ 29,023,312.50 | $ 58,046,625.00 | 0.00 | $ - | 1.80 | $ 52,241,962.50 | 1.80 | $ 52,241,962.50 | 0.20 | $ 5,804,662.50 |
| 5.7.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE SISTEMA A PISO, SOCODA O SIMILAR. (INCLUYE PUERTA, DOS PARALES, UN TABIQUE LISO Y HERRAJES). | UN | 40.00 | $ 6,704,307.78 | $ 268,172,311.20 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 40.00 | $ 268,172,311.20 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | OBJETO: | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | VALOR ANTICIPO: | PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA: |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | VALOR ADICIONAL: | VALOR PRESENTE ACTA: |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | VALOR ANTICIPO ADICIONAL | VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA |
| | | $ - | $ - |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL: | PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO: |
| | CONTRATISTA: CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | FECHA DE INICIO | ESTADO: EN EJECUCION |
| | INTERVENTOR : CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA | | FECHA DE TERMINACION | |
| | SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |
| 5.7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN BAÑO ACERO INOXIDABLE ORINAL 1.48 X 0.46, CON PANELES TIPO SANDUCHE, SOCODA O SIMILAR. | UN | 18.00 | $ 1,610,618.22 | $ 28,991,127.96 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 18.00 | $ 28,991,127.96 |
| 5.7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CLOSET FABRICADO EN MADERA MADECOR DE 20 MM INCLUYE ENTREPAÑOS HORIZONTAL EN MADERA MADECOR, SECCIÓN ROLLIZA DE MADERA DIAMETRO 1 1/2, PUERTAS EN MADECOR PIZANO DE 15 MM, TOPES METÁLICOS, BISAGRAS DE PARCHE, MANIJAS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD, SELLADA, MASILLADO Y PINTADO. | ML | 1.95 | $ 1,811,903.08 | $ 3,533,211.01 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.95 | $ 3,533,211.01 |
| 5.7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESCALERA METÁLICA TIPO GATO PARA ACCESO A TERRAZA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA | ML | 0.00 | $ 2,244,953.23 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - |
| 5.80 | RED HIDRÁULICA | | | | | | | | | | | | |
| 5.8.1 | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 84.30 | $ 15,380.00 | $ 1,296,534.00 | 0.00 | $ - | 84.30 | $ 1,296,534.00 | 84.30 | $ 1,296,534.00 | 0.00 | $ - |
| 5.8.2 | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 80.00 | $ 3,142.03 | $ 251,362.40 | 0.00 | $ - | 80.00 | $ 251,362.40 | 80.00 | $ 251,362.40 | 0.00 | $ - |
| 5.8.3 | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 331.35 | $ 18,697.31 | $ 6,195,353.67 | 0.00 | $ - | 331.35 | $ 6,195,353.67 | 331.35 | $ 6,195,353.67 | 0.00 | $ - |
| 5.8.4 | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 226.00 | $ 4,429.50 | $ 1,001,067.00 | 0.00 | $ - | 226.00 | $ 1,001,067.00 | 226.00 | $ 1,001,067.00 | 0.00 | $ - |
| 5.8.5 | TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 21.70 | $ 22,034.37 | $ 478,145.83 | 0.00 | $ - | 21.70 | $ 478,145.83 | 21.70 | $ 478,145.83 | 0.00 | $ - |
| 5.8.6 | ACCESORIO PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 5.00 | $ 7,072.81 | $ 35,364.05 | 0.00 | $ - | 5.00 | $ 35,364.05 | 5.00 | $ 35,364.05 | 0.00 | $ - |
| 5.8.7 | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 38,807.45 | $ 38,807.45 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 38,807.45 | 1.00 | $ 38,807.45 | 0.00 | $ - |
| 5.8.8 | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 138.00 | $ 68,128.10 | $ 9,401,677.80 | 0.00 | $ - | 138.00 | $ 9,401,677.80 | 138.00 | $ 9,401,677.80 | 0.00 | $ - |
| 5.8.9 | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 136.00 | $ 10,381.65 | $ 1,411,904.40 | 0.00 | $ - | 136.00 | $ 1,411,904.40 | 136.00 | $ 1,411,904.40 | 0.00 | $ - |
| 5.8.10 | BUJE SOLDAR PVCP 1"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 5.00 | $ 12,941.64 | $ 64,708.20 | 0.00 | $ - | 5.00 | $ 64,708.20 | 5.00 | $ 64,708.20 | 0.00 | $ - |
| 5.8.11 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 12,890.76 | $ 25,781.52 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 25,781.52 | 2.00 | $ 25,781.52 | 0.00 | $ - |
| 5.8.12 | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 40.00 | $ 24,273.15 | $ 970,926.00 | 0.00 | $ - | 40.00 | $ 970,926.00 | 40.00 | $ 970,926.00 | 0.00 | $ - |
| 5.8.13 | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 20.00 | $ 56,740.10 | $ 1,134,802.00 | 0.00 | $ - | 20.00 | $ 1,134,802.00 | 20.00 | $ 1,134,802.00 | 0.00 | $ - |
| 5.90 | RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS | | | | | | | | | | | | |
| 5.9.1 | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 164.10 | $ 29,977.33 | $ 4,919,279.85 | 96.90 | $ 2,904,803.28 | 67.20 | $ 2,014,476.58 | 164.10 | $ 4,919,279.85 | 0.00 | $ - |
| 5.9.2 | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 66.00 | $ 14,062.80 | $ 928,144.80 | 52.00 | $ 731,265.60 | 14.00 | $ 196,879.20 | 66.00 | $ 928,144.80 | 0.00 | $ - |
| 5.9.3 | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 82.50 | $ 60,418.42 | $ 4,984,519.65 | 39.90 | $ 2,410,694.96 | 42.60 | $ 2,573,824.69 | 82.50 | $ 4,984,519.65 | 0.00 | $ - |
| 5.9.4 | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 66.00 | $ 43,221.47 | $ 2,852,617.02 | 36.00 | $ 1,555,972.92 | 30.00 | $ 1,296,644.10 | 66.00 | $ 2,852,617.02 | 0.00 | $ - |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **5.9.5** | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 10.00 | $ 76,309.56 | $ 763,095.60 | 6.00 | $ 457,857.36 | 4.00 | $ 305,238.24 | 10.00 | $ 763,095.60 | 0.00 | $ - |
| **5.9.6** | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 10.00 | $ 105,537.31 | $ 1,055,373.10 | 6.00 | $ 633,223.86 | 4.00 | $ 422,149.24 | 10.00 | $ 1,055,373.10 | 0.00 | $ - |
| **5.9.7** | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 40.00 | $ 34,548.91 | $ 1,381,956.40 | 24.00 | $ 829,173.84 | 16.00 | $ 552,782.56 | 40.00 | $ 1,381,956.40 | 0.00 | $ - |
| **5.9.8** | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 50.00 | $ 88,484.78 | $ 4,424,239.00 | 30.00 | $ 2,654,543.40 | 20.00 | $ 1,769,695.60 | 50.00 | $ 4,424,239.00 | 0.00 | $ - |
| **5.9.9** | SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR | UN | 40.00 | $ 1,729,150.39 | $ 69,166,015.60 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 40.00 | $ 69,166,015.60 |
| **5.9.10** | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS | UN | 40.00 | $ 1,003,134.51 | $ 40,125,380.40 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 40.00 | $ 40,125,380.40 |
| **5.9.11** | ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO | UN | 18.00 | $ 1,188,491.00 | $ 21,392,838.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 18.00 | $ 21,392,838.00 |
| **5.9.12** | REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS | UN | 64.00 | $ 27,185.67 | $ 1,739,882.88 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 64.00 | $ 1,739,882.88 |
| **5.10** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | | | | | | | | | | | |
| **5.10.1** | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | PTO | 106.00 | $ 208,006.25 | $ 22,048,662.50 | 0.00 | $ - | 53.00 | $ 11,024,331.25 | 53.00 | $ 11,024,331.25 | 53.00 | $ 11,024,331.25 |
| **5.10.2** | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 20.00 | $ 212,049.81 | $ 4,240,996.20 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 20.00 | $ 4,240,996.20 |
| **5.10.3** | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 20.00 | $ 219,888.57 | $ 4,397,771.40 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 20.00 | $ 4,397,771.40 |
| **5.10.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED LINEAL 30W MNCONTINUUM 15-40W | UN | 88.00 | $ 1,016,343.49 | $ 89,438,227.12 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 88.00 | $ 89,438,227.12 |
| **5.10.5** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V | UN | 61.00 | $ 131,256.49 | $ 8,006,645.89 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 61.00 | $ 8,006,645.89 |
| **5.10.6** | LUMINARIA LED EMERGENCIA 2 X 1W 120 - 277 R3 | UN | 9.00 | $ 400,297.99 | $ 3,602,681.91 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 9.00 | $ 3,602,681.91 |
| **5.10.7** | TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 1,328,450.98 | $ 2,656,901.96 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 2,656,901.96 |
| **5.10.8** | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 1,097,150.02 | $ 1,097,150.02 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,097,150.02 |
| **5.10.9** | TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS.CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 2,799,430.28 | $ 2,799,430.28 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 2,799,430.28 |
| **5.10.10** | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 149.00 | $ 349,013.38 | $ 52,002,993.62 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 149.00 | $ 52,002,993.62 |
| **TOTAL COSTO DIRECTO ZONA DE ALOJAMIENTOS** | | | | | **$ 3,868,279,060.36** | | **$ 938,447,219.56** | | **$ 1,621,662,088.56** | | **$ 2,560,109,308.11** | | **$ 1,308,169,752.25** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **6.00** | **APARTAMENTO FISCAL** | | | | | | | | | | | | |
| **6.10** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| **6.1.1** | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 116.33 | $ 6,620.62 | $ 770,176.72 | 116.33 | $ 770,176.72 | 0.00 | $ - | 116.33 | $ 770,176.72 | 0.00 | $ - |
| **6.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | | | | | | |
| **6.2.1** | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 91.73 | $ 113,807.32 | $ 10,439,545.46 | 91.73 | $ 10,439,545.46 | 0.00 | $ - | 91.73 | $ 10,439,545.46 | 0.00 | $ - |
| **6.2.2** | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | M3 | 78.44 | $ 48,905.05 | $ 3,836,112.12 | 78.44 | $ 3,836,112.12 | 0.00 | $ - | 78.44 | $ 3,836,112.12 | 0.00 | $ - |
| **6.2.3** | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | 729.49 | $ 2,028.72 | $ 1,479,930.95 | 729.49 | $ 1,479,930.95 | 0.00 | $ - | 729.49 | $ 1,479,930.95 | 0.00 | $ - |
| **6.2.4** | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3/KM | 330.23 | $ 2,028.72 | $ 669,944.21 | 330.23 | $ 669,944.21 | 0.00 | $ - | 330.23 | $ 669,944.21 | 0.00 | $ - |
| **6.30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| **6.3.1** | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 1.26 | $ 800,447.03 | $ 1,008,563.26 | 1.26 | $ 1,008,563.26 | 0.00 | $ - | 1.26 | $ 1,008,563.26 | 0.00 | $ - |
| **6.3.2** | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 13.29 | $ 1,461,468.24 | $ 19,422,912.91 | 13.29 | $ 19,422,912.91 | 0.00 | $ - | 13.29 | $ 19,422,912.91 | 0.00 | $ - |
| **6.3.3** | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 8.68 | $ 1,944,132.62 | $ 16,875,071.14 | 8.68 | $ 16,875,071.14 | 0.00 | $ - | 8.68 | $ 16,875,071.14 | 0.00 | $ - |
| **6.3.4** | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 6.92 | $ 1,349,337.03 | $ 9,337,412.25 | 6.92 | $ 9,337,412.25 | 0.00 | $ - | 6.92 | $ 9,337,412.25 | 0.00 | $ - |
| **6.3.5** | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 10.21 | $ 1,901,669.30 | $ 19,416,043.55 | 0.00 | $ - | 10.21 | $ 19,416,043.55 | 10.21 | $ 19,416,043.55 | 0.00 | $ - |
| **6.3.6** | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 7.70 | $ 1,507,757.43 | $ 11,609,732.21 | 0.00 | $ - | 7.70 | $ 11,609,732.21 | 7.70 | $ 11,609,732.21 | 0.00 | $ - |
| **6.3.7** | MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0.31 | $ 2,447,331.03 | $ 758,672.62 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.31 | $ 758,672.62 |
| **6.3.8** | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 256.00 | $ 36,756.54 | $ 9,409,674.24 | 0.00 | $ - | 256.00 | $ 9,409,674.24 | 256.00 | $ 9,409,674.24 | 0.00 | $ - |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **6.3.9** | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | M2 | 57.68 | $ 8,223.01 | $ 474,303.22 | 0.00 | $ - | 57.68 | $ 474,303.22 | 57.68 | $ 474,303.22 | 0.00 | $ - |
| **6.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | | | | | | | | | | | |
| **6.4.1** | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 4221.20 | $ 11,120.63 | $ 46,942,403.36 | 1855.16 | $ 20,630,547.95 | 2366.04 | $ 26,311,855.41 | 4221.20 | $ 46,942,403.36 | 0.00 | $ - |
| **6.4.2** | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 692.70 | $ 11,967.06 | $ 8,289,582.46 | 666.80 | $ 7,979,635.61 | 25.90 | $ 309,946.85 | 692.70 | $ 8,289,582.46 | 0.00 | $ - |
| **6.4.3** | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 256.80 | $ 30,075.87 | $ 7,723,483.42 | 0.00 | $ - | 256.80 | $ 7,723,483.42 | 256.80 | $ 7,723,483.42 | 0.00 | $ - |
| **6.4.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | M2 | 76.96 | $ 79,462.54 | $ 6,115,437.08 | 0.00 | $ - | 76.96 | $ 6,115,437.08 | 76.96 | $ 6,115,437.08 | 0.00 | $ - |
| **6.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | | | | | | | | | | | | |
| **6.5.1** | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 125.06 | $ 70,554.51 | $ 8,823,547.02 | 0.00 | $ - | 125.06 | $ 8,823,547.02 | 125.06 | $ 8,823,547.02 | 0.00 | $ - |
| **6.5.2** | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | M2 | 280.98 | $ 95,254.64 | $ 26,764,648.75 | 0.00 | $ - | 280.98 | $ 26,764,648.75 | 280.98 | $ 26,764,648.75 | 0.00 | $ - |
| **6.5.3** | MURO SUPER BOARD DOBLE CARA, E=0.11 M, CAL 8 MM, INCLUYE PINTURA | M2 | 25.89 | $ 214,942.04 | $ 5,564,849.42 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 25.89 | $ 5,564,849.42 |
| **6.5.4** | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 1.24 | $ 2,232,938.39 | $ 2,768,843.60 | 0.00 | $ - | 1.24 | $ 2,768,843.60 | 1.24 | $ 2,768,843.60 | 0.00 | $ - |
| **6.5.5** | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 172.45 | $ 32,858.77 | $ 5,666,494.89 | 0.00 | $ - | 172.45 | $ 5,666,494.89 | 172.45 | $ 5,666,494.89 | 0.00 | $ - |
| **6.5.6** | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 240.00 | $ 45,008.72 | $ 10,802,092.80 | 0.00 | $ - | 240.00 | $ 10,802,092.80 | 240.00 | $ 10,802,092.80 | 0.00 | $ - |
| **6.5.7** | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | M2 | 63.34 | $ 301,432.09 | $ 19,092,708.58 | 0.00 | $ - | 15.84 | $ 4,774,684.31 | 15.84 | $ 4,774,684.31 | 47.50 | $ 14,318,024.28 |
| **6.5.8** | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | M2 | 6.60 | $ 179,351.23 | $ 1,183,718.12 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 6.60 | $ 1,183,718.12 |
| **6.5.9** | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | ML | 58.95 | $ 40,554.38 | $ 2,390,680.70 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 58.95 | $ 2,390,680.70 |
| **6.5.10** | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | M2 | 3.85 | $ 99,112.92 | $ 381,584.74 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.85 | $ 381,584.74 |
| **6.5.11** | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | M2 | 67.20 | $ 138,203.99 | $ 9,287,308.13 | 0.00 | $ - | 40.32 | $ 5,572,384.88 | 40.32 | $ 5,572,384.88 | 26.88 | $ 3,714,923.25 |
| **6.5.12** | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | ML | 7.40 | $ 166,028.35 | $ 1,228,609.79 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 7.40 | $ 1,228,609.79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **6.5.13** | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | M2 | 67.19 | $ 43,609.40 | $ 2,930,115.59 | 0.00 | $ - | 33.60 | $ 1,465,275.84 | 33.60 | $ 1,465,275.84 | 33.59 | $ 1,464,839.75 |
| **6.60** | **PINTURA** | | | | | | | | | | | | |
| **6.6.1** | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 316.21 | $ 18,207.57 | $ 5,757,415.71 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 316.21 | $ 5,757,415.71 |
| **6.6.2** | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 172.45 | $ 15,401.75 | $ 2,656,031.79 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 172.45 | $ 2,656,031.79 |
| **6.6.3** | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | M2 | 172.45 | $ 27,009.33 | $ 4,657,758.96 | 0.00 | $ - | 86.23 | $ 2,329,014.53 | 86.23 | $ 2,329,014.53 | 86.22 | $ 2,328,744.43 |
| **6.6.4** | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | M2 | 316.21 | $ 48,260.08 | $ 15,260,319.90 | 0.00 | $ - | 158.10 | $ 7,629,918.65 | 158.10 | $ 7,629,918.65 | 158.11 | $ 7,630,401.25 |
| **6.70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **6.7.1** | ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 0.70 | $ 197,050.30 | $ 137,935.21 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.70 | $ 137,935.21 |
| **6.7.2** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO VIDRIO TEMPLADO 10 MM INCLUYE BARANDAS 2 BARRAS ACERO INOXIDABLE INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD 3000 LIBRAS DE PRESION Y 3 MICRAS | M2 | 21.36 | $ 1,592,133.62 | $ 34,007,974.12 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 21.36 | $ 34,007,974.12 |
| **6.7.3** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | UN | 5.00 | $ 2,274,416.18 | $ 11,372,080.90 | 0.00 | $ - | 0.75 | $ 1,705,812.14 | 0.75 | $ 1,705,812.14 | 4.25 | $ 9,666,268.77 |
| **6.7.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA SISTEMA 744, INCLUYE VIDRIO 4 MM | M2 | 4.40 | $ 358,378.07 | $ 1,576,863.51 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 4.40 | $ 1,576,863.51 |
| **6.80** | **CIELO RASO** | | | | | | | | | | | | |
| **6.8.1** | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA | M2 | 63.34 | $ 126,307.83 | $ 8,000,337.95 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 63.34 | $ 8,000,337.95 |
| **6.90** | **RED HIDRÁULICA** | | | | | | | | | | | | |
| **6.9.1** | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 14.09 | $ 15,380.00 | $ 216,704.20 | 0.00 | $ - | 14.09 | $ 216,704.20 | 14.09 | $ 216,704.20 | 0.00 | $ - |
| **6.9.2** | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 18.00 | $ 3,142.03 | $ 56,556.54 | 0.00 | $ - | 18.00 | $ 56,556.54 | 18.00 | $ 56,556.54 | 0.00 | $ - |
| **6.9.3** | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 28.15 | $ 18,697.31 | $ 526,329.28 | 0.00 | $ - | 28.15 | $ 526,329.28 | 28.15 | $ 526,329.28 | 0.00 | $ - |
| **6.9.4** | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 11.00 | $ 4,429.50 | $ 48,724.50 | 0.00 | $ - | 11.00 | $ 48,724.50 | 11.00 | $ 48,724.50 | 0.00 | $ - |
| **6.9.5** | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 38,807.45 | $ 77,614.90 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 77,614.90 | 2.00 | $ 77,614.90 | 0.00 | $ - |
| **6.9.6** | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6.00 | $ 68,128.10 | $ 408,768.60 | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 408,768.60 | 6.00 | $ 408,768.60 | 0.00 | $ - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **6.9.7** | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | $ 10,381.65 | $ 41,526.60 | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 41,526.60 | 4.00 | $ 41,526.60 | 0.00 | $ - |
| **6.9.8** | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | $ 12,890.76 | $ 51,563.04 | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 51,563.04 | 4.00 | $ 51,563.04 | 0.00 | $ - |
| **6.9.9** | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 24,273.15 | $ 48,546.30 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 48,546.30 | 2.00 | $ 48,546.30 | 0.00 | $ - |
| **6.9.10** | VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 56,740.10 | $ 56,740.10 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 56,740.10 | 1.00 | $ 56,740.10 | 0.00 | $ - |
| **6.10** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | | | | | | | | | | | |
| **6.10.1** | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 15.43 | $ 29,977.33 | $ 462,550.20 | 15.43 | $ 462,550.20 | 0.00 | $ - | 15.43 | $ 462,550.20 | 0.00 | $ - |
| **6.10.2** | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 23.00 | $ 14,062.80 | $ 323,444.40 | 23.00 | $ 323,444.40 | 0.00 | $ - | 23.00 | $ 323,444.40 | 0.00 | $ - |
| **6.10.3** | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 8.52 | $ 60,418.42 | $ 514,764.94 | 8.52 | $ 514,764.94 | 0.00 | $ - | 8.52 | $ 514,764.94 | 0.00 | $ - |
| **6.10.4** | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | $ 43,221.47 | $ 129,664.41 | 3.00 | $ 129,664.41 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 129,664.41 | 0.00 | $ - |
| **6.10.5** | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 76,309.56 | $ 152,619.12 | 2.00 | $ 152,619.12 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 152,619.12 | 0.00 | $ - |
| **6.10.6** | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 105,537.31 | $ 105,537.31 | 1.00 | $ 105,537.31 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 105,537.31 | 0.00 | $ - |
| **6.10.7** | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | $ 34,548.91 | $ 138,195.64 | 4.00 | $ 138,195.64 | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 138,195.64 | 0.00 | $ - |
| **6.10.8** | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 5.00 | $ 88,484.78 | $ 442,423.90 | 5.00 | $ 442,423.90 | 0.00 | $ - | 5.00 | $ 442,423.90 | 0.00 | $ - |
| **6.10.9** | SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR | UN | 1.00 | $ 1,729,150.39 | $ 1,729,150.39 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,729,150.39 |
| **6.10.10** | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS | UN | 1.00 | $ 1,003,134.51 | $ 1,003,134.51 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,003,134.51 |
| **6.10.11** | LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 321,535.80 | $ 321,535.80 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 321,535.80 |
| **6.10.12** | REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS | UN | 3.00 | $ 27,185.67 | $ 81,557.01 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 81,557.01 |
| **6.11** | **INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS** | | | | | | | | | | | | |
| **6.11.1** | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO | PTO | 12.00 | $ 208,006.25 | $ 2,496,075.00 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 624,018.75 | 3.00 | $ 624,018.75 | 9.00 | $ 1,872,056.25 |
| **6.11.2** | SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 3.00 | $ 212,049.81 | $ 636,149.43 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 636,149.43 |
| **6.11.3** | SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 2.00 | $ 219,888.57 | $ 439,777.14 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 439,777.14 |
| **6.11.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED PANEL RD 22.8W DL 100-277V | UN | 18.00 | $ 131,256.49 | $ 2,362,616.82 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 18.00 | $ 2,362,616.82 |
| **6.11.5** | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE BREAKER Y TOTALIZADOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 1,097,150.02 | $ 1,097,150.02 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,097,150.02 |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **6.11.6** | SALIDA TV PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | $ 107,353.49 | $ 322,060.47 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 322,060.47 |
| **6.11.7** | SALIDA TELEFONO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 3.00 | $ 95,344.12 | $ 286,032.36 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 286,032.36 |
| **6.11.8** | SALIDA DE LAMPARA 110 V L= 6M EN TUBO EMT Y EN CABLE LIBRE DE HALÓGENO SUMINISTRO E INSTALACIÓN | PTO | 17.00 | $ 349,013.38 | $ 5,933,227.46 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 17.00 | $ 5,933,227.46 |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO ZONA APARTAMENTO FISCAL** | | | | **$ 375,401,661.75** | | **$ 94,719,052.50** | | **$ 161,830,286.20** | | **$ 256,549,338.70** | | **$ 118,852,323.07** |
| **7.00** | **GARITAS Y SHUT DE BASURAS** | | | | | | | | | | | | |
| **7.10** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| **7.1.1** | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 40.60 | $ 6,620.62 | $ 268,797.17 | 0.00 | $ - | 40.60 | $ 268,797.17 | 40.60 | $ 268,797.17 | 0.00 | $ - |
| **7.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | | | | | | |
| **7.2.1** | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 54.75 | $ 113,807.32 | $ 6,230,950.77 | 0.00 | $ - | 54.75 | $ 6,230,950.77 | 54.75 | $ 6,230,950.77 | 0.00 | $ - |
| **7.2.2** | RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON EQUIPO PESADO. | M3 | 39.35 | $ 48,905.05 | $ 1,924,413.72 | 0.00 | $ - | 39.35 | $ 1,924,413.72 | 39.35 | $ 1,924,413.72 | 0.00 | $ - |
| **7.2.3** | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR | M3/KM | 365.96 | $ 2,028.72 | $ 742,430.37 | 0.00 | $ - | 365.96 | $ 742,430.37 | 365.96 | $ 742,430.37 | 0.00 | $ - |
| **7.2.4** | TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES | M3/KM | 197.10 | $ 2,028.72 | $ 399,860.71 | 0.00 | $ - | 197.10 | $ 399,860.71 | 197.10 | $ 399,860.71 | 0.00 | $ - |
| **7.30** | **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** | | | | | | | | | | | | |
| **7.3.1** | SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI) | M3 | 2.64 | $ 800,447.03 | $ 2,113,180.16 | 0.00 | $ - | 2.64 | $ 2,113,180.16 | 2.64 | $ 2,113,180.16 | 0.00 | $ - |
| **7.3.2** | ZAPATA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 7.78 | $ 1,375,792.04 | $ 10,703,662.07 | 0.00 | $ - | 7.78 | $ 10,703,662.07 | 7.78 | $ 10,703,662.07 | 0.00 | $ - |
| **7.3.3** | PEDESTALES EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 2.68 | $ 3,129,144.81 | $ 8,386,108.09 | 0.00 | $ - | 2.68 | $ 8,386,108.09 | 2.68 | $ 8,386,108.09 | 0.00 | $ - |
| **7.3.4** | VIGA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 5.26 | $ 1,461,468.24 | $ 7,687,322.94 | 0.00 | $ - | 5.26 | $ 7,687,322.94 | 5.26 | $ 7,687,322.94 | 0.00 | $ - |
| **7.3.5** | COLUMNA EN CONCRETO 31.5 MPa (4500 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 21.20 | $ 1,944,132.62 | $ 41,215,611.54 | 0.00 | $ - | 21.20 | $ 41,215,611.54 | 21.20 | $ 41,215,611.54 | 0.00 | $ - |
| **7.3.6** | PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 2.38 | $ 1,349,337.03 | $ 3,211,422.13 | 0.00 | $ - | 2.38 | $ 3,211,422.13 | 2.38 | $ 3,211,422.13 | 0.00 | $ - |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **7.3.7** | VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 6.80 | $ 1,901,669.30 | $ 12,931,351.24 | 0.00 | $ - | 6.80 | $ 12,931,351.24 | 6.80 | $ 12,931,351.24 | 0.00 | $ - |
| **7.3.8** | PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 3.55 | $ 1,507,757.43 | $ 5,352,538.88 | 0.00 | $ - | 3.55 | $ 5,352,538.88 | 3.55 | $ 5,352,538.88 | 0.00 | $ - |
| **7.3.9** | PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DÍAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0.47 | $ 1,647,821.03 | $ 774,475.88 | 0.00 | $ - | 0.47 | $ 774,475.88 | 0.47 | $ 774,475.88 | 0.00 | $ - |
| **7.3.10** | ANCLAJE EPÓXICO CON VARILLA DE 3/8" INCLUYE LA VARILLA, LA PERFORACIÓN, LIMPIEZA DE LA PERFORACIÓN CON CHORRO DE AIRE Y RELLENO EPÓXICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 224.00 | $ 36,756.54 | $ 8,233,464.96 | 0.00 | $ - | 201.60 | $ 7,410,118.46 | 201.60 | $ 7,410,118.46 | 22.40 | $ 823,346.50 |
| **7.3.11** | PLASTICO PQA POLIETILENO CAL. 6 SUMINISTRO E INSTALACION | M2 | 22.10 | $ 8,223.01 | $ 181,728.52 | 0.00 | $ - | 22.10 | $ 181,728.52 | 22.10 | $ 181,728.52 | 0.00 | $ - |
| **7.40** | **ACEROS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS** | | | | | | | | | | | | |
| **7.4.1** | ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. | KG | 5500.51 | $ 11,120.63 | $ 61,169,136.52 | 0.00 | $ - | 5500.51 | $ 61,169,136.52 | 5500.51 | $ 61,169,136.52 | 0.00 | $ - |
| **7.4.2** | MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 274.18 | $ 11,967.06 | $ 3,281,128.51 | 0.00 | $ - | 274.18 | $ 3,281,128.51 | 274.18 | $ 3,281,128.51 | 0.00 | $ - |
| **7.4.3** | ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | KG | 74.98 | $ 30,075.87 | $ 2,255,088.73 | 0.00 | $ - | 74.98 | $ 2,255,088.73 | 74.98 | $ 2,255,088.73 | 0.00 | $ - |
| **7.4.4** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO) | M2 | 30.21 | $ 79,462.54 | $ 2,400,563.33 | 0.00 | $ - | 30.21 | $ 2,400,563.33 | 30.21 | $ 2,400,563.33 | 0.00 | $ - |
| **7.50** | **MAMPOSTERIA, PISOS Y AFINADOS** | | | | | | | | | | | | |
| **7.5.1** | MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3) | M2 | 75.04 | $ 70,554.51 | $ 5,294,410.43 | 0.00 | $ - | 75.04 | $ 5,294,410.43 | 75.04 | $ 5,294,410.43 | 0.00 | $ - |
| **7.5.2** | MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:3 | M2 | 84.04 | $ 95,254.64 | $ 8,005,199.95 | 0.00 | $ - | 84.04 | $ 8,005,199.95 | 84.04 | $ 8,005,199.95 | 0.00 | $ - |
| **7.5.3** | DINTELES EN CONCRETO 17.2 MPa (2500 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN | M3 | 0.46 | $ 2,232,938.39 | $ 1,027,151.66 | 0.00 | $ - | 0.46 | $ 1,027,151.66 | 0.46 | $ 1,027,151.66 | 0.00 | $ - |
| **7.5.4** | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 137.92 | $ 32,858.77 | $ 4,531,881.56 | 0.00 | $ - | 137.92 | $ 4,531,881.56 | 137.92 | $ 4,531,881.56 | 0.00 | $ - |
| **7.5.5** | PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN | M2 | 210.56 | $ 45,008.72 | $ 9,477,036.08 | 0.00 | $ - | 210.56 | $ 9,477,036.08 | 210.56 | $ 9,477,036.08 | 0.00 | $ - |
| **7.5.6** | PISO EN BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO BH5 INSTITUCIONAL. INCLUYE LAVADO CON ACIDO. PULIDA CON PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL. | M2 | 20.96 | $ 301,432.09 | $ 6,318,016.61 | 0.00 | $ - | 6.29 | $ 1,896,007.85 | 6.29 | $ 1,896,007.85 | 14.67 | $ 4,422,008.76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **7.5.7** | CERAMICA LISA 0.25X0.40 PARA MUROS | M2 | 31.62 | $ 179,351.23 | $ 5,671,085.89 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 31.62 | $ 5,671,085.89 |
| **7.5.8** | GUARDAESCOBA EN BALDOSA GRANO MARMOL | ML | 41.95 | $ 40,554.38 | $ 1,701,256.24 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 41.95 | $ 1,701,256.24 |
| **7.5.9** | PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA | M2 | 12.87 | $ 99,112.92 | $ 1,275,583.28 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 12.87 | $ 1,275,583.28 |
| **7.5.10** | IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS Y BALCONES CON SIKA PERMALASTIK PRO. INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y SELLO DE FISURAS CON SIKAFLEX 1A O SIMILAR, TELA DE REFUERZO, ARENA, PLASTICO DE BAJA DENSIDAD (PROTECCION LLUVIA) | M2 | 3.55 | $ 138,203.99 | $ 490,624.16 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.55 | $ 490,624.16 |
| **7.5.11** | GUARDAESCOBA MEDIACAÑA PREFABRICADO EN GRANITO. | ML | 5.50 | $ 166,028.35 | $ 913,155.93 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 5.50 | $ 913,155.93 |
| **7.5.12** | AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM | M2 | 33.83 | $ 43,609.40 | $ 1,475,306.00 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 33.83 | $ 1,475,306.00 |
| **7.60** | **PINTURA** | | | | | | | | | | | | |
| **7.6.1** | PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS | M2 | 210.56 | $ 18,207.57 | $ 3,833,785.94 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 210.56 | $ 3,833,785.94 |
| **7.6.2** | PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD) | M2 | 137.92 | $ 15,401.75 | $ 2,124,209.36 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 137.92 | $ 2,124,209.36 |
| **7.6.3** | SELLADOR PARA MUROS INTERIORES, IMPRIMANTE GRECONAL O SIMILAR | M2 | 137.92 | $ 27,009.33 | $ 3,725,126.79 | 0.00 | $ - | 68.96 | $ 1,862,563.40 | 68.96 | $ 1,862,563.40 | 68.96 | $ 1,862,563.40 |
| **7.6.4** | SELLADOR HIDROPOROTECTOR FACHADA T. SIKA TRANSPARENTE 10 O SIMILAR | M2 | 210.56 | $ 48,260.08 | $ 10,161,642.44 | 0.00 | $ - | 52.64 | $ 2,540,410.61 | 52.64 | $ 2,540,410.61 | 157.92 | $ 7,621,231.83 |
| **7.70** | **CARPINTERIA METÁLICA Y ACCESORIOS** | | | | | | | | | | | | |
| **7.7.1** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA CON MELAMINICO COLOR BELLOTA MARCA PELIKANDO EN RH 6MM,EL RELLENO DE LA PUERTA EN RH 15 MM ENCHAPADO CON CANTO FLEXIBLE DE 41 MM PEGADO CON PL 285 Y LAS CARAS DE LA LAMINA SE UNIRAN AL RH 15MM CON CARPINCOL. SE PONDRAN 4 BISAGRAS OMEGA DE 3X3 Y CHAPA DE POMO METALICO. EL MARCO DE LA PUERTA SERA DE 8CM, ALTURA MAX 3.05 MTS INCLUYENDO UN FIJO SUPERIOR DE MAXIMO 50CM Y ANCHO ENTRE 0.80 Y 1.20 MTS SEGUN SE REQUIERA. | UN | 3.00 | $ 2,274,416.18 | $ 6,823,248.54 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 6,823,248.54 |
| **7.7.2** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3" | M2 | 0.80 | $ 520,844.37 | $ 416,675.50 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.80 | $ 416,675.50 |
| **7.7.3** | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ORNAMENTADA DE DOBLE HOJA | M2 | 6.56 | $ 2,455,818.75 | $ 16,110,171.00 | 0.00 | $ - | 1.64 | $ 4,027,542.75 | 1.64 | $ 4,027,542.75 | 4.92 | $ 12,082,628.25 |
| **7.80** | **RED HIDRÁULICA** | | | | | | | | | | | | |
| **7.8.1** | TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 4.50 | $ 15,380.00 | $ 69,210.00 | 0.00 | $ - | 4.50 | $ 69,210.00 | 4.50 | $ 69,210.00 | 0.00 | $ - |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **7.8.2** | ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6.00 | $ 3,142.03 | $ 18,852.18 | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 18,852.18 | 6.00 | $ 18,852.18 | 0.00 | $ - |
| **7.8.3** | TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 16.85 | $ 18,697.31 | $ 315,049.67 | 0.00 | $ - | 16.85 | $ 315,049.67 | 16.85 | $ 315,049.67 | 0.00 | $ - |
| **7.8.4** | ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 8.00 | $ 4,429.50 | $ 35,436.00 | 0.00 | $ - | 8.00 | $ 35,436.00 | 8.00 | $ 35,436.00 | 0.00 | $ - |
| **7.8.5** | VALVULA DE BOLA 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 38,807.45 | $ 38,807.45 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 38,807.45 | 1.00 | $ 38,807.45 | 0.00 | $ - |
| **7.8.6** | PUNTO HIDRÁULICO PVCP PARAL DESDE PISO PROMEDIO 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 2.00 | $ 68,128.10 | $ 136,256.20 | 0.00 | $ - | 2.00 | $ 136,256.20 | 2.00 | $ 136,256.20 | 0.00 | $ - |
| **7.8.7** | BUJE SOLDAR PVCP 1/2"X3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | $ 10,381.65 | $ 41,526.60 | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 41,526.60 | 4.00 | $ 41,526.60 | 0.00 | $ - |
| **7.8.8** | UNIÓN PVC UNIVERSAL PRESIÓN 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 1.00 | $ 12,890.76 | $ 12,890.76 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 12,890.76 | 1.00 | $ 12,890.76 | 0.00 | $ - |
| **7.90** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | | | | | | | | | | | |
| **7.9.1** | TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 7.50 | $ 29,977.33 | $ 224,829.98 | 0.00 | $ - | 7.50 | $ 224,829.98 | 7.50 | $ 224,829.98 | 0.00 | $ - |
| **7.9.2** | ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6.00 | $ 14,062.80 | $ 84,376.80 | 0.00 | $ - | 6.00 | $ 84,376.80 | 6.00 | $ 84,376.80 | 0.00 | $ - |
| **7.9.3** | TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 14.65 | $ 60,418.42 | $ 885,129.85 | 0.00 | $ - | 14.65 | $ 885,129.85 | 14.65 | $ 885,129.85 | 0.00 | $ - |
| **7.9.4** | ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 4.00 | $ 43,221.47 | $ 172,885.88 | 0.00 | $ - | 4.00 | $ 172,885.88 | 4.00 | $ 172,885.88 | 0.00 | $ - |
| **7.9.5** | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 2" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 1.00 | $ 28,809.14 | $ 28,809.14 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 28,809.14 | 1.00 | $ 28,809.14 | 0.00 | $ - |
| **7.9.6** | ADAPTADOR DE LIMPIEZA 4" VENTILACIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 1.00 | $ 76,309.56 | $ 76,309.56 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 76,309.56 | 1.00 | $ 76,309.56 | 0.00 | $ - |
| **7.9.7** | CODO DE REVENTILACIÓN 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 1.00 | $ 105,537.31 | $ 105,537.31 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 105,537.31 | 1.00 | $ 105,537.31 | 0.00 | $ - |
| **7.9.8** | SIFON SANITARIA 180° DE 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 1.00 | $ 34,548.91 | $ 34,548.91 | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 34,548.91 | 1.00 | $ 34,548.91 | 0.00 | $ - |
| **7.9.9** | YEE SANITARIA REDUCIDA DE 4"X2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN | ML | 3.00 | $ 88,484.78 | $ 265,454.34 | 0.00 | $ - | 3.00 | $ 265,454.34 | 3.00 | $ 265,454.34 | 0.00 | $ - |
| **7.9.10** | SANITARIO + FLUXOMETRO T ADRIATRICA, CORONA O SIMILAR | UN | 1.00 | $ 1,729,150.39 | $ 1,729,150.39 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,729,150.39 |
| **7.9.11** | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACCESORIOS | UN | 1.00 | $ 1,003,134.51 | $ 1,003,134.51 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 1,003,134.51 |
| **7.9.12** | REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS | UN | 1.00 | $ 27,185.67 | $ 27,185.67 | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 0.00 | $ - | 1.00 | $ 27,185.67 |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO GARITAS Y SHUT DE BASURAS** | | | | **$ 274,144,184.80** | | **$ 0.00** | | **$ 219,848,004.66** | | **$ 219,848,004.66** | | **$ 54,296,180.15** |
| **8.00** | **URBANISMO Y PAISAJISMO** | | | | | | | | | | | | |
| **8.10** | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| **8.1.1** | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS. | M2 | 1564.01 | $ 6,620.62 | $ 10,354,735.75 | 1564.01 | $ 10,354,735.75 | 0.00 | $ - | 1564.01 | $ 10,354,735.75 | 0.00 | $ - |

| DEPARTAMENTO DEL META<br>MUNICIPIO DE ACACIAS<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: |
|---|---|---|---|
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **V.UNITARIO** | **V.TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR** | **CANT.** | **VALOR** | **CANT** | **VALOR TOTAL** |
| **8.20** | **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | | | | | | |
| **8.2.1** | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE | M3 | 65.44 | $ 113,807.32 | $ 7,447,095.79 | 65.44 | $ 7,447,095.79 | 0.00 | $ - | 65.44 | $ 7,447,095.79 | 0.00 | $ - |
| **8.30** | **RED SANITARIA, PLUVIAL Y APARATOS** | | | | | | | | | | | | |
| **8.30.1** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE | ML | 120.39 | $ 107,621.85 | $ 12,956,594.52 | 120.39 | $ 12,956,594.52 | 0.00 | $ - | 120.39 | $ 12,956,594.52 | 0.00 | $ - |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO URBANISMO Y PAISAJISMO** | | | | **$ 30,758,426.06** | | **$ 30,758,426.06** | | **$ 0.00** | | **$ 30,758,426.06** | | **$ 0.00** |
| | **SUBTOTAL COSTO EJECUCION OBRA** | | | | **$ 11,737,889,570.79** | | **$ 2,056,234,178.94** | | **$ 5,060,339,256.88** | | **$ 7,116,573,435.82** | | **$ 4,621,316,135.05** |
| | **PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO TRÁNSITO** | | | | **$ 44,230,989.72** | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** | | **$ 31,055,801.29** | | **$ 0.00** |
| | **PRESUPUESTO PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** | | | | **$ 76,502,537.38** | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** | | **$ 30,485,921.15** | | **$ 0.00** |
| | **COSTO CERTIFICACION RETIE Y RETILAP** | | | | **$ 43,419,342.24** | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| | **COSTO CERTIFICACION PUNTOS VOZ Y DATOS** | | | | **$ 10,580,523.87** | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** | | **$ 0.00** |
| | **TOTAL COSTO FASE II EJECUCION OBRA** | | | | **$ 11,912,622,964.00** | | **$ 0.00** | | **$ 5,060,339,256.88** | | **$ 7,178,115,158.26** | | |
| | **TOTAL AJUSTADO AL PESO** | | | | **$ 12,575,546,216.00** | | **$ 662,923,252.00** | | **$ 5,060,339,256.88** | | **$ 7,841,038,410.26** | | **$ 4,621,316,135.05** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DEPARTAMENTO DEL META**<br>**MUNICIPIO DE ACACIAS**<br>**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** | **CONTRATO DE OBRA No : 377 DE 2023** | **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **FECHA DE LA PRESENTE ACTA:** |
| | **OBJETO:** | $ 12,575,546,216.00 | 6 DE AGOSTO DEL 2024 |
| | | **VALOR ANTICIPO:** | **PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA:** |
| | | $ 4,765,049,185.60 | 43.11% |
| | ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS DEPARTAMENTO DEL META | **VALOR ADICIONAL:** | **VALOR PRESENTE ACTA:** |
| | | $ - | $ 7,178,115,158.26 |
| | | **VALOR ANTICIPO ADICIONAL** | **VALOR A AMORTIZAR PRESENTE ACTA** |
| | | $ - | $ - |
| | | **VALOR ACTUAL DEL CONTRATO + ADICIONAL:** | **PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO:** |
| | **CONTRATISTA:** CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023 / R.L: ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO | $ 12,575,546,216.00 | 62.35% |
| | | **FECHA DE INICIO** | **ESTADO: EN EJECUCION** |
| | **INTERVENTOR :** CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 / R.L: JUAN CAMILO POSADA VARELA | 27 DE ABRIL DE 2023 | |
| **ACTA PARCIAL CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA** | | **FECHA DE TERMINACION** | |
| | **SUPERVISOR:** IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA | 12 DE NOVIEMBRE DE 2024 | |

En el Municipio de Acacias (Meta), a los seis (6) dias del mes de agosto del año 2024, se reunieron ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO representante legal del CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023, contratista; el ingeniero JUAN CAMILO POSADA VARELA representrante legal del CONSORCIO INTERPOLICIA 2023, interventor y el ingeniero IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA Supervisor del contrato de interventoria,; para dejar constancia por medio de la presente acta parcial las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

| CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE BALANCE ECONOMICO | | | | | | PARCIALES ANTERIORES | | PRESENTE ACTA PARCIAL | | CANTIDAD ACUMULADA | | CANTIDADES POR EJECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | V.UNITARIO | V.TOTAL | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT. | VALOR | CANT | VALOR TOTAL |

| | | |
|---|---|---|
| **Valor Inicial del contrato de obra** | | $ 12,575,546,216.00 |
| **Valor Fase I: ESTUDIOS Y DISEÑOS** | $ | 662,923,252.00 |
| **Valor Fase II: EJECUCIÓN DE OBRA** | $ | 11,912,622,964.00 |
| **Valor Actualizado del contrato de obra** | $ | 12,575,546,216.00 |
| **Valor ejecutado (FASE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | $ | 662,923,252.00 |
| **Porcentaje Ejecutado (FASE 1: ESTUDIOS Y DISEÑOS)** | | 100.00% |
| **Valor ejecutado actual (FASE 2: EJECUCION DE OBRA)** | $ | 7,178,115,158.26 |
| **Porcentaje Ejecutado FASE 2: EJECUCION DE OBRA)** | | 60.26% |
| **Valor Ejecutado Acumulado (FASE 1 Y FASE 2)** | $ | 7,841,038,410.26 |
| **Porcentaje Ejecutado acumulado (FASE 1 Y FASE 2)** | | 62.35% |

**Nota**:

**Para constancia de lo anterior firman la presente ACTA PARCIAL , por los que en ella intervinieron, en Acacias el dia 6 de Agosto de 2024**

**Firma**

**CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023**
**R.L. ALLISON ISABELLA URQUIJO CAMACHO**
Contratista

**Firma**

**CONSORCIO INTERPOLICIA 2023**
**R.L. JUAN CAMILO POSADA VARELA**
Interventor

**Firma**

**ING. IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA**
Secretario de Infraestructura - Supervisor

| INGENIERIA DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE COLOMBIA S.A.S. | | |
|---|---|---|
| INDICOLSA S.A.S<br>ONAC ACREDITADO<br>ISO/IEC 17020:2012<br>16-OIN-024 | **ACUERDO COMERCIAL** | **CODIGO:** PC-FR-02<br>**FECHA:** 2023/08/23<br>**VERSIÓN:** 16<br>**N° ACUERDO: 2087** |

**Fecha:** 25/07/2024

**Señor(es): CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023**

**C.C. / NIT**: 901699813 1

**Contacto: NO REPORTA**

**Dirección:** CR 14 13 76

**Correo:** consorciopolicia2023@gmail.com

**Celular: 3114438800**

**Ciudad/Departamento: ACACIAS-META**

**ALCANCE DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN CONTRA RETIE. RESOLUCIONES 90708 DE AGOSTO 30 DE 2013, 90907 DE 2013, 90795 DE 2014, 40492 DE 2015, 40259 DE 2017 Y 40056 DE 2022 o la que la modifique, adicione o sustituya.**

**Año de inicio: _____ Nueva: _x_ Ampliación: ___ Modificación: ___ Existente: ___ Renovación: ___**

| ITEM | DESCRIPCIÓN ALCANCE |
|---|---|
| **1** | INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN RETIE, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, **ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, DEPARTAMENTO DEL META**<br><br>**REDES DE DISTRIBUCIÓN MEDIA TENSIÓN**<br>• (295) m de red en media tensión aérea<br><br>**REDES DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN**<br>• (220) m de red en baja tensión subterránea<br><br>**DISTRIBUCIÓN (TRANSFORMACIÓN)**<br>• (1) transformador de 225 kVA 13,200/208 interior tipo seco |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

***NOTA: No incluye viáticos ni transporte***

## I. CONSIDERACIONES ECONOMICAS COMERCIALES

1. El pago debe realizarse con la firma del presente acuerdo y previo inicio de las actividades a ejecutar (100% anticipado).
2. El pago podrá realizarse mediante consignación o transferencia electrónica a nombre de INGENIERIA DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE COLOMBIA S.A.S. Nit: 900.939.334-0. Cuenta Corriente Bancolombia N ° 05700013492.
3. El presente acuerdo tiene vigencia de 60 días calendario desde su emisión hasta su aceptación y/o firma entre las partes.
4. El presente acuerdo incluye 1 visita en campo. En caso de requerir una segunda (2) y última visita para el levantamiento de No Conformidades, tendrá un costo adicional **($1.000.000 + IVA**), el cliente debe suministrar los viáticos (gastos de transporte, manutención y alojamiento) del inspector.
5. Si la instalación eléctrica inspeccionada en la visita en sitio presenta no conformidades, el cliente debe subsanar los hallazgos en el tiempo establecido, notificar al organismo mediante correo comercial@indicolsa.com, del levantamiento de las no conformidades para programar segunda visita. Si se vence el periodo acordado para subsanar las no conformidades y estas no se corrigen, se procederá a emitir el(los) dictamen(es) como No aprobado(s), los cuales se reportarán a la SIC conforme Artículo 34.3 literal q del RETIE.
6. En caso de que el alcance solicitado inicialmente no concuerde con el de la instalación eléctrica en sitio, se ajustará el valor económico del acuerdo.
7. El proceso de inspección inicia con la aceptación, suscripción y correspondiente pago y finaliza con el dictamen de inspección aprobado o no aprobado. Para la emisión de la factura, se requiere: acuerdo comercial firmado por el propietario, constructor civil o representante legal, registro único tributario (RUT), certificado de existencia y representación legal, recibo de consignación o transferencia bancaria por el valor total del acuerdo; documentos que pueden ser entregados en medio físico en la Cll 15 N. 40 01 oficina 417 lobby 3 Centro Comercial Primavera Urbana Villavicencio (Meta) o magnético al correo eléctrico comercial@indicolsa.com
8. El dictamen de inspección será emitido de conformidad con la información suministrada por el cliente, de haber errores en la información, el cliente deberá pagar un recargo por valor de (6% SMMLV) por cada nuevo certificado corregido.
9. En caso de que el cliente desista de la realización de la inspección por cualquier motivo, antes de hacer la visita de inspección y solicite la devolución del dinero INDICOLSA SAS, hará un cobro de penalidad del 40%, este cobro es para cubrir los costos administrativos (programación, enlistado de los equipos, apertura de carpeta). Si el cliente desiste de la

inspección después de realizada la visita de inspección y toma de registros. INDICOLSA SAS no hará devolución del dinero.

## II. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA INSPECCIÓN

1. Memorias de cálculo del proyecto firmadas por el diseñador. (Formato físico o digital extensión PDF). Según aplique Artículo 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 del RETIE.
2. Planos eléctricos del proyecto firmados por el diseñador (Formato físico o digital extensión PDF).
3. Planos eléctricos del proyecto firmados por el constructor (Formato físico o digital extensión PDF).
4. Certificado de conformidad de producto de acuerdo con el artículo 10.3 del RETIE. Incluidos en la tabla 2.1. (Formato físico o digital extensión PDF).
5. Declaración de cumplimiento del RETIE, formato Artículo 34.9 del RETIE 2013, (Formato físico o digital extensión PDF) numerado y firmada por el constructor de la obra eléctrica.
6. Fotocopia de la tarjeta profesional tanto del constructor como diseñador eléctrico e interventor (si aplica). Artículo 10.2. RETIE.
7. Autorización escrita del profesional constructor electricista (quien firma la declaración de cumplimiento) a un delegado de mínimo las misma competencia profesional y legal del constructor. Esta la debe firmar el delegante y el delegado. RETIE 34.3 (en caso de no estar presente el constructor firmante de la declaración).
8. Copia del registro de inspección ante la SIC del constructor de la obra eléctrica (Artículo. 10.2.2 RETIE 2013).

*Nota 1. En caso de entregar información técnica en formato digital, el diseñador debe entregar una declaración de responsabilidad de documentos en medio magnético firmada en donde especifique los archivos que entrega; y los archivos preferiblemente deben venir en formato PDF para evitar su modificación.*

*Nota 2. El propietario de la instalación o el responsable de su construcción deben entregar al organismo de inspección la documentación completa que le aplique a la instalación, así mismo debe permitir el desarrollo y la ejecución de las pruebas y las mediciones necesarias para la verificación de la conformidad con RETIE. Articulo 34.3 literal b. VER PC-FR-13 ANEXO OFERTA COMERCIAL.*

## III. RECERTIFICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Para la inspección de instalaciones eléctricas que requieran recertificación, deben entregar el (los) dictamen(es) emitidos anteriormente por el OI acreditado donde certifique la conformidad de la instalación eléctrica.
Las instalaciones eléctricas energizadas con anterioridad a la vigencia del RETIE, no requerirá la declaración del responsable de la construcción, ni certificados de productos.

El organismo de inspección debe verificar que la instalación eléctrica es segura para las personas o animales para dar cumplimiento al artículo 34.6 del Anexo General del RETIE. Así como indicar en el dictamen de inspección la observación de la condición de renovación de la inspección.

## IV. CONSIDERACIONES TECNICAS ESPECIALES

1. Una vez recibida la información INDICOLSA SAS programará la visita y asignará un inspector calificado, el cual será un ingeniero electricista, eléctrico, electromecánico, de distribución, con matrícula profesional y competencia RETIE vigente, además de contar con la experiencia necesaria para la inspección de la obra en mención.
2. INDICOLSA SAS se comunicará con el contacto del proyecto y coordinará la logística de la prestación del servicio según alcance contratado. El ingeniero inspector en sitio realizará una reunión de apertura y cierre de la visita de inspección, el cual se solicita preferiblemente disponer de un lugar o espacio adecuado. Nota: En caso de reprogramar la visita en sitio se debe informar a INDICOLSA S.A.S. con un tiempo de ocho (8) horas de anterioridad a la hora programada. Se dejará constancia por escrito a los correos electrónicos suministrados.
3. Dado que el proceso de inspección es una validación de la declaración de cumplimiento, en la inspección debe estar presente la persona responsable de la instalación eléctrica, es decir, quien suscribe dicha declaración, y solo se permitirá delegar tal actividad, mediante documento escrito firmado por el delegante y el delegado, este último debe ser un profesional de la misma competencia técnica y legal del responsable de la construcción. En el dictamen se dejará constancia del hecho. Artículo 34.3 literal b.
4. El constructor de la instalación debe estar acompañado de personal técnico competente para que maniobre los elementos de la instalación objeto de inspección que requieran ser destapados, accionados y/o extraídos para efectos de pruebas y

mediciones por parte del inspector de INDICOLSA. Este personal debe tener y usar adecuadamente los EPI (Equipos de Protección Individual), así mismo contar con la respectiva afiliación a riesgos profesionales.
En instalaciones que requiera trabajo en alturas es deber del constructor tener personal certificado, según normatividad vigente.

5. Si durante el análisis de riesgo y/o en cualquier momento de la inspección, el inspector considera que no se dan las condiciones de seguridad o desarrollo de sus actividades, este podrá suspender la inspección hasta que las condiciones de seguridad se den.
6. En todo proceso de inspección INDICOLSA S.A.S., se obliga a realizar las medidas, pruebas y ensayos eléctricos mediante los cuales se pueda determinar la conformidad de la instalación eléctrica objeto de inspección. El responsable de la instalación eléctrica debe disponer de instalaciones eléctricas energizadas durante la inspección con el fin de poder adelantar las respectivas verificaciones y ensayos funcionales.
7. No acepta certificaciones parciales. Las instalaciones deben estar completamente terminadas en un cien por ciento (100%), se realizará la inspección únicamente de lo contratado y terminado. Artículo 34.3 literal r.
8. En caso de que la inspección RETIE requiera medición de campos electromagnéticos y/o tensiones de paso y de contacto en conformidad con el Art. 15.5.3. Y Art. 14.4 del RETIE RESOLUCIÓN 90708 / 2013. La labor se realizará subcontratando la prestación de equipos o servicios que estén debidamente acreditados y certificados según aplique. INDICOLSA S.A.S. conservará la responsabilidad frente a la conformidad de dichos productos o servicios, evaluará e informará el costo de dichas mediciones en caso de que aplique.
9. El Director Técnico cuenta con (5) días hábiles para la revisión y aprobación del expediente de la instalación eléctrica, en el proceso de revisión puede detectar No Conformidades, las cuales deberán ser subsanadas por el cliente conforme a lo descrito en el numeral (5) de las consideraciones económicas comerciales del presente documento, previo a la emisión de dictamen (es) por parte del inspector.
10. En cumplimiento del Artículo 34.3 literal o de la Resolución 90708 de agosto 30 de 2013, los dictámenes emitidos por el organismo quedan registrados, cargados en la página web del organismo y la plataforma de la SIC – SICERCO como lo establece la Resolución N. 40056 del 03 de febrero de 2022 del Ministerio de Minas y Energía o la que la modifique, adicione o sustituya. **Nota:** La plataforma del DIIE – se constituirá como un sistema de solo consulta hasta el 4 de febrero de 2023.
11. En cumplimiento al Artículo 34.3 literal q. RETIE. ". "Los organismos de inspección deben reportar a la SIC, dentro de los 10 días hábiles, siguientes a la terminación del plazo dado

para cerrar las no conformidades, aquellas instalaciones inspeccionadas que no fueron aprobadas".

12. INDICOLSA S.A.S., establece el plazo de quince (15) días hábiles a partir de expedido el(los) dictamen(es) para registro, cargue y publicación de los certificados, excepto en instalaciones cuyo resultado haya sido de no aprobada. Resolución 9 0708 de 2013, Resolución 40056 de 2022, Resolución 72736 de 2022 norma que la modifique, adicione o sustituya.
13. La entrega del(los) dictamen (es) se realizará dentro de los (5) días hábiles siguientes a la revisión por parte de la dirección técnica, sujeto al cumplimiento del numeral (5) consideraciones comerciales y el numeral (9) consideraciones técnicas del presente documento.
14. La entrega del (los) dictamen(es) será(n) enviado(s) por correo electrónico al propietario, al constructor o el representante legal del proyecto o a quien se delegue (CON AUTORIZACIÓN). Igualmente estarán disponibles para su descarga en PDF de la página web del organismo. *Nota: Los dictámenes contarán con firma digital expedida por una entidad de certificación digital acreditada que garantiza su autenticidad, según marco legal (Ley 527 de 1999 - Decreto ley 0019 de 2012 - Decreto 2364 de 2012 - Decreto 333 de 2014, o la norma que le sustituya, modifique o derogue).*
15. Desde el momento en que el organismo realiza la entrega de l(os) dictamen(es) de inspección, y el cliente y/o propietario de la instalación declaran que reciben a conformidad, cuentan con un tiempo límite de 5 días hábiles para realizar la revisión total del documento y hacer las reclamaciones pertinentes y/o solicitud de corrección.
16. INDICOLSA S.A.S podrá anular el dictamen de inspección posterior a su expedición y reportar ante la autoridad competente, cuando se presente alguna de las siguientes causales:
    - Cuando la instalación ha sido objeto de modificaciones que permitan el fraude de energía.
    - La instalación ha sufrido modificaciones que no cumplen los requisitos técnicos establecidos y ofrecen alto riesgo.
    - Utilización del dictamen de inspección de manera engañosa o fraudulenta.
17. El cliente debe permitir el acceso al equipo evaluador de ONAC a atestiguar las actividades de inspección de sus instalaciones cuando estas hayan sido realizadas por INDICOLSA S.A.S. La no aceptación por parte de un cliente de INDICOLSA de esta condición implicará la imposibilidad de emitir certificados/informes con la acreditación del ONAC a ese cliente. Esto se establece en documento RAC-3.0-01 versión 08 artículo 6.4.2. Último párrafo indica lo siguiente: “El OEC debe establecer disposiciones documentadas para permitir el acceso del equipo evaluador de ONAC a atestiguar estas actividades de determinación en las instalaciones de sus clientes. La no

aceptación por parte de un cliente del OEC de esta condición implicará la imposibilidad de emitir certificados/informes con la acre de ONAC a ese cliente".

## V. IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA

INDICOLSA S.A.S. informa que, en cumplimiento de sus políticas de imparcialidad, independencia, valores corporativos y confidencialidad, ningún inspector o funcionario está facultado a hacer diseños, asesorías, construcciones, arreglos e interventorías de una instalación a inspeccionar. El cliente está en la obligación de informar a INDICOLSA S.A.S. Si lo anterior no se cumple.

El propietario de la instalación o el responsable de su construcción debe abstenerse de dar incentivos o cualquier tipo de dinero al inspector. Se aclara que el inspector no tiene facultad de pedir o exigir ningún tipo de dinero por ningún concepto. Todos los temas relacionados a costos adicionales serán atendidos por el área comercial de INDICOLSA S.A.S.

## VI. TRATAMIENTO Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

INDICOLSAS S.A.S., en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y requisitos de la Norma NTC-ISO/IEC 17020:2012 se compromete a guardar reserva de la información entregada por el cliente y los registros, evidencias y hallazgos tomados en obra. Dicha información únicamente se publicará por requerimientos legales y/o autorización del cliente mediante acuerdos contractuales y notificar de manera previa sobre su divulgación, salvo esté prohibido por la ley.
INDICOLSA SAS. Guardara la información por los periodos de tiempo que establece el RETIE dependiendo el tipo de instalación.

## VII. QUEJAS Y APELACIONES

El cliente tiene derecho a presentar quejas relacionadas por la prestación del servicio de inspección o la atención del personal que realiza las inspecciones utilizando los siguientes medios:

- Escrito: diligenciando el formato PC-FR-08 recepción de PQA y depositándolo en el buzón ubicado en las instalaciones de la empresa.
- Correo electrónico: enviando correo a gerencia@indicolsa.com

- Personal: dirigiéndose al Gerente de INDICOLSA S.A.S. en la Cll 15 N. 40 01 oficina 417 lobby 3 Centro Comercial Primavera Urbana.
- Teléfono: llamando a la oficina de INDICOLSA S.A.S. Tel 608 6784695 y Cel 3118026346.

Se informa al cliente que el procedimiento de peticiones, quejas y apelaciones y el formato de PQA, se puede consultar en el siguiente link, de la página web del organismo.

**http://www.indicolsa.com/pqrsinfo.php**

El propietario de la instalación o responsable de la construcción tiene derecho a presentar apelación ante INDICOLSA S.A.S., por las decisiones y resultados de la inspección emitidos por el organismo con las cuales no esté de acuerdo, estas deben ser presentadas por escrito, debidamente sustentadas dentro de los cinco (5) días hábiles después de haberse notificado la decisión. Si transcurridos los cinco (5) días hábiles a la notificación de la decisión, no se presenta apelación, se entenderá que acepta la decisión de INDICOLSA S.A.S, sin lugar a posteriores apelaciones o reclamaciones.

*Nota: La inspección con fines de demostrar la conformidad con RETIE la debe contratar el constructor (obra civil), el propietario o representante legal del proyecto donde está incorporada la instalación eléctrica, quien será el dueño del certificado, según el capítulo 9. articulo 34.3 literal b.*

## VIII. MÉRITO EJECUTIVO

El presente acuerdo comercial, prestará por sí mismo mérito ejecutivo para exigir el cumplimiento de todas las obligaciones que puedan derivarse del mismo. Sin perjuicio de la Resolución que de este pueda hacer cualquiera de las partes, en cualquier tiempo, por el no pago del precio conforme a lo estipulado en este acuerdo. Para exigir el pago de cualquier suma de dinero a cargo de una cualquiera de las partes u obligaciones derivadas, se acudirá al procedimiento ejecutivo ante los jueces de la República de Colombia.

IX.

De esta forma se hacen exigibles las obligaciones y prestaciones contenidas en él. En consecuencia, las Partes acuerdan en forma expresa, que este acuerdo comercial suscrito por el cliente, constituirán título ejecutivo suficiente para que INDICOLSA S.A.S exija por vía judicial el cumplimiento de las obligaciones dinerarias a cargo de aquel.

## ACEPTACION DE LAS PARTES

**Aceptación por parte del cliente** **Representante Legal INDICOLSA S.A.S**

**Firma:** _____ **Firma:** _____

**Nombre del cliente:** ISABELLA URQUIJO CAMACHO **Nombre: Jhon A. Espinosa Lancheros**
R.L CONSORCIO POLICIA-ACACIAS 2023

**C.C. No.** 1.122.143.748 **C.C. No. 86.050.181**

*Nota 1. Al suscribir el presente acuerdo, el cliente asegura entender y aceptar cada uno de los términos y condiciones aquí pactados y autoriza a INDICOLSA S.A.S para iniciar con el respectivo proceso de certificación de su(s) instalación(es).*

ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Acacias, 12 de agosto de 2024.

Señores
**MINISTERIO DEL INTERIOR**

**REFERENCIA:** **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META".**

## CERTIFICACIÓN DE ACREDITACIÓN DE PAGO INTEGRAL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de Diciembre del 2002, bajo la gravedad de juramento

## CERTIFICO QUE:

El **Municipio de Acacias** Identificado con **NIT: 892.001.457-3** ha cumplido de forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello habido lugar, en cuanto a Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar.

Atentamente,

ARMANDO CABRERA CALDERON
CONTADOR MUNICIPAL

Proyectó: Ingry madelan mosquera/Tesorera
