Becerril POSITIVO ALCALDÍA MUNICIPAL pdet	**FORMATO** **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
Convenio Interadministrativo No. 1532 de 2020, MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 11 ENTRE CALLES 10 Y 11 – BARRIO ALTO PRADO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$1.250.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-12-2020		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	30-08-2021	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**	30-11-2021
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR	**DESDE:** 27-01-2021	
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	Arq. JORGE ANDRES REALES MARTINEZ	28-12-2020	28-12-2020
	Ing. civil	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
	NOMBRE	**DESDE**	**HASTA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Ing. Harri Manrrique	27-01-2021	ACTUAL
	Ing. Rafael Ortiz		ACTUAL
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 98	17-02-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No.254	14-05-2021	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. _____	DD-MES-AAAA	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. AA058062	20-01-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27-01-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	**FECHA:** 12/05/2021	
	SEGUNDA PRÓRROGA	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	PRIMERA MODIFICACIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
	REINICIO 01	**FECHA:** DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**FECHA:30/05/2022** DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000,00		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000,00		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	$0		
VALOR DE OBRA	$ 1.041.667.000,00		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 125.000.000,00		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 0		

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. El MINISTERIO desembolsará su aporte de la siguiente manera: 1). ANTICIPO. El Ministerio del Interior entregará al MUNICIPIO a título de anticipo un treinta y cinco por ciento (35%) del valor total del convenio que equivale a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($437.500.000), previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, constitución de la cuenta, presentación por parte del Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto. PARÁGRAFO PRIMERO. El manejo de los recursos entregados al MUNICIPIO a título de anticipo deberá realizarse en cuenta bancaria separada de ahorros, no conjunta, a nombre del convenio de cofinanciación suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al Ministerio del Interior. PARÁGRAFO SEGUNDO. Plan de Inversión del Anticipo: EL MUNICIPIO debe presentar a la Entidad el plan de inversión y manejo del anticipo, el cual será aprobado por EL MINISTERIO, a través del supervisor del convenio. La o las entregas que se realicen del anticipo deberá(n) obtener visto bueno del supervisor designado por EL MINISTERIO. PARÁGRAFO TERCERO. Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo: El siguiente es el procedimiento para efectuar el seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo por parte del Supervisor del MINISTERIO: 1. Verificar traslado de efectivo y cheques girados y copias de las órdenes de pago con sus respectivos soportes, certificando que corresponden al Plan de Inversión del Anticipo. 2. Balance del estado del anticipo, elaborando informes mensuales indicando el saldo del anticipo, beneficiarios de los pagos y saldo final. 3. El MUNICIPIO y el SUPERVISOR del MINISTERIO revisarán conjuntamente los movimientos financieros con la correspondiente liquidación de intereses, que servirán para posteriores revisiones del MINISTERIO y de los organismos de control. PARÁGRAFO CUARTO. Amortización del Anticipo: Se realizará en cada desembolso parcial, de acuerdo con los siguientes porcentajes: 60% en el primer desembolso y el 40% final en el segundo desembolso.	N/A	18/02/2021	$437.500.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	2). UN PRIMER DESEMBOLSO, por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES PESOS MCTE ($375.000.000),previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de	30%	02/09/2021	$ 375.000.000

		pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO. B. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. C. Certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. D. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra, la cual debe incluir: I. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, II. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. E. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. F. Presentar amortización de mínimo el 60% del anticipo.			
TERCER DESEMBOLSO		3). UN SEGUNDO DESEMBOLSO, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($337.500.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de ejecución de obra mínimo del 60%, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. C. Presentar amortización del 100% del anticipo.	60%	26/10/2021	$337.500.000
ULTIMO DESEMBOLSO		4). UN ÚLTIMO DESEMBOLSO, hasta por la suma de CIEN MILLONES PESOS MCTE ($100.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	100%	12/11/2021	$100.000.000
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME					$1.250.000.000
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)					$1.034.952.528

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: la equidad seguros generales organismo cooperativo.


PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
AA058062	Cumplimiento	$250.000.00,00	30/12/2020	30/05/2022
	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$437.500.000,00	30/12/2020	30/05/2022
	Calidad del servicio	$250.000.000,00	30/12/2020	30/05/2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra***


DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 064 del 14 de mayo de 2021.	REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR		$ 1.124.948.400,00
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE AL PARQUE KENY RENE VEGA LUQUEZ		NIT C.C. 77.174.668
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/06/2021		Duración: Seis 06 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	03/06/2021	**Fecha Actual de terminación del contrato**	02/12/2021
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$1.124.948.400,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
PÓLIZA No.	No. 65-44-101198270 **Aprobada:** 03/06/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 03/06/2021		
	Calidad del Servicio: 03/06/2021		



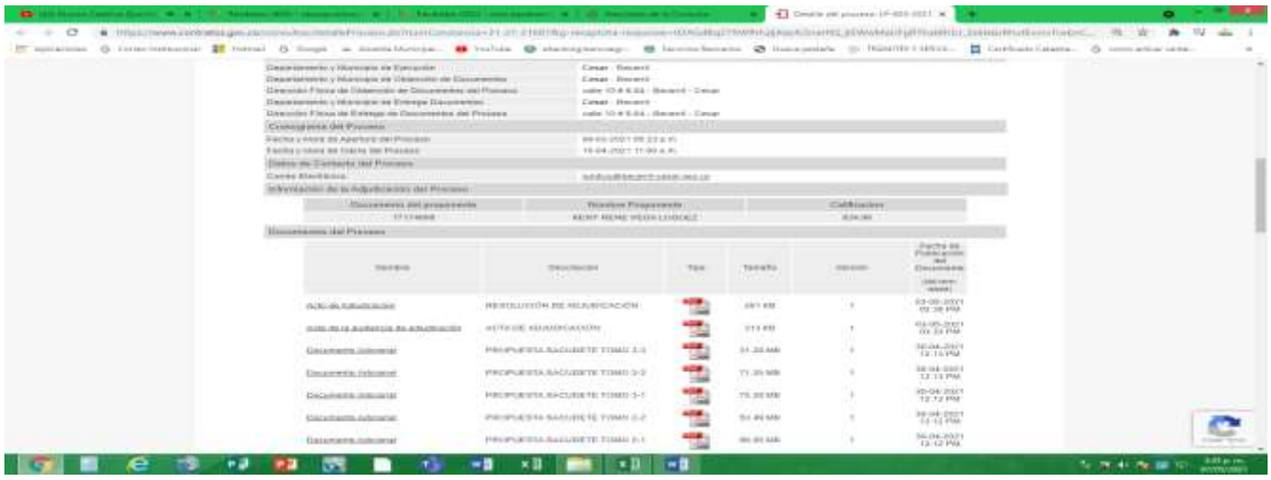

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato: 066 del 26 de mayo de 2021.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 UBICADO EN MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR		$ 124.459.196,40
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/.....		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA SACUDETE BECERRIL 2021 JAIDER MENDOZA		NIT. C.C.
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/06/2021		Duración: Seis 06 meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha Inicial de terminación del contrato	DD/MM/AAAA	**Fecha Actual de terminación del contrato**	DD/MM/AAAA
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$124.459.196,40
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS MUNDIAL**		
PÓLIZA No.	No. M-100142497 **Aprobada:** 02/06/2021		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 01/06/2021		
	Calidad del Servicio: 01/06/2021		

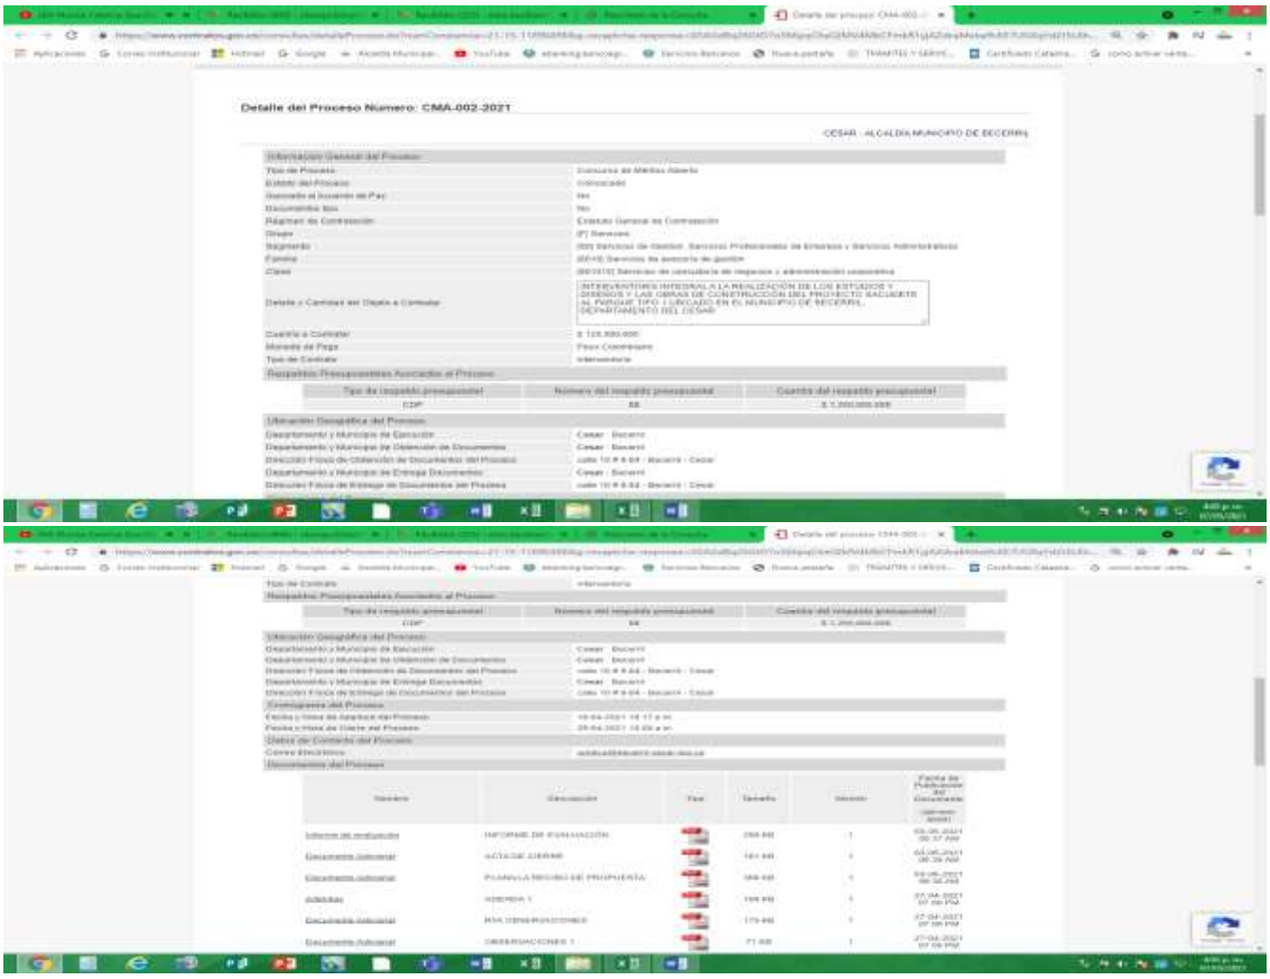

5. INFORME TECNICO

INTRODUCCION	Sacúdete al parque Tipo 1, Ubicado en el Municipio de Becerril Cesar, zona urbana, con disponibilidad de acceso y servicios públicos.

- ***Avance de Estudios, Diseños y de Obra***

CONTRATO DE OBRA N° 064 de 2021	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100.00%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100.00%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	0%
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	100.00%
OBSERVACIONES: CONTRATO EN EJECUCIÓN.	

- ***Avance de Interventoría Estudios, Diseños y Obra***

CONTRATO DE OBRA N° 064 de 2021	
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	100.00%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	100.00%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	

AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	100.00%
OBSERVACIONES: CONTRATO EN EJECUCIÓN.	

- ***Gestión técnica y documental.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
06-2021	Comités de seguimientos virtuales en la etapa de estudios y diseños.	Durante el presente mes se han realizado diferentes comités técnicos de manera virtual con el objetivo de dar seguimiento a la elaboración de los estudios y diseños y además verificar el avance del convenio.
07-2021	Documento a afina	Solicitud del servicio de energía
08-2021	Visita al predio	Se realizo recorrido en compañía de contratista y supervisor al sitio de la obra

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE


- ***Personal actual vigente aprobado por la Supervisión del Municipio.***

NOMBRE	CARGO
ALDO RAFAEL DAZA FUENTES	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

- ***Información Avance Físico – Avance Financiero***

ACTA N°	% EJECUCION	EGRESO N°	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO		ACUMULADO
					AMORTIZADO	SALDO	
1	51.00%			$573.723.684			$573.723.684
2	41.00%			$461.228.844			1.034.952.528
TOTALES							

GRAFICA AVANCE FISICO – AVANCE FINANCIERO DEL CONVENIO SE DEBE COLOCAR EL AVANCE REAL QUE SE TIENE A LA FECHA.

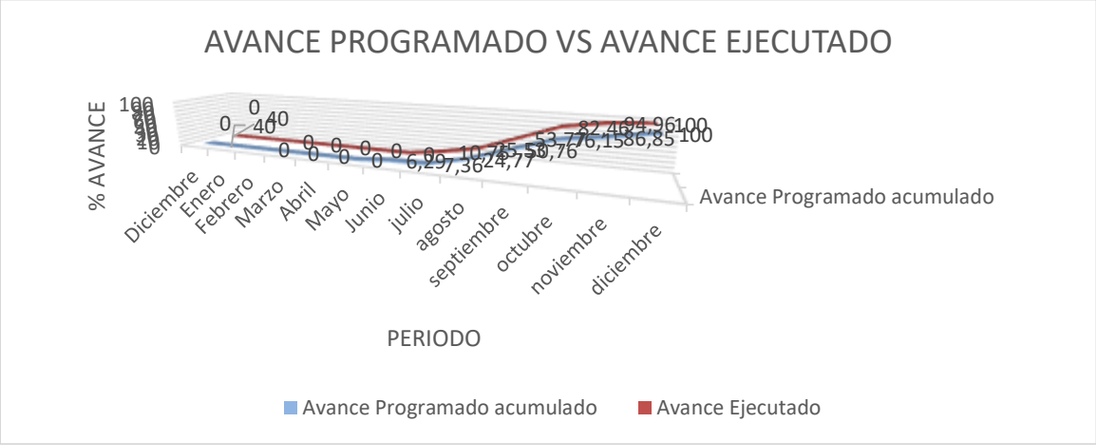

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
1.1	**VISITAS TECNICAS**	**EJECUTADO**	**100.00%**









OBSERVACIONES:
Cancha sintética, cerramiento área útil de la cancha, zona de juegos
Se puede observar uso de la comunidad a la SACUDETE

PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCION PROPUESTOS.	

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

10/02/2021					
11/08/2021					

8. SUPERVISOR

ING. ALDO RAFAEL DAZA FUENTES Supervisor del Convenio Secretario de Obras Públicas	**ING. _____** Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Planeación/Infraestructura

Se Anexan ( ) Folios
