MEMORANDO

MEM2021-13049-SIN-4020
Bogotá D.C. miércoles, 30 de junio de 2021

PARA: Laura Cristina Quintero Chinchilla, Subdirectora de Gestión Contractual

DE: Subdirector de Infraestructura

ASUNTO: REMISIÓN INFORMES DE SUPERVISIÓN MES DE JUNIO 2021.

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia la siguiente documentación de los Convenios aquí descritos:

#	MES Y AÑO DEL INFORME	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	N° CONVENIO
1	Junio 2021	Astrea	Cesar	1400-2020
2	Junio 2021	Becerril	Cesar	1532-2020
3	Junio 2021	La Jagua De Ibirico	Cesar	1541-2020
4	Junio 2021	Valledupar	Cesar	1504-2020
5	Junio 2021	Tuluá	Valle del Cauca	1396-2020
6	Junio 2021	Gachalá	Cundinamarca	943-2021
7	Junio 2021	El Molino	La Guajira	1309-2020
8	Junio 2021	Buenavista	Boyacá	1399-2020
9	Junio 2021	Pijiño Del Carmen	Magdalena	1415-2020
10	Junio 2021	La Tebaida	Quindío	1524-2020
11	Junio 2021	Milán	Caquetá	1525-2020
12	Junio 2021	Juradó	Choco	986-2021
13	Junio 2021	Villanueva	La Guajira	1002-2021
14	Junio 2021	Ubaté	Cundinamarca	1442-2020
15	Junio 2021	Chipaque	Cundinamarca	1502-2020
16	Junio 2021	Mapiripan	Meta	1503-2020
17	Junio 2021	Granada	Meta	1520-2020
18	Junio 2021	Paratebueno	Cundinamarca	1535-2020
19	Junio 2021	Paz de Ariporo	Casanare	0944-2021
20	Junio 2021	Restrepo	Meta	1066-2021
21	Junio 2021	Puerto Leguizamo	Putumayo	1392-2020
22	Junio 2021	Restrepo	Valle del Cauca	1391-2020
23	Junio 2021	San Pedro	Valle del Cauca	1534-2020
24	Junio 2021	Bojacá	Cundinamarca	1307-2020
25	Junio 2021	Nocaima	Cundinamarca	1531-2020
26	Junio 2021	Villeta	Cundinamarca	988-2021
27	Junio 2021	Fusagasugá	Cundinamarca	962-2021
28	Junio 2021	Riofrío	Valle del Cauca	1062-2021
29	Junio 2021	La Virginia	Risaralda	1305-2020
30	Junio 2021	Calamar	Guaviare	1306-2020
31	Junio 2021	Dosquebradas	Risaralda	1348-2020
32	Junio 2021	San José del Guaviare	Guaviare	1444-2020
33	Junio 2021	Abrego	Norte de Santander	1530-2020
34	Junio 2021	Quinchía	Risaralda	941-2021
35	Junio 2021	Mistrató	Risaralda	977-2021

Cordialmente,

IVÁN DARÍO GONZALEZ CUELLAR
Supervisor del Convenio

Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verificación:
https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?id=RZmdi0pcrwdNtpXCs0kuzkrjsfcR3HcxC1DtBTjXjl8%3D

Elaboró: Ing. Rafael Andrés Ortiz Ramirez / Apoyo a la Supervisión
Reviso: Ing. Harry Manrrique / Profesional Especializado
Aprobó: Iván Darío González Cuellar – Supervisor del Convenio.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. 1532 de 2020, BECERRIL – CESAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JUNIO DE 2021.**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el Municipio de Becerril – Cesar.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 11 ENTRE CALLES 10 Y 11 – BARRIO ALTO PRADO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		**$1.250.000.000,00**
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$1.250.000.000,00**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28-12-2020		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30-08-2021		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR	28/12/2020	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. JOSÉ ANDRÉS REALES	28-12-2020	15-03-2021
	ING. HARRY MANRRYQUE	16-03-2021	16-03-2021
	ING. RAFAEL ANDRÉS ORTIZ RAMIREZ	17-03-2021	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 81820	28-12-2020	$ 437.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO	No. 6021	12-01-2021	$ 812.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	DD/MM/AAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. AA058062 EQUIDAD SEGUROS	27-01-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27-01-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 12//05/2021
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 30/05/2022 FECHA: DD/MM/AAAA FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000		

VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR DE OBRA	1.041.667.000
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 0,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1). ANTICIPO.** El Ministerio del Interior entregará al MUNICIPIO a título de anticipo un treinta y cinco por ciento (35%) del valor total del convenio que equivale a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($437.500.000) M/L, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, constitución de la cuenta, presentación por parte del Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: **A.** Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; **B.** Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto**. Parágrafo Primero**. El manejo de los recursos entregados al MUNICIPIO a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada de ahorros, no conjunta, a nombre del convenio de cofinanciación suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al Ministerio del Interior**. Parágrafo Segundo**. Plan de Inversión del Anticipo: EL MUNICIPIO debe presentar a la Entidad el plan de inversión y manejo del anticipo, el cual será aprobado por EL MINISTERIO, a través del supervisor del convenio. La o las entregas que se realicen del anticipo deberá(n) obtener visto bueno del supervisor designado por EL MINISTERIO. **Parágrafo Tercero**. Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo: El siguiente es el procedimiento para efectuar el seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo por parte del Supervisor del MINISTERIO: 1. Verificar traslado de efectivo y cheques girados y copias de las órdenes de pago con sus respectivos soportes, certificando que corresponden al Plan de Inversión del Anticipo. 2. Balance del estado del anticipo, elaborando informes mensuales indicando el saldo del anticipo, beneficiarios de los pagos y saldo final. 3. El MUNICIPIO y el SUPERVISOR del MINISTERIO revisarán conjuntamente los movimientos financieros con la correspondiente liquidación de intereses, que servirán para posteriores revisiones del MINISTERIO y de los organismos de control. **Parágrafo Cuarto**. Amortización del Anticipo: Se	N/A.	18/02/2021	$ 437.5000.000

	realizará en cada desembolso parcial, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 60% en el primer desembolso y el 40% final en el segundo desembolso.			
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2). UN PRIMER DESEMBOLSO**, por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($375.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO. B. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. C. Certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. D. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra, la cual debe incluir: I. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, II. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. E. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. F. Presentar amortización de mínimo el 60% del anticipo.	00%	DD/MM/AAAA	$ 000.000.000
TERCER DESEMBOLSO	**3). UN SEGUNDO DESEMBOLSO**, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($337.500.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de ejecución de obra mínimo del 60%, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. C. Presentar amortización del 100% del anticipo.	00%	DD/MM/AAAA	$ 000.000.000
CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO	**4). UN ÚLTIMO DESEMBOLSO**, hasta por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con	100%	DD/MM/AAAA	$ 00.000.000

	registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Con fundamento en la documentación enviada por el MUNICIPIO para cada desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo del MUNICIPIO, el supervisor del Convenio por parte del MINISTERIO, certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del MUNICIPIO.			
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$437.500.000**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
AA058062	Cumplimiento	$ 250.000.000	30-12-2020	04-03-2022
	Anticipo	$ 437.500.000.000	30-12-2020	04-03-2022
	Calidad de servicio	$ 250.000.000	30-12-2020	04-03-2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 064 del 14 de mayo de 2021.	REALIZACIÓN LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PORYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR.		$ 1.124.948.400
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACÚDETE BECERRIL 2021 R.L. KENY RENE VEGA LUQUEZ		C.C. 77.174.668 de Valledupar
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.124.948.400**
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Interventoría Estudios, Diseños y Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 066 del 26 de mayo de 2021.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PORYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR.		$ 124.459.196,40
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 124.459.196,40**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**apertura**		
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: ABRIL-21	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		N/A
INFORME FINANCIERO		**X**
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 437.700.911,24 A corte abril de 2021.	**X**
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		**X**
OTROS		N/A

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**-**
% EJECUTADO DE OBRA	**-**

EN EJECUCIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS.

- Durante los días 10 de junio de 2021, se solicitan vía correo electrónico documentos correspondientes al convenio.

- Los días 08 y 24, de junio de 2021, se realizaron reuniones de manera virtual con presencia del apoyo a la supervisión por parte del municipio de Becerril Cesar, contratista de los estudios, diseños y ejecución de obra como también el contratista de la interventoría, las reuniones tuvieron como objeto la verificación, avance y cumplimiento en la ejecución de los estudios y diseños del proyecto, el día 24 de junio de 2021 la alcaldía municipal de Becerril Cesar realiza la entrega de los estudios y diseños.

- El día 23 de junio de 2021 se remite vía correo electrónico el cuadro maestro de ejecución el cual contiene información relacionada del presente convenio.

- El día 26 de junio de 2021, se realiza reunión de manera virtual la cual fue liderada por el ingeniero Harry Manrrique, donde se verifica y da seguimiento al cuadro maestro de ejecución de los convenios baja mi apoyo a la supervisión.

- La entidad municipal a la fecha no aporta los informes mensuales de supervisión con su anexo financiero.

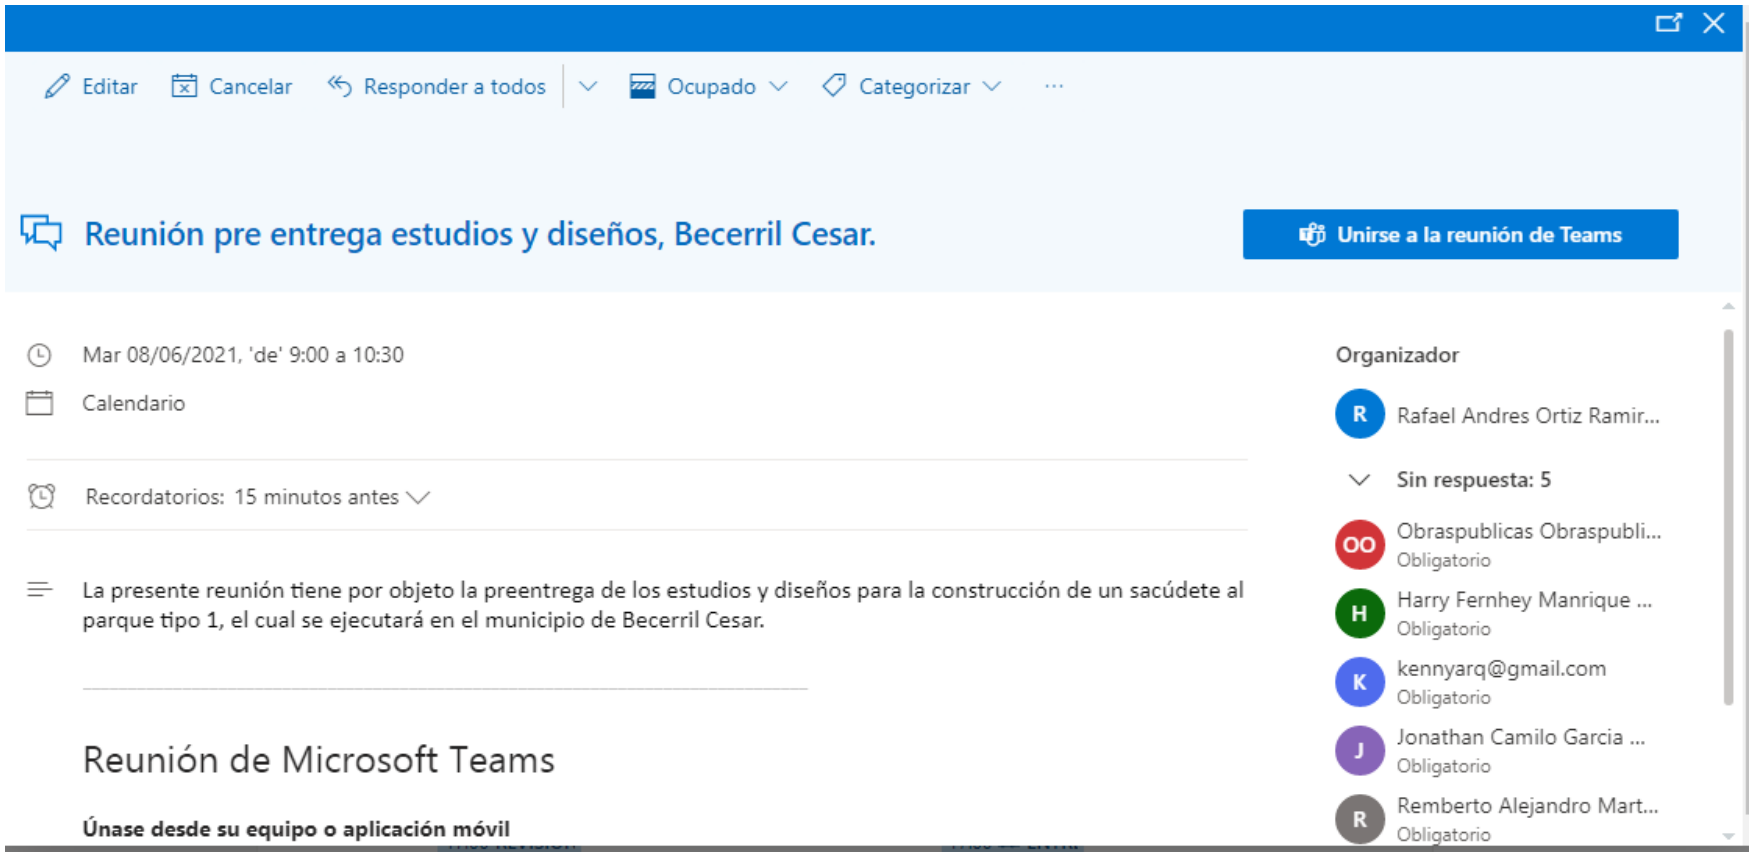
A continuación, se anexa lo enunciado.

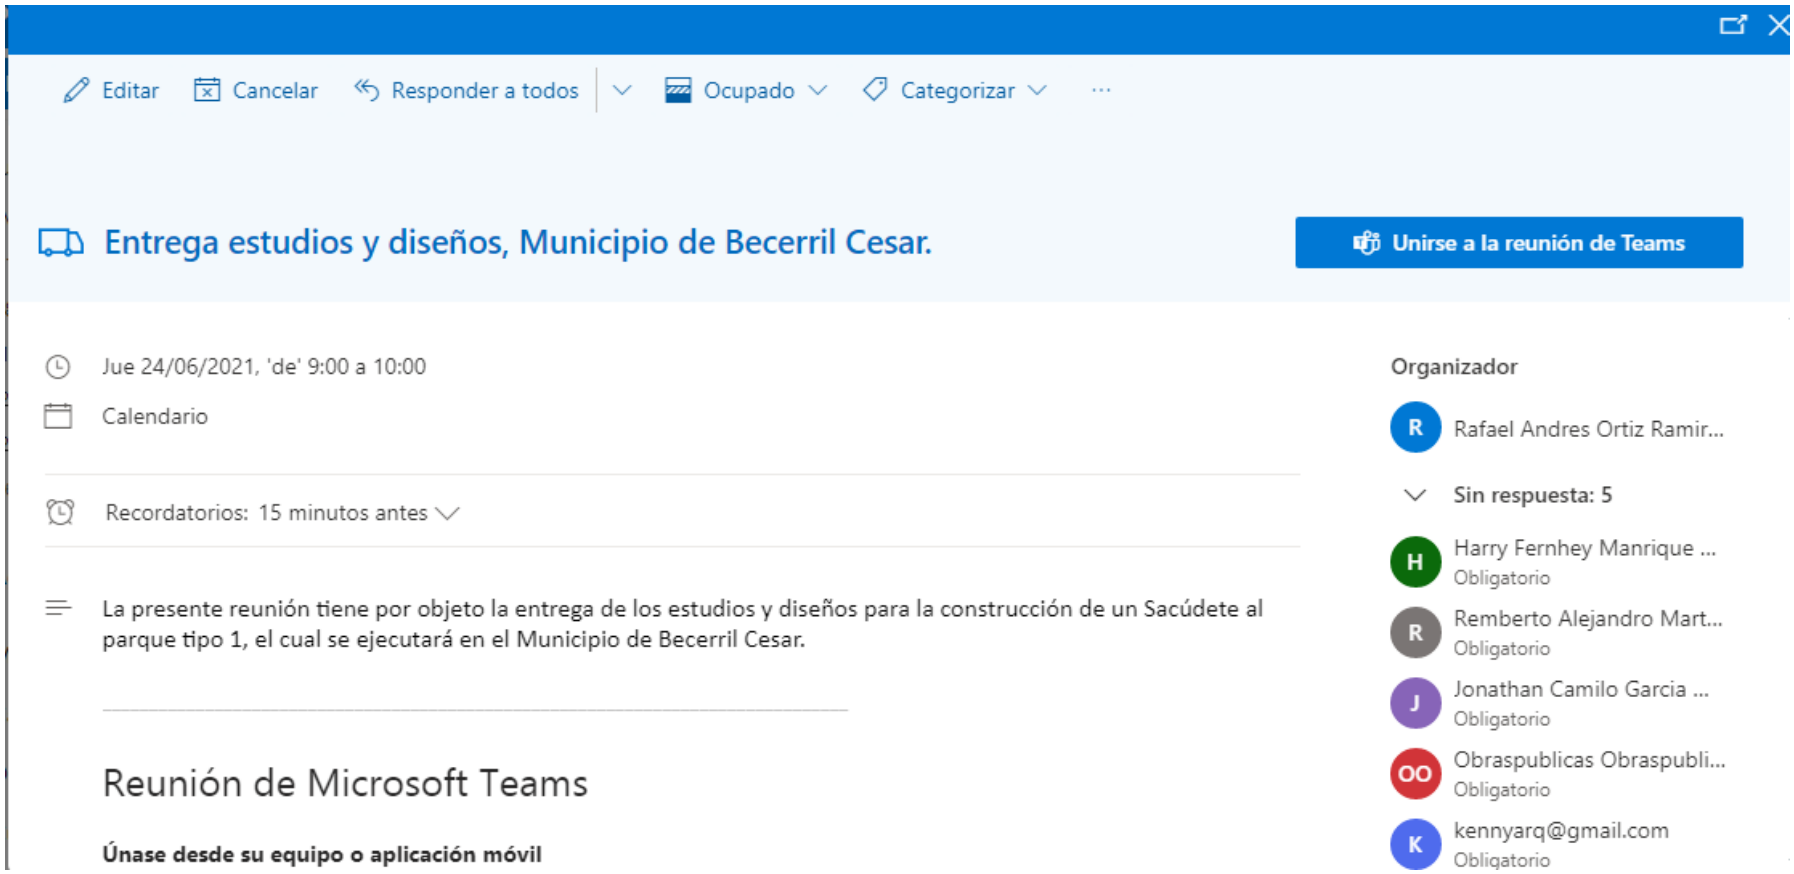
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

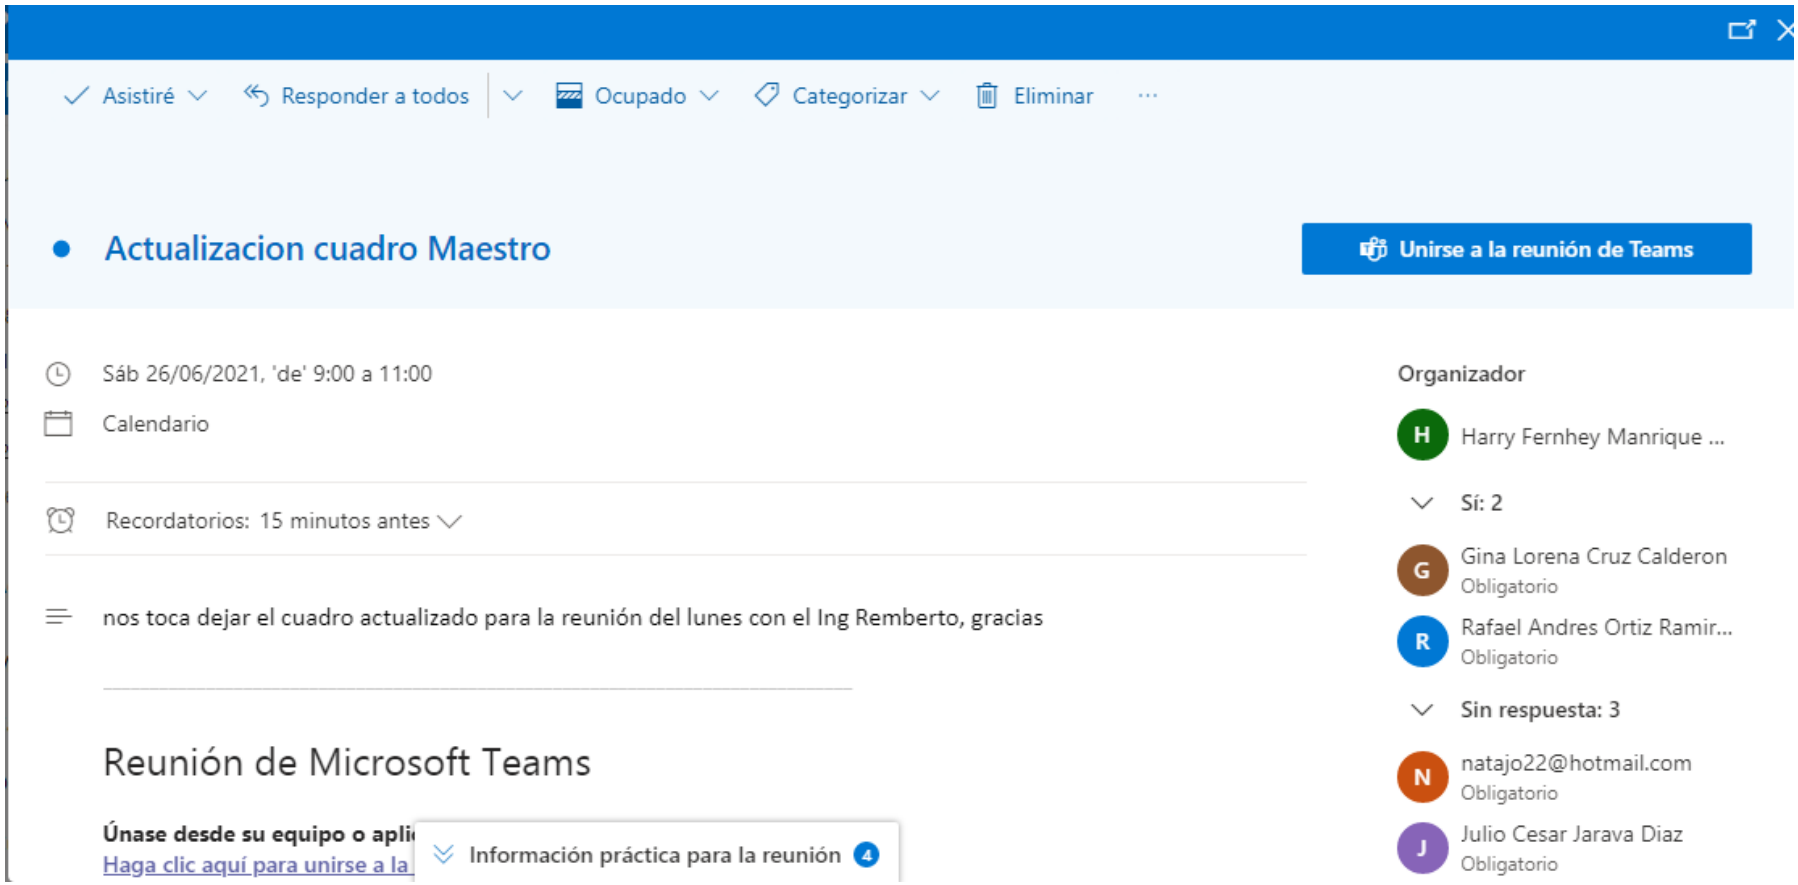
10-02-2021	Visita realizada por el Ingeniero José Andrés Reales	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

ARQ. IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR **Subdirector de Infraestructura** Supervisor Convenio No. 1532 de 2020 Subdirección de Infraestructura Ministerio - FONSECON	Ing. Rafael Andrés Ortiz Ramirez **ING. RAFAEL ANDRES ORTIZ RAMIREZ** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Infraestructura Ministerio - FONSECON


Editar
Cancelar
Responder a todos
Ocupado
Categorizar
Reunión pre entrega estudios y diseños, Becerril Cesar.
Unirse a la reunión de Teams
Mar 08/06/2021, 'de' 9:00 a 10:30
Calendario
Recordatorios: 15 minutos antes
La presente reunión tiene por objeto la preentrega de los estudios y diseños para la construcción de un sacúdete al parque tipo 1, el cual se ejecutará en el municipio de Becerril Cesar.
Reunión de Microsoft Teams
Únase desde su equipo o aplicación móvil
Organizador
Rafael Andres Ortiz Ramir...
Sin respuesta: 5
Obraspublicas Obraspubli...
Obligatorio
Harry Fernhey Manrique ...
Obligatorio
kennyarq@gmail.com
Obligatorio
Jonathan Camilo Garcia ...
Obligatorio
Remberto Alejandro Mart...
Obligatorio


Editar
Cancelar
Responder a todos
Ocupado
Categorizar
Entrega estudios y diseños, Municipio de Becerril Cesar.
Unirse a la reunión de Teams
Jue 24/06/2021, 'de' 9:00 a 10:00
Calendario
Recordatorios: 15 minutos antes
La presente reunión tiene por objeto la entrega de los estudios y diseños para la construcción de un Sacúdete al parque tipo 1, el cual se ejecutará en el Municipio de Becerril Cesar.
Reunión de Microsoft Teams
Únase desde su equipo o aplicación móvil
Organizador
Rafael Andres Ortiz Ramir...
Sin respuesta: 5
Harry Fernhey Manrique ...
Obligatorio
Remberto Alejandro Mart...
Obligatorio
Jonathan Camilo Garcia ...
Obligatorio
Obraspublicas Obraspubli...
Obligatorio
kennyarq@gmail.com
Obligatorio


Asistiré
Responder a todos
Ocupado
Categorizar
Eliminar
Actualizacion cuadro Maestro
Unirse a la reunión de Teams
Sáb 26/06/2021, 'de' 9:00 a 11:00
Calendario
Recordatorios: 15 minutos antes
nos toca dejar el cuadro actualizado para la reunión del lunes con el Ing Remberto, gracias
Reunión de Microsoft Teams
Únase desde su equipo o apli
Haga clic aquí para unirse a la
Información práctica para la reunión
4
Organizador
H
Harry Fernhey Manrique ...
Sí: 2
G
Gina Lorena Cruz Calderon
Obligatorio
R
Rafael Andres Ortiz Ramir...
Obligatorio
Sin respuesta: 3
N
natajo22@hotmail.com
Obligatorio
J
Julio Cesar Jarava Diaz
Obligatorio

CUADRO DE CONVENIOS CON VALOR Y ADICIÓN.

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafael.ortizr@mininterior.gov.co>

Mié 23/06/2021 12:45

Para: Harry Fernhey Manrique Delgado <Harry.manrique@mininterior.gov.co>

1 archivos adjuntos (11 KB)

LISTADO CONVENIOS CON VALORES Y ADICIÓN..xlsx;

Buenas tardes ingeniero, adjunto lo solicitado.

Solicitud informe de supervisión con el anexo financiero del mes de mayo de 2021.

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafael.ortizr@mininterior.gov.co>

Jue 10/06/2021 16:58

Para: Obraspublicas Obraspublicas <obraspublicas@becerril-cesar.gov.co>; Harry Fernhey Manrique Delgado <Harry.manrique@mininterior.gov.co>

Buen día, de manera atenta solicito allegar el informe de supervisión correspondiente al mes de mayo de 2021 con su respectivo informe financiero y extracto bancario, lo anterior dando cumplimiento a la **CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO tiene las siguientes obligaciones: **I. ESPECÍFICAS: 28. Elaborar y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes**, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de Estudios, Diseño y Obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el Ministerio del interior, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto.

Agradezco su atención y cumplimiento a la presente,

Cordialmente,

ING. RAFAEL ORTIZ.
