MEMORANDO

MEM2021-17847-SIN-4020
Bogotá D.C. martes, 31 de agosto de 2021

PARA: Laura Cristina Quintero Chinchilla, Subdirectora de Gestión Contractual

DE: Subdirección de Infraestructura

ASUNTO: **INFORME CONVENIO N°1532 DE 2020, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR.**

Por medio de la presente me permito enviar a su dependencia la siguiente documentación del Convenio de la referencia.

MES DEL INFORME	**AÑO**
Julio	2021

Cordialmente,



REMBERTO MARTÍNEZ POLO
Supervisor del Convenio

Documento emitido por el Ministerio del Interior. URL de verificación: https://compromisos.mininterior.gov.co/consulta/?id=eN7BuRd5H9TvtgGyc%2FEgmxqD75%2BtRGwtdhYs6PE%2Flog%3D

Elaboró: Ing. Rafael Andrés Ortiz Ramirez
Reviso: Ing. Harry Manrrique.

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS FONSECON
CONVENIO No. 1532 de 2020, BECERRIL – CESAR
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JULIO DE 2021.

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el Municipio de Becerril – Cesar.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	CARRERA 11 ENTRE CALLES 10 Y 11 – BARRIO ALTO PRADO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		**$1.250.000.000,00**
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		**$ 0,00**
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		**$1.250.000.000,00**
FECHA SUSCRIPCIÓN	28/12/2020		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/11/2021		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	**ING. REMBERTO MARTÍNEZ POLO**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ARQ. IVAN DARIO GONZALEZ CUELLAR	28/12/2020	30/06/2021
	DRA. LAURA CRISTINA QUINTERO CHINCHILLA	01/07/2021	12/07/2021
	ING. REMBERTO ALEJANDRO MARTÍNEZ POLO	13/07/2021	ACTUAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	ING. JOSÉ ANDRÉS REALES	28/12/2020	15/03/2021
	ING. HARRY MANRRYQUE	16/03/021	16/03/2021
	ING. RAFAEL ANDRÉS ORTIZ RAMIREZ	17/03/2021	ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 81820	28/12/2020	$ 437.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO	No. 6021	12/01/2021	$ 812.500.000
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	N/A	DD/MM/AAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. AA058062 EQUIDAD SEGUROS	27/01/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	27/01/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA MODIFICACIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 12/05/2021
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 30/05/2022		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 83.333.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 41.667.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A		
VALOR DE OBRA	1.041.667.000		
VALOR INTERVENTORÍA	$ 83.333.000		

VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 0,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

- ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	**1). ANTICIPO.** El Ministerio del Interior entregará al MUNICIPIO a título de anticipo un treinta y cinco por ciento (35%) del valor total del convenio que equivale a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($437.500.000) M/L, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, constitución de la cuenta, presentación por parte del Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: **A.** Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; **B.** Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del Proyecto**. Parágrafo Primero**. El manejo de los recursos entregados al MUNICIPIO a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada de ahorros, no conjunta, a nombre del convenio de cofinanciación suscrito. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos así entregados pertenecerán al Ministerio del Interior**. Parágrafo Segundo**. Plan de Inversión del Anticipo: EL MUNICIPIO debe presentar a la Entidad el plan de inversión y manejo del anticipo, el cual será aprobado por EL MINISTERIO, a través del supervisor del convenio. La o las entregas que se realicen del anticipo deberá(n) obtener visto bueno del supervisor designado por EL MINISTERIO. **Parágrafo Tercero**. Seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo: El siguiente es el procedimiento para efectuar el seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo por parte del Supervisor del MINISTERIO: 1. Verificar traslado de efectivo y cheques girados y copias de las órdenes de pago con sus respectivos soportes, certificando que corresponden al Plan de Inversión del Anticipo. 2. Balance del estado del anticipo, elaborando informes mensuales indicando el saldo del anticipo, beneficiarios de los pagos y saldo final. 3. El MUNICIPIO y el SUPERVISOR del MINISTERIO revisarán conjuntamente los movimientos financieros con la correspondiente liquidación de intereses, que servirán para posteriores revisiones del MINISTERIO y de los organismos de control. **Parágrafo Cuarto**. Amortización del Anticipo: Se realizará en cada desembolso parcial, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 60% en el primer desembolso y el 40% final en el segundo desembolso.	N/A.	18/02/2021	$ 437.5000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	**2). UN PRIMER DESEMBOLSO**, por la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($375.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud, junto con la presentación de A. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y	30%	DD/MM/AAAA	$ 000.000.000

	demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO. B. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. C. Certificación del supervisor del Convenio designado por el MUNICIPIO que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario. D. Certificación por parte del supervisor del Convenio designado por el municipio, que acredite el avance de mínimo el 30% de ejecución de obra, la cual debe incluir: I. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, II. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. E. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. F. Presentar amortización de mínimo el 60% del anticipo.			
TERCER DESEMBOLSO	**3). UN SEGUNDO DESEMBOLSO**, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($337.500.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 60% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance de ejecución de obra mínimo del 60%, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor. C. Presentar amortización del 100% del anticipo.	60%	DD/MM/AAAA	$ 000.000.000
CUARTO Y ÚLTIMO DESEMBOLSO	**4). UN ÚLTIMO DESEMBOLSO**, hasta por la suma de CIEN MILLONES DE PESOS M/L ($100.000.000), previa presentación por parte del Supervisor del Convenio designado por el Municipio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Con fundamento en la documentación enviada por el MUNICIPIO para cada desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo del MUNICIPIO, el supervisor del Convenio por parte del MINISTERIO, certificará el cumplimiento de los requisitos por parte del MUNICIPIO.	100%	DD/MM/AAAA	$ 00.000.000
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				**$437.500.000**
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0

3. **PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**

Nombre Aseguradora: EQUIDAD SEGUROS

PÓLIZA No.	AMPAROS		VIGENCIAS

		VALORES ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
AA058062	Cumplimiento	$ 250.000.000	30-12-2020	30-05-2022
	Anticipo	$ 437.500.000	30-12-2020	30-05-2022
	Calidad de servicio	$ 250.000.000	30-12-2020	30-05-2022

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 064 del 14 de mayo de 2021.	REALIZACIÓN LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PORYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR.		$ 1.124.948.400
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACÚDETE BECERRIL 2021 R.L. KENY RENE VEGA LUQUEZ		C.C. 77.174.668 de Valledupar
Fecha de Acta de inicio del contrato	03/06/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	02/12/2021		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 1.124.948.400**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
PÓLIZA No.	**65-40-101058780** **65-44-101198270**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**03-06-2021**		

➢ ***Contrato de Interventoría Estudios, Diseños y Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 066 del 26 de mayo de 2021.	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PORYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1, EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR.		$ 124.459.196,40
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista			
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	**$ 124.459.196,40**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
PÓLIZA No.	**M-100142497**
FECHA DE LA PÓLIZA	**01-06-2021**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	SI	**NO**
FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: **ABRIL-21**		
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME FINANCIERO		**X**
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	$ 437.992.875,23 A corte junio de 2021.	**X**
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		**X**
OTROS		N/A

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**25**
% EJECUTADO DE OBRA	**18**

EN EJECUCIÓN DE OBRA.

- El día 08 de julio de 2021, se solicita al Municipio de Becerril Cesar dar estricto cumplimiento en la entrega de los informes mensuales de supervisión al Mininterior.

- El día 16 de julio de 2021, se reciben los estudios y diseños del proyecto previa revisión y aprobación por parte de la interventoría y la entidad municipal.

- El día 22 de julio de 2021, se solicita a la entidad municipal allegar vía correo electrónico los informes mensuales de supervisión con el respectivo anexo financiero, las especificaciones de los juegos infantiles y la afiliación del personal que está laborando en la obra.

- El día 12 de julio de 2021, se realizó reunión de manera virtual con presencia del supervisor del municipio de Becerril Cesar, contratista de los estudios, diseños y ejecución de obra como también el contratista de la interventoría, el líder de la supervisión y el apoyo a la supervisión del convenio, con el objetivo de verificar el avance de las obras que tienen por objeto la construcción de un Sacúdete al parque tipo 1, el contratista expone que a la fecha ha ejecutado las actividades de cerramiento y que no ha podido dar inicio a las obras por que la entidad municipal no ha realizado las labores de descapoté, retiro y limpieza del material sobrante que hay en el lote, por lo tanto la supervisión del Mininterior solicita de manera urgente dar estricto cumplimiento a esta labor para así poder dar inicio a las obras, la entidad municipal se compromete a realizar estas labores.

- El día 14 de julio de 2021, se realizó reunión de manera virtual la cual fue liderada por el ingeniero Harry Manrrique con el objetivo de revisar el cuadro maestro de ejecución.

- El día 26 de julio de 2021, nuevamente se realiza reunión de manera virtual con los contratistas de obra e interventoría, la supervisión por parte de la Alcaldía Municipal y del Mininterior con el objetivo de verificar el avance de obra, el avance a la fecha es de aproximadamente un 3%, el contratista expone que ha tenido un retraso significativo dentro de su cronograma ya que la entidad municipal no desarrollo las labores de descapote, retiro y limpieza del material sobrante.

- El día 28 de julio de 2021, se realza reunión de manera virtual, la cual es liderada por el ingeniero Harry Manrrique con el objetivo de revisar el PAC del mes siguiente.

- El día 31 de julio de 2021, se realiza reunión de manera virtual la cual es lidera por el ingeniero Remberto Martínez Polo con el objetivo de revisar y verificar el avance de los convenios que están bajo la supervisión.

- La entidad municipal a la fecha no aporta el informe mensual de supervisión.

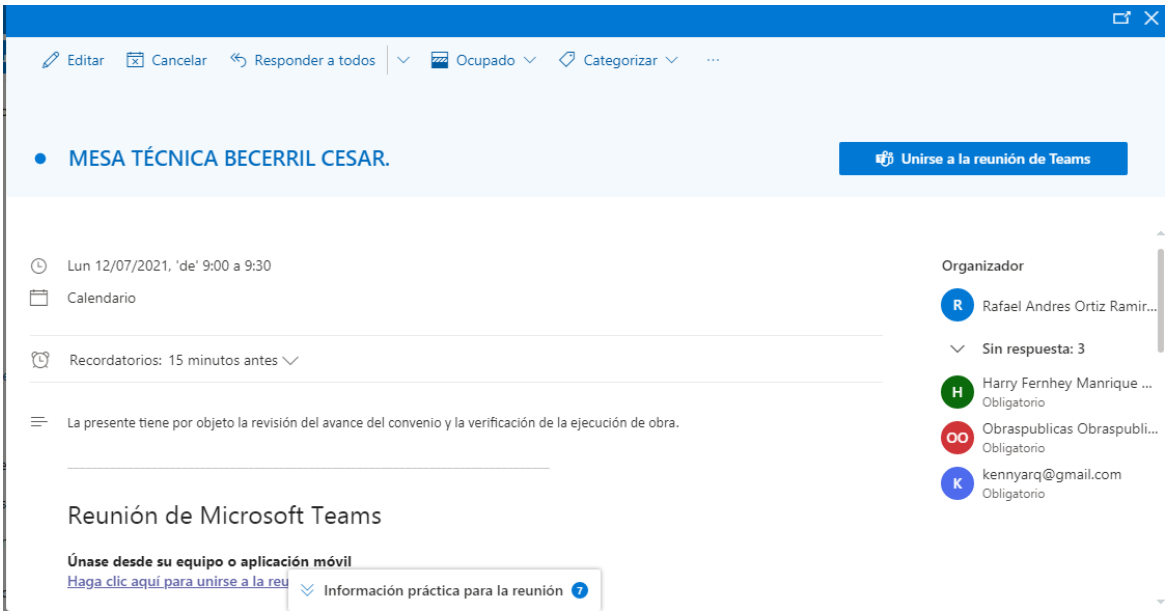
Al presente informe se anexa lo enunciado.

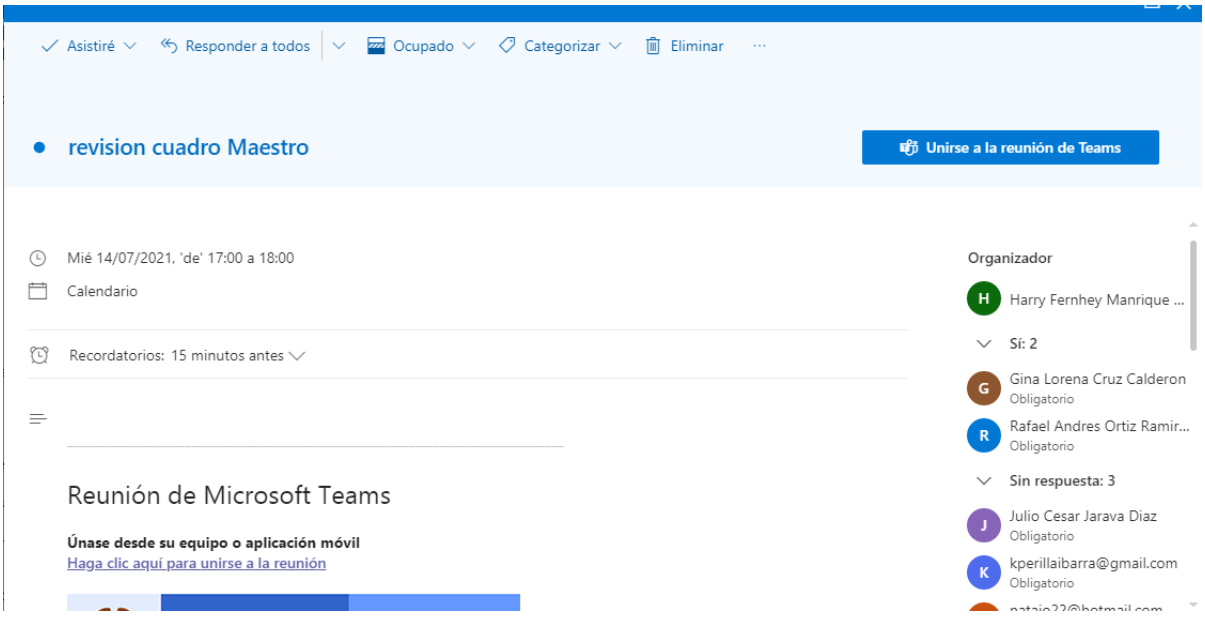
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

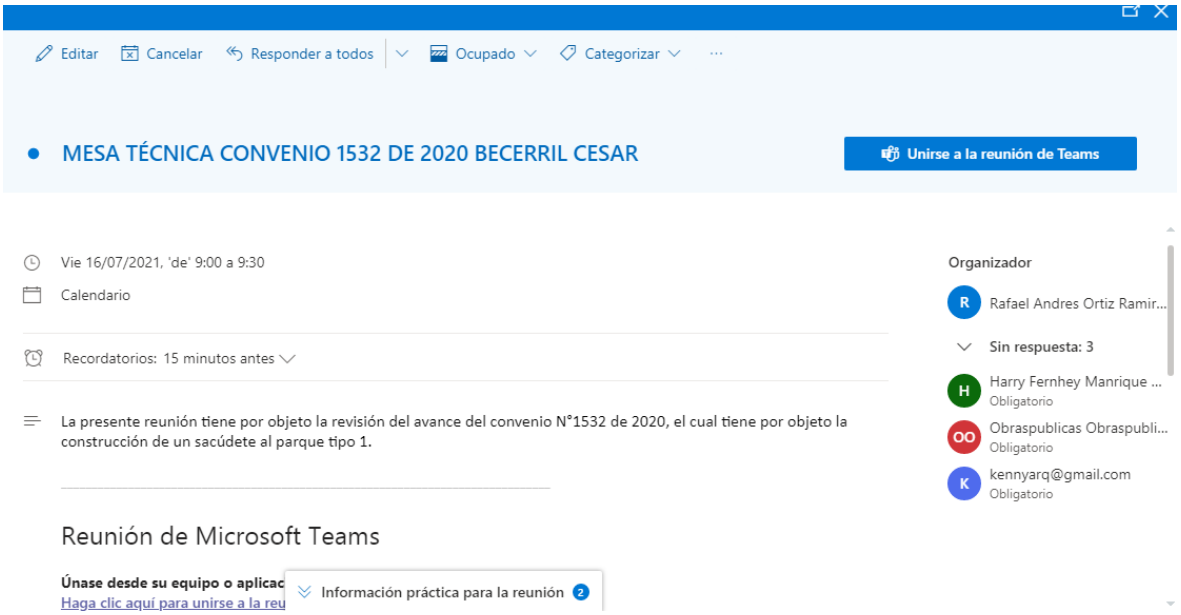
Visita realizada por el Ingeniero José Andrés Reales	10-02-2021	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

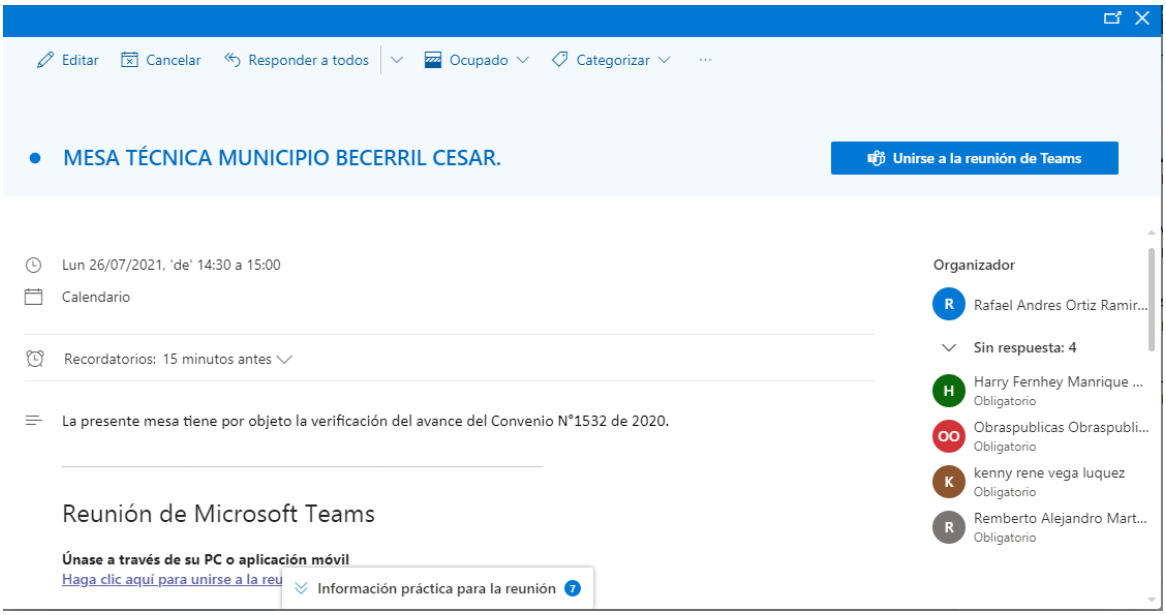
8. SUPERVISOR

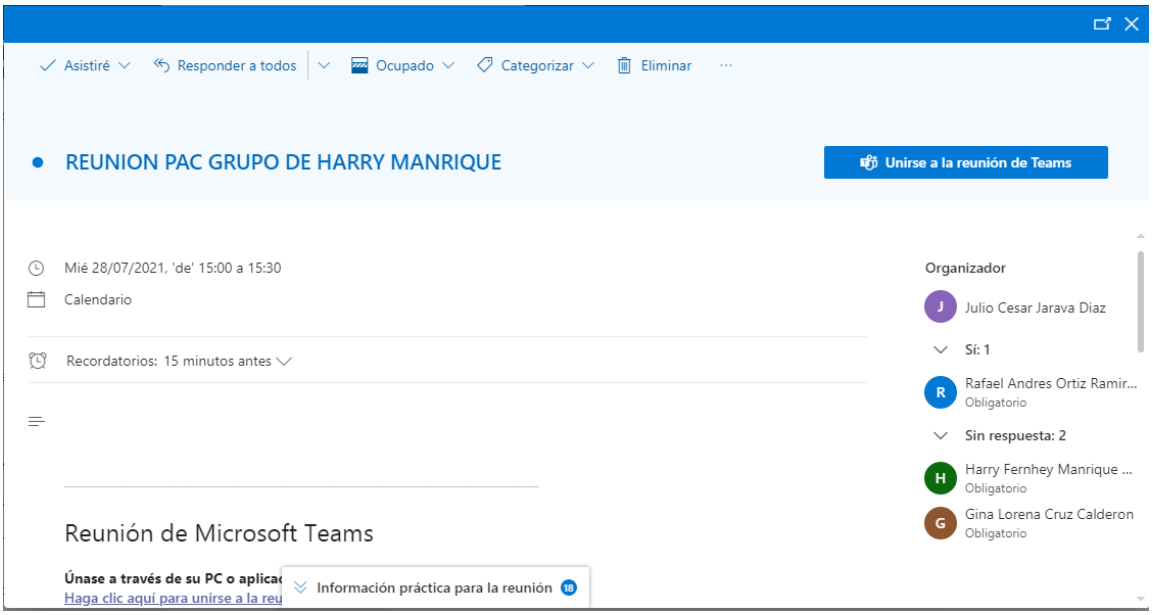
ING. REMBERTO MARTÍNEZ POLO **Coordinador Grupo de Control y Seguimiento** Supervisor Convenio No. 1532 de 2020 Subdirección de Infraestructura Ministerio - FONSECON	Ing. Rafael Andrés Ortiz Ramirez **ING. RAFAEL ANDRES ORTIZ RAMIREZ** Elaboró - Apoyo a la supervisión Subdirección de Infraestructura Ministerio - FONSECON
DOC. LAURA CRISTINA QUINTERIO CHINCHILLA **Subdirectora de Infraestructura (E)** Supervisora del Convenio No. 1532 de 2020 Subdirección de Infraestructura Ministerio - FONSECON	

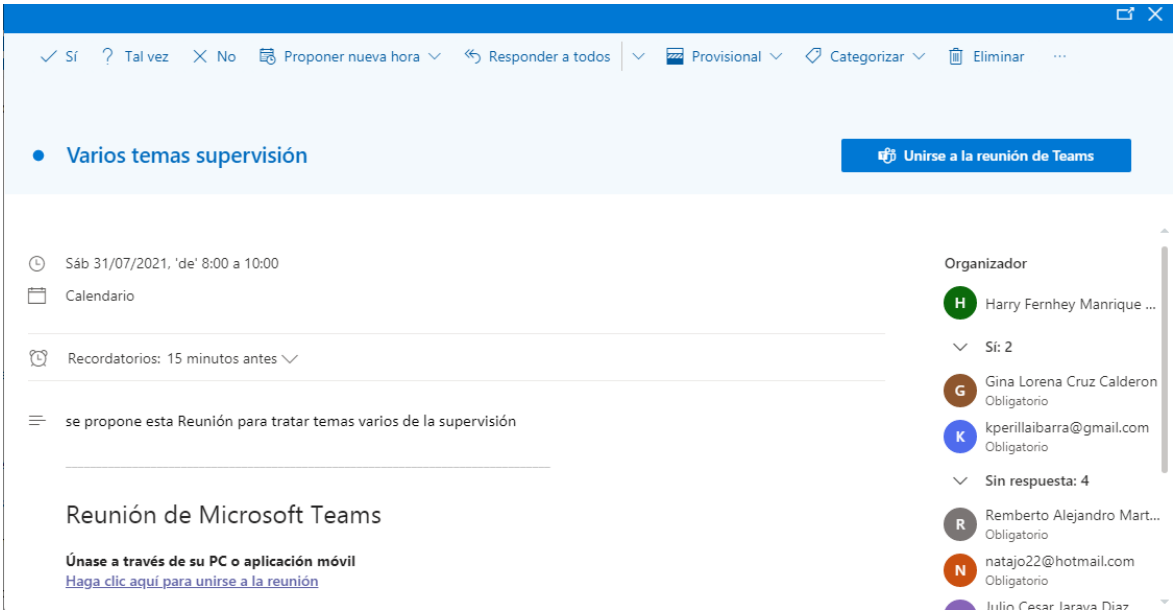

Editar
Cancelar
Responder a todos
Ocupado
Categorizar
MESA TÉCNICA BECERRIL CESAR.
Unirse a la reunión de Teams
Lun 12/07/2021, 'de' 9:00 a 9:30
Calendario
Recordatorios: 15 minutos antes
La presente tiene por objeto la revisión del avance del convenio y la verificación de la ejecución de obra.
Reunión de Microsoft Teams
Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reu
Información práctica para la reunión
Organizador
Rafael Andres Ortiz Ramir...
Sin respuesta: 3
Harry Fernhey Manrique ...
Obligatorio
Obraspublicas Obraspubli...
Obligatorio
kennyarq@gmail.com
Obligatorio


Asistiré
Responder a todos
Ocupado
Categorizar
Eliminar
revision cuadro Maestro
Unirse a la reunión de Teams
Mié 14/07/2021, 'de' 17:00 a 18:00
Calendario
Recordatorios: 15 minutos antes
Reunión de Microsoft Teams
Únase desde su equipo o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión
Organizador
Harry Fernhey Manrique ...
Sí: 2
Gina Lorena Cruz Calderon
Obligatorio
Rafael Andres Ortiz Ramir...
Obligatorio
Sin respuesta: 3
Julio Cesar Jarava Diaz
Obligatorio
kperillaibarra@gmail.com
Obligatorio


Editar
Cancelar
Responder a todos
Ocupado
Categorizar
MESA TÉCNICA CONVENIO 1532 DE 2020 BECERRIL CESAR
Unirse a la reunión de Teams
Vie 16/07/2021, 'de' 9:00 a 9:30
Calendario
Recordatorios: 15 minutos antes
La presente reunión tiene por objeto la revisión del avance del convenio N°1532 de 2020, el cual tiene por objeto la construcción de un sacúdete al parque tipo 1.
Reunión de Microsoft Teams
Únase desde su equipo o aplicac
Haga clic aquí para unirse a la reu
Información práctica para la reunión 2
Organizador
Rafael Andres Ortiz Ramir...
Sin respuesta: 3
Harry Fernhey Manrique ...
Obligatorio
Obraspublicas Obraspubli...
Obligatorio
kennyarq@gmail.com
Obligatorio


Editar
Cancelar
Responder a todos
Ocupado
Categorizar
MESA TÉCNICA MUNICIPIO BECERRIL CESAR.
Unirse a la reunión de Teams
Lun 26/07/2021, 'de' 14:30 a 15:00
Calendario
Recordatorios: 15 minutos antes
La presente mesa tiene por objeto la verificación del avance del Convenio N°1532 de 2020.
Reunión de Microsoft Teams
Únase a través de su PC o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reu
Información práctica para la reunión 7
Organizador
Rafael Andres Ortiz Ramir...
Sin respuesta: 4
Harry Fernhey Manrique ...
Obligatorio
Obraspublicas Obraspubli...
Obligatorio
kenny rene vega luquez
Obligatorio
Remberto Alejandro Mart...
Obligatorio


Asistiré
Responder a todos
Ocupado
Categorizar
Eliminar
REUNION PAC GRUPO DE HARRY MANRIQUE
Unirse a la reunión de Teams
Mié 28/07/2021, 'de' 15:00 a 15:30
Calendario
Recordatorios: 15 minutos antes
Organizador
Julio Cesar Jarava Diaz
Sí: 1
Rafael Andres Ortiz Ramir...
Obligatorio
Sin respuesta: 2
Harry Fernhey Manrique ...
Obligatorio
Gina Lorena Cruz Calderon
Obligatorio
Reunión de Microsoft Teams
Únase a través de su PC o aplica
Haga clic aquí para unirse a la reu
Información práctica para la reunión
18


Sí
Tal vez
No
Proponer nueva hora
Responder a todos
Provisional
Categorizar
Eliminar
Varios temas supervisión
Unirse a la reunión de Teams
Sáb 31/07/2021, 'de' 8:00 a 10:00
Calendario
Recordatorios: 15 minutos antes
se propone esta Reunión para tratar temas varios de la supervisión
Organizador
Harry Fernhey Manrique ...
Sí: 2
Gina Lorena Cruz Calderon
Obligatorio
kperillaibarra@gmail.com
Obligatorio
Sin respuesta: 4
Remberto Alejandro Mart...
Obligatorio
natajo22@hotmail.com
Obligatorio
Reunión de Microsoft Teams
Únase a través de su PC o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión

Solicitud documentos correspondientes al Convenio N°1532 de 2021.

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafael.ortizr@mininterior.gov.co>

Jue 08/07/2021 16:59

Para: Obraspublicas Obraspublicas <obraspublicas@becerril-cesar.gov.co>; Harry Fernhey Manrique Delgado <Harry.manrique@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

La presente tiene por objeto solicitar los informes de supervisión correspondientes a los meses de mayo y junio del 2021 con el respectivo anexo financiero, además se requiere allegar al ministerio de manera física los estudios y diseños del proyecto con las disponibilidades de servicios públicos y la licencia de construcción, paso seguido el municipio de Becerril deberá presentar el cronograma de ejecución de obra, flujo de inversión semanal y mensual aprobado por la interventoría, agradezco la atención y cumplimiento a lo solicitado,

Cordialmente,

ING. RAFAEL ORTIZ.

Solicitud documentos Convenio N°1541 de 2020, suscrito con el Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar.

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafael.ortizr@mininterior.gov.co>

Jue 22/07/2021 12:25

Para: marycarmen785@hotmail.com <marycarmen785@hotmail.com>; Jorge Arias <ing.jorgearias26@gmail.com>; Harry Fernhey Manrique Delgado <Harry.manrique@mininterior.gov.co>

Cordial saludo, la presente tiene por objeto solicitar al municipio de La Jagua De Ibirico Cesar dar estricto cumplimiento a lo pactado dentro del convenio N°1541 de 2020, con relación a la entrega de los informes mensuales de supervisión, los cuales se deben ser allegados al Ministerio del Interior los primeros cinco días de cada mes, además semanalmente se deberán entregar los informes semanales de avance de obra en los formatos que fueron socializados y compartidos, anexo a esto también deberán presentar el consolidado o informe mensual, es de resaltar que la interventoría contratada por la alcaldía municipal es la encargada de elaborar, consolidar, y verificar este tipo de información la cual será aportada como prueba de la ejecución del proyecto, agradezco su atención y cumplimiento a lo solicitado,

Cordialmente,

ING. RAFAEL ORTIZ.
Apoyo a la Supervisión SIN
Ministerio Del Interior.

SOLICITUD DOCUMENTOS CONVENIO N°1541 DE 2020 LA JAGUA DE IBIRICO CESAR.

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafael.ortizr@mininterior.gov.co>

Jue 22/07/2021 17:13

Para: marycarmen785@hotmail.com <marycarmen785@hotmail.com>; Jorge Arias <ing.jorgearias26@gmail.com>; Harry Fernhey Manrique Delgado <Harry.manrique@mininterior.gov.co>

Buenas tardes,

Respetados alcaldes y supervisores

De acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por el Ministerio del Interior en el documento de anexo de especificaciones técnicas, cartilla del IDRD y la presentación del proyecto que se realizó al inicio de los contratos derivados, se establecen las especificaciones mínimas que deben cumplir los juegos infantiles según el código CIO, por lo cual, se solicita el envío de los siguientes documentos para realizar la verificación correspondiente tanto por la Interventoría como por la supervisión del Ministerio:

1. Fichas técnicas de cada juego
2. Fichas de los materiales de cada juego
3. Certificación con la norma EN1176
4. Manifiesto de importación
5. Carta del distribuidor autorizado

Por favor tener en cuenta y solicitar fichas técnicas y validar que emitan los certificados antes de la compra de los juegos para no tener ningún reproceso o inconveniente al momento del recibo de los juegos.

Cordialmente,

ING. RAFAEL ORTIZ.
Apoyo a la Supervisión SIN
Ministerio Del Interior.

SOLICITUD AFILIACIÓN PERSONAL DE OBRA.

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafael.ortizr@mininterior.gov.co>

Vie 23/07/2021 11:51

Para: Secretaria de Planeacion <secretariadeplaneacion@astrea-cesar.gov.co>; Obraspublicas Obraspublicas <obraspublicas@becerril-cesar.gov.co>; Cristhian David Castro Gomez <cristhiandcg@hotmail.com>; marycarmen785@hotmail.com <marycarmen785@hotmail.com>; Jorge Arias <ing.jorgearias26@gmail.com>; Harry Fernhey Manrique Delgado <Harry.manrique@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta solicitamos a los supervisores de los Convenios allegar vía correo electrónico la afiliación del personal que está laborando en obra y el plan de choque a utilizar hasta la fecha de culminación de la misma, lo anterior con el objetivo de dar cumplimento al cronograma de ejecución de los convenios, agradezco su atención y cumplimiento a los mismos,

Cordialmente,

ING. RAFEL ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN
SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

Solicitud documentos Convenio N°1532 de 2020, suscrito con el Municipio de Becerril Cesar.

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafael.ortizr@mininterior.gov.co>

Jue 22/07/2021 12:22

Para: Obraspublicas Obraspublicas <obraspublicas@becerril-cesar.gov.co>; Harry Fernhey Manrique Delgado <Harry.manrique@mininterior.gov.co>

Cordial saludo, la presente tiene por objeto solicitar al municipio de Becerril Cesar dar estricto cumplimiento a lo pactado dentro del convenio N°1532 de 2020, con relación a la entrega de los informes mensuales de supervisión, los cuales se deben ser allegados al Ministerio del Interior los primeros cinco días de cada mes, además semanalmente se deberán entregar los informes semanales de avance de obra en los formatos que fueron socializados y compartidos, anexo a esto también deberán presentar el consolidado o informe mensual, es de resaltar que la interventoría contratada por la alcaldía municipal es la encargada de elaborar, consolidar, y verificar este tipo de información la cual será aportada como prueba de la ejecución del proyecto, agradezco su atención y cumplimiento a lo solicitado,

Cordialmente,

ING. RAFAEL ORTIZ.
Apoyo a la Supervisión SIN
Ministerio Del Interior.

SOLICITUD DOCUMENTOS CONVENIO N°1532 DE 2020 MUNICIPIO BECERRIL CESAR.

Rafael Andres Ortiz Ramirez <rafael.ortizr@mininterior.gov.co>

Jue 22/07/2021 17:17

Para: Obraspublicas Obraspublicas <obraspublicas@becerril-cesar.gov.co>; Harry Fernhey Manrique Delgado <Harry.manrique@mininterior.gov.co>

Buenas tardes,

Respetados alcaldes y supervisores

De acuerdo con los requerimientos mínimos establecidos por el Ministerio del Interior en el documento de anexo de especificaciones técnicas, cartilla del IDRD y la presentación del proyecto que se realizó al inicio de los contratos derivados, se establecen las especificaciones mínimas que deben cumplir los juegos infantiles según el código CIO, por lo cual, se solicita el envío de los siguientes documentos para realizar la verificación correspondiente tanto por la Interventoría como por la supervisión del Ministerio:

1. Fichas técnicas de cada juego
2. Fichas de los materiales de cada juego
3. Certificación con la norma EN1176
4. Manifiesto de importación
5. Carta del distribuidor autorizado

Por favor tener en cuenta y solicitar fichas técnicas y validar que emitan los certificados antes de la compra de los juegos para no tener ningún reproceso o inconveniente al momento del recibo de los juegos.

Cordialmente,

ING. RAFAEL ORTIZ.
Apoyo a la Supervisión SIN
Ministerio Del Interior.
