	INFORME QUINCENAL	Versión	0
PROSOI	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD	Fecha	10/08/2025
		Código	F-Q-11

OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.,
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas

QUINCENA	**No. 7**	**DEL**	**30 de enero de 2026**	**AL**	**12 de febrero de 2026**

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA

Contrato No .	046-2025
Fecha de Iniciación	6/11/2025
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2025
Plazo Inicial	55 dias
Valor inicial	$ 799.444.267,00
Prórroga No.1	N/A
Nueva fecha de terminación	12/02/2026
Adición No 1	N/A
Valor total	$ 799.444.267,00

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

	ACTIVIDAD	VALOR INICIAL	% DE INCIDENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
				INICIO	FIN	INICIO	FIN
			Fase 1				
0	Suscripcion de Acta de inicio						
1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CUBIERTA PARA 240 M2 APROX							
1,1	desmonte de membrana/ textil/ Lona arquitectónico existente.	$ 21.031.406,77	2,63%	17/12/2025	22/12/2025	13/12/2025	15/12/2025
1,2	Desmonte subestructura de membrana de acero postes metálicos, incluyes conexiones, tensores, platinas, pernos	$ 2.760.234,75	0,35%	23/12/2025	25/12/2025	13/12/2025	16/12/2025
1,3	Demonte de paneles de vidrio templado existente, incluye desmonte de estructura de anclaje, acopio y protección durante las actividades	$ 2.547.277,38	0,32%	12/12/2025	18/12/2025	1/12/2025	15/12/2025
1,4	Reinstalación de paneles de vidrio existente, incluye montaje de subestructura desmontada, reemplazo de empaques y chapetas averiadas, anclajes a piso y todo lo necesario para la correcta reinstalación de las Lamparas	$ 6.235.447,03	0,78%	27/01/2026	6/02/2026	27/01/2026	12/02/2026
1,5	Limpieza profunda de pedestales de bases y sustratos en concreto en concreto, incluye lavado con hidro lavado,	$ 824.846,88	0,10%	6/02/2026	10/02/2026	27/01/2026	12/02/2026
1,6	recomposición de áreas de paisajismo afectadas por instalación de sistema de cubierta retráctil, incluye retiro y relleno de sustrato, limpieza, retiro de capa vegetal de paisajismo, reisnatalción y recomposición de especies vegetales puntuales	$ 4.032.119,52	0,50%	22/01/2026	26/01/2026		
1,7	Inspección, chequeo y validación técnica de punto eléctrico de baja tensión, medición de capacidad, validación de circuitos en tablero existente e informe de resultado y recomendaciones.	$ 789.141,66	0,10%	12/12/2025	25/12/2025	12/12/2025	10/02/2025
1,8	intervención, traslado y adecuación de punto eléctrico existente, para dar suplencia a sistema de motorización de bajo consumo e iluminación led del sistema de cubierta retráctil	$ 1.281.626,78	0,16%	27/01/2026	9/02/2026	26/12/2025	10/02/2026
1,9	Suministro e instalación de materiales y accesorios para las salidas eléctricas. incluyendo tubería EMT Ø 3/4", conduletas, cajas, toma corriente y clavija monofásica normal con polo a tierra,15 A, 120V, y seguro de giro ,conductor de cobre CABLE 3No12 AW	$ 853.599,47	0,11%	25/12/2025	2/01/2026	26/12/2025	10/02/2026
1,10	suministro e instalación de access point antena direccional tipo para exteriores tipo El TP-Link CPE710 o superior para enlaces inalámbricos de largo alcance apta para exteriores, incluye canalización, validación e integración al sistema de infraestructur	$ 2.044.855,18	0,26%	26/01/2026	3/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
1,11	Suministro, instalación y desmonte de Cerramiento de protección en poli sombra, incluye subestructura de soporte.	$ 1.059.844,50	0,13%	17/12/2025	23/12/2025	17/12/2025	10/01/2026
1,12	Lavado profundo con medios mecánicos en obra de piso de concreto existente, desbastado o rebaje conforme estado de las piezas de prefabricado instalado , recomposición del color de la losetas	$ 6.451.253,25	0,81%	27/01/2026	2/02/2026	27/01/2026	10/02/2026
1,13	Aseo, Acopio y empaque de escombros en lonas, incluye disposición final fuera del área.	$ 2.857.036,26	0,36%	22/01/2026	2/02/2026	10/02/2026	12/02/2026
1,14	Disposición final de elementos de aceros y membrana textil desmontada, en sitios certificado.	$ 979.226,14	0,12%	28/01/2026	6/02/2026	10/02/2026	12/02/2026
	FIN DE ACTIVIDADES	$ 979.226,14	0,12%	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
2, SISTEMA TOTAL MECANICO DE CUBIERTA RETRACTIL (240 m2)							
	Desarrollos planimétricos del sistema, incluye ajustes	$ -	0,00%	6/11/2025	16/11/2025	6/11/2025	16/11/2025
	Presentación y aprobación por parte de la supervisión	$ -	0,00%	20/11/2025	22/11/2025	20/11/2025	22/11/2025
	Importación de materiales	$ -	0,00%	20/11/2025	24/11/2025	20/11/2025	24/11/2025
	Ejecución y preensamblado en taller	$ -	0,00%	24/11/2025	11/12/2025	24/11/2025	20/12/2025
	Elaboración de elementos de cimentación	$ -	0,00%	11/12/2025	2/01/2026	14/12/2025	19/12/2025
2,1	Sistema total tipo módulos de cubierta mecanizado para 240m2 aproa de cobertura total, compuesto por estructura perimetral 120x120 Aluminio; fijación mediante tornillería. Totalmente autoportante y desmontable, con elementos propios del sistema de conexión	$ 642.344.614,58	80,35%	9/01/2026	29/01/2026	6/02/2026	26/01/2026
	FIN SISTEMA TOTAL	$ -	0,00%	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026
3, SISTEMA DE TOLDO CORTAVIENTOS LATERAL							
3,1	Sistema general de cortavientos toldo o cortina tipo Nimbus, xp 10003 o Baneta o en medidas conforme frentes perimetrales designados del área color a definir con tela o lona en membran acrílica PVC tipo Soltis o equivalente con permeabilidad y translucide	$ 103.351.736,85	12,93%	9/01/2026	3/02/2026	19/01/2026	12/02/2026
	FIN SISTEMA DE TOLDO CORTAVIENTOS LATERAL		0,00%	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026	12/02/2026


PROSOI	**INFORME QUINCENAL**	Versión	0
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD	Fecha	10/08/2025
		Código	F-Q-11

OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.,
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas

QUINCENA	**No. 7**	**DEL**	**30 de enero de 2026**	**AL**	**12 de febrero de 2026**

3. CONTROL DE PROGRAMACIÓN - GRAFICA DE COMPORTAMIENTO PROGRAMADO VERSUS EJECUTADO

SEMANA No.	EJECUTADO	PROGRAMADO
QUINCENA No. 1	7,50%	7,00%
QUINCENA No. 2	8,00%	7,60%
QUINCENA No. 3	40,00%	34,00%
QUINCENA No. 4	61,00%	49,80%
QUINCENA No 5.	66,00%	50,00%
QUINCENA No . 6	79,00%	65,00%
QUINCENA No .7	100,00%	100,00%

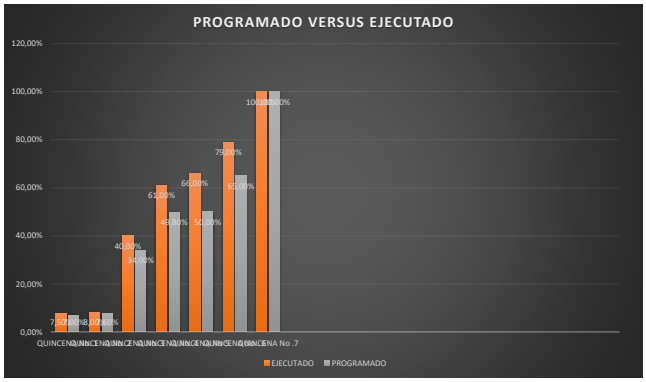


4. CONTROL PERSONAL OBRA

CARGO	PRESENTE INFORME	CANTIDAD
DIRECTOR	1	1
RESIDENTE	1	1
RESIDENTE DE JUNIOR	1	1
RESIDENTE SST	1	1
MAESTRO DE OBRA	1	1
PROVEEDOR PARASOLES	1	5
TOTAL PERSONAL PRESENTE	**QUINCENA** **No. 7**	**10**

5. CONTROL DEL CLIMA

FECHA	SOL	LLUVIA
6/11/2025	4	4
7/11/2025	3	5
8/11/2025	4	4
9/11/2025	5	3
10/11/2025	4	4
11/11/2025	5	5
12/11/2025	3	6
13/11/2025	4	4
14/11/2025	8	0
15/11/2025	8	0
16/11/2025	4	4
17/11/2025	5	3
18/11/2025	4	5
19/11/2025	7	1
20/11/2025	4	4
21/11/2025	4	4
22/11/2025	5	3
23/11/2025	3	5
24/11/2025	4	4
25/11/2025	4	4
26/11/2025	6	2
27/11/2025	5	3
28/11/2025	4	4
29/11/2025	5	3
30/11/2025	4	4
1/12/2025	3	5
2/12/2025	4	4
3/12/2025	5	3
4/12/2025	4	4
5/12/2025	4	4
6/12/2025	4	4
7/12/2025	4	4
8/12/2025	4	4
9/12/2025	4	4
10/12/2025	4	4
11/12/2025	4	4
12/12/2025	4	4
13/12/2025	4	4
14/12/2025	4	4
15/12/2025	4	4
16/12/2025	4	4
17/12/2025	4	4
18/12/2025	4	4
19/12/2025	4	4
20/12/2025	4	4
21/12/2025	3	5
22/12/2025	4	4
23/12/2025	4	4
24/12/2025	5	3
25/12/2025	4	4
26/12/2025	4	4
27/12/2025	4	4
28/12/2025	4	4
29/12/2025	4	4
30/12/2025	4	4
31/12/2025	4	4
1/01/2026	5	3
2/01/2026	4	4
3/01/2026	4	4
4/01/2026	4	4
5/01/2026	4	4
6/01/2026	4	4
7/01/2026	4	4
8/01/2026	4	4
9/01/2026	4	4
10/01/2026	5	4
11/01/2026	4	4
12/01/2026	5	4
13/01/2026	4	4
14/01/2026	5	4
15/01/2026	4	4
16/01/2026	4	4
17/01/2026	3	5
18/01/2026	2	6
19/01/2026	2	6
20/01/2026	1	7
21/01/2026	4	4
22/01/2026	4	4
23/01/2026	3	5
24/01/2026	2	6
25/01/2026	3	5
26/01/2026	2	6
27/01/2026	1	7
28/01/2026	2	6
29/01/2026	3	5
30/01/2026	4	4
1/02/2026	5	3
2/02/2026	4	4
3/02/2026	5	3
4/02/2026	4	4

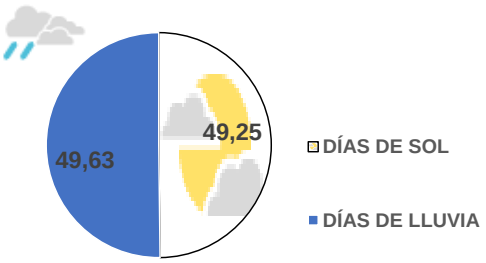

NOTA: para la Quincena se presentan lluvias





	INFORME QUINCENAL	Versión	0
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD	Fecha	10/08/2025
		Código	F-Q-11

OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.,
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas

QUINCENA	**No. 7**	**DEL**	**30 de enero de 2026**	**AL**	**12 de febrero de 2026**
5/02/2026	4	4			
6/02/2026	3	5			
7/02/2026	4	4			
8/02/2026	5	3			
9/02/2026	3	5			
10/02/2026	4	4			
11/02/2026	4	4			
12/02/2026	5	3			
TOTAL DÍAS	**DÍAS DE SOL**	**DÍAS DE LLUVIA**			
	49,25	**49,63**			

	INFORME QUINCENAL	Versión	0
	PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SEGURIDAD	Fecha	10/08/2025
		Código	F-Q-11

OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA LIVIANA AUTOPORTANTE DEL ÁREA DE LA PLAZOLETA CENTRAL DEL MODULO E DEL EDIFICIO DE LOS TRIBUNALES DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
SUPERVISOR	JAIR ESTEBAN PINZÓN HERNÁNDEZ
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA S.A.S.,
CONTRATANTE	Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas

QUINCENA	No. 7	DEL	30 de enero de 2026	AL	12 de febrero de 2026

6. ACTIVIDADES EJECUTADAS

6.1 - REGISTRO FOTOGRÁFICO/ESQUEMAS REVISADOS	DESCRIPCIÓN
	En el presente informe se tiene una instalacion de la pergola funcional

7. ACTIVIDADES, OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES, CONCLUSIONES, COMPROMISOS

Se ejecutan las actividades correspondientes a la instalación y ensamble de la pérgola, de conformidad con el alcance contractual establecido. El día 26 de enero de 2026 se llevó a cabo una entrega parcial de la pérgola y sus respectivas banetas, durante la cual se formularon diversas observaciones por parte de la entidad. En dicha visita estuvo presente el supervisor del contrato, quien realizó y dejó consignadas varias observaciones técnicas.

Posteriormente, se dio inicio al proceso de instalación eléctrica, con el fin de disponer de las tomas de corriente necesarias para la correcta instalación y puesta en funcionamiento de la carpa en su totalidad. Así mismo, tras la revisión del estado de la carpa retirada, se informó al supervisor que esta no se encuentra en condiciones técnicas adecuadas que permitan su reutilización o donación; no obstante, se deja constancia de que se permanece atento a las instrucciones que al respecto sean impartidas por la supervisión.
Se realiza lavada y limpieza de plazoleta, se realiza instalacion de vidrios y suministro e instalacion de access point.

Por otra parte, se informa que las condiciones climáticas adversas, especialmente las lluvias presentadas durante el transcurso del mes, han generado dilaciones en la programación de las actividades. Sin embargo, se hace entrega de la obra el dia 12 de febrero de 2026.

8. FIRMA RESPONSABLES

PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS (PROSOI.SAS)
CARGO: Director de Obra
NOMBRE: Alvaro Rodriguez

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
CARGO: Supervisor
NOMBRE:
