
INFORME DE EJECUCIÓN No. 2

CONVENIO SOLIDARIO No. 039 DE 2025 "OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025 – 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA"

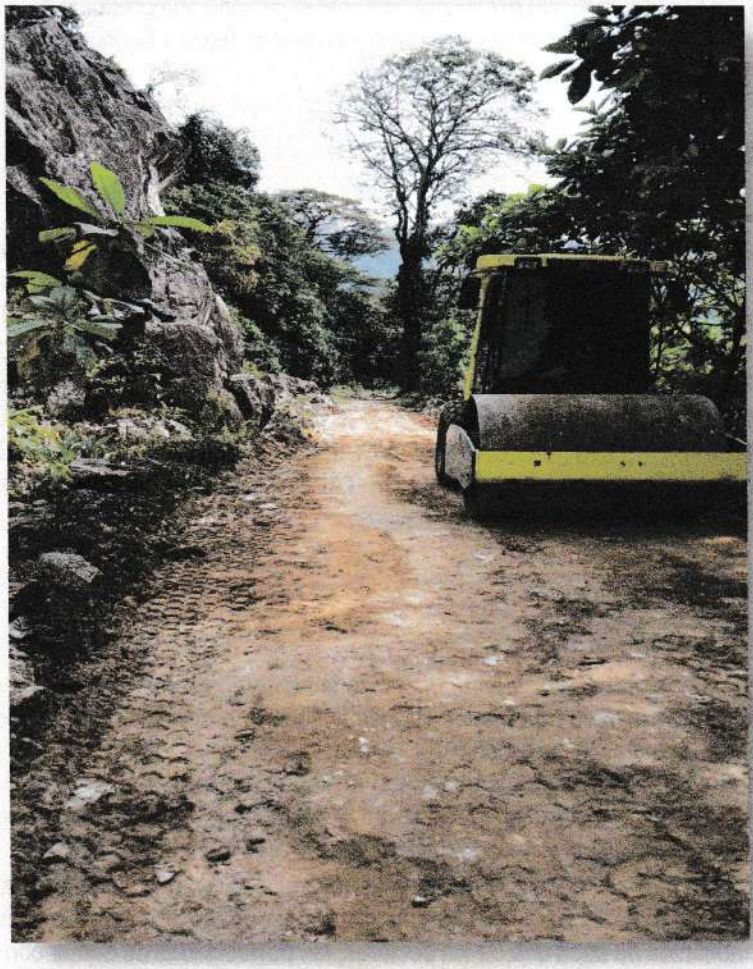

EJECUTOR: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"

R/L: HENRY PAUL ALFONSO

TAURAMENA - CASANARE

26 DE DICIEMBRE DE 2025 A 16 DE FEBRERO DE 2026

PRESENTACIÓN

El presente informe refleja las actuaciones de la Contratación directa No. CDMT-SI-063-2025 que tiene por objeto "OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025 – 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA" durante el período comprendido del 26 de Diciembre de 2025 al 16 de Febrero de 2026 cuyo propósito es presentar el avance físico y financiero alcanzado.

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VIABILIZACIÓN.

De acuerdo a lo expuesto, el presente proceso contractual se realizó conforme al cumplimiento de los estatutos de La Asociación en *él Articulo 20, numeral 26, según naturaleza de los contratos o Convenios, ítem 2, "Junta Directiva: desde (140) salarios mínimos legales mensuales vigentes, más un peso ($1,00) hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.* La Junta Directiva autoriza para que el presidente HENRY PAUL ALFONSO celebre el convenio cuyo objeto es: "OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025 – 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA" por valor de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($432.910.365) CON EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, , elaborado y aprobado para tal fin, con un concepto favorable de las siguientes características:

ALCANCE.

Teniendo en cuenta que el mejoramiento de vías terciarias tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales, para el presente convenio y empleando la maquinaria amarilla de propiedad del Municipio, Asojuntas deberá adelantar los trabajos de conformación de cada uno de los sitios y vías que estén definidos previamente, a través de la Secretaría de Infraestructura, para lo cual se realizará el traslado de la maquinaria, de los operadores y del personal profesional vinculados en el convenio y se adelantarán las labores principales que son: reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica de cunetas, escarificación del material de afirmado existente, extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales, todo esto en aras de brindar, a los habitantes de cada uno de los sectores, las posibilidades de contar con vías que permitan el desarrollo adecuado de sus labores agrícolas, pecuarias y comerciales, entre otras.

Bajo el conocimiento de lo anterior, el municipio de Tauramena aprobó el Plan de Desarrollo 2024- 2027, en su línea estratégica: "Tauramena Es Conectividad Territorial Para El Desarrollo", Sector de inversión: "TRANSPORTE" con el objetivo priorizado: "Fortalecer la infraestructura de servicios para impulsar la conectividad física y digital, de la población del municipio, como soporte del desarrollo integral de territorio", Programa: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL, Subprograma: INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE, teniendo como una de sus metas de producto la "VIA TERCIARIA MEJORADA". Todo lo anterior, En general, las actividades que se van a desarrollar para la ejecución del presente convenio solidario

corresponden a la conformación de la subrasante mejorada que incluye: escarificar, perfilar, conformar, extender y compactar 135 Kms de vías terciarias a nivel de destapada del Municipio de Tauramena.


INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.

OBJETO:	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, VIGENCIA FUTURA 2025-2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.	
PARTES:	MUNICIPIO DE TAURAMENA	
	ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA	
	NIT:	900.002.220-8
	R/L	HENRY PAUL ALFONSO
	C.C.	74.861.785 de YOPAL
SUPERVISOR:	LINO RODRIGUEZ OCHOA	
VALOR :	MUNICIPIO	$389.318.940
	ASOJUNTAS	$43.591.425
VALOR TOTAL INICIAL:	$432.910.365	
VALOR PARCIAL 01:	$62.291.030	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN APORTE MUNICIPIO:	16%	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN APORTE ASOJUNTAS:	16,13%	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$62.291.030	
PLAZO :	CINCO (5) MESES Y ONCE (11) DIAS	
FECHA INICIO:	01 DE DICIEMBRE DE 2025	
FECHA TERMINACIÓN:	11 DE MAYO DE 2026	
PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA APORTE MUNICIPIO:	25,93%	
PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA APORTE ASOJUNTAS	48,39%	

ACTIVIDADES ADELANTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO.

- Se realizó visita de control y seguimiento con el coordinador de maquinaria e Inspector SST para evaluar las condiciones de las vías terciarias a intervenir en Vereda Visinaca vía Lagunitas, Visinaca vía los Lirios, Vereda Cabañas, Vereda Bendiciones y Jaguito del Municipio de Tauramena. así mismo se realizó inspección de las condiciones de la maquinaria amarilla de acuerdo al formato preoperacional de cada equipo por cada semana.

- La inspectora SST se verificaron las afiliaciones al SGSS, Planilla de pagos SGSS, se organizó un cronograma de actividades y charlas al SST, actividades de Seguridad y Salud en el trabajo, inspección de seguridad, registro de asistencia y estadísticas de accidentalidad. (se anexa informe de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo);

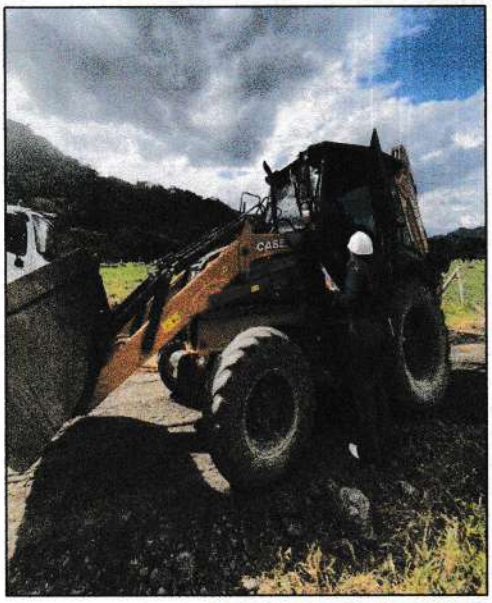





- Se realizó visita técnica de supervisión por parte de la ingeniera Residente de Obra, Coordinador de maquinaria y el Inspector SST para hacer el recorrido de los kilómetros intervenidos y terminados.

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA POR CUMPLIMIENTO DE KILOMETRAJE

TRACTOCAMIÓN Y SEMIRREMOLQUE TIPO CAMABAJA;

Se realizó la instalación de diferentes componentes y accesorios de acuerdo a la normatividad vigente Colombiana para la circulación de este tipo de vehículo.













VOLQUETA AUMAN BJ1226;

Se realizó el mantenimiento del sistema de frenos de la Volqueta de placas OSE966, la cual presentaba fallas en el sistema del recargue del aire.



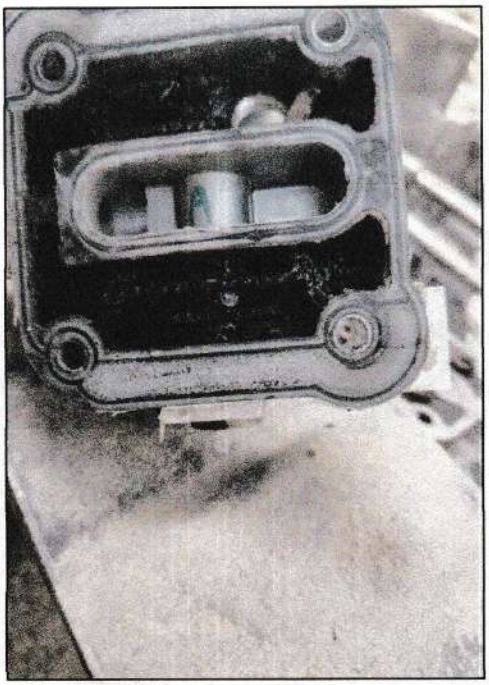


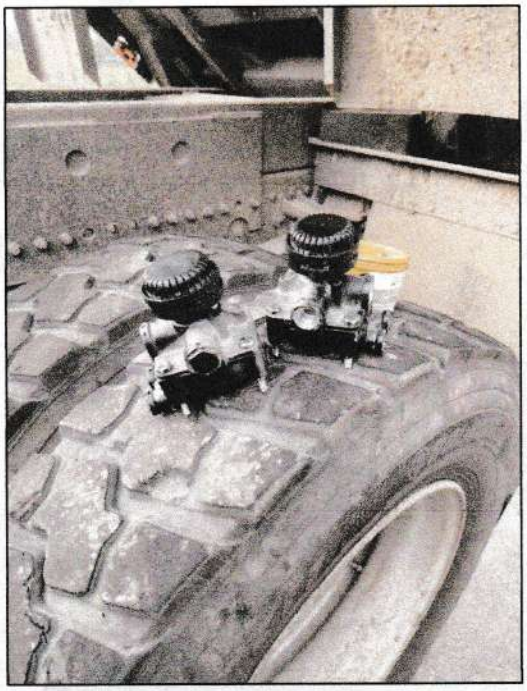






RETROEXCAVADORA CASE 575 SV:

Se realizó el mantenimiento de cumplimiento de horómetro de la retroexcavadora en donde se realiza el cambio de filtros y aceite con el fin de mantener la vida útil de la maquinaria

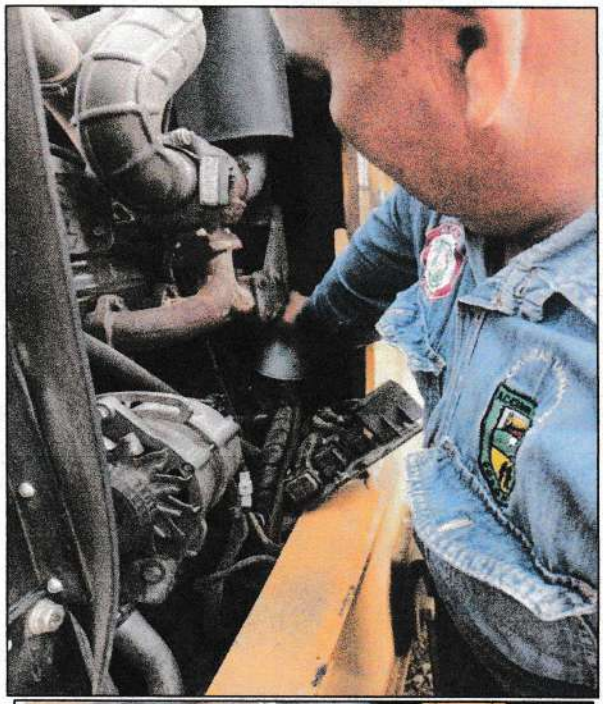

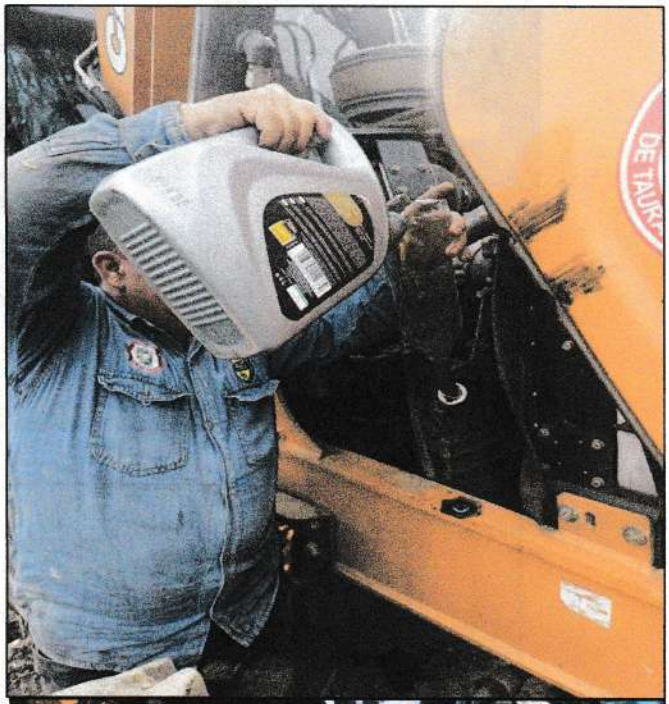

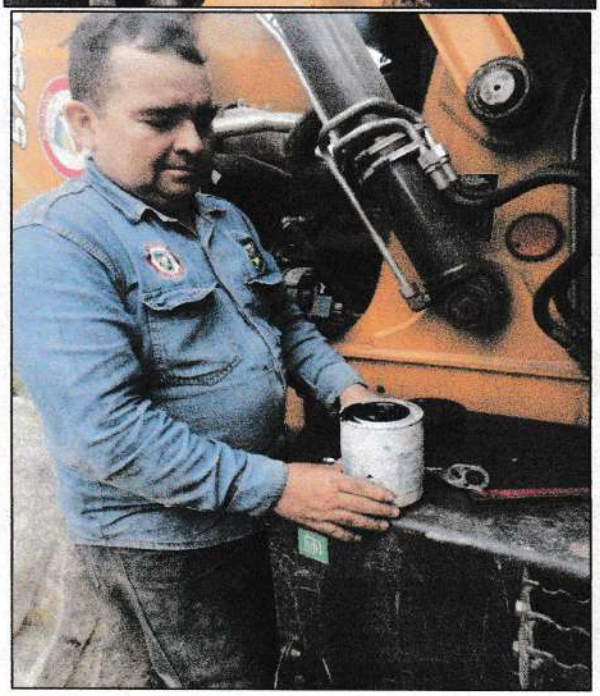


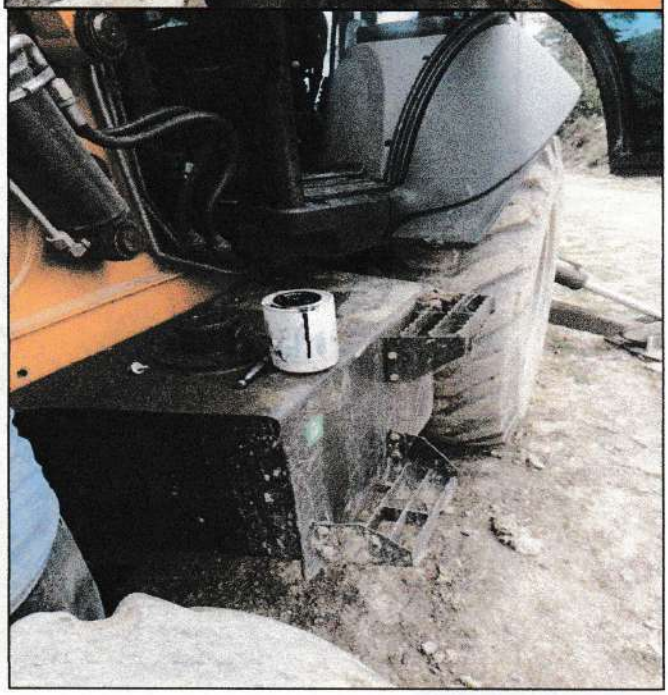



MOTONIVELADORA CASE SERIES 845B:

Se lleva a cabo el cambio de aceite de la motoniveladora de acuerdo a cumplimiento de horómetro.



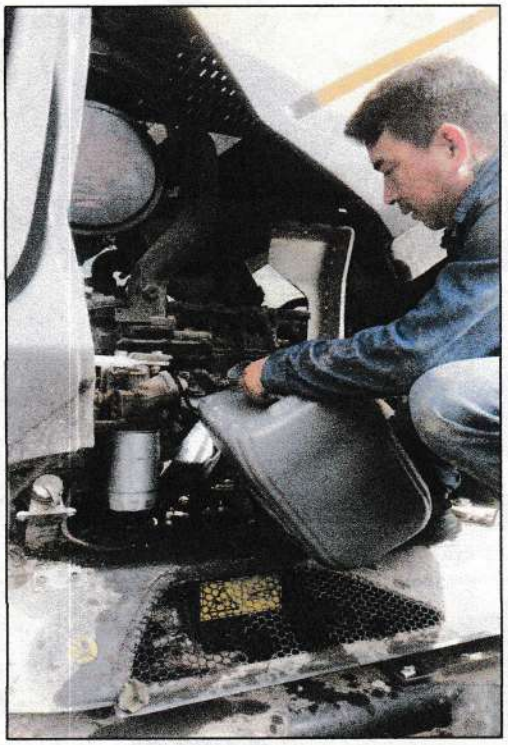


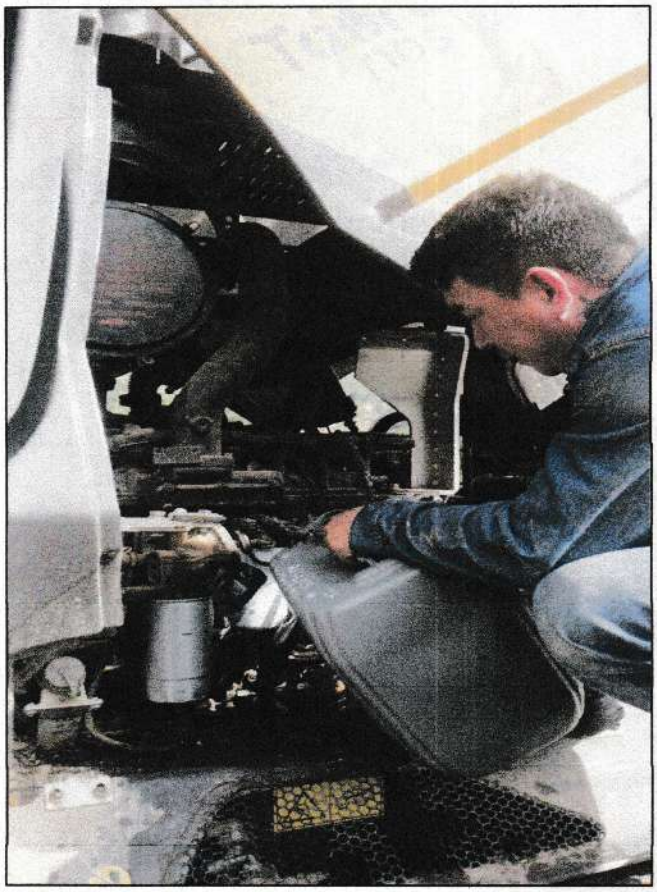


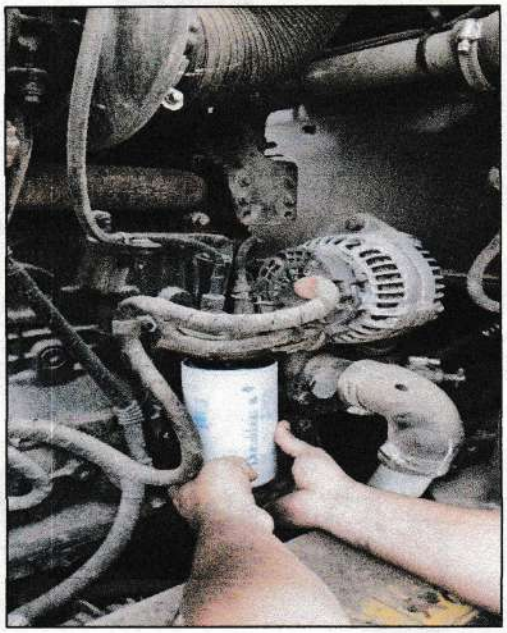

DESPLAZAMIENTO DEL TRACTOCAMIÓN CAMA BAJA

Se realizaron diferentes desplazamientos de la maquinaria amarilla con el tractocamión tipo camabaja para las diferentes Veredas en donde se van a desarrollar las actividades contractuales.

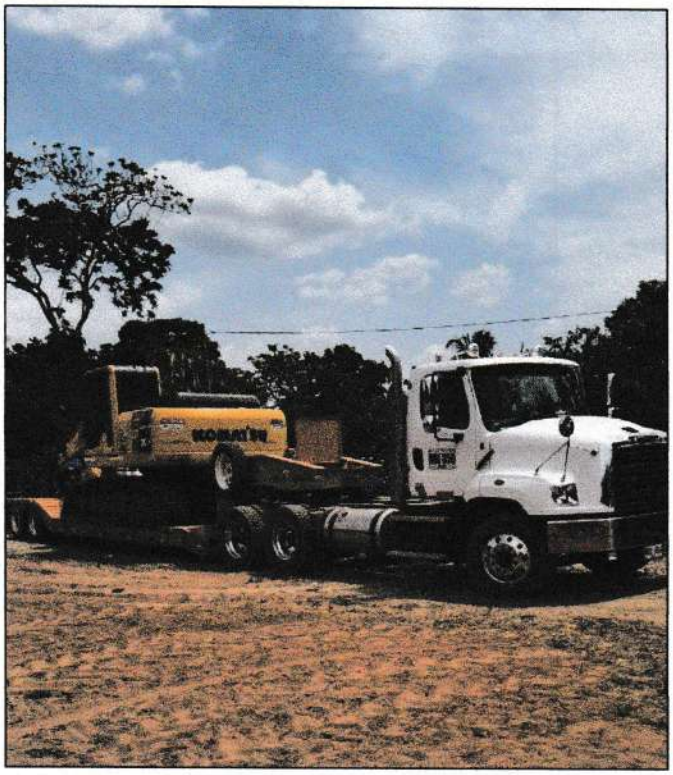

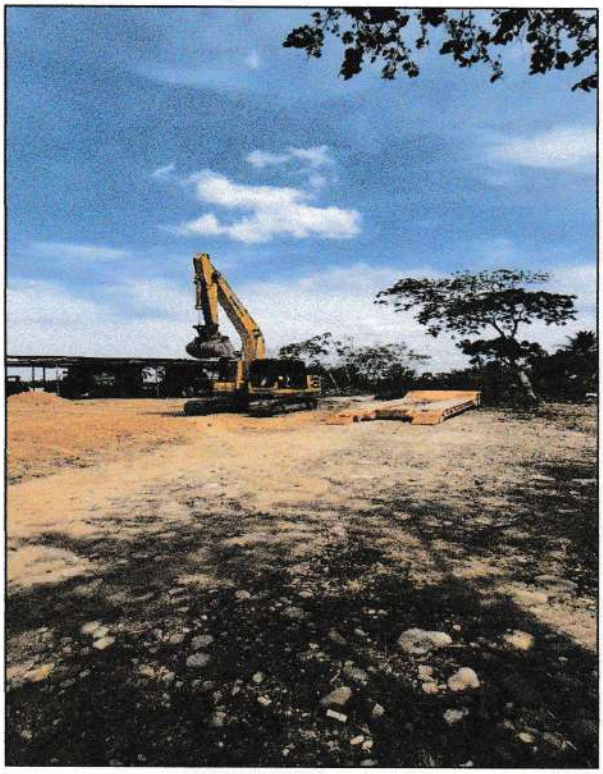



ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8


DESDE EL 25 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 16 DE FEBRERO DE 2026

DÍAS	KM INTERVENIDO DIARIO		DIA	TRAMOS INTERVENIDOS kms	LUGAR
1	MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA	km	26/12/2025	5,25	CABAÑAS
2		km	27/12/2025		
3		km	28/12/2025		
4		km	29/12/2025		
5		km	30/12/2025		
6		km	31/12/2025		
DESCANSO			1/01/2026		
7	1,89	km	2/01/2026		
8	2,15	km	3/01/2026		
DESCANSO			4/01/2026		
10	1,21	km	5/01/2026		
11	1,15	km	6/01/2026	9,65	BENDICIONES Y JAGUITO
12	0,19	km	7/01/2026		
12	1,16	km	8/01/2026		
13	1,26	km	9/01/2026		
14	0,26	km	10/01/2026		
DESCANSO			11/01/2026		
DESCANSO			12/01/2026		
17	0,98	km	13/01/2026		
18	1,20	km	14/01/2026		
DESCANSO			15/01/2026		
19	2,10	km	16/01/2026		
20	1,35	km	17/01/2026		
DESCANSO			18/01/2026		
1	0,91	km	19/01/2026	13,23	VISINACA VIA LAGUNITAS
1	0,79	km	20/01/2026		
2	0,95	km	21/01/2026		
3	0,45	km	22/01/2026		
4	0,98	km	23/01/2026		
5	0,29	km	24/01/2026		
5	1,12	km	25/01/2026		
7	1,89	km	26/01/2026		
7	0,86	km	27/01/2026		
8	0,97	km	28/01/2026		
9	0,99	km	29/01/2026		
10	1,05	km	30/01/2026		
11	1,98	km	31/01/2026		
DESCANSO			1/02/2026		
13	0,26	km	2/02/2026	6,87	VISINACA VIA LOS LIRIOS
13	0,43	km	3/02/2026		
14	0,19	km	4/02/2026		
15	0,35	km	5/02/2026		
16	0,42	km	6/02/2026		
17	0,34	km	7/02/2026		
DESCANSO			8/02/2026		
19	0,36	km	9/02/2026		
19	0,16	km	10/02/2026		
20	0,60	km	11/02/2026		
21	0,89	km	12/02/2026		
21	0,77	km	13/02/2026		
21	0,93	km	14/02/2026		
DESCANSO			15/02/2026		
21	1,17	km	16/02/2026		
TOTAL	**35,00**	**km**			

Bernabe V.

BERNABE VIVAS BAUTISTA
Coordinador de Maquinaria
C.S. 039/2025

Fig. 1 intervención municipio tauramena, Vereda Visinaca via Lagunitas, se Intervinieron **12,17 kms.**

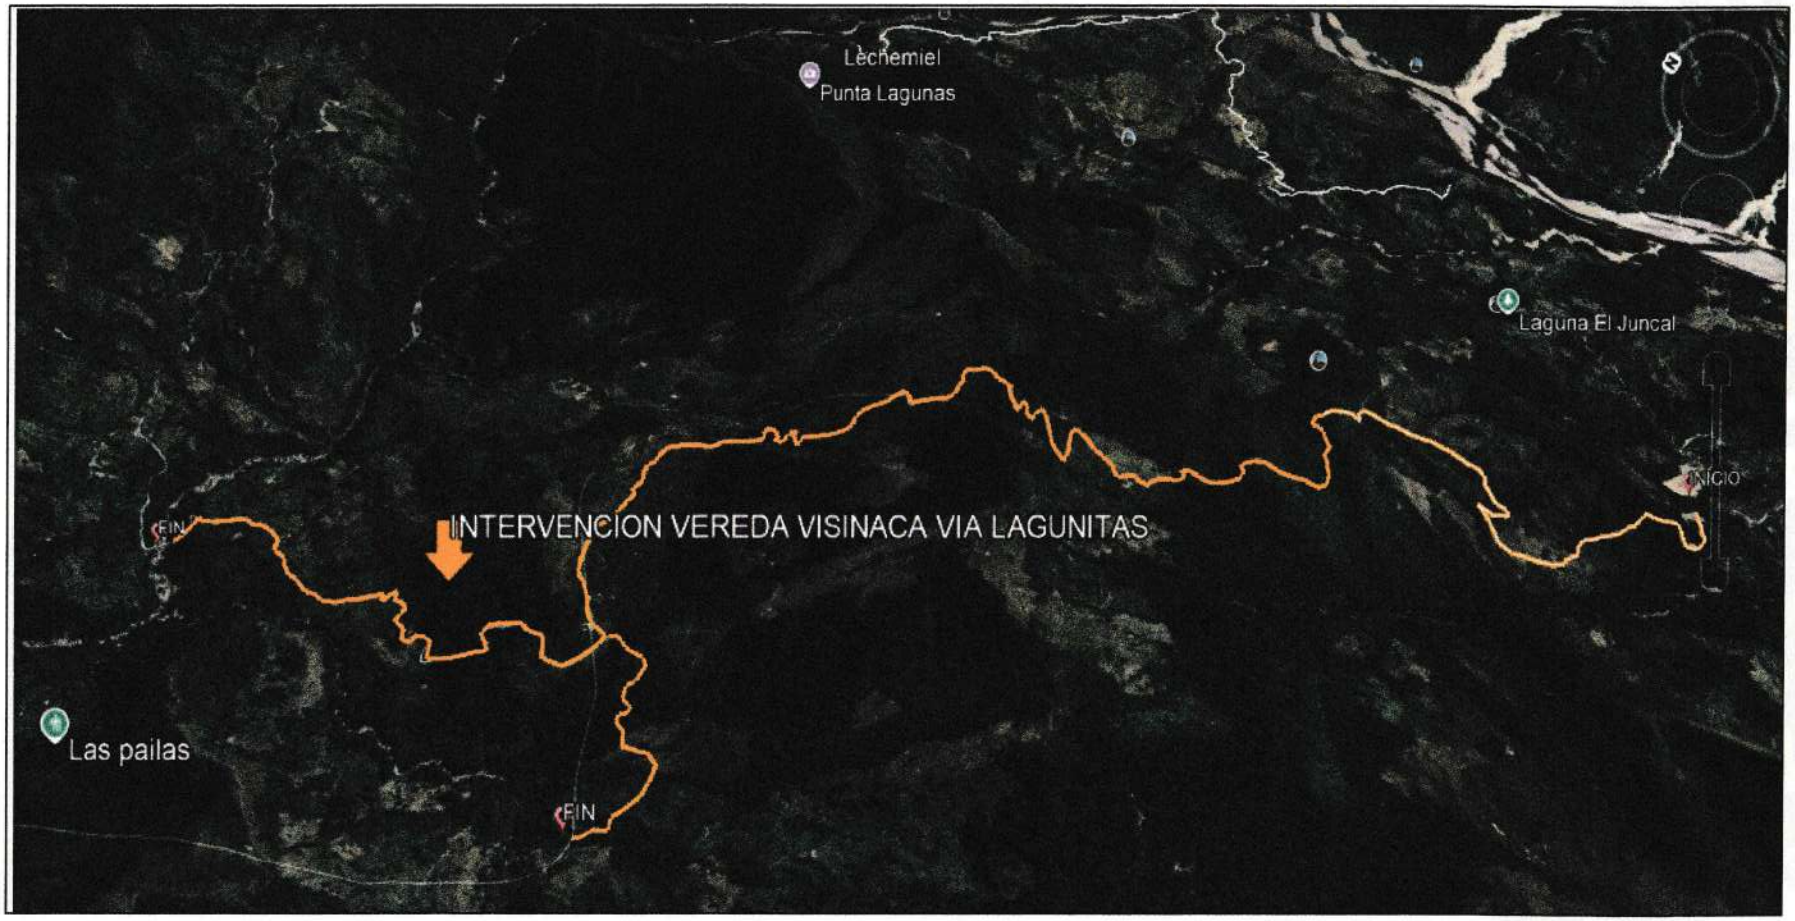


Fuente: Google Earth Pro

Fig. 2 intervención municipio tauramena, Vereda Visinaca via Laguna el Juncal, se Intervinieron **1,06 kms.**



Fuente: Google Earth Pro

Fig. 3 intervención municipio tauramena, Vereda Visinaca via los Lirios, se Intervinieron **6,87 kms.**

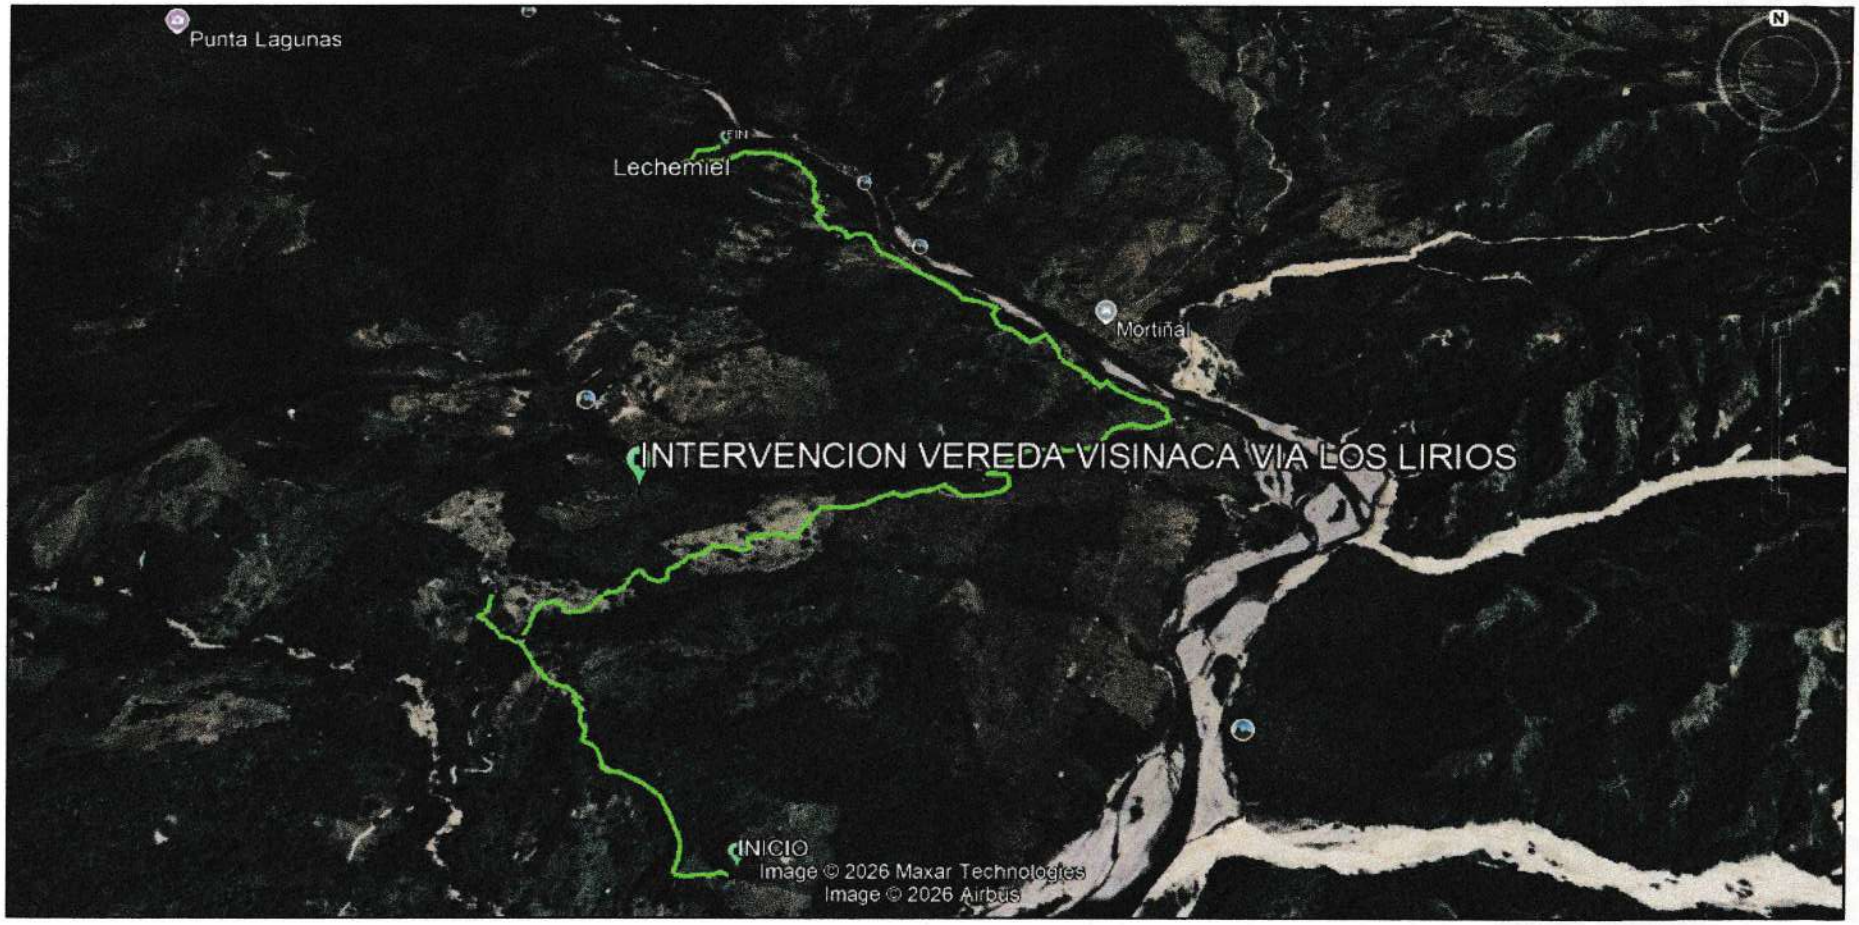

Fuente: Google Earth Pro

Flg. 3 intervención municipio tauramena, Vereda Cabañas, se Intervinieron **2,18 kms.**



Fuente: Google Earth Pro

Fig. 4 intervención municipio tauramena, Vereda Bendiciones y Jaguito, se Intervinieron **2,18 kms.**



Fuente: Google Earth Pro

EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Se ejecutaron los siguientes ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades del Municipio de Tauramena;

AVANCE DE EJECUCIÓN - APORTE MUNICIPIO

ITEM 1. Conformación de las vías terciarias mediante trabajos en la subrasante (incluye: escarificar, perfilar, conformar, extender y compactar.). (las maquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo) 135 km.

Se adelantaron actividades de reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica de cunetas, escarificación del material de afirmado existente, extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales, todo esto en aras de brindar a los habitantes de cada uno de los sectores, las posibilidades de contar con vías que permitan el desarrollo adecuado de sus labores agrícolas, pecuarias y comerciales, mediante las siguientes actividades:

Se adelantaron actividades de reconformación y recuperación de la banca, mediante el empleo de la maquinaria amarilla, la motoniveladora inicio su operación de escarificación ubicándose en uno de los extremos del área donde baja los escarificadores hasta ponerlos en contacto con el material. Iniciará su maniobra lentamente hasta lograr penetrarlos a una profundidad adecuada de acuerdo con el tipo de material en tratamiento hasta llegar al extremo opuesto donde se da la vuelta y se regresa cubriendo la franja continua. Este proceso se repite hasta lograr cubrir toda el área.


Una vez se escarifico, la motoniveladora repitió la operación similar a la del escarificado, pero con la cuchilla ligeramente sesgada con el fin de acordonar el material a lo largo del área en tratamiento.


El Vibrocompactador inicio su maniobra de compactación previa preparación del área con la motoniveladora. Se ubicó en uno de los extremos de la vía hacia el borde y comenzó a desplazarse lentamente hasta llegar al otro extremo en donde se gira y se devuelve, este proceso se repite las veces que sea necesario hasta que se obtiene el grado de compactación adecuado.

Para el periodo comprendido entre el 26 de Diciembre de 2025 al 16 de Febrero de 2026, se obtuvo un avance del 25,93% evidenciado en 35 km intervenidos.

- A continuación, se encuentra el mapeo y registro fotográfico de los tramos intervenidos.
- Vereda Visinaca vía Lagunitas, Visinaca vía los Lirios, Vereda Cabañas, Vereda Bendiciones y Jaguito del Municipio de Tauramena.


REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENCIÓN
VEREDA VISINACA VIA LAGUNITAS
ANTES

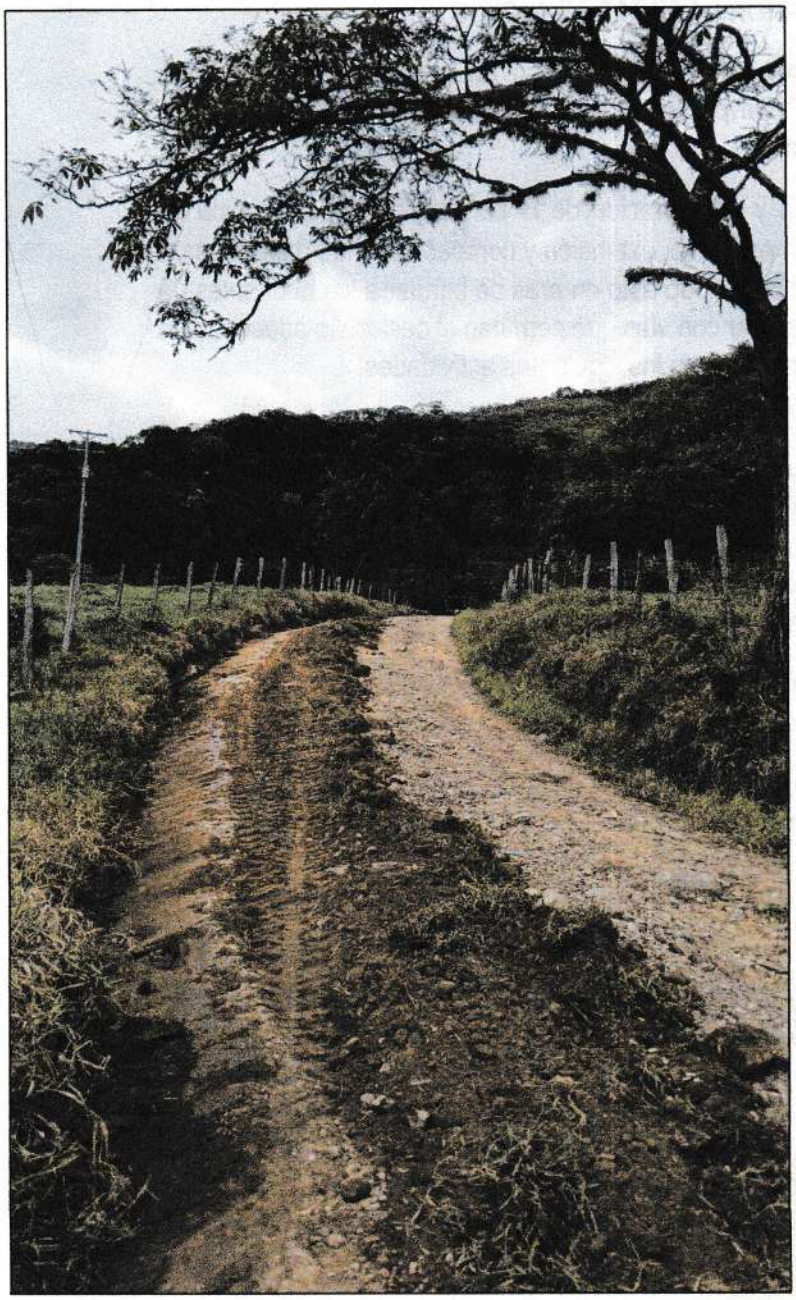

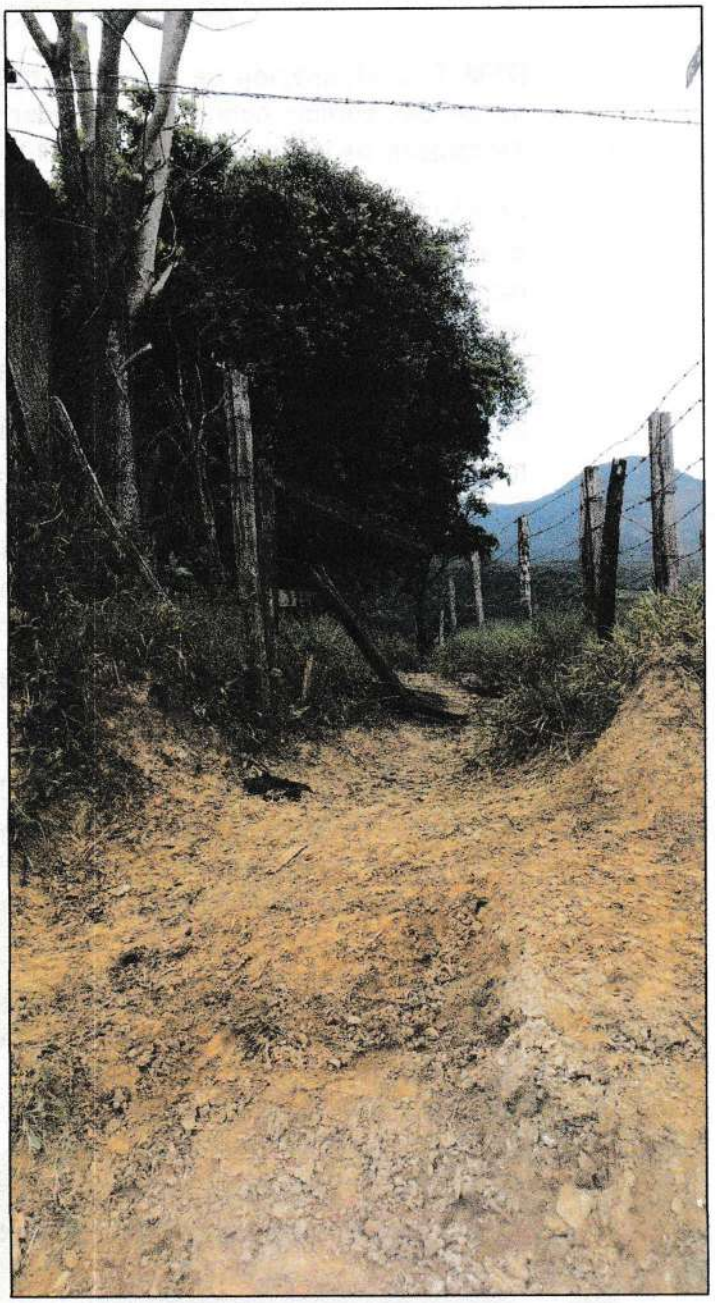



REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENCIÓN
VEREDA VISINACA VIA LAGUNITAS
DURANTE



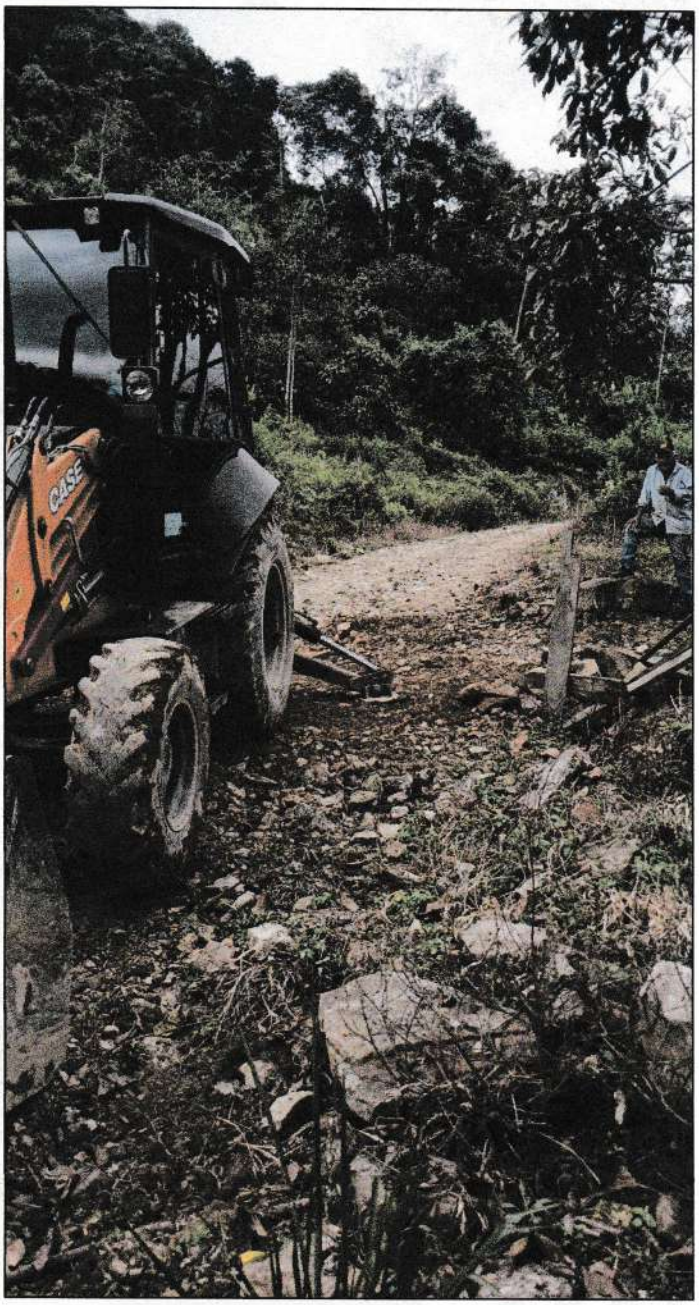



REGISTRO FOTOGRAFICO INTERVENCIÓN
VEREDA VISINACA VIA LAGUNITAS
DESPUÉS

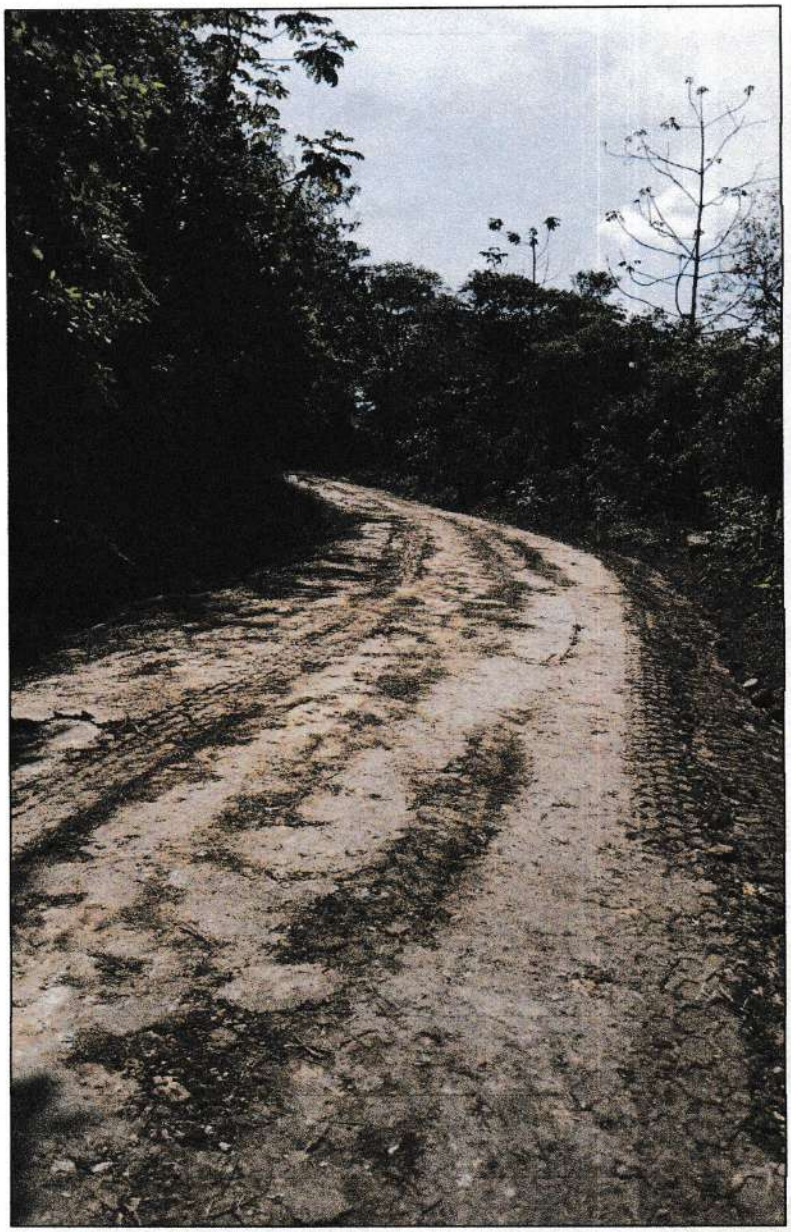

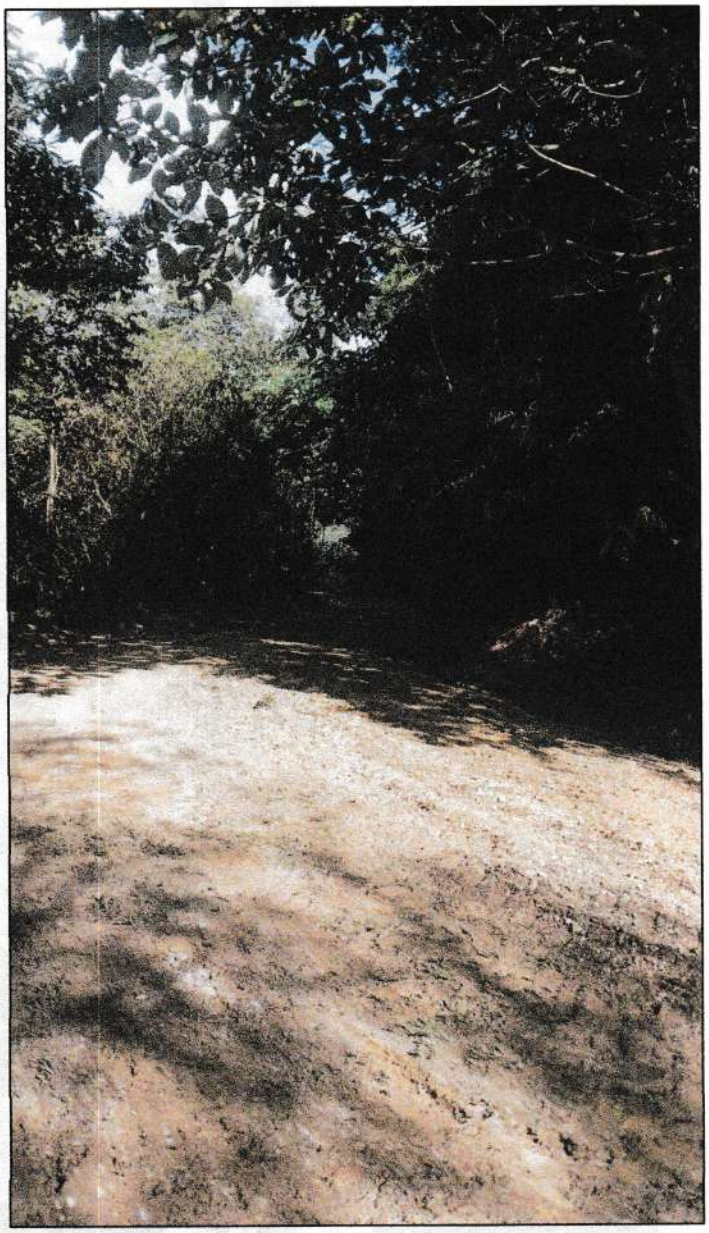


REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENCIÓN VEREDA VISINACA VIA LOS LIRIOS
ANTES

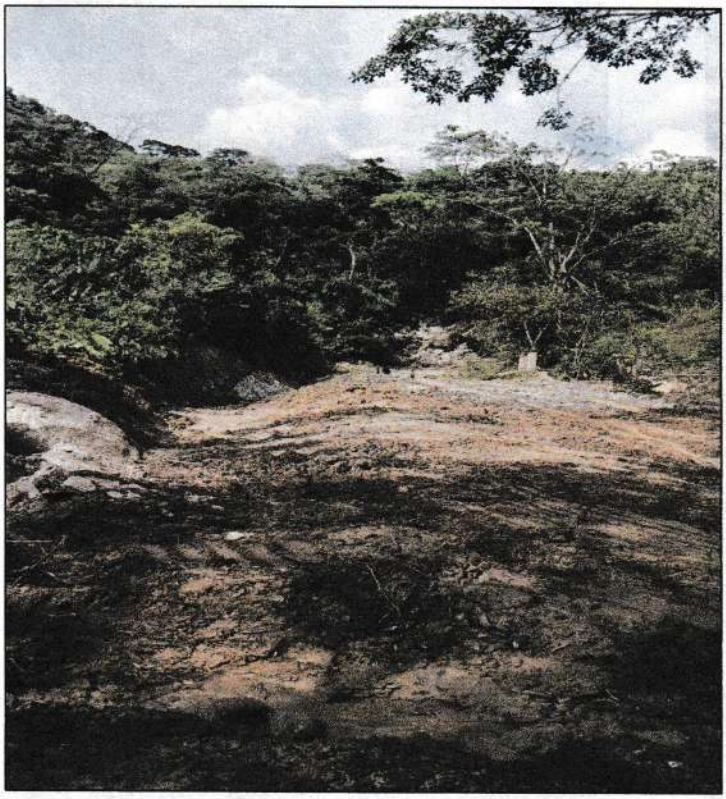


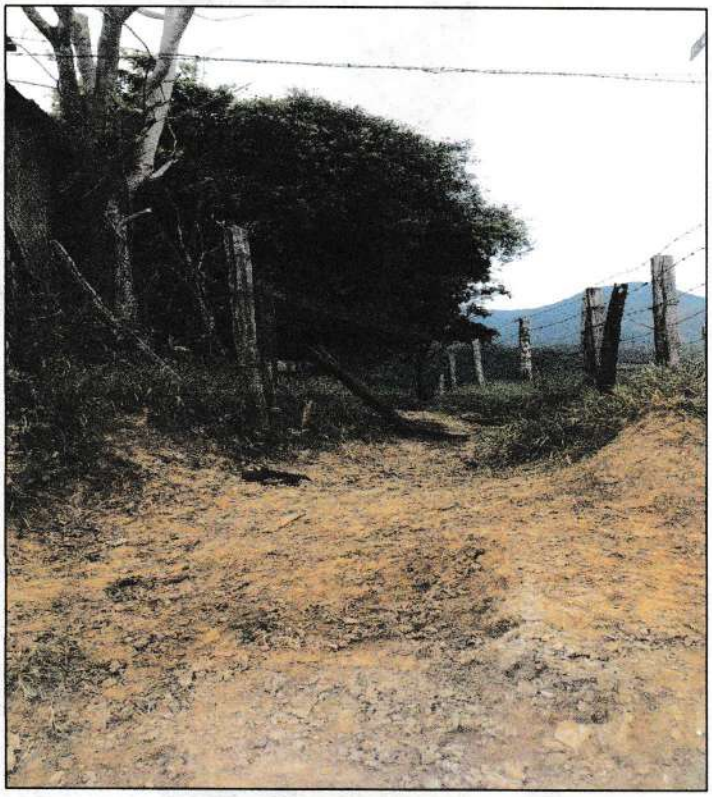




REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENCIÓN VEREDA VISINACA VIA LOS LIRIOS
DURANTE

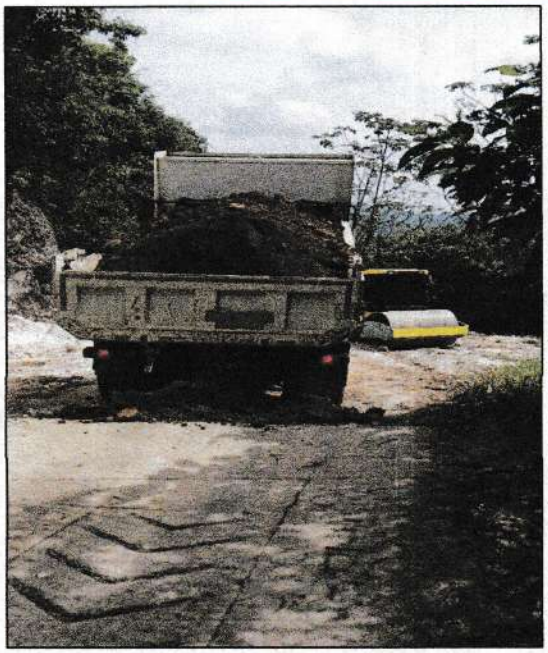

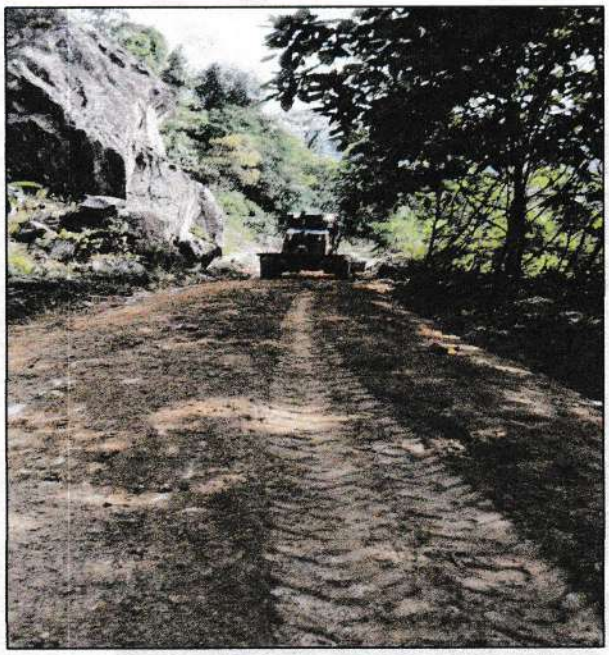




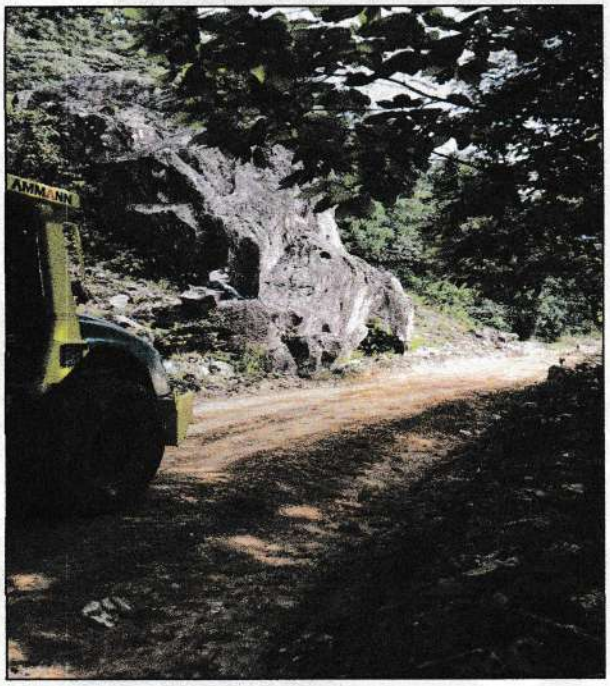


REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENCIÓN VEREDA VISINACA VIA LOS LIRIOS
DESPUÉS




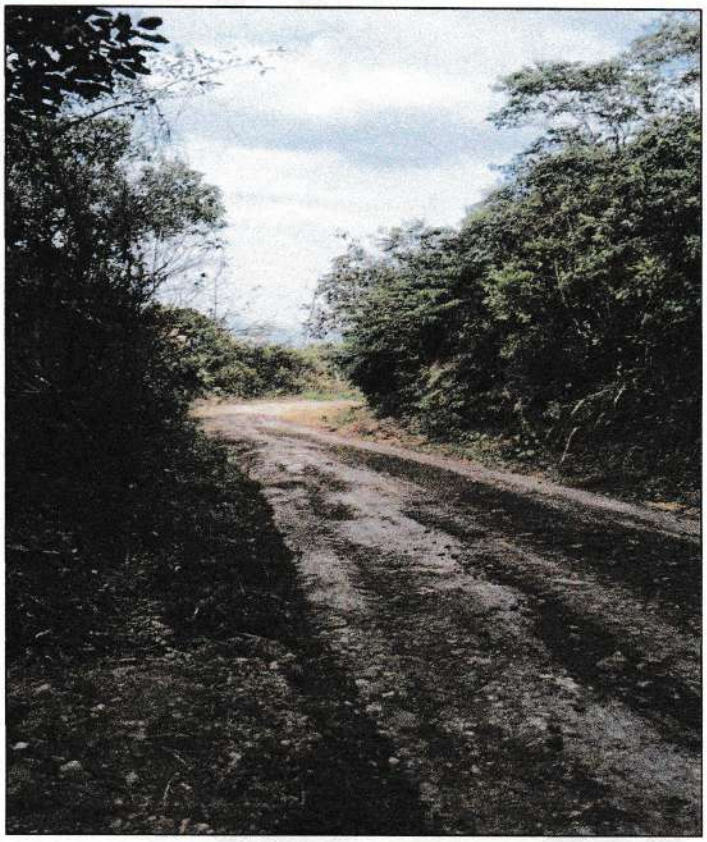





REGISTRO FOTOGRÀFICO
INTERVENCIÓN VEREDA CABAÑAS
ANTES

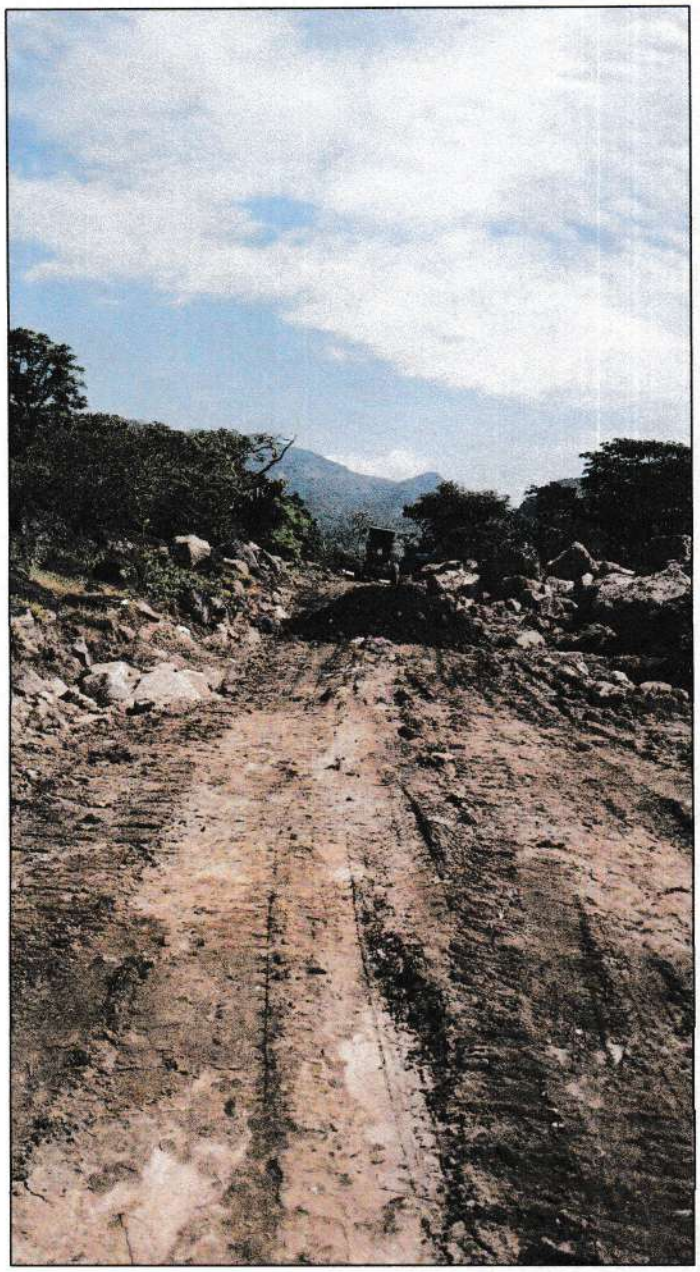


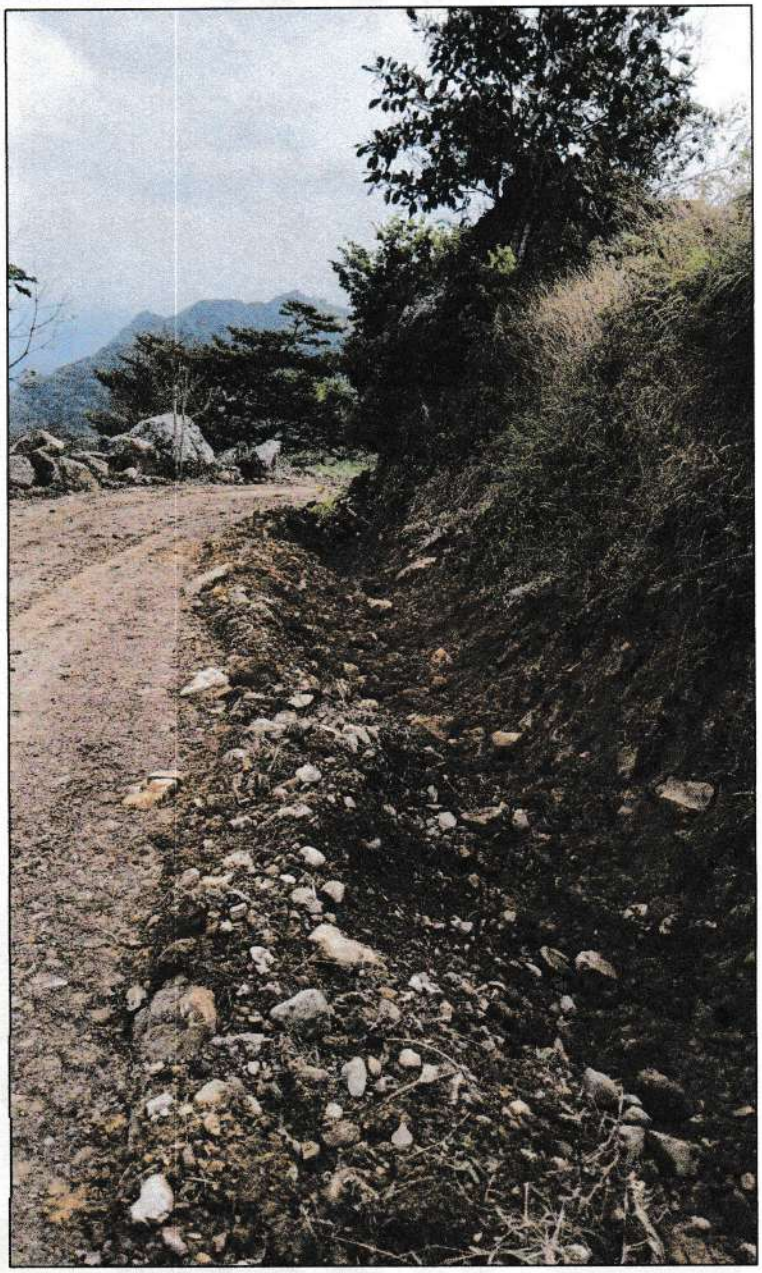

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENCIÓN VEREDA CABAÑAS
DURANTE

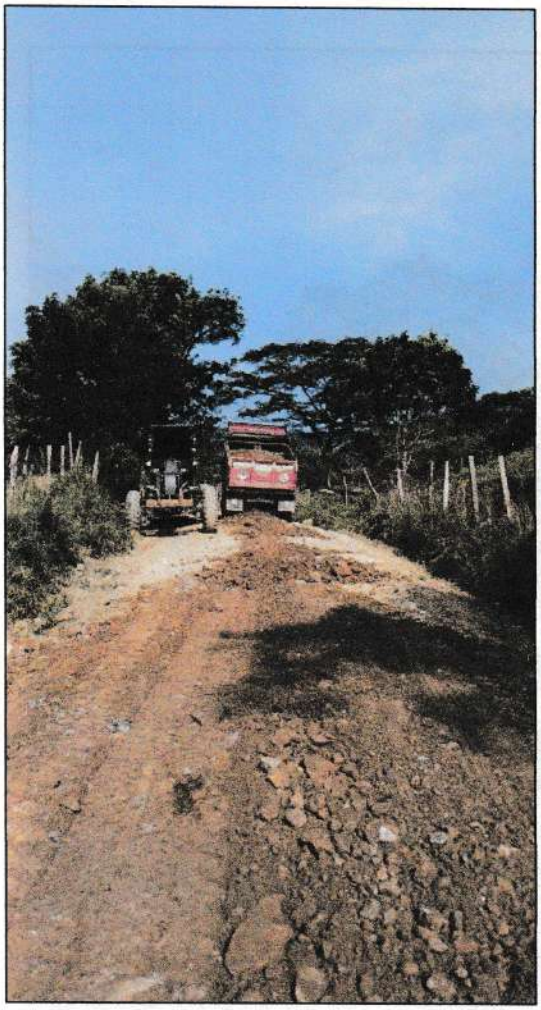


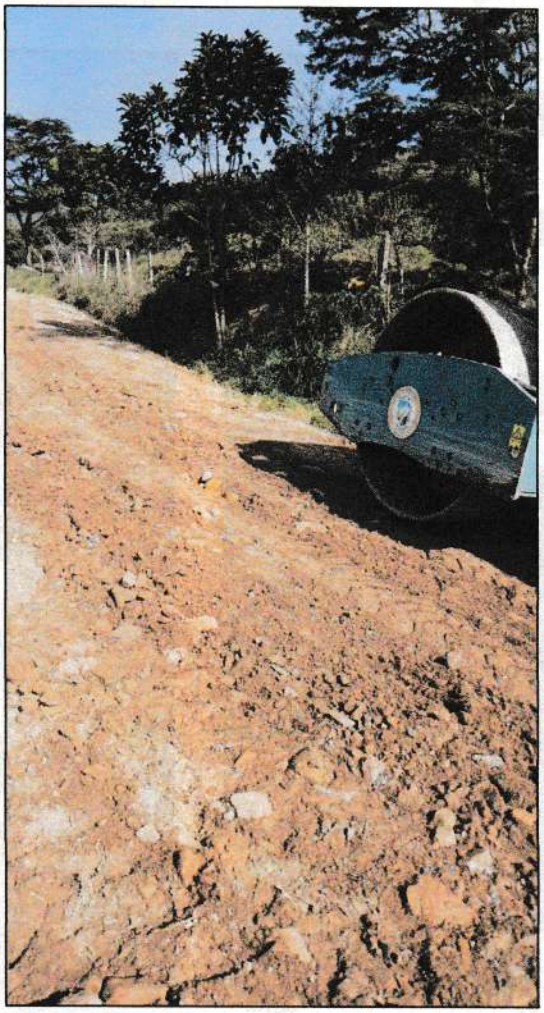


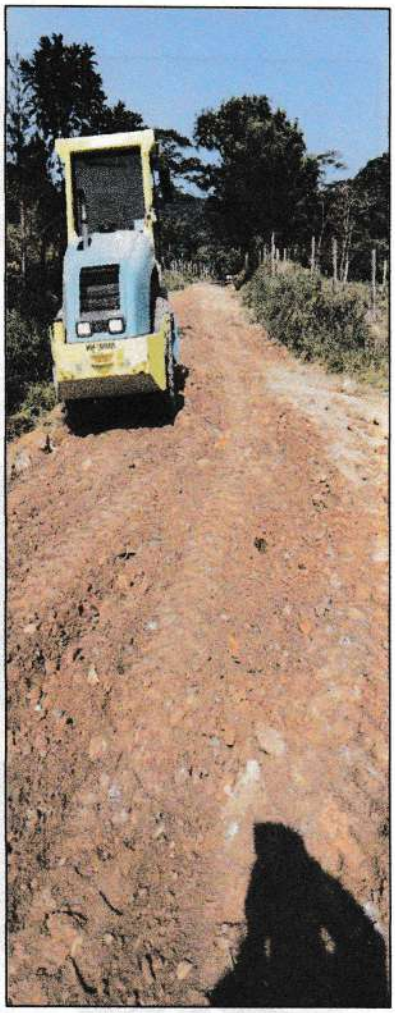


REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENCIÓN VEREDA CABAÑAS


DESPUÉS

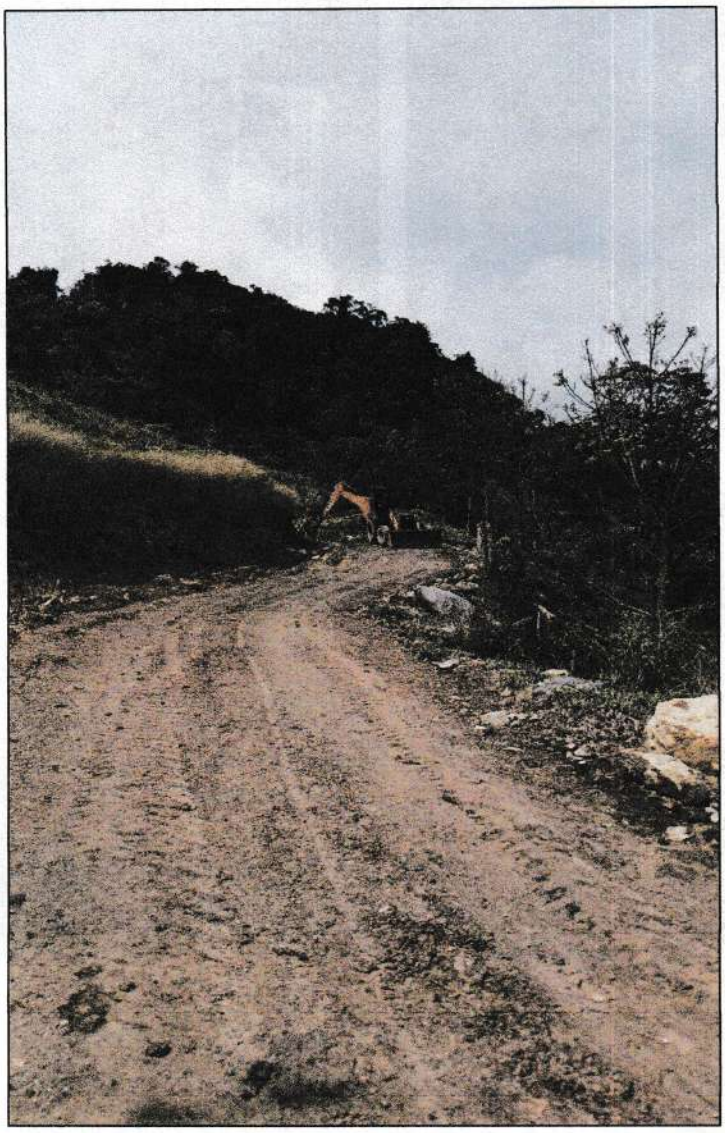

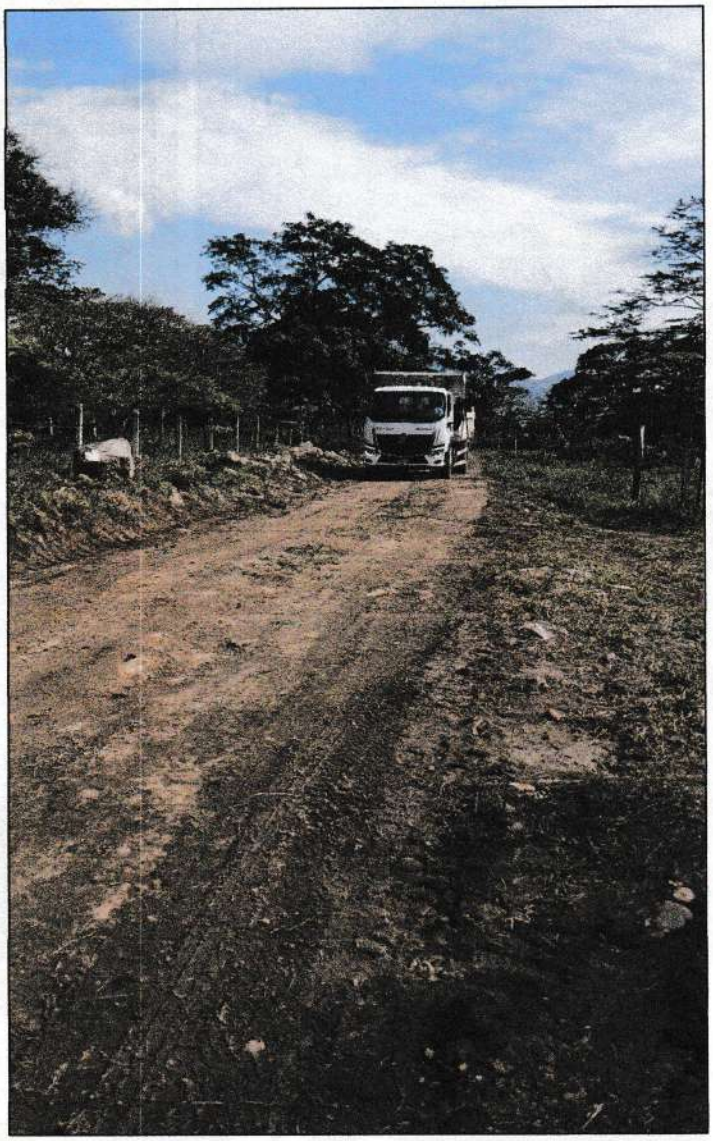



REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENCIÓN VEREDA JAGUITO Y BENDICIONES
ANTES

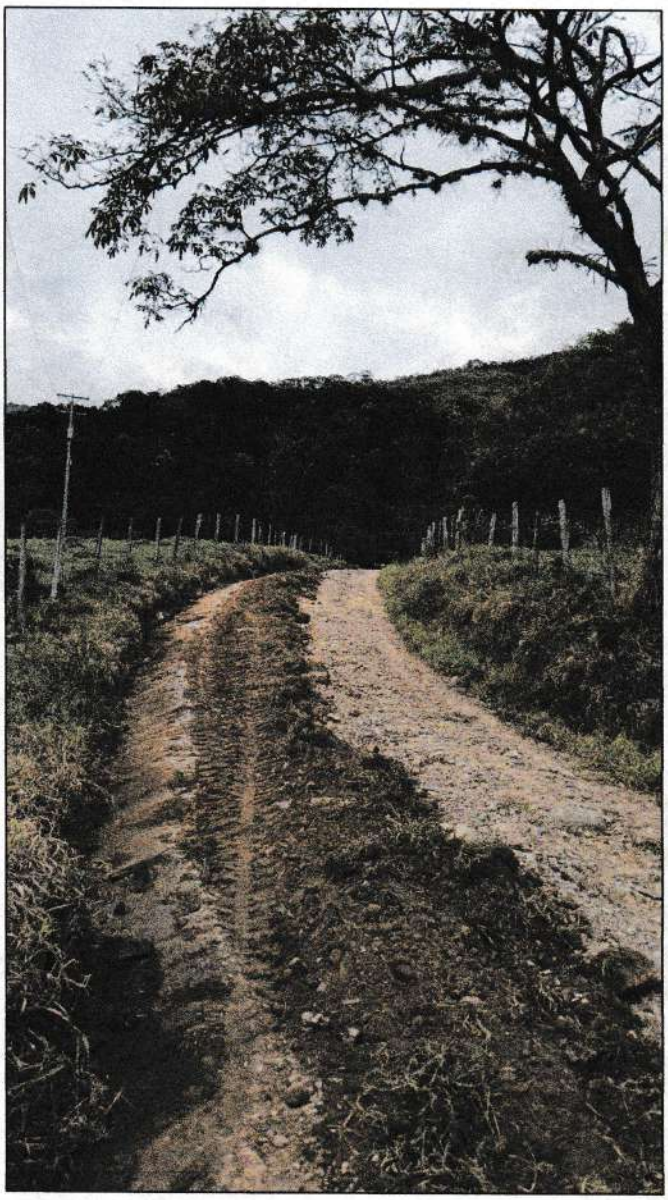

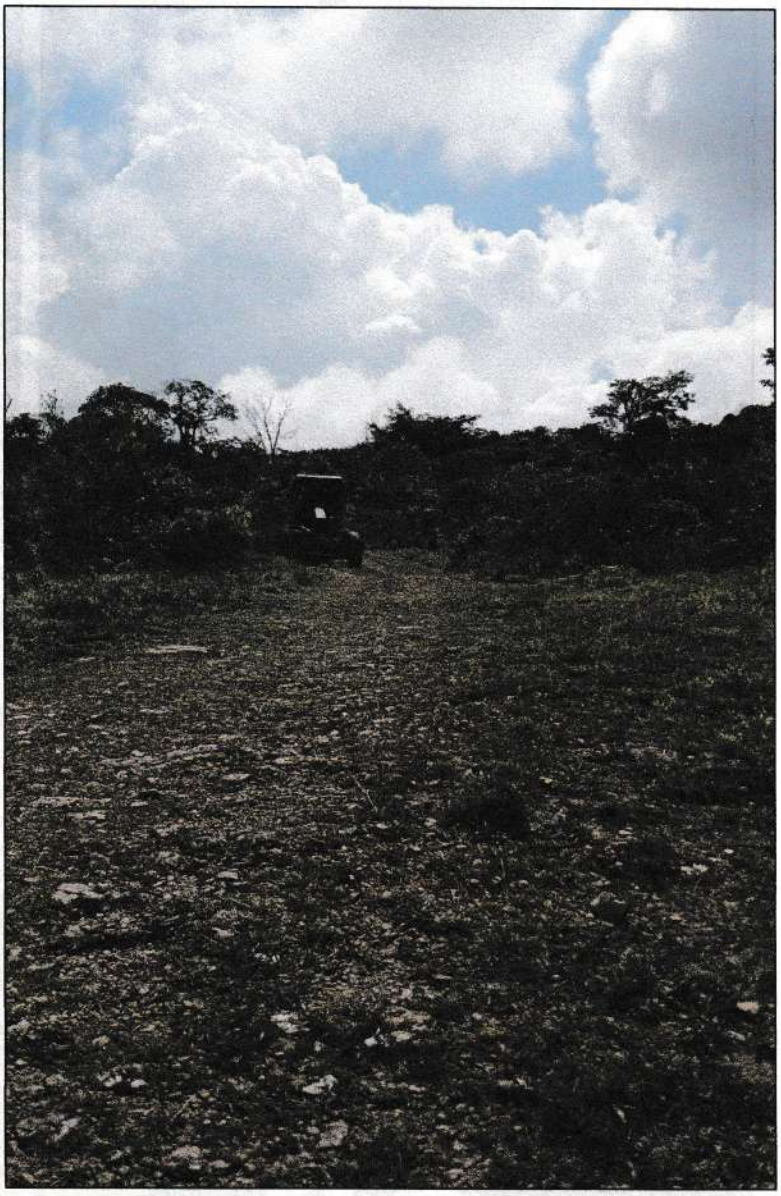


REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENCIÓN VEREDA JAGUITO Y BENDICIONES
DURANTE

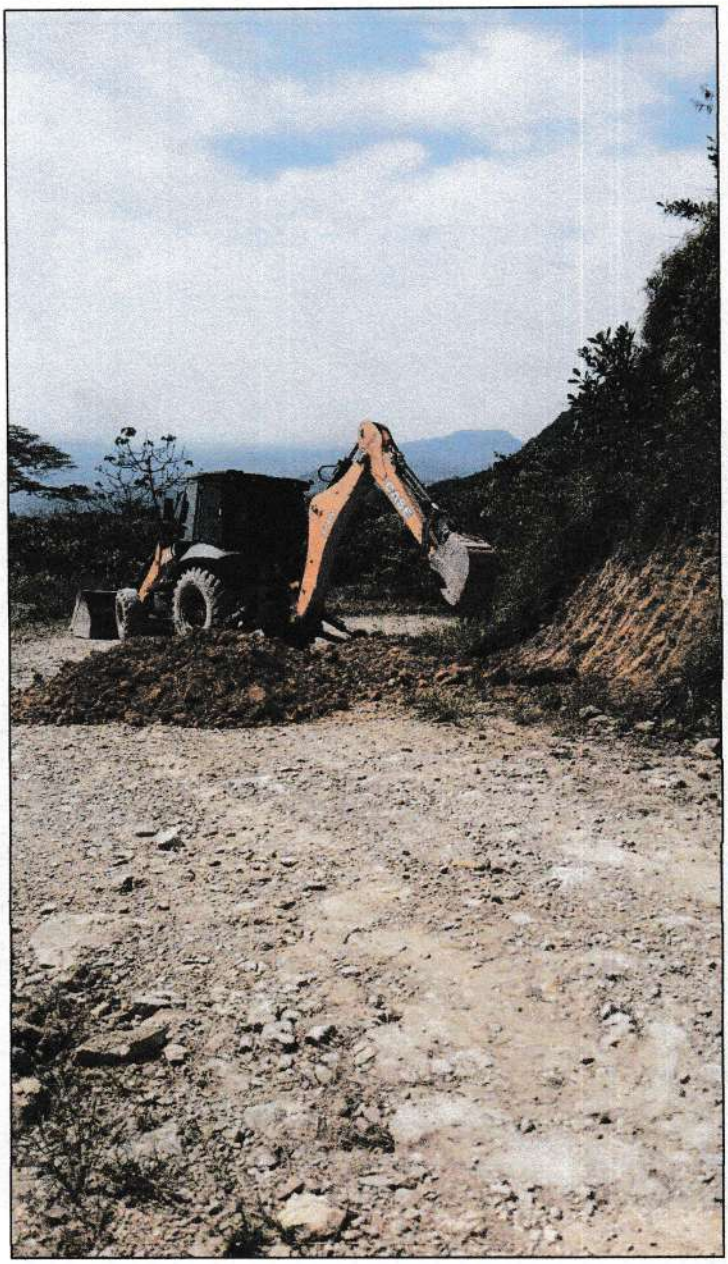

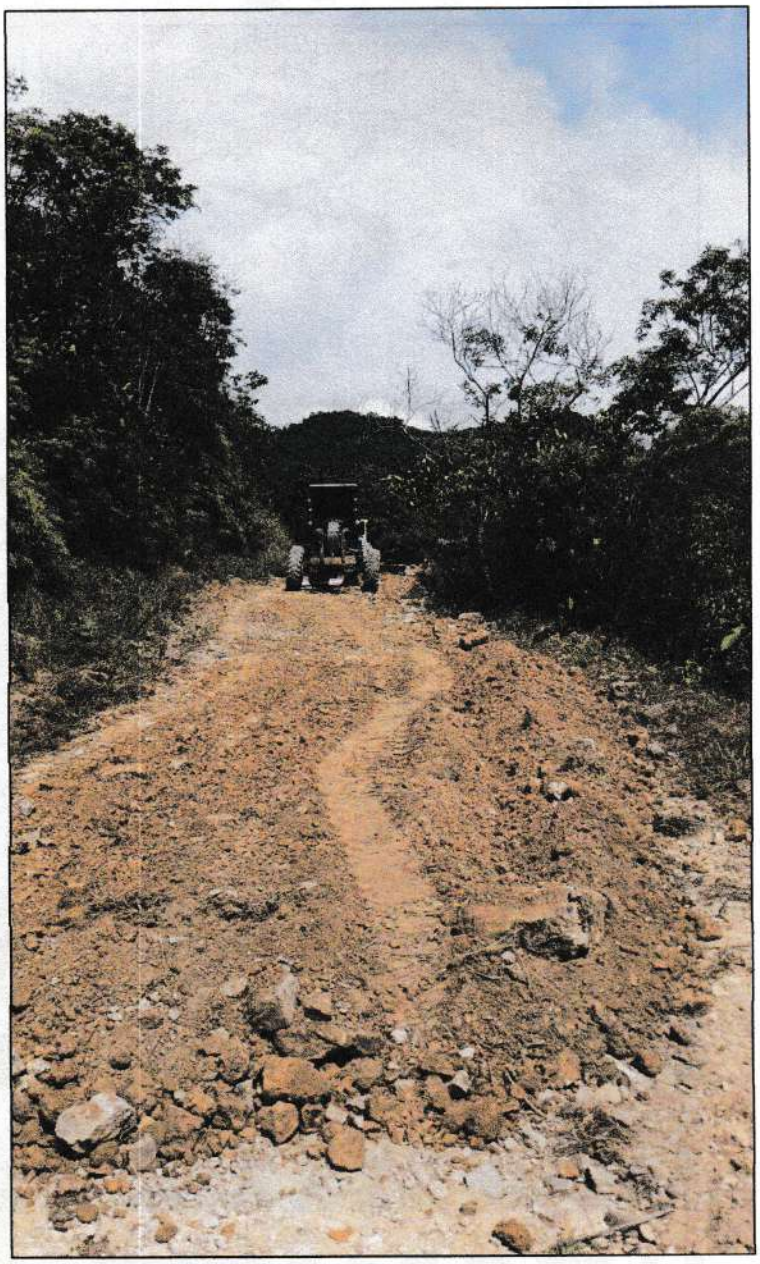

REGISTRO FOTOGRÁFICO
INTERVENCIÓN VEREDA JAGUITO Y BENDICIONES
DESPUÉS

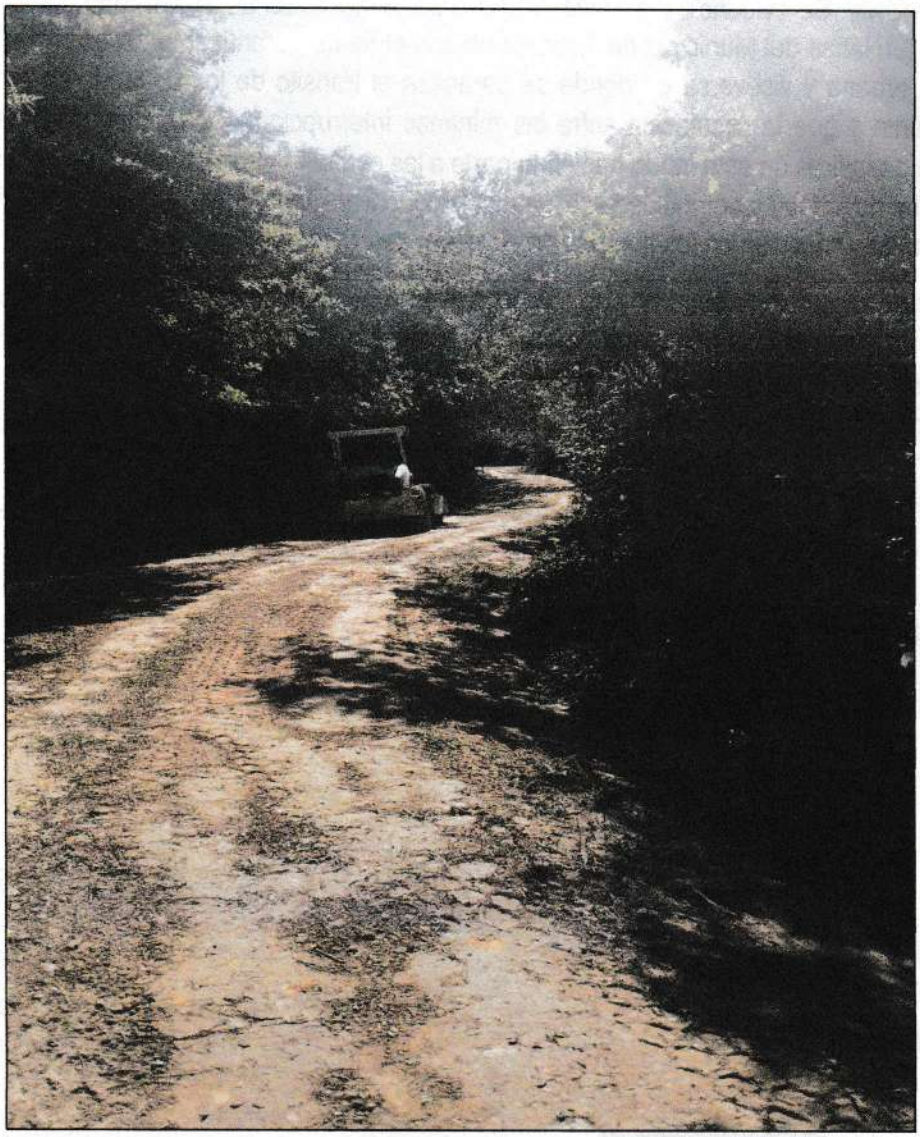

AVANCE DE EJECUCIÓN - APORTE POR PARTE DE ASOJUNTAS TAURAMENA

ITEM 2. Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m de cada lado).

El aporte por parte de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOJUNTAS TAURAMENA" Se evidencio mediante el apoyo en la ejecución de la actividad del mejoramiento de las vías terciarias del Municipio de Tauramena con el fin de garantizar la accesibilidad del área rural hacia la urbana y viceversa en donde se garantiza el tránsito de los usuarios en forma aceptable, permanente y que la circulación sufra las mínimas interrupciones, promoviendo más movilidad de bienes y pasajeros de este modo haciendo parte a las comunidades el proceso de desarrollo local, así mismo dar seguridad y comodidad a los vehículos que transitan por las vías, y que se vea reflejado en la economía, reducción en los tiempos de viaje y el deterioro que puedan tener.

Son actividades que de acuerdo con sus especificaciones no son complejas, no requieren tecnología avanzadas y se realizan con mano de obra local. Buscan dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo nacional y territorial y propender por mejorar el acceso vehicular y peatonal de la población para el acceso a bienes y servicios en la población del Municipio, de igual modo mejorando la calidad de vida de los usuarios de estas vías.

- **Para el periodo comprendido entre el 26 de Diciembre de 2025 al 16 de Febrero de 2026, para el desarrollo de este Ítem se obtuvo un avance del 48,39% y 15 km.**

evidenciado en el siguiente registro fotográfico;



INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

La ejecución de los ítems contractuales del presente Convenio ha sido favorable gracias a las condiciones climáticas, el avance en kilometraje para el periodo comprendido desde el 26 de Diciembre de 2025 al 16 de Febrero de 2026, mostró un mayor rendimiento en el avance de kilometraje.

OBSERVACIONES:

Ninguna.


HENRY PAUL ALFONSO
Representante legal ASOJUNTAS
NIT. No. 900.002.220-8


AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

El presente Convenio Solidario No. 039 del 07 de Noviembre de 2025, presenta el siguiente avance de ejecución:

Para el periodo comprendido entre el **26 de Diciembre de 2025 al 16 de Febrero de 2026**:

- **Aporte Municipio** se obtuvo un avance del **25.93%** evidenciado en **35 kms** intervenidos.
- **Aporte Asojuntas Tauramena** se obtuvo un avance del **48.39%** evidenciado en 15 **kms** intervenidos.

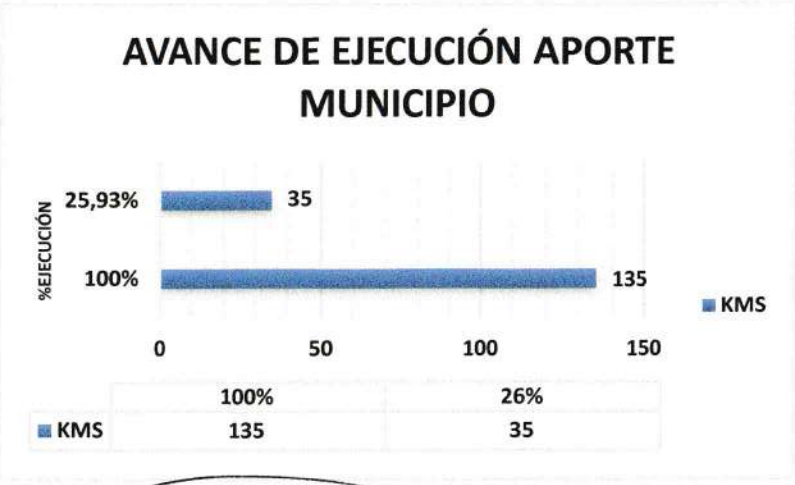

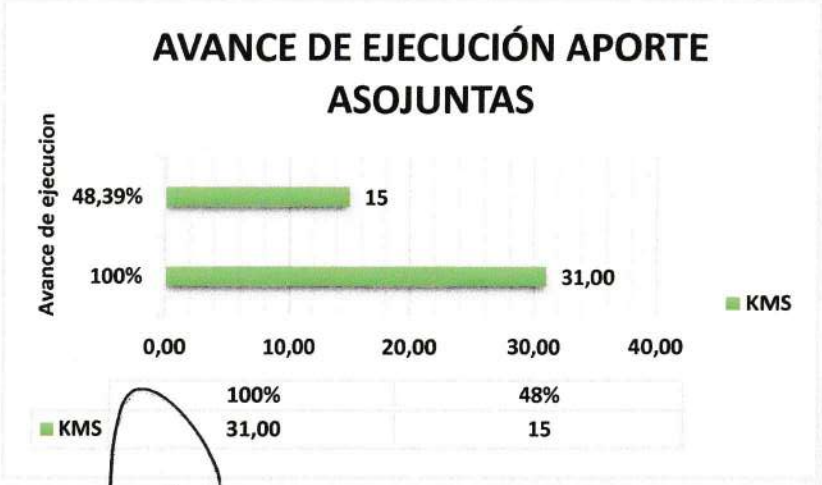

HENRY PAUL ALFONSO
Representante legal ASOJUNTAS
NIT. No. 900.002.220-8

ANGIE LORENA GONZALEZ
Ing. Residente
C.S. 039/2025

ANEXO No.1

BITÁCORA

ANEXO Nº 1

ANUNCIO

Se llevan a cabo actividades de escarificación y compactación en 0,17 km de la vía alterna mantenga.
Responsable.

Ing. Residente

26/12/2025

Clima mañana: Soleado
Soleado: Tarde
personal 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST
No Se llevan a cabo actividades de disgregación, compactación en 0 km debido a mantenimiento preventivo de la maquinaria
Responsable.

Ing. Residente

27/12/2025

Clima mañana: Soleado

Tarde Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

No Se llevan a cabo actividades de disgregación, escarificación y compactación en 0 Km debido al mantenimiento preventivo de la maquinaria

Responsable. Ing. Residente

28/12/2025

Clima mañana: Soleado

Tarde Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

No Se realizan actividades de escarificación, disgregación y compactación en 0 Km debido al mantenimiento de la maquinaria.

Responsable. Ing. Residente

29/12/2025

Clima mañana: nublado

Tarde Soleado

Personal. 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1. Inspector SST

No Se llevan a cabo actividades de disgregación, escarificación y compactación en 0 Km debido al mantenimiento de la maquinaria amarilla

Responsable. Ing. Residente

30/12/2025

clima mañana: Soleado
Tarde: Soleado
personal 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST

No Se realizan actividades de escarificación, compactación y disgregación en 0 Km debido a la maquinaria amarilla

Responsable: Lgm
Ing. Residente

31/12/2025

clima: mañana: Soleado
Tarde: Soleado
personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST

No Se realizan actividades de escarificación, compactación y disgregación en 0 Km debido a la maquinaria amarillo - mantenimiento.

Responsable: Lgm
Ing. Residente

02/01/2026

clima: mañana: Soleado
Tarde: nublado
personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST

No Se llevan a cabo actividades de escarificación, disgregación y compactación en 0 Km debido a mantenimiento de la maquinaria

Responsable: Lgm
Ing. Residente

03/01/2026

Clima mañana · Soleado

Tarde : Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de explotación, compactación y limpieza a lado y lado de la vía en 2,15 Km de la Vereda Cabañas

Responsable: Ing. residente

05/01/2026

clima. mañana · Soleado

Tarde · Soleado

personal 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de explotación, limpieza a lado y lado de la vía, se disgrega y compacta en 1,21 Km de la Vereda Cabañas

Responsable: Ing. residente

06/01/2026

clima. mañana · Soleado


Tarde nublado

personal. 4 operadores


1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST


Se llevan a cabo actividades de disgregación y explotación y compactación en 1,15 Km de la Vereda Bendiciones

Responsable. 
Ing. Residente

07/01/2026

clima. mañana Soleado
Tarde soleado
personal 4 operadores
1 coordinador vaquinaria
1 Inspector SST
Se llevan a cabo actividades de escarificación, disgregación en 0,19 km de la Vereda Bendiciones y Jaguito
Responsable. 
Ing. Residente

08/01/2026

clima. mañana. Soleado
Tarde Soleado
personal. 4 operadores
1 coordinador vaquinaria
1 Inspector SST
Se llevan a cabo actividades de escarificación, disgregación y compactación en 1,16 km de la Vereda Bendiciones y Jaguito
Responsable. 
Ing. Residente

09/01/2026

Clima. mañana. Soleado
Tarde. soleado
personal. 4 operadores
1 coordinador vaquinaria
1 Inspector SST
Se llevan a cabo actividades de escarificación, disgregación y compactación en 1,26 km de la Vereda Bendiciones y Jaguito

Responsable: Lgm
Ing. Residente

10/01/2026

clima mañana: soleado
Tarde: soleado
personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST
Se llevan a cabo actividades de escarificación, compactación y Impiera a lado y lado de la vía en 0,26 Km de la Vereda Badillonel y Jagüito
Responsable: Lgm
Ing. Residente

11/01/2026

clima: mañana: Soleado
Tarde: soleado
personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST
Se llevan a cabo actividades de escarificación y disgregación y escarificación en 1,69 Km de la Vereda Badillonel y Jagüito
Responsable: Lgm
Ing. Residente

13/01/2026

clima mañana: soleado
Tarde: soleado
personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST
Se llevan a cabo actividades de escarificación, compactación y Impiera a lado y lado de

la vía en 0,185 km de la Vereda Berdiconel y Jaguto
Responsable:
Ing. Residente

14/01/2026
clima: mañana · Soleado
Tarde: Soleado
personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST
Se llevan a cabo actividades de escarificación, disgregación y compactación en 0,185 km de la Vereda Berdiconel y Jaguto
Responsable:
Ing. Residente

15/01/2026
clima: mañana: Soleado
Tarde Soleado
personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST
Se llevan a cabo actividades de escarificación, disgregación y compactación en 0,10 km de la Vereda Berdiconel y Jaguto
Responsable:
Ing. Residente

16/01/2026
clima: mañana · Soleado
Tarde soleado
personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificacion, disgregacion y compactacion en 2,10 Km de la Vereda Bendiciones a Jagüito

Responsable

Ing. Residente

17/01/2026

clima: mañana soleado

Tarde Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificacion, disgregacion y compactacion en 1,35 Km de la Vereda Bendiciones a Jagüito

Responsable

Ing. Residente

19/01/2026

clima: mañana: Soleado

Tarde Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de escarificacion, compactacion y disgregacion en 0,91 Km de la Vereda Bendiciones

Responsable

Ing. Residente

20/01/2026

clima: mañana: Soleado

Tarde soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquina

1 Inspector.

Se llevan a cabo actividades de escarificación y compactación en 0,19 km de la Vereda Bendiciones a Jagüito

Responsable: Ing. Residente

21/01/2026

clima: mañana: Soleado
Tarde: Soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificación, disgregación y compactación en 0,25 km de la Vereda Visinaca vía Jagüital

Responsable: Ing. Residente

22/01/2026

clima: mañana: Soleado
Tarde: Soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de disgregación, escarificación y compactación en 0,41 km de la Vereda Bendiciones a Jagüital


Responsable: Ing. Residente

23/01/2026

clima: mañana: Soleado
Tarde: nublado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de escarificación, compactación limpieza a lado y lado de la vía en 0,48 km de la Vereda Vinaca Vía


Responsable: 
Ing Residente

24/01/2026

clima: mañana: Soleado
Tarde: Soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de escarificación, compactación y limpieza a lado de la vía en 0,19 km de la Vereda Vinaca Vía Lagunitas


Responsable: 
Ing Residente

26/01/2026

clima: mañana: Soleado
Tarde: Soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de disgregación, compactación, limpieza a lado y lado de la vía en 1,89 km de la Vereda Vinaca Vía Lagunitas

Responsable: 
Ing Residente

27/01/2026

clima mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de excavación, disgregación, limpieza a lado y lado de la vía en 0,186 km de la vereda Vinaca vía longitudinal

Responsable: Ing. Residente

28/01/2026

clima mañana: Soleado

Tarde soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de disgregación, excavación, compactación en 0,197 km de Vinaca vía longitudinal

Responsable: Ing. Residente

29/01/2026

clima: mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de excavación, disgregación y compactación, limpieza a lado y de la vía en 0,99 km de Vinaca

Via lagunitas

Responsable.

Ing. Residente

30/01/2026

clima mañana: soleado

Tarde soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan a cabo actividades de excavación, disgregación y compactación en 1,08 km de Vivaca via lagunitas

Responsable.

Ing. Residente

31/01/2026

Clima: mañana: Soleado

Tarde soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de excavación y compactación en 1,08 km de Vivaca via lagunitas

Responsable

Ing Residente

02/02/2026

clima. mañana: soleado

Tarde: soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maq

1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de disgregación, escarificación y compactación en 0,26 km de Vinaca vía los Limos

Responsable.

Ing. Residente

03/02/2026

clima: mañana nublado

Tarde nublado

personal: 4 operadores

1 coordinador mag.

1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de escarificación y disgregación en 0,43 km de Vinaca vía los Limos.

Responsable.

Ing. Residente

04/02/2026

clima: mañana Soleado

Tarde Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador mag.

1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de escarificación y disgregación y compactación en 0,19 km de Vinaca vía los Limos

Responsable.

Ing. Residente

05/02/2026

clima: mañana. soleado

Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector HSE

Se ejecutan actividades de limpieza a lado y lado de la vía y disgregación en 0,35 Km de Vinaroz via los Llanos

Responsable:

Ing. Residente

06/02/2026

clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de escarificación, disgregación, compactación en 0,42 Km de Vinaroz via los Llanos.

Responsable:

Ing. Residente

07/02/2026

clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado

personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector HSE

Se ejecutan actividades de escarificación, compactación en 0,34 Km de Vinaroz via los Llanos.

Responsable:

Ing. Residente

09/02/2026

clima: mañana: Soleado

Tarde: Soleado


personal: 4 operadores

1 coordinador maquinaria

1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de escarificación, compactación y limpieza a lado y lado de la vía en 0,36 Km de Vinaca vía la Unión.

Responsable:




Ing. Residente

10/02/2026

clima: mañana. soleado
tarde soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maquinaria
1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de escarificación, disgregación y compactación en 0,46 Km de Vinaca vía Unión. Responsable:



Ing Residente


11/02/2026

clima: mañana. nublado
tarde. Soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maq
1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de escarificación, disgregación y compactación en 0,60 Km de la Vereda Vinaca vía la Unión

Responsable.




Ing. Residente

12/02/2026


clima. mañana: Soleado
tarde. soleado

personal. 4 operadores
1 coordinador maq.
1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de excavación y compactación en 0,89 km de Minaca vía la civil

Responsable: 

Se llevan a cabo actividades de excavación y compactación en 0,10 km de Minaca vía la civil


Responsable: 

13/02/2016

clima: mañana - Soleado
Tarde - soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maq.
1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de disgregación y compactación en 0,44 km de Minaca vía la civil


Responsable: 

14/02/2016

clima: mañana - Soleado
Tarde: Soleado

personal: 4 operadores
1 coordinador maq.
1 Inspector HSE

Se llevo a cabo actividades de excavación, compactación en 0,93 km de Minaca vía la civil

Responsable: 

16/02/2026

Clima: Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

Personal: 4 operadores

1 coordinador maq.

1 Inspector HSE

Se llevan a cabo actividades de excavación y compactación en 1,17 Km de Vía Nueva Los Lirios.

Responsable: [redacted] Ing. Residente

ANEXO No.2

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, HENRY PAUL ALFONSO, identificado con cedula de ciudadanía N. 74.861.785 de Yopal, en mi condición de **Representante Legal** de LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA identificada con Nit 900.002.220-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio con personería Jurica 1077 DEL 18 MARZO 1999 certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses anteriores a la expedición del presente documento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Yo, **ADAN PEÑA PAEZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 74.845.703, y con tarjeta profesional no. 68863-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de **Contador** de LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA identificada con Nit 900.002.220-8, debidamente inscrito en la cámara de comercio con personería Jurica 1077 DEL 18 MARZO 1999, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (instituto colombiano de bienestar familiar icbf, servicio nacional de aprendizaje sena y caja de compensación familiar), cuando a ello hubiere lugar, han sido pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses anteriores a la expedición del presente documento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Tauramena, a los 27 días del mes de Febrero de 2026,

HENRY PAUL ALFONSO
C.C. 74.861.785 de Yopal
Representante Legal

ADAN PEÑA PAEZ
T.P 68863-T
Contador Publico
