
469

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CIHCM416 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN 1 CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA

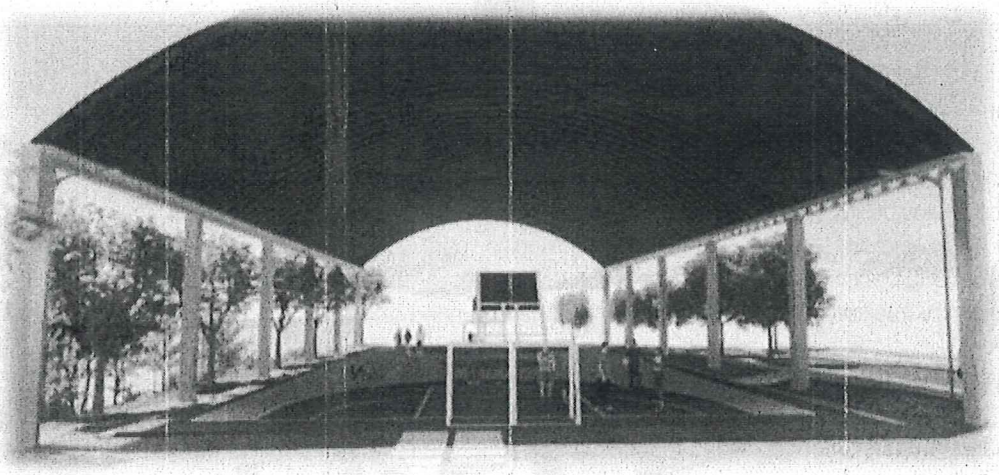

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la Contratista desde el 28 **de NOVIEMBRE DE 2023** hasta el 27 **de DICIEMBRE DE 2023.**

NEIVA - HUILA

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el 28 **de NOVIEMBRE de 2023** hasta el **27 de DICIEMBRE de 2023**, en cumplimiento del contrato general de "INTERVENTORIA No. CIHCM 410 de 2023" cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN 1 CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo cual se efectuará en el agrado: La "**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE I DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA**" ; "**CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA NAZARETH DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA**" ; y "**CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN GARCIA BORRERO DEL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA**".

2. JUSTIFICACIÓN.

En el municipio de Colombia y Baraya, los espacios públicos para las prácticas deportivas de los habitantes, son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Son escasos los programas de fomento al deporte y por eso hay bajo interés por las prácticas deportivas. Buscando el mejoramiento de las zonas de recreación, para que los niños, jóvenes y los adultos puedan llevar a cabo las actividades recreativas y deportivas en un ambiente agradable, seguro y adecuado. se planteó la construcción de tres cubiertas con iluminación, que permita a todos los habitantes de las veredas pertenecientes al municipio agrado donde se pretende desarrollar el proyecto, adelantar actividades recreativas y deportivas para satisfacer las necesidades de recreación y deporte de la población, así como facilitar un buen espacio deportivo para la comunidad, libre se genera la posibilidad de implementar la inclusión de personas con movilidad reducida y que estas se motiven a realizar prácticas de tipo deportivo, social y cultural en miras a mejorar la salud física y mental de todos y cada uno de los ciudadanos para que de esta manera se reduzcan los riesgos de enfermedades de tipo vascular y cardiaco así como evitar el sedentarismo, tan común hoy en día.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO


Los proyectos en el municipio del Colombia y Baraya tienen por objetivo la construcción de una cubierta Autoportante Con Iluminación Para Los Polideportivos Existentes En La Institución Educativa Pablo Sexto Sede I De La Zona Urbana, La Vereda Nazareth De La Zona Rural y La Institución Educativa Joaquín García Borrero; En donde se realizará para cada una su debida cimentación, estructura en concreto, instalación de cubierta, acabados e instalaciones eléctricas.

476


3.1. LOCALIZACIÓN

La interventoría ejercerá sus labores en el municipio del Agrado de los cuales se especifican las siguientes veredas:


MUNICIPIO DE COLOMBIA

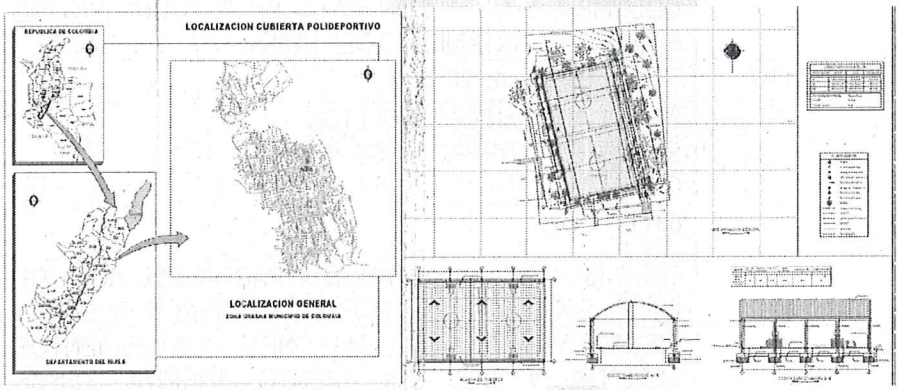

MUNICIPIO DE BARAYA

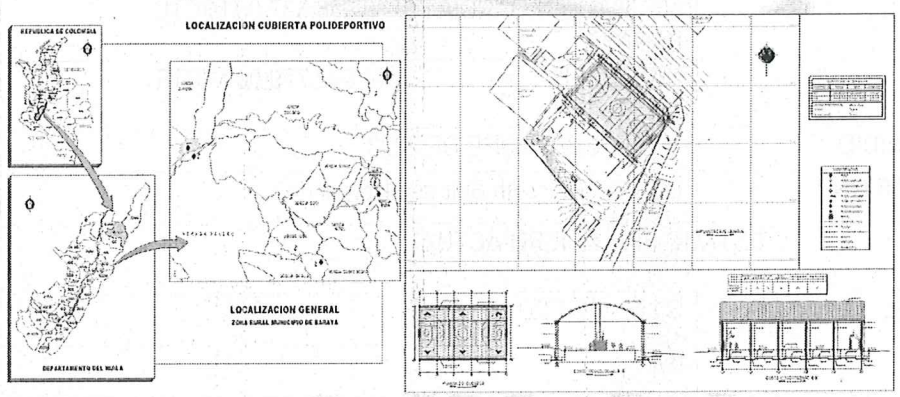

MUNICIPIO DE COLOMBIA

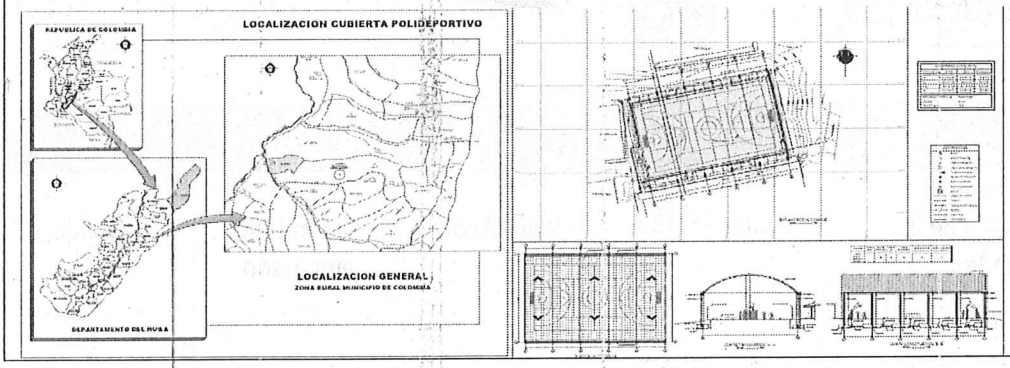

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS		
4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	CIHCM416 DE 2023	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN 1 CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	3 de Noviembre de 2023	
CONTRATISTA	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA R.L JAVIER BARRERO MOSSOS C.C. 74.391.791	
DOCUMENTO C.C - NIT	891101100-5	
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.	
VALOR INICIAL	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS ($ 124.462.130,00 M/CTE)	
VALOR DISCRIMINACION POR OBRA	I.E PABLO VI COLOMBIA	$ 39.973.014,00 M/CTE
	I.E JOAQUIN GARCIA BARAYA	$ 39.966.337,00 M/CTE
	NAZARETH COLOMBIA	$ 44.522.779,00 M/CTE
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023	
APOYO A LA SUPERVISION	Ing. Karoll Lisseth Buitrago Hernández	
ESTADO FINANCIERO ACTUAL		
VALOR CONTRACTUAL	$ 124.462.130,00	
% EJECUTADO	0%	
VALOR ACTA PARCIAL (1)	N/A	
VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Valor acumulado ejecutado	Saldo
Acta Parcial No. 1				

471

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 124.462.130,00	$ 0	$124.462.130,00	$ 0	$ 124.462.130,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	03/11/2023			
Iniciación	10/11/2023	47		
Suspensión No. 1				
Reiniciación No. 1				
Terminación Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		47		

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO		*03 de noviembre de 2023*
ACTA DE INICIO	*0*	*10 de noviembre de 2023*

4.2. CONTRATO DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE I	
CONTRATO No.	CLPIH423 DE 2023
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE I DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	27/10/2023
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL CUBIERTA PABLO SEXTO** R.L YURI ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ C.C 1.118.561.079
DOCUMENTO C.C - NIT	NIT No. 901.770.588-1
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($473.402.864.oo) M/CTE.

FECHA DE ACTA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Nit. 891101100-5
ESTADO FINANCIERO ACTUAL	
VALOR CONTRACTUAL	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($473.402.864.oo) M/CTE.
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
% PROGRAMADO	0,0%
% EJECUTADO	0.5%
VALOR ACTA PARCIAL (1)	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA CLPIH423				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Valor acumulado ejecutado	Saldo
Acta Parcial No. 1				
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$473.402.864,00	$ 0	$473.402.864,00	$ 0	$473.402.864,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	14/11/2023			
Iniciación	28/11/2023	29		
Suspensión No. 1				
Reiniciación No. 1				
Terminación Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		29		

472

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
FIRMA CONTRATO		*14 de noviembre de 2023*
ACTA DE INICIO	*0*	*28 de Noviembre de 2023*
ACTA DE VEEDURIA		*01 de diciembre de 2023*

4.3. CONTRATO DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN GARCIA BORRERO	
CONTRATO No.	CLPIH377 DE 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN GARCIA BORRERO DEL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	24/10/2023
CONTRATISTA	CONSORCIO TABOR 91 CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ Nit. 901765071-4
DOCUMENTOC.C - NIT	901765071-4
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR TOTAL	$ 478.608.070,00 M/CTE
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Nit. 891101100-5
ESTADO FINANCIERO ACTUAL	
VALOR CONTRACTUAL	$ 478.608.070,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,0
% PROGRAMADO	0,0%
% EJECUTADO	0,5%
VALOR ACTA PARCIAL (1)	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA CLPIH402

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Valor acumulado ejecutado	Saldo
Acta Parcial No. 1				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 478.608.070,00	$ 0	$ 478.608.070,00	$ 0	$ 478.608.070,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	**FECHA**	**DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
FIRMA CONTRATO	24/10/2023			
Iniciación	10/11/2023	47		
Suspensión No. 1				
Reiniciación No. 1				
Terminación Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		47		

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
FIRMA CONTRATO		*14 de octubre de 2023*
ACTA DE INICIO	*0*	*10 de noviembre de 2023*
ACTA DE VEEDURIA		*13 de noviembre de 2023*

4.4. CONTRATO DE OBRA VEREDA NAZARETH	
CONTRATO No.	CLPIH394-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA NAZARETH DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	26/10/2023

473

CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVVOS JC JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR TOTAL	$ 531,161,721.00 MCTE
FECHA DE ACTA DE INICIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Nit. 891101100-5
ESTADO FINANCIERO ACTUAL	
VALOR CONTRACTUAL	$ 531,161,721.00
VALOR ANTICIPO	$132,790,430.25
% PROGRAMADO	0,0%
% EJECUTADO	0,5%
VALOR ACTA PARCIAL (1)	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA CLPIH 394				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Valor acumulado ejecutado	Saldo
Acta Parcial No. 1				
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 531,161,721.00	$ 0	$ 531,161,721.00	$ 0	$ 531,161,721.00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	26/10/2023			
Iniciación	23/11/2023	34		
Suspensión No. 1				

Reiniciación No. 1				
Terminación Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		34		

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)			
Tipo de Acta	No.		Fecha
FIRMA CONTRATO			*26 de octubre de 2023*
ACTA DE INICIO	*0*		*23 de noviembre de 2023*
ACTA DE VEEDURIA			*01 de diciembre de 2023*

5. ACTIVIDADES ADMISNITRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El día 1 de noviembre del 2023, la ing. KAROLL LISSETH BUITRAGO HERNANDEZ es designado mediante oficio por la Directora del INDERHUILA como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CIHCM416 – 2023** cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN 1 CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IHCM018-2023.

Dentro de las actividades desarrolladas se tiene las siguientes:

1. Por parte del apoyo a la supervisión se realiza recopilación de información sobre el proceso de interventoría IHCM018-2023 y procesos de licitación publica al cual se hará la interventoría LPIH016-2023; LPIH028-2023 Y LPIH031-2023.

2. La entidad le hace entrega al contratista de obra **UNION TEMPORAL CUBIERTA PABLO SEXTO** el nuevo contrato CLPIH423 de 2023 para la firma como su respectiva legalización del mismo y sacar pólizas, firma que se realiza el día 27 de octubre de 2023 en el SECOP II.

3. La entidad le hace entrega al contratista de obra **CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JC** el nuevo contrato CLPIH394 de 2023 para la firma como su respectiva legalización del mismo y sacar pólizas, firma que se realiza el día 26 de octubre de 2023 en el SECOP II.

4. La entidad le hace entrega al contratista de obra **CONSORCIO TABOR 91** el nuevo contrato CLPIH377 de 2023 para la firma como su respectiva legalización del mismo y sacar pólizas, firma que se realiza el día 26 de octubre de 2023 en el SECOP II.

5. La entidad le hace entrega al contratista de interventoría **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA** el nuevo contrato CIHCM416 DE 2023 para la firma como su respectiva legalización del mismo y sacar pólizas, firma que se realiza el día 03 de noviembre de 2023 en el SECOP II.

474

6. El día 8 de noviembre de 2023 se realizó reunión en las instalaciones del InderHuila estando presente el apoyo a la supervisión Ing. Karoll Lisseth Buitrago Hernandez junto con el representante legal del **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA**, (contratista de interventoría); **CONSORCIO TABOR 91** (contratista de obra No. CLPIH377) y el Ing. WILLIAM PARRA OLAYA del InderHuila en el cual se realizó:

   - ✓ Explicación del proyecto a construir
   - ✓ Explicación de los formatos a tener en cuenta para tema de anticipo
   - ✓ Envió de soportes documentales (planos digitales, especificaciones técnicas, formatos, información de valla)
   - ✓ **Firma del Acta de Inicio de obra e interventoría.**
   - ✓ **Firma de veeduría**

7. El día 13 de noviembre el contratista CLAUDIO MEJIA, se remitió al sitio de obra, municipio de Baraya I.E Joaquin Garcia con el fin de realizar una revisión del sitio a construir.

8. El día 20 de noviembre el contratista del contrato de obra No. CLPIH377 DE 2023 hacen entrega de las pólizas actualizadas según acta de inicio, las cuales fueron revisadas y entregadas al área jurídica para su aprobación.

9. Se realizo visita de obra y socialización el 1 de diciembre con la ingeniera Alejandra contreras, e ingeniero Andrés paredes a la obra de Colombia nazareth y pablo sexto.

10. Se le da tramite a los anticipos presentados por los contratistas.

6. DECRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE CONSULTORÍA / OBRA / INTERVENTORIA

Por el momento no se evidencia avance en obra, puesto que los contratistas están realizando la revisión de planos.

6.1. INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE I DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA
6.2. NAZARETH DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA
6.3. INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN GARCIA BORRERO DEL MUNICIPIO DE BARAYA

En la actualidad al 27 de noviembre solo se han realizado actividades de localización y replanteo de obra.

ING. KAROLL LISSETH BUITRAGO H.
APOYO A LA SUPERVISION


ING. WILLIAM PARRA OLAYA
APOYO A LA SUPERVISION

475

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CIHCM416 DE 2023

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN 1 CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA

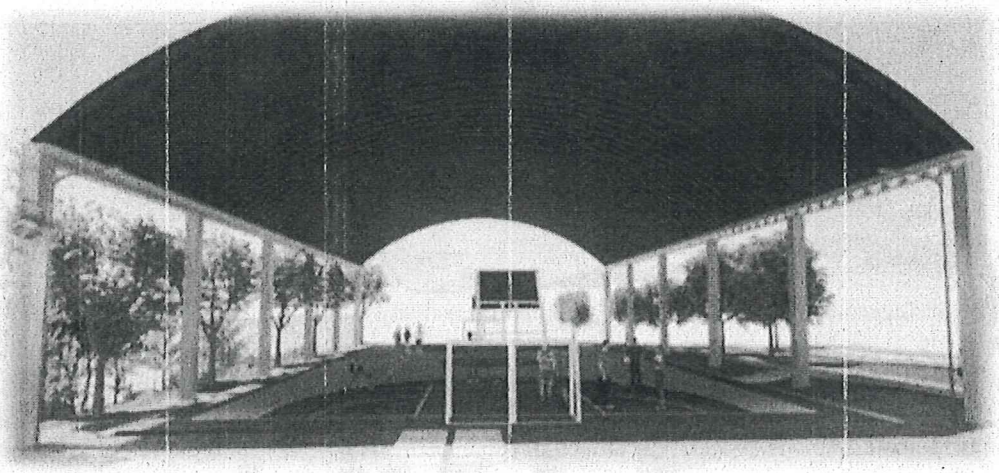

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la Contratista desde el 28 **de DICIEMBRE DE 2023** hasta el 29 **de DICIEMBRE DE 2023**.

NEIVA - HUILA

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el 28 de DICIEMBRE DE 2023 hasta el 29 de DICIEMBRE DE 2023, en cumplimiento del contrato general de "INTERVENTORIA No. CIHCM 410 de 2023" cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN 1 CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo cual se efectuará en el agrado: La **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE I DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA"** ; **"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA NAZARETH DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA"** ; y **"CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN GARCIA BORRERO DEL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

2. JUSTIFICACIÓN.

En el municipio de Colombia y Baraya, los espacios públicos para las prácticas deportivas de los habitantes, son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad física para practicar algún deporte. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Son escasos los programas de fomento al deporte y por eso hay bajo interés por las prácticas deportivas. Buscando el mejoramiento de las zonas de recreación, para que los niños, jóvenes y los adultos puedan llevar a cabo las actividades recreativas y deportivas en un ambiente agradable, seguro y adecuado. se planteó la construcción de tres cubiertas con iluminación, que permita a todos los habitantes de las veredas pertenecientes al municipio agrado donde se pretende desarrollar el proyecto, adelantar actividades recreativas y deportivas para satisfacer las necesidades de recreación y deporte de la población, así como facilitar un buen espacio deportivo para la comunidad, libre se genera la posibilidad de implementar la inclusión de personas con movilidad reducida y que estas se motiven a realizar prácticas de tipo deportivo, social y cultural en miras a mejorar la salud física y mental de todos y cada uno de los ciudadanos para que de esta manera se reduzcan los riesgos de enfermedades de tipo vascular y cardiaco así como evitar el sedentarismo, tan común hoy en día.

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO


Los proyectos en el municipio del Colombia y Baraya tienen por objetivo la construcción de una cubierta Autoportante Con Iluminación Para Los Polideportivos Existentes En La Institución Educativa Pablo Sexto Sede I De La Zona Urbana, La Vereda Nazareth De La Zona Rural y La Institución Educativa Joaquín García Borrero; En donde se realizará para cada una su debida cimentación, estructura en concreto, instalación de cubierta, acabados e instalaciones eléctricas.

476


3.1. LOCALIZACIÓN

La interventoría ejercerá sus labores en el municipio del Agrado de los cuales se especifican las siguientes veredas:


MUNICIPIO DE COLOMBIA

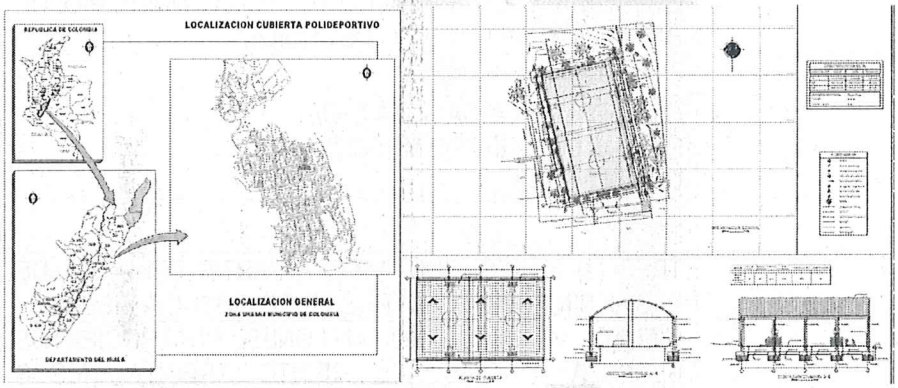

MUNICIPIO DE BARAYA

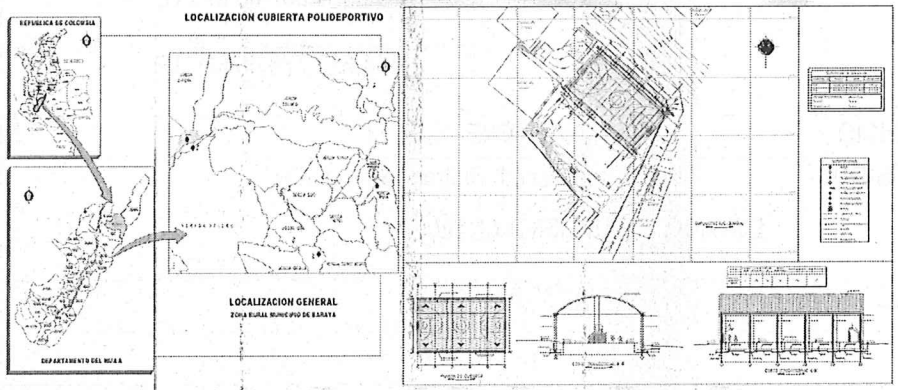

MUNICIPIO DE COLOMBIA

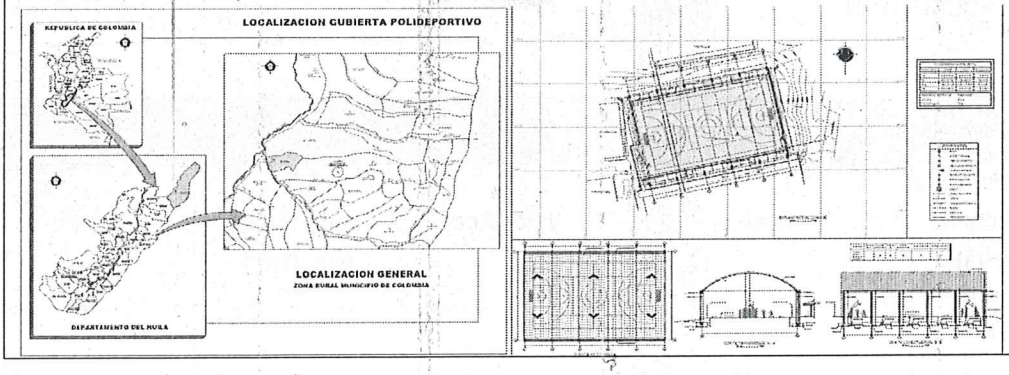

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS		
4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA		
CONTRATO No.	CIHCM416 DE 2023	
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN 1 CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	3 de Noviembre de 2023	
CONTRATISTA	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA R.L JAVIER BARRERO MOSSOS C.C. 74.391.791	
DOCUMENTO C.C - NIT	891101100-5	
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.	
VALOR INICIAL	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS ($ 124.462.130,00 M/CTE)	
VALOR DISCRIMINACION POR OBRA	I.E PABLO VI COLOMBIA	$ 39.973.014,00 M/CTE
	I.E JOAQUIN GARCIA BARAYA	$ 39.966.337,00 M/CTE
	NAZARETH COLOMBIA	$ 44.522.779,00 M/CTE
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023	
APOYO A LA SUPERVISION	Ing. Karoll Lisseth Buitrago Hernández	
ESTADO FINANCIERO ACTUAL		
VALOR CONTRACTUAL	$ 124.462.130,00	
% EJECUTADO	0%	
VALOR ACTA PARCIAL (1)	N/A	
VALOR TOTAL EJECUTADO	N/A	

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Valor acumulado ejecutado	Saldo
Acta Parcial No. 1				

477

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 124.462.130,00	$ 0	$124.462.130,00	$ 0	$ 124.462.130,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	03/11/2023			
Iniciación	10/11/2023	49		
Suspensión No. 1				
Reiniciación No. 1				
Terminación Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		49		

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO		*03 de noviembre de 2023*
ACTA DE INICIO	*0*	*10 de noviembre de 2023*

4.2. CONTRATO DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE I	
CONTRATO No.	CLPIH423 DE 2023
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE I DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA"
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	27/10/2023
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL CUBIERTA PABLO SEXTO** R.L YURI ALEJANDRA CONTRERAS RUIZ C.C 1.118.561.079
DOCUMENTO C.C - NIT	NIT No. 901.770.588-1
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR TOTAL	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($473.402.864.oo) M/CTE.

FECHA DE ACTA DE INICIO	28 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Nit. 891101100-5
ESTADO FINANCIERO ACTUAL	
VALOR CONTRACTUAL	CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($473.402.864.oo) M/CTE.
VALOR ANTICIPO	$ 0,00
% PROGRAMADO	0,0%
% EJECUTADO	0.5%
VALOR ACTA PARCIAL (1)	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA CLPIH423				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Valor acumulado ejecutado	Saldo
Acta Parcial No. 1				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$473.402.864,00	$ 0	$473.402.864,00	$ 0	$473.402.864,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	14/11/2023			
Iniciación	28/11/2023	31		
Suspensión No. 1				
Reiniciación No. 1				
Terminación Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		31		

478

ACTAS (Relacion de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
FIRMA CONTRATO		*14 de noviembre de 2023*
ACTA DE INICIO	*0*	*28 de Noviembre de 2023*
ACTA DE VEEDURIA		*01 de diciembre de 2023*

4.3. CONTRATO DE OBRA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN GARCIA BORRERO	
CONTRATO No.	CLPIH377 DE 2023
OBJETO	CONSTRUCCION DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN GARCIA BORRERO DEL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	24/10/2023
CONTRATISTA	CONSORCIO TABOR 91 CLAUDIO CESAR MEJIA GUTIERREZ Nit. 901765071-4
DOCUMENTOC.C - NIT	901765071-4
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR TOTAL	$ 478.608.070,00 M/CTE
FECHA DE ACTA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Nit. 891101100-5
ESTADO FINANCIERO ACTUAL	
VALOR CONTRACTUAL	$ 478.608.070,00
VALOR ANTICIPO	$ 0,0
% PROGRAMADO	0,0%
% EJECUTADO	0,5%
VALOR ACTA PARCIAL (1)	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA CLPIH402

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Valor acumulado ejecutado	Saldo
Acta Parcial No. 1				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 478.608.070,00	$ 0	$ 478.608.070,00	$ 0	$ 478.608.070,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	**FECHA**	**DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
FIRMA CONTRATO	24/10/2023			
Iniciación	10/11/2023	49		
Suspensión No. 1				
Reiniciación No. 1				
Terminación Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		49		

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
FIRMA CONTRATO		*14 de octubre de 2023*
ACTA DE INICIO	*0*	*10 de noviembre de 2023*
ACTA DE VEEDURIA		*13 de noviembre de 2023*

4.4. CONTRATO DE OBRA VEREDA NAZARETH	
CONTRATO No.	CLPIH394-2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA NAZARETH DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL HUILA
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	26/10/2023

479

CONTRATISTA	CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVVOS JC JUAN CARLOS GARCIA RODRIGUEZ
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR TOTAL	$ 531,161,721.00 MCTE
FECHA DE ACTA DE INICIO	23 DE NOVIEMBRE DE 2023
INTERVENTOR	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA Nit. 891101100-5
ESTADO FINANCIERO ACTUAL	
VALOR CONTRACTUAL	$ 531,161,721.00
VALOR ANTICIPO	$132,790,430.25
% PROGRAMADO	0,0%
% EJECUTADO	0,5%
VALOR ACTA PARCIAL (1)	N/A

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA CLPIH 394				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Valor acumulado ejecutado	Saldo
Acta Parcial No. 1				
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 531,161,721.00	$ 0	$ 531,161,721.00	$ 0	$ 531,161,721.00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	26/10/2023			
Iniciación	23/11/2023	36		
Suspensión No. 1				

Reiniciación No. 1				
Terminación Cto.	29/12/2023			
TOTAL DIAS		36		

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO		*26 de octubre de 2023*
ACTA DE INICIO	*0*	*23 de noviembre de 2023*
ACTA DE VEEDURIA		*01 de diciembre de 2023*

5. ACTIVIDADES ADMISNITRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

El día 1 de noviembre del 2023, la ing. KAROLL LISSETH BUITRAGO HERNANDEZ es designado mediante oficio por la Directora del INDERHUILA como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CIHCM416 – 2023** cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE COLOMBIA Y UN 1 CONTRATO EN EL MUNICIPIO DE BARAYA DEPARTAMENTO DEL HUILA mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IHCM018-2023.

Dentro de las actividades desarrolladas se tiene las siguientes:

1. Se le da tramite a los anticipos presentados por los contratistas.

6. DECRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE CONSULTORÍA / OBRA / INTERVENTORIA

Por el momento no se evidencia avance en obra, puesto que los contratistas están realizando la revisión de planos.

6.1. INSTITUCION EDUCATIVA PABLO SEXTO SEDE I DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA
6.2. NAZARETH DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBIA
6.3. INSTITUCION EDUCATIVA JOAQUIN GARCIA BORRERO DEL MUNICIPIO DE BARAYA

En la actualidad al 27 de noviembre solo se han realizado actividades de localización y replanteo de obra.

ING. KAROLL LISSETH BUITRAGO H.
APOYO A LA SUPERVISION

ING. WILLIAM PARRA OLAYA
APOYO A LA SUPERVISION
