INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Septiembre de 2025.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223,00	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484,00	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555,00	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791,00	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345,00	$ 6.788.140.594,68
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531,00	$ 144.197.531,00
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901,00	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458,00	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000,00	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308,00	$ -
2024	1248624	C-2401-0600-91-51102D-2401024-02	20	PROPIO	ADICION Nº1	$ 5.000.000.000,00	$ -
2024	1248824	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	ADICION Nº1	$ 109.000.000,00	$ -
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 75.674.864,00	$ -
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 30.863.361.184,00	$ 30.541.329.021,00
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 230.716.049,00	$ 230.716.049,00
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 46.696.914.569,00	$ 46.696.914.569,00
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 41.000.000.000,00	$ 41.000.000.000,00
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 175.200.000.000,00	$ 175.200.000.000,00
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000,00	$ 146.000.000.000,00
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000,00	$ 29.200.000.000,00
			TOTAL			$ 635.116.748.262,00	$ 475.801.297.764,68

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 635.116.748.262,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 60.607.748.262,00					
1	Obra	27 a 31 Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
2	Obra	Agosto de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
3	Obra	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
4	Obra	Octubre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
1D	Ajuste	27 a 31 Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
2D	Ajuste	Agosto de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
3D	Ajuste	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
5	Obra	Noviembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
5	EyD	Noviembre de 2022	$ 1.115.211.000,00	$ 211.890.090,00	$ 1.327.101.090,00	$ -	$ 1.327.101.090,00	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 633.789.647.172,00	138755 - 17/12/2023	x		Factura CVCM-3
4D	Ajuste	Octubre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 633.789.647.172,00				
5P	Ajuste	Noviembre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 633.789.647.172,00				
6	Obra	Diciembre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 633.789.647.172,00				
6	EyD	Diciembre de 2022	$ 1.260.596.750,00	$ 239.513.383,00	$ 1.500.110.133,00	$ -	$ 1.500.110.133,00	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 632.289.537.039,00	140557 - 20/12/2023	x		Factura CVCM-4
6P	Ajuste	Diciembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 632.289.537.039,00				
5D	Ajuste	Noviembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 632.289.537.039,00				
6D	Ajuste	Diciembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 632.289.537.039,00				
7	Obra	Enero de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 632.289.537.039,00				
7	EyD	Enero de 2023	$ 190.290.750,00	$ 36.155.243,00	$ 226.445.993,00	$ -	$ 226.445.993,00	$ -	617522	$ 57.554.091.046,00	$ 632.063.091.046,00	22414 - 08/03/2023	x		Factura CVCM-5
8	Obra	Febrero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.554.091.046,00	$ 632.063.091.046,00				
8	EyD	Febrero de 2023	$ 281.531.400,00	$ 53.490.966,00	$ 335.022.366,00	$ -	$ 335.022.366,00	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 631.728.068.680,00	31462 - 30/03/2023	x		Factura CVCM-6
7D	Ajuste	Enero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 631.728.068.680,00				
9	Obra	Marzo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 631.728.068.680,00				
9	EyD	Marzo de 2023	$ 300.493.512,00	$ 57.093.767,00	$ 357.587.279,00	$ -	$ 357.587.279,00	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 631.370.481.401,00	42259 - 28/04/2023	x		Factura CVCM-7
8D	Ajuste	Febrero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 631.370.481.401,00				
10	Obra	Abril de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 631.370.481.401,00				
10	EyD	Abril de 2023	$ 316.332.425,00	$ 60.103.161,00	$ 376.435.586,00	$ -	$ 376.435.586,00	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 630.994.045.815,00	52188 - 26/05/2023	x		Factura CVCM-8
9D	Ajuste	Marzo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 630.994.045.815,00				
11	Obra	Mayo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 630.994.045.815,00				
11	EyD	Mayo de 2023	$ 184.350.650,00	$ 35.026.624,00	$ 219.377.274,00	$ -	$ 219.377.274,00	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 630.774.668.541,00	64357 - 04/07/2023	x		Factura CVCM-9
10D	Ajuste	Abril de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 630.774.668.541,00				
12	Obra	Junio de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 630.774.668.541,00				
12	EyD	Junio de 2023	$ 164.270.025,00	$ 31.211.305,00	$ 195.481.330,00	$ -	$ 195.481.330,00	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 630.579.187.211,00	73262 - 28/07/2023	x		Factura CVCM-10
11D	Ajuste	Mayo de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 630.579.187.211,00				
12D	Ajuste	Junio de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 630.579.187.211,00				
13	Obra	Julio de 2023	$ 1.468.535.700,00	$ 10.731.607,00	$ 1.479.267.307,00	$ -	$ 1.479.267.307,00	$ -	617522	$ 54.590.919.904,00	$ 629.099.919.904,00	80528 - 23/08/2023	x		Factura CVCM-12
13P	Ajuste	Julio de 2023	$ 225.713.937,00	$ 1.649.448,00	$ 227.363.385,00	$ -	$ 227.363.385,00	$ -	617522	$ 54.363.556.519,00	$ 628.872.556.519,00	80529 -23/08/2023	x		Factura CVCM-11
13D	Ajuste	Julio de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 54.363.556.519,00	$ 628.872.556.519,00				
14	Obra	Agosto de 2023	$ 6.108.750.000,00	$ 44.640.865,00	$ 6.153.390.865,00	$ -	$ 6.153.390.865,00	$ -	617522	$ 48.210.165.654,00	$ 622.719.165.654,00	81973 - 21/09/2023	x		Factura CVCM-14
14	EyD	Agosto de 2023	$ 94.048.750,00	$ 17.869.263,00	$ 111.918.013,00	$ -	$ 111.918.013,00	$ -	617522	$ 48.098.247.641,00	$ 622.607.247.641,00	81973 - 21/09/2023	x		Factura CVCM-14
14P	Ajuste	Agosto de 2023	$ 938.914.875,00	$ 6.861.301,00	$ 945.776.176,00	$ -	$ 945.776.176,00	$ -	617522	$ 47.152.471.465,00	$ 621.661.471.465,00	81820 - 18/09/2023	x		Factura CVCM-13
14D	Ajuste	Agosto de 2023	-$ 29.627.437,00	-$ 216.508,00	-$ 29.843.945,00	$ -	-$ 29.843.945,00	$ -	617522	$ 47.182.315.410,00	$ 621.691.315.410,00	83637 - 25/10/2023	x		Factura CVCM-17
15	Obra	Septiembre de 2023	$ 7.777.165.996,32	$ 56.833.136,00	$ 7.833.999.132,32	$ -	$ 7.833.999.132,32	$ -	617522	$ 39.348.316.277,68	$ 613.857.316.278,00	83774 - 27/10/2023	x		Factura CVCM-18
15P	Ajuste	Septiembre de 2023	$ 1.211.402.309,00	$ 8.852.555,00	$ 1.220.254.864,00	$ -	$ 1.220.254.864,00	$ -	617522	$ 38.128.061.413,68	$ 612.637.061.414,00	83637 - 25/10/2023	x		Factura CVCM-17
15D	Ajuste	Septiembre de 2023	-$ 1.903.367,00	-$ 13.909,00	-$ 1.917.276,00	$ -	-$ 1.917.276,00	$ -	617522	$ 38.129.978.689,68	$ 612.638.978.690,00	85600 - 23/11/2023	x		Factura CVCM-20
	Anticipo	**Octubre de 2023**			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.000.000.000,00**	**617522**	**$ 18.129.978.689,68**	**$ 612.638.978.690,00**				
16	Obra	Octubre de 2023	$ 7.982.833.581,00	$ 58.336.092,00	$ 8.041.169.673,00	$ 272.214.625,00	$ 7.768.955.048,00	$ 19.727.785.375,00	617522	$ 10.361.023.641,68	$ 604.597.809.017,00	85602 - 23/11/2023		x	Factura CVCM-19
16P	Ajuste	Octubre de 2023	$ 1.203.743.700,00	$ 8.796.589,00	$ 1.212.540.289,00	$ -	$ 1.212.540.289,00	$ 19.727.785.375,00	617522	$ 9.148.483.352,68	$ 603.385.268.728,00	85600 - 23/11/2023		x	Factura CVCM-20
17	Obra	Noviembre de 2023	$ 9.400.340.158,68	$ 68.694.793,00	$ 9.469.034.951,68	$ 320.551.599,00	$ 9.148.483.352,68	$ 19.407.233.776,00	617522		$ 593.916.233.776,00	87047 - 07/12/2023		x	Factura CVCM-23
										Saldo Registro Presupuestal No. 104023 De (03/02/2023)					
							$ -	$ 19.407.233.776,00		**$ 48.666.666.667,00**	$ 593.916.233.776,00				
17	Obra	Noviembre de 2023	$ 4.593.158.044,32	$ 33.565.386,00	$ 4.626.723.430,32	$ 156.626.689,00	$ 4.470.096.741,32	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 44.196.569.925,68	$ 589.289.510.346,00	87047 - 07/12/2023		x	Factura CVCM-23
16D	Ajuste	Octubre de 2023	-$ 26.617.205,00	-$ 194.510,00	-$ 26.811.715,00		-$ 26.811.715,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 44.223.381.640,68	$ 589.316.322.061,00	87370- 11/12/2023		x	Factura CVCM-24

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Septiembre de 2025.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 85.134.223,00**	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 60.263.058.484,00**	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 259.555.555,00**	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 47.296.791,00**	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 48.475.172.345,00**	$ 6.788.140.594,68
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 144.197.531,00**	$ 144.197.531,00
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 89.863.901,00**	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 33.102.827.458,00**	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 18.000.000.000,00**	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 273.975.308,00**	$ -
2024	1248624	C-2401-0600-91-51102D-2401024-02	20	PROPIO	ADICIÓN Nº1	**$ 5.000.000.000,00**	$ -
2024	1248824	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	ADICION Nº1	**$ 109.000.000,00**	$ -
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 75.674.864,00**	$ -
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 30.863.361.184,00**	$ 30.541.329.021,00
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 230.716.049,00**	$ 230.716.049,00
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 46.696.914.569,00**	$ 46.696.914.569,00
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 41.000.000.000,00**	$ 41.000.000.000,00
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 175.200.000.000,00**	$ 175.200.000.000,00
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 146.000.000.000,00**	$ 146.000.000.000,00
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 29.200.000.000,00**	$ 29.200.000.000,00
			TOTAL			**$ 635.116.748.262,00**	**$ 475.801.297.764,68**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 635.116.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
17P	Ajuste	Noviembre de 2023	$ 2.053.207.181,00	$ 15.004.206,00	$ 2.068.211.387,00		$ 2.068.211.387,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 42.155.170.253,68	$ 587.248.110.674,00	87370- 11/12/2023		x	Factura CVCM-24
18	Obra	Diciembre de 2023	$ 2.075.555.389,00	$ 15.167.520,00	$ 2.090.722.909,00	$ 70.776.439,00	$ 2.019.946.470,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 40.135.223.783,68	$ 585.157.387.765,00	87788 - 13/12/2023		x	Factura CVCM-26
18P	Ajuste	Diciembre de 2023	$ 328.016.331,00	$ 2.397.042,00	$ 330.413.373,00		$ 330.413.373,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.804.810.410,68	$ 584.826.974.392,00	87796 - 13/12/2023		x	Factura CVCM-27
17D	Ajuste	Noviembre de 2023	$ 19.471.427,00	$ 142.291,00	$ 19.613.718,00		$ 19.613.718,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.785.196.692,68	$ 584.807.360.674,00	1256- 11/03/2023	x		Factura CVCM-28
18D	Ajuste	Diciembre de 2023	$ 12.686.186,00	$ 92.707,00	$ 12.778.893,00		$ 12.778.893,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.772.417.799,68	$ 584.794.581.781,00	1257- 11/03/2023	x		Factura CVCM-29
19	Obra	Enero de 2024	$ 1.363.907.123,00	$ 9.967.014,00	$ 1.373.874.137,00	$ 46.509.233,00	$ 1.327.364.904,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.445.052.895,68	$ 583.420.707.644,00	1254 -11/03/2023	x		Factura CVCM-30
19P	Ajuste	Enero de 2024	$ 265.156.244,00	$ 1.937.680,00	$ 267.093.924,00		$ 267.093.924,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.177.958.971,68	$ 583.153.613.720,00	1301 - 12/03/2023	x		Factura CVCM-31
20	Obra	Febrero de 2024	$ 2.113.538.875,00	$ 15.445.092,00	$ 2.128.983.967,00	$ 72.071.676,00	$ 2.056.912.291,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 36.121.046.680,68	$ 581.024.629.753,00	1570 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-32
19D	Ajuste	Enero de 2024	$ 54.981.298,00	$ 401.786,00	$ 55.383.084,00		$ 55.383.084,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 36.065.663.596,68	$ 580.969.246.669,00	1520 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-33
20P	Ajuste	Febrero de 2024	$ 488.453.600,00	$ 3.569.469,00	$ 492.023.069,00		$ 492.023.069,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 35.573.640.527,68	$ 580.477.223.600,00	1605 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-34
21	Obra	Marzo de 2024	$ 2.724.563.486,00	$ 19.910.272,00	$ 2.744.473.758,00	$ 544.912.697,00	$ 2.199.561.061,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 33.374.079.466,68	$ 577.732.749.842,00	3074- 24/04/2024		x	Factura CVCM-35
20D	Ajuste	Febrero de 2024	$ 33.469.758,00	$ 244.587,00	$ 33.714.345,00		$ 33.714.345,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 33.340.365.121,68	$ 577.699.035.497,00	3073- 24/04/2024		x	Factura CVCM-36
21P	Ajuste	Marzo de 2024	$ 568.378.168,00	$ 4.153.533,00	$ 572.531.701,00		$ 572.531.701,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 32.767.833.420,68	$ 577.126.503.796,00	3054 -23/04/2024		x	Factura CVCM-37
	Anticipo	**Marzo de 2024**						**$ 10.000.000.000,00**		**$ 22.767.833.420,68**					
21D	Ajuste	Marzo de 2024	-$ 3.097.092,00	-$ 22.633,00	-$ 3.119.725,00		-$ 3.119.725,00	$ 28.516.337.042,00	104023	$ 22.770.953.145,68	$ 577.129.623.521,00	4250 -17/05/2024	x		Factura CVCM-38
22	Obra	Abril de 2024	$ 1.757.685.418,00	$ 12.844.624,00	$ 1.770.530.042,00	$ 351.537.084,00	$ 1.418.992.958,00	$ 28.164.799.958,00	104023	$ 21.351.960.187,68	$ 575.359.093.479,00	4286 -18/05/2024	x		Factura CVCM-39
22	Gestion SPAS	Abril de 2024	$ 3.619.723.697,00	$ -	$ 3.619.723.697,00		$ 3.619.723.697,00	$ 28.164.799.958,00	104023	$ 17.732.236.490,68	$ 571.739.369.782,00	4286 -18/05/2024	x		Factura CVCM-39
22P	Ajuste	Abril de 2024	$ 410.891.009,00	$ 3.002.665,00	$ 413.893.674,00		$ 413.893.674,00	$ 28.164.799.958,00	104023	$ 17.318.342.816,68	$ 571.325.476.108,00	4250 -17/05/2024	x		Factura CVCM-38
										Saldo Registro Presupuestal No. 215024 De (15/03/2024)					
									215024	**$ 51.466.666.667,00**	$ 571.325.476.108,00				
23	Obra	Mayo de 2024	$ 1.473.905.358,00	$ 10.770.847,00	$ 1.484.676.205,00	$ 294.781.072,00	$ 1.189.895.133,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 50.276.771.534,00	$ 569.840.799.903,00	5930 -17/06/2024	x		Factura CVCM-40
23	Gestion SPAS	Mayo de 2024	$ 2.137.789.644,00		$ 2.137.789.644,00		$ 2.137.789.644,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 48.138.981.890,00	$ 567.703.010.259,00	5930 -17/06/2024	x		Factura CVCM-40
22D	Ajuste	Abril de 2024	$ 5.560.440,00	$ 40.634,00	$ 5.601.074,00		$ 5.601.074,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 48.133.380.816,00	$ 567.697.409.185,00	6054 -20/06/2024	x		Factura CVCM-41
23P	Ajuste	Mayo de 2024	$ 284.017.155,00	$ 2.075.510,00	$ 286.092.665,00		$ 286.092.665,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 47.847.288.151,00	$ 567.411.316.520,00	6056 -20/06/2024	x		Factura CVCM-42
										Saldo Registro Presupuestal No. 104023 De (03/02/2023)					
										$ 17.318.342.816,68					
23D	Ajuste	Mayo de 2024	$ 2.359.675,00	$ 17.244,00	$ 2.376.919,00		$ 2.376.919,00	$ 27.870.018.886,00	104023	$ 17.315.965.897,68	$ 567.408.939.601,00	7383-18/07/2024	x		Factura CVCM-43
24	Obra	Junio de 2024	$ 942.016.522,00	$ 6.883.967,00	$ 948.900.489,00	$ 188.403.304,00	$ 760.497.185,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.555.468.712,68	$ 566.460.039.112,00	7410-18/07/2024	x		Factura CVCM-44
24	Gestion SPAS	Junio de 2024	$ 189.736.982,00	$ 31.581.227,00	$ 221.318.209,00		$ 221.318.209,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.334.150.503,68	$ 566.238.720.903,00	7410-18/07/2024	x		Factura CVCM-44
24P	Ajuste	Junio de 2024	$ 191.281.897,00	$ 1.397.829,00	$ 192.679.726,00		$ 192.679.726,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.141.470.777,68	$ 566.046.041.177,00	7408-18/07/2024	x		Factura CVCM-45
24D	Ajuste	Junio de 2024	-$ 5.582.862,00	-$ 40.798,00	-$ 5.623.660,00		-$ 5.623.660,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.147.094.437,68	$ 566.051.664.837,00	9867-28/08/2024	x		Factura CVCM-48
25	Obra	Julio de 2024	$ 748.471.196,00	$ 5.469.597,00	$ 753.940.793,00	$ 149.694.239,00	$ 604.246.554,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 15.542.847.883,68	$ 565.297.724.044,00	9641-26/08/2024	x		Factura CVCM-47
25	Gestion SPAS	Julio de 2024	$ 994.335.642,00	$ 11.345.660,00	$ 1.005.681.302,00		$ 1.005.681.302,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 14.537.166.581,68	$ 564.292.042.742,00	9641-26/08/2024	x		Factura CVCM-47
25P	Ajuste	Julio de 2024	$ 165.939.552,00	$ 1.212.635,00	$ 167.152.187,00		$ 167.152.187,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 14.370.014.394,68	$ 564.124.890.555,00	9867-28/08/2024	x		Factura CVCM-48
25D	Ajuste	Julio de 2024	-$ 4.060.685,00	-$ 29.674,00	-$ 4.090.359,00		-$ 4.090.359,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 14.374.104.753,68	$ 564.128.980.914,00	11271-18/09/2024	x		Factura CVCM-50
26	Obra	Agosto de 2024	$ 1.149.413.163,00	$ 8.399.558,00	$ 1.157.812.721,00	$ 229.882.633,00	$ 927.930.088,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 13.446.174.665,68	$ 562.971.168.193,00	11270-18/09/2024	x		Factura CVCM-49
26	Gestion SPAS	Agosto de 2024	$ 566.768.003,00	$ 4.055.740,00	$ 570.823.743,00		$ 570.823.743,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 12.875.350.922,68	$ 562.400.344.450,00	11270-18/09/2024	x		Factura CVCM-49
26P	Ajuste	Agosto de 2024	$ 255.714.021,00	$ 1.868.679,00	$ 257.582.700,00		$ 257.582.700,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 12.617.768.222,68	$ 562.142.761.750,00	11271-18/09/2024	x		Factura CVCM-50

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Septiembre de 2025.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 85.134.223,00**	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 60.263.058.484,00**	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 259.555.555,00**	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 47.296.791,00**	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 48.475.172.345,00**	$ 6.788.140.594,68
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 144.197.531,00**	$ 144.197.531,00
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 89.863.901,00**	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 33.102.827.458,00**	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 18.000.000.000,00**	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 273.975.308,00**	$ -
2024	1248624	C-2401-0600-91-51102D-2401024-02	20	PROPIO	ADICIÓN Nº1	**$ 5.000.000.000,00**	$ -
2024	1248824	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	ADICION Nº1	**$ 109.000.000,00**	$ -
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 75.674.864,00**	$ -
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 30.863.361.184,00**	$ 30.541.329.021,00
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 230.716.049,00**	$ 230.716.049,00
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 46.696.914.569,00**	$ 46.696.914.569,00
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 41.000.000.000,00**	$ 41.000.000.000,00
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 175.200.000.000,00**	$ 175.200.000.000,00
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 146.000.000.000,00**	$ 146.000.000.000,00
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 29.200.000.000,00**	$ 29.200.000.000,00
			TOTAL			**$ 635.116.748.262,00**	**$ 475.801.297.764,68**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 635.116.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
26D	Ajuste	Agosto de 2024	-$ 2.633.436,00	-$ 19.244,00	-$ 2.652.680,00		-$ 2.652.680,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 12.620.420.902,68	$ 562.145.414.430,00	13262-18/10/2024	x		Factura CVCM-51
27	Obra	Septiembre de 2024	$ 4.818.424.268,00	$ 35.211.562,00	$ 4.853.635.830,00	$ 164.308.268,00	$ 4.689.327.562,00	$ 27.137.730.442,00	104023	$ 7.931.093.340,68	$ 557.291.778.600,00	13261-18/10/2024	x		Factura CVCM-52
27	Gestion SPAS	Septiembre de 2024	$ 1.151.146.000,00	$ 1.167.740,00	$ 1.152.313.740,00	$ 1.145.000.000,00	$ 7.313.740,00	$ 25.992.730.442,00	104023	$ 7.923.779.600,68	$ 556.139.464.860,00	13261-18/10/2024	x		Factura CVCM-52
27P	Ajuste	Septiembre de 2024	$ 984.248.887,00	$ 7.192.588,00	$ 991.441.475,00		$ 991.441.475,00	$ 25.992.730.442,00	104023	$ 6.932.338.125,68	$ 555.148.023.385,00	13262-18/10/2024	x		Factura CVCM-51
										Saldo Registro Presupuestal No. 215024 De (15/03/2024)					
										$ 47.847.288.151,00					
27D	Ajuste	Septiembre de 2024	-$ 13.420.433,00	-$ 98.072,00	-$ 13.518.505,00		-$ 13.518.505,00	$ 25.992.730.442,00	215024	$ 47.860.806.656,00	$ 555.161.541.890,00	14867-12/11/2024		x	Factura CVCM-54
28	Obra	Octubre de 2024	$ 3.473.407.770,00	$ 25.382.595,00	$ 3.498.790.365,00	$ 118.443.205,00	$ 3.380.347.160,00	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 44.480.459.496,00	$ 551.662.751.525,00	14863-12/11/2024	x		Factura CVCM-53
28	EyD	Octubre de 2024	$ 88.449.737,00	$ 16.805.450,00	$ 105.255.187,00		$ 105.255.187,00	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 44.375.204.309,00	$ 551.557.496.338,00	14863-12/11/2024	x		Factura CVCM-53
28	Estudios Atipicos	Octubre de 2024	$ 2.592.830.221,00	$ 492.637.742,00	$ 3.085.467.963,00		$ 3.085.467.963,00	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 41.289.736.346,00	$ 548.472.028.375,00	14863-12/11/2024	x		Factura CVCM-53
28	Gestion SPAS	Octubre de 2024	$ 9.607.500,00	$ 1.825.425,00	$ 11.432.925,00		$ 11.432.925,00	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 41.278.303.421,00	$ 548.460.595.450,00	14863-12/11/2024	x		Factura CVCM-53
28P	Ajuste	Octubre de 2024	$ 360.717.383,68	$ 2.636.012,00	$ 363.353.395,68		$ 363.353.395,68	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 40.914.950.025,32	$ 548.097.242.054,00	14867-12/11/2024		x	Factura CVCM-54
28P	Ajuste	Octubre de 2024	$ 504.025.018,32	$ 3.683.259,00	$ 507.708.277,32		$ 507.708.277,32	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 40.407.241.748,00	$ 547.589.533.777,00	14867-12/11/2024	x		Factura CVCM-54
28D	Ajuste	Octubre de 2024	$ 4.966.426,00	$ 36.293,00	$ 5.002.719,00		$ 5.002.719,00	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 40.402.239.029,00	$ 547.584.531.058,00	18940-16/12/2024	x		Factura CVCM-56
29	Obra	Noviembre de 2024	$ 2.401.153.689,00	$ 17.546.892,00	$ 2.418.700.581,00	$ 81.879.341,00	$ 2.336.821.240,00	$ 25.792.407.896,00	215024	$ 38.065.417.789,00	$ 545.165.830.477,00	18018-11/12/2024	x		Factura CVCM-55
29	Gestion SPAS	Noviembre de 2024	$ 2.327.388.099,00	$ 4.181.045,00	$ 2.331.569.144,00	$ 1.011.274.198,00	$ 1.320.294.946,00	$ 24.781.133.698,00	215024	$ 36.745.122.843,00	$ 542.834.261.333,00	18018-11/12/2024	x		Factura CVCM-55
29P	Ajuste	Noviembre de 2024	$ 510.158.146,00	$ 3.728.079,00	$ 513.886.225,00		$ 513.886.225,00	$ 24.781.133.698,00	215024	$ 36.231.236.618,00	$ 542.320.375.108,00	18946-16/12/2024	x		Factura CVCM-57
30	Obra	Diciembre de 2024	$ 1.527.639.884,00	$ 11.163.522,00	$ 1.538.803.406,00	$ 52.092.520,00	$ 1.486.710.886,00	$ 24.729.041.178,00	215024	$ 34.744.525.732,00	$ 540.781.571.702,00	18529-13/12/2024	x		Factura CVCM-59
30	Gestion SPAS	Diciembre de 2024	$ 893.643.079,00	$ 6.339.199,00	$ 899.982.278,00	$ 270.850.640,00	$ 629.131.638,00	$ 24.458.190.538,00	215024	$ 34.115.394.094,00	$ 539.881.589.424,00	18529-13/12/2024	x		Factura CVCM-59
30P	Ajuste	Diciembre de 2024	$ 330.591.898,00	$ 2.415.864,00	$ 333.007.762,00		$ 333.007.762,00	$ 24.458.190.538,00	215024	$ 33.782.386.332,00	$ 539.548.581.662,00	18960-16/12/2024	x		Factura CVCM-58
										Saldo Registro Presupuestal No. 1248624 De (31/12/2024)					
							$ -	$ 24.458.190.538,00		**$ 5.000.000.000,00**					
29D	Ajuste	Noviembre de 2024	-$ 7.552.099,00	-$ 55.188,00	-$ 7.607.287,00		-$ 7.607.287,00	$ 24.458.190.538,00	1248624	$ 5.007.607.287,00	$ 539.556.188.949,00	275-11/02/2025	x		Factura CVCM-61
30D	Ajuste	Diciembre de 2024	-$ 3.904.279,00	-$ 28.531,00	-$ 3.932.810,00		-$ 3.932.810,00	$ 24.458.190.538,00	1248624	$ 5.011.540.097,00	$ 539.560.121.759,00	275-11/02/2025	x		Factura CVCM-61
31	Obra	Enero de 2025	$ 2.944.512.100,00	$ 21.517.588,00	$ 2.966.029.688,00	$ 100.407.863,00	$ 2.865.621.825,00	$ 24.357.782.675,00	1248624	$ 2.145.918.272,00	$ 536.594.092.071,00	272-12/02/2025	x		Factura CVCM-60
31	Gestion SPAS	Enero de 2025	$ 499.736.240,00	$ 6.947.835,00	$ 506.684.075,00	$ 246.346.502,00	$ 260.337.573,00	$ 24.111.436.173,00	1248624	$ 1.885.580.699,00	$ 536.087.407.996,00	272-12/02/2025	x		Factura CVCM-60
31P	Ajuste	Enero de 2025	$ 746.639.994,00	$ 5.456.215,00	$ 752.096.209,00		$ 752.096.209,00	$ 24.111.436.173,00	1248624	$ 1.133.484.490,00	$ 535.335.311.787,00	275-11/02/2025	x		Factura CVCM-61
31D	Ajuste	Enero de 2025	$ 55.160.445,00	$ 403.096,00	$ 55.563.541,00		$ 55.563.541,00	$ 24.111.436.173,00	1248624	$ 1.077.920.949,00	$ 535.279.748.246,00	1500-19/03/2025	x		Factura CVCM-68
										Saldo Registro Presupuestal No. 215024 De (15/03/2024)					
										$ 33.782.386.332,00					
32	Obra	Febrero de 2025	$ 2.135.829.564,00	$ 15.607.985,00	$ 2.151.437.549,00	$ 72.831.788,00	$ 2.078.605.761,00	$ 24.038.604.385,00	215024	$ 31.703.780.571,00	$ 533.128.310.697,00	1349-18/03/2025	x		Factura CVCM-62
32	Gestion SPAS	Febrero de 2025	$ 1.704.340.605,00	$ 5.200.684,00	$ 1.709.541.289,00	$ 15.364.700,00	$ 1.694.176.589,00	$ 24.023.239.685,00	215024	$ 30.009.603.982,00	$ 531.418.769.408,00	1349-18/03/2025	x		Factura CVCM-62
32P	Ajuste	Febrero de 2025	$ 492.895.382,00	$ 3.601.928,00	$ 496.497.310,00		$ 496.497.310,00	$ 24.023.239.685,00	215024	$ 29.513.106.672,00	$ 530.922.272.098,00	1498-19/03/2025	x		Factura CVCM-66
32D	Ajuste	Febrero de 2025	$ 23.052.381,00	$ 168.459,00	$ 23.220.840,00		$ 23.220.840,00	$ 24.023.239.685,00	215024	$ 29.489.885.832,00	$ 530.899.051.258,00	3254-22/04/2025	x		Factura CVCM-70
33	Obra	Marzo de 2025	$ 2.635.972.517,00	$ 19.262.876,00	$ 2.655.235.393,00	$ 108.074.873,00	$ 2.547.160.520,00	$ 23.915.164.812,00	215024	$ 26.942.725.312,00	$ 528.243.815.865,00	3890-22/04/2025	x		Factura CVCM-69
33	Gestion SPAS	Marzo de 2025	$ 15.759.028,00	$ 739.791,00	$ 16.498.819,00		$ 16.498.819,00	$ 23.915.164.812,00	215024	$ 26.926.226.493,00	$ 528.227.317.046,00	3890-22/04/2025	x		Factura CVCM-69

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Septiembre de 2025.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223,00	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484,00	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555,00	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791,00	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345,00	$ 6.788.140.594,68
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531,00	$ 144.197.531,00
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901,00	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458,00	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000,00	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308,00	$ -
2024	1248624	C-2401-0600-91-51102D-2401024-02	20	PROPIO	ADICIÓN Nº1	$ 5.000.000.000,00	$ -
2024	1248824	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	ADICION Nº1	$ 109.000.000,00	$ -
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 75.674.864,00	$ -
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 30.863.361.184,00	$ 30.541.329.021,00
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 230.716.049,00	$ 230.716.049,00
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 46.696.914.569,00	$ 46.696.914.569,00
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 41.000.000.000,00	$ 41.000.000.000,00
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 175.200.000.000,00	$ 175.200.000.000,00
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000,00	$ 146.000.000.000,00
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000,00	$ 29.200.000.000,00
			TOTAL			$ 635.116.748.262,00	$ 475.801.297.764,68

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 635.116.748.262,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
33P	Ajuste	Marzo de 2025	$ 583.166.132,00	$ 4.261.599,00	$ 587.427.731,00		$ 587.427.731,00	$ 23.915.164.812,00	215024	$ 26.338.798.762,00	$ 527.639.889.315,00	3916-22/04/2025	x		Factura CVCM-71
33D	Ajuste	Marzo de 2025	$ 23.699.708,00	$ 173.190,00	$ 23.872.898,00		$ 23.872.898,00	$ 23.915.164.812,00	215024	$ 26.314.925.864,00	$ 527.616.016.417,00	3923-14/05/2025	x		Factura CVCM-73
34	Obra	Abril de 2025	$ 2.142.486.792,00	$ 15.656.634,00	$ 2.158.143.426,00	$ 87.841.958,00	$ 2.070.301.468,00	$ 23.827.322.854,00	215024	$ 24.244.624.396,00	$ 525.457.872.991,00	3891-14/05/2025	x		Factura CVCM-72
34P	Ajuste	Abril de 2025	$ 527.928.643,00	$ 3.857.940,00	$ 531.786.583,00		$ 531.786.583,00	$ 23.827.322.854,00	215024	$ 23.712.837.813,00	$ 524.926.086.408,00	4185-14/05/2025	x		Factura CVCM-74
34D	Ajuste	Abril de 2025	$ 4.732.284,00	$ 34.582,00	$ 4.766.866,00		$ 4.766.866,00	$ 23.827.322.854,00	215024	$ 23.708.070.947,00	$ 524.921.319.542,00	5454-13/06/2025	x		Factura CVCM-76
35	Obra	Mayo de 2025	$ 3.580.065.559,00	$ 26.162.018,00	$ 3.606.227.577,00	$ 146.782.688,00	$ 3.459.444.889,00	$ 23.680.540.166,00	215024	$ 20.248.626.058,00	$ 521.315.091.965,00	5804-19/06/2025	x		Factura CVCM-75
35	Gestion SPAS	Mayo de 2025	$ 680.786.024,00	$ 11.271.042,00	$ 692.057.066,00	$ 192.933.700,00	$ 499.123.366,00	$ 23.487.606.466,00	215024	$ 19.749.502.692,00	$ 520.623.034.899,00	5804-19/06/2025	x		Factura CVCM-75
35P	Ajuste	Mayo de 2025	$ 742.885.542,00	$ 5.428.779,00	$ 748.314.321,00		$ 748.314.321,00	$ 23.487.606.466,00	215024	$ 19.001.188.371,00	$ 519.874.720.578,00	5805-19/06/2025	x		Factura CVCM-77
36	Obra	Junio de 2025	$ 5.708.431.579,00	$ 41.715.462,00	$ 5.750.147.041,00	$ 234.045.695,00	$ 5.516.101.346,00	$ 23.253.560.771,00	215024	$ 13.485.087.025,00	$ 514.124.573.537,00	6338-04/07/2025	x		Factura CVCM-78
35D	Ajuste	Mayo de 2025	$ 7.312.779,00	$ 53.439,00	$ 7.366.218,00		$ 7.366.218,00	$ 23.253.560.771,00	215024	$ 13.477.720.807,00	$ 514.117.207.319,00	6900-04/07/2025	x		Factura CVCM-80
36P	Ajuste	Junio de 2025	$ 1.514.986.690,00	$ 11.071.057,00	$ 1.526.057.747,00		$ 1.526.057.747,00	$ 23.253.560.771,00	215024	$ 11.951.663.060,00	$ 512.591.149.572,00	6901-04/07/2025	x		Factura CVCM-79
37	Obra	Julio de 2025	$ 6.614.837.616,00	$ 48.339.198,00	$ 6.663.176.814,00	$ 271.208.342,00	$ 6.391.968.472,00	$ 22.982.352.429,00	215024	$ 5.559.694.588,00	$ 505.927.972.758,00	8280-12/08/2025		x	Factura CVCM-81
37	Gestion SPAS	Julio de 2025	$ 272.960.942,00	$ 9.289.151,00	$ 282.250.093,00		$ 282.250.093,00	$ 22.982.352.429,00	215024	$ 5.277.444.495,00	$ 505.645.722.665,00	8280-12/08/2025		x	Factura CVCM-81
36D	Ajuste	Junio de 2025	-$ 1.467.542,00	-$ 10.725,00	-$ 1.478.267,00		-$ 1.478.267,00	$ 22.982.352.429,00	215024	$ 5.278.922.762,00	$ 505.647.200.932,00	8288-12/08/2025		x	Factura CVCM-83
37P	Ajuste	Julio de 2025	$ 1.730.767.485,00	$ 12.647.916,00	$ 1.743.415.401,00		$ 1.743.415.401,00	$ 22.982.352.429,00	215024	$ 3.535.507.361,00	$ 503.903.785.531,00	8288-12/08/2025		x	Factura CVCM-83
38	Obra	Agosto de 2025	$ 3.408.252.887,00	$ 24.906.463,00	$ 3.433.159.350,00	$ 164.261.079,00	$ 3.268.898.271,00	$ 22.818.091.350,00	215024	$ 266.609.090,00	$ 500.470.626.181,00				
37D	Ajuste	Julio de 2025	$ 66.366.079,00	$ 484.983,00	$ 66.851.062,00		$ 66.851.062,00	$ 22.818.091.350,00	215024	$ 199.758.028,00	$ 500.403.775.119,00				
38P	Ajuste	Agosto de 2025	$ 198.308.848,00	$ 1.449.180,00	$ 199.758.028,00		$ 199.758.028,00	$ 22.818.091.350,00	215024	$ -	$ 500.204.017.091,00				
										Saldo Registro Presupuestal No. 1248624 De (31/12/2024)					
							$ -			**$ 1.077.920.949,00**					
38	Obra	Agosto de 2025	$ 598.114.901,00	$ 4.370.840,00	$ 602.485.741,00		$ 602.485.741,00	$ 22.818.091.350,00	1248624	$ 475.435.208,00	$ 499.601.531.350,00				
38P	Ajuste	Agosto de 2025	$ 471.986.079,00	$ 3.449.129,00	$ 475.435.208,00		$ 475.435.208,00	$ 22.818.091.350,00	1248624	$ -	$ 499.126.096.142,00				
										Saldo Registro Presupuestal No. 1248824 De (31/12/2024)					
										$ 109.000.000,00					
38P	Ajuste	Agosto de 2025	$ 108.209.240,00	$ 790.760,00	$ 109.000.000,00		$ 109.000.000,00	$ 22.818.091.350,00	1248824	$ -	$ 499.017.096.142,00				
										Saldo Registro Presupuestal No. 186725 De (31/12/2024)					
										$ 77.866.666.666,00					
38P	Ajuste	Agosto de 2025	$ 387.984.008,00	$ 2.835.268,00	$ 390.819.276,00		$ 390.819.276,00	$ 22.818.091.350,00	186725	$ 77.475.847.390,00	$ 498.626.276.866,00				
38D	Ajuste	Agosto de 2025	$ 6.837.783,00	$ 49.968,00	$ 6.887.751,00		$ 6.887.751,00	$ 22.818.091.350,00	186725	$ 77.468.959.639,00	$ 498.619.389.115,00				
39	Obra	Septiembre de 2025	$ 2.414.538.298,00	$ 17.644.703,00	$ 2.432.183.001,00	$ 98.996.070,00	$ 2.333.186.931,00	$ 22.719.095.280,00	186725	$ 75.135.772.708,00	$ 496.187.206.114,00				
39	Gestion SPAS	Septiembre de 2025	$ 4.809.147.876,00	$ 15.906.196,00	$ 4.825.054.072,00	$ 1.816.432.680,00	$ 3.008.621.392,00	$ 20.902.662.600,00	186725	$ 72.127.151.316,00	$ 491.362.152.042,00				
TOTALES			**$ 141.551.901.602,00**	**$ 2.202.694.618,00**	**$ 143.754.596.220,00**	**$ 9.097.337.400,00**	**$ 134.657.258.820,00**	**$ 20.902.662.600,00**		**$ 72.127.151.316,00**	**$ 491.362.152.042,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Septiembre de 2025.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 85.134.223,00**	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 60.263.058.484,00**	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 259.555.555,00**	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 47.296.791,00**	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 48.475.172.345,00**	$ 6.788.140.594,68
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 144.197.531,00**	$ 144.197.531,00
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 89.863.901,00**	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 33.102.827.458,00**	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 18.000.000.000,00**	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 273.975.308,00**	$ -
2024	1248624	C-2401-0600-91-51102D-2401024-02	20	PROPIO	ADICIÓN Nº1	**$ 5.000.000.000,00**	$ -
2024	1248824	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	ADICION Nº1	**$ 109.000.000,00**	$ -
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 75.674.864,00**	$ -
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 30.863.361.184,00**	$ 30.541.329.021,00
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 230.716.049,00**	$ 230.716.049,00
2025	186725	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 46.696.914.569,00**	$ 46.696.914.569,00
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 41.000.000.000,00**	$ 41.000.000.000,00
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 175.200.000.000,00**	$ 175.200.000.000,00
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 146.000.000.000,00**	$ 146.000.000.000,00
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	**$ 29.200.000.000,00**	$ 29.200.000.000,00
			TOTAL			**$ 635.116.748.262,00**	**$ 475.801.297.764,68**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 635.116.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 96.083.507.434,00	$ 702.148.708,00	$ 96.785.656.142,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 19.007.119.587,00	$ 138.898.181,00	$ 19.146.017.768,00
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III	$ 3.995.574.999,00	$ 759.159.252,00	$ 4.754.734.251,00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%	$ 19.872.869.361,00	$ 109.850.735,00	$ 19.982.720.096,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
TOTAL BOLSA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS	$ 2.592.830.221,00	$ 492.637.742,00	$ 3.085.467.963,00
VALOR TOTAL	**$ 141.551.901.602,00**	**$ 2.202.694.618,00**	**$ 143.754.596.220,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **CONRADO LOPERA PALACIO**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520280830 ANT

Firma:
Nombre: NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-09718 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39 **DE** Septiembre de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 39 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 7.223.686.174,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72.1 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 72.1 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 5.109.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 635.116.748.262,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		1 de julio del 22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1,1.2,2.3, 4, 67 y 80)	$ 1.238.328,37	0,234%		% P	0,00%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%
	$ 3.559.691,72	0,643%	$ 2.071.552,20	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37	$238.328,37
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%	0,038%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%		% P	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 5.131.191,85	0,927%	$ 3.195.768,57	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$2.598.021,79	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.598.021,79	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,469%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 81 y 82)	$ 13.698.762,53	2,476%		% P	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 23.752.627,71	4,292%	$ 7.348.163,97	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de Orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 89)	$ 535.135.350,83	96,704%	14.462%	% P	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 504.990.230,65	91,251%	$ 80.027.451,55	$ P	$0,0	$7.074.987,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71
				$ E	$0	$7.074.987,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71	$10.386.230,71
				% E	0,00%	1,277%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%	1,875%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112)	$ 467.594,97	0,084%	0,067%	% P	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 9.676.987,46	1,749%	$ 539.169,95	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77 y 88)	$ 23.481,25	0,004%	0,066%	% P	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 376.251,58	0,104%	$ 473.897,44	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,439%	% P	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 2.739.393,02	0,495%	$ 2.427.504,76	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%	% P	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
				% E	0,00%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Ajuste al peso	$ (4,08)	0,000%																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**17,363%**																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.395.369,91**	**99,462%**	**$ 96.083.507,434**																							

REPROGRAMACIÓN No1 | REPROGRAMACIÓN No2 | REPROGRAMACIÓN No3

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,000%	0,000%	1,440%	3,280%	5,580%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	0,290%	1,300%	1,414%	2,520%	2,090%	0,094%	0,192%	0,128%	0,121%	
	$	$ -	$ -	$ 7.970.656,69	$ 16.196.259,47	$ 30.876.880,20	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 7.227.010,81	$ 7.822.819,98	$ 13.991.590,12	$ 16.581.414,76	$ 463.441,84	$ 563.441,84	$ 683.441,84	$ 669.000,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,000%	0,000%	1,440%	4,720%	10,300%	10,590%	10,907%	11,207%	11,500%	11,790%	12,105%	12,404%	12,703%	13,003%	2,673%	4,088%	6,617%	9,014%	7,200%	7,307%	7,427%	8,363%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 7.970.656,69	$ 24.166.916,17	$ 57.044.796,36	$ 58.701.428,47	$ 60.357.860,57	$ 62.014.292,67	$ 63.670.724,78	$ 65.327.156,88	$ 66.983.588,98	$ 68.640.021,08	$ 70.296.453,19	$ 71.952.885,29	$ 14.954.295,81	$ 22.627.115,80	$ 36.618.705,92	$ 53.200.121,35	$ 39.693.780,71	$ 40.433.222,54	$ 41.096.664,38	$ 46.277.346,35			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,265%	1,104%	1,485%	1,440%	2,520%	0,370%	0,248%	0,392%	0,492%	0,316%			
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.468.535,70	$ 6.108.730,60	$ 7.777.166,00	$ 7.962.833,98	$ 13.993.488,20	$ 2.075.595,39	$ 1.363.907,12	$ 2.113.038,88	$ 2.724.863,49	$ 1.757.666,42			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,265%	1,369%	2,775%	4,217%	6,746%	7,121%	7,368%	7,759%	8,242%	8,560%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.468.535,70	$ 7.577.265,70	$ 15.354.451,70	$ 23.337.285,28	$ 37.330.783,48	$ 39.406.338,87	$ 40.770.245,99	$ 42.883.784,87	$ 45.608.348,35	$ 47.366.033,77			

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES*	$32.410.096,98	$ 19.007.119,587	58,354%
	$32.572.015,93		
DISEÑO, EJECUCION Y ANALISIS DE PRUEBA DE CARGA*	$500.000,00		0,000%
	$500.000,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACIÓN DE OBRAS*	$300.000,00	$ -	0,000%
	$305.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)*	$4.267.299,53	$ 841.040,889	19,712%
	$4.266.759,74		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III*	$3.995.575,00	$ 3.995.574,999	99,973%
	$3.995.575,00		
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III * (1) * 19% * (2)*	$759.349,25	$ 759.159,252	99,973%
	$759.349,25		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EA y PAGA e IVA19%)* C*	$33.777.431,20	$ 19.982.720,096	59,090%
	$33.817.431,20		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)* (D)*	$504.000,00		0,000%
	$504.000,00		
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES (I)	$0,00	$ 2.592.830,221	99,961%
	$2.593.850,22		
IVA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19% (4)	$0,00	$ 492.637,742	99,961%
	$492.827,74		
DIAGNÓSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$0,00		0,000%
	$40.000,00		
IVA (19%) - DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$0,00		0,000%
	$7.600,00		
PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE (MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN Y/O REEMPLAZO DE LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS E IVA (J)	$0,00		0,000%
	$4.755.990,20		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)*	$76.634.751,90	$ 47.671.088,766	56,268%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')*	$84.721.378,35		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)*	**$638.007.748,26**	$ 143.754.596,220	22,634%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')*	**$638.116.748,34**		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 4
		FECHA	30/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39 **DE** Septiembre de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 39
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 7.223.686.174,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVIAL PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 meses (En meses segun contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 72,1 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN

VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A):** $ 553.372.996.390,00 (Según contrato inicial)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 143.754.596.220,00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B):** $ 697.127.592.390,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado % Ejecutado	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7	2-8	2-9	2-10	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5	3-6	3-7	3-8	3-9	4-0	4-1	4-2	4-3	4-4
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1,1,1,2,2,3, 4, 67 y 80)	$ 1.230.328,37	0,224%	0,374%	% P	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,006%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%
	$ 3.559.691,72	0,643%	$ 2.071.552,20	$ P	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 35.595,69	$ 35.595,69	$ 35.595,69	$ 35.595,69	$ 35.595,69	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38	$ 71.191,38
				% E	0,018%	0,018%	0,014%	0,004%	0,005%	0,001%	0,000%	0,000%	0,004%	0,134%	0,032%	0,018%	0,052%	0,018%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%	0,578%	% P	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%	0,034%
	$ 5.131.191,85	0,927%	$ 3.195.768,57	$ P	$ 198.234	$ 198.234	$ 113.577	$ 27.564	$ 34.176	$ 17.088	$ 17.088	$ 17.088	$ 17.088	$ 17.088	$ 34.176	$ 34.176	$ 34.176	$ 34.176	$ 34.176	$ 34.176	$ 34.176	$ 34.176	$ 34.176	$ 34.176	$ 34.176	$ 34.176
				% E	0,035%	0,245%	0,038%	0,004%	0,006%	0,001%	0,000%	0,000%	0,015%	0,161%	0,038%	0,000%	0,000%	0,142%	0,115%	0,034%	0,014%	0,016%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 81 y 82)	13.692.762,53	2,476%	1,328%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 23.752.527,71	4,292%	$ 7.348.163,97	$ P	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 89)	$ 504.990.230,65	91,251%	$ 80.027.451,55	$ P	$ 11.023.071	$ 23.743,1	$ 510.393,2	$ 1.189.732	$ 4.747.072,2	$ 2.230.964,6	$ 2.230.972,3	$ 2.230.972,3	$ 2.230.972,3	$ 2.230.972,3	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2
				$ E	$ 11.023.071	$ 23.743,1	$ 510.393,2	$ 1.189.732	$ 4.747.072,2	$ 2.230.964,6	$ 2.230.972,3	$ 2.230.972,3	$ 2.230.972,3	$ 2.230.972,3	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2	$ 4.745.143,2
				% E	2,222%	0,748%	0,737%	0,743%	0,996%	0,875%	0,390%	0,390%	0,390%	0,390%	0,831%	0,831%	0,831%	0,831%	0,831%	0,831%	0,831%	0,831%	0,831%	0,831%	0,831%	0,831%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112)	$ 467.594,97	0,084%	0,097%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 9.676.087,46	1,749%	$ 539.168,95	$ P	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77 y 88)	$ 23.481,25	0,004%	0,086%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 576.251,58	0,104%	$ 473.897,44	$ P	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,439%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 2.739.293,02	0,495%	$ 2.427.504,76	$ P	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 46.340,59	$ 46.340,59	$ 46.340,59	$ 46.340,59	$ 46.340,59	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19	$ 92.681,19
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -	$ P	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0	$ 0,0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Ajuste al peso	$ (4,08)	0,000%																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,39**	**100,000%**	**17,383%**																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.395.369,91**	**99,462%**	**$ 96.083.507,434**																							

REPROGRAMACIÓN #1 — REPROGRAMACIÓN #2 — REPROGRAMACIÓN #3 — REPROGRAMACIÓN #4 — REPROGRAMACIÓN #5 — REPROGRAMACIÓN #6 — REPROGRAMACIÓN #7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,152%	0,172%	0,208%	0,301%	0,462%	0,428%	0,403%	0,488%	0,592%	0,312%	0,238%	0,475%	0,395%	0,474%	0,486%	0,564%	0,658%	0,543%	2,537%	26,471%	0,725%	0,373%	0,373%	0,373%	0,373%
	$	$ 947.612,78	$ 947.612,78	$ 1.141.612,78	$ 1.663.304,56	$ 2.557.550,89	$ 2.357.550,89	$ 2.227.550,89	$ 2.695.550,89	$ 3.267.550,89	$ 1.720.412,45	$ 1.312.550,89	$ 2.642.040,71	$ 1.958.208,61	$ 2.625.208,13	$ 2.695.512,52	$ 3.125.208,13	$ 3.639.446,43	$ 3.000.000,00	$ 14.016.736,06	$ 151.259.120,00	$ 4.000.000,00	$ 2.060.000,00	$ 2.060.000,00	$ 2.060.000,00	$ 2.060.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	8,015%	8,688%	8,896%	9,192%	9,674%	10,526%	11,037%	11,892%	11,728%	12,061%	12,761%	13,240%	13,689%	14,164%	14,650%	15,233%	15,891%	16,838%	19,345%	39,821%	40,199%	40,572%	40,572%	40,572%	40,572%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 47.119.921,14	$ 48.068.693,92	$ 49.202.366,70	$ 50.868.271,26	$ 53.534.175,82	$ 56.550.120,08	$ 58.877.671,11	$ 61.691.985,96	$ 64.695.777,00	$ 66.744.349,26	$ 70.627.876,93	$ 73.275.417,61	$ 75.748.525,61	$ 78.373.916,14	$ 81.068.387,65	$ 84.297.677,78	$ 87.937.124,22	$ 93.176.570,65	$ 107.051.307,04	$ 220.327.039,48	$ 222.482.879,48	$ 224.548.728,48	$ 226.608.728,48	$ 228.668.728,48	$ 230.728.728,48
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,299%	0,170%	0,136%	0,209%	0,670%	0,628%	0,434%	0,278%	0,532%	0,388%	0,476%	0,387%	0,647%	1,032%	1,195%	0,724%	0,426%								
	$	$ 1.473.905,56	$ 842.016,52	$ 746.471,26	$ 1.148.413,16	$ 4.816.424,27	$ 3.473.497,77	$ 2.401.153,69	$ 1.527.039,88	$ 2.944.912,10	$ 2.135.829,59	$ 2.636.972,52	$ 2.142.486,79	$ 3.580.965,56	$ 5.709.451,079	$ 6.614.837,016	$ 4.008.347,798	$ 2.414.038,298								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	8,826%	8,996%	9,131%	9,339%	10,216%	10,822%	11,271%	11,547%	12,079%	12,468%	12,942%	13,329%	13,976%	15,008%	16,203%	16,927%	17,353%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 48.619.939,13	$ 49.781.955,65	$ 50.530.426,66	$ 51.679.840,01	$ 56.498.264,28	$ 59.971.672,65	$ 62.272.825,74	$ 63.800.465,62	$ 66.744.377,72	$ 68.880.207,29	$ 71.516.779,80	$ 73.659.266,594	$ 77.239.232,15	$ 82.947.763,732	$ 89.562.601.348	$ 93.570.949,146	$ 95.985.669,136	$ 96.863.367.454							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES*	$32.410.098,98	$ 19.007.119,59	58,354%
	$32.372.015,00		
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANALISIS DE PRUEBA DE CARGA*	$500.000,00	$ -	0,000%
	$500.000,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y/OPTIMIZACIÓN DE OBRA*	$300.000,00	$ -	0,000%
	$300.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)*	$4.287.299,53	$ 841.046,89	19,712%
	$4.266.759,74		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III* (1)*	$3.995.575,00	$ 3.995.575,00	99,973%
	$3.995.575,00		
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III* (1) * 19% = 20*	$759.349,25	$ 759.159,25	99,973%
	$759.349,25		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EA y PAGA a IVA/19%)= C*	$33.777.431,20	$ 19.982.720,10	59,090%
	$33.817.431,20		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA= 21)*	$504.000,00	$ -	0,000%
	$504.000,00		
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES (3)	$0,00	$ 2.592.830,22	99,981%
	$2.593.830,22		
IVA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19% (4)	$0,00	$ 492.637,74	99,981%
	$492.827,74		
DIAGNÓSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (5)	$0,00	$ -	0,000%
	$40.000,00		
IVA (19%) - DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (5)	$0,00	$ -	0,000%
	$7.600,00		
PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE (MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS E IVA (7)	$0,00	$ -	0,000%
	$4.765.399,20		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)*	$76.634.751,96	$ 47.671.088,79	56,268%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')*	$84.721.378,38		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=A+B)*	**$630.007.748,29**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A+B')*	**$635.116.748,29**	$ 143.754.596,220	22,634%

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES			
TIPO DE SIMBOLO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	X Valor	X Valor	X Valor
CURVAS			

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 4
		FECHA	30/09/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39 **DE** Septiembre de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 39 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 7.223.686.174,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72.1 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 72.1 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 630.007.748.262,00

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 5.109.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 635.116.748.262,00 (Según contrato principal)

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1, 1.2,2.3, 4, 67 y 80)	$ 1.238.328,37	0,234%	0,374%	% P	0,01%	0,01%	0,01%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 3.559.691,72	0,643%	$ 2.071.552,20	$ P	395,5 Bn	395,5 Bn	395,5 Bn	399,2 Bn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%	0,578%	% P	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 5.131.191,85	0,927%	$ 3.195.768,57	$ P	$2,2	$3	$4.24,252	$24.3,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88	$24.2,88
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 81 y 82)	$ 13.698.782,53	2,476%	1,328%	% P	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
	$ 23.732.627,71	4,292%	$ 7.348.163,97	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88)	$ 504.990.230,65	91,251%	$ 80.027.451,55	% P	0,00%	0,00%	1,81%	1,80%	2,60%	2,44%	1,89%	2,38%	2,48%	0,04%	1,46%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	1,99%	1,99%	1,99%
				$ P	$2.021.393	$3.012.393	$10.061.937	$10.201.496	$14.921.757	$1.511.373	$13.128.707	$14.752.239	$26.765.732	$13.844.624	$8.112.772	$11.161.157	$11.161.157	$11.161.157	$11.161.157	$11.161.157	$11.161.157	$11.161.157	$11.159.256	$10.975.277	$17.369.546
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112)	$ 467.584,97	0,084%	0,097%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 9.676.087,46	1,749%	$ 539.168,95	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77 y 88)	$ 23.461,25	0,004%	0,066%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 576.251,58	0,104%	$ 473.897,44	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,439%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 2.739.393,02	0,495%	$ 2.437.504,76	$ P	$55.830	$82.830	$82.830	$55.830	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ -	0,000%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ajuste al peso	$ (4,08)	0,000%																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**17,363%**																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.395.369,91**	**99,462%**	**$ 96.083.507,434**																							

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,368%	0,568%	1,096%	1,920%	2,678%	2,464%	1,872%	4,489%	6,680%	6,136%	1,508%	2,059%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,016%	1,952%	3,218%
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 2.147.450,59	$ 3.147.450,59	$ 11.540.768,62	$ 10.658.315,14	$ 14.817.167,69	$ 13.746.223,47	$ 10.361.057,91	$ 24.356.559,70	$ 37.000.142,26	$ 33.899.974,40	$ 8.346.622,27	$ 11.161.197,25	$ 11.161.197,25	$ 11.161.197,25	$ 11.161.197,25	$ 11.161.197,25	$ 11.161.197,25	$ 11.161.197,25	$ 11.161.197,25	$ 11.155.055,72	$ 10.975.277,06	$ 17.809.546,86
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			40,560%	41,530%	43,531%	45,447%	48,125%	50,619%	52,491%	56,980%	63,586%	69,722%	71,229%	73,290%	75,297%	77,313%	79,330%	81,347%	83,364%	85,381%	87,398%	89,415%	91,398%	94,618%
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 228.696.179,46	$ 229.843.630,40	$ 240.989.419,06	$ 251.547.734,20	$ 266.364.901,88	$ 280.111.065,36	$ 290.472.123,27	$ 314.868.711,97	$ 351.868.854,22	$ 385.767.830,62	$ 394.114.352,90	$ 405.509.900,58	$ 416.671.097,84	$ 427.832.295,09	$ 438.993.492,34	$ 450.154.689,60	$ 461.315.886,85	$ 472.477.084,11	$ 483.638.281,36	$ 494.794.337,08	$ 505.771.614,14	$ 523.581.163,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																								
	VALOR (Miles de Pesos)																								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES*	$32.410.096,98	$ 19.007.119,59	58,354%
	$32.572.015,00		
DISEÑO, EJECUCION Y ANALISIS DE PRUEBA DE CARGA*	$600.000,00	$ -	0,000%
	$600.000,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACIÓN DU OBRA*	$300.000,00	$ -	0,000%
	$300.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)*	$4.267.299,53	$ 841.046,89	19,712%
	$4.266.759,74		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE II+ (1)*	$3.996.575,00	$ 3.995.575,00	99,973%
	$3.996.575,00		
NA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE II+ (1) * 19% = 21*	$759.349,25	$ 759.159,25	99,973%
	$759.349,25		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye ER y PAGA x1/4/5%)+ C*	$33.777.431,20	$ 19.982.720,10	59,090%
	$33.817.431,20		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)+ (D)*	$504.000,00	$ -	0,000%
	$504.000,00		
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES (3)	$0,00	$ 2.592.830,22	99,961%
	$2.593.830,22		
NA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19% (4)	$0,00	$ 492.637,74	99,961%
	$492.637,74		
DIAGNÓSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$0,00	$ -	0,000%
	$40.000,00		
NA (19%) - DIAGNÓSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$0,00	$ -	0,000%
	$7.600,00		
PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE (MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS E IVA (I)	$0,00	$ -	0,000%
	$4.765.990,20		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)*	$76.034.751,96	$ 47.671.088,79	56,268%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')*	$84.721.379,33		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)*	**$630.007.748,26**	$ 143.754.596,220	22,634%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')*	**$635.116.748,24**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en las cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES

TIPO DE GRÁFICO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS	%	%	%

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4 DE 4
		FECHA	30/09/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 39 **DE** Septiembre de 2025 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 39 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 7.223.686.174,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL:	72.1 meses (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO:	72.1 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):**	$ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):**	$ 5.109.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):**	$ 635.116.748.262,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / %Ejecutado	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		ene-28	feb-28	mar-28	abr-28	may-28	jun-28	jul-28
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1, 1.2,2.3, 4, 67 y 80)	$ 1.238.328,37	0,224%	$ 2.071.552,20	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 3.559.691,72	0,643%		$ P	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
				$ E							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.588.021,79	0,469%	0,578%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 5.131.191,85	0,927%	$ 3.195.768,57	$ P	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
				$ E							
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 81 y 82)	$ 13.698.762,53	2,476%	1,328%	% P	0,000%	0,310%	6,210%	0,349%	0,001%	0,000%	0,000%
	$ 23.752.627,71	4,292%	$ 7.348.163,97	$ P	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
				$ E							
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 89)	$ 535.135.350,83	96,704%	14,462%	% P	1,161%	0,94%	1,117%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 504.960.230,65	91,251%	$ 80.027.451,55	$ P	$19.216.593,0	$5.219.140	$6.402.6.386	50,0	50,0	50,0	50,0
				$ E	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112)	$ 467.584,97	0,084%	0,097%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 9.676.087,46	1,749%	$ 539.169,95	$ P	$19.7.03	$19.7.03	$1.31.,317	$19.7.03	$36.89.6	50,0	50,0
				$ E	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77 y 88)	$ 23.481,25	0,004%	0,088%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 576.251,58	0,104%	$ 473.897,44	$ P	1.0,0%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
				$ E	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,430%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 2.739.263,02	0,495%	$ 2.427.504,76	$ P	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
				$ E							
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -	$ P	0,0%	0,0%	0,0	0,0%	0,0%	0,0	0,0
				$ E							
Ajuste al peso				% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ (4,081)	0,000%		$ P					-$4,08		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**17,363%**								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 559.395.369,91**	**99,462%**	**$ 96.093.507,434**								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES		%	1,962%	1,277%	1,448%	0,151%	0,007%	0,000%	0,000%
			$ 10.836.456,54	$ 7.083.644,30	$ 8.014.979,10	$ 836.680,05	$ 40.438,83	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA		%	96,578%	97,855%	99,302%	99,453%	99,462%	99,462%	99,462%
		VALOR (Miles de Pesos)	$ 534.427.619,54	$ 541.983.263,84	$ 549.518.243,02	$ 550.354.931,08	$ 550.395.369,91	$ 550.395.369,91	$ 550.395.369,91
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES		%							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA		%							
		VALOR (Miles de Pesos)							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES*	$32.410.096,58	$ 19.007.119,59	58,354%
	$32.372.015,00		
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANALISIS DE PRUEBA DE C-ARGA*	$600.000,00	$ -	0,000%
	$600.000,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACIÓN DE OBRAS*	$300.000,00	$ -	0,000%
	$305.000,00		
VALOR AA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)*	$4.287.269,53	$ 841.046,89	19,712%
	$4.266.759,74		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III* (1)*	$3.996.575,00	$ 3.995.575,00	99,975%
	$3.996.575,00		
AA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/O OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III* (1) * 19% = (2)*	$759.349,25	$ 759.159,25	99,975%
	$759.349,25		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EA y PAGA e IVA19%)=* C*	$33.777.431,20	$ 19.982.720,10	59,090%
	$33.817.431,20		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)*	$504.000,00	$ -	0,000%
	$504.000,00		
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES (3)	$0,00	$ 2.592.830,22	99,961%
	$2.593.830,22		
AA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19% (4)	$0,00	$ 492.637,74	99,961%
	$492.827,74		
DIAGNÓSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$0,00	$ -	0,000%
	$40.000,00		
AA (19%) - DIAGNÓSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$0,00	$ -	0,000%
	$7.600,00		
PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE (MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS E IVA (J)	$0,00	$ -	0,000%
	$4.765.990,20		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)*	$76.634.751,95	$ 47.671.088,79	56,268%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')*	$84.721.378,35		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)*	**$630.007.748,26**	$ 143.754.596,220	22,634%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')*	**$638.116.748,26**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se hayan considerados ítems de obra que no se pueden agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES			
TIPO DE GRÁFICO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba. Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ARMANDO ALFONSO MEJIA MONSALVO	12635938	CADENERO 1	$ 2.693.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.589.976,00	$ 249.900,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 143.600,00	PROTECCION	9491663788	$ 574.400,00	$ 143.600,00			
2	CABALLERO MALDONADO LUDYS ROCIO	1083456188	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	$ 2.049.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.488.489,00	$ 173.200,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 99.600,00	PORVENIR	9491663788	$ 398.200,00	$ 99.600,00			
3	LOPEZ RODRIGUEZ ALBEIRO JOSE	85372059	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.645.329,00	$ 68.300,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 65.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 263.300,00	$ 39.300,00			
4	POLO MAIGUEL JORGE LUIS	85455573	AYUDANTE	$ 1.756.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.305.666,00	$ 160.500,00	V	COOSALUD	9491663788	$ 92.300,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 369.000,00	$ 92.300,00			
5	SAN JOSE CASTILLO AYLIN VANESSA	1140842732	INGENIERA RESIDENTE	$ 5.995.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.995.701,00	$ 389.500,00	V	SURA	9491663788	$ 239.900,00	COLFONDOS	9491663788	$ 1.019.400,00	$ 239.900,00			
6	PORRETA CARVAL WENDY JOLANYS	39101775	PROFRESIONAL GESTION HUMANA	$ 4.348.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.348.601,00	$ 292.600,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 174.000,00	PROTECCION	9491663788	$ 695.800,00	$ 174.000,00			
7	JAZMIN RUIZ MACA	66912520	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.143.824,00	$ 149.300,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 85.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 343.100,00	$ 85.800,00			
8	HERNAN YESID NARVAEZ PANTOJA	1087413014	PROFESIONAL OFICINA TÉCNICA	$ 6.667.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 7.561.689,00	$ 479.900,00	V	SURA	9491663788	$ 302.500,00	PROTECCION	9491663788	$ 1.286.200,00	$ 302.500,00			
9	GERMAN OSPINA MARIN	15959780	MAESTRO DE OBRA	$ 6.602.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 8.683.727,00	$ 604.400,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 347.400,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 1.476.400,00	$ 347.400,00			
10	FREDY JUNIOR CASTILLO RODRIGUEZ	1083568264	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.044.233,00	$ 142.300,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 81.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 327.100,00	$ 81.800,00			
11	YOANDRIS MEJIA MEJIA	1221982696	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.414.019,00	$ 168.100,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 96.600,00	PROTECCION	9491663788	$ 386.300,00	$ 96.600,00			
12	JOSE DAVID FELIPE SANJUAN	1221964274	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.601.176,00	$ 181.100,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 104.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 416.200,00	$ 104.100,00			
13	JESUS MARIA LEIVA DURAN	1083461770	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.516.252,00	$ 175.200,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 100.700,00	COLFONDOS	9491663788	$ 402.700,00	$ 100.700,00			
14	VANESSA RAMIREZ SANTA	1140835286	ABOGADO PREDIAL	$ 7.601.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 8.184.286,00	$ 372.200,00	V	SANITAS	9491663788	$ 328.000,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 1.392.700,00	$ 328.300,00			
15	JUAN DAVID LOPEZ VASQUEZ	1004376277	OPERADOR MÚLTIPLE MOVIMIENTO DE TIER	$ 3.258.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.038.811,00	$ 266.000,00	V	SALUDTOTAL	9491663788	$ 161.600,00	PORVENIR	9491663788	$ 646.300,00	$ 161.600,00			
16	EDWIN ZAIR SAUMET VASQUEZ	1082854200	INGENIERO DE MANTENIMIENTO	$ 5.173.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 6.067.164,00	$ 386.300,00	V	SANITAS	9491663788	$ 242.700,00	PROTECCION	9491663788	$ 1.031.800,00	$ 242.700,00			
17	ARMANDO JOSE MORALES ARCON	72306439	MECANICO 1	$ 3.652.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.391.523,00	$ 375.300,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 215.700,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 862.700,00	$ 215.700,00			
18	YAIR ALFONSO ARZUZA RIVERA	12637222	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.769.230,00	$ 192.800,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 110.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 443.100,00	$ 110.800,00			
19	GUSTAVO BRAVO VIDES	1082949612	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.427.313,00	$ 169.000,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 97.100,00	COLFONDOS	9491663788	$ 388.400,00	$ 97.100,00			
20	JORGE ALI CASTRO PEREZ	1052053123	OPERADOR PLANTA CONCRETO MÓVIL	$ 2.249.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.019.125,00	$ 210.200,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 120.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 483.100,00	$ 120.800,00			
21	ALEXANDER CORREA ROJAS	13570888	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.480.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.104.823,00	$ 216.100,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 124.200,00	PORVENIR	9491663788	$ 496.800,00	$ 124.200,00			
22	JAIME JUNIOR VARELA AVILA	12630370	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.377.493,00	$ 227.200,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 130.600,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 536.000,00	$ 130.600,00			
23	HERNAN ALCIBAR ACEVEDO GOMEZ	9763548	COORDINADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 5.026.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 6.575.753,00	#N/D	V	SURA	9491663788	$ 263.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 1.118.000,00	$ 263.100,00			
24	VICTOR ALFONSO VILLANUEVA MARIÑO	1083466893	OPERADOR MINICARGADOR	$ 2.379.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.403.877,00	$ 237.000,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 136.200,00	PÓRVENIR	9491663788	$ 544.700,00	$ 136.200,00			
25	JORGE LUIS GARCIA SANCHEZ	19588740	CONDUCTOR MIXER	$ 2.480.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.886.658,00	$ 194.400,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 115.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 461.900,00	$ 111.700,00			
26	JESUS HERNANDO GARCIA GALLEGO	16053802	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.592.720,00	$ 319.700,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 183.800,00	PROTECCION	9491663788	$ 734.900,00	$ 183.800,00			
27	MIRTA DEL CARMEN MERCADO GONZALEZ	30764740	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.718.715,00	$ 119.700,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 68.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 275.000,00	$ 68.800,00			
28	MILLER ANTONIO URIELES RABELO	12634423	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.484.115,00	$ 172.900,00	V	COOSALUD	9491663788	$ 99.400,00	PORVENIR	9491663788	$ 397.500,00	$ 99.400,00			
29	FERNANDO JOSE ROBLES PRADO	12448260	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.747.255,00	$ 330.500,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 189.900,00	COLFONDOS	9491663788	$ 759.600,00	$ 184.100,00			
30	DANYS DE JESUS MUÑOZ SALAS	1083469401	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.132.263,00	$ 287.700,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 165.300,00	PÓRVENIR	9491663788	$ 661.200,00	$ 165.300,00			
31	JAVIER JOSE BUSTILLO MARIANO	72018821	MECANICO 1	$ 3.652.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.191.546,00	$ 361.400,00	V	SURA	9491663788	$ 207.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 830.700,00	$ 207.700,00			
32	RAMIRO ALBERTO ECHEVERRY VALENCIA	15428183	TOPÓGRAFO	$ 4.381.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.392.313,00	$ 375.400,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 215.700,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 862.800,00	$ 215.700,00			
33	CARMEN CECILIA GARIZABALO MANJARREZ	1007937213	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.566.773,00	$ 178.700,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 102.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 410.700,00	$ 169.600,00			
34	GUSTAVO ENRIQUE MUNIVE CHARRIS	1221973557	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.870.825,00	$ 130.300,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 74.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 299.400,00	$ 74.900,00			
35	LUIS ENRIQUE SERNA EUSSE	1044121090	AYUDANTE PRÁCTICO	$ 1.735.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.263.449,00	$ 137.200,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 78.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 350.500,00	$ 78.900,00			
36	CARLOS MANUEL CASTRO VALVERDE	1004162771	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.477.106,00	$ 172.500,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 99.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 396.400,00	$ 99.100,00			
37	JAIDER DE JESUS LAZO OROZCO	1083457506	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.093.786,00	$ 145.800,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 83.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 335.100,00	$ 83.800,00			
38	HEIDI LIZETT POLO MAZZILLY	39143701	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.233.816,00	$ 155.500,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 89.400,00	PORVENIR	9491663788	$ 357.500,00	$ 89.400,00			
39	LEANDRO RAFAEL LORA ONOFRE	12636757	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.215.161,00	$ 154.200,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 88.700,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 354.500,00	$ 88.700,00			
40	YIMY ANDRES MUÑOZ MONTOYA	98696731	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.862.789,00	$ 199.300,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 114.600,00	PORVENIR	9491663788	$ 458.100,00	$ 114.600,00			
41	DEINER LUIS PACHECO CAMARGO	1004323017	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.282.022,00	$ 155.600,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 91.300,00	PORVENIR	9491663788	$ 365.200,00	$ 89.400,00			
42	LEANDRO JOSE GARCIA MEJIA	1083567904	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.998.940,00	$ 139.200,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 80.000,00	PORVENIR	9491663788	$ 319.900,00	$ 80.000,00			
43	NANCY ASTRID PACHON RUEDA	1082841160	PROFESIONAL SOCIO PREDIAL	$ 5.067.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.067.102,00	$ 329.200,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 202.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 810.900,00	$ 202.800,00			
44	MANUEL SEGUNDO CABALLERO OROZCO	85373172	OFICIAL 3	$ 2.159.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.585.755,00	$ 249.600,00	V	SALUDTOTAL	9491663788	$ 143.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 573.800,00	$ 143.500,00			
45	RICARDO ALFONSO PEREZ GAVIRIA	1073984096	CAPATAZ	$ 3.837.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.386.018,00	$ 374.900,00	V	SURA	9491663788	$ 215.500,00	COLFONDOS	9491663788	$ 861.800,00	$ 215.500,00			
46	PEDRO MIGUEL OLMOS GONZALEZ	1103117633	GESTOR AMBIENTAL	$ 4.667.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.196.484,00	$ 350.900,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 208.000,00	PORVENIR	9491663788	$ 831.500,00	$ 208.000,00			
47	RICARDO LONDOÑO MORENO	16894151	GESTOR SSL	$ 5.935.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 6.721.731,00	$ 467.900,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 268.900,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 1.142.900,00	$ 268.900,00			
48	SUREYS VANESSA MONSALVO GARCIA	1065615031	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.773.983,00	$ 123.500,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 71.000,00	PORVENIR	9491663788	$ 283.900,00	$ 71.000,00			
49	ANA MILENA ALBARRACIN PAYARES	39057652	PROFESIONAL SOCIO PREDIAL	$ 3.115.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.115.101,00	$ 195.200,00	V	FAMISANAR	9491663788	$ 124.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 498.700,00	$ 124.800,00			
50	FREDI RAFAEL MORALES GUTIERREZ	1083569122	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.895.466,00	$ 132.000,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 75.900,00	PROTECCION	9491663788	$ 303.300,00	$ 75.900,00			
51	ELIANA JIMENEZ URIBE	1098356916	GESTORA SSL	$ 5.469.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 6.089.600,00	$ 385.800,00	V	SANITAS	9491663788	$ 243.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 1.036.100,00	$ 243.700,00			
52	JORGE ANDRES MEJIA LOPEZ	1085225414	PROMOTOR SOCIAL	$ 2.845.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.489.143,00	$ 242.900,00	V	SURA	9491663788	$ 139.600,00	PROTECCION	9491663788	$ 558.300,00	$ 139.600,00			
53	JULIO CESAR URUETA NORIEGA	12637898	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.473.817,00	$ 172.200,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 99.000,00	PORVENIR	9491663788	$ 395.900,00	$ 99.000,00			
54	RONNY RUIZ DA COSTA	15877434	ASISTENTE MANTENIMIENTO	$ 2.049.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.729.961,00	$ 190.100,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 109.200,00	PORVENIR	9491663788	$ 436.800,00	$ 109.200,00			
55	ELIECER JOSE BLANCO JIMENEZ	1083454506	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.318.472,00	$ 161.400,00	V	FAMISANAR	9491663788	$ 92.800,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 371.000,00	$ 92.800,00			
56	JORGE ELIAS CHAVARRIA CARVAJAL	70579768	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.705.930,00	$ 327.600,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 188.300,00	PORVENIR	9491663788	$ 753.000,00	$ 188.300,00			
57	JAIBERTH DARIO AREIZA SOSSA	70582361	LUBRICADOR	$ 2.419.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.306.910,00	$ 299.800,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 172.300,00	PORVENIR	9491663788	$ 689.200,00	$ 172.300,00			
58	JORGE LUIS RODRIGUEZ MENDOZA	9876342	AYUDANTE MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.576.751,00	$ 179.400,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 103.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 412.300,00	$ 103.100,00			
59	WILLIAM ANCIZAR JIMENEZ RESTREPO	1044120126	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.891.173,00	$ 270.900,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 155.700,00	PROTECCION	9491663788	$ 622.600,00	$ 155.700,00			
60	DELVER ALFONSO NORIEGA GUTIERREZ	85372053	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.581.686,00	$ 318.900,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 183.300,00	PORVENIR	9491663788	$ 733.100,00	$ 183.300,00			
61	SAMIR JOSE ACOSTA CANTILLO	1004381051	OFICIAL 2	$ 2.585.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.965.444,00	$ -	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 158.700,00	COLFONDOS	9491663788	$ 634.600,00	$ -			
62	JAIDER LUIS GARIZABALO MANGA	1004377309	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.291.188,00	$ 159.500,00	V	SANITAS	9491663788	$ 91.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 366.600,00	$ 91.700,00			
63	JOSE LUIS FLOREZ OROZCO	1083568241	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.850.604,00	$ 128.900,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 74.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 296.100,00	$ 74.100,00			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
64	JHOINER FABIAN CUESTA SANTAMARIA	1221982081	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.663.447,00	$ 69.600,00	V	FAMISANAR	9491663788	$ 66.600,00	PROTECCIÓN	9491663788	$ 266.200,00	$ 40.000,00				
65	LUIS GUILLERMO OROZCO FONTALVO	1083469287	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.849.576,00	$ 105.900,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 114.100,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 456.000,00	$ 60.900,00				
66	DAIVER FELIPE ROBLES GARCIA	1082405084	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.273.233,00	$ 158.300,00	V	FAMISANAR	9491663788	$ 91.000,00	PORVENIR	9491663788	$ 363.800,00	$ 91.000,00				
67	ANDERSON YUCETH MIRANDA LEYVA	1221982474	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.275.875,00	$ 158.500,00	V	CAJA ACOPI	9491663788	$ 91.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 364.200,00	$ 91.100,00				
68	JHON KEINER LEIVA DE LA CRUZ	1082404512	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.282.723,00	$ 158.900,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 91.400,00	PORVENIR	9491663788	$ 365.300,00	$ 91.400,00				
69	HUGO ALBERTO BASTIDAS HORMECHEA	9022872	CONDUCTOR TRACTOCAMIÓN EQUIPO	$ 3.126.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.505.804,00	$ 313.700,00	V	CAJA ACOPI	9491663788	$ 180.300,00	PORVENIR	9491663788	$ 721.000,00	$ 180.300,00				
70	KEVIN ENRIQUE COBO PITRE	17815478	OPERADOR PLANTA TRITURACION	$ 2.733.700,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.848.604,00	$ 241.300,00	V	SANITAS	9491663788	$ 138.700,00	COLFONDOS	9491663788	$ 600.800,00	$ 138.700,00				
71	ELKIN YAIR ALMANZA PAYARES	1063957794	ALMACENISTA	$ 2.693.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.715.872,00	$ 258.700,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 148.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 594.600,00	$ 148.700,00				
72	MILTON JESUS SALAMANCA GARCIA	12449252	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.744.818,00	$ 183.800,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 105.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 435.100,00	$ 105.700,00				
73	CARLOS ARTURO CARDONA PATIÑO	8409569	OPERADOR DE GRÚA	$ 3.803.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.727.991,00	$ 398.700,00	V	SURA	9491663788	$ 229.200,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 973.900,00	$ 229.200,00				
74	RONNY LEANDRO GRANADOS CELIS	12449382	CONDUCTOR TRACTO CAMIÓN MATERIAL	$ 3.126.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.759.516,00	$ 261.700,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 150.400,00	PORVENIR	9491663788	$ 601.600,00	$ 150.400,00				
75	JUAN MIGUEL CERPA DEL VALLE	85372869	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.909.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.618.882,00	$ 251.900,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 144.800,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 579.100,00	$ 144.800,00				
76	MILLER SIMON OVIEDO SIERRA	1140851190	OPERADOR MOTONIVELADOR SERIADOR	$ 3.258.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.101.629,00	$ 285.500,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 164.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 656.300,00	$ 164.100,00				
77	MARLON ALONSO MURCIA	85472989	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.998.112,00	$ 208.700,00	V	SURA	9491663788	$ 120.000,00	PORVENIR	9491663788	$ 479.700,00	$ 120.000,00				
78	JEISON DAVID MELGAREJO CARBONO	85370470	OPERADOR CARGADOR	$ 2.883.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.602.827,00	$ 223.600,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 144.200,00	PORVENIR	9491663788	$ 576.500,00	$ 140.100,00				
79	JUAN CARLOS BLANCO CAMPO	72272642	OPERADOR BULLDOZER	$ 2.909.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.151.743,00	$ 192.400,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 126.200,00	PORVENIR	9491663788	$ 504.400,00	$ 126.200,00				
80	ADAN JEISON DIAZ VARELA	1221963812	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 2.733.700,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.028.791,00	$ 280.500,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 161.200,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 644.700,00	$ 161.200,00				
81	JORGE LUIS ORTIZ SAENZ	10773597	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 2.276.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.776.272,00	$ 193.300,00	V	SALUDTOTAL	9491663788	$ 111.100,00	PROTECCION	9491663788	$ 444.300,00	$ 111.100,00				
82	WILBER QUINTANA MERCADO	1044909435	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	$ 1.709.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.090.310,00	$ 215.100,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 123.700,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 494.500,00	$ 123.700,00				
83	JOSE LEVER VARGAS CARDONA	10179924	SOLDADOR 1 METALMECANICA	$ 3.617.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 6.006.500,00	$ 418.100,00	V	COOSALUD	9491663788	$ 240.300,00	PORVENIR	9491663788	$ 1.021.300,00	$ 240.300,00				
84	JOSE LUIS GALAN CABANA	85370483	SOLDADOR 1 METALMECANICA	$ 3.617.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.096.829,00	$ 354.800,00	V	SANITAS	9491663788	$ 203.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 815.500,00	$ 251.600,00				
85	JOEL ANTONIO CACERES CALVO	12448406	OPERADOR DE BULLDOZER	$ 2.909.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.737.349,00	$ 260.200,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 149.500,00	PROTECCION	9491663788	$ 598.000,00	$ 187.500,00				
86	ENDERSON ENRIQUE LLORENTE CERVANTES	85370808	SOLDADOR METALMECANICA 3	$ 2.692.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.986.373,00	$ 277.500,00	V	SURA	9491663788	$ 159.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 637.900,00	$ 159.500,00				
87	JESUS DAVID GONZALEZ POLO	1065573721	SOLDADOR RECONSTRUCCION MAQUINARIA	$ 2.692.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.976.073,00	$ 276.800,00	V	FAMISANAR	9491663788	$ 159.100,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 636.200,00	$ 159.100,00				
88	GLEINER DAVID JUVINAO CANTILLO	1221971529	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.885.868,00	$ 131.300,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 75.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 301.800,00	$ 75.500,00				
89	YEIFRAN EDUARDO LASCARRO OCHOA	85372803	OFICIAL 2	$ 2.585.800,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.384.068,00	$ 235.600,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 135.400,00	PORVENIR	9491663788	$ 541.500,00	$ 135.400,00				
90	FRAYNES RIQUETT GUTIERREZ	85480703	ELECTROAUTO	$ 3.653.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.760.622,00	$ 322.900,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 190.500,00	COLFONDOS	9491663788	$ 761.800,00	$ 190.500,00				
91	JOHN ALEXANDER FERNANDEZ RODRIGUEZ	80654499	MECANICO 1	$ 3.652.900,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.594.334,00	$ 389.400,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 223.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 895.100,00	$ 223.800,00				
92	CARLOS JAVIER ALZATE CASTAÑO	94357455	OPERADOR TERMINADORA DE ASFALTO	$ 3.018.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.066.665,00	$ 261.000,00	V	S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	9491663788	$ 150.000,00	PORVENIR	9491663788	$ 638.100,00	$ 150.000,00				
93	BLADIMIRO JOSE DIAZ DAZA	84037920	LUBRICADOR	$ 2.419.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.618.535,00	$ 251.900,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 144.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 579.000,00	$ 144.800,00				
94	JOSE LUIS GOMEZ AREIZA	1037449297	MECANICO 2	$ 2.890.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.907.100,00	$ 265.300,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 156.400,00	PORVENIR	9491663788	$ 625.300,00	$ 152.500,00				
95	JAVIER RICO FERNANDEZ	79062757	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2.221.800,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.197.793,00	$ 222.600,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 128.000,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 511.700,00	$ 128.000,00				
96	ALBERTH JESUS SALAS POLO	1065602930	SUPERVISOR PAVIMENTOS	$ 4.814.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.942.582,00	$ 299.400,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 198.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 791.000,00	$ 198.100,00				
97	JAVIER ENRIQUE SOLANO QUINTERO	77154309	OPERADOR PLANTA DE ASFALTO	$ 3.592.800,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.690.916,00	$ 326.500,00	V	FAMISANAR	9491663788	$ 187.700,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 750.600,00	$ 187.700,00				
98	HENRY GALLEGO QUINTERO	10188058	CONTRAMAESTRO	$ 3.739.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.332.440,00	$ 371.200,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 213.300,00	PORVENIR	9491663788	$ 853.200,00	$ 213.300,00				
99	WILLMAR ENRIQUE VILLA GARCIA	19615230	CONDUCTOR TRACTOCAMIÓN EQUIPO	$ 3.126.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.711.864,00	$ 328.000,00	V	SANITAS	9491663788	$ 188.500,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 753.900,00	$ 188.500,00				
100	LEIVER VELASQUEZ SUAREZ	1068810899	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.486.240,00	$ 312.300,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 179.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 717.800,00	$ 179.500,00				
101	FABIAN ANDRES RUIZ PALACIO	1028015724	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.912.505,00	$ 133.200,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 76.600,00	PROTECCION	9491663788	$ 306.100,00	$ 76.600,00				
102	JOSE DE LOS ANGELES BELTRAN VILLA	1045166367	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.992.143,00	$ 122.200,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 79.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 318.800,00	$ 79.700,00				
103	LEONARDO JOSE PERTUZ MANJARREZ	1083453888	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.279.958,00	$ 153.100,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 88.000,00	PORVENIR	9491663788	$ 361.600,00	$ 104.900,00				
104	LUIS ALFREDO CEBALLOS ACOSTA	1083463332	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.332.705,00	$ 162.400,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 93.400,00	PORVENIR	9491663788	$ 373.300,00	$ 93.400,00				
105	ORNALDO ENRIQUE GONZALEZ GUTIERREZ	1082405517	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.831.678,00	$ 127.500,00	V	COOSALUD	9491663788	$ 73.300,00	PORVENIR	9491663788	$ 293.100,00	$ 73.300,00				
106	LUIS AVILA GONZALEZ	12631821	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.665.151,00	$ 185.500,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 106.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 426.500,00	$ 106.700,00				
107	ULBARO MANUEL CHARRIZ PERTUZ	12627835	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.718.933,00	$ 186.000,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 108.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 435.100,00	$ 106.900,00				
108	MARLON BRANDON ROA BEDOYA	72266624	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.468.143,00	$ 311.000,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 178.800,00	PROTECCION	9491663788	$ 715.000,00	$ 178.800,00				
109	FERNEY RAFAEL VILLAMIL ALEMAN	1083462067	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.257.596,00	$ 157.200,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 90.400,00	PORVENIR	9491663788	$ 361.300,00	$ 90.400,00				
110	KEVIN DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	1080427334	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.315.776,00	$ 161.200,00	V	CAJA ACOPI	9491663788	$ 92.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 370.600,00	$ 92.700,00				
111	JOHN JAIRO SANDOVAL ORTIZ	1083462142	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.502.902,00	$ 313.500,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 180.200,00	PORVENIR	9491663788	$ 720.500,00	$ 180.200,00				
112	DEIBIS DE JESUS HERNANDEZ GALAN	85370303	MECANICO 2	$ 2.890.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.914.876,00	$ 272.500,00	V	SALUDTOTAL	9491663788	$ 156.600,00	PORVENIR	9491663788	$ 626.400,00	$ 156.600,00				
113	YILBERTY LUIS BAQUERO MENDOZA	1120739109	TORNILLERO	$ 2.194.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.779.943,00	$ 173.200,00	V	SANITAS	9491663788	$ 111.500,00	COLPENSIONES	9491663788	$ 445.200,00	$ 111.500,00				
114	JOSE ALBERTO CELEDON PEÑA	1123730377	RASTRILLERO	$ 2.194.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.721.766,00	$ 169.100,00	V	FAMISANAR	9491663788	$ 109.200,00	COLFONDOS	9491663788	$ 435.900,00	$ 109.200,00				
115	EDWIN ALFONSO GARIZABALO NAVARRO	1065618651	OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	$ 2.221.800,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.058.174,00	$ 192.300,00	V	COOSALUD	9491663788	$ 122.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 489.600,00	$ 122.500,00				
116	DUANER JOSE MEJIA MEJIA	1083454894	AYUDANTE PLANTA DE ASFALTO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.279.056,00	$ 158.700,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 91.200,00	PORVENIR	9491663788	$ 364.700,00	$ 91.200,00				
117	JOSE LUIS CAMPIS PEÑA	1083560647	AYUDANTE PLANTA DE ASFALTO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.895.250,00	$ 132.000,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 75.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 303.300,00	$ 75.900,00				
118	OSCAR DANILO GUTIERREZ GUTIERREZ	1192894931	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.246.866,00	$ 156.400,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 89.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 359.500,00	$ 89.900,00				
119	JHON MARLON ARAUJO SANTAMRIA	1083463751	AYUDANTE PLANTA DE ASFALTO	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.914.123,00	$ 133.300,00	V	MUTUAL SER	9491663788	$ 76.600,00	PORVENIR	9491663788	$ 306.300,00	$ 76.600,00				
120	JHYN RAFAEL CHOLES PACHECO	17830501	RASTRILLERO	$ 2.194.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.765.294,00	$ 165.000,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 106.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 438.900,00	$ 106.900,00				
121	CARLOS RAFAEL GONZALEZ NIEBLES	1082410409	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.370.667,00	$ 158.400,00	V	CAJA ACOPI	9491663788	$ 94.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 379.400,00	$ 94.900,00				
122	DEIMER DAVID JUVINAO PEÑA	1083553661	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.159.652,00	$ 359.200,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 206.400,00	PORVENIR	9491663788	$ 825.600,00	$ 231.000,00				
123	JOSUE MARCIAL HERRERA CASTRO	1082414929	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.539.708,00	$ 176.800,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 101.600,00	PORVENIR	9491663788	$ 406.400,00	$ 101.600,00				
124	YEISON YEDIT CAMACHO RODRIGUEZ	1083457145	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 2.276.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.060.282,00	$ 213.000,00	V	SALUD TOTAL	9491663788	$ 122.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 489.700,00	$ 122.500,00				
125	JOSE GABRIEL CONTRERAS OLIVEROS	92277422	OFICIAL 1	$ 2.913.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.196.352,00	$ 254.800,00	V	NUEVA EPS	9491663788	$ 162.100,00	PROTECCION	9491663788	$ 665.800,00	$ 162.100,00				
126	LEONARDO FABIO PEÑA ABELLO	1193557789	TECNICO AIRE ACONDICIONADO	$ 3.652.900,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.127.620,00	$ 356.900,00	V	CAJA ACOPI	9491663788	$ 205.200,00	COLFONDOS	9491663788	$ 820.500,00	$ 230.100,00				
127	EDUARDO RAUL MARTINEZ DE LA CRUZ	85370436	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.165.985,00	$ 144.200,00		MUTUAL SER	9491663788	$ 86.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 346.600,00	$ 82.900,00				
128	LUIS CARLOS GONZALEZ SANCHEZ	1083568745	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.336.751,00	$ 156.100,00		COOSALUD	9491663788	$ 93.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 373.900,00	$ 102.900,00				
129	LUIS MIGUEL COHEN BARCELO	1080421255	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.231.876,00	$ 142.200,00		COOSALUD	9491663788	$ 89.300,00	PORVENIR	9491663788	$ 357.200,00	$ 81.700,00				

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
130	JOSE MANUEL CARO CASTRO	1129583546	MECANICO 1	$ 3.652.900,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.920.208,00	$ 342.500,00		CAJA ACOPI	9491663788	$ 196.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 787.300,00	$ 196.900,00			
131	MANUEL RODRIGUEZ MUÑOZ	77081191	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.938.919,00	$ 204.600,00		MUTUAL SER	9491663788	$ 117.600,00	PORVENIR	9491663788	$ 470.300,00	$ 117.600,00			
132	RICARDO ANTONIO SANABRIA MENA	1082854832	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.817.821,00	$ 196.200,00		SALUD TOTAL	9491663788	$ 112.800,00	PORVENIR	9491663788	$ 450.900,00	$ 112.800,00			
133	ARMANDO FARID ESCORCIA HERNANDEZ	1004162934	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.710.150,00	$ 188.700,00		NUEVA EPS	9491663788	$ 108.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 433.700,00	$ 108.500,00			
134	JOSE DAVID ANAYA MEJIA	1083554593	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.364.844,00	$ 164.600,00		MUTUAL SER	9491663788	$ 94.600,00	PORVENIR	9491663788	$ 378.400,00	$ 94.600,00			
135	BENJAMIN JOSE GARAVITO GALAN	1083561682	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.826.025,00	$ 196.700,00		SALUD TOTAL	9491663788	$ 113.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 452.200,00	$ 113.100,00			
136	DALWIS VILLALOBOS MELENDEZ	1221966578	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.221.685,00	$ 154.700,00		COOSALUD	9491663788	$ 88.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 355.500,00	$ 88.900,00			
137	EDGAR AVELINO MELO OCHOA	1004375513	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.932.725,00	$ 134.600,00		SALUD TOTAL	9491663788	$ 77.400,00	PORVENIR	9491663788	$ 309.300,00	$ 77.400,00			
138	ESTEBAN JESUS DE LA HOZ CABALLERO	1045760251	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.048.600,00	$ 142.600,00		MUTUAL SER	9491663788	$ 82.000,00	PORVENIR	9491663788	$ 327.800,00	$ 82.000,00			
139	JOSE ANGEL CARIDAD SARMIENTO	1235241563	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.707.068,00	$ 118.900,00		MUTUAL SER	9491663788	$ 68.300,00	PORVENIR	9491663788	$ 290.300,00	$ 68.300,00			
140	JULIO CESAR BERMUDEZ DE LA ROSA	1083570173	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.071.463,00	$ 144.200,00		NUEVA EPS	9491663788	$ 82.900,00	PORVENIR	9491663788	$ 331.500,00	$ 82.900,00			
141	WILLIGTON ANGULO MARTINEZ	12633231	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.952.406,00	$ 135.900,00		NUEVA EPS	9491663788	$ 78.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 312.400,00	$ 78.100,00			
142	JOSE LUIS ACUÑA VERGARA	1063962520	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 2.170.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.418.599,00	$ 168.400,00		SALUD TOTAL	9491663788	$ 96.800,00	COLFONDOS	9491663788	$ 387.000,00	$ 96.800,00			
143	JHON JAIRO VERDOOREN ROSILLO	85370734	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 392.218,00	$ 27.300,00		NUEVA EPS	9491663788	$ 15.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 62.800,00	$ 15.700,00			
144	KEIDER YUSEY MORALES MANJARRES	1221971686	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 440.746,00	$ 30.700,00		NUEVA EPS	9491663788	$ 17.700,00	PORVENIR	9491663788	$ 70.600,00	$ 17.700,00			
145	LEONAR LEONID GUTIERREZ CODINA	12448090	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 410.551,00	$ 28.600,00		MUTUAL SER	9491663788	$ 16.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 65.700,00	$ 16.500,00			
146	MIGUEL ANGEL PEREZ MONTALVO	1080420637	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 410.551,00	$ 28.600,00		NUEVA EPS	9491663788	$ 16.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 65.700,00	$ 16.500,00			
147	TOMAS SEGUNDO SUAREZ MONTERO	1080422848	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 401.115,00	$ 28.000,00		SALUD TOTAL	9491663788	$ 16.100,00	PORVENIR	9491663788	$ 64.200,00	$ 16.100,00			
148	VICTOR JOSE VALVERDE SAMPER	1082410789	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 410.551,00	$ 28.600,00		NUEVA EPS	9491663788	$ 16.500,00	PORVENIR	9491663788	$ 65.700,00	$ 16.500,00			
149	CONRADO HERNAN LOPERA PALACIO	15507009	DIRECTOR DE PROYECTO	$ 22.511.700,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 24.926.700,00	$ 1.734.900,00	V	SURA	9491535576	$ 3.115.900,00	COLPENSIONES	9491535576	$ 4.337.400,00	$ 997.100,00	$ 498.600,00	$ 747.900,00	
150	MARGARETH SOLENA CRUZ GONZALEZ	52155687	AUDITOR INTERNO CALIDAD	$ 12.335.800,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 12.335.800,00	$ 772.800,00	V	COMPENSAR	9491550195	$ 493.500,00	COLPENSIONES	9491550195	$ 1.973.800,00	$ 493.500,00			
151	JORGE SERAFIN PASOS GARCIA	1051417591	PROFESIONAL OFICINA TÉCNICA	$ 5.995.700,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 5.995.701,00	$ 375.600,00	V	SANITAS	9491535576	$ 239.900,00	COLPENSIONES	9491535576	$ 1.019.400,00	$ 239.900,00			
152	WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO	75083946	DIRECTOR DE OBRA	$ 13.046.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 15.461.500,00	$ 1.076.200,00	V	SURA	9491535576	$ 1.932.700,00	PORVENIR	9491535576	$ 2.628.700,00	$ 618.500,00	$ 309.300,00	$ 463.900,00	
153	DAVID ENRIQUE RUIZ CORREA	12626612	ELECTRICISTA INDUSTRIAL	$ 3.512.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 5.193.176,00	$ 361.500,00	V	NUEVA EPS	9491535576	$ 207.800,00	PORVENIR	9491535576	$ 831.000,00	$ 207.800,00			
154	ELKIN DARIO URREA ESCOBAR	71003897	MECANICO 1	$ 4.101.700,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 5.966.576,00	$ 415.300,00	V	SURA	9491535576	$ 238.700,00	PORVENIR	9491535576	$ 1.014.500,00	$ 238.700,00			
155	JHON CARLOS GOMEZ MEJIA	7561577	DIRECTOR DE OBRA	$ 17.135.800,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 19.470.302,00	$ 1.270.100,00	V	SALUD TOTAL	9491535576	$ 2.433.900,00	PROTECCION	9491535576	$ 3.310.300,00	$ 778.900,00	$ 389.600,00	$ 584.300,00	
156	JANER ALFONSO GUTIERREZ CANTILLO	1083463299	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 1.423.500,00	$ 89.200,00	V	NUEVA EPS	9491535576	$ 57.000,00	COLPENSIONES	9491535576	$ 227.800,00	$ 51.300,00			
157	ROBINSON ACOSTA CASTILLO	12633570	OFICIAL 1	$ 2.798.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 2.718.239,00	$ 178.300,00	V	NUEVA EPS	9491535576	$ 108.800,00	PORVENIR	9491535576	$ 435.000,00	$ 102.500,00			
158	BELKY YURLEY ROA CONTRERAS	1094366829	ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 7.444.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 9.430.990,00	$ 656.400,00	V	NUEVA EPS	9491535576	$ 377.300,00	PORVENIR	9491535576	$ 1.603.400,00	$ 377.300,00			
159	JULIAN ANDRES LONDOÑO HENAO	8161615	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	$ 8.800.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	LYL INGENIEROS CONSULTORES	$ 8.800.000,00	$ 46.000,00	I	SURA	80239638	$ 352.000,00	PROTECCION	80239638	$ 1.408.000,00	$ 352.000,00			
160	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ	79758293	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 12.000.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	GEOTERRA CONSULTORES	$ 12.000.000,00	$ 835.200,00	V	SURA	79654530	$ 480.000,00	PROTECCION	79654530	$ 1.920.000,00	$ 480.000,00			
161	CARLOS MARIO MUÑOZ BERRIO	98461736	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONDUCTORES	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	SURA	80321046	$ 178.000,00	COLPENSIONES	80321046	$ 227.800,00	$ 57.000,00			
162	ANDRES CAMILO ESCORCIA	1065137389	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONDUCTORES	$ 1.423.500,00	$ 99.100,00	V	SALUD TOTAL	80365424	$ 178.000,00	PORVENIR	80365424	$ 227.800,00	$ 57.000,00			
163	WUILMER JOSE VILLA BONETT	73428038	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONDUCTORES	$ 1.423.500,00	$ 99.076,00	V	COOSALUD	80320934	$ 178.000,00	COLPENSIONES	80320934	$ 227.760,00	$ 56.940,00			
164	JHON JAIRO AMARANTO CAMARGO	1004383194	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.871.256,00	$ 130.300,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 74.900,00	PROTECCION	80382573	$ 299.500,00	$ 74.900,00			
165	YORDAN JULIAN CHARRIS ACOSTA	1221971396	OFICIAL DE PRIMERA	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.161.001,00	$ 150.500,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 86.500,00	PORVENIR	80382573	$ 345.800,00	$ 86.500,00			
166	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LA CRUZ	1083569120	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.995.153,00	$ 138.900,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 79.900,00	PORVENIR	80382573	$ 319.300,00	$ 79.900,00			
167	SERGIO JAVIER MUNIVE FELIPE	1004164375	CONDUCTOR	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.332.364,00	$ 162.400,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 93.300,00	PORVENIR	80382573	$ 373.200,00	$ 93.300,00			
168	JEINER JOSE TONCEL HERNANDEZ	1004376695	OFICIAL DE SEGUNDA CATEGORIA	$ 2.390.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.287.575,00	$ 159.300,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 91.600,00	PORVENIR	80382573	$ 366.100,00	$ 91.600,00			
169	LESWIN YAMID MARTINEZ OROZCO	1080421433	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.855.079,00	$ 129.200,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 74.300,00	PROTECCION	80382573	$ 296.900,00	$ 74.300,00			
170	FELIX DE JESUS PAREJO BONETT	12635288	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.907.652,00	$ 132.800,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 76.400,00	PORVENIR	80382573	$ 305.300,00	$ 76.400,00			
171	ANSELMO NOVA CALDERON	1100221757	OFICIAL 1RA	$ 2.888.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.700.300,00	$ 188.000,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 108.100,00	PORVENIR	80382573	$ 432.100,00	$ 108.100,00			
172	ARMANDO MANUEL VASQUEZ BLANCO	1083453669	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.855.079,00	$ 129.200,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 74.300,00	PORVENIR	80382573	$ 296.900,00	$ 74.300,00			
173	GEIVERE GUTIERREZ BELEÑO	85491134	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.794.419,00	$ 124.900,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 71.800,00	COLPENSIONES	80382573	$ 287.200,00	$ 71.800,00			
174	EDUARDO DAVID NAVARRO LOPEZ	1221966632	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.818.683,00	$ 126.600,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 72.800,00	PROTECCION	80382573	$ 291.000,00	$ 72.800,00			
175	ELEAR MANUEL PATERNINA HERNANDEZ	85626456	OFICIAL DE PRIMERA	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.287.575,00	$ 159.300,00	V	SAVIA SALUD	80382573	$ 91.600,00	PORVENIR	80382573	$ 366.100,00	$ 91.600,00			
176	GABRIEL OMAR PERTUZ FANDIÑO	1004162890	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.822.727,00	$ 126.900,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 73.000,00	PORVENIR	80382573	$ 291.700,00	$ 73.000,00			
177	YERIS ALBERTO ECHEVERRIA VILLAMIL	1123993361	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.867.212,00	$ 130.000,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 74.700,00	COLFONDOS	80382573	$ 298.800,00	$ 74.700,00			
178	VICTOR ALFONSO GIL MARTINEZ	85373138	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.933.858,00	$ 134.600,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 77.400,00	COLFONDOS	80382573	$ 309.500,00	$ 77.400,00			
179	FABIAN OLMEDO GARCIA LOPEZ	1151186290	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.915.740,00	$ 133.400,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 76.700,00	PROTECCION	80382573	$ 306.600,00	$ 76.700,00			
180	LUIS CARLOS SALCEDO IBARRA	1221968309	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.895.520,00	$ 132.000,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 75.900,00	PORVENIR	80382573	$ 303.300,00	$ 75.900,00			
181	TEYSON MANUEL FONSECA VIDAL	1083469627	OFICIAL DE SEGUNDA	$ 2.390.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.682.687,00	$ 117.200,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 67.400,00	PORVENIR	80382573	$ 296.300,00	$ 67.400,00			
182	ANTONNY JOSE BRAVO SANCHEZ	1080424693	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.822.727,00	$ 126.900,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 73.000,00	PROTECCION	80382573	$ 291.700,00	$ 73.000,00			
183	JESUS EMILIO PARRA GALEANO	70926744	ENCARGADO DE OBRA	$ 4.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 3.130.000,00	$ 217.900,00	V	HUMANA VIVIR	80382573	$ 125.200,00	COLPENSIONES	80382573	$ 500.800,00	$ 125.200,00			
184	LUIS ALBERTO RODELO RODRIGUEZ	1003199009	AUX. DE ALMACEN	$ 1.678.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.261.663,00	$ 157.500,00	V	COOSALUD	80382573	$ 90.500,00	PROTECCION	80382573	$ 361.900,00	$ 90.500,00			
185	ANGI BIBIANA ROA ARANDIA	1073248943	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 2.103.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.260.774,00	$ 157.400,00	V	FAMISANAR	80382573	$ 90.500,00	PROTECCION	80382573	$ 361.800,00	$ 90.500,00			
186	ABEL ENRIQUE CAMARGO PACHECO	1004324752	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.738.486,00	$ 121.000,00	V	FAMISANAR	80382573	$ 69.600,00	PROTECCION	80382573	$ 278.200,00	$ 69.600,00			
187	FANESY DE JESUS MATINEZ MORALES	1080420444	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.863.167,00	$ 129.700,00	V	FAMISANAR	80382573	$ 74.600,00	PROTECCION	80382573	$ 298.200,00	$ 74.600,00			
188	PEDRO JUAN MARTINEZ AHUMADO	1083465249	OFICIAL DE PRIMERA CATEGORIA	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.161.001,00	$ 141.900,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 81.600,00	PROTECCION	80382573	$ 345.800,00	$ 81.600,00			
189	ALDAIR DE JESUS GARIZABALO SANDOVAL	1083452688	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.883.387,00	$ 131.100,00	V	COOSALUD	80382573	$ 75.400,00	PROTECCION	80382573	$ 301.400,00	$ 75.400,00			
190	YESID ALFONSO MENDOZA PALMA	85372741	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.885.079,00	$ 129.200,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 74.300,00	PORVENIR	80382573	$ 296.900,00	$ 74.300,00			
191	DIOGENES JUNIOR FRANCO HERNANDEZ	1004370254	AUXILIAR INGENIRIA	$ 3.313.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 3.313.000,00	$ 230.600,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 132.600,00	PORVENIR	80382573	$ 530.100,00	$ 132.600,00			
192	DEIMER ALBERTO PALACIO PERTUZ	1221963468	OFICIAL DE PRIMERA	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.235.103,00	$ 151.400,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 89.500,00	PORVENIR	80382573	$ 357.700,00	$ 89.500,00			
193	RICHARD MANUEL PEÑA ROA	12447970	OFICIAL DE PRIMERA	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.150.459,00	$ 149.700,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 86.100,00	PORVENIR	80382573	$ 344.100,00	$ 86.100,00			
194	JESUS DAVID TETE RIVAS	1004383024	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.879.343,00	$ 130.900,00	V	COOSALUD	80382573	$ 75.200,00	PORVENIR	80382573	$ 300.700,00	$ 75.200,00			
195	AVID ALEXANDER MUNIVE FELIPE	1004164376	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.875.300,00	$ 130.600,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 75.100,00	PORVENIR	80382573	$ 300.100,00	$ 75.100,00			

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
196	HECTOR EMILIO ASCENCIO HERNANDEZ ASCENCIO	1083468387	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.798.463,00	$ 125.200,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 72.000,00	COLFONDOS	80382573	$ 287.800,00	$ 72.000,00				
197	DAYANA PAOLA AYALA ESCORCIA	1083016702	SST	$ 2.450.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.548.000,00	$ 177.400,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 102.000,00	PROTECCION	80382573	$ 407.700,00	$ 102.000,00				
198	DAINER JOSE GONZALEZ ORTEGA	85490185	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.909.593,00	$ 133.000,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 76.400,00	PORVENIR	80382573	$ 305.600,00	$ 76.400,00				
199	NILTON JOSE CSTILLO CSTILLO	12635200	OFICIAL	$ 2.390.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.226.262,00	$ 155.000,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 89.100,00	PROTECCION	80382573	$ 356.300,00	$ 89.100,00				
200	BRIAN DAYAN FRANCO LOPEZ	1080423560	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.766.161,00	$ 132.000,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 75.900,00	PORVENIR	80382573	$ 303.300,00	$ 75.900,00				
201	EDINSON PERTUZ SUAREZ	1083457256	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.883.388,00	$ 131.100,00	V	MUTUAL SER	80382573	$ 75.400,00	PORVENIR	80382573	$ 301.400,00	$ 75.400,00				
202	YERSON DAVID CADENA IBARRA	1004377893	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.913.637,00	$ 133.200,00	V	MUTUAL SER	80382573	$ 76.600,00	PROTECCION	80382573	$ 306.200,00	$ 76.600,00				
203	AMIZAEL DE JESUS SANJUAN OLIERO	12628993	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.891.476,00	$ 131.700,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 75.700,00	PORVENIR	80382573	$ 302.700,00	$ 75.700,00				
204	DUBAN FELIPE ZAPATA POLO	1080429592	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.915.741,00	$ 130.100,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 76.700,00	PORVENIR	80382573	$ 306.600,00	$ 76.700,00				
205	DIEGO ALBERTO VARGAS VARGAS	71191334	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.311.206,00	$ 161.100,00	V	SAVIA SALUD	80382573	$ 92.600,00	COLPENSIONES	80382573	$ 370.200,00	$ 92.600,00				
206	ZAMIR FABIAN PEREZ GUILLOT	1083463630	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.287.575,00	$ 159.300,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 91.600,00	PORVENIR	80382573	$ 366.100,00	$ 91.600,00				
207	JOCELYN VANESSA MARTINEZ BUELVAS	1083455152	SST	$ 2.288.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.288.000,00	$ 159.300,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 91.600,00	PORVENIR	80382573	$ 366.100,00	$ 91.600,00				
208	RICHAR DAVID PALMA LIZCANO	1004377791	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.895.520,00	$ 125.400,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 75.900,00	PORVENIR	80382573	$ 303.300,00	$ 75.900,00				
209	JHON EDUARDO CHACON MORALES	1085035487	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.903.608,00	$ 132.500,00	V	COOSALUD	80382573	$ 76.200,00	PORVENIR	80382573	$ 304.600,00	$ 76.200,00				
210	CARLOS ALBERTO DAVID LONDOÑO	94153692	ENCARGADO DE OBRA	$ 3.130.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 3.130.000,00	$ 217.900,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 125.200,00	PROTECCION	80382573	$ 500.800,00	$ 125.200,00				
211	PEDRO LUI VALVERDE PEREZ	1193467615	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.059.637,00	$ 120.300,00	V	NUEVA EP	80382573	$ 82.400,00	COLPENSIONES	80382573	$ 329.600,00	$ 82.400,00				
212	JOHAN FARID FONSECA VIDAL	1083559530	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 427.050,00	$ 29.800,00	V	CAJA COPI	80382573	$ 17.100,00	PORVENIR	80382573	$ 68.400,00	$ 17.100,00				
213	YAMID ZAMIR BLANQUILLO CARDENASS	1004377624	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.895.520,00	$ 132.000,00	V	SANITAS	80382573	$ 75.900,00	COLPENSIONES	80382573	$ 303.300,00	$ 75.900,00				
214	JUAN DONALDO RAMIREZ CANO	74352577	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.782.993,00	$ 159.300,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 111.600,00	PORVENIR	80382573	$ 445.500,00	$ 111.600,00				
215	JOSE GREGORIO BLANCO BUELVVAS	1003233322	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.287.575,00	$ 159.300,00	V	COOSALUD	80382573	$ 91.600,00	PORVENIR	80382573	$ 366.100,00	$ 91.600,00				
216	LEOBALDO CAJAR LIÑAN	9168773	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.161.533,00	$ 80.900,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 46.500,00	PORVENIR	80382573	$ 185.900,00	$ 46.500,00				
217	JULIO MANUEL FELIPE SANJUAN	1083568901	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.672.127,00	$ 116.400,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 66.900,00	PROTECCION	80382573	$ 267.600,00	$ 66.900,00				
218	JESUS DAVID JIMENEZ EPIAYU	1118810506	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.651.907,00	$ 115.000,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 66.100,00	PORVENIR	80382573	$ 264.400,00	$ 66.100,00				
219	LUIS ALBERTO PADILLA PEREZ	1083453952	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.684.260,00	$ 117.300,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 67.400,00	COLPENSIONES	80382573	$ 269.500,00	$ 67.400,00				
220	JUAN JOSE POLO GOMEZ	1004354488	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.668.083,00	$ 116.100,00	V	CAJA COPI	80382573	$ 66.800,00	PORVENIR	80382573	$ 266.900,00	$ 66.800,00				
221	OSNAIDER JAVIER CUADRADO MARTINEZ	1192807866	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.568.766,00	$ 178.800,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 102.800,00	COLFONDOS	80382573	$ 411.100,00	$ 102.800,00				
222	JEISON DAVID RIVAS CUETO	1083558068	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.696.392,00	$ 118.100,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 67.900,00	PROTECCION	80382573	$ 271.500,00	$ 67.900,00				
223	ELAICER JOSE AVENDAÑO GONZALES	1080013446	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 733.600,00	$ 51.100,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 29.400,00	PORVENIR	80382573	$ 117.400,00	$ 29.400,00				
224	TOMAS FERMIN TETE SUAREZ	85372105	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.696.392,00	$ 116.100,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 67.900,00	COLPENSIONES	80382573	$ 271.500,00	$ 67.900,00				
225	RAFEL ALFONSO GARIZABALO MONSALVO	85373482	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.168.961,00	$ 151.000,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 86.800,00	PORVENIR	80382573	$ 347.100,00	$ 86.800,00				
226	DIEGO ARMANDO SEVERICHE TARRIFA	1100690699	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 2.405.521,00	$ 137.700,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 96.400,00	PORVENIR	80382573	$ 385.100,00	$ 96.400,00				
227	MARIO ENRIQUE GUTUERREZ VERDEZA	12632684	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 183.400,00	$ 12.800,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 7.400,00	COLPENSIONES	80382573	$ 29.400,00	$ 7.400,00				
228	DARWIN DAVID GIL VASQUEZ	1083452695	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.664.039,00	$ 115.900,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 66.600,00	PORVENIR	80382573	$ 266.300,00	$ 66.600,00				
229	JOSE IVAN PEDRAZA BALLESTA	1080421265	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.696.392,00	$ 118.100,00	V	CAJA COPI	80382573	$ 67.900,00	PORVEIR	80382573	$ 271.500,00	$ 67.900,00				
230	ANUAR YESID GUZMAN JUVINAO	1004163805	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.627.643,00	$ 106.700,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 65.200,00	PORVENIR	80382573	$ 260.500,00	$ 65.200,00				
231	KEVIN ALBERTO CASTRO ARIZA	1083561928	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.738.486,00	$ 121.000,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 69.600,00	PROTECCION	80382573	$ 278.200,00	$ 69.600,00				
232	ARGEMIRO JULIOR YANEZ ARTEAGA	1003070976	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.773.236,00	$ 115.000,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 71.000,00	PORVENIR	80382573	$ 283.800,00	$ 71.000,00				
233	JHONY JOSE CHACON HOYOS	1052950046	OFICIAL	$ 2.618.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 3.413.782,00	$ 112.100,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 136.600,00	COLPENSIONES	80382573	$ 546.300,00	$ 136.600,00				
234	MARLON ENRIQUE GUERRERO DE LA HOZ	1007220122	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.700.436,00	$ 118.400,00	V	MUTUAL SER	80382573	$ 68.100,00	PROTECCION	80382573	$ 272.100,00	$ 68.100,00				
235	ANDRES EDUARDI GARIZABALO MANGA	1004382428	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.696.392,00	$ 118.100,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 67.900,00	PORVENIR	80382573	$ 272.500,00	$ 272.500,00				
236	CESAR AUGUSTO ZAMBRANO PACHECO	1004380503	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.651.907,00	$ 115.000,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 66.100,00	PORVENIR	80382573	$ 264.400,00	$ 66.100,00				
237	JEISON MANUEL MARQUEZ MAURI	1083569579	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.643.819,00	$ 114.500,00	V	NUEVA EPS	80382573	$ 65.800,00	PROTECCION	80382573	$ 263.100,00	$ 65.800,00				
238	MARLON ALFREDO BURGOS ACUÑA	85373442	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.651.907,00	$ 115.000,00	V	MUTUALSER	80382573	$ 66.100,00	PROTECCION	80382573	$ 264.400,00	$ 66.100,00				
239	MARIA CAMILA JARMILLO OSPINA	1083453726	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 237.250,00	$ 16.600,00	V	SALUD TOTAL	80382573	$ 9.500,00	PORVENIR	80382573	$ 38.000,00	$ 9.500,00				
240	WALDIR RAFAEL SERNA BRAVO	1082404379	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.859.123,00	$ 129.400,00	V	COOSALUD	80382573	$ 74.400,00	PORVENIR	80382573	$ 297.500,00	$ 74.400,00				
241	VICTOR DANILO PACHECO NIETO	1082406790	AYUDANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	TOCCI S.A.S	$ 1.838.949,00	$ 128.000,00	v	COOSALUD	80382573	$ 73.600,00	PORVENIR	80382573	$ 294.300,00	$ 73.600,00				
242	BARRIOS PEREZ JADER JESUS	1233504033	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.504.248	$ 109.000	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 100.200	PROTECCION	9491851832	$ 400.700,00	$ 100.200				
243	BARRIOS SILVA MIGUEL ANTONIO	85370443	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.588.129	$ 112.600	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 103.600	PORVENIR	9491851832	$ 414.200,00	$ 103.600				
244	BOTTO MONSALVO CARLOS ANDRES	1082885589	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.580.308	$ 112.300	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 103.300	PORVENIR	9491851832	$ 412.900,00	$ 103.300				
245	CABALLERO ARIZA JESUS CONCEPCION	1004322360	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.387.329	$ 103.900	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 95.500	PORVENIR	9491851832	$ 382.000,00	$ 95.500				
246	CANDANOZA GUERRERO WISMAR JOSE	1065583729	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 1.504.188	$ 33.800	IV	Mutual Ser	9491851832	$ 60.200	PORVENIR	9491851832	$ 240.700,00	$ 41.900		vacaciones		
247	CANTILLO VALERA DAVID ALFONSO	12449538	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.529.715	$ 110.100	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 101.200	COLFONDOS	9491851832	$ 404.800,00	$ 101.200				
248	CASTILLO TORRES EMEL DAVID	1193593260	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.327.900	$ 101.300	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 93.200	PORVENIR	9491851832	$ 372.500,00	$ 93.200				
249	FONSECA VARGAS LEONEL	91044843	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.349.097	$ 102.200	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	9491851832	$ 94.000	PROTECCION	9491851832	$ 375.900,00	$ 94.000				
250	GOMEZ RANGEL MIKE JAVIER	7141780	COORDINADOR DE RIESGOS	$ 3.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 3.471.600	$ 151.100	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 138.900	COLPENSIONES	9491851832	$ 555.500,00	$ 138.900				
251	HERNANDEZ AHUMADA JAIDER RAFAEL	12449200	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.377.627	$ 103.500	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 95.200	PORVENIR	9491851832	$ 380.500,00	$ 95.200				
252	HERNANDEZ RODRIGUEZ ERASMO SANTIAGO	1080429827	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.451.836	$ 106.700	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	9491851832	$ 98.100	PORVENIR	9491851832	$ 392.300,00	$ 98.100		vacaciones 1 dia		
253	HERRERA CONRADO JUAN DAVID	1004323783	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.580.308	$ 112.300	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 103.300	PORVENIR	9491851832	$ 412.900,00	$ 103.300				
254	LAZO OROZCO JOMMER ALBERTO	1221965542	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.324.478	$ 101.200	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 93.000	PORVENIR	9491851832	$ 372.000,00	$ 93.000				
255	LEON REVOLLEDO JAINER	1083554616	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.217.976	$ 96.500	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	9491851832	$ 88.800	PORVENIR	9491851832	$ 354.900,00	$ 88.800				
256	MARMOL CODINA GEISON ATILIO	8508788	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.362.246	$ 102.800	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 94.500	PROTECCION	9491851832	$ 378.000,00	$ 94.500				
257	MARTINEZ VALDERRAMA CRISTIAN XAVIER	1083553580	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.483.834	$ 108.100	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 99.400	PORVENIR	9491851832	$ 397.500,00	$ 99.400				
258	MATEUS LOPEZ DAUSER SMICT	85372413	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.482.894	$ 108.100	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	9491851832	$ 99.400	PROTECCION	9491851832	$ 397.300,00	$ 99.400				
259	NIEBLES MELENDREZ VICTOR HUGO	85490212	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.554.809	$ 111.200	IV	NUEVA EPS	9491851832	$ 102.200	PORVENIR	9491851832	$ 408.800,00	$ 102.200				
260	PABON ROJAS LENIN ALFONSO	12625530	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.542.805	$ 110.700	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 101.800	PORVENIR	9491851832	$ 406.900,00	$ 101.800				
261	PAREDES PACHECO WILLIAM	1084739566	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.201.302	$ 95.800	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 88.100	PORVENIR	9491851832	$ 352.300,00	$ 88.100				
262	PEREZ GUTIERREZ JESUS ANGEL	1083461605	VIGILANTE	$ 1.423.500	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	SERACIS LTDA	$ 2.327.566	$ 101.300	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 93.200	PORVENIR	9491851832	$ 372.500,00	$ 93.200				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MNT-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	19/09/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: SEPTIEMBRE DE 2025 **PROYECTO:** CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
263	ROBLES TEJADA MOISES DE JESUS	1002134064	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.386.587	$ 103.900	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 95.500	PORVENIR	9491851832	$ 381.900,00	$ 95.500			
264	ROJAS MORRON JOEL MOISES	1221981701	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.836.684	$ 79.900	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	9491851832	$ 73.500	PORVENIR	9491851832	$ 293.900,00	$ 73.500			vacaciones 6 días
265	TAMAYO HOYOS DEIVIS BANES	1023893469	SUPERVISOR	$ 1.976.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.504.146	$ 174.300	V	SALUD TOTAL	9491851832	$ 100.200	PORVENIR	9491851832	$ 400.700,00	$ 100.200			
266	TOSCANO ABELLANEDA SEBASTIAN SEGUNDO	12627610	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.603.034	$ 113.300	IV	SALUD TOTAL	9491851832	$ 104.200	PROTECCION	9491851832	$ 416.500,00	$ 104.200			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CONRADO HERNANDO LOPERA PALACIO
Director de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NEFTALI HERNANDEZ PADILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-09718 CLD

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PREACTA DE OBRA N°39

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 39 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
EXPLANACIONES									
1		200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
1,1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
1,2	14101	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
2	11604	201-13		Demolición de Estructuras	m3	161,41	$ 125.703,00	$ 20.289.721,00	
3	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	3.672,19	$ 10.191,00	$ 37.423.288,00	
4	11601		220.1P	Terraplenes (incluye material seleccionado de cantera)	m3		$ 31.904,00		
Subtotal								**$ 57.713.009,00**	
BASES, SUBBASE Y AFIRMADOS									
5	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	1.828,00	$ 145.679,00	$ 266.301.212,00	
6	11602	330-13		Base granular clase A	m3	1.097,00	$ 161.149,00	$ 176.780.453,00	
7	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 175.996,00		
Subtotal								**$ 443.081.665,00**	
PAVIMENTO ASFALTICOS									
8	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.786,00		
9		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
9,1	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	5.029,41	$ 1.766,00	$ 8.881.938,00	
9,2	14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
10	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3		$ 948.454,00		
11			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
11,1	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
11,2	14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
12	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 984.206,00		
13	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	363,75	$ 83.576,00	$ 30.400.770,00	
14	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m3		$ 90.230,00		
Subtotal								**$ 39.282.708,00**	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
15			600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00		
15,1	11604		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	585,85	$ 16.721,00	$ 9.795.998,00	
15,2	14102		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	444,00	$ 16.721,00	$ 7.424.124,00	
16			600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
16,1	11604		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
16,2	14102		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
17		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		
17,1	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	1.485,00	$ 58.765,00	$ 87.266.025,00	
17,2	14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		
18	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	338,47	$ 120.830,00	$ 40.897.330,00	
19	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 162.739,00		
20	14102		621.1.P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,0 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m		$ 1.750.000,00		
21	14102		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,30 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m		$ 2.300.000,00		
22	14102		621.1.2P	Pilote de concreto huecos prefabricados, concreto fc = 50 MPA de diametro 1,20 m, transporte e hincado con viga lanzadora (No incluye acero de refuerzo y no incluye transporte producto de las excavaciones) incluye suministro de elementos metálicos de conexión y platina de continuidad	m		$ 1.795.026,00		
23	14102		621.5.1P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.3m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m		$ 3.530.001,00		

PREACTA DE OBRA N°39

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 39 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
24	14102		621.5.2P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.0m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m		$ 2.937.153,00		
25	14103		630.1.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado, para moldes prefabricados de dados para puentes	m3		$ 2.331.990,00		
26	14103		630.2.P	Concreto clase 50 MPA, para vigas artesa prefabricadas preesforzadas lanzadas, postensado de puentes	m3		$ 2.022.409,00		
27	14103		630.3.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado en segunda etapa para dados, conformación del tablero y vigas riostra	m3		$ 1.238.934,00		
28	14104		630.4.P	Concreto clase A, 50 Mpa, reforzado, para barreras de tráfico, colocación de concreto sobre tablero	m3		$ 1.277.842,00		
29	14102		630.6P	Concreto clase 35 MPA para Dados de cimentación	m3		$ 1.064.792,00		
30	14104		630.7P	Concreto clase 35 MPA para tablero, vigas riostra y anden	m3	110,74	$ 1.124.254,00	$ 124.499.888,00	
31	14103		630.8P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3		$ 1.446.638,00		
32	14102		630.9P	Concreto clase 28 MPA para estribos	m3		$ 1.003.819,00		
33	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 792.029,00		
34	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	10,92	$ 574.960,00	$ 6.278.563,00	
35	14104		632.1P	Baranda Metalica	ml		$ 643.891,00		
36		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,1	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg	5.557,46	$ 6.750,00	$ 37.512.855,00	
36,2	14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg	7.130,88	$ 6.750,00	$ 48.133.440,00	
36,3	14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,4	14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
37	14104	641-13		Acero de Preesfuerzo	Kg		$ 2.105,00		
38	14104	642-13		Apoyo elastomérico	und		$ 5.284.823,00		
39	14104		642,2P	Junta para puente,recorrido 400 mm	ml		$ 52.400.000,00		
40	14104		642,3P	Junta para puente,recorrido 225 mm	ml		$ 20.320.751,00		
41	14103	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	Kg		$ 15.000,00		
42	14103	650-13		Transporte de estructura metalica	Kg		$ 174,00		
43	14103	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	Kg		$ 4.226,00		
44	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	ml		$ 653.594,00		
45	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de	m3		$ 615.232,00		
46	11606	673-13		Geotextil tipo NT 2400 no tejido	m2		$ 7.418,00		
47	11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 126.990,00		
48	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 169.551,00		
Subtotal								**$ 361.808.223,00**	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
49		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
49,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
49,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	25.976,80	$ 1.897,00	$ 49.277.990,00	
50		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
50,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
50,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
51		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
51,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
51,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
52		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
52,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
52,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
53	11607	730-13		Defensa metalica	m		$ 222.702,00		
54	11607	730-13		Sección final	u		$ 98.987,00		
55	14104	740-13		Captafaros	u		$ 21.130,00		
Subtotal								**$ 49.277.990,00**	

PREACTA DE OBRA N°39

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 39 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
OBRAS VARIAS									
56	11606			Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18.785,00		
Subtotal								$ -	
TRANSPORTES									
57	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	125.805,61	$ 1.121,00	$ 141.028.089,00	
Subtotal								**$ 141.028.089,00**	
PRECIOS NO PREVISTOS									
58	14102		621.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,33 con concreto tremie 35 Mpa en suelos cenagosos (incluye excavación bajo agua, incluye acero de refuerzo, incluye adecuación de la zona, no incluye camisas metálica).	m	-	$ 4.716.115,00		
59	14104	630-13		Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga	m3	-	$ 1.825.395,00		
60	14104	630-13		Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga	m3	98,74	$ 1.511.509,00	$ 149.246.399,00	
61	11607	630-13		Concreto clase 28 MPA para cimentación de Defensas en concreto para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 954.668,00		
62	11606	630-13		Geomalla de refuerzo tipo UX-135 o similar para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2	3.390,00	$ 34.026,00	$ 115.348.140,00	
63	11606	683-13		Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2	1.477,00	$ 12.626,00	$ 18.648.602,00	
64	11606	683-13		Geotextil NT 2500 para separación de suelos de subrasante y capas granulares en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 12.590,00		
65	11606	683-13		Relleno con material seleccionado para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga	m3	1.127,52	$ 94.817,00	$ 106.908.064,00	
66	11604		683.5P	Suministro e instalación de tubería PVC novafort de 4" perforada en el PR9 de la variante cienaga.	ml	72,00	$ 37.206,00	$ 2.678.832,00	
67	11601		221.1P	Pedraplen Compacto	m3	-	$ 79.854,00		
68	11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, NO incluye la preparación de la superficie de apoyo en el PR9 de la variante cienaga	ml		$ 82.321,00		
69	14104	720-13		Poste de referencia	Und		$ 476.085,00		
70	14104	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 30cm*20cm*3cm	Und	-	$ 128.232,00		
71	14104	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de diametro 65 cm espesor 10 cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	Und	-	$ 3.068.904,00		
72	14104	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 53cm*58cm*10cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	Und		$ 2.423.682,00		
73	14102		621.5.3P	Camisa metálica permanente para pilote de diámetro 1.33 m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	ml	-	$ 3.725.643,00		
74	14102		621.7.1P	Pruebas de Integridad de Pilotes (PIT) - ASTM D5882	Und		$ 1.575.439,00		
75	14104	731-13		Defensas en concreto tipo I en concreto 4000 PSI (No incluye acero de refuerzo) para el PR9 de la variante de Ciénaga	ml	460,00	$ 323.326,00	$ 148.729.960,00	

PREACTA DE OBRA N°39

FECHA 30/09/2025
(Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 39 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
76	21108		201.14.1P	Traslado de línea de conducción de agua potable de 12", en el tramo comprendido entre las abscisas K8+656 y el K9+206, desde el frente Cero hasta la pila 4 del Viaducto de la Variante de Ciénaga.	Global	-	$ 872.643.912,00		
77	34202		201.14.2P	Traslado de redes de media y baja tensión, en el tramo comprendido entre las abscisas K8+656 y el K9+206, desde el frente cero hasta la pila 4 del viaducto de la variante de ciénaga.	Global	-	$ 463.148.385,00		
78	11603	500-13		Pavimento de concreto hidráulico tipo MR40 (Incluye barras de transferencia de cargas, barras de amarre y canastilla de fijación).	m3		$ 1.384.303,00		
79	14104		650.5P	Protección de estructuras metálicas con pinturas resistentes a ambientes costeros	kg		$ 1.566,00		
80	11601		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado	m3	931,00	$ 40.007,00	$ 37.246.517,00	
81	11603		450.1.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 modificada con asfalto tipo III	m3	60,00	$ 1.445.899,00	$ 86.753.940,00	
82	11603		450.2.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 modificada con asfalto tipo III	m3	-	$ 1.445.899,00		
83	11604	630.13		Concreto de clase 28 MPA, para obras hidraulicas.	m3	73,43	$ 1.289.881,00	$ 94.715.962,00	
84	11604	630.14		Concreto de clase 28 MPA, para box culvert con sección interna 1.0 x 1.0	m3	9,28	$ 1.592.518,00	$ 14.778.567,00	
85	11604	630.16		Concreto de clase 21 MPA, para obras hidraulicas.	m3	9,59	$ 1.216.760,00	$ 11.668.728,00	
86	11604		663.1.1P	Tuberia de Plástico tipo PVC Novafort o similar, norma NTC5055, de diámetro 355 mm o 14 pulgadas.	m	-	$ 153.374,00		
87	11604	671.1.1		Cuneta de concreto 21 MPA vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo.	m3	47,00	$ 712.724,00	$ 33.498.028,00	
88	11601	800.2		Cerca de alambre de Puas con postes de concreto	m	217,00	$ 49.297,00	$ 10.697.449,00	
89	11604		6P	Suministro e instalación de cinta PVC H= 15 cm	m	27,30	$ 56.281,00	$ 1.536.471,00	
90	11607	701.1.2		Suministro e instalación de tachas unidireccionales y/o bidireccionales, con cuerpo en ABS reforzado, lente reflectivo IX	u		$ 12.637,00		
91	11607		710.1.2.1P	Suministro e instalación de señal vertical reglamentaria, preventiva o informativa (SP, SR, SI), formato 90x90 cm en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al Manual de Señalización Vial 2024	u	69,00	$ 1.278.248,00	$ 88.199.112,00	
92	11607		710.1.2.2P	Suministro e instalación de señal vertical reglamentaria SR-02, formato triangular de 120 cm por lado, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u	11,00	$ 1.369.255,00	$ 15.061.805,00	
93	11607		710.1.2.3P	Suministro e instalación de señal vertical preventiva y/o reglamentaria SP-17, SP-20 y SR-20, formato tipo dúplex de 90x90 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u	10,00	$ 2.110.435,00	$ 21.104.350,00	
94	11607		710.1.3.1P	Suministro e instalación de señal vertical informativa SI-06, formato tipo H de 212x106 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u	1,00	$ 2.629.583,00	$ 2.629.583,00	

PREACTA DE OBRA N°39

FECHA: 30/09/2025 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 39 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
95	11607		710.1.3.2P	Suministro e instalación de señal vertical informativa SI-05A, formato tipo H de hasta 190x50 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u	4,00	$ 1.505.409,00	$ 6.021.636,00	
96	11607		710.1.3.3P	Suministro e instalación de señal vertical informativa tipo SI-04 (Postes de referencia), formato 125x45 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 926.686,00		
97	11607		710.1.5.1P	Suministro e instalación de señal vertical preventiva SP-75, formato 40x50 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u	52,00	$ 719.024,00	$ 37.389.248,00	
98	11607		730.1.1P	Suministro e instalación de barrera metálica de contención SMART RAIL H4b, nivel NC4 (muy alto), sin terminales, incluye postes, vigas, herrajes y fijación completa	m		$ 1.395.496,00		
99	11607		730.2.1P	Suministro e instalación de terminal para barrera TAE H-80M, nivel de contención NC4 (muy alto), incluye postes, herrajes y sistema de fijación completo (Analizado para sección inicial y/o final)	u		$ 12.708.533,00		
100	11607		730.3.1P	Suministro e instalación de terminal abatida SMART RAIL H4b, nivel de contención NC4 (muy alto), incluye postes, herrajes y sistema de fijación completo (Analizado para sección incial y/o final)	u		$ 19.658.994,00		
101	11607		741.1.2.3P	Suministro e instalación de delineador de obstáculo lateral tipo DOL, formato 30x90 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 541.770,00		
102	11607		741.1.2.4P	Suministro e instalación de marcador de obstáculo tipo CHEVRON, formato 45x90 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 658.653,00		
103	11607		7P	Suministro y montaje de señal vertical informativa elevada tipo bandera SI-05, formato 334x204 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 38.149.428,00		
104	11607		8P	Suministro y montaje de señal vertical informativa elevada tipo bandera SI-05, formato 770X358 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u	2,00	$ 107.153.170,00	$ 214.306.340,00	
105	11607		9P	Suministro y montaje de señal vertical informativa elevada tipo bandera SI-05, formato 928x358 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 130.135.878,00		
106	11607		10P	Suministro y montaje de señal vertical informativa elevada tipo pórtico SI-05, formato 673x358 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u	1,00	$ 105.178.881,00	$ 105.178.881,00	
107	11607		11P	Suministro y montaje de señal vertical informativa elevada tipo pórtico SI-05, formato 720x458 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 133.420.634,00		
108	11607		12P	Suministro y montaje de señal vertical informativa elevada tipo pórtico SI-05, formato 758x488 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 152.415.398,00		

PREACTA DE OBRA N°39

FECHA: 30/09/2025
(Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 39 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
109	14104		13P	Suministro e instalación de señal vertical reglamentaria, preventiva o informativa (SP, SR, SI), formato 90x90 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, sobre estructuras elevadas de concreto (puente, paso elevado o viaducto) conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 1.863.596,00		
110	14104		14P	Suministro e instalación de señal vertical preventiva y/o reglamentaria SP-17, SP-20 y SR-20, formato tipo duplex de 90x90 cm,, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, sobre estructuras elevadas de concreto (puente, paso elevado o viaducto) conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 2.670.049,00		
111	14104		15P	Suministro e instalación de señal vertical informativa tipo SI-04 (Postes de referencia), formato 125x45 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, sobre estructuras elevadas de concreto (puente, paso elevado o viaducto) conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 1.566.135,00		
112	14104		16P	Suministro e instalación de señal vertical preventiva SP-75, formato 40x50 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, sobre estructuras elevadas de concreto (puente, paso elevado o viaducto) conforme al manual de señalización vial 2024	u		$ 1.447.150,00		
Subtotal								**$ 1.322.346.614,00**	
SALDO BASICO A COBRAR EN ACTA N° 39								**$ 2.414.538.298,00**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
CONRADO LOPERA PALACIO
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 0520280830 ANT

Firma
WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:




Firma
NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-09718 CLD

Firma
PEDRO LUIS SALAS TEJEDA
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	39	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**201.7. Demolición de Estructuras**	**NO DE ORDEN**	**2**	**UNIDAD**	m3

PREDIO	AREA DEMOLICION MUROS	AREA DEMOLICION PISOS
013A D-M85-T1-VC	97,56	47,80
015A D-M85-T1-VC	200,25	86,28
014A D-M85-T1-VC	119,57	83,69
012A D-M85-T1-VC	153,10	92,17
011A D-M85-T1-VC	57,35	53,20
013 D-M85	303,18	102,19
011 D-M85-T1-VC	294,97	186,46
005A I-M77-T1-VC	375,87	98,95
007A I-M77-T1-VC	322,23	100,38
001 I-M83-T1-VC	240,75	118,77
002 I-M83-T1-VC	480,39	129,12
16A D-M85-T1-VC	319,35	142,63
005 D-M85-T1-VC	174,91	58,73
003 D-M83-T1-VC	209,05	116,24
048A D-SR-T1-VC	162,42	52,76
016 D-M85-T1-VC	144,60	42,34
008A-M77-T1-VC	79,37	36,28
018D-M85-T1-VC	134,22	63,98
006AD-M85-T1-VC	342,64	95,82
005AD-M85-T1-VC	711,78	127,39
017D-M85-T1-VC	230,28	104,73
006D-M85-T1-VC	248,72	110,99
019D-M85-T1-VC	341,18	167,62
004A-M85-T1-VC	144,12	73,80
006A-M77-T1-VC	365,55	60,53
002A-M85-T1-VC	119,97	43,40
015D-M85-T1-VC	477,88	86,80
014D-M85-T1-VC	226,76	150,87
009D-M85-T1-VC	188,28	97,09
008D-M85-T1-VC	204,54	83,35
002D-M85-T1-VC	223,68	115,37
061AD-SR-T1-VC	153,53	68,70
01AD-M78-T1-VC	173,68	52,64
004D-M78-T1-VC	191,32	103,77
007AD-M85-T1-VC	222,49	90,70
004D-M78-T1-VC	193,81	74,87
008AD-M85-T1-VC	253,85	170,34
010D-M85	154,21	190,48
21M-17-T1-VC	1289,32	570,64
01A-MT77	99,68	43,84
003A1-M7	152,17	84,00
017-IM87	180,54	55,20
088AD-SR	16,32	0,00
001-DM17	152,20	74,73
01A-I-M77	177,80	80,42
063AD-SR-T1-VC	162,60	75,60
009AD-M77-T1-VC	205,40	111,69
004AI-M17-T1-VC	417,83	219,83
062AD-SR-T1-VC	181,92	70,68
02AD-M78-T1-VC	257,65	156,63
04D-M78	148,75	75,99
02D-M78	178,77	60,08
091AD-SR	54,28	19,32
089AD-SR-T1-VC	48,23	32,32
TOTAL	**12760,87**	**5412,20**
ESPERSOR	0,13	0,15
VOLUMEN	**1658,91**	**811,83**

ESQUEMA	ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO/AREA	ESPESOR	VOLUMEN m³
	LOSA DE PROTECCION EN ACCESO A GRADESA	12,60	2,00	0,20	5,04
	FRENTE CERO		97,02	0,50	48,51
	FRENTE CERO		70,68	0,50	35,34
	CUNETAS - FRENTE 7	42,49	1,2	0,15	7,65
	BORDILLO - FRENTE 7	158,9	0,4	0,2	12,71
TOTAL					**109,25**



CANTIDAD TOTAL CALCULADO	2.579,99
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	2.418,58
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39	161,41

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	FRENTE CERO	2.538,91
CONECTANTE DERECHA	M3	FRENTE CERO	1.759,88
RETORNO	M3	FRENTE CERO	167,01
VIA DE SERVICIO	M3	FRENTE CERO	2.369,23
CALZADA IZQUIERDA Y DERECHA	M3	FRENTE 7	10.769,34
GLORIETA Y SALIDA A BOSCONIA	M3	FRENTE 7	4.176,77
ACCESO A GRADESA	M3	FRENTE 7	807,33
ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA	M3	FRENTE 7	4.933,13
ACCESO CIENAGA -GLORIETA-Y SALIDA BOSCONIA	M3	FRENTE 7	1.041,12
ACCESO SANTA MARTA 1- SALIDA A SANTA MARTA - ACCESO A CIENAGA	M3	FRENTE 7	2.890,00
CONEXIONES A CIENAGA, SANTA MARTA Y BOSCONIA	M3	FRENTE 7	11.364,65
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			42.817,36
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			39.145,17
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			3.672,19

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	39	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**		**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD** m3

ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA- FRENTE 7

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+000		1,85			
K0+010	10,00	11,75	6,80	68,00	68,00
K0+015	4,92	23,22	17,49	86,03	154,03
K0+020	5,08	25,01	24,12	122,50	276,53
K0+025	5,27	24,64	24,83	130,83	407,36
K0+030	4,73	46,5	35,57	168,25	575,60
K0+040	10,00	41,67	44,09	440,85	1.016,45
K0+050	10,00	35,87	38,77	387,70	1.404,15
K0+060	10,00	30,6	33,24	332,35	1.736,50
K0+070	10,00	28,64	29,62	296,20	2.032,70
K0+080	10,00	29,16	28,90	289,00	2.321,70
K0+090	10,00	30,8	29,98	299,80	2.621,50
K0+100	10,00	37,09	33,95	339,45	2.960,95
K0+106	6,27	33,94	35,52	222,68	3.183,63
K0+110	3,73	40,46	37,20	138,76	3.322,39
K0+112	1,86	37,84	39,15	72,82	3.395,21
K0+115	3,53	18,86	28,35	100,08	3.495,28
K0+120	4,61	8,39	13,63	62,81	3.558,10
TOTAL					**3.558,095**

SALIDA A SANTA MARTA- FRENTE 7

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+161		4,56			
K0+165	4,11	4,86	4,71	19,36	19,36
K0+170	5,11	5	4,93	25,19	44,55
K0+180	10,00	5,16	5,08	50,80	95,35
K0+185	5,00	4,62	4,89	24,45	119,80
K0+190	5,00	4,42	4,52	22,60	142,40
K0+195	5,00	4,33	4,38	21,88	164,28
K0+200	5,00	4,35	4,34	21,70	185,98
K0+205	5,00	4,53	4,44	22,20	208,18
K0+210	5,00	4,04	4,29	21,43	229,60
K0+218	7,50	3,27	3,66	27,41	257,01
TOTAL					**257,013**

ACCESO A SANTA MARTA 2 - FRENTE 7

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+000		2,17			
K0+010	10,00	2,23	2,20	22,00	22,00
K0+020	10,00	2,08	2,16	21,55	43,55
K0+030	10,00	2,21	2,15	21,45	65,00
K0+040	10,00	3,57	2,89	28,90	93,90
K0+050	10,00	4,89	4,23	42,30	136,20
K0+060	10,00	9,9	7,40	73,95	210,15
K0+063	2,93	10,96	10,43	30,56	240,71
K0+069	6,05	8,04	9,50	57,48	298,19
K0+070	1,02	7,1	7,57	7,72	305,91
K0+075	5,00	7,68	7,39	36,95	342,86
K0+079	3,56	7,46	7,57	26,95	369,81
K0+080	1,44	9,11	8,29	11,93	381,74
K0+086	5,87	7,5	8,31	48,75	430,49
K0+088	2,51	3,44	5,47	13,73	444,22
K0+090	1,62	1,11	2,28	3,69	447,91
TOTAL					**447,91**

EXCAVACION ACCESO CIENAGA -GLORIETA-Y SALIDA BOSCONIA

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
140		9,5			
150	10	9,28	9,39	93,90	93,90
160	10	9,41	9,35	93,45	187,35
170	10	8,41	8,91	89,10	276,45
180	10	7,99	8,20	82,00	358,45
190	10	7,84	7,92	79,15	437,60
200	10	7,1	7,47	74,70	512,30
210	10	6,56	6,83	68,30	580,60
220	10	6,92	6,74	67,40	648,00
230	10	5,72	6,32	63,20	711,20
240	10	4,74	5,23	52,30	763,50
250	10	3,38	4,06	40,60	804,10
260	10	2,9	3,14	31,40	835,50
264,02	4,02	2,81	2,86	11,48	846,98
310		1,72			
314,48	4,48	1,1	1,41	6,32	6,32
320	5,52	1,37	1,24	6,82	13,13
324,45	4,45	1,2	1,29	5,72	18,85
330	5,55	0,67	0,94	5,19	24,04
340	10	2,48	1,58	15,75	39,79
350	10	5,15	3,82	38,15	77,94
360	10	5,19	5,17	51,70	129,64
370	10	5,24	5,22	52,15	181,79
380	10	5,73	5,49	54,85	236,64
390	10	6,92	6,33	63,25	299,89
400	10	6,72	6,82	68,20	368,09
410	10	7,07	6,90	68,95	437,04
420	10	7,78	7,43	74,25	511,29
427,98	7,98	7,92	7,85	62,64	573,93
TOTAL					**1420,91**
VOLUMEN FRESADO					**-379,80**
TOTAL					**1041,12**

ACCESO A SANTA MARTA 1 - FRENTE 7

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+000		0,19			
K0+000	0,27	4,81	2,50	0,68	0,68
K0+005	4,73	4,77	4,79	22,66	23,34
K0+010	5,00	4,63	4,70	23,50	46,84
K0+015	5,00	4,07	4,35	21,75	68,59
K0+020	5,00	4,18	4,13	20,63	89,22
K0+025	5,00	4,31	4,25	21,23	110,45
K0+030	5,00	4,52	4,42	22,08	132,53
K0+040	10,00	4,52	4,52	45,20	177,73
K0+050	10,00	5,98	5,25	52,50	230,23
K0+060	10,00	4,69	5,34	53,35	283,58
K0+070	10,00	3,69	4,19	41,90	325,48
K0+080	10,00	3,35	3,52	35,20	360,68
K0+090	10,00	4,15	3,75	37,50	398,18
K0+100	10,00	3,72	3,94	39,35	437,53
K0+110	10,00	3,8	3,76	37,60	475,13
K0+120	10,00	4,17	3,99	39,85	514,98
K0+130	10,00	5,26	4,72	47,15	562,13
K0+140	10,00	4,81	5,04	50,35	612,48
K0+150	10,00	4	4,41	44,05	656,53
K0+153	3,37	4,06	4,03	13,58	670,11
TOTAL					**670,11**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

FRENTE 7

ESQUEMA	SECTOR	AREA	ESPESOR	VOLUMEN
	ACCESO SANTA MARTA 1	930,89	1,80	1.675,60
	SALIDA A SANTA MARTA	356,12	0,80	284,90
	ACCESO A CIENAGA	1162,19	0,80	929,75
TOTAL				**2.890,00**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	FRENTE CERO	752,09
CONECTANTE DERECHA	M3	FRENTE CERO	390,50
RETORNO	M3	FRENTE CERO	37,52
VIA DE SERVICIO	M3	FRENTE CERO	533,31
CALZADA DERECHA- CALZADA IZQUIERDA- GLORIETA-SALIDA A BOSCONIA- ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA- ACCESO A CIEMAGA Y ACCESO GRADESA	M3	FRENTE 7	11.811,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			13.524,41
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			11.696,41
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			1.828,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

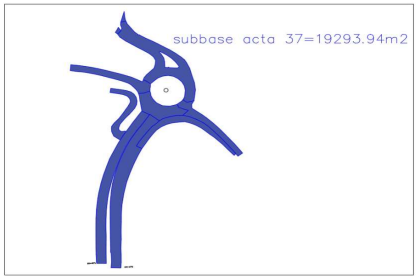
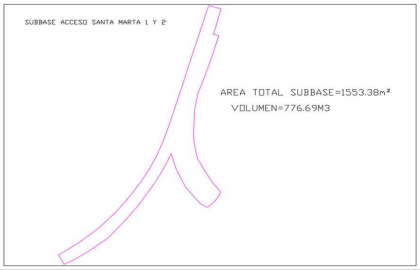
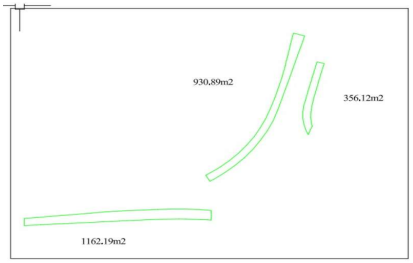
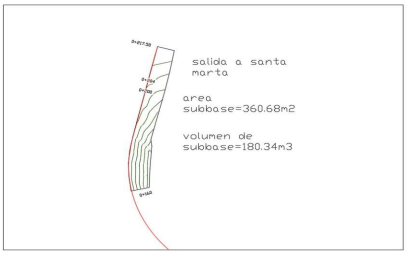
Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD**	m3

FRENTE 7

ESQUEMA	SECTOR	AREA	ESPESOR	VOLUMEN
	CALZADA DERECHA- CALZADA IZQUIERDA- GLORIETA- SALIDA A BOSCONIA- ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA Y ACCESO GRADESA	19.293,94	0,50	9.646,97
	ACCESO A SANTA MARTA 2	1.553,38	0,50	776,69
	ACCESO A SANTA MARTA 1 SALIDA A SANTA MARTA ACCESO A CIENAGA	2.449,20	0,50	1.224,60
	SALIDA A SANTA MARTA	360,68	0,50	180,34
DESCUENTO HOMBRO DE LA CALZADA DERECHA				-18,00
TOTAL				**11.811,00**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**330.1.Base granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**6**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	FRENTE CERO	401,20
CONECTANTE DERECHA	M3	FRENTE CERO	187,89
RETORNO	M3	FRENTE CERO	18,95
CALZADA DERECHA- CALZADA IZQUIERDA- GLORIETA-SALIDA A BOSCONIA- ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA Y ACCESO GRADESA	M3	FRENTE 7	6.997,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			7.605,04
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			6.508,04
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			1.097,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

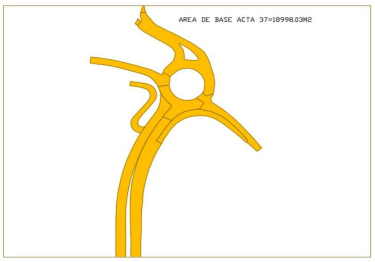



Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**330.1.Base granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**6**	**UNIDAD**	m3

FRENTE 7

ESQUEMA	SECTOR	AREA	ESPESOR	VOLUMEN
	CALZADA DERECHA- CALZADA IZQUIERDA- GLORIETA- SALIDA A BOSCONIA- ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA Y ACCESO GRADESA	18.998,03	0,30	5.699,41
	ACCESO A SANTA MARTA 2	1.553,38	0,30	466,01
	ACCESO A SANTA MARTA 1 SALIDA A SANTA MARTA ACCESO A CIENAGA	2.449,20	0,30	734,76
	SALIDA A SANTA MARTA	360,68	0,30	108,20
DESCUENTO HOMBRO DE LA CALZADA DERECHA				-11,70
TOTAL				**6.997,00**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

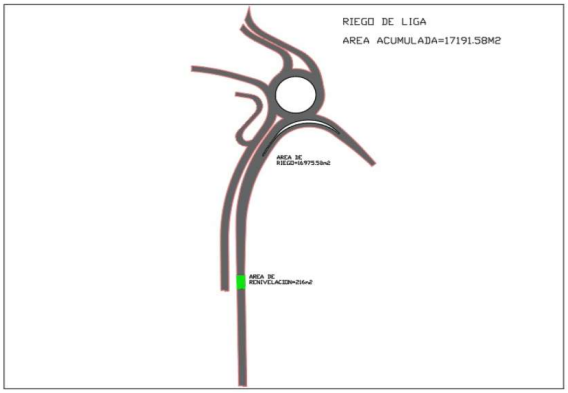
Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

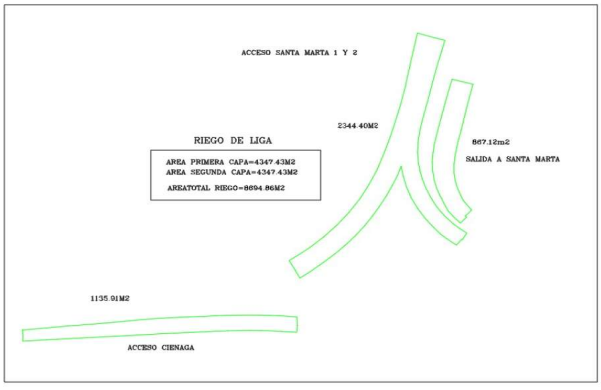
SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1**	**NO DE ORDEN**	**9,1**	**UNIDAD**	m2

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	AREA
CONECTANTE IZQUIERDA	M2	FRENTE CERO	1.693,74
CONECTANTE DERECHA	M2	FRENTE CERO	962,65
RETORNO	M2	FRENTE CERO	207,36
CALZADA DERECHA- CALZADA IZQUIERDA- GLORIETA-SALIDA A BOSCONIA- ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA Y ACCESO GRADESA	M2	FRENTE 7	17.191,58
ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA 2	M2	FRENTE 7	8.694,86
ACCESO A GRADESA 2	M2	FRENTE 7	278,29
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			29.028,48
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			23.999,07
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			5.029,41

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



FRENTE SIETE



FRENTE SIETE

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITOR**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**460.1P. Fresado de pavimento asfaltico**	**NO DE ORDEN**	**13**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	FRENTE CERO	111,56
CALZADA PRINCIPAL	M3	FRENTE CERO	329,52
VIA PROVISIONAL	M3	FRENTE CERO	218,12
ACCESO CIENAGA Y SALIDA A BOSCONIA- ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA 2	M3	FRENTE 7	1.441,42
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			2.100,62
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			1.736,87
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			363,75

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD



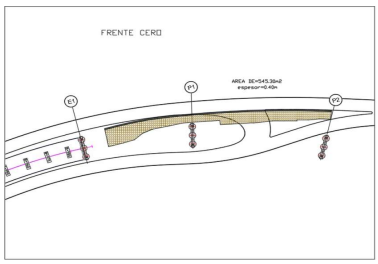
Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**460.1P. Fresado de pavimento asfaltico**	**NO DE ORDEN**	**13**	**UNIDAD**	m3

FRENTE CERO

ESQUEMA	SECTOR	AREA	ESPESOR	VOLUMEN
	CONECTANTE IZQUIERDA	371,88	0,30	111,56
	CALZADA PRINCIPAL	659,03	0,50	329,52
	VIA PROVISIONAL	545,30	0,40	218,12
	TOTAL			**659,20**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

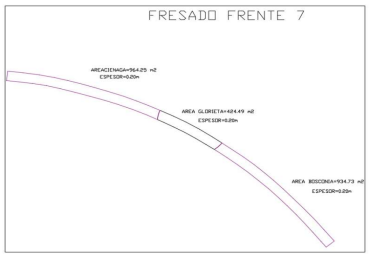
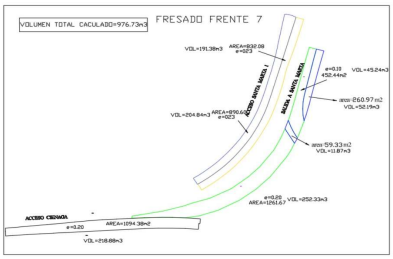
Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**460.1P. Fresado de pavimento asfaltico**	**NO DE ORDEN**	**13**	**UNIDAD**	**m3**

FRENTE SIETE

ESQUEMA	SECTOR	AREA	ESPESOR	VOLUMEN
	ACCESO A CIENAGA Y SALIDA A BOSCONIA	2.323,47	0,20	464,69
	ACCESO A CIENAGA	1094,38	0,2	218,88
	SALIDA A SANTA MARTA	1261,67	0,2	252,33
		59,33	0,2	11,87
		260,97	0,2	52,19
		452,44	0,1	45,24
	ACCESO SANTA MARTA	832,08	0,23	191,38
		890,6	0,23	204,84
TOTAL				**1.441,42**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
MURO EN CONCRETO	FRENTE CERO	m3	592,53
CARCAMO CALZADA IZQUIERDA	FRENTE CERO	m3	91,18
TRASLADO DE REDES	FRENTE CERO	m3	307,40
CARCAMO RETORNO	FRENTE CERO	m3	42,68
ALCANTARILLA	FRENTE CERO	m3	66,88
CANAL EN CONCRETO CONEXION DERECHA K0+310 PUNTO BAJO-CAJA 3	FRENTE CERO	m3	43,00
PUENTE PEATONAL OASIS	FRENTE CERO	m3	51,03
MURO EN CONCRETO - APROCHE DEL PUENTE	FRENTE CERO	m3	1.029,21
CANAL EN CONCRETO K10+432 a K11+240	FRENTE 3	m3	1.550,61
DISIPADORES	FRENTE 3	m3	75,07
CUNETAS	FRENTE 3	m3	76,50
BOX CULVERT DE SERVICIO	FRENTE 4	m3	79,81
BOX CULVERT	FRENTE 7	m3	750,03
MURO EN CONCRETO - GRADESA	FRENTE 7	m3	183,78
CANAL EN CONCRETO DESDE OBRA EXISTENTE - OH14	FRENTE 7	m3	69,94
CANAL EN CONCRETO - GRADESA	FRENTE 7	m3	945,57
CANAL EN CONCRETO GLORIETA	FRENTE 7	m3	341,84
CANAL EN CONCRETO PUNTO BAJO K0+065 A OH3	FRENTE 7	m3	20,84
CANAL EN CONCRETO PUNTO BAJO K0+165 A OH12	FRENTE 7	m3	64,14
CANAL EN CONCRETO PUNTO BAJO K0+135 A OH08	FRENTE 7	m3	24,68
CANAL EN CONCRETO DISIPADOR 1 A OH13	FRENTE 7	m3	37,54
CANAL EN CONCRETO DISIPADOR 2 A CUNETA	FRENTE 7	m3	13,74
CANAL EN CONCRETO DESDE OH5 AL OH6	FRENTE 7	m3	140,86
CANAL DEL OH12 A LA OBRA EXISTENTE K0+115	FRENTE 7	m3	448,56
CANAL DEL OH11 A LA OBRA EXISTENTE K0+115	FRENTE 7	m3	292,97
CUNETAS	FRENTE 7	m3	119,91
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			7.460,28
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			6.212,82
PENDIENTE COBRO POR FALTA DE CANTIDADES CONTRACTUALES			217,61
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			1.029,85

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

CANAL EN CONCRETO GLORIETA (TRAMO 1- DEL OH3 AL OH6)

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0,46		10,06			
2,3	1,84	6,99	8,53	15,69	15,69
5	2,7	6,77	6,88	18,58	34,26
10	5	3,77	5,27	26,35	60,61
13,23	3,23	1,54	2,66	8,58	69,19
14,9	1,67	1,66	1,60	2,67	71,86
15,84	0,94	2,5	2,08	1,96	73,81
20	4,16	5	3,75	15,60	89,41
25	5	8,54	6,77	33,85	123,26
TOTAL					123,26


ESQUEMA



CANAL EN CONCRETO GLORIETA (TRAMO 2 - DEL OH4 HASTA TRAMO 1)

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0,22		1,91			
2,16	1,94	0,89	1,40	2,72	2,72
5	2,84	0,73	0,81	2,30	5,02
10	5	0,42	0,58	2,88	7,89
15	5	0,57	0,50	2,48	10,37
20	5	1,12	0,85	4,23	14,59
22,97	2,97	1,62	1,37	4,07	18,66
TOTAL					18,66

ESQUEMA



CANAL EN CONCRETO INTERNO 1 F-7

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
30		8,02			
31,64	1,64	9,48	8,75	14,35	14,35
35	3,36	15,88	12,68	42,6048	56,95
38,1	3,1	10,78	13,33	41,323	98,28
40	1,9	1,7	6,24	11,856	110,13
TOTAL					110,134


CANAL EN CONCRETO INTERNO 3 F-7

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		0,21			
3,14	3,14	2,92	1,565	4,9141	4,91
5	1,86	4,95	3,935	7,3191	12,23
10	5	6,69	5,82	29,1	41,33
15	5	7,67	7,18	35,9	77,23
16,57	1,57	8,32	7,995	12,55215	89,79
TOTAL					89,785

EXCAVACION CANAL DESDE EL PUNTO BAJO K0+065 AL OH3

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
1,73		1,26			
5	3,27	1,46	1,36	4,45	4,45
10	5	1,55	1,51	7,53	11,97
15	5	1,22	1,39	6,93	18,90
16,63	1,63	1,16	1,19	1,94	20,84
TOTAL					20,84


ESQUEMA



EXCAVACION CANAL DESDE EL PUNTO BAJO K0+165 AL OH12

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
117,73		2,5			
120	2,27	2,41	2,46	5,57	5,57
130	10	1,88	2,15	21,45	27,02
140	10	1,45	1,67	16,65	43,67
150	10	1,1	1,28	12,75	56,42
157,15	7,15	1,06	1,08	7,72	64,14
TOTAL					64,14


ESQUEMA



EXCAVACION CANAL EN CONCRETO PUNTO BAJO K0+135 A OH08

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		0,48			
19,13	19,13	0,61	0,55	10,43	10,43
39,94	20,81	0,76	0,69	14,25	24,68
TOTAL					24,68

ESQUEMA



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

CANAL EN CONCRETO DISIPADOR 1 A OH13

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		1,11			
9,94	9,94	0,80	0,96	9,49	9,49
19,95	10,01	0,65	0,73	7,26	16,75
29,9	9,95	0,82	0,74	7,31	24,06
34,85	4,95	0,76	0,79	3,91	27,97
40,04	5,19	1,01	0,89	4,59	32,57
44,02	3,98	1,49	1,25	4,98	37,54
TOTAL					**37,54**


ESQUEMA



CANAL EN CONCRETO DISIPADOR 2 A CUNETA

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		1,71			
9,92	9,92	0,14	0,93	9,18	9,18
15,13	5,21	0,26	0,20	1,04	10,22
20,43	5,3	0,34	0,30	1,59	11,81
25,94	5,51	0,36	0,35	1,93	13,74
TOTAL					**13,74**

ESQUEMA



CANAL PROVISIONAL -OH12

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
1,36		4,27			
10	8,64	3,63	3,95	34,13	34,13
17,88	7,88	2,21	2,92	23,01	57,14
18,34	0,46	4,85	3,53	1,62	58,76
20,7	2,36	3,88	4,37	10,30	69,06
TOTAL					**69,06**

ESQUEMA

CANAL OH5 A OH6

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
44,46		4,36			
47,01	2,55	7,55	5,96	15,19	15,19
50	2,99	9,31	8,43	25,21	40,39
54,69	4,69	9,69	9,50	44,56	84,95
60,52	5,83	9,49	9,59	55,91	140,86
TOTAL					**140,86**

ESQUEMA

CANAL DEL OH12 A LA OBRA EXISTENTE K0+115

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		7,88			
5	5	8,47	8,18	40,88	40,88
10	5	9,01	8,74	43,70	84,58
15	5	9,25	9,13	45,65	130,23
20	5	10,03	9,64	48,20	178,43
25	5	11,14	10,59	52,93	231,35
30	5	9,03	10,09	50,43	281,78
35	5	6,67	7,85	39,25	321,03
40	5	5,46	6,07	30,33	351,35
45	5	3,97	4,72	23,58	374,93
46,5	1,5	2,13	3,05	4,58	379,50
TOTAL					**379,50**

CANAL DEL OH11 A LA OBRA EXISTENTE K0+115

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
29,75		6,11			
35	5,25	8,39	7,25	38,06	38,06
40	5	9,03	8,71	43,55	81,61
45	5	9,28	9,16	45,78	127,39
50	5	9,73	9,51	47,53	174,91
55	5	9,72	9,73	48,63	223,54
60	5	8,56	9,14	45,70	269,24
63,2	3,2	6,27	7,42	23,73	292,97
TOTAL					**292,97**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

EXCAVACION MURO EN CONCRETO - APROCHE IZQUIERDO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
8894,41		4,34			
8895,29	0,88	7,26	5,80	5,10	5,10
8900	4,71	6,93	7,10	33,42	38,52
8910	10	7,12	7,03	70,25	108,77
8920	10	6,62	6,87	68,70	177,47
8930	10	7,29	6,96	69,55	247,02
8940	10	6,48	6,89	68,85	315,87
8950	10	6,83	6,66	66,55	382,42
8960	10	6,81	6,82	68,20	450,62
8970	10	6,25	6,53	65,30	515,92
8980	10	7,32	6,79	67,85	583,77
8981,65	1,65	22,86	15,09	24,90	608,67
8984,97	3,32	22,84	22,85	75,86	684,53
TOTAL					**684,53**

EXCAVACION MURO EN CONCRETO - APROCHE DERECHO (PARCIAL)

ESQUEMA	AREA	ALTURA	VOLUMEN
	**344,68**	**1**	**344,68**
TOTAL			**344,68**

Esquema	Tipo	Area	Long	Volumen
cuneta tipo1=0.08m2 	Cuneta Tipo 1	0,08	1.167,50	93,4
cuneta tipo2=0.031m2	Cuneta Tipo 2	0,031	855,00	26,51
TOTAL				**119,91**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**Rellenos para Estructuras con suelo**	**NO DE ORDEN**	**17.1**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
TRASLADO DE REDES	FRENTE CERO	m3	307,13
VIA DE SERVICIO	FRENTE CERO	m3	46,41
SEPARADOR CENTRAL K10+677 a K10+760	FRENTE 3	m3	90,93
CANAL EN CONCRETO K10+432 a K11+240	FRENTE 3	m3	293,93
ALCANTARILLA	FRENTE CERO	m3	37,95
CARCAMO	FRENTE CERO	m3	19,15
CANAL EN CONCRETO - GRADESA	FRENTE 7	m3	1.374,04
CANAL EN CONCRETO GLORIETA	FRENTE 7	m3	292,52
CANAL EN CONCRETO DESDE OH5 AL OH6	FRENTE 7	m3	74,67
LLENO LATERAL CIENAGA A BOSCONIA	FRENTE 7	m3	145,80
LLENO PARA ZONAS VERDES	FRENTE 7	m3	3.411,75
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			6.094,27
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			2.682,52
PENDIENTE COBRO POR FALTA DE CANTIDADES CONTRACTUALES			1.926,75
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			1.485,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Rellenos para Estructuras con suelo**		**NO DE ORDEN**	**17.1**	**UNIDAD** m3

CANAL EN CONCRETO GLORIETA (TRAMO 2 - DEL OH4 HASTA TRAMO 1)

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
0,22		5,86			
2,16	1,94	3,70	4,78	9,3	9,3
5	2,84	3,30	3,50	9,9	19,2
10	5	2,91	3,11	15,5	34,7
15	5	2,51	2,71	13,6	48,3
20	5	3,40	2,96	14,8	63,1
22,97	2,97	4,53	3,97	11,8	74,8
TOTAL					**74,84**

CANAL EN CONCRETO GLORIETA (TRAMO 1- DEL OH3 AL OH6)

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
0,46		5,76			
2,3	1,84	2,88	4,32	7,9	7,9
5	2,7	3,17	3,03	8,2	16,1
10	5	3,40	3,29	16,4	32,5
13,23	3,23	3,64	3,52	11,4	43,9
14,9	1,67	4,38	4,01	6,7	50,6
15,84	0,94	6,06	5,22	4,9	55,5
20	4,16	5,07	5,565	23,15	78,66
25	5	3,53	4,30	21,5	100,2
TOTAL					**100,16**

CANAL GRADESA

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
10		1,68			
11,77	1,77	1,25	1,47	2,6	2,6
15,79	4,02	2,03	1,64	6,6	9,2
20	4,21	2,59	2,31	9,7	18,9
30	10	2,44	2,52	25,2	44,1
40	10	2,31	2,38	23,8	67,8
48,36	8,36	3,59	2,95	24,7	92,5
50	1,64	3,14	3,37	5,5	98,0
60	10	3,04	3,09	30,9	128,9
63,71	3,71	5,45	4,25	15,7	144,6
70	6,29	5,08	5,27	33,1	177,8
80	10	4,06	4,57	45,7	223,5
90	10	4,52	4,29	42,9	266,4
100	10	3,93	4,23	42,3	308,6
110	10	4,38	4,16	41,6	350,2
120	10	4,23	4,31	43,1	393,2
130	10	6,31	5,27	52,7	445,9
140	10	6,10	6,21	62,1	508,0
150	10	4,63	5,37	53,7	561,6
160	10	4,52	4,58	45,8	607,4
170	10	4,33	4,43	44,3	651,6
180	10	4,17	4,25	42,5	694,1
190	10	4,13	4,15	41,5	735,6
200	10	3,86	4,00	40,0	775,6
210	10	3,60	3,73	37,3	812,9
217,17	7,17	3,78	3,69	26,5	839,3
220	2,83	3,55	3,67	10,4	849,7
230	10	3,89	3,72	37,2	886,9
TOTAL					**886,89**

CANAL GRADESA

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
42,82		2,35			
47,01	4,19	4,90	3,63	15,2	15,2
50	2,99	5,05	4,98	14,9	30,1
54,69	4,69	3,99	4,52	21,2	51,3
60,52	5,83	4,04	4,02	23,4	74,7
TOTAL					**74,7**

LLEN0 CANAL GRADESA

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
230		3,89			
240	10	2,99	3,44	34,4	34,4
250	10	3,23	3,11	31,1	65,5
260	10	3,22	3,23	32,3	97,8
270	10	2,82	3,02	30,2	128,0
280	10	3,12	2,97	29,7	157,7
290	10	3,01	3,07	30,7	188,3
300	10	2,92	2,97	29,7	218,0
310	10	2,57	2,75	27,5	245,4
320	10	2,88	2,73	27,3	272,7
330	10	2,75	2,82	28,2	300,8
340	10	2,57	2,66	26,6	327,4
350	10	2,77	2,67	26,7	354,1
360	10	2,74	2,76	27,6	381,7
370	10	2,21	2,48	24,8	406,4
380	10	2,51	2,36	23,6	430,0
390	10	3,22	2,87	28,7	458,7
400	10	2,48	2,85	28,5	487,2
TOTAL					**487,15**

LLENO LATERAL -CIENAGA A BOSCONIA

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
190		0,72			
200	10	1,00	0,86	8,60	8,60
210	10	1,38	1,19	11,90	20,50
220	10	1,51	1,45	14,45	34,95
230	10	2,18	1,85	18,45	53,40
240	10	1,14	1,66	16,60	70,00
330		3,61			
340	10	1,60	2,61	26,05	96,05
350	10	1,08	1,34	13,40	109,45
360	10	0,94	1,01	10,10	119,55
370	10	0,99	0,97	9,65	129,20
380	10	1,08	1,04	10,35	139,55
390	10	0,17	0,63	6,25	145,80
TOTAL					**145,80**

CANAL EN CONCRETO GLORIETA - TRAMO 3

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
0		2,57			
3,14	3,14	3,34	2,96	9,28	9,28
5	1,86	3,31	3,33	6,18	15,46
10	5	2,93	3,12	15,60	31,06
15	5	2,29	2,61	13,05	44,11
16,57	1,57	2,54	2,42	3,79	47,90
TOTAL					**47,90**

CANAL EN CONCRETO GLORIETA - TRAMO 4

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
30		3,67			
31,64	1,64	4,30	3,99	6,54	6,54
35	3,36	8,98	6,64	22,31	28,85
38,1	3,1	8,70	8,84	27,40	56,25
40	1,9	5,36	7,03	13,36	69,61
TOTAL					**69,61**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD




Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Rellenos para Estructuras con suelo**	**NO DE ORDEN**	**17.1**	**UNIDAD**	m3

RELLENO PARA ZONAS VERDES

ESQUEMA	UBICACIÓN	AREA	ESPESOR	VOLUMEN
	Calzada derecha	577,1	0,37	213,53
	Calzada derecha	324,87	0,35	113,7
	Calzada derecha	958,69	0,35	335,54
	Salida a Bosconia calzada Derecha	327,89	0,3	98,37
	By Pass Salida a Bosconia	147,5	0,3	44,25
	Salida a Bosconia calzada Derecha	280	0,35	98
	Glorieta y salida a santa Marta	132,1	0,37	48,88
	Separador By Pass Glorieta	251,77	0,5	125,89
	Entrada a gradesa	44,06	0,3	13,22
	Separador Calzada derecha e izquierda	88,96	0,5	44,48
	Glorieta Calzada Izquierda	122,06	0,35	42,72
	Acceso a Cienaga- Calzada Derecha	343,78	0,35	120,32
	Acceso a Cienaga- Calzada Izquierda	181,26	0,37	67,07
	Sector entre Accesos a santa marta 1 y 2 , cienaga y Glorieta	1252,58	0,3	375,77
		1925	0,8	1540
		433,36	0,3	130,01
TOTAL				**3411,75**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Relleno para estructuras con recebo**	**NO DE ORDEN**	**18**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
BOX CULVERT	FRENTE 4	m3	40,40
BOX CULVERT	FRENTE 7	m3	1.367,01
MURO GRADESA	FRENTE 7	m3	120,37
CANAL EN CONCRETO DESDE OBRA EXISTENTE - OH14	FRENTE 7	m3	34,23
CANAL DEL OH12 A LA OBRA EXISTENTE K0+115	FRENTE 7	m3	163,99
CANAL DEL OH11 A LA OBRA EXISTENTE K0+115	FRENTE 7	m3	114,09
MURO EN CONCRETO PARA APROCHE 1	FRENTE CERO	m3	60,39
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			1.900,48
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			1.562,01
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			338,47

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Relleno para estructuras con recebo**	**NO DE ORDEN**	**18**	**UNIDAD**	m3

lleno estructural BOX OH4

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
K0+000		6,32		
K0+000	0,3	6,33	1,90	1,90
K0+005	4,56	6,48	29,21	31,10
K0+010	5	7,46	34,85	65,95
K0+015	5	6,98	36,10	102,05
K0+020	4,7	7,11	33,11	135,17
K0+021	0,8	6,91	5,61	140,77
TOTAL				**140,77**

lleno estructural BOX OH3

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
K0+000		5,76		
K0+005	5	6,08	29,60	29,60
K0+010	5	6,74	32,05	61,65
K0+014	3,63	6,67	24,34	85,99
K0+014	0,3	6,6	1,99	87,98
TOTAL				**87,98**

lleno estructural BOX OH2

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
K0+000		9,31		
K0+005	5	9,68	47,48	47,48
K0+010	5	10,4	50,20	97,68
K0+015	5	9,31	49,28	146,95
K0+018	3,4	9,07	31,25	178,20
TOTAL				**178,20**

LLENO MURO DE GRASEA

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
K0+016		10,73			
K0+017	0,92	7,79	9,26	8,52	8,52
K0+019	2,56	7,18	7,49	19,16	27,68
K0+020	0,29	6,27	6,73	1,95	29,63
K0+023	2,96	6,08	6,18	18,28	47,91
K0+025	2,29	6,40	6,24	14,29	62,20
K0+030	5	5,18	5,79	28,95	91,15
K0+031	1,36	4,99	5,09	6,92	98,06
K0+032	0,3	2,81	3,90	1,17	99,23
K0+035	3,34	2,60	2,71	9,03	108,27
K0+040	5	2,24	2,42	12,10	120,37
TOTAL					**120,37**

LLENO ESTRUCTURAL DE LA OBRA EXISTENTE AL BOX OH14

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
K0+001		1,26			
K0+005	4,41	1,46	1,36	6,00	6,00
K0+010	5	1,43	1,45	7,23	13,22
K0+015	5	1,56	1,50	7,48	20,70
K0+020	5	1,42	1,49	7,45	28,15
K0+022	2,24	1,54	1,48	3,32	31,46
K0+024	2,02	1,20	1,37	2,77	34,23
TOTAL					**34,23**


CANAL DEL OH12 A LA OBRA EXISTENTE K0+115

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
K0+000		3,58			
K0+005	5	3,79	3,69	18,43	18,43
K0+010	5	3,94	3,87	19,33	37,75
K0+015	5	4,00	3,97	19,85	57,60
K0+020	5	3,96	3,98	19,90	77,50
K0+025	5	3,98	3,97	19,85	97,35
K0+030	5	3,54	3,76	18,80	116,15
K0+035	5	2,78	3,16	15,80	131,95
K0+040	5	2,78	2,78	13,90	145,85
K0+045	5	2,93	2,86	14,28	160,13
K0+047	1,5	2,22	2,58	3,86	163,99
TOTAL					**163,99**

CANAL DEL OH11 A LA OBRA EXISTENTE K0+115

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
K0+030		2,08			
K0+035	5,25	3,02	2,55	13,39	13,39
K0+040	5	3,43	3,23	16,13	29,51
K0+045	5	3,56	3,50	17,48	46,99
K0+050	5	3,93	3,75	18,73	65,71
K0+055	5	3,93	3,93	19,65	85,36
K0+060	5	3,53	3,73	18,65	104,01
K0+063	3,2	2,77	3,15	10,08	114,09
TOTAL					**114,09**

RELLENO LATERAL DEL MURO IZQUIERDO DEL APROCHE 1

ESQUEMA	AREA	LONG	VOLUMEN
	0,671	90	60,39

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.7P. Concreto clase 35 MPA para tablero, vigas riostra y anden**	**NO DE ORDEN**	**30**	**UNIDAD**	**m3**

PUENTE	ELEMENTO	CANT DE PRELOSAS	AREA SECCION (m2)	LONG MODULO (m)	VOLUMEN
PUENTE 4	PRELOSAS	314	0,1767	4	221,91
PUENTE 3	PRELOSAS	260	0,1767	4	183,75
PUENTE 2	PRELOSAS	113	0,1767	4	79,86
PUENTE 1	PRELOSAS	295	0,1767	4	208,48
TOTAL					**694,00**



PLANTA PRELOSA PRE FABRICADA
MODULO 1,50m DE ANCHO
ESCALA 1:20

Geometría prelosas de 1,50		
Prelosa	L (m)	D1 (m)
P1	1,50	4,00

PUENTE	ELEMENTO	TRAMO	LONG	AREA	VOLUMEN
PUENTE 4	LOSA	APOYO 13-APOYO 12	55	2,00	110,00
	LOSA	APOYO 12-APOYO 11	55	2,00	110,00
	LOSA	APOYO 11-APOYO 10	65	2,00	130,00
	LOSA	APOYO 10-APOYO 9	60	2,00	120,00
PUENTE 3	LOSA	APOYO 9 - APOYO 8	65	2,00	130,00
	LOSA	APOYO 8 - APOYO 7	65	2,00	130,00
	LOSA	APOYO 7 - APOYO 6	65	2,00	130,00
PUENTE 2	LOSA	APOYO 6 - APOYO 5	40	2,00	80,00
	LOSA	APOYO 5 - APOYO 4	45	2,00	90,00
PUENTE 1	LOSA	APOYO 4 - APOYO 3	50	2,00	100,00
	LOSA	APOYO 3 - APOYO 2	60	2,00	120,00
	LOSA	APOYO 2 - APOYO 1	60	2,00	120,00
	LOSA	APOYO 1 - ESTRIBO 1	50	2,00	100,00
TOTAL					**1470,00**

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	2.274,74
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	2.164,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39	110,74

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 31/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.7P. Concreto clase 35 MPA para tablero, vigas riostra y anden**	**NO DE ORDEN**	**30**	**UNIDAD**	m3

Puente	EJE	Espesor (m)	LONG (m)	Espesor (m) Viga Izquierda	Espesor (m) Viga Central	Espesor (m) Viga Derecha	ANCHO CARTELA (m)	VOLUMEN (m^3)
	E1	k8+985,948		0,18	0,06	0,05	0,60	
		k8+990,948	5,00	0,17	0,06	0,05	0,60	1,0400
		k8+995,948	5,00	0,16	0,06	0,05	0,60	0,9900
		k9+000,948	5,00	0,15	0,06	0,05	0,60	0,9500
		k9+005,948	5,00	0,15	0,06	0,06	0,60	0,9400
Puente 1		k9+010,948	5,00	0,15	0,06	0,07	0,60	0,9800
		k9+015,948	5,00	0,14	0,06	0,07	0,60	0,9700
		k9+020,948	5,00	0,14	0,06	0,07	0,60	0,9500
		k9+025,948	5,00	0,13	0,06	0,08	0,80	1,0800
		k9+030,948	5,00	0,13	0,06	0,09	1,00	1,3800
	P1	k9+035,948	5,00		0,06	0,09	1,00	1,1500
	P1	k9+035,948		0,13	0,06	0,09	1,00	
		k9+040,948	5,00	0,13	0,06	0,10	1,00	1,5700
		k9+045,948	5,00	0,12	0,06	0,10	0,80	1,4300
		k9+050,948	5,00	0,11	0,06	0,10	0,60	1,1000
		k9+055,948	5,00	0,11	0,06	0,10	0,60	0,9400
Puente 1		k9+060,948	5,00	0,11	0,06	0,12	0,60	0,9800
		k9+065,948	5,00	0,11	0,06	0,12	0,60	1,0200
		k9+070,948	5,00	0,10	0,06	0,12	0,60	1,0000
		k9+075,948	5,00	0,10	0,06	0,13	0,60	1,0000
		k9+080,948	5,00	0,10	0,06	0,13	0,60	1,0200
		k9+085,948	5,00	0	0,06	0,14	0,80	1,1900
		k9+090,948	5,00	0	0,06	0,14	1,00	1,4900
	P2	k9+095,948	5,00	0	0,06	0,15	1,00	1,6400
	P2	k9+095,948		0,08	0,06	0,15	1,00	
		k9+100,948	5,00	0,08	0,06	0,15	1,00	1,6100
		k9+105,948	5,00	0,08	0,06	0,16	0,80	1,5000
		k9+110,948	5,00	0,08	0,06	0,16	0,60	1,2300
		k9+115,948	5,00	0,07	0,06	0,16	0,60	1,0600
Puente 1		k9+120,948	5,00	0,07	0,06	0,17	0,60	1,0600
		k9+125,948	5,00	0,07	0,06	0,17	0,60	1,0900
		k9+130,948	5,00	0,06	0,06	0,17	0,60	1,0700
		k9+135,948	5,00	0,06	0,06	0,18	0,60	1,0700
		k9+140,948	5,00	0,06	0,06	0,18	0,60	1,1000
		k9+145,948	5,00	0	0,06	0,18	0,80	1,2500
		k9+150,948	5,00	0	0,06	0,18	1,00	1,5500
	P3	k9+155,948	5,00	0	0,06	0,18	1,00	1,6700
	P3	k9+155,948		0,05	0,06	0,18	1,00	
		k9+160,948	5,00	0,05	0,06	0,18	1,00	1,6400
		k9+165,948	5,00	0,05	0,06	0,18	0,80	1,5000
		k9+170,948	5,00	0,05	0,06	0,18	0,6	1,2100
		k9+175,948	5,00	0,05	0,06	0,18	0,60	1,0600
Puente 1		k9+180,948	5,00	0,05	0,06	0,18	0,60	1,0600
		k9+185,948	5,00	0,05	0,06	0,18	0,60	1,0600
		k9+190,948	5,00	0,05	0,06	0,18	0,60	1,0600
		k9+195,948	5,00	0,05	0,06	0,18	0,60	1,0600
		k9+200,948	5,00	0,05	0,06	0,18	0,60	1,0600
	P4	k9+205,948	5,00	0,05	0,06	0,18	0,40	0,9200
	P4	k9+205,948		0,18	0,03	0,03	0,40	
		k9+210,948	5,00	0,19	0,04	0,04	0,40	0,6900
		k9+215,948	5,00	0,19	0,04	0,04	0,40	0,7400
		k9+220,948	5,00	0,19	0,04	0,04	0,4	0,7400
Puente 2		k9+225,948	5,00	0,19	0,04	0,04	0,40	0,7400
		k9+230,948	5,00	0,19	0,04	0,04	0,40	0,7400
		k9+235,948	5,00	0,19	0,04	0,04	0,40	0,7400
		k9+240,948	5,00	0,19	0,04	0,04	0,60	0,8700
	P5	k9+245,948	5,00	0,19	0,04	0,04	0,60	1,0100
	P5	k9+245,948		0,19	0,04	0,04	0,60	
		k9+250,948	5,00	0,20	0,04	0,04	0,60	1,0300
		k9+255,948	5,00	0,20	0,04	0,04	0,40	0,9200
		k9+260,948	5,00	0,19	0,04	0,04	0,4	0,7600
Puente 2		k9+265,948	5,00	0,16	0,03	0,04	0,40	0,6700
		k9+270,948	5,00	0,13	0,03	0,07	0,60	0,7000
		k9+275,948	5,00	0,11	0,03	0,10	0,40	0,7000
		k9+280,948	5,00	0,08	0,03	0,13	0,40	0,6000
		k9+285,948	5,00	0,05	0,03	0,16	0,40	0,6100
	P6	k9+290,948	5,00	0,03	0,03	0,18	0,40	0,6400
	P6	k9+290,948		0,14	0,05	0,03	0,60	
		k9+295,948	5,00	0,11	0,04	0,05	0,60	0,7300
		k9+300,948	5,00	0,08	0,03	0,08	0,60	0,6600
		k9+305,948	5,00	0,05	0,03	0,10	0,6	0,6200
		k9+310,948	5,00	0,03	0,03	0,12	0,60	0,6100
		k9+315,948	5,00	0,03	0,03	0,12	0,60	0,6200
Puente 3		k9+320,948	5,00	0,03	0,03	0,12	0,60	0,6200
		k9+325,948	5,00	0,03	0,03	0,12	0,60	0,6200
		k9+330,948	5,00	0,03	0,03	0,12	0,60	0,6200
		k9+335,948	5,00	0,03	0,03	0,12	0,60	0,6200
		k9+340,948	5,00	0,03	0,03	0,12	0,60	0,6200
		k9+345,948	5,00	0,03	0,03	0,12	0,80	0,7100
		k9+350,948	5,00	0,03	0,03	0,12	1,00	0,8900
	P7	k9+355,948	5,00	0,03	0,03	0,13	1,20	1,1000
	P7	k9+355,948		0,03	0,04	0,13	1,20	
		k9+360,948	5,00	0,03	0,03	0,13	1,00	1,1700
		k9+365,948	5,00	0,03	0,03	0,13	0,80	0,9500
		k9+370,948	5,00	0,03	0,03	0,13	0,6	0,7600
		k9+375,948	5,00	0,03	0,03	0,13	0,60	0,6600
		k9+380,948	5,00	0,04	0,03	0,13	0,60	0,6800
Puente 3		k9+385,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7100
		k9+390,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+395,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+400,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+405,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+410,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,80	0,8400
		k9+415,948	5,00	0,04	0,04	0,13	1,00	1,0500
	P8	k9+420,948	5,00	0,04	0,04	0,13	1,20	1,2600



Puente	EJE	Espesor (m)	LONG (m)	Espesor (m) Viga Izquierda	Espesor (m) Viga Central	Espesor (m) Viga Derecha	ANCHO CARTELA (m)	VOLUMEN (m^3)
	P8	k9+420,948		0,05	0,04	0,13	1,20	
		k9+425,948	5,00	0,05	0,04	0,13	1,00	1,3200
		k9+430,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,80	1,0700
		k9+435,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,6	0,8400
		k9+440,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+445,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
Puente 3		k9+450,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+455,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+460,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+465,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+470,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+475,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
		k9+480,948	5,00	0,04	0,04	0,13	0,60	0,7300
	P9	k9+485,948	5,00	0	0,04	0,13	0,60	0,7300
	P9	k9+485,948		0,03	0,03	0,03	0,60	
		k9+490,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+495,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+500,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,6	0,2800
		k9+505,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+510,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
Puente 4		k9+515,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+520,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+525,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+530,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+535,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,80	0,3300
		k9+540,948	5,00	0,03	0,03	0,03	1,00	0,4200
	P10	k9+545,948	5,00	0,03	0,03	0,03	1,20	0,5100
	P10	k9+545,948		0,03	0,03	0,03	1,20	
		k9+550,948	5,00	0,03	0,03	0,03	1,00	0,5100
		k9+555,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,80	0,4200
		k9+560,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,6	0,3300
		k9+565,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+570,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
Puente 4		k9+575,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+580,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+585,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+590,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+595,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+600,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,80	0,3300
		k9+605,948	5,00	0,03	0,03	0,03	1,00	0,4200
	P11	k9+610,948	5,00	0,03	0,03	0,03	1,00	0,4600
	P11	k9+610,948		0,03	0,03	0,03	1,00	
		k9+615,948	5,00	0,03	0,03	0,03	1,00	0,4600
		k9+620,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,80	0,4200
		k9+625,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,6	0,3300
		k9+630,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
Puente 4		k9+635,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+640,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+645,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+650,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+655,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,80	0,3300
		k9+660,948	5,00	0,03	0,03	0,03	1,00	0,4200
	P12	k9+665,948	5,00	0,03	0,03	0,03	1,00	0,4600
	P12	k9+665,948		0,03	0,03	0,03	1,00	
		k9+670,948	5,00	0,03	0,03	0,03	1,00	0,4600
		k9+675,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,80	0,4200
		k9+680,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,8	0,3700
		k9+685,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,3300
Puente 4		k9+690,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+695,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+700,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+705,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+710,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
		k9+715,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
	P13	k9+720,948	5,00	0,03	0,03	0,03	0,60	0,2800
	TOTAL							**110,74**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39


SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**630.6. Concreto clase 14 MPA**	**NO DE ORDEN**	**34**	**UNIDAD**	m3

Elemento	Ubicacion	Unidad	Volumen
MURO DE CONTENCION	FRENTE CERO	m3	26,96
CANAL EN CONCRETO CONEXION DERECHA K0+310 PUNTO BAJO-CAJA 3	FRENTE CERO	m3	3,71
CANAL EN CONCRETO	FRENTE 3	m3	53,41
CARCAMOS	FRENTE CERO	m3	4,38
PUENTE PEATONAL OASIS	PUENTE 3	m3	6,40
OBRAS HIDRAULICAS	FRENTE 4	m3	1,90
OBRAS HIDRAULICAS	FRENTE 7	m3	93,80
MUROS EN COCRETO - APROCHES DEL PUENTE	FRENTE CERO	m3	38,60
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			**229,16**
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			**218,24**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			**10,92**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.6. Concreto clase 14 MPA**		**NO DE ORDEN**	**34**	**UNIDAD** m3

MURO BORDE IZQUIERDO

Modulo	Seccion	Longitud	Ancho	Espesor	Solado
1	003-A/007	6,65	3,4	0,05	1,13
2	003-I/007	9,2	4,85	0,05	2,23
3	003-K/007	12,2	4,55	0,05	2,78
4	003-L/007	12,2	4,3	0,05	2,62
5	003-M/007	12,2	4,3	0,05	2,62
6	003-N/007	12,2	4	0,05	2,44
7	003-O/007	12,2	3,7	0,05	2,26
8	003-P/007	12,2	3,45	0,05	2,10
9	003-Q/007	6,2	3,95	0,05	1,22
TOTAL CONCRETO					**19,41**

MURO BORDE DERECHO

Modulo	Seccion	Longitud	Ancho	Espesor	Solado
1	003-A/004	6,65	3,4	0,05	1,13
2	003-B/004	9,2	4,85	0,05	2,23
3	003-C/004	12,2	4,55	0,05	2,78
4	003-D/004	12,2	4,3	0,05	2,62
5	003-E/004	12,2	4	0,05	2,44
6	003-F/004	12,2	3,7	0,05	2,26
7	003-G/004	12,2	3,45	0,05	2,10
8	003-H/004	12,2	3,95	0,05	2,41
9	003-I/004	6,2	3,95	0,05	1,22
TOTAL CONCRETO					**19,20**

Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:
Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**640.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**	**NO DE ORDEN**	**36.1**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	UND	CANTIDAD
CANAL RECTANGULAR K10+432 a K11+240	FRENTE 3	KG	41.713,50
PUENTE PEATONAL K9+310 a K9+340	PUENTE 3	KG	1.877,63
CUNETAS	FRENTE 3	KG	2.308,76
DISIPADORES	FRENTE 3	KG	532,22
CARCAMO- RETORNO	FRENTE CERO	KG	1.187,74
ALCANTARILLA	FRENTE CERO	KG	203,59
BOX CULVERT DE SERVICIO	FRENTE 4	KG	1.551,67
BOX CULVERT OH-014	FRENTE 7	KG	2.305,56
BOX CULVERT OH-013	FRENTE 7	KG	1.364,74
BOX CULVERT OH-012	FRENTE 7	KG	2.210,68
BOX CULVERT OH-011	FRENTE 7	KG	3.186,02
BOX CULVERT OH-010	FRENTE 7	KG	2.037,40
BOX CULVERT OH-09	FRENTE 7	KG	1.981,66
BOX CULVERT OH-08	FRENTE 7	KG	3.851,06
BOX CULVERT OH-07	FRENTE 7	KG	4.390,02
BOX CULVERT OH-06	FRENTE 7	KG	3.651,57
BOX CULVERT OH-05	FRENTE 7	KG	6.405,06
BOX CULVERT OH-04	FRENTE 7	KG	4.015,14
BOX CULVERT OH-03	FRENTE 7	KG	2.622,46
BOX CULVERT OH-02	FRENTE 7	KG	3.813,54
BOX CULVERT OH-01	FRENTE 7	KG	1.932,80
MURO EN CONCRETO GRADESA	FRENTE 7	KG	14.042,32
CANAL DE CONCRETO GRADESA	FRENTE 7	KG	30.513,93
CANAL EN CONCRETO DESDE OBRA EXISTENTE A OH14	FRENTE 7	KG	1.684,72
CANAL EN CONCRETO GLORIETA DEL OH4 A OH6 Y OH3	FRENTE 7	KG	2.998,75
CANAL EN CONCRETO DEL OH6 A OH5	FRENTE 7	KG	1.159,98
MURO EN CONCRETO - APROCHE 1	FRENTE CERO	KG	47.098,69
MURO BORDILLO	FRENTE 7	KG	636,00
CUNETAS Y DISIPADORES	FRENTE 7	KG	19.334,00
ATRAQUE ALCANTARILLA ACCESO GRADESA	FRENTE 7	KG	590,40
CANAL EN CONCRETO CONEXION DERECHA K0+310 PUNTO BAJO-CAJA 3	FRENTE CERO	KG	3.670,44
CANALES TRAPEZOIDALES	FRENTE 7	KG	3.599,17
CANAL DEL OH12 A LA OBRA EXISTENTE K0+115	FRENTE 7	KG	3.308,59
CANAL DEL OH11 A LA OBRA EXISTENTE K0+115	FRENTE 7	KG	3.159,44
TAPA CAJA VIA SANTA MARTA A ROTONDA	FRENTE 7	KG	42,00
LOSA ACCESO A GRADESA	FRENTE 7	KG	300,50
BORDILLO SENTIDO ROTONDA A SANTA MARTA C.D.	FRENTE 7	KG	33,50
NEW JERSEY (PROTECCION PILAS VIA SANTA MARTA)	FRENTE 7	KG	1.894,43
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			227.209,67
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			214.521,33
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			12.688,34

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA


Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**		**NO DE ORDEN**	**36.4**	**UNIDAD** Kg

MURO - BORDILLO					**LONG**	**24,70**	
Nº	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
ACERO TRANSVERSAL INTERNO (VARIABLE)	4	0,25	1,55		1,00 kg/m	100,00	155,00
ACERO TRANSVERSAL EXTERNO (VARIABLE)	4	0,25	1,45		1,00 kg/m	100,00	145,00
ACERO LONGITUDINAL ZAPATA	4	0,25	12,00		1,00 kg/m	12,00	144,00
ACERO LOGITUDINAL MURO	4	0,25	12,00		1,00 kg/m	16,00	192,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**636,00 kg**

CUNETAS TIPO 1					**MODULO =**	**2. 5 METROS**	
MARCA	BARRA No	ITEM	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
P1	4	ACERO LONGITUDINAL	2,40		1,00 kg/m	6,00	14,40
P2	4	ACERO TRANSVERSAL	1,10		1,00 kg/m	10,00	11,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**25,40 kg**
CANTIDAD MODULOS							**467**
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**11.861,80 kg**

CUNETAS TIPO 2					**MODULO =**	**2. 5 METROS**	
MARCA	BARRA No	ITEM	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
P1	4	ACERO LONGITUDINAL	2,40		1,00 kg/m	5,00	12,00
P2	4	ACERO TRANSVERSAL	0,80		1,00 kg/m	10,00	8,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**20,00 kg**
CANTIDAD MODULOS							**332**
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**6.640,00 kg**

DISIPADOR K0+330 CALZADA IZQUIERDA						
No.	**Longitud Varilla (m)**	**No. Varilla**	**Cantidad**	**peso**	**Peso (Kg)**	**Figura**
P1	2,75	4	38	1,00 kg/m	104,50 Kg	
P2	4,10	4	20	1,00 kg/m	82,00 Kg	
P3	0,70	4	6	1,00 kg/m	4,20 Kg	
CANTIDAD PRESENTE ACTA					**190,70kg**	

ATRAQUE TUBERIA SECTOR GRADESA							
MARCA	BARRA No	ITEM	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
P1	4	ACERO TRANSVERSAL	2,40		1,00 kg/m	121,00	290,40
P2	4	ACERO LONGITUDINAL	12,00		1,00 kg/m	25,00	300,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**590,40 kg**

ACERO PARA CANAL FRENTE 0							
MARCA	BARRA No	ITEM	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
P1	4	ACERO TRANSVERSAL EXTERNO (VARIABLE)	2,92		1,00 kg/m	286,00	835,12
P2	4	ACERO TRANSVERSAL INTERNO (VARIABLE)	2,52		1,00 kg/m	286,00	720,72
P3	4	ACERO TRANSVERSAL DE REFUERZO, MURO IZQUIERDO HACIA MAYORES (VARIABLE)	1,1		1,00 kg/m	286,00	314,60
P4	4	ACERO LONGITUDINAL INTERNO	12,00		1,00 kg/m	70,00	840,00
P5	4	ACERO LONGITUDINAL EXTERNO	12,00		1,00 kg/m	80,00	960,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**3.670,44 kg**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**			**01/09/2025 a 30/09/2025**
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**			**NO DE ORDEN**	**36.4**	**UNIDAD**	**Kg**

ACERO CANAL TRAPEZOIDAL FRENTE 7 X ml					TRAMO	MODULO (Metro)	1,00
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
T1	4		0,90	10 varillas N4 @ .30m L=0,90	1,00 kg/m	10,00	9,00
T2	4		2,50	4 varillas N4 @ .30m L=2,50	1,00 kg/m	4,00	10,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**19,00 kg**
CANTIDAD (Longitud)							**189,43**
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**3.599,17 kg**

CANAL DEL OH12 A LA OBRA EXISTENTE K0+115					TRAMO	1 MODULO (12,2 METROS)	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
C1	4		12,00	Recta	1,00 kg/m	30,00	360,00
C2A	4		2,45	1,05 / 1,40	1,00 kg/m	40,00	98,00
C2B	4		2,45	1,05 / 1,40	1,00 kg/m	40,00	98,00
C3	4		1,80	0,15 / 1,50 / 0,15	1,00 kg/m	40,00	72,00
C4A	4		1,55	0,15 / 1.40	1,00 kg/m	40,00	62,00
C4B	4		1,55	0,15 / 1.40	1,00 kg/m	40,00	62,00
L1	4		1,50	1,50	1,00 kg/m	8,00	12,00
L2	5		1,55	0,42 / 0,20 / 120° / 0,62 / 0,30	1,55 kg/m	7,00	16,82
L3	5		0,75	0,10 / 0,55 / 0,10	1,55 kg/m	7,00	8,14
L4	5		3,52	0,70 / 1,25 / 101° / 1,27 / 0,50	1,55 kg/m	7,00	38,19
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**827,15 kg**
CANTIDAD MODULOS							**4,00**
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**3.308,59 kg**

CANAL DEL OH11 A LA OBRA EXISTENTE K0+115					TRAMO	1 MODULO (12,2 METROS)	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
C1	4		12,00	Recta	1,00 kg/m	30,00	360,00
C2A	4		2,45	1,05 / 1,40	1,00 kg/m	40,00	98,00
C2B	4		2,45	1,05 / 1,40	1,00 kg/m	40,00	98,00
C3	4		1,80	0,15 / 1,50 / 0,15	1,00 kg/m	40,00	72,00
C4A	4		1,55	0,15 / 1.40	1,00 kg/m	40,00	62,00
C4B	4		1,55	0,15 / 1.40	1,00 kg/m	40,00	62,00
L1	4		1,50	1,50	1,00 kg/m	8,00	12,00
L2	5		1,55	0,42 / 0,20 / 120° / 0,62 / 0,30	1,55 kg/m	7,00	16,82
L3	5		0,75	0,10 / 0,55 / 0,10	1,55 kg/m	7,00	8,14
L4	5		3,52	0,70 / 1,25 / 101° / 1,27 / 0,50	1,55 kg/m	7,00	38,19
R1	4	Realce de Muro derecho	1,00	0.55 MT + VARIA (0.7MT A 0.20 MT)	1,00 kg/m	226,00	226,00
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**1.053,15 kg**
CANTIDAD MODULOS							**3,00**
TOTAL ACERO DE REFUERZO							**3.159,44 kg**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**			**01/09/2025 a 30/09/2025**
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**	**NO DE ORDEN**	**36.4**	**UNIDAD**	**Kg**

TAPA CAJA VIA SANTA MARTA A ROTONDA

No.	Figura	Longitud Varilla (m)	No. Varilla	Cantidad	peso	Peso (Kg)	Item
CVS1	1.40 MT	1,40	4	30	1,00 kg/m	42,00 Kg	CAJA VIA SANTA MARTA A CIENAGA
CANTIDAD PRESENTE ACTA						**42,00kg**	

ACERO LOSA ACCESO A GRADESA FINCA

No.	Figura	Longitud Varilla (m)	No. Varilla	Cantidad	peso	Peso (Kg)	Item
L1	6.20 MT	6,20	4	24	1,00 kg/m	148,80 Kg	LOSA ACCESO PREDIO GRADESA
L2	4.55 MT	4,55	4	30	1,00 kg/m	136,50 Kg	LOSA ACCESO PREDIO GRADESA
L3	3.8 MT	3,80	4	4	1,00 kg/m	15,20 Kg	LOSA ACCESO PREDIO GRADESA
CANTIDAD PRESENTE ACTA						**300,50kg**	

ACERO BORDILLO SENTIDO ROTONDA A SANTA MARTA C.D.

No.	Figura	Longitud Varilla (m)	No. Varilla	Cantidad	peso	Peso (Kg)	Item
B1	VARIA DE 0.5 MT A 0.20 MT	0,35	4	50	1,00 kg/m	17,50 Kg	BORDILLO
B2	3.8 MT	8,00	4	2	1,00 kg/m	16,00 Kg	BORDILLO
CANTIDAD PRESENTE ACTA						**33,50kg**	

NEW JERSEY (PROTECCION PILAS VIA SANTA MARTA)

No.	Figura	Longitud Varilla (m)	No. Varilla	Cantidad	peso	Peso (Kg)	Item
N1	0.23 MT	0,90	4	280	1,00 kg/m	252,00 Kg	NEW JERSEY VIA SANTA MARTA A CIENAGA
N2	0.40 MT 0.70 MT	1,17	4	280	1,00 kg/m	327,60 Kg	NEW JERSEY VIA SANTA MARTA A CIENAGA
N3	0.40 MT 1.00 MT	1,67	4	187	1,00 kg/m	312,29 Kg	NEW JERSEY VIA SANTA MARTA A CIENAGA
N4	8.80 MT	8,80	5	11	1,55 kg/m	150,04 Kg	NEW JERSEY VIA SANTA MARTA A CIENAGA
N5	2 MT	2,00	5	11	1,55 kg/m	34,10 Kg	NEW JERSEY VIA SANTA MARTA A CIENAGA
N6	12.00 MT	12,00	5	44	1,55 kg/m	818,40 Kg	NEW JERSEY VIA SANTA MARTA A CIENAGA
CANTIDAD PRESENTE ACTA						**1.894,43kg**	

DISIPADOR k0+030 ACCESO A CIENAGA

No.	Figura	Longitud Varilla (m)	No. Varilla	Cantidad	peso	Peso (Kg)	Item
D11	1.40 MT	2,10	4	12	1,00 kg/m	25,20 Kg	DISIPADOR #1 SENTIDO CIENGA - ROTONDA COSTADO DERECHO
D12	2.50 MT	2,10	4	8	1,00 kg/m	16,80 Kg	DISIPADOR #1 SENTIDO CIENGA - ROTONDA COSTADO DERECHO
CANTIDAD PRESENTE ACTA						**42,00kg**	

DISIPADOR K0+120 ACCESO A CIENAGA

No.	Figura	Longitud Varilla (m)	No. Varilla	Cantidad	peso	Peso (Kg)	Item
D21	1.40 MT	2,10	4	14	1,00 kg/m	29,40 Kg	DISIPADOR #2 SENTIDO CIENGA - ROTONDA COSTADO DERECHO
D22	2.50 MT	2,50	4	8	1,00 kg/m	20,00 Kg	DISIPADOR #2 SENTIDO CIENGA - ROTONDA COSTADO DERECHO
CANTIDAD PRESENTE ACTA						**49,40kg**	

DISIPADOR K0+225 ACCESO A CIENAGA

No.	Figura	Longitud Varilla (m)	No. Varilla	Cantidad	peso	Peso (Kg)	Item
D31	1.40 MT	2,63	4	20	1,00 kg/m	52,50 Kg	DISIPADOR #3 SENTIDO CIENAGA - ROTONDA COSTADO DERECHO
D32	3.7 MT	3,70	4	8	1,00 kg/m	29,60 Kg	DISIPADOR #3 SENTIDO CIENAGA - ROTONDA COSTADO DERECHO
CANTIDAD PRESENTE ACTA						**82,10kg**	

CANAL DISIPADOR K0+160 CALZADA DERECHA

No.	Figura	Longitud Varilla (m)	No. Varilla	Cantidad	peso	Peso (Kg)	Item
DK 01	1.40 MT	2,30	4	120	1,00 kg/m	276,00 Kg	DISIPADOR K0+160
DK02	12,00	12,00	4	16	1,00 kg/m	192,00 Kg	DISIPADOR K0+160
CANTIDAD PRESENTE ACTA						**468,00kg**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos**	**NO DE ORDEN**	**49,2**	**UNIDAD**	m

FRENTE DE OBRA	SECTOR	LONGITUD	NUMERO DE LINEAS	LONGITUD TOTAL
FRENTE 3	VIA	1.252,55	4,00	5.010,20
FRENTE 4	VIA	1.568,00	5,00	7.840,00
	GLORIETA DE SEVILLANO			432,50
FRENTE 5	VIA	512,00	5,00	2.560,00
FRENTE 6	VIA	922,00	5,00	4.610,00
FRENTE 7	CALZADA IZQUIERDA			915,82
	CALZADA DERECHA			1.304,10
	BY PASS			188,77
	SALIDA A BOSCONIA			663,86
	GLORIETA			427,86
	SALIDA A SANTA MARTA			504,24
	ACCESO SANTA MARTA 2			455,09
	ACCESO SANTA MARTA 1			415,92
	ACCESO A CIENAGA			648,45
CANTIDAD TOTAL CALCULADO				25.976,80
COBRADOS ACTAS ANTERIORES				-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39				25.976,80

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	39	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**900.2. Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)**	**NO DE ORDEN**	**57**	**UNIDAD**	**m3-Km**






DESCRIPCION	ITEM	VOLUMEN COLOCADO	RELACION ENTRE DENSIDADES SECA	VOLUMEN AJUTADO	KM (FRENTE CERO)	M3-KM
MATERIAL DE EXCAVACION	210.2.2	6.835,02		6.835,02	19,00	129.865,46
MATERIAL DE EXCAVACION	600.1.1P	2.223,91	1.194,70	2.223,91	19,00	42.254,27
MATERIAL DE TERRAPLEN	220.1P	917,13	1,57	1.439,89	30,50	43.916,77
MATERIAL DE PEDRAPLEN	221.1P	2.377,78	1,57	3.733,11	30,50	113.859,97

DESCRIPCION	ITEM	VOLUMEN	RELACION DE DENSIDADES SECA	VOLUMEN AJUTADO	KM (FRENTE 3)	M3-KM
MATERIAL DE EXCAVACION	600.1.1P	1.781,98		1.781,98	21,125	37.644,41

DESCRIPCION	ITEM	VOLUMEN	RELACION DE DENSIDADES SECA	VOLUMEN AJUTADO	KM (FRENTE 7)	M3-KM
MATERIAL DE EXCAVACION	210.2.2	24.617,69		24.617,69	17,10	420.962,42
MATERIAL DE EXCAVACION	600.1.1P	3.454,39		3.454,39	17,10	59.070,07
MATERIAL DE TERRAPLEN	220.1P	13.437,96	1,57	21.097,59	28,067	592.146,08
MATERIAL MEJORAMIENTO	230.1P	16.470,19	1,57	25.858,20	28,067	725.762,05

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	2.165.481,50
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	2.039.675,89
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39	125.805,61

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORI**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.11. Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga**	**NO DE ORDEN**	**60**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
MURO EN CONCRETO - FRENTE CERO	M3	275,01
PUENTE PEATONAL OASIS	M3	16,65
MURO EN CONCRETO GRADESA - FRENTE 7	M3	111,47
ESTRIBO 1 DEL PUENTE 1	M3	14,22
ATRAQUE ALCANTARILLA ACCESO A GRADESA	M3	6,23
MURO EN CONCRETO - APROCHE DEL PUENTE	M3	619,97
PLACA ACCESO A GRADESA - FRENTE 7	M3	6,12
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		1.049,68
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		950,93
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39		98,74

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.11. Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga**		**NO DE ORDEN**	**60**	**UNIDAD** m3

MURO EN CONCRETO DE GRADESA


MODULO	ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	AREA	VOLUMEN
1	VASTAGO	6,20	0,4	4,01		9,94
	ZAPATA	6,20	3,5	0,45		9,765
2	VASTAGO	6,20	0,4	3,44		8,53
	ZAPATA	6,20	3,3	0,45		9,207
3	VASTAGO	6,20	0,4	3,30		8,17
	ZAPATA	6,20	3,3	0,45		9,207
4	VASTAGO	6,20	0,4	3,13		7,75
	ZAPATA	6,20	3,3	0,45		9,207
5	VASTAGO	12,20	0,4	2,45		11,93
	ZAPATA	12,20	2,4	0,40		11,712
ADICIONAL	VASTAGO			0,40	19,18	7,67
	ZAPATA			0,45	18,61	8,37
TOTAL						**111,47**



ESQUEMA MURO ADICIONAL DE GRADESA

ESTRIBO 1- PUENTE 1

ELEMENTO	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN
Pantalla	12	0,4	2,4	11,52
Mensula	12	0,5	0,45	2,7
TOTAL				**14,22**

LOCALIZACION	DIMENSIONES				TOTAL
	LONGITUD	ANCHO (m) / AREA (m2)	ALTO (m)	CANTIDAD PARCIAL	
ALCANTARILLA EN ACCESO GRADESA 	12,20	0,70	0,80	1,00	6,83
	-12,20	0,049			-0,60
CANTIDAD PRESENTE ACTA					**6,23**

MURO EN CONCRETO - APROCHE DEL PUENTE - BORDE IZQUIERDO

Modulo	Seccion	Elemento	Longitud	Ancho/Altura	Espesor	Volumen 35 Mpa
1	003-A/007	Zapata	3,2	6,65	0,65	13,83
		Muro	3,2	5,78	0,53	9,71
2	003-I/007	Zapata	9,2	4,65	0,55	23,53
		Muro	9,2	4,95	0,48	21,63
3	003-K/007	Zapata	12,2	4,35	0,5	26,54
		Muro	12,2	4,49	0,45	24,62
4	003-L/007	Zapata	12,2	4,1	0,45	22,51
		Muro	12,2	4,00	0,43	20,74
5	003-M/007	Zapata	12,2	4,1	0,45	22,51
		Muro	12,2	3,61	0,43	18,69
6	003-N/007	Zapata	12,2	3,8	0,4	18,54
		Muro	12,2	3,30	0,4	16,10
7	003-O/007	Zapata	12,2	3,5	0,4	17,08
		Muro	12,2	2,85	0,4	13,91
8	003-P/007	Zapata	12,2	3,25	0,4	15,86
		Muro	12,2	2,44	0,4	11,91
9	003-Q/007	Zapata	6,2	3,75	0,4	9,30
		Muro	6,2	2,15	0,4	5,32
TOTAL CONCRETO						**312,33**

MURO EN CONCRETO - APROCHE DEL PUENTE - BORDE DERECHO

Modulo	Seccion	Elemento	Longitud	Ancho/Altura	Espesor	Volumen 35 Mpa
1	003-A/004	Muro Pantalla	11,15	4,16	0,53	24,35
		Zapata	3,2	6,65	0,65	13,83
		Muro	3,2	5,05	0,53	8,48
2	003-B/004	Zapata	9,2	4,65	0,55	23,53
		Muro	9,2	4,89	0,48	21,37
3	003-C/004	Zapata	12,2	4,35	0,5	26,54
		Muro	12,2	4,43	0,45	24,29
4	003-D/004	Zapata	12,2	4,1	0,45	22,51
		Muro	12,2	3,91	0,43	20,27
5	003-E/004	Zapata	12,2	3,8	0,4	18,54
		Muro	12,2	3,32	0,4	16,20
6	003-F/004	Zapata	12,2	3,5	0,4	17,08
		Muro	12,2	2,87	0,4	13,98
7	003-G/004	Zapata	12,2	3,25	0,4	15,86
		Muro	12,2	2,46	0,4	12,00
8	003-H/004	Zapata	12,2	3,75	0,4	18,30
		Muro	12,2	2,15	0,4	10,49
9	003-I/004	Zapata	0	3,75	0,4	-
		Muro	0	1,95	0,4	-
TOTAL CONCRETO						**307,64**

DESCRIPCION	LONGITUD	ANCHO	ALTO (m)	VOLUMEN
PLACA DE ACCESO A GRADESA	5,10	6,00	0,20	6,12

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON AMORES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Geomalla de refuerzo tipo UX-135 o similar para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.**	**NO DE ORDEN**	**62**	**UNIDAD**	m2

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	AREA
MURO EN TIERRA ARMADA - APROCHE 1	M2	FRENTE CERO	3.390,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			3.390,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			3.390,00

GEOMALLA

UBICACIÓN	CAPA	# LADOS	ANCHO (m)	LARGO (m)	AREA (m2)	OBSERVACIÓN
ESTRIBO 1	1,00	2,00	7,10	36,00	511,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	2,00	2,00	5,30	36,00	382,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	3,00	2,00	5,30	36,00	382,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	4,00	2,00	5,30	36,00	382,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	5,00	2,00	5,30	36,00	382,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	6,00	2,00	5,30	36,00	382,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	7,00	2,00	5,30	36,00	382,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	1,00	1,00	7,10	15,00	107,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	2,00	1,00	5,30	15,00	80,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	3,00	1,00	5,30	15,00	80,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	4,00	1,00	5,30	15,00	80,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	5,00	1,00	5,30	15,00	80,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	6,00	1,00	5,30	15,00	80,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	7,00	1,00	5,30	15,00	80,00	**MURO PANTALLA**
CANTIDAD TOTAL CALCULADO					**3.390,0**	



ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

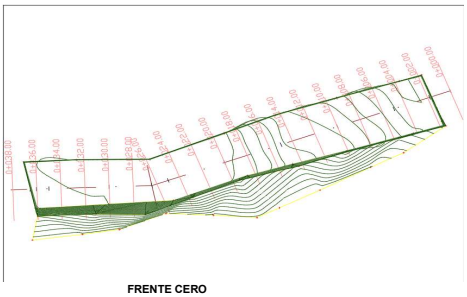
PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**683.2.Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.**	**NO DE ORDEN**	**63**	**UNIDAD**	m2

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	AREA
CONECTATE DERECHA - IZQUIERDA Y RETORNO	M2	FRENTE CERO	3.115,42
VIA DE SERVICIO	M2	FRENTE CERO	1.790,21
MURO EN CONCRETO GRADESA	M2	FRENTE 7	228,82
MURO EN TIERRA ARMADA - APROCHE 1	M2	FRENTE CERO	1.477,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			6.611,45
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			5.134,45
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			1.477,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



FRENTE CERO



Elaboró
EL CONTRATISTA

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma



Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39


SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIA**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**683.2.Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.**	**NO DE ORDEN**	**63**	**UNIDAD**	m2

CONECTANTES DEL FRENTE CERO			
DESCRIPCION	**LONGITUD**	**ANCHO**	**AREA**
MURO EN CONCRETO	219,3	1,23	269,74
CONECTANTE IZQUIERDA	219,3	6	1.315,80
CONECTANTE IZQUIERDA			371,88
CONECTANTE DERECHA	175	6	1.050,00
RETORNO			108,00
TOTAL			**3.115,42**

VIA DE SERVICIO			
DESCRIPCION	**LONGITUD**	**ANCHO**	**AREA**
TRAMO 1	135	5	675,00
TRAMO 2	20	5,25	105,00
TRAMO 3	60	5	300,00
TRAMO 4	110	5	550,00
EMPALME CON CALLE 12	34,73	4,613	160,21
TOTAL			**1790,21**

MURO EN CONCRETO DE GRADESA	
ESQUEMA	**AREA**
	116,05
	78,66
	14,93
	19,18
TOTAL	**228,82**

MURO EN TIERRA ARMADA- ESTRIBO 1						
UBICACIÓN	**CAPA**	**# LADOS**	**ANCHO (m)**	**LARGO (m)**	**AREA (m2)**	**OBSERVACIÓN**
ESTRIBO 1	1,00	2,00	2,43	36,00	175,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	2,00	2,00	2,43	36,00	175,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	3,00	2,00	2,43	36,00	175,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	4,00	2,00	2,43	36,00	175,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	5,00	2,00	2,43	36,00	175,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	6,00	2,00	2,43	36,00	175,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	7,00	2,00	2,43	36,00	175,00	**TRAMO RECTO**
ESTRIBO 1	1,00	1,00	2,43	15,00	36,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	2,00	1,00	2,43	15,00	36,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	3,00	1,00	2,43	15,00	36,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	4,00	1,00	2,43	15,00	36,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	5,00	1,00	2,43	15,00	36,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	6,00	1,00	2,43	15,00	36,00	**MURO PANTALLA**
ESTRIBO 1	7,00	1,00	2,43	15,00	36,00	**MURO PANTALLA**
TOTAL					**1.477,0**	



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

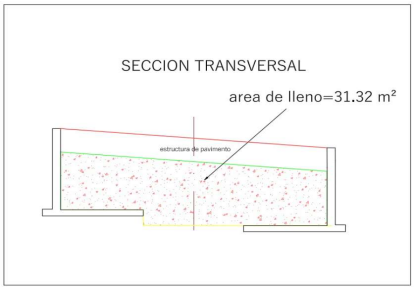
Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Relleno con material seleccionado para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga**	**NO DE ORDEN**	**65**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	AREA	LONG	VOLUMEN
APROCHE 1 DEL PUENTE	M3	31,32	36,00	1.127,52
CANTIDAD TOTAL CALCULADO				1.127,52
COBRADOS ACTAS ANTERIORES				-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39				1.127,52

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma


Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39


SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIA**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**683.5P. Suministro e instalación de tubería PVC novafort de 4" perforada en el PR9 de la variante cienaga.**	**NO DE ORDEN**	**66**	**UNIDAD**	ml

DESCRIPCION	INICIO	FINAL	LONGITUD
MURO EN CONCRETO DEL FRENTE CERO	K8+810	k9+029	219,30
MURO EN CONCRETO GRADESA DEL FRENTE 7	K0+015	k0+052	37,08
MURO EN CONCRETO APROCHE 1			72,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			328,38
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			256,38
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			72,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



LONGITUD =219.30 M
FRENTE CERO



FRENTE 7

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Defensas en concreto tipo I en concreto 4000 PSI (No incluye acero de refuerzo) para el PR9 de la variante de Ciénaga**	**NO DE ORDEN**	**75**	**UNIDAD**	**M**

UBICACIÓN	INICIAL	FINAL	LADO	UNIDAD	LONGITUD
Muro Concreto - Frente cero			Izquierdo	ml	210,14
Puente 4	K9+721	K9+486	Derecho	ml	235,00
	K9+721	K9+486	Izquierdo	ml	235,00
Puente 3	K9+486	K9+291	Derecho	ml	195,00
	K9+486	K9+291	Izquierdo	ml	195,00
Puente 2	K9+291	K9+205	Derecho	ml	85,00
	K9+291	K9+205	Izquierdo	ml	85,00
Puente 1	K8+986	K9+206	Derecho	ml	220,00
	K8+986	K9+206	Izquierdo	ml	220,00
Debajo del puente via santa Marta a Cienaga					20,00
Muro Concreto Gradesa- Frente 7					37,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO					**1.737,14**
COBRADOS ACTAS ANTERIORES					**1.277,14**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39					**460,00**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**230.1P. Mejoramiento de la subrasante con material seleccionado**	**NO DE ORDEN**	**80**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	VOLUMEN
MEJORAMIENTO CALZADA IZQUIERDA Y DERECHA	M3	FRENTE 7	10.405,84
MEJORAMIENTO GLORIETA -ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA	M3	FRENTE 7	3.943,74
MEJORAMIENTO ACCESO A GRADESA	M3	FRENTE 7	264,80
MEJORAMIENTO SALIDA A BOSCONIA	M3	FRENTE 7	924,82
MEJORAMIENTO ACCESO A SANTA MARTA	M3	FRENTE 7	931,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			16.470,19
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			15.539,19
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			931,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:
Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**220.1P. Terraplenes (incluye material seleccionado de cantera)**	**NO DE ORDEN**	**4**	**UNIDAD**	m3


MEJORAMIENTO ACCESO A GRADESA

Abscisa	long	Area m2	Promedio area	Vol m3	Vol Acumulado m3
k0+010		2,02			
k0+012	1,65	7,59	4,81	7,93	7,93
k0+015	3,35	5,36	6,48	21,69	29,62
k0+020	5	5,94	5,65	28,25	57,87
k0+023	2,71	5,15	5,55	15,03	72,90
k0+025	2,29	4,74	4,95	11,32	84,22
k0+030	5	3,67	4,21	21,03	105,25
k0+035	5	3,53	3,60	18,00	123,25
k0+040	5	3,14	3,34	16,68	139,92
k0+045	5	3,07	3,11	15,53	155,45
k0+050	5	3,08	3,08	15,38	170,82
k0+055	5	2,8	2,94	14,70	185,52
k0+060	5	3,07	2,94	14,68	200,20
k0+065	5	3,43	3,25	16,25	216,45
k0+070	5	3,27	3,35	16,75	233,20
k0+075	5	2,49	2,88	14,40	247,60
k0+080	5	1,61	2,05	10,25	257,85
k0+085	5	1,17	1,39	6,95	264,80
TOTAL					**264,80**

MEJORAMIENTO SALIDA A BOSCONIA

Abscisa	long	Area m2	Promedio area	Vol m3	Vol Acumulado m3
k0+030		3,26			
k0+035	5,18	5,94	4,60	23,83	23,83
k0+040	4,82	10,59	8,27	39,84	63,67
k0+050	10	10,87	10,73	107,30	170,97
k0+060	10	8,79	9,83	98,30	269,27
k0+070	10	1,65	5,22	52,20	321,47
k0+080	10	1,46	1,56	15,55	337,02
k0+090	10	2,98	2,22	22,20	359,22
k0+100	10	7,07	5,03	50,25	409,47
k0+110	10	10,14	8,61	86,05	495,52
k0+120	10	7,6	8,87	88,70	584,22
k0+130	10	5,34	6,47	64,70	648,92
k0+140	10	5,16	5,25	52,50	701,42
k0+150	10	4,61	4,89	48,85	750,27
k0+160	10	3,11	3,86	38,60	788,87
k0+170	10	3,35	3,23	32,30	821,17
k0+180	10	3,5	3,43	34,25	855,42
k0+190	10	2,79	3,15	31,45	886,87
k0+200	10	1,78	2,29	22,85	909,72
k0+210	10	1,24	1,51	15,10	924,82
TOTAL					**924,82**

FRENTE 7

ESQUEMA	SECTOR	AREA	ESPESOR	VOLUMEN
	ACCESO SANTA MARTA 1	930,89	1,00	930,89
TOTAL				**931,00**

Elaboró

EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**

Residente de Obra

Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó

EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**

Residente de Interventoría

Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITO**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**450.1.1P. Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 modificada con asfalto tipo III**	**NO DE ORDEN**	**81**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	FRENTE CERO	169,37
CONECTANTE DERECHA	M3	FRENTE CERO	96,27
RETORNO	M3	FRENTE CERO	17,23
VIA PARA DESVIO DEL TRAFICO	M3	FRENTE CERO	30,75
CALZADA DERECHA- CALZADA IZQUIERDA- GLORIETA-SALIDA A BOSCONIA- ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA Y ACCESO GRADESA	M3	FRENTE 7	2.121,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			2.434,62
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			2.374,62
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			60,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD






Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**450.1.1P. Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 modificada con asfalto tipo III**	**NO DE ORDEN**	**81**	**UNIDAD**	m3

FRENTE CERO

ESQUEMA	SECTOR	AREA	ESPESOR	VOLUMEN
	CONECTANTE IZQUERDA	1.693,74	0,10	169,37
	CONECTANTE DERECHA	962,65	0,1	96,27
	RETORNO	61,28	0,1	6,13
	EMPALME CONECTANTE DERECHA	146,08	0,076	11,10
	VIA PARA DESVIO DEL TRAFICO	307,52	0,1	30,75
	TOTAL			**313,62**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

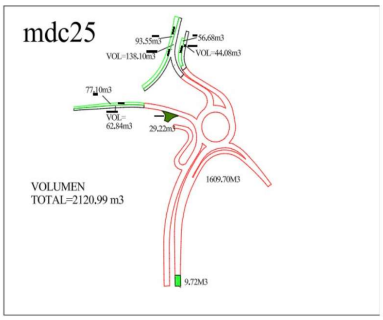
Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**450.1.1P. Mezcla densa en caliente tipo MDC-25 modificada con asfalto tipo III**	**NO DE ORDEN**	**81**	**UNIDAD**	m3

FRENTE 7

ESQUEMA	SECTOR	AREA	ESPESOR	VOLUMEN
	CALZADA DERECHA-CALZADA IZQUIERDA-GLORIETA-SALIDA A BOSCONIA- ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA Y ACCESO GRADESA	17.945,14	0,105	1.884,24
	RENIVELACION PARA EMPALME CON VIA EXISTENTE	216	0,045	9,72
	RENIVELACION DE ACCESO A CIENAGA Y SALIDA A SANTA MARTA			227,03
	TOTAL			**2.121,00**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.13. Concreto de clase 28 MPA, para obras hidraulicas.**	**NO DE ORDEN**	**83**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
CANAL EN CONCRETO K10+432 a K11+240	FRENTE 3	m3	879,63
CANAL EN CONCRETO GRADESA	FRENTE 7	m3	544,99
CANAL EN CONCRETO DESDE OBRA EXISTENTE - OH14	FRENTE 7	m3	37,62
CANAL EN CONCRETO GLORIETA DEL OH4 A OH6 Y OH3	FRENTE 7	m3	135,08
CANAL EN CONCRETO DESDE OH5 AL OH6	FRENTE 7	m3	24,28
CANAL EN CONCRETO PUNTO BAJO K0+310 A CAJA Nº3	FRENTE CERO	m3	43,65
MURO - BORDILLO	FRENTE 7	m3	9,84
CANAL DEL OH12 A LA OBRA EXISTENTE K0+115	FRENTE 7	m3	42,09
CANAL DEL OH11 A LA OBRA EXISTENTE K0+115	FRENTE 7	m3	31,00
TAPA PARA CAJA DE ALCANTARILLA ACCESO SANTA MARTA 1	FRENTE 7	m3	0,34
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			1.748,53
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			1.675,10
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			73,43

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39


SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**Concreto de clase 28 MPA, para obras hidraulicas.**	**NO DE ORDEN**	**83**	**UNIDAD**	m3

CANAL EN CONCRETO DESDE OH5 AL OH6

DETALLE	DESCRIPCION	CANT	AREA (m2)	LONGITUD (ml)	VOLUMEN (m3)
	MUROS		0,44	33,16	14,51
	LOSA DE PISO		24,50	0,35	8,58
	LLAVE DE FUNDACIÓN ENTRADA Y SALIDA	1	0,50	1,7	0,85
	LLAVE DE FUNDACIÓN INTERMEDIA	1	0,14	2,43	0,35
TOTAL					**24,28**

CANAL EN CONCRETO DEL PUNTO BAJO K0+310 A CAJA Nº3 EN FRENTE CERO

DETALLE	DESCRIPCION	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (m3)
	LOSA INFERIOR	56,8	1,00	0,20	11,57
	MURO DERECHO	56,8	0,30	0,75	12,83
	MURO IZQUIERDO	56,8	0,24	0,75	10,13
	TAPAS DEL CANAL	56,8	1,00	0,10	5,70
	BORDILLO	56,8	0,20	0,3	3,42
TOTAL					**43,65**


MURO - BORDILLO DEL FRENTE 7

AREA	LONG	VOLUMEN
0,40	24,60	9,84


TAPA PARA ALCANTARILLA- ACCESO SANTA MARTA 1

LONG	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
1,50	1,50	0,15	0,34

CANAL DEL OH12 A LA OBRA EXISTENTE K0+115

DETALLE	DESCRIPCION	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (m3)
	LOSA INFERIOR	54,1	1,40	0,20	15,15
	MURO DERECHO	53,1	1,25	0,2	13,28
	MURO IZQUIERDO	48,5	1,25	0,2	12,13
	LLAVES INTERMEDIAS	0,45	1,70	0,3	0,92
	LLAVES GRANDES	0,6	1,70	0,3	0,61
TOTAL					**42,09**

CANAL DEL OH11 A LA OBRA EXISTENTE K0+115

DETALLE	DESCRIPCION	LONG	ANCHO	ALTO	VOLUMEN (m3)
	LOSA INFERIOR	34,6	1,40	0,20	9,69
	MURO DERECHO	34,6	1,68	0,2	11,59
	MURO IZQUIERDO	34,6	1,25	0,2	8,65
	LLAVES INTERMEDIAS	0,45	1,70	0,3	0,46
	LLAVES GRANDES	0,6	1,70	0,3	0,61
TOTAL					**31,00**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.14. Concreto de clase 28 MPA, para box culvert con sección interna 1.0 x 1.0**	**NO DE ORDEN**	**84**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
BOX CULVERT DE SERVICIO K12+500	FRENTE 4	m3	30,26
BOX CULVERT OH-014	FRENTE 7	m3	26,39
BOX CULVERT OH-013	FRENTE 7	m3	16,58
BOX CULVERT OH-012	FRENTE 7	m3	19,64
BOX CULVERT OH-011	FRENTE 7	m3	36,83
BOX CULVERT OH-010	FRENTE 7	m3	18,31
BOX CULVERT OH-09	FRENTE 7	m3	17,11
BOX CULVERT OH-08	FRENTE 7	m3	34,81
BOX CULVERT OH-07	FRENTE 7	m3	40,47
BOX CULVERT OH-06	FRENTE 7	m3	35,94
BOX CULVERT OH-05	FRENTE 7	m3	64,42
BOX CULVERT OH-04	FRENTE 7	m3	33,59
BOX CULVERT OH-03	FRENTE 7	m3	24,33
BOX CULVERT OH-02	FRENTE 7	m3	32,44
BOX CULVERT OH-01	FRENTE 7	m3	19,98
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			451,09
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			441,81
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			9,28

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD



Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Concreto de clase 28 MPA, para box culvert con sección interna 1.0 x 1.0**		**NO DE ORDEN**	**84**	**UNIDAD** **m3**


BOX DE SERVICIO K12+500

DESCRIPCION		ELEMENTO	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (m3)
	DESCOLE	LOSA INFERIOR	11,14		0,25	2,785
		VASTAGO DERECHO	7,8		0,4	3,12
		VASTAGO IZQUIERDO	6,57		0,4	2,628
		LLAVE DE CIERRE LOSA INFERIOR	0,09	7,3		0,657
	ENCOLE	ZARPA IZQUIERDA	12,22		0,4	4,888
		ZARPA DERECHA	14,57		0,4	5,828
		VASTAGO DERECHO	14,26		0,4	5,704
		VASTAGO IZQUIERDO	10,4		0,4	4,16
		EMPALME CUNETA DERECHA	1,86		0,1	0,186
		EMPALME CUNETA IZQUIERDA	3,04		0,1	0,304
TOTAL						**30,26**

BOX CULVERT- OH-014

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	20,6			25,75	CUERPO DE BOX
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
		1,35	0,25	1,5	0,51	PANTALLA
TOTAL					**26,39**	

BOX CULVERT- OH-13

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	10,27			12,84	CUERPO DE BOX
	1,25	0,8			1,00	AMPLIACION CUERPO DE BOX
	2,7		0,25		0,68	LOSA ENCOLE
	2,7		0,25		0,68	MURO CAJA
	2,7		0,25		0,68	MURO CAJA
	1,5		0,25		0,38	MURO CAJA
	1,35		0,25		0,34	MURO CAJA
TOTAL					**16,58**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**Concreto de clase 28 MPA, para box culvert con sección interna 1.0 x 1.0**	**NO DE ORDEN**	**84**	**UNIDAD**	m3

BOX CULVERT- OH-12

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	10,3			12,88	CUERPO DE BOX
	1,92		0,25		0,48	LOSA ENCOLE
	0,39		1,1		0,43	MURO CAJA
	0,39		1,6		0,62	MURO CAJA
	0,18		2,09		0,38	MURO CAJA
	0,18		2,09		0,38	MURO CAJA
		1,5	0,3	0,25	0,11	GUARDA RUEDA DESCOLE
	8,52		0,25		2,13	LOSA DESCOLE
	1,66		0,3		0,50	LLAVE DESCOLE
		3,1	1,125	0,25	1,74	ALETAS DESCOLE (2UND)
TOTAL					**19,64**	

BOX CULVERT- OH-11

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	27,2			34,00	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
		1,5	1,5	0,25	0,56	CAJA
		5	1,6	0,25	2,00	CAJA
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**36,83**	

BOX CULVERT- OH-010

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	8,8			11,00	CUERPO DE BOX DERECHO
	2,34		0,25		0,59	LOSA ENCOLE
	0,38		1		0,38	MURO CAJA
	0,38		2,4		0,91	MURO CAJA
	0,26		1,88		0,49	MURO CAJA
	0,26		1,887		0,49	MURO CAJA
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
	8,42		0,25		2,11	LOSA DESCOLE
	1,69		0,30		0,51	LLAVE DESCOLE
		3,02	0,25	1,13	1,71	ALETAS DESCOLE (2UND)
TOTAL					**18,31**	

BOX CULVERT- OH-09

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	8			10,00	CUERPO DE BOX DERECHO
	2,03		0,25		0,51	LOSA ENCOLE
	0,38		1,11		0,42	MURO CAJA
	0,38		2,6		0,99	MURO CAJA
	0,21		1,99		0,42	MURO CAJA
	0,21		1,99		0,42	MURO CAJA
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
	8,14		0,25		2,04	LOSA DESCOLE
	1,64		0,3		0,49	LLAVE DESCOLE
		3,01	1,13	0,25	1,70	ALETAS DESCOLE (2UND)
TOTAL					**17,11**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**Concreto de clase 28 MPA, para box culvert con sección interna 1.0 x 1.0**	**NO DE ORDEN**	**84**	**UNIDAD**	m3

BOX CULVERT- OH8

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
 	1,25	16			20,00	CUERPO BOX CULVERT
		1,6	0,35	0,3	0,17	GUARDA RUEDA ENCOLE
	8,36		0,25		2,09	LOSA ENCOLE
	1,74		0,3		0,52	LLAVE ENCOLE
	0,55		1,15		1,27	ALETAS ENCOLE (2UND)
		1,6	0,35	0,3	0,17	GUARDA RUEDA DESCOLE
	8,36		0,25		2,09	LOSA DESCOLE
	1,74		0,3		0,52	LLAVE DESCOLE
	0,55		1,15		1,27	ALETAS DESCOLE (2UND)
		6,4	0,25	4,2	6,72	LOSA ENTRE BOX 8 Y BOX7
TOTAL					**34,81**	

BOX CULVERT- OH7

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	24,15			30,19	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,3	0,25	0,11	GUARDA RUEDA ENCOLE
	11,08		0,25		2,77	LOSA ENCOLE
	1,83		0,3		0,55	LLAVE ENCOLE
		3,21	1,13	0,25	0,91	ALETAS ENCOLE
		3,06	1,13	0,25	0,86	ALETAS ENCOLE
		1,5	0,3	0,25	0,11	GUARDA RUEDA DESCOLE
	10,7			0,25	2,68	LOSA DESCOLE
	1,85		0,3		0,56	LLAVE DESCOLE
		3,08	1,13	0,25	1,74	ALETAS DESCOLE (2UND)
TOTAL					**40,47**	

BOX CULVERT- OH-06

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	25,01			31,26	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
	8,91		0,25		2,23	LOSA ENCOLE
	1,8		0,3		0,54	LLAVE ENCOLE
		3,15	1,13	0,25	1,78	ALETAS ENCOLE (2UND)
						PANTALLA
TOTAL					**35,94**	

BOX CULVERT- OH-05

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	43			53,75	CUERPO DE BOX DERECHO
		2,92	0,35	0,25	0,26	GUARDA RUEDA ENCOLE
	11,34		0,25		2,84	LOSA ENCOLE
	1,78		0,3		0,53	LLAVE ENCOLE
		3,08	1,13	0,25	0,87	ALETAS ENCOLE
		3	1,13	0,25	0,85	ALETAS ENCOLE
		2,9	0,35	0,25	0,25	GUARDA RUEDA DESCOLE
	11,4		0,25		2,85	LOSA DESCOLE
	1,8		0,3		0,54	LLAVE DESCOLE
		2,95	1,13	0,25	0,83	ALETAS DESCOLE
		3,02	1,13	0,25	0,85	ALETAS DESCOLE
TOTAL					**64,42**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Concreto de clase 28 MPA, para box culvert con sección interna 1.0 x 1.0**		**NO DE ORDEN**	**84**	**UNIDAD** m3

BOX CULVERT- OH-04

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	20,45			25,56	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
	8,36		0,25		2,09	LOSA ENCOLE
	1,74		0,3		0,52	LLAVE ENCOLE
	0,55		1,15		1,27	ALETAS ENCOLE (2UND)
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
	8,36		0,25		2,09	LOSA DESCOLE
	1,74		0,3		0,52	LLAVE DESCOLE
	0,55		1,16		1,28	ALETAS DESCOLE (2UND)
TOTAL					**33,59**	

BOX CULVERT- OH-03

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	14			17,50	CUERPO DE BOX DERECHO
	2,49		0,25		0,62	LOSA ENCOLE
	0,38		1,17		0,44	MURO CAJA
	0,38		1,68		0,64	MURO CAJA
	0,28		1,99		0,56	MURO CAJA
	0,28		1,99		0,56	MURO CAJA
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
	7,39		0,25		1,85	LOSA DESCOLE
	1,39		0,3		0,42	LLAVE DESCOLE
		2,54	1,13	0,25	0,72	ALETAS DESCOLE
		3,16	1,13	0,25	0,89	ALETAS DESCOLE
TOTAL					**24,33**	

BOX CULVERT- OH-02

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	18,45			23,06	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
	8,4		0,25		2,10	LOSA ENCOLE
	1,72		0,3		0,52	LLAVE ENCOLE
		3,07	1,13	0,25	1,73	ALETAS ENCOLE (2UND)
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
		9,38	0,25		2,35	LOSA DESCOLE
		1,84	0,3		0,55	LLAVE DESCOLE
		3,31	1,13	0,25	1,87	ALETAS DESCOLE (2UND)
TOTAL					**32,44**	

BOX CULVERT- OH-01

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	15,8			19,75	CUERPO DE BOX
		1,5	0,3	0,25	0,11	GUARDA RUEDA ENCOLE
		1,5	0,3	0,25	0,11	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**19,98**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.16 Concreto de clase 21 MPA, para obras hidraulicas.**	**NO DE ORDEN**	**85**	**UNIDAD**	m3

Elemento	Ubicacion	Unidad	Volumen
CAJAS PARA CARCAMO	FRENTE CERO	m3	4,53
ALCANTARILLA	FRENTE CERO	m3	1,64
DESARENADORES	FRENTE 3	m3	5,46
DISIPADORES	FRENTE 3	m3	30,80
CANALES TRAPEZOIDALES	FRENTE 7	m3	51,71
DISIPADORES	FRENTE 7	m3	14,25
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			**108,39**
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			**96,68**
PENDIENTE COBRO POR FALTA DE CANTIDADES CONTRACTUALES			**2,12**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			**9,59**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD





Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXION PUMAREJO				
ITEM	**630.16 Concreto de clase 21 MPA, para obras hidraulicas.**		**NO DE ORDEN**	**85**	**UNIDAD** m3

CANAL TRAPEZOIDAL - FRENTE 7

Esquema	Ubicación	Origen	Final	Area	Longitud	Volumen
		Punto Bajo K0+165	OH12	0,273	38,84	10,60
		Punto Bajo K0+065	OH03	0,273	15,60	4,26
		Disipador 1	OH13	0,273	44,09	12,04
		Disipador 2	Cuneta	0,273	40,96	11,18
		Punto Bajo K0+135	OH08	0,273	39,94	10,90
		Punto Bajo K0+080 (Acceso Gradesa)	Empalme Tuberia Alcantarillado	0,273	10,00	2,73
TOTAL					**189,43**	**51,71**

ESQUEMA	DESCRIPCION	LONG (m)	ANCHO (m) / AREA (m2)	ESPESOR	CANT	TOTAL
DISIPADOR K0+330 CALZADA IZQUIERDA	Huella y ContraHuella	9,00	1,50	0,15	1,00	2,03
	Muros Laterales	7,10	0,68	0,15	2,00	1,45
DISIPADOR k0+030 ACCESO A CIENAGA	Losa	2,18	1,50	0,15	1,00	0,49
	Muros Laterales	2,25	0,33	0,15	2,00	0,22
DISIPADOR K0+120 ACCESO A CIENAGA	Losa	2,55	1,50	0,15	1,00	0,57
	Muros Laterales	2,55	0,30	0,15	2,00	0,23
DISIPADOR K0+225 ACCESO A CIENAGA	Losa	5,10	1,50	0,15	1,00	1,15
	Muros Laterales	7,25	0,60	0,15	1,00	0,65
CANAL DISIPADOR K0+160 CALZADA DERECHA	Losa	23,70	1,50	0,15	1,00	5,33
	Muros Laterales	23,70	0,30	0,15	2,00	2,13
TOTAL						**14,25**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39


SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**671.1.1. Cuneta de concreto 21 MPA vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo.**	**NO DE ORDEN**	**87**	**UNIDAD**	m3

Elemento	Ubicacion	Unidad	Volumen
CUNETAS CALZADA DERECHA	FRENTE 3	m3	54,39
CUNETAS CALZADA IZQUIERDA	FRENTE 3	m3	31,27
CUNETAS	FRENTE 7	m3	240,50
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			**326,17**
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			**279,17**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			**47,00**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma


Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39


SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**671.1.1. Cuneta de concreto 21 MPA vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo.**		**NO DE ORDEN**	**87**	**UNIDAD** m3


CUNETAS CALZADA DERECHA EN FRENTE 3						
Elemento	**Abcisa Inicial**	**Abcisa Final**	**Long**	**Espesor**	**Area**	**Volumen**
Cuneta Tipo 2 - Calzada derecha	K10+520	K10+700	180,00		0,12	21,60
Cuneta Tipo 1 - Calzada derecha	K10+700	K10+967	267,00		0,12	32,04
Cuneta de Empalme	K10+517	K10+520		0,10	2,52	0,25
Cuneta de entrega a Disipadores				0,10	3,01	0,30
Cuneta de entrega a Disipadores				0,10	2,00	0,20
TOTAL						**54,39**

CUNETAS CALZADA IZQUIERDA EN FRENTE 3						
Elemento	**Abcisa Inicial**	**Abcisa Final**	**Long**	**Espesor**	**Area**	**Volumen**
Cuneta Tipo 1 - Calzada Izquierda	K10+515	K10+770	255,00		0,12	30,60
Cuneta de entrega a disipador K10+690			1,5	0,1	0,9	0,135
Cuneta de entrega a disipador K10+770			1,5	0,1	0,9	0,135
Cuneta Empalme Con New Jersey				0,20	1,53	0,31
Cuneta Empalme Con New Jersey				0,10	0,96	0,10
TOTAL						**31,27**

CUNETAS - FRENTE 7					
Esquema	**Tipo**	**Long**	**Espesor**	**Ancho**	**Volumen**
	Cuneta Tipo 1	1.167,50	0,10	1,40	163,45
	Cuneta Tipo 2	830,00	0,10	0,90	74,70
	Cuneta - Muro bordillo	25	0,1	0,94	2,35
TOTAL					**240,50**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**Cerca de alambre de Puas con postes de concreto**	**NO DE ORDEN**	**88**	**UNIDAD**	**ml**

Elemento	Ubicacion	Unidad	Volumen
	Frente 7	Ml	470,80
	Frente Cero	Ml	217,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			**687,80**
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			**470,80**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39			**217,00**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/09/2025 a 30/09/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORI**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Suministro e instalación de cinta PVC H= 15 cm**		**NO DE ORDEN**	**89**	**UNIDAD** **m**

DESCRIPCION	UBICACIÓN	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL	TOTAL
BOX CULVERT OH-01	FRENTE 7	31,7	11,70	43,40
BOX CULVERT OH-02	FRENTE 7	36,9	11,70	48,60
BOX CULVERT OH-03	FRENTE 7	28	11,70	39,70
BOX CULVERT OH-04	FRENTE 7	41,66	15,60	57,26
BOX CULVERT OH-05	FRENTE 7	86	23,40	109,40
BOX CULVERT OH-06	FRENTE 7	50,02	15,60	65,62
BOX CULVERT OH-07	FRENTE 7	48,3	15,60	63,90
BOX CULVERT OH-08	FRENTE 7	32	11,70	43,70
BOX CULVERT OH-09	FRENTE 7	16	7,80	23,80
BOX CULVERT OH-10	FRENTE 7	17,6	7,80	25,40
BOX CULVERT OH-11	FRENTE 7	54,4	22,50	76,90
BOX CULVERT OH-12	FRENTE 7	20,6	7,80	28,40
BOX CULVERT OH-13	FRENTE 7	20,54	7,80	28,34
BOX CULVERT OH-14	FRENTE 7	41	11,70	52,70
CANAL EN CONCRETO K10+432 a K11+240	FRENTE 3		205,40	205,40
CANAL EN CONCRETO GRADESA	FRENTE 7		130,20	130,20
CANAL EN CONCRETO DESDE OBRA EXISTENTE - OH14	FRENTE 7		12,60	12,60
CANAL EN CONCRETO GLORIETA DEL OH4 A OH6 Y OH3	FRENTE 7		33,60	33,60
CANAL EN CONCRETO DESDE OH5 AL OH6	FRENTE 7		12,60	12,60
MURO- BORDILLO	FRENTE 7		26,40	26,40
CANAL DEL OH12 A LA OBRA EXISTENTE K0+115	FRENTE 7		15,60	15,60
CANAL DEL OH11 A LA OBRA EXISTENTE K0+115	FRENTE 7		11,70	11,70
CANTIDAD TOTAL CALCULADO				**1.155,22**
COBRADOS ACTAS ANTERIORES				**1.127,92**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39				**27,30**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**Suministro e instalación de señal vertical reglamentaria, preventiva o informativa (SP, SR, SI), formato 90x90 cm en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al Manual de Señalización Vial 2024**	**NO DE ORDEN**	**91**	**UNIDAD**	u

EQUEMA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SR-01 Pare	2,00
	SR-04 No pase	1,00
	SR-10 Prohibido girar en "U"	2,00
	SR-11 Circulación en ambos sentidos	1,00
	SR-26 Prohibido adelantar	3,00
	SR-28A No parquear ni detenerse	1,00
	SR-17 Vehículos pesados a la derecha	4,00
	SR-30 Velocidad máxima 60km/h	34,00
	SR-32 Altura máxima permitida	2,00
	SR-30B Velocidad máxima permitida salida	-
	SP-03 Curva pronunciada a la izquierda	3,00
	SP-04 Curva pronunciada a la derecha	4,00
	SP-13 Vía lateral derecha	1,00
	SP-15 Bifurcación en "Y"	1,00
	SP-17 Bifurcación a la derecha	2,00
	SP-21 Incorporación de transito desde la izquierda	-
	SP-22 Incorporación de transito desde la derecha	1,00
	SP-30 Reducción de la calzada a la izquierda	1,00
	SP-34 Ensanchamiento de la calzada a la izquierda	1,00
	SP-39 Dos sentidos de transito	1,00
	SP-55 Iniciación de separador (dos sentidos)	1,00
	SP-56 Terminación de vía con separador (dos sentidos)	1,00
	SP-59 Ciclistas en la vía (reflectivo verde limón)	1,00
	SI-22 Estación de servicio a 1 km	1,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		69,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39		69,00

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Suministro e instalación de señal vertical reglamentaria SR-02, formato triangular de 120 cm por lado, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024**	**NO DE ORDEN**	**92**	**UNIDAD**	u

EQUEMA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SR-02 Ceda el paso	11,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		11,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39		11,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Suministro e instalación de señal vertical preventiva y/o reglamentaria SP-17, SP-20 y SR-20, formato tipo dúplex de 90x90 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024**	**NO DE ORDEN**	**93**	**UNIDAD**	**u**

EQUEMA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SP-17 Bifurcación a la derecha y SR-30 Velocidad máxima 40km/h	
	SR-20 Prohibido circulación de peatones y SR-28 Prohibido parquear	3,00
	SP-20 Glorieta y SR-30 Velocidad máxima 30km/h	7,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		10,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39		10,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025			
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**			
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO						
ITEM	**Suministro e instalación de señal vertical informativa SI-06, formato tipo H de 212x106 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024**		**NO DE ORDEN**	**94**	**UNIDAD**	**u**	

EQUEMA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SI-06 Santa marta / Bosconia (TIPO H DOBLE PARAL) 212 cm x 106 cm	1,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		1,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39		1,00

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025		
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**		
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO					
ITEM	**Suministro e instalación de señal vertical informativa SI-05A, formato tipo H de hasta 190x50 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024**	**NO DE ORDEN**	**95**	**UNIDAD**	**u**	

EQUEMA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SI-05A Sevillano 172 cm x 50 cm	
	SI-05A Sta. Marta 184 cm x 50 cm	1,00
	SI-05A Ciénaga 158 cm x 50 cm	1,00
	SI-05A B/quilla 150 cm x 50 cm	1,00
	SI-05A Bosconia 150 cm x 50 cm	1,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39		4,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Suministro e instalación de señal vertical preventiva SP-75, formato 40x50 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024**	**NO DE ORDEN**	**97**	**UNIDAD**	u

EQUEMA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SP-75 Delineador de curva horizontal color amarillo 40 cm x 50 cm	52,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		52,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39		52,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Suministro y montaje de señal vertical informativa elevada tipo bandera SI-05, formato 770X358 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024**	**NO DE ORDEN**	**104**	**UNIDAD**	u

EQUEMA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SI-05 Santa marta / Ciénaga/ sevillano 770 cm x 358 cm	1,00
	SI-05 Barranquilla / sevillano / ciénaga 770 cm x 358 cm	1,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		2,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39		2,00

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°39

SOPORTE DEL ACTA No.	**39**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/09/2025 a 30/09/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Suministro y montaje de señal vertical informativa elevada tipo pórtico SI-05, formato 673x358 cm, en lámina de aluminio con recubrimiento retrorreflectivo Tipo XI, conforme al manual de señalización vial 2024**	**NO DE ORDEN**	**106**	**UNIDAD**	u

EQUEMA	DESCRIPCION	CANTIDAD
	SI-05 Sta. Marta / Bosconia	1,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		1,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 39		1,00

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL
