Factura Proforma

Fecha de Expedición: **dic.-24**
Fecha de Vencimiento: **ene.-25**

Vendedor:	**CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**	**Cliente:**	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT:	**901.588.183-1**	**NIT:**	**800.215.807-2**
Dirección:	CR 11 96 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO	**Dirección:**	CRA 59 26 60 11001. 11 COL
Ciudad:	BOGOTA D.C	**Ciudad:**	BOGOTA, D.C.
Departamento:	CUNDINAMARCA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Pais:	COLOMBIA	**Pais:**	COLOMBIA
Telefono:	6549871	**Telefono:**	7056000
Correo:	lrestrepo@mincivil.com	**Correo:**	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Contacto:		**Contacto:**	

Autorización número de Facturación Electronica DIAN 187640134993321 del 20/05/2021 al 20/05/2022 Autoriza con Prefijo MPC del 1 al 200

Nombre del Vendedor CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA
Orden de Compra
Avisos de Despacho 600 mts al sur de la estación del ferrocarril, Ciénaga, Magdalena
Aviso de Recibo

Forma de pago Credito
Medio de Pago Credito ACH

ID	Código Principal	Descripcion	Cantidad	UM	Precio unitario	Desc.	Cargos	Brutos	%IVA	IVA	Obseq.
1		COSTO DIRECTO + ADMINISTRACIÓN + IMPREVISTOS DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 30 A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024.	1		$ 1.468.884.504,00	-	-	$ 1.468.884.504,00		-	
2		UTILIDAD (5%) DEL ACTA N° 30 VR OBRA EJECUTADA A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024. OBJETO CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".	1		$ 58.755.380,00	-	-	$ 58.755.380,00	19	11.163.522,00	
3		GESTION PREDIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 30 VR A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024.	1		$ 18.628.500,00	-	-	$ 18.628.500,00	19	3.539.415,00	
4		ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 30 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024.	1		$ 270.850.640,00	-	-	$ 270.850.640,00		-	
5		ADMINISTRACIÓN GESTION PREDIAL (2.5%) DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 30 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024.				-	-	$ -	19	-	
6		GESTION SOCIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 30 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024.	1		$ 589.428.233,00	-	-	$ 589.428.233,00	-	-	
7		ADMINISTRACIÓN GESTION SOCIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 30 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024.	1		$ 14.735.706,00	-	-	$ 14.735.706,00	19	2.799.784,00	
8		ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 30 VR EJECUTADO A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024.				-	-		19	-	
9		GESTION AMBIENTAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 30 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2024.						$ -	-	-	

total lineas	6,00
Bruto/Sobtotal	$2.421.282.963,00
IVA	$17.502.721,00
Descuentos	
Cargos	
Base + cargos - descuentos	$0,00
Brutos + impuestos	$2.438.785.684,00
Total de anticipos	$322.943.160,00
Total a pagar	**$2.115.842.524,00**

VALOR EN LETRAS: **DOS MIL CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

Observaciones
#$24-02-00;981-2022;ldiazp@invias.gov.co#$ Amortizacion Anticipo $322.943.160,00

Por favor consignar en la cuenta corriente del Banco BBVA Colombia S.A. N° 833032519 a nombre del Consorcio Viaducto Ciénaga del Magdalena.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4
FECHA	dic.-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE -

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No. 30

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.421.282.963,00

MES Diciembre de 2024.

CONTRATO No : **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL: **72,1 MESES** PLAZO ACUMULADO: **72,1 MESES**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **27/07/2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **31/07/2028**

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$630.007.748.262,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$630.007.748.262,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$** -

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 DE FECHA 31/10/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9,00	$ 1.537.478,00	$ 13.837.302,00		$ -		$ -		$ -
1,1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		6,00	$ 9.224.868,00		$ -		$ -
1,2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		3,00	$ 4.612.434,00		$ -	0,62	$ 953.236,00
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	100,00	$ 125.703,00	$ 12.570.300,00	3.239,70	$ 407.240.009,10	64,13	$ 8.061.333,00	2.063,92	$ 259.440.936,00
3	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	46.419,00	$ 10.191,00	$ 473.056.029,00	46.419,00	$ 473.056.029,00	724,44	$ 7.382.768,00	4.968,69	$ 50.635.920,00
4	220.1P		220.1P	Terraplenes (incluye material seleccionado de cantera)	m3	23.159,00	$ 31.904,00	$ 738.864.736,00	23.159,00	$ 738.864.736,00		$ -	917,13	$ 29.260.116,00
Subtotal								**$ 1.238.328.367,00**		**$ 1.632.998.076,10**		**$ 15.444.101,00**		**$ 340.290.208,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
5	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	9.818,00	$ 145.679,00	$ 1.430.276.422,00	9.818,00	$ 1.430.276.422,00	164,02	$ 23.894.270,00	1.435,62	$ 209.139.686,00
6	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	7.159,00	$ 161.149,00	$ 1.153.665.691,00	7.159,00	$ 1.153.665.691,00	206,84	$ 33.332.059,00	450,45	$ 72.589.567,00
7	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	80,00	$ 175.996,00	$ 14.079.680,00	80,00	$ 14.079.680,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 2.598.021.793,00**		**$ 2.598.021.793,00**		**$ 57.226.329,00**		**$ 281.729.253**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
8	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	35.796,00	$ 2.786,00	$ 99.727.656,00	39.072,00	$ 108.854.592,00		$ -		$ -
9	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	150.540,00	$ 1.766,00	$ 265.853.640,00		$ -		$ -		$ -
9,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		69.004,00	$ 121.861.064,00		$ -		$ -
9,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		81.536,00	$ 143.992.576,00		$ -		$ -
10	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	3.534,00	$ 948.454,00	$ 3.351.836.436,00	3.534,00	$ 3.351.836.436,00		$ -		$ -
11	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8.271,00	$ 956.591,00	$ 7.911.964.161,00		$ -		$ -		$ -
11,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		5.417,00	$ 5.181.853.447,00		$ -		$ -
11,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		2.854,00	$ 2.730.110.714,00		$ -		$ -
12	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	100,00	$ 984.206,00	$ 98.420.600,00	100,00	$ 98.420.600,00		$ -		$ -
13	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	11.340,00	$ 83.576,00	$ 947.751.840,00		$ -		$ -		$ -
14	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	11.340,00	$ 90.230,00	$ 1.023.208.200,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$ 13.698.762.533,00**		**$ 11.736.929.429,00**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
15	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	1.344,00	$ 16.721,00	$ 22.473.024,00		$ -		$ -		$ -
15,1	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00		2.939,59	$ 49.152.847,54	768,25	$ 12.845.908,00	2.592,74	$ 43.353.206,00
15,2	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00		444,00	$ 7.424.124,00		$ -		$ -
16	600.2.4P		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	269,00	$ 49.053,00	$ 13.195.257,00		$ -		$ -		$ -
16,1	600.2.4P		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		142,00	$ 6.965.526,00		$ -		$ -
16,2	600.2.4P		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		127,00	$ 6.229.731,00		$ -		$ -
17	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	728,00	$ 58.765,00	$ 42.780.920,00		$ -		$ -		$ -
17,1	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		2.601,00	$ 152.847.765,00	261,17	$ 15.347.655,00	614,71	$ 36.123.433,00
17,2	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		127,00	$ 7.463.155,00		$ -		$ -
18	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	23.307,00	$ 120.830,00	$ 2.816.184.810,00	23.307,00	$ 2.816.184.810,00		$ -		$ -
19	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	152,00	$ 162.739,00	$ 24.736.328,00	152,00	$ 24.736.328,00		$ -		$ -
20	621.1.P		621.1.P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,0 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m	1.750,00	$ 1.750.000,00	$ 3.062.500.000,00	1.382,00	$ 2.418.500.000,00		$ -		$ -
21	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,30 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m	2.030,00	$ 2.300.000,00	$ 4.669.000.000,00		$ -		$ -		$ -
22	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto huecos prefabricados, concreto fc = 50 MPA de diametro 1,20 m, transporte e hincado con viga lanzadora (No incluye acero de refuerzo y no incluye transporte producto de las excavaciones) incluye suministro de elementos metálicos de conexión y platina de continuidad	m	81.657,00	$ 1.795.026,00	$ 146.576.438.082,00	75.780,09	$ 136.027.231.832,34		$ -		$ -
23	621.5.1P		621.5.1P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.3m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m	609,00	$ 3.530.001,00	$ 2.149.770.609,00	609,00	$ 2.149.770.609,00		$ -		$ -
24	621.5.2P		621.5.2P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.0m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m	525,00	$ 2.937.153,00	$ 1.542.005.325,00	525,00	$ 1.542.005.325,00		$ -		$ -
25	630.1.P		630.1.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado, para moldes prefabricados de dados para puentes	m3	4.262,00	$ 2.331.990,00	$ 9.938.941.380,00	4.262,00	$ 9.938.941.380,00		$ -		$ -
26	630.2.P		630.2.P	Concreto clase 50 MPA, para vigas artesa prefabricadas preesforzadas lanzadas, postensado de puentes	m3	38.365,00	$ 2.022.409,00	$ 77.589.721.285,00		$ -		$ -		$ -
27	630.3.P		630.3.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado en segunda etapa para dados, conformación del tablero y vigas riostra	m3	23.835,00	$ 1.238.934,00	$ 29.529.991.890,00	23.835,00	$ 29.529.991.890,00		$ -		$ -
28	630.4.P		630.4.P	Concreto clase A, 50 Mpa, reforzado, para barreras de tráfico, colocación de concreto sobre tablero	m3	4.587,00	$ 1.277.842,00	$ 5.861.461.254,00	4.587,00	$ 5.861.461.254,00		$ -		$ -
29	630.6P		630.6P	Concreto clase 35 MPA para Dados de cimentación	m3	1.912,00	$ 1.064.792,00	$ 2.035.882.304,00	1.912,00	$ 2.035.882.304,00		$ -		$ -
30	630.7P		630.7P	Concreto clase 35 MPA para tablero, vigas riostra y anden	m3	3.672,00	$ 1.124.254,00	$ 4.128.260.688,00	3.672,00	$ 4.128.260.688,00		$ -	959,76	$ 1.079.014.019,00
31	630.8P		630.8P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	335,00	$ 1.446.638,00	$ 484.623.730,00	335,00	$ 484.623.730,00	25,45	$ 36.816.937,00	295,18	$ 427.018.605,00
32	630.9P		630.9P	Concreto clase 28 MPA para estribos	m3	1.184,00	$ 1.003.819,00	$ 1.188.521.696,00	1.184,00	$ 1.188.521.696,00	378,43	$ 379.875.224,00	879,63	$ 882.989.307,00
33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	42,00	$ 792.029,00	$ 33.265.218,00	42,00	$ 33.265.218,00		$ -	23,20	$ 18.375.073,00
34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	27,00	$ 574.960,00	$ 15.523.920,00	127,00	$ 73.019.920,00	26,17	$ 15.046.703,00	86,72	$ 49.860.531,00
35	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	2.950,00	$ 643.891,00	$ 1.899.478.450,00	2.950,00	$ 1.899.478.450,00		$ -		$ -
36	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	22.816.890,00	$ 6.750,00	$ 154.014.007.500,00		$ -		$ -		$ -
36,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.750,00		112.562,00	$ 759.793.500,00	19.544,27	$ 131.923.823,00	43.591,13	$ 294.240.128,00
36,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.750,00		13.804.068,00	$ 93.177.459.000,00		$ -		$ -
36,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.750,00		5.695.450,00	$ 38.444.287.500,00	3.881,25	$ 26.198.438,00	45.022,50	$ 303.901.875,00
36,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.750,00		3.204.810,00	$ 21.632.467.500,00		$ -	342.104,85	$ 2.309.207.738,00
37	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	31.267.401,00	$ 2.105,00	$ 65.817.879.105,00	31.267.401,00	$ 65.817.879.105,00		$ -		$ -
38	642.1	642-13		Apoyo elastomérico	u	627,00	$ 5.284.823,00	$ 3.313.584.021,00	627,00	$ 3.313.584.021,00		$ -		$ -

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FECHA: dic.-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE -

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No. 30

VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.421.282.963,00

MES Diciembre de 2024.

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL: **72,1 MESES** PLAZO ACUMULADO: **72,1 MESES**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **27/07/2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **31/07/2028**

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$630.007.748.262,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$630.007.748.262,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ -**

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 DE FECHA 31/10/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
39	642,2P		642,2P	Junta para puente,recorrido 400 mm	m	106,00	$ 52.400.000,00	$ 5.554.400.000,00	106,00	$ 5.554.400.000,00		$ -		$ -
40	642,3P		642,3P	Junta para puente,recorrido 225 mm	m	64,00	$ 20.320.751,00	$ 1.300.528.064,00	64,00	$ 1.300.528.064,00		$ -		$ -
41	650.2	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	570.180,00	$ 15.000,00	$ 8.552.700.000,00	4.126.456,50	$ 61.896.847.565,17		$ -	2.367.304,38	$ 35.509.565.700,00
42	650.3	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	570.180,00	$ 174,00	$ 99.211.320,00	4.126.456,50	$ 718.003.431,76		$ -	1.451.957,64	$ 252.640.629,00
43	650.4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	570.180,00	$ 4.226,00	$ 2.409.580.680,00	4.126.456,50	$ 17.438.405.187,36		$ -	1.451.957,64	$ 6.135.972.987,00
44	661.1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	300,00	$ 653.594,00	$ 196.078.200,00	300,00	$ 196.078.200,00		$ -		$ -
45	671.1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	344,00	$ 615.232,00	$ 211.639.808,00	344,00	$ 211.639.808,00		$ -		$ -
46	673.1	673-13		Geotextil tipo NT 2400 no tejido	m2	1.450,00	$ 7.418,00	$ 10.756.100,00	1.450,00	$ 10.756.100,00		$ -		$ -
47	673.2	673-13		Material granular drenante	m3	202,00	$ 126.990,00	$ 25.651.980,00	2.202,00	$ 279.631.980,00		$ -		$ -
48	673.3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	27,00	$ 169.551,00	$ 4.577.877,00	27,00	$ 4.577.877,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 535.135.350.825,00**		**$ 511.138.297.422,17**		**$ 618.054.688,00**		**$ 47.342.263.231,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD														
49	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	31.998,00	$ 1.897,00	$ 60.700.206,00		$ -		$ -		$ -
49,1	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		10.158,00	$ 19.269.726,00		$ -		$ -
49,2	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		21.840,00	$ 41.430.480,00		$ -		$ -
50	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	480,00	$ 22.984,00	$ 11.032.320,00		$ -		$ -		$ -
50,1	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		158,00	$ 3.631.472,00		$ -		$ -
50,2	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		322,00	$ 7.400.848,00		$ -		$ -
51	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	711,00	$ 7.990,00	$ 5.680.890,00		$ -		$ -		$ -
51,1	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		678,00	$ 5.417.220,00		$ -		$ -
51,2	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		476,00	$ 3.803.240,00		$ -		$ -
52	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	38,00	$ 384.891,00	$ 14.625.858,00		$ -		$ -		$ -
52,1	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		19,00	$ 7.312.929,00		$ -		$ -
52,2	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		25,00	$ 9.622.275,00		$ -		$ -
53	730.1	730-13		Defensa metalica	m	1.682,00	$ 222.702,00	$ 374.584.764,00	1.682,00	$ 374.584.764,00		$ -		$ -
54	730.2	730-13		Sección final	u	8,00	$ 98.987,00	$ 791.896,00	8,00	$ 791.896,00		$ -		$ -
55	740.1	740-13		Captafaros	u	8,00	$ 21.130,00	$ 169.040,00	549,00	$ 11.600.370,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 467.584.974,00**		**$ 484.865.220,00**		**$ -**		**$ -**
OBRAS VARIAS														
56	810.1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	1.250,00	$ 18.785,00	$ 23.481.250,00	1.250,00	$ 23.481.250,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 23.481.250,00**		**$ 23.481.250,00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES														
57	900.2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	188.641,00	$ 1.121,00	$ 211.466.561,00	513.316,09	$ 575.427.340,17	36.703,15	$ 41.144.231,00	237.534,13	$ 266.275.760,00
Subtotal								**$ 211.466.561,00**		**$ 575.427.340,17**		**$ 41.144.231,00**		**$266.275.760**
58	621.2P		621.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,33 con concreto tremie 35 Mpa en suelos cenagosos (incluye excavación bajo agua, incluye acero de refuerzo, incluye adecuación de la zona, no incluye camisas metálica).	m		$ 4.716.115,00		1.410,00	$ 6.649.722.150,00	114,00	$ 537.637.110,00	1.262,00	$ 5.951.737.130,00
59	630,1	630-13		Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 1.825.395,00		470,00	$ 857.935.650,00		$ -	366,19	$ 668.441.395,00
60	630,11	630-13		Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 1.511.509,00		338,00	$ 510.890.042,00	12,98	$ 19.619.387,00	287,99	$ 435.299.477,00
61	630,12	630-13		Concreto clase 28 MPA para cimentación de Defensas en concreto para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 954.668,00		501,00	$ 478.288.668,00		$ -		$ -
62	683,1	630-13		Geomalla de refuerzo tipo UX-135 o similar para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 34.026,00		20.670,00	$ 703.317.420,00		$ -		$ -
63	683,2	683-13		Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 12.626,00		10.970,00	$ 138.507.220,00	498,00	$ 6.287.748,00	4.533,75	$ 57.243.128,00
64	683,3	683-13		Geotextil NT 2500 para separación de suelos de subrasante y capas granulares en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 12.590,00		4.836,00	$ 60.885.240,00		$ -		$ -
65	683,4	683-13		Relleno con material seleccionado para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga	m3		$ 94.817,00		7.520,00	$ 713.023.840,00		$ -		$ -
66	683.5P		683.5P	Suministro e instalación de tubería PVC novafort de 4" perforada en el PR9 de la variante cienaga.	m		$ 37.206,00		3.220,00	$ 119.803.320,00		$ -	219,30	$ 8.159.276,00
67	221.1P		221.1P	Pedraplen Compacto	m3		$ 79.854,00		4.889,00	$ 390.406.206,00	255,33	$ 20.389.122,00	2.084,23	$ 166.434.102,00
68	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, NO incluye la preparación de la superficie de apoyo en el PR9 de la variante cienaga	m		$ 82.321,00		1.792,00	$ 147.519.232,00	35,00	$ 2.881.235,00	325,00	$ 26.754.325,00
69	720,1	720-13		Poste de referencia	u		$ 476.085,00		23,00	$ 10.949.955,00		$ -		$ -
70	642.2	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 30cm*20cm*3cm	u		$ 128.232,00		28,00	$ 3.590.496,00		$ -	16,00	$ 2.051.712,00
71	642.3	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de diametro 65 cm espesor 10 cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	u		$ 3.068.904,00		24,00	$ 73.653.696,00		$ -	3,00	$ 9.206.712,00
72	642.4	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 53cm*58cm*10cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	u		$ 2.423.682,00		30,00	$ 72.710.460,00		$ -	30,00	$ 72.710.460,00
73	621.5.3P		621.5.3P	Camisa metálica permanente para pilote de diámetro 1.33 m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m		$ 3.725.643,00		1.260,00	$ 4.694.310.180,00	42,00	$ 156.477.006,00	975,00	$ 3.632.501.925,00
74	621.7.1P		621.7.1P	Pruebas de Integridad de Pilotes (PIT) - ASTM D5882	u		$ 1.575.439,00		6,00	$ 9.452.634,00		$ -	4,00	$ 6.301.756,00
75	731.1	731-13		Defensas en concreto tipo I en concreto 4000 PSI (No incluye acero de refuerzo) para el PR9 de la variante de Ciénaga	m		$ 323.326,00		2.101,00	$ 679.307.926,00		$ -	680,14	$ 219.906.946,00

FECHA: dic.-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE - | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA | **ACTA No.** 30 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.421.282.963,00 | **MES** Diciembre de 2024.

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022** | INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL:	**72,1 MESES**	PLAZO ACUMULADO:	**72,1 MESES**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	**27/07/2022**	FECHA DE VENCIMIENTO:	**31/07/2028**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	**$630.007.748.262,00**	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	**$ -**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	**$630.007.748.262,00**		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 DE FECHA 31/10/2024 CANTIDAD	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
76	201.14.1P		201.14.1P	Traslado de línea de conducción de agua potable de 12", en el tramo comprendido entre las abscisas K8+656 y el K9+206, desde el frente Cero hasta la pila 4 del Viaducto de la Variante de Ciénaga.	Global		$ 872.643.912,00		1,00	$ 872.643.912,00		$ -	0,95	$ 829.011.716,00
77	201.14.2P		201.14.2P	Traslado de redes de media y baja tensión, en el tramo comprendido entre las abscisas K8+656 y el K9+206, desde el frente cero hasta la pila 4 del viaducto de la variante de ciénaga.	Global		$ 463.148.385,00		1,00	$ 463.148.385,00		$ -	0,95	$ 439.990.966,00
78	500.1	500-13		Pavimento de concreto hidráulico tipo MR40 (Incluye barras de transferencia de cargas, barras de amarre y canastilla de fijación).	m3		$ 1.384.303,00		470,40	$ 651.176.131,20	37,91	$ 52.478.927,00	358,17	$ 495.815.806,00
79	650.5P		650.5P	Protección de estructuras metálicas con pinturas resistentes a ambientes costeros	kg		$ 1.566,00		2.437.718,71	$ 3.817.467.499,86		$ -	1.691.149,64	$ 2.648.340.336,00
Subtotal								**$ -**		**$ 22.118.710.263,06**		**$ 795.770.535,00**		**$ 15.669.907.168,00**
				Ajuste al peso						$ 254,50				
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)								**$ 553.372.996.303,00**		**$ 550.308.731.048,00**		**$ 1.527.639.884,00**		**$ 63.900.465.620,00**
				PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES				$ 32.410.096.979,00		$ 32.410.096.979,00				$ 10.996.532.107,00
				DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA				$ 600.000.000,00		$ 600.000.000,00				$ -
*				PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS				$ 300.000.000,00		**$ 300.000.000,00**				$ -
				VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES				**$ 586.683.093.282,00**		**$ 583.618.828.027,00**		$ 1.527.639.884,00		$ 74.896.997.727,00
				VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				$ 4.287.299.528,00		$ 4.264.906.820,00		$ 11.163.522,00		$ 547.324.214,00
*				**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)**				**$ 590.970.392.810,00**		**$ 587.883.734.847,00**		**$ 1.538.803.406,00**		**$ 75.444.321.941,00**
				REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)				$ 3.996.575.000,00		$ 3.996.575.000,00				$ 3.995.574.999,00
				IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)				$ 759.349.250,00		$ 759.349.250,00		$ -		$ 759.159.252,00
*				**TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) + (2) = (B)**				**$ 4.755.924.250,00**		**$ 4.755.924.250,00**		**$ -**		**$ 4.754.734.251,00**
				GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C				**$ 33.777.431.202,00**		**$ 33.777.431.202,00**		$ 899.982.278,00		$ 11.950.634.682,00
				PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)				**$ 504.000.000,00**		**$ 504.000.000,00**				$ -
				BOLSA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS (L)						$ 2.593.830.221,00				$ 2.592.830.221,00
				IVA - BOLSA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS 19% (M)						$ 492.827.742,00				$ 492.637.742,00
				TOTAL BOLSA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS.N= (L) + (M)						**$ 3.086.657.963,00**		**$ -**		**$ 3.085.467.963,00**
*				**VALOR TOTAL = (A) + (B) + (C) + (D) + (N)**				**$ 630.007.748.262,00**		**$ 630.007.748.262,00**		**$ 2.438.785.684,00**		**$95.235.158.837,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

	Valor Obra	%	Valor Adquisición Predial	%	Valor Anticipo Total	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 23.430.829.352,80	100%	$ 6.569.170.647,20	100%	$ 30.000.000.000,00	100%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 52.092.520,00	0,22%	$ 270.850.640,00	4,12%	$ 322.943.160,00	1,08%
Valor Amortizado Acumulado	$ 3.114.684.624,00	13,29%	$ 2.427.124.838,00	36,95%	$ 5.541.809.462,00	18,47%
Valor Saldo por Amortizar	$ 20.316.144.728,80	86,71%	$ 4.142.045.809,20	63,05%	$ 24.458.190.538,00	81,53%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1.527.639.884,00	$ 11.163.522,00	$ 1.538.803.406,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%	$ 893.643.079,00	$ 6.339.199,00	$ 899.982.278,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$2.421.282.963,00**	**$17.502.721,00**	**$2.438.785.684,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 35.833.223,00	$ 506.724.310,00
SB	$ 23.894.270,00	$ 209.139.686,00
B	$ 33.332.059,00	$ 72.589.567,00
P	$ -	$ -
OA	$ 1.393.436.101,00	$ 62.405.745.331,00
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ 439.990.966,00
T	$ 41.144.231,00	$ 266.275.760,00
TOTAL	**$1.527.639.884,00**	**$ 63.900.465.620,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de Explanación	$ 35.833.223	$ 506.724.310,00
2. Sub-bases y bases	$ 57.226.329	$ 281.729.253,00
3. Transporte de materiales	$ 41.144.231	$ 266.275.760,00
4. Aceros y elementos metálicos	$ 158.122.261	$ 47.453.869.393,00
5. Concretos, morteros y obras varias	$ 83.553.725	$ 1.879.208.728,00
6. Concreto para estructura de puentes	$ 1.145.472.367	$ 13.371.446.164,00
7 . Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 6.287.748	$ 141.212.012,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste		$ -
TOTAL	**$1.527.639.884,00**	**$ 63.900.465.620,00**

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

FECHA: dic.-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE -

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No. 30

VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.421.282.963,00

MES Diciembre de 2024.

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022**

INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL:	**72,1 MESES**	PLAZO ACUMULADO:	**72,1 MESES**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	**27/07/2022**	FECHA DE VENCIMIENTO:	**31/07/2028**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	**$630.007.748.262,00**	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	**$ -**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	**$630.007.748.262,00**		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACIÓN No. 04 DE FECHA 31/10/2024		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN/REINTEGRO DE ANTICIPO: **$2.421.282.963,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN/REINTEGRO DE ANTICIPO: **$2.098.339.803,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$2.115.842.524,00**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **DOS MIL CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES: La facturación de la presente Acta Parcial, corresponde a la intervención mediante ejecución de Obras en el PR9 de la Variante de Ciénaga, así como, la Ejecución de las Actividades Prediales y Sociales requeridas adelantar en desarrollo actualmente y consideradas adelantar bajo el Contrato de Obra No. 981-22. Nota de la Unidad Ejecutora a través de la Gerencia Grupo Norte: Así mismo, la Interventoría del Proyecto CONSORCIO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO, mediante la suscripción del presente documento, valida en su totalidad el cobro por Gestión y Adquisición Predial de la Obra Ejecutada en el Mes de Diciembre de 2024 realizado en el Acta de Obra No. 30 (Diciembre 2024). Igualmente se valida en su totalidad el cobro Social realizado en el Acta de Obra No. 30 (Diciembre 2024). Cobros y Valores relacionados en Pre-Actas Predial y Social No(s). 30 que se adjuntan como soporte de la presenta Acta de Obra No. 30, debidamente aprobados mediante suscripción de la Interventoría del Proyecto.

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: **ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 43.099.356

Firma:
Nombre: **FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: dic.-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE -

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA


PERIODO MES: **Diciembre de 2024.**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **30** (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: **$2.421.282.963,00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	**NHERNANDEZ**		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	dic-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	**NHERNANDEZ**		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	dic-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	**NHERNANDEZ**		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	dic-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FARANGO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	DICIEMBRE DE 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JCDíazG.	JCDíazG.	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	diciembre 2024	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 981 **DE** 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA **NIT.** 901.588.183-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL GERENTE GRUPO NORTE, AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$2.115.842.524,00** VALOR EN LETRAS: **DOS MIL CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: PARCIAL DE OBRA No. 30 **DEL PERIODO** Diciembre de 2024. y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matricula profesional No.: **13202-097750 BLV**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: dic-24
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA**
Matricula profesional No.: **13202-097750 BLV**
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: dic-24
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ**
Matricula Profesional No.: 25202-087354 CND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha Firma: Diciembre de 2024
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por LUIS JAIME DIAZ PEREZ
Nombre: **LUIS JAIME DIAZ PEREZ**
Matrícula Profesional No.: **22202-273807 COR**
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**30**	**Diciembre de 2024.**
PAGO ANTICIPADO		_____	ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO		_____				
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Certificado de disponibilidad presupuestal
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	**215024**	RUBRO No.	**C-2401-0600-91-51102D-2401013-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 2.115.842.524,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	

TOTAL ACTA INCLUIDO IVA **$2.115.842.524,00**

Firma

Nombre: JUAN CARLOS DIAZ GONZALEZ
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula Profesional No.: 25202-087354 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FNANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. **981 de 2022** **Contratista** **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

Objeto del Contrato **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

Acta No. **30** **Valor basico:** **$2.421.282.963,00** **Período:** **Diciembre de 2024.**

Valor incluido el Iva: **$2.438.785.684,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	9007	VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ -	$ -		$ -
2	N/A	PR9 VARIANTE CIENAGA	$ 2.438.785.684,00			$ 2.438.785.684,00
TOTALES			**$2.438.785.684,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$ 2.438.785.684,00**

VALOR ICA Y TASA BOMBERIL DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**MAGDALENA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	SITIO NUEVO	$ -	$ -
	MUNICIPIO 2	CIENAGA	$ 2.438.785.684,00	$ 2.421.282.963,00
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$2.438.785.684,00**	**$2.421.282.963,00**
		REEMBOLSO DE GASTOS GESTIÓN PREDIAL	$ 293.018.555,00	$ 289.479.140,00
		REEMBOLSO DE GASTOS GESTIÓN SOCIAL	$ 606.963.723,00	$ 604.163.939,00
		REEMBOLSO DE GASTOS GESTIÓN AMBIENTAL	$ -	$ -
	DEPARTAMENTO 2			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			
	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
C.C. 19.072.460

Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 43.099.356

CONSORCIO VIADUCTO
CIÉNAGA DEL MAGDALENA


NIT: 901.588.183-1
Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A
Edificio Pijao Corporativo
BOGOTÁ D.C.
PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PARAFISCALES – Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA, identificado con NIT No. 901.588.183-1, certifica: Que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., en el mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Cordialmente,



ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal
C.C. 43.099.356

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14824897845

(415)7707212489984(8020) 000001482489784 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 8 1 8 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 98 07 OF 201 A

42. Correo electrónico notificaciones@mincivil.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 2 8 9 7 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 2 0 1 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 9 61. Fecha 2022 - 04 - 26 / 11 : 28: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ CASTRO JUAN SEBASTIAN
985. Cargo Analista II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14801406161

(415)7707212489984(8020) 000001480140616 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 0 5 4 5	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico notificaciones@mincivil.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 8 9 7 7 0	6 7 6 0 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 2 1 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 2 2 0	0 8 1 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	4 1	4 2	4 8	5 2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 14 / 14 : 03: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14833779077

(415)7707212489984(8020) 000001483377907 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SP INGENIEROS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
SP INGENIEROS S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 74 28 29

42. Correo electrónico jorge.escudero@sp.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 2 5	3 4 1 7 6 0 0	3 4 1 7 4 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	1 9 8 3 0 4 1 2	4 2 9 0	1 9 8 3 0 4 1 2		4 3 1 1	4 6 6 3		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	4 2	4 8	5 2															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 16 / 16 : 14: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUNERA SANCHEZ JORGE IVAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	9 0 5	5 7 1
73. Fecha	1 9 8 3 0 4 1 2	2 0 1 6 0 8 2 5
74. Número de notaría	7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 3 0 4 1 5	2 0 1 7 0 1 3 1
77. No. Matrícula mercantil	2 1 0 7 0 2 8 8 1 2	2 1 0 7 0 2 8 8 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 3 0 4 1 2	1 9 8 3 0 4 1 5
81. Hasta	2 0 5 0 0 4 2 3	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	2 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	8 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 2 1 2 2 0	9 0 0 4 0 2 2 0 8	5
2	2 0	2 0 1 1 1 2 1 6	9 0 0 1 9 0 4 1 7	6
3	7 9	2 0 1 4 0 1 0 1		
4	2 0	2 0 2 1 1 0 2 7	9 0 0 3 5 2 1 9 7	7
5		Año Mes Día		

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1	SP INGENIEROS S.A.S		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA SAS

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 0 0 7 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 0 9 9 1 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUNERA	SANCHEZ	JORGE	IVAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 0 0 7 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 2 4 1 6 0 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALDARRIAGA	SUAREZ	GLORIA	DEL SOCORRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 6 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 2 7 6 7 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALDARRIAGA	SUAREZ	LUIS	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 6 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 7 7 3 8 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALDARRIAGA	PEREZ	ANDRES	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 6 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 8 8 6 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALDARRIAGA	PEREZ	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
APOD. GENERAL 0 7	2 0 0 9 0 6 1 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 4 7 4 1 0 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CAMPO	DE BOTERO	ANA	MARIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 7 0 1 2 6		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 2 5 0 5 1 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
SANCHEZ	VELEZ	ANA	CECILIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 0 3 0		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 2 5 0 5 1 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
SANCHEZ	VELEZ	ANA	CECILIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 2 7 6 7 7 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALDARRIAGA	SUAREZ	LUIS	ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 7 3 8 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALDARRIAGA	PEREZ	ANDRES	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 8 8 6 5 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALDARRIAGA	PEREZ	CARLOS	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 0 9 9 1 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUNERA	SANCHEZ	JORGE	IVAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 2 4 1 6 0 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALDARRIAGA	SUAREZ	GLORIA	DEL SOCORRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
1	Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 1 6 5 6 5		COLOMBIA 1 6 9	GIRALDO	GARCIA	JAIME					2 0 1 6 0 8 2 5	
2	Cédula de Ciudada 1 3	7 0 0 8 4 3 3 2		COLOMBIA 1 6 9	ORTIZ	URIBE	JUAN	CAMILO				2 0 1 6 0 8 2 5	2 0 1 9 0 3 2 8
3	Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 8 2 7 6 4 4 6		COLOMBIA 1 6 9	MUNERA	PEÑA	CAMILO					2 0 1 6 0 8 2 5	
4	Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 2 5 0 5 1 8		COLOMBIA 1 6 9	SANCHEZ	VELEZ	ANA	CECILIA				2 0 1 6 0 8 2 5	
5	Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 0 0 3 4 4 2		COLOMBIA 1 6 9	ORTIZ	VELEZ	MARTHA	ELENA				2 0 1 6 0 8 2 5	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes	3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 6 0 4 0 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMAYA	LOPEZ	LUIS	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 3 5 2 4 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SIERRA	GIRALDO	JORGE	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 5 7 7 5 0 5		1 6 8 6 9 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BARRERA	BARRERA	ELOISA	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE HORWATH CO S.A.

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 3 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 8 7 0 8 4 3 2		1 3 6 5 5 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VILLADA	LOPERA	JUAN	CARLOS

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE HORWATH CO S.A.

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 1 1 2 1 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 7 4 0 0 9 8		8 1 6 6 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESCUDERO	RODAS	JORGE	EDUARDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 4 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: SP INGENIEROS S.A.S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CR 74 28 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 1 3 1 8 0 0 0 2	1 9 8 3 0 4 1 5	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
3 4 1 7 6 0 0		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 26/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE		2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	MAGDALENA
3. AÑO: 2024	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12**		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: TRANSVERSAL DEL CARIBE RUTA 9007		TRAMO: VIADUCTOS HITOS II-III VARIANTE CIENAGA
6. CONTRATO DE OBRA No:	981 DE 2022		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO	NIT	901.581.159-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	977 DE 2022		

11. PLAZO INICIAL:	72,1 MESES	12. FECHA DE INICIO:	27/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	30	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2028
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	10,301,313,086

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	10,301,316,086
21. VR. ANTICIPO:		
22. VR. ADICIÓN No:	N/A	
23. VR. ADICIÓN No:	N/A	
24. VR. TOTAL ADICIONES:	N/A	
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**10,301,316,086**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	**26.** ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1,421,500	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	3	$ 2,842,500	8,527,500
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	1	$ 1,066,000	1,066,000
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 355,500	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1,095,000	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	$ 821,500	0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 273,500	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	**33.** ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	$ 769,000	0
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 384,500	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	$ 384,500	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	**36.** SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 326,500	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 221,500	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	**38.** ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1,366,000	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	1	$ 2,732,500	2,732,500
	40. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAQR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO	0	$ 683,000	0
	41. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	5	$ 877,000	4,385,000
	42. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV.	0	$ 438,500	0
	43. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV.	1	$ 653,000	653,000
	44. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV.	0	$ 326,500	0
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	**45.** OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 353,500	0
	46. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 235,500	0
	47. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ 353,500	0
	48. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 235,500	0
	49. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 118,000	0
	50. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	0	$ 118,000	0
	51. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 471,000	0
	52. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 235,500	0
	53. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 235,500	0
TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	**54.** ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 327,500	0
	55. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 327,500	0
	56. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 109,000	0
	57. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	$ 763,500	0
	58. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 654,500	0
COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	**59.** PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	$ 153,000	0
	60. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 306,000	0
	61. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	2	$ 153,000	306,000
	62.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	2	$ 153,000	306,000
RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	**63.** TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	1	$ 652,500	652,500
DIAGNOSTICO PREDIAL E INFORME DEL SECTOR	PRE DIAGNOSTICO PREDIAL POR KILOMETRO	0	$ 4,740,500	0
	INFORME GENERAL SECTOR URBANO-VALOR CADA 500 METROS	0	$ 2,508,000	0
	INFORME GENERAL SECTOR RURAL VALOR PRIMEROS 10 KM, VALOR ADICIONAL KM $979.000	0	$ 1,631,500	0
		0	$ 979,000	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		16		18,628,500
IVA(19%)				3,539,415
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**22,167,915**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2
		FECHA	26/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE		2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	MAGDALENA
3. AÑO: 2024	MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12**		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: TRANSVERSAL DEL CARIBE RUTA 9007		TRAMO: VIADUCTOS HITOS II-III VARIANTE CIENAGA
6. CONTRATO DE OBRA No:	981 DE 2022		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		

8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO	NIT	901.581.159-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	977 DE 2022		

11. PLAZO INICIAL:	72,1 MESES	12. FECHA DE INICIO:	27/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	30	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2028
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	10,301,313,086

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: **P** Mejora: **M**	**TRADENTE** (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	**NUM DOC TRADENTE**	**MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ**	**ESCRITURA** (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) **PROMESA VENTA** (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	**No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS**	**VALOR AVALÚO TERRENO**	**PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO**	**VALOR TOTAL AVALÚO**	**VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)**	**OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO**
010AI-M77-T1-VC	M	OSMELI ANTONIO ANDRADES CASTRO	5.075.496	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 15,663,300	$ 15,663,300	N/A
004AI-M17-T1-VC	M	UFANIA MERCEDES PARDO MELENDEZ	26.940.779	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 98,593,200	$ 98,593,200	N/A
002D-M17-T1-VC	P	JORGE LUIS CANDANOZA SOTO	12.634.958	222-18985	161-26/03/2024-Unica-Cienaga		$ 503,245,029	$ 503,245,029	$ 1,209,658,900	$ 130,060,826	Pago de Saldo Pendiente
		ADA LUZ JIMENEZ PEÑA	32.821.708	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 12,179,414	Gastos Notariales
		GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 6,462,000	Gastos de Gobernación
		INSTRUMENTOS PÚBLICO		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 7,891,900	Gastos de Registro

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$ 270,850,640.00**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 270,850,640
64. OTROS(Administración 2.5%)	$ 0
65. IVA (sobre administración 19%)	$ 0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 270,850,640**

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 289,479,140
68. IVA PRESENTE PREACTA	$ 3,539,415
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 293,018,555**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	**$ 22,167,915**

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 2,495,467,017
72. GESTIÓN PREDIAL	$ 18,628,500
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 270,850,640
74. OTROS	$ 0
75. IVA	$ 3,539,415
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 2,788,485,572
77. SALDO POR EJECUTAR	**$ 7,512,827,514**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS:	**ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO**		NOMBRES Y APELLIDOS:	**FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR**	
C.C. _X_ C.E. __	NUMERO:	43,099,356	C.C. _X_ C.E. __	NUMERO	19,072,460
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	0520230613 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	0000014772 CND
Representante Legal	X	Apoderado ☐	Representante Legal	X	Apoderado ☐

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL **ANEXO No. 1 - CONTROL ANTICIPO ADQUISICION PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 26/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE	2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:	MAGDALENA
3. AÑO	MES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 **12**		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: TRANSVERSAL DEL CARIBE RUTA 9007		TRAMO: VIADUCTOS HITOS II-III VARIANTE CIENAGA
6. CONTRATO DE OBRA No:	981 DE 2022		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO	NIT	901.581.159-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	977 DE 2022		

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	**630,007,748,262**
21.1 VR. ANTICIPO TOTAL:	$	**30,000,000,000**
21.2 VR. ANTICIPO OBRA:	$	**23,430,829,353**
21.3 VR. ANTICIPO ADQUISICION PREDIAL:	$	**6,569,170,647**
22. VR. ADICIÓN No:	$	**-**
23. VR. ADICIÓN No:	$	**-**
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	**-**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	**630,007,748,262**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

		TOTAL
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)		
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61	$	**18,628,500**
IVA	$	**3,539,415**
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	$	**22,167,915**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

		TOTAL
62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)		
62.1 SUBTOTAL BOLETA FISCAL (2)	$	**-**
62.2 SUBTOTAL DERECHOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	$	**-**
62.3 SUBTOTAL PAGOS PREDIALES A TRAVES DE FIDUCIA MERCANTIL(2)	$	**-**
62.4 SUBTOTAL PAGOS PREDIALES A TRAVES DE RECURSOS CONTRATISTA(2)	$	**-**
65. IVA	$	**-**
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	**270,850,640**
VR. TOTAL PRESENTE ACTA	$	**293,018,555**

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS ACUMULADOS

73.1 DESEMBOLSOS PREDIALES TOTALES	$	**6,569,170,647**
73.2 DESEMBOLSOS PREDIALES POR ANTICIPO	$	**4,441,608,100**
73.3 DESEMBOLSOS PREDIALES RECURSOS CONTRATISTAS	$	**4,441,608,100**
77. SALDO POR EJECUTAR DE BOLSA PREDIAL	$	**2,127,562,547**

RESUMEN VALORES A LLEVAR A ACTA PACIAL DE OBRA MEPI-MN1-IN4-FR1

CONCEPTO	VALOR ADQUISICION PREDIAL	%
78, VALOR ANTICIPO OTORGADO	$ 6,569,170,647	100
79, VALOR AMORTIZADO/REINTEGRADO PRESENTA ACTA	$ 270,850,640	4.123
80, VALOR AMORTIZADO/REINTEGRADO ACUMULADO	$ 2,156,274,198	32.824
81, VALOR SALDO POR AMORTIZAR/REINTEGRAR	$ 4,142,045,809	63.053

OBSERVACIONES:

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS	**ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO**	NOMBRES Y APELLIDOS	FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
C.C. X C.E.	NUMERO 43,099,356	C.C. X C.E.	NUMERO 19.072.460
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 0520230613 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 0000014772 CND
Representante Legal	[X] Apoderado [ ]	Representante Legal	[X] Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. **El número del presente Anexo a la preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de adquisición predial susceptibles de reintego, no se deberá tramitar el presente Anexo**

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

Fecha: 2024-12-09 16:12:15
Radicado: 2024S-VBOG-093124
Destino: NEFTALI HERNANDEZ PADILLA
Anexos: 0

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-12-09T16:12:18-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-093124
Fecha: 2024-12-09 16:12:15

SEÑOR(A):
NEFTALI HERNANDEZ PADILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO
CRA 4 69 42
interventoriapumarejo@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-123019

Respetado Ingeniero.

Se acusa recibo de su comunicación en donde se realiza entrega de la pre acta predial No. 30 correspondiente al mes de diciembre de 2024 asociada al contrato de obra No. 981 de 2022 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”; así las cosas, una vez revisada la información con sus respectivos soportes por parte del apoyo técnico predial de esta Subdirección , se procede a emitir visto de no objeción a la correspondiente pre acta predial.

La pre acta predial correspondiente al mes de diciembre de 2024 tiene un valor total de $293.018.555,00.

Se aclara que los vistos de no objeción generados por el subdirector de Sostenibilidad, así como los diferentes gestores designados no constituyen aprobación sino la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos en el apéndice predial F, manual de contratación y manual de interventoría en el entendido de que la aprobación es competencia del interventor.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: ALEJANDRO GUZMAN SANCHEZ
Revisado por: OMAR CAMELO OSORIO
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-12-09T16:12:18-05:00,Documento Firmado
Digitalmente.Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-12-09T19:53:40-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)	30	FECHA	DICIEMBRE 2024 (Día / Mes / Año)

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Subdirección Modernización de Carreteras Nacionales - GERENCIA GRUPO NORTE -	OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CONEXION PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIENAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	981 de 2022
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Magdalena			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	977 de 2022

2. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	1 OCTUBRE 2024									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Información y Divulgación	Volantes	Unitario	50000	$ 154,7	$ 7.735.000	X		$ 7.965.116	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 7.965.116	Reembolso de gastos
Información y Divulgación	Cuñas radiales	Unitario	700	$ 40.000	$ 28.000.000	X		$ 28.833.000	0	$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 28.833.000	Reembolso de gastos
Información y Divulgación	Logística reuniones extraordinarias	Unitario	1	$ -	$ -	X		$ -	0	$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ -	
Proyectos Productivos	Proyectos productivos Obras con participación comunitaria	Unitario	1	$ 2.045.054.803	$ 2.045.054.803	X		$ 2.105.895.183		$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 2.105.895.183	
Plan de Manejo Arqueológico	Prospección, rescates, laboratorio, monitoreos arqueológicos,	Unitario	1	$ -	$ -	X		$ -		$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ -	
Capacitación y educación ambiental a la comunidad	Refrigerios	Unitario	3000	$ 8.000	$ 24.000.000	X		$ 24.714.000		$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 24.714.000	
Capacitación y educación ambiental a la comunidad	Souvenir gorra	Unitario	300	$ 10.000	$ 3.000.000	X		$ 3.089.250		$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 3.089.250	
Capacitación y educación ambiental a la comunidad	Souvenir camiseta	Unitario	300	$ 22.000	$ 6.600.000	X		$ 6.796.350		$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 6.796.350	
Capacitación y educación ambiental a la comunidad	Souvenir bolsa reutilizable	Unitario	300	$ 12.000	$ 3.600.000	X		$ 3.707.100		$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ 3.707.100	
Capacitación y educación ambiental a la comunidad	Logística para capacitaciones, talleres dirigidas a la comunidad en temas ambientales	Unitario	1	$ -	$ -	X		$ -		$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ -	
Cultura vial	Logística, refrigerios, souvenires para capacitaciones dirigidas a la comunidad en temas de cultura vial	Unitario	1	$ -	$ -	X		$ -		$ -	2,5%	$ -	$ -		$ -	$ -	

3. BALANCE DE LA INVERSION SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	2	INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	3 DICIEMBRE 2024									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BASICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	REM	ITEM	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - LORENYS ISABEL ORTIZ VILORIA - UMV	Unitario	1	$ 28.967.499	$ 28.967.499	X		$ 29.829.282	1	$ 28.967.499	2,5%	$ 861.783	$ 29.829.282	1	$ 29.829.282	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - LORENYS ISABEL ORTIZ VILORIA - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350	$ 2.677.350	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - LORENYS ISABEL ORTIZ VILORIA - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800	$ 823.800	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - MARINA CHARRIS DE FIGUEROA - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350	$ 2.677.350	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - MARINA CHARRIS DE FIGUEROA - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800	$ 823.800	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - YAZMIN DEL SOCORRO MARTINEZ SALAS - UMV	Unitario	1	$ 74.575.686	$ 74.575.686	X		$ 76.794.313	1	$ 74.575.686	2,5%	$ 2.218.627	$ 76.794.313	1	$ 76.794.313	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - YAZMIN DEL SOCORRO MARTINEZ SALAS - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - YAZMIN DEL SOCORRO MARTINEZ SALAS - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - YAZMIN DEL SOCORRO MARTINEZ SALAS - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - YAZMIN DEL SOCORRO MARTINEZ SALAS - HTO	Unitario	1	$ 3.900.000	$ 3.900.000	X		$ 4.016.025	1	$ 3.900.000	2,5%	$ 116.025,0	$ 4.016.025,0	1	$ 4.016.025	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - YESENIA DEL CARMEN CANTILLO DIAZ - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - YESENIA DEL CARMEN CANTILLO DIAZ - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - YESENIA DEL CARMEN CANTILLO DIAZ - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - AURIS STELLA AMAYA BARCELO - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - AURIS STELLA AMAYA BARCELO - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - AURIS STELLA AMAYA BARCELO - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - SERGIO JAVIER ROSALES CANTILLO - UMV	Unitario	1	$ 43.223.924	$ 43.223.924	X		$ 44.509.836	1	$ 43.223.924	2,5%	$ 1.285.911,7	$ 44.509.835,7	1	$ 44.509.836	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial
Gestión Socipredial	Reconocimiento de factores - SERGIO JAVIER ROSALES CANTILLO - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión socipredial

Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - SERGIO JAVIER ROSALES CANTILLO - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - SIRLEY PATRICIA JIMENEZ BARRIOS - UMV	Unitario	1	$ 19.616.873	$ 19.616.873	X		$ 20.200.475	1	$ 19.616.873	2,5%	$ 583.602,0	$ 20.200.475,0	1	$ 20.200.475	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - SIRLEY PATRICIA JIMENEZ BARRIOS - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - SIRLEY PATRICIA JIMENEZ BARRIOS - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - SIRLEY PATRICIA JIMENEZ BARRIOS - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - GLADY MERCEDES GRANADOS MORENO - UMV	Unitario	1	$ 61.543.773	$ 61.543.773	X		$ 63.374.700	1	$ 61.543.773	2,5%	$ 1.830.927,2	$ 63.374.700,2	1	$ 63.374.700	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - GLADY MERCEDES GRANADOS MORENO - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - GLADY MERCEDES GRANADOS MORENO -	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - ERIKA PATRICIA PINTO ROJAS - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - BEATRIZ MARIA FORNARIS LLANO - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - BEATRIZ ELENA SANTOS SIERRA - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - WAYCA ISAAC VARELA - UME	Unitario	1	$ 19.500.000	$ 19.500.000	X		$ 20.080.125	1	$ 19.500.000	2,5%	$ 580.125,0	$ 20.080.125,0	1	$ 20.080.125	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - HILDA CERVANTES - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - OLGA ESTER MIRANDA DE GARCIA - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - ERIKA BEATRIZ AREVALO FORNARI - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - HERNAN DANIEL SANTOYO ASSIS - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - AMARILIS CANDANOZA SOTO - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - AMARILIS CANDANOZA SOTO - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -DAVID DE JESUS CANDANOZA HERNANDEZ - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -DAVID DE JESUS CANDANOZA HERNANDEZ -	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FAUDY ENRIQUE CANDANOZA SOTO - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -FAUDY ENRIQUE CANDANOZA SOTO - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -OMAR DE JESUS CANDANOZA SOTO - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -OMAR DE JESUS CANDANOZA SOTO - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores -OMAR DE JESUS CANDANOZA SOTO - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - PLINIO CANDANOZA MANOTAS - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - PLINIO CANDANOZA MANOTAS - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - YAHAIRA VILLALBA CANDANOZA - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - YAHAIRA VILLALBA CANDANOZA - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - YAHAIRA VILLALBA CANDANOZA - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - OSMELI ANTONIO ANDRADES - UMV	Unitario	1	$ 82.659.944	$ 82.659.944	X		$ 85.119.077	1	$ 82.659.944	2,5%	$ 2.459.133,3	$ 85.119.077,3	1	$ 85.119.077	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - OSMELI ANTONIO ANDRADES - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - OSMELI ANTONIO ANDRADES - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - OSMELI ANTONIO ANDRADES - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - UFANIA MERCEDES PARDO - UMV	Unitario	1	$ 10.440.534	$ 10.440.534	X		$ 10.751.140	1	$ 10.440.534	2,5%	$ 310.605,9	$ 10.751.139,9	1	$ 10.751.140	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - UFANIA MERCEDES PARDO - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - UFANIA MERCEDES PARDO - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - UFANIA MERCEDES PARDO - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - GLADYS ESTHER LASTRA - UME	Unitario	1	$ 11.700.000	$ 11.700.000	X		$ 12.048.075	1	$ 11.700.000	2,5%	$ 348.075,0	$ 12.048.075,0	1	$ 12.048.075	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - GLADYS ESTHER LASTRA - TDO	Unitario	1	$ 2.600.000	$ 2.600.000	X		$ 2.677.350	1	$ 2.600.000	2,5%	$ 77.350,0	$ 2.677.350,0	1	$ 2.677.350	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores - GLADYS ESTHER LASTRA - ARRTO	Unitario	1	$ 800.000	$ 800.000	X		$ 823.800	1	$ 800.000	2,5%	$ 23.800,0	$ 823.800,0	1	$ 823.800	$ -	Reembolso de gastos para gestión sociopredial
								$ -		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 589.428.233	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ITEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BASICO PRE-ACTA	$ 589.428.233	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	14.735.706
C	VALOR IVA MENSUAL	$ 2.799.784	I	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOAMBIENTAL	$	-
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSION SOCIAL	$ 606.963.723	J	VALOR TOTAL MES GESTION SOCIOPREDIAL	$	606.963.723
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)	$ 2.181.000.000	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$	606.963.723
F	VALOR PROVISION SOCIAL INCLUIDO IVA	$ 2.787.963.723	L	EJECUCION DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		21,77%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: **ALEXANDRA MARIA GREIDINGER RESTREPO**
Representante Legal Contratista ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: **0520230613ANT**

Firma
Nombre: **NIRIA AMPARO CUBIDES HERMIDA**
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No.: **N/A**

Firma
Nombre: **FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR**
Representante Legal Interventoría ☑ **Apoderado** ☐
Matrícula Profesional No.: **0000-14772 CND**

Firma
Nombre: **PAOLA PATRICIA PERTUZ MALDONADO**
Profesional Social Interventoría
Matrícula Profesional No.: **N/A**

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-12-09T19:53:39-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-093222
Fecha: 2024-12-09 19:53:35

SEÑOR(A):
NEFTALI HERNANDEZ PADILLA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO
CRA 4 69 42
interventoriapumarejo@gmail.com
BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-125191

Respetado ingeniero

En atención al radicado 1028-977-2022-1355 por medio del cual, la interventoría con número de contrato 977 de 2022, cuyo objeto contractual es la "INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, remite la pre-acta V30 de la gestión social.

Sobre el particular, esta Subdirección indica:

1. Que el proyecto cuenta con el plan de inversión social V2, con aprobación de la interventoría y no objeción del INVIAS por $2.787.963.723 pesos m/cte.

2. Que la pre-acta V30 remite la solicitud de reembolso de gastos e inversiones por $606.963.723 pesos m/ctre (incluyendo cobro administrativo e IVA admin.)

3. Que la ejecución del recurso social asignado se encuentra causado por el 21,77%.

La Subdirección de Sostenibilidad indica que los documentos presentados al INVIAS cuentan con las justificaciones, observaciones y firmas de la interventoría y el contratista, garantizando la revisión, verificación y aprobación de cada una de las actividades, cantidades y precios, así como la garantía por la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento ante la normatividad social vigente y de los requerimientos que puedan ser formulados por las autoridades competentes por causa de impactos generados y/o falta de ejecución de actividades relacionadas en el apéndice del contrato.

En consideración con lo anterior, esta dependencia indica que los soportes documentados en las carpetas se presentan conforme lo establece el Manual de Interventoría, presentando así el concepto de **NO OBJECIÓN a la pre-acta 30 por gastos e inversiones por $606.963.723 pesos m/ctre (incluyendo cobro administrativo e IVA admin),** toda vez que

se relaciona en el ejercicio de las responsabilidades establecidas en los manuales de interventoría y de contratación que les competen a los gestores sociales y a las funciones de la Subdirección de Sostenibilidad, sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión se realicen.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: RAFAEL ALBERTO DÍAZ FRANCO
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a:
Copia Externa a:

INVIAS
Jairo Fernando Arguello Urrego,SUBDIRECTOR DE S
2024-12-09T19:53:39-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-12-09T19:53:40-05:00
Jairo Fernando Arguello Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Diciembre de 2024.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458	$ 24.889.599.436
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 82.866.666.666	$ 82.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 211.200.000.000	$ 211.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
TOTAL						**$ 630.007.748.262**	**$ 512.430.241.410**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 630.007.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 60.607.748.262,00					
1	Obra	27 a 31 Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
2	Obra	Agosto de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
3	Obra	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
4	Obra	Octubre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
1D	Ajuste	27 a 31 Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
2D	Ajuste	Agosto de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
3D	Ajuste	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
5	Obra	Noviembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 630.007.748.262,00				
5	EyD	Noviembre de 2022	$ 1.115.211.000,00	$ 211.890.090,00	$ 1.327.101.090,00	$ -	$ 1.327.101.090,00	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00	138755 - 17/12/2023	x		Factura CVCM-3
4D	Ajuste	Octubre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00				
5P	Ajuste	Noviembre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00				
6	Obra	Diciembre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 628.680.647.172,00				
6	EyD	Diciembre de 2022	$ 1.260.596.750,00	$ 239.513.383,00	$ 1.500.110.133,00	$ -	$ 1.500.110.133,00	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00	140557 - 20/12/2023	x		Factura CVCM-4
6P	Ajuste	Diciembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
5D	Ajuste	Noviembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
6D	Ajuste	Diciembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
7	Obra	Enero de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 627.180.537.039,00				
7	EyD	Enero de 2023	$ 190.290.750,00	$ 36.155.243,00	$ 226.445.993,00	$ -	$ 226.445.993,00	$ -	617522	$ 57.554.091.046,00	$ 626.954.091.046,00	22414 - 08/03/2023	x		Factura CVCM-5
8	Obra	Febrero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.554.091.046,00	$ 626.954.091.046,00				
8	EyD	Febrero de 2023	$ 281.531.400,00	$ 53.490.966,00	$ 335.022.366,00	$ -	$ 335.022.366,00	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 626.619.068.680,00	31462 - 30/03/2023	x		Factura CVCM-6
7D	Ajuste	Enero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 626.619.068.680,00				
9	Obra	Marzo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 626.619.068.680,00				
9	EyD	Marzo de 2023	$ 300.493.512,00	$ 57.093.767,00	$ 357.587.279,00	$ -	$ 357.587.279,00	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 626.261.481.401,00	42259 - 28/04/2023	x		Factura CVCM-7
8D	Ajuste	Febrero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 626.261.481.401,00				
10	Obra	Abril de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 626.261.481.401,00				
10	EyD	Abril de 2023	$ 316.332.425,00	$ 60.103.161,00	$ 376.435.586,00	$ -	$ 376.435.586,00	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 625.885.045.815,00	52188 - 26/05/2023	x		Factura CVCM-8
9D	Ajuste	Marzo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 625.885.045.815,00				
11	Obra	Mayo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 625.885.045.815,00				
11	EyD	Mayo de 2023	$ 184.350.650,00	$ 35.026.624,00	$ 219.377.274,00	$ -	$ 219.377.274,00	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 625.665.668.541,00	64357 - 04/07/2023	x		Factura CVCM-9
10D	Ajuste	Abril de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 625.665.668.541,00				
12	Obra	Junio de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 625.665.668.541,00				
12	EyD	Junio de 2023	$ 164.270.025,00	$ 31.211.305,00	$ 195.481.330,00	$ -	$ 195.481.330,00	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 625.470.187.211,00	73262 - 28/07/2023	x		Factura CVCM-10
11D	Ajuste	Mayo de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 625.470.187.211,00				
12D	Ajuste	Junio de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 625.470.187.211,00				
13	Obra	Julio de 2023	$ 1.468.535.700,00	$ 10.731.607,00	$ 1.479.267.307,00	$ -	$ 1.479.267.307,00	$ -	617522	$ 54.590.919.904,00	$ 623.990.919.904,00	80528 - 23/08/2023	x		Factura CVCM-12
13P	Ajuste	Julio de 2023	$ 225.713.937,00	$ 1.649.448,00	$ 227.363.385,00	$ -	$ 227.363.385,00	$ -	617522	$ 54.363.556.519,00	$ 623.763.556.519,00	80529 -23/08/2023	x		Factura CVCM-11
13D	Ajuste	Julio de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 54.363.556.519,00	$ 623.763.556.519,00				
14	Obra	Agosto de 2023	$ 6.108.750.000,00	$ 44.640.865,00	$ 6.153.390.865,00	$ -	$ 6.153.390.865,00	$ -	617522	$ 48.210.165.654,00	$ 617.610.165.654,00	81973 - 21/09/2023	x		Factura CVCM-14
14	EyD	Agosto de 2023	$ 94.048.750,00	$ 17.869.263,00	$ 111.918.013,00	$ -	$ 111.918.013,00	$ -	617522	$ 48.098.247.641,00	$ 617.498.247.641,00	81973 - 21/09/2023	x		Factura CVCM-14
14P	Ajuste	Agosto de 2023	$ 938.914.875,00	$ 6.861.301,00	$ 945.776.176,00	$ -	$ 945.776.176,00	$ -	617522	$ 47.152.471.465,00	$ 616.552.471.465,00	81820 - 18/09/2023	x		Factura CVCM-13
14D	Ajuste	Agosto de 2023	-$ 29.627.437,00	-$ 216.508,00	-$ 29.843.945,00	$ -	-$ 29.843.945,00	$ -	617522	$ 47.182.315.410,00	$ 616.582.315.410,00	83637 - 25/10/2023	x		Factura CVCM-17
15	Obra	Septiembre de 2023	$ 7.777.165.996,32	$ 56.833.136,00	$ 7.833.999.132,00	$ -	$ 7.833.999.132,00	$ -	617522	$ 39.348.316.278,00	$ 608.748.316.278,00	83774 - 27/10/2023	x		Factura CVCM-18

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Diciembre de 2024.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458	$ 24.889.599.436
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 82.866.666.666	$ 82.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 211.200.000.000	$ 211.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
TOTAL						**$ 630.007.748.262**	**$ 512.430.241.410**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 630.007.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
15P	Ajuste	Septiembre de 2023	$ 1.211.402.309,00	$ 8.852.555,00	$ 1.220.254.864,00	$ -	$ 1.220.254.864,00	$ -	617522	$ 38.128.061.414,00	$ 607.528.061.414,00	83637 - 25/10/2023	x		Factura CVCM-17
15D	Ajuste	Septiembre de 2023	-$ 1.903.367,00	-$ 13.909,00	-$ 1.917.276,00	$ -	-$ 1.917.276,00	$ -	617522	$ 38.129.978.690,00	$ 607.529.978.690,00	23/11/2023	x		Factura CVCM-20
	Anticipo	**Octubre de 2023**			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.000.000.000,00**	**617522**	**$ 18.129.978.690,00**	**$ 607.529.978.690,00**				
16	Obra	Octubre de 2023	$ 7.982.833.581,00	$ 58.336.092,00	$ 8.041.169.673,00	$ 272.214.625,00	$ 7.768.955.048,00	$ 19.727.785.375,00	617522	$ 10.361.023.642,00	$ 599.488.809.017,00	23/11/2023	x		Factura CVCM-19
16P	Ajuste	Octubre de 2023	$ 1.203.743.700,00	$ 8.796.589,00	$ 1.212.540.289,00	$ -	$ 1.212.540.289,00	$ 19.727.785.375,00	617522	$ 9.148.483.353,00	$ 598.276.268.728,00	23/11/2023	x		Factura CVCM-20
17	Obra	Noviembre de 2023	$ 9.400.340.158,68	$ 68.694.793,00	$ 9.469.034.952,00	$ 320.551.599,00	$ 9.148.483.353,00	$ 19.407.233.776,00	617522		$ 588.807.233.776,00	87047 - 07/12/2023	x		Factura CVCM-23
								$ 19.407.233.776,00		**Saldo Registro Presupuestal No. 104023 De (03/02/2023)**					
					$ -		$ -	$ 19.407.233.776,00		**$ 48.666.666.667,00**	$ 588.807.233.776,00				
17	Obra	Noviembre de 2023	$ 4.593.158.044,32	$ 33.565.386,00	$ 4.626.723.430,32	$ 156.626.689,00	$ 4.470.096.741,32	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 44.196.569.925,68	$ 584.180.510.345,68	87047 - 07/12/2023	x		Factura CVCM-23
16D	Ajuste	Octubre de 2023	-$ 26.617.205,00	-$ 194.510,00	-$ 26.811.715,00		-$ 26.811.715,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 44.223.381.640,68	$ 584.207.322.060,68	87370- 11/12/2023	x		Factura CVCM-24
17P	Ajuste	Noviembre de 2023	$ 2.053.207.181,00	$ 15.004.206,00	$ 2.068.211.387,00		$ 2.068.211.387,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 42.155.170.253,68	$ 582.139.110.673,68	87370- 11/12/2023	x		Factura CVCM-24
18	Obra	Diciembre de 2023	$ 2.075.555.389,00	$ 15.167.520,00	$ 2.090.722.909,00	$ 70.776.439,00	$ 2.019.946.470,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 40.135.223.783,68	$ 580.048.387.764,68	87788 - 13/12/2023	x		Factura CVCM-26
18P	Ajuste	Diciembre de 2023	$ 328.016.331,00	$ 2.397.042,00	$ 330.413.373,00		$ 330.413.373,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.804.810.410,68	$ 579.717.974.391,68	87796 - 13/12/2023	x		Factura CVCM-27
17D	Ajuste	Noviembre de 2023	$ 19.471.427,00	$ 142.291,00	$ 19.613.718,00		$ 19.613.718,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.785.196.692,68	$ 579.698.360.673,68	1256- 11/03/2023	x		Factura CVCM-28
18D	Ajuste	Diciembre de 2023	$ 12.686.186,00	$ 92.707,00	$ 12.778.893,00		$ 12.778.893,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.772.417.799,68	$ 579.685.581.780,68	1257- 11/03/2023	x		Factura CVCM-29
19	Obra	Enero de 2024	$ 1.363.907.123,00	$ 9.967.014,00	$ 1.373.874.137,00	$ 46.509.233,00	$ 1.327.364.904,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.445.052.895,68	$ 578.311.707.643,68	1254 -11/03/2023	x		Factura CVCM-30
19P	Ajuste	Enero de 2024	$ 265.156.244,00	$ 1.937.680,00	$ 267.093.924,00		$ 267.093.924,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.177.958.971,68	$ 578.044.613.719,68	1301 - 12/03/2023	x		Factura CVCM-31
19D	Ajuste	Enero de 2024	$ 54.981.298,00	$ 401.786,00	$ 55.383.084,00		$ 55.383.084,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.122.575.887,68	$ 577.989.230.635,68	1570 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-32
20	Obra	Febrero de 2024	$ 2.113.538.875,00	$ 15.445.092,00	$ 2.128.983.967,00	$ 72.071.676,00	$ 2.056.912.291,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 36.065.663.596,68	$ 575.860.246.668,68	1520 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-33
20P	Ajuste	Febrero de 2024	$ 488.453.600,00	$ 3.569.469,00	$ 492.023.069,00		$ 492.023.069,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 35.573.640.527,68	$ 575.368.223.599,68	1605 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-34
21	Obra	Marzo de 2024	$ 2.724.563.486,00	$ 19.910.272,00	$ 2.744.473.758,00	$ 544.912.697,00	$ 2.199.561.061,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 33.374.079.466,68	$ 572.623.749.841,68	3074- 24/04/2024	x		Factura CVCM-35
20D	Ajuste	Febrero de 2024	$ 33.469.758,00	$ 244.587,00	$ 33.714.345,00		$ 33.714.345,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 33.340.365.121,68	$ 572.590.035.496,68	3073- 24/04/2024	x		Factura CVCM-36
21P	Ajuste	Marzo de 2024	$ 568.378.168,00	$ 4.153.533,00	$ 572.531.701,00		$ 572.531.701,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 32.767.833.420,68	$ 572.017.503.795,68	3054 -23/04/2024	x		Factura CVCM-37
	Anticipo	**Marzo de 2024**						**$ 10.000.000.000,00**		**$ 22.767.833.420,68**	$ 559.015.890.554,68				
21D	Ajuste	Marzo de 2024	-$ 3.097.092,00	-$ 22.633,00	-$ 3.119.725,00		-$ 3.119.725,00	$ 28.516.337.042,00	104023	$ 22.770.953.145,68	$ 572.020.623.520,68	4250 -17/05/2024	x		Factura CVCM-38
22	Obra	Abril de 2024	$ 1.757.685.418,00	$ 12.844.624,00	$ 1.770.530.042,00	$ 351.537.084,00	$ 1.418.992.958,00	$ 28.164.799.958,00	104023	$ 21.351.960.187,68	$ 570.250.093.478,68	4286 -18/05/2024	x		Factura CVCM-39
22	Gestion SPAS	Abril de 2024	$ 3.619.723.697,00		$ 3.619.723.697,00		$ 3.619.723.697,00	$ 28.164.799.958,00	104023	$ 17.732.236.490,68	$ 566.630.369.781,68	4286 -18/05/2024	x		Factura CVCM-39
22P	Ajuste	Abril de 2024	$ 410.891.009,00	$ 3.002.665,00	$ 413.893.674,00		$ 413.893.674,00	$ 28.164.799.958,00	104023	$ 17.318.342.816,68	$ 566.216.476.107,68	4250 -17/05/2024	x		Factura CVCM-38
										Saldo Registro Presupuestal No. 215024 De (15/03/2024)					
								$ 28.164.799.958,00	215024	**$ 51.466.666.667,00**	$ 566.216.476.107,68				
23	Obra	Mayo de 2024	$ 1.473.905.358,00	$ 10.770.847,00	$ 1.484.676.205,00	$ 294.781.072,00	$ 1.189.895.133,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 50.276.771.534,00	$ 564.731.799.902,68	5930 -17/06/2024	x		Factura CVCM-40
23	Gestion SPAS	Mayo de 2024	$ 2.137.789.644,00		$ 2.137.789.644,00		$ 2.137.789.644,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 48.138.981.890,00	$ 562.594.010.258,68	5930 -17/06/2024	x		Factura CVCM-40
22D	Ajuste	Abril de 2024	$ 5.560.440,00	$ 40.634,00	$ 5.601.074,00		$ 5.601.074,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 48.133.380.816,00	$ 562.588.409.184,68	6054 -20/06/2024	x		Factura CVCM-41
23P	Ajuste	Mayo de 2024	$ 284.017.155,00	$ 2.075.510,00	$ 286.092.665,00		$ 286.092.665,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 47.847.288.151,00	$ 562.302.316.519,68	6056 -20/06/2024	x		Factura CVCM-42
										Saldo Registro Presupuestal No. 104023 De (03/02/2023)					
								$ 27.870.018.886,00		**$ 17.318.342.816,68**					
23D	Ajuste	Mayo de 2024	$ 2.359.675,00	$ 17.244,00	$ 2.376.919,00		$ 2.376.919,00	$ 27.870.018.886,00	104023	$ 17.315.965.897,68	$ 562.299.939.600,68	7383-18/07/2024	x		Factura CVCM-43
24	Obra	Junio de 2024	$ 942.016.522,00	$ 6.883.967,00	$ 948.900.489,00	$ 188.403.304,00	$ 760.497.185,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.555.468.712,68	$ 561.351.039.111,68	7410-18/07/2024	x		Factura CVCM-44

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Diciembre de 2024.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458	$ 24.889.599.436
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 82.866.666.666	$ 82.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 211.200.000.000	$ 211.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
TOTAL						**$ 630.007.748.262**	**$ 512.430.241.410**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 630.007.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
24	Gestion SPAS	Junio de 2024	$ 189.736.982,00	$ 31.581.227,00	$ 221.318.209,00		$ 221.318.209,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.334.150.503,68	$ 561.129.720.902,68	7410-18/07/2024	x		Factura CVCM-44
24P	Ajuste	Junio de 2024	$ 191.281.897,00	$ 1.397.829,00	$ 192.679.726,00		$ 192.679.726,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.141.470.777,68	$ 560.937.041.176,68	7408-18/07/2024	x		Factura CVCM-45
24D	Ajuste	Junio de 2024	-$ 5.582.862,00	-$ 40.798,00	-$ 5.623.660,00		-$ 5.623.660,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.147.094.437,68	$ 560.942.664.836,68	9867-28/08/2024	x		Factura CVCM-48
25	Obra	Julio de 2024	$ 748.471.196,00	$ 5.469.597,00	$ 753.940.793,00	$ 149.694.239,00	$ 604.246.554,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 15.542.847.883,68	$ 560.188.724.043,68	9641-26/08/2024	x		Factura CVCM-47
25	Gestion SPAS	Julio de 2024	$ 994.335.642,00	$ 11.345.660,00	$ 1.005.681.302,00		$ 1.005.681.302,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 14.537.166.581,68	$ 559.183.042.741,68	9641-26/08/2024	x		Factura CVCM-47
25P	Ajuste	Julio de 2024	$ 165.939.552,00	$ 1.212.635,00	$ 167.152.187,00		$ 167.152.187,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 14.370.014.394,68	$ 559.015.890.554,68	9867-28/08/2024	x		Factura CVCM-48
25D	Ajuste	Julio de 2024	-$ 4.060.685,00	-$ 29.674,00	-$ 4.090.359,00		-$ 4.090.359,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 14.374.104.753,68	$ 559.019.980.913,68	11271-18/09/2024	x		Factura CVCM-50
26	Obra	Agosto de 2024	$ 1.149.413.163,00	$ 8.399.558,00	$ 1.157.812.721,00	$ 229.882.633,00	$ 927.930.088,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 13.446.174.665,68	$ 557.862.168.192,68	11270-18/09/2024	x		Factura CVCM-49
26	Gestion SPAS	Agosto de 2024	$ 566.768.003,00	$ 4.055.740,00	$ 570.823.743,00		$ 570.823.743,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 12.875.350.922,68	$ 557.291.344.449,68	11270-18/09/2024	x		Factura CVCM-49
26P	Ajuste	Agosto de 2024	$ 255.714.021,00	$ 1.868.679,00	$ 257.582.700,00		$ 257.582.700,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 12.617.768.222,68	$ 557.033.761.749,68	11271-18/09/2024	x		Factura CVCM-50
26D	Ajuste	Agosto de 2024	-$ 2.633.436,00	-$ 19.244,00	-$ 2.652.680,00		-$ 2.652.680,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 12.620.420.902,68	$ 557.036.414.429,68	13262-18/10/2024	x		Factura CVCM-51
27	Obra	Septiembre de 2024	$ 4.818.424.268,00	$ 35.211.562,00	$ 4.853.635.830,00	$ 164.308.268,00	$ 4.689.327.562,00	$ 27.137.730.442,00	104023	$ 7.931.093.340,68	$ 552.182.778.599,68	13261-18/10/2024	x		Factura CVCM-52
27	Gestion SPAS	Septiembre de 2024	$ 1.151.146.000,00	$ 1.167.740,00	$ 1.152.313.740,00	$ 1.145.000.000,00	$ 7.313.740,00	$ 25.992.730.442,00	104023	$ 7.923.779.600,68	$ 551.030.464.859,68	13261-18/10/2024	x		Factura CVCM-52
27P	Ajuste	Septiembre de 2024	$ 984.248.887,00	$ 7.192.588,00	$ 991.441.475,00		$ 991.441.475,00	$ 25.992.730.442,00	104023	$ 6.932.338.125,68	$ 550.039.023.384,68	13262-18/10/2024	x		Factura CVCM-51
27D	Ajuste	Septiembre de 2024	-$ 13.420.433,00	-$ 98.072,00	-$ 13.518.505,00		-$ 13.518.505,00	$ 25.992.730.442,00	104023	$ 6.945.856.630,68	$ 550.052.541.889,68		x		
28	Obra	Octubre de 2024	$ 3.473.407.770,00	$ 25.382.595,00	$ 3.498.790.365,00	$ 118.443.205,00	$ 3.380.347.160,00	$ 25.874.287.237,00	104023	$ 3.565.509.470,68	$ 546.553.751.524,68				
28	EyD	Octubre de 2024	$ 88.449.737,00	$ 16.805.450,00	$ 105.255.187,00		$ 105.255.187,00	$ 25.874.287.237,00	104023	$ 3.460.254.283,68	$ 546.448.496.337,68				
28	Estudios Atipicos	Octubre de 2024	$ 2.592.830.221,00	$ 492.637.742,00	$ 3.085.467.963,00		$ 3.085.467.963,00	$ 25.874.287.237,00	104023	$ 374.786.320,68	$ 543.363.028.374,68				
28	Gestion SPAS	Octubre de 2024	$ 9.607.500,00	$ 1.825.425,00	$ 11.432.925,00		$ 11.432.925,00	$ 25.874.287.237,00	104023	$ 363.353.395,68	$ 543.351.595.449,68				
28P	Ajuste	Octubre de 2024	$ 360.717.383,68	$ 2.636.012,00	$ 363.353.395,68		$ 363.353.395,68	$ 25.874.287.237,00	104023	$ -	$ 542.988.242.054,00				
										Saldo Registro Presupuestal No. 215024 De (15/03/2024)					
										$ 47.847.288.151,00					
28P	Ajuste	Octubre de 2024	$ 504.025.018,32	$ 3.683.259,00	$ 507.708.277,32		$ 507.708.277,32	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 47.339.579.873,68	$ 542.480.533.776,68				
28D	Ajuste	Octubre de 2024	$ 4.966.426,00	$ 36.293,00	$ 5.002.719,00		$ 5.002.719,00	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 47.334.577.154,68	$ 542.475.531.057,68				
29	Obra	Noviembre de 2024	$ 2.401.153.689,00	$ 17.546.892,00	$ 2.418.700.581,00	$ 81.879.341,00	$ 2.336.821.240,00	$ 25.792.407.896,00	215024	$ 44.997.755.914,68	$ 540.056.830.476,68				
29	Gestion SPAS	Noviembre de 2024	$ 2.327.388.099,00	$ 4.181.045,00	$ 2.331.569.144,00	$ 1.011.274.198,00	$ 1.320.294.946,00	$ 24.781.133.698,00	215024	$ 43.677.460.968,68	$ 537.725.261.332,68				
29P	Ajuste	Noviembre de 2024	$ 510.158.146,00	$ 3.728.079,00	$ 513.886.225,00		$ 513.886.225,00	$ 24.781.133.698,00	215024	$ 43.163.574.743,68	$ 537.211.375.107,68				
30	Obra	Diciembre de 2024	$ 1.527.639.884,00	$ 11.163.522,00	$ 1.538.803.406,00	$ 52.092.520,00	$ 1.486.710.886,00	$ 24.729.041.178,00	215024	$ 41.676.863.857,68	$ 535.672.571.701,68				
30	Gestion SPAS	Diciembre de 2024	$ 893.643.079,00	$ 6.339.199,00	$ 899.982.278,00	$ 270.850.640,00	$ 629.131.638,00	$ 24.458.190.538,00	215024	$ 41.047.732.219,68	$ 534.772.589.423,68				
TOTALES			**$ 93.375.541.594,00**	**$ 1.859.617.244,00**	**$ 95.235.158.838,00**	**$ 5.541.809.462,00**	**$ 89.693.349.376,00**	**$ 24.458.190.538,00**		**$ 41.047.732.219,68**	**$ 534.772.589.423,68**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Diciembre de 2024.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458	$ 24.889.599.436
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 82.866.666.666	$ 82.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 211.200.000.000	$ 211.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
TOTAL						**$ 630.007.748.262**	**$ 512.430.241.410**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 630.007.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 63.900.465.621,00	$ 466.964.941,00	$ 64.367.430.562,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 10.996.532.107,00	$ 80.359.273,00	$ 11.076.891.380,00
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III	$ 3.995.574.999,00	$ 759.159.252,00	$ 4.754.734.251,00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%	$ 11.890.138.646,00	$ 60.496.036,00	$ 11.950.634.682,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
TOTAL BOLSA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS	$ 2.592.830.221,00	$ 492.637.742,00	$ 3.085.467.963,00
VALOR TOTAL	**$ 93.375.541.594,00**	**$ 1.859.617.244,00**	**$ 95.235.158.838,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **CONRADO LOPERA PALACIO**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520280830 ANT

Firma
Nombre: **NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-09718 CLD**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	dic.-24 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 30 **DE** Diciembre de 2024 (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 30 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.421.282.963,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 630.007.748.262,00

PLAZO ACUMULADO: 72,1 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ -

1 de 4

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		7 de julio al 31 de julio del 202	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1,1.2,2.3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,224%	0,092%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,008%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,012%	0,000%	0,025%	0,024%	0,024%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%
	$ 2.023.404,28	0,366%	$ 506.724,31	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$ 383.530	$ 17.151	$ 17.151	$ 17.151	$ 17.151	$ 17.151	$ 17.151	$ 17.151	$ 17.151	$ 17.151	$ 0	$ 138.417	$ 134.890	$ 134.890	$ 67.037	$ 67.537	$ 67.537	$ 69.000
				$ E					$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576	$ 277			$ 23.989	$ 22.145	$ 0	$ 108.187
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,002%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,002%	0,000%	0,000%	0,000%	0,004%	0,004%	0,000%	0,018%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%	0,051%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,041%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 2.598.021,79	0,469%	$ 281.729,26	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$227.350	$0,0	$0,0	$0,0	
				$ E																						
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13 Y 14)	$ 13.698.762,53	2,476%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 11.736.929,43	2,121%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79)	$ 535.135.350,83	96,704%	11,277%	% P	0,000%	1,440%	3,288%	5,580%	0,296%	0,296%	0,296%	0,296%	0,296%	0,296%	0,296%	0,296%	0,296%	0,296%	1,306%	1,354%	2,463%	2,996%	0,084%	0,102%	0,120%	0,100%
	$ 532.392.503,14	96,209%	$ 62.405.745,33	$ P	$0,0	$7.970.657	$18.196.259	$30.878.090	$1.656.432	$1.656.432	$1.656.432	$1.656.432	$1.656.432	$1.656.432	$1.656.432	$1.656.432	$1.656.432	$1.656.432	$7.227.011	$7.493.531	$13.643.898	$16.022.427	$463.442	$563.442	$663.442	$554.000
				$ E		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.468.536	$6.108.750	$7.776.490	$7.982.557	$13.993.498	$16.022.427	$1.339.919	$2.091.394	$2.724.563	$1.657.493
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,265%	1,104%	1,405%	1,443%	2,529%	2,996%	0,242%	0,378%	0,492%	0,300%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55 Y 69)	$ 467.584,97	0,084%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 495.815,18	0,090%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77)	$ 23.481,25	0,004%	0,080%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 486.629,64	0,088%	$ 439.990,97	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E					$0																	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,05%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,016%	0,016%	0,016%	0,017%	0,017%	0,017%
	$ 575.427,34	0,104%	$ 266.275,76	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$191.812	$191.812	$191.863	$35.865	$35.805	$0
				$ E																						
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E					$0																	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Ajuste por acta de modificación	$ 0,25																									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**11,547%**																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.308.731,05**	**99,446%**	**$ 63.900.465,621**																							

REPROGRAMACION N°1 REPROGRAMACION N°2 REPROGRAMACION N°3

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,000%	0,000%	1,440%	3,288%	5,580%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	1,306%	1,414%	2,528%	2,996%	0,084%	0,102%	0,120%	0,121%
	VALOR	$ -	$ -	$ 7.970.656,69	$ 18.196.259,47	$ 30.878.090,20	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 7.227.010,81	$ 7.822.819,90	$ 13.991.590,12	$ 16.581.414,76	$ 463.441,84	$ 563.441,84	$ 663.441,84	$ 669.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,000%	0,000%	1,440%	4,729%	10,366%	10,665%	10,965%	11,264%	11,563%	11,863%	12,162%	12,461%	12,761%	13,060%	2,675%	4,089%	6,617%	9,614%	9,700%	9,802%	9,922%	8,363%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 7.970.656,69	$ 26.166.916,17	$ 57.044.996,36	$ 58.701.428,47	$ 60.357.860,57	$ 62.014.292,67	$ 63.670.724,78	$ 65.327.156,88	$ 66.983.588,98	$ 68.640.021,08	$ 70.296.453,19	$ 71.952.885,29	$ 14.804.296,51	$ 22.627.116,50	$ 36.618.706,62	$ 53.200.121,38	$ 39.869.760,71	$ 40.433.222,54	$ 41.096.664,38	$ 46.277.348,35
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,265%	1,104%	1,405%	1,443%	2,529%	2,996%	0,375%	0,246%	0,382%	0,492%	0,318%	
	VALOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.468.535,70	$ 6.108.750,00	$ 7.777.166,00	$ 7.982.833,58	$ 13.993.498,20	$ 2.075.555,39	$ 1.363.907,12	$ 2.113.538,88	$ 2.724.563,49	$ 1.757.685,42		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,265%	1,369%	2,775%	4,217%	6,746%	7,121%	7,367%	7,749%	8,242%	8,589%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.468.535,70	$ 7.577.285,70	$ 15.354.451,70	$ 23.337.285,28	$ 37.330.783,48	$ 39.406.338,87	$ 40.770.245,99	$ 42.883.784,87	$ 45.608.348,35	$ 47.366.033,77		

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$32.410.096,98	$ 10.996.532,11	33,929%
	$32.410.096,98		
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$600.000,00		0,000%
	$600.000,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS	$300.000,00		0,000%
	$300.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$4.287.299,53	$ 547.324,21	12,833%
	$4.264.906,82		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	$3.996.575,00	$ 3.995.575,00	99,975%
	$3.996.575,00		
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)	$759.349,25	$ 759.159,25	99,975%
	$759.349,25		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL ,AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C	$33.777.431,20	$ 11.950.634,68	35,381%
	$33.777.431,20		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)	$504.000,00		0,000%
	$504.000,00		
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES	$0,00	$ 2.592.830,22	99,961%
	$2.593.830,22		
IVA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19%	$0,00	$ 492.637,74	99,961%
	$492.827,74		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$76.634.751,96	$ 31.334.693,22	39,316%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$79.699.017,21		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$630.007.748,26**	$ 95.235.158,84	15,117%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$630.007.748,26**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	PÁGINA	2 DE 4
	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	FECHA	31/12/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30 **DE** Diciembre de 2024. (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 30 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.421.282.963,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 630.007.748.262,00

PLAZO ACUMULADO: 72,1 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

2 de 4

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	23 may-24	24 jun-24	25 jul-24	26 ago-24	27 sep-24	28 oct-24	29 nov-24	30 dic-24	31 ene-25	32 feb-25	33 mar-25	34 abr-25	35 may-25	36 jun-25	37 jul-25	38 ago-25	39 sep-25	40 oct-25	41 nov-25	42 dic-25	43 ene-26	44 feb-26
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1,1.2,2.3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,224%	0,092%	% P	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,000%	0,000%	0,018%	0,018%	0,018%	0,018%	0,061%	0,061%	0,061%	0,061%	0,015%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 2.023.404,28	0,366%	$ 506.724,31	$ P	$79.309	$79.309	$79.309	$79.309	$79.309	$0	$0	$97.602	$97.602	$97.602	$97.602	$280.105	$280.105	$280.105	$280.105	$82.884	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$145.459	$9.924	$75.538	$24.865	$26.203	$28.736	$2.455	$13.533	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0,026%	0,002%	0,014%	0,004%	0,005%	0,007%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5.6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%	0,051%	% P	0,014%	0,014%	0,014%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,010%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 2.598.021,79	0,469%	$ 281.729,26	$ P	$75.768	$75.768	$75.768	$0	$0	$0	$0	$0	$52.587	$52.587	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$0	$108.352	$30.594	$33.357	$27.044	$4.956	$0	$57.225	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13 Y 14)	$ 13.698.762,53	2,476%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 11.736.929,43	2,121%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E														$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79)	$ 535.135.350,83	96,704%	11,277%	% P	0,186%	0,186%	0,181%	0,271%	0,452%	0,341%	0,403%	0,430%	0,286%	0,340%	0,425%	0,818%	0,803%	2,242%	1,880%	1,846%	2,296%	4,289%	3,209%	4,821%	1,114%	1,124%
	$ 532.392.503,14	96,209%	$ 62.405.745,33	$ P	$206.000	$206.000	$206.000	$300.000	$500.000	$1.888.707	$2.227.957	$2.379.502	$1.561.869	$1.916.359	$2.351.149	$2.855.721	$4.438.198	$12.404.475	$10.404.675	$10.213.262	$12.702.913	$12.702.913	$17.756.075	$26.555.484	$6.166.462	$6.218.562
				$ E	$1.223.073	$223.741	$651.272	$1.060.932	$4.727.722	$4.424.000	$4.833.372	$18.018.620	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0,222%	0,149%	0,101%	0,193%	0,858%	0,819%	0,750%	0,552%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55 Y 69)	$ 467.584,97	0,084%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 495.815,18	0,090%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77)	$ 23.481,25	0,004%	0,080%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,094%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 486.629,64	0,088%	$ 439.990,97	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$463.148	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$7.827	$7.827	$7.827	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							$439.991	$0														
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,048%	% P	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,000%	0,000%	0,017%	0,017%	0,017%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 575.427,34	0,104%	$ 266.275,76	$ P	$95.995	$95.995	$95.995	$95.995	$95.995	$0,0	$0,0	$95.995	$93.259	$93.259	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$100.334	$0	$60.837	$21.399	$17.353	$5.456	$37.23	$41.144	$ -	$ -												
				% E	0,018%	0,000%	0,011%	0,004%	0,003%	0,001%	0,004%	0,007%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**11,547%**																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.308.730,79**	**99,446%**	**$ 63.900.465,621**																							

REPROGRAMACIÓN #04

REPROGRAMACIÓN #05

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,152%	0,170%	0,206%	0,301%	0,462%	0,425%	0,403%	0,465%	0,326%	0,390%	0,453%	0,567%	0,853%	2,292%	1,931%	1,852%	2,297%	2,297%	3,209%	4,871%	1,114%	1,124%
	VALOI			$ 841.672,78	$ 941.672,78	$ 1.141.672,78	$ 1.665.904,56	$ 2.663.904,56	$ 2.351.855,80	$ 2.227.957,03	$ 2.573.008,46	$ 1.805.311,38	$ 2.159.806,25	$ 2.542.009,12	$ 3.135.826,13	$ 4.718.302,80	$ 12.684.579,93	$ 10.684.579,93	$ 10.303.372,06	$ 12.710.739,77	$ 12.710.739,77	$ 17.756.074,57	$ 26.555.484,37	$ 6.166.462,19	$ 6.218.561,65
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			5,515%	5,685%	5,891%	9,192%	9,674%	10,626%	11,029%	11,502%	11,828%	12,219%	12,678%	13,245%	14,097%	16,390%	18,320%	20,163%	22,479%	24,776%	27,860%	32,690%	33,971%	35,094%	
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 47.119.021,14	$ 48.060.693,92	$ 49.202.366,70	$ 50.868.271,26	$ 53.534.175,82	$ 56.050.120,08	$ 57.078.077,11	$ 59.651.085,56	$ 61.456.396,94	$ 63.616.203,19	$ 66.158.212,31	$ 69.294.038,44	$ 74.012.341,24	$ 86.696.921,17	$ 97.381.501,09	$ 107.685.473,95	$ 120.396.213,72	$ 133.106.953,50	$ 150.863.028,46	$ 181.418.512,83	$ 187.984.975,02	$ 194.203.536,67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			0,266%	0,170%	0,135%	0,208%	0,871%	0,628%	0,434%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	VALOI			$ 1.473.905,36	$ 942.016,52	$ 748.471,20	$ 1.149.413,16	$ 4.818.424,27	$ 3.473.407,77	$ 2.401.153,69	$ 1.527.639,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			8,826%	8,996%	9,131%	9,339%	10,210%	10,837%	11,271%	11,547%															
	VALOR (Miles de Pesos)			$ 48.839.939,13	$ 49.781.955,65	$ 50.530.426,85	$ 51.679.840,01	$ 56.498.264,28	$ 59.971.672,05	$ 62.372.825,74	$ 63.900.465,62															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$32.410.096,98 / $32.410.096,98	$ 10.996.532,11	33,929%
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$600.000,00 / $600.000,00	$ -	0,000%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS	$300.000,00 / $300.000,00	$ -	0,000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$4.287.299,53 / $4.264.906,82	$ 547.324,21	12,833%
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	$3.996.575,00 / $3.996.575,00	$ 3.995.575,00	99,975%
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)	$759.349,25 / $759.349,25	$ 759.159,25	99,975%
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL ,AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C	$33.777.431,20 / $33.777.431,20	$ 11.950.634,68	35,381%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)	$504.000,00 / $504.000,00	$ -	0,000%
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES	$0,00 / $2.593.830,22	$ 2.592.830,22	99,961%
IVA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19%	$0,00 / $492.827,74	$ 492.637,74	99,961%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B ')	$78.634.751,98	$ 31.334.693,22	39,316%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$79.699.017,21		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$630.007.748,26**	**$ 95.235.168,84**	15,117%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$630.007.748,01**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 30 **DE** Diciembre de 2024. (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 30
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 1.527.639.884,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 630.007.748.262,00

PLAZO ACUMULADO: 72,1 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1,1.2,2.3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,224%	0,092%
	$ 2.023.404,28	0,366%	$ 506.724,31
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%	0,051%
	$ 2.598.021,79	0,469%	$ 281.729,26
IMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13)	$ 13.698.762,53	2,476%	0,000%
	$ 11.736.929,43	2,121%	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79)	$ 532.392.503,14	96,209%	$ 62.405.745,33
	$ 535.135.350,83	96,704%	11,277%
EGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1,	$ 467.584,97	0,084%	0,000%
	$ 495.815,18	0,090%	$ -
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77)	$ 23.481,25	0,004%	0,080%
	$ 486.629,64	0,088%	$ 439.990,97
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,048%
	$ 575.427,34	0,104%	$ 266.275,76
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**11,547%**
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.308.730,79**	**99,446%**	**$ 63.900.465,62**

% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	45 mar-26	46 abr-26	47 may-26	48 jun-26	49 jul-26	50 ago-26	51 sep-26	52 oct-26	53 nov-26	54 dic-26	55 ene-27	56 feb-27	57 mar-27	58 abr-27	59 may-27	60 jun-27	61 jul-27	62 ago-27	63 sep-27	64 oct-27	65 nov-27	66 dic-27
% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
% P	0,000%	0,000%	0,241%	0,241%	0,241%	0,241%	0,241%	0,241%	0,241%	0,241%	0,241%	0,241%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
$ P	$0,0	$0	$228.659	$227.330	$227.330	$227.330	$227.330	$227.330	$227.330	$227.330	$227.330	$226.651	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
$ E																						
% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,080%	0,085%	0,085%	0,085%	0,085%	0,085%	0,085%	0,240%	0,464%
$ P														$441.593	$28.529	$28.529	$28.529	$28.529	$28.529	$28.529	$219.033	$2.678.173
$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
% P	1,249%	2,144%	1,927%	1,899%	2,676%	2,562%	3,455%	5,993%	6,293%	5,673%	1,466%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,048%	1,963%	1,259%
$ P	$6.910.265,00	$11.861.756,77	$10.892.596,18	$10.508.826,09	$14.592.757	$14.343.272	$19.459.137	$33.152.230	$34.687.269	$31.420.240	$8.112.172	$11.151.107	$11.151.107	$11.151.107	$11.151.107	$11.151.107	$11.151.107	$11.151.107	$11.151.107	$11.158.055	$10.375.277	$10.337.837
$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,019%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,002%	0,002%	0,003%
$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$105.100	$16.647	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$9.352	$3.352	$9.341	$18.703
$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
$ E																						
% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
$ E																						
% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,249%	2,144%	1,968%	1,899%	2,676%	2,633%	3,516%	6,037%	6,313%	5,724%	1,510%	2,061%	2,020%	2,100%	2,025%	2,025%	2,025%	2,025%	2,024%	2,023%	2,025%	3,295%
	VALOI	$ 6.910.265,00	$ 11.861.756,77	$ 10.892.596,18	$ 10.508.826,09	$ 14.810.087,34	$ 14.570.608,67	$ 19.459.137,50	$ 33.406.215,60	$ 34.933.302,10	$ 31.672.982,27	$ 8.358.205,32	$ 11.405.951,85	$ 11.179.900,65	$ 11.621.493,86	$ 11.208.429,20	$ 11.208.429,20	$ 11.208.429,20	$ 11.208.429,20	$ 11.199.077,50	$ 11.195.935,97	$ 11.203.851,50	$ 18.234.713,31
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	36,343%	38,487%	40,455%	42,354%	45,030%	47,663%	51,180%	57,217%	63,530%	69,253%	70,764%	72,825%	74,845%	76,945%	78,971%	80,996%	83,022%	85,047%	87,071%	89,094%	91,119%	94,414%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 201.113.802,47	$ 212.975.559,24	$ 223.868.155,41	$ 234.376.981,50	$ 249.187.068,83	$ 263.757.677,51	$ 283.216.815,00	$ 316.623.030,60	$ 351.556.332,71	$ 383.229.314,97	$ 391.587.520,29	$ 402.993.472,14	$ 414.173.372,79	$ 425.794.866,65	$ 437.003.295,85	$ 448.211.725,04	$ 459.420.154,24	$ 470.628.583,43	$ 481.827.660,93	$ 493.023.596,89	$ 504.227.448,40	$ 522.462.161,70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	VALOI	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$32.410.096,98	$ 10.996.532,11	33,929%
	$32.410.096,98		
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$600.000,00	$ -	0,000%
	$600.000,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS	$300.000,00	$ -	0,000%
	$300.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$4.287.299,53	$ 547.324,21	12,766%
	$4.287.299,53		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	$3.996.575,00	$ 3.995.575,00	99,975%
	$3.996.575,00		
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)	$759.349,25	$ 759.159,25	99,975%
	$759.349,25		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C	$33.777.431,20	$ 11.950.634,68	35,381%
	$33.777.431,20		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)	$504.000,00	$ -	0,000%
	$504.000,00		
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES	$0,00	$ 2.592.830,22	99,961%
	$2.593.830,22		
IVA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19%	$0,00	$ 492.637,74	99,961%
	$492.827,74		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$76.634.751,96	$ 31.334.693,22	40,888%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$76.634.751,96		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$630.007.748,26**	$ 95.235.158,84	15,117%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$630.007.748,26**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVÁR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	PÁGINA	4 DE 4
	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	FECHA	31/12/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 30 **DE** Diciembre de 2024. (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 1.527.639.884,00

SEGUIMIENTO No. 30
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022. **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 72,1 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 630.007.748.262,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	67 ene-28	68 feb-28	69 mar-28	70 abr-28	71 may-28	72 jun-28	73 jul-28
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1,1.2,2,3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,224%	0,092%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 2.023.404,28	0,366%	$ 506.724,31	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%	0,051%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 2.598.021,79	0,469%	$ 281.729,26	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
IMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13 Y	$ 13.698.762,53	2,476%	0,000%	% P	0,330%	0,330%	0,251%	0,599%	0,001%	0,000%	0,000%
	$ 11.736.929,43	2,121%	$ -	$ P	$1.858.152	$1.827.861	$1.387.187	$3.143.862	$3.357	$0,0	$0,0
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79)	$ 535.135.350,83	96,704%	11,277%	% P	1,95%	0,94%	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 532.392.503,14	96,209%	$ 62.405.745,33	$ P	$10.814.596	$5.213.140	$3.445.789			$0,0	$0,0
				$ E				$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1,	$ 467.584,97	0,084%	0,000%	% P	0,003%	0,003%	0,001%	0,003%	0,001%	0,000%	0,000%
	$ 495.815,18	0,090%	$ -	$ P	$18.703	$18.703	$46.758	$18.703	$37.217	$0,0	$0,0
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77)	$ 23.481,25	0,004%	0,080%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 486.629,64	0,088%	$ 439.990,97	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,048%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 575.427,34	0,104%	$ 266.275,76	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Ajuste por acta de modificación	$ 0,25										$0,2545
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**11,547%**								
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.308.731,05**	**99,446%**	**$ 63.900.465,62**								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	2,293%	1,277%	0,882%	0,573%	0,007%	0,000%	0,000%	
	VALOR	$ 12.691.451,11	$ 7.065.644,30	$ 4.879.734,39	$ 3.168.565,67	$ 41.173,62	$ -	$ 0,2545	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	96,707%	97,984%	98,866%	99,439%	99,446%	99,446%	99,446%	
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 535.153.612,81	$ 542.219.257,11	$ 547.098.991,51	$ 550.267.557,17	$ 550.308.730,79	$ 550.308.730,79	$ 550.308.731,048	$ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
	VALOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	
	VALOR (Miles de Pesos)								

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$32.410.096,98 / $32.410.096,98	$ 10.996.532,11	33,929%
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$600.000,00 / $600.000,00	$ -	0,000%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS	$300.000,00 / $300.000,00	$ -	0,000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$4.287.299,53 / $4.287.299,53	$ 547.324,21	12,766%
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)	$3.996.575,00 / $3.996.575,00	$ 3.995.575,00	99,975%
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% =(2)	$759.349,25 / $759.349,25	$ 759.159,25	99,975%
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C	$33.777.431,20 / $33.777.431,20	$ 11.950.634,68	35,381%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)	$504.000,00 / $504.000,00	$ -	0,000%
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES	$0,00 / $2.593.830,22	$ 2.592.830,22	99,961%
IVA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19%	$0,00 / $492.827,74	$ 492.637,74	99,961%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$76.634.751,96	$ 31.334.693,22	40,888%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$76.634.751,96		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$630.007.748,26**	$ 95.235.158,84	15,117%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$630.007.748,26**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1 DE 4	
FECHA	DIC - 2024 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indica Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de P	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CABALLERO MALDONADO LUDYS ROCIO	108345618 8	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	$ 1.872.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.260.305,00	$ 157.400,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 90.500,00	PORVENIR	9477304792	$ 361.700,00	$ 90.500,00			
2	LOPEZ RODRIGUEZ ALBEIRO JOSE	85372059	AYUDANTE	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.460.145,00	$ 101.700,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 58.500,00	PORVENIR	9477304792	$ 233.700,00	$ 58.500,00			
3	POLO MAIGUEL JORGE LUIS	85455573	AYUDANTE	$ 1.604.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.818.143,00	$ 126.600,00	V	COOSALUD	9477304792	$ 72.800,00	COLPENSIONES	9477304792	$ 291.000,00	$ 72.800,00			
4	SAN JOSE CASTILLO AYLIN VANESSA	1140842732	INGENIERA RESIDENTE	$ 5.699.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.699.301,00	$ 357.100,00	V	SURA	9477304792	$ 228.000,00	COLFONDOS	9477304792	$ 969.300,00	$ 228.000,00			
5	PORRETA CARVAL WENDY JOLANYS	39101775	PROFRESIONAL GESTION HUMANA	$ 4.221.900,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.221.900,00	$ 274.300,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 169.100,00	PROTECCION	9477304792	$ 675.700,00	$ 169.100,00			
6	JAZMIN RUIZ MACA	66912520	SERVICIOS GENERALES	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.896.305,00	$ 132.000,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 75.900,00	PORVENIR	9477304792	$ 303.500,00	$ 75.900,00			
7	CUBIDES HERMIDA NIRIA AMPARO	66830413	GESTORA SOCIAL	$ 6.010.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.810.055,00	$ 348.700,00	V	NUEVA EPS	9477304792	$ 232.800,00	COLPENSIONES	9477304792	$ 988.800,00	$ 232.800,00			
8	HERNAN YESID NARVAEZ PANTOJA	1087413014	PROFESIONAL OFICINA TÉCNICA	$ 6.338.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 7.020.817,00	$ 474.000,00	V	SURA	9477304792	$ 280.900,00	PROTECCION	9477304792	$ 1.193.900,00	$ 280.900,00			
9	GERMAN OSPINA MARIN	15959780	MAESTRO DE OBRA	$ 6.276.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 7.817.100,00	$ 544.100,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 312.700,00	COLPENSIONES	9477304792	$ 1.329.000,00	$ 312.700,00			
10	HERBERT ALFREDO VERA GALINDO	1073323239	LABORATORISTA	$ 5.019.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.019.000,00	$ 349.400,00	V	COMPENSAR	9477304792	$ 200.800,00	PORVENIR	9477304792	$ 803.100,00	$ 200.800,00			
11	FREDY JUNIOR CASTILLO RODRIGUEZ	1083568264	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.037.845,00	$ 141.900,00	V	MUTUAL SER	9477304792	$ 81.600,00	PORVENIR	9477304792	$ 326.100,00	$ 81.600,00			
12	YOANDRIS MEJIA MEJIA	1221982696	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.887.121,00	$ 131.400,00	V	MUTUAL SER	9477304792	$ 75.500,00	PROTECCION	9477304792	$ 302.000,00	$ 75.500,00			
13	JOSE DAVID FELIPE SANJUAN	1221964274	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.012.410,00	$ 140.100,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 80.500,00	PORVENIR	9477304792	$ 322.000,00	$ 80.500,00			
14	JESUS MARIA LEIVA DURAN	1083461770	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.630.182,00	$ 113.500,00	V	MUTUAL SER	9477304792	$ 65.300,00	COLFONDOS	9477304792	$ 260.900,00	$ 65.300,00			
15	VANESSA RAMIREZ SANTA	1140835286	ABOGADO PREDIAL	$ 7.225.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 7.982.547,00	$ 505.300,00	V	SANITAS	9477304792	$ 319.500,00	COLPENSIONES	9477304792	$ 1.357.800,00	$ 319.500,00			
16	JUAN DAVID LOPEZ VASQUEZ	1004376277	OPERADOR MÚLTIPLE MOVIMIENTO DE T	$ 2.975.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.945.233,00	$ 274.600,00	V	SALUDTOTAL	9477304792	$ 157.900,00	PORVENIR	9477304792	$ 631.300,00	$ 157.900,00			
17	EDWIN ZAIR SAUMET VASQUEZ	1082854200	INGENIERO DE MANTENIMIENTO	$ 4.917.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.844.568,00	$ 384.000,00	V	SANITAS	9477304792	$ 233.900,00	PROTECCION	9477304792	$ 994.100,00	$ 233.900,00			
18	ARMANDO JOSE MORALES ARCON	72306439	MECANICO 1	$ 3.336.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.353.723,00	$ 303.100,00	V	NUEVA EPS	9477304792	$ 174.200,00	COLPENSIONES	9477304792	$ 696.600,00	$ 174.200,00			
19	DEIBIS JUNIOR HERNANDEZ RAMIREZ	1004382793	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.607.337,00	$ 111.900,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 64.300,00	PORVENIR	9477304792	$ 257.200,00	$ 64.300,00			
20	YAIR ALFONSO ARZUZA RIVERA	12637222	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUI	$ 1.982.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.605.098,00	$ 181.400,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 104.300,00	PORVENIR	9477304792	$ 416.900,00	$ 104.300,00			
21	GUSTAVO BRAVO VIDES	1082949612	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUI	$ 1.982.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.317.837,00	$ 161.400,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 92.800,00	COLFONDOS	9477304792	$ 370.900,00	$ 92.800,00			
22	JORGE ALI CASTRO PEREZ	1052053123	OPERADOR PLANTA CONCRETO MÓVIL	$ 2.054.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.655.074,00	$ 184.800,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 106.300,00	PORVENIR	9477304792	$ 424.900,00	$ 106.300,00			
23	ALEXANDER CORREA ROJAS	13570888	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUI	$ 2.264.900,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.019.457,00	$ 210.200,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 120.800,00	PORVENIR	9477304792	$ 483.200,00	$ 120.800,00			
24	JAIME JUNIOR VARELA AVILA	12630370	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUI	$ 1.982.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.055.810,00	$ 212.700,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 122.300,00	COLPENSIONES	9477304792	$ 489.000,00	$ 122.300,00			
25	HERNAN ALCIBAR ACEVEDO GOMEZ	9763548	COORDINADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 4.778.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.738.174,00	$ 388.300,00	V	SURA	9477304792	$ 229.600,00	PORVENIR	9477304792	$ 975.600,00	$ 229.600,00			
26	VICTOR ALFONSO VILLANUEVA MARIÑO	1083466893	OPERADOR MINICARGADOR	$ 2.173.400,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.653.753,00	$ 184.800,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 106.200,00	PORVENIR	9477304792	$ 424.700,00	$ 106.200,00			
27	JORGE LUIS GARCIA SANCHEZ	19588740	CONDUCTOR MIXER	$ 2.264.900,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.584.504,00	$ 149.400,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 103.500,00	PORVENIR	9477304792	$ 413.600,00	$ 85.900,00			
28	JESUS HERNANDO GARCIA GALLEGO	16053802	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.344.653,00	$ 232.800,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 133.800,00	PROTECCION	9477304792	$ 535.200,00	$ 133.800,00			
29	MIRTA DEL CARMEN MERCADO GONZALEZ	30764740	SERVICIOS GENERALES	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.363.587,00	$ 95.000,00	V	MUTUAL SER	9477304792	$ 54.600,00	PORVENIR	9477304792	$ 218.200,00	$ 54.600,00			
30	MILLER ANTONIO URIELES RABELO	12634423	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.769.838,00	$ 123.200,00	V	COOSALUD	9477304792	$ 70.800,00	PORVENIR	9477304792	$ 283.200,00	$ 70.800,00			
31	FERNANDO JOSE ROBLES PRADO	12448260	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.233.808,00	$ 225.100,00	V	NUEVA EPS	9477304792	$ 129.400,00	COLFONDOS	9477304792	$ 517.500,00	$ 129.400,00			
32	WILDIS JOSE MELENDREZ MANGA	1083458755	OFICIAL 3	$ 1.972.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.591.015,00	$ 180.400,00	V	FAMISANAR	9477304792	$ 103.700,00	PORVENIR	9477304792	$ 414.600,00	$ 103.700,00			
33	VICTOR ALFONSO ARIAS MOLINA	77105480	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUI	$ 1.982.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.535.078,00	$ 176.500,00	V	NUEVA EPS	9477304792	$ 101.500,00	PORVENIR	9477304792	$ 405.700,00	$ 101.500,00			
34	DANYS DE JESUS MUÑOZ SALAS	1083469401	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.238.628,00	$ 225.500,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 129.600,00	PORVENIR	9477304792	$ 518.200,00	$ 129.600,00			
35	ARMANDO LUIS ESPINOSA ROMERO	1063970540	OPERADOR DE TELEHANDLER	$ 2.071.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.421.383,00	$ 162.500,00	V	ASME SALUD	9477304792	$ 96.900,00	PORVENIR	9477304792	$ 387.500,00	$ 93.400,00			
36	JAVIER JOSE BUSTILLO MARIANO	72018821	MECANICO 1	$ 3.336.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.173.022,00	$ 290.500,00	V	SURA	9477304792	$ 167.000,00	PORVENIR	9477304792	$ 667.000,00	$ 167.000,00			
37	RAMIRO ALBERTO ECHEVERRY VALENCIA	15428183	TOPÓGRAFO	$ 4.165.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.674.420,00	$ 325.400,00	V	NUEVA EPS	9477304792	$ 187.000,00	COLPENSIONES	9477304792	$ 748.000,00	$ 187.000,00			
38	CARMEN CECILIA GARIZABALO MANJARREZ	1007937213	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.091.540,00	$ 145.600,00	V	MUTUAL SER	9477304792	$ 83.700,00	PORVENIR	9477304792	$ 334.700,00	$ 83.700,00			
39	GUSTAVO ENRIQUE MUNIVE CHARRIS	1221973557	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.192.337,00	$ 152.600,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 87.700,00	PORVENIR	9477304792	$ 350.800,00	$ 87.700,00			
40	LUIS ENRIQUE SERNA EUSSE	1044121090	AYUDANTE PRÁCTICO	$ 1.584.800,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.959.143,00	$ 130.400,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 78.400,00	PORVENIR	9477304792	$ 313.500,00	$ 74.900,00			
41	CARLOS MANUEL CASTRO VALVERDE	1004162771	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.002.519,00	$ 139.400,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 80.200,00	PORVENIR	9477304792	$ 320.500,00	$ 80.200,00			
42	JHOANN SEBASTIAN GOMEZ GARCIA	1065830136	ASISTENTE ALMACEN	$ 1.872.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.014.436,00	$ 140.300,00	V	NUEVA EPS	9477304792	$ 80.600,00	PROTECCION	9477304792	$ 322.400,00	$ 110.100,00			
43	HECTOR FABIAN ESPINOSA PATIÑO	1093220593	INGENIERO RESIDENTE	$ 5.185.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 7.171.990,00	$ 499.200,00	V	SURA	9477304792	$ 286.900,00	PORVENIR	9477304792	$ 1.219.400,00	$ 286.900,00			
44	JAIDER DE JESUS LAZO OROZCO	1083457506	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.761.830,00	$ 122.700,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 70.500,00	PORVENIR	9477304792	$ 281.900,00	$ 70.500,00			
45	HEIDI LIZETT POLO MAZZILLY	39143701	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.087.301,00	$ 145.300,00	V	MUTUAL SER	9477304792	$ 83.500,00	PORVENIR	9477304792	$ 334.000,00	$ 83.500,00			
46	LEANDRO RAFAEL LORA ONOFRE	08/07/2024	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.677.754,00	$ 116.800,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 67.200,00	COLPENSIONES	9477304792	$ 268.500,00	$ 67.200,00			
47	YIMY ANDRES MUÑOZ MONTOYA	98696731	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.982.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.787.437,00	$ 194.100,00	V	SALUD TOTAL	9477304792	$ 111.500,00	PORVENIR	9477304792	$ 446.000,00	$ 111.500,00			
48	CONRADO HERNAN LOPERA PALACIO	15507009	DIRECTOR DE PROYECTO	$ 21.856.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 24.271.000,00	$ 1.689.300,00	V	SURA	9477301522	$ 3.033.900,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 4.271.800,00	$ 970.900,00	$ 485.500,00	$ 728.200,00	
49	MARGARETH SOLENA CRUZ GONZALEZ	52155687	AUDITOR INTERNO CALIDAD	$ 12.030.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 12.030.600,00	$ 837.400,00	V	COMPENSAR	9476819985	$ 481.300,00	COLPENSIONES	9476819985	$ 1.924.900,00	#N/D			
50	NEUDIS DIAZ DIAZ	73180776	INGENIERO RESIDENTE PREDIAL	$ 6.972.100,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 6.972.102,00	$ 436.800,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 278.900,00	PORVENIR	9477301522	$ 1.185.600,00	$ 278.900,00			
51	JORGE SERAFIN PASOS GARCIA	1051417591	PROFESIONAL OFICINA TÉCNICA	$ 5.699.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 5.699.301,00	$ 370.300,00	V	SANITAS	9477301522	$ 228.000,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 969.100,00	$ 228.000,00			
52	RICARDO ALFONSO PEREZ GAVIRIA	1073984096	CAPATAZ	$ 3.504.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 4.773.318,00	$ 270.200,00	V	SURA	9477301522	$ 191.100,00	COLFONDOS	9477301522	$ 763.800,00	$ 183.500,00			
53	NANCY ASTRID PACHON RUEDA	1082841160	PROFESIONAL SOCIO PREDIAL	$ 4.816.600,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 4.816.602,00	$ 312.900,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 192.900,00	PORVENIR	9477301522	$ 770.700,00	$ 192.900,00			
54	MARIA CATALINA MORENO PINO	1044505420	GESTOR CALIDAD	$ 5.596.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 5.596.200,00	$ 363.600,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 224.000,00	COLFONDOS	9477301522	$ 951.900,00	$ 224.000,00			
55	WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO	75083946	DIRECTOR DE OBRA	$ 12.666.500,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 15.081.501,00	$ 1.049.700,00	V	SURA	9477301522	$ 1.885.200,00	PORVENIR	9477301522	$ 2.564.100,00	$ 603.300,00	$ 301.700,00	$ 452.500,00	
56	MANUEL SEGUNDO CABALLERO OROZCO	85373172	OFICIAL 3	$ 1.972.200,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 2.352.708,00	$ 163.800,00	V	SALUDTOTAL	9477301522	$ 94.200,00	PORVENIR	9477301522	$ 376.500,00	$ 94.200,00			
57	SUREYS VANESSA MONSALVO GARCIA	1065615031	SERVICIOS GENERALES	$ 1.300.000,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 1.514.312,00	$ 105.400,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 60.600,00	PORVENIR	9477301522	$ 242.300,00	$ 60.600,00			
58	MARTIN DANILO GUERRERO CABEZA	1083465789	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 3.197.663,00	$ 222.600,00	V	MUTUAL SER	9477301522	$ 128.000,00	PORVENIR	9477301522	$ 511.700,00	$ 128.000,00			
59	ARMANDO ALFONSO MEJIA MONSALVO	12635938	CADENERO 1	$ 2.459.700,00	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MINCIVIL S.A	$ 2.789.443,00	$ 194.200,00	V	MUTUAL SER	9477301522	$ 111.600,00	PROTECCION	9477301522	$ 446.400,00	$ 111.600,00			

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 DE 4
FECHA	DIC - 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL:

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de P.	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
60	MILTON JESUS SALAMANCA GARCIA	12449252	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.982.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.491.989,00	$ 173.500,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 99.700,00	PORVENIR	9477301522	$ 398.800,00	$ 99.700,00			
61	RONNY LEANDRO GRANADOS CELIS	12449382	CONDUCTOR TRACTO CAMIÓN MATERIAL	$ 2.855.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.786.244,00	$ 263.600,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 151.500,00	PORVENIR	9477301522	$ 605.800,00	$ 151.500,00			
62	JUAN MIGUEL CERPA DEL VALLE	85372869	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.656.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.241.707,00	$ 225.700,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 129.700,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 518.700,00	$ 129.700,00			
63	ALFONSO MIGUEL CORREA SUAREZ	73201895	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.982.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.429.151,00	$ 169.100,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 97.200,00	PORVENIR	9477301522	$ 388.700,00	$ 97.200,00			
64	MILLER SIMON OVIEDO SIERRA	1140851190	OPERADOR MOTONIVELADOR SERIADO	$ 2.975.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.417.514,00	$ 231.000,00	V	MUTUAL SER	9477301522	$ 136.800,00	PORVENIR	9477301522	$ 546.900,00	$ 136.800,00			
65	DANIEL ENRIQUE AGUILAR RUIZ	1004376234	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 1.625.001,00	$ 113.200,00	V	SURA	9477301522	$ 65.100,00	PORVENIR	9477301522	$ 260.100,00	$ 65.100,00			
66	DAVID ENRIQUE RUIZ CORREA	12626612	ELECTRICISTA INDUSTRIAL	$ 3.207.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.119.234,00	$ 286.700,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 164.800,00	PORVENIR	9477301522	$ 659.100,00	$ 164.800,00			
67	IVAN DE JESUS CANTILLO RIVALDO	1063948472	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.982.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.564.881,00	$ 178.600,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 102.600,00	COLFONDOS	9477301522	$ 410.400,00	$ 102.600,00			
68	JORGE ANDRES MEJIA LOPEZ	1085225414	PROMOTOR SOCIAL	$ 2.598.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.179.745,00	$ 221.400,00	V	SURA	9477301522	$ 127.200,00	PROTECCION	9477301522	$ 508.800,00	$ 127.200,00			
69	EDWANS YEUSENS ZUÑIGA RESTREPO	1083556713	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.253.086,00	$ 226.500,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 130.200,00	PROTECCION	9477301522	$ 520.500,00	$ 130.200,00			
70	JULIO CESAR URUETA NORIEGA	12637898	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 1.795.743,00	$ 125.000,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 71.900,00	PORVENIR	9477301522	$ 287.400,00	$ 71.900,00			
71	MARLON ALONSO MURCIA	85472989	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.982.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.849.987,00	$ 198.400,00	V	SURA	9477301522	$ 114.000,00	PORVENIR	9477301522	$ 456.000,00	$ 114.000,00			
72	DEIBIS DE JESUS HERNANDEZ GALAN	85370303	MECANICO 2	$ 2.639.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.437.063,00	$ 239.300,00	V	SALUDTOTAL	9477301522	$ 137.500,00	PORVENIR	9477301522	$ 550.000,00	$ 137.500,00			
73	RONNY RUIZ DA COSTA	15877434	ASISTENTE MANTENIMIENTO	$ 1.872.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.406.131,00	$ 167.500,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 96.300,00	PORVENIR	9477301522	$ 385.000,00	$ 96.300,00			
74	JEISON DAVID MELGAREJO CARBONO	85370470	OPERADOR CARGADOR	$ 2.633.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.127.164,00	$ 217.700,00	V	MUTUAL SER	9477301522	$ 125.100,00	PORVENIR	9477301522	$ 500.400,00	$ 125.100,00			
75	JUAN CARLOS BLANCO CAMPO	72272642	OPERADOR BULLDOZER	$ 2.656.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.890.342,00	$ 201.200,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 115.700,00	PORVENIR	9477301522	$ 462.500,00	$ 115.700,00			
76	ELIECER JOSE BLANCO JIMENEZ	1083454506	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 1.630.889,00	$ 113.600,00	V	FAMISANAR	9477301522	$ 65.300,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 261.000,00	$ 65.300,00			
77	JORGE ELIAS CHAVARRIA CARVAJAL	70579768	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.216.941,00	$ 223.900,00	V	MUTUAL SER	9477301522	$ 128.700,00	PORVENIR	9477301522	$ 514.800,00	$ 128.700,00			
78	PEDRO MIGUEL OLMOS GONZALEZ	1103117633	GESTOR AMBIENTAL	$ 4.436.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.436.802,00	$ 288.300,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 177.700,00	PORVENIR	9477301522	$ 710.000,00	$ 177.700,00			
79	ADAN JEISON DIAZ VARELA	1221963812	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 2.496.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.828.915,00	$ 196.900,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 113.200,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 452.700,00	$ 113.200,00			
80	JORGE LUIS ORTIZ SAENZ	10773597	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 2.078.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.030.308,00	$ 211.000,00	V	SALUDTOTAL	9477301522	$ 121.300,00	PROTECCION	9477301522	$ 484.900,00	$ 121.300,00			
81	JAIBERTH DARIO AREIZA SOSSA	70582361	LUBRICADOR	$ 2.209.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.692.973,00	$ 257.100,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 147.800,00	PORVENIR	9477301522	$ 590.900,00	$ 147.800,00			
82	ELKIN DARIO URREA ESCOBAR	71003897	MECANICO 1	$ 3.745.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 5.127.127,00	$ 315.500,00	V	SURA	9477301522	$ 205.200,00	PORVENIR	9477301522	$ 820.400,00	$ 196.400,00			
83	WILBER QUINTANA MERCADO	1044909435	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	$ 1.546.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.406.964,00	$ 167.600,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 96.300,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 385.200,00	$ 96.300,00			
84	JOSE LEVER VARGAS CARDONA	10179924	SOLDADOR 1 METALMECANICA	$ 3.303.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.937.871,00	$ 274.100,00	V	COOSALUD	9477301522	$ 157.600,00	PORVENIR	9477301522	$ 630.100,00	$ 157.600,00			
85	RICARDO LONDOÑO MORENO	16894151	GESTOR SSL	$ 5.642.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 5.783.358,00	$ 402.600,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 231.400,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 983.400,00	$ 231.400,00			
86	JORGE LUIS RODRIGUEZ MENDOZA	9876342	AYUDANTE MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.283.243,00	$ 159.000,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 91.400,00	PORVENIR	9477301522	$ 365.400,00	$ 91.400,00			
87	JOSE LUIS GALAN CABANA	85370483	SOLDADOR 1 METALMECANICA	$ 3.303.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.438.738,00	$ 289.500,00	V	SANITAS	9477301522	$ 172.100,00	PORVENIR	9477301522	$ 704.800,00	$ 170.900,00			
88	EDWARD FRANCISCO RAMIREZ JARAMILLO	1047429687	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.155.738,00	$ 144.300,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 121.800,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 500.500,00	$ 111.400,00			
89	JOEL ANTONIO CACERES CALVO	12448406	OPERADOR DE BULLDOZER	$ 2.656.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.005.859,00	$ 209.300,00	V	MUTUAL SER	9477301522	$ 120.300,00	PROTECCION	9477301522	$ 481.000,00	$ 120.300,00			
90	JHON CARLOS GOMEZ MEJIA	7561577	DIRECTOR DE OBRA	$ 16.636.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 19.051.701,00	$ 1.326.000,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 2.381.500,00	PROTECCION	9477301522	$ 3.238.900,00	$ 762.100,00	$ 381.100,00	$ 571.600,00	
91	WILLIAM ANCIZAR JIMENEZ RESTREPO	1044120126	OFICIAL 0	$ 2.660.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.304.652,00	$ 230.100,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 132.200,00	PROTECCION	9477301522	$ 528.800,00	$ 132.200,00			
92	ENDERSON ENRIQUE LLORENTE CERVANTES	85370808	SOLDADOR METALMECANICA 3	$ 2.459.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.000.249,00	$ 208.900,00	V	SURA	9477301522	$ 120.100,00	PORVENIR	9477301522	$ 480.100,00	$ 120.100,00			
93	DELVER ALFONSO NORIEGA GUTIERREZ	85372053	OFICIAL 1	$ 2.660.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.212.120,00	$ 223.600,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 128.500,00	PORVENIR	9477301522	$ 514.000,00	$ 128.500,00			
94	ANA MILENA ALBARRACIN PAYARES	39057652	PROFESIONAL SOCIO PREDIAL	$ 2.844.800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.844.801,00	$ 178.200,00	V	FAMISANAR	9477301522	$ 113.900,00	PORVENIR	9477301522	$ 455.300,00	$ 113.900,00			
95	JESUS DAVID GONZALEZ POLO	1065575721	SOLDADOR RECONSTRUCCION MAQUINA	$ 2.459.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.544.613,00	$ 246.800,00	V	FAMISANAR	9477301522	$ 141.800,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 567.200,00	$ 141.800,00			
96	FRAYNES RIQUETT GUTIERREZ	85480703	ELECTROAUTO	$ 3.336.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.231.069,00	$ 294.500,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 169.300,00	COLFONDOS	9477301522	$ 677.000,00	$ 169.300,00			
97	WILLMAR ENRIQUE VILLA GARCIA	19615230	CONDUCTOR TRACTO CAMIÓN	$ 2.855.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.768.495,00	$ 331.900,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 190.800,00	PROTECCIÓN	9477301522	$ 763.000,00	$ 190.800,00			
98	EDUARDO LUIS CORTES PADILLA	1045694472	ASISTENTE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	$ 3.169.100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.169.102,00	$ 169.200,00	V	SANITAS	9477301522	$ 127.000,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 507.400,00	$ 127.000,00			
99	SAMIR JOSE ACOSTA CANTILLO	1004381051	OFICIAL 2	$ 2.361.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.919.790,00	$ 203.300,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 116.800,00	COLFONDOS	9477301522	$ 467.200,00	$ 116.800,00			
100	YEIFRAN EDUARDO LASCARRO OCHOA	85372803	OFICIAL 2	$ 2.361.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.361.500,00	$ 164.400,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 94.500,00	PORVENIR	9477301522	$ 377.900,00	$ 94.500,00			
101	LUIS FELIPE ROZO TRIANA	16161341	OPERADOR PERFORADOR HIDRÁULICO	$ 2.633.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.633.201,00	$ 12.300,00	V	MUTUAL SER	9477301522	$ 105.500,00	PORVENIR	9477301522	$ 421.400,00	$ 7.100,00			
102	JANER ALFONSO GUTIERREZ CANTILLO	1083463299	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 1.300.944,00	$ 57.400,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 46.900,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 203.100,00	$ 33.000,00			
103	ROBINSON ACOSTA CASTILLO	12633570	OFICIAL 1	2.660.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.660.301,00	$ 12.400,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 106.500,00	PORVENIR	9477301522	$ 425.800,00	$ 7.100,00			
104	BELKY YURLEY ROA CONTRERAS	1094366829	ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SOSTEN	$ 7.076.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 9.062.992,00	$ 504.700,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 362.700,00	PORVENIR	9477301522	$ 1.541.000,00	$ 362.700,00			
105	JAIDER LUIS GARIZABALO MANGA	1004377309	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 1.670.924,00	$ 116.300,00	V	SANITAS	9477301522	$ 66.900,00	PORVENIR	9477301522	$ 267.400,00	$ 66.900,00			
106	JOSE LUIS FLOREZ OROZCO	1083568241	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.261.341,00	$ 157.400,00	V	MUTUAL SER	9477301522	$ 90.500,00	PORVENIR	9477301522	$ 361.900,00	$ 90.500,00			
107	JHOINER FABIAN CUESTA SANTAMARIA	1221982081	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 1.858.624,00	$ 129.400,00	V	FAMISANAR	9477301522	$ 74.400,00	PROTECCIÓN	9477301522	$ 297.400,00	$ 74.400,00			
108	LEIVER VELASQUEZ SUAREZ	1068810899	OFICIAL 1	$ 2.660.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.207.303,00	$ 223.300,00	V	COOSALUD	9477301522	$ 128.300,00	PROTECCIÓN	9477301522	$ 513.200,00	$ 128.300,00			
109	CARLOS JOSE GUTIERREZ ACUÑA	1082403357	OPERADOR DE GRUA	$ 3.473.200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.442.173,00	$ 309.200,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 177.700,00	PORVENIR	9477301522	$ 710.800,00	$ 177.700,00			
110	LUIS GUILLERMO OROZCO FONTALVO	1083469287	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 1.989.566,00	$ 138.500,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 79.600,00	COLPENSIONES	9477301522	$ 318.400,00	$ 79.600,00			
111	GLEINER DAVID JUVINAO CANTILLO	1221971529	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 1.946.939,00	$ 135.600,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 77.900,00	PORVENIR	9477301522	$ 311.600,00	$ 77.900,00			
112	JOHN ALEXANDER FERNANDEZ RODRIGUEZ	80654499	MECANICO 1	$ 3.336.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.686.522,00	$ 256.600,00	V	NUEVA EPS	9477301522	$ 147.500,00	PORVENIR	9477301522	$ 589.900,00	$ 147.500,00			
113	DAIVER FELIPE ROBLES GARCIA	1082405084	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.075.526,00	$ 144.500,00	V	FAMISANAR	9477301522	$ 83.100,00	PORVENIR	9477301522	$ 332.100,00	$ 83.100,00			
114	ANDERSON YUCETH MIRANDA LEYVA	1221982474	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.371.324,00	$ 165.100,00	V	CAJA ACOPI	9477301522	$ 94.900,00	PORVENIR	9477301522	$ 379.500,00	$ 94.900,00			
115	JHON KEINER LEIVA DE LA CRUZ	1082404512	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 1.592.029,00	$ 110.900,00	V	MUTUAL SER	9477301522	$ 63.700,00	PORVENIR	9477301522	$ 254.800,00	$ 63.700,00			
116	YEIDI EMILCE CONTRERAS CLAVIJO	9475147034	INSPECTORA SST	$ 2.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.222.230,00	$ 224.300,00	V	FAMISANAR	9477301527	$ 132.900,00	PROTECCION	9477301527	$ 531.300,00	$ 132.900,00			
117	HENRY GALLEGO QUINTERO	10188058	CONTRAMAESTRO	$ 314.600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.484.610,00	$ 312.200,00	V	SALUD TOTAL	9477301522	$ 179.400,00	PORVENIR	9477301522	$ 717.600,00	$ 179.400,00			
118	ALEXANDER OSORIO SANCHEZ	9.975.248	AYUDANTE PRACTICO	$ 1.219.790	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL PILOTES	$ 2.529.652,00	$ 172.400,00	V	NUEVA EPS	9477303072	$ 101.300,00	PROTECCION	9477303072	$ 404.800,00	$ 101.300,00			

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-6	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	3 DE 4	
FECHA	DIC - 2024 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
119	EVER ROBINSON CAÑAS	70.141.891	OPERADOR PILOTEADORA	$ 3.016.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL PILOTES	$ 4.180.589,00	$ 261.400,00	V	NUEVA EPS	9477303072	$ 167.400,00	COLPENSIONES	9477303072	$ 669.100,00	$ 165.400,00			
120	JOSE LUIS MERIÑO TORRES	1.083.458.157	SOLDADOR 3 METALMECANICO	$ 1.892.700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL PILOTES	$ 2.718.815,00	$ 133.400,00	V	MUTUALSER	9477303072	$ 108.800,00	PORVENIR	9477303072	$ 435.100,00	$ 99.700,00			
121	MARIA CAMILA VILLALOBOS	1.233.691.875	INGENIERA RESIDENTE	$ 2.792.300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL PILOTES	$ 4.369.558,00	$ 126.200,00	V	COMPENSAR	9477303072	$ 175.300,00	PORVENIR	9477303072	$ 699.400,00	$ 176.500,00			
122	JULIAN ANDRES LONDOÑO HENAO	8161615	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	$ 8.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LYL INGENIEROS CONSULTORES	$ 8.000.000,00	$ 41.800,00	I	SURA	74361844	$ 320.000,00	PROTECCION	74361844	$ 1.280.000,00	$ 320.000,00			
123	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ	79758293	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 12.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GEOTERRA CONSULTORES	$ 12.000.000,00	$ 835.200,00	V	SURA	74184340	$ 480.000,00	PROTECCION	74184340	$ 1.920.000,00	$ 1.088.000,00			
124	CARLOS MARIO MUÑOZ BERRIO	98461736	CONDUCTOR	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONDUCTORES	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SURA	73954607	$ 162.500,00	COLPENSIONES	73954607	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
125	ANDRES CAMILO ESCORCIA	1065137389	CONDUCTOR	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONDUCTORES	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SALUD TOTAL	74023374	$ 162.500,00	PORVENIR	74023374	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
126	WUILMER JOSE VILLA BONETT	73428038	CONDUCTOR	$ 1.300.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONDUCTORES	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	COOSALUD	73944817	$ 162.500,00	COLPENSIONES	73944817	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
127	CARLOS ARTURO CARDONA PATIÑO	8409569	OPERADOR GRUA	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SP EXPLANACIONES	$ 6.024.638,00	$ 363.700,00	V	SURA	74225072	$ 241.000,00	COLPENSIONES	74225072	$ 964.000,00	$ 241.000,00			
128	JHON JAIRO AMARANTO CAMARGO	CC 1004383194	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.489.348,00	$ 103.700,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 59.600,00	PROTECCION	74160548	$ 238.300,00	$ 59.600,00			
129	YONI ENRIQUE ORTIZ ROJAS	CC 1067810693	OFICIAL DE SEGUNDA CATEGORIA	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 3.826.680,00	$ 66.300,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 38.100,00	PORVENIR	74160548	$ 115.000,00	$ 38.100,00			
130	YORDAN JULIAN CHARRIS ACOSTA	CC 1221971396	OFICIAL DE PRIMERA	$ 1.730.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.886.945,00	$ 123.400,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 70.900,00	PORVENIR	74160548	$ 302.000,00	$ 70.900,00			
131	OSCAR DAVID ACOSTA DE AVILA	CC 1083465706	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.510.543,00	$ 105.200,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 60.500,00	PORVENIR	74160548	$ 241.700,00	$ 60.500,00			
132	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LA CRUZ	CC 1083569120	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.531.739,00	$ 106.700,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 61.100,00	PORVENIR	74160548	$ 245.100,00	$ 61.100,00			
133	SERGIO JAVIER MUNIVE FELIPE	CC 1004164375	CONDUCTOR	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.748.978,00	$ 121.800,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 70.000,00	PORVENIR	74160548	$ 279.900,00	$ 70.000,00			
134	JEINER JOSE TONCEL HERNANDEZ	CC 1004376695	AYUDANTE	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.456.804,00	$ 100.800,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 61.700,00	PORVENIR	74160548	$ 246.600,00	$ 57.900,00			
135	LESWIN YAMID MARTINEZ OROZCO	CC 1080421433	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.483.697,00	$ 100.300,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 59.500,00	PROTECCION	74160548	$ 237.500,00	$ 57.700,00			
136	FELIX DE JESUS PAREJO BONETT	CC 12635288	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.531.739,00	$ 106.700,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 61.300,00	PORVENIR	74160548	$ 245.100,00	$ 61.300,00			
137	ANSELMO NOVA CALDERON	CC 1100221757	OFICIAL 1RA	$ 1.950.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 2.243.967,00	$ 156.200,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 89.800,00	PORVENIR	74160548	$ 359.100,00	$ 89.800,00			
138	ARMANDO MANUEL VASQUEZ BLANCO	CC 1083453669	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.490.761,00	$ 103.800,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 59.700,00	PORVENIR	74160548	$ 238.600,00	$ 59.700,00			
139	GEIVERE GUTIERREZ BELEÑO	CC 85491134	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.507.011,00	$ 104.900,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 80.300,00	COLPENSIONES	74160548	$ 241.200,00	$ 80.300,00			
140	EDUARDO DAVID NAVARRO LOPEZ	CC 1221966632	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.514.076,00	$ 105.400,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 60.600,00	PROTECCION	74160548	$ 242.300,00	$ 60.600,00			
141	ELEAR MANUEL PATERNINA HERNANDEZ	CC 65626456	OFICIAL DE PRIMERA	$ 1.730.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.880.244,00	$ 130.900,00	V	SAVIA SALUD	74160548	$ 75.300,00	PORVENIR	74160548	$ 300.900,00	$ 75.300,00			
142	GABRIEL OMAR PERTUZ FANDIÑO	CC 1004162890	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.510.543,00	$ 105.200,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 60.500,00	PORVENIR	74160548	$ 241.700,00	$ 60.500,00			
143	YERIS ALBERTO ECHEVERRIA VILLAMIL	CC 1123993361	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.503.476,00	$ 104.700,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 50.200,00	COLFONDOS	74160548	$ 240.600,00	$ 50.200,00			
144	VICTOR ALFONSO GIL MARTINEZ	CC 85373138	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.510.543,00	1	05200	V	NUEVA EPS	74160548	$ 60.500,00	COLFONDOS	74160548	$ 241.700,00	$ 60.500,00			
145	FABIAN OLMEDO GARCIA LOPEZ	CC 1151186290	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.510.543,00	$ 121.800,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 60.500,00	PROTECCION	74160548	$ 241.700,00	$ 60.500,00			
146	LUIS CARLOS SALCEDO IBARRA	CC 1221968309	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.524.674,00	$ 106.200,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 61.000,00	PORVENIR	74160548	$ 244.000,00	$ 61.000,00			
147	LUIS MIGUEL COHEN BARCELO	CC 1080421255	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.517.609,00	$ 105.700,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 60.800,00	PORVENIR	74160548	$ 242.900,00	$ 60.800,00			
148	TEYSON MANUEL FONSECA VIDAL	CC 1083469627	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.475.217,00	$ 102.700,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 59.100,00	PORVENIR	74160548	$ 236.100,00	$ 59.100,00			
149	ANTONNY JOSE BRAVO SANCHEZ	CC 1080424693	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 52.000,00	PROTECCION	74160548	$ 208.000,00	$ 52.500,00			
150	JESUS EMILIO PARRA GALEANO	CC 70926744	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.498.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 3.170.000,00	$ 220.700,00	V	HUMANA VIVIR	74160548	$ 126.800,00	COLPENSIONES	74160548	$ 507.200,00	$ 126.800,00			
151	LUIS ALBERTO RODELO RODRIGUEZ	CC 1003199009	AUX. DE ALMACEN	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.857.739,00	$ 129.300,00	V	COOSALUD	74160548	$ 74.400,00	PROTECCION	74160548	$ 297.300,00	$ 74.400,00			
152	ANGI BIBIANA ROA ARANDIA	CC 1073248943	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.721.348,00	$ 119.900,00	V	FAMISANAR	74160548	$ 68.900,00	PROTECCION	74160548	$ 275.500,00	$ 68.900,00			
153	ABEL ENRIQUE CAMARGO PACHECO	CC 1004324752	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.434.239,00	$ 99.900,00	V	FAMISANAR	74160548	$ 57.400,00	PROTECCION	74160548	$ 229.400,00	$ 57.400,00			
154	FANESY DE JESUS MATINEZ MORALES	CC 1080420444	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.454.022,00	$ 101.200,00	V	FAMISANAR	74160548	$ 58.200,00	PROTECCION	74160548	$ 232.700,00	$ 58.200,00			
155	BYRON MARCELO NARVAEZ CERVANTES	CC 1083555074	OFICIAL DE SEGUNDA CATEGORIA	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.536.001,00	$ 107.000,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 61.500,00	PROTECCION	74160548	$ 245.800,00	$ 61.500,00			
156	MALORY FABIAN PAZ HERNANDEZ	CC 1193244808	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.586.141,00	$ 110.400,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 63.500,00	PORVENIR	74160548	$ 253.800,00	$ 63.500,00			
157	PEDRO JUAN MARTINEZ AHUMADO	CC 1083465249	OFICIAL DE SEGUNDA CATEGORIA	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.846.738,00	$ 128.600,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 73.900,00	PROTECCION	74160548	$ 295.500,00	$ 73.900,00			
158	MABEL ESTER PIZARRO REYES	CC1082868201	INSPECTORA SST	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 2.200.000,00	$ 153.200,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 88.000,00	PORVENIR	74160548	$ 352.000,00	$ 88.000,00			
159	IVAN CAMILO RIVERO RIVAS	CC1004375872	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.643.369,00	$ 114.400,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 65.800,00	PROTECCION	74160548	$ 263.000,00	$ 65.800,00			
160	ARAUJO JIMENEZ EDINSON ALFONSO	1080420577	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.946.908,00	$ 84.700,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 77.900,00	PORVENIR	9477600433	$ 311.600,00	$ 77.900,00			
161	BARRIOS PEREZ JADER JESUS	1233504033	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.986.258,00	$ 86.500,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 79.500,00	PROTECCION	9477600433	$ 317.900,00	$ 79.500,00			
162	BARRIOS SILVA MIGUEL ANTONIO	85370443	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.087.482,00	$ 73.800,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 83.600,00	PORVENIR	9477600433	$ 334.100,00	$ 79.100,00			
163	BOTTO MONSALVO CARLOS ANDRES	1082885589	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.826.397,00	$ 79.500,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 73.100,00	PORVENIR	9477600433	$ 292.300,00	$ 73.100,00			
164	CABALLERO ARIZA JESUS CONCEPCION	1004322360	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.955.551,00	$ 64.400,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 78.300,00	PORVENIR	9477600433	$ 313.000,00	$ 72.300,00			
165	CANDANOZA GUERRERO WISMAR JOSE	1065583729	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.207.013,00	$ 96.100,00	IV	Mutual Ser	9477600433	$ 88.300,00	PORVENIR	9477600433	$ 353.200,00	$ 88.300,00			
166	CANTILLO VALERA DAVID ALFONSO	12449538	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.782.855,00	$ 77.600,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 71.400,00	COLFONDOS	9477600433	$ 285.300,00	$ 71.400,00			
167	CASTILLO TORRES EMEL DAVID	1193593260	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.953.292,00	$ 83.100,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 76.400,00	PORVENIR	9477600433	$ 310.900,00	$ 76.400,00			
168	FONSECA VARGAS LEONEL	91044843	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.180.071,00	$ 94.900,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	9477600433	$ 87.300,00	PROTECCION	9477600433	$ 348.900,00	$ 87.300,00			
169	GOMEZ RANGEL MIKE JAVIER	7141780	COORDINADOR DE RIESGOS	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 3.300.000,00	$ 143.600,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 132.000,00	COLPENSIONES	9477600433	$ 528.000,00	$ 132.000,00			
170	HERNANDEZ AHUMADA JAIDER RAFAEL	12449200	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.833.619,00	$ 79.800,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 73.400,00	PORVENIR	9477600433	$ 293.400,00	$ 73.400,00			
171	HERNANDEZ RODRIGUEZ ERASMO SANTIAGO	1080429827	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.371.888,00	$ 103.200,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	9477600433	$ 94.900,00	PORVENIR	9477600433	$ 379.600,00	$ 94.900,00			
172	HERRERA CONRADO JUAN DAVID	1004323783	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.888.876,00	$ 82.200,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 75.600,00	PORVENIR	9477600433	$ 302.300,00	$ 75.600,00			
173	LAZO OROZCO JOMMER ALBERTO	1221965542	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.984.053,00	$ 66.200,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 79.500,00	PORVENIR	9477600433	$ 317.500,00	$ 74.200,00			VACACIONES 6 DÍAS
174	LEON REVOLLEDO JAINER	1083554616	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.070.997,00	$ 90.100,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	9477600433	$ 82.900,00	PORVENIR	9477600433	$ 331.400,00	$ 82.900,00			
175	MARMOL CODINA GEISON ATILIO	8508788	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.923.623,00	$ 83.700,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 77.000,00	PROTECCION	9477600433	$ 307.800,00	$ 77.000,00			
176	MARTINEZ FANDIÑO EDWIN JESUS	1083552672	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.007.930,00	$ 87.400,00	IV	Mutual Ser	9477600433	$ 80.400,00	PORVENIR	9477600433	$ 321.300,00	$ 80.400,00			
177	MARTINEZ VALDERRAMA CRISTIAN XAVIER	1083553580	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.993.724,00	$ 86.800,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 79.800,00	PORVENIR	9477600433	$ 319.000,00	$ 79.800,00			

CÓDIGO	MEPI-MINT-IN-15-FR-6	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	4 DE 4	
FECHA	DIC - 2024 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE DE 2024 **PROYECTO:** CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ividico Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
178	MATEUS LOPEZ DAUSER SMICT	85372413	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.839.632,00	$ 66.900,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	9477600433	$ 73.700,00	PROTECCION	9477600433	$ 294.500,00	$ 73.700,00			VACACIONES 7 DIAS
179	MOLINA POLO FREYDHER DE JESUS	1004382587	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.643.136,00	$ 71.500,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	9477600433	$ 65.800,00	PORVENIR	9477600433	$ 263.000,00	$ 65.800,00			
180	MORALES MONSALVO IGNACIO SEGUNDO	12630773	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.947.373,00	$ 84.800,00	IV	Mutual Ser	9477600433	$ 77.900,00	PORVENIR	9477600433	$ 311.600,00	$ 77.900,00			
181	MORENO AVENDAÑO JULIO CESAR	1004376519	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.025.851,00	$ 88.200,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 81.100,00	PORVENIR	9477600433	$ 324.200,00	$ 81.100,00			
182	NIEBLES MELENDREZ VICTOR HUGO	85490212	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.735.731,00	$ 43.100,00	IV	NUEVA EPS	9477600433	$ 69.500,00	PORVENIR	9477600433	$ 277.800,00	$ 43.100,00			VACACIONES
183	PABON ROJAS LENIN ALFONSO	12625530	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.906.849,00	$ 66.600,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 76.300,00	PORVENIR	9477600433	$ 305.200,00	$ 72.500,00			VACACIONES 5 DIAS
184	PAREDES PACHECO WILLIAM	1084739566	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.999.357,00	$ 87.000,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 80.000,00	PORVENIR	9477600433	$ 319.900,00	$ 80.000,00			
185	PEÑA CORTES EDGAR JUNIOR	1083569107	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.046.996,00	$ 69.400,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	9477600433	$ 82.100,00	PORVENIR	9477600433	$ 327.700,00	$ 79.900,00			VACACIONES 7 DÍAS
186	PEREZ GUTIERREZ JESUS ANGEL	1083461605	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.838.324,00	$ 76.200,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 73.600,00	PORVENIR	9477600433	$ 294.200,00	$ 70.100,00			
187	ROBLES TEJADA MOISES DE JESUS	1002134064	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.076.436,00	$ 90.400,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 83.100,00	PORVENIR	9477600433	$ 332.300,00	$ 83.100,00			
188	ROJAS MORRON JOEL MOISES	1221981701	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.037.309,00	$ 88.700,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	9477600433	$ 81.500,00	PORVENIR	9477600433	$ 326.000,00	$ 81.500,00			
189	SALAS HERNANDEZ LUIS EDUARDO	1065125702	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.390.884,00	$ 104.100,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 95.700,00	PORVENIR	9477600433	$ 382.600,00	$ 95.700,00			
190	SANCHEZ NORIEGA HUGO ARISTIDES	1083460187	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.888.522,00	$ 82.200,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	9477600433	$ 75.600,00	PORVENIR	9477600433	$ 302.200,00	$ 75.600,00			
191	TAMAYO HOYOS DEIVIS BANES	1023893469	SUPERVISOR	$ 1.976.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.976.001,00	$ 50.500,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 79.100,00	PORVENIR	9477600433	$ 316.300,00	$ 79.100,00			VACACIONES 19 DÍAS
192	TOSCANO ABELLANEDA SEBASTIAN SEGUNDO	12627610	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.012.050,00	$ 87.600,00	IV	SALUD TOTAL	9477600433	$ 80.500,00	PROTECCION	9477600433	$ 322.000,00	$ 80.500,00			
193	VELASCO MARTINEZ CARLOS MARIO	1004382200	VIGILANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.954.924,00	$ 85.100,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD	9477600433	$ 78.200,00	PORVENIR	9477600433	$ 312.800,00	$ 78.200,00			
194	YORLYS DE LA CANDELARIA SILVA RIVERA	1100627580	HSE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LINEA VIVA DE LA COSTA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SALUD TOTAL	31576880	$ 52.000,00	PORVENIR	31576880	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
195	EVER EMILIO HOYOS OROZCO	92.505.546	LINIERO L.V	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LINEA VIVA DE LA COSTA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	SANITAS	31576880	$ 52.000,00	PORVENIR	31576880	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
196	DANIEL SAMIR VASQUEZ RICO	85.203.560	CONDUCTOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LINEA VIVA DE LA COSTA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S	31576880	$ 52.000,00	COLFONDOS	31576880	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
197	JAIR QUIROZ DORIA	1.104.017.110	CONDUCTOR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LINEA VIVA DE LA COSTA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	NUEVA E.P.S.	31576880	$ 52.000,00	PORVENIR	31576880	$ 208.000,00	$ 52.000,00			
198	IVAN ENRIQUE ALMANZA MARTINEZ	92.523.582	AUXILIAR	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LINEA VIVA DE LA COSTA	$ 1.300.000,00	$ 90.500,00	V	EPS- MUTUAL SER	31576880	$ 52.000,00	COLPENSIONES	31576880	$ 208.000,00	$ 52.000,00			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre del personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **CONRADO HERNANDO LOPERA PALACIO**
Director de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **NEFTALI HERNANDEZ PADILLA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-09718 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PREACTA DE OBRA N°30

FECHA: dic.-24 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**	diciembre-24		
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 30 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
EXPLANACIONES									
1		200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
1,1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
1,2	14101	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
2	11604	201-13		Demolición de Estructuras	m3	64,13	$ 125.703,00	$ 8.061.333,00	
3	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	724,44	$ 10.191,00	$ 7.382.768,00	
4	11601		220.1P	Terraplenes (incluye material seleccionado de cantera)	m3		$ 31.904,00		
Subtotal								**$ 15.444.101,00**	
BASES, SUBBASE Y AFIRMADOS									
5	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	164,02	$ 145.679,00	$ 23.894.270,00	
6	11602	330-13		Base granular clase A	m3	206,84	$ 161.149,00	$ 33.332.059,00	
7	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 175.996,00		
Subtotal								**$ 57.226.329,00**	
PAVIMENTO ASFALTICOS									
8	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.786,00		
9		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
9,1	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
9,2	14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
10	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3		$ 948.454,00		
11			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
11,1	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
11,2	14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
12	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 984.206,00		
13	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 83.576,00		
14	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m3		$ 90.230,00		
Subtotal								$ -	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
15			600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00		
15,1	11604		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	768,25	$ 16.721,00	$ 12.845.908,00	
15,2	14102		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00		
16			600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
16,1	11604		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
16,2	14102		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
17		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		
17,1	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	261,17	$ 58.765,00	$ 15.347.655,00	
17,2	14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		
18	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		$ 120.830,00		
19	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 162.739,00		
20	14102		621.1.P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,0 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m		$ 1.750.000,00		
21	14102		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,30 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m		$ 2.300.000,00		
22	14102		621.1.2P	Pilote de concreto huecos prefabricados, concreto fc = 50 MPA de diametro 1,20 m, transporte e hincado con viga lanzadora (No incluye acero de refuerzo y no incluye transporte producto de las excavaciones) incluye suministro de elementos metálicos de conexión y platina de continuidad	m		$ 1.795.026,00		
23	14102		621.5.1P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.3m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m		$ 3.530.001,00		
24	14102		621.5.2P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.0m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m		$ 2.937.153,00		
25	14103		630.1.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado, para moldes prefabricados de dados para puentes	m3		$ 2.331.990,00		
26	14103		630.2.P	Concreto clase 50 MPA, para vigas artesa prefabricadas preesforzadas lanzadas, postensado de puentes	m3		$ 2.022.409,00		

PREACTA DE OBRA N°30

FECHA: dic.-24 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 30 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
27	14103		630.3.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado en segunda etapa para dados, conformación del tablero y vigas riostra	m3		$ 1.238.934,00		
28	14104		630.4.P	Concreto clase A, 50 Mpa, reforzado, para barreras de tráfico, colocación de concreto sobre tablero	m3		$ 1.277.842,00		
29	14102		630.6P	Concreto clase 35 MPA para Dados de cimentación	m3		$ 1.064.792,00		
30	14104		630.7P	Concreto clase 35 MPA para tablero, vigas riostra y anden	m3		$ 1.124.254,00		
31	14103		630.8P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	25,45	$ 1.446.638,00	$ 36.816.937,00	
32	14102		630.9P	Concreto clase 28 MPA para estribos	m3	378,43	$ 1.003.819,00	$ 379.875.224,00	
33	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 792.029,00		
34	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	26,17	$ 574.960,00	$ 15.046.703,00	
35	14104		632.1P	Baranda Metalica	ml		$ 643.891,00		
36		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,1	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg	19.544,27	$ 6.750,00	$ 131.923.823,00	
36,2	14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,3	14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg	3.881,25	$ 6.750,00	$ 26.198.438,00	
36,4	14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
37	14104	641-13		Acero de Preesfuerzo	Kg		$ 2.105,00		
38	14104	642-13		Apoyo elastomérico	und		$ 5.284.823,00		
39	14104		642,2P	Junta para puente,recorrido 400 mm	ml		$ 52.400.000,00		
40	14104		642,3P	Junta para puente,recorrido 225 mm	ml		$ 20.320.751,00		
41	14103	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	Kg		$ 15.000,00		
42	14103	650-13		Transporte de estructura metalica	Kg		$ 174,00		
43	14103	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	Kg		$ 4.226,00		
44	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	ml		$ 653.594,00		
45	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la	m3		$ 615.232,00		
46	11606	673-13		Geotextil tipo NT 2400 no tejido	m2		$ 7.418,00		
47	11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 126.990,00		
48	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 169.551,00		
Subtotal								**$ 618.054.688,00**	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
49		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
49,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
49,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
50		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
50,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
50,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
51		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
51,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
51,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
52		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
52,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
52,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
53	11607	730-13		Defensa metalica	m		$ 222.702,00		
54	11607	730-13		Sección final	u		$ 98.987,00		
55	14104	740-13		Captafaros	u		$ 21.130,00		
Subtotal								$ -	
OBRAS VARIAS									
56	11606			Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18.785,00		
Subtotal								$ -	

PREACTA DE OBRA N°30

FECHA: dic.-24 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 30 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
TRANSPORTES									
57	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	36.703,15	$ 1.121,00	$ 41.144.231,00	
Subtotal								**$ 41.144.231,00**	
PRECIOS NO PREVISTOS									
58	14102		621.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,33 con concreto tremie 35 Mpa en suelos cenagosos (incluye excavación bajo agua, incluye acero de refuerzo, incluye adecuación de la zona, no incluye camisas metálica).	m	114,00	$ 4.716.115,00	$ 537.637.110,00	
59	14104	630-13		Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 1.825.395,00		
60	14104	630-13		Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga	m3	12,98	$ 1.511.509,00	$ 19.619.387,00	
61	11607	630-13		Concreto clase 28 MPA para cimentación de Defensas en concreto para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 954.668,00		
62	11606	630-13		Geomalla de refuerzo tipo UX-135 o similar para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 34.026,00		
63	11606	683-13		Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2	498,00	$ 12.626,00	$ 6.287.748,00	
64	11606	683-13		Geotextil NT 2500 para separación de suelos de subrasante y capas granulares en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 12.590,00		
65	11606	683-13		Relleno con material seleccionado para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga	m3		$ 94.817,00		
66	11604		683.5P	Suministro e instalación de tubería PVC novafort de 4" perforada en el PR9 de la variante cienaga.	ml		$ 37.206,00		
67	11601		221.1P	Pedraplen Compacto	m3	255,33	$ 79.854,00	$ 20.389.122,00	
68	11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, NO incluye la preparación de la superficie de apoyo en el PR9 de la variante cienaga	ml	35,00	$ 82.321,00	$ 2.881.235,00	
69	14104	720-13		Poste de referencia	Und		$ 476.085,00		
70	14104	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 30cm*20cm*3cm	Und		$ 128.232,00		
71	14104	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de diametro 65 cm espesor 10 cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	Und		$ 3.068.904,00		
72	14104	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 53cm*58cm*10cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	Und		$ 2.423.682,00		
73	14102		621.5.3P	Camisa metálica permanente para pilote de diámetro 1.33 m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	ml	42,00	$ 3.725.643,00	$ 156.477.006,00	
74	14102		621.7.1P	Pruebas de Integridad de Pilotes (PIT) - ASTM D5882	Und		$ 1.575.439,00		
75	14104	731-13		Defensas en concreto tipo I en concreto 4000 PSI (No incluye acero de refuerzo) para el PR9 de la variante de Ciénaga	ml		$ 323.326,00		
76	21108		201.14.1P	Traslado de línea de conducción de agua potable de 12", en el tramo comprendido entre las abscisas K8+656 y el K9+206, desde el frente Cero hasta la pila 4 del Viaducto de la Variante de Ciénaga.	Global		$ 872.643.912,00		

PREACTA DE OBRA N°30

FECHA: dic.-24 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 30 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
77	34202		201.14.2P	Traslado de redes de media y baja tensión, en el tramo comprendido entre las abscisas K8+656 y el K9+206, desde el frente cero hasta la pila 4 del viaducto de la variante de ciénaga.	Global		$ 463.148.385,00		
78	11603	500-13		Pavimento de concreto hidráulico tipo MR40 (Incluye barras de transferencia de cargas, barras de amarre y canastilla de fijación).	m3	37,91	$ 1.384.303,00	$ 52.478.927,00	
79	14104		650.5P	Protección de estructuras metálicas con pinturas resistentes a ambientes costeros	kg		$ 1.566,00		
Subtotal								**$ 795.770.535,00**	
SALDO BASICO A COBRAR EN ACTA N° 30								**$ 1.527.639.884,00**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma
CONRADO LOPERA PALACIO
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 0520280830 ANT

Firma
HECTOR FABIAN ESPINOSA PATIÑO
Residente de Obra
Matrícula No. 6620227 2681 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:
Firma
NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-09718 CLD

Firma
PEDRO LUIS SALAS TEJEDA
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°30




SOPORTE DEL ACTA No.	30	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**201.7. Demolición de Estructuras**	**NO DE ORDEN**	**2**	**UNIDAD**	m3


VARIANTE DE CIENAGA		
PREDIO	**AREA DEMOLICION MUROS**	**AREA DEMOLICION PISOS**
013A D-M85-T1-VC	97,56	47,80
015A D-M85-T1-VC	200,25	86,28
014A D-M85-T1-VC	119,57	83,69
012A D-M85-T1-VC	153,10	92,17
011A D-M85-T1-VC	57,35	53,20
013 D-M85	303,18	102,19
011 D-M85-T1-VC	294,97	186,46
005A I-M77-T1-VC	375,87	98,95
007A I-M77-T1-VC	322,23	100,38
001 I-M83-T1-VC	240,75	118,77
002 I-M83-T1-VC	480,39	129,12
16A D-M85-T1-VC	319,35	142,63
005 D-M85-T1-VC	174,91	58,73
003 D-M83-T1-VC	209,05	116,24
048A D-SR-T1-VC	162,42	52,76
016 D-M85-T1-VC	144,60	42,34
008A-M77-T1-VC	79,37	36,28
018D-M85-T1-VC	134,22	63,98
006AD-M85-T1-VC	342,64	95,82
005AD-M85-T1-VC	711,78	127,39
017D-M85-T1-VC	230,28	104,73
006D-M85-T1-VC	248,72	110,99
019D-M85-T1-VC	341,18	167,62
004A-M85-T1-VC	144,12	73,80
006A-M77-T1-VC	365,55	60,53
002A-M85-T1-VC	119,97	43,40
015D-M85-T1-VC	477,88	86,80
014D-M85-T1-VC	226,76	150,87
009D-M85-T1-VC	188,28	97,09
008D-M85-T1-VC	204,54	83,35
002D-M85-T1-VC	223,68	115,37
061AD-SR-T1-VC	153,53	68,70
01AD-M78-T1-VC	173,68	52,64
004D-M78-T1-VC	191,32	103,77
007AD-M85-T1-VC	222,49	90,70
004D-M78-T1-VC	193,81	74,87
008AD-M85-T1-VC	253,85	170,34
010D-M85	154,21	190,48
21M-17-T1-VC	1289,32	570,64
01A-MT77	99,68	43,84
003A1-M7	152,17	84,00
017-IM87	180,54	55,20
TOTAL	**10759,12**	**4434,91**
ESPERSOR	0,13	0,15
VOLUMEN	**1398,69**	**665,24**










CANTIDAD TOTAL CALCULADO	2.063,92
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	1.999,79
SALDO PENDIENTE POR AGOTAMIENTO DE CANTIDADES CONTRACTUALES	-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30	64,13

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO




Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR FABIÁN ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	1.472,17
CONECTANTE DERECHA	M3	1.759,88
RETORNO	M3	167,01
VIA DE SERCIVIO	M3	1.569,63
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		4.968,69
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		4.244,25
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30		724,44

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 6620227258 TRIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

CONECTANTE IZQUIERDA

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
8815		4,90		24,50	
8820	5	2,55	3,73	18,635	18,635
8825	5	3,47	3,01	15,06	33,6975
8830	5	4,78	4,13	20,63	54,3275
8835	5	5,56	5,17	25,84	80,1675
8840	5	6,11	5,83	29,16	109,3275
8845	5	6,82	6,46	32,32	141,6425
8850	5	7,45	7,13	35,67	177,31
8853.98-140	3,98	7,53	7,49	29,81	207,1202
145	5	6,95	7,24	36,20	243,3202
150	5	6,44	6,70	33,48	276,7952
155	5	6,40	6,42	32,10	308,8952
160	5	6,16	6,28	31,40	340,2952
165	5	5,69	5,92	29,61	369,9077
170	5	5,87	5,78	28,89	398,7952
175	5	6,04	5,96	29,78	428,5702
180	5	6,32	6,18	30,90	459,4702
185	5	6,68	6,50	32,50	491,9702
190	5	6,77	6,73	33,63	525,5952
195	5	7,17	6,97	34,85	560,4452
200	5	7,13	7,15	35,75	596,1952
205	5	7,47	7,30	36,50	632,6952
210	5	9,02	8,25	41,23	673,9202
215	5	7,58	8,30	41,50	715,4202
220	5	6,50	7,04	35,20	750,6202
225	5	6,24	6,37	31,85	782,4702
230	5	6,16	6,20	31,00	813,4702
235	5	6,46	6,31	31,55	845,0202
240	5	6,82	6,64	33,20	878,2202
245	5	6,83	6,83	34,13	912,3452
250	5	6,92	6,88	34,38	946,7202
255	5	6,96	6,94	34,70	981,4202
260	5	6,98	6,97	34,85	1016,2702
265	5	7,06	7,02	35,10	1051,3702
270	5	7,46	7,26	36,30	1087,6702
275	5	9,46	8,46	42,30	1129,9702
280	5	8,22	8,84	44,20	1174,1702
285	5	8,58	8,40	42,00	1216,1702
290	5	9,39	8,99	44,93	1261,0952
295	5	9,60	9,50	47,48	1308,5702
300	5	6,81	8,21	41,03	1349,5952
305	5	6,33	6,57	32,85	1382,4452
310	5	6,15	6,24	31,20	1413,6452
315	5	6,31	6,23	31,15	1444,7952
320	5	4,64	5,48	27,38	1472,1702
TOTAL					**1472,17**

CONECTANTE DERECHA

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
245		8,04		0,00	0,00
250	5	8,71	8,38	41,88	41,88
255	5	8,7	8,71	43,53	85,40
260	5	8,64	8,67	43,35	128,75
265	5	9,03	8,84	44,18	172,93
270	5	9,27	9,15	45,75	218,68
275	5	9,49	9,38	46,90	265,58
280	5	9,72	9,61	48,03	313,60
285	5	9,95	9,84	49,18	362,78
290	5	10,42	10,19	50,93	413,70
295	5	10,72	10,57	52,85	466,55
300	5	11,85	11,29	56,43	522,98
305	5	11,28	11,57	57,83	580,80
310	5	10,96	11,12	55,60	636,40
315	5	11,01	10,99	54,93	691,33
320	5	11	11,01	55,03	746,35
325	5	11,08	11,04	55,20	801,55
330	5	10,98	11,03	55,15	856,70
335	5	11,17	11,08	85,88	942,58
340	5	11,23	11,20	86,50	1029,08
345	5	11,44	11,34	56,68	1085,75
350	5	11,7	11,57	57,85	1143,60
355	5	11,84	11,77	58,85	1202,45
360	5	10,79	11,32	56,58	1259,03
370	10	12,35	11,57	115,70	1374,73
380	10	12,33	12,34	123,40	1498,13
390	10	8,91	10,62	106,20	1604,33
395	5	8,15	8,53	42,65	1646,98
400	5	6,35	7,25	36,25	1683,23
405	5	4,89	5,62	28,10	1711,33
410	5	3,59	4,24	21,20	1732,53
415	5	2,75	3,17	15,85	1748,38
420	5	1,85	2,30	11,50	1759,88
TOTAL					**1759,88**

CONEXION RETORNO BARRANQUILLA - BARRANQUILLA

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
24,35		7,58			
25	0,65	6,33	6,955	4,52	4,52
27,51	2,51	12,48	9,405	23,61	28,13
28,87	1,36	22,35	17,415	23,68	51,81
30	1,13	22,10	22,225	25,11	76,93
31,97	1,97	24,20	23,15	45,61	122,53
33,76	1,79	25,50	24,85	44,48	167,01
TOTAL					**167,01**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RNS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

VIA DE SERVICIO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		3,41			
5	5	4,86	4,14	20,68	20,68
10	5	5,616	5,24	26,19	46,87
15	5	5,26	5,44	27,19	74,06
20	5	4,22	4,74	23,70	97,76
25	5	4,58	4,40	22,00	119,76
30	5	4,89	4,74	23,68	143,44
35	5	3,9	4,40	21,98	165,41
40	5	3,228	3,56	17,82	183,23
45	5	3,08	3,15	15,77	199,00
50	5	3,06	3,07	15,35	214,35
55	5	3,1	3,08	15,40	229,75
60	5	3,19	3,15	15,73	245,48
65	5	3,11	3,15	15,75	261,23
70	5	3,26	3,19	15,93	277,15
75	5	3,2	3,23	16,15	293,30
80	5	3,17	3,19	15,93	309,23
85	5	3,3	3,24	16,18	325,40
90	5	3,58	3,44	17,20	342,60
95	5	3,77	3,68	18,38	360,98
100	5	3,45	3,61	18,05	379,03
105	5	3,09	3,27	16,35	395,38
110	5	2,97	3,03	15,15	410,53
115	5	2,93	2,95	14,75	425,28
120	5	3,20	3,07	15,325	440,60
125	5	3,50	3,35	16,75	457,35
130	5	4,23	3,87	19,325	476,68
135	5	4,61	4,42	22,1	498,78
140	5	4,41	4,51	22,55	521,33
145	5	3,97	4,19	20,95	542,28
150	5	3,54	3,76	18,775	561,05
155	5	3,64	3,59	17,95	579,00
160	5	3,80	3,72	18,6	597,60
165	5	4,12	3,96	19,8	617,40
170	5	3,93	4,03	20,125	637,53
175	5	3,79	3,86	19,3	656,83
180	5	3,73	3,76	18,8	675,63
185	5	3,73	3,73	18,65	694,28
190	5	3,91	3,82	19,1	713,38
195	5	4,16	4,04	20,175	733,55
200	5	4,50	4,33	21,65	755,20
205	5	4,39	4,45	22,225	777,43
210	5	4,48	4,44	22,175	799,60

VIA DE SERVICIO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
215	5	4,39	4,44	22,175	821,78
220	5	3,87	4,13	20,65	842,43
225	5	3,95	3,91	19,55	861,98
230	5	3,93	3,94	19,7	881,68
235	5	3,76	3,85	19,225	900,90
240	5	3,63	3,70	18,475	919,38
245	5	3,80	3,72	18,575	937,95
250	5	3,81	3,81	19,025	956,98
255	5	3,89	3,85	19,25	976,23
260	5	4,56	4,23	21,125	997,35
265	5	6,23	5,40	26,975	1024,33
270	5	6,34	6,29	31,43	1055,75
275	5	5,96	6,15	30,75	1086,50
280	5	5,79	5,88	29,38	1115,88
TOTAL					**1115,88**

VIA DE SERVICIO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
245		0,00		0	
250	5	0,36	0,18	0,8925	0,89
255	5	0,58	0,47	2,35	3,24
260	5	1,67	1,12	5,6225	8,87
265	5	3,24	2,45	12,265	21,13
270	5	4,84	4,04	20,2	41,33
275	5	4,77	4,81	24,025	65,36
280	5	4,59	4,68	23,4	88,76
285	5	4,78	4,69	23,425	112,18
290	5	4,69	4,74	23,675	135,86
295	5	4,67	4,68	23,4	159,26
300	5	4,71	4,69	23,45	182,71
305	5	4,53	4,62	23,1	205,81
310	5	4,35	4,44	22,2	228,01
315	5	4,45	4,40	22	250,01
320	5	3,53	3,99	19,95	269,96
325	5	0,47	2,00	10	279,96
TOTAL					**279,96**

VIA DE SERVICIO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
1,83		3,53			
5	3,17	3,99	3,76	11,92	11,92
10	5	4,18	4,09	20,43	32,34
15	5	5,02	4,60	23,00	55,34
20	5	4,78	4,90	24,50	79,84
25	5	5	4,89	24,45	104,29
26,44	1,44	5,12	5,06	7,29	111,58
30	3,56	5,12	5,12	18,23	129,81
35	5	4,23	4,68	23,38	153,18
36,04	1,04	4,08	4,16	4,32	157,50
36,56	0,52	1,8	2,94	1,53	159,03
TOTAL					**159,03**

EMPALME CON TRONCAL VIA SERVICIO

AREA	ESPESOR	VOLUMEN
18,46	0,8	**14,768**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

SECCION TRANSVERSAL CONECTANTE DERECHA

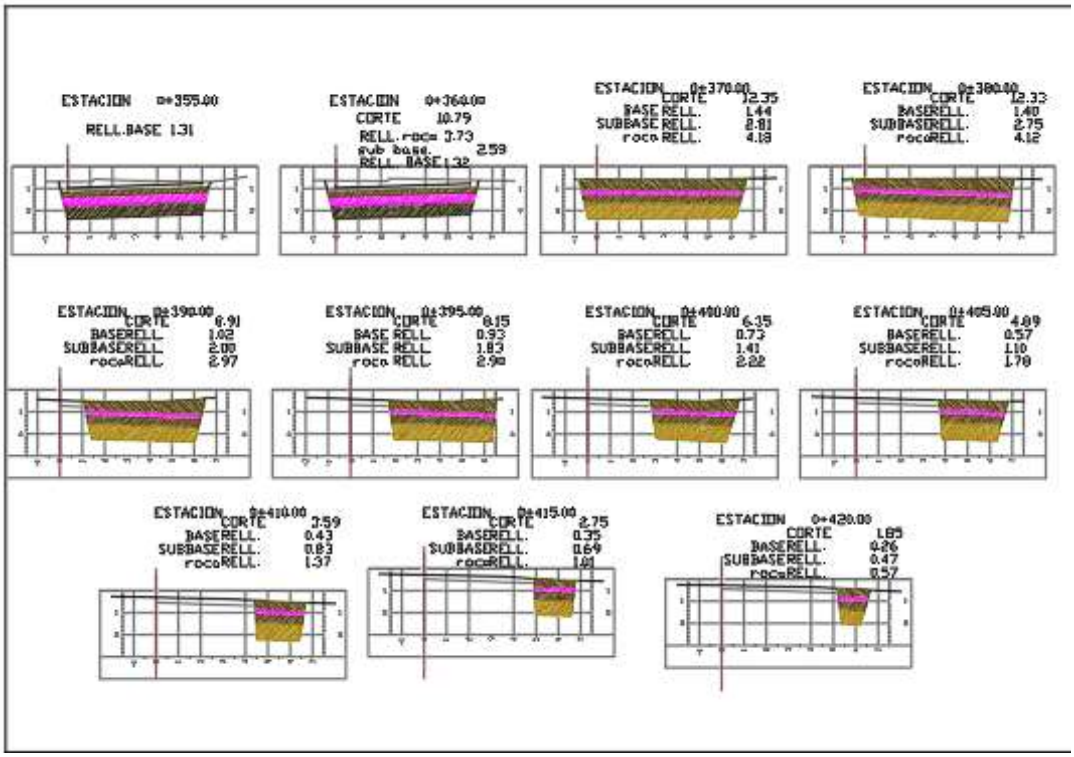

SECCION TRANSVERSAL CONEXION RETORNO BARRANQUILLA - BARRANQUILLA

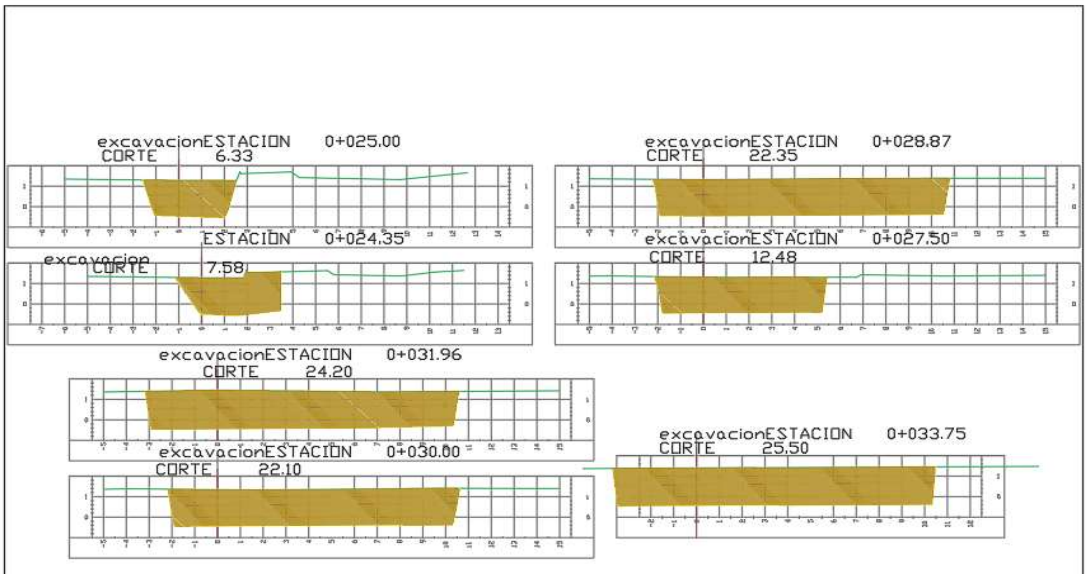

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	474,29
CONECTANTE DERECHA	M3	390,50
RETORNO	M3	37,52
VIA DE SERCIVIO	M3	533,31
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		1.435,62
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		1.271,60
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30		164,02

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**		**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD** m3

CONECTANTE IZQUIERDA

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
8815		1,17			
8820	5	1,23	1,20	6,01	6,01
8825	5	1,42	1,33	6,64	12,65
8830	5	1,60	1,51	7,55	20,20
8835	5	1,79	1,70	8,48	28,68
8840	5	1,98	1,88	9,42	38,09
8845	5	2,16	2,07	10,35	48,44
8850	5	2,35	2,26	11,28	59,71
8853.98-140	3,98	2,40	2,37	9,45	69,16
145	5	2,40	2,40	12,00	81,16
150	5	2,40	2,40	12,00	93,16
155	5	2,40	2,40	12,00	105,16
160	5	2,40	2,40	12,00	117,16
165	5	2,40	2,40	12,00	129,16
170	5	2,40	2,40	12,00	141,16
175	5	2,40	2,40	12,00	153,16
180	5	2,40	2,40	12,00	165,16
185	5	2,40	2,40	12,00	177,16
190	5	2,40	2,40	12,00	189,16
195	5	2,40	2,40	12,00	201,16
200	5	2,40	2,40	12,00	213,16
205	5	2,40	2,40	12,00	225,16
210	5	2,40	2,40	12,00	237,16
215	5	2,40	2,40	12,00	249,16
220	5	2,40	2,40	12,00	261,16
225	5	2,40	2,40	12,00	273,16
230	5	2,40	2,40	12,00	285,16
235	5	2,40	2,40	12,00	297,16
240	5	2,40	2,40	12,00	309,16
245	5	2,40	2,40	12,00	321,16
250	5	2,40	2,40	12,00	333,16
255	5	2,40	2,40	12,00	345,16
260	5	2,40	2,40	12,00	357,16
265	5	2,40	2,40	12,00	369,16
270	5	2,40	2,40	12,00	381,16
275	5	2,40	2,40	12,00	393,16
280	5	2,40	2,40	12,00	405,16
285	5	2,40	2,40	12,00	417,16
290	5	2,40	2,40	12,00	429,16
295	5	2,40	2,40	12,00	441,16
300	5	1,67	2,04	10,18	451,34
305	5	1,39	1,53	7,66	458,99
310	5	1,06	1,23	6,13	465,12
315	5	0,92	0,99	4,96	470,08
320	5	0,76	0,84	4,22	474,29
TOTAL					**474,29**

CONECTANTE DERECHA

Abscisa	LONG	Area sub-base m2	Vol T m3	acumulado
245		2,4	0,00	0,00
250	5	2,4	12,00	12,00
255	5	2,4	12,00	24,00
260	5	2,4	12,00	36,00
265	5	2,4	12,00	48,00
270	5	2,4	12,00	60,00
275	5	2,4	12,00	72,00
280	5	2,4	12,00	84,00
285	5	2,4	12,00	96,00
290	5	2,4	12,00	108,00
295	5	2,4	12,00	120,00
300	5	2,4	12,00	132,00
305	5	2,4	12,00	144,00
310	5	2,4	12,00	156,00
315	5	2,4	12,00	168,00
320	5	2,4	12,00	180,00
325	5	2,4	12,00	192,00
330	5	2,4	12,00	204,00
335	5	2,4	12,00	216,00
340	5	2,4	12,00	228,00
345	5	2,4	12,00	240,00
350	5	2,4	12,00	252,00
355	5	2,4	12,00	264,00
360	5	2,59	12,48	276,48
370	10	2,81	27,00	303,48
380	10	2,75	27,80	331,28
390	10	2	23,75	355,03
395	5	1,83	9,58	364,60
400	5	1,41	8,10	372,70
405	5	1,1	6,28	378,98
410	5	0,83	4,83	383,80
415	5	0,69	3,80	387,60
420	5	0,47	2,90	390,50
TOTAL				**390,50**

CONEXION RETORNO BARRANQUILLA - BARRANQUILLA

Abscisa	LONG	Area sub-base m2	Vol T m3	acumulado
24,35		1,62		
25	0,65	1,44	0,99	0,99
27,51	2,51	2,88	5,42	6,42
28,87	1,36	5,07	5,41	11,82
30	1,13	4,99	5,68	17,51
31,97	1,97	5,38	10,21	27,72
33,76	1,79	5,57	9,80	37,52
TOTAL				**37,52**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR FABIÁN ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**		**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD** m3

VIA DE SERVICIO

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
0		1,13			
5	5	1,395	1,2625	6,3125	6,3125
10	5	1,395	1,395	6,975	13,2875
15	5	1,395	1,395	6,975	20,2625
20	5	1,395	1,395	6,975	27,2375
25	5	1,395	1,395	6,975	34,2125
30	5	1,395	1,395	6,975	41,1875
35	5	1,395	1,395	6,975	48,1625
40	5	1,43	1,4125	7,0625	55,225
45	5	1,497	1,4635	7,3175	62,5425
50	5	1,5	1,4985	7,4925	70,035
55	5	1,5	1,5	7,5	77,535
60	5	1,5	1,5	7,5	85,035
65	5	1,5	1,5	7,5	92,535
70	5	1,5	1,5	7,5	100,035
75	5	1,5	1,5	7,5	107,535
80	5	1,5	1,5	7,5	115,035
85	5	1,5	1,5	7,5	122,535
90	5	1,5	1,5	7,5	130,035
95	5	1,5	1,5	7,5	137,535
100	5	1,5	1,5	7,5	145,035
105	5	1,5	1,5	7,5	152,535
110	5	1,5	1,5	7,5	160,035
115	5	1,5	1,5	7,5	167,535
120	5	1,5	1,5	7,5	175,035
125	5	1,5	1,5	7,5	182,535
130	5	1,5	1,5	7,5	190,035
135	5	1,5	1,5	7,5	197,535
140	5	1,5	1,5	7,5	205,035
145	5	1,5	1,5	7,5	212,535
150	5	1,5	1,5	7,5	220,035
155	5	1,5	1,5	7,5	227,535
160	5	1,5	1,5	7,5	235,035
165	5	1,5	1,5	7,5	242,535
170	5	1,5	1,5	7,5	250,035
175	5	1,395	1,4475	7,2375	257,2725
180	5	1,395	1,395	6,975	264,2475
185	5	1,395	1,395	6,975	271,2225
190	5	1,395	1,395	6,975	278,1975
195	5	1,395	1,395	6,975	285,1725
200	5	1,395	1,395	6,975	292,1475
205	5	1,395	1,395	6,975	299,1225
210	5	1,395	1,395	6,975	306,0975
215	5	1,395	1,395	6,975	313,0725
220	5	1,395	1,395	6,975	320,0475
225	5	1,395	1,395	6,975	327,0225
230	5	1,395	1,395	6,975	333,9975
235	5	1,395	1,395	6,975	340,9725
240	5	1,395	1,395	6,975	347,9475
245	5	1,395	1,395	6,975	354,9225
250	5	1,395	1,395	6,975	361,8975
255	5	1,395	1,395	6,975	368,8725
260	5	1,395	1,395	6,975	375,8475
265	5	1,395	1,395	6,975	382,8225
270	5	1,395	1,395	6,975	389,7975
275	5	1,395	1,395	6,975	396,7725
279,38	4,38	1,395	1,395	6,1101	402,8826
TOTAL					**402,88**

VIA DE SERVICIO

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
245		0,00		0,00	
250	5	0,12	0,06	0,30	0,30
255	5	0,29	0,21	1,03	1,33
260	5	0,572	0,43	2,16	3,49
265	5	1,06	0,82	4,08	7,57
270	5	1,50	1,28	6,40	13,97
275	5	1,49	1,50	7,48	21,44
280	5	1,46	1,48	7,38	28,82
285	5	1,46	1,46	7,30	36,12
290	5	1,46	1,46	7,30	43,42
295	5	1,47	1,47	7,33	50,74
300	5	1,48	1,48	7,38	58,12
305	5	1,49	1,49	7,43	65,54
310	5	1,50	1,50	7,48	73,02
315	5	1,50	1,50	7,50	80,52
320	5	1,24	1,37	6,85	87,37
325	5	0,16	0,70	3,50	90,87
TOTAL					**90,87**

VIA DE SERVICIO

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
1,83		1,05			
5	3,17	1,05	1,05	3,33	3,33
10	5	1,05	1,05	5,25	8,58
15	5	1,02	1,04	5,18	13,75
20	5	0,92	0,97	4,85	18,60
25	5	0,92	0,92	4,60	23,20
26,44	1,44	0,93	0,93	1,33	24,54
30	3,56	0,94	0,94	3,33	27,86
35	5	0,97	0,96	4,78	32,64
36,04	1,04	0,97	0,97	1,01	33,65
36,56	0,52	0,47	0,72	0,37	34,02
TOTAL					**34,02**

EMPALME CON TRONCAL VIA SERVICIO

AREA	ESPESOR	VOLUMEN
18,46	0,3	**5,54**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR FABIAN ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30


SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**320.1.Subbase Granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**5**	**UNIDAD**	m3

SECCION TRANSVERSAL CONECTANTE DERECHA

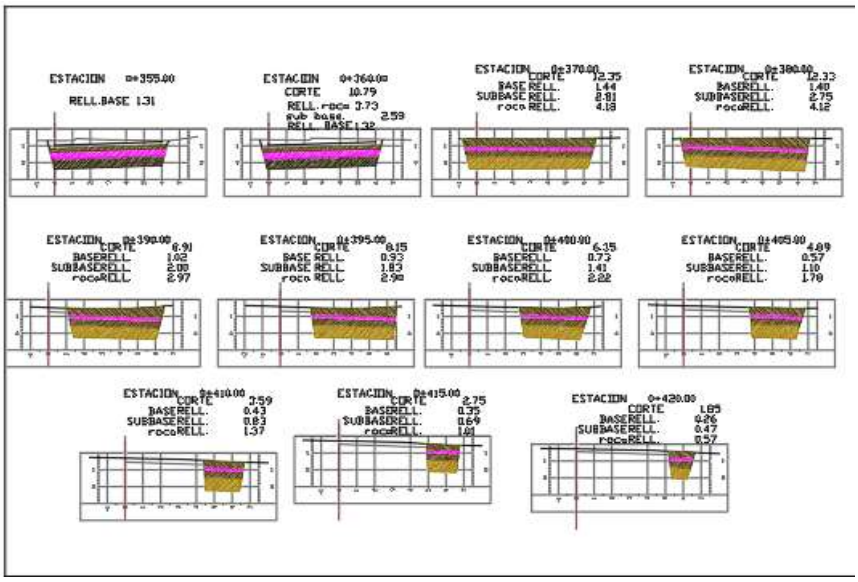

SECCION TRANSVERSAL CONEXION RETORNO BARRANQUILLA - BARRANQUILLA

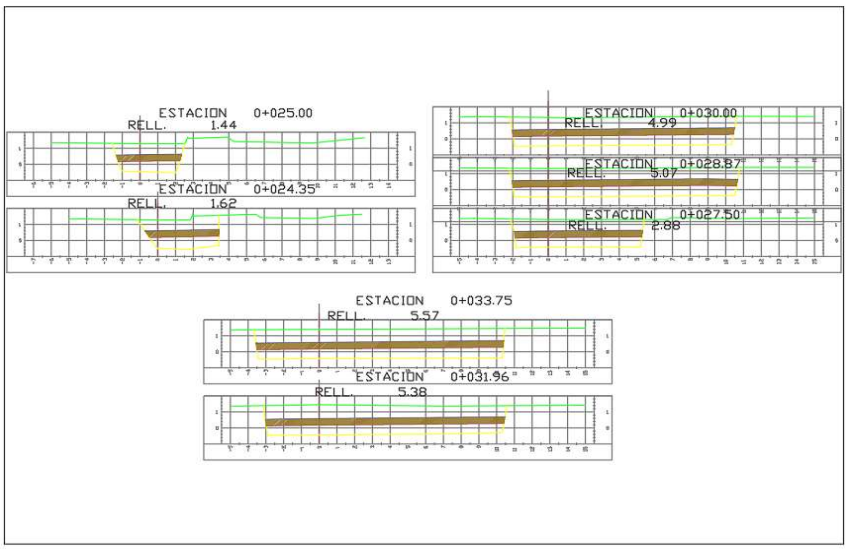

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR FABIAN ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**330.1.Base granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**6**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	243,61
CONECTANTE DERECHA	M3	187,89
RETORNO	M3	18,95
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		450,45
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		243,61
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30		206,84

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**330.1.Base granular clase A**		**NO DE ORDEN**	**6**	**UNIDAD** m3

CONECTANTE IZQUIERDA

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
8815		0,55			
8820	5	0,62	0,58	2,92	2,92
8825	5	0,71	0,66	3,32	6,24
8830	5	0,80	0,76	3,78	10,01
8835	5	0,81	0,80	4,02	14,03
8840	5	0,99	0,90	4,49	18,51
8845	5	1,08	1,04	5,18	23,69
8850	5	1,17	1,13	5,63	29,32
8853.98-140	3,98	1,20	1,19	4,72	34,03
145	5	1,20	1,20	6,00	40,03
150	5	1,20	1,20	6,00	46,03
155	5	1,20	1,20	6,00	52,03
160	5	1,20	1,20	6,00	58,03
165	5	1,20	1,20	6,00	64,03
170	5	1,20	1,20	6,00	70,03
175	5	1,20	1,20	6,00	76,03
180	5	1,20	1,20	6,00	82,03
185	5	1,20	1,20	6,00	88,03
190	5	1,20	1,20	6,00	94,03
195	5	1,20	1,20	6,00	100,03
200	5	1,20	1,20	6,00	106,03
205	5	1,20	1,20	6,00	112,03
210	5	1,20	1,20	6,00	118,03
215	5	1,20	1,20	6,00	124,03
220	5	1,20	1,20	6,00	130,03
225	5	1,20	1,20	6,00	136,03
230	5	1,20	1,20	6,00	142,03
235	5	1,20	1,20	6,00	148,03
240	5	1,20	1,20	6,00	154,03
245	5	1,20	1,20	6,00	160,03
250	5	1,20	1,20	6,00	166,03
255	5	1,20	1,20	6,00	172,03
260	5	1,20	1,20	6,00	178,03
265	5	1,20	1,20	6,00	184,03
270	5	1,20	1,20	6,00	190,03
275	5	1,20	1,20	6,00	196,03
280	5	1,20	1,20	6,00	202,03
285	5	1,20	1,20	6,00	208,03
290	5	1,20	1,20	6,00	214,03
295	5	1,20	1,20	6,00	220,03
300	5	1,07	1,14	5,68	225,71
305	5	1,00	1,04	5,18	230,88
310	5	0,86	0,93	4,65	235,54
315	5	0,85	0,86	4,28	239,81
320	5	0,67	0,76	3,80	243,61
TOTAL					**243,61**

CONECTANTE DERECHA

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
250		1,30			0,00
260	10	1,31	1,31	13,05	13,05
270	10	1,31	1,31	13,10	26,15
280	10	1,31	1,31	13,10	39,25
290	10	1,31	1,31	13,10	52,35
300	10	1,31	1,31	13,10	65,45
310	10	1,31	1,31	13,10	78,55
320	3,98	1,31	1,31	5,21	83,76
330	5	1,29	1,30	6,50	90,26
335	5	1,31	1,30	6,50	96,76
340	5	1,31	1,31	6,55	103,31
345	5	1,31	1,31	6,55	109,86
350	5	1,31	1,31	6,55	116,41
355	5	1,31	1,31	6,55	122,96
360	5	1,32	1,32	6,58	129,54
370	10	1,44	1,38	13,80	143,34
380	10	1,40	1,42	14,20	157,54
390	10	1,02	1,21	12,10	169,64
395	5	0,93	0,98	4,88	174,51
400	5	0,73	0,83	4,15	178,66
405	5	0,57	0,65	3,25	181,91
410	5	0,43	0,50	2,50	184,41
415	5	0,35	0,39	1,95	186,36
420	5	0,26	0,31	1,53	187,89
TOTAL					**187,89**

CONEXION RETORNO BARRANQUILLA - BARRANQUILLA

Abscisa	long	Area m2	promedio areas	Vol m3	Vol AC m3
24,35		0,85			0,00
25	0,65	0,75	0,80	0,52	0,52
27,51	2,51	1,46	1,11	2,77	3,29
28,87	1,36	2,55	2,01	2,73	6,02
30	1,13	2,51	2,53	2,86	8,88
31,97	1,97	2,71	2,61	5,14	14,02
33,76	1,79	2,80	2,76	4,93	18,95
TOTAL					**18,95**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR FABIAN ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 6620227258? BIS


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**330.1.Base granular clase A**	**NO DE ORDEN**	**6**	**UNIDAD**	m3

SECCION TRANSVERSAL CONECTANTE DERECHA

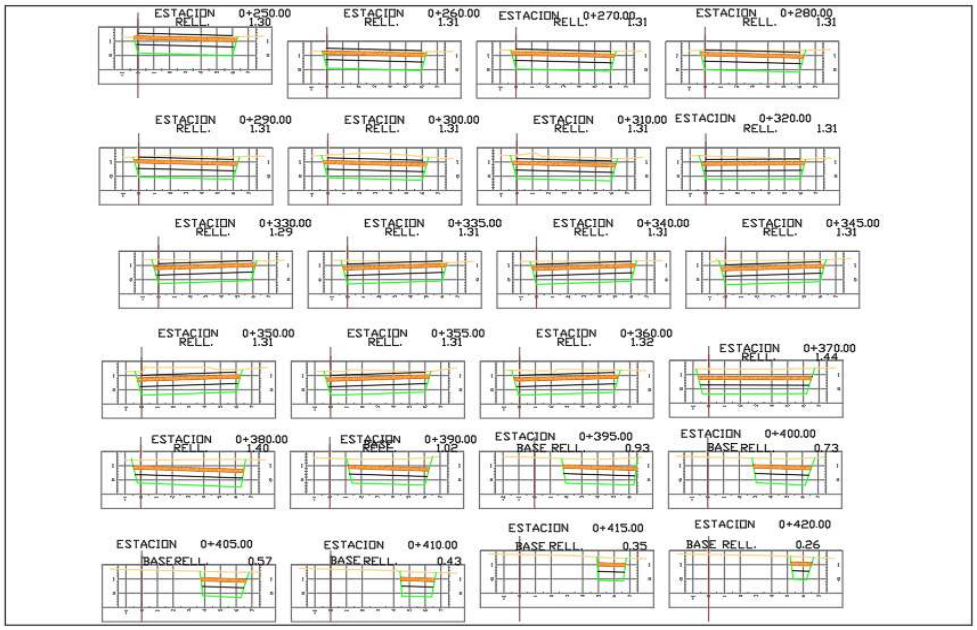

SECCION TRANSVERSAL CONEXION RETORNO BARRANQUILLA - BARRANQUILLA

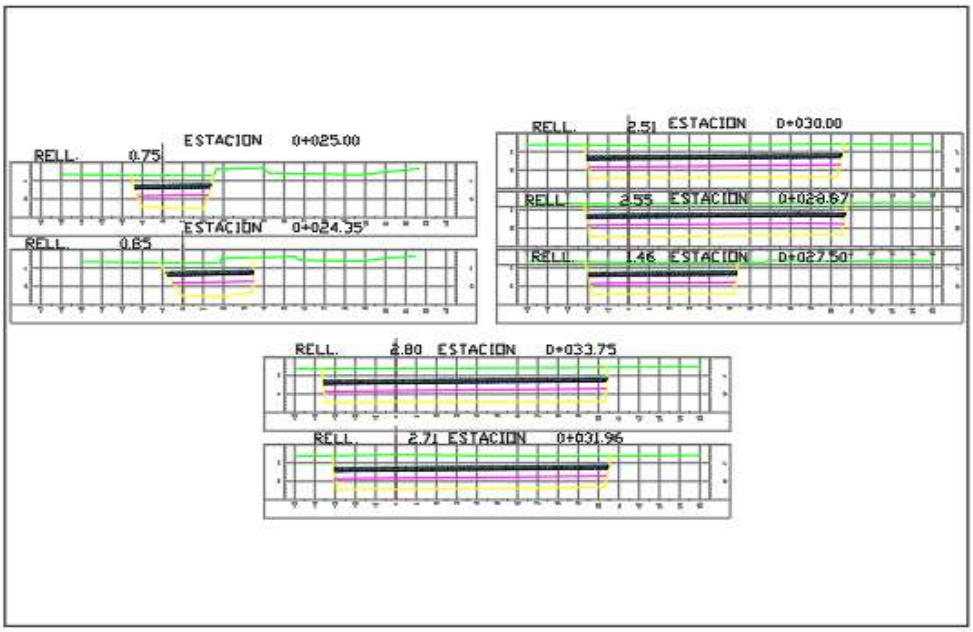

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR FABIAN ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 6620227258I RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
MURO EN CONCRETO - FRENTE CERO	m3	592,53
CARCAMO - FRENTE CERO	m3	91,18
TRASLADO DE REDES	m3	307,40
CANAL RECTANGULAR TRAMO VARIANTE CIENAGA	m3	1.550,61
PUENTE PEATONAL OASIS	m3	51,03
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		2.592,74
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		1.824,49
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30		768,25

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 6620227258I BIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	30	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

MURO EN CONCRETO

ABSCISA	area m2	VOL m3	ACUM M3	ABSCISA	area m2	VOL m3	ACUM M3	ABSCISA	area m2	VOL m3	ACUM M3
32	1,44			106	1,91	3,61	199,77	182	3,11	5,95	392,13
32,1	3,29	0,24	0,24	108	2,15	4,06	203,83	184	3,36	6,47	398,60
34	3,31	6,27	6,51	110	2,37	4,52	208,35	186	3,53	6,89	405,49
36	3,33	6,64	13,15	112	2,52	4,89	213,24	188	3,35	6,88	412,37
38	3,37	6,70	19,85	114	2,49	5,01	218,25	190	3,13	6,48	418,85
40	3,50	6,87	26,72	116	2,52	5,01	223,26	192	2,91	6,04	424,89
42	3,59	7,09	33,81	118	2,59	5,11	228,37	194	3,01	5,92	430,81
44	4,07	7,66	41,47	120	2,58	5,17	233,54	196	3,07	6,08	436,89
46	3,84	7,91	49,38	122	2,41	4,99	238,53	198	3,11	6,18	443,07
48	3,52	7,36	56,74	124	2,08	4,49	243,02	200	3,09	6,20	449,27
50	2,90	6,42	63,16	126	2,15	4,23	247,25	202	3,08	6,17	455,44
52	2,78	5,68	68,84	128	2,26	4,41	251,66	204	3,06	6,14	461,58
54	2,71	5,49	74,33	130	2,36	4,62	256,28	206	3,04	6,10	467,68
56	2,79	5,50	79,83	132	2,46	4,82	261,10	208	3,08	6,12	473,80
58	2,76	5,55	85,38	134	2,56	5,02	266,12	210	3,13	6,21	480,01
60	2,58	5,34	90,72	136	2,65	5,21	271,33	212	3,29	6,42	486,43
62	2,57	5,15	95,87	138	2,69	5,34	276,67	214	3,63	6,92	493,35
64	2,41	4,98	100,85	140	2,61	5,30	281,97	216	3,90	7,53	500,88
66	2,36	4,77	105,62	142	2,47	5,08	287,05	218	3,77	7,67	508,55
68	2,60	4,96	110,58	144	2,52	4,99	292,04	220	3,38	7,15	515,70
70	2,76	5,36	115,94	146	2,60	5,12	297,16	222	3,16	6,54	522,24
72	2,77	5,53	121,47	148	2,62	5,22	302,38	224	2,96	6,12	528,36
74	2,73	5,50	126,97	150	2,56	5,18	307,56	226	3,00	5,96	534,32
76	2,52	5,25	132,22	152	2,46	5,02	312,58	228	2,97	5,97	540,29
78	2,27	4,79	137,01	154	2,34	4,80	317,38	230,00	1,47	4,44	544,73
80	2,80	5,07	142,08	156	2,41	4,75	322,13	232,00	1,58	3,05	547,78
82	3,09	5,89	147,97	158	2,42	4,83	326,96	234,00	1,97	3,55	551,33
84	3,16	6,25	154,22	160	2,47	4,89	331,85	236,00	2,04	4,01	555,34
86	2,59	5,75	159,97	162	2,53	5,00	336,85	238,00	2,17	4,21	559,55
88	2,11	4,70	164,67	164	2,65	5,18	342,03	240,00	2,28	4,45	564,00
90	2,07	4,18	168,85	166	2,80	5,45	347,48	242,00	2,05	4,33	568,33
92	2,00	4,07	172,92	168	2,88	5,68	353,16	244,00	2,24	4,29	572,62
94	1,99	3,99	176,91	170	2,74	5,62	358,78	246,00	2,39	4,63	577,25
96	1,99	3,98	180,89	172	2,66	5,40	364,18	248,00	2,55	4,94	582,19
98	1,98	3,97	184,86	174	2,73	5,39	369,57	250,00	2,62	5,17	587,36
100	1,97	3,95	188,81	176	2,76	5,49	375,06	252,00	2,55	5,17	592,53
102	1,84	3,81	192,62	178	2,76	5,52	380,58				
104	1,70	3,54	196,16	180	2,84	5,60	386,18				

Elemento	Abcisa inicial	Abcisa final	volumen m3	observacion
CARCAMO	11,82	39,32	91,18	secciones

Elemento	long	Ancho	Alto	Volumen
Ducto Gas	29	1,10	1,00	31,90
Acometidas Acueducto	551	0,50	1,00	275,50

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR FABIAN ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

CANAL RECTANGULAR - K10+432 a K10+517,4

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		2,44			
10	10	1,31	1,88	18,75	18,75
20	10	0,78	1,05	10,45	29,2
24,4	4,4	0,77	0,78	3,41	32,61
30	5,6	0,72	0,75	4,172	36,782
40	10	0,80	0,76	7,6	44,382
50	10	1,25	1,03	10,25	54,632
60	10	1,51	1,38	13,8	68,432
70	10	1,34	1,43	14,25	82,682
80	10	1,92	1,63	16,3	98,982
85,4	5,4	1,74	1,83	9,882	108,864
TOTAL					**108,86**

CANAL RECTANGULAR - K10+690 a K10+968,90

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		2,25			
10	10	2,1	2,18	21,75	21,75
20	10	2,11	2,11	21,05	42,8
30	10	2,68	2,40	23,95	66,75
40	10	2,06	2,37	23,7	90,45
50	10	1,24	1,65	16,5	106,95
60	10	1,6	1,42	14,2	121,15
70	10	1,68	1,64	16,4	137,55
80	10	1,94	1,81	18,1	155,65
90	10	3,08	2,51	25,1	180,75
100	10	4	3,54	35,4	216,15
110	10	3,68	3,84	38,4	254,55
120	10	3,2	3,44	34,4	288,95
130	10	2,59	2,90	28,95	317,9
140	10	2,66	2,63	26,25	344,15
150	10	2,68	2,67	26,7	370,85
160	10	3	2,84	28,4	399,25
170	10	2,41	2,71	27,05	426,3
180	10	2,28	2,35	23,45	449,75
190	10	2,45	2,37	23,65	473,4
200	10	2,65	2,55	25,5	498,9
210	10	2,83	2,74	27,4	526,3
220	10	3,29	3,06	30,6	556,9
230	10	3,3	3,30	32,95	589,85
240	10	3,12	3,21	32,1	621,95
250	10	2,66	2,89	28,9	650,85
260	10	2,95	2,81	28,05	678,9
270	10	3,27	3,11	31,1	710
278,88	8,88	0	1,64	14,5188	724,5188
TOTAL					**724,52**

CANAL RECTANGULAR - K10+980-K11+100

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		4,51			
10	10	3,72	4,12	41,15	41,15
20	10	3,5	3,61	36,1	77,25
30	10	3,52	3,51	35,1	112,35
40	10	3,79	3,66	36,55	148,9
50	10	3,84	3,82	38,15	187,05
60	10	4,14	3,99	39,9	226,95
70	10	4,41	4,28	42,75	269,7
80	10	3,34	3,88	38,75	308,45
90	10	3,05	3,20	31,95	340,4
100	10	3	3,03	30,25	370,65
109,8	9,8	3,27	3,14	30,723	401,373
110	0,2	3,26	3,27	0,653	402,026
120	10	0,36	1,81	18,1	420,126
124,58	4,58	1,67	1,02	4,6487	424,7747
TOTAL					**424,77**

CANAL RECTANGULAR - K11+100-K11+239,43

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		3,06			
10	10	2,44	2,75	27,5	27,5
20	10	1,87	2,16	21,55	49,05
30	10	1,65	1,76	17,6	66,65
40	10	1,92	1,79	17,85	84,5
50	10	2,1	2,01	20,1	104,6
60	10	2,12	2,11	21,1	125,7
70	10	2,17	2,15	21,45	147,15
80	10	2,17	2,17	21,7	168,85
90	10	1,91	2,04	20,4	189,25
100	10	1,77	1,84	18,4	207,65
110	10	1,99	1,88	18,8	226,45
120	10	2,38	2,19	21,85	248,3
130	10	2,63	2,51	25,05	273,35
132,2	2,2	2,77	2,70	5,94	279,29
139,43	7,23	0,87	1,82	13,1586	292,4486
TOTAL					**292,45**

PUENTE PEATONAL EL OASIS APOYO 1

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0,66		8,59			
2,38	1,72	8,39	8,49	14,60	14,60
4,07	1,69	8,21	8,30	14,03	28,63
TOTAL					**28,63**

PUENTE PEATONAL EL OASIS APOYO 2

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
19,41		5,79			
21,04	1,63	6,85	6,32	10,3016	10,30
22,75	1,71	7,3	7,08	12,09825	22,40
TOTAL					**22,40**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3


SECCIONES TRASVERSALES DE EXCAVACION DEL K10+980-K11+100

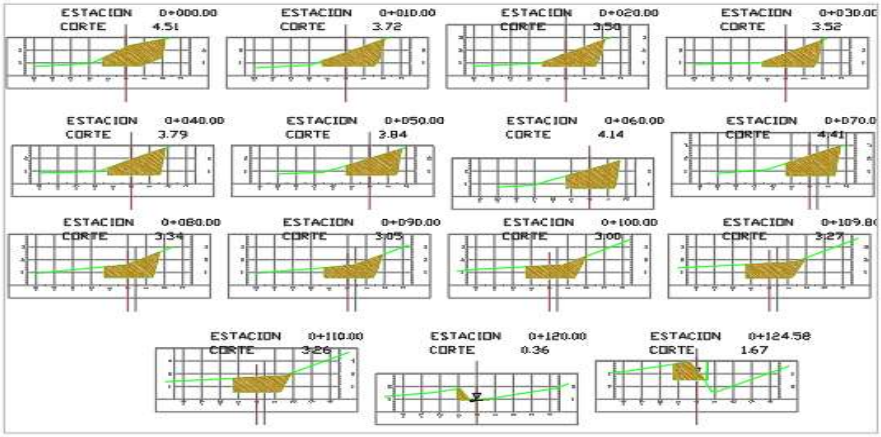


SECCIONES TRASVERSALES DE EXCAVACION K11+100-K11+139,42

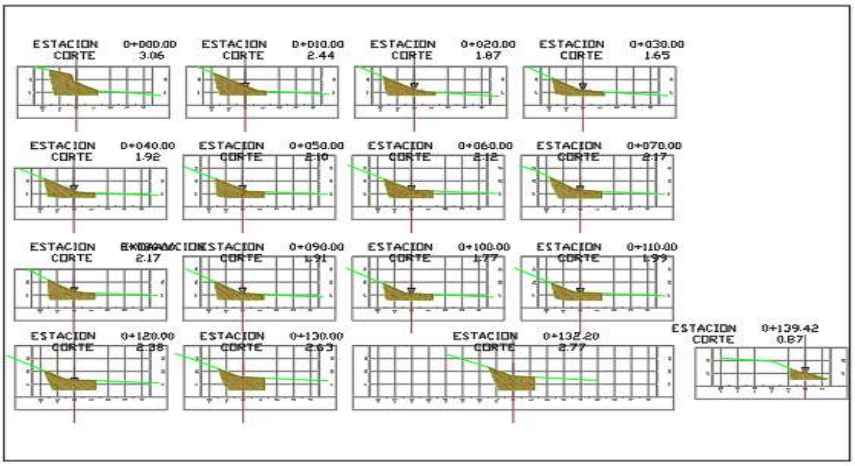

PUENTE PEATONAL OASIS

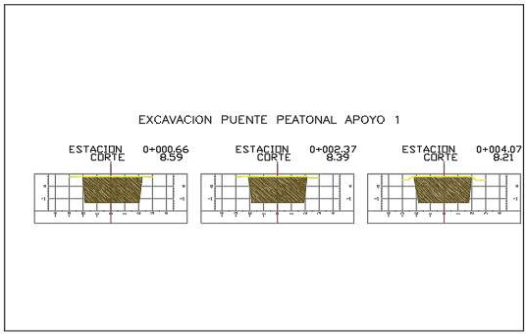

APOYO 1

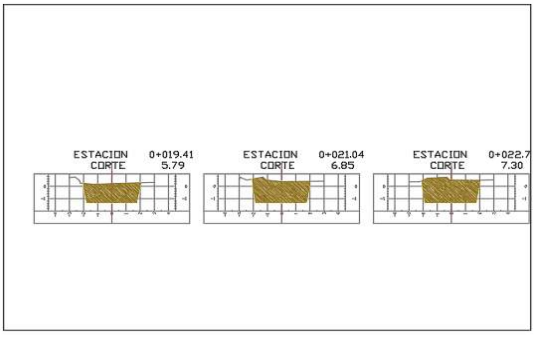

APOYO 2

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESTIVEN ZAPATA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 6620227258I RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**Rellenos para Estructuras con suelo**	**NO DE ORDEN**	**17.1**	**UNIDAD**	m3

Elemento	long	Ancho	Area	Altura	Volumen
Ducto Gas	29	1,10	31,90	1,00	31,90
	29	0,10	0,01		-0,23
Acometidas Acueducto	551	0,50	275,50	1,00	275,50
	551	0,01	0,00008		-0,04
Anden Via de Servicio			232,03	0,20	46,41
Canal Rectangular - Frente 3					261,17
CANTIDAD TOTAL CALCULADO					614,71
COBRADOS ACTAS ANTERIORES					353,54
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30					261,17

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR FABIAN ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 BIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**Rellenos para Estructuras con suelo**	**NO DE ORDEN**	**17.1**	**UNIDAD**	**m3**

CANAL RECTANGULAR - FRENTE 3 K10+980-K11+100

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		1,88			
10	10	1,78	1,83	18,3	18,3
20	10	1,72	1,75	17,5	35,8
30	10	1,64	1,68	16,8	52,6
40	10	1,54	1,59	15,9	68,5
50	10	1,36	1,45	14,5	83
60	10	1,27	1,32	13,15	96,15
70	10	1,39	1,33	13,3	109,45
80	10	1,16	1,28	12,75	122,2
90	10	1,13	1,15	11,45	133,65
100	10	1,04	1,09	10,85	144,5
109,8	9,8	0,9	0,97	9,506	154,006
110	0,2	0,88	0,89	0,178	154,184
TOTAL					**154,18**

CANAL RECTANGULAR - FRENTE 3 K11+100-K11+240

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		1,06			
10	10	1,12	1,09	10,9	10,9
20	10	0,95	1,04	10,35	21,25
30	10	0,81	0,88	8,8	30,05
40	10	0,85	0,83	8,3	38,35
50	10	0,8	0,83	8,25	46,6
60	10	0,71	0,76	7,55	54,15
70	10	0,85	0,78	7,8	61,95
80	10	0,8	0,83	8,25	70,2
90	10	0,78	0,79	7,9	78,1
100	10	0,69	0,74	7,35	85,45
110	10	0,7	0,70	6,95	92,4
120	10	0,77	0,74	7,35	99,75
130	10	0,48	0,63	6,25	106
132,2	2,2	0,42	0,45	0,99	106,99
			0,21		
TOTAL					**106,99**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR FABIAN ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				


ITEM	**Rellenos para Estructuras con suelo**	**NO DE ORDEN**	**17.1**	**UNIDAD**	m3

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

CANAL RECTANGULAR - FRENTE 3 K10+980-K11+100

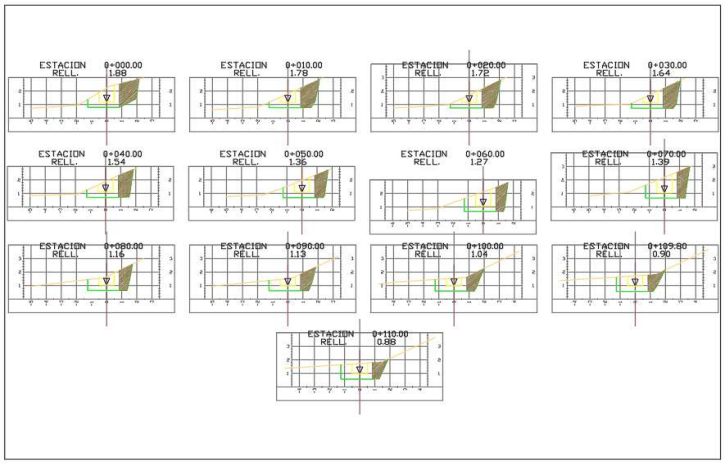

CANAL RECTANGULAR - FRENTE 3 K11+100-K11+240

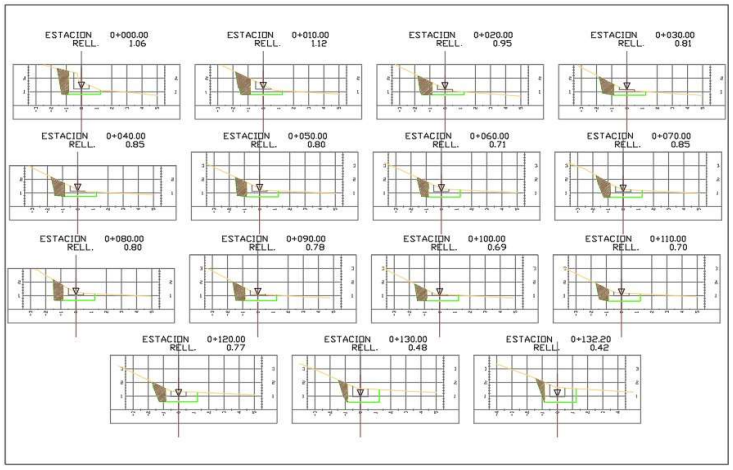

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR FABIAN ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 6620227254 I RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.8P. Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes**	**NO DE ORDEN**	**31**	**UNIDAD**	m3

APOYO	COLUMNA	ESTE	NORTE	AREA M2	LONG ML	VOLUMEN M3
13	42	980461,277	1708464,975	1,13	6,50	7,35
	41	980457,493	1708462,749	1,13	6,50	7,35
	40	980453,685	1708460,508	1,13	6,50	7,35
12	39	980433,384	1708512,378	1,13	6,50	7,35
	38	980429,592	1708510,146	1,13	6,50	7,35
	37	980425,800	1708507,915	1,13	6,50	7,35
11	36	980405,491	1708559,780	1,13	7,00	7,92
	35	980401,699	1708557,549	1,13	7,00	7,92
	34	980397,907	1708555,317	1,13	7,00	7,92
10	33	980372,527	1708615,801	1,13	7,50	8,48
	32	980368,735	1708613,569	1,13	7,50	8,48
	31	980364,943	1708611,338	1,13	7,50	8,48
9	30	980342,098	1708667,512	1,13	7,50	8,48
	29	980338,306	1708665,281	1,13	7,50	8,48
	28	980334,514	1708663,050	1,13	7,50	8,48
8	27	980309,134	1708723,533	1,13	7,50	8,48
	26	980305,342	1708721,302	1,13	7,50	8,48
	25	980301,549	1708719,070	1,13	7,50	8,48
7	24	980276,169	1708779,555	1,13	7,50	8,48
	23	980272,377	1708777,323	1,13	7,50	8,48
	22	980268,585	1708775,091	1,13	7,50	8,48
6	21	980242,845	1708835,519	1,13	8,00	9,05
	20	980239,124	1708833,170	1,13	8,00	9,05
	19	980235,403	1708830,821	1,13	8,00	9,05
5	18	980242,845	1708835,519	1,13	8,00	9,05
	17	980239,124	1708833,170	1,13	8,00	9,05
	16	980235,403	1708830,821	1,13	8,00	9,05
4	15	980186,405	1708900,441	1,13	8,00	9,05
	14	980183,633	1708897,024	1,13	8,00	9,05
	13	980180,860	1708893,607	1,13	8,00	9,05
3	12	980143,822	1708928,187	1,13	7,50	8,48
	11	980141,818	1708924,270	1,13	7,50	8,48
	10	980139,811	1708920,355	1,13	7,50	8,48
2	9	980086,541	1708948,988	1,13	5,50	6,22
	8	980085,567	1708944,697	1,13	5,50	6,22
	7	980084,592	1708940,406	1,13	5,50	6,22

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	295,18
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	269,73
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30	25,45

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO






Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.9P. Concreto clase 28 MPA para estribos**	**NO DE ORDEN**	**32**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD (ml)	VOLUMEN (m3)
CANAL RECTANGULAR	1,38	628,31	867,07
LLAVE DE FUNDACION INTERMEDIA	0,02	628,31	12,57
CANTIDAD TOTAL CALCULADA			879,63
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			501,20
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30			378,43

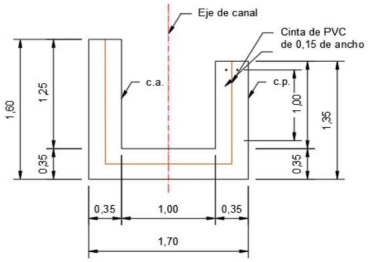

DETALLE 1
SECCION TRANSVERSAL



DETALLE 2
LLAVE DE FUNDACIÓN INTERMEDIA
GEOMETRÍA
ESCALA 1:15

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.6. Concreto clase 14 MPA**		**NO DE ORDEN**	**34**	**UNIDAD** m3

SOLADO MURO DE CONTENCIÓN (FRENTE CERO)


MÓDULO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	VOLUMEN
2	12,16	2,65	0,05	32,224	1,61
3	12,16	2,65	0,05	32,224	1,61
4	12,16	2,65	0,05	32,224	1,61
5	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
6	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
7	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
8	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
9	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
10	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
11	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
12	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
13	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
14	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
15	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
16	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
17	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
18	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
19	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
20	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
21	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
22	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
23	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
24	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
25	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
26	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
27	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
28	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
29	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
30	6,16	2,26	0,05	13,9216	0,70
31	12,16	2,26	0,05	27,4816	1,37
32	10,5	2,26	0,05	23,73	1,19
				539,1052	**26,96**

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	86,72
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	60,55
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30	26,17

DESCRIPCION	LONG	ANCHO	ESPESOR	VOL M3
CARCAMO- FRENTE CERO	26,3	2,4	0,05	3,16
CANAL - FRENTE 3	628,31	1,7	0,05	53,41

MEJORAMIENTO EN CICLOPEO PARA LA ZARPA DEL APOYO 1 PTE PEATONAL

ZARPA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	VOLUMEN	% CONCRETO	VOLUMEN ROCA
APOYO 1	4	4	0,5	16	8,00	40%	**3,20**



ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTOR**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**640.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**	**NO DE ORDEN**	**36.1**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
CANAL RECTANGULAR	KG	41.713,50
PUENTE PEATONAL	KG	1.877,63
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		43.591,13
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		24.046,86
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30		19.544,27

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOSA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTOR**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**640.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**	**NO DE ORDEN**	**36.1**	**UNIDAD**	m3

CANAL RECTANGULAR

CUADRO DE DESPIECE CANAL UN MODULO DE 12 METROS

ITEM	#	Peso Unit. (Kg)	LONG	CANT	Cant Modulos	Peso Modulo
C1	4	1	12	30	1,00	360
C2A	4	1	2,45	40	1,00	98
C2B	4	1	2,2	40	1,00	88
C3	4	1	1,8	40	1,00	72
C4A	4	1	1,55	40	1,00	62
C4B	4	1	1,3	40	1,00	52
L1	4	1	1,9	8	1,00	15
L2	5	1,55	1,55	7	1,00	17
L3	5	1,55	0,75	7	1,00	8
L4	5	1,55	3,52	7	1,00	38
					TOTAL	**810**

DESCRIPCION	Kg/ml	LONGITUD (ml)	PESO (Kg)
CANAL RECTANGULAR	66,39	628,31	41.713,50

PUENTE PEATONAL EL OASIS

ELEMENTO	VARILLA N°	POCISIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	PESO Kg/ml	TOTAL Kg
ZARPA	5	I	3,36	62	1,55	322,90
	5	Z	3,5	102	1,55	553,35
	5	L	2,9	74	1,55	332,63
VASTAGO	6	V	3,64	30	2,24	244,61
	6	G	3,5	30	2,24	235,20
	5	K	1,4	50	1,55	108,50
	5	U	1,73	30	1,55	80,45
TOTAL						**1877,63**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**	**NO DE ORDEN**	**36.3**	**UNIDAD**	**Kg**

APOYO	COLUMNA	KG/ML	LONG	TOTAL KG
13	42	172,5	6,5	1121,25
	41	172,5	6,5	1121,25
	40	172,5	6,5	1121,25
12	39	172,5	6,5	1121,25
	38	172,5	6,5	1121,25
	37	172,5	6,5	1121,25
11	36	172,5	7,00	1207,5
	35	172,5	7,00	1207,5
	34	172,5	7,00	1207,5
10	33	172,5	7,50	1293,75
	32	172,5	7,50	1293,75
	31	172,5	7,50	1293,75
9	30	172,5	7,50	1293,75
	29	172,5	7,50	1293,75
	28	172,5	7,50	1293,75
8	27	172,5	7,50	1293,75
	26	172,5	7,50	1293,75
	25	172,5	7,50	1293,75
7	24	172,5	7,50	1293,75
	23	172,5	7,50	1293,75
	22	172,5	7,50	1293,75
6	21	172,5	8,00	1380,00
	20	172,5	8,00	1380,00
	19	172,5	8,00	1380,00
5	18	172,5	8,00	1380,00
	17	172,5	8,00	1380,00
	16	172,5	8,00	1380,00
4	15	172,5	8,00	1380,00
	14	172,5	8,00	1380,00
	13	172,5	8,00	1380,00
3	12	172,5	7,50	1293,75
	11	172,5	7,50	1293,75
	10	172,5	7,50	1293,75
2	9	172,5	5,50	948,75
	8	172,5	5,50	948,75
	7	172,5	5,50	948,75

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	45.022,50
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	41.141,25
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30	3.881,25

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30


SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24		
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"					
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**		
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO					
ITEM	**900.2. Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)**	**NO DE ORDEN**	**57**	**UNIDAD**	**m3-Km**	


DESCRIPCION	ITEM	VOLUMEN	KM (FRENTE CERO)	M3-KM
MATERIAL DE EXCAVACION	210.2.2	4.968,69	19,00	94.405,09
MATERIAL DE EXCAVACION	600.1.1P	991,11	19,00	18.831,02
MATERIAL DE TERRAPLEN	220.1P	917,13	30,50	27.972,47
MATERIAL DE PEDRAPLEN	221.1P	2.084,23	30,50	63.569,00


DESCRIPCION	ITEM	VOLUMEN	KM (FRENTE 3)	M3-KM
MATERIAL DE EXCAVACION	600.1.1P	1.550,61	21,13	32.756,55

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	237.534,13
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	200.830,98
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30	36.703,15

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

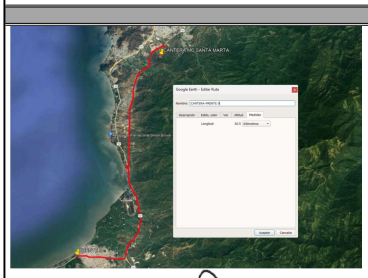

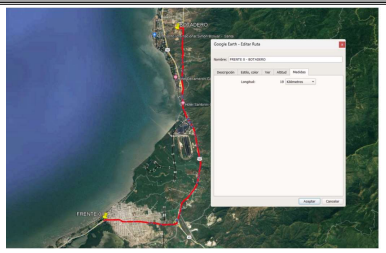



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°30


SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**621.2P. Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,33 con concreto tremie 35 Mpa en suelos cenagosos (incluye excavación bajo agua, incluye acero de refuerzo, incluye adecuación de la zona, no incluye camisas metálica).**	**NO DE ORDEN**	**58**	**UNIDAD**	**ml**

APOYO	PILOTE	ESTE	NORTE	LONG PILOTE EFECTIVA
13	42	980453,685	1708460,508	29,00
	41	980457,493	1708462,749	29,00
	40	980461,277	1708464,975	29,00
12	39	980433,384	1708512,378	34,00
	38	980429,592	1708510,146	34,00
	37	980425,800	1708507,915	34,00
11	36	980405,491	1708559,780	29,00
	35	980401,699	1708557,549	29,00
	34	980397,907	1708555,317	29,00
10	33	980372,527	1708615,801	34,00
	32	980368,735	1708613,569	34,00
	31	980364,943	1708611,338	34,00
9	30	980342,098	1708667,512	29,00
	29	980338,306	1708665,281	29,00
	28	980334,514	1708663,050	29,00
8	27	980309,134	1708723,533	34,00
	26	980305,342	1708721,302	34,00
	25	980301,549	1708719,070	34,00
7	24	980276,169	1708779,555	34,00
	23	980272,377	1708777,323	34,00
	22	980268,585	1708775,091	34,00
6	21	980242,845	1708835,519	29,00
	20	980239,124	1708833,170	29,00
	19	980235,403	1708830,821	29,00
5	18	980242,845	1708835,519	34,00
	17	980239,124	1708833,170	34,00
	16	980235,403	1708830,821	34,00
4	15	980186,405	1708900,441	34,00
	14	980183,633	1708897,024	34,00
	13	980180,860	1708893,607	34,00
3	12	980143,822	1708928,187	34,00
	11	980141,818	1708924,270	34,00
	10	980139,811	1708920,355	34,00
2	9	980086,541	1708948,988	40,00
	8	980085,567	1708944,697	40,00
	7	980084,592	1708940,406	40,00
1	5	980026,011	1708950,572	40,00
	4	980026,129	1708946,173	40,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO				**1262,00**
COBRADOS ACTAS ANTERIORES				**1148,00**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30				**114,00**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORI**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.11. Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga**	**NO DE ORDEN**	**60**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
MURO EN CONCRETO - FRENTE CERO	M3	275,01
PUENTE PEATONAL OASIS	M3	12,98
		-
		-
		-
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		287,99
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		275,01
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30		12,98

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30


SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.11. Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga**	**NO DE ORDEN**	**60**	**UNIDAD**	m3

MURO TRAMO 0

MODULO	TIPO	AREA BASE m2	LONG MODULO m	VOL ZAPATA	H MURO m	ESPESOR MURO m	VOL MURO	VOL CONCRETO	VOL ACUMULADO M3
2	T-2	0,86	12,16	10,43	1,14	0,35	4,85	15,28	15,28
3	T-2	0,86	12,16	10,43	1,4	0,35	5,96	16,39	31,66
4	T-2	0,86	12,16	10,43	1,43	0,35	6,09	16,51	48,18
5	T-2	0,86	6,16	5,28	1,47	0,35	3,17	8,45	56,63
6	T-2	0,86	6,16	5,28	1,51	0,35	3,26	8,54	65,17
7	T-2	0,86	6,16	5,28	1,55	0,35	3,34	8,62	73,79
8	T-2	0,86	6,16	5,28	1,58	0,35	3,41	8,69	82,48
9	T-2	0,86	6,16	5,28	1,62	0,35	3,49	8,77	91,25
10	T-2	0,86	6,16	5,28	1,65	0,35	3,56	8,84	100,09
11	T-2	0,86	6,16	5,28	1,65	0,35	3,56	8,84	108,93
12	T-2	0,86	6,16	5,28	1,67	0,35	3,60	8,88	117,82
13	T-2	0,86	6,16	5,28	1,65	0,35	3,56	8,84	126,66
14	T-2	0,86	6,16	5,28	1,62	0,35	3,49	8,77	135,43
15	T-2	0,86	6,16	5,28	1,58	0,35	3,41	8,69	144,12
16	T-2	0,86	6,16	5,28	1,52	0,35	3,28	8,56	152,68
17	T-2	0,86	6,16	5,28	1,45	0,35	3,13	8,41	161,09
18	T-2	0,86	6,16	5,28	1,38	0,35	2,98	8,26	169,35
19	T-2	0,86	6,16	5,28	1,31	0,35	2,82	8,11	177,45
20	T-2	0,86	6,16	5,28	1,23	0,35	2,65	7,93	185,39
21	T-2	0,86	6,16	5,28	1,16	0,35	2,50	7,78	193,17
22	T-2	0,86	6,16	5,28	1,09	0,35	2,35	7,63	200,80
23	T-2	0,86	6,16	5,28	1,02	0,35	2,20	7,48	208,28
24	T-2	0,86	6,16	5,28	0,95	0,35	2,05	7,33	215,61
25	T-2	0,86	6,16	5,28	0,91	0,35	1,96	7,24	222,86
26	T-2	0,86	6,16	5,28	0,87	0,35	1,88	7,16	230,01
27	T-2	0,86	6,16	5,28	0,84	0,35	1,81	7,09	237,11
28	T-2	0,86	6,16	5,28	0,81	0,35	1,75	7,03	244,14
29	T-2	0,72	6,16	4,44	0,77	0,35	1,66	6,10	250,24
30	T-2	0,72	6,16	4,44	0,74	0,35	1,60	6,04	256,28
31	T-1	0,72	12,16	8,72	0,34	0,35	1,45	10,17	266,45
32	T-3	0,72	10,50	7,53	0,28	0,35	1,03	8,56	275,01
TOTAL									**275,01**

PUENTE PEATONAL OASIS

ELEMENTO	APOYO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	AREA	VOLUMEN (M3)
ZAPATA	1	3	3	0,5	1,5	4,5
ZAPATA	2	3	3	0,5	1,5	4,5
LLAVE	1	3			0,15	0,45
LLAVE	2	3			0,15	0,45
VASTAGO	1	1,5	0,4	2,3	0,92	1,38
VASTAGO	2	1,5	0,4	2,3	0,92	1,38
TOPES	1	0,3			0,27	0,16
TOPES	2	0,3			0,27	0,16
TOTAL						**12,98**



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIA**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**683.2.Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.**	**NO DE ORDEN**	**63**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	ANCHO PROMEDIO	LONG	AREA M2	OBSERVACION
MURO	1,23	219,3	269,74	
CONECTANTE IZQUIERDA	6,0	219,3	1.315,80	
CONECTANTE DERECHA	6,0	175	1.050,00	
TRAMO 1 VIA DE SERVICIO	5,0	135	675,00	K0+110 -K0+245
TRAMO 2 VIA DE SERVICIO	5,25	20	105,00	K0+245 -K0+265
TRAMO 3 VIA DE SERVICIO	5,0	60	300,00	TRAMO DE EMPALME K0+265- K0+325
TRAMO 4 VIA DE SERVICIO	5,0	110	550,00	TRAMO DE EMPALME K0+000- K0+110
EMPALME CON CALLE 12	4,613	34,73	160,21	
RETORNO			108,00	

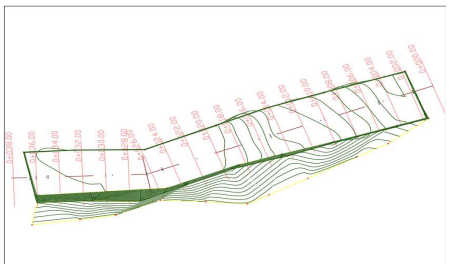

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	4.533,75
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	4.035,75
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30	498,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA LATINO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	30	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**221.1P. Pedraplen Compacto**	**NO DE ORDEN**	**67**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	674,43
CONECTANTE DERECHA	M3	782,08
RETORNO	M3	57,45
VIA DE SERVICIO	M3	565,47
PUENTE PEATONAL	M3	4,80
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		2.084,23
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		1.828,90
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30		255,33

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO






Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	25	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	221.1P. Pedraplen Compacto		**NO DE ORDEN**	67	**UNIDAD** m3

CONECTANTE IZQUIERDA

Abscisa	LONG	Area Roca m2	Promedio Area	Vol Roca m3	Vol Roca AC m3
8815		1,78		9,465	
8820	5	1,03	1,40	7,0175	7,02
8825	5	1,40	1,21	6,07	13,08
8830	5	1,77	1,58	7,92	21,00
8835	5	2,14	1,96	9,78	30,78
8840	5	2,51	2,33	11,63	42,41
8845	5	2,88	2,70	13,49	55,90
8850	5	3,25	3,07	15,35	71,25
8853.98-140	3,98	3,36	3,31	13,16	84,41
145	5	3,36	3,36	16,80	101,21
150	5	3,36	3,36	16,80	118,01
155	5	3,36	3,36	16,80	134,81
160	5	3,36	3,36	16,80	151,61
165	5	3,36	3,36	16,80	168,41
170	5	3,36	3,36	16,80	185,21
175	5	3,36	3,36	16,80	202,01
180	5	3,36	3,36	16,80	218,81
185	5	3,36	3,36	16,80	235,61
190	5	3,36	3,36	16,80	252,41
195	5	3,36	3,36	16,80	269,21
200	5	3,29	3,33	16,63	285,83
205	5	3,36	3,33	16,63	302,46
210	5	3,36	3,36	16,80	319,26
215	5	3,36	3,36	16,80	336,06
220	5	3,36	3,36	16,80	352,86
225	5	3,36	3,36	16,80	369,66
230	5	3,36	3,36	16,80	386,46
235	5	3,36	3,36	16,80	403,26
240	5	3,36	3,36	16,80	420,06
245	5	3,36	3,36	16,80	436,86
250	5	3,36	3,36	16,80	453,66
255	5	3,36	3,36	16,80	470,46
260	5	3,36	3,36	16,80	487,26
265	5	3,36	3,36	16,80	504,06
270	5	3,36	3,36	16,80	520,86
275	5	3,36	3,36	16,80	537,66
280	5	3,36	3,36	16,80	554,46
285	5	3,36	3,36	16,80	571,26
290	5	3,68	3,52	17,60	588,86
295	5	3,68	3,68	18,40	607,26
300	5	2,16	2,92	17,10	624,36
305	5	2,86	2,51	15,05	639,41
310	5	2,35	2,61	13,03	652,43
315	5	2,28	2,32	11,58	664,01
320	5	1,89	2,09	10,43	674,43
TOTAL					**674,43**

CONECTANTE DERECHA

Abscisa	LONG	Area Roca m2	Promedio Area	Vol Roca m3	Vol Roca AC m3
245		4,80		0,00	0
250	5,00	4,80	4,80	24,00	24
255	5,00	4,80	4,80	24,00	48
260	5,00	4,80	4,80	24,00	72
265	5,00	4,80	4,80	24,00	96
270	5,00	4,80	4,80	24,00	120
275	5,00	4,80	4,80	24,00	144
280	5,00	4,80	4,80	24,00	168
285	5,00	4,80	4,80	24,00	192
290	5,00	4,80	4,80	24,00	216
295	5,00	4,80	4,80	24,00	240
300	5,00	4,80	4,80	24,00	264
305	5,00	4,80	4,80	24,00	288
310	5,00	4,80	4,80	24,00	312
315	5,00	4,80	4,80	24,00	336
320	5,00	4,80	4,80	24,00	360
325	5,00	4,80	4,80	24,00	384
330	5,00	4,80	4,80	24,00	408
335	5,00	4,80	4,80	54,50	463
340	5,00	4,80	4,80	54,50	517
345	5,00	4,80	4,80	24,00	541
350	5,00	4,80	4,80	24,00	565
355	5,00	4,80	4,80	24,00	589
360	5,00	3,73	4,27	21,33	610
370	10,00	4,18	3,96	39,55	650
380	10,00	4,12	4,15	41,50	691
390	10,00	2,97	3,55	35,45	727
395	5,00	2,90	2,94	14,68	742
400	5,00	2,22	2,56	12,80	754
405	5,00	1,78	2,00	10,00	764
410	5,00	1,37	1,58	7,88	772
415	5,00	1,01	1,19	5,95	778
420	5,00	0,57	0,79	3,95	782
TOTAL					**782,1**

CONEXION RETORNO BARRANQUILLA - BARRANQUILLA

Abscisa	LONG	Area Roca m2	Promedio Area	Vol Roca m3	Vol Roca AC m3
24,35		2,67			
25	0,65	2,21	2,44	1,59	1,59
27,51	2,51	4,32	3,27	8,20	9,78
28,87	1,36	7,86	6,09	8,28	18,06
30	1,13	7,71	7,79	8,80	26,86
31,97	1,97	8,11	7,91	15,58	42,44
33,76	1,79	8,66	8,39	15,01	57,45
TOTAL					**57,45**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**25**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**221.1P. Pedraplen Compacto**		**NO DE ORDEN**	**67**	**UNIDAD** m3

VIA DE SERVICIO

Abscisa	LONG	Area Roca m2	Promedio Area	Vol Roca m3	Vol Roca AC m3
0		1,13			
5	5	1,395	1,2625	6,3125	6,31
10	5	1,395	1,395	6,975	13,29
15	5	1,395	1,395	6,975	20,26
20	5	1,395	1,395	6,975	27,24
25	5	1,395	1,395	6,975	34,21
30	5	1,395	1,395	6,975	41,19
35	5	1,395	1,395	6,975	48,16
40	5	1,43	1,4125	7,0625	55,23
45	5	1,50	1,4635	7,3175	62,54
50	5	1,5	1,4985	7,4925	70,04
55	5	1,5	1,5	7,5	77,54
60	5	1,5	1,5	7,5	85,04
65	5	1,5	1,5	7,5	92,54
70	5	1,5	1,5	7,5	100,04
75	5	1,5	1,5	7,5	107,54
80	5	1,5	1,5	7,5	115,04
85	5	1,5	1,5	7,5	122,54
90	5	1,5	1,5	7,5	130,04
95	5	1,5	1,5	7,5	137,54
100	5	1,5	1,5	7,5	145,04
105	5	1,5	1,5	7,5	152,54
110	5	1,5	1,5	7,5	160,04
115	5	1,50	1,50	7,5	167,54
120	5	1,50	1,50	7,50	175,04
125	5	1,50	1,50	7,50	182,54
130	5	1,50	1,50	7,50	190,04
135	5	1,50	1,50	7,50	197,54
140	5	1,50	1,50	7,50	205,04
145	5	1,50	1,50	7,50	212,54
150	5	1,50	1,50	7,50	220,04
155	5	1,50	1,50	7,50	227,54
160	5	1,50	1,50	7,50	235,04
165	5	1,50	1,50	7,50	242,54
170	5	1,50	1,50	7,50	250,04
175	5	1,40	1,45	7,24	257,27
180	5	1,40	1,40	6,98	264,25
185	5	1,40	1,40	6,98	271,22
190	5	1,40	1,40	6,98	278,20
195	5	1,40	1,40	6,98	285,17
200	5	1,40	1,40	6,98	292,15
205	5	1,40	1,40	6,98	299,12
210	5	1,40	1,40	6,98	306,10
215	5	1,40	1,40	6,98	313,07
220	5	1,40	1,40	6,98	320,05
225	5	1,40	1,40	6,98	327,02
230	5	1,40	1,40	6,98	334,00
235	5	1,40	1,40	6,98	340,97
240	5	1,40	1,40	6,98	347,95
245	5	1,40	1,40	6,98	354,92
250	5	1,40	1,40	6,98	361,90
255	5	1,40	1,40	6,98	368,87
260	5	1,40	1,40	6,98	375,85
265	5	1,40	1,40	6,98	382,82
270	5	1,40	1,40	6,98	389,80
275	5	1,40	1,40	6,98	396,77
279,38	4,38	1,40	1,40	6,11	402,88
TOTAL					**402,88**

VIA DE SERVICIO

Abscisa	LONG	Area Roca m2	Promedio Area	Vol Roca m3	Vol Roca AC m3
245		0,00		0,00	
250	5	0,12	0,06	0,30	0,30
255	5	0,29	0,21	1,03	1,33
260	5	0,57	0,43	2,16	3,49
265	5	1,06	0,82	4,08	7,57
270	5	1,50	1,28	6,40	13,97
275	5	1,49	1,50	7,48	21,44
280	5	1,46	1,48	7,38	28,82
285	5	1,46	1,46	7,30	36,12
290	5	1,46	1,46	7,30	43,42
295	5	1,47	1,47	7,33	50,74
300	5	1,48	1,48	7,38	58,12
305	5	1,49	1,49	7,43	65,54
310	5	1,50	1,50	7,48	73,02
315	5	1,50	1,50	7,50	80,52
320	5	1,24	1,37	6,85	87,37
325	5	0,16	0,70	3,50	90,87
TOTAL					**90,87**

Abscisa	LONG	Area Roca m2	Promedio Area	Vol Roca m3	Vol Roca AC m3
1,83		2,08			
5	3,17	2,08	2,08	6,5936	6,59
10	5	2,06	2,07	10,35	16,94
15	5	1,99	2,025	10,125	27,07
20	5	1,81	1,9	9,5	36,57
25	5	1,8	1,805	9,025	45,59
26,44	1,44	1,74	1,77	2,5488	48,14
30	3,56	1,79	1,765	6,2834	54,43
35	5	1,86	1,825	9,125	63,55
36,04	1,04	1,86	1,86	1,9344	65,49
36,56	0,52	0,83	1,345	0,6994	66,18
TOTAL					**66,18**

EMPALME CON TRONCAL VIA SERVICIO

AREA	ESPESOR	VOLUMEN
18,46	0,3	**5,54**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30


SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**221.1P. Pedraplen Compacto**	**NO DE ORDEN**	**67**	**UNIDAD**	m3

SECCION TRANSVERSAL CONECTANTE DERECHA

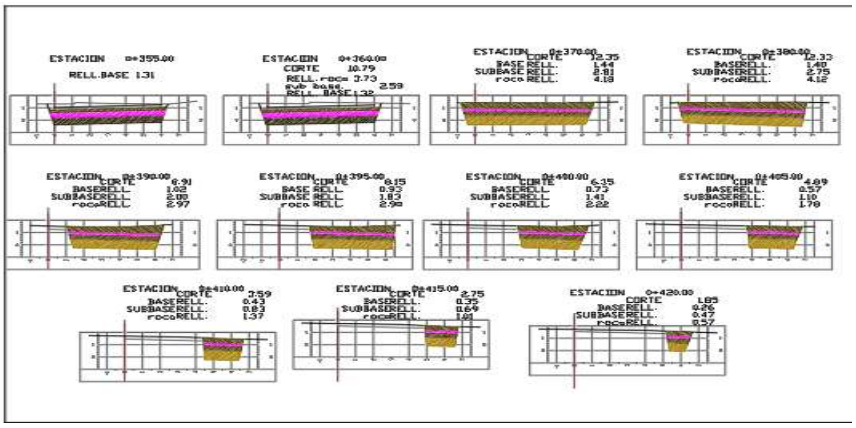

SECCION TRANSVERSAL CONEXION RETORNO BARRANQUILLA - BARRANQUILLA

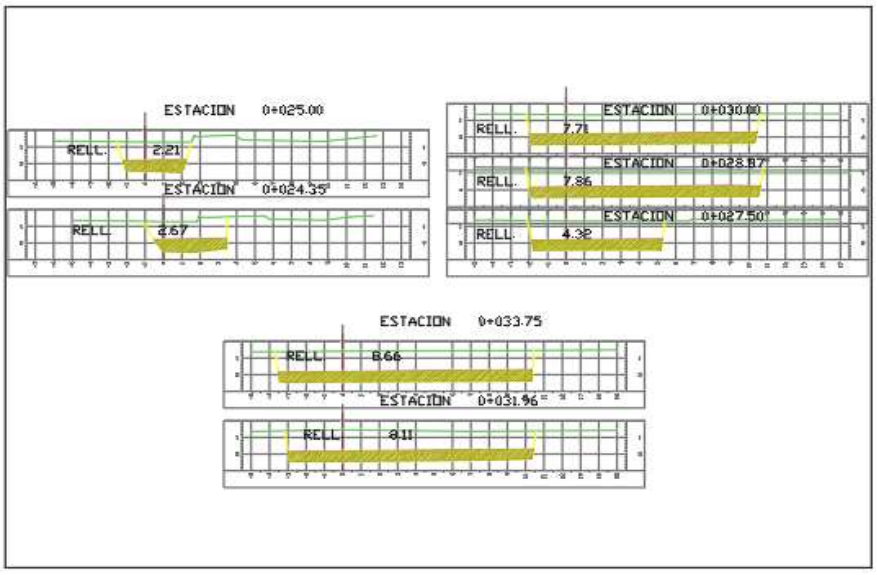

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**25**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/12/2024 a 31/12/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**221.1P. Pedraplen Compacto**	**NO DE ORDEN**	**67**	**UNIDAD**	m3

MEJORAMIENTO EN CICLOPEO PARA LA ZARPA DEL APOYO 1 PTE PEATONAL

ZARPA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	VOLUMEN	% PIEDRA	VOLUMEN ROCA
APOYO 1	4	4	0,5	16	8,00	60%	**4,80**



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA MATINO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Bordillos en concreto vaciado in situ, NO incluye la preparación de la superficie de apoyo en el PR9 de la variante cienaga**	**NO DE ORDEN**	**68**	**UNIDAD**	**M**

DESCRIPCION	UNIDAD	VOLUMEN
BORDILLO VIA DE SERVICIO	Metro	290,00
BORDILLO VIA EMPALME CON CALLE 12	Metro	35,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO		325,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES		290,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30		35,00

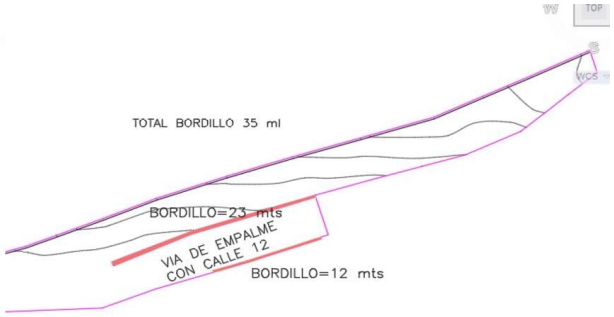

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 66202272581 RIS

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**621.5.3P. Camisa metálica permanente para pilote de diámetro 1.33 m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)**	**NO DE ORDEN**	**73**	**UNIDAD**	ml

APOYO	PILOTE	ESTE	NORTE	LONG PILOTE EFECTIVA
13	42	980453,685	1708460,508	29,00
	41	980457,493	1708462,749	29,00
	40	980461,277	1708464,975	29,00
12	39	980433,384	1708512,378	33,00
	38	980429,592	1708510,146	33,00
	37	980425,800	1708507,915	33,00
11	36	980405,491	1708559,780	28,00
	35	980401,699	1708557,549	28,00
	34	980397,907	1708555,317	28,00
10	33	980372,527	1708615,801	32,00
	32	980368,735	1708613,569	32,00
	31	980364,943	1708611,338	32,00
9	30	980342,098	1708667,512	28,00
	29	980338,306	1708665,281	28,00
	28	980334,514	1708663,050	28,00
8	27	980309,134	1708723,533	32,00
	26	980305,342	1708721,302	32,00
	25	980301,549	1708719,070	32,00
7	24	980276,169	1708779,555	32,00
	23	980272,377	1708777,323	33,00
	22	980268,585	1708775,091	33,00
6	21	980242,845	1708835,519	27,00
	20	980239,124	1708833,170	27,00
	19	980235,403	1708830,821	27,00
5	18	980242,845	1708835,519	21,00
	17	980239,124	1708833,170	21,00
	16	980235,403	1708830,821	21,00
4	15	980186,405	1708900,441	32,00
	14	980183,633	1708897,024	32,00
	13	980180,860	1708893,607	32,00
2	9	980086,541	1708948,988	31,00
	8	980085,567	1708944,697	30,00
	7	980084,592	1708940,406	30,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO				975,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES				933,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30				42,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°30

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		diciembre-24	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				


ITEM	**500.1 Pavimento de concreto hidráulico tipo MR40 (Incluye barras de transferencia de cargas, barras de amarre y canastilla de fijación).**	**NO DE ORDEN**	**78**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	AREA (m2)	ESPESOR	VOLUMEN (m3)
VIA DE SERVICIO	1790,85	0,20	358,17
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			358,17
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			320,26
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 30			37,91

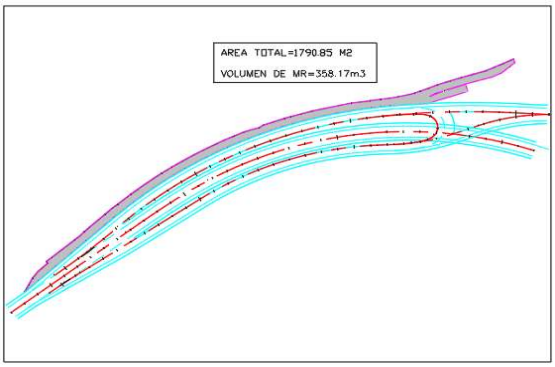

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



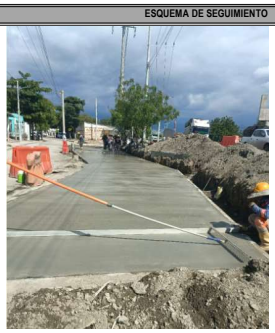



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL
