Factura Proforma

Fecha de Expedición: **mar.-25**
Fecha de Vencimiento: **may.-25**

Vendedor:	**CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**	**Cliente:**	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
NIT:	**901.588.183-1**	**NIT:**	**800.215.807-2**
Dirección:	CR 11 96 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO	**Dirección:**	CRA 59 26 60 11001. 11 COL
Ciudad:	BOGOTA D.C	**Ciudad:**	BOGOTA, D.C.
Departamento:	CUNDINAMARCA	**Departamento:**	CUNDINAMARCA
Pais:	COLOMBIA	**Pais:**	COLOMBIA
Telefono:	6549871	**Telefono:**	7056000
Correo:	lrestrepo@mincivil.com	**Correo:**	siifnacion,facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Contacto:		**Contacto:**	

Autorización número de Facturación Electronica DIAN 187640134993321 del 20/05/2021 al 20/05/2022 Autoriza con Prefijo MPC del 1 al 200

Nombre del Vendedor CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA
Orden de Compra
Avisos de Despacho 600 mts al sur de la estación del ferrocarril, Ciénaga, Magdalena
Aviso de Recibo

Forma de pago Credito
Medio de Pago Credito ACH

ID	Código Principal	Descripcion	Cantidad	UM	Precio unitario	Desc.	Cargos	Brutos	%IVA	IVA	Obseq.
1		COSTO DIRECTO + ADMINISTRACIÓN + IMPREVISTOS DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 33 A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2025.	1		$ 2.534.588.959,00	-	-	$ 2.534.588.959,00		-	
2		UTILIDAD (5%) DEL ACTA N° 33 VR OBRA EJECUTADA A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MARZO DE 2025. OBJETO CONTRATO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".	1		$ 101.383.558,00	-	-	$ 101.383.558,00	19	19.262.876,00	
3		GESTION PREDIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 33 VR A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2025.	1		$ 3.597.000,00	-	-	$ 3.597.000,00	19	683.430,00	
4		ADQUISICIÓN PREDIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 33 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2025.	1		$ 11.865.393,00	-	-	$ 11.865.393,00		-	
5		ADMINISTRACIÓN GESTION PREDIAL (2.5%) DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 33 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2025.	1		$ 296.635,00	-	-	$ 296.635,00	19	56.361,00	
6		GESTION SOCIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 33 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2025.				-	-	$ -	-	-	
7		ADMINISTRACIÓN GESTION SOCIAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 33 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2025.				-	-	$ -	19	-	
8		ESTUDIOS Y DISEÑOS EJECUTADOS EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 33 VR EJECUTADO A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2025.				-	-		19	-	
9		GESTION AMBIENTAL DE LA OBRA EJECUTADA EN EL ACTA PARCIAL DE OBRA N° 33 VR REEMBOLSABLE A CARGO DEL CONTRATO 981 de 2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO DE 2025.						$ -	-	-	

total lineas	5,00
Bruto/Sobtotal	$2.651.731.545,00
IVA	$20.002.667,00
Descuentos	
Cargos	
Base + cargos - descuentos	$0,00
Brutos + impuestos	$2.671.734.212,00
Total de anticipos	$108.074.873,00
Total a pagar	**$2,563,659,339,00**

VALOR EN LETRAS: **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

Observaciones
#$24-02-00;981-2022;Ldiazp@invias.gov.co#$ Amortizacion Anticipo $108.074.873,00

Por favor consignar en la cuenta corriente del Banco BBVA Colombia S.A. N° 833032519 a nombre del Consorcio Viaducto Ciénaga del Magdalena.

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No. 33

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 2.651.731.545,00

MES Marzo de 2025.

CONTRATO No.: **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL: **72,1 MESES** PLAZO ACUMULADO: **72,1 MESES**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **27/07/2022** FECHA DE VENCIMIENTO: **31/07/2028**

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$630.007.748.262,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$635.116.748.262,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ 5.109.000.000,00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 31/03/2025		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES															
1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	9,00	$ 1.537.478,00		$ 13.837.302,00		$ -		$ -		$ -
1,1	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00			8,03	$ 12.345.948,34	0,49	$ 753.364,00	2,05	$ 3.151.830,00
1,2	200.2	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00			3,00	$ 4.612.434,00		$ -	0,62	$ 953.236,00
2	201.7	201-13		Demolición de Estructuras	m3	100,00	$ 125.703,00		$ 12.570.300,00	3.239,70	$ 407.240.009,10	40,22	$ 5.055.775,00	2.137,26	$ 268.659.994,00
3	210.2.2	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	46.419,00	$ 10.191,00		$ 473.056.029,00	65.730,54	$ 669.859.933,14	16.892,99	$ 172.156.461,00	35.852,60	$ 365.373.847,00
4	220.1P		220.1P	Terraplenes (incluye material seleccionado de cantera)	m3	23.159,00	$ 31.904,00		$ 738.864.736,00	42.283,73	$ 1.349.020.121,92		$ -	23.158,37	$ 738.844.636,00
Subtotal								**$**	**1.238.328.367,00**		**$ 2.443.078.446,50**		**$ 177.965.600,00**		**$ 1.376.983.543,00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS															
5	320.1	320-13		Subbase Granular clase A	m3	9.818,00	$ 145.679,00		$ 1.430.276.422,00	20.782,51	$ 3.027.575.274,29		$ -	1.476,52	$ 215.097.957,00
6	330.1	330-13		Base granular clase A	m3	7.159,00	$ 161.149,00		$ 1.153.665.691,00	12.966,49	$ 2.089.536.897,01		$ -	450,45	$ 72.589.567,00
7	330.4	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	80,00	$ 175.996,00		$ 14.079.680,00	80,00	$ 14.079.680,00		$ -		$ -
Subtotal								**$**	**2.598.021.793,00**		**$ 5.131.191.851,30**		**$ -**		**$ 287.687.524**
PAVIMENTOS ASFALTICOS															
8	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	35.796,00	$ 2.786,00	$	99.727.656,00	39.072,00	$ 108.854.592,00		$ -		$ -
9	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	150.540,00	$ 1.766,00	$	265.853.640,00		$ -		$ -		$ -
9,1	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00			69.004,00	$ 121.861.064,00		$ -		$ -
9,2	421.1	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00			81.536,00	$ 143.992.576,00		$ -		$ -
10	450.1P		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	3.534,00	$ 948.454,00	$	3.351.836.436,00	3.534,00	$ 3.351.836.436,00		$ -		$ -
11	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	8.271,00	$ 956.591,00	$	7.911.964.161,00		$ -		$ -		$ -
11,1	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00			5.417,00	$ 5.181.853.447,00		$ -		$ -
11,2	450.2P		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00			2.854,00	$ 2.730.110.714,00		$ -		$ -
12	450.9P		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3	100,00	$ 984.206,00	$	98.420.600,00	100,00	$ 98.420.600,00		$ -		$ -
13	460.1P		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3	11.340,00	$ 83.576,00	$	947.751.840,00		$ -		$ -		$ -
14	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte y la remoción de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	11.340,00	$ 90.230,00	$	1.023.208.200,00		$ -		$ -		$ -
Subtotal								**$**	**13.698.762.533,00**		**$ 11.736.929.429,00**		**$ -**		**$ -**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES															
15	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	1.344,00	$ 16.721,00	$	22.473.024,00		$ -		$ -		$ -
15,1	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00			5.623,68	$ 94.033.516,43	156,42	$ 2.615.499,00	3.255,03	$ 54.427.357,00
15,2	600.1.1P		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00			444,00	$ 7.424.124,00		$ -		$ -
16	600.2.4P		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	269,00	$ 49.053,00	$	13.195.257,00		$ -		$ -		$ -
16,1	600.2.4P		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00			142,00	$ 6.965.526,00		$ -		$ -
16,2	600.2.4P		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00			127,00	$ 6.229.731,00		$ -		$ -
17	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	728,00	$ 58.765,00	$	42.780.920,00		$ -		$ -		$ -
17,1	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00			2.601,00	$ 152.847.765,00		$ -	795,49	$ 46.746.970,00
17,2	610.1	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00			127,00	$ 7.463.155,00		$ -		$ -
18	610.2	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	23.307,00	$ 120.630,00	$	2.811.184.810,00	23.307,00	$ 2.811.184.810,00	959,21	$ 115.901.344,00	1.014,48	$ 122.579.618,00
19	610.3	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	152,00	$ 162.739,00	$	24.736.328,00	152,00	$ 24.736.328,00		$ -		$ -
20	621.1.P		621.1.P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,0 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m	1.750,00	$ 1.750.000,00	$	3.062.500.000,00	1.382,00	$ 2.418.500.000,00		$ -		$ -
21	621.1.1P		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,30 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m	2.030,00	$ 2.300.000,00	$	4.669.000.000,00		$ -		$ -		$ -
22	621.1.2P		621.1.2P	Pilote de concreto huecos prefabricados, concreto fc = 50 MPA de diametro 1,20 m, transporte e hincado con viga lanzadora (No incluye acero de refuerzo y no incluye transporte producto de las excavaciones) incluye suministro de elementos metálicos de conexión y platina de continuidad	m	81.657,00	$ 1.795.026,00	$	146.576.438.082,00	75.780,09	$ 136.027.231.832,34		$ -		$ -
23	621.5.1P		621.5.1P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.3m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m	609,00	$ 3.530.001,00	$	2.149.770.609,00	609,00	$ 2.149.770.609,00		$ -		$ -
24	621.5.2P		621.5.2P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1,0m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m	525,00	$ 2.937.153,00	$	1.542.005.325,00	525,00	$ 1.542.005.325,00		$ -		$ -
25	630.1.P		630.1.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado, para moldes prefabricados de dados para puentes	m3	4.262,00	$ 2.331.990,00	$	9.938.941.380,00	4.262,00	$ 9.938.941.380,00		$ -		$ -
26	630.2.P		630.2.P	Concreto clase 50 MPA, para vigas artesa prefabricadas preesforzadas lanzadas, postensado de puentes	m3	38.365,00	$ 2.022.409,00	$	77.589.721.285,00		$ -		$ -		$ -
27	630.3.P		630.3.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado en segunda etapa para dados, conformación del tablero y vigas riostra	m3	23.835,00	$ 1.238.934,00	$	29.529.991.890,00	23.835,00	$ 29.529.991.890,00		$ -		$ -
28	630.4.P		630.4.P	Concreto clase A, 50 Mpa, reforzado, para barreras de tráfico, colocación de concreto sobre tablero	m3	4.587,00	$ 1.277.842,00	$	5.861.461.254,00	452,71	$ 578.491.851,82		$ -		$ -
29	630.6P		630.6P	Concreto clase 35 MPA para Dados de cimentación	m3	1.912,00	$ 1.064.792,00	$	2.035.882.304,00	1.912,00	$ 2.035.882.304,00		$ -		$ -
30	630.7P		630.7P	Concreto clase 35 MPA para tablero, vigas riostra y anden	m3	3.672,00	$ 1.124.254,00	$	4.128.260.688,00	3.672,00	$ 4.128.260.688,00		$ -	1.554,00	$ 1.747.090.716,00
31	630.8P		630.8P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3	335,00	$ 1.446.638,00	$	484.623.730,00	335,00	$ 484.623.730,00		$ -	295,18	$ 427.018.605,00
32	630.9P		630.9P	Concreto clase 28 MPA para estribos	m3	1.184,00	$ 1.003.819,00	$	1.188.521.696,00	1.184,00	$ 1.188.521.696,00	171,81	$ 172.466.142,00	1.176,90	$ 1.181.394.581,00
33	630.4	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	42,00	$ 792.029,00	$	33.265.218,00	84,43	$ 66.871.008,47	23,63	$ 18.715.645,00	65,63	$ 51.980.863,00
34	630.6	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	27,00	$ 574.960,00	$	15.523.920,00	249,91	$ 143.688.253,60	10,60	$ 6.094.576,00	111,59	$ 64.159.786,00
35	632.1P		632.1P	Baranda Metalica	m	2.950,00	$ 643.891,00	$	1.899.478.450,00	2.950,00	$ 1.899.478.450,00		$ -		$ -
36	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	22.816.890,00	$ 6.750,00	$	154.014.007.500,00		$ -		$ -		$ -
36,1	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.750,00			220.078,80	$ 1.485.531.900,00	13.341,74	$ 90.056.745,00	73.548,54	$ 496.452.645,00
36,2	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.750,00			13.804.068,00	$ 93.177.459.000,00		$ -		$ -
36,3	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.750,00			5.695.450,00	$ 38.444.287.500,00		$ -	45.022,50	$ 303.901.875,00
36,4	640.1	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 6.750,00			3.204.810,00	$ 21.632.467.500,00		$ -	494.007,28	$ 3.334.549.140,00
37	641.1	641-13		Acero de Preesfuerzo	TFm	31.267.401,00	$ 2.105,00	$	65.817.879.105,00	31.267.401,00	$ 65.817.879.105,00		$ -		$ -
38	642.1	642-13		Apoyo elastomérico	u	627,00	$ 5.284.823,00	$	3.313.584.021,00	627,00	$ 3.313.584.021,00		$ -		$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA	31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA | **ACTA No.** 33 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2.651.731.545,00 | **MES** Marzo de 2025.

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No.: **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022** | INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL: **72,1 MESES** | PLAZO ACUMULADO: **72,1 MESES**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **27/07/2022** | FECHA DE VENCIMIENTO: **31/07/2028**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: | FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: | FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$630.007.748.262,00** | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ 5.109.000.000,00**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$635.116.748.262,00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 31/03/2025		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
39	642,2P		642,2P	Junta para puente,recorrido 400 mm	m	106,00	$ 52.400.000,00	$ 5.554.400.000,00		106,00	$ 5.554.400.000,00		$ -		$ -
40	642,3P		642,3P	Junta para puente,recorrido 225 mm	m	64,00	$ 20.320.751,00	$ 1.300.528.064,00		64,00	$ 1.300.528.064,00		$ -		$ -
41	650,2	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	kg	570.180,00	$ 15.000,00	$ 8.552.700.000,00		4.126.456,50	$ 61.896.847.565,17		$ -	2.372.570,98	$ 35.588.564.700,00
42	650,3	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	570.180,00	$ 174,00	$ 99.211.320,00		4.126.456,50	$ 718.003.431,76	396.598,39	$ 69.008.120,00	2.093.014,63	$ 364.184.546,00
43	650,4	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	kg	570.180,00	$ 4.226,00	$ 2.409.580.680,00		4.126.456,50	$ 17.438.405.187,36	239.192,00	$ 1.010.825.392,00	1.696.416,24	$ 7.169.055.030,00
44	661,1	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	300,00	$ 653.594,00	$ 196.078.200,00		300,00	$ 196.078.200,00		$ -		$ -
45	671,1	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	344,00	$ 615.232,00	$ 211.639.808,00		344,00	$ 211.639.808,00		$ -	85,67	$ 52.706.925,00
46	673,1	673-13		Geotextil tipo NT 2400 no tejido	m2	1.450,00	$ 7.418,00	$ 10.756.100,00		1.450,00	$ 10.756.100,00		$ -		$ -
47	673,2	673-13		Material granular drenante	m3	202,00	$ 126.990,00	$ 25.651.980,00		2.202,00	$ 279.631.980,00		$ -		$ -
48	673,3	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3	27,00	$ 169.551,00	$ 4.577.877,00		27,00	$ 4.577.877,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 535.135.350.825,00**			**$ 506.730.221.212,95**		**$ 1.485.683.463,00**		**$ 51.004.813.357,00**
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
49	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	31.998,00	$ 1.897,00	$ 60.700.206,00			$ -		$ -		$ -
49,1	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00			10.158,00	$ 19.269.726,00		$ -		$ -
49,2	1P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00			31.140,00	$ 59.072.580,00		$ -		$ -
50	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	480,00	$ 22.984,00	$ 11.032.320,00			$ -		$ -		$ -
50,1	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00			158,00	$ 3.631.472,00		$ -		$ -
50,2	2P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00			2.822,00	$ 64.860.848,00		$ -		$ -
51	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	711,00	$ 7.990,00	$ 5.680.890,00			$ -		$ -		$ -
51,1	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00			678,00	$ 5.417.220,00		$ -		$ -
51,2	4P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00			506,00	$ 4.042.940,00		$ -		$ -
52	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	38,00	$ 384.891,00	$ 14.625.858,00			$ -		$ -		$ -
52,1	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00			19,00	$ 7.312.929,00		$ -		$ -
52,2	5P	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00			35,00	$ 13.471.185,00		$ -		$ -
53	730,1	730-13		Defensa metalica	m	1.682,00	$ 222.702,00	$ 374.584.764,00		1.715,00	$ 381.933.930,00		$ -		$ -
54	730,2	730-13		Sección final	u	8,00	$ 98.987,00	$ 791.896,00		9,00	$ 890.883,00		$ -		$ -
55	740,1	740-13		Captafaros	u	8,00	$ 21.130,00	$ 169.040,00		549,00	$ 11.600.370,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 467.584.974,00**			**$ 571.504.083,00**		**$ -**		**$ -**
OBRAS VARIAS															
56	810,1	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	1.250,00	$ 18.785,00	$ 23.481.250,00		1.250,00	$ 23.481.250,00		$ -		$ -
Subtotal								**$ 23.481.250,00**			**$ 23.481.250,00**		**$ -**		**$ -**
TRANSPORTES															
57	900,2	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	188.641,00	$ 1.121,00	$ 211.466.561,00		1.433.390,51	$ 1.606.830.764,99	697.771,39	$ 782.201.728,00	1.211.086,99	$ 1.357.628.516,00
Subtotal								**$ 211.466.561,00**			**$ 1.606.830.764,99**		**$ 782.201.728,00**		**$1.357.628.516**
58	621,2P		621,2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,33 con concreto tremie 35 Mpa en suelos cenagosos (incluye excavación bajo agua, incluye acero de refuerzo, incluye adecuación de la zona, no incluye camisas metálica).	m		$ 4.716.115,00			1.410,00	$ 6.649.722.150,00		$ -	1.262,00	$ 5.951.737.130,00
59	630,1	630-13		Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 1.825.395,00			470,00	$ 857.935.650,00	11,30	$ 20.626.964,00	377,49	$ 689.068.359,00
60	630,11	630-13		Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 1.511.509,00			354,65	$ 536.056.666,85		$ -	291,65	$ 440.831.600,00
61	630,12	630-13		Concreto clase 28 MPA para cimentación de Defensas en concreto para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 954.668,00			501,00	$ 478.288.668,00		$ -		$ -
62	683,1	630-13		Geomalla de refuerzo tipo UX-135 o similar para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 34.026,00			20.670,00	$ 703.317.420,00		$ -		$ -
63	683,2	683-13		Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 12.626,00			10.970,00	$ 138.507.220,00		$ -	4.533,75	$ 57.243.128,00
64	683,3	683-13		Geotextil NT 2500 para separación de suelos de subrasante y capas granulares en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 12.590,00			4.836,00	$ 60.885.240,00		$ -		$ -
65	683,4	683-13		Relleno con material seleccionado para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga	m3		$ 94.817,00			7.520,00	$ 713.023.840,00		$ -		$ -
66	683,5P		683,5P	Suministro e instalación de tubería PVC novafort de 4" perforada en el PR9 de la variante cienaga.	m		$ 37.206,00			3.220,00	$ 119.803.320,00		$ -	219,30	$ 8.159.276,00
67	221,1P		221,1P	Pedraplen Compacto	m3		$ 79.854,00			4.889,00	$ 390.406.206,00		$ -	2.146,93	$ 171.440.948,00
68	672,1	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, NO incluye la preparación de la superficie de apoyo en el PR9 de la variante cienaga	m		$ 82.321,00			1.792,00	$ 147.519.232,00		$ -	850,80	$ 70.038.707,00
69	720,1	720-13		Poste de referencia	u		$ 476.085,00			23,00	$ 10.949.955,00		$ -		$ -
70	642,2	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 30cm*20cm*3cm	u		$ 128.232,00			28,00	$ 3.590.496,00	4,00	$ 512.928,00	20,00	$ 2.564.640,00
71	642,3	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de diametro 65 cm espesor 10 cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	u		$ 3.068.904,00			24,00	$ 73.653.696,00	6,00	$ 18.413.424,00	9,00	$ 27.620.136,00
72	642,4	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 53cm*58cm*10cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	u		$ 2.423.682,00			30,00	$ 72.710.460,00		$ -	30,00	$ 72.710.460,00
73	621,5,3P		621,5,3P	Camisa metálica permanente para pilote de diámetro 1,33 m en Acero ASTM A36 espesor 9mm, (incluye proceso de hincado)	m		$ 3.725.643,00			1.260,00	$ 4.694.310.180,00	30,00	$ 111.769.290,00	1.141,00	$ 4.250.958.663,00
74	621,7,1P		621,7,1P	Pruebas de Integridad de Pilotes (PIT) - ASTM D5882	u		$ 1.575.439,00			6,00	$ 9.452.634,00		$ -	4,00	$ 6.301.756,00
75	731,1	731-13		Defensas en concreto tipo I en concreto 4000 PSI (No incluye acero de refuerzo) para el PR9 de la variante de Ciénaga	m		$ 323.326,00			2.101,00	$ 679.307.926,00	120,00	$ 38.799.120,00	800,14	$ 258.706.066,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA | **ACTA No.** 33 | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,651,731,545,00 | **MES** Marzo de 2025.

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No.: **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022** | INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL: **72,1 MESES** | PLAZO ACUMULADO: **72,1 MESES**

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **27/07/2022** | FECHA DE VENCIMIENTO: **31/07/2028**

FECHA DE SUSPENSIÓN 1: | FECHA DE REANUDACIÓN:

FECHA DE SUSPENSIÓN 2: | FECHA DE REANUDACIÓN:

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$630,007,748,262,00**

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): **$ 5.109.000.000,00**

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$635.116.748.262,00**

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 31/03/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
76	201.14.1P		201.14.1P	Traslado de línea de conducción de agua potable de 12", en el tramo comprendido entre las abscisas K8+656 y el K9+206, desde el frente Cero hasta la pila 4 del Viaducto de la Variante de Ciénaga.	Global		$ 872.643.912,00		1,00	$ 872.643.912,00		$ -	0,95	$ 829.011.716,00
77	201.14.2P		201.14.2P	Traslado de redes de media y baja tensión, en el tramo comprendido entre las abscisas K8+656 y el K9+206, desde el frente cero hasta la pila 4 del viaducto de la variante de ciénaga.	Global		$ 463.148.385,00		1,00	$ 463.148.385,00		$ -	0,95	$ 439.990.966,00
78	500.1	500-13		Pavimento de concreto hidráulico tipo MR40 (Incluye barras de transferencia de cargas, barras de amarre y canastilla de fijación).	m3		$ 1.384.303,00		470,40	$ 651.176.131,20		$ -	358,17	$ 495.815.806,00
79	650.5P		650.5P	Protección de estructuras metálicas con pinturas resistentes a ambientes costeros	kg		$ 1.566,00		2.442.987,71	$ 3.825.718.753,86		$ -	2.437.718,71	$ 3.817.467.500,00
Subtotal								**$ -**		**$ 22.152.128.141,91**		**$ 190.121.726,00**		**$ 17.589.666.857,00**
				Ajuste al peso						$ 4.731,35				$ 4,00
SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)								**$ 553.372.996.303,00**		**$ 550.395.369.911,00**		**$ 2.635.972.517,00**		**$ 71.616.779.801,00**
	PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 32.410.096.979,00		$ 32.572.015.000,00				$ 12.633.415.829,00
	DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA							$ 600.000.000,00		$ 600.000.000,00				$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS							$ 300.000.000,00		$ 305.000.000,00				$ -
	VALOR BÁSICO DE OBRAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES							**$ 586.683.093.282,00**		**$ 583.872.384.911,00**		$ 2.635.972.517,00		$ 84.250.195.630,00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)							$ 4.287.299.528,00		$ 4.266.759.736,00		$ 19.262.876,00		$ 615.674.507,00
*	**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) = (A)**							**$ 590.970.392.810,00**		**$ 588.139.144.647,00**		**$ 2.655.235.393,00**		**$ 84.865.870.137,00**
	REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)							$ 3.996.575.000,00		$ 3.996.575.000,00				$ 3.995.574.999,00
	IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)							$ 759.349.250,00		$ 759.349.250,00		$ -		$ 759.159.252,00
*	**TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) + (2) = (B)**							**$ 4.755.924.250,00**		**$ 4.755.924.250,00**		**$ -**		**$ 4.754.734.251,00**
	GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C							**$ 33.777.431.202,00**		**$ 33.817.431.202,00**		$ 16.498.819,00		$ 14.183.358.865,00
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)							**$ 504,000,000,00**		**$ 504,000,000,00**				$ -
	BOLSA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS (L)									$ 2.593.830.221,00				$ 2.592.830.221,00
	IVA - BOLSA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS 19% (M)									$ 492.827.742,00				$ 492.637.742,00
	TOTAL BOLSA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS.N= (L) + (M)									**$ 3.086.657.963,00**		$ -		$ 3.085.467.963,00
	DIAGNÓSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)									$ 40.000.000,00				$ -
	IVA (19%) - DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)									$ 7.600.000,00				$ -
	TOTAL DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (K) = F + G									**$ 47.600.000,00**				$ -
	PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE (MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS E IVA (J)									**$ 4,765,990,200,00**				$ -
*	**VALOR TOTAL = (A) + (B) + (C) + (D) + (N) +(K)+(J)**							**$ 630,007,748,262,00**		**$ 635,116,748,262,00**		**$ 2,671,734,212,00**		**$106,889,431,216,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 30 %

Utilidad 5 %

	Valor Obra	%	Valor Adquisición Predial	%	Valor Anticipo Total	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 23.430.829.352,80	100%	$ 6.569.170.647,20	100%	$ 30.000.000.000,00	100%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 108.074.873,00	0,46%	$ -	0,00%	$ 108.074.873,00	0,36%
Valor Amortizado Acumulado	$ 3.395.999.148,00	14,49%	$ 2.688.836.040,00	40,93%	$ 6.084.835.188,00	20,28%
Valor Saldo por Amortizar	$ 20.034.830.204,80	85,51%	$ 3.880.334.607,20	59,07%	$ 23.915.164.812,00	79,72%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 2.635.972.517,00	$ 19.262.876,00	$ 2.655.235.393,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%	$ 15.759.028,00	$ 739.791,00	$ 16.498.819,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$2,651,731,545,00**	**$20,002,667,00**	**$2,671,734,212,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 177.965.600,00	$ 1.548.424.491,00
SB	$ -	$ 215.097.957,00
B	$ -	$ 72.589.567,00
P	$ -	$ -
OA	$ 1.675.805.189,00	$ 67.983.048.300,00
SCT	$ -	$ -
OV	$ -	$ 439.990.966,00
T	$ 782.201.728,00	$ 1.357.628.516,00
TOTAL	**$2,635,972,517,00**	**$ 71,616,779,801,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de Explanación	$ 177.965.600	$ 1.548.424.491,00
2. Sub-bases y bases	$ -	$ 287.687.524,00
3. Transporte de materiales	$ 782.201.728	$ 1.357.628.516,00
4. Aceros y elementos metálicos	$ 1.169.890.257	$ 51.074.175.436,00
5. Concretos, morteros y obras varias	$ 118.516.843	$ 2.119.477.341,00
6. Concreto para estructura de puentes	$ 368.471.737	$ 15.069.248.125,00
7 . Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 18.926.352	$ 160.138.364,00
(N) Ítems no sujetos a ajuste		$ -
TOTAL	**$2,635,972,517,00**	**$ 71,616,779,801,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA No. 33

VALOR BÁSICO ACTA: $ 2,651,731,545,00

MES Marzo de 2025.

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No.: **981 de 2022**

OBJETO: **"MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **977 DE 2022** INTERVENTOR: **CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**

PLAZO INICIAL:	**72,1 MESES**	PLAZO ACUMULADO:	**72,1 MESES**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	**27/07/2022**	FECHA DE VENCIMIENTO:	**31/07/2028**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:		FECHA DE REANUDACIÓN:	
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**:	**$630,007,748,262,00**	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	**$ 5.109.000.000,00**
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**:	**$635.116.748.262,00**		

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS FECHA 31/03/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN/REINTEGRO DE ANTICIPO: **$2.651.731.545,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN/REINTEGRO DE ANTICIPO: **$2.543.656.672,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$2.563.659.339,00**

(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

La facturación de la presente Acta Parcial, corresponde a la intervencion en la variante de cienaga

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).

5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: _____
Nombre: **ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 43.099.356

Firma: _____
Nombre: **FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

PERIODO MES: **Marzo de 2025.**

ACTA PARCIAL DE OBRA No. **33** (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: **$2.651.731.545,00**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	10/04/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	NHERNANDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10/04/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	NHERNANDEZ		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10/04/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NHERNANDEZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	14/04/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FARANGO		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	14/04/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PAOLA AVILA ARGOTA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	13/05/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	PAOLA AVILA ARGOTA		SE FIRMA EN ESTA FECHA YA QUE LA NO OBJECIÓN PREDIAL FUE EMITIDA POR PARTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD EL 13/05/2025 POR MEDIO DEL RADICADO 2025S-VBOG-029787
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15/05/25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Luis Diaz	Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 981 **DE** 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA **NIT.** 901.588.183-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL GERENTE GRUPO NORTE, AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$2.563.659.339,00** VALOR EN LETRAS: **DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: PARCIAL DE OBRA No. 33 **DEL PERIODO** Marzo de 2025. y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: **FABIÁN ARANGO PINEDA**
Matrícula profesional No.: **13202 097750 BLV**
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 14/04/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **FABIÁN ARANGO PINEDA**
Matrícula profesional No.: **13202 097750 BLV**
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 14/04/2025
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: **PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA**
Matrícula profesional No.: **08202-384226 ATL**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Firmado digitalmente por DIAZ PEREZ LUIS JAIME
Nombre: **LUIS JAIME DIAZ PEREZ**
Matrícula Profesional No.: **22202-273807**
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

CONTRATO DE OBRA: No. 981 de 2022

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERÍODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**33**	**Marzo de 2025.**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO						
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Certificado de disponibilidad presupuestal
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO:		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO	**215024**	RUBRO No.	**C-2401-0600-91-51102D-2401013-02**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$ 2.563.659.339,00**

TOTAL ACTA INCLUIDO IVA **$2.563.659.339,00**

Firma

Nombre: PAOLA ANDREA AVILA ARGOTA
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Matricula profesional No.: 08202-384226 ATL

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FNANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

Contrato No. 981 de 2022 **Contratista** CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

Objeto del Contrato "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

Acta No. 33 **Valor basico:** $2.651.731.545,00 **Periodo:** Marzo de 2025.

Valor incluido el Iva: $2.671.734.212,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	9007	VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ -	$ -		$ -
2	N/A	PR9 VARIANTE CIENAGA	$ 2.671.734.212,00			$ 2.671.734.212,00
TOTALES			**$2.671.734.212,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$ 2.671.734.212,00**

VALOR ICA Y TASA BOMBERIL DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**MAGDALENA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
	MUNICIPIO 1	SITIO NUEVO	$ -	$ -
	MUNICIPIO 2	CIENAGA	$ 2.671.734.212,00	$ 2.651.731.545,00
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$2.671.734.212,00**	**$2.651.731.545,00**
		REEMBOLSO DE GASTOS GESTIÓN PREDIAL	$ 16.498.819,00	$ 15.759.028,00
		REEMBOLSO DE GASTOS GESTIÓN SOCIAL	$ -	$ -
		REEMBOLSO DE GASTOS GESTIÓN AMBIENTAL	$ -	$ -
	DEPARTAMENTO 2			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			
	DEPARTAMENTO 3			
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
C.C. 19.072.460

Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
C.C. 43.099.356

CONSORCIO VIADUCTO
CIÉNAGA DEL MAGDALENA

NIT: 901.588.183-1
Carrera 11 No. 98-07 Oficina 201A
Edificio Pijao Corporativo
BOGOTÁ D.C.
PBX: (57 1) 3289770 – 3289774

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
PARAFISCALES – Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal del CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA, identificado con NIT No. 901.588.183-1, certifica: Que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Bogotá D.C., a los (04) cuatro días del mes de abril de dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente,

ALEXANDRA GREIDINGER RESTREPO
Representante Legal
C.C. 43.099.356

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14824897845

(415)7707212489984(8020) 000001482489784 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 8 1 8 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 98 07 OF 201 A

42. Correo electrónico notificaciones@mincivil.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 2 8 9 7 7 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 2 0 1 3 1							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	8																						

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 9 61. Fecha 2022 - 04 - 26 / 11 : 28: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DIAZ CASTRO JUAN SEBASTIAN
985. Cargo Analista II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14801406161

(415)7707212489984(8020) 000001480140616 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 0 5 4 5	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MINCIVIL S.A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 11 98 07 OF 201 A ED PIJAO CORPORATIVO

42. Correo electrónico notificaciones@mincivil.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 8 9 7 7 0	6 7 6 0 2 5 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 2 1 0	1 9 8 2 0 5 1 0	4 2 2 0 0 8 1 1		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	4 1	4 2	4 8	5 2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 14 / 14 : 03: 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GREIDINGER RESTREPO ALEXANDRA MARIA
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14833779077

(415)7707212489984(8020) 000001483377907 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SP INGENIEROS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
SP INGENIEROS S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 74 28 29

42. Correo electrónico jorge.escudero@sp.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 0 0 2 5	3 4 1 7 6 0 0	3 4 1 7 4 4 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	1 9 8 3 0 4 1 2	4 2 9 0	1 9 8 3 0 4 1 2		4 3 1 1	4 6 6 3

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	4 2	4 8	5 2															

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 16 / 16 : 14: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MUNERA SANCHEZ JORGE IVAN
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	9 0 5	5 7 1
73. Fecha	1 9 8 3 0 4 1 2	2 0 1 6 0 8 2 5
74. Número de notaría	7	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 8 3 0 4 1 5	2 0 1 7 0 1 3 1
77. No. Matrícula mercantil	2 1 0 7 0 2 8 8 1 2	2 1 0 7 0 2 8 8 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	1 9 8 3 0 4 1 2	1 9 8 3 0 4 1 5
81. Hasta	2 0 5 0 0 4 2 3	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	2 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	8 0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	1 0 0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 1 2 1 2 2 0	9 0 0 4 0 2 2 0 8	5
2	2 0	2 0 1 1 1 2 1 6	9 0 0 1 9 0 4 1 7	6
3	7 9	2 0 1 4 0 1 0 1		
4	2 0	2 0 2 1 1 0 2 7	9 0 0 3 5 2 1 9 7	7
5		Año Mes Día		

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1	SP INGENIEROS S.A.S		

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante: CONCESIONARIA NUEVA FISCALIA SAS

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 0 0 7 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 0 0 9 9 1 6 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MUNERA	SANCHEZ	JORGE	IVAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 0 0 7 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 2 4 1 6 0 9 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALDARRIAGA	SUAREZ	GLORIA	DEL SOCORRO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 6 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 2 7 6 7 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALDARRIAGA	SUAREZ	LUIS	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 6 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 1 7 7 3 8 1 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALDARRIAGA	PEREZ	ANDRES	FELIPE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 0 9 0 6 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 8 8 6 5 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SALDARRIAGA	PEREZ	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
APOD. GENERAL 0 7	2 0 0 9 0 6 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	4 1 4 7 4 1 0 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMPO	DE BOTERO	ANA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
APOD. GENERAL 0 7	2 0 1 7 0 1 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 2 5 0 5 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	VELEZ	ANA	CECILIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 0 3 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 2 5 0 5 1 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	VELEZ	ANA	CECILIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 2 7 6 7 7 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALDARRIAGA	SUAREZ	LUIS	ALFONSO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 7 3 8 1 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALDARRIAGA	PEREZ	ANDRES	FELIPE

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 7 8 8 6 5 3		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALDARRIAGA	PEREZ	CARLOS	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	7 0 0 9 9 1 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUNERA	SANCHEZ	JORGE	IVAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	3 2 4 1 6 0 9 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SALDARRIAGA	SUAREZ	GLORIA	DEL SOCORRO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **0000014833779907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 2 1 6 5 6 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GIRALDO	GARCIA	JAIME	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 0 0 8 4 3 3 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORTIZ	URIBE	JUAN	CAMILO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	2 0 1 9 0 3 2 8

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 1 2 8 2 7 6 4 4 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MUNERA	PEÑA	CAMILO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 2 5 0 5 1 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SANCHEZ	VELEZ	ANA	CECILIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 3 0 0 3 4 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ORTIZ	VELEZ	MARTHA	ELENA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 8 2 5	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 1 6 0 4 0 4 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
AMAYA	LOPEZ	LUIS	CARLOS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 3 5 2 4 2 0		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
SIERRA	GIRALDO	JORGE	ALBERTO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 9 0 3 2 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 5 7 7 5 0 5		1 6 8 6 9 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
BARRERA	BARRERA	ELOISA	MARIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE HORWATH CO S.A.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 3 2 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 8 7 0 8 4 3 2		1 3 6 5 5 4 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
VILLADA	LOPERA	JUAN	CARLOS

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada
8 3 0 0 0 0 8 1 8	9	CROWE HORWATH CO S.A.

147. Fecha de nombramiento: 2 0 2 1 1 2 1 6

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 1 7 4 0 0 9 8		8 1 6 6 1 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ESCUDERO	RODAS	JORGE	EDUARDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14833779077

(415)7707212489984(8020) **000001483377907 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 2 4 2 4	8	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 2 1 0	

162. Nombre del establecimiento: SP INGENIEROS S.A.S

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CR 74 28 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 1 3 1 8 0 0 0 2	1 9 8 3 0 4 1 5	
168. Teléfono: 3 4 1 7 6 0 0	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RELACION DE ADQUISICION PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

		FECHA	31/03/2025 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	**MAGDALENA**

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
CONTRATO DE OBRA No	981 DE 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No**	**977 DE 2022**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**NOMBRE INTERVENTORIA**	**CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO**
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO)	VARIANTE CIENAGA-TRAMO 2		

2. DESCRIPCIÓN

PREDIO	Cedula Ciudadanía o NIT	Propietario	Abs. Inicial	Abs. Final	Avalúo
002I-M93-T1-VC	891780043-5	Municipio De Ciénaga	K10+633,14	K10+661,55	$ 4.817.542
004I-T2-VC	891780043-5	Municipio De Ciénaga	K11+898,02	K12+015,63	$ 3.234.793
005ACI-T2-VC	891780043-5	Municipio De Ciénaga	K 12+038,86	K 12+039,18	$ 32.700
005ADI-T2-VC	891780043-5	Municipio De Ciénaga	K 12+026,99	K 12+032,67	$ 8.100
007D-T1-VC	8190046009	Organización Popular De Vivienda Anamariel	K12+269,01	K12+318,40	$ 3.691.000
007D-T1-VC	110012031007	Juzgado 007 civil del circuito	K12+269,01	K12+318,40	$ 81.258

Firma

Nombre: Conrado Hernando Lopera Palacio
Director de Proyecto
Matrícula Profesional No: 0520280830ANT

Firma

Nombre: DAVID JOSE SUAREZ MOGOLLON
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No: 22202124456COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL GESTIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-9
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	27/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

PRE ACTA PREDIAL No: 33
PERIODO - MES: mar-25
FECHA ELABORACION: 27/03/2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): II_III y VC
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022

PLAZO ACUMULADO: 33
FECHA DE SUSPENSION:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2028
VALOR ADICIÓN No: N.A
VALOR TOTAL ADICIONES: N.A

2. DESCRIPCION

No. Predio	Propietario											ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS		ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL							ENAJENACIÓN VOLUNTARIA									TRAMITES ADICIONALES PARA EL INICIO DE LA EXPROPIACIÓN JUDICIAL					COMPRA DE MEJORAS				RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO
		26. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO	27. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL: COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO POR RESOLUCIÓN 898 DE 2014	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR LA FICHA PREDIAL	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	30. ELABORACIÓN DE PLANO Y FICHA PREDIAL PARA MEJORA	31. MODIFICAR Y ACTUALIZAR SIN TRABAJO DE CAMPO	32. ELABORAR FICHA PREDIAL SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INMUEBLE	35. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE TITULOS PARA MEJORAS	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA	38. CON PROPIEDAD DE TERRENO	39. PROPIEDAD DE TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES (RES. 2684/2015)	41. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	40. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAQR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO	42. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV.	43. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON	44. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON	45. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	46. INSCRIPCIÓN DE OFERTA	47. PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA (TITULAR INSCRITO)	48. ELABORACIÓN - LEGALIZACIÓN PROMESA COMPRA	49. TRÁMITE DE PRIMER PAGO	50. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	51. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA A FAVOR DE INVIAS	52. TRÁMITE DE PAGO FINAL	53. RADICACIÓN DE LA SOLICITUD ANTE IGAC	54. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN	55. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	56. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	57. PRESENTACIÓN DE DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD DE ENTREGA ANTICIPADA	58. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	59. NOTIFICACIÓN PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	60. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	61. ENTREGA DEL PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPRAVENTA	62. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	63. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN
003D-M85-T1-VC	GLADYS ESTHER LASTRA PARDO		24						24						25						28																		
005D-M85-T1-VC	NELVIS ROSA MEJIA MORENO		24						24						25						28																		
007D-M85-T1-VC	CENUDITH MARIA PEÑA GARCIA		24						24						25						28																		
009 D-M85-T1-VC	MARITZA ISABEL GUILLOT FONTALVO		24						24						25						28																		
011 D-M85-T1-VC	MARIA EUGENIA MARQUEZ NIETO		24						24						25						28																		
011AD-M85-T1-VC	YESENIA DEL CARMEN CANTILLO DIAZ					24					24					25																			26	28	29	29	
012AD-M85-T1-VC	MARIA DONELIA CASTRO ACEVEDO					24					24					25																			26	28	29	29	
012D-M85-T1-VC	KATERIN JULISA CANTILLO AMAYA		24						24						25						28																		
013 D-M85-T1-VC	ELKIN JOSE GOMEZ CASTRO			31		24				32	24					25																							
013AD-M85-T1-VC	JADER ENRIQUE CANTILLO JIMENEZ					24	31			32	24					25																			26				
014 D-M85-T1-VC	MARIA DONELIA CASTRO ACEVEDO		24						24						25						28																		
014AD-M85-T1-VC	AURIS STELLA AMAYA BARCELO					24					24					25																			26	28	29	29	
015 D-M85-T1-VC	MARIA DONELIA CASTRO ACEVEDO		24						24						25						28																		
015AD-M85-T1-VC	SERGIO JAVIER ROSALES CANTILLO					24					24					25																			27	28	29	29	
016AD-M85-T1-VC	ELOISA ESTHER MARZAL ANCHILA					24	29				33																												
016D-M85-T1-VC	MARINA ESTELA CHARRIS FIGUEROA		24																																				
019D-M85-T1-VC	GRISELDA ROSA MEJIA SERNA		24						24						25						28																		
071AI-SR-T1-VC	BEATRIZ ELENA SANTOS SIERRA					24					25					26																			26	28	29	29	
001D-M17-T1-VC	HILDA ROSA CANDANOZA SOTO		27						29						31						32																		
002D-M17-T1-VC	JORGE LUIS CANDANOZA SOTO		24	24					24	24					25						26	26		27	27	31													
004AI-M17-T1-VC	UFANIA MERCEDES PARDO MELENDEZ					24					26					26																			28	29	30	30	
010D-M85-T1-VC	OLGA TORRES DE ROBLES Y FELIPE JOSE ROBLES CAMARGO		24	29					24	31					25		31				32																		
017AD-M85-T1-VC	SIRLEY PATRICIA JIMENEZ BARRIOS					24					24					25																			26	28	29	29	
069AI-SR-T1-VC	ERIKA PATRICIA PINTO ROJAS					24					25					26																			26	28	29	29	
070AI-SR-T1-VC	BEATRIZ MARIA FORNARIS LLANOS					24					25					26																			26	28	29	29	
072AI-SR-T1-VC	MIRYAM ESTHER SARMIENTO DURAN					24					25					26																			26	28	29	29	
073AI-SR-T1-VC	ISOLINA MARIA DURAN GUERRERO					24					25					26																			26	28	29	29	
074AI-SR-T1-VC	ALIX MERCEDES LEYVA GRANADOS					24					25					26																			26	28	29	29	
075AI-SR-T1-VC	JOSÉ FRANCISCO LOPEZ MARTINEZ					24					25					26																			26	28	29	29	
076AI-SR-T1-VC	OLGA ESTHER MIRANDA DE GARCIA					24					25					26																			27	29	29	29	
077AI-SR-T1-VC	ERIKA BEATRIZ AREVALO FORNARIS					24					25					26																			26	28	29	29	
078AI-SR-T1-VC	GREGORIA MARIA PINEDA CABANA					24					25					26																			27	29	29	29	
079AI-SR-T1-VC	YEIDER JOSE MACHADO FONTALVO					24					25					26																			27	29	29	29	
082AI-SR-T1-VC	MARY LUZ OJEDA HERNANDEZ					24					25					26																			26	28	29	29	
086AI-SR-T1-VC	HERNAN DANIEL SANTOYO ASSIS					24					25					26																			28	29	29	29	
001AI-M77-T1-VC	MAGALIS ESTHER RAMIREZ OROZCO			29		24				31	24					25	31				32	32																	
002AI-M77-T1-VC	CARLOS ALFONSO RAMIREZ OROZCO			29		24				31	24					25																							
002I-M83-T1-VC	MARINA ESTELA CHARRIS DE FIGUEROA					24					24					25																			26	28	29	29	
003AI-M77-T1-VC	MARLENIS MARIA RAMIREZ OROZCO			29		24				31	24					25																							
004AI-M77-T1-VC	FRANCISCA ISABEL OROZCO OJITO			29		24				31	24					25	31				32	32																	
005AI-M77-T1-VC	FERNANDO JOSE AMORTEGUI NUÑEZ					24					27					29																			31	31	31	31	
006AI-M77-T1-VC	RUTH OROZCO OJITO		24						27						30						32																		
007AI-M77-T1-VC	JENNIFER CAROLINA AMORTEGUI NUÑEZ					24					27					29																			31	31	31	31	
008AI-M77-T1-VC	YAZMIN DEL SOCORRO MARTINEZ SALAS					24					25					26																			27	29	29	29	
009AD-M77-T1-VC	ROBINSON MANUEL GUTIERREZ BALLESTEROS					24					24					25																			26				
010AI-M77-T1-VC	OSMELI ANTONIO ANDRADES CASTRO					24					25					26																			27	29	30	30	
060AD-SR-T1-VC	GLADY MERCEDES GRANADOS MORENO					24					25					26																			27	29	29	29	
061AD-SR-T1-VC	SANDRI PAOLA FONTALVO CORRO					24					29					30																			32				
062AD-SR-T1-VC	MARIA REGINA SUAREZ VARGAS					24					29					30																			32				
063AD-SR-T1-VC	DARLENIS JUDITH CAMARGO CAMARGO					24					29					30																			32				
065AD-SR-T1-VC	VICTOR CARLOS ANDRADES VALVERDE					24					25					26																			27	31	31	31	30
087AD-SR-T1-VC	JONH EDUAR HERNANDEZ OROZCO					24					25					26																			27	31	31	31	
088AD-SR-T1-VC	SANDRY JULIETH CORRO SUAREZ					24					25					26																			27	29	29	29	
001AI-M83-T1-VC	ELVIRA ROSA GARIZABALO FELIPE					25					29					31																							
012AD-M77-T1-VC	BLEIDIS SOFIA GARIZABALO RODRIGUEZ					25					29					31																			32				
011AI-M77-T1-VC	ELVIRA ROSA GARIZABALO FELIPE					25					26					28																			31				
010AD-M85-T1-VC	LUISA FERNANDA MEJIA MORENO					25					29					30																			33				
081AD-SR-T1-VC	JANFRAN JOSE PAREJO SAN JUAN					25					29								30																32				
002D-M78-T1-VC	NICOL CAROLINA MARTINEZ MEJIA		30						32																														
004D-M78-T1-VC	ALVARO JOSE MARTINEZ MELENDEZ		30																																				
007AD-M85-T1-VC	NURIS MERCEDES OROZCO DE EVENDAÑO		30																																				
004AD-M85-T1-VC	KAREN PAOLA CANTILLO FERNANDEZ Y OTRA					25					29					31																							
005AD-M78-T1-VC	JADER MANUEL ROBLES AVILES					25					29					30																			32				
002AD-M78-T1-VC	VICTOR MANUEL ROBLES TORRES			30		25			33																														
001AD-M78-T1-VC	ALFREDO JESUS VALVERDE MANGAS					25					31					32																							
067AD-SR-T1-VC	OSVALDO VALDEMAR SANCHEZ GUTIERREZ					25					29								28																31	31	31	31	
002I-M77-T1-VC	EDWIN ALBAN LOPEZ		31						32																														
008AD-M85-T1-VC	ELIAS SEGUNDO FELIPE ESCORCIA Y OTRO		31						32																														
001D-M78-T1-VC	ANA CECILIA CORRO GONZALEZ Y ANA MARCEDES GONZALEZ ACOSTA		31																																				
080AI-SR-T1-VC	DIOSELINA CAMARGO Y OTRAS					31																																	
011AD-M17-T1-VC	JOSE BENITO CASTRO CAMACHO					31																																	
064AD-SR-T1-VC	NANCY CECILIA VALVERDE PEREZ					31					32																												
066AD-SR-T1-VC	JIMMY GARIZABALO ARIZA					31					32																												
002D-M85-T1-VC	NESTOR CARLOS HENRIQUEZ DAVILA		32																																				
005AD-M85-T1-VC	ROSA ISABEL DIAZ PASCUALES		32																																				
006AD-M85-T1-VC	ANA DOLORES PADILLA DE AYALA		32																																				
006D-M85-T1-VC	ROCIO DEL CARMEN MEJÍA MORENO		32																																				
004D-M85-T1-VC	UBALDO CESAR HEREIRA SANDOVAL - ABIGAIL MANJARRES DE RICAURTE		32																																				
008D-M85-T1-VC	LIDA JUDICTH CHARRIS MORENO		32																																				
015D-T2-VC	GRASAS Y DERIVADOS S.A - S.A																				32	32																	
005ACI-T2-VC	MUNICIPIO DE CIENAGA		Preacta N. 54 - Cto 1200/16						Preacta N. 54 - Cto 1200/16					Preacta N. 55 - Cto 1200/16							Preacta N. 82 - Cto 1200/16	Preacta N. 82 - Cto 1200/16								Preacta N. 84 Cto 1200/16			33						
005ADI-T2-VC	MUNICIPIO DE CIENAGA		Preacta N. 54 - Cto 1200/16						Preacta N. 54 - Cto 1200/16					Preacta N. 55 - Cto 1200/16							Preacta N. 82 - Cto 1200/16	Preacta N. 84 - Cto 1200/16								Preacta N. 84 Cto 1200/16			33						
007D-T1-VC	ORGANIZACIÓN POPULAR DE VIVIENDA ANAMARIEL		Preacta N. 80 - Cto 1200/16						Preacta N. 80 - Cto 1200/16					Preacta N. 80 - Cto 1200/16							Preacta N. 84 - Cto 1200/16	Preacta N. 84 - Cto 1200/16								Preacta N. 84 Cto 1200/16			33						
001D-H(II_III)-CPPV)	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		31																																				
TOTAL		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
Preacta gestión y adquisición No 1 julio de 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 2 agosto de 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 3 septiembre de 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 4 octubre de 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 5 noviembre de 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 6 diciembre de 2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 7 enero de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 8 febrero de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 9 marzo de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 10 abril de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 11 mayo de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 12 junio de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 13 julio de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 14 agosto de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 15 septiembre de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 16 octubre de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 17 noviembre de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 18 diciembre de 2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 19 enero de 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 20 febrero de 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 21 marzo de 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 22 abril de 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 23 mayo de 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 24 junio de 2024		0	13	1	0	39	0	0	11	1	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 25 julio de 2024		0	0	0	0	10	0	0	0	0	19	0	0	0	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 26 agosto de 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	20	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 27 septiembre de 2024		0	1	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 28 octubre de 2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	15	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 29 noviembre de 2024		0	0	5	0	0	1	0	1	0	10	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	22	22	0
Preacta gestión y adquisición No 30 diciembre de 2024		0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1
Preacta gestión y adquisición No 31 enero de 2025		0	4	1	0	4	1	0	0	5	1	0	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	5	5	0
Preacta gestión y adquisición No 32 febrero de 2025		0	6	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Preacta gestión y adquisición No 33 marzo de 2025		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
TOTAL ACUMULADO A LA PRESENTE ACTA		**0**	**27**	**8**	**0**	**53**	**2**	**0**	**17**	**8**	**50**	**0**	**0**	**0**	**13**	**45**	**3**	**0**	**2**	**0**	**16**	**4**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**39**	**30**	**29**	**29**	**1**

Firma
Nombre: Conrado Hernando Lopera Palacio
Director de Proyecto
Matricula Profesional No: 0520280830ANT

Firma
Nombre: DAVID JOSE SUAREZ MOGOLLON
Profesional Predial Interventor
Matricula Profesional No: 22202124456COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL DE GESTION Y ADQUISICIÓN PREDIAL

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-10
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES
DIRECCIÓN TERRITORAL: MAGDALENA

Pre-acta Predial No. 33
PERIODO - MES: FEBRERO
FECHA ELABORACION: 27/03/2025

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN
CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): II_III y VC
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 981 DE 2022

PLAZO ACUMULADO: 33
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/07/2028
VALOR ADICIÓN No 1: N.A
VALOR TOTAL ADICIONES: N.A

2. DESCRIPCION

COMPROBANTE DE PAGO	FECHA COMPROBANTE	FICHA PREDIAL	ÁREA ADQUIRIDA	MEJORA, CULTIVOS Y/O ESPECIES (SI/NO)	ABS. INICIAL	ABS. FINAL	No. MATRICULA INMOBILIARIA PREDIO MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	MATRICULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVIAS	NUMERO DOCUMENTO BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	BENEFICIARIO Y/O TRADENTE	FECHA AVALÚO	VALOR AVALÚO	VALOR ADQUISICIÓN PREDIAL NO.		DESCRIPCION DEL PAGO (PORCENTAJE DE FORMA DE PAGO)
														VALOR PAGO	SALDO POR PAGAR	
1015023	13/03/2025	002I-M93-T1-VC	246,92M2	NO	K10+633,14	K10+661,55	222-43438	NA	NA	891780043-5	Municipio De Ciénaga	12/08/2022	$ 22.692.000,00	$ 4.817.542,00	$ -	Indexación dentro del proceso de expropiación.
1015027	13/03/2025	004I-T2-VC	7.530,15 M2	SI	K11+898,02	K12+015,63	222-42896	NA	NA	891780043-5	Municipio De Ciénaga	17/07/2020	$ 8.460.000,00	$ 3.234.793,00	$ -	Indexación dentro del proceso de expropiación.
1013841	13/03/2025	005ACI-T2-VC	36,11 M2	NO	K 12+038,86	K 12+039,18	222-40134	NA	NA	891780043-5	Municipio De Ciénaga	03/07/2023	$ 32.700,00	$ 32.700,00	$ -	Admisión de demanda (deposito judicial - avalúo)
1013646	13/03/2025	005ADI-T2-VC	8,85 M2	NO	K 12+026,99	K 12+032,67	222-40133	NA	NA	891780043-5	Municipio De Ciénaga	03/07/2023	$ 8.100,00	$ 8.100,00	$ -	Admisión de demanda (deposito judicial - avalúo)
1015014	13/03/2025	007D-T1-VC	3263,42 M2	SI	K12+269,01	K12+318,40	222-47219	NA	NA	8190046009	Organización Popular De Vivienda Anamariel	09/08/2023	$ 3.691.000,00	$ 3.691.000,00	$ -	Admisión de demanda (deposito judicial - avalúo)
1015014	13/03/2025	007D-T1-VC	3263,42 M2	SI	K12+269,01	K12+318,40	222-47219	NA	NA	110012031007	Juzgado 007 civil del circuito	09/08/2023	N.A.	$ 81.258,00	$ -	comisión mas IVA de cla comisión del (deposito judicial - avalúo)
													TOTAL	$ 11.865.393	$ -	

NOTA:

Firma
Nombre: Conrado Hernando Lopera Palacio
Director de Proyecto
Matrícula Profesional No:: 0520280830ANT

Firma
Nombre : DAVID JOSE SUAREZ MOGOLLON
Profesional Predial Interventor
Matrícula Profesional No:10889822202124456COR

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES		2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	MAGDALENA
3. AÑO: 2025	MES 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: TRANSVERSAL DEL CARIBE RUTA 9007		TRAMO: VIADUCTOS HITOS II-III VARIANTE CIENAGA
6. CONTRATO DE OBRA No:	981 DE 2022		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO	NIT	901.581.159-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	977 DE 2022		

11. PLAZO INICIAL:	72,1 MESES	12. FECHA DE INICIO:	27/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	33	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2028
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	11.432.477.132

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	10.301.316.086
21. VR. ANTICIPO:		
22. VR. ADICIÓN No:1	$	1.131.161.046
23. VR. ADICIÓN No:	N/A	
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	1.131.161.046,00
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	**$**	**11.432.477.132**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		**CANTIDAD**	**V/R UNIDAD.**	**TOTAL**
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	**26.** ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	$ 1.421.500	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	$ 2.842.500	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	$ 1.066.000	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	$ 355.500	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	$ 1.095.000	0
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, SIN NECESIDAD DE REALIZAR TRABAJO DE CAMPO	0	$ 821.500	0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	$ 273.500	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	**33.** ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	1	$ 769.000	769.000
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	$ 384.500	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	1	$ 384.500	384.500
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	**36.** SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	$ 326.500	0
	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	$ 221.500	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	**38.** ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	$ 1.366.000	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	$ 2.732.500	0
	40. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAQR EL AVALÚO COMERCIAL POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO	0	$ 683.000	0
	41. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	$ 877.000	0
	42. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV.	0	$ 438.500	0
	43. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS: CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y/O ESPECIES, SIN TERRENO PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV.	0	$ 653.000	0
	44. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR EL AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS POR RAZONES INHERENTES AL PROYECTO, PARA AVALÚOS CON VALORES ENTRE 0 HASTA 1.9 SMMLV.	0	$ 326.500	0
ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	**45.** OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	$ 353.500	0
	46. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	$ 235.500	0
	47. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	$ 353.500	0
	48. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	$ 235.500	0
	49. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 118.000	0
	50. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL PREDIO	0	$ 118.000	0
	51. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	$ 471.000	0
	52. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 235.500	0
	53. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	$ 235.500	0
TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	**54.** ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	$ 327.500	0
	55. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 327.500	0
	56. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	$ 109.000	0
	57. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	3	$ 763.500	2.290.500
	58. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	$ 654.500	0
COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	**59.** PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	1	$ 153.000	153.000
	60. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	$ 306.000	0
	61. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	$ 153.000	0
	62.TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	$ 153.000	0
RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	**63.** TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	$ 652.500	0
DIAGNOSTICO PREDIAL E INFORME DEL SECTOR	PRE DIAGNOSTICO PREDIAL POR KILOMETRO	0	$ 4.740.500	0
	INFORME GENERAL SECTOR URBANO-VALOR CADA 500 METROS	0	$ 2.508.000	0
	INFORME GENERAL SECTOR RURAL VALOR PRIMEROS 10 KM, VALOR ADICIONAL KM $979.000	0	$ 1.631.500	0
		0	$ 979.000	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61		6		3.597.000
IVA(19%)				683.430
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL				**4.280.430**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES		2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	MAGDALENA
3. AÑO: 2025	MES 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: TRANSVERSAL DEL CARIBE RUTA 9007		TRAMO: VIADUCTOS HITOS II-III VARIANTE CIENAGA
6. CONTRATO DE OBRA No:	981 DE 2022		
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO	NIT	901.581.159-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	977 DE 2022		

11. PLAZO INICIAL:	72,1 MESES	12. FECHA DE INICIO:	27/07/2022	13. FECHA DE REANUDACIÓN:	N/A
14. PLAZO ACUMULADO:	33	15. FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	16. FECHA DE VENCIMIENTO:	31/07/2028
17. TIPO DE GESTIÓN:	PREDIAL	18. VR. DE LA GESTIÓN:		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:	11.432.477.132

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

FICHA PREDIAL No.	Predio: P Mejora: M	TRADENTE (EN CASO DE TENER VARIOS PROPIETARIOS SEPARE CON / ASI: PEPITO PEREZ/PEPITA LUGO/……)	NUM DOC TRADENTE	MATRÍCULA INMOBILIARIA MATRIZ	ESCRITURA (E: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad) PROMESA VENTA (CV: Numero-Fecha-Notaria-Ciudad)	No. MATRÍCULA INMOBILIARIA A NOMBRE DE INVÍAS	VALOR AVALÚO TERRENO	PAGO(S) ACUMULADO(S) DEL TERRENO	VALOR TOTAL AVALÚO	VALOR PAGADO CON ESTA PRE-ACTA(SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO DEL TERRENO
002I-M93-T1-VC	P	Municipio De Ciénaga	891780043-5	222-43438	N/A	N/A	$ 22.692.000,00	$ 22.692.000,00	$ 22.692.000	$ 4.817.542	indexación - orden judicial
004I-T2-VC	P	Municipio De Ciénaga	891780043-6	222-42896	N/A	N/A	$ 8.460.000,00	$ 8.460.000,00	$ 8.460.000	$ 3.234.793	indexación - orden judicial
005ACI-T2-VC	P	Municipio De Ciénaga	891780043-7	222-40134	N/A	N/A	$ 32.700,00	$ 32.700,00	$ 32.700	$ 32.700	deposito judicial
005ADI-T2-VC	P	Municipio De Ciénaga	891780043-8	222-40133	N/A	N/A	$ 8.100,00	$ 8.100,00	$ 8.100	$ 8.100	deposito judicial
007D-T1-VC	P	Organización Popular De Vivienda Anamariel	8190046009	222-47219	N/A	N/A	$ 3.691.000,00	$ 3.691.000,00	$ 3.691.000	$ 3.691.000	deposito judicial
007D-T1-VC	P	Organización Popular De Vivienda Anamariel	8190046009	222-47219	N/A	N/A	N.A.	N.A.	N.A	$ 81.258	comisión mas el IVA de la comisión cobrado al (deposito judicial del avalúo)

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	**$ 11.865.393,00**
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	$ 11.865.393
64. OTROS(Administración 2.5%)	$ 296.635
65. IVA (sobre administración 19%)	$ 56.361
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	**$ 12.218.389**

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	$ 15.462.393
68. ADMIN + IVA PRESENTE PREACTA	$ 1.036.426
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	**$ 16.498.819**
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	**$ 4.280.430**

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PREDIALES	$ 3.071.897.004
72. GESTIÓN PREDIAL	$ 3.597.000
73. DESEMBOLSOS PREDIALES	$ 11.865.393
74. OTROS	$ 296.635
75. IVA	$ 739.791
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 3.088.395.823
77. SALDO POR EJECUTAR	**$ 8.344.081.309**

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA		FIRMA DEL INTERVENTOR	
NOMBRES Y APELLIDOS:	**ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO**	NOMBRES Y APELLIDOS:	**FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR**
C.C. X C.E. __	NUMERO 43.099.356	C.C. X C.E. __	NUMERO 19.072.460
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 0520230613 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO 0000014772 CND
Representante Legal X	Apoderado	Representante Legal X	Apoderado

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero ($0) pesos.

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL **ANEXO No. 1 - CONTROL ANTICIPO ADQUISICION PREDIAL**	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

1.UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES	2. DIRECCIÓN TERRITORAL:	MAGDALENA
3. AÑO: 2025	MES: 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
5. LOCALIZACIÓN:	RUTA: TRANSVERSAL DEL CARIBE RUTA 9007		TRAMO: VIADUCTOS HITOS II-III
6. CONTRATO DE OBRA No:	981 DE 2022		VARIANTE CIENAGA
7. OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLANTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		
8. CONTRATISTA:	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	NIT	901.588.183-1
9. INTERVENTOR:	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO	NIT	901.581.159-2
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	977 DE 2022		

II. INFORMACION FINANCIERA

20. VR. INICIAL (INCLUIDO IVA):	$	**630.007.748.262**
21.1 VR. ANTICIPO TOTAL:	$	**30.000.000.000**
21.2 VR. ANTICIPO OBRA:	$	**23.430.829.353**
21.3 VR. ANTICIPO ADQUISICION PREDIAL:	$	**5.649.122.900**
22. VR. ADICIÓN No: 1	$	**5.109.000.000**
23. VR. ADICIÓN No:	$	**-**
24. VR. TOTAL ADICIONES:	$	**5.109.000.000**
25. VR. TOTAL ACUMULADO:	$	**635.116.748.262**

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN

1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B)		**TOTAL**
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61	$	**3.597.000**
IVA	$	**683.430**
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL	$	**4.280.430**

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)		**TOTAL**
62.1 SUBTOTAL BOLETA FISCAL (2)		
62.2 SUBTOTAL DERECHOS NOTARIALES Y DE REGISTRO	$	**-**
62.3 SUBTOTAL PAGOS PREDIALES A TRAVES DE FIDUCIA MERCANTIL(2)	$	**-**
62.4 SUBTOTAL PAGOS PREDIALES A TRAVES DE RECURSOS CONTRATISTA(2)	$	**-**
65. IVA	$	**-**
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	$	**-**
VR. TOTAL PRESENTE ACTA	$	**4.280.430**

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS ACUMULADOS

73.1 DESEMBOLSOS PREDIALES TOTALES	$	**5.649.122.900**
73.2 DESEMBOLSOS PREDIALES POR ANTICIPO	$	**5.649.122.900**
73.3 DESEMBOLSOS PREDIALES RECURSOS CONTRATISTA	$	**5.649.122.900**
77. SALDO POR EJECUTAR DE BOLSA PREDIAL (DEL ANTICIPO)	$	**-**

RESUMEN VALORES A LLEVAR A ACTA PARCIAL DE OBRA MEPI-MN1-IN4-FR1

CONCEPTO		VALOR ADQUISICION PREDIAL	%
78, VALOR ANTICIPO OTORGADO	$	5.649.122.900	100
79, VALOR AMORTIZADO/REINTEGRADO PRESENTA ACTA	$	-	0,000
80, VALOR AMORTIZADO/REINTEGRADO ACUMULADO	$	2.673.471.340	47,325
81, VALOR SALDO POR AMORTIZAR/REINTEGRAR	$	2.975.651.560	52,675

OBSERVACIONES: Conforme a la modificación/actualización del PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.5 con fecha de 1 de marzo de 2025, se ajusta el valor del anticipo en el presente formato por valor de $5.649.122.900. Para el presente pre-acta no se reportan gastos de adquisición, para la amortización del anticipo, se presenta el anexo con el proposito de reportar la novedad que hacen referencia a los valores actualizados del anticipo asignado para el componente predial.

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA			FIRMA DEL INTERVENTOR		
NOMBRES Y APELLIDOS	**ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO**		NOMBRES Y APELLIDOS	FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR	
C.C. X C.E.	NUMERO	43.099.356	C.C. X C.E.	NUMERO	19.072.460
MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	0520230613 ANT	MATRICULA PROFESIONAL	NUMERO	0000014772 CND
Representante Legal [X]		Apoderado [ ]	Representante Legal [X]		Apoderado [ ]

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. **El número del presente Anexo a la preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de adquisición predial susceptibles de reintego, no se deberá tramitar el presente Anexo**

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Marzo de 2025.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-240100B-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458	$ 18.159.788.747
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2024	1248624	C-2401-0600-91-51102D-2401024-02	20	PROPIO	ADICION Nº1	$ 5.000.000.000	$ 1.066.380.852
2024	1248824	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	ADICION Nº1	$ 109.000.000	$ 109.000.000
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 82.866.666.666	$ 82.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 211.200.000.000	$ 211.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
			TOTAL			**$ 635.116.748.262**	**$ 506.875.811.573**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 635.116.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										$ 60.607.748.262,00					
1	Obra	27 a 31 Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
2	Obra	Agosto de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
3	Obra	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
4	Obra	Octubre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
1D	Ajuste	27 a 31 Julio de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
2D	Ajuste	Agosto de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
3D	Ajuste	Septiembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
5	Obra	Noviembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 60.607.748.262,00	$ 635.116.748.262,00				
5	EyD	Noviembre de 2022	$ 1.115.211.000,00	$ 211.890.090,00	$ 1.327.101.090,00	$ -	$ 1.327.101.090,00	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 633.789.647.172,00	138755 - 17/12/2023	x		Factura CVCM-3
4D	Ajuste	Octubre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 633.789.647.172,00				
5P	Ajuste	Noviembre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 633.789.647.172,00				
6	Obra	Diciembre de 2022	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 59.280.647.172,00	$ 633.789.647.172,00				
6	EyD	Diciembre de 2022	$ 1.260.596.750,00	$ 239.513.383,00	$ 1.500.110.133,00	$ -	$ 1.500.110.133,00	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 632.289.537.039,00	140557 - 20/12/2023	x		Factura CVCM-4
6P	Ajuste	Diciembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 632.289.537.039,00				
5D	Ajuste	Noviembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 632.289.537.039,00				
6D	Ajuste	Diciembre de 2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 632.289.537.039,00				
7	Obra	Enero de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.780.537.039,00	$ 632.289.537.039,00				
7	EyD	Enero de 2023	$ 190.290.750,00	$ 36.155.243,00	$ 226.445.993,00	$ -	$ 226.445.993,00	$ -	617522	$ 57.554.091.046,00	$ 632.063.091.046,00	22414 - 08/03/2023	x		Factura CVCM-5
8	Obra	Febrero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.554.091.046,00	$ 632.063.091.046,00				
8	EyD	Febrero de 2023	$ 281.531.400,00	$ 53.490.966,00	$ 335.022.366,00	$ -	$ 335.022.366,00	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 631.728.068.680,00	31462 - 30/03/2023	x		Factura CVCM-6
7D	Ajuste	Enero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 631.728.068.680,00				
9	Obra	Marzo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 57.219.068.680,00	$ 631.728.068.680,00				
9	EyD	Marzo de 2023	$ 300.493.512,00	$ 57.093.767,00	$ 357.587.279,00	$ -	$ 357.587.279,00	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 631.370.481.401,00	42259 - 28/04/2023	x		Factura CVCM-7
8D	Ajuste	Febrero de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 631.370.481.401,00				
10	Obra	Abril de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.861.481.401,00	$ 631.370.481.401,00				
10	EyD	Abril de 2023	$ 316.332.425,00	$ 60.103.161,00	$ 376.435.586,00	$ -	$ 376.435.586,00	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 630.994.045.815,00	52188 - 26/05/2023	x		Factura CVCM-8
9D	Ajuste	Marzo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 630.994.045.815,00				
11	Obra	Mayo de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.485.045.815,00	$ 630.994.045.815,00				
11	EyD	Mayo de 2023	$ 184.350.650,00	$ 35.026.624,00	$ 219.377.274,00	$ -	$ 219.377.274,00	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 630.774.668.541,00	64357 - 04/07/2023	x		Factura CVCM-9
10D	Ajuste	Abril de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 630.774.668.541,00				
12	Obra	Junio de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.265.668.541,00	$ 630.774.668.541,00				
12	EyD	Junio de 2023	$ 164.270.025,00	$ 31.211.305,00	$ 195.481.330,00	$ -	$ 195.481.330,00	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 630.579.187.211,00	73262 - 28/07/2023	x		Factura CVCM-10
11D	Ajuste	Mayo de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 630.579.187.211,00				
12D	Ajuste	Junio de 2023	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 56.070.187.211,00	$ 630.579.187.211,00				
13	Obra	Julio de 2023	$ 1.468.535.700,00	$ 10.731.607,00	$ 1.479.267.307,00	$ -	$ 1.479.267.307,00	$ -	617522	$ 54.590.919.904,00	$ 629.099.919.904,00	80528 - 23/08/2023	x		Factura CVCM-12
13P	Ajuste	Julio de 2023	$ 225.713.937,00	$ 1.649.448,00	$ 227.363.385,00	$ -	$ 227.363.385,00	$ -	617522	$ 54.363.556.519,00	$ 628.872.556.519,00	80529 -23/08/2023	x		Factura CVCM-11
13D	Ajuste	Julio de 2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	617522	$ 54.363.556.519,00	$ 628.872.556.519,00				
14	Obra	Agosto de 2023	$ 6.108.750.000,00	$ 44.640.865,00	$ 6.153.390.865,00	$ -	$ 6.153.390.865,00	$ -	617522	$ 48.210.165.654,00	$ 622.719.165.654,00	81973 - 21/09/2023	x		Factura CVCM-14

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Marzo de 2025.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-240100B-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458	$ 18.159.788.747
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2024	1248624	C-2401-0600-91-51102D-2401024-02	20	PROPIO	ADICION Nº1	$ 5.000.000.000	$ 1.066.380.852
2024	1248824	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	ADICION Nº1	$ 109.000.000	$ 109.000.000
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 82.866.666.666	$ 82.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 211.200.000.000	$ 211.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
TOTAL						**$ 635.116.748.262**	**$ 506.875.811.573**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 635.116.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
14	EyD	Agosto de 2023	$ 94.048.750,00	$ 17.869.263,00	$ 111.918.013,00	$ -	$ 111.918.013,00	$ -	617522	$ 48.098.247.641,00	$ 622.607.247.641,00	81973 - 21/09/2023	x		Factura CVCM-14
14P	Ajuste	Agosto de 2023	$ 938.914.875,00	$ 6.861.301,00	$ 945.776.176,00	$ -	$ 945.776.176,00	$ -	617522	$ 47.152.471.465,00	$ 621.661.471.465,00	81820 - 18/09/2023	x		Factura CVCM-13
14D	Ajuste	Agosto de 2023	-$ 29.627.437,00	-$ 216.508,00	-$ 29.843.945,00	$ -	-$ 29.843.945,00	$ -	617522	$ 47.182.315.410,00	$ 621.691.315.410,00	83637 - 25/10/2023	x		Factura CVCM-17
15	Obra	Septiembre de 2023	$ 7.777.165.996,32	$ 56.833.136,00	$ 7.833.999.132,00	$ -	$ 7.833.999.132,00	$ -	617522	$ 39.348.316.278,00	$ 613.857.316.278,00	83774 - 27/10/2023	x		Factura CVCM-18
15P	Ajuste	Septiembre de 2023	$ 1.211.402.309,00	$ 8.852.555,00	$ 1.220.254.864,00	$ -	$ 1.220.254.864,00	$ -	617522	$ 38.128.061.414,00	$ 612.637.061.414,00	83637 - 25/10/2023	x		Factura CVCM-17
15D	Ajuste	Septiembre de 2023	-$ 1.903.367,00	-$ 13.909,00	-$ 1.917.276,00	$ -	-$ 1.917.276,00	$ -	617522	$ 38.129.978.690,00	$ 612.638.978.690,00	23/11/2023	x		Factura CVCM-20
	Anticipo	**Octubre de 2023**			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 20.000.000.000,00**	**617522**	**$ 18.129.978.690,00**	**$ 612.638.978.690,00**				
16	Obra	Octubre de 2023	$ 7.982.833.581,00	$ 58.336.092,00	$ 8.041.169.673,00	$ 272.214.625,00	$ 7.768.955.048,00	$ 19.727.785.375,00	617522	$ 10.361.023.642,00	$ 604.597.809.017,00	23/11/2023	x		Factura CVCM-19
16P	Ajuste	Octubre de 2023	$ 1.203.743.700,00	$ 8.796.589,00	$ 1.212.540.289,00	$ -	$ 1.212.540.289,00	$ 19.727.785.375,00	617522	$ 9.148.483.353,00	$ 603.385.268.728,00	23/11/2023	x		Factura CVCM-20
17	Obra	Noviembre de 2023	$ 9.400.340.158,68	$ 68.694.793,00	$ 9.469.034.952,00	$ 320.551.599,00	$ 9.148.483.353,00	$ 19.407.233.776,00	617522		$ 593.916.233.776,00	87047 - 07/12/2023	x		Factura CVCM-23
								$ 19.407.233.776,00		**Saldo Registro Presupuestal No. 104023 De (03/02/2023)**					
					$ -		$ -	$ 19.407.233.776,00		**$ 48.666.666.667,00**	$ 593.916.233.776,00				
17	Obra	Noviembre de 2023	$ 4.593.158.044,32	$ 33.565.386,00	$ 4.626.723.430,32	$ 156.626.689,00	$ 4.470.096.741,32	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 44.196.569.925,68	$ 589.289.510.345,68	87047 - 07/12/2023	x		Factura CVCM-23
16D	Ajuste	Octubre de 2023	-$ 26.617.205,00	-$ 194.510,00	-$ 26.811.715,00		-$ 26.811.715,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 44.223.381.640,68	$ 589.316.322.060,68	87370- 11/12/2023	x		Factura CVCM-24
17P	Ajuste	Noviembre de 2023	$ 2.053.207.181,00	$ 15.004.206,00	$ 2.068.211.387,00		$ 2.068.211.387,00	$ 19.250.607.087,00	104023	$ 42.155.170.253,68	$ 587.248.110.673,68	87370- 11/12/2023	x		Factura CVCM-24
18	Obra	Diciembre de 2023	$ 2.075.555.389,00	$ 15.167.520,00	$ 2.090.722.909,00	$ 70.776.439,00	$ 2.019.946.470,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 40.135.223.783,68	$ 585.157.387.764,68	87788 - 13/12/2023	x		Factura CVCM-26
18P	Ajuste	Diciembre de 2023	$ 328.016.331,00	$ 2.397.042,00	$ 330.413.373,00		$ 330.413.373,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.804.810.410,68	$ 584.826.974.391,68	87796 - 13/12/2023	x		Factura CVCM-27
17D	Ajuste	Noviembre de 2023	$ 19.471.427,00	$ 142.291,00	$ 19.613.718,00		$ 19.613.718,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.785.196.692,68	$ 584.807.360.673,68	1256- 11/03/2023	x		Factura CVCM-28
18D	Ajuste	Diciembre de 2023	$ 12.686.186,00	$ 92.707,00	$ 12.778.893,00		$ 12.778.893,00	$ 19.179.830.648,00	104023	$ 39.772.417.799,68	$ 584.794.581.780,68	1257- 11/03/2023	x		Factura CVCM-29
19	Obra	Enero de 2024	$ 1.363.907.123,00	$ 9.967.014,00	$ 1.373.874.137,00	$ 46.509.233,00	$ 1.327.364.904,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.445.052.895,68	$ 583.420.707.643,68	1254 -11/03/2023	x		Factura CVCM-30
19P	Ajuste	Enero de 2024	$ 265.156.244,00	$ 1.937.680,00	$ 267.093.924,00		$ 267.093.924,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.177.958.971,68	$ 583.153.613.719,68	1301 - 12/03/2023	x		Factura CVCM-31
19D	Ajuste	Enero de 2024	$ 54.981.298,00	$ 401.786,00	$ 55.383.084,00		$ 55.383.084,00	$ 19.133.321.415,00	104023	$ 38.122.575.887,68	$ 583.098.230.635,68	1570 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-32
20	Obra	Febrero de 2024	$ 2.113.538.875,00	$ 15.445.092,00	$ 2.128.983.967,00	$ 72.071.676,00	$ 2.056.912.291,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 36.065.663.596,68	$ 580.969.246.668,68	1520 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-33
20P	Ajuste	Febrero de 2024	$ 488.453.600,00	$ 3.569.469,00	$ 492.023.069,00		$ 492.023.069,00	$ 19.061.249.739,00	104023	$ 35.573.640.527,68	$ 580.477.223.599,68	1605 - 15/03/2023	x		Factura CVCM-34
21	Obra	Marzo de 2024	$ 2.724.563.486,00	$ 19.910.272,00	$ 2.744.473.758,00	$ 544.912.697,00	$ 2.199.561.061,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 33.374.079.466,68	$ 577.732.749.841,68	3074- 24/04/2024	x		Factura CVCM-35
20D	Ajuste	Febrero de 2024	$ 33.469.758,00	$ 244.587,00	$ 33.714.345,00		$ 33.714.345,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 33.340.365.121,68	$ 577.699.035.496,68	3073- 24/04/2024	x		Factura CVCM-36
21P	Ajuste	Marzo de 2024	$ 568.378.168,00	$ 4.153.533,00	$ 572.531.701,00		$ 572.531.701,00	$ 18.516.337.042,00	104023	$ 32.767.833.420,68	$ 577.126.503.795,68	3054 -23/04/2024	x		Factura CVCM-37
	Anticipo	**Marzo de 2024**						**$ 10.000.000.000,00**		**$ 22.767.833.420,68**	$ 564.124.890.554,68				
21D	Ajuste	Marzo de 2024	-$ 3.097.092,00	-$ 22.633,00	-$ 3.119.725,00		-$ 3.119.725,00	$ 28.516.337.042,00	104023	$ 22.770.953.145,68	$ 577.129.623.520,68	4250 -17/05/2024	x		Factura CVCM-38
22	Obra	Abril de 2024	$ 1.757.685.418,00	$ 12.844.624,00	$ 1.770.530.042,00	$ 351.537.084,00	$ 1.418.992.958,00	$ 28.164.799.958,00	104023	$ 21.351.960.187,68	$ 575.359.093.478,68	4286 -18/05/2024	x		Factura CVCM-39
22	Gestion SPAS	Abril de 2024	$ 3.619.723.697,00		$ 3.619.723.697,00		$ 3.619.723.697,00	$ 28.164.799.958,00	104023	$ 17.732.236.490,68	$ 571.739.369.781,68	4286 -18/05/2024	x		Factura CVCM-39
22P	Ajuste	Abril de 2024	$ 410.891.009,00	$ 3.002.665,00	$ 413.893.674,00		$ 413.893.674,00	$ 28.164.799.958,00	104023	$ 17.318.342.816,68	$ 571.325.476.107,68	4250 -17/05/2024	x		Factura CVCM-38

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Marzo de 2025.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458	$ 18.159.788.747
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2024	1248624	C-2401-0600-91-51102D-2401024-02	20	PROPIO	ADICION Nº1	$ 5.000.000.000	$ 1.066.380.852
2024	1248824	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	ADICION Nº1	$ 109.000.000	$ 109.000.000
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 82.866.666.666	$ 82.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 211.200.000.000	$ 211.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
			TOTAL			**$ 635.116.748.262**	**$ 506.875.811.573**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 635.116.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										Saldo Registro Presupuestal No. 215024 De (15/03/2024)					
								$ 28.164.799.958,00	215024	**$ 51.466.666.667,00**	$ 571.325.476.107,68				
23	Obra	Mayo de 2024	$ 1.473.905.358,00	$ 10.770.847,00	$ 1.484.676.205,00	$ 294.781.072,00	$ 1.189.895.133,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 50.276.771.534,00	$ 569.840.799.902,68	5930 -17/06/2024	x		Factura CVCM-40
23	Gestion SPAS	Mayo de 2024	$ 2.137.789.644,00		$ 2.137.789.644,00		$ 2.137.789.644,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 48.138.981.890,00	$ 567.703.010.258,68	5930 -17/06/2024	x		Factura CVCM-40
22D	Ajuste	Abril de 2024	$ 5.560.440,00	$ 40.634,00	$ 5.601.074,00		$ 5.601.074,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 48.133.380.816,00	$ 567.697.409.184,68	6054 -20/06/2024	x		Factura CVCM-41
23P	Ajuste	Mayo de 2024	$ 284.017.155,00	$ 2.075.510,00	$ 286.092.665,00		$ 286.092.665,00	$ 27.870.018.886,00	215024	$ 47.847.288.151,00	$ 567.411.316.519,68	6056 -20/06/2024	x		Factura CVCM-42
										Saldo Registro Presupuestal No. 104023 De (03/02/2023)					
								$ 27.870.018.886,00		**$ 17.318.342.816,68**					
23D	Ajuste	Mayo de 2024	$ 2.359.675,00	$ 17.244,00	$ 2.376.919,00		$ 2.376.919,00	$ 27.870.018.886,00	104023	$ 17.315.965.897,68	$ 567.408.939.600,68	7383-18/07/2024	x		Factura CVCM-43
24	Obra	Junio de 2024	$ 942.016.522,00	$ 6.883.967,00	$ 948.900.489,00	$ 188.403.304,00	$ 760.497.185,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.555.468.712,68	$ 566.460.039.111,68	7410-18/07/2024	x		Factura CVCM-44
24	Gestion SPAS	Junio de 2024	$ 189.736.982,00	$ 31.581.227,00	$ 221.318.209,00		$ 221.318.209,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.334.150.503,68	$ 566.238.720.902,68	7410-18/07/2024	x		Factura CVCM-44
24P	Ajuste	Junio de 2024	$ 191.281.897,00	$ 1.397.829,00	$ 192.679.726,00		$ 192.679.726,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.141.470.777,68	$ 566.046.041.176,68	7408-18/07/2024	x		Factura CVCM-45
24D	Ajuste	Junio de 2024	-$ 5.582.862,00	-$ 40.798,00	-$ 5.623.660,00		-$ 5.623.660,00	$ 27.681.615.582,00	104023	$ 16.147.094.437,68	$ 566.051.664.836,68	9867-28/08/2024	x		Factura CVCM-48
25	Obra	Julio de 2024	$ 748.471.196,00	$ 5.469.597,00	$ 753.940.793,00	$ 149.694.239,00	$ 604.246.554,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 15.542.847.883,68	$ 565.297.724.043,68	9641-26/08/2024	x		Factura CVCM-47
25	Gestion SPAS	Julio de 2024	$ 994.335.642,00	$ 11.345.660,00	$ 1.005.681.302,00		$ 1.005.681.302,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 14.537.166.581,68	$ 564.292.042.741,68	9641-26/08/2024	x		Factura CVCM-47
25P	Ajuste	Julio de 2024	$ 165.939.552,00	$ 1.212.635,00	$ 167.152.187,00		$ 167.152.187,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 14.370.014.394,68	$ 564.124.890.554,68	9867-28/08/2024	x		Factura CVCM-48
25D	Ajuste	Julio de 2024	-$ 4.060.685,00	-$ 29.674,00	-$ 4.090.359,00		-$ 4.090.359,00	$ 27.531.921.343,00	104023	$ 14.374.104.753,68	$ 564.128.980.913,68	11271-18/09/2024	x		Factura CVCM-50
26	Obra	Agosto de 2024	$ 1.149.413.163,00	$ 8.399.558,00	$ 1.157.812.721,00	$ 229.882.633,00	$ 927.930.088,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 13.446.174.665,68	$ 562.971.168.192,68	11270-18/09/2024	x		Factura CVCM-49
26	Gestion SPAS	Agosto de 2024	$ 566.768.003,00	$ 4.055.740,00	$ 570.823.743,00		$ 570.823.743,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 12.875.350.922,68	$ 562.400.344.449,68	11270-18/09/2024	x		Factura CVCM-49
26P	Ajuste	Agosto de 2024	$ 255.714.021,00	$ 1.868.679,00	$ 257.582.700,00		$ 257.582.700,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 12.617.768.222,68	$ 562.142.761.749,68	11271-18/09/2024	x		Factura CVCM-50
26D	Ajuste	Agosto de 2024	-$ 2.633.436,00	-$ 19.244,00	-$ 2.652.680,00		-$ 2.652.680,00	$ 27.302.038.710,00	104023	$ 12.620.420.902,68	$ 562.145.414.429,68	13262-18/10/2024	x		Factura CVCM-51
27	Obra	Septiembre de 2024	$ 4.818.424.268,00	$ 35.211.562,00	$ 4.853.635.830,00	$ 164.308.268,00	$ 4.689.327.562,00	$ 27.137.730.442,00	104023	$ 7.931.093.340,68	$ 557.291.778.599,68	13261-18/10/2024	x		Factura CVCM-52
27	Gestion SPAS	Septiembre de 2024	$ 1.151.146.000,00	$ 1.167.740,00	$ 1.152.313.740,00	$ 1.145.000.000,00	$ 7.313.740,00	$ 25.992.730.442,00	104023	$ 7.923.779.600,68	$ 556.139.464.859,68	13261-18/10/2024	x		Factura CVCM-52
27P	Ajuste	Septiembre de 2024	$ 984.248.887,00	$ 7.192.588,00	$ 991.441.475,00		$ 991.441.475,00	$ 25.992.730.442,00	104023	$ 6.932.338.125,68	$ 555.148.023.384,68	13262-18/10/2024	x		Factura CVCM-51
27D	Ajuste	Septiembre de 2024	-$ 13.420.433,00	-$ 98.072,00	-$ 13.518.505,00		-$ 13.518.505,00	$ 25.992.730.442,00	104023	$ 6.945.856.630,68	$ 555.161.541.889,68	14867-09/11/2024		x	Factura CVCM-54
28	Obra	Octubre de 2024	$ 3.473.407.770,00	$ 25.382.595,00	$ 3.498.790.365,00	$ 118.443.205,00	$ 3.380.347.160,00	$ 25.874.287.237,00	104023	$ 3.565.509.470,68	$ 551.662.751.524,68	14863-09/11/2024		x	Factura CVCM-53
28	EyD	Octubre de 2024	$ 88.449.737,00	$ 16.805.450,00	$ 105.255.187,00		$ 105.255.187,00	$ 25.874.287.237,00	104023	$ 3.460.254.283,68	$ 551.557.496.337,68	14863-09/11/2024		x	Factura CVCM-53
28	Estudios Atipicos	Octubre de 2024	$ 2.592.830.221,00	$ 492.637.742,00	$ 3.085.467.963,00		$ 3.085.467.963,00	$ 25.874.287.237,00	104023	$ 374.786.320,68	$ 548.472.028.374,68	14863-09/11/2024		x	Factura CVCM-53
28	Gestion SPAS	Octubre de 2024	$ 9.607.500,00	$ 1.825.425,00	$ 11.432.925,00		$ 11.432.925,00	$ 25.874.287.237,00	104023	$ 363.353.395,68	$ 548.460.595.449,68	14863-09/11/2024		x	Factura CVCM-53
28P	Ajuste	Octubre de 2024	$ 360.717.383,68	$ 2.636.012,00	$ 363.353.395,68		$ 363.353.395,68	$ 25.874.287.237,00	104023	$ -	$ 548.097.242.054,00	14867-09/11/2024		x	Factura CVCM-54

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Marzo de 2025.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458	$ 18.159.788.747
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2024	1248624	C-2401-0600-91-51102D-2401024-02	20	PROPIO	ADICION Nº1	$ 5.000.000.000	$ 1.066.380.852
2024	1248824	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	ADICION Nº1	$ 109.000.000	$ 109.000.000
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 82.866.666.666	$ 82.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 211.200.000.000	$ 211.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
TOTAL						**$ 635.116.748.262**	**$ 506.875.811.573**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 635.116.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
										Saldo Registro Presupuestal No. 215024 De (15/03/2024)					
										$ 47.847.288.151,00					
28P	Ajuste	Octubre de 2024	$ 504.025.018,32	$ 3.683.259,00	$ 507.708.277,32		$ 507.708.277,32	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 47.339.579.873,68	$ 547.589.533.776,68	14867-09/11/2024	x		Factura CVCM-54
28D	Ajuste	Octubre de 2024	$ 4.966.426,00	$ 36.293,00	$ 5.002.719,00		$ 5.002.719,00	$ 25.874.287.237,00	215024	$ 47.334.577.154,68	$ 547.584.531.057,68	18940-16/12/2024	x		Factura CVCM-56
29	Obra	Noviembre de 2024	$ 2.401.153.689,00	$ 17.546.892,00	$ 2.418.700.581,00	$ 81.879.341,00	$ 2.336.821.240,00	$ 25.792.407.896,00	215024	$ 44.997.755.914,68	$ 545.165.830.476,68	18018-11/12/2024	x		Factura CVCM-55
29	Gestion SPAS	Noviembre de 2024	$ 2.327.388.099,00	$ 4.181.045,00	$ 2.331.569.144,00	$ 1.011.274.198,00	$ 1.320.294.946,00	$ 24.781.133.698,00	215024	$ 43.677.460.968,68	$ 542.834.261.332,68	18018-11/12/2024	x		Factura CVCM-55
29P	Ajuste	Noviembre de 2024	$ 510.158.146,00	$ 3.728.079,00	$ 513.886.225,00		$ 513.886.225,00	$ 24.781.133.698,00	215024	$ 43.163.574.743,68	$ 542.320.375.107,68	18946-16/12/2024		x	Factura CVCM-57
30	Obra	Diciembre de 2024	$ 1.527.639.884,00	$ 11.163.522,00	$ 1.538.803.406,00	$ 52.092.520,00	$ 1.486.710.886,00	$ 24.729.041.178,00	215024	$ 41.676.863.857,68	$ 540.781.571.701,68	18529-13/12/2024	x		Factura CVCM-59
30	Gestion SPAS	Diciembre de 2024	$ 893.643.079,00	$ 6.339.199,00	$ 899.982.278,00	$ 270.850.640,00	$ 629.131.638,00	$ 24.458.190.538,00	215024	$ 41.047.732.219,68	$ 539.881.589.423,68	18529-13/12/2024	x		Factura CVCM-59
30P	Ajuste	Diciembre de 2024	$ 330.591.898,00	$ 2.415.864,00	$ 333.007.762,00		$ 333.007.762,00	$ 24.458.190.538,00	215024	$ 40.714.724.457,68	$ 539.548.581.661,68	18960-16/12/2024	x		Factura CVCM-58
29D	Ajuste	Noviembre de 2024	-$ 7.552.099,00	-$ 55.188,00	-$ 7.607.287,00		-$ 7.607.287,00	$ 24.458.190.538,00	215024	$ 40.722.331.744,68	$ 539.556.188.948,68	275-11/02/2025	x		Factura CVCM-61
30D	Ajuste	Diciembre de 2024	-$ 3.904.279,00	-$ 28.531,00	-$ 3.932.810,00		-$ 3.932.810,00	$ 24.458.190.538,00	215024	$ 40.726.264.554,68	$ 539.560.121.758,68	275-11/02/2025	x		Factura CVCM-61
										Saldo Registro Presupuestal No. 1248624 De (31/12/2024)					
										$ 5.000.000.000,00					
31	Obra	Enero de 2025	$ 2.944.512.100,00	$ 21.517.588,00	$ 2.966.029.688,00	$ 100.407.863,00	$ 2.865.621.825,00	$ 24.357.782.675,00	1248624	$ 2.134.378.175,00	$ 536.594.092.070,68	272-12/02/2025	x		Factura CVCM-60
31	Gestion SPAS	Enero de 2025	$ 499.736.240,00	$ 6.947.835,00	$ 506.684.075,00	$ 246.346.502,00	$ 260.337.573,00	$ 24.111.436.173,00	1248624	$ 1.874.040.602,00	$ 536.087.407.995,68	272-12/02/2025	x		Factura CVCM-60
31P	Ajuste	Enero de 2025	$ 746.639.994,00	$ 5.456.215,00	$ 752.096.209,00		$ 752.096.209,00	$ 24.111.436.173,00	1248624	$ 1.121.944.393,00	$ 535.335.311.786,68	275-11/02/2025	x		Factura CVCM-61
31D	Ajuste	Enero de 2025	$ 55.160.445,00	$ 403.096,00	$ 55.563.541,00		$ 55.563.541,00	$ 24.111.436.173,00	1248624	$ 1.066.380.852,00	$ 535.279.748.245,68	1500-19/03/2025		x	Factura CVCM-68
										Saldo Registro Presupuestal No. 215024 De (15/03/2024)					
										$ 40.726.264.554,68					
32	Obra	Febrero de 2025	$ 2.135.829.564,00	$ 15.607.985,00	$ 2.151.437.549,00	$ 72.831.788,00	$ 2.078.605.761,00	$ 24.038.604.385,00	215024	$ 38.647.658.793,68	$ 533.128.310.696,68	1349-18/03/2025		x	Factura CVCM-62
32	Gestion SPAS	Febrero de 2025	$ 1.704.340.605,00	$ 5.200.684,00	$ 1.709.541.289,00	$ 15.364.700,00	$ 1.694.176.589,00	$ 24.023.239.685,00	215024	$ 36.953.482.204,68	$ 531.418.769.407,68	1349-18/03/2025		x	Factura CVCM-62
32P	Ajuste	Febrero de 2025	$ 492.895.382,00	$ 3.601.928,00	$ 496.497.310,00		$ 496.497.310,00	$ 24.023.239.685,00	215024	$ 36.456.984.894,68	$ 530.922.272.097,68	1498-19/03/2025		x	Factura CVCM-66
32D	Ajuste	Febrero de 2025	$ 23.052.381,00	$ 168.459,00	$ 23.220.840,00		$ 23.220.840,00	$ 24.023.239.685,00	215024	$ 36.433.764.054,68	$ 530.899.051.257,68				
33	Obra	Marzo de 2025	$ 2.635.972.517,00	$ 19.262.876,00	$ 2.655.235.393,00	$ 108.074.873,00	$ 2.547.160.520,00	$ 23.915.164.812,00	215024	$ 33.886.603.534,68	$ 528.243.815.864,68				
33	Gestion SPAS	Marzo de 2025	$ 15.759.028,00	$ 739.791,00	$ 16.498.819,00		$ 16.498.819,00	$ 23.915.164.812,00	215024	$ 33.870.104.715,68	$ 528.227.317.045,68				
TOTALES			**$ 104.948.575.370,00**	**$ 1.940.855.846,00**	**$ 106.889.431.216,00**	**$ 6.084.835.188,00**	**$ 100.804.596.028,00**	**$ 23.915.164.812,00**		**$ 33.870.104.715,68**	**$ 528.227.317.045,68**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 de 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: Marzo de 2025.

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 85.134.223	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 60.263.058.484	$ -
2022	617522	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 259.555.555	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401008-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 47.296.791	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401013-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 48.475.172.345	$ -
2023	104023	C-2401-0600-91-0-2401023-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 144.197.531	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401008-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 89.863.901	$ -
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 33.102.827.458	$ 18.159.788.747
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401013-02	16	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 18.000.000.000	$ 18.000.000.000
2024	215024	C-2401-0600-91-51102D-2401023-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 273.975.308	$ 273.975.308
2024	1248624	C-2401-0600-91-51102D-2401024-02	20	PROPIO	ADICION Nº1	$ 5.000.000.000	$ 1.066.380.852
2024	1248824	C-2401-0600-144-51102D-2401024-02	16	NACIÓN	ADICION Nº1	$ 109.000.000	$ 109.000.000
2025				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 82.866.666.666	$ 82.866.666.666
2026				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 211.200.000.000	$ 211.200.000.000
2027				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 146.000.000.000	$ 146.000.000.000
2028				VIGENCIAS FUTURAS	CONTRATO PRINCIPAL (981 DE 2022)	$ 29.200.000.000	$ 29.200.000.000
				TOTAL		**$ 635.116.748.262**	**$ 506.875.811.573**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 635.116.748.262,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No. 617522 De (21/01/2022)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 71.616.779.802,00	$ 523.353.390,00	$ 72.140.133.192,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES,USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 12.633.415.829,00	$ 92.321.116,00	$ 12.725.736.945,00
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III	$ 3.995.574.999,00	$ 759.159.252,00	$ 4.754.734.251,00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%	$ 14.109.974.519,00	$ 73.384.346,00	$ 14.183.358.865,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ -	$ -	$ -
TOTAL BOLSA DE ESTUDIOS GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES ATIPICOS	$ 2.592.830.221,00	$ 492.637.742,00	$ 3.085.467.963,00
VALOR TOTAL	**$ 104.948.575.370,00**	**$ 1.940.855.846,00**	**$ 106.889.431.216,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: **CONRADO LOPERA PALACIO**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 0520280830 ANT

Firma
Nombre: **NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **17202-09718 CLD**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA	PÁGINA	1 DE 4
	SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES	FECHA	31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 33 **DE** Marzo de 2025 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 2.651.731.545,00

SEGUIMIENTO No. 33 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022. **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 72,1 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 5.109.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 635.116.748.262,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 de julio al 31 de julio del 22	2 ago-22	3 sep-22	4 oct-22	5 nov-22	6 dic-22	7 ene-23	8 feb-23	9 mar-23	10 abr-23	11 may-23	12 jun-23	13 jul-23	14 ago-23	15 sep-23	16 oct-23	17 nov-23	18 dic-23	19 ene-24	20 feb-24	21 mar-24	22 abr-24
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1,1.2,2.3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,224%		% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,096%	0,093%	0,093%	0,093%	0,093%	0,093%	0,093%	0,093%	0,093%	0,093%	0,000%	0,024%	0,024%	0,024%	0,012%	0,012%	0,012%	0,012%
	$ 2.833.484,65	0,512%	$ 1.548.424,49	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$30.958	$27.151	$27.151	$27.151	$27.151	$27.151	$27.151	$27.151	$27.151	$27.151	$0,0	$133.417	$124.880	$159.368	$27.152	$27.151	$27.151	$27.152
				$ E					$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$676	$277			$23.388	$22.143	$0	$100.187
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,004%	0,004%	0,018%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%	0,052%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 5.131.191,85	0,927%	$ 287.687,53	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$227.365	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13 Y 14)	$ 13.698.762,53	2,476%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 11.736.929,43	2,121%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79)	$ 535.135.350,83	96,704%	12,285%	% P	0,000%	0,000%	1,440%	3,283%	5,574%	0,298%	0,298%	0,298%	0,298%	0,298%	0,298%	0,298%	0,298%	0,298%	0,298%	1,305%	1,914%	2,495%	2,895%	0,954%	0,072%	0,106%
	$ 528.017.844,81	95,418%	$ 67.983.048,30	$ P	$0,0	$0,0	$7.970.657	$18.196.259	$30.847.172	$1.839.282	$1.839.282	$1.839.282	$1.839.282	$1.839.282	$1.839.282	$1.839.282	$1.839.282	$1.839.282	$1.839.282	$7.227.011	$7.494.591	$13.554.898	$10.027.427	$2.060.992	$306.000	$600.000
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$7.227.011	$7.494.591	$13.554.898	$10.027.427	$2.060.992	$306.000	$600.000
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,242%	0,378%	0,492%	0,300%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55 Y 69)	$ 467.584,97	0,084%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 582.454,04	0,105%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77)	$ 23.481,25	0,004%	0,080%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 486.629,64	0,088%	$ 439.990,97	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E					$0																	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,245%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,015%	0,017%	0,017%	0,017%	0,000%
	$ 1.606.830,76	0,290%	$ 1.357.628,52	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$191.812	$191.812	$191.805	$30.265	$30.265
				$ E																					$0	$0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E					$0																	
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Ajuste por acta de modificación	$ 4,73	0,000%																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**12,942%**																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.395.369,91**	**99,462%**	**$ 71.616.779,80**																							

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,000%		0,000%		1,440%	3,288%	5,580%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	0,299%	1,306%	1,414%	2,528%	2,996%	0,084%	0,102%	0,120%	0,121%
	VALC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.970.656,69	$ 18.196.259,47	$ 30.878.080,20	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 1.656.432,10	$ 7.227.010,81	$ 7.822.819,98	$ 13.991.590,12	$ 16.581.414,76	$ 463.441,84	$ 563.441,84	$ 663.441,84	$ 669.000,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,000%	0,000%	1,440%	4,729%	10,309%	10,608%	10,907%	11,207%	11,506%	11,806%	12,105%	12,404%	12,703%	13,003%	2,675%	4,089%	6,617%	9,614%	7,205%	7,307%	7,427%	8,363%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ 7.970.656,69	$ 26.166.916,17	$ 57.044.996,36	$ 58.701.428,47	$ 60.357.860,57	$ 62.014.292,67	$ 63.670.724,78	$ 65.327.156,88	$ 66.983.588,98	$ 68.640.021,08	$ 70.296.453,19	$ 71.952.885,29	$ 14.804.296,51	$ 22.627.116,50	$ 36.618.706,62	$ 53.200.121,38	$ 39.869.780,71	$ 40.433.222,54	$ 41.096.664,38	$ 46.277.348,35
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,266%	1,104%	1,405%	1,443%	2,529%	0,375%	0,246%	0,382%	0,492%	0,318%
	VALC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.468.535,70	$ 6.108.750,00	$ 7.777.166,00	$ 7.982.833,58	$ 13.993.498,20	$ 2.075.555,39	$ 1.363.907,12	$ 2.113.538,88	$ 2.724.563,49	$ 1.757.685,42
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,266%	1,369%	2,775%	4,217%	6,746%	7,121%	7,368%	7,750%	8,242%	8,560%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.468.535,70	$ 7.577.285,70	$ 15.354.451,70	$ 23.337.285,28	$ 37.330.783,48	$ 39.406.338,87	$ 40.770.245,99	$ 42.883.784,87	$ 45.608.348,35	$ 47.366.033,77

REPROGRAMACION Nº1 — REPROGRAMACION Nº2 — REPROGRAMACION Nº3

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES*	$32.410.096,98 / $32.572.015,00	$ 12.633.415,83	38,786%
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA*	$600.000,00 / $600.000,00		0,000%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS*	$300.000,00 / $305.000,00		0,000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)*	$4.287.299,53 / $4.266.759,74	$ 615.674,51	14,430%
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)*	$3.996.575,00 / $3.996.575,00	$ 3.995.575,00	99,975%
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)*	$759.349,25 / $759.349,25	$ 759.159,25	99,975%
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C*	$33.777.431,20 / $33.817.431,20	$ 14.183.358,87	41,941%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)*	$504.000,00 / $504.000,00		0,000%
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES (3)	$0,00 / $2.593.830,22	$ 2.592.830,22	99,961%
IVA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19% (4)	$0,00 / $492.827,74	$ 492.637,74	99,961%
DIAGNÓSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$0,00 / $40.000,00		0,000%
IVA (19%) - DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$0,00 / $7.600,00		0,000%
PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE (MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS E IVA (J)	$0,00 / $4.765.990,20		0,000%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)*	$76.634.751,96	$ 35.272.651,42	41,634%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')*	$84.721.378,35		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)*	**$630.007.748,26**	$ 106.889.431,22	16,830%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')*	**$635.116.748,26**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 4
		FECHA	31/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 33 **DE** Marzo de 2025. (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 2.651.731.545,00

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022. **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72,1 meses (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 72,1 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 5.109.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 635.116.748.262,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	%Programado	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor programado	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26
				$ Valor Ejecutado																						
				%Ejecutado																						
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1,1.2,2.3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,224%	0,280%	% P	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,013%	0,000%	0,000%	0,018%	0,018%	0,018%	0,012%	0,011%	0,011%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%
	$ 2.833.484,65	0,512%	$ 1.548.424,49	$ P	$70.000	$70.000	$70.000	$70.000	$70.000	$0,0	$0,0	$97.602	$97.597	$97.602	$67.602	$58.500	$55.850	$55.850	$55.850	$55.850	$55.850	$55.850	$55.850	$55.850	$55.850	$55.850
				$ E	$145.410	$3.924	$75.838	$24.665	$26.203	$30.736	$2.455	$35.833	$11.287	$352.448	$172.966	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0,026%	0,001%	0,014%	0,004%	0,005%	0,006%	0,000%	0,006%	0,002%	0,064%	0,032%											
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%	0,052%	% P	0,014%	0,014%	0,014%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,010%	0,010%	0,000%	0,090%	0,090%	0,090%	0,090%	0,090%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 5.131.191,85	0,927%	$ 287.687,53	$ P	$75.788	$75.788	$75.788	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$52.587	$52.587	$0,0	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$500.000	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$0	$108.252	$50.334	$33.537	$27.944	$4.936	$0	$37.226	$3.938	$0	$0											
				% E	0,000%	0,020%	0,009%	0,006%	0,005%	0,001%	0,000%	0,007%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13 Y 14)	$ 13.698.762,53	2,476%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,118%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 11.736.929,43	2,121%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$478.656				$1.000.000			$3.350.000	$3.350.000				
				$ E												$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79)	$ 535.135.350,83	96,704%	12,285%	% P	0,106%	0,126%	0,183%	0,271%	0,452%	0,341%	0,403%	0,430%	0,138%	0,166%	0,232%	0,343%	0,404%	0,615%	0,886%	0,942%	0,860%	0,392%	0,356%	1,114%	0,356%	1,124%
	$ 528.017.844,81	95,418%	$ 67.983.048,30	$ P	$200.000	$250.000	$360.000	$533.700	$1.000.000	$1.888.707	$2.372.957	$2.375.503	$761.565	$916.758	$1.314.463	$1.898.041	$2.236.158	$3.404.475	$4.904.475	$5.213.262	$4.702.913	$2.170.121	$1.759.121	$6.166.463	$1.759.121	$6.218.563
				$ E	$1.228.073	$823.741	$561.282	$1.069.592	$4.747.722	$3.424.066	$1.388.372	$1.393.436	$2.915.322	$385.506	$1.675.805	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				% E	0,222%	0,149%	0,101%	0,193%	0,858%	0,619%	0,350%	0,252%	0,527%	0,178%	0,303%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55 Y 69)	$ 467.584,97	0,084%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 582.454,04	0,105%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E																						
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77)	$ 23.481,25	0,004%	0,080%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,004%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,001%	0,001%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 486.629,64	0,088%	$ 439.990,97	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$463.148	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$7.827	$7.827	$7.827	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E										$439.991	$0	$0										
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,245%	% P	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,017%	0,000%	0,000%	0,017%	0,017%	0,017%	0,000%	0,033%	0,033%	0,033%	0,015%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 1.606.630,76	0,290%	$ 1.357.628,52	$ P	$85.905	$36.905	$83.905	$83.905	$82.905	$0,0	$0,0	$85.905	$85.905	$85.905	$93.259	$185.000	$185.000	$185.000	$85.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$100.334	$0	$68.837	$21.319	$17.333	$14.530	$0	$41.144	$11.333	$197.813	$103.202											
				% E	0,018%	0,000%	0,011%	0,004%	0,003%	0,001%	0,000%	0,004%	0,000%	0,007%	0,002%	0,004%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E									$3	$0	$0											
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Ajuste por acta de modificación	$ 4,73	0,000%																								
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**12,942%**																							
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.395.369,91**	**99,462%**	**$ 71.616.779,80**																							

REPROGRAMACION N°4 — REPROGRAMACION N°5 — REPROGRAMACION N°6 — REPROGRAMACION N°7

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,132%	0,170%	0,206%	0,301%	0,482%	0,425%	0,403%	0,463%	0,182%	0,333%	0,298%	0,478%	0,720%	0,756%	1,009%	1,051%	1,474%	4,014%	4,693%	6,353%	1,132%	1,141%			
	VALOR	$ 841.672,76	$ 541.672,76	$ 1.141.672,76	$ 1.665.904,56	$ 2.665.904,56	$ 2.351.855,80	$ 2.227.957,03	$ 2.573.008,46	$ 1.005.311,38	$ 1.838.472,20	$ 1.647.069,61	$ 2.642.540,71	$ 4.019.047,95	$ 4.765.325,03	$ 5.585.325,06	$ 5.816.939,32	$ 8.156.589,77	$ 22.212.797,63	$ 25.955.388,30	$ 35.154.997,71	$ 6.262.312,79	$ 6.314.411,63			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	8,518%	8,688%	8,891%	9,192%	9,674%	10,635%	11,037%	11,592%	11,799%	12,061%	12,763%	13,241%	13,967%	14,723%	15,733%	16,784%	18,268%	22,272%	26,962%	33,315%	34,447%	35,588%			
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 47.119.021,14	$ 48.060.693,92	$ 49.202.366,70	$ 50.868.271,26	$ 53.534.176,82	$ 56.050.120,08	$ 61.078.077,11	$ 63.651.085,56	$ 64.905.777,00	$ 66.744.249,26	$ 70.627.876,90	$ 73.270.417,61	$ 77.289.465,57	$ 81.474.790,65	$ 87.060.115,73	$ 92.877.055,05	$ 101.033.644,82	$ 123.246.442,47	$ 149.202.030,78	$ 184.357.028,48	$ 190.619.340,67	$ 196.933.752,32			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,266%	0,170%	0,135%	0,208%	0,871%	0,628%	0,434%	0,276%	0,532%	0,386%	0,476%														
	VALOR	$ 1.473.905,36	$ 942.016,52	$ 748.471,20	$ 1.149.413,16	$ 4.818.424,27	$ 3.473.407,77	$ 2.401.153,69	$ 1.527.639,88	$ 2.944.512,10	$ 2.135.829,56	$ 2.635.972,52														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	8,826%	8,996%	9,131%	9,339%	10,210%	10,837%	11,271%	11,547%	12,079%	12,465%	12,942%														
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 48.839.939,13	$ 49.781.955,65	$ 50.530.426,85	$ 51.679.840,01	$ 56.498.264,28	$ 59.971.672,05	$ 62.372.825,74	$ 63.900.465,62	$ 66.844.977,72	$ 68.980.807,29	$ 71.616.779,80														

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES*	$32.410.096,98	$ 12.633.415,83	38,786%
	$32.572.015,00		
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA*	$600.000,00	$ -	0,000%
	$600.000,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS*	$300.000,00	$ -	0,000%
	$305.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)*	$4.287.299,53	$ 615.674,51	14,430%
	$4.266.759,74		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)*	$3.996.575,00	$ 3.995.575,00	99,975%
	$3.996.575,00		
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)*	$759.349,25	$ 759.159,25	99,975%
	$759.349,25		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C*	$33.777.431,20	$ 14.183.358,87	41,941%
	$33.817.431,20		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)*	$504.000,00	$ -	0,000%
	$504.000,00		
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES (3)	$0,00	$ 2.592.830,22	99,961%
	$2.593.830,22		
IVA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19% (4)	$0,00	$ 492.637,74	99,961%
	$492.827,74		
DIAGNÓSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$0,00	$ -	0,000%
	$40.000,00		
IVA (19%) - DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$0,00	$ -	0,000%
	$7.600,00		
PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE (MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS E IVA (J)	$0,00	$ -	0,000%
	$4.765.990,20		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)*	$76.634.751,90	$ 35.272.651,42	41,634%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')*	$84.721.378,35		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)*	**$630.007.748,26**	$ 106.889.431,22	16,830%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')*	**$635.116.748,26**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES			
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 DE 4
FECHA	31/03/2025

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 33 **DE** Marzo de 2025. (Indicar mes y año)

SEGUIMIENTO No. 33 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 2.651.731.545,00

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022. **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72.1 meses (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 72.1 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ 5.109.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 635.116.748.262,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1.1,2,2,3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,224%	0,280%
	$ 2.833.484,65	0,512%	$ 1.548.424,49
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%	0,052%
	$ 5.131.191,85	0,927%	$ 287.687,53
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13 Y 14)	$ 13.698.762,53	2,476%	0,000%
	$ 11.736.929,43	2,121%	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79)	$ 535.135.350,83	96,704%	12,285%
	$ 528.017.844,81	95,418%	$ 67.983.048,30
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55 Y 69)	$ 467.584,97	0,084%	0,000%
	$ 582.454,04	0,105%	$ -
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77)	$ 23.481,25	0,004%	0,080%
	$ 486.629,64	0,088%	$ 439.990,97
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,245%
	$ 1.606.830,76	0,290%	$ 1.357.628,52
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -
Ajuste por acta de modificación	$ 4,73	0,000%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**12,942%**
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.395.369,91**	**99,462%**	**$ 71.616.779,80**

		45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66
% Programado																							
$ Valor programado																							
$ Valor Ejecutado																							
%Ejecutado		mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26	ago-26	sep-26	oct-26	nov-26	dic-26	ene-27	feb-27	mar-27	abr-27	may-27	jun-27	jul-27	ago-27	sep-27	oct-27	nov-27	dic-27
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1.1,2,2,3, 4, Y 67)	% P	0,017%	0,017%	0,017%	0,018%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ P	$95.850	$95.850	$95.850	$90.868	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
	$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	% P	0,000%	0,000%	0,042%	0,042%	0,042%	0,042%	0,042%	0,042%	0,042%	0,042%	0,042%	0,042%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ P	$0,0	$0	$234.350	$234.350	$234.350	$234.350	$234.350	$234.350	$234.350	$234.350	$234.350	$234.350	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
	$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13 Y 14)	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ P																						
	$ E	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79)	% P	1,249%	2,144%	1,927%	1,883%	2,635%	2,442%	3,456%	4,393%	5,093%	5,679%	1,456%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,017%	2,016%	1,383%	3,183%
	$ P	$6.910.266	$11.861.757	$10.653.987	$10.281.496	$14.582.757	$13.511.873	$19.126.707	$33.162.238	$34.687.269	$31.426.949	$8.112.172	$11.161.197	$11.161.197	$11.161.197	$11.161.197	$11.161.197	$11.161.197	$11.161.197	$11.161.197	$11.158.056	$10.975.277	$17.612.973
	$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55 Y 69)	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,019%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,003%	0,002%	0,002%	0,003%	0,003%
	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$105.550	$15.547	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$18.703	$9.352	$9.341	$18.703
	$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77)	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
	$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	% P	0,009%	0,009%	0,009%	0,009%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ P	$51.601,0	$51.601,0	$51.601,0	$51.601,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
	$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL OTROS ITEMS	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
	$ E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

-$ 62.182,33

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,275%	2,170%	1,996%	1,926%	2,678%	2,484%	3,518%	6,038%	6,314%	5,725%	1,512%	2,063%	2,020%	2,020%	2,020%	2,020%	2,020%	2,020%	2,020%	2,019%	2,018%	3,186%
	VALOR	$ 7.057.716,78	$ 12.009.207,75	$ 11.046.788,62	$ 10.658.315,14	$ 14.817.107,69	$ 13.746.223,47	$ 19.466.157,85	$ 33.413.235,95	$ 34.940.322,45	$ 31.680.002,62	$ 8.365.225,67	$ 11.414.251,09	$ 11.179.900,65	$ 11.179.900,65	$ 11.179.900,65	$ 11.179.900,65	$ 11.179.900,65	$ 11.179.900,65	$ 11.179.900,65	$ 11.170.548,95	$ 11.167.407,42	$ 10.984.818,46	$ 17.631.676,87
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	36,863%	39,033%	41,029%	42,956%	45,633%	48,117%	51,635%	57,673%	63,987%	69,712%	71,224%	73,286%	75,307%	77,327%	79,347%	81,368%	83,388%	85,408%	87,427%	89,446%	91,430%	94,616%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 203.991.469,10	$ 216.000.676,85	$ 227.046.465,47	$ 237.704.780,60	$ 252.521.888,29	$ 266.268.111,76	$ 285.734.269,61	$ 319.147.505,56	$ 354.087.828,01	$ 385.767.830,63	$ 394.133.056,30	$ 405.547.307,38	$ 416.727.208,03	$ 427.907.108,69	$ 439.087.009,34	$ 450.266.909,99	$ 461.446.810,64	$ 472.626.711,30	$ 483.797.260,25	$ 494.964.667,67	$ 505.949.486,13	$ 523.581.163,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																						
	VALOR																						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																						
	VALOR (Miles de Pesos)																						

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
	VALOR ACTUALIZADO		
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES*	$32.410.099,98	$ 12.633.415,83	38,786%
	$32.572.015,00		
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA*	$600.000,00	$ -	0,000%
	$600.000,00		
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS*	$300.000,00	$ -	0,000%
	$305.000,00		
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)*	$4.287.299,53	$ 615.674,51	14,430%
	$4.266.759,74		
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)*	$3.996.575,00	$ 3.995.575,00	99,975%
	$3.996.575,00		
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1) * 19% = (2)*	$759.349,25	$ 759.159,25	99,975%
	$759.349,25		
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C*	$33.777.431,20	$ 14.183.358,87	41,941%
	$33.817.431,20		
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)*	$504.000,00	$ -	0,000%
	$504.000,00		
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES (3)	$0,00	$ 2.592.830,22	99,961%
	$2.593.830,22		
IVA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19% (4)	$0,00	$ 492.637,74	99,961%
	$492.827,74		
DIAGNÓSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$0,00	$ -	0,000%
	$40.000,00		
IVA (19%) - DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$0,00	$ -	0,000%
	$7.600,00		
PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE (MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS E IVA (J)	$0,00	$ -	0,000%
	$4.765.990,20		
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)*	$79.634.751,96	$ 35.272.651,42	41,634%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')*	$84.721.378,35		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)*	**$630.007.748,26**	$ 106.889.431,22	16,830%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')*	**$635.116.748,26**		

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
TIPO DE DIBUJO	$ Valor	$ Valor	$ Valor
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:

Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista

C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:

Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor

C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES - GERENCIA GRUPO NORTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 33 **DE** Marzo de 2025. (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 2.651.731.545,00

SEGUIMIENTO No. 33
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 981 DEL 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 de 2022. **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

PLAZO INICIAL: 72.1 meses (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: 72.1 meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 27 JULIO DEL 2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 JULIO DEL 2028 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 630.007.748.262,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 5.109.000.000,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 635.116.748.262,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL PROGRAMADA Miles de pesos VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado $ Valor programado $ Valor Ejecutado %Ejecutado	67 ene-28	68 feb-28	69 mar-28	70 abr-28	71 may-28	72 jun-28	73 jul-28
EXPLANACIONES (Numero de Orden 1,1.1,1.2,2,3, 4, Y 67)	$ 1.238.328,37	0,224%	0,280%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 2.833.484,65	0,512%	$ 1.548.424,49	$ P	$6.5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Numero de Orden 5,6 Y 7)	$ 2.598.021,79	0,469%	0,052%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 5.131.191,85	0,927%	$ 287.687,53	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS (Numero de Orden 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13 Y 14)	$ 13.698.762,53	2,476%	0,000%	% P	0,000%	0,330%	0,251%	0,148%	0,001%	0,000%	0,000%
	$ 11.736.929,43	2,121%	$	$ P		$1.827.801	$1.387.187	$817.985	$3.857	$0,0	$0,0
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Numero de orden 15, 15.1, 15.2, 16, 16.1, 16.2, 17, 17.1, 17.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79)	$ 535.135.350,83	96,704%	12,285%	% P	1,96%	2,94%	1,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	$ 528.017.844,81	95,418%	$ 67.983.048,30	$ P	$10.814.585	$5.219.140	$6.493.659	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Numero de Orden 49, 49.1, 49.2, 50, 50.1, 50.2, 51, 51.1, 51.2, 52, 52.1, 52.2, 53, 54, 55 Y 69)	$ 467.584,97	0,084%	0,000%	% P	0,003%	0,003%	0,224%	0,013%	0,007%	0,000%	0,000%
	$ 582.454,04	0,105%	$	$ P	$18.703	$18.703	$133.397	$18.703	$37.217	$0,0	$0,0
				$ E	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
OBRAS VARIAS (Numero de Orden 56, 77)	$ 23.481,25	0,004%	0,080%	% P	0,004%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 486.629,64	0,088%	$ 439.990,97	$ P	$22.157	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TRANSPORTES (Numero de Orden 57)	$ 211.466,56	0,038%	0,245%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ 1.606.830,76	0,290%	$ 1.357.628,52	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
TOTAL OTROS ITEMS	$ -	0,000%	0,000%	% P	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
	$ -	0,000%	$ -	$ P	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
				$ E							
				% E	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Ajuste por acta de modificación	$ 4,730	0,000%		% P					0,000%		
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 553.372.996,30**	**100,000%**	**12,942%**	$ P					$4,7		
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 550.395.369,91**	**99,462%**	**$ 71.616.779,80**								

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	1,962%	1,277%	1,448%	0,151%	0,007%	0,000%	0,000%
	VALOR	$ 10.856.452,55	$ 7.065.644,30	$ 8.014.243,66	$ 836.688,05	$ 41.178,35	$ -	$ -
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	96,578%	97,855%	99,303%	99,454%	99,462%	99,462%	99,462%
	VALOR (Miles de Pesos)	$ 534.437.615,55	$ 541.503.259,85	$ 549.517.503,51	$ 550.354.191,56	$ 550.395.369,91	$ 550.395.369,91	$ 550.395.369,91
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%							
	VALOR							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%							
	VALOR (Miles de Pesos)							

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES*	$32.410.096,98 $32.572.015,00	$ 12.633.415,83	38,786%
DISEÑO, EJECUCIÓN Y ANÁLISIS DE PRUEBA DE CARGA*	$600.000,00 $600.000,00	$ -	0,000%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA ACELERACIÓN DE OBRAS POR AVANCE DE OBRA Y OPTIMIZACION DE OBRAS*	$300.000,00 $305.000,00	$ -	0,000%
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)*	$4.267.299,53 $4.266.759,74	$ 615.674,51	14,430%
REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1)*	$3.996.575,00 $3.996.575,00	$ 3.995.575,00	99,975%
IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III.= (1).* 19% = (2)*	$759.349,25 $759.349,25	$ 759.159,25	99,975%
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye EIA y PAGA e IVA19%)= C*	$33.777.431,20 $33.817.431,20	$ 14.183.358,87	41,941%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)= (D)*	$504.000,00 $504.000,00	$ -	0,000%
BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES (3)	$0,00 $2.593.830,22	$ 2.592.830,22	99,961%
IVA - BOLSA DE ESTUDIOS ADICIONALES GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES 19% (4)	$0,00 $492.827,74	$ 492.637,74	99,961%
DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISION, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (F)	$0,00 $40.000,00	$ -	0,000%
IVA (19%) - DIAGNOSTICO DE LOS PUENTES Y/O REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$0,00 $7.600,00	$ -	0,000%
PROVISIÓN PARA ACTIVIDADES DE INSTRUMENTACIÓN DEL PUENTE (MANTENIMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS Y/O EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN), INCLUYE COSTOS INDIRECTOS E IVA (J)	$0,00 $4.765.990,20	$ -	0,000%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)*	$76.634.751,96	$ 35.272.651,42	41,634%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')*	$84.721.378,35		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)*	**$630.007.748,26**	$ 106.889.431,22	16,830%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')*	**$635.116.748,26**		

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor	$ Valor
CURVAS			

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: ALEXANDRA MARÍA GREIDINGER RESTREPO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista
C.C. 43.099.356

Aprueba Firma:
Nombre: FRANCISCO JAVIER DAZA TOVAR
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor
C.C. 19.072.460

Original: Archivo de Gestión Contractual
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	24/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2025

PROYECTO: CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	ARMANDO ALFONSO MEJIA MONSALVO	12635938	CADENERO 1	$ 2.459.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	CABALLERO MALDONADO LUDYS ROCIO	1083456188	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	$ 1.872.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	DANIEL ENRIQUE AGUILAR RUIZ	1004376234	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 2.847.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	LOPEZ RODRIGUEZ ALBEIRO JOSE	85372059	AYUDANTE	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	POLO MAIGUEL JORGE LUIS	85455573	AYUDANTE	$ 1.604.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	SAN JOSE CASTILLO AYLIN VANESSA	1140842732	INGENIERA RESIDENTE	$ 5.699.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	PORRETA CARVAL WENDY JOLANYS	39101775	PROFRESIONAL GESTION HUMANA	$ 4.221.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	JAZMIN RUIZ MACA	66912520	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9	HERNAN YESID NARVAEZ PANTOJA	1087413014	PROFESIONAL OFICINA TÉCNICA	$ 6.338.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	GERMAN OSPINA MARIN	15959780	MAESTRO DE OBRA	$ 6.276.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	HERBERT ALFREDO VERA GALINDO	1073323239	LABORATORISTA	$ 5.019.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12	FREDY JUNIOR CASTILLO RODRIGUEZ	1083568264	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	YOANDRIS MEJIA MEJIA	1221982696	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14	JOSE DAVID FELIPE SANJUAN	1221964274	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	JESUS MARIA LEIVA DURAN	1083461770	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	VANESSA RAMIREZ SANTA	1140835286	ABOGADO PREDIAL	$ 7.225.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	JUAN DAVID LOPEZ VASQUEZ	1004376277	OPERADOR MÚLTIPLE MOVIMIENTO DE T	$ 2.975.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	EDWIN ZAIR SAUMET VASQUEZ	1082854200	INGENIERO DE MANTENIMIENTO	$ 4.917.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	ARMANDO JOSE MORALES ARCON	72306439	MECANICO 1	$ 3.336.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
20	YAIR ALFONSO ARZUZA RIVERA	12637222	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUI	$ 1.982.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	GUSTAVO BRAVO VIDES	1082949612	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUI	$ 1.982.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	JORGE ALI CASTRO PEREZ	1052053123	OPERADOR PLANTA CONCRETO MÓVIL	$ 2.054.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
23	ALEXANDER CORREA ROJAS	13570888	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUI	$ 2.264.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24	JAIME JUNIOR VARELA AVILA	12630370	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUI	$ 1.982.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
25	HERNAN ALCIBAR ACEVEDO GOMEZ	9763548	COORDINADOR PLANTA DE CONCRETO	$ 4.778.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
26	VICTOR ALFONSO VILLANUEVA MARIÑO	1083466893	OPERADOR MINICARGADOR	$ 2.173.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
27	JORGE LUIS GARCIA SANCHEZ	19588740	CONDUCTOR MIXER	$ 2.264.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	JESUS HERNANDO GARCIA GALLEGO	16053802	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	MIRTA DEL CARMEN MERCADO GONZALEZ	30764740	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	MILLER ANTONIO URIELES RABELO	12634423	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	FERNANDO JOSE ROBLES PRADO	12448260	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
32	DANYS DE JESUS MUÑOZ SALAS	1083469401	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
33	JAVIER JOSE BUSTILLO MARIANO	72018821	MECANICO 1	$ 3.336.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
34	RAMIRO ALBERTO ECHEVERRY VALENCIA	15428183	TOPÓGRAFO	$ 4.165.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	CARMEN CECILIA GARIZABALO MANJARREZ	1007937213	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	GUSTAVO ENRIQUE MUNIVE CHARRIS	1221973557	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	LUIS ENRIQUE SERNA EUSSE	1044121090	AYUDANTE PRÁCTICO	$ 1.584.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	CARLOS MANUEL CASTRO VALVERDE	1004162771	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	JAIDER DE JESUS LAZO OROZCO	1083457506	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
40	HEIDI LIZETT POLO MAZZILLY	39143701	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	LEANDRO RAFAEL LORA ONOFRE	12636757	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
42	YIMY ANDRES MUÑOZ MONTOYA	98696731	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUI	$ 1.982.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
43	DEINER LUIS PACHECO CAMARGO	1004323017	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	LEANDRO JOSE GARCIA MEJIA	1083567904	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	NANCY ASTRID PACHON RUEDA	1082841160	PROFESIONAL SOCIO PREDIAL	$ 4.816.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
46	MANUEL SEGUNDO CABALLERO OROZCO	85373172	OFICIAL 3	$ 1.972.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	RICARDO ALFONSO PEREZ GAVIRIA	1073984096	CAPATAZ	$ 3.504.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	PEDRO MIGUEL OLMOS GONZALEZ	1103117633	GESTOR AMBIENTAL	$ 4.436.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	RICARDO LONDOÑO MORENO	16894151	GESTOR SSL	$ 5.642.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
50	SUREYS VANESSA MONSALVO GARCIA	1065615031	SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	ANA MILENA ALBARRACIN PAYARES	39057652	PROFESIONAL SOCIO PREDIAL	$ 2.844.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
52	FREDI RAFAEL MORALES GUTIERREZ	1083569122	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
53	ELIANA JIMENEZ URIBE	1098356916	GESTORA SSL	$ 5.199.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
54	JORGE ANDRES MEJIA LOPEZ	1085225414	PROMOTOR SOCIAL	$ 2.598.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
55	EDWANS YEUSENS ZUÑIGA RESTREPO	1083556713	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
56	JULIO CESAR URUETA NORIEGA	12637898	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	RONNY RUIZ DA COSTA	15877434	ASISTENTE MANTENIMIENTO	$ 1.872.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
58	ELIECER JOSE BLANCO JIMENEZ	1083454506	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
59	JORGE ELIAS CHAVARRIA CARVAJAL	70579768	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
60	JAIBERTH DARIO AREIZA SOSSA	70582361	LUBRICADOR	$ 2.209.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
61	JORGE LUIS RODRIGUEZ MENDOZA	9876342	AYUDANTE MOVIMIENTO DE TIERRAS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	WILLIAM ANCIZAR JIMENEZ RESTREPO	1044120126	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

No.	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.907.526,00	$ 202.400,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 116.400,00	PROTECCION	9483082389	$ 465.300,00	$ 2.907.526,00			
2	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.238.261,00	$ 155.800,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 89.600,00	PORVENIR	9483082389	$ 358.200,00	$ 2.238.261,00			
3	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.096.466,00	$ 141.300,00	V	SURA	9483082389	$ 81.300,00	PORVENIR	9483082389	$ 332.900,00	$ 2.096.466,00			
4	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.491.065,00	$ 103.800,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 59.700,00	PORVENIR	9483082389	$ 238.600,00	$ 1.491.065,00			
5	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.886.451,00	$ 131.300,00	V	COOSALUD	9483082389	$ 75.500,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 301.900,00	$ 1.886.451,00			
6	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.699.302,00	$ 304.200,00	V	SURA	9483082389	$ 228.000,00	COLFONDOS	9483082389	$ 969.400,00	$ 5.699.302,00			
7	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.221.900,00	$ 284.100,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 169.000,00	PROTECCION	9483082389	$ 675.600,00	$ 4.221.900,00			
8	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.949.577,00	$ 135.700,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 78.000,00	PORVENIR	9483082389	$ 312.000,00	$ 1.949.577,00			
9	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 7.298.304,00	$ 493.300,00	V	SURA	9483082389	$ 292.000,00	PROTECCION	9483082389	$ 1.241.100,00	$ 7.298.304,00			
10	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 7.451.000,00	$ 518.600,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 298.100,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 1.266.800,00	$ 7.451.000,00			
11	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.269.950,00	$ 366.800,00	V	COMPENSAR	9483082389	$ 210.800,00	PORVENIR	9483082389	$ 843.200,00	$ 5.269.950,00			
12	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.956.025,00	$ 136.200,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 78.300,00	PORVENIR	9483082389	$ 313.000,00	$ 1.956.025,00			
13	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.092.701,00	$ 145.700,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 83.800,00	PROTECCION	9483082389	$ 334.900,00	$ 2.092.701,00			
14	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.427.429,00	$ 169.000,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 97.100,00	PORVENIR	9483082389	$ 388.400,00	$ 2.427.429,00			
15	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.827.084,00	$ 127.200,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 73.100,00	COLFONDOS	9483082389	$ 292.400,00	$ 1.827.084,00			
16	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 8.009.199,00	$ 505.300,00	V	SANITAS	9483082389	$ 320.600,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 1.362.300,00	$ 8.009.199,00			
17	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.377.085,00	$ 235.100,00	V	SALUDTOTAL	9483082389	$ 135.100,00	PORVENIR	9483082389	$ 540.400,00	$ 3.377.085,00			
18	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.844.568,00	$ 384.000,00	V	SANITAS	9483082389	$ 233.900,00	PROTECCION	9483082389	$ 994.100,00	$ 5.844.568,00			
19	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.994.135,00	$ 278.000,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 159.800,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 639.100,00	$ 3.994.135,00			
20	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.474.035,00	$ 172.200,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 99.000,00	PORVENIR	9483082389	$ 639.100,00	$ 2.474.035,00			
21	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.468.649,00	$ 171.900,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 98.800,00	COLFONDOS	9483082389	$ 395.900,00	$ 2.468.649,00			
22	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.539.717,00	$ 176.800,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 101.600,00	PORVENIR	9483082389	$ 395.000,00	$ 2.539.717,00			
23	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.697.775,00	$ 187.800,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 108.000,00	PORVENIR	9483082389	$ 406.400,00	$ 2.697.775,00			
24	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.888.983,00	$ 201.100,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 115.600,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 431.700,00	$ 2.888.983,00			
25	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.771.280,00	$ 401.700,00	V	SURA	9483082389	$ 230.900,00	PORVENIR	9483082389	$ 462.300,00	$ 5.771.280,00			
26	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.535.634,00	$ 176.500,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 101.500,00	PÓRVENIR	9483082389	$ 405.800,00	$ 2.535.634,00			
27	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.847.538,00	$ 198.200,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 114.000,00	PORVENIR	9483082389	$ 405.800,00	$ 2.847.538,00			
28	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.395.257,00	$ 236.400,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 135.900,00	PROTECCION	9483082389	$ 455.700,00	$ 3.395.257,00			
29	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.629.805,00	$ 113.500,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 65.200,00	PORVENIR	9483082389	$ 543.300,00	$ 1.629.805,00			
30	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.905.170,00	$ 132.600,00	V	COOSALUD	9483082389	$ 76.300,00	PORVENIR	9483082389	$ 260.800,00	$ 1.905.170,00			
31	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.351.883,00	$ 233.300,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 134.100,00	COLFONDOS	9483082389	$ 304.900,00	$ 3.351.883,00			
32	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.313.328,00	$ 230.700,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 132.600,00	PÓRVENIR	9483082389	$ 536.400,00	$ 3.313.328,00			
33	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.046.110,00	$ 281.700,00	V	SURA	9483082389	$ 161.900,00	PORVENIR	9483082389	$ 530.200,00	$ 4.046.110,00			
34	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.625.979,00	$ 310.700,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 185.100,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 740.300,00	$ 4.625.979,00			
35	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.868.346,00	$ 130.100,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 74.800,00	PORVENIR	9483082389	$ 740.300,00	$ 1.868.346,00			
36	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.831.276,00	$ 405.900,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 233.300,00	PORVENIR	9483082389	$ 299.000,00	$ 5.831.276,00			
37	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.958.032,00	$ 136.300,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 78.400,00	PORVENIR	9483082389	$ 933.100,00	$ 1.958.032,00			
38	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.095.228,00	$ 145.900,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 83.900,00	PORVENIR	9483082389	$ 313.300,00	$ 2.095.228,00			
39	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.909.244,00	$ 132.900,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 76.400,00	PORVENIR	9483082389	$ 305.500,00	$ 1.909.244,00			
40	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.781.954,00	$ 114.200,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 71.300,00	PORVENIR	9483082389	$ 305.500,00	$ 1.781.954,00			
41	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.933.330,00	$ 134.600,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 77.400,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 285.200,00	$ 1.933.330,00			
42	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.609.335,00	$ 181.700,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 104.400,00	PORVENIR	9483082389	$ 309.400,00	$ 2.609.335,00			
43	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.016.626,00	$ 140.400,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 80.700,00	PORVENIR	9483082389	$ 417.500,00	$ 2.016.626,00			
44	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.847.766,00	$ 128.700,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 74.000,00	PORVENIR	9483082389	$ 322.700,00	$ 1.847.766,00			
45	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.816.602,00	$ 312.900,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 192.900,00	PORVENIR	9483082389	$ 295.700,00	$ 4.816.602,00			
46	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.480.138,00	$ 166.900,00	V	SALUDTOTAL	9483082389	$ 96.000,00	PORVENIR	9483082389	$ 770.700,00	$ 2.480.138,00			
47	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.253.772,00	$ 296.100,00	V	SURA	9483082389	$ 170.200,00	COLFONDOS	9483082389	$ 393.600,00	$ 4.253.772,00			
48	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 4.436.802,00	$ 288.300,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 177.700,00	PORVENIR	9483082389	$ 680.700,00	$ 4.436.802,00			
49	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.642.300,00	$ 392.800,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 225.700,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 710.000,00	$ 5.642.301,00			
50	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.649.146,00	$ 114.800,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 66.000,00	PORVENIR	9483082389	$ 902.800,00	$ 1.649.146,00			
51	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.844.801,00	$ 184.800,00	V	FAMISANAR	9483082389	$ 113.900,00	PORVENIR	9483082389	$ 263.900,00	$ 1.649.146,00			
52	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.837.141,00	$ 127.900,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 73.500,00	PROTECCION	9483082389	$ 546.700,00	$ 1.837.141,00			
53	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 5.199.300,00	$ 361.900,00	V	SANITAS	9483082389	$ 208.000,00	PORVENIR	9483082389	$ 294.000,00	$ 5.199.300,00			
54	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.416.520,00	$ 237.800,00	V	SURA	9483082389	$ 136.700,00	PROTECCION	9483082389	$ 546.700,00	$ 3.416.520,00			
55	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.283.989,00	$ 209.100,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 122.100,00	PROTECCION	9483082389	$ 546.700,00	$ 3.283.989,00			
56	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.128.803,00	$ 148.200,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 85.200,00	PORVENIR	9483082389	$ 516.300,00	$ 2.128.803,00			
57	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.312.870,00	$ 161.000,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 92.600,00	PORVENIR	9483082389	$ 340.700,00	$ 2.312.870,00			
58	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.783.244,00	$ 124.200,00	V	FAMISANAR	9483082389	$ 71.400,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 370.100,00	$ 1.783.244,00			
59	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.310.917,00	$ 230.500,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 132.500,00	PORVENIR	9483082389	$ 529.800,00	$ 3.310.917,00			
60	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.243.909,00	$ 225.800,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 129.800,00	PORVENIR	9483082389	$ 519.100,00	$ 3.243.909,00			
61	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.361.515,00	$ 164.400,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 94.500,00	PORVENIR	9483082389	$ 377.900,00	$ 2.361.515,00			
62	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.069.948,00	$ 213.700,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 122.800,00	PROTECCION	9483082389	$ 491.200,00	$ 3.069.948,00			

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		
FECHA	24/03/2025 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2025 **PROYECTO:** CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
63	DELVER ALFONSO NORIEGA GUTIERREZ	85372053	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.175.776,00	$ 202.300,00	V	NUEVA EPS	9483082389	$ 122.500,00	PORVENIR	9483082389	$ 503.600,00	$ 3.175.776,00			
64	SAMIR JOSE ACOSTA CANTILLO	1004381051	OFICIAL 2	$ 2.361.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.986.100,00	$ 207.900,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 119.500,00	COLFONDOS	9483082389	$ 503.600,00	$ 2.986.100,00			
65	JAIDER LUIS GARIZABALO MANGA	1004377309	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.079.806,00	$ 141.500,00	V	SANITAS	9483082389	$ 83.200,00	PORVENIR	9483082389	$ 332.800,00	$ 2.079.806,00			
66	JOSE LUIS FLOREZ OROZCO	1083568241	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.527.436,00	$ 164.400,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 94.500,00	PORVENIR	9483082389	$ 397.800,00	$ 2.527.436,00			
67	JHOINER FABIAN CUESTA SANTAMARIA	1221982081	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.725.307,00	$ 115.800,00	V	FAMISANAR	9483082389	$ 66.600,00	PROTECCIÓN	9483082389	$ 273.700,00	$ 1.725.307,00			
68	LUIS GUILLERMO OROZCO FONTALVO	1083469287	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.882.993,00	$ 118.300,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 68.000,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 294.000,00	$ 1.882.993,00			
69	DAIVER FELIPE ROBLES GARCIA	1083605084	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.102.448,00	$ 133.200,00	V	FAMISANAR	9483082389	$ 84.200,00	PORVENIR	9483082389	$ 336.500,00	$ 2.102.448,00			
70	ANDERSON YUCETH MIRANDA LEYVA	1221982474	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.460.438,00	$ 171.300,00	V	CAJA ACOPI	9483082389	$ 98.500,00	PORVENIR	9483082389	$ 393.700,00	$ 2.460.438,00			
71	JHON KEINER LEIVA DE LA CRUZ	1082404512	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 1.895.680,00	$ 132.000,00	V	MUTUAL SER	9483082389	$ 75.900,00	PORVENIR	9483082389	$ 303.400,00	$ 1.895.680,00			
72	HUGO ALBERTO BASTIDAS HORMECHE	9022872	CONDUCTOR TRACTOCAMIÓN EQUIPO	$ 2.855.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 3.705.243,00	$ 257.900,00	V	CAJA ACOPI	9483082389	$ 148.300,00	PORVENIR	9483082389	$ 592.900,00	$ 3.705.243,00			
73	KEVIN ENRIQUE COBO PITRE	17815478	OPERADOR PLANTA TRITURACION	$ 2.496.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.685.699,00	$ 154.000,00	V	SANITAS	9483082389	$ 88.500,00	COLFONDOS	9483082389	$ 410.900,00	$ 2.685.699,00			
74	ELKIN YAIR ALMANZA PAYARES	1063957794	ALMACENISTA	$ 2.459.700,00				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 2.839.795,00	$ 197.700,00	V	SALUD TOTAL	9483082389	$ 113.600,00	PORVENIR	9483082389	$ 592.900,00	$ 3.705.243,00			
75	CARLOS ARTURO CARDONA PATIÑO	8409569	OPERADOR DE GRÚA	$ 3.473.200,00																								X	X	X	X	X	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	$ 551.182,00	$ 38.400,00	V	SURA	9483082389	$ 22.100,00	COLPENSIONES	9483082389	$ 410.900,00	$ 2.685.699,00			
76	CONRADO HERNAN LOPERA PALACIO	15507099	DIRECTOR DE PROYECTO	$ 21.856.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 24.271.000,00	$ 1.689.300,00	V	SURA	9483081204	$ 3.033.900,00	COLPENSIONES	9483081204	$ 4.223.300,00	$ 24.271.000,00	$ 485.500,00	$ 728.200,00	
77	MARGARETH SOLENA CRUZ GONZALEZ	52155687	AUDITOR INTERNO CALIDAD	$ 12.030.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 12.030.600,00	$ 837.400,00	V	COMPENSAR	9482712713	$ 481.300,00	COLPENSIONES	9482712713	$ 1.924.900,00	$ 481.300,00			
78	JORGE SERAFIN PASOS GARCIA	1051417591	PROFESIONAL OFICINA TÉCNICA	$ 5.699.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 5.699.301,00	$ 370.300,00	V	SANITAS	9483081204	$ 228.000,00	COLPENSIONES	9483081204	$ 999.100,00	$ 5.699.301,00			
79	WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO	7698946	DIRECTOR DE OBRA	$ 12.666.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 15.081.501,00	$ 1.049.700,00	V	SURA	9483081204	$ 1.885.200,00	PORVENIR	9483081204	$ 2.564.100,00	$ 15.081.501,00	$ 301.700,00	$ 452.600,00	
80	MILTON JESUS SALAMANCA GARCIA	17449252	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.982.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.447.822,00	$ 170.400,00	V	NUEVA EPS	9483081204	$ 98.000,00	PORVENIR	9483081204	$ 391.700,00	$ 4.938.098,00			
81	RONNY LEANDRO GRANADOS CELIS	17449382	CONDUCTOR TRACTO CAMIÓN MATERIA	$ 2.855.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.381.597,00	$ 305.000,00	V	SALUD TOTAL	9483081204	$ 175.300,00	PORVENIR	9483081204	$ 701.100,00	$ 8.589.561,00			
82	JUAN MIGUEL CERPA DEL VALLE	85372869	OPERADOR EXCAVADORA	$ 2.656.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.381.597,00	$ 305.000,00	V	SALUD TOTAL	9483081204	$ 175.300,00	COLPENSIONES	9483081204	$ 583.800,00	$ 7.094.464,00			
83	MILLER SIMON OVIEDO SIERRA	1140851190	OPERADOR MOTONIVELADOR SERIADOS	$ 2.975.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.705.899,00	$ 258.000,00	V	MUTUAL SER	9483081204	$ 148.300,00	PORVENIR	9483081204	$ 593.000,00	$ 7.145.081,00			
84	DAVID ENRIQUE RUIZ CORREA	12626612	ELECTRICISTA INDUSTRIAL	$ 3.207.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.899.337,00	$ 271.400,00	V	NUEVA EPS	9483081204	$ 156.000,00	PORVENIR	9483081204	$ 623.900,00	$ 3.899.337,00			
85	MARLON ALONSO MURCIA	85477989	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	$ 1.982.100,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.562.366,00	$ 178.400,00	V	SURA	9483081204	$ 102.500,00	PORVENIR	9483081204	$ 410.000,00	$ 5.090.133,00			
86	DEIBIS DE JESUS HERNANDEZ GALAN	85370303	MECANICO 2	$ 2.639.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.397.658,00	$ 236.500,00	V	SALUDTOTAL	9483081204	$ 136.000,00	PORVENIR	9483081204	$ 543.700,00	$ 3.397.658,00			
87	JEISON DAVID MELGAREJO CARBONO	85370470	OPERADOR CARGADOR	$ 2.633.400,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.679.674,00	$ 186.600,00	V	MUTUAL SER	9483081204	$ 107.200,00	PORVENIR	9483081204	$ 428.800,00	$ 5.206.537,00			
88	JUAN CARLOS BLANCO CAMPO	72727942	OPERADOR BULLDOZER	$ 2.656.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.562.366,00	$ 186.600,00	V	NUEVA EPS	9483081204	$ 116.000,00	PORVENIR	9483081204	$ 464.000,00	$ 5.591.136,00			
89	ADAN JEISON DIAZ VARELA	1231963812	OPERADOR RETROCARGADOR	$ 2.496.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.679.674,00	$ 201.900,00	V	NUEVA EPS	9483081204	$ 116.000,00	COLPENSIONES	9483081204	$ 484.400,00	$ 5.960.778,00			
90	JORGE LUIS ORTIZ SAENZ	10773597	AUXILIAR DE LABORATORIO	$ 2.078.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.786.246,00	$ 210.700,00	V	SALUDTOTAL	9483081204	$ 107.900,00	PROTECCION	9483081204	$ 447.900,00	$ 4.823.910,00			
91	ELKIN DARIO URREA ESCOBAR	71005867	MECANICO 1	$ 3.745.800,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.833.215,00	$ 187.700,00	V	SURA	9483081204	$ 193.400,00	PORVENIR	9483081204	$ 773.500,00	$ 4.603.366,00			
92	WILBER QUINTANA MERCADO	1044909435	CONDUCTOR VEHICULO LIVIANO	$ 1.561.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.279.013,00	$ 277.000,00	V	NUEVA EPS	9483081204	$ 91.200,00	COLPENSIONES	9483081204	$ 364.700,00	$ 4.619.677,00			
93	JOSE LEVER VARGAS CARDONA	10179924	SOLDADOR 1 METALMECANICA	$ 3.303.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.035.838,00	$ 158.700,00	V	COOSALUD	9483081204	$ 155.400,00	PORVENIR	9483081204	$ 639.700,00	$ 9.102.183,00			
94	JOSE LUIS GALAN CABANA	85370483	SOLDADOR 1 METALMECANICA	$ 3.303.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.499.224,00	$ 270.300,00	V	SANITAS	9483081204	$ 180.000,00	PORVENIR	9483081204	$ 719.900,00	$ 6.124.358,00			
95	JOEL ANTONIO CACERES CALVO	12448406	OPERADOR DE BULLDOZER	$ 2.656.900,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.287.433,00	$ 313.200,00	V	MUTUAL SER	9483081204	$ 131.500,00	PROTECCION	9483081204	$ 526.000,00	$ 5.414.105,00			
96	JHON CARLOS GOMEZ MEJIA	7561577	DIRECTOR DE OBRA	$ 16.636.700,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 19.051.701,00	$ 1.326.000,00	V	SALUD TOTAL	9483081204	$ 2.381.500,00	PROTECCION	9483081204	$ 3.238.900,00	$ 19.051.701,00	$ 381.100,00	$ 452.500,00	
97	ENDERSON ENRIQUE LLORENTE CERVANTES	85370808	SOLDADOR METALMECANICA 3	$ 2.459.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.720.657,00	$ 1.326.000,00	V	SURA	9483081204	$ 188.900,00	PORVENIR	9483081204	$ 755.400,00	$ 7.942.356,00			
98	JESUS DAVID GONZALEZ POLO	1065573721	SOLDADOR RECONSTRUCCION MAQUINA	$ 2.459.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.484.919,00	$ 328.600,00	V	FAMISANAR	9483081204	$ 139.400,00	COLPENSIONES	9483081204	$ 557.600,00	$ 6.034.089,00			
99	FRAYNES RIQUETT GUTIERREZ	85480703	ELECTROAUTO	$ 3.336.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.939.731,00	$ 242.600,00	V	SALUD TOTAL	9483081204	$ 157.600,00	COLFONDOS	9483081204	$ 630.400,00	$ 6.512.990,00			
100	WILLMAR ENRIQUE VILLA GARCIA	19615230	CONDUCTOR TRACTO CAMIÓN	$ 2.855.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.205.731,00	$ 274.300,00	V	SALUD TOTAL	9483081204	$ 168.300,00	PROTECCIÓN	9483081204	$ 673.000,00	$ 4.205.731,00			
101	YEIFRAN EDUARDO LASCARRO OCHOA	85372803	OFICIAL 2	$ 2.361.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.946.744,00	$ 292.800,00	V	NUEVA EPS	9483081204	$ 117.900,00	PORVENIR	9483081204	$ 471.500,00	$ 4.488.677,00			
102	LUIS FELIPE ROZO TRIANA	16161341	OPERADOR PERFORADOR HIDRÁULICO	$ 2.633.200,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.195.406,00	$ 205.100,00	V	MUTUAL SER	9483081204	$ 95.500,00	PORVENIR	9483081204	$ 479.100,00	$ 4.595.130,00			
103	JANER ALFONSO GUTIERREZ CANTILLO	1083463299	AYUDANTE OFICIOS VARIOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 1.449.289,00	$ 166.200,00	V	NUEVA EPS	9483081204	$ 58.000,00	COLPENSIONES	9483081204	$ 231.900,00	$ 1.449.289,00			
104	ROBINSON ACOSTA CASTILLO	12633570	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.660.300,00	$ 185.200,00	V	NUEVA EPS	9483081204	$ 58.000,00	PORVENIR	9483081204	$ 425.700,00	$ 2.660.301,00			
105	BELKY YURLEY ROA CONTRERAS	1094366829	ESPECIALISTA AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 7.076.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 9.062.991,00	$ 630.800,00	V	NUEVA EPS	9483081204	$ 362.600,00	PORVENIR	9483081204	$ 1.540.900,00	$ 9.062.991,00			
106	LEIVER VELASQUEZ SUAREZ	1068810899	OFICIAL 1	$ 2.660.300,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 3.349.473,00	$ 233.200,00	V	COOSALUD	9483081204	$ 134.000,00	PROTECCIÓN	9483081204	$ 536.000,00	$ 3.349.473,00			
107	GLEINER DAVID JUVINAO CANTILLO	1221971529	AYUDANTE OBRA CONCRETOS	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 2.017.915,00	$ 140.500,00	V	SALUD TOTAL	9483081204	$ 80.800,00	PORVENIR	9483081204	$ 322.900,00	$ 3.338.249,00			
108	JOHN ALEXANDER FERNANDEZ RODRIGUEZ	80654499	MECANICO 1	$ 3.336.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.655.340,00	$ 246.500,00	V	NUEVA EPS	9483081204	$ 141.700,00	PORVENIR	9483081204	$ 566.700,00	$ 5.003.424,00			
109	HENRY GALLEGO QUINTERO	10188058	CONTRAMAESTRO	$ 3.414.600,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MINCIVIL S.A	$ 4.655.340,00	$ 324.100,00	V	SALUD TOTAL	9483081204	$ 186.300,00	PORVENIR	9483081204	$ 744.900,00	$ 4.655.340,00			
110	JULIAN ANDRES LONDOÑO HENAO	8161615	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA	$ 8.800.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	LYL INGENIEROS CONSULTORES	$ 8.800.000,00	$ 46.000,00	I	SURA	76652792	$ 352.000,00	PROTECCION	76652792	$ 1.408.000,00	$ 352.000,00			
111	NEIMAR ARLEY CASTAÑO PELAEZ	79758293	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	$ 12.000.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	GEOTERRA CONSULTORES	$ 12.000.000,00	$ 835.200,00	V	SURA	76581783	$ 480.000,00	PROTECCION	76581783	$ 1.920.000,00	$ 480.000,00			
112	CARLOS MARIO MUÑOZ BERRIO	98461736	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONDUCTORES	$ 1.423.500,00	$ 99.076,00	V	SURA	76338257	$ 178.000,00	COLPENSIONES	76338257	$ 227.760,00	$ 56.940,00			
113	ANDRES CAMILO ESCORCIA	1065137389	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONDUCTORES	$ 1.423.500,00	$ 99.076,00	V	SALUD TOTAL	76357844	$ 178.000,00	PORVENIR	76357844	$ 227.760,00	$ 56.940,00			
114	WUILMER JOSE VILLA BONETT	73428038	CONDUCTOR	$ 1.423.500,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONDUCTORES	$ 1.423.500,00	$ 99.076,00	V	COOSALUD	76228662	$ 178.000,00	COLPENSIONES	76228662	$ 227.760,00	$ 56.940,00			
115	JHON JAIRO AMARANTO CAMARGO	1004383194	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.516.337,00	$ 89.100,00	V	MUTUALSER	75421829	$ 60.700,00	PROTECCION	75421829	$ 242.700,00	$ 60.700,00			
116	YORDAN JULIAN CHARRIS ACOSTA	1221971396	OFICIAL DE PRIMERA	$ 1.730.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.834.000,00	$ 42.600,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 73.500,00	PORVENIR	74160548	$ 293.700,00	$ 36.800,00			
117	OSCAR DAVID ACOSTA DE AVILA	1083465706	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.473.787,00	$ 86.100,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 59.000,00	PORVENIR	74160548	$ 235.900,00	$ 59.000,00			
118	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LA CRUZ	1083569120	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.496.996,00	$ 87.700,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 59.900,00	PORVENIR	74160548	$ 239.600,00	$ 59.900,00			
119	SERGIO JAVIER MUNIVE FELIPE	1004164375	CONDUCTOR	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.822.979,00	$ 107.200,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 73.000,00	PORVENIR	74160548	$ 291.800,00	$ 73.000,00			
120	JEINER JOSE TONCEL HERNANDEZ	1004376695	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.746.367,00	$ 102.100,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 70.000,00	PORVENIR	74160548	$ 279.500,00	$ 70.000,00			
121	LESWIN YAMID MARTINEZ OROZCO	1080421433	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.531.810,00	$ 90.200,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 61.300,00	PROTECCION	74160548	$ 245.200,00	$ 61.300,00			
122	FELIX DE JESUS PAREJO BONETT	12635288	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.520.205,00	$ 89.300,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 60.900,00	PORVENIR	74160548	$ 243.300,00	$ 60.900,00			
123	ANSELMO NOVA CALDERON	1100221757	OFICIAL 1RA	$ 1.950.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 2.433.112,00	$ 143.400,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 50.400,00	PORVENIR	74160548	$ 389.400,00	$ 97.400,00			
124	ARMANDO MANUEL VASQUEZ BLANCO	1083463669	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.496.996,00	$ 87.700,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 59.900,00	PORVENIR	74160548	$ 239.600,00	$ 59.900,00			
125	GEIVERE GUTIERREZ BELEÑO	85491134	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.485.392,00	$ 86.900,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 59.500,00	COLPENSIONES	74160548	$ 237.800,00	$ 59.500,00			
126	EDUARDO DAVID NAVARRO LOPEZ	1221966632	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.574.369,00	$ 93.100,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 63.000,00	PROTECCION	74160548	$ 252.000,00	$ 63.000,00			

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
VERSIÓN	1	
PÁGINA		
FECHA	24/03/2025 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2025 **PROYECTO:** CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Ingreso Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
127	ELEAR MANUEL PATERNINA HERNANDE	65626456	OFICIAL DE PRIMERA	$ 1.730.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.911.821,00	$ 111.800,00	V	SAVIA SALUD	74160548	$ 76.600,00	PORVENIR	74160548	$ 306.000,00	$ 76.600,00			
128	GABRIEL OMAR PERTUZ FANDIÑO	1004162890	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.570.492,00	$ 92.800,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 62.900,00	PORVENIR	74160548	$ 251.400,00	$ 62.900,00			
129	YERIS ALBERTO ECHEVERRIA VILLAMIL	1123993361	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.583.965,00	$ 93.900,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 63.500,00	COLFONDOS	74160548	$ 253.800,00	$ 63.500,00			
130	VICTOR ALFONSO GIL MARTINEZ	85373138	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.531.810,00	$ 90.200,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 61.300,00	COLFONDOS	74160548	$ 245.200,00	$ 61.100,00			
131	FABIAN OLMEDO GARCIA LOPEZ	1151186290	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.543.415,00	$ 91.000,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 61.800,00	PROTECCION	74160548	$ 247.000,00	$ 61.800,00			
132	LUIS CARLOS SALCEDO IBARRA	1221968309	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.477.655,00	$ 86.400,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 59.200,00	PORVENIR	74160548	$ 236.500,00	$ 59.200,00			
133	LUIS MIGUEL COHEN BARCELO	1080421255	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.477.655,00	$ 86.400,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 59.200,00	PORVENIR	74160548	$ 236.500,00	$ 59.200,00			
134	TEYSON MANUEL FONSECA VIDAL	1083469627	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.477.050,00	$ 86.300,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 59.100,00	PORVENIR	74160548	$ 236.400,00	$ 59.100,00			
135	ANTONNY JOSE BRAVO SANCHEZ	1080424693	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.446.710,00	$ 84.200,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 57.900,00	PROTECCION	74160548	$ 231.600,00	$ 57.900,00			
136	JESUS EMILIO PARRA GALEANO	70926744	ENCARGADO DE OBRA	$ 2.498.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 3.450.000,00	$ 203.900,00	V	HUMANA VIVIR	74160548	$ 138.100,00	COLPENSIONES	74160548	$ 552.100,00	$ 138.100,00			
137	LUIS ALBERTO RODELO RODRIGUEZ	1003199009	AUX. DE ALMACEN	$ 1.700.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.973.209,00	$ 117.900,00	V	COOSALUD	74160548	$ 79.000,00	PROTECCION	74160548	$ 315.800,00	$ 79.000,00			
138	ANGI BIBIANA ROA ARANDIA	1073248943	AUX. ADMINISTRATIVA	$ 1.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 2.095.165,00	$ 127.900,00	V	FAMISANAR	74160548	$ 83.900,00	PROTECCION	74160548	$ 335.300,00	$ 83.900,00			
139	ABEL ENRIQUE CAMARGO PACHECO	1004324752	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.575.134,00	$ 103.100,00	V	FAMISANAR	74160548	$ 63.100,00	PROTECCION	74160548	$ 252.100,00	$ 63.100,00			
140	FANESY DE JESUS MATINEZ MORALES	1080420444	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.518.503,00	$ 89.200,00	V	FAMISANAR	74160548	$ 60.800,00	PROTECCION	74160548	$ 243.100,00	$ 60.800,00			
141	BYRON MARCELO CERVANTES NARVAE	1083555074	OFICIAL DE SEGUNDA CATEGORIA	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.555.019,00	$ 81.900,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 62.300,00	PROTECCION	74160548	$ 248.900,00	$ 56.600,00			
142	MALORY FABIAN PAZ HERNANDEZ	193244808	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.466.051,00	$ 85.600,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 58.700,00	PORVENIR	74160548	$ 234.700,00	$ 58.700,00			
143	PEDRO JUAN MARTINEZ AHUMADO	1083465249	OFICIAL DE SEGUNDA CATEGORIA	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.911.821,00	$ 111.800,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 76.600,00	PROTECCION	74160548	$ 306.000,00	$ 76.600,00			
144	IVAN CAMILO RIVERO RIVAS	1004375872	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 593.375,00	$ 4.200,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 2.400,00	PROTECCION	74160548	$ 9.500,00	$ 23.800,00			
145	ALDAIR DE JESUS GARIZABALO SANDO	1083452688	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.481.523,00	$ 86.700,00	V	COOSALUD	74160548	$ 59.300,00	PROTECCION	74160548	$ 237.100,00	$ 59.300,00			
146	YESID ALFONSO MENDOZA PALMA	85372741	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.520.205,00	$ 89.300,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 60.900,00	PORVENIR	74160548	$ 243.300,00	$ 60.900,00			
147	WALDIR JUNIOR PERTUZ FANDIÑO	1082415327	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																TOCCI S.A.S	$ 980.795,00	$ 39.100,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 32.000,00	PORVENIR	74160548	$ 127.800,00	$ 39.300,00			
148	DIOGENES JUNIOR FRANCO HERNANDE	1004370254	AUXILIAR INGENIRIA	$ 1.350.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 3.313.000,00	$ 192.200,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 132.600,00	PORVENIR	74160548	$ 530.200,00	$ 132.600,00			
149	PEDRO ENRIQUE ALMARALES MATOS	1143236002	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.508.601,00	$ 88.500,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 60.400,00	PORVENIR	74160548	$ 241.500,00	$ 60.400,00			
150	DEIMER ALBERTO PALACIO PERTUZ	1221963468	OFICIAL DE PRIMERA	$ 1.730.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.911.821,00	$ 111.800,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 76.600,00	PORVENIR	74160548	$ 306.000,00	$ 76.600,00			
151	RICHARD MANUEL PEÑA ROA	12447970	OFICIAL DE PRIMERA	$ 1.730.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.862.435,00	$ 106.400,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 74.600,00	PORVENIR	74160548	$ 298.100,00	$ 74.600,00			
152	OSCAR DANILO GUTIERREZ GUTIERREZ	1192894931	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.555.019,00	$ 91.800,00	V	MUTUALSER	74160548	$ 62.300,00	PORVENIR	74160548	$ 248.900,00	$ 62.300,00			
153	JESUS DAVID TETE RIVAS	1004383024	AYUDANTE	$ 13.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.496.996,00	$ 87.700,00	V	COOSALUD	74160548	$ 59.000,00	PORVENIR	74160548	$ 239.600,00	$ 59.900,00			
154	DIEGO ANDRES CASTRO BARRIOS	1065139222	OFICIAL DE PRIMERA	$ 1.730.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.911.821,00	$ 111.800,00	V	SALUD TOTAL	74160548	$ 76.600,00	PORVENIR	74160548	$ 306.000,00	$ 76.600,00			
155	ZAMIR FABIAN PEREZ GUILLOT	1083463630	OFICIAL DE SEGUNDA CATEGORIA	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.911.821,00	$ 111.800,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 76.600,00	PORVENIR	74160548	$ 306.000,00	$ 76.600,00			
156	HECTOR EMILIO ASCENCIO HERNANTEZ ASCENCIO	1083468387	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.466.051,00	$ 85.600,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 58.700,00	COLFONDOS	74160548	$ 234.700,00	$ 58.700,00			
157	DAYANA PAOLA AYALA ESCORCIA	1083016702	SST	$ 2.450.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 2.790.337,00	$ 164.700,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 111.700,00	PROTECCION	74160548	$ 446.600,00	$ 111.700,00			
158	DAINER JOSE GONZALEZ ORTEGA	85490185	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.535.678,00	$ 90.400,00	V	NUEVA EPS	74160548	$ 61.500,00	PORVENIR	74160548	$ 245.800,00	$ 61.500,00			
159	KEVIN ANDRES VILLA FINCE	1082855752	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																TOCCI S.A.S	$ 995.930,00	$ 39.900,00	V	COOSALUD	74160548	$ 32.400,00	PORVENIR	74160548	$ 129.600,00	$ 39.900,00			
160	WALDIR RAFAEL SERNA BRAVO	1082404379	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.566.624,00	$ 1.566.624,00	V	COOSALUD	74160548	$ 92.500,00	PORVENIR	74160548	$ 250.700,00	$ 62.700,00			
161	VICTOR DANILO PACHECO NIETO	1082406790	AYUDANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	TOCCI S.A.S	$ 1.539.547,00	$ 90.700,00	V	COOSALUD	74160548	$ 61.600,00	PORVENIR	74160548	$ 246.400,00	$ 61.600,00			
162	BARRIOS PEREZ JADER JESUS	1233504033	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.815.407,00	$ 79.000,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 72.700,00	PROTECCION	9482928888	$ 290.500,00	$ 72.700,00			
163	BARRIOS SILVA MIGUEL ANTONIO	85370443	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.981.100,00	$ 86.200,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 79.300,00	PORVENIR	9482928888	$ 317.000,00	$ 79.300,00			
164	BOTTO MONSALVO CARLOS ANDRES	1082885589	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.719.155,00	$ 74.800,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 68.800,00	PORVENIR	9482928888	$ 275.100,00	$ 68.800,00			
165	CABALLERO ARIZA JESUS CONCEPCION	1004322360	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.788.790,00	$ 77.900,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 71.600,00	PORVENIR	9482928888	$ 286.300,00	$ 71.600,00			
166	CANDANOZA GUERRERO WISMAR JOSE	1065583729	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.897.540,00	$ 82.600,00	IV	Mutual Ser	9482928888	$ 76.000,00	PORVENIR	9482928888	$ 303.700,00	$ 76.000,00			
167	CANTILLO VALERA DAVID ALFONSO	12449538	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.032.613,00	$ 79.600,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 81.400,00	COLFONDOS	9482928888	$ 325.300,00	$ 79.600,00			3 dias vacaciones
168	CASTILLO TORRES EMEL DAVID	1193593260	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.756.993,00	$ 76.500,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 70.300,00	PORVENIR	9482928888	$ 281.200,00	$ 70.300,00			
169	FONSECA VARGAS LEONEL	91044843	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.095.528,00	$ 91.200,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	9482928888	$ 83.900,00	PROTECCION	9482928888	$ 335.300,00	$ 83.900,00			
170	GOMEZ RANGEL MIKE JAVIER	7141780	COORDINADOR DE RIESGOS	$ 3.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 3.471.600,00	$ 151.100,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 138.900,00	COLPENSIONES	9482928888	$ 555.500,00	$ 138.900,00			
171	HERNANDEZ AHUMADA JAIDER RAFAEL	12449200	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.646.736,00	$ 71.700,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 65.900,00	PORVENIR	9482928888	$ 263.500,00	$ 65.900,00			
172	HERNANDEZ RODRIGUEZ ERASMO SANTIAGO	1080429827	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.906.923,00	$ 80.900,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	9482928888	$ 74.400,00	PORVENIR	9482928888	$ 303.300,00	$ 74.400,00			
173	HERRERA CONRADO JUAN DAVID	1004323783	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.791.848,00	$ 78.000,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 71.700,00	PORVENIR	9482928888	$ 286.700,00	$ 71.700,00			
174	LAZO OROZCO JOMMER ALBERTO	1221965542	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.716.642,00	$ 74.700,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 68.700,00	PORVENIR	9482928888	$ 274.700,00	$ 68.700,00			
175	LEON REVOLLEDO JAINER	1083554616	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.977.208,00	$ 76.800,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	9482928888	$ 79.200,00	PORVENIR	9482928888	$ 316.400,00	$ 76.900,00			3 dias vacaciones
176	MARMOL CODINA GEISON ATILIO	8508788	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.953.247,00	$ 85.000,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 78.200,00	PROTECCION	9482928888	$ 312.600,00	$ 78.200,00			
177	MARTINEZ FANDIÑO EDWIN JESUS	1083552672	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														SERACIS LTDA	$ 1.275.889,00	$ 55.600,00	IV	Mutual Ser	9482928888	$ 51.100,00	PORVENIR	9482928888	$ 204.200,00	$ 71.400,00			retiro / 20 DIAS
178	MARTINEZ VALDERRAMA CRISTIAN XAVIER	1083553580	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.017.290,00	$ 87.600,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 80.700,00	PORVENIR	9482928888	$ 322.800,00	$ 80.700,00			
179	MATEUS LOPEZ DAUSER SMICT	85372413	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.028.114,00	$ 78.300,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	9482928888	$ 81.200,00	PROTECCION	9482928888	$ 324.600,00	$ 78.300,00			3 dias vacaciones
180	MOLINA POLO FREYDHER DE JESUS	1004382587	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.897.539,00	$ 82.600,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	9482928888	$ 76.000,00	PORVENIR	9482928888	$ 303.700,00	$ 76.000,00			
181	MORALES MONSALVO IGNACIO SEGUNDO	12630773	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.008.954,00	$ 87.400,00	IV	Mutual Ser	9482928888	$ 80.400,00	PORVENIR	9482928888	$ 321.500,00	$ 80.400,00			
182	MORENO AVENDAÑO JULIO CESAR	1004376519	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.812.700,00	$ 78.900,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 72.600,00	PORVENIR	9482928888	$ 290.100,00	$ 72.600,00			
183	NIEBLES MELENDREZ VICTOR HUGO	85490212	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.953.247,00	$ 85.000,00	IV	NUEVA EPS	9482928888	$ 78.200,00	PORVENIR	9482928888	$ 312.600,00	$ 78.200,00			
184	PAREDES PACHECO WILLIAM	1084739566	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.067.674,00	$ 90.000,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 82.800,00	PORVENIR	9482928888	$ 330.900,00	$ 82.800,00			
185	PEÑA CORTES EDGAR JUNIOR	1083569107	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.543.074,00	$ 65.100,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	9482928888	$ 59.900,00	PORVENIR	9482928888	$ 245.000,00	$ 59.900,00			
186	PEREZ GUTIERREZ JESUS ANGEL	1083461605	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.715.288,00	$ 74.700,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 68.700,00	PORVENIR	9482928888	$ 274.500,00	$ 68.700,00			
187	ROBLES TEJADA MOISES DE JESUS	1002134064	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.923.191,00	$ 83.700,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 77.000,00	PORVENIR	9482928888	$ 307.800,00	$ 77.000,00			
188	ROJAS MORRON JOEL MOISES	1221981701	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.039.821,00	$ 88.600,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	9482928888	$ 81.600,00	PORVENIR	9482928888	$ 326.400,00	$ 81.600,00			
189	SALAS HERNANDEZ LUIS EDUARDO	1065125702	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.995.719,00	$ 83.500,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 79.900,00	PORVENIR	9482928888	$ 319.400,00	$ 79.000,00			vacaciones 1 dia
190	SANCHEZ NORIEGA HUGO ARISTIDES	1083460187	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.729.868,00	$ 75.300,00	IV	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE	9482928888	$ 69.200,00	PORVENIR	9482928888	$ 276.800,00	$ 69.200,00			
191	TAMAYO HOYOS DEIVIS BANES	1023893469	SUPERVISOR	$ 1.976.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 2.078.800,00	$ 144.700,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 83.200,00	PORVENIR	9482928888	$ 332.700,00	$ 83.200,00			
192	TOSCANO ABELLANEDA SEBASTIAN SEGUNDO	12627610	VIGILANTE	$ 1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	SERACIS LTDA	$ 1.839.200,00	$ 80.100,00	IV	SALUD TOTAL	9482928888	$ 73.600,00	PROTECCION	9482928888	$ 294.300,00	$ 73.600,00			

		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	24/03/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO NORTE-SUBDIRECCION MODERNIZACION CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE OBRA No: 981 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO DE 2025 **PROYECTO:** CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) – CIÉNAGA (VIADUCTOS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 977 DE 2022 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJAMAG

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																										Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 4/04/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente. el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CONRADO HERNANDO LOPERA PALACIO
Director de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: NEFTALI HERNANDEZ PADILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-09718 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión - INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PREACTA DE OBRA N°33

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	33	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 33 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
EXPLANACIONES									
1		200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
1,1	11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	0,49	$ 1.537.478,00	$ 753.364,00	
1,2	14101	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha		$ 1.537.478,00		
2	11604	201-13		Demolición de Estructuras	m3	40,22	$ 125.703,00	$ 5.055.775,00	
3	11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	16.892,99	$ 10.191,00	$ 172.156.461,00	
4	11601		220.1P	Terraplenes (incluye material seleccionado de cantera)	m3		$ 31.904,00		
Subtotal								**$ 177.965.600,00**	
BASES, SUBBASE Y AFIRMADOS									
5	11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		$ 145.679,00		
6	11602	330-13		Base granular clase A	m3		$ 161.149,00		
7	11602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3		$ 175.996,00		
Subtotal								$ -	
PAVIMENTO ASFALTICOS									
8	11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		$ 2.786,00		
9		421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
9,1	11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
9,2	14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		$ 1.766,00		
10	11603		450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3		$ 948.454,00		
11			450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
11,1	11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
11,2	14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		$ 956.591,00		
12	11603		450.9P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 para bacheos	m3		$ 984.206,00		
13	11603		460.1P	Fresado de pavimento asfaltico	m3		$ 83.576,00		
14	11603	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente	m3		$ 90.230,00		
Subtotal								$ -	
ESTRUCTURAS Y DRENAJES									
15			600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00		
15,1	11604		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3	156,42	$ 16.721,00	$ 2.615.499,00	
15,2	14102		600.1.1P	Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 16.721,00		
16			600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
16,1	11604		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
16,2	14102		600.2.4P	Excavaciones varias en material comun bajo agua (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	m3		$ 49.053,00		
17		610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		
17,1	11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		
17,2	14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 58.765,00		
18	11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	959,21	$ 120.830,00	$ 115.901.344,00	
19	11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 162.739,00		
20	14102		621.1.P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,0 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m		$ 1.750.000,00		
21	14102		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ concreto fc = 35 MPA de diametro 1,30 m.(incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo) (No incluye transporte de material producto de las excavaciones)	m		$ 2.300.000,00		
22	14102		621.1.2P	Pilote de concreto huecos prefabricados, concreto fc = 50 MPA de diametro 1,20 m, transporte e hincado con viga lanzadora (No incluye acero de refuerzo y no incluye transporte producto de las excavaciones) incluye suministro de elementos metálicos de conexión y platina de continuidad	m		$ 1.795.026,00		
23	14102		621.5.1P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.3m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m		$ 3.530.001,00		

PREACTA DE OBRA N°33

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	33	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 33 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
24	14102		621.5.2P	Camisa metálica permanenete para pilote de diámetro 1.0m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	m		$ 2.937.153,00		
25	14103		630.1.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado, para moldes prefabricados de dados para puentes	m3		$ 2.331.990,00		
26	14103		630.2.P	Concreto clase 50 MPA, para vigas artesa prefabricadas preesforzadas lanzadas, postensado de puentes	m3		$ 2.022.409,00		
27	14103		630.3.P	Concreto clase 50 Mpa, reforzado en segunda etapa para dados, conformación del tablero y vigas riostra	m3		$ 1.238.934,00		
28	14104		630.4.P	Concreto clase A, 50 Mpa, reforzado, para barreras de tráfico, colocación de concreto sobre tablero	m3		$ 1.277.842,00		
29	14102		630.6P	Concreto clase 35 MPA para Dados de cimentación	m3		$ 1.064.792,00		
30	14104		630.7P	Concreto clase 35 MPA para tablero, vigas riostra y anden	m3		$ 1.124.254,00		
31	14103		630.8P	Concreto clase 35 MPA, para pilas de puentes	m3		$ 1.446.638,00		
32	14102		630.9P	Concreto clase 28 MPA para estribos	m3	171,81	$ 1.003.819,00	$ 172.466.142,00	
33	11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	23,63	$ 792.029,00	$ 18.715.645,00	
34	11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	10,60	$ 574.960,00	$ 6.094.576,00	
35	14104		632.1P	Baranda Metalica	ml		$ 643.891,00		
36		640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,1	11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg	13.341,74	$ 6.750,00	$ 90.056.745,00	
36,2	14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,3	14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
36,4	14104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	Kg		$ 6.750,00		
37	14104	641-13		Acero de Preesfuerzo	Kg		$ 2.105,00		
38	14104	642-13		Apoyo elastomérico	und		$ 5.284.823,00		
39	14104		642,2P	Junta para puente,recorrido 400 mm	ml		$ 52.400.000,00		
40	14104		642,3P	Junta para puente,recorrido 225 mm	ml		$ 20.320.751,00		
41	14103	650-13		Fabricación de estructura metálica Acero	Kg		$ 15.000,00		
42	14103	650-13		Transporte de estructura metalica	Kg	396.598,39	$ 174,00	$ 69.008.120,00	
43	14103	650-13		Montaje de estructura metálica Acero	Kg	239.192,00	$ 4.226,00	$ 1.010.825.392,00	
44	11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de	ml		$ 653.594,00		
45	11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion	m3		$ 615.232,00		
46	11606	673-13		Geotextil tipo NT 2400 no tejido	m2		$ 7.418,00		
47	11604	673-13		Material granular drenante	m3		$ 126.990,00		
48	11604	673-13		Material de cobertura tipo SBG	m3		$ 169.551,00		
Subtotal								**$ 1.485.683.463,00**	
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD									
49		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
49,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
49,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		$ 1.897,00		
50		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
50,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
50,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2		$ 22.984,00		
51		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
51,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
51,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		$ 7.990,00		
52		Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
52,1	11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
52,2	14104	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u		$ 384.891,00		
53	11607	730-13		Defensa metalica	m		$ 222.702,00		
54	11607	730-13		Sección final	u		$ 98.987,00		
55	14104	740-13		Captafaros	u		$ 21.130,00		

PREACTA DE OBRA N°33

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	33	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 33 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
Subtotal								$ -	
OBRAS VARIAS									
56	11606			Protección de Taludes con bloques de césped	m2		$ 18.785,00		
Subtotal								$ -	
TRANSPORTES									
57	11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	697.771,39	$ 1.121,00	$ 782.201.728,00	
Subtotal								**$ 782.201.728,00**	
PRECIOS NO PREVISTOS									
58	14102		621.2P	Pilote de concreto vaciado in situ de diámetro 1,33 con concreto tremie 35 Mpa en suelos cenagosos (incluye excavación bajo agua, incluye acero de refuerzo, incluye adecuación de la zona, no incluye camisas metálica).	m		$ 4.716.115,00		
59	14104	630-13		Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga	m3	11,30	$ 1.825.395,00	$ 20.626.964,00	
60	14104	630-13		Concreto clase 35 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas para el PR9 de la variante Cienaga	m3	-	$ 1.511.509,00		
61	11607	630-13		Concreto clase 28 MPA para cimentación de Defensas en concreto para el PR9 de la variante Cienaga	m3		$ 954.668,00		
62	11606	630-13		Geomalla de refuerzo tipo UX-135 o similar para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 34.026,00		
63	11606	683-13		Geotextil NT 2000 para separación de capas para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 12.626,00		
64	11606	683-13		Geotextil NT 2500 para separación de suelos de subrasante y capas granulares en el PR9 de la variante cienaga.	m2		$ 12.590,00		
65	11606	683-13		Relleno con material seleccionado para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos en el PR9 de la variante cienaga	m3		$ 94.817,00		
66	11604		683.5P	Suministro e instalación de tubería PVC novafort de 4" perforada en el PR9 de la variante cienaga.	ml		$ 37.206,00		
67	11601		221.1P	Pedraplen Compacto	m3		$ 79.854,00		
68	11604	672-13		Bordillos en concreto vaciado in situ, NO incluye la preparación de la superficie de apoyo en el PR9 de la variante cienaga	ml		$ 82.321,00		
69	14104	720-13		Poste de referencia	Und		$ 476.085,00		
70	14104	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 30cm*20cm*3cm	Und	4,00	$ 128.232,00	$ 512.928,00	
71	14104	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de diametro 65 cm espesor 10 cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	Und	6,00	$ 3.068.904,00	$ 18.413.424,00	
72	14104	642-13		Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 53cm*58cm*10cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.	Und		$ 2.423.682,00		
73	14102		621.5.3P	Camisa metálica permanente para pilote de diámetro 1.33 m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)	ml	30,00	$ 3.725.643,00	$ 111.769.290,00	
74	14102		621.7.1P	Pruebas de Integridad de Pilotes (PIT) - ASTM D5882	Und		$ 1.575.439,00		
75	14104	731-13		Defensas en concreto tipo I en concreto 4000 PSI (No incluye acero de refuerzo) para el PR9 de la variante de Ciénaga	ml	120,00	$ 323.326,00	$ 38.799.120,00	

PREACTA DE OBRA N°33

FECHA: 31/03/2025 (Día / Mes / Año)

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**U. EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

En el municipio de Ciénaga (Magdalena), el ingeniero CONRADO LOPERA PALACIO como Director de Obra, el ingeniero NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA como Director de Interventoría; se reunieron para realizar la preacta de obra No. 33 cuyo resumen se describe a continuación:

No. DE ORDEN	GRUPO	ESPECIFICACIÓN		CANTIDADES PARA PAGO					
		GR.	PART.	ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL	OBSERVACION
76	21108		201.14.1P	Traslado de línea de conducción de agua potable de 12", en el tramo comprendido entre las abscisas K8+656 y el K9+206, desde el frente Cero hasta la pila 4 del Viaducto de la Variante de Ciénaga.	Global		$ 872.643.912,00		
77	34202		201.14.2P	Traslado de redes de media y baja tensión, en el tramo comprendido entre las abscisas K8+656 y el K9+206, desde el frente cero hasta la pila 4 del viaducto de la variante de ciénaga.	Global		$ 463.148.385,00		
78	11603	500-13		Pavimento de concreto hidráulico tipo MR40 (Incluye barras de transferencia de cargas, barras de amarre y canastilla de fijación).	m3		$ 1.384.303,00		
79	14104		650.5P	Protección de estructuras metálicas con pinturas resistentes a ambientes costeros	kg		$ 1.566,00		
Subtotal								**$ 190.121.726,00**	
SALDO BASICO A COBRAR EN ACTA N° 33								**$ 2.635.972.517,00**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma
CONRADO LOPERA PALACIO
Director de obra
Matrícula Profesional No.: 0520280830 ANT

Firma
WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:
Firma
NEFTALÍ HERNÁNDEZ PADILLA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-09718 CLD

Firma
PEDRO LUIS SALAS TEJEDA
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**1.1 Desmonte y limpieza en zonas no boscosas**	**NO DE ORDEN**	**2**	**UNIDAD**	Ha

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	VOLUMEN
GLORIETA Y CONEXIÓN A SANTA MARTA	Ha	FRENTE 7	0,59
CALZADO IZQUIERDA Y DERECHA	Ha	FRENTE 7	1,15
ACCESO A SANTA MARTA	Ha	FRENTE 7	0,06
ACCESO A BOSCONIA	Ha	FRENTE 7	0,24
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			2,05
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			1,56
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33			0,49

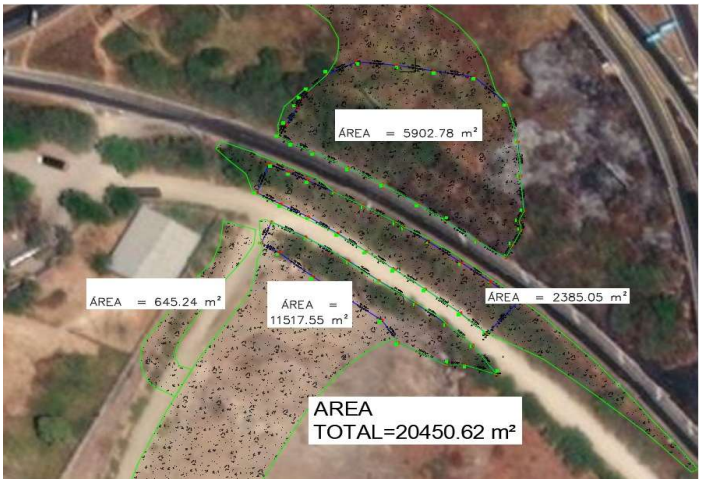

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma


Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	33	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**201.7. Demolición de Estructuras**	**NO DE ORDEN**	**2**	**UNIDAD**	m3

PREDIO	AREA DEMOLICION MUROS	AREA DEMOLICION PISOS
013A D-M85-T1-VC	97,56	47,80
015A D-M85-T1-VC	200,25	86,28
014A D-M85-T1-VC	119,57	83,69
012A D-M85-T1-VC	153,10	92,17
011A D-M85-T1-VC	57,35	53,20
013 D-M85	303,18	102,19
011 D-M85-T1-VC	294,97	186,46
005A I-M77-T1-VC	375,87	98,95
007A I-M77-T1-VC	322,23	100,38
001 I-M83-T1-VC	240,75	118,77
002 I-M83-T1-VC	480,39	129,12
16A D-M85-T1-VC	319,35	142,63
005 D-M85-T1-VC	174,91	58,73
003 D-M83-T1-VC	209,05	116,24
048A D-SR-T1-VC	162,42	52,76
016 D-M85-T1-VC	144,60	42,34
008A-M77-T1-VC	79,37	36,28
018D-M85-T1-VC	134,22	63,98
006AD-M85-T1-VC	342,64	95,82
005AD-M85-T1-VC	711,78	127,39
017D-M85-T1-VC	230,28	104,73
006D-M85-T1-VC	248,72	110,99
019D-M85-T1-VC	341,18	167,62
004A-M85-T1-VC	144,12	73,80
006A-M77-T1-VC	365,55	60,53
002A-M85-T1-VC	119,97	43,40
015D-M85-T1-VC	477,88	86,80
014D-M85-T1-VC	226,76	150,87
009D-M85-T1-VC	188,28	97,09
008D-M85-T1-VC	204,54	83,35
002D-M85-T1-VC	223,68	115,37
061AD-SR-T1-VC	153,53	68,70
01AD-M78-T1-VC	173,68	52,64
004D-M78-T1-VC	191,32	103,77
007AD-M85-T1-VC	222,49	90,70
004D-M78-T1-VC	193,81	74,87
008AD-M85-T1-VC	253,85	170,34
010D-M85	154,21	190,48
21M-17-T1-VC	1289,32	570,64
01A-MT77	99,68	43,84
003A1-M7	152,17	84,00
017-IM87	180,54	55,20
088AD-SR	16,32	0,00
001-DM17	152,20	74,73
01A-I-M77	177,80	80,42
TOTAL	**11105,44**	**4590,06**
ESPERSOR	0,13	0,15
VOLUMEN	**1443,71**	**688,51**

ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN m³
LOS DE PROTECCION ACCESO A GRADESA	12,60	2,00	0,20	5,04

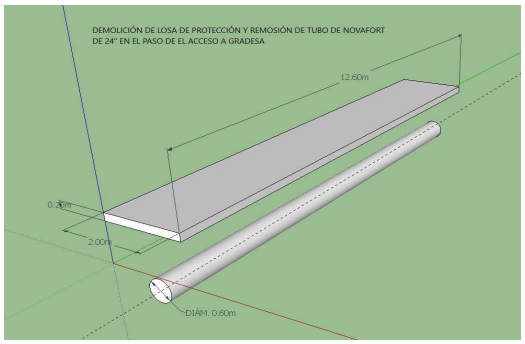

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	2.137,26
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	2.097,04
SALDO PENDIENTE POR AGOTAMIENTO DE CANTIDADES CONTRACTUALES	-
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33	40,22

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	FRENTE CERO	1.679,90
CONECTANTE DERECHA	M3	FRENTE CERO	1.759,88
RETORNO	M3	FRENTE CERO	167,01
VIA DE SERCIVIO	M3	FRENTE CERO	1.569,63
CALZADA IZQUIERDA Y DERECHA	M3	FRENTE 7	10.769,34
GLORIETA Y SALIDA A BOSCONIA	M3	FRENTE 7	4.176,77
ACCESO A GRADESA	M3	FRENTE 7	807,33
ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA	M3	FRENTE 7	3.558,10
CONEXIONES A CIENAGA, SANTA MARTA Y BOSCONIA	M3	FRENTE 7	11.364,65
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			35.852,60
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			18.959,61
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33			16.892,99

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	33	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

CONECTANTE IZQUIERDA- FRENTE CERO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
8815		4,90		24,50	
8820	5	2,55	3,73	18,635	18,635
8825	5	3,47	3,01	15,06	33,6975
8830	5	4,78	4,13	20,63	54,3275
8835	5	5,56	5,17	25,84	80,1675
8840	5	6,11	5,83	29,16	109,3275
8845	5	6,82	6,46	32,32	141,6425
8850	5	7,45	7,13	35,67	177,31
8853.98-140	3,98	7,53	7,49	29,81	207,1202
145	5	6,95	7,24	36,20	243,3202
150	5	6,44	6,70	33,48	276,7952
155	5	6,40	6,42	32,10	308,8952
160	5	6,16	6,28	31,40	340,2952
165	5	5,69	5,92	29,61	369,9077
170	5	5,87	5,78	28,89	398,7952
175	5	6,04	5,96	29,78	428,5702
180	5	6,32	6,18	30,90	459,4702
185	5	6,68	6,50	32,50	491,9702
190	5	6,77	6,73	33,63	525,5952
195	5	7,17	6,97	34,85	560,4452
200	5	7,13	7,15	35,75	596,1952
205	5	7,47	7,30	36,50	632,6952
210	5	9,02	8,25	41,23	673,9202
215	5	7,58	8,30	41,50	715,4202
220	5	6,50	7,04	35,20	750,6202
225	5	6,24	6,37	31,85	782,4702
230	5	6,16	6,20	31,00	813,4702
235	5	6,46	6,31	31,55	845,0202
240	5	6,82	6,64	33,20	878,2202
245	5	6,83	6,83	34,13	912,3452
250	5	6,92	6,88	34,38	946,7202
255	5	6,96	6,94	34,70	981,4202
260	5	6,98	6,97	34,85	1016,2702
265	5	7,06	7,02	35,10	1051,3702
270	5	7,46	7,26	36,30	1087,6702
275	5	9,46	8,46	42,30	1129,9702
280	5	8,22	8,84	44,20	1174,1702
285	5	8,58	8,40	42,00	1216,1702
290	5	9,39	8,99	44,93	1261,0952
295	5	9,60	9,50	47,48	1308,5702
300	5	6,81	8,21	41,03	1349,5952
305	5	6,33	6,57	32,85	1382,4452
310	5	6,15	6,24	31,20	1413,6452
315	5	6,31	6,23	31,15	1444,7952
320	5	4,64	5,48	27,38	1472,1702
320		6,36			1472,1702
325	5	6,68	6,52	32,60	1504,7702
330	5	5,85	6,27	31,33	1536,0952
340	10	5,61	5,73	57,30	1593,3952
350	10	5,56	5,59	55,85	1649,2452
355	5	6,7	6,13	30,65	1679,8952
TOTAL					**1679,90**

CONECTANTE DERECHA- FRENTE CERO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
245		8,04		0,00	0,00
250	5	8,71	8,38	41,88	41,88
255	5	8,7	8,71	43,53	85,40
260	5	8,64	8,67	43,35	128,75
265	5	9,03	8,84	44,18	172,93
270	5	9,27	9,15	45,75	218,68
275	5	9,49	9,38	46,90	265,58
280	5	9,72	9,61	48,03	313,60
285	5	9,95	9,84	49,18	362,78
290	5	10,42	10,19	50,93	413,70
295	5	10,72	10,57	52,85	466,55
300	5	11,85	11,29	56,43	522,98
305	5	11,28	11,57	57,83	580,80
310	5	10,96	11,12	55,60	636,40
315	5	11,01	10,99	54,93	691,33
320	5	11	11,01	55,03	746,35
325	5	11,08	11,04	55,20	801,55
330	5	10,98	11,03	55,15	856,70
335	5	11,17	11,08	85,88	942,58
340	5	11,23	11,20	86,50	1029,08
345	5	11,44	11,34	56,68	1085,75
350	5	11,7	11,57	57,85	1143,60
355	5	11,84	11,77	58,85	1202,45
360	5	10,79	11,32	56,58	1259,03
370	10	12,35	11,57	115,70	1374,73
380	10	12,33	12,34	123,40	1498,13
390	10	8,91	10,62	106,20	1604,33
395	5	8,15	8,53	42,65	1646,98
400	5	6,35	7,25	36,25	1683,23
405	5	4,89	5,62	28,10	1711,33
410	5	3,59	4,24	21,20	1732,53
415	5	2,75	3,17	15,85	1748,38
420	5	1,85	2,30	11,50	1759,88
TOTAL					**1759,88**

CONEXION RETORNO BARRANQUILLA - BARRANQUILLA- FRENTE CERO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
24,35		7,58			
25	0,65	6,33	6,955	4,52	4,52
27,51	2,51	12,48	9,405	23,61	28,13
28,87	1,36	22,35	17,415	23,68	51,81
30	1,13	22,10	22,225	25,11	76,93
31,97	1,97	24,20	23,15	45,61	122,53
33,76	1,79	25,50	24,85	44,48	167,01
TOTAL					**167,01**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	33	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

VIA DE SERVICIO- FRENTE CERO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		3,41			
5	5	4,86	4,14	20,68	20,68
10	5	5,616	5,24	26,19	46,87
15	5	5,26	5,44	27,19	74,06
20	5	4,22	4,74	23,70	97,76
25	5	4,58	4,40	22,00	119,76
30	5	4,89	4,74	23,68	143,44
35	5	3,9	4,40	21,98	165,41
40	5	3,228	3,56	17,82	183,23
45	5	3,08	3,15	15,77	199,00
50	5	3,06	3,07	15,35	214,35
55	5	3,1	3,08	15,40	229,75
60	5	3,19	3,15	15,73	245,48
65	5	3,11	3,15	15,75	261,23
70	5	3,26	3,19	15,93	277,15
75	5	3,2	3,23	16,15	293,30
80	5	3,17	3,19	15,93	309,23
85	5	3,3	3,24	16,18	325,40
90	5	3,58	3,44	17,20	342,60
95	5	3,77	3,68	18,38	360,98
100	5	3,45	3,61	18,05	379,03
105	5	3,09	3,27	16,35	395,38
110	5	2,97	3,03	15,15	410,53
115	5	2,93	2,95	14,75	425,28
120	5	3,20	3,07	15,325	440,60
125	5	3,50	3,35	16,75	457,35
130	5	4,23	3,87	19,325	476,68
135	5	4,61	4,42	22,1	498,78
140	5	4,41	4,51	22,55	521,33
145	5	3,97	4,19	20,95	542,28
150	5	3,54	3,76	18,775	561,05
155	5	3,64	3,59	17,95	579,00
160	5	3,80	3,72	18,6	597,60
165	5	4,12	3,96	19,8	617,40
170	5	3,93	4,03	20,125	637,53
175	5	3,79	3,86	19,3	656,83
180	5	3,73	3,76	18,8	675,63
185	5	3,73	3,73	18,65	694,28
190	5	3,91	3,82	19,1	713,38
195	5	4,16	4,04	20,175	733,55
200	5	4,50	4,33	21,65	755,20
205	5	4,39	4,45	22,225	777,43
210	5	4,48	4,44	22,175	799,60
TOTAL					**799,60**

EMPALME CON TRONCAL VIA SERVICIO

AREA	ESPESOR	VOLUMEN
18,46	0,8	**14,768**

VIA DE SERVICIO- FRENTE CERO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
215	5	4,39	4,44	22,175	821,78
220	5	3,87	4,13	20,65	842,43
225	5	3,95	3,91	19,55	861,98
230	5	3,93	3,94	19,7	881,68
235	5	3,76	3,85	19,225	900,90
240	5	3,63	3,70	18,475	919,38
245	5	3,80	3,72	18,575	937,95
250	5	3,81	3,81	19,025	956,98
255	5	3,89	3,85	19,25	976,23
260	5	4,56	4,23	21,125	997,35
265	5	6,23	5,40	26,975	1024,33
270	5	6,34	6,29	31,43	1055,75
275	5	5,96	6,15	30,75	1086,50
280	5	5,79	5,88	29,38	1115,88
TOTAL					**1115,88**

VIA DE SERVICIO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
245		0,00		0	
250	5	0,36	0,18	0,8925	0,89
255	5	0,58	0,47	2,35	3,24
260	5	1,67	1,12	5,6225	8,87
265	5	3,24	2,45	12,265	21,13
270	5	4,84	4,04	20,2	41,33
275	5	4,77	4,81	24,025	65,36
280	5	4,59	4,68	23,4	88,76
285	5	4,78	4,69	23,425	112,18
290	5	4,69	4,74	23,675	135,86
295	5	4,67	4,68	23,4	159,26
300	5	4,71	4,69	23,45	182,71
305	5	4,53	4,62	23,1	205,81
310	5	4,35	4,44	22,2	228,01
315	5	4,45	4,40	22	250,01
320	5	3,53	3,99	19,95	269,96
325	5	0,47	2,00	10	279,96
TOTAL					**279,96**

VIA DE SERVICIO- FRENTE CERO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
1,83		3,53			
5	3,17	3,99	3,76	11,92	11,92
10	5	4,18	4,09	20,43	32,34
15	5	5,02	4,60	23,00	55,34
20	5	4,78	4,90	24,50	79,84
25	5	5	4,89	24,45	104,29
26,44	1,44	5,12	5,06	7,29	111,58
30	3,56	5,12	5,12	18,23	129,81
35	5	4,23	4,68	23,38	153,18
36,04	1,04	4,08	4,16	4,32	157,50
36,56	0,52	1,8	2,94	1,53	159,03
TOTAL					**159,03**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

		CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA

SOPORTE DEL ACTA No.	**30**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/12/2024 a 31/12/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

CALZADA IZQUIERDA Y DERECHA- FRENTE 7

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+075		32,16			
K0+080	4,69	45,17	38,67	181,34	181,34
K0+090	10	41,27	43,22	432,20	613,54
K0+100	10	33,24	37,26	372,55	986,09
K0+110	10	33,52	33,38	333,80	1.319,89
K0+120	10	37,15	35,34	353,35	1.673,24
K0+130	10	39,79	38,47	384,70	2.057,94
K0+140	10	42,09	40,94	409,40	2.467,34
K0+150	10	41,61	41,85	418,50	2.885,84
K0+160	10	41,69	41,65	416,50	3.302,34
K0+170	10	41,98	41,84	418,35	3.720,69
K0+180	10	38,83	40,41	404,05	4.124,74
K0+190	10	39,97	39,40	394,00	4.518,74
K0+200	10	38,10	39,04	390,35	4.909,09
K0+201	1,28	37,98	38,04	48,69	4.957,78
K0+203	2,18	44,76	41,37	90,19	5.047,97
K0+210	6,54	43,49	44,13	288,58	5.336,54
K0+220	10	43,51	43,50	435,00	5.771,54
K0+230	10	34,96	39,24	392,35	6.163,89
K0+240	10	30,90	32,93	329,30	6.493,19
K0+250	10	39,28	35,09	350,90	6.844,09
K0+260	10	34,48	36,88	368,80	7.212,89
K0+270	10	31,84	33,16	331,60	7.544,49
K0+280	10	33,54	32,69	326,90	7.871,39
K0+290	10	35,95	34,75	347,45	8.218,84
K0+300	10	34,47	35,21	352,10	8.570,94
K0+310	10	33,63	34,05	340,50	8.911,44
K0+320	10	33,90	33,77	337,65	9.249,09
K0+330	10	39,93	36,92	369,15	9.618,24
K0+340	10	54,71	47,32	473,20	10.091,44
K0+350	10	80,87	67,79	677,90	10.769,34
TOTAL					**10769,34**

GLORIETA- FRENTE 7

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+090		19,3			
K0+100	10,00	14,3	16,80	168,00	168,00
K0+110	10,00	24,69	19,50	194,95	362,95
K0+120	10,00	23,62	24,16	241,55	604,50
K0+130	10,00	24,3	23,96	239,60	844,10
K0+140	10,00	28,69	26,50	264,95	1.109,05
K0+147	6,67	30,16	29,43	196,26	1.305,31
K0+150	3,33	24,42	27,29	90,88	1.396,19
K0+160	10,00	37,06	30,74	307,40	1.703,59
K0+164	3,92	30,84	33,95	133,08	1.836,67
K0+170	6,08	36,01	33,43	203,22	2.039,90
K0+180	10,00	20,94	28,48	284,75	2.324,65
K0+190	10,00	13,19	17,07	170,65	2.495,30
K0+197	7,46	18,9	16,05	119,70	2.614,99
TOTAL					**2614,99**

SALIDA A BOSCONIA- FRENTE 7

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+022		2,13			
K0+030	7,73	6,11	4,12	31,848	31,85
K0+035	5,18	8,44	7,28	37,685	69,53
K0+040	4,82	12,74	10,59	51,044	120,58
K0+050	10,00	17,28	15,01	150,100	270,68
K0+060	10,00	11,78	14,53	145,300	415,98
K0+070	10,00	1,41	6,60	65,950	481,93
K0+080	10,00	0,94	1,18	11,750	493,68
K0+090	10,00	3,84	2,39	23,900	517,58
K0+100	10,00	12,35	8,10	80,950	598,53
K0+110	10,00	14,7	13,53	135,250	733,78
K0+120	10,00	11,49	13,10	130,950	864,73
K0+130	10,00	11,09	11,29	112,900	977,63
K0+140	10,00	13,15	12,12	121,200	1.098,83
K0+150	10,00	7,92	10,54	105,350	1.204,18
K0+160	10,00	7,42	7,67	76,700	1.280,88
K0+170	10,00	6,32	6,87	68,700	1.349,58
K0+180	10,00	5,48	5,90	59,000	1.408,58
K0+190	10,00	5,16	5,32	53,200	1.461,78
K0+200	10,00	3,89	4,53	45,250	1.507,03
K0+210	10,00	2,67	3,28	32,800	1.539,83
K0+220	10,00	1,72	2,20	21,950	1.561,78
TOTAL					**1561,78**

ACCESO A GRADESA - FRENTE 7

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+010		1,98			
K0+012	1,65	8,43	5,21	8,588	8,59
K0+015	3,35	8,5	8,47	28,358	36,95
K0+020	5,00	7	7,75	38,750	75,70
K0+023	2,71	6,53	6,77	18,333	94,03
K0+025	2,29	6,31	6,42	14,702	108,73
K0+030	5,00	1,92	4,12	20,575	129,31
K0+035	5,00	4,6	3,26	16,300	145,61
K0+040	5,00	4,02	4,31	21,550	167,16
K0+045	5,00	4,19	4,11	20,525	187,68
K0+050	5,00	4,8	4,50	22,475	210,16
K0+055	5,00	5,64	5,22	26,100	236,26
K0+060	5,00	6,91	6,28	31,375	267,63
K0+065	5,00	7,98	7,45	37,225	304,86
K0+070	5,00	7,87	7,93	39,625	344,48
K0+075	5,00	6,8	7,34	36,675	381,16
K0+080	5,00	6,92	6,86	34,300	415,46
K0+085	5,00	10,95	8,94	44,675	460,13
K0+090	5,00	10,57	10,76	53,800	513,93
K0+095	5,00	9,98	10,28	51,375	565,31
K0+100	5,00	8,91	9,45	47,225	612,53
K0+105	5,00	8,84	8,88	44,375	656,91
K0+110	5,00	8,75	8,80	43,975	700,88
K0+115	5,00	9,39	9,07	45,350	746,23
K0+120	5,00	9,97	9,68	48,400	794,63
K0+122	2,21	1,52	5,75	12,696	807,33
TOTAL					**807,33**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	**m3**

ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA- FRENTE 7					
Abscisa	**long**	**Area exc m2**	**Promedio area**	**Vol exc m3**	**Vol exc AC m3**
K0+000		1,85			
K0+010	10,00	11,75	6,80	68,00	68,00
K0+015	4,92	23,22	17,49	86,03	154,03
K0+020	5,08	25,01	24,12	122,50	276,53
K0+025	5,27	24,64	24,83	130,83	407,36
K0+030	4,73	46,5	35,57	168,25	575,60
K0+040	10,00	41,67	44,09	440,85	1.016,45
K0+050	10,00	35,87	38,77	387,70	1.404,15
K0+060	10,00	30,6	33,24	332,35	1.736,50
K0+070	10,00	28,64	29,62	296,20	2.032,70
K0+080	10,00	29,16	28,90	289,00	2.321,70
K0+090	10,00	30,8	29,98	299,80	2.621,50
K0+100	10,00	37,09	33,95	339,45	2.960,95
K0+106	6,27	33,94	35,52	222,68	3.183,63
K0+110	3,73	40,46	37,20	138,76	3.322,39
K0+112	1,86	37,84	39,15	72,82	3.395,21
K0+115	3,53	18,86	28,35	100,08	3.495,28
K0+120	4,61	8,39	13,63	62,81	3.558,10
TOTAL					**3.558,095**

SECTOR	**AREA m²**	**ALTURA**	**EXCAVACION**
ACCESO A CIENAGA	2012,52	2,2	4.427,54
ACCESO SANTA MARTA 1	1547,88	2,2	3.405,34
ACCESO SANTA MARTA 2	370,25	2,2	814,55
SALIDA SANTA MARTA	450,35	2,2	990,77
SALIDA A BOSCONIA	784,75	2,2	1.726,45
TOTALES			**11.364,65**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

EXCAVACION CALZADA DERECHA E IZQUIERDA

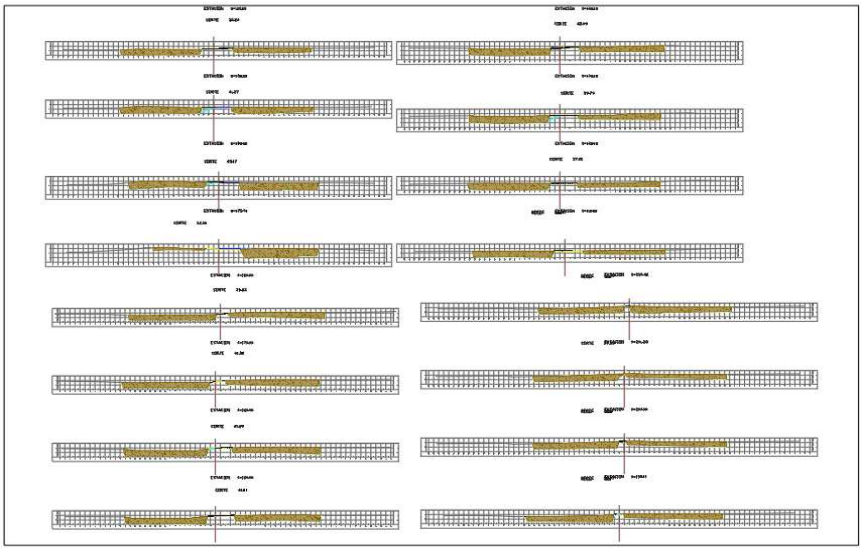

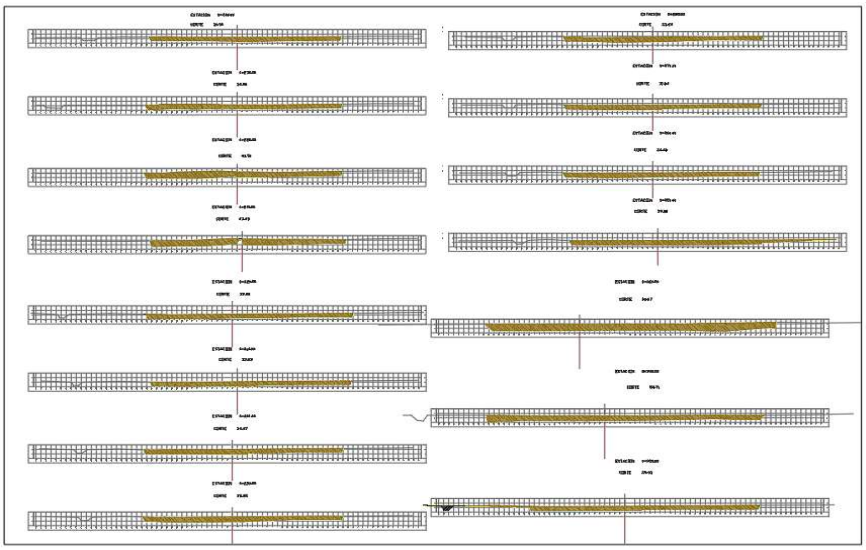

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma


Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

EXCAVACION GLORIETA Y SALIDA A BOSCONIA- FRENTE 7

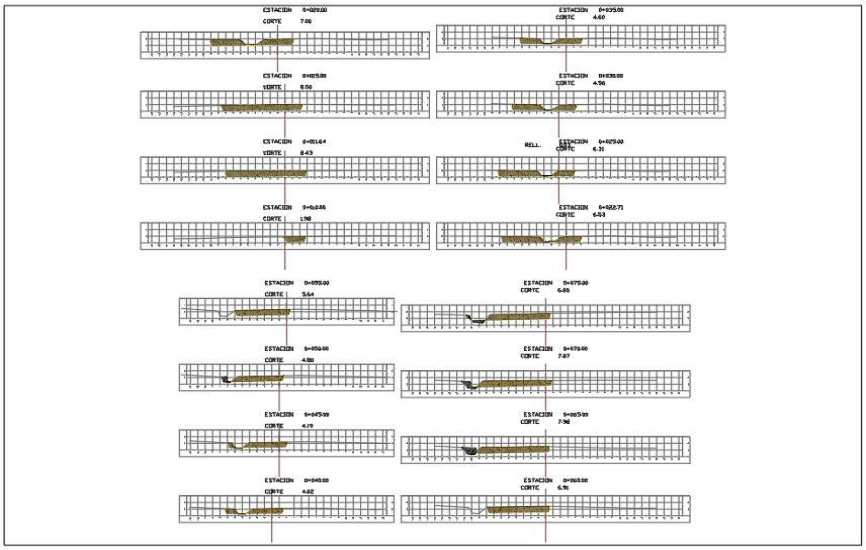

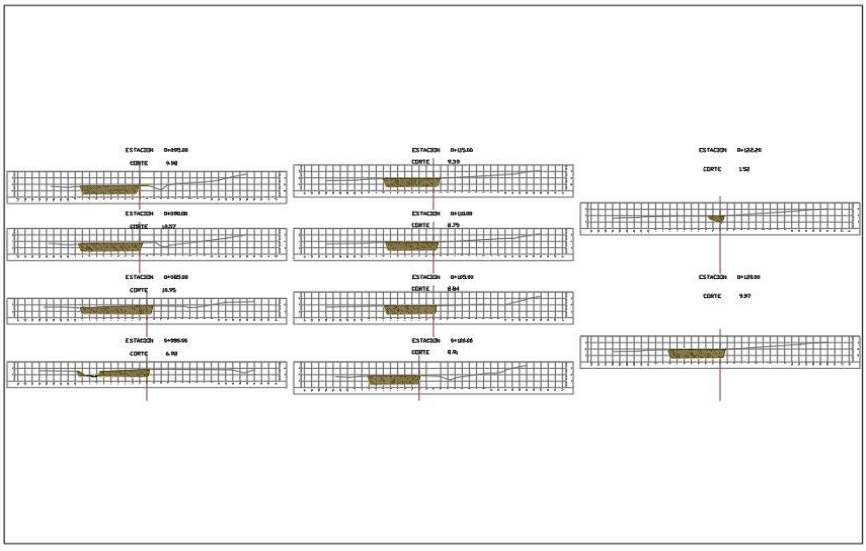

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

SECCIONES DE EXCAVACION ACCESO A GRADESA FRENTE 7

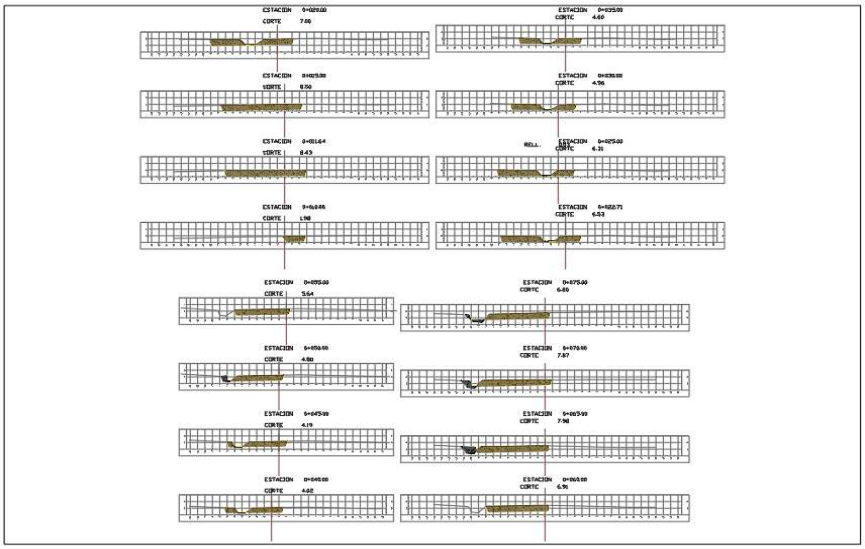

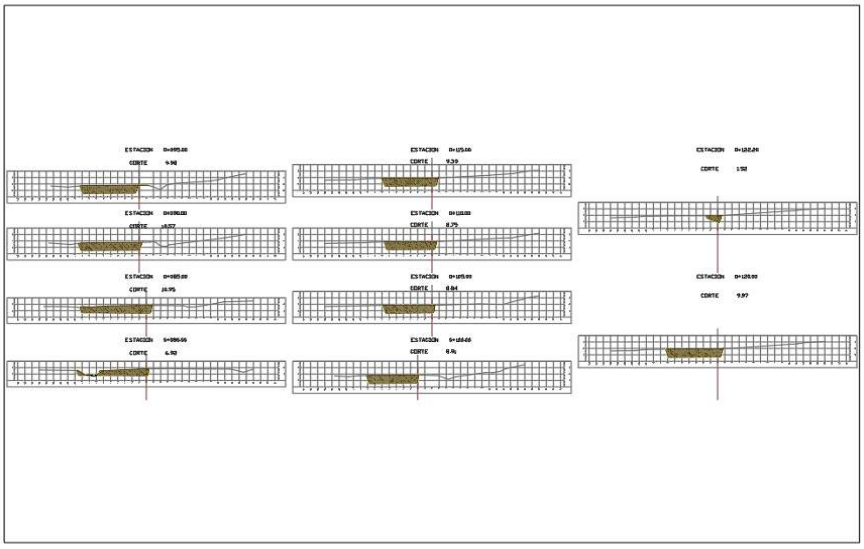

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**210.2.2. Excavaciones en material común de la Explanación y Canales**	**NO DE ORDEN**	**3**	**UNIDAD**	m3

SECCIONES DE EXCAVACION ACCESO Y SALIDA A SANTA MARTA - FRENTE 7

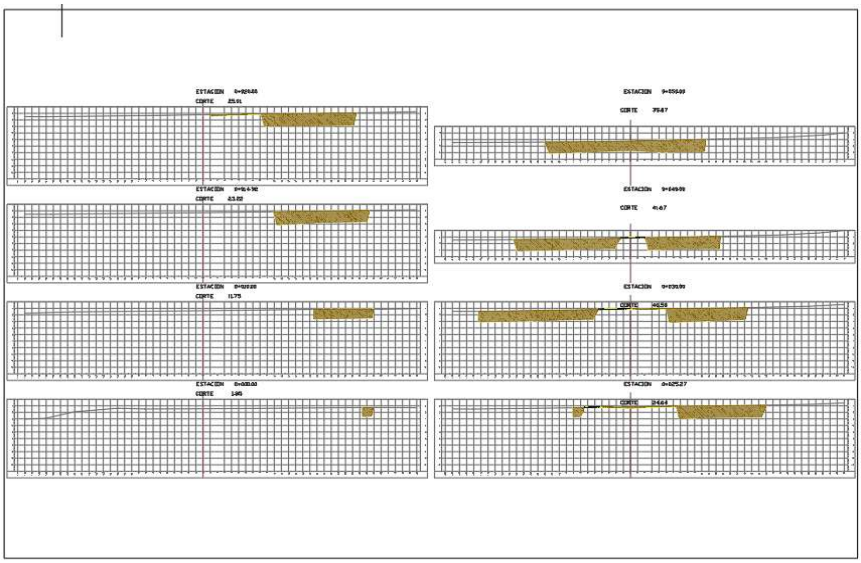

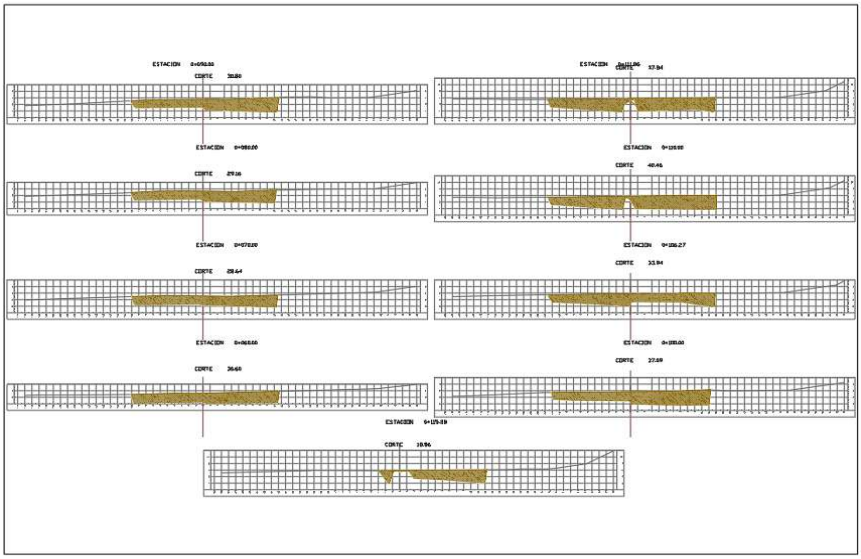

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**220.1P. Terraplenes (incluye material seleccionado de cantera)**	**NO DE ORDEN**	**4**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UNIDAD	UBICACIÓN	VOLUMEN
CONECTANTE IZQUIERDA	M3	FRENTE CERO	917,13
MEJORAMIENTO CALZADA IZQUIERDA	M3	FRENTE 7	5.629,35
MEJORAMIENTO CALZADA DERECHA	M3	FRENTE 7	4.355,80
MEJORAMIENTO GLORIETA	M3	FRENTE 7	3.798,05
MEJORAMIENTO ACCESO 1 A SANTA MARTA	M3	FRENTE 7	1.440,37
MEJORAMIENTO ACCESO 2 A SANTA MARTA	M3	FRENTE 7	1.317,63
MEJORAMIENTO SALIDA A SANTA MARTA	M3	FRENTE 7	1.611,00
TERRAPLEN CALZADA IZQUIERDA	M3	FRENTE 7	1.730,05
TERRAPLEN CALZADA DERECHA	M3	FRENTE 7	2.359,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			23.158,37
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			23.158,37
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33			-

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



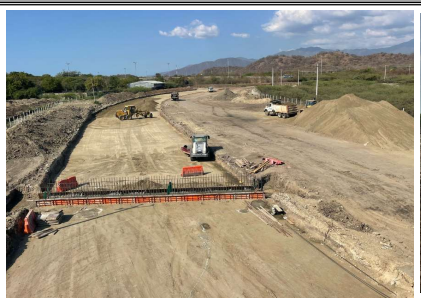



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
MURO EN CONCRETO	FRENTE CERO	m3	592,53
CARCAMO CALZADA IZQUIERDA	FRENTE CERO	m3	91,18
TRASLADO DE REDES	FRENTE CERO	m3	307,40
CARCAMO RETORNO	FRENTE CERO	m3	42,68
ALCANTARILLA	FRENTE CERO	m3	66,88
CANAL EN CONCRETO K10+432 a K11+240	FRENTE 3	m3	1.550,61
PUENTE PEATONAL OASIS	PUENTE 3	m3	51,03
DISIPADORES	FRENTE 3	m3	75,07
CUNETAS	FRENTE 3	m3	76,50
BOX CULVERT DE SERVICIO	FRENTE 4	m3	79,81
BOX CULVERT	FRENTE 7	m3	321,35
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			3.255,03
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			3.098,61
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33			156,42

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

MURO EN CONCRETO- FRENTE CERO

ABSCISA	area m2	VOL m3	ACUM M3	ABSCISA	area m2	VOL m3	ACUM M3	ABSCISA	area m2	VOL m3	ACUM M3
32	1,44			106	1,91	3,61	199,77	182	3,11	5,95	392,13
32,1	3,29	0,24	0,24	108	2,15	4,06	203,83	184	3,36	6,47	398,60
34	3,31	6,27	6,51	110	2,37	4,52	208,35	186	3,53	6,89	405,49
36	3,33	6,64	13,15	112	2,52	4,89	213,24	188	3,35	6,88	412,37
38	3,37	6,70	19,85	114	2,49	5,01	218,25	190	3,13	6,48	418,85
40	3,50	6,87	26,72	116	2,52	5,01	223,26	192	2,91	6,04	424,89
42	3,59	7,09	33,81	118	2,59	5,11	228,37	194	3,01	5,92	430,81
44	4,07	7,66	41,47	120	2,58	5,17	233,54	196	3,07	6,08	436,89
46	3,84	7,91	49,38	122	2,41	4,99	238,53	198	3,11	6,18	443,07
48	3,52	7,36	56,74	124	2,08	4,49	243,02	200	3,09	6,20	449,27
50	2,90	6,42	63,16	126	2,15	4,23	247,25	202	3,08	6,17	455,44
52	2,78	5,68	68,84	128	2,26	4,41	251,66	204	3,06	6,14	461,58
54	2,71	5,49	74,33	130	2,36	4,62	256,28	206	3,04	6,10	467,68
56	2,79	5,50	79,83	132	2,46	4,82	261,10	208	3,08	6,12	473,80
58	2,76	5,55	85,38	134	2,56	5,02	266,12	210	3,13	6,21	480,01
60	2,58	5,34	90,72	136	2,65	5,21	271,33	212	3,29	6,42	486,43
62	2,57	5,15	95,87	138	2,69	5,34	276,67	214	3,63	6,92	493,35
64	2,41	4,98	100,85	140	2,61	5,30	281,97	216	3,90	7,53	500,88
66	2,36	4,77	105,62	142	2,47	5,08	287,05	218	3,77	7,67	508,55
68	2,60	4,96	110,58	144	2,52	4,99	292,04	220	3,38	7,15	515,70
70	2,76	5,36	115,94	146	2,60	5,12	297,16	222	3,16	6,54	522,24
72	2,77	5,53	121,47	148	2,62	5,22	302,38	224	2,96	6,12	528,36
74	2,73	5,50	126,97	150	2,56	5,18	307,56	226	3,00	5,96	534,32
76	2,52	5,25	132,22	152	2,46	5,02	312,58	228	2,97	5,97	540,29
78	2,27	4,79	137,01	154	2,34	4,80	317,38	230,00	1,47	4,44	544,73
80	2,80	5,07	142,08	156	2,41	4,75	322,13	232,00	1,58	3,05	547,78
82	3,09	5,89	147,97	158	2,42	4,83	326,96	234,00	1,97	3,55	551,33
84	3,16	6,25	154,22	160	2,47	4,89	331,85	236,00	2,04	4,01	555,34
86	2,59	5,75	159,97	162	2,53	5,00	336,85	238,00	2,17	4,21	559,55
88	2,11	4,70	164,67	164	2,65	5,18	342,03	240,00	2,28	4,45	564,00
90	2,07	4,18	168,85	166	2,80	5,45	347,48	242,00	2,05	4,33	568,33
92	2,00	4,07	172,92	168	2,88	5,68	353,16	244,00	2,24	4,29	572,62
94	1,99	3,99	176,91	170	2,74	5,62	358,78	246,00	2,39	4,63	577,25
96	1,99	3,98	180,89	172	2,66	5,40	364,18	248,00	2,55	4,94	582,19
98	1,98	3,97	184,86	174	2,73	5,39	369,57	250,00	2,62	5,17	587,36
100	1,97	3,95	188,81	176	2,76	5,49	375,06	252,00	2,55	5,17	**592,53**
102	1,84	3,81	192,62	178	2,76	5,52	380,58				
104	1,70	3,54	196,16	180	2,84	5,60	386,18				

CARCAMO CALZADA IZQUIERDA- FRENTE CERO

Elemento	Abcisa	Volumen	Volumen Acumulado	observacion
CARCAMO	K0+012	0	0	secciones
CARCAMO	K0+013	2,18	2,18	secciones
CARCAMO	K0+015	6,36	8,54	secciones
CARCAMO	K0+020	20,38	28,92	secciones
CARCAMO	K0+025	20,59	49,51	secciones
CARCAMO	K0+030	16,99	66,5	secciones
CARCAMO	K0+000	14,724	81,22	secciones
CARCAMO	K0+039	9,61	90,84	secciones
CARCAMO	K0+039	0,34	**91,18**	secciones

CARCAMO RETORNO- FRENTE CERO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3
0		1,66		
2	2	1,59	1,63	3,25
5	3	1	1,30	3,885
10	5	1,12	1,06	5,3
15	5	1,49	1,31	6,525
17,88	2,88	2,35	1,92	5,5296
20	2,12	2,02	2,19	4,6322
25	5	1,4	1,71	8,55
28,81	3,81	1,23	1,32	5,01015
TOTAL				**42,68**

EXCAVACION CAJAS 3-4-5-DESCOLE, ALCANTARILLADO FRENTE CERO

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+025		0,67			
K0+030	5,28	1,59	1,13	5,9664	5,97
K0+036	6,19	2,18	1,89	11,66815	17,63
K0+038	1,57	3,04	2,61	4,0977	21,73
K0+040	2,24	1,37	2,21	4,9392	26,67
K0+045	5,09	1,12	1,25	6,33705	33,01
K0+050	4,91	1,46	1,29	6,3339	39,34
K0+052	1,88	2,32	1,89	3,5532	42,90
K0+054	1,78	2,97	2,65	4,7081	47,60
K0+054	0,78	1,26	2,12	1,6497	49,25
K0+060	5,38	0,83	1,05	5,6221	54,88
K0+066	6,03	1,03	0,93	5,6079	60,48
K0+069	3,26	1,22	1,13	3,6675	64,15
K0+071	1,71	1,97	1,60	2,72745	66,88
TOTAL					**66,88**

TRASLADO DE REDES - FRENTE CERO

Elemento	long	Ancho	Alto	Volumen
Ducto Gas	29	1,10	1,00	31,90
Acometidas Acueducto	551	0,50	1,00	275,50

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**		**15.1**	**UNIDAD** m3

CANAL RECTANGULAR - K10+432 a K10+517,4

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		2,44			
10	10	1,31	1,88	18,75	18,75
20	10	0,78	1,05	10,45	29,2
24,4	4,4	0,77	0,78	3,41	32,61
30	5,6	0,72	0,75	4,172	36,782
40	10	0,80	0,76	7,6	44,382
50	10	1,25	1,03	10,25	54,632
60	10	1,51	1,38	13,8	68,432
70	10	1,34	1,43	14,25	82,682
80	10	1,92	1,63	16,3	98,982
85,4	5,4	1,74	1,83	9,882	108,864
TOTAL					**108,86**

CANAL RECTANGULAR - K10+690 a K10+968,90

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		2,25			
10	10	2,1	2,18	21,75	21,75
20	10	2,11	2,11	21,05	42,8
30	10	2,68	2,40	23,95	66,75
40	10	2,06	2,37	23,7	90,45
50	10	1,24	1,65	16,5	106,95
60	10	1,6	1,42	14,2	121,15
70	10	1,68	1,64	16,4	137,55
80	10	1,94	1,81	18,1	155,65
90	10	3,08	2,51	25,1	180,75
100	10	4	3,54	35,4	216,15
110	10	3,68	3,84	38,4	254,55
120	10	3,2	3,44	34,4	288,95
130	10	2,59	2,90	28,95	317,9
140	10	2,66	2,63	26,25	344,15
150	10	2,68	2,67	26,7	370,85
160	10	3	2,84	28,4	399,25
170	10	2,41	2,71	27,05	426,3
180	10	2,28	2,35	23,45	449,75
190	10	2,45	2,37	23,65	473,4
200	10	2,65	2,55	25,5	498,9
210	10	2,83	2,74	27,4	526,3
220	10	3,29	3,06	30,6	556,9
230	10	3,3	3,30	32,95	589,85
240	10	3,12	3,21	32,1	621,95
250	10	2,66	2,89	28,9	650,85
260	10	2,95	2,81	28,05	678,9
270	10	3,27	3,11	31,1	710
278,88	8,88	0	1,64	14,5188	724,5188
TOTAL					**724,52**

CANAL RECTANGULAR - K10+980-K11+100

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		4,51			
10	10	3,72	4,12	41,15	41,15
20	10	3,5	3,61	36,1	77,25
30	10	3,52	3,51	35,1	112,35
40	10	3,79	3,66	36,55	148,9
50	10	3,84	3,82	38,15	187,05
60	10	4,14	3,99	39,9	226,95
70	10	4,41	4,28	42,75	269,7
80	10	3,34	3,88	38,75	308,45
90	10	3,05	3,20	31,95	340,4
100	10	3	3,03	30,25	370,65
109,8	9,8	3,27	3,14	30,723	401,373
110	0,2	3,26	3,27	0,653	402,026
120	10	0,36	1,81	18,1	420,126
124,58	4,58	1,67	1,02	4,6487	424,7747
TOTAL					**424,77**

CANAL RECTANGULAR - K11+100-K11+239,43

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		3,06			
10	10	2,44	2,75	27,5	27,5
20	10	1,87	2,16	21,55	49,05
30	10	1,65	1,76	17,6	66,65
40	10	1,92	1,79	17,85	84,5
50	10	2,1	2,01	20,1	104,6
60	10	2,12	2,11	21,1	125,7
70	10	2,17	2,15	21,45	147,15
80	10	2,17	2,17	21,7	168,85
90	10	1,91	2,04	20,4	189,25
100	10	1,77	1,84	18,4	207,65
110	10	1,99	1,88	18,8	226,45
120	10	2,38	2,19	21,85	248,3
130	10	2,63	2,51	25,05	273,35
132,2	2,2	2,77	2,70	5,94	279,29
139,43	7,23	0,87	1,82	13,1586	292,4486
TOTAL					**292,45**

PUENTE PEATONAL EL OASIS APOYO 1

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0,66		8,59			
2,38	1,72	8,39	8,49	14,60	14,60
4,07	1,69	8,21	8,30	14,03	28,63
TOTAL					**28,63**

PUENTE PEATONAL EL OASIS APOYO 2

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
19,41		5,79			
21,04	1,63	6,85	6,32	10,3016	10,30
22,75	1,71	7,3	7,08	12,09825	22,40
TOTAL					**22,40**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3

EXCAVACION CUNETA COSTADO IZQUIERDO K10+515-K10+769

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K10+515		0,003			
K10+520	4,84	0,04	0,02	0,104	0,10
K10+530	10	0,11	0,08	0,75	0,85
K10+540	10	0,12	0,12	1,15	2,00
K10+550	10	0,09	0,11	1,05	3,05
K10+560	10	0,09	0,09	0,9	3,95
K10+570	10	0,08	0,09	0,85	4,80
K10+580	10	0,08	0,08	0,8	5,60
K10+590	10	0,1	0,09	0,9	6,50
K10+600	10	0,12	0,11	1,1	7,60
K10+610	10	0,08	0,10	1	8,60
K10+620	10	0,09	0,09	0,85	9,45
K10+630	10	0,09	0,09	0,9	10,35
K10+640	10	0,09	0,09	0,9	11,25
K10+650	10	0,1	0,10	0,95	12,20
K10+660	10	0,08	0,09	0,9	13,10
K10+670	10	0,08	0,08	0,8	13,90
K10+680	10	0,09	0,09	0,85	14,75
K10+690	10	0,08	0,09	0,85	15,60
K10+700	10	0,07	0,08	0,75	16,35
K10+710	10	0,07	0,07	0,7	17,05
K10+720	10	0,05	0,06	0,6	17,65
K10+730	10	0,05	0,05	0,5	18,15
K10+740	10	0,04	0,05	0,45	18,60
K10+750	10	0,05	0,05	0,45	19,05
K10+760	10	0,06	0,06	0,55	19,60
K10+769	9,42	0,03	0,05	0,4239	20,03
TOTAL					**20,03**

OBRAS HIDRAULICAS DEL FRENTE 3

Elemento	Abcisa	Calzada	long	Ancho	Area	Altura	Volumen
Disipador	K10+610	Derecha	7,7	2,10	16,17	0,35	5,60
Disipador	K10+693	Derecha	9	2,00	18,00	0,67	12,00
Disipador	K10+790	Derecha	8,4	2,30	19,32	0,76	14,64
Disipador	K10+880	Derecha	8,6	2,00	17,20	0,67	11,46
Disipador	K10+690	Izquierda		2,10	4,40		9,24
Disipador	K10+770	Izquierda		2,20	4,74		10,43
Desarenador	K12+010	Derecha	2,5	1,20	3,00	1,30	3,90
Desarenador	K12+030	Derecha	2,5	1,20	3,00	1,30	3,90
Desarenador	K12+470	Derecha	2,5	1,20	3,00	1,30	3,90
TOTAL							**75,07**

EXCAVACION CUNETA COSTADO DERECHO K10+520-K10+967

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K10+520		0,068			
K10+530	10	0,061	0,06	0,645	0,65
K10+540	10	0,068	0,06	0,645	1,29
K10+550	10	0,027	0,05	0,475	1,77
K10+560	10	0,029	0,03	0,28	2,05
K10+570	10	0,044	0,04	0,365	2,41
K10+580	10	0,064	0,05	0,54	2,95
K10+590	10	0,067	0,07	0,655	3,61
K10+600	10	0,048	0,06	0,575	4,18
K10+610	10	0,077	0,06	0,625	4,81
K10+620	10	0,084	0,08	0,805	5,61
K10+630	10	0,056	0,07	0,7	6,31
K10+640	10	0,111	0,08	0,835	7,15
K10+650	10	0,058	0,08	0,845	7,99
K10+660	10	0,071	0,06	0,645	8,64
K10+670	10	0,064	0,07	0,675	9,31
K10+680	10	0,077	0,07	0,705	10,02
K10+690	10	0,066	0,07	0,715	10,73
K10+700	10	0,076	0,07	0,71	11,44
K10+710	10	0,098	0,09	0,87	12,31
K10+720	10	0,137	0,12	1,175	13,49
K10+730	10	0,057	0,10	0,97	14,46
K10+740	10	0,095	0,08	0,76	15,22
K10+750	10	0,141	0,12	1,18	16,40
K10+760	10	0,215	0,18	1,78	18,18
K10+770	10	0,243	0,23	2,29	20,47
K10+780	10	0,25	0,25	2,465	22,93
K10+790	10	0,219	0,23	2,345	25,28
K10+800	10	0,206	0,21	2,125	27,40
K10+810	10	0,226	0,22	2,16	29,56
K10+820	10	0,257	0,24	2,415	31,98
K10+830	10	0,285	0,27	2,71	34,69
K10+840	10	0,315	0,30	3	37,69
K10+850	10	0,207	0,26	2,61	40,30
K10+860	10	0,177	0,19	1,92	42,22
K10+870	10	0,121	0,15	1,49	43,71
K10+880	10	0,155	0,14	1,38	45,09
K10+890	10	0,166	0,16	1,605	46,69
K10+900	10	0,177	0,17	1,715	48,41
K10+910	10	0,08	0,13	1,285	49,69
K10+920	10	0,053	0,07	0,665	50,36
K10+930	10	0,091	0,07	0,72	51,08
K10+940	10	0,151	0,12	1,21	52,29
K10+950	10	0,166	0,16	1,585	53,87
K10+960	10	0,168	0,17	1,67	55,54
K10+966	6,28	0,128	0,15	0,93	56,47
TOTAL					**56,47**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	33	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)	**NO DE ORDEN**	15.1	**UNIDAD**	m3

EXCAVACION BOX DE SERVICIO K12+500 ENCOLE

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+028		12,15			
K0+030	2,00	10,27	11,21	22,42	22,42
K0+032	2,00	8,49	9,38	18,76	41,18
K0+033	0,83	7,91	8,20	6,806	47,99
K0+034	0,92	7,36	7,64	7,0242	55,01
K0+034	0,25	7,21	7,29	1,82125	56,83
TOTAL					**56,83**

EXCAVACION BOX OH-06

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+000		1,3			
K0+005	5	1,3	1,30	6,5	6,50
K0+010	5	1,58	1,44	7,2	13,70
K0+015	5	0,94	1,26	6,3	20,00
K0+020	5	1,04	0,99	4,95	24,95
K0+025	4,88	1	1,02	4,9776	29,93
TOTAL					**29,93**

EXCAVACION BOX DE SERVICIO K12+500 DESCOLE

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+011		0,11			
K0+012	0,60	0,01	0,06	0,036	0,036
K0+014	2,00	0,56	0,29	0,57	0,606
K0+016	2,00	5,34	2,95	5,9	6,506
K0+018	1,52	8	6,67	10,1384	16,6444
K0+018	0,48	5,63	6,82	3,2712	19,9156
K0+019	0,83	1,75	3,69	3,0627	22,9783
TOTAL					**22,98**

EXCAVACION BOX OH-04

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+000		1,92			
K0+000	0,3	1,93	1,93	0,5775	0,58
K0+005	4,56	2,15	2,04	9,3024	9,88
K0+010	5	2,3	2,23	11,125	21,00
K0+015	5	2,25	2,28	11,375	32,38
K0+020	4,7	1,76	2,01	9,4235	41,80
K0+021	0,8	2,15	1,96	1,564	43,37
TOTAL					**43,37**

EXCAVACION BOX OH-010

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
0		1,41			
1,11	1,11	1,31	1,36	1,5096	1,51
5	3,89	0,99	1,15	4,4735	5,98
6,67	1,67	0,84	0,92	1,52805	7,51
8,76	2,09	0,65	0,75	1,55705	9,07
TOTAL					**9,07**

EXCAVACION BOX OH-03

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+000		1,51			
K0+005	5	2,55	2,03	10,15	10,15
K0+010	5	3,07	2,81	14,05	24,20
K0+014	3,63	2,64	2,86	10,36365	34,56
K0+014	0,3	2,03	2,34	0,7005	35,26
TOTAL					**35,26**

EXCAVACION BOX OH-07

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+002		8,07			
K0+004	2	8,37	8,22	16,44	16,44
K0+006	2	8,1	8,24	16,47	32,91
K0+008	2	7,76	7,93	15,86	48,77
K0+010	2	7,27	7,52	15,03	63,80
K0+012	2	6,69	6,98	13,96	77,76
K0+014	2	6,13	6,41	12,82	90,58
K0+016	2	5,76	5,95	11,89	102,47
K0+018	2	5,69	5,73	11,45	113,92
K0+020	2	6,27	5,98	11,96	125,88
K0+022	2	6,85	6,56	13,12	139,00
K0+024	2	7,32	7,09	14,17	153,17
K0+024	0,37	5,94	6,63	2,4531	155,62
K0+026	1,63	5,48	5,71	9,3073	164,93
TOTAL					**164,93**

EXCAVACION BOX OH-02

Abscisa	long	Area exc m2	Promedio area	Vol exc m3	Vol exc AC m3
K0+000		2,43			
K0+005	5	2,26	2,35	11,725	11,73
K0+010	5	2,1	2,18	10,9	22,63
K0+015	5	1,9	2,00	10	32,63
K0+018	3,4	1,73	1,82	6,171	38,80
TOTAL					**38,80**


Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:
Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**600.1.1P. Excavaciones varias sin clasificar (No incluye transporte de material proveniente de excavacion)**	**NO DE ORDEN**	**15.1**	**UNIDAD**	m3


Excavación estructural BOX OH-010

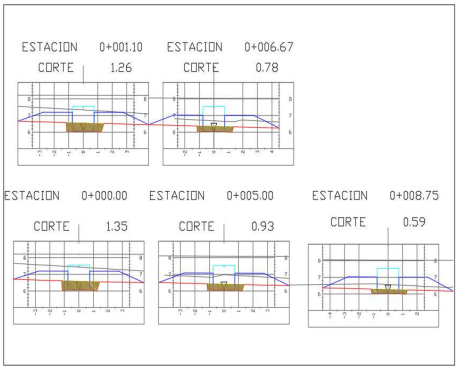


Excavación estructural BOX OH-06

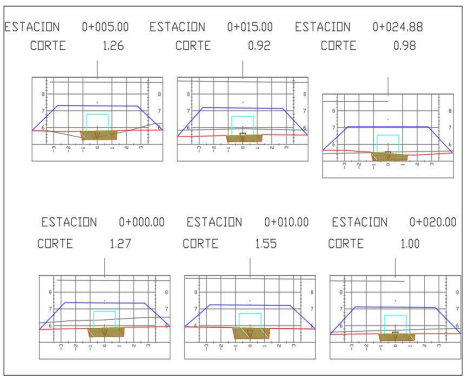


Excavación estructural BOX OH-04

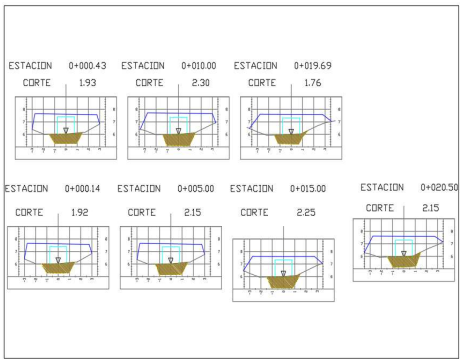

Excavación estructural BOX OH-03

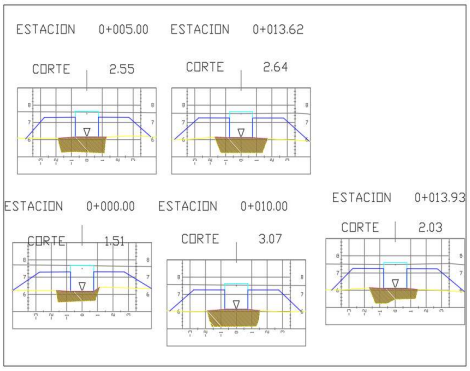

Excavación estructural BOX OH-02

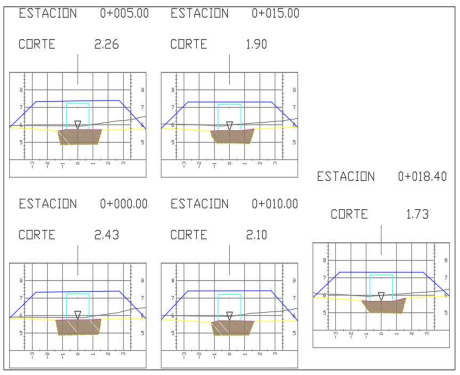

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Relleno para estructuras con recebo**	**NO DE ORDEN**	**18**	**UNIDAD**	**m3**

DESCRIPCION	UBICACIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
BOX CULVERT	FRENTE 4	m3	40,40
BOX CULVERT	FRENTE 7	m3	974,08
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			1.014,48
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			55,27
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33			959,21

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Relleno para estructuras con recebo**	**NO DE ORDEN**	**18**	**UNIDAD**	m3

Lleno box de servicio Encole y Descole K12+500

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
16		1,78		
17,52	1,52	6,26	6,11	6,11
28		9,99		
30	2	7,66	17,65	23,76
32,83	2,83	4,1	16,64	40,40
TOTAL				**40,40**

lleno estructural BOX OH10

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
0		4,02		
1,11	1,11	4,21	4,57	4,57
5	3,89	4,17	16,30	20,87
6,67	1,67	4,18	6,97	27,84
8,76	2,09	4,56	9,13	36,97
TOTAL				**36,97**

lleno estructural BOX OH9

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
0		5,18		
1,95	1,95	5,31	10,23	10,23
5	3,05	6,47	17,96	28,19
7,73	2,73	7,56	19,15	47,34
8,1	0,37	7,34	2,76	50,10
TOTAL				**50,10**

lleno estructural BOX OH8

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
0		6,54		
0,54	0,54	6,63	3,56	3,56
3,54	3	6,28	19,37	22,92
8,54	5	6,85	32,83	55,75
13,54	5	7,23	35,20	90,95
14,33	0,79	7,22	5,71	96,65
15,97	1,64	6,24	11,04	107,69
TOTAL				**107,69**

lleno estructural BOX OH7

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
2		4,09		
4	2	4,29	8,38	8,38
6	2	4,46	8,75	17,13
8	2	4,67	9,13	26,26
10	2	4,61	9,28	35,54
12	2	5,13	9,74	45,28
14	2	5,33	10,46	55,74
16	2	5,47	10,80	66,54
18	2	5,77	11,24	77,78
20	2	5,25	11,02	88,80
22	2	6,17	11,42	100,22
24	2	6,15	12,32	112,54
24,37	0,37	6,29	2,30	114,84
26	1,63	6,49	10,42	125,26
TOTAL				**125,26**

lleno estructural BOX OH6

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
0		9,82		
5	5	9,83	49,13	49,13
10	5	9,21	47,60	96,73
15	5	10,43	49,10	145,83
20	5	10,26	51,73	197,55
24,88	4,88	10,05	49,56	247,11
TOTAL				**247,11**

lleno estructural BOX OH4

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
0,14		6,32		
0,44	0,3	6,33	1,90	1,90
5	4,56	6,48	29,21	31,10
10	5	7,46	34,85	65,95
15	5	6,98	36,10	102,05
19,7	4,7	7,11	33,11	135,17
20,5	0,8	6,91	5,61	140,77
TOTAL				**140,77**

lleno estructural BOX OH3

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
0		5,76		
5	5	6,08	29,60	29,60
10	5	6,74	32,05	61,65
13,63	3,63	6,67	24,34	85,99
13,93	0,3	6,6	1,99	87,98
TOTAL				**87,98**

lleno estructural BOX OH2

Abscisa	LONG	Area llenom2	Vol T m3	volumen acumulado
0		9,31		
5	5	9,68	47,48	47,48
10	5	10,4	50,20	97,68
15	5	9,31	49,28	146,95
18,4	3,4	9,07	31,25	178,20
TOTAL				**178,20**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Relleno para estructuras con recebo**	**NO DE ORDEN**	**18**	**UNIDAD**	m3


Lleno box de servicio Encole y Descole K12+500

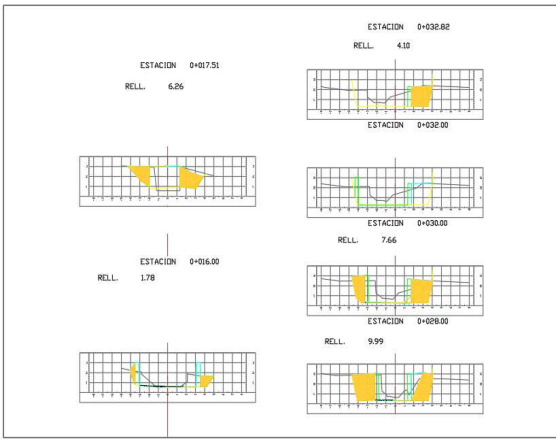


lleno estructural BOX OH-010

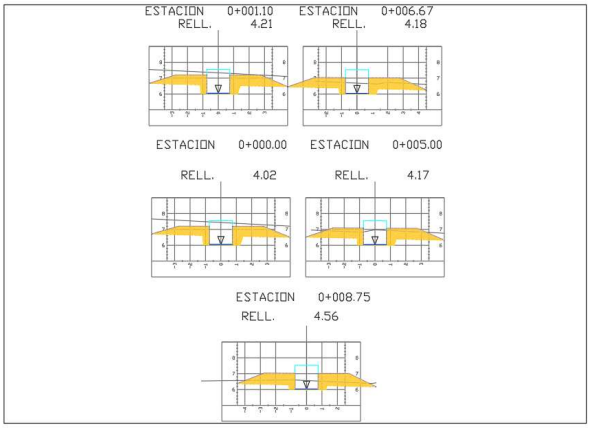


lleno estructural BOX OH-09

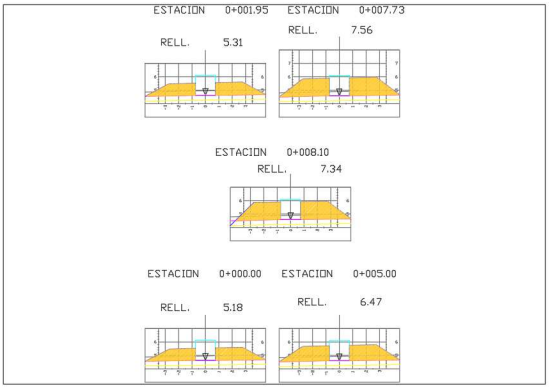


lleno estructural BOX OH-08

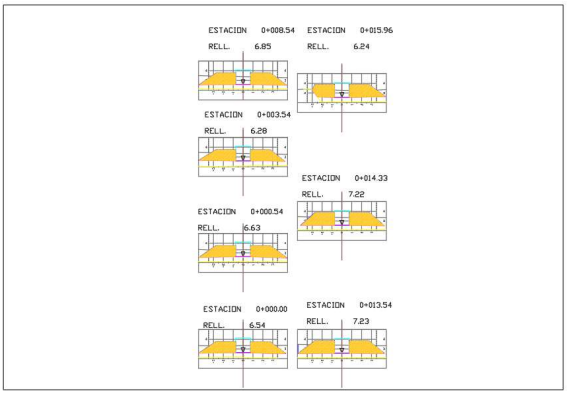

lleno estructural BOX OH-07

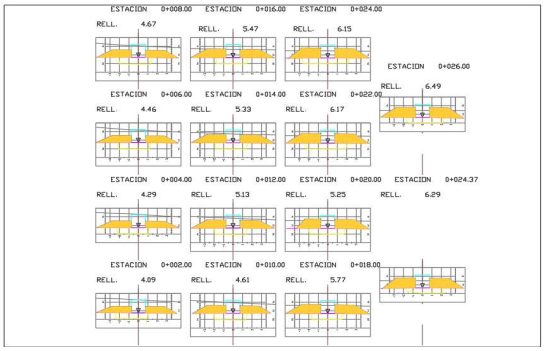

lleno estructural BOX OH-06

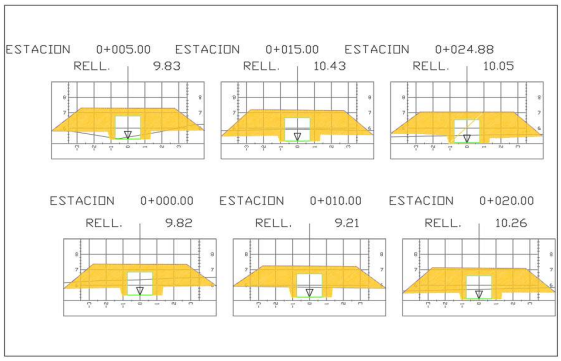

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Relleno para estructuras con recebo**	**NO DE ORDEN**	**18**	**UNIDAD**	m3


lleno estructural BOX OH-04

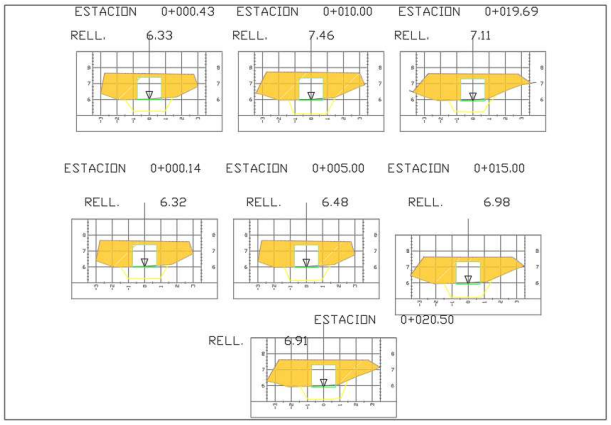

lleno estructural BOX OH-03

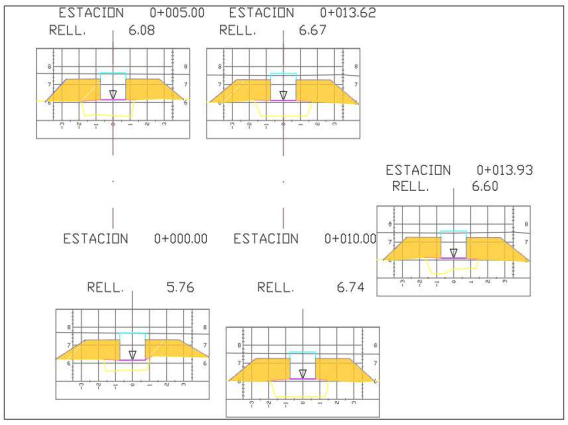

lleno estructural BOX OH-02

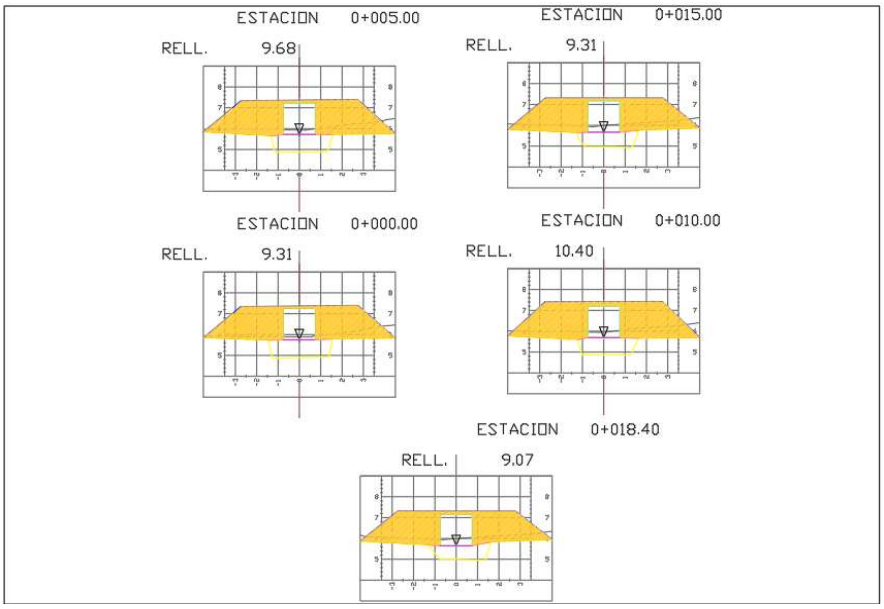

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.9P. Concreto clase 28 MPA para estribos**		**NO DE ORDEN**	**32**	**UNIDAD** m3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	UNIDAD	VOLUMEN
CANAL EN CONCRETO K10+432 a K11+240	FRENTE 3	m3	879,63
BOX CULVERT DE SERVICIO K12+500	FRENTE 4	m3	30,26
BOX CULVERT OH-013	FRENTE 7	m3	13,10
BOX CULVERT OH-012	FRENTE 7	m3	13,14
BOX CULVERT OH-010	FRENTE 7	m3	11,26
BOX CULVERT OH-09	FRENTE 7	m3	10,26
BOX CULVERT OH-08	FRENTE 7	m3	28,09
BOX CULVERT OH-07	FRENTE 7	m3	30,69
BOX CULVERT OH-06	FRENTE 7	m3	31,53
BOX CULVERT OH-05	FRENTE 7	m3	54,26
BOX CULVERT OH-04	FRENTE 7	m3	33,59
BOX CULVERT OH-03	FRENTE 7	m3	17,76
BOX CULVERT OH-02	FRENTE 7	m3	23,33
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			1.176,90
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			1.005,09
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33			171,81

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33



SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**630.9P. Concreto clase 28 MPA para estribos**	**NO DE ORDEN**	**32**	**UNIDAD**	m3

CANAL RECTANGULAR K10+432 a K11+240

DETALLE	DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD (ml)	VOLUMEN (m3)
	CANAL RECTANGULAR	1,38	628,31	867,07
 DETALLE 2 LLAVE DE FUNDACION INTERMEDIA GEOMETRIA ESCALA 1:10	LLAVE DE FUNDACION INTERMEDIA	0,02	628,31	12,57
TOTAL				**879,63**

BOX DE SERVICIO K12+500

DESCRIPCION		ELEMENTO	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	VOLUMEN (m3)
	DESCOLE	LOSA INFERIOR	11,14		0,25	2,785
		VASTAGO DERECHO	7,8		0,4	3,12
		VASTAGO IZQUIERDO	6,57		0,4	2,628
		LLAVE DE CIERRE LOSA INFERIOR	0,09	7,3		0,657
	ENCOLE	ZARPA IZQUIERDA	12,22		0,4	4,888
		ZARPA DERECHA	14,57		0,4	5,828
		VASTAGO DERECHO	14,26		0,4	5,704
		VASTAGO IZQUIERDO	10,4		0,4	4,16
		EMPALME CUNETA DERECHA	1,86		0,1	0,186
		EMPALME CUNETA IZQUIERDA	3,04		0,1	0,304
TOTAL						**30,26**

BOX CULVERT- OH-010

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	8,8			11,00	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**11,26**	

BOX CULVERT- OH-09

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	8			10,00	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**10,26**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma

Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.9P. Concreto clase 28 MPA para estribos**	**NO DE ORDEN**	**32**	**UNIDAD**	m3

BOX CULVERT- OH8

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	16			20,00	CUERPO BOX CULVERT
		1,6	0,35	0,3	0,17	GUARDA RUEDA ENCOLE
	8,36		0,25		2,09	LOSA ENCOLE
	1,74		0,3		0,52	LLAVE ENCOLE
	0,55		1,15		1,27	ALETAS ENCOLE (2UND)
		1,6	0,35	0,3	0,17	GUARDA RUEDA DESCOLE
	8,36		0,25		2,09	LOSA DESCOLE
	1,74		0,3		0,52	LLAVE DESCOLE
	0,55		1,15		1,27	ALETAS DESCOLE (2UND)
TOTAL					**28,09**	

BOX CULVERT- OH7

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	24,15			30,19	CUERPO DE BOX DERECHO
		2,4	0,35	0,3	0,25	GUARDA RUEDA ENCOLE
		2,4	0,35	0,3	0,25	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**30,69**	

BOX CULVERT- OH-06

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	25,01			31,26	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**31,53**	

BOX CULVERT- OH-05

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	43			53,75	CUERPO DE BOX DERECHO
		2,92	0,35	0,25	0,26	GUARDA RUEDA ENCOLE
		2,9	0,35	0,25	0,25	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**54,26**	

BOX CULVERT- OH-04

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	20,45			25,56	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
	8,36		0,25		2,09	LOSA ENCOLE
	1,74		0,3		0,52	LLAVE ENCOLE
	0,55		1,15		1,27	ALETAS ENCOLE (2UND)
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
	8,36		0,25		2,09	LOSA DESCOLE
	1,74		0,3		0,52	LLAVE DESCOLE
	0,55		1,16		1,28	ALETAS DESCOLE (2UND)
TOTAL					**33,59**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.9P. Concreto clase 28 MPA para estribos**	**NO DE ORDEN**	**32**	**UNIDAD**	m3

BOX CULVERT- OH-03

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	14			17,50	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**17,76**	

BOX CULVERT- OH-02

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	18,45			23,06	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**23,33**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**630.9P. Concreto clase 28 MPA para estribos**	**NO DE ORDEN**	**32**	**UNIDAD**	m3

BOX CULVERT- OH-12

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	10,3			12,88	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**13,14**	

BOX CULVERT- OH-13

DESCRIPCION	AREA (m2)	LONGITUD	ESPESOR	ANCHO	VOLUMEN (m3)	ELEMENTO
	1,25	10,27			12,84	CUERPO DE BOX DERECHO
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA ENCOLE
		1,5	0,35	0,25	0,13	GUARDA RUEDA DESCOLE
TOTAL					**13,10**	

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Concreto clase 21 MPA**	**NO DE ORDEN**	**33**	**UNIDAD**	**m3**

Elemento	Ubicacion	Unidad	Volumen
ANDEN	FRENTE CERO	m3	23,20
CAJAS PARA CARCAMO	FRENTE CERO	m3	4,53
ALCANTARILLA	FRENTE CERO	m3	1,64
DESARENADORES	FRENTE 3	m3	5,46
DISIPADORES	FRENTE 3	m3	30,80
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			**65,63**
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			**42,00**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33			**23,63**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33


SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**			**01/03/2025 a 31/03/2025**		
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"						
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA		
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**			
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO						
ITEM	**Concreto clase 21 MPA**			**NO DE ORDEN**	**33**	**UNIDAD**	**m3**


ANDEN - VIA DE SERVICIO DEL FRENTE CERO					
Elemento	**Ubicación**	**Area**	**Espesor**	**Area**	**Volumen**
Anden	Frente Cero	232,03	0,10	232,03	23,20
TOTAL					**23,20**


DESARENADOR - FRENTE 3						
Elemento	**Calzada**	**Abcisa**	**Elemento**	**Area**	**Espesor**	**Volumen**
Desarenador	Derecha	K10+010	Talud y Hombro de cuneta	5,00	0,10	0,50
			Cajon	0,36	2,40	0,86
Desarenador	Derecha	K10+030	Talud y Hombro de cuneta	5,00	0,10	0,50
			Cajon	0,36	2,40	0,86
Desarenador	Derecha	K10+470	Talud y Hombro de cuneta	5,00	0,10	0,50
			Cajon	0,36	2,40	0,86
Desarenador	Izquierda	K10+470	Talud y Hombro de cuneta	5,00	0,10	0,50
			Cajon	0,36	2,40	0,86
TOTAL						**5,46**


DISIPADOR - FRENTE 3						
Elemento	**Calzada**	**Abcisa**	**Elemento**	**Area**	**Ancho**	**Volumen**
Disipador	Derecha	K10+610	Huellas- Contrahuellas	1,675	1,50	2,51
			Muros Laterales	13,12	0,15	1,97
Disipador	Derecha	K10+693	Huellas- Contrahuellas	1,778	1,50	2,67
			Muros Laterales	14,00	0,15	2,10
			Muro de Cierre	1,15	0,35	0,40
Disipador	Derecha	K10+790	Huellas- Contrahuellas	1,725	1,50	2,59
			Muros Laterales	12,66	0,15	1,90
Disipador	Derecha	K10+880	Huellas- Contrahuellas	2,00	1,50	2,99
			Muros Laterales	15,12	0,15	2,27
Disipador	Derecha	K10+966	Muro de Cierre a Disipador	8,58	0,15	1,29
Disipador	Izquierda	K10+690	Huellas- Contrahuellas	2,11	1,20	2,53
			Muros Laterales	13,96	0,15	2,09
			Llaves	0,27	1,20	0,32
Disipador	Izquierda	K10+770	Huellas- Contrahuellas	2,12	1,20	2,54
			Muros Laterales	15,32	0,15	2,30
			Llaves	0,27	1,20	0,32
TOTAL						**30,80**


ESQUEMA DE SEGUIMIENTO























Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Concreto clase 21 MPA**		**NO DE ORDEN**	**33**	**UNIDAD** **m3**

CAJAS DE CARCAMOS EN FRENTE CERO

Elemento	Calzada	Abcisa	Elemento	Area	Espesor	Volumen
caja 1 area1=0.38 h1=0.36 area2=0.30 h1=0.26			Muro	0,380	0,36	0,14
			Muro	0,300	0,26	0,08
			Piso	1,44	0,25	0,36
caja 2 area1=0.38 h1=0.60 area2=0.30 h1=0.50			Muro	0,380	0,60	0,23
			Muro	0,30	0,50	0,15
			Piso	1,44	0,25	0,36
caja 3 area1=0.38 h1=0.70 area2=0.30 h1=0.60			Muro	0,380	0,70	0,27
			Muro	0,30	0,60	0,18
			Piso	1,44	0,25	0,36
caja 4 area1=0.44 h1=1.15 area2=0.36 h1=1.05			Muro	0,44	1,15	0,51
			Muro	0,36	1,05	0,38
			Piso	1,44	0,25	0,36
caja 5 area1=0.44 h1=1.05 area2=0.36 h1=0.95			Muro	0,44	1,05	0,46
			Muro	0,36	0,95	0,34
			Piso	1,44	0,25	0,36
TOTAL						**4,53**

CABEZAL DE SALIDA EN FRENTE CERO

Elemento	Calzada	Abcisa	Elemento	Area	Espesor	Volumen
			Pantalla	1,38	0,15	0,21
			Losa	2,59	0,15	0,39
			Muro Izquierdo	2,15	0,15	0,32
			Muro Derecho	2,15	0,15	0,32
			Losa Piso del tubo	1,82	0,15	0,27
			Losa Proteccion del tubo	0,86	0,15	0,13
TOTAL						**1,64**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.6. Concreto clase 14 MPA**	**NO DE ORDEN**	**34**	**UNIDAD**	**m3**

Elemento	Ubicacion	Unidad	Volumen
MURO DE CONTENCION	FRENTE CERO	m3	26,96
CANAL EN CONCRETO	FRENTE 3	m3	53,41
CARCAMOS	FRENTE 3	m3	4,38
PUENTE PEATONAL OASIS	PUENTE 3	m3	6,40
OBRAS HIDRAULICAS	FRENTE 4	m3	1,90
OBRAS HIDRAULICAS	FRENTE 7	m3	18,54
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			**111,58**
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			**100,98**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33			**10,60**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.6. Concreto clase 14 MPA**		**NO DE ORDEN**	**34**	**UNIDAD** m3

SOLADO MURO DE CONTENCIÓN (FRENTE CERO)

MÓDULO	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	VOLUMEN
2	12,16	2,65	0,05	32,224	1,61
3	12,16	2,65	0,05	32,224	1,61
4	12,16	2,65	0,05	32,224	1,61
5	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
6	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
7	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
8	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
9	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
10	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
11	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
12	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
13	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
14	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
15	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
16	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
17	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
18	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
19	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
20	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
21	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
22	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
23	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
24	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
25	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
26	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
27	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
28	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
29	6,16	2,45	0,05	15,092	0,75
30	6,16	2,26	0,05	13,9216	0,70
31	12,16	2,26	0,05	27,4816	1,37
32	10,5	2,26	0,05	23,73	1,19
				TOTAL	**26,96**

CANAL EN CONCRETO- FRENTE 3

DESCRIPCION	LONG	ANCHO	ESPESOR	VOL M3
CANAL - FRENTE 3	628,31	1,7	0,05	53,41

CARCAMOS- FRENTE CERO

DESCRIPCION	LONG	ANCHO	ESPESOR	VOL M3
CARCAMO	26,3	2,4	0,05	3,16
CARCAMO- RETORNO	24,55	1	0,05	1,23
				4,38

MEJORAMIENTO EN CICLOPEO PTE PEATONAL


ZARPA	LARGO	ANCHO	ESPESOR	AREA	VOLUMEN	%	VOLUMEN ROCA
APOYO 1	4	4	0,5	16	8,00	40%	**3,20**
APOYO 2	4	4	0,5	16	8,00	40%	**3,20**
			TOTAL				**6,40**

OBRAS HIDRAULICAS (FRENTE 4)

ELEMENTO	AREA	LONG	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
BOX DE SERVICIO ENCOLE	12,22			0,05	0,611
BOX DE SERVICIO ENCOLE	14,57			0,05	0,7285
BOX DE SERVICIO DESCOLE	11,14			0,05	0,557
TOTAL					**1,90**

OBRAS HIDRAULICAS (FRENTE 3)

ELEMENTO	AREA	LONG	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
CUERPO BOX CULVERT OH-010		8,8	1,70	0,05	0,75
CUERPO BOX CULVERT OH-09		8	1,70	0,05	0,68
CUERPO BOX CULVERT OH-12		10,30	1,70	0,05	0,88
CUERPO BOX CULVERT OH-13		10,27	1,70	0,05	0,87
CUERPO BOX CULVERT OH-08		16	1,70	0,05	1,36
ENCOLE BOX CULVERT OH-08	8,36			0,05	0,42
DESCOLE BOX CULVERT OH-08	8,36			0,05	0,42
CUERPO BOX CULVERT OH-07		24,15	1,70	0,05	2,05
CUERPO BOX CULVERT OH-06		25,01	1,70	0,05	2,13
CUERPO BOX CULVERT OH-05		43,00	1,70	0,05	3,66
CUERPO BOX CULVERT OH-04		20,45	1,70	0,05	1,74
ENCOLE BOX CULVERT OH-04	8,36			0,05	0,42
DESCOLE BOX CULVERT OH-04	8,36			0,05	0,42
BOX CULVERT OH-03		14,00	1,70	0,05	1,19
BOX CULVERT OH-02		18,45	1,70	0,05	1,57
TOTAL					**18,54**



Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**640.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**	**NO DE ORDEN**	**36.1**	**UNIDAD**	m3

DESCRIPCION	UBICACIÓN	UND	CANTIDAD
CANAL RECTANGULAR K10+432 a K11+240	FRENTE 3	KG	41.713,50
PUENTE PEATONAL K9+310 a K9+340	PUENTE 3	KG	1.877,63
CUNETAS	FRENTE 3	KG	2.308,76
DISIPADORES	FRENTE 3	KG	532,22
CARCAMO- RETORNO	FRENTE CERO	KG	1.187,74
ALCANTARILLA	FRENTE CERO	KG	202,37
BOX CULVERT DE SERVICIO	FRENTE 4	KG	1.542,36
BOX CULVERT OH-013	FRENTE 7	KG	1.223,10
BOX CULVERT OH-012	FRENTE 7	KG	1.223,10
BOX CULVERT OH-010	FRENTE 7	KG	1.050,86
BOX CULVERT OH-09	FRENTE 7	KG	970,70
BOX CULVERT OH-08	FRENTE 7	KG	2.660,15
BOX CULVERT OH-07	FRENTE 7	KG	2.683,32
BOX CULVERT OH-06	FRENTE 7	KG	2.789,48
BOX CULVERT OH-05	FRENTE 7	KG	4.686,27
BOX CULVERT OH-04	FRENTE 7	KG	3.179,02
BOX CULVERT OH-03	FRENTE 7	KG	1.607,66
BOX CULVERT OH-02	FRENTE 7	KG	2.110,30
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			73.548,54
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			60.206,79
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33			13.341,74

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	33	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTOR**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1 Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**	**NO DE ORDEN**	**36.1**	**UNIDAD**	m3

CANAL RECTANGULAR

CUADRO DE DESPIECE CANAL UN MODULO DE 12 METROS

ITEM	#	Peso Unit. (Kg)	LONG	CANT	Cant Modulos	Peso Modulo
C1	4	1	12	30	1,00	360
C2A	4	1	2,45	40	1,00	98
C2B	4	1	2,2	40	1,00	88
C3	4	1	1,8	40	1,00	72
C4A	4	1	1,55	40	1,00	62
C4B	4	1	1,3	40	1,00	52
L1	4	1	1,9	8	1,00	15
L2	5	1,55	1,55	7	1,00	17
L3	5	1,55	0,75	7	1,00	8
L4	5	1,55	3,52	7	1,00	38
					TOTAL	**810**

DESCRIPCION	Kg/ml	LONGITUD (ml)	PESO (Kg)
CANAL RECTANGULAR	66,39	628,31	41.713,50

PUENTE PEATONAL EL OASIS

ELEMENTO	VARILLA N°	POCISIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	PESO Kg/ml	TOTAL Kg
ZARPA	5	I	3,36	62	1,55	322,90
	5	Z	3,5	102	1,55	553,35
	5	L	2,9	74	1,55	332,63
VASTAGO	6	V	3,64	30	2,24	244,61
	6	G	3,5	30	2,24	235,20
	5	K	1,4	50	1,55	108,50
	5	U	1,73	30	1,55	80,45
TOTAL						**1877,63**


CUNETAS Y DISIPADORES - FRENTE 3

ELEMENTO	ABCISA INICIAL	ABCISA FINAL	CALZADA	LONG	ANCHO	KG/M2	TOTAL KG
CUNETA	K10+520	K10+700	DERECHA	165,22	1,1	3	545,23
CUNETA	K10+520	K10+700	DERECHA	3,29	0,74	3	7,30
CUNETA	K10+700	K10+967	DERECHA	258,4	1	3	775,20
CUNETA	K10+700	K10+967	DERECHA	2,3	0,7	3	4,83
CANAL TRAPEZOIDAL	K12+520	K12+540		20	3,4	3	204
CUNETA	K10+515	K10+770	IZQUIERDA	255	1	3	765,00
CUNETA	K10+515	K10+770	IZQUIERDA	3	0,8	3	7,20
TOTAL							**2.309**

DISIPADOR - FRENTE 3

ELEMENTO	ABCISA	CALZADA	ELEM	LONG	ANCHO	AREA	KG/M2	VOLUMEN
DISIPADOR	K10+610	DERECHA	Muro			11,78	3	35,34
			Piso	11,05	1,40	15,47	3	46,41
DISIPADOR	K10+693	DERECHA	Muro			12,62	3	37,86
			Piso	11,85	1,40	16,59	3	49,77
DISIPADOR	K10+790	DERECHA	Muro			10,94	3	32,82
			Piso	11,49	1,40	16,09	3	48,26
DISIPADOR	K10+880	DERECHA	Muro			13,04	3	39,12
			Piso	13,30	1,40	18,62	3	55,86
DISIPADOR	K10+966	DERECHA	Muro			4,97	3	14,91
DISIPADOR	K10+690	IZQUIERDA	Muro			13,62	3	40,86
			Piso	14,13	1,10	15,54	3	46,63
DISIPADOR	K10+770	IZQUIERDA	Muro			12,64	3	37,92
			Piso	14,08	1,10	15,49	3	46,46
TOTAL								**532,22**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

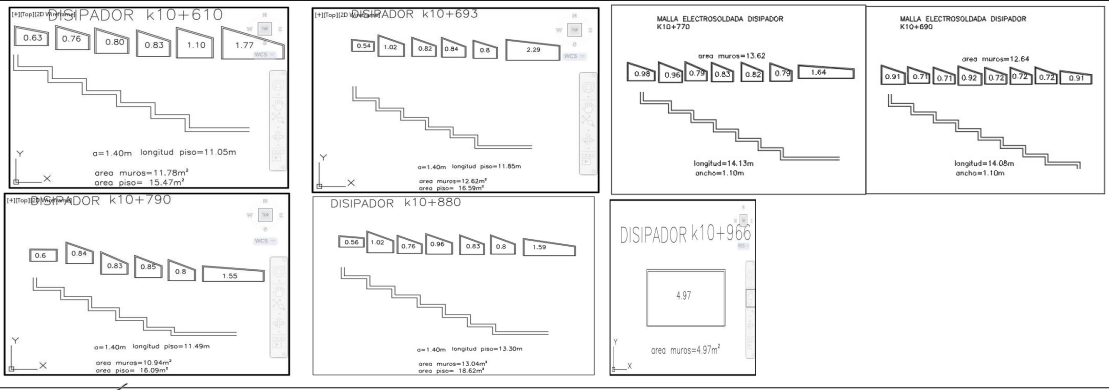

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**		**NO DE ORDEN**	**36.4**	**UNIDAD**	**Kg**

ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	AREA	PESO TOTAL (KG)
CARCAMO LOSA Y MUROS				951,17
REJILLAS				236,57
TOTAL				**1.187,74**

PROYECTO	VARIANTE CIÉNAGA	Estructura	CÁRCAMOS Y PASOS	Recubrimiento		Elaboró		FECHA	16/12/2024
Frente	FRENTE 0	Localización	KM000	Plano		Aprobó		HOJA 1	1 DE 1

Nº	FIGURA	ITEM	Gancho (90, 135 o 180)	Nº Ganchos	Espacio entre varillas	Nº Varilla	Longitud 1 Gancho	Longitud	Longitud 2 Gancho	Longitud 1 Traslapo (m)	Longitud varilla (m)	Cantidad	Longitud Total (m)	Peso barra m/l	Peso (kg)
		CRUCE NO. 1													
1		REFUERZO CARA EXTERNA CUERPO NO. 1			0,12	3	0,60	0,90	0,60		2,10	103	216,30	0,994kg/m	320,24kg
2		REFUERZO CARA EXTERNA PASO NO.1			0,12	3	0,60	0,90	0,60		2,10	11	23,10	0,994kg/m	12,84kg
3		REFUERZO CARA EXTERNA PASO NO. 2			0,12	3	0,60	0,90	0,60		2,10	11	23,10	0,994kg/m	12,84kg
4		REFUERZO CARA INTERNA CUERPO NO. 1			0,12	3	0,50	0,70	0,50		1,70	103	175,10	0,994kg/m	97,34kg
5		REFUERZO CARA INTERNA PASO NO. 1			0,12	3	0,50	0,70	0,50		1,70	11	18,70	0,994kg/m	10,40kg
6		REFUERZO CARA INTERNA PASO NO. 2			0,12	3	0,60	0,70	0,60		1,90	11	20,90	0,994kg/m	11,62kg
7	14,68	REFUERZO LOSA INFERIOR DEL CÁRCAMO			0,12	3	0,00	14,68	0,00		14,68	15	220,20	0,994kg/m	122,43kg
8	14,68	ACERO LONGITUDINAL INTERNO CRUCE NO. 1			0,12	3	0,00	14,68	0,00		14,68	8	117,44	0,994kg/m	65,30kg
9	14,68	ACERO LONGITUDINAL EXTERNO CRUCE NO. 1			0,12	3	0,00	14,68	0,00		14,68	10	146,80	0,994kg/m	81,62kg
		CRUCE NO. 2													
10		REFUERZO CARA EXTERNA CUERPO NO. 2			0,12	3	0,70	0,90	0,70		2,30	51	117,30	0,994kg/m	65,22kg
11		REFUERZO CARA EXTERNA PASO NO. 3			0,12	3	0,70	0,90	0,70		2,30	23	52,90	0,994kg/m	29,41kg
12		REFUERZO CARA EXTERNA PASO NO. 4			0,12	3	0,70	0,90	0,70		2,30	11	25,30	0,994kg/m	14,07kg
13		REFUERZO CARA INTERNA CUERPO NO. 2			0,12	3	0,60	0,70	0,60		1,90	51	96,90	0,994kg/m	53,88kg
14		REFUERZO CARA INTERNA PASO NO. 3			0,12	3	0,60	0,70	0,60		1,90	23	43,70	0,994kg/m	24,30kg
15		REFUERZO CARA INTERNA PASO NO. 4			0,12	3	0,65	0,70	0,65		2,00	11	22,00	0,994kg/m	12,23kg
16	9,73	REFUERZO LOSA INFERIOR DEL CÁRCAMO			0,12	3	0,00	9,73	0,00		9,73	15	145,95	0,994kg/m	81,15kg
17	9,73	ACERO LONGITUDINAL INTERNO CRUCE NO. 2			0,12	3	0,00	9,73	0,00		9,73	12	116,76	0,994kg/m	64,92kg
18	9,73	ACERO LONGITUDINAL EXTERNO CRUCE NO. 2			0,12	3	0,00	9,73	0,00		9,73	13	126,49	0,994kg/m	70,33kg

	No. 3	No. 4	No. 5	No. 8	
CANTIDAD DE VARILLAS	151	0	0	0	TOTAL KG 960,17kg

PROYECTO	VARIANTE CIÉNAGA	Estructura	REJILLA DE CÁRCAMOS	Recubrimiento		Elaboró		FECHA	16/12/2024
Frente	FRENTE 0	Localización	KM000	Plano		Aprobó		HOJA 1	1 DE 1

Nº	FIGURA	ITEM	Gancho (90, 135 o 180)	Nº Ganchos	Espacio entre varillas	Nº Varilla	Longitud 1 Gancho	Longitud	Longitud 2 Gancho	Longitud 1 Traslapo (m)	Longitud varilla (m)	Cantidad	Longitud Total (m)	Peso barra m/l	Peso (kg)
		ACERO CÁRCAMOS - REJILLAS													
1	1,00 / 0,75 / 0,75 / 1,00	ESTRIBO REJILLA DEL CÁRCAMO			1,10	4	0,75	2,00	0,75		3,50	24	84,00	0,994kg/m	83,50kg
2	0,68 / 0,10 / 0,10	ACERO TRANSVERSAL PARA REJILLA DEL CÁRCAMO			1,10	4	0,10	0,68	0,10		0,88	175	154,00	0,994kg/m	153,08kg

	No. 3	No. 4	No. 5	No. 8	
CANTIDAD DE VARILLAS	0	20	0	0	TOTAL KG 236,57kg

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**32**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/12/2024 a 31/12/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**	**NO DE ORDEN**	**36.4**	**UNIDAD**	**Kg**

CABEZAL DE SALIDA- ALCANTARILLA - FRENTE CERO

MARCA	BARRA No	SEPARACION	ESQUEMA	LONGITUD (m)	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
P1	4		0,77 – 1,47 Variable	1,12	0,99 kg/m	22	24,49
P2	4		1,4 – 1,20 Variable	1,30	0,99 kg/m	22	28,43
FML-03	4		0,85 / 0,85	1,80	0,99 kg/m	6	10,74
FML-04	4		recta	0,90	0,99 kg/m	8	7,16
FML-04a	4		0,40 / 3,40	3,80	0,99 kg/m	22	83,10
FML-04b	4		3,05 – 0,85 Variable	1,95	0,99 kg/m	25	48,46
			TOTAL				**202,37**

ENCOLE Y DESCOLE BOX DE SERVICIO K12+500 - FRENTE 4

MARCA	BARRA No	SEPARACION	ESQUEMA	LONGITUD (m)	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
M1b	4	Via servicio	Recta	6,00	0,99 kg/m	16	95,42
M3b	4	Via servicio	1.95 / 0.2 / 2.5	4,65	0,99 kg/m	21	97,06
M4b	4	Via servicio	0.2 / 0.2 / 2.2	2,60	0,99 kg/m	28	72,36
M5b	4	Via servicio	Recta	6,00	0,99 kg/m	16	95,42
M2c	4	Via servicio	0.5 / 0.2 / 2.5	3,20	0,99 kg/m	28	89,06
M6c	4	Via servicio	0.5 / 1.5	2,00	0,99 kg/m	27	53,68
M1b	4	Via Talud	Recta	5,00	0,99 kg/m	16	79,52
M3b	4	Via Talud	1.95 / 0.2 / 2.5	4,65	0,99 kg/m	18	83,20
M4b	4	Via Talud	0.2 / 0.2 / 2.2	2,60	0,99 kg/m	24	62,03
M5b	4	Via Talud	Recta	5,00	0,99 kg/m	16	79,52
M2c	4	Via Talud	0.5 / 0.2 / 2.5	3,20	0,99 kg/m	24	76,34
M6c	4	Via Talud	0.5 / 1.5	2,00	0,99 kg/m	45	89,46
PA1	4	ACERO VERTICAL EXTERNO ALETA IZQUIERDA	0.2 / 0.4 / 2.45 - 1-65	2,65	0,99 kg/m	16	42,15
PA2	4	ACERO VERTICAL EXTERNO ALETA IZQUIERDA	0.40 / 0.15 / 1.65 - 2.45	2,60	0,99 kg/m	16	41,35
PA3	4	ACERO VERTICAL INTERNO ALETA DERECHA	0.2 / 0.4 / 2.45	3,05	0,99 kg/m	16	48,51
PA4	4	ACERO VERTICAL INTERNO ALETA DERECHA	0.2 / 0.4 / 2.45	3,05	0,99 kg/m	16	48,51
PA5	4	ACERO VERTICAL INTERNO ALETA DERECHA	Recta	3,00	0,99 kg/m	24	71,57
PA6	4	ACERO VERTICAL EXTERNO ALETA IZQUIERDA	Recta	3,00	0,99 kg/m	20	59,64
PL1	4	ACERO TRANSVERSAL LOSA	0.15 / 0.15 / 7.10 - 2.76	5,23	0,99 kg/m	24	124,77
PL2	4	ACERO LONGITUDINAL LOSA	2.15 / 0.3	2,45	0,99 kg/m	28	68,19
PL3	4	ACERO LONGITUDINAL LOSA (BAÑOLETAS)	0.3 / 2.15 - 0.5	1,63	0,99 kg/m	40	64,61
			TOTAL				**1.542,36**


Elaboró
EL CONTRATISTA:


Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

SOPORTE DEL ACTA No.	32	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/12/2024 a 31/12/2024	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	981 de 2022	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.			NO DE ORDEN	36.4	UNIDAD	Kg

BOX CULVERT OH-013					LONGITUD (m)	10,27	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	424	745,98
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	37	441,34
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
TOTAL							**1.223,10**

BOX CULVERT OH-12					LONGITUD (m)	10,30	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	424	745,98
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	37	441,34
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
TOTAL							**1.223,10**


Elaboró
EL CONTRATISTA:


Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

SOPORTE DEL ACTA No.	32	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/12/2024 a 31/12/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**		**NO DE ORDEN**	**36.4**	**UNIDAD** **Kg**

BOX CULVERT OH-010					**LONGITUD (m)**	**8,8**	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	360	633,38
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	32	381,70
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
TOTAL							**1.050,86**

BOX CULVERT OH-09					**LONGITUD (m)**	**8**	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	328	577,08
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	30	357,84
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
TOTAL							**970,70**

BOX CULVERT OH-08					**LONGITUD (m)**	**16**	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	648	1.140,08
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	54	644,11
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
FML-05	4	Aleta	3,00	Recta	0,99 kg/m	44	131,21
FML-06	4	Aleta	3,00	Recta	0,99 kg/m	44	131,21
FML-07	4	Aleta	1,80		0,99 kg/m	64	114,51
FML-08	4	Aleta	1,80		0,99 kg/m	64	114,51
FML-01	4	Losa inf	3,95		0,99 kg/m	40	157,05
FML-02	4	Losa inf	5,90	Recta	0,99 kg/m	8	46,92
FML-03	4	Losa inf	2,40		0,99 kg/m	16	38,17
FML-03a	4	Losa inf	2,20		0,99 kg/m	16	34,99
FML-03b	4	Losa inf	1,68		0,99 kg/m	22	36,63
FML-03c	4	Losa inf	1,60		0,99 kg/m	22	34,99
TOTAL							**2.660,15**


Elaboró
EL CONTRATISTA:


Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

SOPORTE DEL ACTA No.	**32**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/12/2024 a 31/12/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**		**NO DE ORDEN**	**36.4**	**UNIDAD** **Kg**

BOX CULVERT OH-07					**LONGITUD (m)**	**24,15**	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	976	1.717,15
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	78	930,38
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
TOTAL							**2.683,32**

BOX CULVERT OH-06					**LONGITUD (m)**	**25,01**	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	1016	1.787,53
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	81	966,17
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
TOTAL							**2.789,48**

BOX CULVERT OH-05					**LONGITUD (m)**	**43,00**	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	1728	3.040,21
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	135	1.610,28
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
TOTAL							**4.686,27**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma





Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra


Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma

Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

SOPORTE DEL ACTA No.	**32**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/12/2024 a 31/12/2024**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**640.1. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.**		**NO DE ORDEN**	**36.4**	**UNIDAD** **Kg**

BOX CULVERT OH4					**LONGITUD (m)**	**20,83**	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	848	1.491,95
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	68	811,10
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
FML-05	4	Aleta	3,00	Recta	0,99 kg/m	44	131,21
FML-06	4	Aleta	3,00	Recta	0,99 kg/m	44	131,21
FML-07	4	Aleta	1,80		0,99 kg/m	64	114,51
FML-08	4	Aleta	1,80		0,99 kg/m	64	114,51
FML-01	4	Losa inf	3,95		0,99 kg/m	40	157,05
FML-02	4	Losa inf	5,90	Recta	0,99 kg/m	8	46,92
FML-03	4	Losa inf	2,40		0,99 kg/m	16	38,17
FML-03a	4	Losa inf	2,20		0,99 kg/m	16	34,99
FML-03b	4	Losa inf	1,68		0,99 kg/m	22	36,63
FML-03c	4	Losa inf	1,60		0,99 kg/m	22	34,99
				TOTAL			**3.179,02**

BOX CULVERT OH3					**LONGITUD (m)**	**14,00**	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	568	999,33
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	48	572,54
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
				TOTAL			**1.607,66**

BOX CULVERT OH2					**LONGITUD (m)**	**18,45**	
MARCA	BARRA No	SEPARACION	LONGITUD (m)	ESQUEMA	PESO (kg)	CANTIDAD	TOTAL (kg)
FML-01	4	0,20	1,77		0,99 kg/m	752	1.323,05
FML-02	4	0,30	12,00		0,99 kg/m	63	751,46
GRF	4	0,20	1,50		0,99 kg/m	16	23,86
GRR	4	0,25	1,50		0,99 kg/m	8	11,93
				TOTAL			**2.110,30**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**650.3 Transporte de estructura metalica**			**NO DE ORDEN**	**42** **UNIDAD** **KG**

DESPIECE DE ACERO ESTRUCTURAL

	PUENTE 4				PUENTE 3			PUENTE 2		PUENTE 1			
Elemento	**P13-P12**	**P12-P11**	**P11-P10**	**P10-P9**	**P9-P8**	**P8-P7**	**P7-P6**	**P6-P5**	**P5-P4**	**P4-P3**	**P3-P2**	**P2-P1**	**P1-E1**
Viga principal Alma/Patines		614.551				484.730			184.243		273.127		
Conexión pernada Tipo 1		15.827,11				25.323,37			5.535,29		9.282,24		
Conexión pernada Tipo 2		11.773,94				10.391,54			3.319,34		8.223,21		
Conexión pernada Tipo 3						0,00			0,00		0,00		
Conexión pernada Tipo 4		5.195,77				0,00			0,00		0,00		
Viga Diafragma		1.709,73	1.606,11	1.916,97	3.523,08	1.606,11	1.968,78	3.885,75	1.968,78	3.678,51	1.709,73	1.709,73	1.916,97
Platinas V. Diafragma		267,78	267,78	267,78	535,56	267,78	267,78	535,56	267,78	535,56	267,78	267,78	267,78
Arriostramiento Lateral		1.225,41	1.440,38	1.299,67	1.433,21	1.447,44	1.433,20	998,08	870,94	1.086,19	1.349,04	1.349,03	1.088,09
Platina AL 1			582,79	509,94	582,79	582,79	582,79	437,09	364,25	437,09	582,79	582,79	437,09
Platina AL 2			1.070,84	936,99	1.070,84	1.070,84	1.070,84	803,13	669,28	803,13	1.070,84	1.070,84	803,13
Cuerda Sup			1.569,20	1.345,03	1.569,20	1.569,20	1.569,20	1.156,79	925,01	1.121,77	1.563,10	1.565,54	1.122,07
Cuerda Inf			1.569,20	1.345,03	1.569,20	1.569,20	1.569,20	1.156,79	925,01	1.121,77	1.563,10	1.565,54	1.122,07
Diagonales			2.097,95	1.798,24	2.097,95	2.097,95	2.097,95	1.501,58	1.201,26	1.489,40	2.085,15	2.085,15	1.489,40
Platina 1			864,08	740,64	864,08	864,08	864,08	617,20	493,76	617,20	864,08	864,08	617,20
Platina 2			352,03	301,74	352,03	352,03	352,03	251,45	201,16	251,45	352,03	352,03	251,45
Platina 3			473,92	552,91	473,92	552,91	552,91	552,91	394,93	315,95	394,93	552,91	552,91
Rigidizador apoyo tipo 1		3.278,00				3.278,00			1.632,00		1.606,50		
Rigidizador apoyo tipo 2		3.777,00				7.551,00			3.274,00		3.328,00		
Rigidizador apoyo tipo 3		7.753,00				7.749,00			0,00		6.656,00		
Rigidizadores Transversal tipo 1		6.057,00				3.400,00			4.470,00		7.159,50		
Rigidizadores Transversal tipo 2		2.685,00				4.259,00			1.029,00		1.090,50		
Rigidizadores Transversal tipo 3		7.416,00				5.236,00			0,00		0,00		
Conector Tipo 8"		30.438,79				13.910,07			4.394,74		8.110,82		
Conector Tipo 10"		0,00				0,00			0,00		2.688,63		
Conector Tipo 12"		0,00				11.154,89			2.226,46		2.907,23		
Topes Sismico Tipo 1		415,93				415,93			0,00		242,37		
Topes Sismico Tipo 2		318,91				637,81			0,00		455,52		
Topes Sismico Tipo 3		554,34				0,00			0,00		0,00		
PL 190X2400X13		0,00				0,00			0,00		0,00		
PL 290X2400X13		852,32				852,32			0,00		426,16		
PL490X2400X13		1.440,13				0,00			0,00		1.080,10		
PL590X2400X13		867,02				1.734,03			0,00		0,00		
PL300X2400X13		21.161,09				18.515,95			0,00		10.580,54		
TOTAL				**760.474,64**			**637.520,00**		**230.302,00**				**381.858,39**
PERNOS 0,86%				**6.540,00**			**5.483,00**		**1.981,00**				**3.284,00**
SOLDADURA (3%)				**22.814,00**			**19.126,00**		**6.909,00**				**11.456,00**
TOTAL EJECUTADO				**789.828,64**			**662.129,00**		**239.192,00**				**396.598,39**

PUENTE PEATONAL EL OASIS					
ELEMENTO	**CANTIDAD**	**LONG**	**AREA (m2)**	**DENSIDAD (Kg/m3)**	**TOTAL**
VIGAS METALICAS	3	18	0,01244	7.840	5.266,60



HEA 320 = AREA 0,01244

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	2.093.014,63
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	1.696.416,24
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33	396.598,39

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**650.4 Montaje de estructura metálica Acero**		**NO DE ORDEN**	**43**	**UNIDAD** KG

DESPIECE DE ACERO ESTRUCTURAL

	PUENTE 4				PUENTE 3			PUENTE 2		PUENTE 1			
Elemento	**P13-P12**	**P12-P11**	**P11-P10**	**P10-P9**	**P9-P8**	**P8-P7**	**P7-P6**	**P6-P5**	**P5-P4**	**P4-P3**	**P3-P2**	**P2-P1**	**P1-E1**
Viga principal Alma/Patines		614.551				484.730			184.243				
Conexión pernada Tipo 1		15.827,11				25.323,37			5.535,29				
Conexión pernada Tipo 2		11.773,94				10.391,54			3.319,34				
Conexión pernada Tipo 3						0,00			0,00				
Conexión pernada Tipo 4		5.195,77				0,00			0,00				
Viga Diafragma		1.709,73	1.606,11	1.916,97	3.523,08	1.606,11	1.968,78	3.885,75	1.968,78				
Platinas V. Diafragma		267,78	267,78	267,78	535,56	267,78	267,78	535,56	267,78				
Arriostramiento Lateral		1.225,41	1.440,38	1.299,67	1.433,21	1.447,44	1.433,20	998,08	870,94				
Platina AL 1			582,79	509,94	582,79	582,79	582,79	437,09	364,25				
Platina AL 2			1.070,84	936,99	1.070,84	1.070,84	1.070,84	803,13	669,28				
Cuerda Sup			1.569,20	1.345,03	1.569,20	1.569,20	1.569,20	1.156,79	925,01				
Cuerda Inf			1.569,20	1.345,03	1.569,20	1.569,20	1.569,20	1.156,79	925,01				
Diagonales			2.097,95	1.798,24	2.097,95	2.097,95	2.097,95	1.501,58	1.201,26				
Platina 1			864,08	740,64	864,08	864,08	864,08	617,20	493,76				
Platina 2			352,03	301,74	352,03	352,03	352,03	251,45	201,16				
Platina 3			473,92	552,91	473,92	552,91	552,91	552,91	394,93				
Rigidizador apoyo tipo 1		3.278,00				3.278,00			1.632,00				
Rigidizador apoyo tipo 2		3.777,00				7.551,00			3.274,00				
Rigidizador apoyo tipo 3		7.753,00				7.749,00			0,00				
Rigidizadores Transversal tipo 1		6.057,00				3.400,00			4.470,00				
Rigidizadores Transversal tipo 2		2.685,00				4.259,00			1.029,00				
Rigidizadores Transversal tipo 3		7.416,00				5.236,00			0,00				
Conector Tipo 8"		30.438,79				13.910,07			4.394,74				
Conector Tipo 10"		0,00				0,00			0,00				
Conector Tipo 12"		0,00				11.154,89			2.226,46				
Topes Sismico Tipo 1		415,93				415,93			0,00				
Topes Sismico Tipo 2		318,91				637,81			0,00				
Topes Sismico Tipo 3		554,34				0,00			0,00				
PL 190X2400X13		0,00				0,00			0,00				
PL 290X2400X13		852,32				852,32			0,00				
PL490X2400X13		1.440,13				0,00			0,00				
PL590X2400X13		867,02				1.734,03			0,00				
PL300X2400X13		21.161,09				18.515,95			0,00				
TOTAL				**760.474,64**			**637.520,00**		**230.302,00**				**-**
PERNOS 0,86%				**6.540,00**			**5.483,00**		**1.981,00**				**-**
SOLDADURA (3%)				**22.814,00**			**19.126,00**		**6.909,00**				
TOTAL EJECUTADO				**789.828,64**			**662.129,00**		**239.192,00**				**-**

PUENTE PEATONAL EL OASIS					
ELEMENTO	**CANTIDAD**	**LONG**	**AREA (m2)**	**DENSIDAD (Kg/m3)**	**TOTAL**
VIGAS METALICAS	3	18	0,01244	7.840	5.266,60



HEA 320 = AREA 0,01244

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	1.696.416,24
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	1.457.224,24
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33	239.192,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.10. Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga**	**NO DE ORDEN**	**59**	**UNIDAD**	m3

FRENTE	ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD
PUENTE 4	VIGA CABEZAL	m3	149,16
PUENTE 3	VIGA CABEZAL	m3	92,47
PUENTE 2	VIGA CABEZAL	m3	31,64
PUENTE 1	VIGA CABEZAL	m3	71,27
FRENTE CERO	CARCAMO	m3	32,95
CANTIDAD TOTAL CALCULADO			377,49
COBRADOS ACTAS ANTERIORES			366,19
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33			11,30

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO







Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**630.10. Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga**		**NO DE ORDEN**	**59**	**UNIDAD** m3

VIGAS CABEZALES

Pila	Descripción	Cantidad (un)	Ancho (m)	Longitud (m)	Área (m2)	Alto (m)	Volumen Total (m3)
Escalón 1	Apoyo 13	1,00	0,75	3,80	2,85	1,31	3,73
Escalón 2	Apoyo 13	1,00	0,75	4,40	3,30	1,40	4,62
Escalón 3	Apoyo 13	1,00	0,75	3,80	2,85	1,49	4,25
Escalón 4	Apoyo 13	1,00	0,75	3,80	2,85	1,30	3,71
Escalón 5	Apoyo 13	1,00	0,75	4,40	3,30	1,39	4,59
Escalón 6	Apoyo 13	1,00	0,75	3,80	2,85	1,48	4,22
Tope Sis 1	Apoyo 13	1,00	1,50	1,16	1,74	2,30	4,00
Tope Sis 2	Apoyo 13	1,00	1,50	1,16	1,74	2,30	4,00
Viga No. 13							**33,12**
Escalón 1	Apoyo 12	1,00	1,30	3,80	4,94	1,30	6,42
Escalón 2	Apoyo 12	1,00	1,30	4,40	5,72	1,39	7,95
Escalón 3	Apoyo 12	1,00	1,30	3,80	4,94	1,48	7,31
Tope Sis 1	Apoyo 12	1,00	1,30	0,96	1,25	2,30	2,87
Tope Sis 2	Apoyo 12	1,00	1,30	0,96	1,25	2,30	2,87
Viga No. 12							**27,42**
Escalón 1	Apoyo 11	1,00	1,30	3,80	4,94	1,30	6,42
Escalón 2	Apoyo 11	1,00	1,30	4,40	5,72	1,39	7,95
Escalón 3	Apoyo 11	1,00	1,30	3,80	4,94	1,48	7,31
Tope Sis 1	Apoyo 11	1,00	1,30	0,96	1,25	2,30	2,87
Tope Sis 2	Apoyo 11	1,00	1,30	0,96	1,25	2,30	2,87
Viga No. 11							**27,42**
Escalón 1	Apoyo 10	1,00	1,30	3,80	4,94	1,30	6,42
Escalón 2	Apoyo 10	1,00	1,30	4,40	5,72	1,39	7,95
Escalón 3	Apoyo 10	1,00	1,30	3,80	4,94	1,48	7,31
Tope Sis 1	Apoyo 10	1,00	1,30	0,86	1,12	2,30	2,57
Tope Sis 2	Apoyo 10	1,00	1,30	0,86	1,12	2,30	2,57
Viga No. 10							**26,82**
Seccion A							
Escalón 1	Apoyo 9	1,00	0,75	3,80	2,85	1,30	3,71
Escalón 2	Apoyo 9	1,00	0,75	4,40	3,30	1,48	4,88
Escalón 3	Apoyo 9	1,00	0,75	3,80	2,85	1,57	4,47
Tope Sis 1	Apoyo 9	1,00	0,75	1,16	0,87	2,31	2,01
Tope Sis 2	Apoyo 9	1,00	0,75	1,16	0,87	2,30	2,00
Seccion B							
Escalón 1	Apoyo 9	1,00	0,75	3,80	2,85	1,57	4,47
Escalón 2	Apoyo 9	1,00	0,75	4,40	3,30	1,48	4,88
Escalón 3	Apoyo 9	1,00	0,75	3,80	2,85	1,39	3,96
Tope Sis 1	Apoyo 9	1,00	0,75	1,16	0,87	2,30	2,00
Tope Sis 2	Apoyo 9	1,00	0,75	1,16	0,87	2,30	2,00
Viga No. 9							**34,38**
Escalón 1	Apoyo 8	1,00	1,30	3,80	4,94	1,30	6,42
Escalón 2	Apoyo 8	1,00	1,30	4,40	5,72	1,48	8,47
Escalón 3	Apoyo 8	1,00	1,30	3,80	4,94	1,57	7,76
Tope Sis 1	Apoyo 8	1,00	1,30	0,86	1,12	2,30	2,57
Tope Sis 2	Apoyo 8	1,00	1,30	0,86	1,12	2,30	2,57
Viga No. 8							**27,79**
Escalón 1	Apoyo 7	1,00	1,30	3,80	4,94	1,30	6,42
Escalón 2	Apoyo 7	1,00	1,30	4,40	5,72	1,48	8,47
Escalón 3	Apoyo 7	1,00	1,30	3,80	4,94	1,57	7,76
Tope Sis 1	Apoyo 7	1,00	1,30	0,86	1,12	2,30	2,57
Tope Sis 2	Apoyo 7	1,00	1,30	0,86	1,12	2,30	2,57
Viga No. 7							**27,79**
Seccion A							
Escalón 1	Apoyo 6	1,00	0,75	3,80	2,85	1,30	3,71
Escalón 2	Apoyo 6	1,00	0,75	4,40	3,30	1,65	5,45
Escalón 3	Apoyo 6	1,00	0,75	3,80	2,85	1,84	5,24
Tope Sis 1	Apoyo 6	1,00	0,75	1,11	0,83	2,46	2,05
Tope Sis 2	Apoyo 6	1,00	0,75	1,11	0,83	2,30	1,91
Seccion B							
Escalón 1	Apoyo 6	1,00	0,75	3,46	2,60	1,73	4,49
Escalón 2	Apoyo 6	1,00	0,75	4,40	3,30	1,63	5,38
Escalón 3	Apoyo 6	1,00	0,75	4,14	3,11	1,46	4,53
Tope Sis 1	Apoyo 6	1,00	0,75	0,85	0,64	2,41	1,54
Tope Sis 2	Apoyo 6	1,00	0,75	1,50	1,13	2,30	2,59
Viga No. 6							**36,89**
Escalón 1	Apoyo 5	1,00	1,30	3,80	4,94	1,30	6,42
Escalón 2	Apoyo 5	1,00	1,30	4,40	5,72	1,65	9,44
Escalón 3	Apoyo 5	1,00	1,30	3,80	4,94	1,85	9,14
Tope Sis 1	Apoyo 5	1,00	1,30	1,11	1,44	2,30	3,32
Tope Sis 2	Apoyo 5	1,00	1,30	1,11	1,44	2,30	3,32
Viga No. 5							**31,64**

VIGAS CABEZALES

Pila	Descripción	Cantidad (un)	Ancho (m)	Longitud (m)	Área (m2)	Alto (m)	Volumen Total (m3)
Seccion A							
Escalón 1	Apoyo 4	1,00	0,75	3,47	2,60	2,13	5,54
Escalón 2	Apoyo 4	1,00	0,75	4,40	3,30	1,77	5,84
Escalón 3	Apoyo 4	1,00	0,75	4,13	3,10	1,30	4,03
Tope Sis 10	Apoyo 4	1,00	0,75	1,11	0,83	2,30	1,91
Tope Sis 9	Apoyo 4	1,00	0,75	1,11	0,83	2,45	2,04
Seccion B							
Escalón 1	Apoyo 4	1,00	0,75	4,13	3,10	1,45	4,49
Escalón 2	Apoyo 4	1,00	0,75	4,40	3,30	1,80	5,94
Escalón 3	Apoyo 4	1,00	0,75	3,47	2,60	2,00	5,21
Tope Sis 9	Apoyo 4	1,00	0,75	1,11	0,83	2,30	1,91
Tope Sis 10	Apoyo 4	1,00	0,75	1,11	0,83	2,43	2,02
Viga No. 4							**38,93**
Escalón 1	Apoyo 2	1,00	1,30	3,80	4,94	2,07	10,23
Escalón 2	Apoyo 2	1,00	1,30	4,40	5,72	1,74	9,95
Escalón 3	Apoyo 2	1,00	1,30	3,80	4,94	1,30	6,42
Tope Sis 1	Apoyo 2	1,00	1,30	0,96	1,25	2,30	2,87
Tope Sis 2	Apoyo 2	1,00	1,30	0,96	1,25	2,30	2,87
Viga No. 2							**32,34**

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33


SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				


ITEM	**630.10. Concreto clase 35 MPA para vigas cabezales para el PR9 de la variante Cienaga**		**NO DE ORDEN**	**59**	**UNIDAD**	m3

CARCAMO CALZADA IZQUIERDA- FRENTE CERO			
DESCRIPCION	**AREA M2**	**LONG M**	**VOL M3**
CONCRETO CUERPO	0,84	24,35	20,45
CONCRETO ALETAS	0,6	2	1,2
TOTAL			**21,65**

CARCAMO RETORNO- FRENTE CERO				
ELEMENTO	**LONG ML**	**AREA M2**	**ESPESOR**	**VOLUMEN M3**
CARCAMO ENTRE CAJA 1 Y 2	14,83	0,37		5,55
CARCAMO ENTRE CAJA 2 Y 3	9,72	0,43		4,15
REJILLAS	25,00	0,64	0,100	1,60
TOTAL				**11,30**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

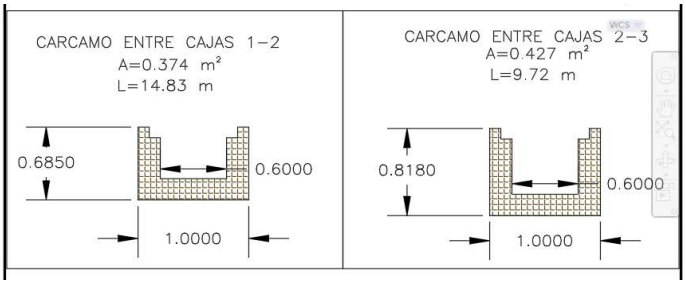



REJILLA

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**642.2.Suministro e instalación de apoyo elastomerico de 30cm*20cm*3cm**	**NO DE ORDEN**	**70**	**UNIDAD**	**Un**

PUENTE	APOYO	CANTIDAD
PUENTE 4	13	2,00
	12	2,00
	11	2,00
	10	2,00
	9	2,00
PUENTE 3	8	2,00
	7	2,00
	6	2,00
PUENTE 2	5	2,00
	4	2,00



DETALLE TOPE SÍSMICO 1
ESCALA 1:33



APOYO DE NEOPRENO TIPO 1
ESCALA 1:10

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	20,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	16,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33	4,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:
Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD


Aprobó
EL INTERVENTOR:
Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL


PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**642.3. Suministro e instalación de apoyo elastomerico de diametro 65 cm espesor 10 cm, con 5 refuerzos A36 de 3 mm, para el PR9 de la variante de cienaga.**	**NO DE ORDEN**	**71**	**UNIDAD**	Un

PUENTE	APOYO	CANTIDAD
PUENTE 3	6	3,00
PUENTE 2	5	3,00
	4	3,00



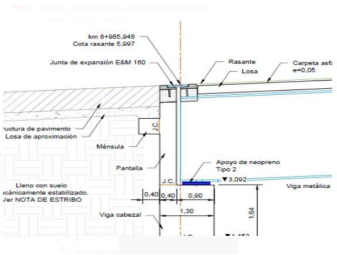

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	9,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	3,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33	6,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **HECTOR ESPINOZA PATIÑO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202140932 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**			01/03/2025 a 31/03/2025
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES-GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIENAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXION PUMAREJO				
ITEM	**900.2. Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)**	**NO DE ORDEN**	**57**	**UNIDAD**	m3-Km






DESCRIPCION	ITEM	VOLUMEN	KM (FRENTE CERO)	M3-KM
MATERIAL DE EXCAVACION	210.2.2	5.176,41	19,00	98.351,87
MATERIAL DE EXCAVACION	600.1.1P	1.100,66	19,00	20.912,63
MATERIAL DE TERRAPLEN	220.1P	917,13	30,50	27.972,47
MATERIAL DE PEDRAPLEN	221.1P	2.146,93	30,50	65.481,35

DESCRIPCION	ITEM	VOLUMEN	KM (FRENTE 3)	M3-KM
MATERIAL DE EXCAVACION	600.1.1P	1.753,20	21,125	37.036,43

DESCRIPCION	ITEM	VOLUMEN	KM (FRENTE 7)	M3-KM
MATERIAL DE EXCAVACION	210.2.2	19.311,54	17,10	330.227,28
MATERIAL DE EXCAVACION	600.1.1P	401,16	17,10	6.859,90
MATERIAL DE TERRAPLEN	220.1P	843,81	28,07	23.683,13
MATERIAL DE TERRAPLEN PENDIENTE DEL ACTA N°32	220.1P	21.397,44	28,07	600.561,93

CANTIDAD TOTAL CALCULADO	1.211.086,99
COBRADOS ACTAS ANTERIORES	513.315,60
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33	697.771,39

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

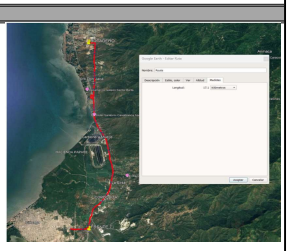Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		01/03/2025 a 31/03/2025	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORIAL:**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**CARRETERA:**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				

ITEM	**621.5.3P. Camisa metálica permanente para pilote de diámetro 1.33 m en Acero ASTM A36 espesor 9mm. (incluye proceso de hincado)**	**NO DE ORDEN**	**73**	**UNIDAD**	**ml**

APOYO	PILOTE	ESTE	NORTE	LONG PILOTE EFECTIVA
13	42	980453,685	1708460,508	29,00
	41	980457,493	1708462,749	29,00
	40	980461,277	1708464,975	29,00
12	39	980433,384	1708512,378	33,00
	38	980429,592	1708510,146	33,00
	37	980425,800	1708507,915	33,00
11	36	980405,491	1708559,780	28,00
	35	980401,699	1708557,549	28,00
	34	980397,907	1708555,317	28,00
10	33	980372,527	1708615,801	32,00
	32	980368,735	1708613,569	32,00
	31	980364,943	1708611,338	32,00
9	30	980342,098	1708667,512	28,00
	29	980338,306	1708665,281	28,00
	28	980334,514	1708663,050	28,00
8	27	980309,134	1708723,533	32,00
	26	980305,342	1708721,302	32,00
	25	980301,549	1708719,070	32,00
7	24	980276,169	1708779,555	32,00
	23	980272,377	1708777,323	33,00
	22	980268,585	1708775,091	33,00
6	21	980242,845	1708835,519	27,00
	20	980239,124	1708833,170	27,00
	19	980235,403	1708830,821	27,00
5	18	980242,845	1708835,519	21,00
	17	980239,124	1708833,170	21,00
	16	980235,403	1708830,821	21,00
4	15	980186,405	1708900,441	32,00
	14	980183,633	1708897,024	32,00
	13	980180,860	1708893,607	32,00
3	12	980143,822	1708928,187	30,00
	11	980141,818	1708924,270	30,00
	10	980139,811	1708920,355	30,00
2	9	980086,541	1708948,988	31,00
	8	980085,567	1708944,697	30,00
	7	980084,592	1708940,406	30,00
1	5	980026,011	1708950,572	38,00
	4	980026,129	1708946,173	38,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO				1141,00
COBRADOS ACTAS ANTERIORES				1111,00
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33				30,00

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO

Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRES LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:


Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL

PREACTA DE OBRA N°33

SOPORTE DEL ACTA No.	**33**	**PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE**		**01/03/2025 a 31/03/2025**	
OBJETO	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CONEXIÓN PUENTE PUMAREJO (BARRANQUILLA) - CIÉNAGA (VIADUCTOS) EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ATLÁNTICO Y MAGDALENA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				
CONTRATO No.	**981 de 2022**	**UNIDAD EJECUTORA:**	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES- GRUPO NORTE	**DIRECCIÓN TERRITORI**	MAGDALENA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIADUCTO CIÉNAGA DEL MAGDALENA	**PR**	9007	**SECTOR:**	
INTERVENTOR	CONSORCIO CONEXIÓN PUMAREJO				
ITEM	**Defensas en concreto tipo I en concreto 4000 PSI (No incluye acero de refuerzo) para el PR9 de la variante de Ciénaga**	**NO DE ORDEN**	**75**	**UNIDAD**	**M**

UBICACIÓN	INICIAL	FINAL	LADO	UNIDAD	LONGITUD
Muro Concreto			Izquierdo	ml	210,14
Puente 4			Derecho	ml	235,00
Puente 4			Izquierdo	ml	235,00
Puente 3			Derecho	ml	60,00
Puente 3			Izquierdo	ml	60,00
CANTIDAD TOTAL CALCULADO					**800,14**
COBRADOS ACTAS ANTERIORES					**680,14**
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA No. 33					**120,00**

ESQUEMA DE SEGUIMIENTO





Elaboró
EL CONTRATISTA:

Firma
Nombre: **WILSON ANDRÉS LOPEZ SALGADO**
Residente de Obra
Matrícula No. 17202-108243 CLD

Aprobó
EL INTERVENTOR:

Firma
Nombre: **PEDRO LUIS SALAS TEJEDA**
Residente de Interventoría
Matrícula No. 08202-35360 ATL
