	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 141 DE 2.022 — **Contratista:** CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
F1-F14-289-2022 — JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 — HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
ARG-OBRA-009-2022 — EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
LP 04-003-15.05/058 — CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
LP 005/003-15.5/059 — CONSORCIO ONIX CCM R/L JHSNIER SEGOVIA QUINTERO
F1-F14-240-2022 — CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
484 de 2022 — CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CASTRO CALVO
258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 — CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023 — CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
N° 156 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023 — CONSORCIO INFRAVIAL 2023 R/L PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA

Contrato de Interventoría No. 1100 **Interventoría:** CONSULTORES DONOVAN SAS

Objeto Contrato de Obra:
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9".

INFORME MENSUAL No. **21** **MES O PERIODO:** Ocutbre

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		17
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		18
2.1	Localización		18
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		20
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		25
2.4	Características técnicas del proyecto		25
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		31
3.1	Información general del contrato		31
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		55
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		62
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		68
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		84
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	84
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	135
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	139
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	141
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	150
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	154
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	158
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	168
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		168
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	168
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	N/A
	• Seguimiento Programa de Obra		204
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	N/A
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	187
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	187
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		195
5.1	Información general del contrato		195
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		196
5.3	Informes especialistas y profesionales		196
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		N/A
5.5	Informe matriz de riesgos.		N/A
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		N/A
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		N/A
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		197
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	197
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	198
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	200
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	202
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	2206
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		N/A
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	N/A
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	N/A
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	N/A
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		207
8	**Anexos**		209
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		210
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		215
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		N/A
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		220

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 3886 de fecha 19/10/2022

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: F1-F14-289-2022

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

PLAZO INICIAL:	6 MESES
FECHA DE INICIO:	11/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	21/03/2024
PRORROGA N°1	27/12/2023 - 15/01/2024 (50 DIAS)
SUSPENSIÓN N°1	12/11/2023 - 31/12/2023 (20 DIAS)
REINICIO N°1	17/01/2024
PRORROGA N°3	22/01/2024 - 21/03/2024 (60 DIAS)
PLAZO ACUMULADO:	9.7 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1,799,782,602.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 899,891,301.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 899,891,301.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.885
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	10
Otros (Especificar cuales)	Muro de Concreto reforzado	ml	15

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Placa huella	Construcción	ml	0	964
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Filtro	ml	0	12
	Muros	ml	0	1
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	0	9
Otros (Especificar cuales)			0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,799,782,602.00		1,799,782,602.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,799,782,602.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0.00		$ -	1,799,782,602.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	1,799,782,602.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 1,799,782,602.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,799,782,602.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción placa huella, Abscisa K0+330 Tramo 1



Instalación señalización

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023

OBJETO:

MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA

CONTRATISTA: HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	4/07/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23/02/2024
PRORROGA N°1	5/11/2023 - 31/12/2023 (57 DIAS)
SUSPENSIÓN N°1	26/12/2023 - 15/01/2024 (21 DIAS)
REINICIO N°1	16/01/2024
PRORROGA N°3	22/01/2024 - 23/02/2024 (32 DIAS)
PLAZO ACUMULADO:	6.97 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 795,011,198.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.415
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	4
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	415
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	0	2
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento Vial	m2	0	6665

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	795,011,198.00		795,011,198.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			795,011,198.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0.00		$ -	795,011,198.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	795,011,198.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 793,252,652.80
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 795,011,198.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción final de placa huella



Construcción final de placa huella

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: ARG-OBRA-009-2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 202219050001, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

CONTRATISTA: EMCONSUT S.A.S

PLAZO INICIAL:	3.5 MESES
FECHA DE INICIO:	3/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	18/07/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	En Suspensión
PRORROGA N°1	19/07/2023 - 1/09/2023 (45 DIAS)
PRORROGA N°2	2/09/2023 - 31/10/2023 (60 DIAS)
PRORROGA N°3	1/11/2023 - 31/12/2023 (61 DIAS)
SUSPENSIÓN N°1	22/12/2023
PLAZO ACUMULADO:	10 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 958,081,628.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 287,424,488.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 88,788,288.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.46
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	10
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	55
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	0	4
Otros (Especificar cuales)	Mantenimiento periódico	m2	0	1500

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	958,081,628.00		958,081,628.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			958,081,628.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0.00		$ -	181,135,883.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	181,135,883.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 957,950,000.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 181,135,883.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 18.91%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: F1-F14-240-2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADERES 23

PLAZO INICIAL:	1.7 MESES
FECHA DE INICIO:	9/08/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024
PRORROGA N°1	1/10/2023 - 30/10/2023 (30 DIAS)
PRORROGA N°2	31/10/2023 - 31/12/2023 (62 DIAS)
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023 - 15/01/2024 (19 DIAS)
REINICIO N°1	16/01/2024
PRORROGA 3	20/01/2024 - 31/05/2024 (133días)
PRORROGA 4	01/06/2024 - 30/06/2024 (30días)
PRORROGA 5	01/07/2024 - 31/07/2024 (31 días)
SUSPENSIÓN N°2	26/07/2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/09/2024 - 30/09/2024 (30 días)
REINICIO N°2	1/10/2024
PRORROGA N°6	7/10/204 - 15/12/2024 (69 días)
PLAZO ACUMULADO:	14.5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 2,248,615,000.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 1,124,307,500.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	1.85
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	15
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	220	1170
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	
Otros (Especificar cuales)	Muro de contención	ml	54	54

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	2,248,615,000.00		2,248,615,000.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			2,248,615,000.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 302,367,306.00		$ 302,367,306.00	1,755,663,899.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	1,755,663,899.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 2,005,764,580.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,755,663,899.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	78.08%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	6
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	16
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**24**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA TERMINADA



LABORES REALIZADAS EN PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO,SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS G Y A S. A. S.

PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	16/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024
PRORROGA N°1	1/09/2023 31/10/2023 (61 DIAS)
PRORROGA N°2	1/11/2023 - 31/12/2023 (61 DIAS)
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023
PRORROGA N°3	5/03/2024 3/05/2024 (60 DIAS)
PRORROGA N°4	4/05/2024 31/05/2024 (28 DIAS)
PRORROGA N°5	1/06/2024 30/06/2024 (30 DIAS)
PRORROGA N°6	1/07/2024 31/07/2024 (31 DIAS)
SUSPENSIÓN N°2	26/07/2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/09/2024 - 30/09/2024 (30 días)
REINICIO N°2	1/10/2024
PRORROGA N°7	7/10/204 - 15/12/2024 (69 días)
PLAZO ACUMULADO:	15.3 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 4,306,911,911.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 1,292,073,573.30
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	2.125
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	23
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	337
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	0	15
Otros (Especificar cuales)	Filtro	ml	0	857

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	4,306,911,911.00		4,306,911,911.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			4,306,911,911.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	1,173,591,669.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	1,173,591,669.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 4,306,500,000.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,173,591,669.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	27.25%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estado actual de la obra



Estado actual de la obra

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: LP-090-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22

PLAZO INICIAL:	4 MESES
FECHA DE INICIO:	16/05/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024
PRORROGA N°1	17/09/2023 31/10/2023 (45 DIAS)
PRORROGA N°2	1/11/2023 - 31/12/2023 (61 DIAS)
SUSPENSIÓN N°1	21/12/2023
REINICIO N°1	14/2/2024
PRORROGA N°3	25/02/2024 24/04/2024 (60 DIAS)
SUSPENSIÓN N°2	23/04/2024 29/05/2024
REINICIO N°2	30/5/2024
PRORROGA N°4	01/06/2024 30/06/2024 (30 DIAS)
PRORROGA N°5	01/07/2024 31/07/2024 (31 DIAS)
SUSPENSIÓN N°3	26/07/2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 3	1/09/2024 - 30/09/2024 (30 días)
REINICIO N°3	1/10/2024
PRORROGA N°6	7/10/204 - 15/12/2024 (69 días)
PLAZO ACUMULADO:	11.9 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1,065,446,290.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 319,633,887.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.506
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	4
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	225	345
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	0	4
Otros (Especificar cuales)			0	

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,065,446,290.00		1,065,446,290.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,065,446,290.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	276,643,918		$ -	831,430,260
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	831,430,260

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 762,113,731.24

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 831,430,259.87

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 78.04%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 6

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 9

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

TRAMO TERMINADO

TRAMO TERMINADO

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 005-003-15.05/059

OBJETO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO ONIX CCM

PLAZO INICIAL:	5 MESES
FECHA DE INICIO:	25/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	25/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024
PRORROGA N°1	26/09/2023 31/10/2023 (36 DIAS)
PRORROGA N°2	1/11/2023 - 31/12/2023 (61 DIAS)
SUSPENCIÓN N°1	28/12/2023
REINICIO N°1	5/3/2024
PRORROGA N°3	09/03/2024 31/05/2024 (84 DIAS)
PRORROGA N°4	01/06/2024 30/06/2024 (30 DIAS)
PRORROGA N°5	01/07/2024 31/07/2024 (31 DIAS)
SUSPENSIÓN N°2	26/07/2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/09/2024 - 30/09/2024 (30 días)
AMPLIACIÓN 2 SUSPENSIÓN 2	1/10/2024 - 31/10/2024 (31 días)
REINICIO N°2	1/11/2024
PRORROGA N°6	7/11/2024 - 15/12/2024 (39 días)
PLAZO ACUMULADO:	15.4 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 3,478,131,956.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 1,043,439,586.80
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 175,522,419.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	1.05
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Batea	Und	1
	Box Coulvert	Und	3
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	30
	Dren	m	393
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	m	4
	Muro de contención en concreto reforzado	und	2

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	725
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Alcantarillas	und	2	10
	Box Coulvert		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas			
	demolicion alcantarilas	und	0	8
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	und	0	3
	Muro de contención en concreto reforzado	und	0	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	3,478,131,956.00		3,478,131,956.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			3,478,131,956.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 172,022,747.00		$ 172,022,747.00	1,526,300,917.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	1,526,300,917.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 3,443,858,756.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,526,300,917.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	43.88%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1 N/A	**Foto 2 N/A**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: LP 04-003-15.05/058

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO PH CHALGUAYACO

PLAZO INICIAL:	3.5 MESES
FECHA DE INICIO:	3/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	3/09/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/05/2024
PRORROGA N°1	4/09/2023 31/10/2023 (58 DIAS)
PRORROGA N°2	1/11/2023 - 31/12/2023 (61 DIAS)
PRORROGA N°3	1/01/2024 - 29/02/2024 (60 DIAS)
PRORROGA N°4	1/03/2024 - 30/05/2024 (91 DIAS)
PLAZO ACUMULADO:	12.5 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1,063,184,929.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ 16,815,071.00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 1,080,000,000.00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 318,955,478.70
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 286,832,694.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.456
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	6
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	35	560
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	0	7
Otros (Especificar cuales)	Demolicion de alcantarilla	und	0	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,080,000,000.00		1,080,000,000.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,080,000,000.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 7,648,553.00		$ 7,648,553.00	1,080,000,000.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	1,080,000,000.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 1,080,000,000.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,080,000,000.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	6
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	2
	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



TRAMO FINALIZADO



SEÑALES INSTALADAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 141 DE 2022

OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS CALDERAS (RESGUARDO INDIGENA DE CALDERAS) Y LA VEGA, MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO INZA 2022

PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE INICIO:	28/04/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	28/07/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	16/03/2024
PRORROGA N°1	29/07/2023 - 14/09/2023 (48DIAS)
PRORROGA N°2	15/09/2023 - 31/10/2023 (47DIAS)
PRORROGA N°3	1/11/2023 - 31/12/2023 (61 DIAS)
SUSPENSIÓN N°1	27/12/2023 10/01/2024 (15 DIAS)
REINICIO N°1	11/01/2024
PRORROGA N°4	16/01/2024 - 16/03/2024 (2 meses)
PLAZO ACUMULADO:	10.2 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 608,231,289.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ 182,469,386.85
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 139,829,518.44

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.24
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	4
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	ml	0	240
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	0	4
Otros (Especificar cuales)	Afirmado	km	0	3.07

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	608,231,289.00		608,231,289.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			608,231,289.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	51,820,610.49		$ -	608,231,289.49
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	608,231,289.49

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 608,231,289.49
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 608,231,289.49
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	6
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**6**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA



PLACA HUELLA

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 484-2022

OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURALES 2022

PLAZO INICIAL:	5 MESES
FECHA DE INICIO:	1/06/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	1/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2024
PRORROGA N°1	2/10/2023 - 31/10/2023 (30 DIAS)
PRORROGA N°2	1/11/2023 - 15/12/2023 (45 DIAS)
SUSPENSIÓN N°1	5/12/2023 - 10/01/2024 (37 DIAS)
REINICIO N°1	11/01/2024
PRORROGA N°3	22/01/2024 - 22/04/2024 (3 meses)
PRORROGA N°4	22/04/2024 31/05/2024 (1 mes)
SUSPENSIÓN N°2	14/05/2024 3/06/2024
REINICIO N°2	4/6/2024
PRORROGA N°5	22/06/2024 30/06/2024 (9 DIAS)
PRORROGA N°6	01/07/2024 31/07/2024 (31 DIAS)
PLAZO ACUMULADO:	12.8 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 912,367,379.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	0.496
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	Und	8
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	Und	1
	Muro de contención en concreto reforzado	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		70	500
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	und	0	8
Otros (Especificar cuales)	Muro en gaviones	und	0	2
	Filtro	ml	0	483.8

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	912,367,379.00		912,367,379.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			912,367,379.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	29,504,666.00		$ -	912,367,379.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	912,367,379.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 901,549,665.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 912,367,379.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	6
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Placa huela



socialización de preentrega de obra

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** OCTUBRE

CONTRATO DE OBRA No.: 156-2023

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL 2023

PLAZO INICIAL:	5 MESES
FECHA DE INICIO:	4/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024
SUSPENSIÓN N°1	7/12/2023 - 4/02/2024
REINICIO N°1	5/02/2024
PRORROGA N°1	05/04/2024 30/05/2024 (56 DIAS)
SUSPENSIÓN N°2	24/05/2024 2/06/2024 (9 DIAS)
REINICIO N°2	3/6/2024
PRORROGA N°2	10/06/2024 30/06/2024 (30 DIAS)
PRORROGA N°3	01/07/2024 31/07/2024 (31 DIAS)
SUSPENSIÓN N°3	26/07/2024
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 3	1/09/2024 - 30/09/2024 (30 días)
REINICIO N°3	1/10/2024
PRORROGA N°4	7/10/2024 - 15/12/2024 (69 días)
PLAZO ACUMULADO:	11.2 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 1,815,000,000.00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ -
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. LUIS EDUARDO ELDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	km	1.1
	Mejoramiento		
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas	Und	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción		0	
	Mejoramiento		0	
	Rehabilitación		0	
Estructuras	Túneles		0	
	Puentes		0	
	Pontones		0	
Mantenimiento	Alcantarillas de 36 pulgadas		0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	1,815,000,000.00		1,815,000,000.00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			1,815,000,000.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -		$ -	452,287,174.00
AJUSTES			$ -	
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -	
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -	
ESTUDIOS Y DISEÑOS			$ -	
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -	
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)			$ -	
VALOR EJECUTADO			$ -	452,287,174.00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 1,493,905,579.00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 452,287,174.00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	24.92%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Estado actual de obra



Estado actual de vía

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y MINAS

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
INTERVENTORÍA DE OBRA

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

INFORME MENSUAL No. 21 DE INTERVENTORÍA

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.

RESPONSABLE	CARGO	FIRMA
CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ	Director de interventoría	

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN.....17

2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS.....18

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 18
2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 20
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS 25
2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 25
2.5 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO 30
2.6 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO 30
2.7 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.....30

3 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 31

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....31
3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.....55
3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 62
3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA 68

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 84

4.1 INFORME SEMANAL 84
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 135
4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA.....139
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 141
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....150
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 154
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA....158
4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.....168
4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 168

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 195

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....195
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.....196
5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.....196

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA....197

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....197
6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....198

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 200
6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA....202
6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 206

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 207

8 ANEXOS 209

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 210
8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO....215
8.3 BITÁCORAS....216

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Ubicación de los once (11) Municipios a intervenir 20
Ilustración 2 Localización Departamental Municipio de ARGELIA 21
Ilustración 3 Localización Departamental Municipio de MERCADERES....21
Ilustración 4 Localización Departamental Municipio de SUCRE 22
Ilustración 5 Localización Departamental Municipio de BOLIVAR 23
Ilustración 6 Localización Departamental Municipio de ALMAGUER....23
Ilustración 7 Localización Departamental Municipio de INZA....24
Ilustración 8 Localización Departamental Municipio de SANTANDER DE QUILICHAO 24
Ilustración 9 Localización Departamental Municipio de PUERTO TEJADA 25

1 INTRODUCCIÓN

Mediante Contrato 1100 de 2022 “CONSULTORES DONOVAN SAS” realiza la “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” “LOTE 9” el cual fue adjudicado por Resolución de Adjudicación No 1715 del 24 de mayo de 2022, previo Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DTE-SEP- 197-2021.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS -, estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

COLOMBIA RURAL, Es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de BOLÍVAR, ALMAGUER, SANTANDER DE QUILICHAO, SUCRE, BOLÍVAR, MERCADERES, SUCRE, ALMAGER, ARGELIA, INZA Y PUERTO TEJADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito evaluar las diferentes actividades de orden técnico, administrativo, financiero desarrolladas por los contratistas durante el período comprendido entre el 1 al 31 de octubre de 2024, e igualmente resumir las actividades de apoyo técnico, control y supervisión adelantadas por la interventoría durante el mismo período, de tal manera que la entidad contratante tenga una visión oportuna y precisa sobre el desarrollo y el estado del contrato y de las obras que nos ocupan.

2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS -, estructuró el programa “COLOMBIA RURAL” que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, ejecutando obras en los mismos, mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución y financiación.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de ONCE
(11) Convenios Interadministrativos que se suscribieron entre INVIAS y municipios del Departamento del Cauca en la vigencia 2021, del Programa Colombia Rural:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR CONVENIO	CONVENIO NO.
CAUCA	ARGELIA	958.081.628	1984-2021
CAUCA	MERCADERES	2.248.615.000	1894-2021
CAUCA	SUCRE	4.306.911.911	1866-2021
CAUCA	SUCRE	1.065.446.290	1769-2021
CAUCA	BOLIVAR	3.478.131.956	1867-2021
CAUCA	BOLIVAR	1.063.184.929	1750-2021
CAUCA	ALMAGUER	1.799.782.602	1749-2021
CAUCA	ALMAGUER	795.011.198	1982-2021
CAUCA	INZA	608.231.289	1983-2021
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	912.367.379	1768-2021
CAUCA	PUERTO TEJADA	1.815.000.000	2496-2019

Las principales actividades y obras para ejecutar son las siguientes:

2.1 LOCALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de once (11) Convenios Interadministrativos que se suscribieron en el departamento de Cauca, como parte del programa Colombia Rural:

METAS FISICAS CONTRACTUALES						
CONVENIO	**MUNICIPIO**	**CORREDOR**	**LONG (KM)**	**PUNTO DE INICIO**	**PUNTO FINAL**	**OBSERVACIONES**
1984-2021	ARGELIA	LA PLAYA-EL ENCANTO	1.80	Cruce con carretera 25cc03	Vereda el encanto	Construcción de 460m de placa huella, construcción de 10 alcantarillas, mantenimiento periódico
1894-2021	MERCADERES	LA PLAYA -LA DESPENSA	1.85	Vereda la Despensa	Vereda la Despensa	construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36"

						Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m
1866-2021	SUCRE	EL PARAÍSO - LA CEJA – LA CABECERA MUNICIPAL	2.125	Puente sobre el Río Mazamorras vía que conduce Sucre-La Ceja	Caseta Central vereda la Ceja	construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 2125 ml de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio
1769-2021	SUCRE	25CC08 S4-1 LA BALASTRERA	0.706	inicia inmediatamente se pasa la quebrada Peña Blanca	Termina 830 metros arriba de la quebrada Peña Blanca	construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36" Construcción de 706 ml de placa huella
1867-2021	BOLIVAR	VIA AGUA GORDAS - LOS MILAGROS	1.05	Puente militar río Dantas K22+642	Cabecera de Milagros – Cauca K23+643	demolición de 9 alcantarillas y 1 batea en concreto reforzado, construcción de 1050 metros de placa huella, Construcción de 30 alcantarillas de 36" en concreto reforzado, construcción de 3 Box Culvert en concreto reforzado tipo C, Construcción de 393 metros de dren horizontal, construcción de 2 muros de contención de longitudes de 6 m y 20m en concreto reforzado, construcción de 1 Muro de contención de longitud de 4m y altura 4 metros en gaviones, instalación de 30 señales de tránsito verticales.
1750-2021	BOLIVAR	BOLIVAR-CHALGUAYACO	13.5	Vda. Chalguayaco	Vda. Cucho	Construcción de 6 alcantarillas en tubo de concreto reforzado de 36", Construcción de 456 ml de placa huella, demolición de una alcantarilla.
1749-2021	ALMAGUER	CAQUIONA-HATO-HUMUS RESGUARDO	0.885	KM 0 + 000	KM 0 + 818	construcción de 10 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 885 ml de placa huella de ancho tipo 5m Construcción 15m de muro en concreto reforzado tipo, de 3m de altura
1982-2021	ALMAGUER	VIA 12CC05-5 LA HERRADURA EL CHILCO LA HONDA ROSA PAMBA	0.415	KM 0 + 000	KM 0 + 405	construcción de 4 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36" Construcción de 415 ml de placa huella de ancho tipo 5 m
1983-2021	INZÁ	SAN ANDRES DE PISIMBALA-ALTO PISIMBALA-TUMBICHUCUE	14	VÍA 26CC04 PR 4+0000 = PR 0+0000 SAN	VÍA 26CC04 PR 18+0000 TUMBICHUCUE	construcción alcantarillas - construcción de placa huella en concreto - Long = 240 m - conformación de calzada existente
1768-2021	SANTANER DE QUILICHAO	PANAMERICANA – CRUCERO LA SALINA - ALTO DE SAN JOSÉ DE MANDIVA Y EMANUEL	7.10	PR 0+0000 Ruta 25KA126 vía Panamericana – Crucero de Salinas – Alto el Paraíso	PR 4+0800 Ruta 25KA126- 1 vía Crucero de Salina – Alto de San José Mandiva y Emanuel	construcción y recuperación alcantarillas - construcción de placa huella en concreto - Long =496 m - conformación de calzada existente y afirmado - construcción de muro en concreto reforzado y muro en gaviones
2496-2019	PUERTO TEJADA	VÍA VILLA OLÍMPICA – JUAN IGNACIO	1.80	Villa Olímpica	Juan Ignacio	Construcción de 1100 metros de pavimento flexible y construcción de una alcantarilla

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por la interventoría, en desarrollo del contrato que se obtenga como resultado del presente Concurso de Méritos.

Las obras a construir se encuentran ubicadas en el DEPARTAMENTO DE CAUCA, A continuación, se presenta el mapa de localización de las obras para los Municipios de Argelia, Mercaderes, Sucre, Bolívar, Almaguer, Inzá, Santander de Quilichao y Puerto Tejada del departamento del Cauca.

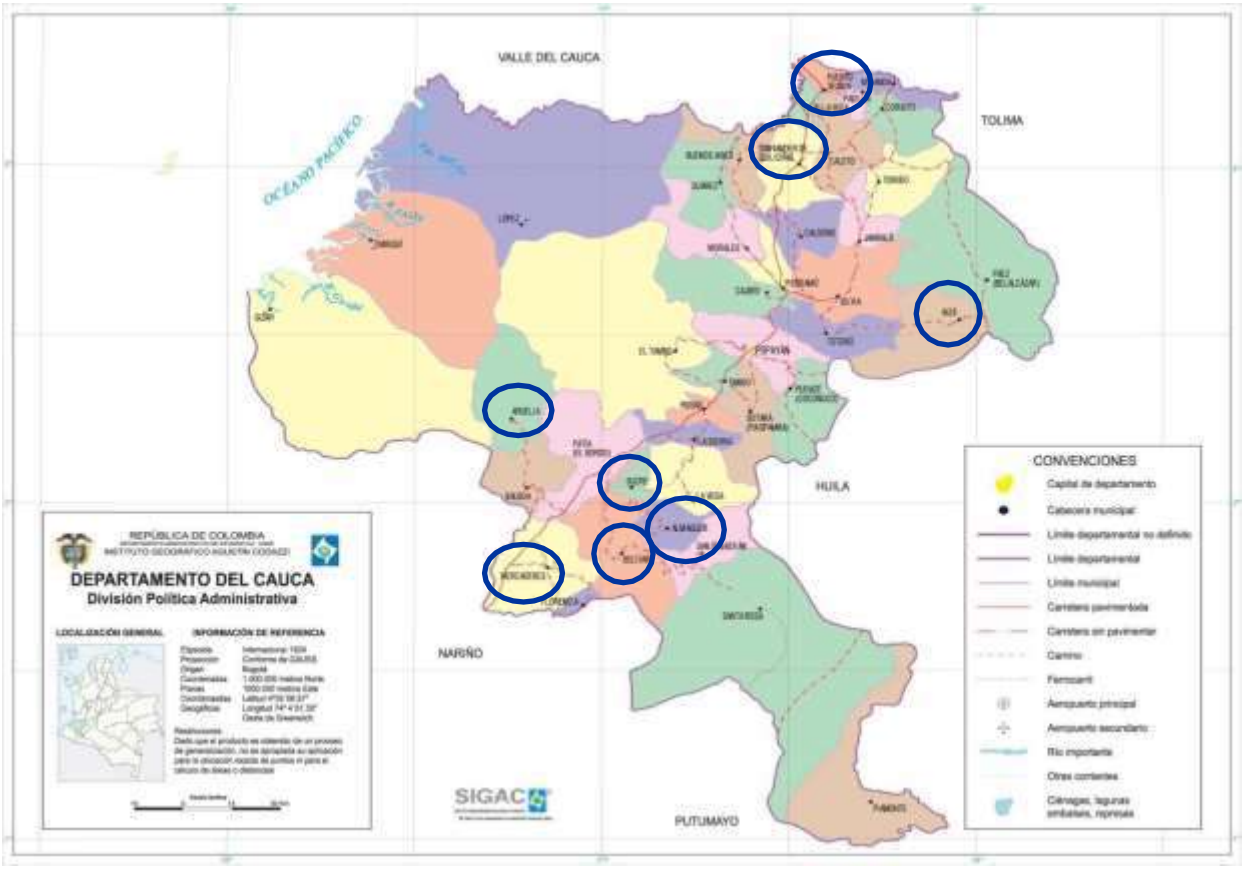


Ilustración 1 Ubicación de los once (11) Municipios a intervenir

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

2.2.1 ARGELIA – CAUCA

Es un municipio colombiano ubicado al occidente del departamento del Cauca, en el piedemonte de la cordillera occidental sobre la llanura del Pacifico, ubicado sobre el macizo colombiano a 184 km de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.250 m. su temperatura es 22 °C .

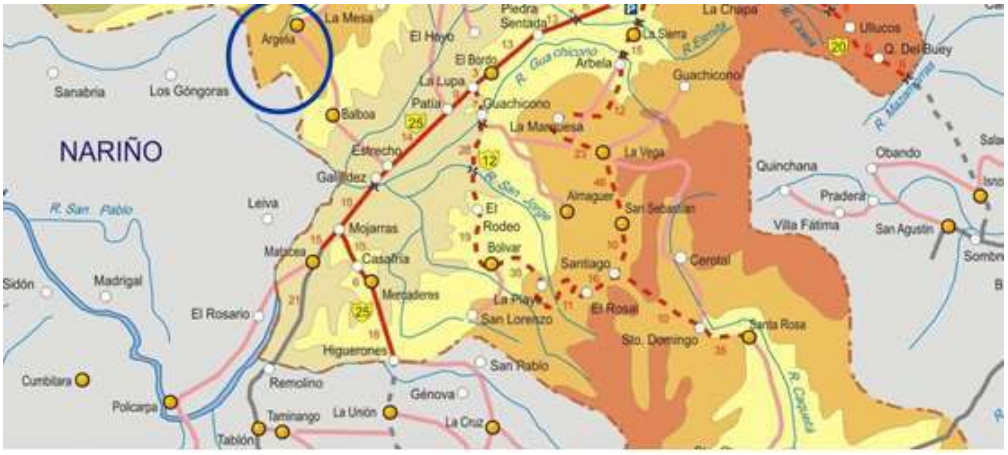


Ilustración 2 Localización Departamental Municipio de ARGELIA

2.2.2 MERCADERES – CAUCA

Es un municipio colombiano situado en el suroeste del país, en el departamento de Cauca, a 97 km de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.167 m. su temperatura es 22 °C. Limita al este con Bolívar, al norte con Patía y Balboa, al oeste con Leiva y El Rosario, ambos en el departamento de Nariño, y al sur con Florencia y con el municipio de Taminango del departamento de Nariño.

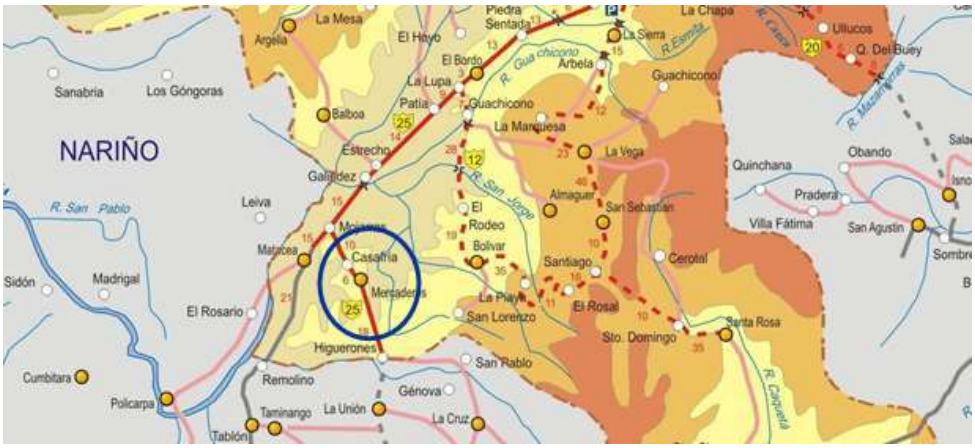


Ilustración 3 Localización Departamental Municipio de MERCADERES

2.2.3 SUCRE – CAUCA

Sucre está ubicada a 02º, 03,30” Latitud Norte y 76º, 56,46” Longitud Oeste Su altura sobre el nivel del mar es de 1.140 m. su temperatura es 26 °C y su precipitación es 1600 ml anuales.

Por el Norte limita con los municipios del Patía y la Vega, por el Oriente con Almaguer, la Vega y Bolívar, por el Occidente con el Patía y en su parte sur con el Municipio de Bolívar.



Ilustración 4 Localización Departamental Municipio de SUCRE

2.2.4 BOLIVAR - CAUCA

Se encuentra ubicado sobre el costado occidental de la cordillera central, haciendo parte del denominada Macizo Colombiano, Limita al norte con Florida, al oriente con Rio blanco, al sur con Corinto y Padilla, y al occidente con Puerto Tejada. Dista 145 km de la capital.

La región cuenta con una altura promedio sobre el nivel del mar de 1. 177 m.s. n.m, con terreno ondulado y con una temperatura promedio de 18°C.

Las vías en estudio hacen parte de la red de vías terciarias y sirve como conexión de cabeceras municipales, centros poblados y veredales, cumpliendo un papel ponderable en el desarrollo socioeconómico en la época del posconflicto

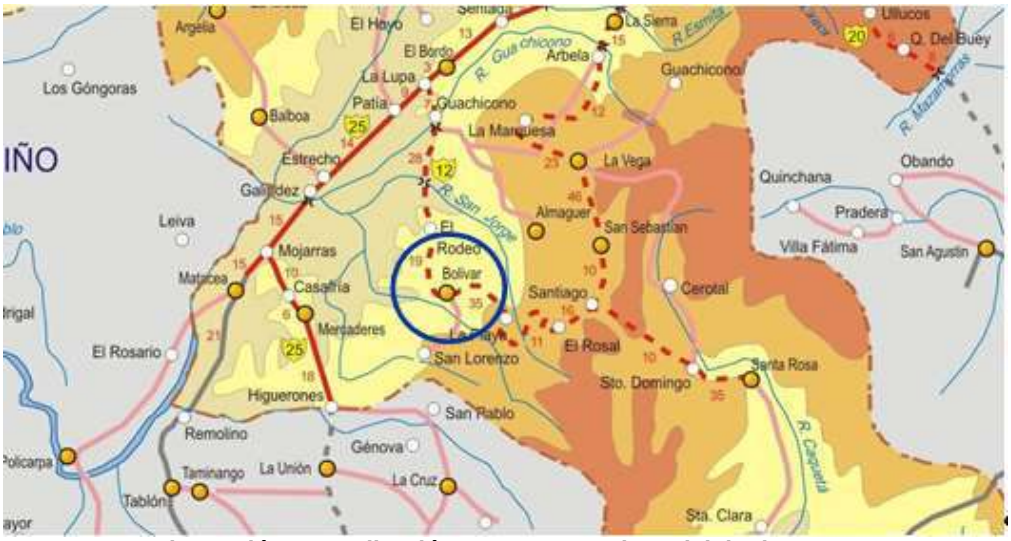


Ilustración 5 Localización Departamental Municipio de BOLIVAR

2.2.5 ALMAGUER – CAUCA

Pertenece al denominado Macizo Colombiano, La población de Almaguer se halla situada al pie de la colina de Belén - Panecillos y Santa Bárbara, como sus cerros tutelares, ceñida por el poderoso macizo de la cordillera de los Andes. Altura sobre el nivel del mar: 2.312 m. Temperatura media: 17°C. Dista de Popayán 172 km. Limita al Norte: Municipio de La Vega. Al sur: Municipios de Bolívar y San Sebastián. Al Oriente: Municipio de San Sebastián. Y al Occidente: Municipio de Sucre.

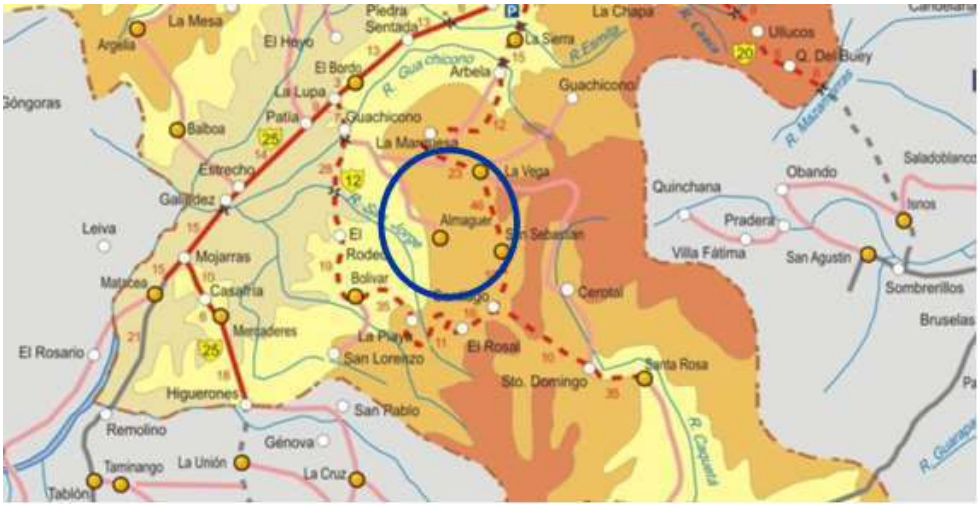


Ilustración 6 Localización Departamental Municipio de ALMAGUER

2.2.6 INZA – CAUCA

Es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Cauca, a 102 km de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.754 m. su temperatura es 27 °C.

Limita por el Norte y el Este con Páez, por el Sur con el departamento del Huila y por el Oeste con Totoró y Silvia.



Ilustración 7 Localización Departamental Municipio de INZA

2.2.7 SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA

Es un municipio colombiano ubicado en el sector norte del departamento del Cauca, a 97 km al norte de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 1.071 m. su temperatura es 27 °C. Limita al norte con los Municipios de Villa Rica y Jamundí, al Occidente con el municipio de Buenos Aires, al oriente con los municipios de Caloto y Jambaló y al sur con el Municipio de Caldono.



Ilustración 8 Localización Departamental Municipio de SANTANDER DE QUILICHAO

2.2.8 PUERTO TEJADA – CAUCA

Es un municipio colombiano localizado en la Provincia Norte del departamento del Cauca, cercana al área metropolitana de Cali 97 km al norte de Popayán, su altura sobre el nivel del mar es de 968 m. su temperatura es 27 °C.

Limita al norte con los Municipios de Santiago de Cali y Candelaria, al Occidente con los municipios de Villarrica y Jamundí, al oriente con los municipios de Miranda y Padilla y al sur con los municipios de Caloto y Villarrica.



Ilustración 9 Localización Departamental Municipio de PUERTO TEJADA

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

Las vías para intervenir son vías rurales, prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.
De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de Argelia, Mercaderes, Sucre, Bolívar, Almaguer, Inzá, Santander de Quilichao y Puerto Tejada; En El Departamento Del Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

2.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras proyectadas fueron producto del programa COLOMBIA RURAL, mediante el cual prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las

regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

Los municipios son los encargados de suministrar al contratista de obra, los diseños para su respectiva aprobación u observaciones y a su vez remitir a la interventoría para su concepto y poder dar viabilidad para el inicio de las obras.

Las diferentes vías objeto de los contratos requieren las siguientes actividades:

2.4.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Las actividades de mejoramiento son el conjunto de obras que consisten básicamente en el cambio de la infraestructura vial existente con aportes a la estructura de la banca, obras de drenaje y contención que incidan favorablemente en las condiciones de transitabilidad, con el propósito de garantizar un mayor nivel de servicio, acorde al tránsito actual y atraído, que mejore la calidad de vida de los usuarios. Las principales actividades por ejecutar para el mejoramiento de las vías rurales son las siguientes:

Construcción de Placa Huella • Pavimentos convencionales • Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes. • Construcción de Filtros y/o cunetas • Bases Estabilizadas • Tecnologías alternativas.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar el control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2013) y a las especificaciones particulares para su ejecución y a las Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías, adoptado por Resolución No. 1375 y No. 1376 del 26 de mayo de 2014 respectivamente, las cuales pueden ser consultadas en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/. De igual manera, se tendrán en cuenta las cartillas del programa Colombia Rural para la construcción de placa huella, obras de drenaje y estructuras viales. El alcance de las obras a ejecutar y el presupuesto respectivo se definirá una vez se suscriba el convenio, se confirme la cofinanciación por parte del ente territorial en los casos que se requiera y se actualicen los precios unitarios con el incremento del salario mínimo.

2.4.1.1 Placa Huella

Es un sistema orientado a generar condiciones de transitabilidad adecuadas para vehículos, animales y personas en tramos críticos de vías rurales. El sistema consiste en la colocación de franjas delgadas de placas de concreto separadas transversalmente a una distancia tal, que coinciden con las huellas de la circulación vehicular, con anchos en promedio de 0,90 m cada una, entre las cuales se aloja una zona central construida en concreto ciclópeo y/o piedra pegada, manteniendo unos sobre anchos externos

variables en piedra pegada para garantizar el acomodamiento de la sección al ancho disponible de la vía. Sus módulos se confinan transversalmente con viguetas de concreto, tipo riostras y lateralmente por berma cunetas.

2.4.1.2 Alcantarillas

Como elemento de drenaje transversal, es un tubo de dimensión mínima de 36” (0.90 m), siguiendo los lineamientos del Manual de Drenaje Para Carreteras, la cual tiene dos tipos de configuración. La primera es tipo poceta-aleta, la cual es apta para recolectar y evacuar a través de la estructura de vía, la escorrentía de origen superficial y subsuperficial, aportante por las cunetas y/o filtros. La segunda configuración tipo aleta-aleta permite, además de recibir y evacuar la escorrentía aportante por las cunetas y filtros, dar continuidad a cauces con flujos intermitentes o efímeros.

2.4.1.3 Muros Gaviones

La metodología de diseños incluye parámetros geomecánicas de ángulo de fricción igual a 30° y de cohesión igual a 0kPa, ambas magnitudes asumidas tanto para el relleno del muro, como para el material de fundación. El ángulo de inclinación del relleno de cara al trasdós del muro se considera horizontal, y la magnitud de la sobrecarga incluye cargas permanentes, entre las cuales se menciona tanto el peso propio de la carpeta de rodamiento; como cargas de tránsito asociadas al flujo vehicular, y otras como las ocasionadas por el empuje dinámico.

2.4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

El mantenimiento periódico es el conjunto de todas las obras a ejecutar en una vía, que comprende la realización de actividades de conservación a intervalos variables, destinados primordialmente a recuperar los deterioros de la capa de rodadura ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o agentes externos.

La principal actividad por ejecutar es el Suministro e instalación de afirmado Para la ejecución de las obras de mantenimiento periódico se deberá realizar el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras, el cual puede ser consultado en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

Nota 1: Las especificaciones particulares prevalecen sobre las especificaciones generales; sin embargo, todos los trabajos que no estén cubiertos en las especificaciones particulares se ejecutarán conforme a lo estipulado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras vigentes por parte del Instituto Nacional de Vías.

Nota 2: El equipo mínimo requerido debe estar acorde con lo indicado en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y Especificaciones Generales de Mantenimiento de Carreteras vigentes por parte del Instituto Nacional de Vías y Especificaciones Particulares que se llegaren a adoptar.

Nota 3: Los aportes previstos en maquinaria amarilla y materiales granulares por parte de los Entes Territoriales deben cumplir con el requerimiento de las Especificaciones de Construcción de Carreteras y estar acordes con la necesidad que tiene el proyecto, reflejada en los análisis de precios unitarios del presupuesto del proyecto

2.4.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

El mantenimiento rutinario consiste en el conjunto de actividades a ejecutar en las vías rurales que buscan mejorar el comportamiento estructural y funcional de las vías con el fin de mantener las condiciones óptimas para la transitabilidad en la vía, empleando la mano de obra local y herramienta menor.

Las principales actividades por ejecutar son: • Desmonte y limpieza en zonas no boscosas • Rocería • Reparación de baches • Limpieza de alcantarillas y descoles • Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor • Reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo Para la ejecución de las obras de mantenimiento rutinario se deberá realizar el control con base en el Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras, el cual puede ser consultado en el vínculo de documentos técnicos de la página http://www.invias.gov.co/ y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar.

Las actividades del mantenimiento rutinario se realizarán bajo un sistema de gestión con participación comunitaria con un alto componente social que posibilite a las administraciones locales introducir una modalidad de mantenimiento de la red vial rural a menor costo y con un significativo arraigo local, favoreciendo inclusive el que las comunidades se empoderen y gestionen el desarrollo de obras en las vías, que son vitales para su progreso y el bienestar de sus habitantes, esto se logra con la participación comunitaria.

El personal vinculado debe pertenecer a organizaciones de acción comunal y/o cabildos y/o organizaciones indígenas y/o organizaciones civiles y/o cooperativas de trabajo, dando prioridad a las mujeres rurales, que se encuentren en las zonas de influencia de las vías, quienes serán los responsables de la ejecución de las actividades de Mantenimiento Rutinario del Corredor Productivo seleccionado a través de su

comunidad formalizada, que se denominarán los “Emprendedores Rurales”, cuya cartilla podrá ser consultada en la página https://colombiarural.invias.gov.co.

El Ente Territorial ejecutará estas actividades de manera directa a través de Convenios Solidarios con las juntas de acción comunal y/o asociaciones comunales y/o cabildos y/o organizaciones indígenas y/o organizaciones civiles y/o cooperativas de trabajo. Lo anterior, conforme a lo regulado en el parágrafo 3 y 4 del artículo 3 de la Ley 1551 de 2012 y demás normas aplicables a la materia.

Así mismo el artículo 141 de la Ley 136 de 1994 establece que los municipios pueden vincular a las organizaciones comunitarias, cívicas, profesionales, juveniles, sindicales, benéficas o de utilidad común no gubernamentales y sin ánimo de lucro, al mejoramiento y desarrollo municipal mediante su participación en el ejercicio de las funciones, la prestación de servicios o la ejecución de obras públicas a cargo de la administración central o descentralizada. De conformidad a lo establecido en la Cartilla “Emprendedores Rurales Programa Colombia Rural”, para la operación los Entes Territoriales se obligan a aportar la dotación, herramientas y equipos que se relacionan a continuación: • DOTACIÓN: overol, botas, cascos, chalecos reflectivos, guantes, conos reflectivos, botiquín, cintas de señalización. • HERRAMIENTA Y EQUIPOS: picas, carretillas, machetes con estuche, barras, pisones, palas, rastrillos, limas, baldes, azadones, escobas, guadañas; así como el mantenimiento y el combustible requerido para el óptimo funcionamiento de los equipos; respaldado mediante certificación expresa de aportes en bienes y servicios.

El procedimiento para cuantificar la cantidad de estos elementos se encuentra establecido en la Cartilla “Emprendedores Rurales Programa Colombia Rural”.

2.5 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

- Construcción de Placa Huella
- Pavimentos Convencionales
- Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención, pontones y puentes.
- Construcción de Filtros y/o cunetas
- Bases Estabilizadas
- Tecnologías Alternativas

2.6 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

- Conformación de la calzada existente
- Mejoramiento de la subrasante con adición de material
- Suministro e instalación de afirmado

2.7 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

- Desmonte y limpieza en zonas no boscosas
- Rocería
- Reparación de baches
- Limpieza de alcantarillas y descoles
- Remoción de derrumbes menores (sin maquinaria y/o equipo) únicamente con herramienta menor
- Perfilado y/o reconstrucción de cunetas y/o reconstrucción de zanjas de coronación, que no requieran maquinaria y/o equipo, encoles y descoles.

3 INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

3.1.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Argelia, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	ARG-OBRA-009-2022
Objeto del Contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA – CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 202219050001, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA
Valor del Contrato de Obra Inicial	$ 958.081.628
Nombre del Contratista	EMCONSUT S.A.S
Representante legal	WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
Fecha suscripción Contrato de obra	07 de octubre 2022
Acta de inicio	03 de abril de 2023
Fecha de terminación inicial	18 de julio de 2023
Fecha de suscripción OTROSI 1 (Prorroga N°1)	11 de julio de 2023
Fecha de finalización según Prorroga N°1	01 septiembre de 2023
Fecha de suscripción OTROSI 2 (Prorroga N°2)	01 de septiembre de 2023
Fecha de finalización según Prorroga N°2	31 de octubre de 2023
Fecha de suscripción OTROSI 3 (Prórroga N°3)	31 de octubre de 2023.
Fecha de finalización según Prórroga N°3	31 diciembre de 2023
Fecha de suspensión N°1	22 de diciembre de 2023
Fecha establecida para el Reinicio 1	11 de enero de 2024
Fecha de Terminación	20 de enero de 2024
Estado actual	Vencido por plazo contractual el 20 de enero 2024

3.1.1.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cantidad	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN NO.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de Placa Huella				
Conformación de la calzada existente	m2	2.925,60	$ 1.020,00	$2.984.112,00
Subbase granular clase c	m3	438,84	$ 281.980,00	$123.744.103,00
Sello asfaltico para juntas	m	1.950,40	$ 3.040,00	$5.929.208,00
Excavaciones varias sin clasificar	m3	225,03	$ 13.620,00	$3.064.909,00
Rellenos para estructuras con suelo.	m3	99,36	$ 18.300,00	$1.818.288,00
Rellenos con material filtrante	m3	39,74	$ 249.430,00	$9.912.348,00
Concreto resistencia 21mpa (D)	m3	368,17	$ 826.140,00	$304.159.964,00
Concreto resistencia 14mpa (g) (ciclópeo)	m3	173,88	$ 551.760,00	$ 95.940.029,00
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	16.547,10	$ 7.860,00	$130.060.206,00
Tubería de plástico tipo sanitaria norma ntc 1087 de diámetro 101.6 mm	m	110,40	$ 33.170,00	$3.661.968,00
Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	m2	2.252,16	$ 9.030,00	$20.336.995,00
			Sub- total	**$701.612.130,00**
Construcción de alcantarillas 36"				
Remoción de alcantarillas	m	56,00	$36.690	$ 2.054.641,00
Excavaciones varias sin clasificar	m3	535,53	$13.620,00	$ 7.293.977,00
Rellenos para estructuras con suelo.	m3	36,00	$18.300,00	$ 658.800,00
Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	98,00	$826.140,00	$ 80.961.720,00
Concreto resistencia 14MPa (f)	m3	18,00	$551.760,00	$ 9.931.680,00
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	7.354,20	$7.880	$ 57.951.096,00
Tubería de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diámetro interior	m	70,00	$556.010	$ 38.920.700,00
			Sub- total	**$197.772.614,00**
Elementos de bioseguridad				
Elementos e insumos de protección protocolo bioseguridad (Según comprobante por mes)	gl	1	$1.095.274,00	$1.095.274,00
			Sub- total	**$1.095.274,00**
SECCIÓN 2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO				
Conformación de la calzada existente	m3	1.500,00	$1.020,00	$1.530.000,00
Suministro e instalación de afirmado	m3	189,24	$245.040,00	$46.371.462,00
			Sub- total	**$47.901.462,00**
			Sub total básico de obra (A)	$948.381.480,00
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$9.492.046,00
			Valor IVA consultoría (c)	$208.102,00
			Valor total A+B+C+AIU	**$958.081.628,00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU

2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.2 MERCADERES 1894 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Mercaderes, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	CE-F1-F14-240-2022-02
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.
Valor del Contrato de Obra	$ 2.248.615.000
Nombre del Contratista	CONSORCIO MERCADERES 23
Representante legal	JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
Fecha suscripción Contrato de obra	30 de diciembre de 2022
Acta de inicio	9 de agosto de 2023
Prorroga 1	1 de octubre de 2023
Prorroga 2	31 de octubre de 2023
Suspensión 1	28 de diciembre de 2023
Reinicio 1	16 de enero de 2024
Prorroga 3	20 de enero 2024
Prórroga 4	1 de junio de 2024
Prórroga 5	1 de julio de 2024
Suspensión 2	26 de julio de 2024
Ampliación 1 a la suspensión 2	1 de septiembre de 2024
Reinicio 2	1 de octubre de 2024
Prórroga 6	7 de octubre de 2024
Fecha de terminación inicial	30 de septiembre de 2023

Fecha de terminación vigente	15 de diciembre de 2024

3.1.2.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
Construcción de alcantarillas de 36”				
Excavaciones varias en material común en seco	M3	679.80	$ 13,720	$ 9,326,856
Relleno para estructuras con suelo	M3	209.15	$ 80,370	$ 16,809,386
Concreto resistencia 21MPa (d) - mezcla in situ	M3	120.51	$ 792,200	$ 95,468,022
Concreto resistencia 14mpa (F)	M3	20.20	$ 625,000	$ 12,625,000
Acero de refuerzo fy 4200 MPa	KG	8,930.10	$ 9,120	$ 81,442,512
Tubería de concreto reforzado, clase II de 900mm de diámetro interior	ML	92.70	$ 1,210,000	$ 112,167,000
			Sub- total	**$ 327,838,776**
Construcción de placa huella en concreto				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	4,245.20	$ 17,160	$ 72,847,632
Subbase granular clase C	M3	1,550.67	$ 198,400	$ 307,652,928
Concreto resistencia 21MPa (D) - mezcla in situ	M3	933.79	$ 792,000	$ 739,561,680
Concreto resistencia 14MPa (F)	M3	50.07	$ 625,500	$ 31,318,785
Concreto resistencia 14MPa (G) (ciclópeo)	M3	445.78	$ 482,240	$ 214,972,947
Acero de refuerzo Fy 420 MPa	KG	56,320.00	$ 9,120	$ 513,638,400
Sello para juntas	ML	6,729.33	$ 3,900	$ 26,244,387
			Sub- total	**$ 1,906,236,759**
Elementos de Bioseguridad				
Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 2,468,398	$ 2,468,398
			Sub- total	**$ 2,468,398**
			Sub total básico de obra (A)	$ 2,236,543,932
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 11,602,071
			Valor IVA (C)	$ 468,996
			Valor total A+B+AIU	**$ 2,248,615,000**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.3 SUCRE 1866 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Sucre, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	258-2022
Objeto del Contrato de Obra	CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DE 2021
Valor del Contrato de Obra	$ 4.306.911.911
Nombre del Contratista	CONSTRUOBRAS GIA SAS
Representante legal	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
Fecha suscripción Contrato de obra	28 de octubre de 2022
Acta de inicio	16 de mayo de 2023
Prorroga 1	1 septiembre de 2023
Prorroga 2	1 noviembre 2023
Suspensión 1	28 de diciembre de 2023
Reinicio 1	1/03/2024
Prorroga 3	5 de marzo de 2024
Prorroga 4	4 de mayo de 2024
Prórroga 5	1 de junio 2024
Prórroga 6	1 de julio 2024
Suspensión 2	26 de julio de 2024
Ampliación 1 a la suspensión 2	1 de septiembre de 2024
Reinicio 2	1 de octubre de 2024
Prórroga 7	7 de octubre de 2024
Fecha de terminación inicial	31 de agosto de 2023
Fecha de terminación vigente	15 diciembre de 2024

3.1.3.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Demolición de estructuras	m³	93.60	$174.053,76	$16.291.431,94
Remoción de alcantarillas	m	84.00	$88.439,54	$7.428.921,36
			Sub- total	**$23.720.353,3**
Construcción pavimento rígido				
Excavación de la explanación, canales y prestamos (incluye retiro de material)	m3	7599,75	$ 9,992.33	$ 75,939,209.93
Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	m3/km	65357,85	$ 1,684.83	$ 110,116,866.42
Mejoramiento de la subrasante con adición de material	m3	1174,51	$ 109,109.10	$ 128,149,729.04
Sub base granular clase b	m3	2062,50	$ 181,940.55	$ 375,252,384.38
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	21100,67	$ 9,855.75	$ 207,962,928.35
Pavimento en concreto rígido Mr= 4.1 MPa	m3	2612,50	$ 823,981.88	$ 2,152,652,661.50
Bordillo en concreto 21 MPa vaciado in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	ml	5000,00	$ 71,640.11	$ 358,200,550.00
			Sub- total	**$3,408,274,329.61**
Construcción de alcantarillas de 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	1012,00	$ 32,540.12	$ 32,930,601.44
Relleno para estructuras con material de recebo	M3	402,50	$ 101,368.86	$ 40,800,966.15
Relleno con material proveniente de la excavación	M3	172,50	$ 13,509.53	$ 2,330,393.93
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	179,40	$ 821,087.76	$ 147,303,144.14
Acero de refuerzo Fy 420 Mpa.	kg	13340,00	$ 9,855.75	$ 131,475,705.00
Concreto resistencia 14 MPa (F)	M3	18,40	$ 675,707.99	$ 12,433,027.02
Tubería de concreto reforzado 21 MPa de 900 mm de diámetro interior (incluye atraque con sub base granular)	ML	161,00	$ 957,967.62	$ 154,232,786.82
			Sub- total	**$521,506,624.5**
Construcción de filtro				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	753,12	$ 32,540.12	$ 24,506,615.17
Material granular drenante	M3	740,40	$ 198,796.81	$ 147,189,158.12
Geotextil NT 1800 resistencia a la tensión 470 N	M2	5491,50	$ 6,069.37	$ 33,329,945.36
Tubería perforada de 4 pulgadas	ML	1569,00	$ 34,094.35	$ 53,494,035.15
			Sub- total	**$258,519,753.80**
Señalización y seguridad vial				
Línea de demarcación con pintura en frio (amarilla o blanca)	ml	7499,00	$ 2,512.29	$ 18,839,662.71
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo X(75x75)	Und	51	$ 652,493.24	$ 33,277,155.24

Sub- total	**$ 52,116,817.95**
Sub total básico de obra (A)	$4,264,137,879
Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 42,774,034,00
Valor total A+B+AIU	**$4,306,911,913**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.4 SUCRE 1769 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Sucre, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Valor del Contrato de Obra	$ 1.065.446.290
Nombre del Contratista	CONSORCIO SUCRE 22
Representante legal	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Fecha suscripción Contrato de obra	1 de febrero 2023
Acta de inicio	16 de mayo de 2023
Prorroga 1	17 septiembre de 2023
Prorroga 2	1 noviembre
Suspensión 1	21 de diciembre de 2023
Reinicio 1	14 de febrero de 2024
Prorroga 3	25 de febrero de 2024
Suspensión 2	23 de abril de 2024

Reinicio N°2	30 de mayo de 2024
Prorroga 4	1 de junio de 2024
Prorroga 5	1 de julio de 2024
Suspensión 3	26 de julio de 2024
Ampliación 1 a la suspensión 3	1 de septiembre de 2024
Reinicio 3	1 de octubre de 2024
Fecha de terminación inicial	16 de septiembre de 2023
Fecha de terminación vigente	15 diciembre de 2024

3.1.4.1 Propuesta Económica – Modificatoria al presupuesto 1

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de placa huella				
Sub base granular clase C	m³	630.00	$ 190,127.00	$ 119,127,010.00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m³	634.00	$ 777,315.00	$ 492,817,710.00
Concreto resistencia 14 MPA (G) (ciclópeo)	m³	227.00	$ 439,460.00	$ 99,757,420.00
Acero de refuerzo Fy = 4200 MPa	kg	21090.00	$ 9,942.00	$ 209,676,780.00
Sello de juntas	ml	2800.00	$ 4,090.00	$ 11,452,000.00
			Sub- total	**$ 933,483,920.00**
Construcción de alcantarillas de 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	m³	358.00	$ 36,671.00	$ 13,128,218.00
Acero de refuerzo Fy = 420 MPA	m³	3474.00	$ 9,942.00	$ 34,538,508.00
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior (Incluye atraque con sub base granular)"	m	36.00	$ 851,010.00	$ 30,636,360.00
Concreto resistencia 14 MPa (F)	m³	1.00	$ 575,351.00	$ 575,351.00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m³	56.00	$ 777,315.00	$ 43,529,640.00
			Sub- total	**$122.408.077,00**
Obras De Compensación Ambiental y/o Complementarias				
Obras de compensación	GLB	1.0%	$ 7,517,969.00	$ 7,517,969.00
			Sub- total	**$ $ 7,517,969.00**
Elementos de Bioseguridad				
Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 1.711.197,00	$ 1.711.197,00
			Sub- total	**$ 1.711.197,00**
			Sub total básico de obra (A)	$1.065.121.163,00
			Valor Iva (elementos de Bioseguridad) (19%) =B	$ 325,127.00
			Valor total A+B+AIU	**$1.065.446.290,00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU

2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    -
    - AIU:30%

3.1.5 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Bolívar, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	LP 005-003-15.05/059
Objeto del Contrato de Obra	REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS
Valor del Contrato de Obra	$ 3.478.131.956
Nombre del Contratista	CONSORCIO ONIX CCM
Representante legal	JHANER SEGOVIA QUINTRO
Fecha suscripción Contrato de obra	13 de diciembre de 2022
Acta de inicio	25 de abril de 2023
Prorroga 1	26 de septiembre de 2023
Prorroga 2	1 noviembre
Suspensión 1	28 de diciembre de 2023
Reinicio 1	5 de marzo de 2024
Prorroga 3	9 de marzo de 2024
Prórroga 4	1 de junio de 2024
Prórroga 5	1 de julio de 2024
Suspensión 2	26 de julio de 2024
Ampliación 1 a la suspensión 2	1 de septiembre de 2024

Ampliación 2 a la suspensión 2	1 de octubre de 2024
Reinicio 2	1 de noviembre de 2024
Prórroga 6	7 de noviembre de 2024
Fecha de terminación inicial	25 de septiembre de 2023
Fecha de terminación vigente	15 diciembre de 2024

3.1.5.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
Actividades preliminares y explanación				
Demolición de estructuras	m3	142	$ 181,764.00	$ 25,810,488.00
Remoción de alcantarillas	ml	89	$ 81,042.00	$ 7,212,738.00
Excavaciones varias en roca en seco	m3	86	$ 91,174.00	$ 7,840,964.00
			Sub- total	**$ 40,864,190.00**
Afirmados, Subbase y Bases				
Subbase granular clase C SBG-50	m3	950	$ 311,091	$ 295,536,450
			Sub- total	**$ 295,536,450**
Estructura de pavimento				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	102	$ 24,000	$2,448,000.00
Concreto resistencia 21MPa (D) – Mezcla In Situ	m3	690	$ 765,385	$528,115,650
Concreto resistencia 14MPa (f) - Ciclópeo	m3	445	$ 554,024	$246,540,680
Defensa metálica	m	12	$ 218,922	$2,627,064
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	63,500	$ 9,700	$615,950,000
			Sub- total	**$1,395,681,394**
Estructuras de drenaje				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	2350	$ 24,000	$ 56,400,000
Excavaciones varias en roca en seco		285	$ 91,174	$ 25,984,590
Relleno para estructuras con recebo	m3	538	$ 204,226	$ 109,873,588
Concreto resistencia 28MPa (C) mezcla In Situ	m3	80	$ 1,036,426	$ 82,914,080
Concreto resistencia 21MPa (D) mezcla In Situ	m3	903	$ 765,385	$ 691,142,655
Concreto resistencia 14mpa - (F)	m3	5	$ 727,128	$ 3,635,640
Acero de refuerzo Fy 60.000 PSI	kg	37,500	$ 9,700	$ 363,750,000
Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior	ml	180	$ 868,679	$ 156,362,220
Relleno de gravilla	m3	87	$ 269,491	$ 23,445,717
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	826	$ 10,205	$ 8,429,330
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	ml	393	$ 38,199	$ 15,012,207
			Sub- total	**$ 1,536,950,027**
Obras de estabilización				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	150	$ 24,000	$ 3,600,000
Relleno para estructuras con recebo	m3	73	$ 204,226	$ 14,908,498
Concreto resistencia 21MPa (D) mezcla In Situ	m3	52	$ 765,385	$ 39,800,020

Concreto resistencia 14mpa - (F)	m3	2	$ 727,128	$ 1,454,256
Acero de refuerzo Fy 60.000 PSI	kg	7,923	$ 9,700	$ 76,853,100
Relleno de gravilla	m3	15	$ 269,491	$ 4,042,365
Geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 N aproximadamente	m2	120	$ 10,205	$ 1,224,600
Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	ml	26	$ 38,199	$ 993,174
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 2: recubrimiento de aleación Zn-5A1-MM	m3	24	$ 730,253	$ 17,526,072
			Sub- total	**$ 160,402,085**
Señalización horizontal y vertical				
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP y/o SI, con tablero en lámina retro reflectiva tipo IX (75 x 75) cm	m3	30	$ 730,253	$ 21,907,590
			Sub- total	**$ 21,907,590**
			Sub total básico de obra (A)	$3,445,219,240
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$32,912,716
			Valor total A+B+AIU	**$3,478,131,956**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.6 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Bolívar, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	LP 004-003-15.05/058
Objeto del Contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Valor del Contrato de Obra	$ 1.063.184.929

Nombre del Contratista	CONSORCIO PH CHALGUAYACO
Representante legal	HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
Fecha suscripción Contrato de obra	13 de diciembre de 2022
Acta de inicio	3 de abril de 2023
Prorroga 1	4 de septiembre de 2023
Prorroga 2	1 noviembre de 2023
Prorroga 3	1 de enero de 2024
Prorroga 4	1 de marzo de 2024
Fecha de terminación inicial	3 de septiembre de 2023
Fecha de terminación vigente	31 de mayo de 2024
Estado actual	Ejecutada la meta física 100%

3.1.6.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
Actividades preliminares y explanación				
Demolición de estructuras	m3	27,13	$ 153,105	$ 4,153,828
Remoción de alcantarillas	ml	44	$ 55,477	$ 2,444,705
			Sub- total	**$ 8,598,533**
Afirmados, Subbase y Bases				
Subbase granular clase C	m3	573	$ 258,200	$ 147,915,292
			Sub- total	**$ 147,915,292**
Estructura de pavimento				
Excavaciones manuales para riostras de placa huella, incluye transporte	m3	48	$ 26,725	$1,295,460
Concreto resistencia 21MPa (D) – Mezcla In Situ (Huellas, riostra, cunetas)	m3	597	$ 715,730	$427,201,113
Concreto resistencia 14MPa - Ciclópeo	m3	207	$ 544,008	$112,672,163
Acero de refuerzo Fy 420 MPa.	kg	22,975	$ 9,843	$226,143,564
			Sub- total	**$767,312,300**
Estructuras de drenaje				
Excavaciones varias en material común en seco (incluye retiro)	m3	392	$ 26,725	$ 110,481,446
Acero de refuerzo Fy 60.000 PSI	kg	5,255	$ 9,843	$ 51,726,410
Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior	ml	62	$ 817,200	$ 50,416,173
			Sub- total	**$ 112,624,029**
Señalización horizontal y vertical				
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retro reflectiva tipo III (75 x 75) cm	m3	24	$ 746,991	$ 17,556,081
			Sub- total	**$ 17,556,081**

Sub total básico de obra (A)	$ 1,052,006,235
Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 110,520,062
Valor total A+B+AIU	**$ 1,062,526,297**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.7 ALMAGUER 1749 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Almaguer, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	F1-F14-289-2022
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Valor del Contrato de Obra	$ 1.799.782.602
Nombre del Contratista	JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS
Fecha suscripción Contrato de obra	21 de diciembre de 2022
Acta de inicio	11 de mayo de 2023
Prorroga 2	12 de noviembre de 2023
Suspensión 1	27 de diciembre de 2023
Reinicio 1	17 de enero de 2024
Prorroga 3	22 de enero de 2024
Fecha de terminación inicial	11 de noviembre de 2023
Fecha de terminación vigente	21 de marzo de 2024
Estado actual	Ejecutada la meta física 100%

3.1.7.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN NO.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de alcantarillas 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	m3	440.00	$ 41,548.00	$ 18,281,120.00
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	206.00	$ 17,079.00	$ 3,518,274.00
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	78.00	$ 992,001.00	$ 77,376,078.00
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	8.00	$ 796,225.00	$ 6,369,800.00
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	5789.00	$ 9,553.00	$ 55,302,317.00
Tubería de concreto reforzado 21MPA de 900mm de diámetro interior	ml	70.00	$ 978,174.00	$ 68,472,180.00
			Sub- total	**$197.772.614,00**
Construcción de Placa Huella				
Excavaciones Varias sin Clasificar	m2	803.49	$ 41,548.00	$ 33,383,403.00
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	484.96	$ 17,079.00	$ 8,282,632.00
Subbase granular tipo C	m	769.09	$ 405,707.00	$ 312,025,197.00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	13.90	$ 796,225.00	$ 11,067,528.00
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	615.76	$ 992,001.00	$ 610,834,536.00
Concreto resistencia 14 MPA (G) 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	m3	223.94	$ 703,683.00	$ 157,582,771.00
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	m3	27,059.67	$ 9,553.00	$ 258,501,028.00
Sello para juntas	m3	6,978.00	$ 6,405.00	$ 44,694,090.00
			Sub- total	**$1,436,371,185.00**
Construcción de filtro				
Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	20.40	$ 41,548.00	$ 847,579.00
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	132.40	$ 9,958.00	$ 1,318,439.00
Tubería plástica tipo sanitaria norma NTC 1087 de diámetro 101,6MM	ml	34.00	$ 41,853.00	$ 1,423,002.00
Relleno con material filtrante	m3	20.40	$ 353,549.00	$ 7,212,400.00
			Sub- total	**$ 10,801,420.00**
Construcción muro de contención				
Excavaciones Varias sin Clasificar	m2	129.03	$ 41,548.00	$ 5,360,938.00
Relleno con material filtrante	m3	18.34	$ 353,549.00	$ 6,484,089.00
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	37.35	$ 992,001.00	$ 37,051,237.00
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	2.10	$ 796,225.30	$ 1,672,073.00
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	4,862.28	$ 9,553.00	$ 46,449,361.00
Tubería de plástico tipo sanitaria norma NTC 1087 de diámetro 101,6MM	ml	15.03	$ 41,853.00	$ 629,051.00
Tubería de plástico tipo sanitaria norma NTC 1087 de diámetro 50,8MM	ml	15.73	$ 23,880.00	$ 375,632.00
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	121.13	$ 9,958.00	$ 1,206,213.00
Rellenos para estructuras con suelo	m3	41.26	$ 17,079.00	$ 704,680.00
			Sub- total	**$ 99,933,274.00**
Señalización y seguridad vial				
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retro reflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	6.00	$ 637,719.00	$ 3,826,314.00
			Sub- total	**$ 3,826,314.00**
Elementos de bioseguridad				

Elementos bioseguridad	gl	1	$1,482,535.00	$ 1,482,535.00
			Sub- total	**$ 1,482,535.00**
Obras de compensación ambiental y/o complementarias				
Obras de compensación ambiental y/o complementarias	gl	1	$17,766,423.00	$ 17,766,423.00
			Sub- total	**$ 17,766,423.00**
			Sub total básico de obra (A)	$1,799,500,920.00
			Valor IVA consultoría (c)	$ 281,682.00
			Valor total A+B+C+AIU	**$1,799,782,602.00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.8 ALMAGUER 1982 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Almaguer, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	93-2023
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CH\LCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA
Valor del Contrato de Obra	$ 795.011.198
Nombre del Contratista	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
Fecha suscripción Contrato de obra	14 de marzo de 2023
Acta de inicio	4 de julio de 2023
Prorroga 1	5 de noviembre de 2023
Suspensión 1	26 de diciembre de 2023
Reinicio 1	16 de enero de 2024
Prorroga 2	22 de enero de 2024
Fecha de terminación inicial	4 de noviembre de 2023

Fecha de terminación vigente	23 de febrero de 2024
Estado actual	Ejecutada la meta física 100%

3.1.8.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN NO.1 ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de Placa Huella				
Subbase granular tipo C	m3	336.15	$445,142	$ 149,634,483
Sello asfaltico para juntas	ml	3240.00	$3,105	$ 10,060,200
Excavaciones Varias sin Clasificar	m3	243.45	$46,140	$ 11,232,783
Relleno para estructuras con material de excavación	m3	74.70	$15,496	$ 1,157,551
Concreto resistencia 21MPa (D)	m3	250.45	$1,020,185	$ 255,505,333
Concreto resistencia 14 MPa (G) ciclópeo	m3	104.00	$705,577	$ 73,380,008
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	12501.56	$9,618	$ 120,240,004
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	12.90	$714,961	$ 9,222,997
			Sub- total	**$ 630,433,359**
Construcción de alcantarillas 36"				
Excavaciones varias sin clasificar	m3	176.00	$46,140	$ 8,120,640
Relleno para estructuras con suelo	m3	82.40	$15,496	$ 1,276,870
Concreto 21MPa (D)	m3	31.23	$1,020,185	$ 31,860,378
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	3.22	$714,961	$ 2,302,174
Acero de Refuerzo Fy 60.000 PSI.	kg	2,315.00	$9,618	$ 22,265,670
Tubería de concreto reforzado clase II de 900mm de diámetro interior	ml	28.00	$873,572	$ 24,460,016
			Sub- total	**$ 90,285,748**
Señalización y seguridad vial				
Señal vertical de tránsito tipo 1 con lámina retro reflectiva tipo III (75 x 75) cm	und	4.00	$ 628,120	$ 2,512,480
			Sub- total	**$ 2,512,480**
Revisión de estudios y diseños				
Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural adaptada mediante resolución No. 2483 del 19/10/2020	gl	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000
			Sub- total	**$ 5,000,000**
Elementos de bioseguridad				
Elementos e insumos de protección protocolo bioseguridad (Según comprobante por mes)	gl	1	$1,287,132	$1,287,132
			Sub- total	**$1,287,132**
Obras de compensación ambiental y/o complementarias				
Obras de compensación ambiental y/o complementarias	gl	1%		$ 7,309,314
			Sub- total	**$ 7,309,314**
Mantenimiento vial				
Conformación de calzada existente	m2	6,665	1,130	$7,531,450

Afirmado con material de la zona	m3	333	148,520	$49,457,160
			Sub- total	**$ 56,988,6610**
			Sub total básico de obra (A)	$793,816,643
			Valor IVA consultoría (B)	$1,194,555
			Valor total A+B+AIU	**$795,011,198**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.9 INZA 1983 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Inzá, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	141 DE 2022
Objeto del Contrato de Obra	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL EN CORCONDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA - CAUCA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Valor del Contrato de Obra	$ 608.231.289
Nombre del Contratista	CONSORCIO INZA 2022
Representante legal	JAMES PIAMBA HOYOS
Fecha suscripción Contrato de obra	27 de septiembre de 2022
Acta de inicio	28 de abril de 2023
Prorroga 1	29 de julio de 2023
Prorroga 2	15 de septiembre de 2023
Prorroga 3	1 de noviembre de 2023

Suspensión 1	27 de diciembre de 2023
Reinicio 1	11 de enero de 2024
Prorroga 4	16 de enero de 2024
Fecha de terminación inicial	28 de julio de 2023
Fecha de terminación vigente	16 de marzo de 2024
Estado actual	Ejecutada la meta física 100%

3.1.9.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCION 1. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de alcantarillas				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	176	$ 46,500	$ 8,184,000
Rellenos para estructuras con suelo	M3	108	$ 44,980	$ 4,857,840
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	31.20	$ 746,518	$ 23,291,362
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	M3	3	$ 640,825	$ 2,050,640
Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	2316	$ 8,563.00	$ 19,831,908
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	28	$ 683,987	$ 19,151,636
Disipadores de energía en concreto ciclópeo	M3	28	$ 518,395.00	$ 14,515,060
Geotextil	M2	381.59	$ 11,905.00	$ 4,542,829
Material granular drenante	M3	55.26	$ 180,864	$ 9,994,545
			Sub- total	**$ 106,419,819**
Construcción de placa huella en concreto				
Excavaciones varias sin clasificar	M3	53.76	$ 46,811	$ 2,516,559
Rellenos para estructuras con suelo	M3	34	$ 44,980	$ 1,529,320
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	80.48	$ 746,518	$ 60,079,769
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	M3	2.40	$ 640,825.00	$ 1,537,980
Concreto de resistencia 14Mpa (G) (ciclópeo)	M3	53.76	$ 449,265.00	$ 24,152,486
Acero de refuerzo Fy=4200 Mpa.	Kg	7759	$ 8,563.00	$ 66,440,317
Cuneta de concreto vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo	M3	31.36	$ 763,510	$ 23,943,674
Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	M3	11.0	$ 846,548	$ 9,312,028
Subbase Granular Clase C	M3	180.00	$ 231,636	$ 41,694,480
			Sub- total	**$ 231,206,613**
Revisión y/o ajuste de diseños base Cartilla Colombia rural				
Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia rural adaptada mediante resolución No. 2483 del 19-oct-2020	GLB	1.00	$ 6,098,780	$ 6,098,780
			Sub- total	**$ 6,098,780**
Elementos de Bioseguridad				

Elementos de Bioseguridad	GLB	1.00	$ 1,853,627	$ 1,853,627
			Sub- total	**$ 1,853,627**
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO				
Conformación de calzada	M2	58,500.00	$ 1,119	$ 65,461,500
Afirmado	M3	2,300.00	$ 67,920	$ 156,216,000
Excavaciones varias sin clasificar	M3	32.00	$ 47,691	$ 1,526,112
Rellenos para estructuras con suelo.	M3	6.00	$ 44,989	$ 269,934
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	M3	12.00	$ 746,667	$ 8,960,004
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	M3	1.00	$ 640,953	$ 640,953
Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	920.00	$ 8,565	$ 7,879,800
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	6.00	$ 683,987	$ 4,103,922
Disipadores de energía en concreto ciclópeo	M3	21.00	$ 518,395.00	$ 10,886,295
			Sub- total	**$ 255,944,520**
			Sub total básico de obra (A)	$ 601,523,359,49
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 5,201,230
			Valor IVA (C)	$ 1,506,700
			Valor total A+B+AIU	**$ 608,231,289,49**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.10 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	484-2022
Objeto del Contrato de Obra	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.
Valor del Contrato de Obra	$ 912.367.379

Nombre del Contratista	CONSORCIO VIAS RURAL 2022
Representante legal	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Fecha suscripción Contrato de obra	7 de septiembre de 2022
Acta de inicio	1 de junio de 2023
Prorroga 1	2 de octubre de 2023
Prorroga 2	1 de noviembre de 2023
Suspensión 1	5 de diciembre de 2023
Reinicio 1	11 de enero de 2024
Prorroga 3	22 de enero de 2024
Prorroga 4	22 de abril de 2024
Suspensión 2	14 de mayo de 2024
Reinicio 2	4 de junio de 2024
Prorroga 5	22 de junio de 2024
Prorroga 6	1 de julio de 2024
Fecha de terminación inicial	1 de octubre de 2023
Fecha de terminación vigente	31 de julio de 2024
Estado actual	Ejecutada la meta física 100%

3.1.10.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción y recuperación de alcantarillas				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	542.64	$ 36,126.00	$19,603,413.00
Rellenos para estructuras con material recebo	m3	309.86	$ 63,494.00	$19,674,251.00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m3	62.48	$ 607,882.00	$37,980,467.00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	4.72	$ 443,814.00	$2,094,802.00
Acero de refuerzo Fy=4200 Mpa.	Kg	5,422.4	$ 7,234.00	$39,225,642.00
Tubería de concreto reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	ml	56.00	$ 648,333.00	$36,306,648.00
			Sub- total	**$ 154.885.223,00**
Construcción muro en gaviones				
Excavaciones varias en material común en seco	m3	120,00	$ 36,126.00	$4,335,120.00
Rellenos para estructuras con material de recebo	m3	314,00	$ 63,494.00	$19,937,116.00

Concreto de resistencia 14Mpa (G) (ciclopeo)	m3	12,00	$ 348,816.00	$4,185,792.00
Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: Recubrimiento de Zinc Galvanizado	m3	68,00	$ 324,854.00	$22,090,072.00
			Sub- total	**$ 50.548.100,00**
Construcción de placa huella en concreto				
Excavaciones varias en material común	m3	524.237	$ 36,126.00	$18,938,586.00
Rellenos para estructuras con material de recebo	m3	287.17	$ 63,494.00	$18,233,572.00
Concreto resistencia 21 Mpa (D)	m3	265.81	$ 607,882.00	$161,581,114.00
Concreto resistencia 14 Mpa (F)	m3	55.00	$ 443,814.00	$24,409,770.00
Concreto de resistencia 14Mpa (G) (ciclopeo)	m3	135.64	$ 348,816.00	$47,313,402.00
Acero de refuerzo fy=4200 Mpa.	Kg	18,517.38	$ 7,234.00	$133,954,727.00
Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	106.02	$ 673,649.00	$71,420,267.00
Bordillo de concreto vaciado in situ; incluye la preparación de la superficie de apoyo	ml	1,240.00	$ 67,916.00	$84,215,840.00
Subbase Granular Clase A	m3	469.72	$ 139,495.00	$65,523,591.00
			Sub- total	**$ 625.590.869,00**
No previsto				
Excavaciones varias en material común	m3	212.12	$ 36,126.00	$7,663,047.00
Material granular drenante	m3	209.0365	$ 195,311.00	$40,827,132.00
Tuberia de drenaje diametro 100mm	m	392.80	$ 36,057.00	$14,163,190.00
Geotextil NT 2500	m2	1,374.80	$ 9,927.00	$13,647,639.60
			Sub- total	**$ 76.301.008.60**
			Sub total básico de obra (A)	$ 907.325.200,60
			Obras de compensación ambiental y/o complementarias hasta el 1% de (A) (B)	$ 5.042.166,00
			Ajuste por redondeo(C)	$ 12.00
			Valor total A+B+AIU	**$ 912.367.379,00**

Notas:

1. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
2. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
3. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%
    - Imprevisto I:5%
    - Utilidad U:5%
    - AIU:30%

3.1.11 PUERTO TEJADA 2496 – CAUCA

Entidad Ejecutora	Municipio de Puerto Tejada, Departamento del Cauca
No. del Contrato de Obra	156 del 5 de septiembre de 2023
Objeto del Contrato de Obra	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIASS EN LA VÍA VILLA OLÍMPICA – JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA
Valor del Contrato de Obra	$ 1.815.000.000
Nombre del Contratista	CONSORCIO INFRAVIAL 2023
Representante legal	PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
Fecha suscripción Contrato de obra	29 de agosto de 2023
Acta de inicio	4 de diciembre de 2023
Suspensión 1	7 de diciembre de 2023
Reinicio 1	5 de febrero de 2024
Prorroga 1	5 de abril de 2024
Suspensión 2	24 de mayo de 2024
Reinicio 2	3 de junio de 2024
Prórroga 2	10 de junio de 2024
Prórroga 3	1 de julio de 2024
Suspensión 3	26 de julio de 2024
Ampliación 1 a la suspensión 3	1 de septiembre de 2024
Reinicio 3	1 de octubre de 2024
Prórroga 4	7 de octubre de 2024
Fecha de terminación inicial	4 de febrero de 2024
Fecha de terminación vigente	15 de diciembre de 2024

3.1.11.1 Propuesta Económica

Descripción	Unid	Cant	V. Unitario	V. Total
SECCIÓN 1 - ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO				
Construcción de pavimento flexible				
Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m2	251.33	$33.069.00	$8.311.166.00

Subbase granular clase C SBG-50	m3	2.217.6	$107962.00	$239.416.531.00
Base granular clase C gradación gruesa	m3	2.217.60	$115.632.00	$256.425.523.00
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	7.392.00	$2.716.00	$20.076.672.00
Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 compra de mezcla	m3	739.20	$1.273.832.00	$941.616.614.00
Excavaciones varias sin clasificar	m3	3.104.64	$39.789.00	$123.530.521.00
Relleno para estructuras con suelo	m3	147.84	$27.607.00	$4.081.419.00
Concreto resistencia 21Mpa (D) Mezcla in situ	m3	147.84	$703.908.00	$104.065.759.00
Concreto resistencia 14Mpa (F)	m3	11.09	$490.230.00	$5.435.670.00
Acero de refuerzo Fy 4200 Mpa	Kg	6.066.82	$9.638.00	$58.472.011.00
Línea de demarcación con pintura en frío	m	3.696.00	$1.867.00	$6.900.432.00
Señal vertical de tránsito tipo SR, SP, y/o SI, tablero en lámina con lámina retro reflectiva tipo IV (75X75cm)	u	2.00	$406.783.00	$813.566.00
			Sub- total	**$ 1.769.145.884,00**
Construcción de alcantarillado 36” (1 unidad)				
Remoción de alcantarillas	m	6.00	$76.116.00	$456.696.00
Excavaciones varias sin clasificar	m3	49.00	$39.789.00	$1.949.661.00
Relleno para estructuras con suelo	m3	3.60	$27.607.00	$99.385.00
Concreto resistencia 21MPa (D) mezcla in situ	m3	9.80	$703.908.00	$6.898.298.00
Concreto resistencia 14MPa (F)	m3	1.80	$490.230.00	$882.414.00
Acero de refuerzo Fy 4200 MPa	kg	735.42	$9.638.00	$7.087.978.00
Tubería de concreto reforzado, clase III de 900mm de diámetro interior	M	7.00	$927.331.00	$6.491.317.00
			Sub- total	**$ 23.865.749,00**
Revisión de diseños base cartilla Colombia rural				
Revisión y/o ajuste de diseños base de la cartilla Colombia Rural Adoptada mediante resolución NO. 2483 del 19/10/2020 incluye ajuste a diseños de puente y ensayos (*)	GL	1	$3.410.295.00	$3.410.295.00
			Sub- total	**$ 3.410.295,00**
			Subtotal obras	$1.796.421.928.00
			Sub total básico de obra (A)	$1.796.421.928.00
			Obras complementarias: hasta 1% (B)	$17.930.116.00
			Valor IVA (consultoría) (19%) = (C)	$647.956.00
			Valor total	**$1.815.000.000,00**

Notas:

4. Se debe tener en cuenta que el precio unitario incluye el valor AIU
5. Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso
6. El AIU y su discriminación debe estar en porcentaje:
    - Administración A: 20%

- Imprevisto I:5%
- Utilidad U:5%
- AIU:30%

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

De acuerdo con lo establecido en el Manual De Interventoría Obra Pública, el contratista implementador deberá efectuar la entrega en medio magnético los siguientes documentos, previo a la suscripción de la orden de inicio:

- Copia de actos administrativos y/o pronunciamientos de la autoridad ambiental competente como resoluciones, autos, providencias y otros requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).
- Copia del(los) Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoría.
- Copia del documento de aprobación de garantías.
- Contrato suscrito entre Entidad municipal y contratista.
- Carpeta que contenga la información y documentación de la Etapa Precontractual (Pliegos de Condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.).
- Programa de obra e inversión.
- Los contratos que cuenten con anticipo, deben presentar la documentación respectiva de constitución de FIDUCIA y demás requeridos.
- Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría.

Adicionalmente, dando cumplimiento a VII. ENTREGA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR "El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de inicio del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso de selección del Contratista de Obra"

- Entrega de hojas de vida del personal profesional
- Gestión municipal y/o certificación programa de Reintegración y Reincorporación
- Entrega de documentos mínimos para la maquinaria
- Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica
- Gestión municipal y/o certificación para el programa de generación de empleo
- Instalaciones provisionales
- Documentos del laboratorio toma de control de calidad
- Plan de calidad
- Plan de Manejo de Tránsito - PMT
- Certificación inventario de vías publicas
- Realizar mediante oficio la consulta del modelo de datos ante la Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración con el fin de que los

planos que se van a desarrollar durante la ejecución del contrato sean compatibles y consistentes con el Sistema de Información Geográfico SIG
- Informe, Datos crudos de campo, capas geográficas en formato shapefile con posición original
- Plan de Gestión Social - PGS
- Presentar protocolo bioseguridad a la entidad, ARL y entes territoriales
- Plan Gestión Ambiental
- Estudios y diseños
- Instalación Valla Informativa

3.2.1 Contrato de obra– Convenio 1984-2021 MUNICIPIO DEL ARGELIA

- El contrato se encuentra vencido por plazo contractual desde el 20 de enero del 2024.
- En reiteradas ocaciones se ha alertado al municipio de Argélia mediante oficio para iniciar con los tramites pertinentes para el incumplimiento del contrato ya que la obra fue abandonada, sin enbargo hasta la fecha no se ha tenido respuesta alguna.

3.2.2 Contrato de obra– Convenio 1894-2021 MUNICIPIO DE MERCADERES

Durante el mes de octubre, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- En campo se desarrollan actividades de corte, figurado de acero para las riostras, se adelanta la excavación de las mismas, Instalación de acero para placa huella, de igual manera instalan formaleta para la fundición de concreto reforzado de las huellas y también para la fundición de concreto ciclópeo. Se cuenta con aproximadamente 900 metros de placa huella fundida, con cunetas, bordillos tal como aparece en el diseño geométrico entregado por el municipio.
- Se realizan actividades de la abscisa K1+000 a K1+050
- El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
- Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
- Se realizan actividades de la abscisa K1+170 al K1+230
- Se realiza excavación para perfilar los taludes para el muro de contención.
- Se realiza la instalación de acero para la zarpa y vástago del muro de contención
- Se realiza la fundición de la zarpa y el vástago del muro de contención

3.2.3 Contrato de obra– Convenio 1866-2021 MUNICIPIO DE SUCRE

Durante el mes de octubre, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Teniendo en cuenta que se da el reinicio con fecha del 01 de octubre del 2024 se hacen las siguientes precisiones: se solicita la organización de toda la documentación del contrato teniendo en cuenta la fecha de terminación.
- Se solicita que se entregue el cronograma de actividades, plan de contingencia, flujo de caja teniendo en cuenta la prorroga N7.
- Se solicita el reinicio de las actividades dado el tiempo que falta por culminar la vigencia del contrato.
- Se recibe la sollicitud de reinicio y solicitud de prórroga N 7 del contrato, la interventoría envia unas observaciones para subsanar, posteriormente el contratista subsana los documentos, lo que permite a la interventoría dar aval a la solicitud, seguidamente la entidad contratante aprueba la prórroga N7, la cual inicia desde el 7 de octubre del 2024 hasta el 15 de diciembre del 2024.
- Mediante comité en las instalaciones del invias territorial Cauca. entre el contratista, interventoría y municipio de sucre, se mencionan los siguientes temas: solicitud de reinicio de obra y solicitud de prórroga por parte del contratista, solicitud del flujo de caja, creonograma de actividades y un plan de contingencia teniendo encuenta el tiempo de vigencia del contrato. solicitud de actualización y organización de todos los documentos administrativos que hacen parte del proceso CTO 258 de 28 de octubre del 2022, y por ultimo se menciona que se deben entregar obras funcionales para la continuidad de las solicitudedes de los pagos parciales.
- Se reitera la solicitud de actualizar y organizar las documentación faltante del archivo del contrato, para dar continuidad al los trámitres administrativos
- El día 14 de octubre del 2024 se cita al contratista a una reunión en la oficina de la interventoría, entre los temas a tratar se hicieron las siguientes precisiones; se solicita que los documentos que estan atrasados y que hacen parte de los tramites del contrato en referencia, sean subsanados, es decir poder ir adelantando de manera perentoria la documentación faltante del archivlo del proceso.
- por otra parte se solicita que se de continuidad a la ejecución de las obras dado que ya hubo suscripción de prorroga N7 y reinicio de obra con fecha del 01 de octubre del 2024, por ende la interventoría manifiesta que es de importancia que se pueda iniciar con las actividades con el personal que mencionan en el plan de contingencia entregado.
- Se manifiesta que a la fecha no se tiene subsanado el documento cronograma de actividades de obra, ni el flujo de caja correspondiente a la PRORROGA N7.
- Se solicita que se inicien con las actividades de obra teniendo en cuenta la vigencia del contrato.

- Adicionalmente la interventoría hace mención que las primeras actividades a realizar en la ejecución de la obra deben estar encaminadas a organizar las obras que han quedado inconclusas como lo es el pavimento rigido instalado.
- De acuerdo con los últimos compromisos pactados en la reunión con el INVIAS, se presenta el siguiente avance: a la fecha, los documentos solicitados a la interventoría han sido subsanados y entregados a la entidad contratante. Asimismo, se solicitó al contratista la corrección de los documentos requeridos por el municipio. Sin embargo, se realizaron algunas observaciones adicionales sobre los documentos entregados, las cuales deben ser corregidas; hasta la fecha, los documentos subsanados aún no han sido entregados.
- El día 25 de octubre se da aval a la solicitud de pago ORDEN DE GIRO No 3 TRANSPORTE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLES, se esta a la espera a la aprobación en la plataforma Alianza.
- El día 25 de octubre del 2024 mediante correo electrónico se solicita entrega del cronograma de actividades, flujo de caja y diagrama de gantt respecto a la Prorroga N7.
- El día 25 de octubre del 2024 mediante correo electronico se solicita entrega de pólizas actualizadas teniendo en cuenta la prorroga N7 y el reinicio de obra.
- Armado de las canastillas dovelas para la fundición del concreto rigido
- Proceso de encofrado de placa de concreto margen izquierda en el sentido del abscisado pro un total de 110 ml 2,90 ml de ancho.
- Se evidencia que se ha acopiado un total de aproximadamente 30 m3 de material granular y un total de 350 bultos de cemento para la funcidicón del MR.
- Se hace un proceso de mantenimiento de a la sub base instalada, para ello se utilizo del equipo de la motoniveladora y el vibrocompactador.
- El día 28 de octubre del 2024 la interventioria manifiesta que se recibieron las pólizas referentes al reinio N2, Sin embargo se solicita que sean entregadas en original. seguidamente se solicita de caracter urgente las pólizas respecto al modificatorio N7
- El día 28 de octubre del 2024 mediante el oficio DON-1100-INV-779-2024 que tiene como asunto FALTA DE PERSONAL IDENTIFICABLE EN EL PROYECTO Y AUSENCIA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DEL CONTRATO DE OBRA N° 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022, la interventoría manifiesta que a la fecha del presente documento no hay presencia del personal en obra como se programo en el plan de contingencia remitido por el contratista el pasado 01 de octubre del 2024.
- El día 29 de octubre del 2024 mediante correo se da la clarida respecto al documento Modificatoria N7, entregada por el contratista en fisico a la entidad contratante, se adjunta el documento que tiene validez y que fue avalado por todas las partes intervinientes.

3.2.4 Contrato de obra– Convenio 1769-2021 MUNICIPIO DE SUCRE

Durante el mes de octubre, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- El contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
- Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
- Se realizan actividades de la abscisa K0+384 a la K0+339

3.2.5 Contrato de obra– Convenio 1867-2021 MUNICIPIO DE BOLIVAR

Durante el mes de octubre, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- El día 09 de octubre de 2024 se realiza una inspección de obra, en compañía del contratista, representantes de la entidad contratante e interventoría, entre los objetivos de las la inspección esta, mirar el estado de las obras ejecutadas y de la verificación de que obras son funcionales. entre los mencionado se manifiesta por parte de la interventoría que se deben culminar las obras muros en gaviones, muro de contención, y terminar el 200 ml aproximadamente de placa huella para llegar al pueblo.
- Adicionalmente se manifiesta que se debe incluir un plan de contingencia y darle cumplimiento al mismo, debido al tiempo de vigencia del contrato.
- El día 18 de octubre del 2024 el contratista envía vía a correo el C.O - 0,57 y C.O.- 056 en el cual manifiesta unas observaciones y unas solicitudes, la interventoría proyecta la respuesta a tales solicitudes y manifiesta que lo mencionado en el documento no hace parte de las funciones de la interventoría, por lo cual transfiere la solicitud a la entidad contratante.
- El día 26 de octubre del 2024 mediante el oficio DON-1100-INV-777-2024 RESPUESTA Oficio C.0.-057 Remitido por el contratista el día 18 de octubre de 2024. para el conocimiento y postura de la interventoría a la solicitud del contratista.
- Se reitera la solicitud para el inicio de las actividades en campo.
- Se solicita el reinicio de las actividades en capo para darle continuidad a la ejecución de las obras.
- El día 28 de octubre del 2024 mediante el oficio DON-1100-INV-778-2024 que tiene por asunto RESPUESTA OFICIO CON ASUNTO: VALIDACIÓN CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL CONSORCIO ONIX CCM, manifestando que la interventoría no tiene objeciones ante el comunicado.
- El día 28 de octubre del 2024 mediante el oficio DON-1100-INV-781-2024 la interventoría manifiesta que: se da respuesta al comunicado enviado por el contratista TRASLADO Oficios C.0.-056- C.0.-057 Remitido por el contratista el día 18 de octubre de 2024.

3.2.6 Contrato de obra – Convenio 1750-2021 MUNICIPIO DE BOLIVAR

- Las actividades constructivas contractuales se encuentran ejecutadas en un 100% (meta física finalizada).

3.2.7 Contrato de obra – Convenio 1749 MUNICIPIO DE ALMAGUER

- Las actividades constructivas contractuales se encuentran ejecutadas en un 100% (meta física finalizada).

3.2.8 Contrato de obra– Convenio 1982-2021 MUNICIPIO DEL ALMAGUER

- Las actividades constructivas contractuales se encuentran ejecutadas en un 100% (meta física finalizada).

3.2.9 Contrato de obra – Convenio 1983-2021 MUNICIPIO DE INZÁ

- Las actividades constructivas contractuales se encuentran ejecutadas en un 100% (meta física finalizada).

3.2.10 Contrato de obra– Convenio 1768-2021 MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

- Las actividades constructivas contractuales se encuentran ejecutadas en un 100% (meta física finalizada).

3.2.11 Contrato de obra– Convenio 2496-2019 MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA

Durante el mes de octubre, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- No se ejecutan actividades de obra.
- Se lleva a cabo reunión en el municipio de puerto tejada en compañía de contratista, donde se establecen compromisos para dar el reinicio de actividades de obra, al momento se está esperando la aprobación del balance de obra para la ejecución de la obra ya que el municipio no está de acuerdo en la reducción de la meta física
- A pesar de que la interventoría ya ha emitido el aval para reiniciar el contrato de obra, hasta la fecha no se cuenta con la aprobación formal, ya que no ha sido firmado por el municipio ni por el contratista.
- En esta semana se firma el acta de reinicio y prorroga No.4 con fecha de terminación el 15 de diciembre de 2024.
- En la semana no se realizan actividades de obra

- El día 30 de octubre se lleva a cabo un comité en compañía de personal de la alcaldía de puerto tejada, comunidad y personal de interventoría, en el cual el contratista en cabeza de su representante legal no hizo presencia, en este comité el municipio y comunidad manifiestan la preocupación por la cual no se da reinicio a actividades de obra, de igual manera se establecen unos compromisos de las partes involucradas para continuar con las actividades los cuales reposan en el acta de comité.


3.2.12 Gestión ambiental y social de los diferentes contratos de obra

- Durante el mes de octubre de 2024, se avala el documento PAGA de manera EXTEMPORANEA, el convenio Santander de Quilichao 1768, mediante oficio DON-1100-INV-743-2024, del 01 de octubre, y se remite ante la subdirección de sostenibilidad (SS) de INVIAS para su revisión y concepto.
- En cuanto a convenios que no han enviado el documento PAGA subsanado, se reitera la entrega a: Sucre 1866 mediante oficio DON-1100-INV-765-2024 del 22 de octubre del 2024; Por otro lado, y como seguimiento a la gestión ambiental implementada en obra, se solicita los informes trimestrales a los convenios de: Mercaderes 1894 mediante oficio DON-1100-INV-768-2024 del 22 de octubre del 2024, Sucre 1769, mediante oficio DON-1100-INV-767-2024 del 22 de octubre del 2024, Almaguer 1982, mediante oficio DON-1100-INV-769-2024, del 23 de octubre, Inza 1983, mediante oficio DON-1100-INV-771-2024, del 23 de octubre y Santander de Quilichao 1768, Mediante oficio DON-1100-INV-771-2024, del 23 de octubre, donde este último, los remite de manera incompleta, toda vez que, no anexa el estado ambiental a la terminación del contrato, informe indispensable para la posterior liquidación.
- Para el desarrollo de la gestión social se emitieron oficios reiterando la solicitud de información social pendiente durante la ejecución del contrato, como para los que ya han finalizado actividades de obra para los siguientes contratos: Puerto tejada 2496 a través del oficio DON-1100-INV-774-2024, Mercaderes 1894 a través del oficio DON-1100-INV-775-2024, Bolívar 1750 a través del oficio DON-1100-INV-766-2024. Santander de Quilichao 1768 a través del oficio DON-1100-INV-776-2024, se emitieron observaciones al informe de acta parcial presentada por el municipio de Bolívar 1967 a través del oficio DON-1100-INV-759-2024
- Se realiza la aprobación de actas de vecindad de cierre para convenio 1768 Santander de Quilichao.

3.3 SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

En los siguientes municipios se presentan los siguientes ítems no previstos:

3.3.1 MERCADERES 1894

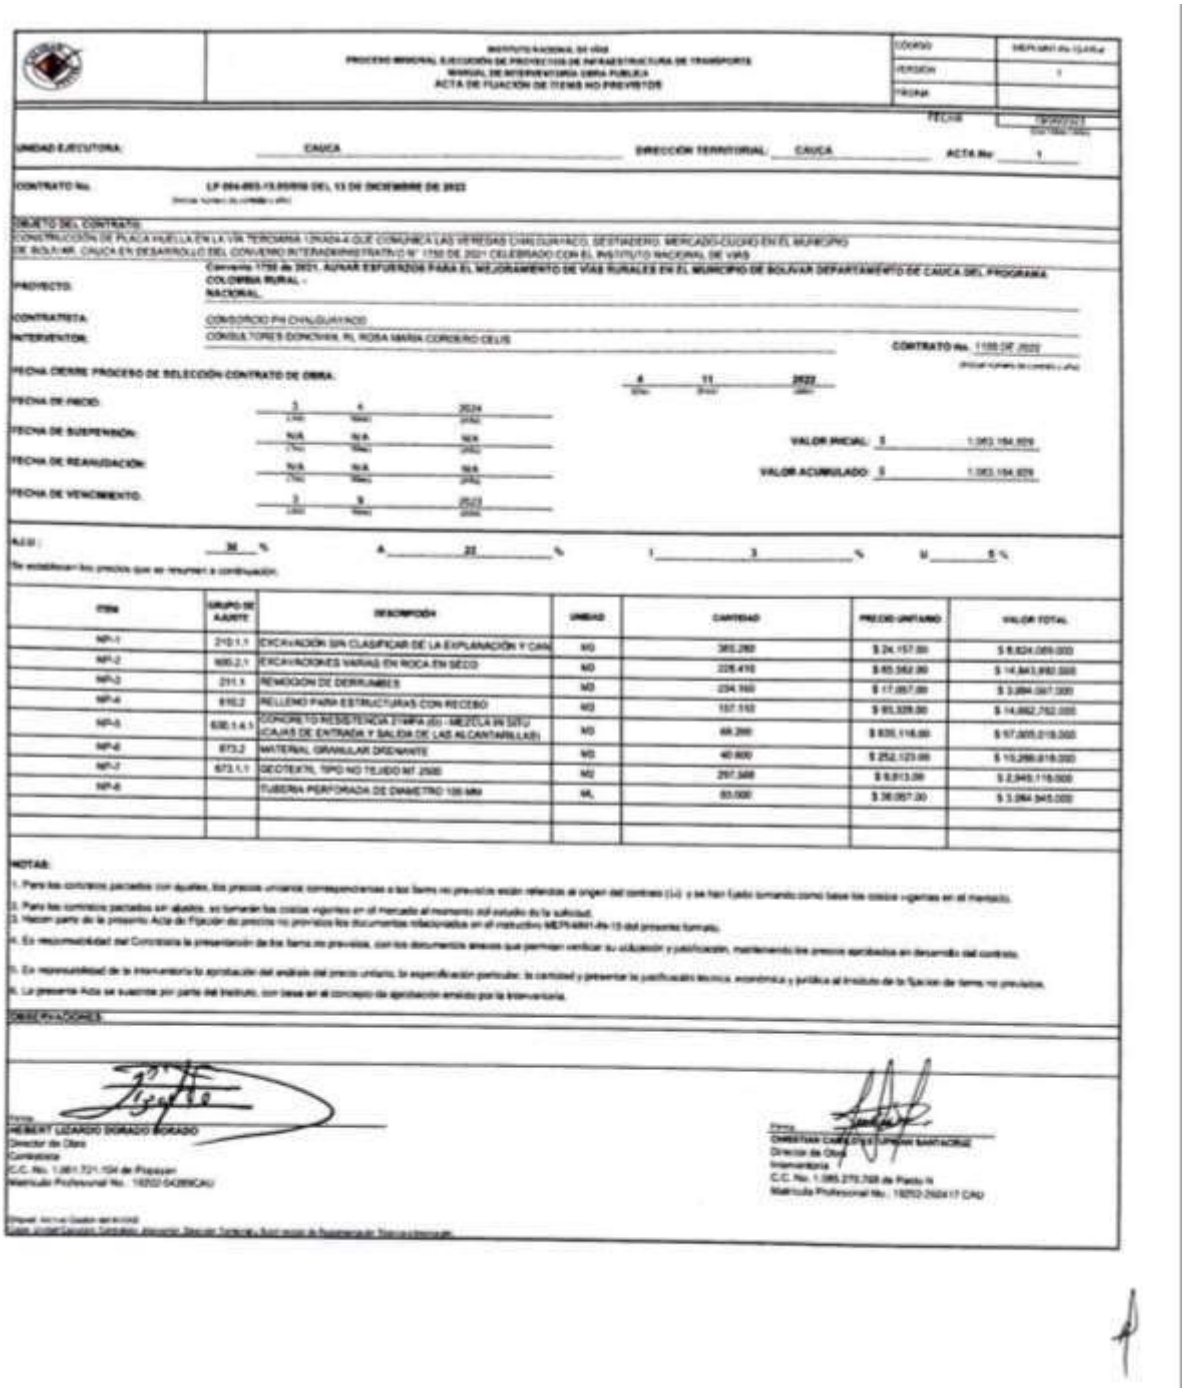

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO: MEPI-MAN-INTERVENTORIA-13-FOR-01
VERSIÓN: 1
VIGENCIA:

FECHA: 10/11/2024

UNIDAD EJECUTORA: CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — ACTA No: 1

CONTRATO No.: LP-004-053-13-55/56 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA "TERCIARIA 12VADA-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHIGUAYACO, GESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1700 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROYECTO: Convenio 1700 de 2021. AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATISTA: CONSORCIO PH CHILGUAYACO

INTERVENTOR: CONSULTORES DONCIVIL PL ROSA MARIA CORDERO CELIS — CONTRATO No. 1100 DE 2022

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 4 / 11 / 2022

FECHA DE INICIO: 1 / 4 / 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A / N/A / N/A

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A / N/A / N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 7 / 9 / 2025

VALOR INICIAL: $ 1.063.184.929

VALOR ACUMULADO: $ 1.063.184.929

A.I.U.: I 30 % — A 22 % — I 3 % — U 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CAN	M3	380,280	$ 24.157,00	$ 9.824.089,000
NP-2	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	226,410	$ 65.562,00	$ 14.843.992,000
NP-3	211.1	REMOCION DE DERRUMBES	M3	234,160	$ 17.057,00	$ 3.994.047,000
NP-4	610.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	157,110	$ 95.329,00	$ 14.982.702,000
NP-5	630.1.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (3) - MEZCLA EN SITU (CAJAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS ALCANTARILLAS)	M3	68,280	$ 835.116,00	$ 57.005.019,000
NP-6	673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	40,600	$ 252.123,00	$ 10.235.019,000
NP-7	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO MT 2500	M2	297,500	$ 9.813,00	$ 2.945.116,000
NP-8		TUBERIA PERFORADA DE DIAMETRO 100 MM	ML	83,000	$ 36.067,00	$ 3.994.945,000

NOTAS:
1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los ítems no previstos serán referidos al origen del contrato (I-0) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MAN-IN-13 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su soluciones y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es responsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijación de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
HEBERT LIZARDO DORADO BORADO
Director de Obra
Contratista
C.C. No. 1.061.721.104 de Popayan
Matrícula Profesional No.: 19252-242BRCAU

Firma
CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Obra
Interventoría
C.C. No. 1.085.272.728 de Pasto N
Matrícula Profesional No.: 19252-292417 CAU

3.3.2 SUCRE 1769 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 02/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____ ACTA No: 1

CONTRATO No. LP-090-2023 (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 54-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROYECTO: PLACA HUELLA VIA LA BALASTRERA - PENA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, CAUCA.

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

CONTRATO No. 1100 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

FECHA DE INICIO: 16 (Día) 5 (Mes) 2023 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

VALOR INICIAL: $ 1.055.446.290

VALOR ACUMULADO: $ -

A.I.U : 30 % A 22 % I 3 % U 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
N.P 1		EXCAVACIÓN VARIAS SIN CLASIFICAR	m2	602,47	$ 36.671,00	$ 22.093.177,00
N.P 2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	260,73	$ 197.522,00	$ 51.499.911,00
N.P 3		TUBERIA DE DRENAJE Diam 100mm	ml	494,6	$ 34.978,00	$ 17.300.119,00
N.P 4		GEOTEXTIL NT 2500	m2	1746,85	$ 10.896,00	$ 19.033.678,00
N.P 5		EXCAVACIÓN DE CLASIFICAR DE PRESTAMOS	m3	1092,91	$ 20.241,00	$ 22.121.591,00
N.P 6		MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	m3	490,04	$ 187.110,00	$ 91.691.384,00
N.P 7		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	123,86	$ 51.879,00	$ 6.425.733,00
N.P 8		PREPARACIÓN, PERFORACIÓNES, DEMOLICIÓN, EXTRACCIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES DE ROCA	und	15	$ 1.374.088,00	$ 20.611.320,00

NOTAS:
1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-35292CAU

Firma
Nombre: ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

3.3.3 BOLIVAR 1750 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 19/06/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

CONTRATO No. **LP 004-003-15.05/058 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2022** (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VÍA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROYECTO: **Convenio 1750 de 2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.**

CONTRATISTA: CONSORCIO PH CHALGUAYACO

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN, RL ROSA MARIA CORDERO CELIS **CONTRATO No.** 1100 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 4 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE INICIO: 3 (Día) 4 (Mes) 2024 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año) **VALOR INICIAL:** $ 1,063,184,929

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Día) N/A (Mes) N/A (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 1,063,184,929

FECHA DE VENCIMIENTO: 3 (Día) 9 (Mes) 2023 (Año)

A.I.U : **30** % **A** **22** % **I** **3** % **U** **5** %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-1	210.1.1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN Y CAN	M3	365.280	$ 24,157.00	$ 8,824,069.000
NP-2	600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	226.410	$ 65,562.00	$ 14,843,892.000
NP-3	211.1	REMOCION DE DERRUMBES	M3	234.160	$ 17,057.00	$ 3,994,067.000
NP-4	610.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	157.110	$ 93,328.00	$ 14,662,762.000
NP-5	630.1.4.1	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU (CAJAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LAS ALCANTARILLAS)	M3	68.260	$ 835,116.00	$ 57,005,018.000
NP-6	673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	40.800	$ 252,123.00	$ 10,286,618.000
NP-7	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT 2500	M2	297.500	$ 9,913.00	$ 2,949,118.000
NP-8		TUBERIA PERFORADA DE DIAMETRO 100 MM	ML	85.000	$ 36,057.00	$ 3,064,845.000

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (I_0) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.

2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.

4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.

5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.

6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
Director de Obra
Contratista
C.C. No. 1.061.721.104 de Popayan
Matrícula Profesional No.: 19202-54289CAU

Firma
CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Obra
Interventoría
C.C. No. 1.085.270.769 de Pasto N
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.

3.3.4 ALMAGUER 1982 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-10-FR-4
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 9/10/2023

UNIDAD EJECUTORIA: CAUCA DIRECCION TERRITORIAL: CAUCA ACTA No: 1

CONTRATO No. 93 DEL 14 DE MARZO 2023
(Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

PAUTE(S) (s): Convenio 1982 de 2021, AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CACUA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL, VIA 12CC05-5 LA HERRADURA EL CHILCO LA HONDA ROSA PAMBA

CONTRATISTA: HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN, RL ROSA MARIA CORDERO CEUS CONTRATO No. 1100 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 26 (Día) 11 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE INICIO: 4 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

FECHA DE SUSPENSION: N/A N/A N/A

FECHA DE REANUDACION: N/A N/A N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

VALOR INICIAL: $ 795.011.198

VALOR ACUMULADO: $ 795.011.198

A.I.U: 30 % A 22 % I 3 % U 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP-1	673.1.1	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	m2	228,380	$ 9.924,00	$ 2.266.443,0
NP-2	673.2	MATERIAL GRANULAR DRENANTE 3"	m3	28,980	$ 193.700,00	$ 5.613.426,0
NP-3	663.1-P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DRENAJE 4"	ml	60,100	$ 48.222,00	$ 2.898.142,0

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es responsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
EDGAR CEVON SOTEL
Director de Obra
Contratista
C.C. No. 1.061.721.104 de Popayan
Matricula Profesional No.: 19202-260428 CAU

Firma
CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SAINT ACRUZ
Director de Obra
Interventoría
C.C. No. 1.085.270.769 de Pasto N
Matricula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Archivo Gestión de INVIAS
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación

3.3.5 INZÁ 1983– CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 25/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

CONTRATO No. 141-2022 (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO DE PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL DE CONCORDANCIA CON EL CONVENIO 1983 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE INZA-CAUCA Y EL INSTITUTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES SAN ANDRES - PISIMBALA - ALTO DE PISIMBALA - TUMBICHUCUE EN EL MUNICIPIO DE INZA

CONTRATISTA: CONSORCIO INZA 2022

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS **CONTRATO No.** 1100 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 7 (Día) 9 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE INICIO: 28 (Día) 4 (Mes) 2023 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 608,231,289

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 608,231,289

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 12 (Mes) 2023 (Año)

A.I.U : **30** % **A** **22** % **I** **3** % **U** **5** %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
NP1		DEMOLICION CAMARAS DE INSPECCION EXISTENTE CONSTRUIDAS EN LADRILLO (INCLUYE RETIRO HASTA 20KM)	UND	5	$ 980,539.00	$ 4,902,695.00

NOTAS:

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (I_0) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JAMES PIAMBA HOYOS
Representante Legal o Director
Contratista
NIT: 901637609-9

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN
Representante Legal o Director
Interventoria
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

3.3.6 SANTANDER DE QUILICHAO 1768– CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE FIJACIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS

CODIGO: MEPI-MN1-IN-10-FR-4
VERSIÓN: 1
PÁGINA:

FECHA: 13/07/2023 (Día - Mes - Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORSAL: CAUCA ACTA No: 1

CONTRATO No. 494-2022 (Indicar número de contrato y año)

OBJETO DEL CONTRATO:
EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

PROYECTO: PLACA HUELLA VIA MADIVA- ALTO PARAISO, SANTANDER DE QUILICHAO, CAUCA

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURAL 2022

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS CONTRATO No. 1100 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 11 (Día) 8 (Mes) 2022 (Año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) 8 (Mes) 2023 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 1 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

VALOR INICIAL: $ 912.367.379

VALOR ACUMULADO: $ -

A.I.U.: 30 % A 20 % I 5 % U 5 %

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
600-13		Excavaciones varias en material común	m	212,12	$ 36.126,00	$ 7.663.047,00
673,2		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	209,04	$ 195.311,00	$ 40.827.132,00
1-P		TUBERIA DE DRENAJE DIAMETRO 100mm	ml	392,8	$ 36.057,00	$ 14.163.190,00
673.1.1-P		GEOTEXTIL NT 2500	m2	1374,8	$ 9.927,00	$ 13.647.640,00

NOTAS:
1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los ítems no previstos serán referidos al origen del contrato (lo) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es responsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijación de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
Representante Legal o Director
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-35292 CAU

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN
Representante Legal o Director
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales de la interventoría en cuanto a revisar y aprobar las condiciones estipuladas para el desarrollo de cada uno de los proyectos, se solicita a los contratistas de obra la entrega de los documentos requeridos para dar inicio a la etapa de construcción.

Durante el periodo del presente informe, se realiza seguimiento a las entregas del contratista. Las cuales se listan a continuación:

3.4.1 MERCADERES 1894 – CAUCA

	MERCADERES - CONVENIO 1894 **CONSORCIO MERCADERES 23 - RL. JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA**	
	Estado	**Observaciones**
Acta de Inicio (Firmada por todas las partes)	OK	El acta de inicio se encuentra firmada por todas las partes.
Prorrogas	OK	Se presentan las siguientes prorrogas en el contrato: *Prorroga N°1 (30 días) desde 01/10/2023 hasta 30/10/2023 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°2 (62 días) desde 31/10/2023 hasta 31/12/2023 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°3 (133dias) desde el 20/01/2024 hasta 31/05/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°4 (30 días) desde el 01/06/2024 hasta 30/06/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°5 (31 días) desde el 01/07/2024 hasta 31/07/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°6 (69 días) desde el 07/10/2024 hasta 15/12/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría.
Pólizas Actualizadas acta de inicio	OK	Se encuentran las pólizas actualizadas con acta de inicio
Pólizas Actualizadas con Prorrogas	OK	El contratista se encuentra con las pólizas actualizadas según la Prorroga N°6 (69 días) desde el 07/10/2024 hasta 15/12/2024

Hojas de vida	OK	EL PERSONAL REQUERIDO ES EL SIGUIENTE: - Un (1) Ingeniero Civil con posgrado en obras civiles - Un (1) Ingeniero civil con posgrado en alta gerencia - Un (1) Ingeniero civil con maestría en mecánica de suelos - Un (1) Ingeniero civil con posgrado en ingeniería de vías terrestres - Un (1) Ingeniero industrial con posgrado en gerencia de la salud ocupacional -Un (1) Ingeniero sanitario y ambiental con maestría en Sistemas Integrados de Gestión de la prevención de riesgos laborales, la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social corporativa. -Un (1) Ingeniero ambiental y sanitario con posgrado en seguridad y salud en el trabajo y Delineante de arquitectura e ingeniería. - Un (1) topógrafo, Técnico profesional en Topografía o Topógrafo. ESTADO DE APROBACIÓN: La interventoría verificó que los perfiles de los trabajadores cumplían con los requisitos establecidos en el anexo técnico. El personal requerido se encuentra aprobado mediante oficio DON-1100-INV-259-2023 del 5 de septiembre de 2023.
Planillas de seguridad social	OK	El contratista envía planillas pagas de seguridad social al día hasta el mes de octubre 2024.
Relación de equipo (Maquinaria) mínimo obligatorio	OK	**MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO** 1. Dos Vehículos tipo volqueta con capacidad de volco de 7m3, no superior a 20 años 2. Una excavadora hidráulica con brazo mínimo de 2.5m y cucharon de 0.5m3 3. Una motoniveladora 4. Un vibrocompactador **MAQUINARIA APROBADA** 1. Dos Vehículos tipo volqueta con capacidad de volco de 7m3, no superior a 20 años 2. Una excavadora hidráulica con brazo mínimo de 2.5m y cucharon de 0.5m3 3. Una motoniveladora 4. Un vibrocompactador La maquinaria cumple con los requisitos del anexo técnico y/o pliego de condiciones y se encuentra aprobada mediante el oficio DON-1100-375-2023 del 17 de noviembre
Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica	OK	El contratista hizo entrega de los análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica los APUS y el desglose del AIU.
Programa de obra y flujo de caja actualizada	OK	El contratista envía el programa de obra y flujo de caja actualizada con la prorroga N°6
Programa de Inversiones	OK	El contratista envía el programa de inversión actualizada con la prorroga N°6

Bitácora	OK	Se encuentra actualizada la bitácora hasta el mes de Octubre del 2024.
Programa de generación de empleo	Sin Enviar	Se solicita al contratista la entrega del programa de generación de empleo mediante oficio DON-1100-INV-392-2023 de 27 de noviembre de 2023, a la fecha no se ha tenido respuesta. *Se solicita al contratista la entrega del programa de generación de empleo mediante oficio DON-1100-INV-775-2024 del 23 de octubre del 2024, a la fecha no se ha tenido respuesta.
Plan de Gestión Social - PGS	OK	El contratista entrega el plan de gestión social, fue revisado y avalado por la interventoría.
Plan Gestión Ambiental - PAGA	OK	*Mediante oficio DON-1100-INV-681-2024, del 19 de junio, se emite concepto favorable a la V6 subsanada del documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-055435
Fuente de materiales, que cumpla con la calidad requerida en la norma de ensayo y especificaciones vigentes	OK	Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 Título minero FVL-161 Pendiente de anexar certificado de registro minero
Escombrera	OK	Coordenadas de los tramos de vía a disponer del material de excavaciones ubicados entre las Veredas La Playa - Despensa. Certificado autorizado por la alcaldía el 23 de agosto del 2023.
Estudios y diseños	OK	Topografía: El contratista entrega la topografía
	OK	**Diseño Geométrico:** El diseño se encuentra revisado y avalado por la interventoría
	OK	**Geotecnia:** El contratista envió los estudios de geotecnia, ya se encuentran revisados y avalados por parte de la interventoría, el contratista acepta los diseños
	OK	**Estructural:** El contratista envió los diseños estructurales, ya se encuentran revisados y avalados por parte de la interventoría, el contratista acepta los diseño**s**
	En subsanación	**Hidrosanitario:** El contratista envió los estudios y diseños hidrosanitarios, se realizaron dos revisiones, se encuentra pendiente el envió de las subsanaciones a la segunda revisión.
Valla	OK	La valla ya se encuentra instalada en la obra
Gestión, permiso y/o licencia y/o trámite para ocupación de cauce	N/A	N/A
Acta de conformación de veedurías	OK	El acta se encuentra en subsanaciones por parte de la personería, se solicito al secretario la remisión de la nueva acta.

3.4.2 SUCRE 1866 – CAUCA

	SUCRE 1 - CONVENIO 1866	
	CONSTRUOBRAS GYA SAS - RL POLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO	
	Estado	**Observaciones**
Acta de Inicio (Firmada por todas las partes)	OK	El acta de inicio se encuentra firmada por todas las partes.
Prorrogas	OK	Se presentan las siguientes prorrogas en el contrato: *Prorroga N°1 (61 días) desde 1/09/2023 hasta 31/10/2023 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°2 (61 días) desde 01/11/2023 hasta 31/12/2023 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°3 (60 días) desde 05/03/2024 hasta 03/05/2024 Avalada y firmada por interventoría y alcaldía municipal. *Prorroga N°4 (28 días) desde 04/05/2024 hasta 31/05/2024 Avalada y firmada por interventoría y alcaldía municipal *Prorroga N°5 (30 días) desde 01/06/2024 hasta 30/06/2024 Avalada y firmada por interventoría y alcaldía municipal *Prorroga N°6 (31 días) desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024 Avalada y firmada por interventoría y alcaldía municipal. *Prorroga N°7 (69 días) desde el 07/10/2024 hasta 15/12/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría.
Pólizas Actualizadas acta de inicio	OK	Se encuentran las pólizas actualizadas con acta de inicio
Pólizas Actualizadas con Prorrogas	OK	El contratista se encuentra con las pólizas actualizadas según la Prorroga N°7 (69 días) desde el 07/10/2024 hasta 15/12/2024
Hojas de vida	OK	**EL PERSONAL REQUERIDO ES EL SIGUIENTE:** -Un (1) Ing. Civil con especialización en vías -Un (1) Ing. Civil con especialización en pavimentos y/o alguna de las ramas de la ingeniería civil -Un (1) Ing. Civil con especialización en Geotecnia y/o en Pavimentos y/o Geotecnia Ambiental -Un (1) técnico constructor o maestro de obra -Un (1) Tecnólogo en topografía **ESTADO DE APROBACIÓN:** Se encuentra aprobado el siguiente personal: -Un (1) Ing. Civil con especialización en vías -Un (1) Ing. Civil con especialización en pavimentos y/o alguna de las ramas de la ingeniería civil -Un (1) Ing. Civil con especialización en Geotecnia y/o en Pavimentos y/o Geotecnia Ambiental -Un (1) técnico constructor o maestro de obra

		-Un (1) Tecnólogo en topografía La interventoría verificó que los perfiles de los trabajadores cumplían con los requisitos establecidos en el anexo técnico. El personal requerido se encuentra aprobado Mediante oficio DON-1100-INV-036-2023 del 19 de enero del 2023
Planillas de seguridad social	Sin enviar	El contratista envía planillas pagas de seguridad social al día hasta el mes de marzo de 2024. En el mes de abril envían afiliaciones para el reinicio de obra del 01 marzo de 2024. Se solicita al contratista el envió de las planillas pagadas desde el mes de marzo hasta octubre del 2024, mediante oficio DON-1100-INV-780-2024 del 18-10-2024.
Relación de equipo (Maquinaria) mínimo obligatorio	OK	**MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO** 1. Retroexcavadora de llantas 2. Una motoniveladora 3. Dos volquetas con capacidad mínima de 7m3 4. Un carrotanque de agua 5. Un vibrocompactador 10ton 6. Cuatro mezcladoras con motor a gasolina **MAQUINARIA APROBADA** -Aprobada con el informe de preacta 2 1. Retroexcavadora de llantas 2. Una motoniveladora 3. Dos volquetas con capacidad mínima de 7m3 4. Un carrotanque de agua (pend SOAT y tecno) 5. Un vibrocompactador 10ton 6. Cuatro mezcladoras con motor a gasolina
Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica	Sin enviar	Se ha solicitado a los municipios en los comité de obra la propuesta económica, la cual a la fecha no ha sido enviada Se solicito mediante DON-1100-INV-278-2023 el 21-09-2023 Se solicito mediante DON-1100-INV-346-2023 el 24-10-2023
Programa de obra y flujo de caja actualizada	OK	El contratista envía el programa de obra y flujo de caja actualizada con la Prorroga 7
Programa de Inversiones	Sin Enviar	El contratista envía el programa de inversiones actualizado con la Prorroga 5 hasta el 30/06/2024, se solito al contratista el envío del programa de inversiones actualizado con la prorroga 7.
Bitácora	OK	Se encuentra actualizada la bitácora hasta el mes de octubre del 2024.
Programa de generación de empleo	OK	Contratista hace entrega del programa de generación de empleo el día 23 de febrero del 2024.
Plan de Gestión Social - PGS	Sin enviar	Se solicita al contratista la entrega del programa de generación de empleo mediante oficio DON-1100-INV-394-2023 de 27 de noviembre de 2023, a la fecha no se ha tenido respuesta

Plan Gestión Ambiental - PAGA	Sin enviar	*Mediante oficio DON-1100-INV-549-2024 del 01 de abril, se envía segundo presunto incumpliendo a la entrega de la documentación del contrato. PAGA *Mediante oficio DON-1100-INV-644-2024 del 27 de mayo del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA *Mediante oficio DON-1100-INV-685-2024 del 24 de junio del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA *Mediante oficio DON-1100-INV-765-2024 del 22 de octubre del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA *Mediante oficio DON-1100-INV-795-2024 del 14 de noviembre del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA
Fuente de materiales, que cumpla con la calidad requerida en la norma de ensayo y especificaciones vigentes	OK	Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 Título minero FVL-161 Pendiente de anexar certificado de registro minero
Escombrera	OK	1. El municipio no cuenta con escombrera 2. Solicitud de un particular para disposición de RCD 3. Autorización por parte del municipio para disponer en los predios de: *Terreno localizado en K0+060 margen derecha, propietario Yilber Villamarin. *Terreno localizado en K0+390 a K0+410 margen derecha, propietario Edward Hernán Hoyos *Terreno localizado en K0+495 margen derecha, propietario Álvaro Chávez Calvache
Estudios y diseños	OK	Topografía: El contratista entrega la topografía, avalada por el especialista en diseño geométrico
	OK	**Diseño Geométrico:** El contratista envía el diseño geométrico, se da revisión y aval por parte de la interventoría, se encuentra a la espera de la aceptación del contratista de estudios
	OK	**Geotecnia:** Se encuentra avalada por la interventoría, a la espera de la aceptación por parte del contratista.
	OK	**Estructural:** Se encuentra avalada por la interventoría.
	OK	**Hidrosanitario:** Se encuentra avalada por la interventoría, a la espera de la aceptación por parte del contratista.
Valla	OK	La valla ya se encuentra instalada en la obra
Gestión, permiso y/o licencia y/o trámite para ocupación de cauce	N/A	N/A
Acta de conformación de veedurías	OK	El acta de conformación de veedurías se encuentra conformada mediante la resolución N° 016 de 2024

3.4.3 SUCRE 1769 – CAUCA

	SUCRE 2 - CONVENIO 1769 **CONSORCIO SUCRE 22 . RL. JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO**	
	Estado	**Observaciones**
Acta de Inicio (Firmada por todas las partes)	OK	El acta de inicio se encuentra firmada por todas las partes.
Prorrogas	OK	Se presentan las siguientes prorrogas en el contrato: *Prorroga N°1 (45 días) desde 17/09/2023 hasta 31/10/2023 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°2 (61 días) desde 01/11/2023 hasta 31/12/2023 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°3 (60 días) desde 25/02/2024 hasta 24/04/2024 Avalada y firmada por interventoría y alcaldía municipal *Prorroga N°4 (30 días) desde 01/06/2024 hasta 30/06/2024 Avalada y firmada por interventoría y alcaldía municipal *Prorroga N°5 (31 días) desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024 Avalada y firmada por interventoría y alcaldía municipal *Prorroga N°6 (69 días) desde el 07/10/2024 hasta 15/12/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría.
Pólizas Actualizadas acta de inicio	OK	Se encuentran las pólizas actualizadas con acta de inicio
Pólizas Actualizadas con Prorrogas	OK	El contratista se encuentra con las pólizas actualizadas según la Prorroga N°6 (69 días) desde el 07/10/2024 hasta 15/12/2024
Hojas de vida	OK	**EL PERSONAL REQUERIDO ES EL SIGUIENTE:** -Un Director de Obra -Un Residente de Obra -Un Profesional SISO **ESTADO DE APROBACIÓN:** Se encuentra aprobado el siguiente personal: -Un Director de Obra -Un Residente de Obra -Un Profesional SISO La interventoría verificó que los perfiles de los trabajadores cumplían con los requisitos establecidos en el anexo técnico. El personal requerido se encuentra aprobado Mediante oficio DON-1100-INV-215-2023 del 3 de agosto del 2023 y Mediante oficio DON-1100-INV-414-2023 del 12 de diciembre del 2023
Planillas de seguridad social	OK	El contratista envía planillas pagas de seguridad social al día hasta el mes de octubre del 2024.
Relación de equipo (Maquinaria)	OK	**MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO**

mínimo obligatorio		1. Una motoniveladora 2. Retroexcavadora 3. Compactador de llanta - rodillo 4. Volquetas de 7m3 **MAQUINARIA APROBADA** 1. Una motoniveladora 2. Retroexcavadora 3. Compactador de llanta - rodillo 4. Volquetas de 7m3 La maquinaria cumple con los requisitos del anexo técnico y/o pliego de condiciones y se encuentra aprobada mediante el oficio DON-1100-INV-430-2023, del 27 de diciembre.
Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica	Sin enviar	El contratista envía los análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica, sin embargo, se realizó un modificatorio 1 donde se reajusta la propuesta, se solicita al municipio los nuevos APU´s. Se solicito mediante DON-1100-INV-279-2023 el 21-09-2023 Se solicito mediante DON-1100-INV-347-2023 el 24-10-2023
Programa de obra y flujo de caja actualizada	OK	El contratista envía el programa de obra y flujo de caja actualizada con la Prorroga N°6
Programa de Inversiones	OK	El contratista envía el programa de inversiones actualizado con la Prorroga N°6
Bitácora	Sin Enviar	Se encuentra actualizada la bitácora hasta el mes de diciembre, el contrato estuvo suspendido desde el 21/12/2023 hasta el 25/02/2024, se solicita al contratista enviar la bitácora de los meses de marzo, abril, junio, julio y octubre.
Programa de generación de empleo	OK	Contratista hace entrega del programa de generación de empleo el día 23 de febrero del 2024.
Plan de Gestión Social - PGS	Sin Enviar	Se solicita al contratista la entrega del programa de generación de empleo mediante oficio DON-1100-INV-395-2023 de 27 de noviembre de 2023, a la fecha no se ha tenido respuesta
Plan Gestión Ambiental - PAGA	OK	*Mediante oficio DON-1100-INV-550-2024 del 01 de abril, se envía tercer presunto incumpliendo a la entrega de la documentación del contrato. PAGA *Mediante oficio DON-1100-INV-661-2024 del 05 de junio del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA. *Mediante oficio DON-1100-INV-686-2024 del 24 de junio del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA *Mediante oficio DON-1100-INV-703-2024 del 18 de julio, se emite concepto favorable al documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y

		concepto - 2024E-VUVRAZ-065923
Fuente de materiales, que cumpla con la calidad requerida en la norma de ensayo y especificaciones vigentes	OK	Se enviaron con el PAGA pero no se han aprobado con oficio Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 - ING DE VIAS Título minero FVL-161 Pendiente de anexar certificado de registro minero
Escombrera	OK	Predio Álvaro Chávez Calvache, vereda peña blanca. APROBADO CON EL ACTA PARCIAL 1
Estudios y diseños	OK	Topografía: El contratista entrega la topografía, avalada por el especialista en diseño geométrico
	OK	**Diseño Geométrico:** El contratista envía el diseño geométrico, se da revisión y aval por parte de la interventoría, cuenta con aceptación del contratista a los estudios
	OK	**Geotecnia:** Se encuentra avalada por la interventoría, a la espera de la aceptación por parte del contratista.
	OK	**Estructural:** Se encuentra avalada por la interventoría.
	OK	**Hidrosanitario:** El contratista envía el diseño hidráulico, se da revisión y aval por parte de la interventoría, cuenta con aceptación del contratista a los estudios
Valla	OK	La valla ya se encuentra instalada en la obra
Gestión, permiso y/o licencia y/o trámite para ocupación de cauce	N/A	N/A
Acta de conformación de veedurías	OK	El acta de conformación de veedurías se encuentra conformada mediante la resolución N° 033 de 2023

3.4.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

	BOLIVAR 1 - CONVENIO 1867	
	CONSORCIO ÓNIX CCM JHANER SEGOVIA QUINTERO	
	Estado	**Observaciones**
Acta de Inicio (Firmada por todas las partes)	OK	El acta de inicio se encuentra firmada por todas las partes.
Prorrogas	Sin enviar	Se presentan las siguientes prorrogas en el contrato: *Prorroga N°1 (36 días) desde 26/09/2023 hasta 31/10/2023 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°2 (61 días) desde 01/11/2023 hasta 31/12/2023 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°3 (84 días) desde 09/03/2024 hasta 31/05/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría.

		*Prorroga N°4 (30 días) desde 01/06/2024 hasta 30/06/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°5 (31 días) desde 01/07/2024 hasta 31/07/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°6 (69 días) desde el 07/10/2024 hasta 15/12/2024 A la espera de que el municipio envíe la prorroga a la interventoría.
Pólizas Actualizadas acta de inicio	OK	Se encuentran las pólizas actualizadas con acta de inicio
Pólizas Actualizadas con Prorrogas	Sin enviar	El contratista se encuentra con las pólizas actualizadas según la prorroga N°4 hasta el 31/07/2024 Pendiente enviar las pólizas actualizadas con la Prorroga N°6
Hojas de vida	OK	**EL PERSONAL REQUERIDO ES EL SIGUIENTE:** - Un Director de Obra - Un Residente de Obra **ESTADO DE APROBACIÓN:** Se encuentra aprobado el siguiente personal: - Un Director de Obra - Un Residente de Obra La interventoría verificó que los perfiles de los trabajadores cumplían con los requisitos establecidos en el anexo técnico. El personal requerido se encuentra aprobado Mediante oficio DON-1100-INV-073-2023 del 16 de marzo del 2023 y Mediante oficio DON-1100-INV-081-2023 del 29 de marzo del 2023
Planillas de seguridad social	Sin enviar	El contratista envía planillas pagas de seguridad social al día hasta el mes de agosto del 2023. Se solicita enviar los comprobantes de pago para verificación y autenticidad de las mismas. La interventoría ha solicitado mediante oficio DON-1100-INV-760-2024 del 07-10-2024, que se envíen las planillas pagas desde el mes de septiembre de 2023 hasta octubre de 2024 de manera escrita y en los comités de obra.
Relación de equipo (Maquinaria) mínimo obligatorio	OK	**MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO** 1. Mezclador de trompo con capacidad mínima de 1 saco 2. Retro cargador 3. Moto niveladora 4. Vibrocompactador 5. Volquetas 3 unidades capacidad mínima de volco 6m3 **MAQUINARIA APROBADA** 1. Mezclador de trompo con capacidad mínima de 1 saco 2. Retro cargador

		3. Moto niveladora 4. Vibrocompactador 5. Volquetas 1 capacidad mínima de volco 6m3 (pendiente anexar SOAT y tecnicomecánica vigente) La maquinaria cumple con los requisitos del anexo técnico y/o pliego de condiciones y se encuentra aprobada mediante el oficio DON-1100-INV-276-2023 del 21 de septiembre de 2023, a la fecha no se adjunta los documentos faltantes de las volquetas (SOAT y tecnicomecánica)
Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica	OK	El contratista hizo entrega de los análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica los APUS y el desglose del AIU.
Programa de obra y flujo de caja actualizada	Sin Enviar	El contratista envía el programa de obra y flujo de caja actualizada con la Prorroga N°5 hasta 31/07/2024, se solicita el envio del programa de obra y flujo de caja actualizada con la Prorroga N°7.
Programa de Inversiones	Sin Enviar	El contratista envía el programa de inversiones actualizada con la Prorroga N°5 hasta 31/07/2024, se solicita el envio del programa de inversiones actualizada con la Prorroga N°7.
Bitácora	Sin Enviar	Se encuentra actualizada la bitácora hasta el mes de junio del 2024, se solicita se envie la bitácora del mes de julio.
Programa de generación de empleo	ok	Mediante informe de acta N° 2 el contratista realiza entrega del programa de generación de empleo
Plan de Gestión Social - PGS	Sin enviar	Se solicita al contratista la entrega del programa de generación de empleo mediante informe de incumplimiento 25 de noviembre de 2023, a la fecha no se ha tenido respuesta
Plan Gestión Ambiental - PAGA	Sin enviar	*Mediante oficio DON-1100-INV-616-2024 del 10 de mayo, se reitera la entrega del documento PAGA *Mediante oficio DON-1100-INV-652-2024 del 31 de mayo, se reitera la entrega del documento PAGA. *Mediante oficio DON-1100-INV-664-2024 del 07 de junio, se reitera la entrega del documento PAGA. *Mediante oficio DON-1100-INV-687-2024 del 24 de junio, se reitera la entrega del documento PAGA. *Mediante oficio DON-1100-INV-786-2024 del 05 de Noviembre, se reitera la entrega del documento PAGA *Mediante oficio DON-1100-INV-796-2024 del 14 de Noviembre, se reitera la entrega del documento PAGA
Fuente de materiales, que cumpla con la calidad requerida en la norma de ensayo y	OK	Resolución 601 de CORPONARIÑO, donde se concede la licencia ambiental. A asociación de arenas del mayo "ASOMAYO"

especificaciones vigentes		Registro minero ARE-TB8-10401 , con 30 años de vigencia.
Escombrera	Sin enviar	Considerando que el municipio ha certificado la inexistencia de una escombrera, hasta la fecha, el municipio no ha definido la asignación del uso del suelo para la disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). Se envía informe de incumpliendo a la documentación contractual, el día 25 de noviembre de 2023.
Estudios y diseños	OK	Topografía: El contratista entrega la topografía correspondiente al tramo de placa huella, falta la entrega de la topografía de los puntos de los Box Culverts.
	Sin enviar	**Diseño Geométrico:** El contratista hace entrega de los diseños geométricos, se realiza la primera revisión, segunda revisión y la tercera revisión por parte de la interventoría, se encuentra a la espera de que el contratista envié las subsanaciones.
	OK	**Geotecnia:** Se encuentra en la tercera revisión por parte del especialista de la interventoría los estudios correspondientes al tramo de placa huella, sin embargo mediante correo electrónico el día 18 de abril de 2023 se remite oficio 60-23-GDING-V180 con recomendaciones al contratista y se recibe respuesta por parte del contratista mediante oficio C.O. -017 del 30 de abril de 2023, se está a la espera de la aceptación de los estudios y diseños por parte del contratista y a la espera de los estudios de suelos de los Box culverts para su revisión, para emitir el aval final de parte de la interventoría
	Sin enviar	**Estructural:** se solicita la entrega de los ajustes a los diseños estructurales de los Box Culverts los cuales no han sido enviados a la interventoría
	Sin enviar	**Hidrosanitario:** mediante el Oficio C.O. -012 del 04 de marzo el contratista envía diseño hidráulico únicamente para el tramo de placa huella, se solicita la entrega del estudio hidrológico e hidráulico del proyecto de sitios puntuales en los cuales se estime el caudal de cada punto. A la fecha no han sido enviados a la interventoría los ajustes los ajustes al estudio hidrológico de los Box Culverts en cada punto crítico para su revisión pertinente.
Valla	OK	La valla ya se encuentra instalada en la obra
Gestión, permiso y/o licencia y/o trámite para ocupación de cauce	Sin enviar	En reunión realizada el 7 de noviembre en las instalaciones de INVIAS Territorial Cauca, el municipio representado por el secretario de infraestructura se compromete a ajustar los diseños tipo para la construcción de los box culvert y entregarlos al contratista y poder así solicitar el permiso.
Acta de conformación de veedurías	OK	El acta de conformación de veedurías se encuentra conformada mediante la resolución N° 010 de 2023

3.4.5 PUERTO TEJADA 2496– CAUCA

PUERTO TEJADA - CONVENIO 2496

	CONSORCIO INFRAVIAL 2023 - PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA	
	Estado	**Observaciones**
Acta de Inicio (Firmada por todas las partes)	OK	El acta de inicio se encuentra firmada por todas las partes.
Prorrogas	Sin enviar	Se presentan las siguientes prorrogas en el contrato: *Prorroga N°1 (56 días) desde 05/04/2024 hasta 30/05/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°2 (21 días) desde 10/06/2024 hasta 30/06/2024 El municipio envía la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°2 (31 días) desde 1/07/2024 hasta 31/07/2024 A la espera de que el municipio envíe la prorroga a la interventoría. *Prorroga N°3 (69 días) desde el 07/10/2024 hasta 15/12/2024 A la espera de que el municipio envíe la prorroga a la interventoría.
Pólizas Actualizadas acta de inicio	OK	Se encuentran las pólizas actualizadas con acta de inicio
Pólizas Actualizadas con Prorrogas	Sin enviar	El contratista se encuentra con las pólizas actualizadas según la Prorroga N°1 (56 días) desde 05/04/2024 hasta 30/05/2024
Hojas de vida	OK	**EL PERSONAL REQUERIDO ES EL SIGUIENTE:** -Un (1) Director de obra -Un (1) Residente de obra -Un (1) profesional SISO **ESTADO DE APROBACIÓN:** Mediante oficio DON-1100-INV-306-2023 del 3 de octubre del 2023, Se presentan observaciones a las hojas de vida del personal, se encuentra a la espera de las subsanaciones correspondientes. Mediante oficio DON-1100-INV-306-2023 del 3 de octubre 2023 se realizan observaciones a las hojas de vida del personal faltante. La interventoría verificó que los perfiles de los trabajadores cumplían con los requisitos establecidos en el anexo técnico. El personal requerido se encuentra aprobado Mediante oficio DON-1100-INV-524-2023 del 12 de marzo 2024 se encuentra aprobado: -Un (1) Director de obra -Un (1) Residente de obra -Un (1) profesional SISO
Planillas de seguridad social	Sin enviar	El contratista envía planillas pagas de seguridad social del personal de obra, hasta el mes de junio 2024. Se solicita al contratista el envio de las planillas pagadas del mes de julio y octubre del 2024.
Relación de equipo (Maquinaria) mínimo obligatorio	En ajustes	**MAQUINARIA MÍNIMA DEL PROYECTO** 1. Retroexcavadora sobre llantas 1 motor 62hp

		2. Motoniveladora potencia 215 hp cuchilla se 4,27mts, peso 18 TN 3. Vibrocompactador 1 potencia 99hp peso 8 TN 4. Compactador manual saltarín) peso de operación 53KG Terminadora finisher 1 potencia volante 174 hp 5. Carrotanque de agua 1000 GLN **MAQUINARIA APROBADA** 1. Retroexcavadora sobre llantas 1 motor 62hp 2. Motoniveladora potencia 215 hp cuchilla se 4,27mts, peso 18 TN 3. Vibrocompactador 1 potencia 99hp peso 8 TN *Mediante oficio DON-1100-INV-303-2023 del 2 de octubre se aprueba la maquinaria antes mencionada y se realizan observaciones a la maquinaria faltante. *Mediante comunicado DON-1100-INV-477-2024 del 10 de febrero, se solicita la subsanación de las observaciones emitidas en el oficio 303. *Mediante comunicado DON-1100-INV-491-2024 del 27 de febrero, se realiza la segunda solicitud de documentos contractuales (maquinaria) *Mediante comunicado DON-1100-INV-505-2024 del 05 de marzo, se realiza la tercera solicitud de documentos contractuales (PAGA) *Mediante comunicado DON-1100-INV-646-2024 del 28 de mayo, se reitera la entrega del equipo minimo requerido
Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica	OK	El contratista hizo entrega de los análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica los APUS y el desglose del AIU.
Programa de obra y flujo de caja actualizada	Sin Enviar	El contratista envía el programa de obra y flujo de caja actualizada con la Prorroga N°1 hasta 30/05/2024
Programa de Inversiones	Sin Enviar	El contratista envía el programa de inversiones actualizado con la Prorroga N°1 hasta 30/05/2024
Bitácora	Sin Enviar	Se solicita al contratista entregar la bitácora de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y octubre de 2024.
Programa de generación de empleo	Sin Enviar	Se solicita al contratista la entrega del programa de generación de empleo mediante oficio DON-1100-INV-303-2023 de 2 de octubre de 2023, a la fecha no se ha tenido respuesta. Mediante oficio DON-1100-INV-689-2024 de 4 de junio de 2024 se solicitó nuevamente. Se solicita al contratista la entrega del programa de generación de empleo mediante oficio DON-1100-INV-774-2024 del 23 de octubre del 2024, a la fecha no se ha tenido respuesta.
Plan de Gestión Social - PGS	Sin Enviar	Se solicita al contratista la entrega del plan de gestión social mediante oficio DON-1100-INV-303-2023 de 2 de octubre de 2023, a la fecha no se ha tenido respuesta. Mediante oficio DON-1100-INV-689-2024 de 4 de junio de 2024 se solicitó nuevamente.

Plan Gestión Ambiental - PAGA	Sin enviar	*Mediante comunicado DON-1100-INV-608-2024 del 03 de mayo, se emiten observaciones a la v3 del documento PAGA *Mediante comunicado DON-1100-INV-646-2024 del 28 de mayo, se reitera la entrega del PAGA subsanando las observaciones del oficio DON-1100-INV-608-2024 *Mediante comunicado DON-1100-INV-660-2024 del 04 de junio, se emiten observaciones a la v4 del documento PAGA. *Mediante comunicado DON-1100-INV-689-2024 del 24 de junio, se reitera la entrega del documento PAGA. *Mediante comunicado DON-1100-INV-797-2024 del 14 noviembre, se reitera la entrega del documento PAGA.
Fuente de materiales, que cumpla con la calidad requerida en la norma de ensayo y especificaciones vigentes	OK	Licencia ambiental Resolución 0793 del 18 de dic del 2007. Municipio de caloto, vereda santa rita. Titulo minero EAT - 141. no se ha aprobado, lo enviaron en el informe de acta parcial 1
Escombrera	Sin Enviar	Dentro de la documentación enviada el 29 de septiembre, en el documento PAGA, no se anexa documentación de la escombrera. En las versiones 2,3 y 4 del PAGA, tampoco se ha definido el sitio de disposición final de los RCD
Estudios y diseños	OK	**Topografía:** Se solicita al contratista el envió de la topografía El contratista remite el 05-10-2023 se remite al especialista de interventoría para revisión Interventoría remite observaciones el 17-10-2023 EL 18-10-2023 se remite aprobación de los diseños
	OK	**Diseño Geométrico:** Se solicita al contratista el envió de la topografía El contratista remite el 05-10-2023 se remite al especialista de interventoría para revisión Interventoría remite observaciones el 17-10-2023 EL 18-10-2023 se remite aprobación de los diseños
	OK	**Geotecnia:** el contratista envía el estudio de geotecnia, se encuentra en revisión por parte de la interventoría. Se emitieron observaciones el día 20-09-2023 sobre el estudio de suelos El contratista remite el 05-10-2023 se remite al especialista de interventoría para revisión EL 24-10-2023 se remite aprobación de los diseños
	OK	**Estructural:** Se solicita al contratista el envió de la topografía El contratista remite el 05-10-2023 se remite al especialista de interventoría para revisión EL 24-10-2023 se remite aprobación de los diseños

	NA	**Hidrosanitario:** NO SE CNSTRUIRAN ALCANTARILLAS
Valla	OK	La valla ya se encuentra instalada en la obra
Gestión, permiso y/o licencia y/o trámite para ocupación de cauce	N/A	
Acta de conformación de veedurías	OK	Se emitió diseño de valla informativa Aprobada por comunicaciones de Invías, Posteriormente se envió al contratista para su instalación en obra, El contratista instaló valla informativa.

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA


4.1 INFORME SEMANAL

Se presentan informes semanales del periodo 1 al 31 de octubre de 2024 de los contratos de obra de los convenios en formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 que se encuentran en ejecución:

- Informe Semanal 86 - 20241001 - 20241003
- Informe Semanal 87 - 20241004 - 20241010
- Informe Semanal 88 – 20241011 - 20241017
- Informe Semanal 89 – 20241018 - 20241024
- Informe Semanal 90 – 20241025 - 20241031

4.1.1 MERCADERES 1894 – CAUCA

- Informe Semanal 86 - 20241001 – 20241003

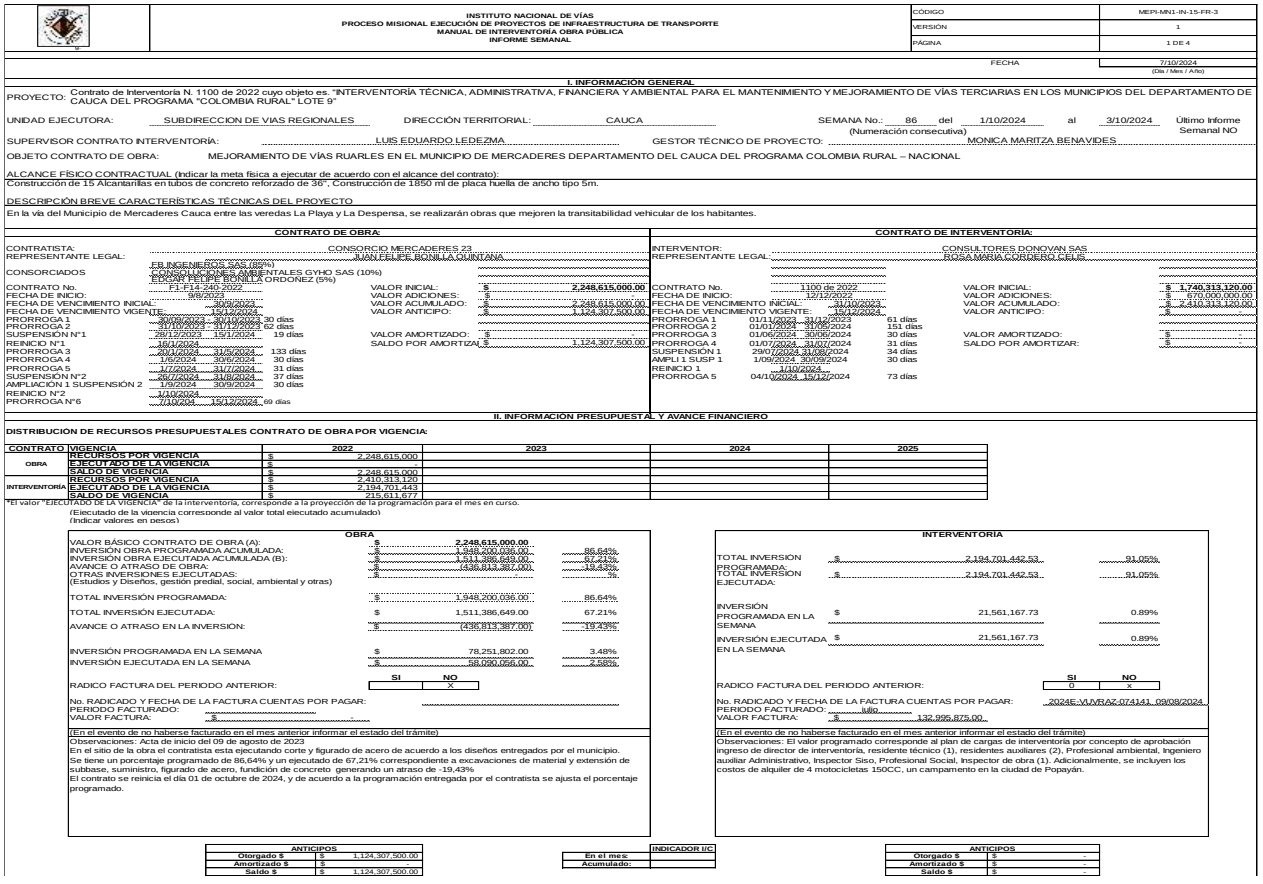

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | VERSIÓN: 1 | PÁGINA: 1 DE 4

FECHA: 7/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 86 del 1/10/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADERES 23
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONSORCIADOS: FB INGENIEROS SAS (60%); CONSTRUCCIONES AMBIENTALES GYHO SAS (10%); EDGAR HERNANDO ORDOÑEZ (5%)
CONTRATO No.: F1-F14-245-2022
FECHA DE INICIO: 9/8/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
VALOR INICIAL: $ 2,248,615,000.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 2,248,615,000.00
VALOR ANTICIPO: $ 1,124,307,500.00
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR $ 1,124,307,500.00

PRORROGA 1	30/12/2023	31/12/2023	30 días
PRORROGA 2	31/10/2023	31/12/2023	62 días
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023	15/1/2024	19 días
REINICIO N°1	16/1/2024		
PRORROGA 3	20/1/2024	31/5/2024	133 días
PRORROGA 4	1/6/2024	30/6/2024	30 días
PRORROGA 5	1/7/2024	31/7/2024	31 días
SUSPENSIÓN N°2	26/7/2024	31/8/2024	37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/8/2024	30/9/2024	30 días
REINICIO N°2	1/10/2024		
PRORROGA N°6	7/10/24	15/12/2024	60 días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.: 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES: $ 570,000,000.00
VALOR ACUMULADO: $ 2,310,313,120.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024	30/09/2024	30 días
REINICIO 1	1/10/2024		
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,194,701,443			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,611,677			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,248,615,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,949,200,036.00	86.64%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,511,386,649.00	67.21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (436,813,387.00)	-19.43%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,949,200,036.00	86.64%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,511,386,649.00	67.21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (436,813,387.00)	-19.43%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 78,251,802.00	3.48%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 58,090,056.00	2.58%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Acta de inicio del 09 de agosto de 2023
En el sitio de la obra el contratista esta ejecutando corte y figurado de acero de acuerdo a los diseños entregados por el municipio.
Se tiene un porcentaje programado de 86,64% y un ejecutado de 67,21% correspondiente a excavaciones de material y extensión de subbase, suministro, figurado de acero, fundición de concreto generando un atraso de -19,43%
El contrato se reinicia el día 01 de octubre de 2024, y de acuerdo a la programación entregada por el contratista se ajusta el porcentaje programado.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 2,194,701,442.53	91.05%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 2,194,701,442.53	91.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VLVRAZ-074141 09/09/2024
PERIODO FACTURADO: ago
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoria por concepto de aprobación ingreso de director de interventoria, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,124,307,500.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1,124,307,500.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 86.64%
Meta Física Ejecutada % 67.21%

Avance o Atraso Físico % -19.43%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023
* Alcantarillas	UND	15	15	
* Placa Huella	ML	1850	1850	
* Muros de contencion	ML	66	66	
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Prog	15			15	100.0%
Ejec	0			0	0.00%
Prog	1850			1850	100.0%
Ejec	990			990	53.51%
Prog	66			66	100.0%
Ejec	40			40	60.61%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidráulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa huella.

Ejecutado: se encuentra un aproximado de 1850 metros de sub base instalada y compactada, a la espera de los resultados de las densidades tomadas por el laboratorio,
Se tiene 990 metros lineales completos con bordillo y cunetas y 20 a falta de cunetas y bordillos

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:

Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, vereda Palo Verde, municipios de Patía y Mercaderes	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: *Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 - Título minero FVL-161

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO: Mediante oficio DON-1100-INV-681-2024, del 19 de junio, se emite concepto favorable a la V6 subsanada del documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-055435.
De manera extemporánea, según lo establecido contractualmente y superando el 15% del total del tiempo de ejecución del contrato,

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	20	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 26

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-708-2024 solicitando información social pendiente a la fecha e informes de seguimiento PAGA

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*La comunidad pese a que se ha socializado el tema con los dueños y vecinos del sitio de construcción del muro se opusieron y por tal razón se suspenden actividades en el sitio de la obra, para volver a realizar una socialización con la comunidad presente en la zona.
*Se empieza con la excavación para la construcción de los muros en el margen izquierdo aproximadamente en el K0+100 hasta el K0+150.
* Se realiza la fundición del vástago del muro de altura de 3m.
*En campo se desarrollan actividades de corte, figurado de acero para las riostras, se adelanta la excavación de las mismas, Instalación de acero para placa huella, de igual manera instalan formaleta para la fundición de concreto reforzado de las huellas y también para la fundición de concreto ciclópeo. Se cuenta con aproximadamente 900 metros de placa huella fundida, con cunetas, bordillos tal como aparece en el diseño geométrico entregado por el municipio.
*Se realizan actividades de la abscisa K1+000 a K1+050


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
Se realizan actividades de la abscisa K1+050 al K1+000


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Seguir con la construccion de la placa huella en todos sus componentes, acero de refuerzo, concreto ciclopeo, concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

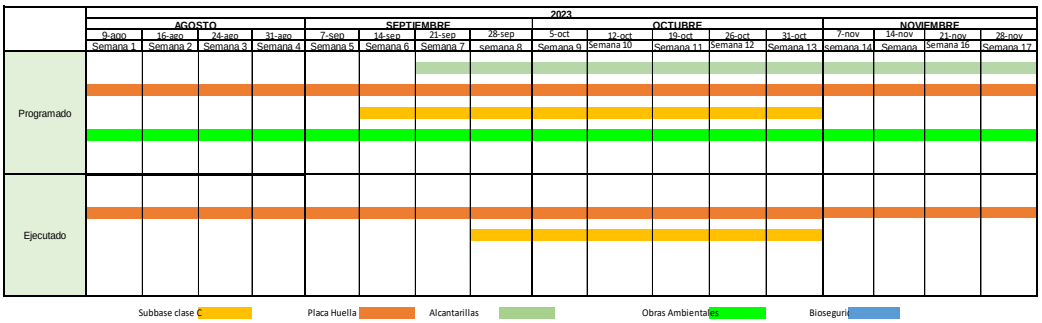


ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

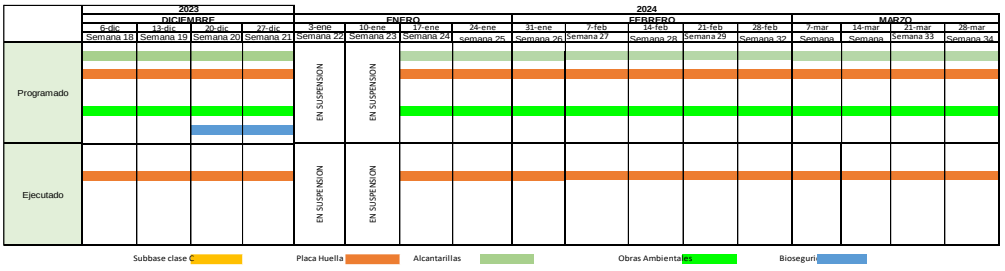

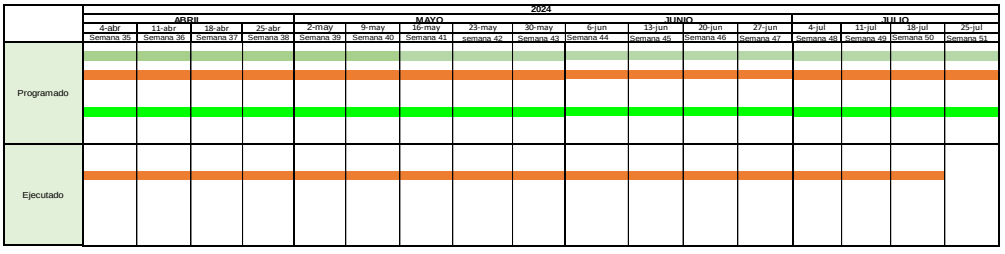

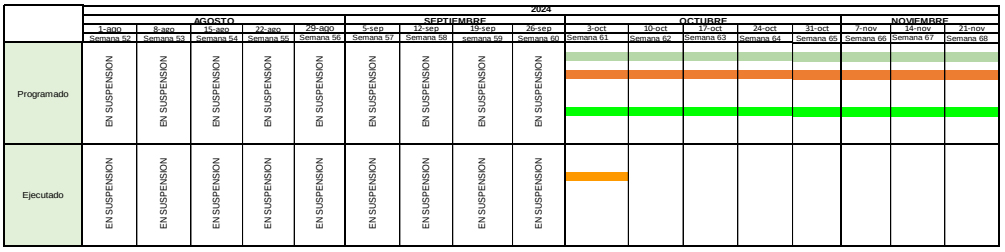

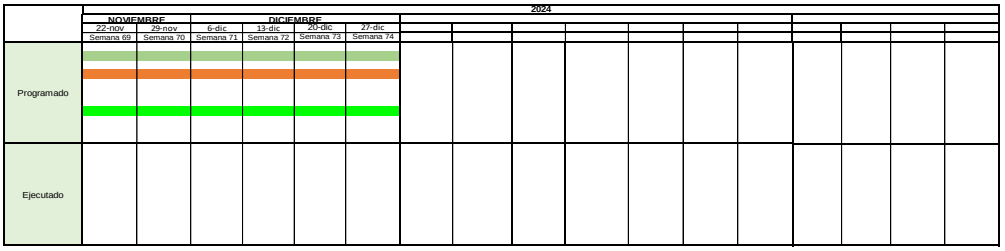

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



FUNDICION DE HUELLAS



RECALCE DE ALCANTARILLA EXISTENTE



FUNDICION DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*El contrato de obra se encuentra suspendido, se adelantaron comités presenciales en la territorial INVIAS Cauca para dar celeridad al reinicio del contrato de obra.
*El contrato se reinició el 16 de enero, se solicita al contratista el flujo de caja actualizado con la suspensión y prorroga,
*En inspección se recomienda al contratista realizar cortes al bordillo, ya que por las temperaturas altas en la zona estos presentas grietas.
*Se hace control de la mezcla que están preparando en obra, revisando que la dosificación del concreto se encuentre acorde para la resistencia requerida.
*Mediante comunicación DON-1100-INV-479-2024 se informa a la entidad ALCALDIA DE MERCADERES, el presunto incumplimiento del contratista al plazo contractual
*Se realiza requerimiento al contratista para que entregue la programación actualizada a la prorroga 3.
*De acuerdo a comunicaciones DON-1100-INV-493-2024 se realiza la reiteración del presunto incumplimiento a la entrega de documentación contractual.
*En comité de seguimiento realizado en la territorial cauca del INVIAS el contratista se compromete a realizar un plan de contingencia para mitigar el impacto de la sequia en el sector de la obra, pues se encuentra realizando fundición, actividad que depende en su totalidad de la disposición del agua.
*Se llevaron las muestras de concreto tomada en sitio para su posterior ensayo, se esta a la espera de los resultados por parte del laboratorio.
*Se revisan ordenes de giro 12, 13, 14 Y 15 para la consignación por parte de la fiducia.
*Solo se avala la orden 13, que cumplía con los requerimientos,
*En inspección realizada por parte de interventoría, se evidencia la necesidad de construir un muro de contención en el K0+100 al k0+150 aproximadamente en el margen izquierdo de la vía, pues en el lado derecho en el sentido del abscisado de la vía se realizaron apiques donde la altura donde se encontró tierra firma fue aproximadamente 7 metros de altura, lo cual complica y encarece una solución de contención para el tramo, por eso se punto por realizarlo al lado izquierdo que se cuenta con una altura aproximadamente de 3metros en la parte mas alta y de 1.5 en la parte mas baja, por lo cual se solicita al contratista que proponga el diseño del muro de acuerdo con la cartilla de Colombia rural y se ajuste a lo que tenemos en el sitio de la obra.
*La interventoría realiza recomendación al contratista nuevamente la entrega de un plan de acción que permita cumplir con las exigencias del objeto contractual en el plazo previsto.
*Se reciben por parte del contratista unos PAU no previstos, los cuales se empiezan a realizar su respectiva revisión para su posterior aprobación y ejecución.
*Se realizan observaciones a los APU no previstos entregados por el contratista.
*Se programa comité con la secretaria del municipio para socializar el tema de los muros de contención.
*En comité se solicita al contratista un plan de contingencia que permita optimizar recursos y disminuir tiempos que permitan acabar con la construcción de la placa huella en el menor tiempo posible y dentro de los plazos exigidos.
*El día 30 de mayo mediante oficio DON-1100-INV-651-2024 se avala la prorroga al contrato en referencia hasta el día 30 de junio de 2024.
*Se suspende el contrato el dia 26 de julio
*Mediante el oficio DON-1100-INV-744-2024 se da el concepto favorable a la solicitud de reinicio por parte del contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ELABORO	APROBÓ
ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

- Informe Semanal 87 - 20241004 – 20241010

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 87 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADERES 23
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONSORCIADOS: FB INGENIEROS SAS (85%); CONSOLUCIONES AMBIENTALES GYHO SAS (10%); EDGAR FELIPE BONILLA ORDOÑEZ (5%)
CONTRATO No. FI-F14-240-2022
FECHA DE INICIO: 9/8/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
PRORROGA 1 30/09/2023 - 30/10/2023 30 días
PRORROGA 2 31/10/2023 - 31/12/2023 62 días
SUSPENSIÓN N°1 28/12/2023 15/1/2024 19 días
REINICIO N°1 16/1/2024
PRORROGA 3 20/1/2024 31/5/2024 133 días
PRORROGA 4 1/6/2024 30/6/2024 30 días
PRORROGA 5 1/7/2024 31/7/2024 31 días
SUSPENSIÓN N°2 26/7/2024 31/8/2024 37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2 1/9/2024 30/9/2024 30 días
REINICIO N°2 1/10/2024
PRORROGA N°6 7/10/204 15/12/2024 69 días

VALOR INICIAL:	$ 2,248,615,000.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 2,248,615,000.00
VALOR ANTICIPO:	$ 1,124,307,500.00
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR	$ 1,124,307,500.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No. 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
PRORROGA 1 01/11/2023 31/12/2023 61 días
PRORROGA 2 01/01/2024 31/05/2024 151 días
PRORROGA 3 01/06/2024 30/06/2024 30 días
PRORROGA 4 01/07/2024 31/07/2024 31 días
SUSPENSIÓN 1 29/07/2024 31/08/2024 34 días
AMPLI 1 SUSP 1 1/09/2024 30/09/2024 30 días
REINICIO 1 1/10/2024
PRORROGA 5 04/10/2024 15/12/2024 73 días

VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ 670,000,000.00
VALOR ACUMULADO:	$ 2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,216,262,610			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194,050,510			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,248,615,000.00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,955,620,465.50	86.97%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,598,683,904.00	71.10%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (356,936,561.50)	-15.87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 1,955,620,465.50	86.97%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,598,683,904.00	71.10%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (356,936,561.50)	-15.87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 7,195,568.00	0.32%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 87,297,255.00	3.88%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Acta de inicio del 09 de agosto de 2023
En el sitio de la obra el contratista esta ejecutando corte y figurado de acero de acuerdo a los diseños entregados por el municipio.
Se tiene un porcentaje programado de 86,97% y un ejecutado de 71,10% correspondiente a excavaciones de material y extensión de subbase, suministro, figurado de acero, fundición de concreto generando un atraso de -15,87%
El contrato se reinicia el día 01 de octubre de 2024, y de acuerdo a la programación entregada por el contratista se ajusta el porcentaje programado.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,216,262,610.25	91.95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,216,262,610.25	91.95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,124,307,500.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1,124,307,500.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 86.97%
Meta Física Ejecutada % 71.10%
Avance o Atraso Físico % -15.87%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Alcantarillas	UND	15	15		Prog	15			15	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
* Placa Huella	ML	1850	1850		Prog	1850			1850	100.0%
					Ejec	1065			1065	57.57%
* Muros de contencion	ML	66	66		Prog	66			66	100.0%
					Ejec	40			40	60.61%
*										

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidráulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa huella.
Ejecutado: se encuentra un aproximado de 1850 metros de sub base instalada y compactada, a la espera de los resultados de las densidades tomadas por el laboratorio,
Se tiene 1065 metros lineales completos con bordillo y cunetas y 20 a falta de cunetas y bordillos

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galindez, vereda Palo Verde, municipios de Patia y Mercaderes	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: *Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 - Titulo minero FVL-161

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **APROBADO:** Mediante oficio DON-1100-INV-681-2024, del 19 de junio, se emite concepto favorable a la V6 subsanada del documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-055435.
De manera extemporánea, según lo establecido contractualmente y superando el 15% del total del tiempo de ejecución del contrato,

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-708-2024 solicitando información social pendiente a la fecha e informes de seguimiento PAGA

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*La comunidad pese a que se ha socializado el tema con los dueños y vecinos del sitio de construcción del muro se opusieron y por tal razón se suspenden actividades en el sitio de la obra, para volver a realizar una socialización con la comunidad presente en la zona.
*Se empieza con la excavación para la construcción de los muros en el margen izquierdo aproximadamente en el K0+100 hasta el K0+150.
* Se realiza la fundición del vástago del muro de altura de 3m.
*En campo se desarrollan actividades de corte, figurado de acero para las riostras, se adelanta la excavación de las mismas, Instalación de acero para placa huella, de igual manera instalan formaleta para la fundición de concreto reforzado de las huellas y también para la fundición de concreto ciclópeo. Se cuenta con aproximadamente 900 metros de placa huella fundida, con cunetas, bordillos tal como aparece en el diseño geométrico entregado por el municipio.
*Se realizan actividades de la abscisa K1+000 a K1+050


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
Se realizan actividades de la abscisa K1+000 al K1+065

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Seguir con la construccion de la placa huella en todos sus componentes, acero de refuerzo, concreto ciclopeo, concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

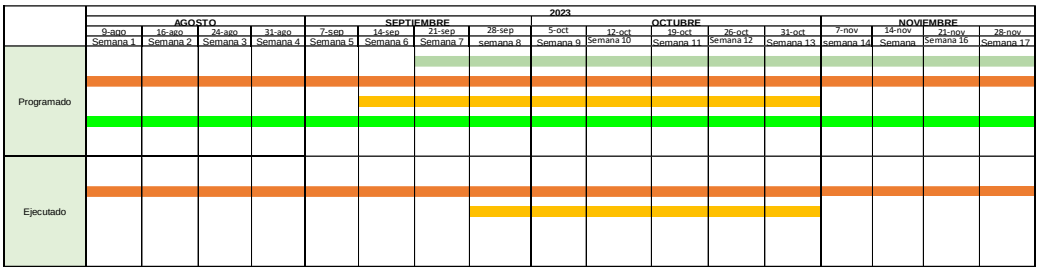


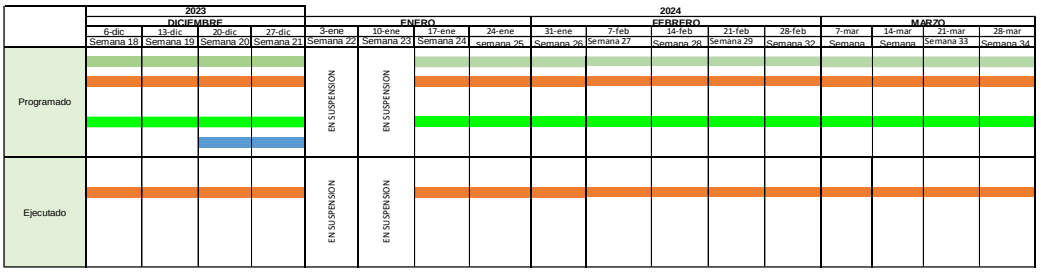




ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

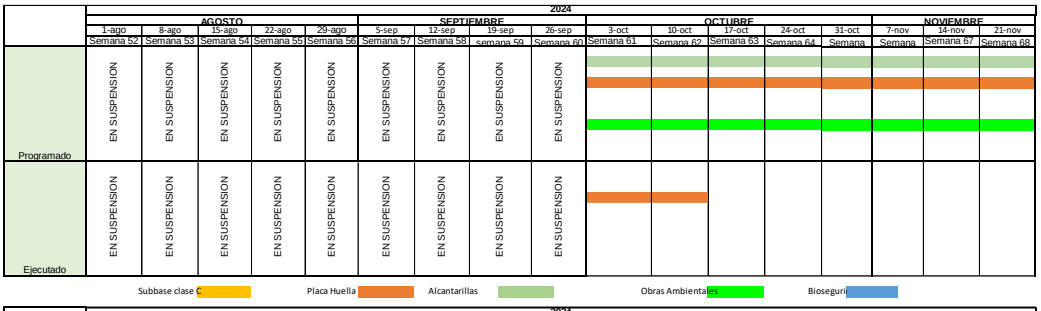

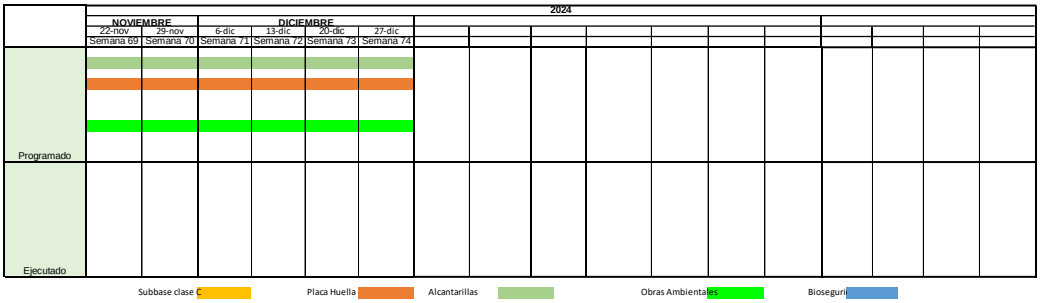



FORMALETA Y PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO



MURO DE CONTENCION



PLACA FUNDIDA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*El contrato de obra se encuentra suspendido, se adelantaron comités presenciales en la territorial INVIAS Cauca para dar celeridad al reinicio del contrato de obra.
*El contrato se reinició el 16 de enero, se solicita al contratista el flujo de caja actualizado con la suspensión y prorroga,
*En inspección se recomienda al contratista realizar cortes al bordillo, ya que por las temperaturas altas en la zona estos presentas grietas.
*Se hace control de la mezcla que están preparando en obra, revisando que la dosificación del concreto se encuentre acorde para la resistencia requerida.
*Mediante comunicación DON-1100-INV-479-2024 se informa a la entidad ALCALDIA DE MERCADERES, el presunto incumplimiento del contratista al plazo contractual
*Se realiza requerimiento al contratista para que entregue la programación actualizada a la prorroga 3.
*De acuerdo a comunicaciones DON-1100-INV-493-2024 se realiza la reiteración del presunto incumplimiento a la entrega de documentación contractual.
*En comité de seguimiento realizado en la territorial cauca del INVIAS el contratista se compromete a realizar un plan de contingencia para mitigar el impacto de la sequia en el sector de la obra, pues se encuentra realizando fundición, actividad que depende en su totalidad de la disposición del agua.
*Se llevaron las muestras de concreto tomada en sitio para su posterior ensayo, se esta a la espera de los resultados por parte del laboratorio.
*Se revisan ordenes de giro 12, 13, 14 Y 15 para la consignación por parte de la fiducia.
*Solo se avala la orden 13, que cumplia con los requerimientos,
*En inspección realizada por parte de interventoría, se evidencia la necesidad de construir un muro de contención en el K0+100 al k0+150 aproximadamente en el margen izquierdo de la vía, pues en el lado derecho en el sentido del abscisado de la vía se realizaron apiques donde la altura donde se encontró tierra firma fue aproximadamente 7 metros de altura, lo cual complica y encarece una solución de contención para el tramo, por eso se punto por realizarlo al lado izquierdo que se cuenta con una altura aproximadamente de 3metros en la parte mas alta y de 1.5 en la parte mas baja, por lo cual se solicita al contratista que proponga el diseño del muro de acuerdo con la cartilla de Colombia rural y se ajuste a lo que tenemos en el sitio de la obra.
*La interventoría realiza recomendación al contratista nuevamente la entrega de un plan de acción que permita cumplir con las exigencias del objeto contractual en el plazo previsto.
*Se reciben por parte del contratista unos PAU no previstos, los cuales se empiezan a realizar su respectiva revisión para su posterior aprobación y ejecución.
*Se realizan observaciones a los APU no previstos entregados por el contratista.
*Se programa comité con la secretaria del municipio para socializar el tema de los muros de contención.
*En comité se solicita al contratista un plan de contingencia que permita optimizar recursos y disminuir tiempos que permitan acabar con la construcción de la placa huella en el menor tiempo posible y dentro de los plazos exigidos.
*El día 30 de mayo mediante oficio DON-1100-INV-651-2024 se avala la prorroga al contrato en referencia hasta el día 30 de junio de 2024.
*Se suspende el contrato el dia 26 de julio
*Mediante el oficio DON-1100-INV-744-2024 se da el concepto favorable a la solicitud de reinicio por parte del contratista

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 88 – 20241011 – 20241017

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	21/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoria N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 88 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADERES 23
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONSORCIADOS: FB INGENIEROS SAS (85%); CONSOLUCIONES AMBIENTALES GYHO SAS (10%); EDGAR FELIPE BONILLA ORDOÑEZ (5%)
CONTRATO No.: F1-F14 240-2022
FECHA DE INICIO: 9/8/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

VALOR INICIAL: $ 2,248,615,000.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 2,248,615,000.00
VALOR ANTICIPO: $ 1,124,307,500.00
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR $ 1,124,307,500.00

PRORROGA 1	30/09/2023	30/10/2023	30 días
PRORROGA 2	31/10/2023	31/12/2023	62 días
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023	15/1/2024	19 días
REINICIO N°1	16/1/2024		
PRORROGA 3	20/1/2024	31/5/2024	133 días
PRORROGA 4	1/6/2024	30/6/2024	30 días
PRORROGA 5	1/7/2024	31/7/2024	31 días
SUSPENSIÓN N°2	26/7/2024	31/8/2024	37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/9/2024	30/9/2024	30 días
REINICIO N°2	1/10/2024		
PRORROGA N°6	7/10/204	15/12/2024	69 días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.: 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES: $ 670,000,000.00
VALOR ACUMULADO: $ 2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024	30/09/2024	30 días
REINICIO 1	1/10/2024		
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,237,823,778			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 172,489,342			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la Interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,248,615,000.00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,969,337,017.00	87.58%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,651,352,474.00	73.44%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (317,984,543.00)	-14.14%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1,969,337,017.00	87.58%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,651,352,474.00	73.44%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (317,984,543.00)	-14.14%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13,716,551.50	0.61%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 52,668,570.00	2.34%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Acta de inicio del 09 de agosto de 2023
En el sitio de la obra el contratista esta ejecutando corte y figurado de acero de acuerdo a los diseños entregados por el municipio.
Se tiene un porcentaje programado de 87,58% y un ejecutado de 73,44% correspondiente a excavaciones de material y extensión de subbase, suministro, figurado de acero, fundición de concreto generando un atraso de -14,14%
El contrato se reinicia el día 01 de octubre de 2024, y de acuerdo a la programación entregada por el contratista se ajusta el porcentaje programado.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,237,823,777.98	92.84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,237,823,777.98	92.84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/09/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoria por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,124,307,500.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 1,124,307,500.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 87.58%
Meta Física Ejecutada % 73.44%
Avance o Atraso Físico % -14.14%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Alcantarillas	UND	15	15		Prog	15			15	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
* Placa Huella	ML	1850	1850		Prog	1850			1850	100.0%
					Ejec	1105			1105	59.73%
* Muros de contencion	ML	66	66		Prog	66			66	100.0%
					Ejec	54			54	81.82%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidráulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa huella.
Ejecutado: se encuentra un aproximado de 1850 metros de sub base instalada y compactada, a la espera de los resultados de las densidades tomadas por el laboratorio,
Se tiene 1105 metros lineales completos con bordillo y cunetas y 20 a falta de cunetas y bordillos

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: 15 alcantarillas
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: 67 metros de muro de contencion
Ejecutado: 54 metros de muro de contencion

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, vereda Palo Verde, municipios de Patía y Mercaderes	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: *Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 - Titulo minero FVL-161

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **APROBADO:** Mediante oficio DON-1100-INV-681-2024, del 19 de junio, se emite concepto favorable a la V6 subsanada del documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-055435.
De manera extemporánea, según lo establecido contractualmente y superando el 15% del total del tiempo de ejecución del contrato,

OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-708-2024 solicitando información social pendiente a la fecha e informes de seguimiento PAGA

ELABORO	APROBÓ
ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*La comunidad pese a que se ha socializado el tema con los dueños y vecinos del sitio de construcción del muro se opusieron y por tal razón se suspenden actividades en el sitio de la obra, para volver a realizar una socialización con la comunidad presente en la zona.
*Se empieza con la excavación para la construcción de los muros en el margen izquierdo aproximadamente en el K0+100 hasta el K0+150.
* Se realiza la fundición del vástago del muro de altura de 3m.
*En campo se desarrollan actividades de corte, figurado de acero para las riostras, se adelanta la excavación de las mismas, Instalación de acero para placa huella, de igual manera instalan formaleta para la fundición de concreto reforzado de las huellas y también para la fundición de concreto ciclópeo. Se cuenta con aproximadamente 900 metros de placa huella fundida, con cunetas, bordillos tal como aparece en el diseño geométrico entregado por el municipio.
*Se realizan actividades de la abscisa K1+000 a K1+050


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
Se realizan actividades de la abscisa K1+065 al K1+105
Se realiza excavación para perfilar los taludes para el muro de contención.
Se realiza la instalación de acero para la zarpa y vástago del muro de contención
Se realiza la fundición de la zarpa y el vástago del muro de contención


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Seguir con la construccion de la placa huella en todos sus componentes, acero de refuerzo, concreto ciclopeo, concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos


X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

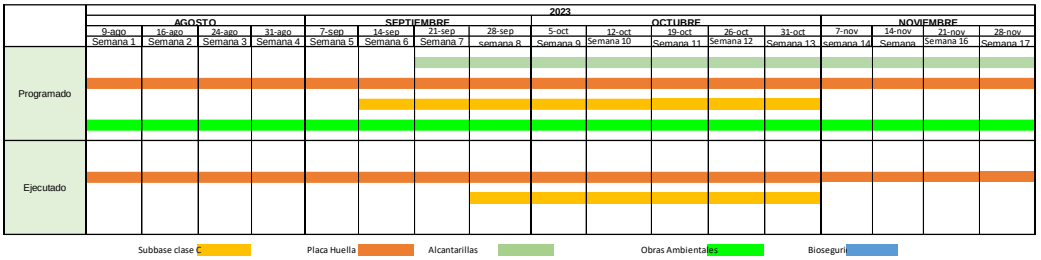



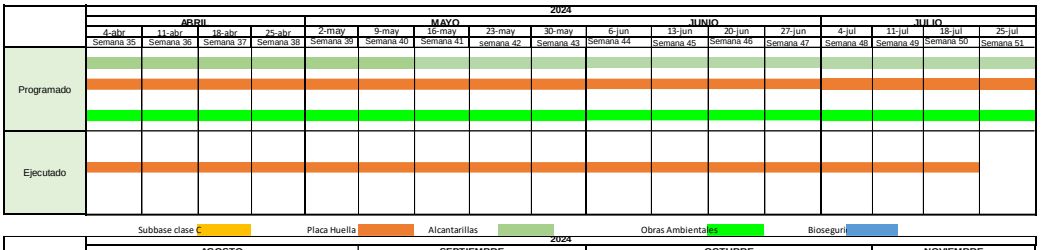

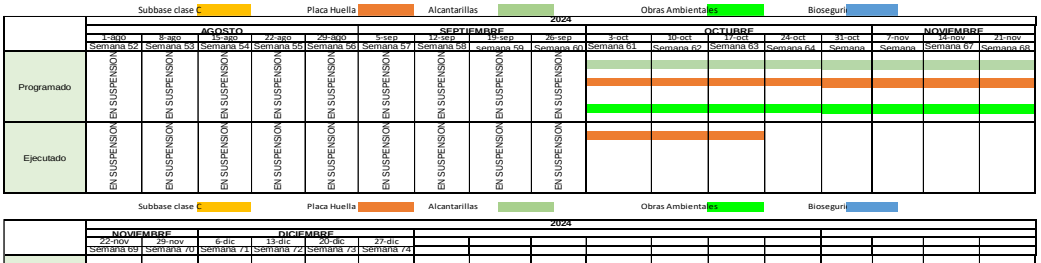



ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
			Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024



FORMALETA Y PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO



INSTALACION DE ACERO PARA HUELLA REFORZADA



ACERO DE MURO INSTALADO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*El día 30 de mayo mediante oficio DON-1100-INV-651-2024 se avala la prorroga al contrato en referencia hasta el día 30 de junio de 2024.
*Se suspende el contrato el dia 26 de julio
*Mediante el oficio DON-1100-INV-744-2024 se da el concepto favorable a la solicitud de reinicio por parte del contratista
*Mediante el oficio DON-1100-INV-749-2024 se da el traslado y aval a la prorroga hasta el 15 de diciembre de 2024 del contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ

Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 89 – 20241018 – 20241024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	28/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 89 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADERES 23
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONSORCIADOS: FB INGENIEROS SAS (85%); CONSOLUCIONES AMBIENTALES GYHO SAS (10%); EDGAR FELIPE BONILLA ORDOÑEZ (5%)

CONTRATO No. F1-F14-240-2022
FECHA DE INICIO: 9/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

PRORROGA 1	30/09/2023	30/10/2023	30 días
PRORROGA 2	31/10/2023	31/12/2023	62 días
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023	15/1/2024	19 días
REINICIO N°1	16/1/2024		
PRORROGA 3	20/1/2024	31/5/2024	133 días
PRORROGA 4	1/6/2024	30/6/2024	30 días
PRORROGA 5	1/7/2024	31/7/2024	31 días
SUSPENSIÓN N°2	26/7/2024	31/8/2024	37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/9/2024	30/9/2024	30 días
REINICIO N°2	1/10/2024		
PRORROGA N°6	7/10/204	15/12/2024	69 días

VALOR INICIAL: $ 2,248,615,000.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 2,248,615,000.00
VALOR ANTICIPO: $ 1,124,307,500.00
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR $ 1,124,307,500.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS

CONTRATO No. 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024	30/09/2024	30 días
REINICIO 1	1/10/2024		
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días

VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES: $ 670,000,000.00
VALOR ACUMULADO: $ 2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,259,384,946			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 150,928,174			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Eiecutado de la vioencia corresponde al valor total eiecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,248,615,000.00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,984,852,460.50	88.27%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,705,594,415.00	75.85%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (279,258,045.50)	-12.42%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 1,984,852,460.50	88.27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,705,594,415.00	75.85%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ (279,258,045.50)	-12.42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 15,515,443.50	0.69%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 54,241,941.00	2.41%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Acta de inicio del 09 de agosto de 2023
En el sitio de la obra el contratista esta ejecutando corte y figurado de acero de acuerdo a los diseños entregados por el municipio.
Se tiene un porcentaje programado de 88,27% y un ejecutado de 75,85% correspondiente a excavaciones de material y extensión de subbase, suministro, figurado de acero, fundición de concreto generando un atraso de -12,42%
El contrato se reinicia el día 01 de octubre de 2024, y de acuerdo a la programación entregada por el contratista se ajusta el porcentaje programado.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,259,384,945.71	93.74%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,259,384,945.71	93.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoria por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	1,124,307,500.00
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	1,124,307,500.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 88.27%
Meta Física Ejecutada % 75.85%
Avance o Atraso Físico % 12.42%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023
Alcantarillas	UND	15	15	
Placa Huella	ML	1850	1850	
Muros de contencion	ML	66	66	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Prog	15			15	100.0%
Ejec	0			0	0.00%
Prog	1850			1850	100.0%
Ejec	1170			1170	63.24%
Prog	66			66	100.0%
Ejec	54			54	81.82%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidráulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Total	5	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa huella.
Ejecutado: se encuentra un aproximado de 1850 metros de sub base instalada y compactada, a la espera de los resultados de las densidades tomadas por el laboratorio,
Se tiene 1170 metros lineales completos con bordillo y cunetas y 24 a falta de cunetas y bordillos

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: 15 alcantarillas
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: 67 metros de muro de contencion
Ejecutado: 54 metros de muro de contencion

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, vereda Palo Verde, municipios de Patía y Mercaderes	PERMISO MINERO:	SI X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: *Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 - Titulo minero FVL-161

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **APROBADO:** Mediante oficio DON-1100-INV-681-2024, del 19 de junio, se emite concepto favorable a la V6 subsanada del documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-055435.
De manera extemporánea, según lo establecido contractualmente y superando el 15% del total del tiempo de ejecución del contrato,

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-768-2024 del 22 de octubre del 2024, se solicita la entrega de informes de seguimiento ambiental

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-708-2024 solicitando información social pendiente a la fecha e informes de seguimiento PAGA

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*La comunidad pese a que se ha socializado el tema con los dueños y vecinos del sitio de construcción del muro se opusieron y por tal razón se suspenden actividades en el sitio de la obra, para volver a realizar una socialización con la comunidad presente en la zona.
*Se empieza con la excavación para la construcción de los muros en el margen izquierdo aproximadamente en el K0+100 hasta el K0+150.
* Se realiza la fundición del vástago del muro de altura de 3m.
*En campo se desarrollan actividades de corte, figurado de acero para las riostras, se adelanta la excavación de las mismas, Instalación de acero para placa huella, de igual manera instalan formaleta para la fundición de concreto reforzado de las huellas y también para la fundición de concreto ciclópeo. Se cuenta con aproximadamente 900 metros de placa huella fundida, con cunetas, bordillos tal como aparece en el diseño geométrico entregado por el municipio.
*Se realizan actividades de la abscisa K1+000 a K1+050


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
Se realizan actividades de la abscisa K1+105 al K1+170
Se realiza excavación para perfilar los taludes para el muro de contención.
Se realiza la instalación de acero para la zarpa y vástago del muro de contención
Se realiza la fundición de la zarpa y el vástago del muro de contención

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Seguir con la construccion de la placa huella en todos sus componentes, acero de refuerzo, concreto ciclopeo, concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

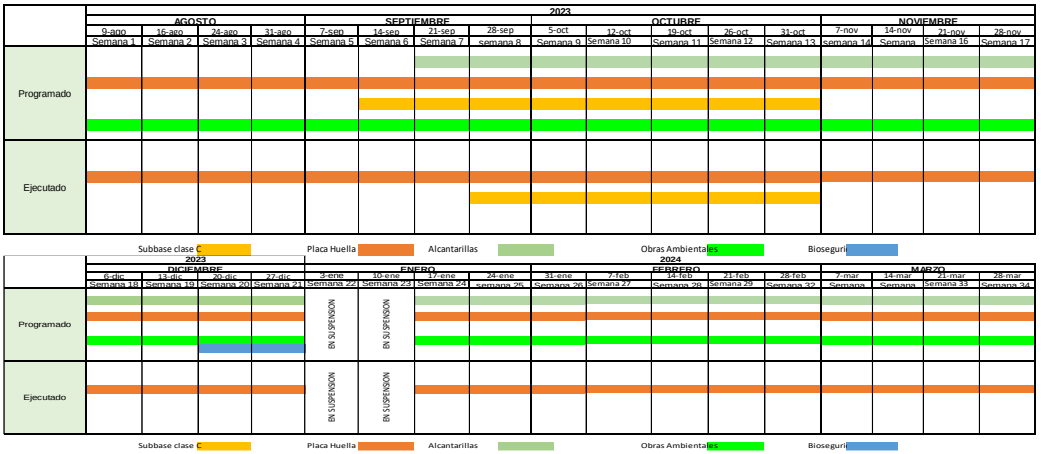


ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ELABORO

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ









INSTALACION DE ACERO PARA HUELLA REFORZADA



ACERO PARA EL BASTAGO



BASTAGO DE MURO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*El día 30 de mayo mediante oficio DON-1100-INV-651-2024 se avala la prorroga al contrato en referencia hasta el día 30 de junio de 2024.
*Se suspende el contrato el dia 26 de julio
*Mediante el oficio DON-1100-INV-744-2024 se da el concepto favorable a la solicitud de reinicio por parte del contratista
*Mediante el oficio DON-1100-INV-749-2024 se da el traslado y aval a la prorroga hasta el 15 de diciembre de 2024 del contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 90 – 20241025 - 20241031

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA	4/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 90 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVSOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VÍAS RUARLES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 15 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", Construcción de 1850 ml de placa huella de ancho tipo 5m.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
En la vía del Municipio de Mercaderes Cauca entre las veredas La Playa y La Despensa, se realizarán obras que mejoren la transitabilidad vehicular de los habitantes.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADERES 23
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN LEONCE BONILLA CURIEL
CONSORCIADOS: FB INGENIEROS SAS (90%); CONSULTORES DONOVAN AMBIENTALES GYHO SAS (10%); EDGAR FELIPE BONILLA ORDOÑEZ (5%)

CONTRATO No.	F1-F14-240-2022	VALOR INICIAL:	$ 2,248,615,000.00
FECHA DE INICIO:	9/8/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30/7/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2,248,615,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 1,123,307,500.00
PRORROGA 1	30/06/2023 - 30/10/2023 30 días		
PRORROGA 2	31/10/2023 - 31/12/2023 62 días		
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023 15/1/2024 19 días		
REINICIO N°1	16/1/2024	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA 3	20/1/2024 31/5/2024 133 días	SALDO POR AMORTIZAR	$ 1,124,307,500.00
PRORROGA 4	1/6/2024 30/6/2024 30 días		
PRORROGA 5	1/7/2024 31/7/2024 31 días		
SUSPENSIÓN N°2	26/7/2024 31/8/2024 37 días		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/9/2024 30/9/2024 30 días		
REINICIO N°2	6/10/2024		
PRORROGA N°6	7/10/94 15/1/2025 69 días		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CONTRERAS CEPEDA

CONTRATO No.	1100 de 2022	VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022	VALOR ADICIONES:	$ 870,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	11/10/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 2,610,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/4/2025	VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA 1	01/11/2023 - 31/12/2023 61 días		
PRORROGA 2	01/01/2024 - 31/05/2024 151 días		
PRORROGA 3	01/06/2024 - 30/06/2024 30 días	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA 4	01/07/2024 - 31/07/2024 31 días	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024 31/08/2024 34 días		
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024 30/09/2024 30 días		
REINICIO 1	1/10/2024		
PRORROGA 5	04/10/2024 15/12/2024 73 días		

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 2,248,615,000			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,280,946,113			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 129,367,007			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoria, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 2,248,615,000.00	
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 2,005,764,580.00	89.20%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,755,663,899.00	78.08%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (250,100,681.00)	-11.12%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 2,005,764,580.00	89.20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,755,663,899.00	78.08%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (250,100,681.00)	-11.12%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20,687,258.00	0.92%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 50,069,484.00	2.23%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Acta de inicio del 09 de agosto de 2023
En el sitio de la obra el contratista esta ejecutando corte y figurado de acero de acuerdo a los diseños entregados por el municipio.
Se tiene un porcentaje programado de 89,20% y un ejecutado de 78,08% correspondiente a excavaciones de material y extensión de subbase, suministro, figurado de acero, fundición de concreto generando un atraso de -11,12%
El contrato se reinicia el día 01 de octubre de 2024, y de acuerdo a la programación entregada por el contratista se ajusta el porcentaje programado.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,280,946,113.44	94.63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,280,946,113.44	94.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,124,307,500.00
Amortizado $	$
Saldo $	$ 1,124,307,500.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 89.20%
Meta Física Ejecutada % 78.08%
Avance o Atraso Físico % -11.12%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
Alcantarillas	UND	15	15		Prog	15			15	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
Placa Huella	ML	1850	1850		Prog	1850			1850	100.0%
					Ejec	1170			1170	63.24%
Muros de contencion	ML	66	66		Prog	66			66	100.0%
					Ejec	54			54	81.82%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Excavadora Hidráulica	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Total	**5**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Realización de un total de 15 alcantarillas y 1850 ml de placa huella.
Ejecutado: se encuentra un aproximado de 1850 metros de sub base instalada y compactada, a la espera de los resultados de las densidades tomadas por el laboratorio.
Se tiene 1230 metros lineales completos con bordillo y cunetas y 15 a falta de cunetas y bordillos

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado: 15 alcantarillas
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado: 67 metros de muro de contencion
Ejecutado: 54 metros de muro de contencion

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, vereda Palo Verde, municipios de Patía y Mercaderes	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: *Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 - Titulo minero FVL-161

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **APROBADO:** Mediante oficio DON-1100-INV-681-2024, del 19 de junio, se emite concepto favorable a la V6 subsanada del documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-055435.
De manera extemporánea, según lo establecido contractualmente y superando el 15% del total del tiempo de ejecución del contrato,

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-768-2024 del 22 de octubre del 2024, se solicita la entrega de informes de seguimiento ambiental

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	12	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 18

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-715-2024 solicitando información social pendiente a la fecha e informes de seguimiento PAGA

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energias renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

*La comunidad pese a que se ha socializado el tema con los dueños y vecinos del sitio de construcción del muro se opusieron y por tal razón se suspenden actividades en el sitio de la obra, para volver a realizar una socialización con la comunidad presente en la zona.
*Se empieza con la excavación para la construcción de los muros en el margen izquierdo aproximadamente en el K0+100 hasta el K0+150.
* Se realiza la fundición del vástago del muro de altura de 3m.
*En campo se desarrollan actividades de corte, figurado de acero para las riostras, se adelanta la excavación de las mismas, Instalación de acero para placa huella, de igual manera instalan formaleta para la fundición de concreto reforzado de las huellas y también para la fundición de concreto ciclópeo. Se cuenta con aproximadamente 900 metros de placa huella fundida, con cunetas, bordillos tal como aparece en el diseño geométrico entregado por el municipio.
*Se realizan actividades de la abscisa K1+000 a K1+050


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
Se realizan actividades de la abscisa K1+170 al K1+230
Se realiza excavación para perfilar los taludes para el muro de contención.
Se realiza la instalación de acero para la zarpa y vástago del muro de contención
Se realiza la fundición de la zarpa y el vástago del muro de contención


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


Seguir con la construccion de la placa huella en todos sus componentes, acero de refuerzo, concreto ciclopeo, concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS













ALISTADO DE SUBBASE PARA FUNDICION



INSTALACION DE ACERO



TRAMO FUNDIDO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*El día 30 de mayo mediante oficio DON-1100-INV-651-2024 se avala la prorroga al contrato en referencia hasta el día 30 de junio de 2024.
*Se suspende el contrato el dia 26 de julio
*Mediante el oficio DON-1100-INV-744-2024 se da el concepto favorable a la solicitud de reinicio por parte del contratista
*Mediante el oficio DON-1100-INV-749-2024 se da el traslado y aval a la prorroga hasta el 15 de diciembre de 2024 del contrato.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ

Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.1.2 SUCRE 1866 – CAUCA

- Informe Semanal 86 - 20241001 – 20241003

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 86 (Numeración consecutiva) del 1/10/2024 al 3/10/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DEL 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rigido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS GIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO No. 258
FECHA DE INICIO: 16/5/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/8/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

PRORROGA N°1	1/09/2023	31/10/2023	61 días
PRORROGA N°2	1/11/2023	31/12/2023	61 días
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023		
REINICIO N°1	1/3/2024		
PRORROGA N°3	5/03/2024	3/05/2024	60 días
PRORROGA N°4	4/05/2024	31/05/2024	28 días
PRORROGA N°5	1/6/2024	30/6/2024	30 días
PRORROGA N°6	1/7/2024	30/7/2024	31 días
SUSPENSIÓN N°2	26/7/2024	31/8/2024	37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/9/2024	30/9/2024	30 días
REINICIO N°2	1/10/2024		
PRORROGA N°7	7/10/2024	15/12/2024	69 días

VALOR INICIAL:	$	4,306,911,911.00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	4,306,911,911.00
VALOR ANTICIPO:	$	1,292,073,573.30
VALOR AMORTIZADO:	$	323,312,433.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$	968,761,140.30

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No. 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024	30/09/2024	30 días
REINICIO 1	1/10/2024		
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días

VALOR INICIAL:	$	1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$	670,000,000.00
VALOR ACUMULADO:	$	2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4,306,911,911			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,173,591,669			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,133,320,242			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,194,701,443			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,611,677			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4,306,911,911.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	4,306,500,000.00	99.99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	1,173,591,669.00	27.25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(3,132,908,331.00)	-72.74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	4,306,500,000.00	99.99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	1,173,591,669.00	27.25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	(3,132,908,331.00)	-72.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha se cuenta con un porcentaje programado de 99,99% y un porcentaje ejecutado de 27,25%, por lo tanto se reporta un atraso de 72,74%, basado en el cronograma de actividades entregado por el contratista el día 08 de mayo del 2024 conforme a la suscripción de la adición de tiempo Prorroga N 4. se reitera que el contratista no ha entregado el cronograma actualizado referente a la prorroga N7. es decir que los porcentajes no se actualizan para este semanal

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	2,194,701,442.53	91.05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	2,194,701,442.53	91.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,292,073,573.30
Amortizado $	$ 83,040,811.00
Saldo $	$ 1,209,032,762.30

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.87
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 99.99%
Meta Física Ejecutada % 27.25%

Avance o Atraso Físico % -72.74%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento rígido	ML	2125	2125	1995	Prog	1995			1995	100.0%
					Ejec	337			337	16.89%
* Alcantarillas	UND	23	23	19	Prog	19			19	100%
					Ejec	15			15	78.95%
* Filtro	ML	1569	1569	1215	Prog	1215			1215	77.4%
					Ejec	857			857	54.6%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibro compactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido, construcción de 23 alcantarillas y 1569 ml de filtro

Ejecutado: A la fecha el contratista cuenta con 15 alcantarillas terminadas, se cuenta con 857 ml de filtro terminados y 337ml de pavimento rígido margen derecha en el sentido del abscisado, se manifiesta que el tramo de pavimento rígido que se presenta no es funcional debido a que no se ha ejecutado en el tramo completo. de esta manera se hace la notación que las cantidades se tiene en cuenta para el porcentaje del avance de obra. para el pago parcial es de recordar que la interventoria enfatiza que no se reconocera para pago las obras que no estan funcionales.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:

Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, vereda Palo Verde, municipios de Patía y Mercaderes	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 - Título minero FVL-161

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencia maquinaria como retroexcavadora, que a la fecha del siguiente reporte, no se ha enviado su documentación según pliego de condiciones y/o anexo, técnico, para su revisión y concepto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-132-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la versión 1 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la primera solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-235-2023 del 17 de agosto, se emiten observaciones a la versión 2 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-278-2023 del 21 de septiembre, se reitera subsanar las observaciones emitidas en el oficio 235.
*Mediante oficio DON-1100-INV-346-2023, del 23 de octubre, se realiza la cuarta solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-394-2023, del 27 de noviembre, se reitera la entrega del PAGA, Subsanando las observaciones emitidas en el oficio 235 del 17 de agosto.
*Mediante oficio DON-1100-INV-416-2023, del 15 de diciembre, se emite el estado actual del contrato y solicitudes al documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-423-2023, del 18 de diciembre, se emiten observaciones a la Versión 3 del documento.
*Mediante oficio DON-1100-INV-644-2024 del 27 de mayo del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA
*Mediante oficio DON-1100-INV-685-2024 del 24 de junio del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA

OBSERVACIONES: *Mediante oficio DON-1100-INV-549-2024 del 01 de abril, se envía segundo solicitud de presunto incumpliendo a la entrega de la documentación del contrato. PAGA

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	9	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se aprueban actas de vecindad de inicio, el contratista subsana observaciones realizadas
se aprueba acta de resolución de veeduría

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* A la fecha se tiene terminada un total de 15 alcantarillas ubicadas en las abscisas Km 2+077m, Km 1+960m, Km 1+866m, Km 1+550m, Km 1+390m,Km 1+333m, Km 1+041m, Km1+174m. Km 0+911m, Km1+284m, Km 1+103m. Km 0+975m, Km 0+830m,km 0+403m y km 0+483
* Elaboración de alcantarilla Km 0+282m caja de encole fundición de muros laterales, muro posterior y muro guardarruedas.
* Elaboración de obra de descole alcantarilla Km 0+283,48m
* A la fecha se tiene un total de 857 ml de filtro entre las abscisas Km 2+080m - Km1+960m, Km1+960m - Km1+865m, Km1+866m - Km1+810m, Km1+386m - Km1+335m y Km1+286m - Km1+175,93m,km 0+911m -Km 0+975m, Km 0+975 - Km 1+042m, Km1+284m- Km 1+321,7m, Km 0+911m - Km0+830m y Km 0+830m - Km 0 + 773m. incluye la instalación del geotextil, material drenante y tubería perforada N4.
* Instalación de sub base granular por un total de 432 ml. se esta a la prueba de las densidades para liberación de tramo
* Mejoramiento de la vía por un total de 432 ml
* Elaboración de placas de concreto MR42 por un total de 337,9ml losa margen derecha en el sentido del abscisado.
* No hubo actividades de obra en esta semana, el contratista sustenta que no hay flujo de caja para la compra de los materiales de obra.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


* Teniendo en cuenta que se da el reinicio con fecha del 01 de octubre del 2024 se hacen las siguientes precisiones: se solicita la organización de toda la documentación del contrato teniendo en cuenta la fecha de terminación.
* Se solicita que se entregue el cronograma de actividades, plan de contingencia, flujo de caja teniendo en cuenta la prorroga N7.
* Se solicita el reinicio de las actividades dado el tiempo que falta por culminar la vigencia del contrato.
* Se recibe la sollicitud de reinicio y solicitud de prórroga N 7 del contrato, la interventoría envia unas observaciones para subsanar, posteriormente el contratista subsana los documentos, lo que permite a la interventoría dar aval a la solicitud, seguidamente la entidad contratante aprueba la prórroga N7, la cual inicia desde el 7 de octubre del 2024 hasta el 15 de diciembre del 2024.
* Mediante comité en las instalaciones del invias territorial Cauca. entre el contratista, interventoría y municipio de sucre, se mencionnan los siguientes temas: solicitud de reinicio de obra y solicitud de prórroga por parte del contratista, solicitud del flujo de caja, creonograma de actividades y un plan de contingencia teniendo encuenta el tiempo de vigencia del contrato. solicitud de actualización y organización de todos los documentos administrativos que hacen parte del proceso CTO 258 de 28 de octubre del 2022, y por ultimo se menciona que se deben entregar obras funcionales para la continuidad de las solicitudedes de los pagos parciales.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Entrega del plan de contingencia teniendo en cuenta el tiempo de vigencia del contrato
* Entrega del programado de actividades, flujo de caja teniendo en cuenta el prorroga N7.
* inicio de las actividades en campo.


ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

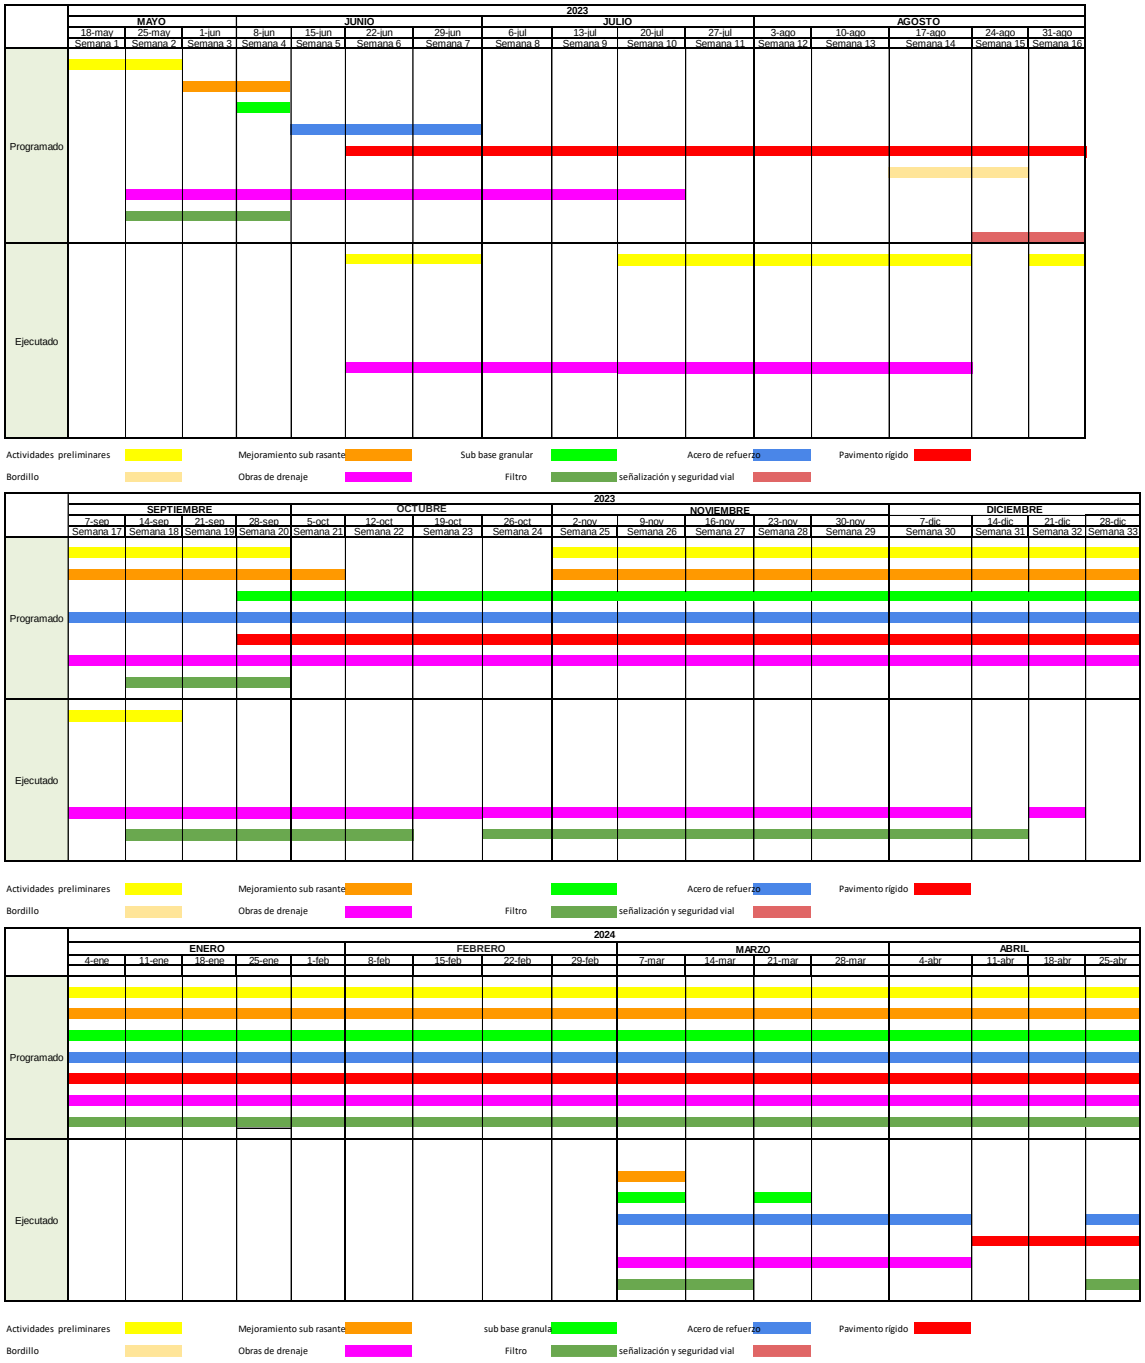

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

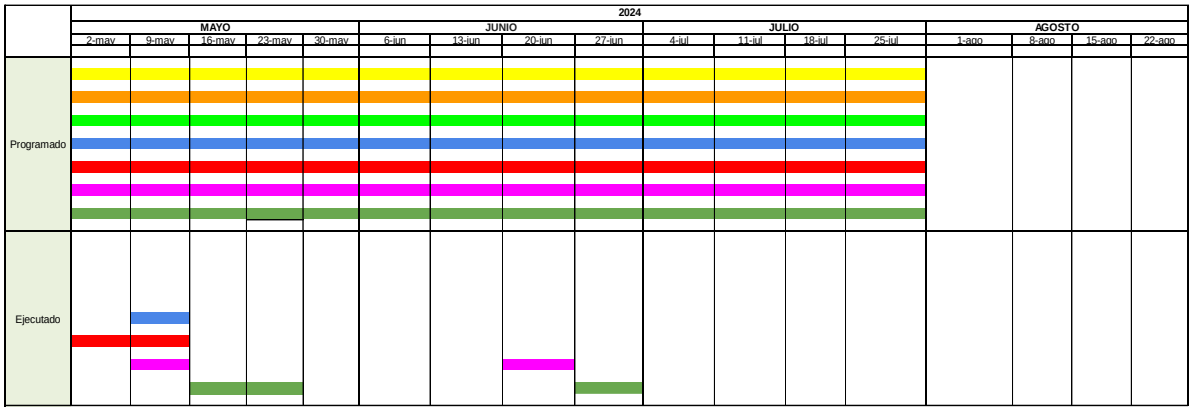

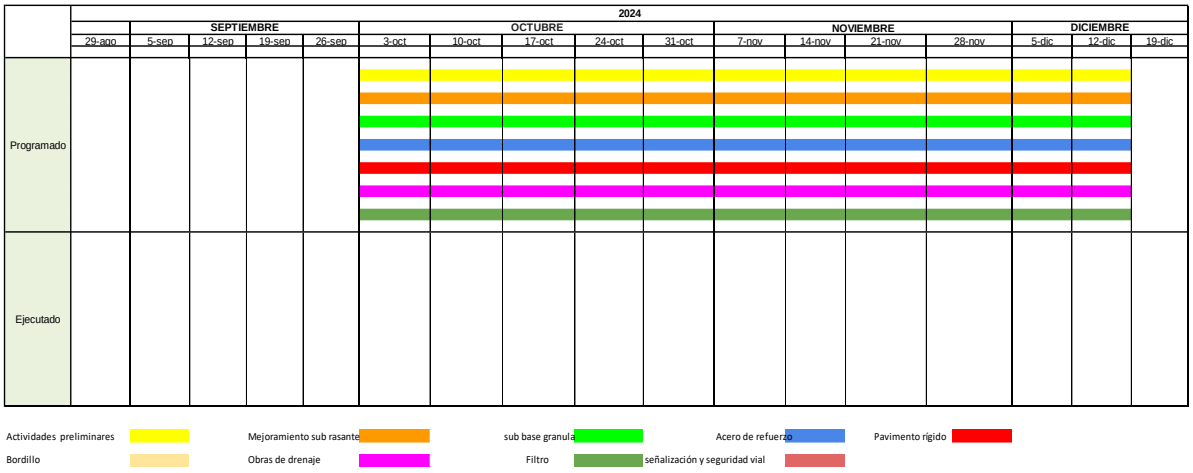

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

*Revisión de programación y flujo de caja.
*Solicitud de plan de contingencia.
* Solicitud de localización y replanteo del diseño geométrico en la obra
* Seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas en obra, dando cumplimiento a lo establecido en el manual de interventoría de obra pública - instructivo para el seguimiento de la gestión ambiental.
* Mediante inspección realizada el día 22 de noviembre, se hacen una serie se medidas correctivas en las actividades en campo. igualmente se hace reporte del avance de obra y comparativo de lo ejecutado con respecto a lo programado
* Seguimiento al avance semanal de ejecución de obra
* Seguimiento a las obras ejecutadas, estabilidad de la obra
* Mediante oficio DON-1100-INV-232-2023 el día 11 de octubre del 2023, se manifiesta un presunto incumplimiento al plazo contractual contrato No 258 de octubre 2023
* Mediante oficio DON-1100-INV-405-2023 el día 5 de diciembre del 2023. se manifiesta un presunto incumplimiento al plazo contractual Sucre 1866.
* Mediante oficio DON-informe-estado-actual-al-convenio-1866-Sucre se comparte el avance en los componentes administrativos, financieros y técnicos del estado del contrato de obra.

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

- Informe Semanal 87 - 20241004 – 20241010

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 87 (Numeración consecutiva) del 4/10/2024 al 10/10/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DEL 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS GIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO No. 258 — VALOR INICIAL: $ 4,306,911,911.00
FECHA DE INICIO: 16/5/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/8/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 4,306,911,911.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024 — VALOR ANTICIPO: $ 1,292,073,573.30
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ 1,292,073,573.30

PRORROGA N°1	1/09/2023	31/10/2023	61 días
PRORROGA N°2	1/11/2023	31/12/2023	61 días
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023		
REINICIO N°1	1/3/2024		
PRORROGA N°3	5/03/2024	3/05/2024	60 días
PRORROGA N°4	4/05/2024	31/05/2024	28 días
PRORROGA N°5	1/6/2024	30/6/2024	30 días
PRORROGA N°6	1/7/2024	30/7/2024	31 días
SUSPENSIÓN N°2	26/7/2024	31/8/2024	37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/9/2024	30/9/2024	30 días
REINICIO N°2	1/10/2024		
PRORROGA N°7	7/10/204	15/12/2024	69 días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No. 1100 de 2022 — VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 — VALOR ADICIONES: $ 670,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2,410,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días
SUSPENSION 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024	30/09/2024	30 días
REINICIO 1	1/10/2024		
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4,306,911,911			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,173,591,669			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,133,320,242			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,216,262,610			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194,050,510			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4,306,911,911.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4,306,500,000.00	99.99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,173,591,669.00	27.25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3,132,908,331.00)	-72.74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,306,500,000.00	99.99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,173,591,669.00	27.25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3,132,908,331.00)	-72.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha se cuenta con un porcentaje programado de 99,99% y un porcentaje ejecutado de 27,25%, por lo tanto se reporta un atraso de 72,74%, basado en el cronograma de actividades entregado por el contratista el día 08 de mayo del 2024 conforme a la suscripción de la adición de tiempo Prorroga N 4. se reitera que el contratista no ha entregado el cronograma actualizado referente a la prorroga N7. es decir que los porcentajes no se actualizan para este semanal

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,216,262,610.25	91.95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,216,262,610.25	91.95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,292,073,573.30
Amortizado $	$ 83,040,811.00
Saldo $	$ 1,209,032,762.30

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.89
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99.99%
Meta Física Ejecutada % 27.25%
Avance o Atraso Físico % -72.74%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Pavimento rígido	ML	2125	2125	1995	Prog	1995			1995	100.0%
						Ejec	337			337	16.89%
*	Alcantarillas	UND	23	23	19	Prog	19			19	100%
						Ejec	15			15	78.95%
*	Filtro	ML	1569	1569	1215	Prog	1215			1215	77.4%
						Ejec	857			857	54.6%
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo v/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibro compactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido, construcción de 23 alcantarillas y 1569 ml de filtro

Ejecutado: A la fecha el contratista cuenta con 15 alcantarillas terminadas, se cuenta con 857 ml de filtro terminados y 337ml de pavimento rígido margen derecha en el sentido del abscisado, se manifiesta que el tramo de pavimento rígido que se presenta no es funcional debido a que no se ha ejecutado en el tramo completo. de esta manera se hace la notación que las cantidades se tiene en cuenta para el porcentaje del avance de obra. para el pago parcial es de recordar que la interventoria enfatiza que no se reconocera para pago las obras que no estan funcionales.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:

Ejecutado:

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, vereda Palo Verde, municipios de Patía y Mercaderes	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 - Título minero FVL-161

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACION DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencia maquinaria como retroexcavadora, que a la fecha del siguiente reporte, no se ha enviado su documentación según pliego de condiciones y/o anexo, técnico, para su revisión y concepto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-132-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la versión 1 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la primera solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-235-2023 del 17 de agosto, se emiten observaciones a la versión 2 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-278-2023 del 21 de septiembre, se reitera subsanar las observaciones emitidas en el oficio 235.
*Mediante oficio DON-1100-INV-346-2023, del 23 de octubre, se realiza la cuarta solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-394-2023, del 27 de noviembre, se reitera la entrega del PAGA, Subsanando las observaciones emitidas en el oficio 235 del 17 de agosto.
*Mediante oficio DON-1100-INV-416-2023, del 15 de diciembre, se emite el estado actual del contrato y solicitudes al documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-423-2023, del 18 de diciembre, se emiten observaciones a la Versión 3 del documento.
*Mediante oficio DON-1100-INV-644-2024 del 27 de mayo del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA
*Mediante oficio DON-1100-INV-685-2024 del 24 de junio del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA

OBSERVACIONES: *Mediante oficio DON-1100-INV-549-2024 del 01 de abril, se envía segundo solicitud de presunto incumpliendo a la entrega de la documentación del contrato. PAGA

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se aprueban actas de vecindad de inicio, el contratista subsana observaciones realizadas
se aprueba acta de resolución de veeduría

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* A la fecha se tiene terminada un total de 15 alcantarillas ubicadas en las abscisas Km 2+077m, Km 1+960m, Km 1+866m, Km 1+550m, Km 1+390m,Km 1+333m, Km 1+041m, Km1+174m. Km 0+911m, Km1+284m, Km 1+103m. Km 0+975m, Km 0+830m,km 0+403m y km 0+483
* Elaboración de alcantarilla Km 0+282m caja de encole fundición de muros laterales, muro posterior y muro guardarruedas.
* Elaboración de obra de descole alcantarilla Km 0+283,48m
* A la fecha se tiene un total de 857 ml de filtro entre las abscisas Km 2+080m - Km1+960m, Km1+960m - Km1+865m, Km1+866m - Km1+810m, Km1+386m - Km1+335m y Km1+286m - Km1+175,93m,km 0+911m -Km 0+975m, Km 0+975 - Km 1+042m, Km1+284m- Km 1+321,7m, Km 0+911m - Km0+830m y Km 0+830m - Km 0 + 773m. incluye la instalación del geotextil, material drenante y tubería perforada N4.
* Instalación de sub base granular por un total de 432 ml. se esta a la prueba de las densidades para liberación de tramo
* Mejoramiento de la vía por un total de 432 ml
* Elaboración de placas de concreto MR42 por un total de 337,9ml losa margen derecha en el sentido del abscisado.
* No hubo actividades de obra en esta semana, el contratista sustenta que no hay flujo de caja para la compra de los materiales de obra.
* Teniendo en cuenta que se da el reinicio con fecha del 01 de octubre del 2024 se hacen las siguientes precisiones: se solicita la organización de toda la documentación del contrato teniendo en cuenta la fecha de terminación.
* Se solicita que se entregue el cronograma de actividades, plan de contingencia, flujo de caja teniendo en cuenta la prorroga N7.
* Se solicita el reinicio de las actividades dado el tiempo que falta por culminar la vigencia del contrato.
* Se recibe la solicitud de reinicio y solicitud de prórroga N 7 del contrato, la interventoria envia unas observaciones para subsanar, posteriormente el contratista subsana los documentos, lo que permite a la interventoría dar aval a la solicitud, seguidamente la entidad contratante aprueba la prórroga N7, la cual inicia desde el 7 de octubre del 2024 hasta el 15 de diciembre del 2024.
* Mediante comité en las instalaciones del invías territorial Cauca. entre el contratista, interventoría y municipio de sucre, se mencionnan los siguientes temas: solicitud de reinicio de obra y solicitud de prórroga por parte del contratista, solicitud del flujo de caja, creonograma de actividades y un plan de contingencia teniendo encuenta el tiempo de vigencia del contrato. solicitud de actualización y organización de todos los documentos administrativos que hacen parte del proceso CTO 258 de 28 de octubre del 2022, y por ultimo se menciona que se deben entregar obras funcionales para la continuidad de las solicitudedes de los pagos parciales.


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


* Aún no se tiene actividades de obra en campo.
* Se reitera la solicitud de actualizar y organizar las documentación faltante del archivo del contrato, para dar continuidad al los trámites administrativos

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Entrega del plan de contingencia teniendo en cuenta el tiempo de vigencia del contrato
* Entrega del programado de actividades, flujo de caja teniendo en cuenta el prorroga N7.
* inicio de las actividades en campo.

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

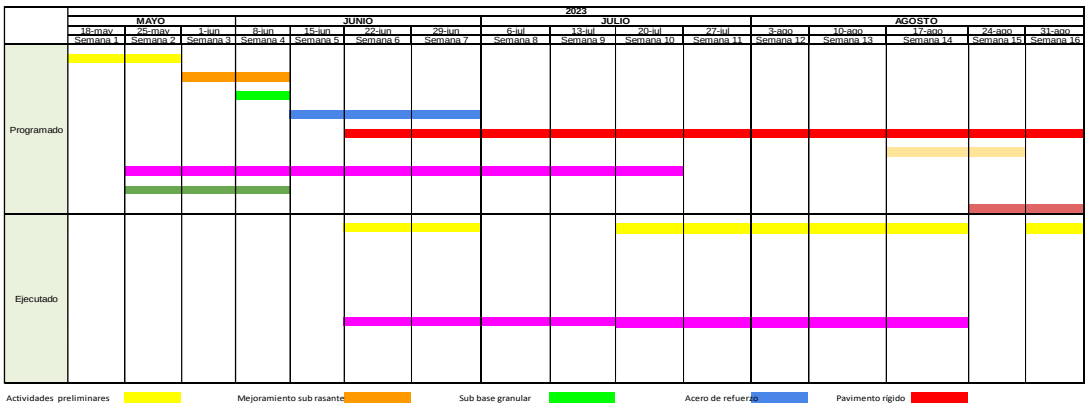


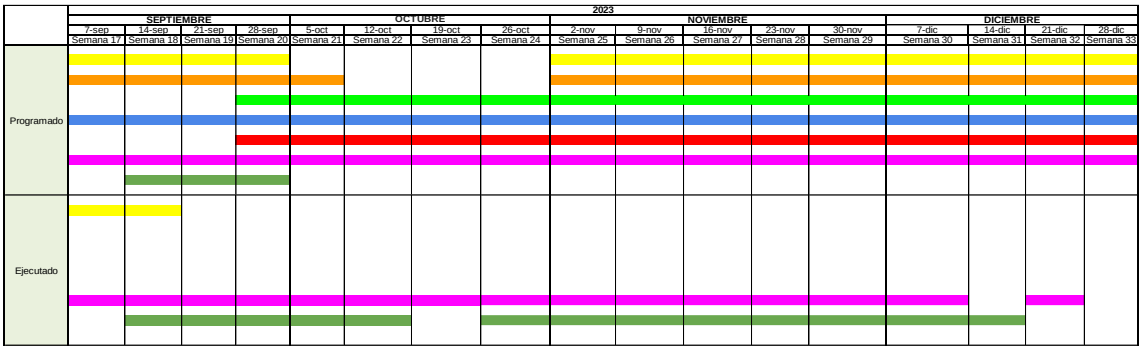
2023
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
7-sep Semana 17
14-sep Semana 18
21-sep Semana 19
28-sep Semana 20
5-oct Semana 21
12-oct Semana 22
19-oct Semana 23
26-oct Semana 24
2-nov Semana 25
9-nov Semana 26
16-nov Semana 27
23-nov Semana 28
30-nov Semana 29
7-dic Semana 30
14-dic Semana 31
21-dic Semana 32
28-dic Semana 33
Programado
Ejecutado


Actividades preliminares
Mejoramiento sub rasante
Acero de refuerzo
Pavimento rígido
Bordillo
Obras de drenaje
Filtro
señalización y seguridad vial

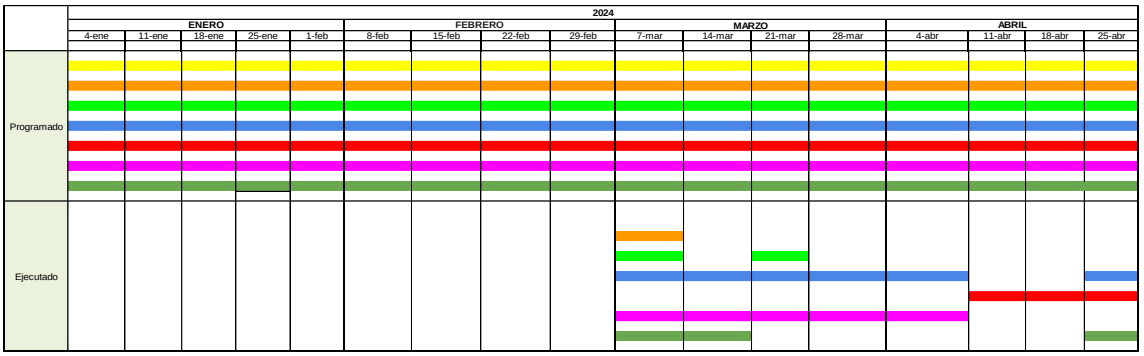
2024
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
4-ene
11-ene
18-ene
25-ene
1-feb
8-feb
15-feb
22-feb
29-feb
7-mar
14-mar
21-mar
28-mar
4-abr
11-abr
18-abr
25-abr
Programado
Ejecutado


Actividades preliminares
Mejoramiento sub rasante
sub base granular
Acero de refuerzo
Pavimento rígido
Bordillo
Obras de drenaje
Filtro
señalización y seguridad vial

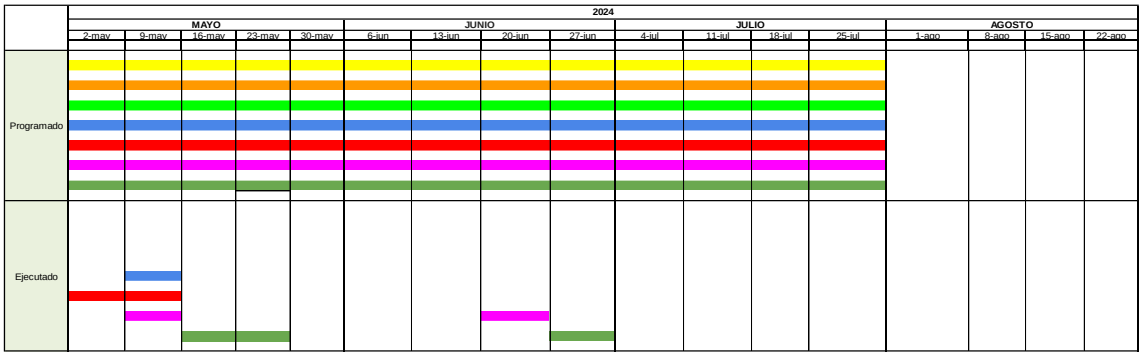
2024
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
2-may
9-may
16-may
23-may
30-may
6-jun
13-jun
20-jun
27-jun
4-jul
11-jul
18-jul
25-jul
1-ago
8-ago
15-ago
22-ago
Programado
Ejecutado


Actividades preliminares
Mejoramiento sub rasante
sub base granular
Acero de refuerzo
Pavimento rígido
Bordillo
Obras de drenaje
Filtro
señalización y seguridad vial

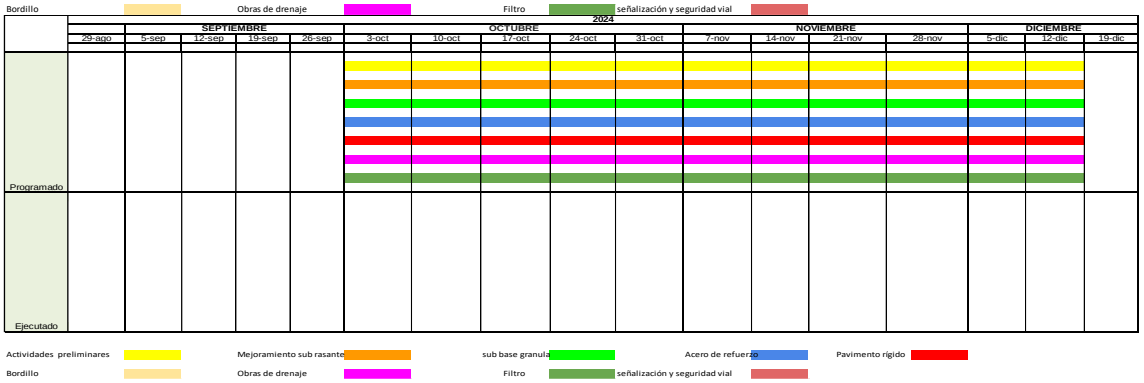
2024
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
29-ago
5-sep
12-sep
19-sep
26-sep
3-oct
10-oct
17-oct
24-oct
31-oct
7-nov
14-nov
21-nov
28-nov
5-dic
12-dic
19-dic
Programado
Ejecutado

Actividades preliminares
Mejoramiento sub rasante
sub base granular
Acero de refuerzo
Pavimento rígido
Bordillo
Obras de drenaje
Filtro
señalización y seguridad vial

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024	

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





*Revisión de programación y flujo de caja.
*Solicitud de plan de contingencia.
* Solicitud de localización y replanteo del diseño geométrico en la obra
* Seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas en obra, dando cumplimiento a lo establecido en el manual de interventoría de obra pública - instructivo para el seguimiento de la gestión ambiental.
* Mediante inspección realizada el día 22 de noviembre, se hacen una serie se medidas correctivas en las actividades en campo. igualmente se hace reporte del avance de obra y comparativo de lo ejecutado con respecto a lo programado
* Seguimiento al avance semanal de ejecución de obra
* Seguimiento a las obras ejecutadas, estabilidad de la obra
* Mediante oficio DON-1100-INV-232-2023 el día 11 de octubre del 2023, se manifiesta un presunto incumplimiento al plazo contractual contrato No 258 de octubre 2023
* Mediante oficio DON-1100-INV-405-2023 el día 5 de diciembre del 2023. se manifiesta un presunto incumplimiento al plazo contractual Sucre 1866.
* Mediante oficio DON-informe-estado-actual-al-convenio-1866-Sucre se comparte el avance en los componentes administrativos, financieros y técnicos del estado del contrato de obra.

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 88 – 20241011 – 20241017

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 88 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DEL 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS GIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO No. 258 | VALOR INICIAL: $ 4,306,911,911.00
FECHA DE INICIO: 16/5/2023 | VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/8/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 4,306,911,911.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024 | VALOR ANTICIPO: $ 1,292,073,573.30
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ 1,292,073,573.30

PRORROGA N°1	1/09/2023	31/10/2023	61 días
PRORROGA N°2	1/11/2023	31/12/2023	61 días
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023		
REINICIO N°1	1/3/2024		
PRORROGA N°3	5/03/2024	3/05/2024	60 días
PRORROGA N°4	4/05/2024	31/05/2024	28 días
PRORROGA N°5	1/6/2024	30/6/2024	30 días
PRORROGA N°6	1/7/2024	30/7/2024	31 días
SUSPENSIÓN N°2	26/7/2024	31/8/2024	37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/9/2024	30/9/2024	30 días
REINICIO N°2	1/10/2024		
PRORROGA N°7	7/10/204	15/12/2024	69 días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CEUS
CONTRATO No. 1100 de 2022 | VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 | VALOR ADICIONES: $ 670,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023 | VALOR ACUMULADO: $ 2,410,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024 | VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024	30/09/2024	30 días
REINICIO 1	1/10/2024		
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4,306,911,911			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,173,591,669			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,133,320,242			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,237,823,778			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 172,489,342			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4,306,911,911.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4,306,500,000.00	99.99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,173,591,669.00	27.25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3,132,908,331.00)	-72.74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,306,500,000.00	99.99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,173,591,669.00	27.25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3,132,908,331.00)	-72.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha se cuenta con un porcentaje programado de 99,99% y un porcentaje ejecutado de 27,25%, por lo tanto se reporta un atraso de 72,74%, basado en el cronograma de actividades entregado por el contratista el día 08 de mayo del 2024 conforme a la suscripción de la adición de tiempo Prorroga N 4. El contratista entrega el cronograma de actividades referente a la prorroga N7 sin embargo se hacen una serie de observaciones que a la fecha del presente documento no se han subsanado.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,237,823,777.98	92.84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,237,823,777.98	92.84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,292,073,573.30
Amortizado $	$ 323,312,433.00
Saldo $	$ 968,761,140.30

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.91
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 99.99%
Meta Física Ejecutada % 27.25%

Avance o Atraso Físico % -72.74%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento rígido	ML	2125	2125	1995	Prog	1995			1995	100.0%
					Ejec	337			337	16.89%
* Alcantarillas	UND	23	23	19	Prog	19			19	100%
					Ejec	15			15	78.95%
* Filtro	ML	1569	1569	1215	Prog	1215			1215	77.4%
					Ejec	857			857	54.6%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibro compactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido, construcción de 23 alcantarillas y 1569 ml de filtro

Ejecutado: A la fecha el contratista cuenta con 15 alcantarillas terminadas, se cuenta con 857 ml de filtro terminados y 337ml de pavimento rígido margen derecha en el sentido del abscisado, se manifiesta que el tramo de pavimento rígido que se presenta no es funcional debido a que no se ha ejecutado en el tramo completo. de esta manera se hace la notación que las cantidades se tiene en cuenta para el porcentaje del avance de obra. para el pago parcial es de recordar que la interventoría enfatiza que no se reconocera para pago las obras que no estan funcionales.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:

Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, vereda Palo Verde, municipios de Patía y Mercaderes	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 - Título minero FVL-161

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencia maquinaria como retroexcavadora, que a la fecha del siguiente reporte, no se ha enviado su documentación según pliego de condiciones y/o anexo, técnico, para su revisión y concepto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante oficio DON-1100-INV-132-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la versión 1 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la primera solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-235-2023 del 17 de agosto, se emiten observaciones a la versión 2 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-278-2023 del 21 de septiembre, se reitera subsanar las observaciones emitidas en el oficio 235.
*Mediante oficio DON-1100-INV-346-2023, del 23 de octubre, se realiza la cuarta solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-394-2023, del 27 de noviembre, se reitera la entrega del PAGA, Subsanando las observaciones emitidas en el oficio 235 del 17 de agosto.
*Mediante oficio DON-1100-INV-416-2023, del 15 de diciembre, se emite el estado actual del contrato y solicitudes al documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-423-2023, del 18 de diciembre, se emiten observaciones a la Versión 3 del documento.
*Mediante oficio DON-1100-INV-644-2024 del 27 de mayo del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA
*Mediante oficio DON-1100-INV-685-2024 del 24 de junio del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA

OBSERVACIONES: *Mediante oficio DON-1100-INV-549-2024 del 01 de abril, se envía segundo solicitud de presunto incumpliendo a la entrega de la documentación del contrato. PAGA

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se aprueban actas de vecindad de inicio, el contratista subsana observaciones realizadas
se aprueba acta de resolución de veeduría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* Elaboración de placas de concreto MR42 por un total de 337,9ml losa margen derecha en el sentido del abscisado.
* No hubo actividades de obra en esta semana, el contratista sustenta que no hay flujo de caja para la compra de los materiales de obra.
* Teniendo en cuenta que se da el reinicio con fecha del 01 de octubre del 2024 se hacen las siguientes precisiones: se solicita la organización de toda la documentación del contrato teniendo en cuenta la fecha de terminación.
* Se solicita que se entregue el cronograma de actividades, plan de contingencia, flujo de caja teniendo en cuenta la prorroga N7.
* Se solicita el reinicio de las actividades dado el tiempo que falta por culminar la vigencia del contrato.
* Se recibe la sollicitud de reinicio y solicitud de prórroga N 7 del contrato, la interventoría envía unas observaciones para subsanar, posteriormente el contratista subsana los documentos, lo que permite a la interventoría dar aval a la solicitud, seguidamente la entidad contratante aprueba la prórroga N7, la cual inicia desde el 7 de octubre del 2024 hasta el 15 de diciembre del 2024.
* Mediante comité en las instalaciones del invias territorial Cauca. entre el contratista, interventoría y municipio de sucre, se mencionnan los siguientes temas: solicitud de reinicio de obra y solicitud de prórroga por parte del contratista, solicitud del flujo de caja, creonograma de actividades y un plan de contingencia teniendo encuenta el tiempo de vigencia del contrato. solicitud de actualización y organización de todos los documentos administrativos que hacen parte del proceso CTO 258 de 28 de octubre del 2022, y por ultimo se menciona que se deben entregar obras funcionales para la continuidad de las solicitudedes de los pagos parciales.
* Se reitera la solicitud de actualizar y organizar las documentación faltante del archivo del contrato, para dar continuidad al los trámites administrativos


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


* Aún no se tiene actividades de obra en campo.
* Se manifiesta que a la fecha no se tiene subsanado el documento cronograma de actividades de obra, ni el flujo de caja correspondiente a la PRORROGA N7.
* Se solicita que se inicien con las actividades de obra teniendo en cuenta la vigencia del contrato.
* El día 14 de octubre del 2024 se cita al contratista a una reunión en la oficina de la interventoría, entre los temas a tratar se hicieron las siguientes precisiones; se solicita que los documentos que estan atrasados y que hacen parte de los tramites del contrato en referencia, sean subsanados, es decir poder ir adelantando de manera perentoria la documentación faltante del archivo del proceso.
por otra parte se solicita que se de continuidad a la ejecución de las obras dado que ya hubo suscripción de prorroga N7 y reinicio de obra con fecha del 01 de octubre del 2024, por ende la interventoría manifiesta que es de importancia que se pueda iniciar con las actividades con el personal que mencionan en el plan de contingencia entregado.
* Adicionalmente la interventoría hace mención que las primeras actividades a realizar en la ejecución de la obra deben estar encaminadas a organizar las obras que han quedado inconclusas como lo es el pavimento rigido instalado.


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


* Entrega del programado de actividades, flujo de caja teniendo en cuenta el prorroga N7 teniendo en cuenta las observaciones mencionadas.
* inicio de las actividades en campo.


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

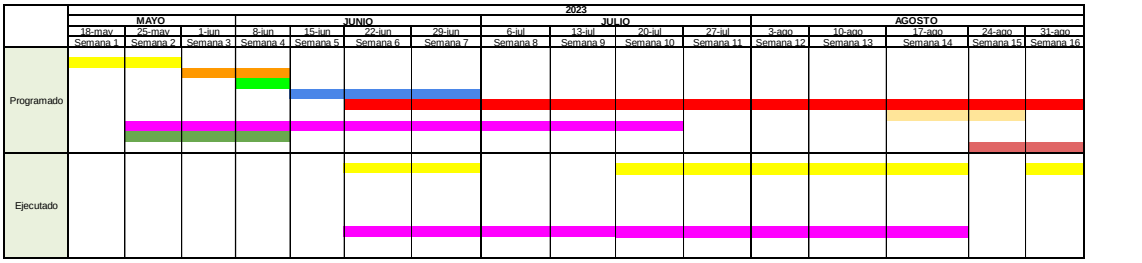

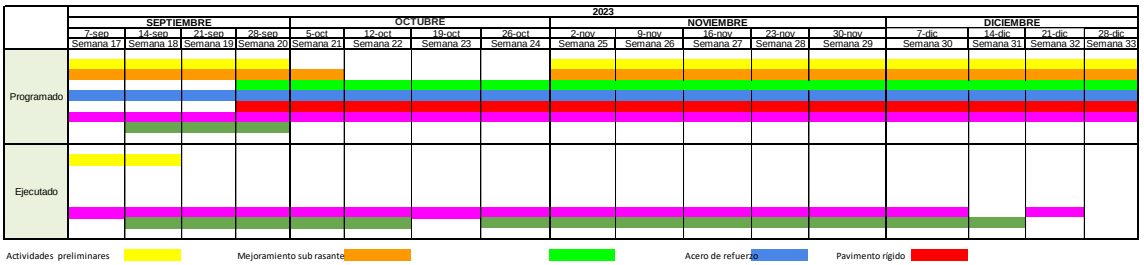

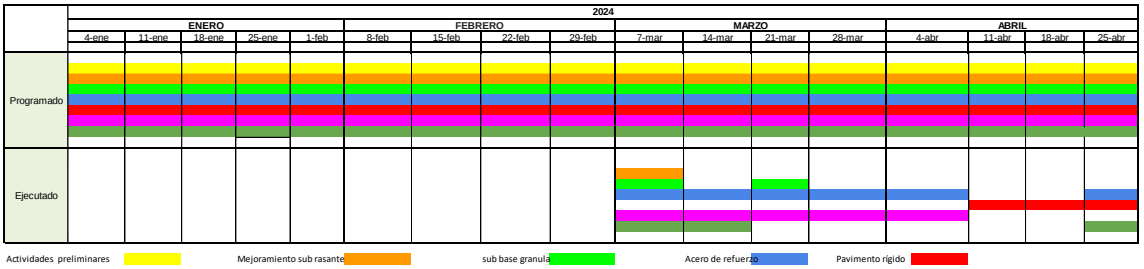

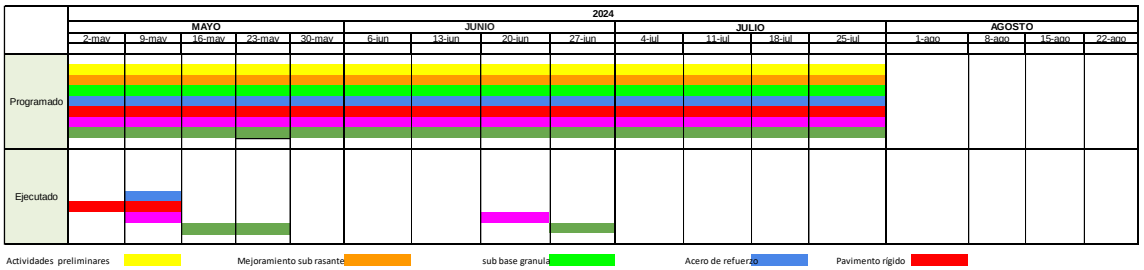

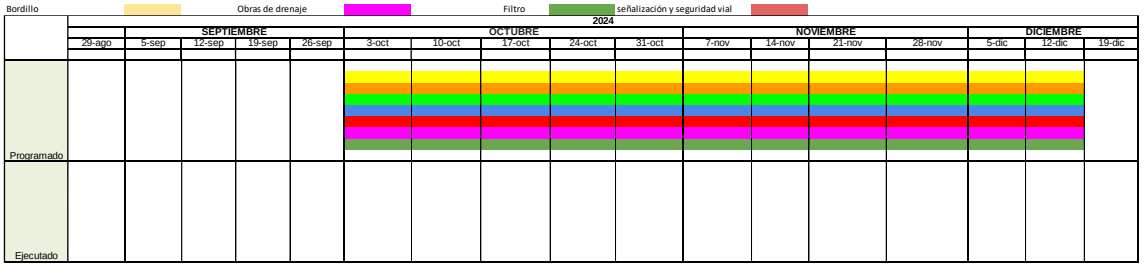

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

*Revisión de programación y flujo de caja PRORROGA N7
*Solicitud de plan de contingencia.
* Solicitud de localización y replanteo del diseño geométrico en la obra
* Seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas en obra, dando cumplimiento a lo establecido en el manual de interventoría de obra pública - instructivo para el seguimiento de la gestión ambiental.
* Mediante inspección realizada el día 22 de noviembre, se hacen una serie se medidas correctivas en las actividades en campo. igualmente se hace reporte del avance de obra y comparativo de lo ejecutado con respecto a lo programado
* Seguimiento al avance semanal de ejecución de obra
* Seguimiento a las obras ejecutadas, estabilidad de la obra
* Mediante oficio DON-1100-INV-232-2023 el día 11 de octubre del 2023, se manifiesta un presunto incumplimiento al plazo contractual contrato No 258 de octubre 2023
* Mediante oficio DON-1100-INV-405-2023 el día 5 de diciembre del 2023. se manifiesta un presunto incumplimiento al plazo contractual Sucre 1866.
* Mediante oficio DON-informe-estado-actual-al-convenio-1866-Sucre se comparte el avance en los componentes administrativos, financieros y técnicos del estado del contrato de obra.

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 89 – 20241018 – 20241024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 28/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 89 (Numeración consecutiva) del 18/10/2024 al 24/10/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DEL 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS GIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO No.: 258 — VALOR INICIAL: $ 4,306,911,911.00
FECHA DE INICIO: 16/5/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/8/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 4,306,911,911.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024 — VALOR ANTICIPO: $ 1,292,073,573.30
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ 1,292,073,573.30

PRORROGA N°1	1/09/2023	31/10/2023	61 días
PRORROGA N°2	1/11/2023	31/12/2023	61 días
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023		
REINICIO N°1	1/3/2024		
PRORROGA N°3	5/03/2024	30/6/2024	60 días
PRORROGA N°4	4/05/2024	31/05/2024	28 días
PRORROGA N°5	1/6/2024	30/6/2024	30 días
PRORROGA N°6	1/7/2024	30/7/2024	31 días
SUSPENSIÓN N°2	29/7/2024	31/8/2024	37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/8/2024	30/9/2024	30 días
REINICIO N°2	1/10/2024		
PRORROGA N°7	7/10/204	15/12/2024	69 días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS.
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CEUS
CONTRATO No.: 1100 de 2022 — VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 — VALOR ADICIONES: $ 670,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023 — VALOR ACUMULADO: $ 2,410,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días
SUSPENSION 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días
AMPLI 1 SUSP 1	1/08/2024	30/09/2024	30 días
REINICIO 1	1/10/2024		
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4,306,911,911			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,173,591,669			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,133,320,242			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,259,384,946			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 150,928,174			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4,306,911,911.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4,306,500,000.00	99.99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,173,591,669.00	27.25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3,132,908,331.00)	-72.74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,306,500,000.00	99.99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,173,591,669.00	27.25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3,132,908,331.00)	-72.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: A la fecha se cuenta con un porcentaje programado de 99,99% y un porcentaje ejecutado de 27,25%, por lo tanto se reporta un atraso de 72,74%, basado en el cronograma de actividades entregado por el contratista el día 08 de mayo del 2024 conforme a la suscripción de la adición de tiempo Prorroga N 4. El contratista entrega el cronograma de actividades referente a la prorroga N7 sin embargo se hacen una serie de observaciones que a la fecha del presente documento no se han subsanado.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,292,073,573.30
Amortizado $	$ 323,312,433.00
Saldo $	$ 968,761,140.30

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.93
Acumulado:	

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA:	$ 2,259,384,945.71	93.74%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 2,259,384,945.71	93.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 99.99%
Meta Física Ejecutada % 27.26%

Avance o Atraso Físico % -72.74%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento rígido	ML	2125	2125	1995	Prog	1995			1995	100.0%
					Ejec	337			337	16.89%
* Alcantarillas	UND	23	23	19	Prog	19			19	100%
					Ejec	15			15	78.95%
* Filtro	ML	1569	1569	1215	Prog	1215			1215	77.4%
					Ejec	857			857	54.6%
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Volqueta 7 m3	2	
Motoniveladora	1	
Retroexcavadora de llantas	1	
Vibro compactador 10 Ton	1	
Carro Tanque Cisterna	1	
Total	**6**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 2125 ml de pavimento rígido, construcción de 23 alcantarillas y 1569 ml de filtro

Ejecutado: A la fecha el contratista cuenta con 15 alcantarillas terminadas, se cuenta con 857 ml de filtro terminados y 337ml de pavimento rígido margen derecha en el sentido del abscisado, se manifiesta que el tramo de pavimento rígido que se presenta no es funcional debido a que no se ha ejecutado en el tramo completo. de esta manera se hace la notación que las cantidades se tiene en cuenta para el porcentaje del avance de obra. para el pago parcial es de recordar que la interventoría enfatiza que no se reconocera para pago las obras que no estan funcionales.

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:

Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, vereda Palo Verde, municipios de Patía y Mercaderes	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Licencia ambiental Resolución 000136 del 23 de abril del 2009 - Título minero FVL-161

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencia maquinaria como retroexcavadora, que a la fecha del siguiente reporte, no se ha enviado su documentación según pliego de condiciones y/o anexo, técnico, para su revisión y concepto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

*Mediante oficio DON-1100-INV-132-2023 del 6 de junio, se emiten observaciones a la versión 1 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-148-2023 del 26 de junio se realiza la primera solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-168-2023 del 07 de julio se realiza la segunda solicitud de documentos socioambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-235-2023 del 17 de agosto, se emiten observaciones a la versión 2 del documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-278-2023 del 21 de septiembre, se reitera subsanar las observaciones emitidas en el oficio 235.
*Mediante oficio DON-1100-INV-346-2023, del 23 de octubre, se realiza la cuarta solicitud de documentos socio ambientales.
*Mediante oficio DON-1100-INV-394-2023, del 27 de noviembre, se reitera la entrega del PAGA, Subsanando las observaciones emitidas en el oficio 235 del 17 de agosto.
*Mediante oficio DON-1100-INV-416-2023, del 15 de diciembre, se emite el estado actual del contrato y solicitudes al documento PAGA.
*Mediante oficio DON-1100-INV-423-2023, del 18 de diciembre, se emiten observaciones a la Versión 3 del documento.
*Mediante oficio DON-1100-INV-644-2024 del 27 de mayo del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA
*Mediante oficio DON-1100-INV-685-2024 del 24 de junio del 2024, se reitera la entrega del documento PAGA
*Mediante oficio DON-1100-INV-765-2024 del 22 de octubre del 2024, se reitera la entrega del documento

OBSERVACIONES: *Mediante oficio DON-1100-INV-549-2024 del 01 de abril, se envía segundo solicitud de presunto incumpliendo a la entrega de la documentación del contrato. PAGA

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se aprueban actas de vecindad de inicio, el contratista subsana observaciones realizadas
se aprueba acta de resolución de veeduría

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* Elaboración de placas de concreto MR42 por un total de 337,9ml losa margen derecha en el sentido del abscisado.
* No hubo actividades de obra en esta semana, el contratista sustenta que no hay flujo de caja para la compra de los materiales de obra.
* Teniendo en cuenta que se da el reinicio con fecha del 01 de octubre del 2024 se hacen las siguientes precisiones: se solicita la organización de toda la documentación del contrato teniendo en cuenta la fecha de terminación.
* Se solicita que se entregue el cronograma de actividades, plan de contingencia, flujo de caja teniendo en cuenta la prorroga N7.
* Se solicita el reinicio de las actividades dado el tiempo que falta por culminar la vigencia del contrato.
* Se recibe la sollicitud de reinicio y solicitud de prórroga N 7 del contrato, la interventoría envía unas observaciones para subsanar, posteriormente el contratista subsana los documentos, lo que permite a la interventoría dar aval a la solicitud, seguidamente la entidad contratante aprueba la prórroga N7, la cual inicia desde el 7 de octubre del 2024 hasta el 15 de diciembre del 2024.
* Mediante comité en las instalaciones del invias territorial Cauca. entre el contratista, interventoría y municipio de sucre, se mencionan los siguientes temas: solicitud de reinicio de obra y solicitud de prórroga por parte del contratista, solicitud del flujo de caja, creonograma de actividades y un plan de contingencia teniendo encuenta el tiempo de vigencia del contrato. solicitud de actualización y organización de todos los documentos administrativos que hacen parte del proceso CTO 258 de 28 de octubre del 2022, y por ultimo se menciona que se deben entregar obras funcionales para la continuidad de las solicitudedes de los pagos parciales.
* Se reitera la solicitud de actualizar y organizar las documentación faltante del archivo del contrato, para dar continuidad al los trámitres administrativos
* El día 14 de octubre del 2024 se cita al contratista a una reunión en la oficina de la interventoría, entre los temas a tratar se hicieron las siguientes precisiones; se solicita que los documentos que estan atrasados y que hacen parte de los tramites del contrato en referencia, sean subsanados, es decir poder ir adelantando de manera perentoria la documentación faltante del archivio del proceso.
por otra parte se solicita que se de continuidad a la ejecución de las obras dado que ya hubo suscripción de prorroga N7 y reinicio de obra con fecha del 01 de octubre del 2024, por ende la interventoría manifiesta que es de importancia que se pueda iniciar con las actividades con el personal que mencionan en el plan de contingencia entregado.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


* Aún no se tiene actividades de obra en campo.
* Se manifiesta que a la fecha no se tiene subsanado el documento cronograma de actividades de obra, ni el flujo de caja correspondiente a la PRORROGA N7.
* Se solicita que se inicien con las actividades de obra teniendo en cuenta la vigencia del contrato.
* Adicionalmente la interventoría hace mención que las primeras actividades a realizar en la ejecución de la obra deben estar encaminadas a organizar las obras que han quedado inconclusas como lo es el pavimento rigido instalado.
* De acuerdo con los últimos compromisos pactados en la reunión con el INVIAS, se presenta el siguiente avance: a la fecha, los documentos solicitados a la interventoría han sido subsanados y entregados a la entidad contratante. Asimismo, se solicitó al contratista la corrección de los documentos requeridos por el municipio. Sin embargo, se realizaron algunas observaciones adicionales sobre los documentos entregados, las cuales deben ser corregidas; hasta la fecha, los documentos subsanados aún no han sido entregados.
* El día 25 de octubre se da aval a la solicitud de pago ORDEN DE GIRO No 3 TRANSPORTE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLES, se esta a la espera a la aprobación en la plataforma Alianza.
* El día 25 de octubre del 2024 mediante correo electrónico se solicita entrega del cronograma de actividades, flujo de caja y diagrama de gantt respecto a la Prorroga N7

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Entrega del programado de actividades, flujo de caja teniendo en cuenta el prorroga N7 teniendo en cuenta las observaciones mencionadas.
* inicio de las actividades en campo, teniendo en cuenta el tiempo de vigencia del contrato y a las condiciones propuestas en el plan de contingencia entregado.
* Inicio de la fundición del tramo de pavimento iniciado, terminación de las dos tres alcantarillas faltantes.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

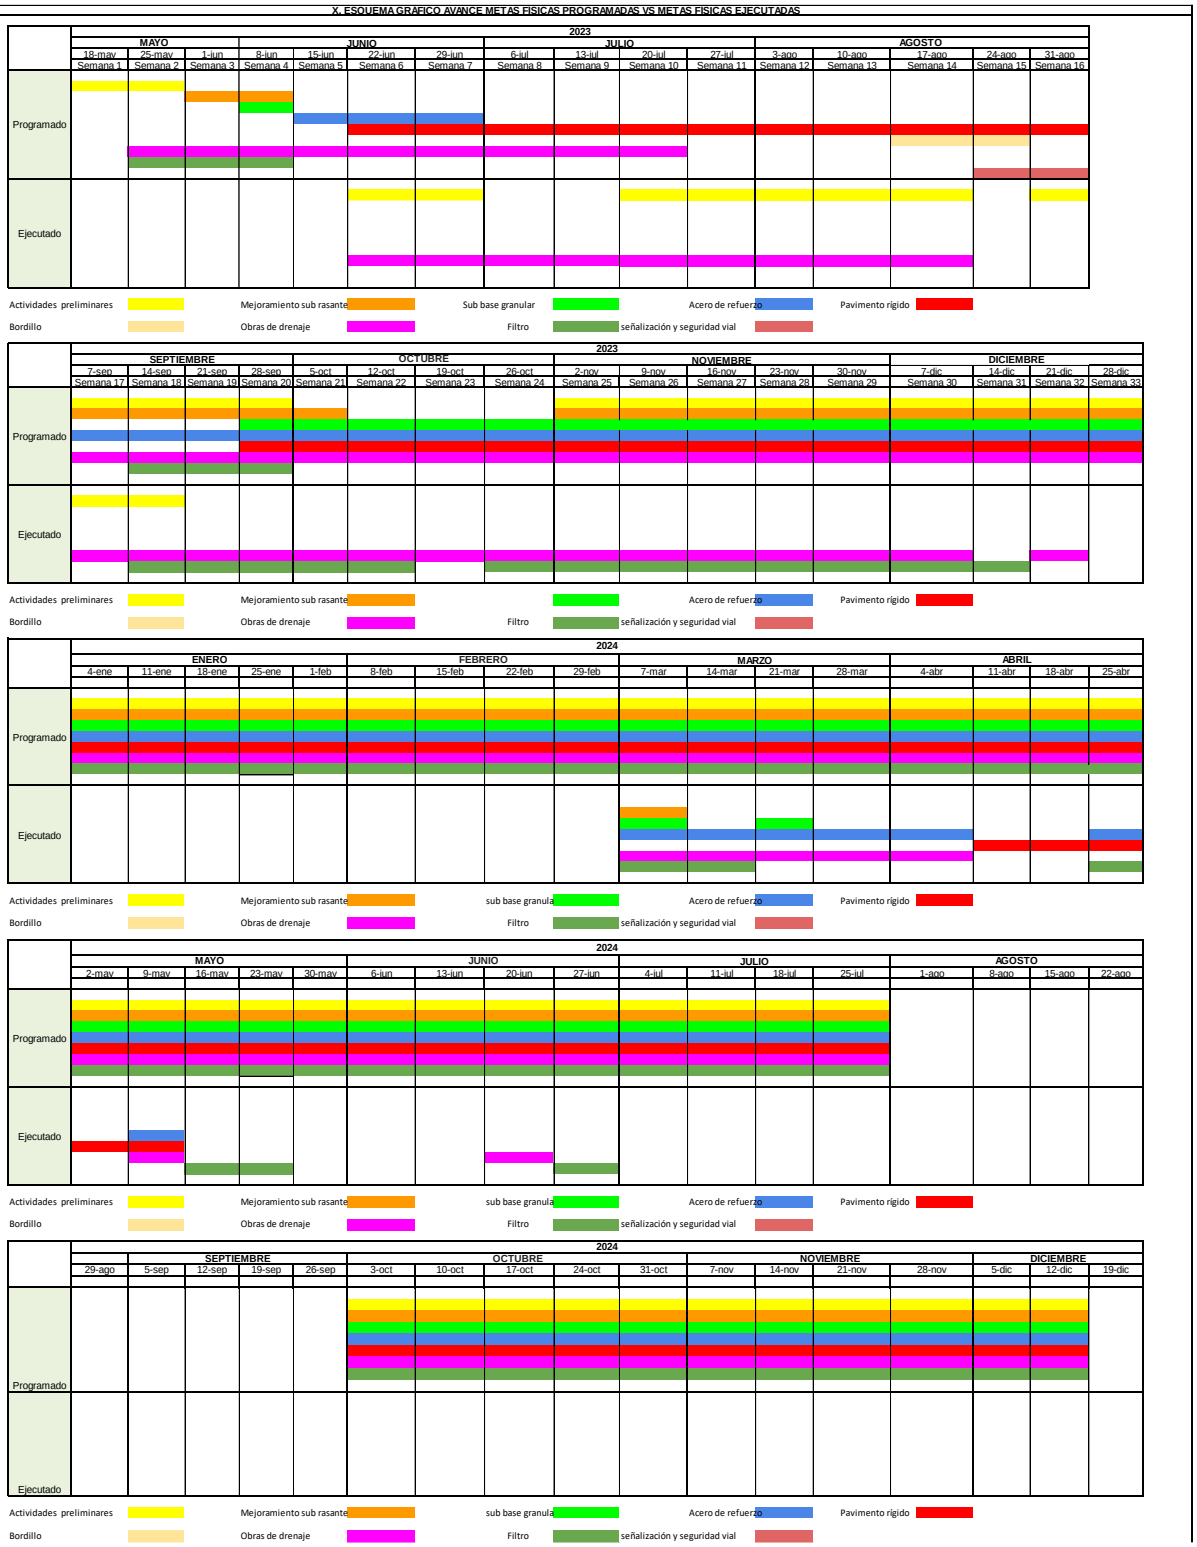

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024	

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







*Revisión de programación y flujo de caja PRORROGA N7
*Solicitud de plan de contingencia.
* Solicitud de localización y replanteo del diseño geométrico en la obra
* Seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas en obra, dando cumplimiento a lo establecido en el manual de interventoría de obra pública - instructivo para el seguimiento de la gestión ambiental.
* Mediante inspección realizada el día 22 de noviembre, se hacen una serie se medidas correctivas en las actividades en campo. igualmente se hace reporte del avance de obra y comparativo de lo ejecutado con respecto a lo programado
* Seguimiento al avance semanal de ejecución de obra
* Seguimiento a las obras ejecutadas, estabilidad de la obra
* Mediante oficio DON-1100-INV-232-2023 el día 11 de octubre del 2023, se manifiesta un presunto incumplimiento al plazo contractual contrato No 258 de octubre 2023
* Mediante oficio DON-1100-INV-405-2023 el día 5 de diciembre del 2023. se manifiesta un presunto incumplimiento al plazo contractual Sucre 1866.
* Mediante oficio DON-informe-estado-actual-al-convenio-1866-Sucre se comparte el avance en los componentes administrativos, financieros y técnicos del estado del contrato de obra.

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ

Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 90 – 20241025 - 20241031

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4
		FECHA	4/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 90 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DEL 2021.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 23 Alcantarillas en tubos de concreto reforzado de 36", construcción de 2125 metros de pavimento rígido de 19 cm de espesor y 5.5 metros de ancho promedio.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Las veredas Quiteto, Crucero, Bello, la Granja y veredas pertenecientes al Paraíso, se verán beneficiadas con la recuperación de estructuras de drenaje existentes, pavimento rígido, construcción de nuevas alcantarillas y señalización vial que dará mayor seguridad a los habitantes que transiten el corredor vial.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSTRUOBRAS GIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL:	PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO No.	258
FECHA DE INICIO:	16/5/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/8/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024
VALOR INICIAL:	$ 4,306,911,911.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 4,306,911,911.00
VALOR ANTICIPO:	$ 1,292,073,573.30
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,292,073,573.30

PRORROGA N°1	1/09/2023	31/10/2023	61 días
PRORROGA N°2	1/11/2023	31/12/2023	61 días
SUSPENSIÓN N°1	28/12/2023		
REINICIO N°1	1/3/2024		
PRORROGA N°3	5/03/2024	3/05/2024	60 días
PRORROGA N°4	4/05/2024	31/05/2024	28 días
PRORROGA N°5	1/6/2024	30/6/2024	30 días
PRORROGA N°6	1/7/2024	30/7/2024	31 días
SUSPENSIÓN N°2	29/7/2024	31/8/2024	37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 2	1/9/2024	30/9/2024	30 días
REINICIO N°2	1/10/2024		
PRORROGA N°7	7/10/204	15/12/2024	69 días

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.	1100 de 2022
FECHA DE INICIO:	12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024
VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ 670,000,000.00
VALOR ACUMULADO:	$ 2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024	30/09/2024	30 días
REINICIO 1	1/10/2024		
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 4,306,911,911			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 1,173,591,669			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 3,133,320,242			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,280,946,113			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 129,367,007			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 4,306,911,911.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 4,306,500,000.00	99.99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 1,173,591,669.00	27.25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3,132,908,331.00)	-72.74%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 4,306,500,000.00	99.99%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1,173,591,669.00	27.25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3,132,908,331.00)	-72.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	0.00%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha se cuenta con un porcentaje programado de 99,99% y un porcentaje ejecutado de 27,25%, por lo tanto se reporta un atraso de 72,74%, basado en el cronograma de actividades entregado por el contratista el día 08 de mayo del 2024 conforme a la suscripción de la adición de tiempo Prorroga N 4. El contratista entrega el cronograma de actividades referente a la prorroga N7 sin embargo se hacen una serie de observaciones que a la fecha del presente documento no se han subsanado.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,280,946,113.44	94.63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,280,946,113.44	94.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-UVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoria por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 1,292,073,573.30
Amortizado $	$ 323,312,433.00
Saldo $	$ 968,761,140.30

INDICADOR I/C	
En el mes:	1.94
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

4.1.3 SUCRE 1769 – CAUCA

- Informe Semanal 86 - 20241001 – 20241003

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 86 (Numeración consecutiva) del 1/10/2024 al 3/10/2024 — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolívar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO SUCRE 22				
REPRESENTANTE LEGAL:	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO				
CONSORCIADOS	JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO (90%) YANETH STELLA AVIRAMA PAZ (10%)				
CONTRATO No.	1P-090-2022	VALOR INICIAL:	$ 1,065,446,290.00		
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	16/9/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,065,446,290.00		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 319,633,887.00		
PRORROGA N°1	17/09/2023 31/10/2023 45 días	VALOR AMORTIZADO:	$ -		
MODIFICACIÓN 1	17/5/2023 Valor del contrato	SALDO POR AMORTIZAR:	$ 319,633,887.00		
PRORROGA N°2	1/11/2023 31/12/2023 61 días				
SUSPENSIÓN N°1	21/12/2023				
REINICIO N°1	14/2/2024				
PRORROGA N°3	25/02/2024 24/04/2024 60 días				
SUSPENSIÓN N°2	23/4/2024 29/5/2024 37 días				
REINICIO N°2	30/5/2024				
PRORROGA N°4	01/06/2024 30/6/2024 30 días				
PRORROGA N°5	01/07/2024 30/7/2024 31 días				
SUSPENSIÓN N°3	29/7/2024 31/8/2024 37 días				
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 3	1/9/2024 30/9/2024 30 días				
REINICIO N°3	1/10/2024				
PRORROGA N°6	7/10/204 15/12/2024 69 días				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS				
REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS				
CONTRATO No.	1100 de 2022			VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022			VALOR ADICIONES:	$ 670,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 2,410,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024			VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA 1	01/11/2023 31/12/2023	61 días		VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA 2	01/01/2024 31/05/2024	151 días		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA 3	01/06/2024 30/06/2024	30 días			
PRORROGA 4	01/07/2024 31/07/2024	31 días			
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024 31/08/2024	34 días			
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024 30/09/2024	30 días			
REINICIO 1	1/10/2024				
PRORROGA 5	04/10/2024 15/12/2024	73 días			

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 568,900,828			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 496,545,462			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,194,701,443			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,611,677			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,065,446,290.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 596,969,556.29	56.03%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 568,900,827.71	53.40%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (28,068,728.58)	-2.63%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		56.03%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 568,900,827.71	53.40%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (28,068,728.58)	-2.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ (425,858,881.71)	0.76%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14,114,485.60	1.32%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

##

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Observaciones: Acta de inicio del 16 de mayo de 2023
En el sitio de la obra el contratista esta ejecutando corte y figurado de acero de acuerdo a los diseños entregados por el municipio.
Se tiene un porcentaje programado de 56,03% y un ejecutado de 53,40% correspondiente a excavaciones de material y extensión de subbase, suministro, figurado de acero, fundición de concreto generando un atraso de -2,63%
El contrato se reinicia el día 01 de octubre de 2023, y de acuerdo a la programación entregada por el contratista se ajusta el porcentaje programado.

1022828438
543865381 3

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,194,701,442.53	91.05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,194,701,442.53	91.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 319,633,887.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 319,633,887.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 56.03%
Meta Física Ejecutada % 53.40%
Avance o Atraso Físico % -2.63%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	506			Prog	506			506	100.0%
					Ejec	160			160	31.62%
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
					Ejec	4			4	100.0%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	1
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36"
Ejecutado: Construcción de 4 alcantarillas y 160ml de placa huella

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, municipio de Mercaderes y Patía , Cauca	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 9002 del 19 de mayo del 2016 - ASAREGA
Título minero: IHH-14591

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencia maquinaria como vibrocompactador y volqueta, que a la fecha del siguiente reporte, no se ha enviado su documentación según pliego de condiciones y/o anexo, técnico, para su revisión y conce pto.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **APROBADO,** mediante oficio DON-1100-INV-703-2024 del 18 de julio, se emite concepto favorable al documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-065923.
De manera extemporánea, según lo establecido contractualmente y superando el 15% del total del tiempo de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	11	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 17

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-550-2023,, se envía tercera solicitud de presunto incumpliendo a la entrega de la documentación del contrato.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* El contratista empieza con la excavación de la subrasante para llegar a los niveles de diseño con el fin de comenzar a construir la estructura necesaria que soporta la placa huella.
* El contratista empieza con el acopio de subbase necesaria para la construcción de la estructura que soportará la placa huella.
* Se comienza con la extensión y compactación de subbase desde la K0+700 hasta k0+600 aproximadamente
* El contratista envía solicitud de suspensión el día 20 de diciembre, la cual la interventoría analiza y responde con concepto favorable el día 21 de diciembre de 2023, quedando a la espera del acta de suspensión por parte del municipio de sucre.
* Una vez reiniciado el contrato desde el 14 de febrero de 2024, se solicita al contratista adelantar trabajos para la liberación del tramo de subbase, para proceder con la fundición de concreto, pues según plan de contingencia debe fundir 73,5 metros lineales por semana.
* Se realiza la liberación de un tramo de 180 metros de sub base, el contratista entrega densidades tomadas en sitio por el laboratorio P&M ESTUDIOS SAS.
* Las fuertes lluvias ocasionaron que la capa de subbase sufriera daños, a los cuales se deberán hacer los arreglos pertinentes para la posterior instalación de concreto ciclópeo y reforzado de la placa huella.
* Se realiza la fundición de 10 franjas de ciclópeo central de 0.90m y 20 franjas de concreto ciclópeo de 0.15m de espesor entre la abscisa Km 0+531,06-Km0+500
* El contratista realiza actividades de fundición de concreto, instalación de acero, se realizan actividades de fundición desde la K0+640 al K0+560.
* Instalación de la sub base granular en 100 ml de tramo aproximadamente


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
Se realizan actividades de la abscisa K0+540 a la K0+525


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


1, Cumplir con el plan de choque con el tal de cumplir las metas propuestas inicialmente.
2, Seguir con la construccion de la placa huella en todos sus componentes, acero de refuerzo, concreto ciclopeo, concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

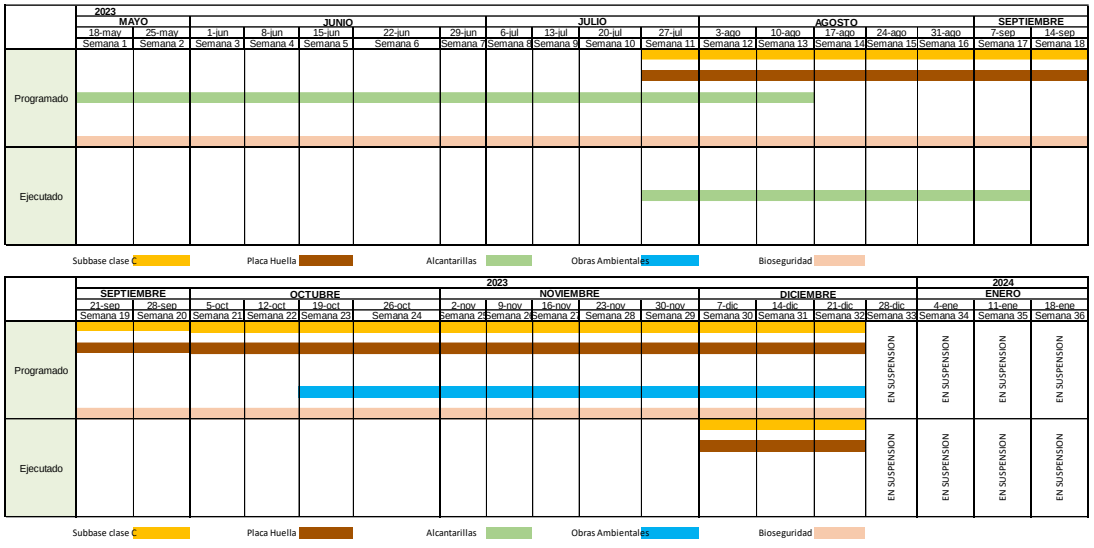

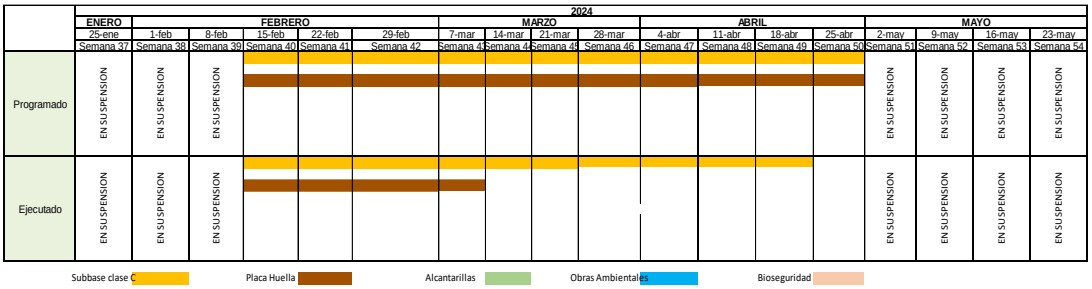

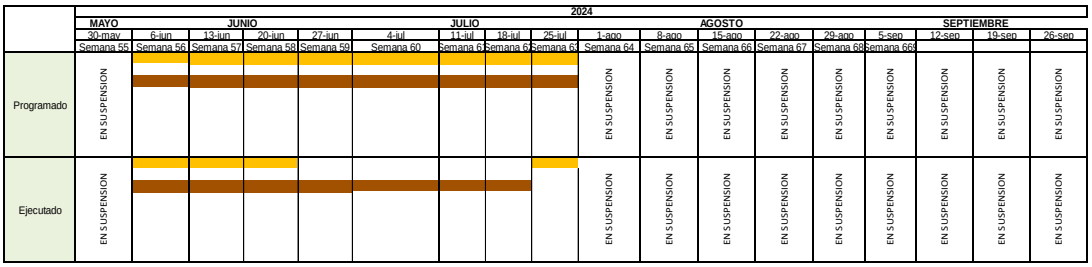

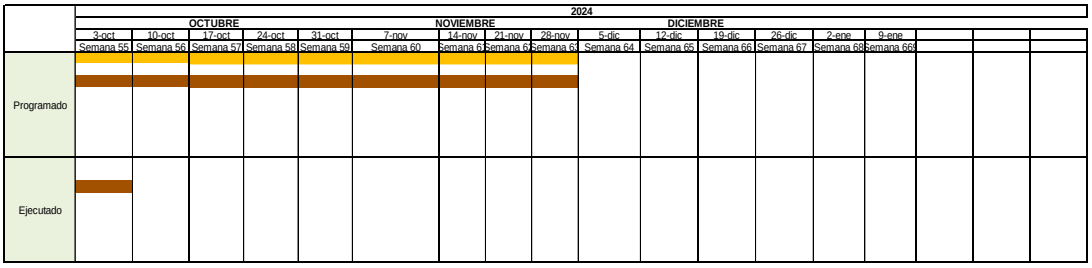

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDICION DE HUELLA EN CONCRETO REFORZADO



TRAMO TERMINADO



TRAMO TERMINADO

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificar cantidades, diseños y correcta ejecución de las actividades.
Revisión de documentación al contratista.
Realizar comités de obra mensuales en la territorial invitas para informar de primera mano al supervisor del estado actual del contrato.
* Seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas en obra, dando cumplimiento a lo establecido en el manual de interventoría de obra pública - instructivo para el seguimiento de la gestión ambiental.
Seguimiento a las actividades sociales implementadas en obra.
*El contratista allega el balance de obra con cantidades e ítems no previstos necesarios para la correcta ejecución de la obra, se recibe y se empieza con la revisión de estos por parte de la interventoría.
*Se continua en reunión con el contratista para terminar de definir cantidades, e ítems reales necesarios para la ejecución de la obra.
*En inspección por parte de la interventoría se recomienda al contratista chequear niveles de subrasante para garantizar el diseño geométrico propuesto por el municipio.
*La interventoría revisa la solicitud de suspensión del contratista la cual aprueba desde la fecha 21 de diciembre de 2023.
*El contrato de obra se encuentra suspendido, se adelantaron comités presenciales en la territorial INVIAS Cauca para dar celeridad al reinicio del contrato de obra.
*Se envía un informe al municipio con el estado detallado del contrato en los ámbitos, financieros, técnicos, ambientales y sociales de todas las actividades desarrolladas por el contratista en todo el tiempo de ejecución.
*Se solicita al contratista las pólizas actualizadas de acuerdo a la prorroga 4 que amplia el plazo contractual 60 días.
*Se recuerda al contratista que el seguimiento del plan de contingencia, de acuerdo a directrices del municipio se realiza semanalmente.
* Se recomienda al contratista realizar las respectivas densidades de campo para la posterior liberación del tramo.
*Se reciben por parte de interventoría un tramos de 180 metros de sub base con un espesor de 15cm y ancho de 5 metros para la posterior construcción de la placa.
*Se solicita al contratista en comité de seguimiento realizado en la territorial INVIAS, hacer estricto cumplimiento del plan de contingencia entregado, para poder cumplir con la entrega de la obra al fin del plazo contractual.
*Se da tramite al acta parcial 1 presentada por el contratista.
*Mediante el oficio DON-1100-INV-584-2024 se da traslado al municipio para que realice los trámites pertinentes en caso de aceptar la solicitud de suspensión elevada por el contratista de obra.
*Mediante el oficio DON-1100-INV-593-2024, se da el aval por parte de interventoría para la suspensión del contrato, se esta a la espera de que el municipio elabore el documento.
*El contrato se encuentra fue reiniciado el 30 de mayo de 20245
*Se realiza modificatorio 5 que amplia el plazo hasta el 30 de junio de 2024,
*Se realiza modificatorio 6 que amplia el plazo hasta el 31 de julio de 2024,
* Se suspende el contrato el 26 de julio de 2024
*Se reinicia el contrato el dia 01 de octubre de 2024,

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ

Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 87 - 20241004 – 20241010

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 87 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolivar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONSORCIADOS: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO (90%); YANETH STELLA AVIRAMA PAZ (10%)
CONTRATO No.: LP-090-2023
FECHA DE INICIO: 16 DE MAYO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 16/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

PRORROGA N°1	17/09/2023	31/10/2023	45 días
MODIFICACIÓN 1		17/5/2023	Valor del contrato
PRORROGA N°2	1/11/2023	31/12/2023	61 días
SUSPENSIÓN N°1		21/12/2023	
REINICIO N°1		14/2/2024	
PRORROGA N°3	25/03/2024	24/04/2024	60 días
SUSPENSIÓN N°2		23/4/2024	23/5/2024 17 días
REINICIO N°2		30/5/2024	
PRORROGA N°4	01/06/2024	30/6/2024	30 días
PRORROGA N°5	01/07/2024	30/7/2024	31 días
SUSPENSIÓN N°3		26/7/2024	31/8/2024 37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 3		1/9/2024	30/9/2024 30 días
REINICIO N°3		1/10/2024	
PRORROGA N°6		7/10/2024	15/12/2024 69 días

VALOR INICIAL:	$	1,065,446,290.00
VALOR ADICIONES:	$	-
VALOR ACUMULADO:	$	1,065,446,290.00
VALOR ANTICIPO:	$	319,633,887.00
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	319,633,887.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.: 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024	30/09/2024	30 días
REINICIO 1		1/10/2024	
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días

VALOR INICIAL:	$	1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$	670,000,000.00
VALOR ACUMULADO:	$	2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR AMORTIZADO:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:	$	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 625,358,770			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 440,087,520			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,216,262,610			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194,050,510			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	1,065,446,290.00
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 613,270,884.52	57.56%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 625,358,770.11	58.69%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 12,087,885.59	1.13%
		%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:		57.56%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 625,358,770.11	58.69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 12,087,885.59	1.13%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16,301,328.24	1.53%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 56,457,942.40	5.30%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

##

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:Observaciones: Acta de inicio del 16 de mayo de 2023
En el sitio de la obra el contratista esta ejecutando corte y figurado de acero de acuerdo a los diseños entregados por el municipio.
Se tiene un porcentaje programado de 57,56% y un ejecutado de 58,69% correspondiente a excavaciones de material y extensión de subbase, suministro, figurado de acero, fundición de concreto generando un avance de 1,13%
El contrato se reinicia el día 01 de octubre de 2023, y de acuerdo a la programación entregada por el contratista se ajusta el porcentaje programado.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,216,262,610.25	91.95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,216,262,610.25	91.95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoria por concepto de aprobación ingreso de director de interventoria, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	319,633,887.00
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	319,633,887.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS		
Otorgado $	$	-
Amortizado $	$	-
Saldo $	$	-

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 57,56%
Meta Física Ejecutada % 58,69%
Avance o Atraso Físico % 1,13%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	506			Prog	506			506	100.0%
						Ejec	200			200	39.53%
*	Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
						Ejec	4			4	100.0%
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	1
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	7	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36"
Ejecutado: Construcción de 4 alcantarillas y 200ml de placa huella
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, municipio de Mercaderes y Patía , Cauca	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 9002 del 19 de mayo del 2016 - ASAREGA
Título minero: IHH-14591

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencia maquinaria como vibrocompactador y volqueta, que a la fecha del siguiente reporte, no se ha enviado su documentación según pliego de condiciones y/o anexo, técnico, para su revisión y concepto.

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **APROBADO,** mediante oficio DON-1100-INV-703-2024 del 18 de julio, se emite concepto favorable al documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-065923.
De manera extemporánea, según lo establecido contractualmente y superando el 15% del total del tiempo de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-550-2023,, se envía tercera solicitud de presunto incumpliendo a la entrega de la documentación del contrato.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* El contratista empieza con la excavación de la subrasante para llegar a los niveles de diseño con el fin de comenzar a construir la estructura necesaria que soporta la placa huella.
* El contratista empieza con el acopio de subbase necesaria para la construcción de la estructura que soportará la placa huella.
* Se comienza con la extensión y compactación de subbase desde la K0+700 hasta k0+600 aproximadamente
* El contratista envía solicitud de suspensión el día 20 de diciembre, la cual la interventoría analiza y responde con concepto favorable el día 21 de diciembre de 2023, quedando a la espera del acta de suspensión por parte del municipio de sucre.
* Una vez reiniciado el contrato desde el 14 de febrero de 2024, se solicita al contratista adelantar trabajos para la liberación del tramo de subbase, para proceder con la fundición de concreto, pues según plan de contingencia debe fundir 73,5 metros lineales por semana.
* Se realiza la liberación de un tramo de 180 metros de sub base, el contratista entrega densidades tomadas en sitio por el laboratorio P&M ESTUDIOS SAS.
* Las fuertes lluvias ocasionaron que la capa de subbase sufriera daños, a los cuales se deberán hacer los arreglos pertinentes para la posterior instalación de concreto ciclópeo y reforzado de la placa huella.
* Se realiza la fundición de 10 franjas de ciclópeo central de 0.90m y 20 franjas de concreto ciclópeo de 0.15m de espesor entre la abscisa Km 0+531,06-Km0+500
* El contratista realiza actividades de fundición de concreto, instalación de acero, se realizan actividades de fundición desde la K0+640 al K0+560.
* Instalación de la sub base granular en 100 ml de tramo aproximadamente


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
Se realizan actividades de la abscisa K0+525 a la K0+485


IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, Cumplir con el plan de choque con el tal de cumplir las metas propuestas inicialmente.
2, Seguir con la construccion de la placa huella en todos sus componentes, acero de refuerzo, concreto ciclopeo, concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

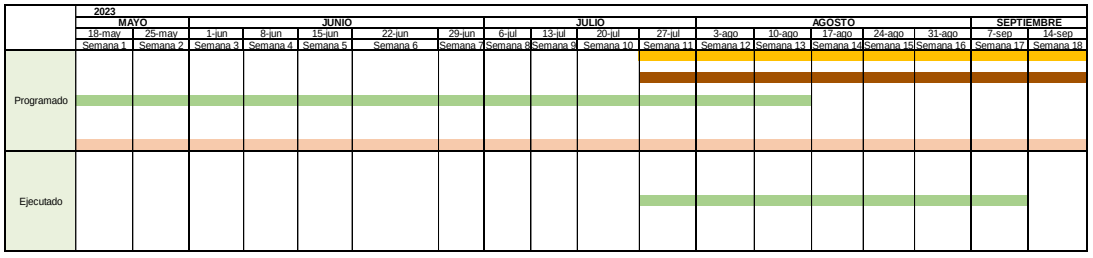


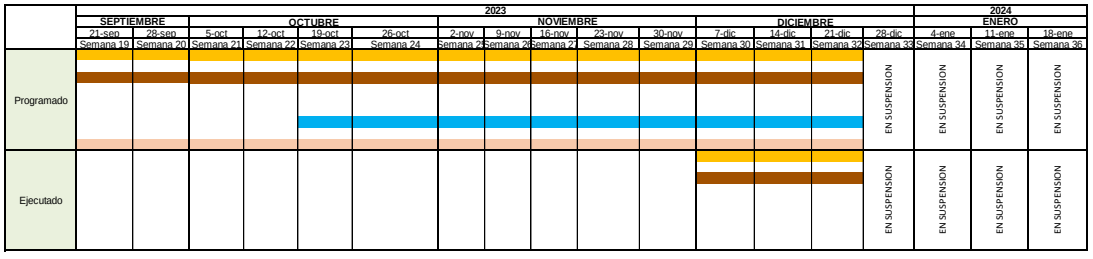


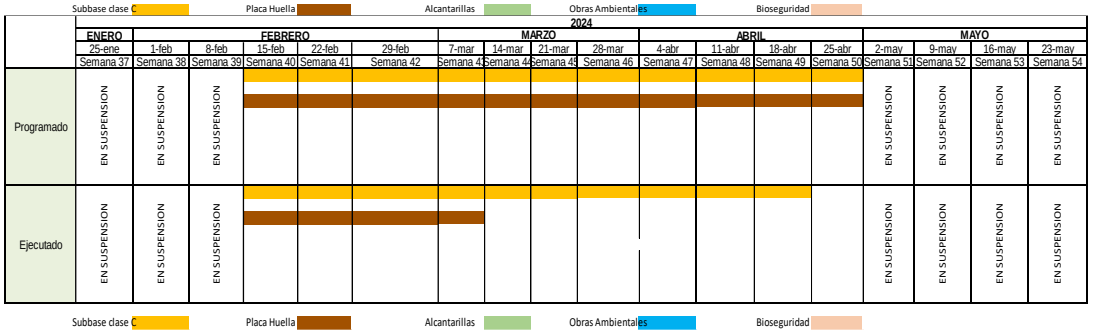

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ELABORO

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
APROBÓ

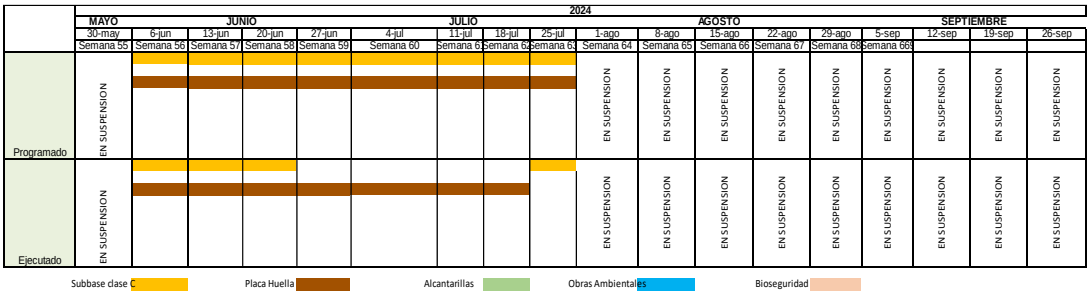

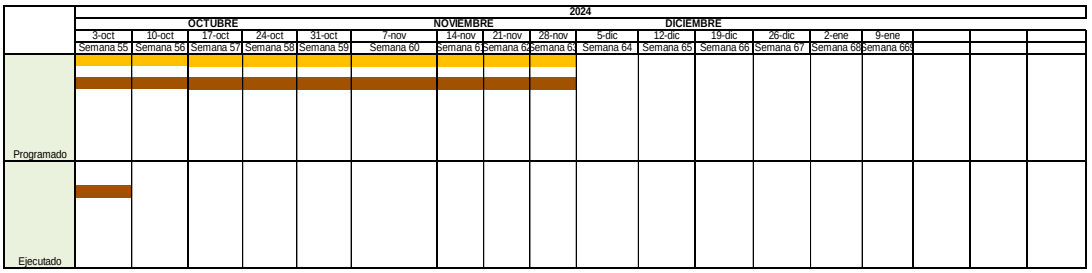

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACIOND E ACERO



FUNDICION DE CONCRETO



CHEQUEO ESPESOR PLACA DE CONCRETO

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Continuar seguimiento de actividades de obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contratista, verificar cantidades, diseños y correcta ejecución de las actividades.
Revisión de documentación al contratista.
Realizar comités de obra mensuales en la territorial invitas para informar de primera mano al supervisor del estado actual del contrato.
* Seguimiento a las medidas de manejo ambiental implementadas en obra, dando cumplimiento a lo establecido en el manual de interventoría de obra pública - instructivo para el seguimiento de la gestión ambiental.
Seguimiento a las actividades sociales implementadas en obra.
*El contratista allega el balance de obra con cantidades e ítems no previstos necesarios para la correcta ejecución de la obra, se recibe y se empieza con la revisión de estos por parte de la interventoría.
*Se continua en reunión con el contratista para terminar de definir cantidades, e ítems reales necesarios para la ejecución de la obra.
*En inspección por parte de la interventoría se recomienda al contratista chequear niveles de subrasante para garantizar el diseño geométrico propuesto por el municipio.
*La interventoría revisa la solicitud de suspensión del contratista la cual aprueba desde la fecha 21 de diciembre de 2023.
*El contrato de obra se encuentra suspendido, se adelantaron comités presenciales en la territorial INVIAS Cauca para dar celeridad al reinicio del contrato de obra.
*Se envía un informe al municipio con el estado detallado del contrato en los ámbitos, financieros, técnicos, ambientales y sociales de todas las actividades desarrolladas por el contratista en todo el tiempo de ejecución.
*Se solicita al contratista las pólizas actualizadas de acuerdo a la prorroga 4 que amplia el plazo contractual 60 días.
*Se recuerda al contratista que el seguimiento del plan de contingencia, de acuerdo a directrices del municipio se realiza semanalmente.
* Se recomienda al contratista realizar las respectivas densidades de campo para la posterior liberación del tramo.
*Se reciben por parte de interventoría un tramos de 180 metros de sub base con un espesor de 15cm y ancho de 5 metros para la posterior construcción de la placa.
*Se solicita al contratista en comité de seguimiento realizado en la territorial INVIAS, hacer estricto cumplimiento del plan de contingencia entregado, para poder cumplir con la entrega de la obra al fin del plazo contractual.
*Se da tramite al acta parcial 1 presentada por el contratista.
*Mediante el oficio DON-1100-INV-584-2024 se da traslado al municipio para que realice los trámites pertinentes en caso de aceptar la solicitud de suspensión elevada por el contratista de obra.
*Mediante el oficio DON-1100-INV-593-2024, se da el aval por parte de interventoría para la suspensión del contrato, se esta a la espera de que el municipio elabore el documento.
*El contrato se encuentra fue reiniciado el 30 de mayo de 20245
*Se realiza modificatorio 5 que amplia el plazo hasta el 30 de junio de 2024,
*Se realiza modificatorio 6 que amplia el plazo hasta el 31 de julio de 2024,
* Se suspende el contrato el 26 de julio de 2024
*Se reinicia el contrato el dia 01 de octubre de 2024,
*Mediante el oficio DON-1100-INV-751-2024 se da el traslado y aval de la prorropga hasta el 15 de diciembre de 2024,

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ

Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 88 – 20241011 – 20241017

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 21/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 88 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolivar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONSORCIADOS: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO (90%); YANETH STELLA AVIRAMA PAZ (10%)
CONTRATO No. LP-090-2023
FECHA DE INICIO: 16 DE MAYO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 18/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

PRORROGA N°1	17/09/2023	31/10/2023	45 días	
MODIFICACIÓN 1		17/5/2023		Valor del contrato
PRORROGA N°2	1/11/2023	31/12/2023	61 días	
SUSPENSIÓN N°1		21/12/2023		
REINICIO N°1		14/2/2024		
PRORROGA N°3	25/02/2024	24/04/2024	60 días	
SUSPENSIÓN N°2	23/4/2024	29/5/2024	37 días	
REINICIO N°2		30/5/2024		
PRORROGA N°4	01/06/2024	30/6/2024	30 días	
PRORROGA N°5	01/07/2024	30/7/2024	31 días	
SUSPENSIÓN N°3	26/7/2024	31/8/2024	37 días	
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 3	1/9/2024	30/9/2024	30 días	
REINICIO N°3	1/10/2024			
PRORROGA N°6	7/10/204	15/12/2024	69 días	

VALOR INICIAL:	$ 1,065,446,290.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,065,446,290.00
VALOR ANTICIPO:	$ 319,633,887.00
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 319,633,887.00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No. 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024

PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días	
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días	
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días	
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días	
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días	
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024	30/09/2024	30 días	
REINICIO 1		1/10/2024		
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días	

VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ 670,000,000.00
VALOR ACUMULADO:	$ 2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 695,931,198			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 369,515,092			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,237,823,778			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 172,489,342			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,065,446,290.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 670,165,716.41	62.90%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 695,931,198.11	65.32%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 25,765,481.70	2.42%
		%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:		62.90%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 695,931,198.11	65.32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 25,765,481.70	2.42%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 57,001,376.52	5.35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 70,572,428.00	6.62%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

##

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Observaciones: Acta de inicio del 16 de mayo de 2023
En el sitio de la obra el contratista esta ejecutando corte y figurado de acero de acuerdo a los diseños entregados por el municipio.
Se tiene un porcentaje programado de 62,90% y un ejecutado de 65,32% correspondiente a excavaciones de material y extensión de subbase, suministro, figurado de acero, fundición de concreto generando un avance de 2,42%
El contrato se reinicia el día 01 de octubre de 2023, y de acuerdo a la programación entregada por el contratista se ajusta el porcentaje programado.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,237,823,777.98	92.84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,237,823,777.98	92.84%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 319,633,887.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 319,633,887.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62.90%
Meta Física Ejecutada % 65.32%
Avance o Atraso Físico % 2.42%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base				Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
*	Placa Huella	ML	506			Prog	506			506	100.0%
						Ejec	250			250	49.41%
*	Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
						Ejec	4			4	100.0%
*											
*											

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36
Ejecutado: Construcción de 4 alcantarillas y 250ml de placa huella
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	1
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, municipio de Mercaderes y Patía , Cauca	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 9002 del 19 de mayo del 2016 - ASAREGA
Título minero: IHH-14591

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencia maquinaria como vibrocompactador y volqueta, que a la fecha del siguiente reporte, no se ha enviado su documentación según pliego de condiciones y/o anexo, técnico, para su revisión y concepto.

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **APROBADO,** mediante oficio DON-1100-INV-703-2024 del 18 de julio, se emite concepto favorable al documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-065923.
De manera extemporánea, según lo establecido contractualmente y superando el 15% del total del tiempo de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-550-2023,, se envía tercera solicitud de presunto incumpliendo a la entrega de la documentación del contrato.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* El contratista empieza con la excavación de la subrasante para llegar a los niveles de diseño con el fin de comenzar a construir la estructura necesaria que soporta la placa huella.
* El contratista empieza con el acopio de subbase necesaria para la construcción de la estructura que soportará la placa huella.
* Se comienza con la extensión y compactación de subbase desde la K0+700 hasta k0+600 aproximadamente
* El contratista envía solicitud de suspensión el día 20 de diciembre, la cual la interventoría analiza y responde con concepto favorable el día 21 de diciembre de 2023, quedando a la espera del acta de suspensión por parte del municipio de sucre.
* Una vez reiniciado el contrato desde el 14 de febrero de 2024, se solicita al contratista adelantar trabajos para la liberación del tramo de subbase, para proceder con la fundición de concreto, pues según plan de contingencia debe fundir 73,5 metros lineales por semana.
* Se realiza la liberación de un tramo de 180 metros de sub base, el contratista entrega densidades tomadas en sitio por el laboratorio P&M ESTUDIOS SAS.
* Las fuertes lluvias ocasionaron que la capa de subbase sufriera daños, a los cuales se deberán hacer los arreglos pertinentes para la posterior instalación de concreto ciclópeo y reforzado de la placa huella.
* Se realiza la fundición de 10 franjas de ciclópeo central de 0.90m y 20 franjas de concreto ciclópeo de 0.15m de espesor entre la abscisa Km 0+531,06-Km0+500
* El contratista realiza actividades de fundición de concreto, instalación de acero, se realizan actividades de fundición desde la K0+640 al K0+560.
* Instalación de la sub base granular en 100 ml de tramo aproximadamente


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
Se realizan actividades de la abscisa K0+485 a la K0+435

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, Cumplir con el plan de choque con el tal de cumplir las metas propuestas inicialmente.
2, Seguir con la construccion de la placa huella en todos sus componentes, acero de refuerzo, concreto ciclopeo, concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

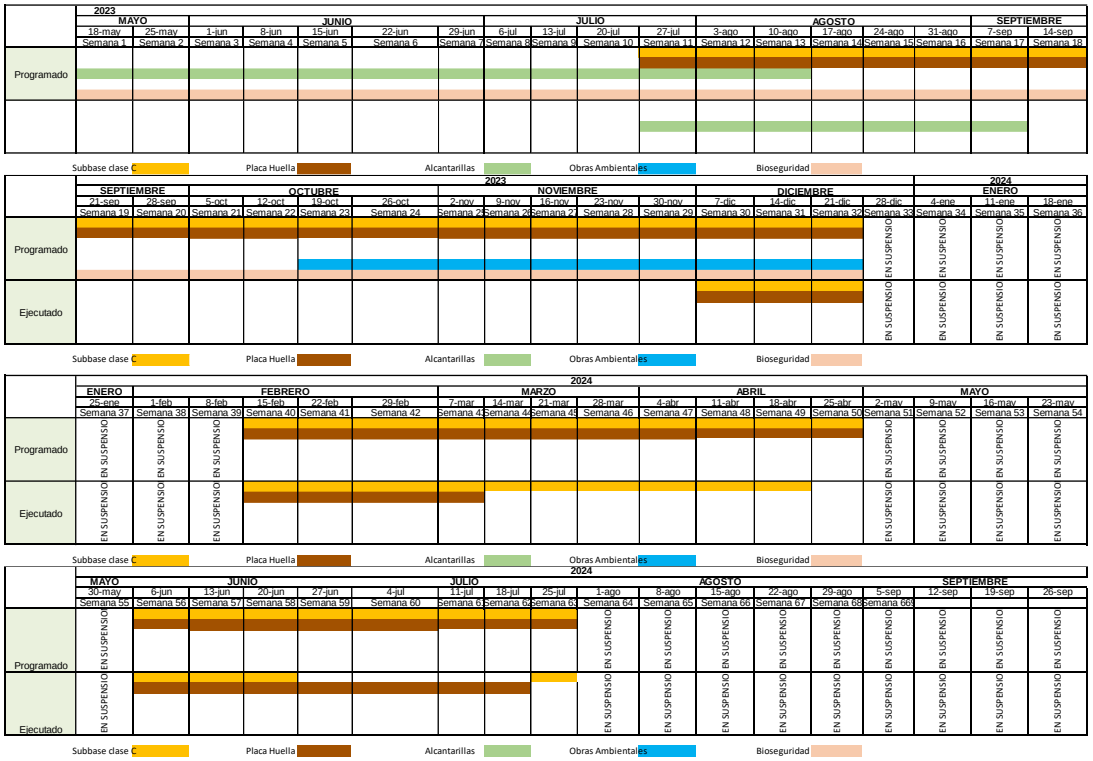

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

	2024																		
	OCTUBRE					NOVIEMBRE				DICIEMBRE									
	3-oct	10-oct	17-oct	24-oct	31-oct	7-nov	14-nov	21-nov	28-nov	5-dic	12-dic	19-dic	26-dic	2-ene	9-ene				
	Semana 55	Semana 56	Semana 57	Semana 58	Semana 59	Semana 60	Semana 61	Semana 62	Semana 63	Semana 64	Semana 65	Semana 66	Semana 67	Semana 68	Semana 69				
Programado																			
Ejecutado																			

Subbase clase C | Placa Huella | Alcantarillas | Obras Ambientales | Bioseguridad

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACIOND E ACERO



FUNDICION DE CONCRETO



CHEQUEO ESPESOR PLACA DE CONCRETO

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante el oficio DON-1100-INV-584-2024 se da traslado al municipio para que realice los trámites pertinentes en caso de aceptar la solicitud de suspensión elevada por el contratista de obra.
*Mediante el oficio DON-1100-INV-593-2024, se da el aval por parte de interventoría para la suspensión del contrato, se esta a la espera de que el municipio elabore el documento.
*El contrato se encuentra fue reiniciado el 30 de mayo de 20245
*Se realiza modificatorio 5 que amplia el plazo hasta el 30 de junio de 2024,
*Se realiza modificatorio 6 que amplia el plazo hasta el 31 de julio de 2024,
* Se suspende el contrato el 26 de julio de 2024
*Se reinicia el contrato el dia 01 de octubre de 2024,
*Mediante el oficio DON-1100-INV-751-2024 se da el traslado y aval de la prorropga hasta el 15 de diciembre de 2024,

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matricula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 89 – 20241018 – 20241024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 28/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 89 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolívar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONSORCIADOS: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO (90%); YANETH STELLA AVIRAMA PAZ (10%)
CONTRATO No.: LP-090-2023
FECHA DE INICIO: 16 DE MAYO DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 16/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
PRORROGA N°1: 17/09/2023 31/10/2023 45 días
MODIFICACIÓN 1: 17/5/2023 Valor del contrato
PRORROGA N°2: 1/11/2023 31/12/2023 61 días
SUSPENSIÓN N°1: 21/12/2023
REINICIO N°1: 14/2/2024
PRORROGA N°3: 25/02/2024 24/04/2024 60 días
SUSPENSIÓN N°2: 25/4/2024 30/5/2024 37 días
REINICIO N°2: 30/5/2024
PRORROGA N°4: 01/06/2024 30/6/2024 30 días
PRORROGA N°5: 01/07/2024 30/7/2024 31 días
SUSPENSIÓN N°3: 26/7/2024 31/8/2024 37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 3: 1/8/2024 30/8/2024 30 días
REINICIO N°3: 1/10/2024
PRORROGA N°6: 7/10/2024 15/12/2024 69 días

VALOR INICIAL: $ 1,065,446,290.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1,065,446,290.00
VALOR ANTICIPO: $ 319,633,887.00
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ 319,633,887.00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.: 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
PRORROGA 1: 01/11/2023 31/12/2023 61 días
PRORROGA 2: 01/01/2024 31/05/2024 151 días
PRORROGA 3: 01/06/2024 30/06/2024 30 días
PRORROGA 4: 01/07/2024 31/07/2024 31 días
SUSPENSIÓN 1: 25/07/2024 31/08/2024 34 días
AMPLI 1 SUSP 1: 1/09/2024 30/09/2024 30 días
REINICIO 1: 1/10/2024
PRORROGA 5: 04/10/2024 15/12/2024 73 días

VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES: $ 670,000,000.00
VALOR ACUMULADO: $ 2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,065,446,290			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 767,915,075			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 297,531,215			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,259,384,946			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 150,928,174			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la Interventoria, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 1,065,446,290.00
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 751,565,812.97 70.54%
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 767,915,074.67 72.07%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ 16,349,261.70 1.53%
%

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: 70.54%
TOTAL INVERSION EJECUTADA: $ 767,915,074.67 72.07%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION: $ 16,349,261.70 1.53%

INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA $ 81,400,096.56 7.64%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA $ 71,983,876.56 6.76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

##

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Observaciones: Acta de inicio del 16 de mayo de 2023
En el sitio de la obra el contratista esta ejecutando corte y figurado de acero de acuerdo a los diseños entregados por el municipio.
Se tiene un porcentaje programado de 70,54% y un ejecutado de 72,07% correspondiente a excavaciones de material y extensión de subbase, suministro, figurado de acero, fundición de concreto generando un avance de 1,53%
El contrato se reinicia el día 01 de octubre de 2023, y de acuerdo a la programación entregada por el contratista se ajusta el porcentaje programado.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSION PROGRAMADA: $ 2,259,384,945.71 93.74%
TOTAL INVERSION EJECUTADA: $ 2,259,384,945.71 93.74%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 21,561,167.73 0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 21,561,167.73 0.89%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoria por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 319,633,887.00
Amortizado $	$
Saldo $	$ 319,633,887.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 70.54%
Meta Física Ejecutada % 72.07%

Avance o Atraso Físico % 1.53%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	506			Prog	506			506	100.0%
					Ejec	300			300	59.29%
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
					Ejec	4			4	100.0%
*										
*										

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	1
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36
Ejecutado: Construcción de 4 alcantarillas y 250ml de placa huella

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, municipio de Mercaderes y Patía , Cauca	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 9002 del 19 de mayo del 2016 - ASAREGA
Titulo minero: IHH-14591

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencia maquinaria como vibrocompactador y volqueta, que a la fecha del siguiente reporte, no se ha enviado su documentación según pliego de condiciones y/o anexo, técnico, para su revisión y concepto.

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **APROBADO,** mediante oficio DON-1100-INV-703-2024 del 18 de julio, se emite concepto favorable al documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-065923.
De manera extemporánea, según lo establecido contractualmente y superando el 15% del total del tiempo de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: *Mediante oficio DON-1100-INV-767-2024 del 22 de octubre del 2024, se solicita la entrega de informes de seguimiento ambiental

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-550-2023,, se envía tercera solicitud de presunto incumpliendo a la entrega de la documentación del contrato.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* El contratista empieza con la excavación de la subrasante para llegar a los niveles de diseño con el fin de comenzar a construir la estructura necesaria que soporta la placa huella.
* El contratista empieza con el acopio de subbase necesaria para la construcción de la estructura que soportará la placa huella.
* Se comienza con la extensión y compactación de subbase desde la K0+700 hasta k0+600 aproximadamente
* El contratista envía solicitud de suspensión el día 20 de diciembre, la cual la interventoría analiza y responde con concepto favorable el día 21 de diciembre de 2023, quedando a la espera del acta de suspensión por parte del municipio de sucre.
* Una vez reiniciado el contrato desde el 14 de febrero de 2024, se solicita al contratista adelantar trabajos para la liberación del tramo de subbase, para proceder con la fundición de concreto, pues según plan de contingencia debe fundir 73,5 metros lineales por semana.
* Se realiza la liberación de un tramo de 180 metros de sub base, el contratista entrega densidades tomadas en sitio por el laboratorio P&M ESTUDIOS SAS.
* Las fuertes lluvias ocasionaron que la capa de subbase sufriera daños, a los cuales se deberán hacer los arreglos pertinentes para la posterior instalación de concreto ciclópeo y reforzado de la placa huella.
* Se realiza la fundición de 10 franjas de ciclópeo central de 0.90m y 20 franjas de concreto ciclópeo de 0.15m de espesor entre la abscisa Km 0+531,06-Km0+500
* El contratista realiza actividades de fundición de concreto, instalación de acero, se realizan actividades de fundición desde la K0+640 al K0+560.
* Instalación de la sub base granular en 100 ml de tramo aproximadamente


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
Se realizan actividades de la abscisa K0+435 a la K0+384

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


1, Cumplir con el plan de choque con el tal de cumplir las metas propuestas inicialmente.
2, Seguir con la construccion de la placa huella en todos sus componentes, acero de refuerzo, concreto ciclopeo, concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS





ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO		**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

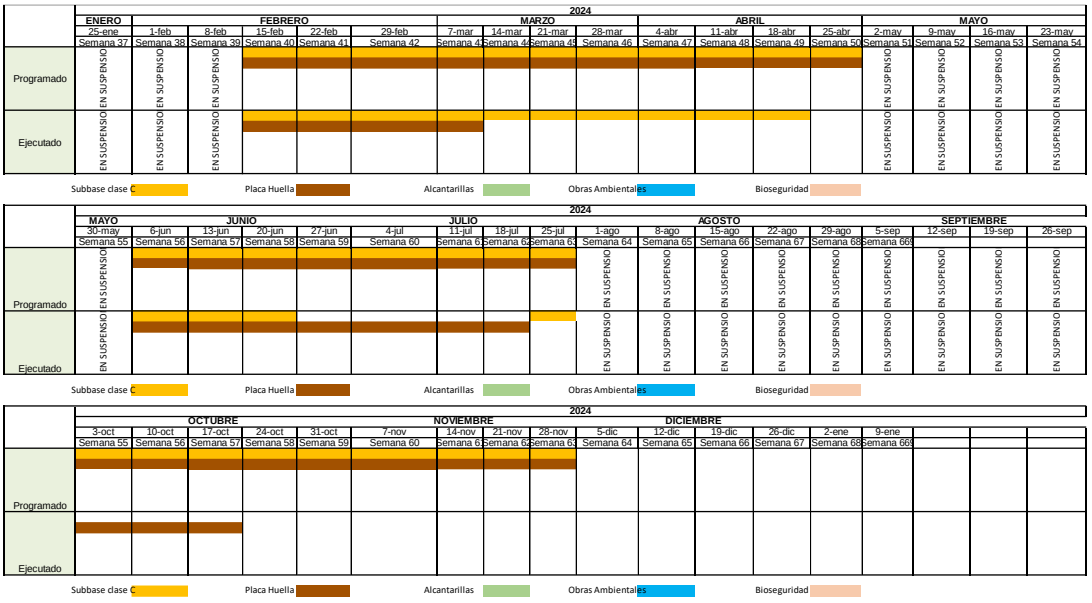

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



INSTALACIOND E ACERO



FUNDICION DE CONCRETO



CHEQUEO ESPESOR PLACA DE CONCRETO

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

*Mediante el oficio DON-1100-INV-584-2024 se da traslado al municipio para que realice los trámites pertinentes en caso de aceptar la solicitud de suspensión elevada por el contratista de obra.
*Mediante el oficio DON-1100-INV-593-2024, se da el aval por parte de interventoría para la suspensión del contrato, se esta a la espera de que el municipio elabore el documento.
*El contrato se encuentra fue reiniciado el 30 de mayo de 20245
*Se realiza modificatorio 5 que amplia el plazo hasta el 30 de junio de 2024,
*Se realiza modificatorio 6 que amplia el plazo hasta el 31 de julio de 2024,
* Se suspende el contrato el 26 de julio de 2024
*Se reinicia el contrato el dia 01 de octubre de 2024,
*Mediante el oficio DON-1100-INV-751-2024 se da el traslado y aval de la prorropga hasta el 15 de diciembre de 2024,

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matricula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 90 – 20241025 - 20241031

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 4/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 90 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 4 Alcantarillas de concreto reforzado de 36", construcción de 706 ml de placa huella.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Construcción de 830 ml de placa huella en el corredor 25CC08 S4-1 La Balastera - Peña Blanca -Santa Inés - límites con Lerma (Bolívar) Iniciando el cruce de la quebrada Peña Blanca hasta 830 metros arriba de la quebrada y construcción de cuatro (4) alcantarillas transversales de 36"

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22
REPRESENTANTE LEGAL: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONSORCIADOS: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO (90%); YANETH STELLA AVIRAMA PAZ (10%)

CONTRATO No.	LP-090-2023	VALOR INICIAL:	$ 1,065,446,290.00
FECHA DE INICIO:	16 DE MAYO DE 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	16/9/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 1,065,446,290.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$ 319,633,887.00
PRORROGA N°1	17/09/2023 31/10/2023 45 días	VALOR AMORTIZADO:	$ 319,633,887.00
MODIFICACIÓN 1	17/5/2023 Valor del contrato	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA N°2	1/11/2023 31/12/2023 61 días		
SUSPENSIÓN N°1	21/12/2023		
REINICIO N°1	14/2/2024		
PRORROGA N°3	25/02/2024 24/04/2024 60 días		
SUSPENSIÓN N°2	23/4/2024 29/5/2024 37 días		
REINICIO N°2	30/5/2024		
PRORROGA N°4	01/06/2024 30/6/2024 30 días		
PRORROGA N°5	01/07/2024 30/7/2024 31 días		
SUSPENSIÓN N°3	26/7/2024 31/8/2024 37 días		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 3	1/8/2024 30/9/2024 30 días		
REINICIO N°3	1/10/2024		
PRORROGA N°6	7/10/2024 15/12/2024 69 días		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS

CONTRATO No.	1100 de 2022		VALOR INICIAL:	$	1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022		VALOR ADICIONES:	$	670,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL	31/10/2023		VALOR ACUMULADO:	$	2,410,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024		VALOR ANTICIPO	$	-
PRORROGA 1	01/11/2023 31/12/2023	61 días	VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRORROGA 2	01/01/2024 31/05/2024	151 días	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRORROGA 3	01/06/2024 30/06/2024	30 días			
PRORROGA 4	01/07/2024 31/07/2024	31 días			
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024 31/08/2024	34 días			
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024 30/09/2024	30 días			
REINICIO 1	1/10/2024				
PRORROGA 5	04/10/2024 15/12/2024	73 días			

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,065,446,290			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 831,430,260			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 234,016,030			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,280,946,113			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 129,367,007			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,065,446,290.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 762,113,731.24	71.53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 831,430,259.87	78.04%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 69,316,528.63	6.51%
		%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA: ##########		71.53%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 831,430,259.87	78.04%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSION:	$ 69,316,528.63	6.51%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 10,547,918.27	0.99%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 63,515,185.20	5.96%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

##

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:Observaciones: Acta de inicio del 16 de mayo de 2023
En el sitio de la obra el contratista esta ejecutando corte y figurado de acero de acuerdo a los diseños entregados por el municipio.
Se tiene un porcentaje programado de 71,53% y un ejecutado de 78,04% correspondiente a excavaciones de material y extensión de subbase, suministro, figurado de acero, fundición de concreto generando un avance de 6,51%
El contrato se reinicia el día 01 de octubre de 2023, y de acuerdo a la programación entregada por el contratista se ajusta el porcentaje programado.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,280,946,113.44	94.63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,280,946,113.44	94.63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	0	x

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 319,633,887.00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 319,633,887.00

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 71.53%
Meta Física Ejecutada % 78.04%
Avance o Atraso Físico % 6.51%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Placa Huella	ML	506			Prog	506			506	100.0%
					Ejec	345			345	68.18%
* Alcantarillas	UND	4			Prog	4			4	100.0%
					Ejec	4			4	100.0%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 706 metros lineales de placa huellas y construcción de 4 alcantarillas en tubería de concreto reforzado de 36"
Ejecutado: Construcción de 4 alcantarillas y 250ml de placa huella
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Mezclador de trompo 1 saco	1	1
Retro cargador	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Volqueta 6 m3	3	
Total	**7**	

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Galíndez, municipio de Mercaderes y Patía , Cauca	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 9002 del 19 de mayo del 2016 - ASAREGA
Título minero: IHH-14591

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES: Realizado el recorrido de obra, se evidencia maquinaria como vibrocompactador y volqueta, que a la fecha del siguiente reporte, no se ha enviado su documentación según pliego de condiciones y/o anexo, técnico, para su revisión y concepto.

P.A.G.A (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **APROBADO,** mediante oficio DON-1100-INV-703-2024 del 18 de julio, se emite concepto favorable al documento PAGA y se radica ante la subdirección de sostenibilidad del INVIAS para su revisión y concepto - 2024E-VUVRAZ-065923.
De manera extemporánea, según lo establecido contractualmente y superando el 15% del total del tiempo de ejecución del contrato.

OBSERVACIONES: *Mediante oficio DON-1100-INV-767-2024 del 22 de octubre del 2024, se solicita la entrega de informes de seguimiento ambiental

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	0	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 16

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-550-2023,, se envía tercera solicitud de presunto incumplimiento a la entrega de la documentación del contrato.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

* El contratista empieza con la excavación de la subrasante para llegar a los niveles de diseño con el fin de comenzar a construir la estructura necesaria que soporta la placa huella.
* El contratista empieza con el acopio de subbase necesaria para la construcción de la estructura que soportará la placa huella.
* Se comienza con la extensión y compactación de subbase desde la K0+700 hasta k0+600 aproximadamente
* El contratista envía solicitud de suspensión el día 20 de diciembre, la cual la interventoría analiza y responde con concepto favorable el día 21 de diciembre de 2023, quedando a la espera del acta de suspensión por parte del municipio de sucre.
* Una vez reiniciado el contrato desde el 14 de febrero de 2024, se solicita al contratista adelantar trabajos para la liberación del tramo de subbase, para proceder con la fundición de concreto, pues según plan de contingencia debe fundir 73,5 metros lineales por semana.
* Se realiza la liberación de un tramo de 180 metros de sub base, el contratista entrega densidades tomadas en sitio por el laboratorio P&M ESTUDIOS SAS.
* Las fuertes lluvias ocasionaron que la capa de subbase sufriera daños, a los cuales se deberán hacer los arreglos pertinentes para la posterior instalación de concreto ciclópeo y reforzado de la placa huella.
* Se realiza la fundición de 10 franjas de ciclópeo central de 0.90m y 20 franjas de concreto ciclópeo de 0.15m de espesor entre la abscisa Km 0+531,06-Km0+500
* El contratista realiza actividades de fundición de concreto, instalación de acero, se realizan actividades de fundición desde la K0+640 al K0+560.
* Instalación de la sub base granular en 100 ml de tramo aproximadamente

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

El la semana el contratista inicia con la construccion de huellas en concreto ciclopeo y completa huellas de concreto reforzado, cunetas y bordillos.
Se realiza la instalacion y figurado de acero para riostras, cunetas y bordillos.
Se realizan actividades de la abscisa K0+384 a la K0+339

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1, Cumplir con el plan de choque con el tal de cumplir las metas propuestas inicialmente.
2, Seguir con la construccion de la placa huella en todos sus componentes, acero de refuerzo, concreto ciclopeo, concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

| | 2023 | | |

4.1.4 PUERTO TEJADA 2496– CAUCA

- Informe Semanal 86 - 20241001 – 20241003

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 7/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoria N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 86 del 1/10/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 1100 metros de pavimento flexible y la construcción de una alcantarilla de 36 pulgadas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tramo priorizado pretende realizarán la construcción de pavimento flexible asfaltico, construcción de alcantarillas y actividades necesarias para mejorar la movilidad y transitabilidad de la población beneficiaria.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL 2023
REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
CONSORCIADOS: PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA (99%); DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ (1%)

CONTRATO No.	156		VALOR INICIAL:	$	1,815,000,000.00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/2/2024		VALOR ACUMULADO:	$	1,815,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024		VALOR ANTICIPO:	$	-
SUSPENSIÓN N°1	7/12/2023	4/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-
REINICIO N° 1	5/2/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
PRORROGA N°1	02/04/2024	31/05/2024	60 días		
SUSPENSIÓN N°2	24/05/2024	2/06/2024	9 días		
REINICIO N° 2	03/06/2024				
PRORROGA N°2	03/06/2024	30/06/2024	21 días		
PRORROGA N°3	1/07/2024	31/07/2024	31 días		
SUSPENSIÓN N°3	26/7/2024	31/8/2024	37 días		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN 3	1/9/2024	30/9/2024	30 días		
REINICIO N°3	1/10/2024				
PRORROGA N°4	7/10/204	15/12/2024	69 días		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS

CONTRATO No.	1100 de 2022				VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022				VALOR ADICIONES:	$ 670,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023				VALOR ACUMULADO:	$ 2,410,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024				VALOR ANTICIPO:	$ -
PRORROGA 1	01/11/2023	31/12/2023	61 días		VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA 2	01/01/2024	31/05/2024	151 días		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA 3	01/06/2024	30/06/2024	30 días			
PRORROGA 4	01/07/2024	31/07/2024	31 días			
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024	31/08/2024	34 días			
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024	30/09/2024	30 días			
REINICIO 1	1/10/2024					
PRORROGA 5	04/10/2024	15/12/2024	73 días			

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,815,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 452,287,174			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,362,712,826			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,194,701,443			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 215,611,677			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoria, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,815,000,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,493,905,579.00	82.31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 452,287,174.00	24.92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1,041,618,405.00)	-57.39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		82.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24,706,104.00	24.92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1,041,618,405.00)	-57.39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 128,212,762.00	7.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24,354,269.16	1.89%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha después de varias semanas el contratista sigue sin ejecutar actividades, según cronograma se lleva un programado del 82,31% un ejecutado del 24,92% y un atraso en obra del 57,39%, al la fecha no se cuenta con cronograma ni programación de ejecución de obra actualizada.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,194,701,442.53	91.05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,194,701,442.53	91.05%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VLIVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 82,31% — Avance o Atraso Físico % -57,39%
Meta Física Ejecutada % 24,92%

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Metafisica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Fisico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento flexible	ML	1100			Prog	1100			1100	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
* Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta fisica aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance fisico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Compactador manual (Saltarín)	1	
Terminadora Finisher	1	
Carro Tanque de agua	1	
Total	6	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 1100 metros lineales de pavimento flexible y construcción de 1 alcantarillas en tubería de 36´´en concreto reforzado
Ejecutado: Cajeo o excavaciones, e instalación de 1000ml de subbase y base

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Municipio de Guachené, vereda sabanetas, sector las vegas — DISPONIBLE
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 1116 del 17 de mayo del 2011 - Titulo minero NºICQ 08242

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES:N/A

ELABORO	APROBÓ
ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Guachené, vereda sabanetas, sector las vegas	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 1116 del 17 de mayo del 2011 - Titulo minero N° ICQ 08242

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A
EMISIONES:	SI	NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

*Mediante comunicado DON-1100-INV-303-2023 del 02 de octubre, se emiten Observaciones a la v1 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-477-2024 del 10 de febrero, se solicita la subsanación de las observaciones emitidas en el oficio 305.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-491-2024 del 27 de febrero, se realiza la segunda solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-505-2024 del 05 de marzo, se realiza la tercera solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-530-2024 del 14 de marzo, se realiza la cuarta solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-531-2024 del 14 de marzo, se emiten observaciones a la v2 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-549-2024 del 27 de marzo, se realiza la quinta solicitud de documentos contractuales (PAGA)
*Mediante comunicado DON-1100-INV-608-2024 del 03 de mayo, se emiten observaciones a la v3 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-646-2024 del 28 de mayo, se reitera la entrega del PAGA subsanando las observaciones del oficio DON-1100-INV-608-2024
*Mediante comunicado DON-1100-INV-660-2024 del 04 de junio, se emiten observaciones a la v4 del documento PAGA
*Mediante comunicado DON-1100-INV-689-2024 del 24 de junio, se reitera la entrega del documento PAGA.

OBSERVACIONES: El contratista emite la versión 3 del documento PAGA, el día 2 de mayo del 2024, donde la interventoría emitirá un concepto en los próximos 3 días hábiles.

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-709-2024 solicitando información social pendiente a la fecha

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

- Instalación de 800 ml de base
- Instalación de 1000 ml de base
- A la fecha continua el inconveniente con respecto a los empozamientos en los canales aledaños a la vía, dado esto imposibilita la ejecución de actividades de obra, es por esto que el contratista solicita la suspensión del contrato hasta que se subsane los inconvenientes antes mencionados y por eso se llega a un acuerdo entre las partes de suspender el contrato de obra .
- Se da el reinicio del contrato de obra, a la fecha no se ejecutan actividades de obra.
- Actividades de rocería en el canal afectado por los empozamientos de aguas y que detiene el reinicio de actividades de obra.
- Comité técnico en compañía de la alcaldía del municipio de Puerto Tejada en cabeza de la alcaldesa, interventoría y representante del contratista, en donde se socializa el avance de obra hasta la fecha y se establecen compromisos para las partes.
- A la fecha no se realizan actividades de obra, cabe resaltar que a la fecha se han realizado actividades de cajeo, extensión y compactación aproximadamente 1.000ml de sub base y base.
- A esta semana no se ejecutan actividades de obra.
- Se lleva a cabo reunión en el municipio de puerto tejada en compañía de contratista, donde se establecen compromisos para dar el reinicio de actividades de obra, al momento se está esperando la aprobación del balance de obra para la ejecución de la obra ya que el municipio no está de acuerdo en la reducción de la meta física

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2024																
	FEBRERO					MARZO				ABRIL				MAYO			
	1-feb	8-feb	15-feb	22-feb	29-feb	7-mar	14-mar	21-mar	28-mar	4-abr	11-abr	18-abr	25-abr	2-may	9-may	16-may	23-may	30-may
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18
Programado																		
Ejecutado																	EN SUSPENSIÓN	EN SUSPENSIÓN

PAVIMENTO FLEXIBLE ALCANTARILLAS 36´´ OBRAS COMPLEMENTARIAS

	2024																
	JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
	6-jun	13-jun	20-jun	27-jun	4-jul	11-jul	18-jul	25-jul	1-ago	8-ago	15-ago	22-ago	29-ago	5-sep	12-sep	19-sep	26-sep	3-oct
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18
Programado																		
Ejecutado	EN SUSPENSIÓN																	

PAVIMENTO FLEXIBLE ALCANTARILLAS 36´´ OBRAS COMPLEMENTARIAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión en municipio de Puerto Tejada.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

-Revisión de la tercera entrega de los estudios y diseños enviados por el contratista el día 5 de octubre de 2023.
Se envían los oficios DON-1100-INV-372 y DON-1100-INV-377 donde se solicita el acta de inicio con sus respectivas firmas, puesto a que ya se encuentra en las condiciones óptimas para dar inicio a las actividades constructivas.
- El día 4 de diciembre de 2023 se firma acta de inicio.
- El día 7 de diciembre es suspendido el contrato de obra.
- El día 5 de febrero se dio reinicio al contrato de obra, sin embargo aunque se han hecho las solicitudes verbal y en comité de obra no se tiene flujo de caja, balance y programación.
- El día 24 de mayo es suspendido el contrato de obra.
- El día 3 de junio se da el reinicio de el contrato de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 87 - 20241004 – 20241010

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-PR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 14/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | SEMANA No.: 87 (Numeración consecutiva) del 4/10/2024 al ######## | Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 1100 metros de pavimento flexible y la construcción de una alcantarilla de 36 pulgadas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tramo priorizado pretende realizarán la construcción de pavimento flexible asfaltico, construcción de alcantarillas y actividades necesarias para mejorar la movilidad y transitabilidad de la población beneficiaria.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL 2023
REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
CONSORCIADOS: PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA (99%); DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ (1%)
CONTRATO No.: 156
FECHA DE INICIO: 4/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 4/2/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
SUSPENSIÓN N°1: 7/12/2023 - 4/02/2024
REINICIO N° 1: 5/2/2024
PRORROGA N°1: 02/04/2024 31/05/2024 60 días
SUSPENSIÓN N°2: 24/05/2024 - 2/06/2024 9 días
REINICIO N° 2: 03/06/2024
PRORROGA N°2: 10/06/2024 30/06/2024 21 días
PRORROGA N°3: 1/07/2024 - 31/07/2024 31 días
SUSPENSIÓN N°3: 26/7/2024 31/8/2024 37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN: 1/9/2024 30/9/2024 30 días
REINICIO N°3: 1/10/2024
PRORROGA N°4: 7/10/204 15/12/2024 69 días

VALOR INICIAL:	$ 1,815,000,000.00
VALOR ADICIONES:	$ -
VALOR ACUMULADO:	$ 1,815,000,000.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.: 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
PRORROGA 1: 01/11/2023 31/12/2023 61 días
PRORROGA 2: 01/01/2024 31/05/2024 151 días
PRORROGA 3: 01/06/2024 30/06/2024 30 días
PRORROGA 4: 01/07/2024 31/07/2024 31 días
SUSPENSIÓN 1: 29/07/2024 31/08/2024 34 días
AMPLI 1 SUSP 1: 1/09/2024 30/09/2024 30 días
REINICIO 1: 1/10/2024
PRORROGA 5: 04/10/2024 15/12/2024 73 días

VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES:	$ 670,000,000.00
VALOR ACUMULADO:	$ 2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 1,815,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 452,287,174			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,362,712,826			
INTERVENTORÍA	**RECURSOS POR VIGENCIA**	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,216,262,610			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194,050,510			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoría, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,815,000,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,493,905,579.00	82.31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 452,287,174.00	24.92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1,041,618,405.00)	-57.39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		82.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24,706,104.00	24.92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1,041,618,405.00)	-57.39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 128,212,762.00	7.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34,354,269.16	1.89%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha después de varias semanas el contratista sigue sin ejecutar actividades, según cronograma se lleva un programado del 82,31% un ejecutado del 24,92% y un atraso en obra del 57,39%, al la fecha no se cuenta con cronograma ni programación de ejecución de obra actualizada.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,216,262,610.25	91.95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,216,262,610.25	91.95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VLVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 82.31%
Meta Física Ejecutada % 24.92%
Avance o Atraso Físico % -57.39%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Metafísica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento flexible	ML	1100			Prog	1100			1100	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
* Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Compactador manual (saltarin)	1	
Terminadora Finisher	1	
Carro Tanque de agua	1	
Total	**6**	**0**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 1100 metros lineales de pavimento flexible y construcción de 1 alcantarillas en tubería de 36´en concreto reforzado
Ejecutado: Cajeo o excavaciones, e instalación de 1000ml de subbase y base
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3 Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Municipio de Guachené, vereda sabanetas, sector las vegas
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 1116 del 17 de mayo del 2011 - Titulo minero N.º ICQ 08242

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante comunicado DON-1100-INV-303-2023 del 02 de octubre, se emiten Observaciones a la v1 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-477-2024 del 10 de febrero, se solicita la subsanación de las observaciones emitidas en el oficio 305.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-491-2024 del 27 de febrero, se realiza la segunda solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-505-2024 del 05 de marzo, se realiza la tercera solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-530-2024 del 14 de marzo, se realiza la cuarta solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-531-2024 del 14 de marzo, se emiten observaciones a la v2 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-549-2024 del 27 de marzo, se realiza la quinta solicitud de documentos contractuales (PAGA)
*Mediante comunicado DON-1100-INV-608-2024 del 03 de mayo, se emiten observaciones a la v3 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-646-2024 del 28 de mayo, se reitera la entrega del PAGA subsanando las observaciones del oficio DON-1100-INV-608-2024
*Mediante comunicado DON-1100-INV-660-2024 del 04 de junio, se emiten observaciones a la v4 del documento PAGA
*Mediante comunicado DON-1100-INV-689-2024 del 24 de junio, se reitera la entrega del documento PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-709-2024 solicitando información social pendiente a la fecha

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALUOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
- Instalación de 800 ml de base
- Instalación de 1000 ml de base
- A la fecha continua el inconveniente con respecto a los empozamientos en los canales aledaños a la vía, dado esto imposibilita la ejecución de actividades de obra, es por esto que el contratista solicita la suspensión del contrato hasta que se subsane los inconvenientes antes mencionados y por eso se llega a un acuerdo entre las partes de suspender el contrato de obra .
- Se da el reinicio del contrato de obra, a la fecha no se ejecutan actividades de obra.
- Actividades de rocería en el canal afectado por los empozamientos de aguas y que detiene el reinicio de actividades de obra.
- Comité técnico en compañía de la alcaldía del municipio de Puerto Tejada en cabeza de la alcaldesa, interventoría y representante del contratista, en donde se socializa el avance de obra hasta la fecha y se establecen compromisos para las partes.
- A la fecha no se realizan actividades de obra, cabe resaltar que a la fecha se han realizado actividades de cajeo, extensión y compactación aproximadamente 1.000ml de sub base y base.
- A esta semana no se ejecutan actividades de obra.
- Se lleva a cabo reunión en el municipio de puerto tejada en compañía de contratista, donde se establecen compromisos para dar el reinicio de actividades de obra, al momento se está esperando la aprobación del balance de obra para la ejecución de la obra ya que el municipio no está de acuerdo en la reducción de la meta física

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

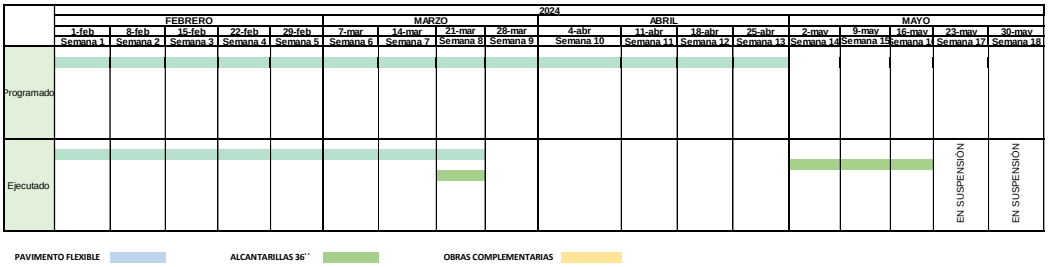

PAVIMENTO FLEXIBLE ALCANTARILLAS 36´´ OBRAS COMPLEMENTARIAS

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

	2024																		
	JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE					
	6-jun	13-jun	20-jun	27-jun	4-jul	11-jul	18-jul	25-jul	1-ago	8-ago	15-ago	22-ago	29-ago	5-sep	12-sep	19-sep	26-sep	3-oct	
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 1	Semana 17	Semana 18	
Programado																			
Ejecutado	EN SUSPENSIÓN																		

PAVIMENTO FLEXIBLE ALCANTARILLAS 36´´ OBRAS COMPLEMENTARIAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión en municipio de Puerto Tejada.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

-Revisión de la tercera entrega de los estudios y diseños enviados por el contratista el día 5 de octubre de 2023.
Se envían los oficios DON-1100-INV-372 y DON-1100-INV-377 donde se solicita el acta de inicio con sus respectivas firmas, puesto a que ya se encuentra en las condiciones óptimas para dar inicio a las actividades constructivas.
- El día 4 de diciembre de 2023 se firma acta de inicio.
- El día 7 de diciembre es suspendido el contrato de obra.
- El día 5 de febrero se dio reinicio al contrato de obra, sin embargo aunque se han hecho las solicitudes verbal y en comité de obra no se tiene flujo de caja, balance y programación.
- El día 24 de mayo es suspendido el contrato de obra.
- El día 3 de junio se da el reinicio de el contrato de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matricula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 88 – 20241011 – 20241017

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 4
FECHA	21/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 88 (Numeración consecutiva) del 11/10/2024 al ########## Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 1100 metros de pavimento flexible y la construcción de una alcantarilla de 36 pulgadas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tramo priorizado pretende realizarán la construcción de pavimento flexible asfaltico, construcción de alcantarillas y actividades necesarias para mejorar la movilidad y transitabilidad de la población beneficiaria.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL 2023
REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
CONSORCIADOS: PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA (99%); DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ (1%)
CONTRATO No.: 106
FECHA DE INICIO: 4/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 4/2/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
SUSPENSIÓN N°1: 7/12/2023 - 4/02/2024
REINICIO N° 1: 5/2/2024
PRORROGA N°1: 02/04/2024 - 31/05/2024 — 60 días
SUSPENSIÓN N°2: 24/05/2024 - 2/06/2024 — 9 días
REINICIO N° 2: 3/06/2024
PRORROGA N°2: 10/06/2024 - 30/06/2024 — 21 días
PRORROGA N°3: 1/07/2024 - 31/07/2024 — 31 días
SUSPENSIÓN N°3: 26/7/2024 - 31/8/2024 — 37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIO: 1/9/2024 - 30/9/2024 — 30 días
REINICIO N°3: 1/10/2024
PRORROGA N°4: 7/10/2024 - 15/12/2024 — 69 días

VALOR INICIAL: $ 1,815,000,000.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1,815,000,000.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.: 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
PRORROGA 1: 01/11/2023 - 31/12/2023 — 61 días
PRORROGA 2: 01/01/2024 - 31/05/2024 — 151 días
PRORROGA 3: 01/06/2024 - 30/06/2024 — 30 días
PRORROGA 4: 01/07/2024 - 31/07/2024 — 31 días
SUSPENSIÓN 1: 29/07/2024 - 31/08/2024 — 34 días
AMPLI 1 SUSP 1: 1/09/2024 - 30/09/2024 — 30 días
REINICIO 1: 1/10/2024
PRORROGA 5: 04/10/2024 - 15/12/2024 — 73 días

VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES: $ 670,000,000.00
VALOR ACUMULADO: $ 2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,815,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 452,287,174			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,362,712,826			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,237,823,778			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 172,489,342			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoria, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,815,000,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,493,905,579.00	82.31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 452,287,174.00	24.92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1,041,618,405.00)	-57.39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		82.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24,706,104.00	24.92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1,041,618,405.00)	-57.39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 128,213,762.00	7.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34,354,269.16	1.89%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del tramite)

Observaciones: A la fecha después de varias semanas el contratista sigue sin ejecutar actividades, según cronograma se lleva un programado del 82,31% un ejecutado del 24,92% y un atraso en obra del 57,39%, al la fecha no se cuenta con cronograma ni programación de ejecución de obra actualizada.
A pesar de que la interventoria ya ha emitido el aval para reiniciar el contrato de obra, hasta la fecha no se cuenta con la aprobación formal, ya que no ha sido firmado por el municipio ni por el contratista.

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,237,823,777.98	92.84%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,237,823,777.98	92.84%
INVERSIÓN	$ 21,561,167.73	0.89%
PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del tramite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 82.31%
Meta Física Ejecutada % 24.92%

Avance o Atraso Físico % -57.39%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Metafísica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento flexible	ML	1100			Prog	1100			1100	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
* Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Compactador manual (Saltarin)	1	
Terminadora Finisher	1	
Carro Tanque de agua	1	
Total	**6**	**0**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 1100 metros lineales de pavimento flexible y construcción de 1 alcantarillas en tubería de 36´en concreto reforzado
Ejecutado: Cajeo o excavaciones, e instalación de 1000ml de subbase y base

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Guachené, vereda sabanetas, sector las vegas	PERMISO MINERO: SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 1116 del 17 de mayo del 2011 - Titulo minero NºICQ08242

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante comunicado DON-1100-INV-303-2023 del 02 de octubre, se emiten Observaciones a la v1 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-477-2024 del 10 de febrero, se solicita la subsanación de las observaciones emitidas en el oficio 305.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-491-2024 del 27 de febrero, se realiza la segunda solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-505-2024 del 05 de marzo, se realiza la tercera solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-530-2024 del 14 de marzo, se realiza la cuarta solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-531-2024 del 14 de marzo, se emiten observaciones a la v2 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-549-2024 del 27 de marzo, se realiza la quinta solicitud de documentos contractuales (PAGA)
*Mediante comunicado DON-1100-INV-608-2024 del 03 de mayo, se emiten observaciones a la v3 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-646-2024 del 28 de mayo, se reitera la entrega del PAGA subsanando las observaciones del oficio DON-1100-INV-608-2024
*Mediante comunicado DON-1100-INV-660-2024 del 04 de junio, se emiten observaciones a la v4 del documento PAGA
*Mediante comunicado DON-1100-INV-689-2024 del 24 de junio, se reitera la entrega del documento PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-709-2024 solicitando información social pendiente a la fecha

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
- Instalación de 800 ml de base
- Instalación de 1000 ml de base
- A la fecha continua el inconveniente con respecto a los empozamientos en los canales aledaños a la vía, dado esto imposibilita la ejecución de actividades de obra, es por esto que el contratista solicita la suspensión del contrato hasta que se subsane los inconvenientes antes mencionados y por eso se llega a un acuerdo entre las partes de suspender el contrato de obra .
- Se da el reinicio del contrato de obra, a la fecha no se ejecutan actividades de obra.
- Actividades de rocería en el canal afectado por los empozamientos de aguas y que detiene el reinicio de actividades de obra.
- Comité técnico en compañía de la alcaldía del municipio de Puerto Tejada en cabeza de la alcaldesa, interventoría y representante del contratista, en donde se socializa el avance de obra hasta la fecha y se establecen compromisos para las partes.
- A la fecha no se realizan actividades de obra, cabe resaltar que a la fecha se han realizado actividades de cajeo, extensión y compactación aproximadamente 1.000ml de sub base y base.
- A esta semana no se ejecutan actividades de obra.
- Se lleva a cabo reunión en el municipio de puerto tejada en compañía de contratista, donde se establecen compromisos para dar el reinicio de actividades de obra, al momento se está esperando la aprobación del balance de obra para la ejecución de la obra ya que el municipio no está de acuerdo en la reducción de la meta física

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
- A pesar de que la interventoría ya ha emitido el aval para reiniciar el contrato de obra, hasta la fecha no se cuenta con la aprobación formal, ya que no ha sido firmado por el municipio ni por el contratista.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



PAVIMENTO FLEXIBLE ALCANTARILLAS 36´´ OBRAS COMPLEMENTARIAS

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS
ELABORO	APROBÓ

	2024																	
	JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				
	6-jun	13-jun	20-jun	27-jun	4-jul	11-jul	18-jul	25-jul	1-ago	8-ago	15-ago	22-ago	29-ago	5-sep	12-sep	19-sep	26-sep	3-oct
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 1	Semana 17	Semana 18
Programado																		
Ejecutado	EN SUSPENSIÓN																	

PAVIMENTO FLEXIBLE ALCANTARILLAS 36´´ OBRAS COMPLEMENTARIAS

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reunión en municipio de Puerto Tejada.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

-Revisión de la tercera entrega de los estudios y diseños enviados por el contratista el día 5 de octubre de 2023.
Se envían los oficios DON-1100-INV-372 y DON-1100-INV-377 donde se solicita el acta de inicio con sus respectivas firmas, puesto a que ya se encuentra en las condiciones óptimas para dar inicio a las actividades constructivas.
- El día 4 de diciembre de 2023 se firma acta de inicio.
- El día 7 de diciembre es suspendido el contrato de obra.
- El día 5 de febrero se dio reinicio al contrato de obra, sin embargo aunque se han hecho las solicitudes verbal y en comité de obra no se tiene flujo de caja, balance y programación.
- El día 24 de mayo es suspendido el contrato de obra.
- El día 3 de junio se da el reinicio de el contrato de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matricula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 89 – 20241018 – 20241024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1 DE 4

FECHA 28/10/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 89 (Numeración consecutiva) del 18/10/2024 al 24/10/2024 Último Informe Semanal NO

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 1100 metros de pavimento flexible y la construcción de una alcantarilla de 36 pulgadas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tramo priorizado pretende realizarán la construcción de pavimento flexible asfaltico, construcción de alcantarillas y actividades necesarias para mejorar la movilidad y transitabilidad de la población beneficiaria.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL 2023
REPRESENTANTE LEGAL: PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA
CONSORCIADOS: PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA (99%), DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ (1%)
CONTRATO No.: 156
FECHA DE INICIO: 4/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 4/2/2024
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
SUSPENSIÓN N°1: 7/12/2023 - 4/02/2024
REINICIO N° 1: 5/2/2024
PRORROGA N°1: 02/04/2024 31/05/2024 60 días
SUSPENSIÓN N°2: 24/05/2024 - 2/06/2024 9 días
REINICIO N° 2: 03/06/2024
PRORROGA N°2: 10/06/2024 - 30/06/2024 21 días
PRORROGA N°3: 1/07/2024 - 31/07/2024 31 días
SUSPENSIÓN N°3: 26/7/2024 31/8/2024 37 días
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓ: 1/9/2024 30/9/2024 30 días
REINICIO N°3: 1/10/2024
PRORROGA N°4: 7/10/204 15/12/2024 69 días

VALOR INICIAL: $ 1,815,000,000.00
VALOR ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 1,815,000,000.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS
REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA CORDERO CELIS
CONTRATO No.: 1100 de 2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 15/12/2024
PRORROGA 1 01/11/2023 31/12/2023 61 días
PRORROGA 2 01/01/2024 31/05/2024 151 días
PRORROGA 3 01/06/2024 30/06/2024 30 días
PRORROGA 4 01/07/2024 31/07/2024 31 días
SUSPENSIÓN 1 29/07/2024 31/08/2024 34 días
AMPLI 1 SUSP 1 1/09/2024 30/09/2024 30 días
REINICIO 1 1/10/2024
PRORROGA 5 04/10/2024 15/12/2024 73 días

VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00
VALOR ADICIONES: $ 670,000,000.00
VALOR ACUMULADO: $ 2,410,313,120.00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,815,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 452,287,174			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,362,712,826			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,259,384,946			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 150,928,174			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoria, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001	
		Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024	

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,815,000,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,493,905,579.00	82.31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 452,287,174.00	24.92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1,041,618,405.00)	-57.39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION PROGRAMADA:		82.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24,706,104.00	24.92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1,041,618,405.00)	-57.39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 128,212,762.00	7.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34,354,269.16	1.89%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha después de varias semanas el contratista sigue sin ejecutar actividades, según cronograma se lleva un programado del 82,31% un ejecutado del 24,92% y un atraso en obra del 57,39%, al la fecha no se cuenta con cronograma ni programación de ejecución de obra actualizada.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,259,384,945.71	93.74%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$ 2,259,384,945.71	93.74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoría, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 82.31%
Meta Física Ejecutada % 24.92%
Avance o Atraso Físico % -57.39%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Metafísica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento flexible	ML	1100			Prog	1100			1100	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
* Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
*										
*										

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 1100 metros lineales de pavimento flexible y construcción de 1 alcantarillas en tubería de 36" en concreto reforzado
Ejecutado: Cajeo o excavaciones, e instalación de 1000ml de subbase y base
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Compactador manual (Saltarin)	1	
Terminadora Finisher	1	
Carro Tanque de agua	1	
Total	**6**	**0**

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Municipio de Guachené, vereda sabanetas, sector las vegas	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 1116 del 17 de mayo del 2011 - Titulo minero Nº ICQ 08242

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante comunicado DON-1100-INV-303-2023 del 02 de octubre, se emiten Observaciones a la v1 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-477-2024 del 10 de febrero, se solicita la subsanación de las observaciones emitidas en el oficio 305.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-491-2024 del 27 de febrero, se realiza la segunda solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-505-2024 del 05 de marzo, se realiza la tercera solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-530-2024 del 14 de marzo, se realiza la cuarta solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-531-2024 del 14 de marzo, se emiten observaciones a la v2 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-549-2024 del 27 de marzo, se realiza la quinta solicitud de documentos contractuales (PAGA)
*Mediante comunicado DON-1100-INV-608-2024 del 03 de mayo, se emiten observaciones a la v3 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-646-2024 del 28 de mayo, se reitera la entrega del PAGA subsanando las observaciones del oficio DON-1100-INV-608-2024
*Mediante comunicado DON-1100-INV-660-2024 del 04 de junio, se emiten observaciones a la v4 del documento PAGA
*Mediante comunicado DON-1100-INV-689-2024 del 24 de junio, se reitera la entrega del documento PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Mediante oficio DON-1100-INV-709-2024 solicitando información social pendiente a la fecha

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS
- Instalación de 800 ml de base
- Instalación de 1000 ml de base
- A la fecha continua el inconveniente con respecto a los empozamientos en los canales aledaños a la vía, dado esto imposibilita la ejecución de actividades de obra, es por esto que el contratista solicita la suspensión del contrato hasta que se subsane los inconvenientes antes mencionados y por eso se llega a un acuerdo entre las partes de suspender el contrato de obra .
- Se da el reinicio del contrato de obra, a la fecha no se ejecutan actividades de obra.
- Actividades de rocería en el canal afectado por los empozamientos de aguas y que detiene el reinicio de actividades de obra.
- Comité técnico en compañía de la alcaldía del municipio de Puerto Tejada en cabeza de la alcaldesa, interventoría y representante del contratista, en donde se socializa el avance de obra hasta la fecha y se establecen compromisos para las partes.
- A la fecha no se realizan actividades de obra, cabe resaltar que a la fecha se han realizado actividades de cajeo, extensión y compactación aproximadamente 1.000ml de sub base y base.
- A esta semana no se ejecutan actividades de obra.
- Se lleva a cabo reunión en el municipio de puerto tejada en compañía de contratista, donde se establecen compromisos para dar el reinicio de actividades de obra, al momento se está esperando la aprobación del balance de obra para la ejecución de la obra ya que el municipio no está de acuerdo en la reducción de la meta física
- A pesar de que la interventoría ya ha emitido el aval para reiniciar el contrato de obra, hasta la fecha no se cuenta con la aprobación formal, ya que no ha sido firmado por el municipio ni por el contratista.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
- En esta semana se firma el acta de reinicio y prorroga No.4 con fecha de terminación el 15 de diciembre de 2024.
- En la semana no se realizan actividades de obra


ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTOR DE INTERVENTORÍA ELABORO	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS



PAVIMENTO FLEXIBLE ALCANTARILLAS 36´´ OBRAS COMPLEMENTARIAS



PAVIMENTO FLEXIBLE ALCANTARILLAS 36´´ OBRAS COMPLEMENTARIAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

-Revisión de la tercera entrega de los estudios y diseños enviados por el contratista el día 5 de octubre de 2023.
Se envían los oficios DON-1100-INV-372 y DON-1100-INV-377 donde se solicita el acta de inicio con sus respectivas firmas, puesto a que ya se encuentra en las condiciones óptimas para dar inicio a las actividades constructivas.
- El día 4 de diciembre de 2023 se firma acta de inicio.
- El día 7 de diciembre es suspendido el contrato de obra.
- El día 5 de febrero se dio reinicio al contrato de obra, sin embargo aunque se han hecho las solicitudes verbal y en comité de obra no se tiene flujo de caja, balance y programación.
- El día 24 de mayo es suspendido el contrato de obra.
- El día 3 de junio se da el reinicio de el contrato de obra.
- El día 1 de octubre se da el reinicio de el contrato de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

- Informe Semanal 90 – 20241025 - 20241031

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA 4/11/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO: Contrato de Interventoría N. 1100 de 2022 cuyo objeto es. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 90 del 25/10/2024 al 31/10/2024 Último Informe Semanal NO
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: MONICA MARITZA BENAVIDES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de 1100 metros de pavimento flexible y la construcción de una alcantarilla de 36 pulgadas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural debido al deterioro de las vías terciarias, puesto que presentan problemas en la superficie de rodadura. El tramo priorizado pretende realizarán la construcción de pavimento flexible asfaltico, construcción de alcantarillas y actividades necesarias para mejorar la movilidad y transitabilidad de la población beneficiaria.

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C.
TELF. 60 (1) 265 02 21

INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022

No. Copias impresas: 1

Versión No.: 001

Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAVIAL 2023		
REPRESENTANTE LEGAL:	PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA		
CONSORCIADOS	PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA (99%) DIEGO FERNANDO RUIZ MUÑOZ (1%)		
CONTRATO No.	156	VALOR INICIAL:	$ 1,815,000,000.00
FECHA DE INICIO:	4/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	4/2/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 1,815,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024	VALOR ANTICIPO:	$
SUSPENSIÓN N°1	7/12/2023 4/02/2024	VALOR AMORTIZADO:	$
REINICIO N° 1	5/2/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA N°1	02/04/2024 01/05/2024 60 días		
SUSPENSIÓN N°2	24/05/2024 - 2/06/2024 9 días		
REINICIO N° 2	03/06/2024		
PRORROGA N°2	10/06/2024 - 30/06/2024 21 días		
PRORROGA N°3	1/07/2024 - 31/07/2024 31 días		
SUSPENSIÓN N°3	29/7/2024 31/8/2024 37 días		
AMPLIACIÓN 1 SUSPENSIÓN	1/9/2024 30/9/2024 30 días		
REINICIO N°3	17/9/2024		
PRORROGA N°4	7/10/204 15/12/2024 69 días		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSULTORES DONOVAN SAS			
REPRESENTANTE LEGAL	ROSA MARIA CORDERO CELIS			
CONTRATO No.	1100 de 2022		VALOR INICIAL:	$ 1,740,313,120.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2022		VALOR ADICIONES:	$ 670,000,000.00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/10/2023		VALOR ACUMULADO:	$ 2,410,313,120.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	15/12/2024		VALOR ANTICIPO:	$
PRORROGA 1	01/11/2023 31/12/2023	61 días	VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRORROGA 2	01/01/2024 31/05/2024	151 días	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
PRORROGA 3	01/06/2024 30/06/2024	30 días		
PRORROGA 4	01/07/2024 31/07/2024	31 días		
SUSPENSIÓN 1	29/07/2024 31/08/2024	34 días		
AMPLI 1 SUSP 1	1/09/2024 30/09/2024	30 días		
REINICIO 1	1/10/2024			
PRORROGA 5	04/10/2024 15/12/2024	73 días		

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1,815,000,000			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 452,287,174			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 1,362,712,826			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2,410,313,120			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 2,280,946,113			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 129,367,007			

*El valor "EJECUTADO DE LA VIGENCIA" de la interventoria, corresponde a la proyección de la programación para el mes en curso.
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 1,815,000,000.00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 1,493,905,579.00	82.31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 452,287,174.00	24.92%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1,041,618,405.00)	-57.39%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		82.31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 24,706,104.00	24.92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1,041,618,405.00)	-57.39%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 128,212,762.00	7.06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34,354,269.18	1.89%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: A la fecha después de varias semanas el contratista sigue sin ejecutar actividades, según cronograma se lleva un programado del 82,31% un ejecutado del 24,92% y un atraso en obra del 57,39%, al la fecha no se cuenta con cronograma ni programación de ejecución de obra actualizada.

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 2,280,946,113.44	94.63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2,280,946,113.44	94.63%
INVERSION PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21,561,167.73	0.89%

RADICÓ FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 2024E-VUVRAZ-074141 09/08/2024
PERIODO FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ 132,995,875.00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: El valor programado corresponde al plan de cargas de interventoría por concepto de aprobación ingreso de director de interventoria, residente técnico (1), residentes auxiliares (2), Profesional ambiental, Ingeniero auxiliar Administrativo, Inspector Siso, Profesional Social, Inspector de obra (1). Adicionalmente, se incluyen los costos de alquiler de 4 motocicletas 150CC, un campamento en la ciudad de Popayán.

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 82.31%
Meta Física Ejecutada % 24.92%
Avance o Atraso Físico % -57.39%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Metafísica Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia 2023	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector 3	Total	%
* Pavimento flexible	ML	1100			Prog	1100			1100	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
* Alcantarillas	UND	1			Prog	1			1	100.0%
					Ejec	0			0	0.00%
*										
*										

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Retroexcavadora sobre llantas	1	
Motoniveladora	1	
Vibro compactador	1	
Compactador manual (Saltarin)	1	
Terminadora Finisher	1	
Carro Tanque de agua	1	
Total	6	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Programado: Construcción de 1100 metros lineales de pavimento flexible y construcción de 1 alcantarillas en tubería de 36¨en concreto reforzado
Ejecutado: Cajeo o excavaciones, e instalación de 1000ml de subbase y base
TRAMO Y/O SECTOR 2: Programado:
Ejecutado:
TRAMO Y/O SECTOR 3: Programado:
Ejecutado:

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Municipio de Guachené, vereda sabanetas, sector las vegas	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Licencia ambiental con resolución 1116 del 17 de mayo del 2011 - Titulo minero Nº ICQ 08242

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:N/A

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:
*Mediante comunicado DON-1100-INV-303-2023 del 02 de octubre, se emiten Observaciones a la v1 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-477-2024 del 10 de febrero, se solicita la subsanación de las observaciones emitidas en el oficio 305.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-491-2024 del 27 de febrero, se realiza la segunda solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-505-2024 del 05 de marzo, se realiza la tercera solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-530-2024 del 14 de marzo, se realiza la cuarta solicitud de documentos contractuales.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-531-2024 del 14 de marzo, se emiten observaciones a la v2 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-549-2024 del 27 de marzo, se realiza la quinta solicitud de documentos contractuales (PAGA)
*Mediante comunicado DON-1100-INV-608-2024 del 03 de mayo, se emiten observaciones a la v3 del documento PAGA.
*Mediante comunicado DON-1100-INV-646-2024 del 28 de mayo, se reitera la entrega del PAGA subsanando las observaciones del oficio DON-1100-INV-608-2024
*Mediante comunicado DON-1100-INV-660-2024 del 04 de junio, se emiten observaciones a la v4 del documento PAGA
*Mediante comunicado DON-1100-INV-689-2024 del 24 de junio, se reitera la entrega del documento PAGA.

OBSERVACIONES:

V. GESTION SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	0	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:
Se realiza reunión solicitada por la comunidad, en las instalaciones de la alcaldía municipal de puerto tejada, allí se expuso el estado del contrato y se escuchó las inquietudes de la comunidad acerca del reinicio de obra, en donde se adquirieron compromisos por parte de la interventoría como del contratista.

VI. GESTION PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: N/A

VII. GESTION DE SOSTENIBILIDAD

Según el instructivo para el seguimiento y evaluación de la sostenibilidad, este aplica a proyectos de eficiencia energética y uso de fuentes de energías renovables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto de infraestructura vial. Por consiguiente no aplica.

ELABORO	APROBÓ
ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS ACUMULADAS

- Instalación de 800 ml de base
- Instalación de 1000 ml de base
- A la fecha continua el inconveniente con respecto a los empozamientos en los canales aledaños a la vía, dado esto imposibilita la ejecución de actividades de obra, es por esto que el contratista solicita la suspensión del contrato hasta que se subsane los inconvenientes antes mencionados y por eso se llega a un acuerdo entre las partes de suspender el contrato de obra .
- Se da el reinicio del contrato de obra, a la fecha no se ejecutan actividades de obra.
- Actividades de rocería en el canal afectado por los empozamientos de aguas y que detiene el reinicio de actividades de obra.
- Comité técnico en compañía de la alcaldía del municipio de Puerto Tejada en cabeza de la alcaldesa, interventoría y representante del contratista, en donde se socializa el avance de obra hasta la fecha y se establecen compromisos para las partes.
- A la fecha no se realizan actividades de obra, cabe resaltar que a la fecha se han realizado actividades de cajeo, extensión y compactación aproximadamente 1.000ml de sub base y base.
- A esta semana no se ejecutan actividades de obra.
- Se lleva a cabo reunión en el municipio de puerto tejada en compañía de contratista, donde se establecen compromisos para dar el reinicio de actividades de obra, al momento se está esperando la aprobación del balance de obra para la ejecución de la obra ya que el municipio no está de acuerdo en la reducción de la meta física
- A pesar de que la interventoría ya ha emitido el aval para reiniciar el contrato de obra, hasta la fecha no se cuenta con la aprobación formal, ya que no ha sido firmado por el municipio ni por el contratista.
- En esta semana se firma el acta de reinicio y prorroga No.4 con fecha de terminación el 15 de diciembre de 2024.
- En la semana no se realizan actividades de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

- El día 30 de octubre se lleva a cabo un comite en compañia de personal de la alcaldia de puerto tejada, comunidad y personal de interventoria, en el cual el contratista en cabeza de su representante legal no hizo presencia, en este comite el municipio y comunidad manifiestan la preocupación por la cual no se da reinicio a actividades de obra, de igual manera se establecen unos compromisos de las partes involucradas para continuar con las actividades los cuales reposan en el acta de comite.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

	2024																
	FEBRERO					MARZO				ABRIL				MAYO			
	1-feb	8-feb	15-feb	22-feb	29-feb	7-mar	14-mar	21-mar	28-mar	4-abr	11-abr	18-abr	25-abr	2-may	9-may	16-may	23-may	30-may
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18
Programado																		
Ejecutado																	EN SUSPENSIÓN	EN SUSPENSIÓN

PAVIMENTO FLEXIBLE — ALCANTARILLAS 36´´ — OBRAS COMPLEMENTARIAS

	2024																
	JUNIO					JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE			
	6-jun	13-jun	20-jun	27-jun	4-jul	11-jul	18-jul	25-jul	1-ago	8-ago	15-ago	22-ago	29-ago	5-sep	12-sep	19-sep	26-sep	3-oct
	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15	Semana 16	Semana 17	Semana 18
Programado																		
Ejecutado	EN SUSPENSIÓN																	

PAVIMENTO FLEXIBLE — ALCANTARILLAS 36´´ — OBRAS COMPLEMENTARIAS

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO





Reunion con la comunidad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

-Revisión de la tercera entrega de los estudios y diseños enviados por el contratista el día 5 de octubre de 2023.
Se envían los oficios DON-1100-INV-372 y DON-1100-INV-377 donde se solicita el acta de inicio con sus respectivas firmas, puesto a que ya se encuentra en las condiciones óptimas para dar inicio a las actividades constructivas.
- El día 4 de diciembre de 2023 se firma acta de inicio.
- El día 7 de diciembre es suspendido el contrato de obra.
- El día 5 de febrero se dio reinicio al contrato de obra, sin embargo aunque se han hecho las solicitudes verbal y en comité de obra no se tiene flujo de caja, balance y programación.
- El día 24 de mayo es suspendido el contrato de obra.
- El día 3 de junio se da el reinicio de el contrato de obra.
- El día 1 de octubre se da el reinicio de el contrato de obra.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, se realiza seguimiento de maquinaria y equipos mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 maquinaria y equipo cto obra para los municipios que se encuentran en ejecución y que tuvieron maquinaria en obra:

4.2.1 MERCADERES 1894 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL –

CONTRATO No. F1-F14-240-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADOTRA DE ORUGA	CATERPILLAR		V. La Despensa																															
MOTONIVELADORA	COBELCO/ 120G		V. La Despensa																															
VOLQUETA	CHEVROLET	7	V. La Despensa																															
VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC		V. La Despensa																															
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																															
			TOTAL ACTIVO																															
			TOTAL EN REPARACIÓN																															
			TOTAL INACTIVO																															

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Para el mes de octubre, no se registro maquinaria en obra.
*Aprobado el equipo minimo requerido, mediante oficio DON-1100-375-2023 del 17 de noviembre.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma No Aplica
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No Aplica
Nombre:
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.2 SUCRE 1866 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÌA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO,SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO No. 258-2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS G I A S. A. S.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CASE		V. La Ceja																														
MOTONIVELADORA			V. La Ceja																														
VIBROCOMPACTADOR	CATERPILLAR		V. La Ceja																														
VOLQUETA		7M	V. La Ceja																														
TOTAL ACTIVO																																	
TOTAL EN REPARACIÓN																																	
TOTAL INACTIVO																																	

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Para el mes de octubre, no se registro maquinaria en obra.
Maquinaria aprobada mediante oficio 631 -1 del 17 de mayo con el informe preacta 2.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma No Aplica
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No Aplica
Nombre:
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.3 SUCRE 1769 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO No. LP-090-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CASE 580		V. La Balastrera																														
VIBROCPOMPACTADOR			V. La Balastrera																														
VOLQUETA		7	V. La Balastrera																														
MOTONIVELADORA			V. La Balastrera																														
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Para el mes de octubre, no se registro maquinaria en obra.
Maquinaria aprobada

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma No Aplica
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No Aplica
Nombre:
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.2.4 PUERTO TEJADA 2496– CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA VILLA OLIMPICA – JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – CAUCA.

CONTRATO No. 156-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS INFRAVIAL 2023

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 **INTERVENTORÍA:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROEXCAVADORA	CASE		Villa olimpica																														
VOLQUETA		16M	Villa olimpica																														
MOTONIVELADORA			Villa olimpica																														
VIBROCOMPACTADOR			Villa olimpica																														
			TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																														
			TOTAL ACTIVO																														
			TOTAL EN REPARACIÓN																														
			TOTAL INACTIVO																														

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Para el mes de octubre, no se registro maquinaria en obra.
A la fecha del siguiente reporte, solo se tiene aprobado la retroexcavadora, motoniveladora y vibrocompactador; pero se esta a la espera de la carta de disponibilidad y compromiso.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma No Aplica
Nombre:
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma No Aplica
Nombre:
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Durante este periodo, se realiza seguimiento al personal y pago de seguridad social mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 personal control aportes legales y seguridad social obra:

4.3.1 MERCADERES 1894 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (DÍa / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-240-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	EDGAR FELIPE BONILLA ORDOÑEZ	76316048	DIRECTOR	$ 3,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Independiente			I	Nueva EPS	76643514	$ 437,500	Colpensiones	76643514	$ 560,000	$ 210,000	$ -	$ -	
2	LUZ ESTELLA QUINTANA	34544403	RESIDENTE	$ 2,500,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 23		$ 174,000	V	Nueva EPS	9467573895	$ 100,000	Colpensiones	9467573895	$ 400,000	$ 100,000	$ -	$ -	
3	HOYOS ORDOÑEZ GILDA YOLIMA	34561599	AMBIENTAL	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Independiente		$ 36,200	I	SAN ITAS	9466831108	$ 162,000	Porvenir	9466831108	$ 208,000	$ -	$ -	$ -	
4	MARTINEZ MANUEL	1059908262	PROF. SST	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Independiente		$ 68,000	V	Nueva EPS	9467871634	$ 162,500	Porvenir	9467871634	$ 208,000	$ 26,000	$ -	$ -	
5	CARDENAS QUINTERO ALEXANDER	80140992	MAESTRO OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Independiente		$ 90,500	V	Nueva EPS	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
6	ASTUDILLO NARVAEZ DIEGO ALEXANDE	76343243	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 26		$ 90,500	V	Nueva EPS	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
7	DAVID FAJARDO ALEJANDRO	1061019713	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 27		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
8	INSUASTY MARINO	4709833	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 28		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
9	LOPEZ GALINDEZ NILTON OMAR	1096034526	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 29		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
10	MEDINA OMEN DIEGO FERNANDO	1061737631	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 30		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
11	MELENDEZ PINTA CARLOS ALBERTO	1061020097	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 31		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468340454	$ 52,000	Proteccion	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
12	MELENDEZ LOPEZ YEISON CAMILO	1061021429	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 32		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
13	MUÑOZ RAMOS ANDERSON FABIAN	1096036648	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 33		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
14	MUÑOZ MARTINEZ JELVIS	1086328358	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 34		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
15	SANCHEZ MUÑOZ WILMAN ALEXIS	1059534017	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 35		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
16	ORDOÑEZ MUÑOZ FABIAN ERNESTO	1063811382	AYUDANTE OBRA	$ 1,300,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO MERCADERES 36		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468340454	$ 52,000	Porvenir	9468340454	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Sanicruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: Juan Felipe Bonilla Quintana
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3.2 SUCRE 1769 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: LP-090-2023
CONTRATISTA: CONSORCIO SUCRE 22

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100
INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

NOMBRE ARL:
NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	CALVO JOSE	10549315	DIRECTOR	$ 2,500,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	INDEPENDIENTE		$ 90,500	V	SANITAS	9468406747	$ 52,000	PORVENIR	9468406747	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
2	MUÑOZ ALEXANDER	76332344	RESIDENTE OBRA	$ 1,500,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO SUCRE 22		$ 90,500	V	EMSSANAR	9468406747	$ 52,000	PORVENIR	9468406747	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
3	MULCUE LUIS	1064433981	MAESTRO	$ 1,300,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO SUCRE 22		$ 90,500	V	NUEVA EPS	9468406090	$ 52,000	PORVENIR	9468406090	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
4	CHAVES ALVARO	10692388	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO SUCRE 22		$ 90,500	V	NUEVA EPS	9468406747	$ 52,000	PORVENIR	9468406747	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
5	HOYOS EDWIN	1061985243	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO SUCRE 22		$ 90,500	V	SANITAS	9468406747	$ 52,000	PORVENIR	9468406747	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
6	UAJI ALVEIRO	4628275	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO SUCRE 22		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468406747	$ 52,000	PORVENIR	9468406747	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
7	UAJI JHOAN	1007095536	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO SUCRE 22		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468406747	$ 52,000	PORVENIR	9468406747	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
8	MUÑOZ EDWAR	1144524202	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO SUCRE 22		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468406747	$ 52,000	PORVENIR	9468406747	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	
9	NAVIA MILTON	76027927	AYUDANTE	$ 1,300,000	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	CONSORCIO SUCRE 22		$ 90,500	V	ASMET SALUD	9468406747	$ 52,000	PORVENIR	9468406747	$ 208,000	$ 52,000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñán Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: Jesus Ancizar Calvo Castro
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Se presentan en el formato MEPIMN1-IN-15-FR-8 el reporte de las actas parciales cobradas por los contratistas a la fecha:

4.4.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: ARG-OBRA-009-2022 **CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S

MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 2022190500011, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100- 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	713	-		Nacion	Contrato Principal	$ 958,081,628	$ 662,120,669
TOTAL						$ 958,081,628	$ 662,120,669

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 958,081,628.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial de obra	nov-23	$ 295,960,959		$ 295,960,959	$ 88,788,288	$ 207,172,671	$ 198,636,200	713 del 18/10/2022	$ 662,120,669	$ 662,120,669	-			N/A
2															
3															
4															
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 958,081,628	$ -	**$ 958,081,628**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 958,081,628	$ -	**$ 958,081,628**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: William Alcides Sanchez fajardo
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.2 SUCRE 1866 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 258-2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS G I A S. A. S.

MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100- 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	2022197850032	-		Nacion	Contrato Principal	$ 4,306,911,911	$ 4,030,109,209
			TOTAL			$ 4,306,911,911	$ 4,030,109,209

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4,306,911,911.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial de obra	nov-23	$ 276,802,702		$ 276,802,702.00	$ 83,040,811	$ 193,761,891	$ 1,209,032,762.70	2022197850032 de 16/05/2023	$ 4,030,109,209.00	$ 4,030,109,209.00	-			Pagada
2	Parcial de obra	mar-24	$ 360,407,432.90		$ 360,407,432.90	$ 240,271,622	$ 120,135,811	$ 968,761,141	2022197850032 de	$ 3,669,701,776.10	$ 3,669,701,776.10	-			N/A
3															
4															
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1,063,184,929	$ -	**$ 1,063,184,929**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 1,063,184,929	$ -	**$ 1,063,184,929**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Habert Lizardo Dorado Dorado
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.3 SUCRE 1769 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: LP 090-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22

MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100- 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	211	-		Nacion	Contrato Principal	$ 1,078,384,354	$ 748,706,652
TOTAL						$ 1,078,384,354	$ 748,706,652

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1,078,384,354.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial de obra	feb-24	$ 329,677,702		$ 329,677,702	$ 131,871,081	$ 197,806,621	$ 187,762,806	211 de 3/03/2023	$ 748,706,652	$ 748,706,652	-			Pagada
2				$ -			$ -					-			
3															
4															
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1,078,384,354	$ -	**$ 1,078,384,354**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 1,078,384,354	$ -	**$ 1,078,384,354**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Jesus Ancizar Calvo Castro
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: LP 005-003-15.05/059
CONTRATISTA: CONSORCIO ONIX CCM

MES INFORME MENSUAL: oct-24
PROYECTO: BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100- 2022
INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	20221021002	-		Nacion	Contrato Principal	$ 3,478,131,956	$ 3,219,860,703
TOTAL						$ 3,478,131,956	$ 3,219,860,703

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3,478,131,956.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial de obra	jun-23	$ 217,034,666	$ 41,236,587	$ 258,271,253	$ 77,481,376	$ 180,789,877	$ 965,958,211	891 del 11/12/2021	$ 3,219,860,703	$ 3,219,860,703	-			Pagada
2	Parcial de obra	ago-23	$ 274,624,771	$ 52,178,706	$ 326,803,477	$ 98,041,043	$ 228,762,434	$ 867,917,168	892 del 11/12/2021	$ 2,893,057,226	$ 2,893,057,226	-			Pagada
3															
4															
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 3,445,219,240	$ -	**$ 3,445,219,240**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 32,912,716	$ -	**$ 32,912,716**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 3,478,131,956	$ -	**$ 3,478,131,956**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Cristhian Camilo Moreno Herrera
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.5 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: LP 04-003-15.05/058 **CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO

MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVÉNIO INTERADMINISTRATIVO N° 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100- 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	202212130010	-		Nacion	Contrato Principal	$ 318,955,479	$ 524,455,442
2023	202304110016			Nacion	Contrato Principal	$ 744,229,450	
TOTAL						$ 1,063,184,929	$ 524,455,442

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,063,184,929.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial de obra	nov-23	$ 538,729,487		$ 538,729,487	$ 161,618,846	$ 377,110,641	$ 157,336,632.60	202212130010 de 13/12/2022 202304110016 de 11/04/2023	$ 524,455,442	$ 524,455,442	-			Pagada
2	Parcial de obra	ene-24	$ 417,379,495		$ 956,108,982	$ 125,213,849	$ 292,165,647	$ 32,122,784	202212130010 de 13/12/2022 202304110016 de 11/04/2023	$ 107,075,947	$ 107,075,947	-			Pagada
3															
4															
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1,063,184,929	$ -	**$ 1,063,184,929**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 1,063,184,929	$ -	**$ 1,063,184,929**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Habert Lizardo Dorado Dorado
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.6 ALMAGUER 1749 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-289-2022
CONTRATISTA: JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

MES INFORME MENSUAL: oct-24
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100- 2022
INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	815	-		Nacion	Contrato Principal	$ 1,799,782,602	$ 881,999,880
TOTAL						$ 1,799,782,602	$ 881,999,880

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1,799,782,602.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial de obra	nov-23	$ 917,782,722		$ 917,782,722	$ 458,891,361	$ 458,891,361	$ 440,999,940	815 del 29/12/2022	$ 881,999,880	$ 881,999,880	-			N/A
2	Parcial de obra	mar-24	$ 771,163,550		$ 1,688,946,272	$ 440,999,940	$ 330,163,610	$ -	815 del 29/12/2022	$ 110,836,330	$ 110,836,330				N/A
3															
4															
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 1,799,782,602	$ -	**$ 1,799,782,602**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 1,799,782,602	$ -	**$ 1,799,782,602**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Julian Lizandro Gonzales Casas
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.7 ALMAGUER 1982 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023
CONTRATISTA: HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

MES INFORME MENSUAL: oct-24
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100- 2022
INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	486	-		Nacion	Contrato Principal	$ 795,011,198	$ 354,807,811
TOTAL						$ 795,011,198	$ 354,807,811

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 795,011,198.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial de obra	nov-23	$ 440,203,387		$ 440,203,387		$ 440,203,387		486 del 1/07/2023	$ 354,807,811	$ 354,807,811	-			N/A
2	Parcial de obra	ene-24	$ 311,005,140		$ 311,005,140		$ 311,005,140		486 del 1/07/2023	$ 43,802,671	$ 43,802,671	-			N/A
3															
4															
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 795,011,198	$ -	**$ 795,011,198**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 795,011,198	$ -	**$ 795,011,198**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Henry Andres Gomez Rengifo
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.8 INZA 1983 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 141 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 2022

MES INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN LAS VEREDAS CALDERAS (RESGUARDO INDIGENA DE CALDERAS) Y LA VEGA, MUNICIPIO DE INZÁ CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100- 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	562	-		Nacion	Contrato Principal	$ 608,231,289	$ 142,132,895
TOTAL						$ 608,231,289	$ 142,132,895

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 608,231,289.44

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial de obra	dic-23	$ 466,098,395		$ 466,098,395	$ 139,829,513.69	$ 326,268,881	$ 42,639,873.16	1120 del 1/07/2023	$ 142,132,895	$ 142,132,895	-			N/A
2	Parcial de obra	feb-24	$ 74,829,209.83		$ 74,829,209.83	$ 42,639,873.16	$ 32,189,337	$ -	1120 del 1/07/2023	$ 67,303,685	$ 67,303,685				N/A
3															
4															
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 608,231,289	$ -	**$ 608,231,289**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 608,231,289	$ -	**$ 608,231,289**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: James Piamba Hoyos
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.4.9 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 484 de 2022
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS RURAL 2022

MES INFORME MENSUAL: oct-24
PROYECTO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100- 2022
INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1120	-		Nacion	Contrato Principal	$ 912,367,379	$ 717,869,042
TOTAL						$ 912,367,379	$ 717,869,042

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 912,367,379.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial de obra	nov-23	$ 194,498,337		$ 194,498,337		$ 194,498,337		1120 del 1/07/2023	$ 717,869,042	$ 717,869,042	-			N/A
2	Parcial de obra	mar-24	$ 311,771,211		$ 506,269,548		$ 311,771,211		1120 del 1/07/2023	$ 406,097,831	$ 406,097,831				N/A
3	Parcial de obra	may-24	$ 309,931,484		$ 816,201,032		$ 309,931,484		1120 del 1/07/2023	$ 96,166,347	$ 96,166,347				N/A
4	Parcial de obra	jul-24	$ 96,166,347		$ 912,367,379		$ 96,166,347		1120 del 1/07/2023	$ -	$ -				N/A
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 912,367,379	$ -	**$ 912,367,379**
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES		$ -	**$ -**
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	**$ -**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	**$ -**
GESTIÓN AMBIENTAL , SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ -	$ -	**$ -**
VALOR TOTAL	$ 912,367,379	$ -	**$ 912,367,379**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Jesus Anclzar Calvo Castro
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Durante este periodo, se realiza seguimiento de tiempo mediante el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10 estado general del tiempo para los contratos activos.

4.5.1 MERCADERES 1894 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-240-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	24	23	24	23	24	22	24	24	24	23	24	24	23	24	24	24	22	24	24	24	21	23	23	24	23	24	23	24	24	21	724
Lluvias moderadas	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	11
Lluvias intensas	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	3	9
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Juan Felipe Bonilla Quintana
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.2 SUCRE 1866 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 258-2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS G Y A S. A. S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÌA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO,SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	23	23	24	24	24	24	24	23	22	24	24	21	23	24	22	24	24	24	24	24	23	24	21	24	23	20	22	23	721
Lluvias moderadas	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	2	0	17
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	6
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Paola Andrea Arteaga Jaramillo
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.3 SUCRE 1769 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: LP-090-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	22	24	23	24	24	24	22	24	24	20	24	24	24	22	24	23	24	23	24	24	23	24	21	24	22	24	23	22	22	21	717
Lluvias moderadas	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	2	0	1	0	2	0	13
Lluvias intensas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	3	14
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Jesus Ancizar Calvo Castro
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.5.4 PUERTO TEJADA 2496 - CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 156-2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAVIAL 2023

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	23	24	24	24	24	23	24	24	24	23	23	24	22	24	22	23	24	24	24	24	24	23	23	24	24	24	22	24	22	23	728
Lluvias moderadas	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	0	9
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	7
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Paola Fernanda Erazo Rodriguez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 63202-355568 QND

Firma
Nombre: Jesus Ancizar Calvo Castro
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11 de INVÍAS con los ensayos realizados y los resultados obtenidos, para los convenios:

4.6.1 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: 005-003-15.05/059 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM

PROYECTO: REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	8/04/2023	Registro de resistencia a la compresión de cilindros de concreto ciclopeo	INV. E -401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412	Bolivar	3	2500 PSI	2561	SI	Edad de ensayo 28 dias
2	17/08/2023	Registro de resistencia a la compresión de cilindros de concreto hidráulico	INV. E -401, E-402, E-403, E-404, E-410, E-412	Bolivar	3	3000 PSI	3107	SI	Edad de ensayo 28 dias
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Jhaner Segovia Quintero
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6.2 ALMAGUER 1749 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: F1-F14-289-2022 **CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	15/07/2023 - 17/07/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	4	3000 PSI	3695	SI	Edad de ensayo 49-51 días
2	15/07/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	2	3000 PSI	3939	SI	Edad de ensayo 47 días
3	15/07/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	3	3000 PSI	4397	SI	Edad de ensayo 43 días
4	15/07/2023 - 22/07/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	3	3000 PSI	4517	SI	Edad de ensayo 40 días
5	15/07/2023 - 17/07/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	4	3000 PSI	3342	SI	Edad de ensayo 33-35 días
6	2/09/2023 y 14/09/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	3	3000 PSI	3584	SI	Edad de ensayo 16 y 28 dias
7	4/09/2023 y 18/09/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	3	3000 PSI	3284	SI	Edad de ensayo 14 y 28 dias
8	7/09/2023 y 21/09/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	3	3000 PSI	3235	SI	Edad de ensayo 14 y 28 dias
9	11/09/2023 y 25/09/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	2	3000 PSI	3048	SI	Edad de ensayo 14 y 28 dias
10	2/10/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	4	3000 PSI	3443	SI	Edad del ensayo 7 y 28 dias
11	3/10/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	4	3000 PSI	3338	SI	Edad del ensayo 7 y 28 dias
12	30/11/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	1	3000 PSI	3960	SI	Edad del ensayo 56 dias
13	3/11/2023	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Almaguer	2	3000 PSI	4289	SI	Edad del ensayo 56 dias
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Julian Lizandro Gonzales Casas
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6.3 ALMAGUER 1982 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023 **CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA EL CHILCO DEL CORREGIMIENTO LA HERRADURA, MUNICIPIO DE ALMAGUER, CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	25/06/2023	Diseño de mezcla	INV-E-223	Almaguer	4	3000 PSI	2122 PSI	SI	Edad de ensayo 7 dias
2									
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Henry Andres Gomez Rengifo
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6.4 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 - CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: 484-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURALES 2022

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-24 **PROYECTO:** EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO A REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL-NACIONAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	13/05/2024	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Santander de Quilichao	1	3000 Psi	3554 Psi	si	En obra proporcione 1:2:3 Cemento San Marcos Arena Triturado
2	13/05/2024	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Santander de Quilichao	1	3000 Psi	3182 Psi	si	En obra proporcione 1:2:3 Cemento San Marcos Arena Triturado
3	13/05/2024	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Santander de Quilichao	1	3000 Psi	3791 Psi	si	En obra proporcione 1:2:3 Cemento San Marcos Arena Triturado
4	20/06/2024	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Santander de Quilichao	1	3000 Psi	3474 Psi	si	En obra proporcione 1:2:3 Cemento San Marcos Arena Triturado
5	20/06/2024	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Santander de Quilichao	1	3000 Psi	3204 Psi	si	En obra proporcione 1:2:3 Cemento San Marcos Arena Triturado
6	20/06/2024	Resistencia a la compresión del concreto hidraulico	INV E -410-13	Santander de Quilichao	1	3000 Psi	3551 Psi	si	En obra proporcione 1:2:3 Cemento San Marcos Arena Triturado
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Jesus Ancizar Calvo Castro
Representante Legal

Firma
Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el seguimiento de garantías de los contratos de obra que continúan en ejecución, no se presenta para los contratos con meta física finalizada al 100%.

4.7.1 MERCADERES 1894 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 11 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. L.P. 003 DE 2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL

FECHA DE INICIO: 9/08/2023

PLAZO INICIAL: 3

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 2,248,615,000.00

VALOR ACUMULADO: $ 2,248,615,000.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 224,861,500.00	30	12	2022	30	9	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100.0%	$ 2,248,615,000.00	30	12	2022	30	9	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 449,723,000.00	30	12	2022	30	9	2025
Calidad de la revisión, ajustes y diseños	30.0%	$ 674,584,500.00	30	12	2023	30	9	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 674,584,500.00	30	12	2022	5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000050922

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	13.3%	$ 300,000,000.00	27	9	2022	30	9	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012759 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 224,861,500.00	9	8	2023	17	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50.0%	$ 1,124,307,500.00	9	8	2023	17	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 449,723,000.00	9	8	2023	15	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 674,584,500.00	Día	Mes	Año	5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 435-47-994000052216

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: _____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: _____ **PRÓRROGA No.:** 6 **MODIFICACIÓN No.:** _____ **SUSPENSIÓN No.:** _____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	17.3%	$ 390,000,000.00	6	10	2024	15	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 435-74-994000012863 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: _____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.2 SUCRE 1866 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. MS-SP-LP-002-2022 **CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS G Y AS. A. S.

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VÌA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÌA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO,SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE-CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL"

FECHA DE INICIO: 16/05/2023

PLAZO INICIAL: 4

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4,306,911,911.00

VALOR ACUMULADO: $ 4,306,911,911.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 430,691,191.10	16	5	2023	18	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 1,292,073,573.30	16	5	2023	18	7	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15.0%	$ 646,036,786.65	16	5	2023	19	3	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20.0%	$ 861,382,382.20				5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101261798

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/02/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	9.3%	$ 400,000,000.00	16	5	2023	18	3	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101046612 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/02/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 7 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 430,691,191.10	16	5	2023	15	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 1,292,073,573.30	16	5	2023	15	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15.0%	$ 646,036,786.65	16	5	2023	15	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20.0%	$ 861,382,382.20				5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101261798

Certificado de modificación o anexo No.: 14
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 7 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10.8%	$ 464,000,000.00	16	5	2023	15	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101046612 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. 14
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñán Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.3 SUCRE 1769 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) / 11 (Mes) / 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. MS-SP-LP-003-2022 **CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 16/05/2023

PLAZO INICIAL: 4

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,078,384,354.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,078,384,354.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 107,838,435.40	1	2	2023	1	10	2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 323,515,306.20	1	2	2023	1	10	2023
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15.0%	$ 161,757,653.10	1	2	2023	1	6	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20.0%	$ 215,676,870.80	1	2	2023	1	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100018793

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/02/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	18.5%	$ 200,000,000.00	27	9	2022	27	12	2022
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100004020 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 7 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	9.9%	$ 106,544,629.00	5	10	2024	15	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	29.6%	$ 319,633,887.00	5	10	2024	15	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14.8%	$ 159,816,943.00	5	10	2024	15	12	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	19.8%	$ 213,089,258.00	15	12	2024	15	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CCS-100018793

Certificado de modificación o anexo No.: 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: ____

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ____ **PRÓRROGA No.:** 7 **MODIFICACIÓN No.:** ____ **SUSPENSIÓN No.:** ____

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	24.1%	$ 260,000,000.00	1	2	2023	15	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CCS-100004020 **OTRAS PÓLIZAS No.** ____

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: ____

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.4 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10 (Día) 11 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 005-003-15.05/059 **CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -

FECHA DE INICIO: 25/04/2023

PLAZO INICIAL: 5

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 3,478,131,956.00

VALOR ACUMULADO: $ 3,478,131,956.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 347,813,195.56	13	12	2022	13/09/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 1,043,439,586.00	13	12	2022	13/09/2023		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 695,626,391.00	13	12	2022	13	5	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 1,043,439,586.00				5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 40-44-101058457

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	13.3%	$ 464,000,000.00	13	12	2022	13	12	2027
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 40-40-101015399 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10.0%	$ 347,813,195.60	25	4	2023	30	11	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30.0%	$ 1,043,439,586.80	25	4	2023	30	11	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.0%	$ 695,626,391.20	25	4	2023	31	7	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30.0%	$ 1,043,439,586.80	Día	Mes	Año	5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 40-44-101058457

Certificado de modificación o anexo No.: 14
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 5 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	15.0%	$ 520,000,000.00	25	4	2023	31	7	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 40-40-101015399 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 14
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.7.5 PUERTO TEJADA 2496 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	10 (Día)	11 (Mes)	2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 156 de 5 de septiembre 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAVIAL 2023

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA-CAUCA

FECHA DE INICIO: 5/12/2023

PLAZO INICIAL: 2

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 15/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,815,000,000.00

VALOR ACUMULADO: $ 1,815,000,000.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN S.A.S.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20.0%	$ 363,000,000.00	5	9	2023	5	3	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e	5.0%	$ 90,750,000.00	5	9	2023	5	11	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20.0%	$ 363,000,000.00	Día	Mes	Año	5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101274737

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	19.2%	$ 348,000,000.00	5	9	2023	5	11	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101050238 **OTRAS PÓLIZAS No.** -

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 3

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20.0%	$ 363,000,000.00	4	12	2023	5	2	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5.0%	$ 90,750,000.00	4	12	2023	5	10	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20.0%	$ 363,000,000.00	Día	Mes	Año	5 años		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101274737

Certificado de modificación o anexo No.: 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 3

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	21.5%	$ 390,000,000.00	5	9	2023	5	10	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101050238 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Christian Camilo Estupiñan Santacruz
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Los planes de calidad remitidos a la interventoría se encuentran en revisión.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.9.1 SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

4.9.1.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE ARGELIA
NIT: 891.500.725-1
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ARGELIA Territorio de

12

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO N°: ARG.OBRA-009-2022 **DE:** 07 DE OCTUBRE DE 2022
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA DE LA VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA - CAUCA, EN EL MARCO DEL PROYECTO RADICADO CON EL CÓDIGO BPIN 202219050001, DENOMINADO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE ARGELIA CAUCA
PROCESO SELECCIÓN N°: LP-003-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN: 3.5 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIACIÓN: ABRIL 03 DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: JULIO 18 DE 2023
VALOR DEL CONTRATO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($ 958´081.628.00).
VALOR DEL ANTICIPO: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 287´424.488.00)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: VEREDA EL ENCANTO DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DEPARTAMENTO DE CAUCA.
CONTRATISTA: EMCONSUT S.A.S.
NIT: 900.361.801-6
INTERVENTOR(A): CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
NIT: 900.644.351-9
SUPERVISOR(A): BRAYAN ALEJANDRO CISNEROS DELGADO
C.C. 1.082.776.235 SAN AGUSTIN-HUILA

La siguiente tabla lista los ítems en los cuales se programa invertir del anticipo de este contrato:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE %
1	Alquiler de maquinaria Amarilla HM	$ 57,484,897.60	20%
2	Transporte de materiales	$ 28,742,448.80	10%
3	Compra de materiales y accesorios	$ 201,197,141.60	70%
TOTAL			100%

"ARGELIA TERRITORIO DE VIDA"
DIRECCIÓN: CALLE 2 # 2 ESQUINA — CÓDIGO POSTAL: — SEC. GOBIERNO: 3213607959 — DESPACHO: 3216046767
TELÉFONOS: ALCALDE: 3107902075
CORREO: ALCALDIA@ARGELIA-CAUCA.GOV.CO — PÁGINA WEB: WWW.ARGELIA-CAUCA.GOV.CO

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE ARGELIA NIT: 891.500.725-1	ARGELIA Territorio de
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

NOTAS

1. Los porcentajes y los ítems para la inversión del Anticipo pueden variar conforme la clase de contrato.
2. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo, sin retenciones.
3. Solo se permite máximo un 10% del total del anticipo para compra de equipos nuevos y/o repuestos.
4. Los gastos Financieros corresponden a cuota de manejo, cuatro por mil, comisiones, entre otros.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 03 días del mes de abril de 2023.

(Firma)

WILLIAM ALCIDES SANCHEZ FAJARDO
Contratista

(Firma)

BRAYAN ALEJANDRO CISNEROS
Supervisor

Firma

JHONNATAN PATIÑO CERON
Alcalde Municipal

Firma

ROSA MARÍA CORDERO CELIS
Interventoría

Original: Tesorería Municipal
Copia N°1: Supervisor(a) del contrato
Copia N°2: Interventor(a)
Copia N°3: Contratista

4.9.1.2 MERCADERES 1894 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINTRA-MN-IN-2-PR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1
FECHA	8 (Día)	8 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE MERCADERES, CAUCA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. P1-P14-243-2022 DE 30 de diciembre de 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO MERCADERES 23

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES - DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100 DE 2022 INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN S.A.S

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la revisión cuando se trate de una revisión)

JUSTIFICACIÓN: De acuerdo a la Cláusula Sexta ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO del Contrato de Obra No. P1-P14-243-2022 del 30 de diciembre de 2022
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO 1.124.307.500,00

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	SUMINISTRO DE MATERIALES	480.000.000,00	209.307.500,00			689.307.500,00	58,5%
2	MANO DE OBRA INCLUYE NOMINAS Y COSTO DE PERSONAL	150.000.000,00	40.000.000,00			190.000.000,00	16,9%
3	TRANSPORTE DE MAQUINARIA Y MATERIALES	100.000.000,00				100.000.000,00	8,9%
4	COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR	165.000.000,00				165.000.000,00	14,7%
TOTAL		875.000.000,00	249.307.500,00			1.124.307.500,00	100%

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos o insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos, en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para este caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la interventoría para su inversión.

JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
R/L CONSORCIO MERCADERES 23
Contratista
CC 1.144.094.382

ROSA MARIA CORDERO CELIS
R/L CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
Interventor
CC. 53.155.174

Original: Archivo de Gestión del contrato (Responsable Administrativo)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.1.3 SUCRE 1866 – CAUCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT :817.003.440-5

A. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA	:	258 DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2022
CONTRATISTA	:	CONSTRUOBRAS GIA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO NIT: 900442569-1
OBJETO	:	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VÍA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DE 2021
VALOR	:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($4.306.911.911)
ANTICIPO	:	MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON TRES DÉCIMOS ($1.292.073.573.3)
PLAZO	:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	693 DE 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022
OBJETO	:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9
CONTRATO DE INTERVENTORIA	:	1100 DE 2022
CONTRATISTA	:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S. NIT. 900.644.351-9 RL ROSA MARIA CORDERO CELIS
VALOR	:	MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($1.740.313.120), IVA INCLUIDO
PLAZO	:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023.

PROGRAMACIÓN INICIAL ☑

REPROGRAMACIÓN ☐

B. DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 193.811.036,00	15%
2	SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO	$ 607.274.579,45	47%
3	MANO DE OBRA INCLUYE NÓMINAS Y SUBCONTRATOS DE MANO DE OBRA	$ 232.573.243,19	18%
4	TRANSPORTE MAQUINARIA COMBUSTIBLES	$ 129.207.357,33	10%
5	COMPRA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA MENOR	$ 124.039.063,04	9,6%
6	VALOR GMF	$ 5.168.294,29	0,40%
	TOTAL	$ 1.292.073.573,30	100%

NOTAS

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Sólo se permite un máximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los Veintisiete días del mes de mayo del 2023

PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
R/L CONSTRUOBRAS GIA SAS
Contratista

ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría

4.9.1.4 SUCRE 1769 – CAUCA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SUCRE
NIT :817.003.440-6

A. DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA	:	LP-090-2023
CONTRATISTA	:	CONSORCIO SUCRE 22 NIT: 901.667.156-1 R.L: JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO C.C: 10.546.096 expedida en Popayán.
OBJETO	:	"MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA"
VALOR	:	MIL SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS MDA/CTE. ($1,065,446,290).
ANTICIPO	:	$ 319.633.887,00
PLAZO	:	El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de CUATRO (04) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	No. 108 del 21 DE ENERO DEL 2023 por valor de ($ 1.080.000.000)
OBJETO INTERVENTORIA	:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"
CONTRATO DE INTERVENTORIA	:	1100 DE 2022.
REPRESENTANTE LEGAL	:	CONSULTORES DONOVAN S.A.S. NIT. 900.644.351-9 R.L: ROSA MARIA CORDERO CELIS C.C: 53.155.174 expedida en Bogotá D.C
VALOR	:	MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($1.740.313.120), IVA INCLUIDO.
PLAZO	:	HASTA 31 DE OCTUBRE DE 2023.

PROGRAMACIÓN INICIAL ☑

REPROGRAMACIÓN ☐

B. DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 35.159.727,60	11,0%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 31.963.388,70	10,0%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 79.908.471,00	25,0%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 172.602.299,70	54,0%
	TOTAL	$ 319.633.887,00	100%

NOTAS

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Sólo se permite un máximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los veintinueve días del mes de mayo del 2023

JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
10.546.096 expedida en Popayán.
R.L. CONSORCIO SUCRE 22
NIT. 901.667.156-1
Contratista

ROSA MARIA CORDERO CELIS
53.155.174 expedida en Bogotá D.C
R.L. CONSULTORES DONOVAN S.A.S.
NIT. 900.644.351-9
Interventoria

4.9.1.5 BOLIVAR 1750 – CAUCA

PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA NIT 800.095.961-2
CONTRATISTA:	CONSORCIO PH CHALGUAYACO NIT. 901.661.375-0
REPRESENTANTE LEGAL:	HEBERT LIZARDO DORADO DORADO C.C. 76.316.092 de Popayán Cauca
DIRECCIÓN:	CARRERA 6ª # 20N-23 INT 201
CONTRATO:	LP-004-003-15.05/058
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA TERCIARIA 12KA04-4 QUE COMUNICA LAS VEREDAS CHALGUAYACO, SESTIADERO, MERCADO-CUCHO EN EL MUNICIPIO DE BOLIVAR, CAUCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1750 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR INICIAL:	MIL SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($1.063.184.929,00)
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
INTERVENTOR	CONSULTORES DONOVAN S.A.S. NIT 900.644.351-9
SUPERVISOR	MARIO ALEXANDER RENDÓN – SECRETARIO DE PLANEACIÓN

La siguiente tabla lista los ítems en los cuales se programa invertir el anticipo de este contrato:

DESCRIPCIÓN	%	VALOR PARCIAL	VALOR
Materiales	98,20%	$313.207.853,70	$313.207.853,70
Equipo	0,92%	$2.935.081,50	$2.935.081,50
Transporte	0,73%	$2.335.817,90	$2.335.817,90
Mano De Obra	0,15%	$ 476.725,60	$ 476.725,60
TOTAL INVERSIÓN ANTICIPO	100%		**$ 318.955.478,70**

CONTRATISTA

HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
Repr. Legal consorcio PH CHALGUAYACO
C.C. 76.316.092

INTERVENTOR

ROSA MARÍA CORDERO CELIS
Repr. Legal CONSULTORES DONOVAN S.A.S
C.C. 53.155.174

4.9.1.6 ALMAGUER 1749 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCION TERRITORIAL CAUCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No: F1-F14-289-2022
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. _____ (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** _____

OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALMAGUER DEPARTAMENTO DEL CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____ (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** _____

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	Pago salarios y jornales	$ 63.415.737,00					5,58
2	Transporte de Materiales y Maquinaria	$ 203.763.489,00					16,67
3	Compra de Materiales	$ 506.723.125,00					77,75
4							
5							
N							
TOTAL		$ 773.902.351,00					100%

NOTAS:
1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la Inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de Inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.9.1.7 INZÁ 1983 – CAUCA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA

CODIGO: MNIPRA-MN-01-FR-1
VERSION: 1
PAGINA: 1 DE 1

FECHA: 6 (Día) 7 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE INZA — DIRECCIÓN TERRITORIAL:

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 27 DE SEPTIEMBRE 2022 — CONTRATISTA: CONSORCIO INZA 2022 R/L JAMES PIAMBA HOYOS

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS, PLACA HUELLAS EN CONCRETO LONGITUD= 240 m. CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE Y RECUPERACIÓN DE ALCANTARILLAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022 — INTERVENTOR: ROSA MARIA CORDERO CELIS

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar el número consecutivo del número de la revisión anterior del plan (iniciar en número 1))

JUSTIFICACION: De acuerdo a la Clausula Cuarta Valor y Forma de Pago del Contrato de Obra No. 141 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

VALOR ANTICIPO: $ 182.469.357,00

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1				VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	SUMINISTRO DE MATERIALES	$ 177.678.001,00				$ 177.678.001,00	97,37%
2	GASTOS DE ADMINISTRACION	$ 4.791.356,00				$ 4.791.356,00	2,63%
TOTAL		182.469.357,00	-			182.469.357,00	100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal. (deberán priorizarse a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra). En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Solo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos, en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del interventor previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en equipo de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la interventoría para su inversión.

(Firma)
JAMES PIAMBA HOYOS
R/L CONSORCIO INZA
Contratista
CC 76.327.028

(Firma)
ROSA MARIA CORDERO CELIS
Representante Legal o su Apoderado(a)
CC. Interventor 53.155.174
Matrícula No. 25202-261378 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Administración Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRA

4.9.2.1 ARGELIA 1984 – CAUCA

PRESUPUESTO ARGELIA MODIFICATORIO 1						SEMANA 73	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA							
1	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	2527.20	$ 1,020.00	$ 2,577,744.00	2527.20	$ 2,577,744.00
2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	463.46	$ 281,980.00	$ 130,686,451.00	463.46	$ 130,686,450.80
3	SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS	ML	1647.00	$ 3,040.00	$ 5,006,880.00		
4	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	225.03	$ 13,620.00	$ 3,064,909.00	225.03	$ 3,064,908.60
5	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	99.36	$ 18,300.00	$ 1,818,288.00		
6	RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE	M3	39.74	$ 249,430.00	$ 9,912,348.00		
7	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	396.45	$ 826,140.00	$ 327,523,203.00	36.45	$ 30,112,803.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) CICLOPEO	M3	102.38	$ 551,760.00	$ 56,489,189.00	6.08	$ 3,354,700.80
9	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	17014.94	$ 7,860.00	$ 133,737,428.00	1554.93	$ 12,221,717.57
10	TUBERIA DE PLASTICO TIPO SANITARIA NORMA NTC 1087 DE DIAMETRO 101,6 MM	ML	110.40	$ 33,170.00	$ 3,661,968.00		
11	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	2252.16	$ 9,030.00	$ 20,336,995.00		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS 36¨							
12	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	23	$ 36,690.00	$ 843,870.00	23.00	$ 843,870.00
13	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	168.1	$ 13,620.00	$ 2,289,522.00	168.10	$ 2,289,522.00
14	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	273.22	$ 18,300.00	$ 4,999,926.00	273.22	$ 4,999,926.00
15	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	105.15	$ 826,140.00	$ 86,868,621.00	105.15	$ 86,868,621.00
16	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	3.77	$ 551,760.00	$ 2,080,135.20	3.77	$ 2,080,135.20
17	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	3846.44	$ 7,880.00	$ 30,309,947.20	3846.44	$ 30,309,947.20
18	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	23	$ 556,010.00	$ 12,788,230.00	23.00	$ 12,788,230.00
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
19	ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO BIOSEGURIDAD (SEGÚN COMPROBANTE POR MES)	GL	0	$ 1,095,274.00	$ -		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO							
20	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	3259.925	$ 1,020	$ 3,325,123.50	3259.93	$ 3,325,123.50
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE AFIRMADO	M3	488.740	$ 245,040	$ 119,760,849.60	488.74	$ 119,760,849.60
VALOR TOTAL					$ 958,081,627.50		$ 445,284,549
							46.48%

4.9.2.2 MERCADERES 1894 – CAUCA

PRESUPUESTO MERCADERES						SEMANA 90	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS 36¨							
1.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	679.8	$ 13,720	$ 9,326,856	500.00	$ 6,860,000
1.2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	209.15	$ 80,370	$ 16,809,386		$ -
1.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU	M3	120.51	$ 792,200	$ 95,468,022		$ -
1.4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPa (F)	M3	20.2	$ 625,000	$ 12,625,000		$ -
1.5	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa	KG	8930.1	$ 9,120	$ 81,442,512		$ -
1.6	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE	ML	92.7	$ 1,210,000	$ 112,167,000		$ -
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA							$ -
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	4245.2	$ 17,160	$ 72,847,632	6994.68	$ 120,028,709
2.2	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	1550.67	$ 198,400	$ 307,652,928	1548.75	$ 307,272,000
2.3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU	M3	933.79	$ 792,000	$ 739,561,680	939.88	$ 744,381,792
2.4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	50.07	$ 625,500	$ 31,318,785	22.50	$ 14,073,750
2.5	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) (CICLOPEO)	M3	445.78	$ 482,240	$ 214,972,947	391.40	$ 188,748,736
2.6	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	56320	$ 9,120	$ 513,638,400	41041.20	$ 374,295,744
2.7	SELLO PARA JUNTAS	ML	6729.33	$ 3,900	$ 26,244,387		$ -
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
3.1	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	GLB	1	$ 2,468,398	$ 2,468,398		
				IVA CONSULTORIA	$ 468,996		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS							
	COMPLEMENTARIAS			1%	$ 11,602,071		
VALOR TOTAL					$ 2,248,615,000		$ 1,755,660,731
							78.08%

4.9.2.3 SUCRE 1866 – CAUCA

PRESUPUESTO SUCRE 1866 MODIFICATORIO NO. 2								
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SEMANA 90**	
PRELIMINARES							
1	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	171.68	$ 174,053.76	$ 29,881,550	67.56	$ 11,759,072
2	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	108	$ 88,439.54	$ 9,551,470	75.00	$ 6,632,966
CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO							$ -
3	EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES	M3	7320.88	$ 9,992.33	$ 73,152,649	7314.97	$ 73,093,594
4	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES	M3/KM	87827.68	$ 1,684.83	$ 147,974,710	78635.97	$ 132,488,241
5	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIAL	M3	2308.13	$ 109,109.10	$ 251,837,987	345.81	$ 37,731,018
6	SUBBASE GRANULAR CLASE B	M3	1916.13	$ 181,940.55	$ 348,621,746	376.29	$ 68,462,410
7	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	26936.33	$ 9,855.75	$ 265,477,734	997.17	$ 9,827,858
8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR = 4,1	M3	2427.1	$ 823,981.88	$ 1,999,886,421	352.48	$ 290,437,133
9	BORDILLO EN CONCRETO 21 MPA VACIADO IN	ML	3990	$ 71,640.11	$ 285,844,039		$ -
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36¨							$ -
10	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	1217.61	$ 32,540.12	$ 39,621,176	1363.19	$ 44,358,366
11	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL	M3	561.19	$ 101,368.86	$ 56,887,191	288.25	$ 29,219,574
12	RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA	M3	654.81	$ 13,509.53	$ 8,846,175	477.95	$ 6,456,880
13	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	152.13	$ 821,087.76	$ 124,912,081	103.01	$ 84,580,250
14	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	11299.69	$ 9,855.75	$ 111,366,920	7347.12	$ 72,411,378
15	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	39.44	$ 675,707.99	$ 26,649,923	38.69	$ 26,143,142
16	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA	ML	161	$ 957,967.62	$ 154,232,787	123.00	$ 117,830,017
CONSTRUCCION DE FILTRO							$ -
17	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	560	$ 32,540.12	$ 18,222,467	478.77	$ 15,579,293
18	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	550	$ 198,796.81	$ 109,338,246	455.00	$ 90,452,549
19	GEOTEXTIL NT 1800 RESISTENCIA A LA	M2	4266	$ 6,069.37	$ 25,891,932	2978.00	$ 18,074,584
20	TUBERIA PERFORADA DE 4 PULGADAS	ML	1215	$ 34,094.35	$ 41,424,635	939.39	$ 32,027,898
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL							$ -
21	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN	ML	7980	$ 2,512.29	$ 20,048,074		$ -
22	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON	UND	52	$ 652,493.24	$ 33,929,648		$ -
ITEMS NO PREVISTOS CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN							$ -
23	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	109.42	$ 32,540.12	$ 3,560,540	109.42	$ 3,560,540
24	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES	M3/KM	1463	$ 1,684.83	$ 2,464,906	1463.00	$ 2,464,906
25	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL	M3	90	$ 101,368.86	$ 9,123,197		
26	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	1.8	$ 675,707.99	$ 1,216,274		
27	GEOTEXTIL NT 1800 RESISTENCIA A LA	M2	84	$ 6,069.37	$ 509,827		
28	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	7.8	$ 198,796.81	$ 1,550,615		
29	TUBERIA PERFORADA DE 4 PULGADAS	ML	15	$ 34,094.35	$ 511,415		
30	CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa (D)	M3	37.28	$ 821,087.76	$ 30,610,152		
31	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa.	KG	3144.49	$ 9,855.75	$ 30,991,307		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS							
32	Obras de compensación ambiental y/o	%	1	$ 42,774,034	$ 42,774,034		
VALOR TOTAL					$ 4,306,911,828		$ 1,173,591,669
							27.25%

4.9.2.4 SUCRE 1769 – CAUCA

PRESUPUESTO SUCRE 2 MODIFICACION No. 3								
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		SEMANA 90	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA								
1	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	498.70	$ 190,127.00	$ 94,816,335	532.54	$	101,250,233
2	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	407.49	$ 777,315.00	$ 316,748,089	273.78	$	212,813,254
3	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G)	M3	142.88	$ 439,460.00	$ 62,790,045	115.44	$	50,731,262
4	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	19986.10	$ 9,942.00	$ 198,701,806	11722.14	$	116,541,518
5	SELLO DE JUNTAS CON MATERIAL	ML	0.00	$ 4,090.00	$ -		$	-
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36¨							$	-
6	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	132.08	$ 36,671	$ 4,843,506	1091.99	$	40,044,365
7	ACERO DE REFUERZO FY = 420 MPA	KG	2337.55	$ 9,942	$ 23,239,922	2329.40	$	23,158,895
8	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA	ML	27.00	$ 851,010	$ 22,977,270	25.00	$	21,275,250
9	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	2.05	$ 575,351	$ 1,179,470	2.73	$	1,570,708
10	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	30.07	$ 777,315	$ 23,373,862	38.34	$	29,802,257
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL							$	-
11	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL	%	1	$ 7,517,969	$ 7,517,969		$	-
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							$	-
11	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	GLB		$ 1,711,197	$ -		$	-
ACTIVIDADES NO PREVISTAS							$	-
NP-01	EXCAVACIÓN VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	530.22	$ 36,671	$ 19,443,698	438.95	$	16,096,735
NP-02	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	235.44	$ 197,522	$ 46,504,580	209.63	$	41,406,537
NP-03	TUBERIA DE DRENAJE Diam 100mm	ML	456.38	$ 34,978	$ 15,963,260	350.00	$	12,242,300
NP-04	GEOTEXTIL NT 2500	M2	1613.08	$ 10,896	$ 17,576,120	1424.08	$	15,516,776
NP-05	EXCAVACIÓN DE CLASIFICAR DE PRESTAMOS	M3	1092.91	$ 20,241	$ 22,121,591	700.00	$	14,168,700
NP-06	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	710.14	$ 187,110	$ 132,874,295	450.00	$	84,199,500
NP-07	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	123.86	$ 51,879	$ 6,425,733	123.60	$	6,412,244
NP-08	PREPARACIÓN, PERFORACIÓNES, DEMOLICIÓN, EXTRACCIÓN Y RETIRO DE SOBRANTES DE ROCA	UND	22.00	$ 1,374,088	$ 30,229,936	22.00	$	30,229,936
N.P 9	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	142.86	$ 30,700	$ 4,385,802	124.17	$	3,812,019
N.P 10	RELLENO CON MATERIAL DE RECEBO	M3	216.29	$ 63,494	$ 13,733,117	159.98	$	10,157,770
VALOR TOTAL					$ 1,047,327,487		$	831,430,259
								79.39%

4.9.2.5 BOLÍVAR 1867 – CAUCA

PRESUPUESTO BOLIVAR 1867 - MILAGROS - ACTA DE MODIFICACION NO. 2								
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**SEMANA 90**	
A. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES								
1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	142	$ 181,764.00	$ 25,810,488		50	$ 9,088,200.00
2	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	89	$ 81,042.00	$ 7,212,738		48	$ 3,890,016.00
3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	86	$ 91,174.00	$ 7,840,964		32	$ 2,917,568.00
B. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES								$ -
4	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	800.89	$ 311,091	$ 249,149,671		800	$ 248,872,800.00
C. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO								$ -
5	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	755.27	$ 24,000	$ 18,126,480		580.86	$ 13,940,640.00
6	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU	M3	690	$ 765,385	$ 528,115,650		533.19	$ 408,095,628.15
7	CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa - CICLÓPEO	M3	445	$ 554,024	$ 246,540,680		150.38	$ 83,314,129.12
8	DEFENZA METÁLICA	M	12	$ 218,922	$ 2,627,064			$ -
9	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	KG	30129.47	$ 9,700	$ 292,255,859		26004.05	$ 252,239,285.00
D. ESTRUCTURAS DE DRENAJE								$ -
10	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	M3	2350	$ 24,000	$ 56,400,000		400	$ 9,600,000.00
11	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	285	$ 91,174	$ 25,984,590		57.22	$ 5,216,976.28
12	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	538	$ 204,226	$ 109,873,588		149.28	$ 30,486,857.28
13	CONCRETO RESISTENCIA 28MPA (C) - MEZCLA IN SITU	M3	80	$ 1,036,426	$ 82,914,080			$ -
14	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU	M3	903	$ 765,385	$ 691,142,655		70	$ 53,576,950.00
15	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	5	$ 727,128	$ 3,635,640		6.8	$ 4,944,470.40
16	ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI	KG	37500	$ 9,700	$ 363,750,000		6189.98	$ 60,042,806.00
17	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	180	$ 868,679	$ 156,362,220		54	$ 46,908,666.00
18	RELLENO DE GRAVILLA	M3	87	$ 269,491	$ 23,445,717		34	$ 9,162,694.00
19	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSIÓN GRAB MÍNIMA DE 700 N APROXIMADAMENTE	M2	826	$ 10,205	$ 8,429,330		210	$ 2,143,050.00
20	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS	ML	393	$ 38,199	$ 15,012,207			$ -
E. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN								$ -
21	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL	M3	626.61	$ 24,000	$ 15,038,640		650	$ 15,600,000.00
22	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	321.31	$ 204,226	$ 65,619,856		100	$ 20,422,600.00
23	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA	M3	52	$ 765,385	$ 39,800,020		41.25	$ 31,572,131.25
24	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	2	$ 727,128	$ 1,454,256		3.09	$ 2,246,825.52
25	ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI	KG	7923	$ 9,700	$ 76,853,100		3893.15	$ 37,763,555.00
26	RELLENO CON GRAVILLA	M3	15	$ 269,491	$ 4,042,365			$ -
27	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO CON RESISTENCIA	M2	1559.2	$ 10,205	$ 15,911,636		500	$ 5,102,500.00
28	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A	M3	0	$ 38,199	$ -			$ -
29	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO	M3	548	$ 475,149	$ 260,381,652		300	$ 142,544,700.00
F. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL								$ -
30	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP	UND	30	$ 730,253	$ 21,907,590			$ -
31	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O	GLB	0	$ 32,912,716	$ -			$ -
F. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL								$ -
INP1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON	M2	149.28	$ 267,420	$ 39,920,458		80	$ 21,393,600.00
INP2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL	M3	425	$ 31,530	$ 13,400,250		100	$ 3,153,000.00
INP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC	ML	267	$ 34,354	$ 9,172,518		60	$ 2,061,240.00
VALOR TOTAL					$ 3,478,131,962			$ 1,526,300,888
								43.88%

4.9.2.6 BOLÍVAR 1750 – CAUCA

PRESUPUESTO BOLIVAR 1750 - CHALGUAYACO MODIFICATORIO No. 1							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 74	
A. ACTIVIDADES PRELIMINARES Y EXPLANACIONES							
1	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	M3	4.34	$ 153,105.00	$ 664,476	4.34	$ 664,475.70
2	REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS	ML	6	$ 55,477.00	$ 332,862	6.00	$ 332,862.00
B. AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES							
3	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	448.29	$ 258,200	$ 115,748,478	448.29	$ 115,748,478.00
C. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO							
4	EXCAVACIONES MANUAL PARA RIOSTRAS DE PLACA HUELLA	M3	60.1	$ 26,725	$ 1,606,173	60.10	$ 1,606,172.50
5	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU (HUELLAS, RIOSTRAS, CUNETAS)	M3	504.23	$ 715,730	$ 360,892,538	504.23	$ 360,892,537.90
6	CONCRETO RESISTENCIA 14 Mpa - CICLÓPEO	M3	80.3	$ 544,008	$ 43,683,842	80.30	$ 43,683,842.40
7	ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa	KG	29289.02	$ 9,843	$ 288,291,824	29289.02	$ 288,291,823.86
D. ESTRUCTURAS DE DRENAJE							
8	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE RETIRO)	M3	310.14	$ 26,725	$ 8,288,492	310.14	$ 8,288,491.50
9	ACERO DE REFUERZO Fy=60.000 PSI	KG	5980.4	$ 9,843	$ 58,865,077	5980.40	$ 58,865,077.20
10	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE D DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	43	$ 817,200	$ 35,139,600	43.00	$ 35,139,600.00
E. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL							
11	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROREFLECTIVA TIPO III (75X75	UND	17	$ 746,991	$ 12,698,847	17.00	$ 12,698,847.00
12	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	GLB	0.00	$ 10,520,062	$ -		
ITEMS NO PREVISTOS							
1	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA	M3	398.22	$ 24,157.00	$ 9,619,801	398.22	$ 9,619,800.54
2	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D) - MEZCLA IN SITU (CAJAS DE ENTRADA Y SALIDA)	M3	79.85	$ 835,116	$ 66,684,013	74.00	$ 61,798,584.00
3	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO	M3	410.89	$ 93,328	$ 38,347,542	410.89	$ 38,347,541.92
4	REMOCION DE DERRUMBRES	M3	328	$ 17,057	$ 5,594,696	328.34	$ 5,600,495.38
5	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	M3	284.23	$ 65,562	$ 18,634,687	284.23	$ 18,634,687.26
6	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	37.13	$ 252,123	$ 9,361,327	30.38	$ 7,659,496.74
7	GEOTEXTIL TIPO NO TEJIDO NT 2500	M2	274.05	$ 9,913	$ 2,716,658	221.55	$ 2,196,225.15
8	TUBERIA PERFORADA DE DIAMETRO 100 MM	ML	78.3	$ 36,057	$ 2,823,263	63.30	$ 2,282,408.10
VALOR TOTAL					$ 1,079,994,196		$ 1,072,351,447
							99.29%

4.9.2.7 ALMAGUER 1749 – CAUCA

PRESUPUESTO ALMAGUER 1749 - HATO HUMUS - MODIFICACION No. 1							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SEMANA 67**	
A. CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS DE 36¨							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	431.06	$ 41,548.00	$ 17,909,681	431.06	$ 17,909,680.88
2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	152.07	$ 17,079.00	$ 2,597,204	152.07	$ 2,597,203.53
3	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	59.47	$ 992,001.00	$ 58,994,299	59.47	$ 58,994,299.47
4	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	8.32	$ 796,225.00	$ 6,624,592	8.32	$ 6,624,592.00
5	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA	KG	5189.48	$ 9,553.00	$ 49,575,102	5189.48	$ 49,575,102.44
6	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900MM DE DIÁMETRO INTERIOR	ML	63	$ 978,174.00	$ 61,624,962	63.00	$ 61,624,962.00
B. CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
7	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	580.46	$ 41,548.00	$ 24,116,952	580.46	$ 24,116,952.08
8	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	0	$ 17,079.00	$ -	0.00	$ -
9	SUBBASE GRANULAR TIPO C	M3	1052.76	$ 405,707	$ 427,112,101	1052.76	$ 427,112,101.32
10	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	17.42	$ 796,225.00	$ 13,870,240	17.42	$ 13,870,239.50
11	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	630.78	$ 992,001.00	$ 625,734,391	630.78	$ 625,734,390.78
12	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (G) CICLOPEO	M3	216.68	$ 703,683	$ 152,474,032	216.68	$ 152,474,032.44
13	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA	KG	28614.56	$ 9,553	$ 273,354,892	28614.56	$ 273,354,891.68
14	SELLO PARA JUNTAS	ML	6384.26	$ 6,405	$ 40,891,185	6384.26	$ 40,891,185.43
C. CONSTRUCCIÓN DE FILTRO							
15	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	0	$ 41,548.00	$ -		
16	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	0	$ 9,958	$ -		
17	TUBERIA PLASTICA SANITARIA NORMA NTC 1087 DE DIAMETRO 101,6MM	ML	0	$ 41,853	$ -		
18	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	0	$ 353,549	$ -		
D. CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN							
19	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	55.66	$ 41,548.00	$ 2,312,562	55.66	$ 2,312,561.68
20	RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE	M3	3.96	$ 353,549	$ 1,400,054	3.96	$ 1,400,054.04
21	CONCRETO RESISTENCIA 21MPA (D)	M3	20.92	$ 992,001.00	$ 20,752,661	20.92	$ 20,752,660.92
22	CONCRETO RESISTENCIA 14MPA (F)	M3	1.1	$ 796,225.00	$ 875,848	1.10	$ 875,847.50
23	ACERO DE REFUERZO Fy 420 MPA	KG	1508.4	$ 9,553	$ 14,409,745	1508.40	$ 14,409,745.20
24	TUBERIA PLASTICA SANITARIA NORMA NTC 1087 DE DIAMETRO 101,6MM	ML	11.45	$ 41,853	$ 479,217	11.45	$ 479,216.85
25	TUBERIA PLASTICA SANITARIA NORMA NTC 1087 DE DIAMETRO 50,8MM	ML	0	$ 23,880	$ -		
26	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	45.6	$ 9,958	$ 454,085	45.60	$ 454,084.80
27	RELLENO PARA ESTRUCTURA CON SUELO	M3	22.98	$ 17,079	$ 392,475	22.98	$ 392,475.42
E. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL							
28	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO III (75X75)CM	UND	6	$ 637,719	$ 3,826,314	6.00	$ 3,826,314.00
F. ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
29	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	GLB	0	$ 1,482,535	$ -		
30	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	GLB	0	$ 17,766,423	$ -		
SUB TOTAL					$ 1,799,782,594		$ 1,799,782,594
VALOR IVA CONSULTORIA					$ -		100.00%
VALOR TOTAL					$ 1,799,782,594		$ 28,090,155

4.9.2.8 ALMAGUER 1982 – CAUCA

PRESUPUESTO ALMAGUER 1982 - CHILCO MODIFICATORIO No. 2							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SEMANA 64**	
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
1	SUBBASE GRANULAR TIPO C	M3	335.75	$ 445,142.00	$ 149,456,427	335.75	$ 149,456,426.50
2	SELLO ASFALTICO PARA JUNTAS	ML	0	$ 3,105.00	$ -		
3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	401.49	$ 46,140.00	$ 18,524,749	401.49	$ 18,524,748.60
4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO EXCAVACIÓN	M3	171.48	$ 15,496.00	$ 2,657,254	171.48	$ 2,657,254.08
5	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	241.9	$ 1,020,185.00	$ 246,782,752	241.90	$ 246,782,751.50
6	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	M3	103.57	$ 705,577.00	$ 73,076,610	103.57	$ 73,076,609.89
7	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	10740.6	$ 9,618.00	$ 103,303,091	10740.60	$ 103,303,090.80
8	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	6.95	$ 714,961.00	$ 4,968,979	6.95	$ 4,968,978.95
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS 36¨							
9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	326.24	$ 46,140	$ 15,052,714	326.24	$ 15,052,713.60
10	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	161.54	$ 15,496	$ 2,503,224	161.54	$ 2,503,223.84
11	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	45.74	$ 1,020,185	$ 46,663,262	45.74	$ 46,663,261.90
12	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	6.21	$ 714,961	$ 4,439,908	6.21	$ 4,439,907.81
13	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	3965.62	$ 9,618	$ 38,141,333	3965.62	$ 38,141,333.16
14	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	18	$ 873,572	$ 15,724,296	18.00	$ 15,724,296.00
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL							
15	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75x75) CM	UND	0	$ 637,799	$ -		
REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS							
16	REVISION Y/O AJUSTEN DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCION No. 2483 DEL 19/10/2020	GLB	1	$ 5,000,000	$ 5,000,000	1.00	$ 5,000,000.00
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
17	ELEMENTOS E INSUMOS DE PROTECCIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD (SEGÚN COMPROBANTE POR MES)	GLB	0	$ 1,287,132	$ -		
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS							
18	OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	%	0	$ 7,335,318	$ -		
MANTENIMIENTO VIAL							
19	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	6665	$ 1,130	$ 7,531,450	6665.00	$ 7,531,450.00
20	AFIRMADO CON MATERIAL DE LA ZONA	M3	333	$ 148,520	$ 49,457,160	333.00	$ 49,457,160.00
CONSTRUCCION DE FILTRO							
19	GEOTEXTIL TIPO NT-2500 O SIMILAR NO TEJIDO	M2	228.38	$ 9,924	$ 2,266,443	228.38	$ 2,266,443.12
20	MATERIAL GRANULAR DRENANTE 3"	M3	28.98	$ 193,700	$ 5,613,426	28.98	$ 5,613,426.00
21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DRENAJE 4"	ML	60.1	$ 48,222	$ 2,898,142	60.10	$ 2,898,142.20
VALOR TOTAL					$ 794,061,220		$ 794,061,218
							100.00%

4.9.2.9 INZÁ 1983 – CAUCA

PRESUPUESTO INZA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 70	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS							
1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	263.90	$ 46,500.00	$ 12,271,350	250.32	$ 11,639,880
2	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	107.85	$ 44,980.00	$ 4,851,093	75.20	$ 3,382,496
3	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	40.67	$ 753,018.00	$ 30,625,242	30.12	$ 22,680,902
4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	1.92	$ 640,824.00	$ 1,230,382	1.56	$ 999,685
5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	2386.97	$ 8,565.00	$ 20,444,398	2218.00	$ 18,997,170
6	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE	ML	24.00	$ 586,929.00	$ 14,086,296	24.00	$ 14,086,296
7	DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO	M3	8.51	$ 518,395.00	$ 4,409,602		
8	GEOTEXTIL	M2	0	$ 11,908.00	$ -		
9	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	M3	0	$ 180,900.00	$ -		
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN CONCRETO							
10	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	11.46	$ 46,811	$ 536,454	11.46	$ 536,454
11	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	0	$ 44,989	$ -		
12	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	98.81	$ 753,018	$ 74,405,709	94.98	$ 71,521,650
13	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	3.77	$ 640,824	$ 2,415,906	3.70	$ 2,371,049
14	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	M3	46.21	$ 449,262	$ 20,760,397	44.82	$ 20,135,923
15	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	6849.72	$ 8,565	$ 58,667,852	6739.00	$ 57,719,535
16	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU; NO	M3	39.7	$ 763,510	$ 30,311,347	39.70	$ 30,311,347
17	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; NO	M3	21.65	$ 546,548	$ 11,832,764	21.65	$ 11,832,764
18	SUBBASE GRANULAR CLASE C	M3	181.68	$ 231,636	$ 42,083,628	181.68	$ 42,083,628
AJUSTES DE DISEÑOS BASE CARTILLA COLOMBIA RURAL							
19	REVISION Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCION NO. 2483 DEL 19 OCT 2020	GLB	1	$ 6,100,000	$ 6,100,000		
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
20	ELEMENTOS DE BIOSEGUIRDAD	GLB	1	$ 1,830,000	$ 1,830,000		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO							
21	CONFORMACION DE CALZADA	M2	58800.00	$ 1,119	$ 65,797,200	58500.00	$ 65,461,500
22	AFIRMADO	M3	2402.36	$ 67,920	$ 163,168,474	2300.00	$ 156,216,000
23	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	440.99	$ 46,500	$ 20,506,035	440.99	$ 20,506,035
24	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	131.80	$ 44,980	$ 5,928,364	131.80	$ 5,928,364
25	DEMOLICION CAMARAS DE INSPECCION	UND	5	$ 980,539	$ 4,902,695		
VALOR TOTAL					$ 597,165,188		$ 556,410,679
							93.18%

4.9.2.10 SANTANDER DE QUILICHAO 1768 – CAUCA

PRESUPUESTO SANTANDER DE QUILICHAO MODIFICATORIO 1							
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**SEMANA 85**	
CONSTRUCCION Y RECUPERACION DE ALCANTARILLAS							
1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	495.02	$ 36,126.00	$ 17,883,093	495.02	$ 17,883,092.52
2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL RECEBO	M3	304.02	$ 63,494.00	$ 19,303,446	304.02	$ 19,303,445.88
3	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	64.93	$ 607,882.00	$ 39,469,778	64.93	$ 39,469,778.26
4	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	4.27	$ 443,814.00	$ 1,895,086	4.27	$ 1,895,085.78
5	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	5481.88	$ 7,234.00	$ 39,655,920	5481.88	$ 39,655,919.92
6	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO 21 MPA DE 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR	ML	56	$ 648,333.00	$ 36,306,648	56.00	$ 36,306,648.00
CONSTRUCCION MURO EN CONCRETO REFORZADO							
7	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	0.00	$ 36,126.00	$ -		
8	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL RECEBO	M3	0.00	$ 63,494.00	$ -		
9	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	0.00	$ 607,882.00	$ -		
10	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	0.00	$ 443,814.00	$ -		
11	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	0.00	$ 7,234.00	$ -		
CONSTRUCCION MURO EN GAVIONES							
12	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	85.62	$ 36,126.00	$ 3,093,108	85.62	$ 3,093,108.12
13	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL RECEBO	M3	14.23	$ 63,494.00	$ 903,520	14.23	$ 903,519.62
14	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	M3	0	$ 348,816.00	$ -		
15	GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO	M3	54	$ 324,854.00	$ 17,542,116	54.00	$ 17,542,116.00
CONSTRUCCION PLACA HUELLA EN CONCRETO							
16	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	708.01	$ 36,126.00	$ 25,577,569	708.01	$ 25,577,569.26
17	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL RECEBO	M3	91.98	$ 63,494.00	$ 5,840,178		
18	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D)	M3	250.09	$ 607,882.00	$ 152,025,209	250.09	$ 152,025,209.38
19	CONCTERO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	6.59	$ 443,814.00	$ 2,924,734	6.59	$ 2,924,734.26
20	CONCTERO RESISTENCIA 14 MPA (G) CICLOPEO	M3	104.61	$ 348,816.00	$ 36,489,642	104.61	$ 36,489,641.76
21	ACERO DE REFUERZO FY 420 MPA	KG	17778.77	$ 7,234.00	$ 128,611,622	17778.77	$ 128,611,622.18
22	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU;	M3	110.48	$ 673,649.00	$ 74,424,742	110.48	$ 74,424,741.52
23	BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU;	ML	1023	$ 67,916.00	$ 69,478,068	890.01	$ 60,445,919.16
24	SUBBASE GRANULAR CLASE A	M3	502.44	$ 139,495.00	$ 70,087,868	502.44	$ 70,087,867.80
CONSTRUCCION FILTRO							
25	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	265.88	$ 36,126.00	$ 9,605,181	265.88	$ 9,605,180.88
26	MATERIAL GRANURAL DRENANTE	M3	274.37	$ 195,311.00	$ 53,587,479	274.37	$ 53,587,479.07
27	TUBERIA DE DRENAJE DIAMETRO 100MM	ML	483.8	$ 36,057.00	$ 17,444,377	483.80	$ 17,444,376.60
28	GEOTEXTIL NT 2500	M2	1710.38	$ 9,927.00	$ 16,978,942	1710.38	$ 16,978,942.26
29	MATERIAL DE MEJORAMIENTO PARA VIAS	M3	491.45	$ 138,767.00	$ 68,197,042	491.45	$ 68,197,042.15
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							
30	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	GLB	1	$ 2,820,000	$ 2,820,000		
VALOR TOTAL					$ 910,145,368		$ 892,453,040
							98.06%

4.9.2.11 PUERTO TEJADA 2496 – CAUCA

PRESUPUESTO PUERTO TEJADA						SEMANA 90	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
CONSTRUCCION PAVIMENTO FLEXIBLE							
1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	251.33	$ 33,069.00	$ 8,311,232		
2	SUBBASE GRANULAR CLASE C SBG-50	M3	2217.6	$ 107,962.00	$ 239,416,531	1620	$ 174,898,440.00
3	BASE GRANULAR CLASE C GRADACION GRUESA	M3	2217.6	$ 115,632.00	$ 256,425,523	1330	$ 153,790,560.00
4	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-1	M2	7392	$ 2,716.00	$ 20,076,672		$ -
5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA	M3	739.2	$ 1,273,832.00	$ 941,616,614		$ -
6	EXCAVACIONES VARIAS CLASIFICAR	M3	3104.64	$ 39,789.00	$ 123,530,521	3054.00	$ 121,515,606.00
7	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	147.84	$ 27,607.00	$ 4,081,419	1.00	$ 27,607.00
8	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA	M3	147.84	$ 703,908.00	$ 104,065,759		$ -
9	CONCRETO RESISTENCIA 14 MPA (F)	M3	11.09	$ 490,230.00	$ 5,436,651		$ -
10	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	6066.82	$ 9,638.00	$ 58,472,011		$ -
11	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN	ML	3696	$ 1,867.00	$ 6,900,432		$ -
12	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LAMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (75X75 CM)	UND	2	$ 406,783.00	$ 813,566		$ -
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 36´´							$ -
13	REMOCION DE ALCANTARILLAS	ML	6.00	$ 76,116.00	$ 456,696	5.00	$ 380,580.00
14	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	49.00	$ 39,789.00	$ 1,949,661	40.00	$ 1,591,560.00
15	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	3.60	$ 27,607.00	$ 99,385	3.00	$ 82,821.00
16	CONCRETO RESISTENCIA 21 MPA (D) - MEZCLA	M3	9.80	$ 703,908.00	$ 6,898,298		$ -
17	CONCRETO RESITENCIA 14 MPA (F)	M3	1.80	$ 490,230.00	$ 882,414		$ -
18	ACERO DE REFUERZO FY 4200 MPA	KG	735.42	$ 9,638.00	$ 7,087,978		$ -
19	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE III	ML	7.00	$ 927,331.00	$ 6,491,317		$ -
REVISION DE DISEÑOS BASE CARTILLA COLOMBIA RURAL							$ -
20	REVISION Y/O AJUSTE DE DISEÑOS BASE DE LA CARTILLA COLOMBIA RURAL ADOPTADA MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 2483 DEL 19/10/2020 - INCLUYE AJUSTE A DISEÑOS DE PUENTE Y ENSAYOS (*)	GLB	1	$ 3,410,295.00	$ 3,410,295		$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS							$ -
21	OBRAS COMPLEMENTARIAS	%	1	$ 17,998,332.70	$ 17,998,333		$ -
VALOR IVA							$ -
22	VALOR IVA CONSULTORIA 19%	%	19	$ 2,820,000	$ 53,580,000		$ -
VALOR TOTAL					$ 1,868,001,308		$ 452,287,174.00
							24.21%


4.9.3 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

Para el presente periodo no se realizaron comités de obra en las instalaciones de INVIAS Cauca.

4.9.4 ACTAS DE REUNIÓN

Durante el periodo del presente informe, se desarrollaron las siguientes reuniones:

4.9.4.1 BOLIVAR 1867 – CAUCA

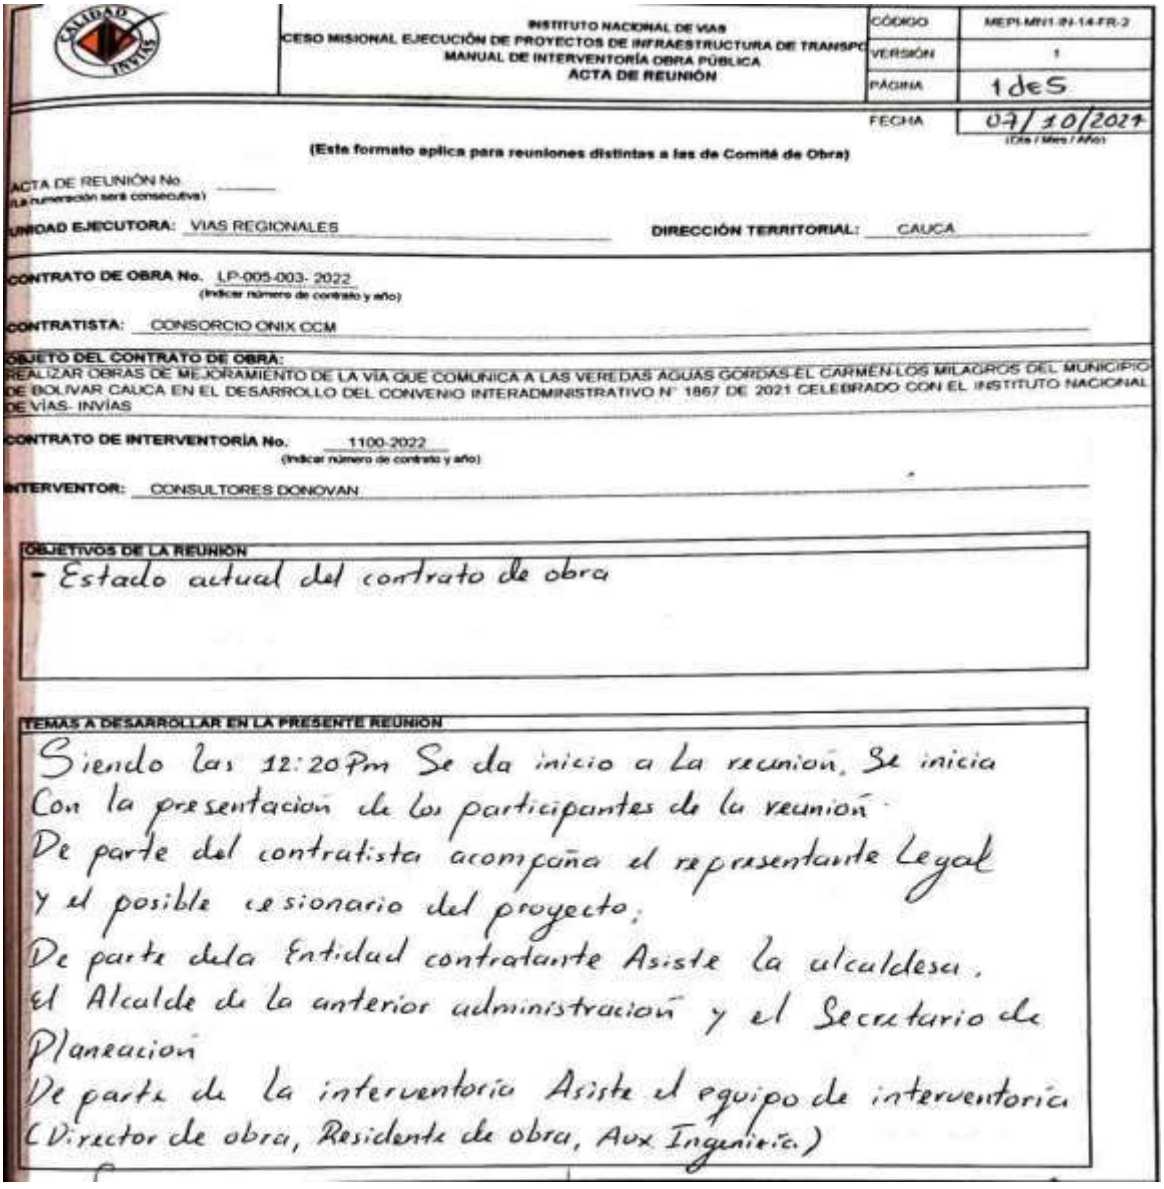

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO: MEPI-MN1-PI-14-FR-2
VERSIÓN: 1
PÁGINA: 1 de 5
FECHA: 07/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. LP-005-003- 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO ONIX CCM

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS AGUAS GORDAS-EL CARMEN-LOS MILAGROS DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA EN EL DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1867 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS- INVÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN

OBJETIVOS DE LA REUNION
- Estado actual del contrato de obra

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION
Siendo las 12:20 Pm Se da inicio a la reunión, Se inicia Con la presentación de los participantes de la reunión.
De parte del contratista acompaña el representante Legal y el posible cesionario del proyecto.
De parte dela Entidad contratante Asiste la alcaldesa, el Alcalde de la anterior administración y el Secretario de Planeación
De parte de la interventoria Asiste el equipo de interventoría (Director de obra, Residente de obra, Aux Ingeniería.)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPO MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI.MN1.91-14.FR.2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 5
		FECHA	07/10/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

Seguidamente se hace un resumen general del estado actual de la obra Mencionando lo siguiente

los porcentaje suministrados estan basados al último cronograma entregado por el contratista

Porcentaje Programado: 99:01%

Porcentaje Ejecutado: 43.88%

Atraso de obra: 55.13%

Obras Ejecutadas hasta la fecha: 10 Alcantarillas, conformación de calzado Existente, Extención y compactación de 945ml de Sub base granular, Construcción de 725ml de placa huella, construcción de un muro de contención Construcion muro 6,9ml que falta por Terminar.

Porcentaje de obras funcionales: 35.57% Corresponde a la Ejecución de 9 alcantarillas, y Conformación de calzada de 725ml

Pagos Realizados: Se han Tramitado hasta la fecha 2 Actas Parciales; Acta parcial N1 + Acta parcial N2 Igual $585.074.730 Pesos y Se ha amortizado un total de $175.522.419 Pesos.

Estado del Anticipo: falta por Amortizar 771.506.113 Pesos del Valor entregado.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI.MN1.PL14.FR.2
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 5
FECHA	07/10/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNION

Por otra parte La Interventoria manifiesta lo Siguiente:
* las planillas de Seguridad Social presentan Inconsistencias (Se solicita que el contratista Se acerque a la oficina de interventoria a dar claridad de la información.
* A la fecha Tambien Se presentan observaciones a los documentos de caracter Ambiental de Igual manera se Solicita Subsanar La documentación

Toma la Palabra el Contratista y manifiesta lo Siguiente:
* Solicitud de dar continuidad al Trámite de acta N3
* Solicitud de liquidación del contrato Vía correo
* Posible Sesionaría del contrato.
* Manifiesta que hay razones "Valederas" Para Solicitar Liquidación del contrato.
* La interventoría no ve viable un pago Acta N3 Si el contratista Quiere Liquidar, Tenerlo en conocimiento que se quedaría obras inconclusas, Solo el pago de las obras funcionales existentes en obra.
* El Contratista reitera que requiere Liquidar o en su defecto dar cesión el contrato. (Manifiesta que con el Pago del Acta N3: Termina la Placa hasta el Pueblo y entrega obras funcionales)
* El Contratista manifiesta que envio Solicitud de liquidación, la interventoría sustenta que ya dió respuesta a la Solicitud.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI.MN1.P6-14.FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 5
FECHA	03/10/2024 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En resumen se tiene lo siguiente:

* Se concluye entre las partes intervinientes que: Se solicita reinicio del contrato. Posteriormente diligenciar el Acta N3. Terminar la placa huella 1040 m L Aproximadamente para dar Trámite al Acta N4 y Amortizar el 100% del Anticipo. Seguidamente dar en sesión el contrato con obras funcionales.
* Se Manifiesta por parte del contratista que se Seguirá perdiendo con el Preciounitario de concreto Clase D
* Se Manifiesta por parte del Municipio que:
  - Solicitud de Balance de Cantidades Teniendo en cuenta las observaciones ya mencionadas en la reunión
  - Diligencia por parte de la interventoría respecto a La revisión y aval a los Trámites

*

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CODIGO: MEC-UN-11-IN-14-FR-2
VERSIÓN: 1
PAGINA: 5 de 5
FECHA: 05/10/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentación Propuesta		Contratista
Visita de obra	05/10/2024	Contratista, Int.

FECHA PROXIMA REUNION _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:
1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente
2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
CHRISTIAN ESTUPIÑAN S	Directora Interve.	Donovan	
SANDRA LILIANA RODRIGUEZ	ALCALDESA	MORALES CAUCA	
Jhaner Segovia O	Apoyo Contratista	Consorcio Unicoen	
Mario Rendón	Supervisor Cto Obra	Alcaldía Bolívar	
Y. Inés Sánchez	Ing Auxiliar	Donovan	
Paola Fda Escobar	Ing. Residente Inter	Consultores Donovan SAS	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

4.9.4.2 PUERTO TEJADA 2496 – CAUCA

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/10/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. N° 156 -2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAVIAL 2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1100-2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

-Reinicio N°3 del contrato

-Atender solicitudes y requerimientos de la comunidad.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. siendo las 10:00 am se da inicio al comite tecnico con la participación del equipo tecnico de la interventoria, y profesionales Del municipio de Puerto tejada, contratista representado Por el ingeniero Nicolas y comunidad en general.
se hace la presentación de los asistentes. de la comunidad y la Veeduria. quiere manifiestan quienes tomaste vías de echo
se da a conocer que el contrato se encontraba suspendido desde hasta el 1 de octubre del 2024.
se informa los acciones que no realizado la interventoria como lo el que se ha enviado acta de reinicio la cual el contratista no ha firmado
se informa que no se ha tramitado el pago de la subsis ya que no ha entregado la informacion pertinente
se informa que si el contatista no realiza el reinicio de obra se inicia con un proceso de incumplimiento.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30-10-24 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se informa que hubo un atraso ya que el tema de los canales afectados por los ingenios donde no se intervino a tiempo y ello incurre en demora en la ejecución del contrato.
- La comunidad manifiesta que el tema de los canales no es excusa para la demora de la ejecución de la obra ya que es un tramo pequeño, informan que el cambio de la tubería afecto la alcantarilla realizada en el PR.
- La comunidad informa que el contratista no instalo valla informativa lo cual la interventoría informa que el contratista instalo una valla las cuales no cumplen con las medidas establecidas por comunicación de INVIAS.
- El contratista dice que el esta dispuesto de colocar somos de concreto y que le paguen lo que le ha realizado, desde la interventoría se explica que se debe entregar la documentación pertinente
- Se explica que no le pagan toda la ejecución de la bota por que tiene una afectación, desde la interventoría se explica que si la base se encuentra en condiciones optimas y se entrega la papelería pertinente se hara el pago.
- El contratista informa que el día 30 de octubre enviado acta N° 1 con todos los anexos.
- una vez firmado el reinicio se hara el pago de forma el dia lunes 4 de noviembre del 2024.
- La inquietud manifiesta inquietud por faltante el cual puede presentar, mas adelante inconvenientes de accidentalidad
- Se informa que el diseño de la alcantarilla ya se aprobo se manifiesta a la comunidad que no se cambiara el diametro de la alcantarilla
- Se hace visita para establecer el metraje para la limpia mecanización. de los canales,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPS.MN1.IN-14.FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 30-10-24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
-Entrega Acta y completa con sus anexos.	30-10-2024	Contratista.
-Inicio de obra		Contratista.

FECHA PROXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Gustavo Cuellar	Secretaria	Planeación	
Brayan Ortiz	Apoyo técnico	Planeación	
Jairo Castillo	Jurídico	Planeación	
Esperanza Mancilla	Líder T.A.C.	planeación	
Lucy Zape	Lidereza comunit	planeacion	Lucy Zape
Andrés Felipe García	Líder J.A.C	Planeación	
Anyerenito Zape	C. Veeduría	Planeacion	
Amanda Gutierrez C	C. Veeduría	Vda. Cantarito	
Fabio Nieto	Veeduria	[illegible]	
[illegible]	Prof. Social	Donovan	
Daniel Noriega	Aux Interventoria	Donovan	
Juan Pinzón	Resp. Interventoria	Donovan	

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONSULTORES DONOVAN S.A.S.	ING. KELLY JOHANNA GRAST SANCHEZ Representante Legal Suplente
No. del Contrato de Interventoría	1100 DE 2022
Objeto del Contrato de Interventoría	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"
Valor inicial del Contrato de Interventoría	$1.740.313.120
Valor acumulado Contrato de Interventoría	$2.410.313.120
Fecha suscripción Contrato	12 de diciembre de 2021
Fecha Orden de Inicio	12 de diciembre de 2022
Prorroga N° 1	Del 1 de noviembre hasta 31 de diciembre de 2023
Adición N°1	$300.000.000
Prorroga N°2	Del 1 de enero de 2024 hasta el 31 de mayo de 2024
Prorroga N°3	Del 1 de junio de 2024 hasta el 30 de junio de 2024
Adición N°2	$150.000.000
Prorroga N°4	Del 1 de julio de 2024 hasta el 31 de julio de 2024
Suspensión N°1	29 de julio de 2024
Ampliación 1 a la suspensión 1	1 de septiembre de 2024
Reinicio 1	1 de octubre de 2024
Prorroga N°5	Del 4 de octubre de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024
Adición N°3	$220.000.000
Fecha de terminación inicial	Hasta el 31 de octubre de 2023

Fecha de terminación vigente	15 de diciembre de 2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante este periodo, se ha realizado revisión y requerimientos a la entrega de los siguientes documentos:

- Copia de actos administrativos y/o pronunciamientos de la autoridad ambiental competente como resoluciones, autos, providencias y otros requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique).
- Copia del(los) Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoría.
- Carpeta de la etapa de Pre-Contractual (Pliegos de condiciones, oferta, resolución de adjudicación, etc.).
- Programa de obra e inversión
- Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría.

En particular, se realizaron las siguientes actividades de control y seguimiento:

- Generar comunicaciones a los contratistas dando respuesta a inquietudes y a su vez solicitando la información referente al contrato.
- Revisar, verificar y corroborar la documentación entregada por el contratista, velando por la calidad de la información suministrada.
- Emitir las observaciones y recomendaciones a los documentos exigidos por los contratos y pliegos de condiciones, siguiendo las instrucciones que se describen en el Manual de Interventoría de obras públicas del INVÍAS en su versión del 2022.
- Dar aprobación a la información que sea suministrada sin observaciones o subsanando las que se hayan generado por Interventoría.
- Se reiteran solicitud de información técnica para el inicio de obras conforme los documentos contractuales, especificación y normatividad del INVÍAS, resaltando la urgencia de estos.
- Efectuar seguimiento a las actividades ejecutadas de cada contrato, velando por la calidad y cumplimiento de las especificaciones del proyecto.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

Para este periodo, no se requirió la participación de ninguno de los especialistas, por esta razón no se efectuaron informe alguno.

6 REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se hace seguimiento al equipo y vehículos del contrato de interventoría mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO VEHICULOS CONTRATO INT.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCT/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1100 - 2022

INTERVENTORÍA: CONSULTORES DONOVAN SAS

CONTRATO DE OBRA No.

	CONTRATISTA:
141 DE 2.022	CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
F1-F14-269-2022	JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
ARG-OBRA-009-2022	EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SANCHEZ FAJARDO
LP 04-003-15.05/058	CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
LP 005/003-15.5/059	CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO
F1-F14-240-2022	CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
494 de 2022	CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
268 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	CONSORCIO SUCRE 22 R/L JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
N° 156 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CONSORCIO INFRAVIAL 2023 R/L PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	**DESCRIPCIÓN**	**OCT/2024**																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Motocicleta PKW47F	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
Motocicleta WZZ88G	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
Motocicleta MCX94G	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
Motocicleta MCX69G	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se realizó seguimiento a los contratos de obra con el siguiente personal:

NOMBRE	CARGO	DEDICACIÓN REAL MENSUAL
Christian Camilo Estupiñán Santacruz	Director de Interventoría	95%
Paola Fernanda Erazo Rodríguez	Ingeniero Residente de Interventoría 1	95%
Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	100%
Yilmar Rene Sánchez Bolaños	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	100%
Leonel Enrique Camacho Granados	Profesional ambiental	80%
Sonia Constanza Pérez Motta	Profesional social	80%
Keren Yireth Sánchez Meneses	Ingeniera auxiliar administrativa	100%
Ana Lucy Meneses Muñoz	Inspector SST	100%
Juan David Ordoñez Daza	Inspector	100%

De igual manera, se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL INTERVENTORIA:

Calle 17 10 – 16 BOGOTÁ D.C. TELF. 60 (1) 265 02 21	**INFORME DE INTERVENTORÍA No. 21** CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1100 DE 2022	No. Copias impresas: 1 Versión No.: 001 Fecha de realización: Noviembre 10 de 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022

INTERVENTOR: CONSULTORES DONOVAN SAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT/2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9".

CONTRATO DE OBRA No.:

141 DE 2 022
F1-F14 -289-2022
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023
ARG-OBRA-009-2022
LP 04-003-15.05/058
LP 005/003-15.5/059
F1-F14-240-2022
484 de 2022
258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023
N° 156 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
JULIÁN LIZANDRO GONZALES CASAS
HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
EMCONSUT S.A.S, R/L WILLIAM ALCIDES SÁNCHEZ FAJARDO
CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO
CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
CONSTRUCIBRAS DYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONSORCIO SUCRE 22 R/L JESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONSORCIO INFRAVIAL 2023 R/L PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA

NOMBRE ARL: Colmena y Sura

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: Compensar

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	OCT/2024																																			% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Christian Camilo Estupiñan Santacruz	1085270769	Director de Interventoría	$ 6,602,500	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				95%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 6,602,500	$ 459,534	V	Sanitas	9476635414	$ 264,100	Porvenir	9476635414	$ 1,056,400	$ 264,100	$ -	$ -	
2	Paola Fernanda Erazo Rodriguez	1085289652	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 5,225,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				95%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 5,225,000	$ 363,660	V	Asmet Salud	9476635414	$ 209,000	Porvenir	9476635414	$ 836,000	$ 209,000	$ -	$ -	
3	Daniel Alejandro Mañunga Gaviria	1061784737	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 1	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9476635414	$ 140,000	Porvenir	9476635414	$ 560,000	$ 140,000	$ -	$ -	
4	Yilmar Rene Sanchez Bolaños	1061757234	Ingeniero Auxiliar de Interventoría 2	$ 3,500,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,500,000	$ 243,600	V	Sanitas	9476635414	$ 140,000	Porvenir	9476635414	$ 560,000	$ 140,000	$ -	$ -	
5	Leonel Enrique Camacho Granados	85154105	Profesional ambiental	$ 3,040,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				80%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,040,000	$ 211,584	V	Nueva E.P.S	9476635414	$ 121,600	Porvenir	9476635414	$ 486,400	$ 121,600	$ -	$ -	
6	Sonia Constanza Perez Motta	1061800536	Profesional social	$ 3,040,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				80%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,040,000	$ 211,584	V	A.I.C	9476635414	$ 121,600	Porvenir	9476635414	$ 486,400	$ 121,600	$ -	$ -	
7	Keren Yireth Sánchez Meneses	1005874974	Ingeniero Auxiliar Administrativo	$ 3,000,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 3,000,000	$ 208,800	V	Sanitas	9476635414	$ 120,000	Colpensiones	9476635414	$ 480,000	$ 120,000	$ -	$ -	
8	Ana Lucy Meneses Muñoz	25299410	Inspector SST	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Sanitas	9476635414	$ 80,000	Porvenir	9476635414	$ 320,000	$ 80,000	$ -	$ -	
9	Juan David Ordoñez Daza	1058973435	Inspector	$ 2,000,000	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X				100%	CONSULTORES DONOVAN SAS	$ 2,000,000	$ 139,200	V	Nueva E.P.S	9476635414	$ 80,000	Porvenir	9476635414	$ 320,000	$ 80,000	$ -	$ -	
N																																															
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 31,907,500																																												

El Interventor adjunta la certificación de fecha 31/10/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matricula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.: 19202-75853 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ING. CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑÁN DIRECTORA DE INTERVENTORÍA ELABORÓ	**LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** SUPERVISOR DE INTERVENTORIA - INVÍAS APROBÓ

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

De acuerdo a lo ofertado durante el proceso licitatorio mediante concurso de méritos No.CMA-DO-SRT-062-2021, la oferta económica adjudicada es:

Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (H/M)	Valor Total
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
	PERSONAL PROFESIONAL				
1	Director de Interventoría	$ 6,950,000.00		16	$ 111,200,000
1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5,500,000.00		18	$ 99,000,000
1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3,500,000.00		16	$ 56,000,000
	MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas)				$ 87,500,000
1	Especialista Ambiental y/o sostenibilidad	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Estructuras	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6,500,000.00		0	$ -
1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 3,500,000.00		1.5	$ 5,250,000
	PERSONAL TÉCNICO				
1	Inspector SST	$ 2,000,000.00		28	$ 56,000,000
1	Inspector	$ 2,000,000.00		28	$ 56,000,000
	PERSONAL ADMINISTRATIVO				
1	Secretaria	$ 1,150,000.00		6	$ 6,900,000
	SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 477,850,000.00
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2.36**
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 1,127,726,000.00**

CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*

Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación	Valor Total
	OTROS COSTOS DIRECTOS				
	VIÁTICOS				
1	Director y Especialistas	$ 220,000.00	GL	48	$ 10,560,000
	COSTOS DE ALQUILER Y EQUIPOS DE OFICINA				
1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000
1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor, peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o	$ 5,600,000.00	Mes	6	$ 33,600,000
1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)	$ 750,000.00	Mes	30	$ 22,500,000
1	Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y	$ 6,500,000.00	Mes	10	$ 65,000,000
1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 550,000.00	Mes	20	$ 11,000,000
1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1,250,000.00	Mes	6	$ 7,500,000
	OTROS COSTOS				
1	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2,500,000.00	Mes	16	$ 40,000,000
1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 1,000,000.00	Mes	16	$ 16,000,000
1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.)	$ 1,000,000.00	GL	16	$ 16,000,000
1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 550,000.00	Mes	6	$ 3,300,000
1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 200,000.00	Mes	12	$ 2,400,000
				SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 261,460,000
*				**SUBTOTAL COSTOS BASICOS (A) + (B) = (C)**	$ 1,389,186,000
				PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = (D)	$ 73,262,000
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E)	$ 1,462,448,000
*				**IVA = 19% * (E) = (F)**	$ 277,865,120
*				**COSTO TOTAL = (E) + (F)**	**$ 1,740,313,120**

En este sentido se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INF FIN Y PRESUPUESTAL INT en donde se evidencia el avance financiero de Interventoría conforme a las actas de cobro tramitadas.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-15-FR-9 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 5/11/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 - 2022 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

MES INFORME MENSUAL: OCT/2024 **PROYECTO:** PROGRAMA COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE OBRA No: 141 DE 2 022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INZA 22 R/L JAMES PIAMBA HOYOS
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-289-2022	**CONTRATISTA:** JULIÁN LIZANDRO GÓNZALES CASAS
CONTRATO DE OBRA No: No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	**CONTRATISTA:** HENRY ANDRES GOMEZ RENGIFO
CONTRATO DE OBRA No: ARG-OBRA-009-2022	**CONTRATISTA:** EMCONSUT S.A.S, R/L WILIAM ALCIDES SANCHEZ FAJARDO
CONTRATO DE OBRA No: LP 04-003-15.05/058	**CONTRATISTA:** CONSORCIO PH CHALGUAYACO R/L HEBERT LIZARDO DORADO DORADO
CONTRATO DE OBRA No: LP 005/003-15.5/059	**CONTRATISTA:** CONSORCIO ONIX CCM R/L JHANER SEGOVIA QUINTERO
CONTRATO DE OBRA No: F1-F14-240-2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO MERCADERES 23 R/L JUAN FELIPE BONILLA QUINTANA
CONTRATO DE OBRA No: 484 de 2022	**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS RURAL 2022 R/L JESUS ANCISAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	**CONTRATISTA:** CONSTRUOBRAS GYA SAS R/L PAOLA ANDREA ARTEAGA JARAMILLO
CONTRATO DE OBRA No: LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	**CONTRATISTA:** CONSORCIO SUCRE 22 R/LJESUS ANCIZAR CALVO CASTRO
CONTRATO DE OBRA No: N°. 156 DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**CONTRATISTA:** CONSORCIO INFRAVIAL 2023 R/L PABLO ENRIQUE TORRES VALENCIA

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2022	1112522	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 210,000,000.00	$ -
2023	145523	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	CONTRATO PRINCIPAL	$ 1,530,313,120.00	
2023	1287623	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACIÓN	ADICIÓN N°1	$ 300,000,000.00	
2024	617124	C-2402-0600-12-51102A-2402041-02	10	NACIÓN	ADICIÓN N°2	$ 150,000,000.00	$ 17,172,844
2024	1059724	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	11	NACIÓN	ADICIÓN N°3	$ 220,000,000.00	
0	0						
				TOTAL		**$ 2,410,313,120.00**	**$ 17,172,844.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 2,410,313,120**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DIC/23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,740,313,120	**$ 1,740,313,120**	-	-
2	ENE/23	$ 17,968,300	$ 3,413,977	**$ 21,382,277.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,718,930,843	$ 1,718,930,843	-	-
3	FEB/23	$ 15,161,300	$ 2,880,647	**$ 18,041,947.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,700,888,896	$ 1,700,888,896	-	-
4	MAR/23	$ 17,937,180	$ 3,408,064	**$ 21,345,244.20**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,679,543,651.80	$ 1,679,543,651.80	-	-
5	ABR/23	$ 16,402,000	$ 3,116,380	**$ 19,518,380.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,660,025,271.80	$ 1,660,025,271.80	-	-
6	MAY/23	$ 78,173,840	$ 14,853,030	**$ 93,026,869.60**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,566,998,402.20	$ 1,566,998,402.20	-	-
7	JUN/23	$ 108,860,200	$ 20,683,438	**$ 129,543,638.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,437,454,764.20	$ 1,437,454,764.20	-	-
8	JUL/23	$ 119,044,800	$ 22,618,512	**$ 141,663,312.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,295,791,452.20	$ 1,295,791,452.20	-	-
9	AGO/23	$ 115,175,700	$ 21,883,383	**$ 137,059,083.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,158,732,369.20	$ 1,158,732,369.20	-	-
10	SEP/23	$ 133,248,800	$ 25,317,272	**$ 158,566,072.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 1,000,166,297.20	$ 1,000,166,297.20	-	-
11	OCT/23	$ 134,855,600	$ 25,622,564	**$ 160,478,164.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 839,688,133.20	$ 1,139,688,133.20	-	-
12	NOV/23	$ 128,866,000	$ 24,484,540	**$ 153,350,540.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 686,337,593.20	$ 986,337,593.20	-	-
13	DIC/23	$ 125,588,000	$ 23,861,720	**$ 149,449,720.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 536,887,873.20	$ 836,887,873.20	-	-
14	ENE/24	$ 134,325,000	$ 25,521,750	**$ 159,846,750.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 377,041,123.20	$ 677,041,123.20	-	-
15	FEB/24	$ 125,576,000	$ 23,859,440	**$ 149,435,440.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 227,605,683.20	$ 527,605,683.20	-	-
16	MAR/24	$ 120,187,000	$ 22,835,530	**$ 143,022,530.00**	$ -	$ -	$ -	1112522; 18-10-2022 y 145523; 14-02-2023	$ 84,583,153.20	$ 384,583,153.20	-	-
17	ABR/24	$ 120,170,000	$ 22,832,300	**$ 143,002,301.00**	$ -	$ -	$ -	1287623; 23-11-2023	$ 241,580,852.00	$ 241,580,852.00	-	-
18	MAY/24	$ 104,540,720	$ 19,862,736	**$ 124,403,456.00**	$ -	$ -	$ -	1287623; 23-11-2023	$ 117,177,396.00	$ 117,177,396.00	-	-
19	JUN/24	$ 98,326,620	$ 18,682,057	**$ 117,008,677.00**	$ -	$ -	$ -	1287623; 23-11-2023 y 617124; 11-07-2024	$ 150,168,719.00	$ 150,168,719.00	-	-
20	JUL/24	$ 111,761,240	$ 21,234,635	**$ 132,995,875.00**	$ -	$ -	$ -	617124; 11-07-2024	$ 17,172,844.00	$ 17,172,844.00	-	-
21	OCT/24	$ 79,604,200	$ 15,124,798	**$ 94,728,998.00**	$ -	$ -	$ -	1059724; 22-10-2024	$ 142,443,846.00	$ 142,443,846.00	-	-
22		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
23		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
24		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
25		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -				-	-
	TOTALES	**$ 1,905,772,500**	**$ 362,096,773**	**$ 2,267,869,273.80**	$ -	$ -	$ -		**$ 142,443,846.00**	**$ 142,443,846.00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 1,679,452,701	$ 319,096,012.36	$ 1,998,548,713.20
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 226,319,800	$ 43,000,760.60	$ 269,320,560.60
VALOR TOTAL	$ 1,905,772,501	$ 362,096,772.96	**$ 2,267,869,273.80**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Como parte de los compromisos de esta Interventoría se relaciona el seguimiento de las garantías del contrato mismo:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1100 **INTERVENTOR:** CONSULTORES DONOVAN SAS

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9"

FECHA DE INICIO: 12/12/2022

PLAZO INICIAL: 10.8 Meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 3/10/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 1,740,313,120.00

VALOR ACUMULADO: $ 2,190,313,120.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 174,031,312	22	7	2022	30	4	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	17%	$ 292,489,600	22	7	2022	30	4	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 348,062,624	22	7	2022	31	10	2026
Calidad del servicio	30%	$ 522,093,936	31	10	2023	31	10	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100216606

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/10/2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/09/2024 (Dia / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	9%	$ 204,031,312	26	6	2024	31	1	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	16%	$ 342,909,768	26	6	2024	31	1	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	19%	$ 408,062,624	26	6	2024	31	7	2027
Calidad del servicio	28%	$ 612,093,936	31	7	2024	31	7	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100216606

Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: ----------

OBSERVACIONES:

Mediante MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado 2024E-VUVRAZ-050731 con fecha 2024-06-05 hora 17:59: se remitió a la Subdirección de gestión contractual y procesos administrativos el Anexo N°6 de la póliza N° NB-100216606, que reconoce la PRORROGA N°3 del contrato de interventoría 1100 del 2022, la cual se encuentra en revisión.

NOTAS:


1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: CHRISTIAN CAMILO ESTUPIÑAN SANTACRUZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-260417 CAU

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-79853 Cau

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

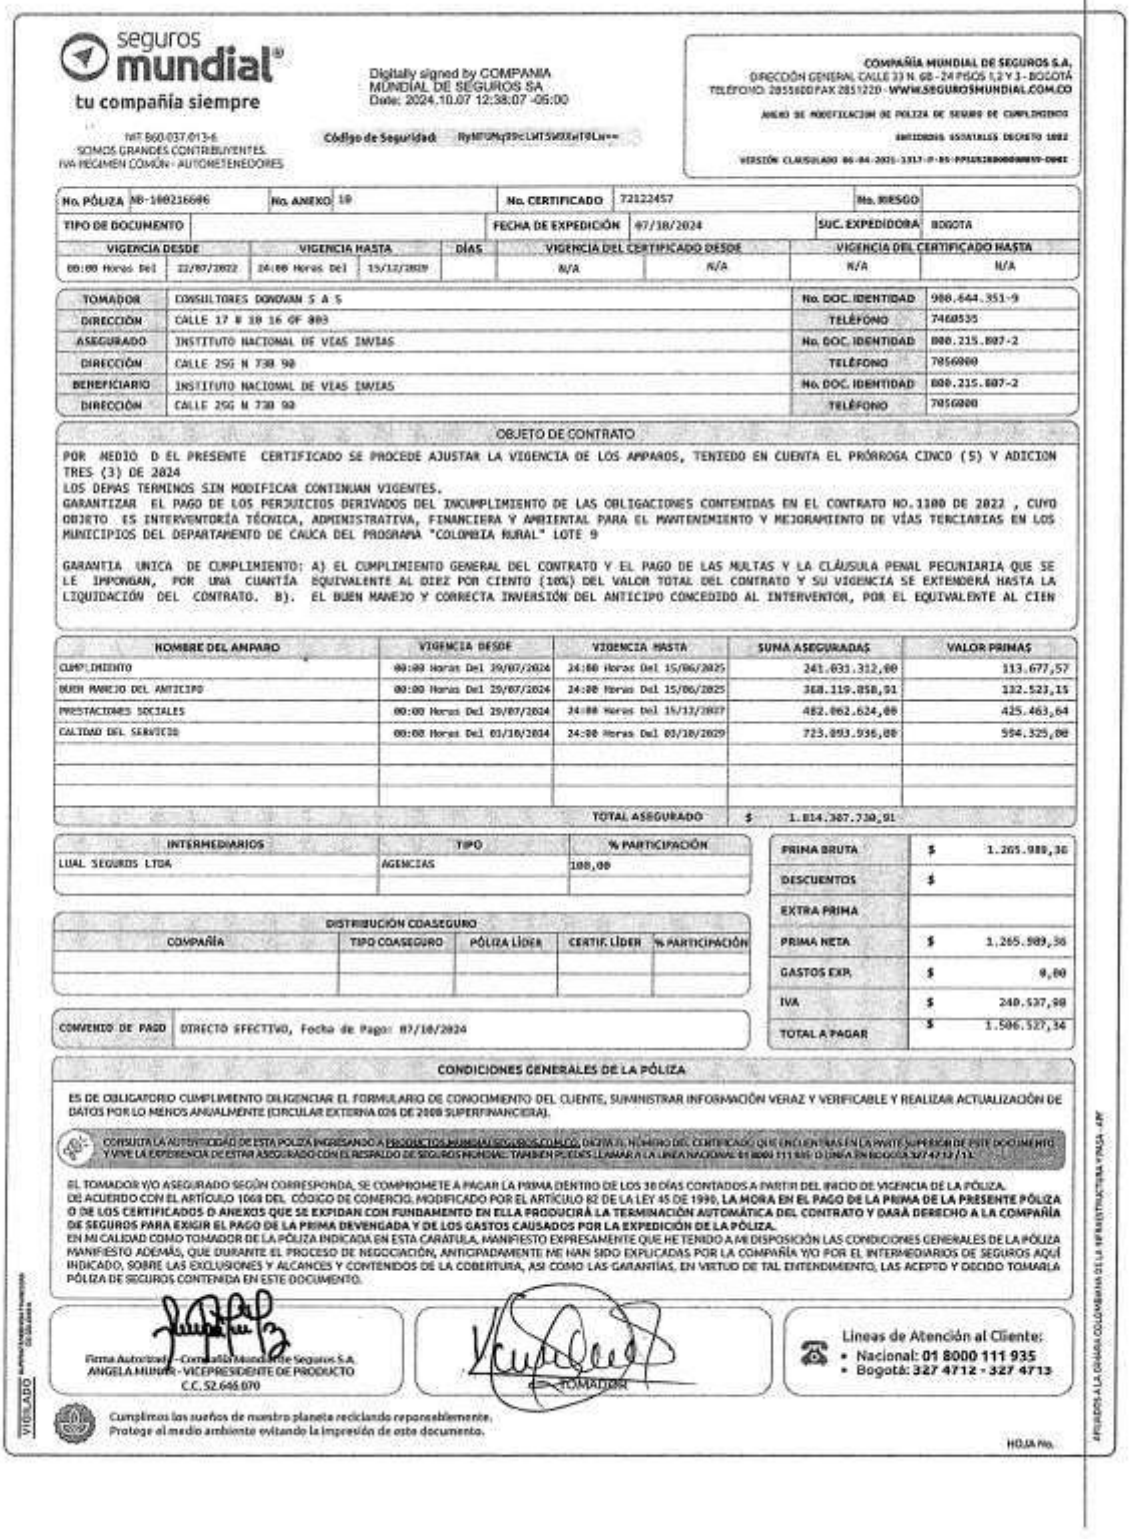

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.10.07 12:38:07 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: RyNFUNqI9rCLHTSW0XeT9Lw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855000 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO
ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-0-85-PPI0202000000059-0002

No. PÓLIZA	NB-100216686	No. ANEXO	19	No. CERTIFICADO	72122457	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/07/2022	24:00 Horas Del	15/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSULTORES DONOVAN S A S	No. DOC. IDENTIDAD	900.644.351-9
DIRECCIÓN	CALLE 17 # 10 16 OF 803	TELÉFONO	7460535
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G N 73B 90	TELÉFONO	7856000
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS	No. DOC. IDENTIDAD	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25G N 73B 90	TELÉFONO	7856000

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO D EL PRESENTE CERTIFICADO SE PROCEDE AJUSTAR LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS, TENIEDO EN CUENTA EL PRÓRROGA CINCO (5) Y ADICION TRES (3) DE 2024
LOS DEMAS TERMINOS SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.1100 DE 2022 , CUYO OBJETO ES INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 9

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO: A) EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, POR UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. B). EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, POR EL EQUIVALENTE AL CIEN

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 29/07/2024	24:00 Horas Del 15/06/2025	241.031.312,00	113.677,57
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas Del 29/07/2024	24:00 Horas Del 15/06/2025	368.119.858,91	132.523,15
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 29/07/2024	24:00 Horas Del 15/12/2027	482.062.624,00	425.463,64
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 03/10/2024	24:00 Horas Del 03/10/2029	723.093.936,00	554.325,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.814.307.730,91	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
LUAL SEGUROS LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.265.989,36
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.265.989,36
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	240.537,98
TOTAL A PAGAR	$	1.506.527,34

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/10/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTA 327 4712 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

FIRMA TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

HOJA No.

APLICADOS A LA CIRCULAR COLOMBIANA 029 DE SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-85-PPSU52R000000059-D00I

No. PÓLIZA	80-100316606	No. ANEXO	10	No. CERTIFICADO	73122457	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	22/07/2022	24:00 Horas Del	15/12/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

POR CIENTO (100%) DEL MONTO QUE EL INTERVENTOR RECIBA EN DINERO O EN ESPECIE, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. C). EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR EL EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DEL MISMO Y TRES (3) AÑOS MÁS. D). LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y POR UNA CUANTÍA EQUIVALENTE AL TREINTA POR CIENTO (30%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

LA VIGENCIA GLOBAL DE LOS AMPAROS ES PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 22/07/2022 AL 31/07/2024.

SE RECONOCE EL CONTRATO PRINCIPAL NO. 1100 DE 2022 CON SU OBJETO COMPLETO


"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - ARP

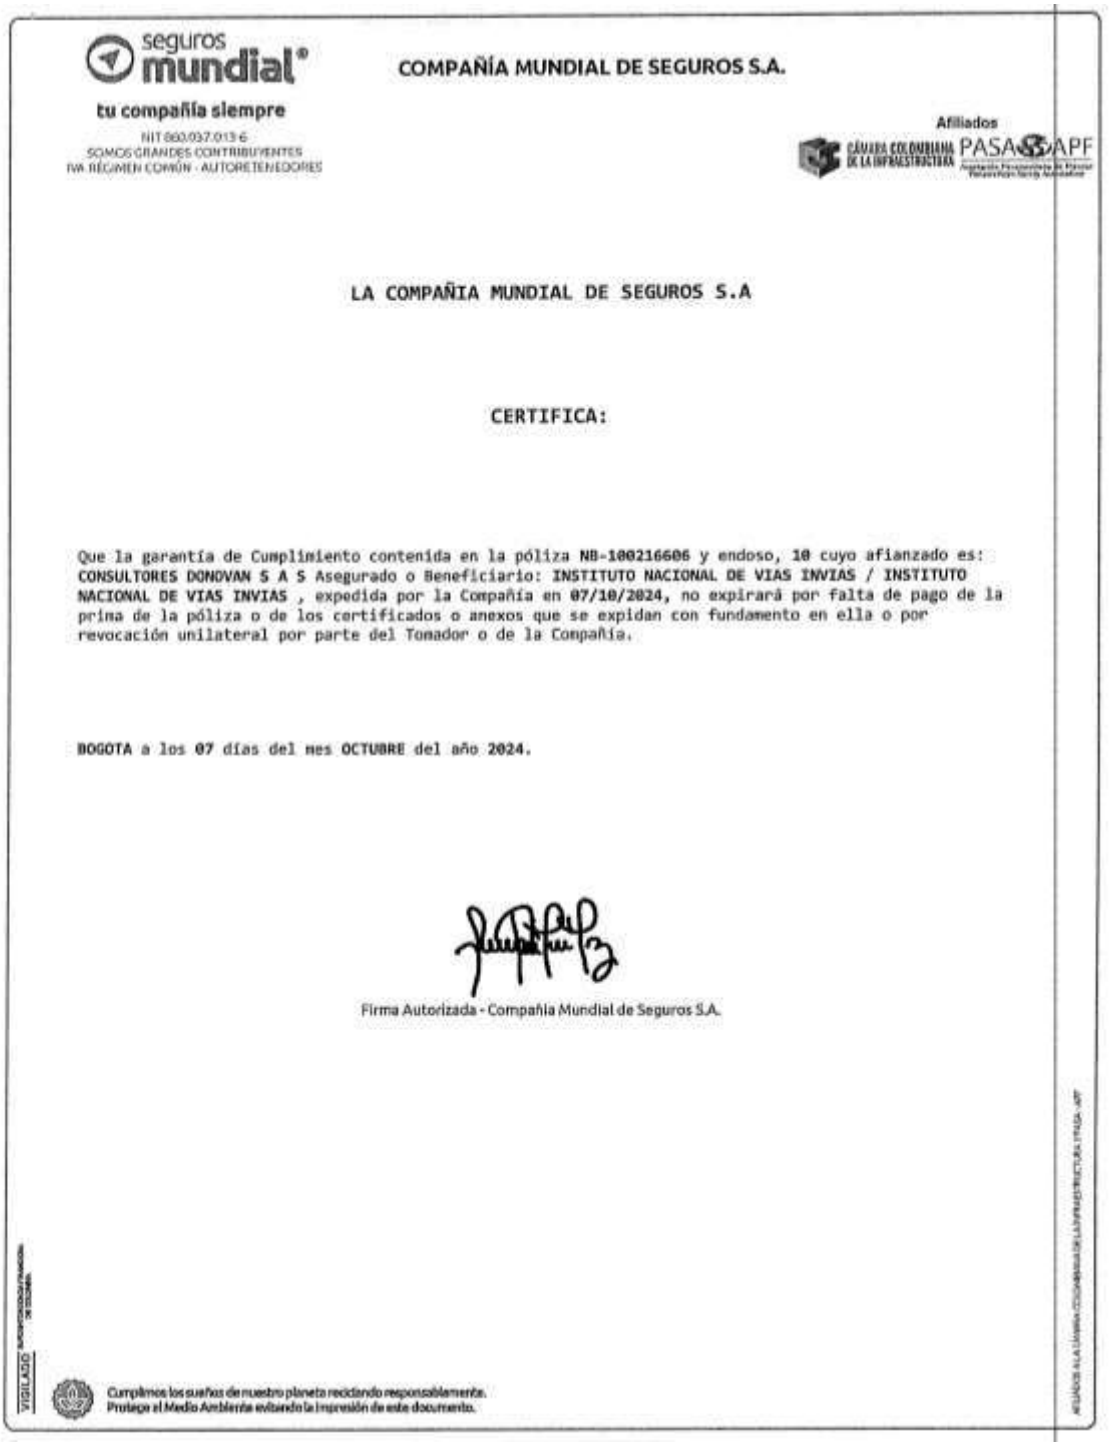

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100216606** y endoso, **10** cuyo afianzado es: **CONSULTORES DONOVAN S A S** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** , expedida por la Compañía en **07/10/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **07** días del mes **OCTUBRE** del año **2024.**

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

6.5 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No se cuenta con el plan de calidad, no aplica para este periodo.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El 12 de diciembre, la interventoría firmo Acta de inicio del contrato 1100 de 2022, cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” “LOTE 9”.

- En el transcurso del contrato la interventoría solicito a las Alcaldías Municipales del Cauca, que suscribieron convenio con el INVIAS y que son objeto de seguimiento de esta interventoría, el envío de los Estudios y Diseños de las obras para revisión y aprobación de los especialistas de la interventoría.

- Luego de la revisión de la documentación requerida y bajo mutuo acuerdo entre las partes (Contratista, Interventoría y Municipio) se suscriben los contratos de obra:

CONTRATO	FECHA DE INICIO	MUNICIPIO
ARG-OBRA-009-2022	03/04/2023	Argelia 1984
F1-F14-240-2022	09/08/2023	Mercaderes 1894
258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022	16/05/2023	Sucre 1866
LP 090-2023 DEL 01 DE FEBRERO 2023	16/05/2023	Sucre 1769
LP 005/003-15.5/059	25/04/2023	Bolívar 1867
LP 04-003-15.05/058	3/04/2023	Bolívar 1750
F1-F14-289-2022	11/05/2023	Almaguer 1749
No. 93 DEL 14 DE MARZO DEL 2023	4/07/2023	Almaguer 1982
141 DE 2.022	28/04/2023	Inzá 1983
484 de 2022	01/06/2023	Santander de Quilichao 1768
156 del 5 de septiembre de 2023	4/12/2023	Puerto Tejada

- Hasta el momento, los municipios de Sucre (convenio 1866), Bolívar (convenio 1867) y Puerto Tejada (convenio 2496) exhiben un porcentaje de ejecución inferior al 50%. La interventoría ha emitido oficios de presuntos incumplimientos a los municipios, se han enviado oficios de requerimiento para la entrega de la documentación faltante, así como del PAGA y documentos sociales; se ha supervisado el avance de los mismos, se espera que el siguiente periodo se tengan avances significativos.

- Los municipios de Almaguer (convenio 1749) presenta un 100% de ejecución de la meta física del contrato, Almaguer (convenio 1982) presenta un 100% de ejecución de la meta física del contrato, Inzá (convenio 1983) presenta un 100% de ejecución de la meta física del contrato, Bolívar (convenio 1750) presenta un

100% de ejecución de la meta física del contrato y Santander de Quilichao (convenio 1768) presenta un 100% de ejecución de la meta física del contrato, se encuentran en el proceso de liquidación.

- La interventoría manifiesta su creciente preocupación la falta de entrega de documentación pendiente, como el Plan Adaptativo de la Guía Ambiental (PAGA) el cual hasta la fecha solo se ha remitido a la Subdirección de Sostenibilidad de INVIAS (SS), el de los convenios, 1750 Bolívar y 1982 Almaguer; dichos documentos recibieron observaciones el 29 de diciembre del 2023, por parte de la subdirección de sostenibilidad de INVIAS, las cuales fueron remitidas a los contratistas para su subsanación; Posteriormente se volvieron a remitir con concepto aprobatorio el documento PAGA de los convenios 1750 Bolívar, el día 25 de enero del 2024 y el convenio de Almaguer 1982, el día 14 de junio del 2024. A la fecha, no se tiene respuesta de revisión y concepto por parte de la subdirección de sostenibilidad de INVIAS.

- La interventoría ha llevado a cabo todas las acciones necesarias para propiciar el reinicio del contrato derivado del convenio 1984 Argelia. El contrato de obra terminó por vencimiento de plazo contractual el día 20 de enero de 2024 sin que el contratista hiciera presencia en la zona objeto del proyecto, ni estableciera comunicación con la entidad contratante ni la interventoría. Tanto la Alcaldía de Argelia como la interventoría, hicieron múltiples intentos de comunicarse con el contratista de obra para que compareciera y diera cumplimiento a sus compromisos contractuales, no obstante, a pesar de los correos electrónicos, llamadas telefónicas y oficios enviados no fue posible contactarlo. La interventoría recomienda nuevamente a la Alcaldía de Argelia realizar las respectivas denuncias y alertas a las entidades de control correspondientes, así como activar los procesos de presunto incumplimiento que le han sido radicados.

- Aunque varios proyectos muestran avances significativos o han sido finalizados satisfactoriamente, otros presentan retrasos atribuibles a problemas administrativos, incumplimientos contractuales y falta de ejecución. Es fundamental reforzar las estrategias de supervisión, garantizar el cumplimiento de compromisos y priorizar la resolución de problemas administrativos para salvaguardar los recursos públicos y asegurar la conclusión exitosa de los proyectos en curso.

8 ANEXOS

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

MUNICIPIO DE ARGELIA – CAUCA – CONVENIO: 1984

FECHA	OBJETO	MEDIO
7/10/2024	DON-1100-INV-753-2024 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO 1984 de 2021.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE MERCADERES – CAUCA – CONVENIO: 1894

FECHA	OBJETO	MEDIO
2/10/2024	DON-1100-INV-744-2024 RESPUESTA SOLICITUD DE REINICIO N°2 AL CONTRATO DE OBRA No F1-F14-243 – 2022.	CORREO ELECTRONICO
4/10/2024	DON-1100-INV-749-2024 TRASLADO DE SOLICITUD DE PROROGA No. 6 AL CONTRATO DE OBRA F1-F14-243-2022 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022	CORREO ELECTRONICO
7/10/2024	DON-1100-INV-754-2024 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO 1894 de 2021.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA – CONVENIO: 1866

FECHA	OBJETO	MEDIO
4/10/2024	DON-1100-INV-750-2024 SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA N° 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022 Y LP-090-2023 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2022.	CORREO ELECTRONICO
17/10/2024	DON-1100-INV-764-2024 APROBACION HOJA DE VIDA POR CAMBIO DE DIRECTOR CONTRATO 258 SUCRE.	CORREO ELECTRONICO
21/10/2024	REQUISITOS PARA COBRO DE ACTAS PARCIALES -CORREO DE CARACTER INFORMATIVO.	CORREO ELECTRONICO
25/10/2024	ENTREGA DE CRONOGRAMA, FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO Y PLAN DE CONTINGENCIA SEGUN MODIFICATORIO 7 Y REINICIO N° 02 CONTRATO DE OBRA LP-258 CONVENIO 1866 SUCRE.	CORREO ELECTRONICO
28/10/2024	DON-1100-INV-779-2024 FALTA DE PERSONAL IDENTIFICABLE EN EL	CORREO ELECTRONICO

	PROYECTO Y AUSENCIA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DEL CONTRATO DE OBRA N° 258 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2022.	
29/10/2024	Aclaración Documento Modificatorio N°7 Contrato derivado Convenio 1866 Sucre.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA – CONVENIO: 1769

FECHA	OBJETO	MEDIO
5/10/2024	DON-1100-INV-751-2024 TRASLADO DE SOLICITUD PRORROGA No.6 AL CONTRATO DE OBRA LP-090-2023 DEL 01 DE FEBRERO DE 2023.	CORREO ELECTRONICO
7/10/2024	SOLICITUD ENTREGA DE CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO CON LA PRORROGA N°6	CORREO ELECTRONICO
10/10/2024	SEGUNDA REITERACION DE ENTREGA DE CRONOGRAMA, FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO Y PLAN DE CONTINGENCIA, SEGUN MODIFICATORIO N°7 CONVENIO 1769 SUCRE	CORREO ELECTRONICO
10/10/2024	SOLICITUD DE POLIZAS ACTUALIZADAS CON REINICIO N°3 Y MODIFICATORIO N°7 DEL CONTRATO DERIVADO CONVENIO 1769 SUCRE.	CORREO ELECTRONICO
11/10/2024	TERCERA REITERACION DE ENTREGA DE CRONOGRAMA, FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO Y PLAN DE CONTINGENCIA, SEGUN MODIFICATORIO N°7 CONVENIO 1769 SUCRE.	CORREO ELECTRONICO
19/10/2024	OFICIO PARA COMPLETAR DOCUMENTOS EN ORIGINAL EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL LP-090-2023 CONVENIO 1769 SUCRE.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA – CONVENIO: 1867

FECHA	OBJETO	MEDIO
7/10/2024	DON-1100-INV-759-2024 REVISIÓN INFORME DE OBRA No. 3	CORREO ELECTRONICO
17/10/2024	DON-1100-INV-764-2024 SOLICITUD DE REINICIO N°2 AL CONTRATO DE OBRA No LP 005/003-15.05/059. DEL 13 DE	CORREO ELECTRONICO

	DICIEMBRE DE 2022.	
26/10/2024	DON-1100-INV-777-2024 RESPUESTA Oficio C.0.-057 Remitido por el contratista el día 18 de octubre de 2024.	CORREO ELECTRONICO
28/10/2024	DON-1100-INV-778-2024 RESPUESTA OFICIO CON ASUNTO: VALIDACIÓN CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL CONSORCIO ONIX CCM.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CAUCA – CONVENIO: 1750

FECHA	OBJETO	MEDIO
9/10/2024	DOCUMENTOS TRAMITE ACTA PARCIAL 3 CONVENIO 1750 BOLIVAR.	CORREO ELECTRONICO
23/10/2024	REVISION ACTA PARCIAL N°3 Y FINAL Y DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGA A LA INTERVENTORIA CONVENIO 175O BOLIVAR.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE ALMAGUER– CAUCA – CONVENIO: 1749

FECHA	OBJETO	MEDIO
7/10/2024	DON-1100-INV-755-2024 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 1749 de 2021.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE ALMAGUER– CAUCA – CONVENIO: 1982

FECHA	OBJETO	MEDIO
7/10/2024	DON-1100-INV-756-2024 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO No 1982 de 2021.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE INZA – CAUCA – CONVENIO: 1983

FECHA	OBJETO	MEDIO
7/10/2024	DON-1100-INV-757-2024 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO 1983 de 2021.	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO – CAUCA – CONVENIO: 1768

FECHA	OBJETO	MEDIO
1/10/2024	CONCEPTO FAVORABLE PAGA	CORREO

		ELECTRONICO
1/10/2024	REMISION PAGA MUNICIPIO DE SANTANDER - CUACA	CORREO ELECTRONICO

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – CAUCA – CONVENIO: 2496

FECHA	OBJETO	MEDIO
3/10/2024	SEGUNDO REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE AJUSTES DE LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO Y RESPONSABILIDAD CIVIL DEL CONTRATO DE OBRA 2466 DE 2019 (PUERTO TEJADA).	CORREO ELECTRONICO
5/10/2024	DON-1100-INV-752-2024 TRASLADO SOLICITUD DE PRORROGA N°3 AL CONTRATO DE OBRA No. 156 de 2023.	CORREO ELECTRONICO
7/10/2024	SOLICITUD ENTREGA DE CRONOGRAMA Y FLUJO DE CAJA ACTUALIZADO Y PLAN DE CONTINGENCIA CON LA PRORROGA N°4 CONVENIO 2496 PUERTO TEJADA.	CORREO ELECTRONICO
7/10/2024	DON-1100-INV-758-2024 SOLICITUD CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTA CONVENIO 2496 de 2019.	CORREO ELECTRONICO
8/10/2024	DON-1100-INV-761-2024 RESPUESTA OFICIO OF-CIV-036-2024 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2024.	CORREO ELECTRONICO
16/10/2024	DON-1100-INV-763-2024 Respuesta Oficio OF-CIV-032-2024- CONTRATO 153 DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023.	CORREO ELECTRONICO
24/10/2024	DON-1100-INV-773-2024 PRIMER APREMIO DE SOLICITUD DE REINICIO DE ACTIVIDADES AL CONTRATO DE OBRA No. 156 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2023.	CORREO ELECTRONICO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS


- DON-1100-INV-748-2024 SOLICITUD DE RESPUESTA A RADICADOS PAGA LOTE 9 CAUCA. 4/10/2024.
- DON-1100-INV-762-2024 RADICACIÓN PÓLIZA No NB-100216606 - ANEXO No 10. 15/10/2024.

- INFORME SEMANAL 86 y 87 CONTRATO DE INTERVENTORIA 1100 DE 2022. 18/10/2024.

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO

MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE MERCADERES DEPARTAMENTO DE CAUCA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL.

REGISTRO FOTOGRÁFICO MERCADERES 1894

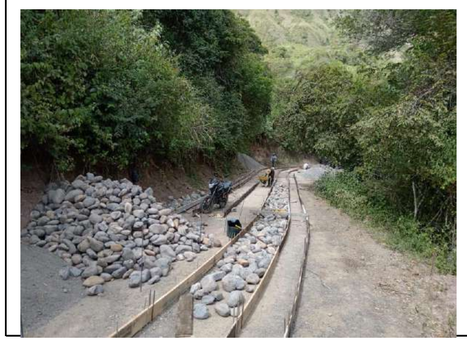

FORMALETA Y PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO



MURO DE CONTENCION



PLACA FUNDIDA



FORMALETA Y PIEDRA PARA CONCRETO CICLOPEO



INSTALACION DE ACERO PARA HUELLA REFORZADA



ACERO DE MURO INSTALADO



INSTALACION DE ACERO PARA HUELLA REFORZADA



ACERO PARA EL BASTAGO



BASTAGO DE MURO



TRAMO FUNDIDO



RECALCE DE ALCANTARILLA EXISTENTE



FUNDICION DE HUELLAS

CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO EL PARAISO, SECTOR LA CEJA CON LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SUCRE – CAUCA PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO 1866 DE 2021

REGISTRO FOTOGRÁFICO SUCRE 1866



Estado actual de la obra



Estado actual de la obra



Estado actual de la obra

MEJORAMIENTO DE VIA TERCIARIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA 25CC 08 S4-1 LA BALASTRERA - PEÑA BLANCA, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DEL CAUCA

REGISTRO FOTOGRÁFICO SUCRE 1769



INSTALACIOND E ACERO



FUNDICION DE CONCRETO



CHEQUEO ESPESOR PLACA DE CONCRETO



INSTALACIOND E ACERO



FUNDICION DE CONCRETO



CHEQUEO ESPESOR PLACA DE CONCRETO



TRAMO TERMINADO



TRAMO TERMINADO



TRAMO TERMINADO



FUNDICION DE HUELLA EN CONCRETO REFORZADO



TRAMO TERMINADO



TRAMO TERMINADO

CONSULTORES DONOVAN S.A.S

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA VILLA OLÍMPICA - JUAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PUERTO TEJADA 2496



Estado actual de la vía



Estado actual de la vía



Estado actual de la vía



Estado actual de la vía



Estado actual de la vía



Estado actual de la vía



Reunión en municipio de Puerto Tejada



Reunión en municipio de Puerto Tejada

8.3 BITÁCORAS

BITACORA DE OBRA
MERCADERES 1894
MES DE OCTUBRE 2024

municipio de Mercaderes, se otorga la suspencion 02 desde 26 de Julio hasta 31 de agosto del 2024. "mediante oficio de fecha 26 de Julio donde la Secretaria de planeacion manifiesta que desde el componente tecnico se cuenta con la justificacion y surge la necesidad latente de suspender las actividades constructivas hasta 31 de agosto del 2024." y aval por parte de la interventoria.

30-08-2024. Se amplia suspencion 02, hasta el 30 de septiembre del 2024, con aval de interventoria y del municipio ratificando que aun no se cuentan con las garantias para el personal de obra.

1-10-2024. Mediante oficio de fecha 01 de octubre 2024, el contratista solicita el reinicio del contrato de obra F1-F14-243-2022, por considerar que las hechos que generaron la suspencion se superaron por lo tanto la interventoria avala la solicitud del Consorcio Mercaderes 23 en tal sentido la secretaria de planeacion manifiesta que se cuenta con la justificacion de reiniciar las actividades constructivas a partir del 1-oct.-2024.

Martes. Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra: Ing. residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, vibro de concreto, rana, herramienta menor.
Actividades, se realizo armado de acero de refuerzo, instalacion de formaleta para cunetas del K1+087 al K1+120 se realizo acarreo de materiales, equipos y herramienta al punto de obra conformacion de terreno y fundicion de cunetas.

Powered by CamScanner

Miercoles
2-10-2024 Estado del clima: Tiempo seco
Personal en obra: Ing residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, vibro concreto, rana, herramienta menor
Actividades: Se continua con retro de material derrumbe entre K1+200 al K1+250 LD para conformacion de ~~cunetas~~ terreno para cunetas. se realiza instalacion de formaleta entre K1+160 al K1+250 L izq. se realiza formaletiado de cunetas desde K1+000 al K1+087 se realizo fundicion de cunetas K1+000 al K1+087.

Jueves
3-10-2024 Estado del clima: Tiempo seco
Personal de obra: Ing residente, 2 maestros 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, vibro concreto, rana, herramienta menor
Actividades: Se instala acero de refuerzo para cunetas, formaletiado de cunetas L.der. K1+160 al K1+250 y fundicion en concreto. de cunetas K1+160 al K1+230.

Viernes
4-10-2024 Estado del clima: Tiempo seco
Personal en obra: Ing. residente, 2 maestros, 8 ayudantes.
Equipos y herramienta. Mezcladora, vibro de concreto, rana, herramienta
Actividades Se instala acero de refuerzo para cunetas y fundicion Lado izquierdo K1+160 al K1+250

Sabado
5-10-2024 Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra Ing residente. 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: herramienta menor.
Se realiza acarreo de formaletas y herramienta, materiales al K0+120 sector del muro, jornada de orden y aseo

Powered by CamScanner

Domingo
6-10-2024 Estado del clima: Domingo.
Sin actividades en obra:

Lunes 7/10/2024 Estado del clima: Mañana pasada con lluvias suaves, tarde seco.
Personal en obra: Ing. residente, 2 maestros, 8 ayudantes.
Equipos y herramienta: Mezcladora, vibro concreto, rana, herramienta menor.
Actividades: Se realiza formaleteado para concreto ciclopeo y fundicion de ciclopeo entre K0+153 al K0+137, atendiendo solicitud presentada por la JAC de la Despensa con fecha 10-09-2... tiempo el cual estuvo suspendida la obra, y despues de las actos administrativos donde se avala la solicitud, por parte de interventoria se inicia corte de talud para construccion de muro de contencion entre K0+121 al K0+094 debido a que el existente, que era en mamposteria y que presentaba gran deterioro colapsara dias atras

Martes 8/10/2024. Estado del clima: Tiempo seco
Personal en obra: Ing. residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, vibro concreto, rana, herramienta menor
Actividades: Se continua con corte de talud y excavacion de zarpa para muro de contencion K0+121 al K0+094 a=1.80 m
Long.=10m alto=2m.
Se instala formaleto para concreto ciclopeo huella central a=0.9...
K0+121 al K0+137.

Miercoles 9/10/2024 Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra: Ing. residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, vibro-concreto, rana, herramienta menor
Actividades: Se continua con excavacion y corte de talud
Se realiza excavacion, instalacion de acero de refuerzo y solados de limpieza y nivelacion para riostras, instalacion de acero de refuerzo para huellas entre K0+153 al K0+137, formaleteado de bordillo alto a=0.67 x 11ml y formaleteado de cuneta Lder:

Powered by CamScanner

Jueves 10/10/2024 Estado del clima: Tiempo seco
Personal en obra. Ing. residente, 2 maestro. 8 ayudantes
Equipos y herramienta. Mezcladora, rana, herramienta menor.
Actividades: Se continua con corte y excavacion para muro entre K0+121 al K0+094, se continua con instalacion de acero de refuerzo, excavacion, solados de limpieza para riostras entre K0+1 al K0+142,6 se amplia la huella en este punto, debido a que no cuenta con el ancho de diseño, por lo tanto y para darle angulo de giro se elimina ciclopeo lateral se amplia la huell para mayor area de huella. a= 1,60 dos huellas.

Viernes 11/10/2024. Estado del clima: Tiempo seco
Personal en obra: Ing. residente, 2 maestros. 8 ayudantes.
Equipos y herramienta: Mezcladora, rana, herramienta menor vibro concreto.
Actividades: Se realiza jornada de fundicion de huellas. riostr y conetas entre K0+121.6 al K0+153
Se realiza solado de limpieza y nivelacion para zarpa de muro K0+121 al K0+101.6

Sabado 12/10/2024 Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra: Ing residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, rana, herramienta menor vibro concreto
Actividades. Se realiza corte, flejado y armado de acero para zarpa y bastones de muro del K0+121 al K0+104 se continua con excavacion de zarpa y solado de limpiez del K0+101.6 al K0+094.

Domingo 13/10/2024 Sin actividades

Lunes 14/10/2024 Sin actividades festivo.

Powered by CamScanner

Martes 15/10/2024 Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra: Ing. residente. 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora. vibro concreto, rana, herramienta men
Actividades: Se realizo fundicion de zarpa del KO+121 al KO+104
Se realiza armado de acero, flejado del refuerzo de la zarpa KO+104 al KO+094

Miercoles 16/10/2024 Estado del clima. Tiempo seco
Personal en obra: Ing. residente. 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, vibro concreto, rana, herramienta men
Actividades: Se realizo armado del acero de refuerzo para la pantalla del KO+121 al KO+104 y fundicion de zarpa del KO+104 al KO+094

Jueves 17/10/2024 Estado del clima: llovisnas leves durante el dia.
Personal en obra: Ing residente, 2 maestros, 8 ayudantes.
Equipos y herramienta: herramienta menor, rana.
Actividades: Se realizo instalacion de formaleta para pantalla del KO+121 al KO+104 y armado de acero de refuerzo de pantalla del KO+104 al KO+094. Se realiza relleno de muros del KO+121 al KO+153 e instalacion de geotextil y tubena perforada de 4".

Viernes 18/10/2024 Estado del clima: Tiempo parcialmente seco.
Personal en obra: Ing. residente. 2 maestros. 8 ayudantes.
Equipos y herramienta: herramienta menor, rana, Mezcladora, vibro
Actividades: Se realizo fundicion de pantalla de muro de contencion h= 2,0m a=0,35 del KO+121 al KO+104. se continua con relleno del muro KO+121 al KO+153. conformacion del respaldo.

Sabado 19/10/2024 Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra: 1ng. residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, rana, herramienta menor

Powered by CamScanner

Actividades: Se continua con relleno del respaldo del muro del K0+121 al K0+153, instalacion de formaleta para pantalla del K0+104 al K0+09

Domingo 20/10/2024 Estado del clima: Fuertes lluvias desde la tarde y madrugada.
Sin actividades de obra: Domingo.

Lunes 21/10/2024 Estado del clima: llovisnas suaves durante la mañana.
Personal en obra: Ing. residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, rana, vibro de concreto, herramienta menor.
Actividades: Se realizo formaleteado y aseguraco de esta para pantalla de muro entre K0+104 al K0+094 y se realiza fundicion de muro pantalla longitud total del muro 26,6 ml h= 2,0m a= 0,35m

Martes 22/10/2024 Estado del clima. Tiempo parcialmente seco.
Personal en obra: Ing. residente 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, rana, vibro concreto, herramienta menor.
Actividades: Se realizo instalacion de geotextil, tuberia perforada de 4" y llena de material filtrante grava 3" h=0,80. a=0,30 K0+121 al K0+104. y lleno de muro al respaldo.

Miercoles 23/10/2024 Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra: Ing. residente 2 maestros. 8 ayudantes
Equipos y herramienta: herramienta menor, rana.
Actividades: Se continua con lleno, instalacion de geotextil, tuberia perforada de 4" y lleno de filtro del K0+104 al K0+094. se continua con lleno al respaldo del muro. se realiza conformacion de terreno sobre K0+121 al K0+078. se realizo excavacion de sumidero y para instalacion de tuberia de 10" para captacion de agua. K0+116.

Powered by CamScanner

Jueves 24/10/2024 Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra: Ing. residente, 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, rana, herramienta menor.
Actividades: Se realiza instalacion de formaleta para concreto ciclopeo y fundicion de huellas en ciclopeo del K0+121 al K0+0
Se realiza visita y recorrido por la obra con personal de interventoria 1 ingeniero civil. realizo las siguientes observaciones:
- Ampliar el personal para iniciar intervencion con los alcantarillas y cumplir los plazos hasta el 15-Dic-2024

- Proyectar obra de captacion para manejo de aguas sobre el K0+115. (disipador, o poceta y canalizacion).
- Evaluar y proyectar obra de contencion tipo muro para el sector K1+140 zaguan ya que presenta erosion a la rasante Lado izquierdo. y garantizar estabilidad del tramo.

Viernes 25/10/2024. Estado del clima: Tiempo seco
Personal en obra: Ing. residente, 2 maestros, 8 ayudantes.
Equipos y herramienta: Mezcladora, rana, herramienta menor, vibro
Actividades: Se realizo instalacion de formaleta y fundicion de concreto ciclopeo K0+098 al K0+078,7
Armado de acero de refuerzo para huellas, excavacion y solado de limpiera para riostras K0+121 al K0+098. y fundicion de huellas y riostras del K0+098 al K0+109. Se fundio dentellon en ciclopeo para estabilizacion de hombro Long: 8ml *H=1,10 a=0,60.

Sabado 26/10/2024 Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra: Ing. residente 2 maestros 8 ayudantes.
Equipos y herramienta: Mezcladora, vibro de concreto, rana herramienta menor.
Actividades: Se realizo excavacion y solado de limpieza para riostras, armado de acero de refuerzo para huellas y fundicion de huella a=0,90 y riostras del K0+098 al K0+078,7.

Domingo 27/10/2023 Sin actividades.

Lunes 28/10/2023 Estado del clima: Tiempo seco
Personal en obra: Ing. residente 8 ayudantes 2 maestros.
Equipos y herramienta: Mezcladora, rana, herramienta menor, vibro. ecf
Actividades: Se realiza excavacion para poceta de 1.30 x 1.30 M para captacion y canalizacion de aguas en el KO+115. h=3m instalacion de posimaleta para cunetas del KO+109 al 0+78.7 lado derecho.

Martes 29/10/2023 Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra: Ing residente 8 ayudantes, 2 maestros.
Equipos y herramienta: Mezcladora, rana herramienta menor vibro de ccto.
Actividades: Se continua con excavacion para canalizacion de aguas por tuberia de 10" Long. 12 ml h=0.80 m a=0,60 y fundicion de cunetas del KO+109 al KO+78.7 Lado derecho.

Miercoles 30/10/2023 Estado del clima: Tiempo seco.
Personal en obra: Ing. residente. 2 maestros, 8 ayudantes
Equipos y herramienta: Mezcladora, herramienta menor.
Actividades: Se realiza corte, flejado y armado del acero de refuerzo para poceta KO+115 h=3.0m.
Excavacion solado de limpieza para riostras. instalacion de acero de refuerzo para huellas a=2.0m del KO+109 al KO+121.6.

Jueves 31/10/2023 Estado del clima Tiempo seco
Personal en obra: Ing residente 2 maestros, 8 ayudantes
Actividades: Se realizo fundicion de poceta de 1.30 x 1.30 h=3m, fundicion de cunetas KO+098, al KO+78.7 L Der.

Powered by CamScanner

BITACORA DE OBRA
SUCRE 1866
MES DE JULIO Y OCTUBRE 2024

30/06/2024	Domingo/06/30/2024 No se realizan trabajos.
01/07/2024	Lunes/01/07/2024 No se presenta personal en obra.
02/07/2024	Martes/02/07/2024 No se presenta personal en obra.
03/07/2024	Miercoles/03/07/2024 No se presenta personal en obra.
04/07/2024	Jueves/04/07/2024 No se presenta personal en obra.
05/07/2024	Viernes/05/07/2024. No se presenta personal en obra.
06/07/2024	Sabado/05/07/2024 No se presenta personal en obra.
07/07/2024	Domingo/07/07/2024.
08/07/2024	Lunes/08/07/2024. No se presenta personal en obra.
09/07/2024	Martes/08/07/2024 No se presenta personal en obra.
10/07/2024	Miercoles/10/07/2024. No se presenta personal en obra.
11/07/2024	Jueves/11/07/2024 No se presenta personal en obra.

Yolmar Sanchez
Ing. Aux. interventoría

Yolmar Sanchez
Ing Aux. interventoría

Yolmar Sanchez
Ing Aux. interventoría

Powered by CamScanner

12/07/2024 Viernes /12/ 2024
No se presenta personal en obra.

13/07/2024 Sabado / 13 / 2024.
No se presenta personal en obra.

14/07/2024 Domingo / 14 /2024.

15/07/2024 Lunes. / 15 /2024
No se presenta personal en obra. Yilmar Sanchez
Ing Aux interventoría

16/07/2024 Martes / 16 / 2024
No se presenta personal en obra

17/07/2024 Miercoles / 17 / 2024
No se presenta personal en obra.

18/07/2024 Jueves / 18 / 2024.
No se presenta personal en obra. Yilmar Sanchez
Ing Aux interventoría

19/07/2024 Viernes / 19 / 2024.
No se presenta personal en obra.

20/07/2024 Sabado / 20 /2024
Día festivo.

21/07/2024 Domingo /21 / 2024
No hubo actividades de obra.

22/07/2024 Lunes /22/ 2024
No se presenta personal en obra Yilmar Sanchez
Ing Aux. interventoría

23/07/2024 Martes /23/ 2024
No se presenta personal en obra.

Powered by CamScanner

24/07/2024 Miercoles /24/ 2024

No se presenta personal en obra.

Yilmar Sanchez
Ing. Aux interventoria

25/07/2024 Jueves /25/2024

No se presenta personal en obra

26/07/2024 Viernes /26/2024

No se presenta personal en obra

27/07/2024 Sábado/27/2024

No se presenta personal en obra

28/07/2024 Domingo /28/2024

No se presenta personal en obra

Yilmar Sanchez
Ing Aux interventoria

Powered by CamScanner

24/07/2024 Miercoles /24/ 2024
No se presenta personal en obra.
Yilmar Sanchez
Ing. Aux interventoría

23/07/2024 Jueves /25/2024
No se presenta personal en obra.

26/07/2024 Viernes /26/2024
No se presenta personal en obra

27/07/2024 Sábado/27/2024
No se presenta personal en obra

28/07/2024 Domingo /28/2024
No se presenta personal en obra
Yilmar Sanchez
Ing Aux interventoría

26/07/2024 al 30/09/2024 El contrato en esta Suspendido

01/10/2024 Martes 01 de octubre 2024
No se presenta personal en obra.
Residente obra.

02/10/2024 Miercoles 02 de octubre 2024
No se presenta personal en obra.
Residente obra
Yilmar Sanchez
Ing Aux. Interventoría

03/10/2024 Jueves 03 de octubre 2024
No se presenta personal en obra.
Residente obra

04/10/2024 Viernes 04 de octubre 2024
No se presenta personal en obra
Residente obra

05/10/2024 Sábado 05 de octubre 2024
No se presenta personal en obra
Residente obra.
Yilmar Sanchez
Ing. Aux Interventoría

06/10/2024 Domingo 06 de octubre 2024
Residente obra

Powered by CamScanner

07/10/2024 Lunes 07 de octubre 2024
No se presentan personal en obra
Residente obra. Yilmar Sanchez Ing Aux. Inte Res. Inte

08/10/2024 Martes 08 de octubre 2024
No se presenta personal en obra
Residente obra Yilmar Sanchez Ing Aux. Int. Res. Inte

09/10/2024 Miercoles 09 de octubre 2024
No se presenta personal en obra, sin embargo en la ciudad de Popayan se da inicio con el corte de barras de 1"
Residente obra Yilmar Sanchez Ing Aux Int Resid Inte

10/10/2024 Jueves 10 de octubre 2024
No se presenta personal en obra, sin embargo en la ciudad de Popayan se continúa con el corte de barras 1"
Residente obra Yilmar Sanchez Ing. Aux Int Residente

11/10/2024 Viernes 11 de octubre 2024
No se presenta personal en obra, sin embargo en la ciudad de Popayan se continua con el corte de varillas de 1" para la construcción de dovelas

12/10/2024 Sábado 12 de octubre 2024
Residente obra Yilmar Sanchez Ing. Aux. Int. Residente
No se presenta personal en obra

13/10/2024. Domingo 13 de octubre de 2024
No se Presenta Personal en obra
Residente obra Yilmar Sanchez Ing Aux Int Residente

14/10/2024 Lunes 14 de octubre de 2024
No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte Varilla

15/10/2024 Martes 15 de octubre de 2024
Residente obra Yilmar Sanchez Ing Aux Int Res Int
No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte Varilla 1"

16/10/2024 Miercoles 16 de octubre de 2024
Residente obra Yilmar Sanchez Ing Aux Residente
No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte de varilla 1"

17/10/2024 Jueves 17 de octubre de 2024
Residente obra Yilmar Sanchez Ing Aux Residente
No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte de varillas

18/10/2024 Viernes 18 de octubre de 2024
Residente obra Yilmar San Ing Aux Residente
No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte de varilla 1"

19/10/2024 Sabado 19 de octubre de 2024
Residente obra Yilmar Sanchez Ing Aux Residente
No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte de varilla 1"

20/10/2024 Domingo 20 de octubre de 2024
Residente de obra Yilmar San Ing Aux Resid. Inte.
No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte de 1"

21/10/2024 Lunes 21 de octubre de 2024
Residente de obra Yilmar San Ing Aux. Resid Inte
No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte de 1"

22/10/2024 Martes 22 de octubre de 2024
Residente de obra NKA Resi Inte

Powered by CamScanner

No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte de vanilla 1"

23/10/2024 Miercoles 23 de octubre de 2024 Residente de obra Yilmar Sanchez Ing Aux Int

No se Presenta Personal en obra sin embargo se continua con el corte de vanilla 1"

24/10/2024 Jueves 24 de octubre de 2024 Residente de obra

No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte de vanilla 1"

25/10/2024 Viernes 25 de octubre de 2024 Residente de obra

No se Presenta Personal en Obra, Sin embargo se continua con el corte de vanilla 1"

26/10/2024 Sabado 26 de octubre de 2024 Residente de obra

No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte de vanilla 1"

27/10/2024 Domingo 27 de octubre de 2024 Residente de obra

No se Presenta Personal en obra, sin embargo se continua con el corte de vanilla

28/10/2024 Lunes 28 de octubre de 2024

No se Presenta Personal en obra, mediante oficio 20241100-INV-779-2024 la interventoria notifica de manera oficial la falta de Ejecucion de las actividades constructivas desde el 01 de octubre de 2024. lo cual Este hecho ha generado un considerable atraso en las actividades Programadas y establecidas en el Plan de contingencia entregado el 01 de octubre de 2024 Por el contratista de obra, en el Proyecto se ve un avance del 27,25% en contraste con el 99.99% Programado, resaltando un deficit de ejecucion del 72,74 %, segun lo reportado en el informe semanal 89 enviado a la Subdireccion de Invias.

Se notifica a contratista y municipio de un Presunto incumplimiento del contrato para que se inicien todas las acciones Pertinentes, con el fin de salvaguardar los recursos economicos del contrato.

Se precisa que es imperativo reformar las actividades economicas de manera inmediata, dado que segun lo establecido en el modificatorio N°7 el contrato cuenta con fecha de finalizacion Prevista al 15 de diciembre de 2024 y en el tiempo restante no se alcanzaran las metas Planteadas en el contrato, se recomienda ejecutar actividades aunadas en toda la seccion transversal del pavimento.

Yilmar Sanchez

Relacion de Firmas.

Residente Obra Residente interventoria

El Contratista da claridad que Pese a no registrar Personal en obra se estan realizando actividades de Programacion, Suministro de material Petreo, y Corte y Figurado de acero de refuerzo.

NKA

29/10/2024 | Martes 29 de octubre de 2024

Estado del clima = Soleado durante el transcurso de todo el día.
Personal en obra = (1) maestro, (1) oficial, (1) ayudante (0:1:1) - (1:0:0)
Equipo: (1) motoniveladora, (1) volqueta,
Actividades ejecutadas = se realiza extendido, conformación y compactación de subbase se realizo ademas canastillas en acero, para la fundición programada de concreto en los 347 metros de la segunda franja. // // // // // // //

Residente obra Residente interv.

30/10/2024. Miercoles 30 de octubre de 2024.
Estado del clima = Soleado durante el transcurso de todo el día
Personal en obra = 1 maestro, (1) oficial, (1) ayudante, 1 conductor.
Equipo: (1) volqueta, equipo de soldadura.
Actividades Ejecutadas = se realiza la construcción y armado para dovelas, 1" de diametro y barras de transferencia, ademas se realiza el transporte y suministro de agregados petreos como subbase y triturado.
Relación de Firmas.

Residente Obra Yilmar Sanchez Residente interventoría

31/10/2024. JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2024
Estado del clima = soleado en el transcurso de todo el día
Personal en obra = 1 maestro, (1) Oficial, (1) ayudante, 2 operadores de volqueta, (1) operador de motoniveladora.
Actividades Realizadas = se continua con la construcción y armado de Pasibas para la construcción de Dovelas,
se da inicio con el suministro, extensión, nivelación y compactación de material de subbase SBG-BG-25 de acuerdo a las especificaciones tecnicas del Proyecto.
se realiza el descargue de 350 bultos de cemento, segun diseño de mezcla.
Relación de Firmas y Recomendaciones de la interventoría: se recomienda por parte de la interventoría iniciar con la fundición de las losas lo antes posible, dado el Porcentaje de atraso que presenta el contrato en cuanto a su avance
Relación de Firmas.

Residente Obra Yilmar Sanchez Ing. Aux. Residente interventoría

01-NOV-2024 VIERNES 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

Powered by CamScanner
