AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONSULTA DEL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES

Yo **GELBER RAFAEL MOGOLLON VIVAS** identificado con cédula de ciudadania número 79.878.171 de Bogotá, actuando en representación PROPIA como persona natural me permito autorizar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ para realizar la consulta y verificación del registro de inhabilidades por delitos sexuales.

Se expide en Bogotá D. C. a los veintiún (29) días del mes de noviembre de 2.025.

GELBER RAFAEL MOGOLLON VIVAS
C.C. 79.878.171 de Bogotá.
Persona Natural

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONSULTA DEL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES

Yo **RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 19.388.445 de Bogotá, actuando en representación PROPIA como persona natural me permito autorizar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ para realizar la consulta y verificación del registro de inhabilidades por delitos sexuales.

Se expide en Bogotá D. C. a los veintiún (29) días del mes de noviembre de 2.025.




RAFAEL MOGOLLON RODRIGUEZ
C.C. 19.388.445 de Bogotá.
REPRESENTANTE LEGAL

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA CONSULTA DEL REGISTRO DE INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES

Yo **FRANS COCK** identificado con cédula de ciudadanía número 79.132.039 de Bogotá, actuando en representación PROPIA como persona natural me permito autorizar a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ para realizar la consulta y verificación del registro de inhabilidades por delitos sexuales.

Se expide en Bogotá D. C. a los veintiún (29) días del mes de noviembre de 2 025



FRANS COCK
C.C. 79.132.039 de Bogotá.
Persona Natural

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 100 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoria**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.455.237.837,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	03/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	03/10/2025
Fecha de Vencimiento:	02/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	02/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		ACUMULADO
Obra programada (%)	3,91%	24,59%	Obra Física Ejecutada (%)	15,66%	35,30%
Valor de la Obra programada:	$ 95.894.574,95	$ 603.637.759,64	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 384.490.245,27	$ 866.698.956,46

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	20,68%	19,64%	10,71%
Durante el periodo	3,91%	15,66%	
Acumulado actual	24,59%	35,30%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	1,40%	30,04%	-28,64%	24,13%	25,29%	-1,16%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	7,19%	23,09%	-15,90%	16,23%	33,95%	-17,72%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	2,72%	49,46%	-46,74%	26,87%	65,42%	-38,55%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	0,32%	0,84%	-0,52%	19,24%	22,68%	-3,44%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	2,07%	2,66%	-0,59%	17,44%	12,10%	5,34%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	2,33%	2,29%	0,04%	18,33%	14,70%	3,63%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	11,31%	1,24%	10,07%	49,35%	37,63%	11,72%
			3,91%	15,66%	-11,75%	24,51%	30,25%	-5,74%

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.455.237.837,00
VALOR PARCIAL 1		
VALOR PARCIAL 2		
TOTAL VALOR FACTURADO	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 2.455.237.837,00	$ 2.455.237.837,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 0,00	$ 0,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	24,59%	35,30%	10,71%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	100	11

CURVA S

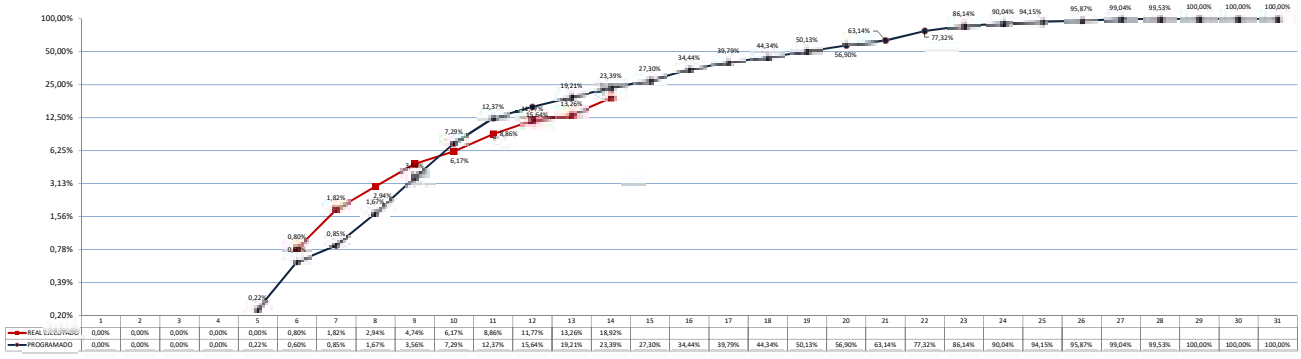

GENERALIDADES EN RELACION A LOS 07 FRENTES DE TRABAJO

1.Comite de obra N°6: Se lleva a cabo el comité de obra N.6 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 100 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia durante la semana el desarrollo de actividades en el área de la sala CRIL con el desarrollo de las actividades de la finalización del retiro y el embalaje de la cubierta y la pintura de las cerchas y rejas correspondientes a la cubierta existente y nueva.

2. Seguridad Social y SST: Durante la presente semana se registró el ingreso de personal nuevo por parte del contratista, manteniéndose a la fecha un total de 37 trabajadores operativos aprobados. Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades montaje del sistema de cubiertas del aula de bilingüismo; se realizó la verificación del personal y la supervisión del correcto uso de los EPP por parte del personal, durante la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 30,04% en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 1,40% para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo superior de un 28,64% , donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes a la sala CRIL y a la casona, donde igualmente se ha tenido en cuenta la rectificacion de las memorias presentadas por parte del contratista y las cantidades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades situadas en la casona no han presentado desarrollo en referencia al proceso estructural.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
-SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se ha presentado un avance significativo en referencia al desarrollo de actividades del piso y la cubierta de la sala CRIL, al igual que en la instalacion del desague de la cubierta de la casona.



5. Generales: En el transcurso de la semana se evidencia que no se presentó una alta afluencia de personal lo cual no permitió el correcto desarrollo de la programación y el avance de estas.

6. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, Se evidencia el uso de baño portátil, los sumideros cercanos cuentan con su debida protección, se realizó el embalaje establecido e las tejas de asbesto, se acopiaron los RCDs generados por las demoliciones, tener en cuenta que está cerca de las zonas verdes, pero se ve mucho desorden por las grandes cantidades que se encuentran en el frente, se recomienda realizar la disposición adecuada del material respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que garantizar jornadas de orden y aseo.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: A la fecha, se evidencia que la ejecución de las actividades en la institución se desarrolla de la siguiente manera:
Batería de baños:
Se observa el desarrollo de las cuchillas, así como la instalación de platinas y perfilería metálica correspondiente a los trabajos para la instalación de la nueva cubierta. De igual manera, se evidencia el armado y encofrado para la fundida de la viga corona. En este frente también se realiza el levantamiento de los muros en mampostería, cumpliendo con los parámetros técnicos establecidos, y de forma paralela se ejecuta la instalación de la tubería hidráulica e hidrosanitaria correspondiente.
Biblioteca y bloque amarillo (aulas):
En estas áreas se está realizando la instalación de perfilería metálica, cerchas y el refuerzo de las cerchas existentes. Asimismo, se desarrollan actividades de aplicación de pintura en dichos elementos estructurales.
Bloque café (aulas):
Se está ejecutando la reparación de las cintas en concreto de los vanos, como parte de las actividades de mantenimiento y adecuación de este bloque.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de labores de mampostería, instalación de tuberías y ejecución de pañetes, así como la fundición de elementos estructurales asociados. Se realizó la verificación del personal presente en obra. Así mismo, se verificó el desmonte del tanque con el fin de dar continuidad a las labores de mampostería, Durante las actividades, se constató el uso adecuado de los EPP por parte del personal.
Se contó con la presencia de la inspectora SST, en razón a la ejecución de actividades que involucran trabajos en alturas. En este se realizó la socialización y diligenciamiento del permiso de trabajo correspondiente, previo al inicio de las labores. Así mismo, la inspectora de SST llevó a cabo la charla de seguridad enfocada en trabajos en alturas, uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP) y medidas de autocuidado, verificando el cumplimiento de los lineamientos establecidos para la eiecución seoura de dichas actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 23,09% en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 7,19% para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo superior de un 15,19%, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes a la batería de baños y el avance significativo de ciertas actividades de cubierta, donde igualmente se ha tenido en cuenta la rectificacion de las memorias presentadas por parte del contratista y las cantidades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades correspondientes a la cubierta presentan un atraso acumulado, el cual ha venido incrementándose progresivamente, generando un retraso significativo en el cumplimiento de la programación establecida.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- DEMOLICIÓN PLACA MACIZA DESDE H=0.16 M HASTA H= 0.30 M.
- DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO E= 0.04 A 0.06 M.
- EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4".
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS.
- FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20. **- SUMINISTRO E**
INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH. **- SUMINISTRO E**
INSTALACIÓN DE CANAL GALVANIZADA CALIBRE 18 DESARROLLO

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Las actividades que presentan mayor avance corresponden a las ejecutadas al interior de la batería de baños, en referencia a las redes hidraulicas e hidrosanitarias. Al igual que el desarrollo de cierta actividades que son derivadas del retiro de cubierta existente.



5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se verifico el cerramiento en buen estado, Se hizo el procedimiento adecuado con las cubiertas de asbesto ya que cuentan con el embalaje de estas en vinipel, se reportó el ingreso de material al frente, los cuales están acopiados debidamente al igual que los RCDs generados por las demoliciones pero se ve mucho desorden por las grandes cantidades que se encuentran, por lo que se recomienda realizar la disposición adecuadamente el material respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Batería de baños de bachillerato: Se evidencia el desarrollo en su totalidad del pañete en la sección de mujeres; se encuentra pendiente el afinado de los muros y la verificación de las escuadras, previo a la actividad de enchape en muros. En la sección de hombres se continúa con la ejecución del pañete, actividad que a la fecha no ha sido finalizada. Las instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias se encuentran finalizadas y se realizó la instalación de las tapas correspondientes.
Batería de baños de primaria: Se evidencia el desarrollo de actividades en la sección de hombres, donde se fundió la placa de sobrepiso y se finalizaron las instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias de la placa de contrapiso. En la sección de mujeres se avanza en la finalización de las instalaciones correspondientes a la placa de contrapiso, con el fin de proceder posteriormente a su fundida. En ambas secciones se ejecutó la reestructuración de las cajas de inspección.
Aula múltiple: Se evidencia que se realizó la apertura del vano para la reorganización de las puertas y se avanza en la instalación de la perfilería metálica y el refuerzo de las cerchas existentes. De igual manera, se continúa con la aplicación de pintura en estos elementos.
Aulas infantiles: Se realizó la aplicación total del mástico, evidenciándose una correcta ejecución de esta actividad. Con base en lo anterior, se procedió a la instalación del piso en una de las aulas, la cual a la fecha presenta algunos detalles pendientes por corregir.

2. Seguridad Social y SST: Se realizó la verificación del personal presente en obra. Así mismo, se supervisan las actividades de montaje de las estructuras de las cubiertas, constatando el uso adecuado y permanente de los EPP. Se realizó la visita por parte de la inspectora de SST, en donde realizó la charla respectiva a autocuidado y el buen uso del equipo de protección personal.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 49,46 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 2,72 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 46,74 % , donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes a las aulas multiples en referencia a la cubierta, donde igualmente se ha tenido en cuenta la rectificacion de las memorias presentadas por parte del contratista y las cantidades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades correspondientes al desarrollo de la mamposteria interios de las areas y actividades derivadas del movimiento de escombros.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA SUPERIOR A 20 METROS.
- MURO LADRILLO PRENSADO MACIZO.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se han desarrollado actividades correspondientes a la pintura de las cerchas existentes, así como al montaje de la estructura metálica. Adicionalmente, en la batería de baños se están ejecutando actividades no programadas relacionadas con el pañete.



INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 100 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

5. Generales: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
- Batería de baños de bachillerato: Se evidencia el desarrollo en su totalidad del pañete en la sección de mujeres; se encuentra pendiente el afinado de los muros y la verificación de las escuadras, previo a la actividad de enchape en muros. En la sección de hombres se continúa con la ejecución del pañete, actividad que a la fecha no ha sido finalizada. Las instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias se encuentran finalizadas y se realizó la instalación de las tapas correspondientes.
- Batería de baños de primaria: Se evidencia el desarrollo de actividades en la sección de hombres, donde se fundió la placa de sobrepiso y se finalizaron las instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias de la placa de contrapiso. En la sección de mujeres se avanza en la finalización de las instalaciones correspondientes a la placa de contrapiso, con el fin de proceder posteriormente a su fundida. En ambas secciones se ejecutó la reestructuración de las cajas de inspección.
- Aula múltple: Se evidencia que se realizó la apertura del vano para la reorganización de las puertas y se avanza en la instalación de la perfilería metálica y el refuerzo de las cerchas existentes. De igual manera, se continúa con la aplicación de pintura en estos elementos.
- Aulas infantiles: Se realizó la aplicación total del másticc, evidenciándose una correcta ejecución de esta actividad. Con base en lo anterior, se procedió a la instalación del piso en una de las aulas, la cual a la fecha presenta algunos detalles pendientes por corregir.

6. Ambiental: Se verifico el cerramiento en buen estado, se verifica que la mezcla e concreto se realiza en batea metálica, se acopiaron los RCDs generados por las demoliciones al igual de los materiales que ingresaron al frente adecuadamente, sin afectación de las zonas verdes, ni sumideros y se recomiendo hacer la disposición adecuadamente de los RCDs respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia que se llevó a cabo la desinstalación de la cubierta en las dos (02) áreas que estaban pendientes de intervención por temas relacionados con la OTIC: el aula del rack y la sala de sistemas. De igual manera, se finalizó la limpieza y la aplicación de pintura en todas las cerchas y rejas, tanto de las aulas como del hall de distribución.
En estas mismas áreas se desarrollaron actividades de reparación de muros. Se observó que el enchape del hall de distribución presenta desprendimientos; por lo tanto, se procederá a su retiro para garantizar la correcta terminación de la superficie.
Dentro de las actividades preliminares, se ejecutó un refuerzo del cerramiento en lámina de teja de zinc con polisombra, lo cual permitirá incrementar la estabilidad del mismo.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se realizó la verificación del personal presente en obra, como hallazgo los trabajadores aún no cuentan con la dotación, aunque si portan con casco, botas y guantes. Por otra parte, se informa que el personal de vigilancia de la obra negó el ingreso a un trabajador, debido a que intentó acceder a la institución registrándose con un nombre diferente al correspondiente, situación que fue catalogada como irregular. Adicionalmente, se evidenció que dicho trabajador no hizo presencia en la institución durante 2 últimos días, correspondientes al jueves 08 de enero de 2026 y al viernes siguiente.
Por lo tanto, se registró el ingreso de otros 2 trabajadores que si cuentan con la debida verificación de identidad y la autorización correspondiente para el acceso a la obra, cumpliendo con los protocolos establecidos.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 0,84 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 0,32 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 0,52 %, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes al desarrollo de actividades en el punto fijo en referencia al resane y pintura de estas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se han desarrollado actividades correspondientes al desarrollo de actividades de resane y pintura de los puntos fijos.



5. Generales: N/A

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento en buenas condiciones con su señalización adecuada, se ubican materiales de construcción acopiados adecuadamente, por lo que se recomendó si se llega a generar residuos RCD disponer el material a un centro de aprovechamiento, al igual se recomendó al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de resane en los muros correspondientes al pasillo y a los salones, se avanzó en la aplicación de pintura sobre las cerchas y se finalizó en su totalidad tanto exterior e interiormente. Se valida diligenciamiento de ATS, Charlas de SST, uso adecuado de dotación y EPP. El cerramiento no se ha completado en su totalidad; no obstante, actualmente ya se encuentra debidamente señalizado, garantizando condiciones mínimas de seguridad y control en el área intervenida.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 2,66 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 2,07 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 0,59 %, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes a actividades preliminares y actividades de cubierta y derivadas de este desmonte, donde igualmente se ha tenido en cuenta la rectificacion de las memorias presentadas por parte del contratista y las cantidades.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades derivadas del desmonte de la cubierta no han sido ejecutadas o finalizadas.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se han desarrollado actividades derivadas del retiro de la cubiertas, en lo que refiere a la dispocision del material peligroso (Teja de asbesto).



5. Generales: Se registra la llegada de material (arena), su descargue y acopio en una de las aulas no intervenidas. Finalmente, se evidencia que el cerramiento en lámina de teja de zinc con polisombra no ha sido finalizado ni se ha realizado su respectiva reparación.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, el contratista realizo el desmantelamiento de todas las cubiertas, sin embargo, no se realizó el cubrimiento o embalaje establecido para su totalidad, se realizó el cerramiento adecuado en el frente, se asigna una zona de acopio temporal y delimitada para los escombros que cumple, se evidencio deterioro de las lonas con arena, por lo cual se hizo el llamado de atención y se atendió, al igual se recomendo al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades resane en los muros correspondientes al segundo piso de la institución. De igual manera, se continúa con el alistamiento del muro de la fachada de este mismo nivel. Se evidenció que la señalización correspondiente, aún no ha sido instalada en el cerramiento de la obra. No obstante, se realizó la entrega oportuna de los elementos de los EPP al personal de nuevo ingreso, garantizando su dotación conforme a los lineamientos establecidos. Adicionalmente, se constató el uso adecuado del sistema de andamios para la ejecución de los trabajos de mampostería en el segundo piso del bloque intervenido, verificando su empleo como apoyo seguro para el desarrollo de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 2,29 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 2,33 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación negativa del 0,04 %, donde se evidencia que el desarrollo de las actividades programadas en referencia a las derivadas de la desinstalacion de la cubierta existente no se ha terminado de confirmar el peso emitido por la entidad.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades derivadas del desmonte de la cubierta no han sido ejecutadas o finalizadas.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- DEMOLICIÓN DE ENCOROZADO DE CUBIERTA.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: N/A

5. Generales:

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se realizó el debido mantenimiento al cerramiento perimetral, se acopiaron los RCDs generados por las demoliciones, se realizó la debida disposición a las tejas de asbesto, pero se recomienda realizar la disposición adecuadamente del material sobrante respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: De acuerdo con lo visualizado la semana pasada, la institución no ha desarrollado las actividades conforme a lo programado, ya que el enfoque principal ha estado en la ejecución de actividades correctivas relacionadas con la cubierta de los cuatro (04) módulos.
Se observó que se realizó la desinstalación de la cubierta y el ajuste de toda la perfilería; con base en esto, se procedió a avanzar en las actividades de pintura de dicha perfilería y en el encorozado interior y exterior.
En el área del shut de basuras, se evidencia el desarrollo del alzado de los muros en sistema liviano, teniendo en cuenta la instalación de la perfilería metálica y la colocación de las láminas de Superboard, con un avance aproximado del 30 %.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de resane integral de los módulos del bloque, tanto en sus superficies interiores como exteriores. Asimismo, se ejecutó el encorazado en la zona exterior y se intervino la canaleta. Se validó la entrega de EPP al personal de nuevo ingreso que no contaba con ellos, garantizando el cumplimiento de las medidas básicas de seguridad. Adicionalmente, se efectuó la verificación del estado de los andamios utilizados en la obra, con el fin de confirmar su adecuado funcionamiento y asegurar condiciones seguras para la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: Se evidencia que la estructura metálica correspondiente a la cubierta se encuentra desalineada, lo que genera que la instalación de la cubierta no presente una correcta alineación. En consecuencia, se requiere realizar un reproceso consistente en la desinstalación y corrección de la estructura metálica.

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 1,24% en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 11,31% para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 10,07%, se informa que este bajo porcentaje se debe al retraso que presentamos en ambos frentes (Shut de basuras y modulos) esto se debe al reproceso presentado por la cubierta y a la ausencia de desarrollo de actividades de acabados de obra blanca.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades que no presentan desarrollo de actividades hacen referencia a un tema electrico y al desarrollo de acabados de pisos y muros, al igual que la instalacion de puertas.
Los items no desarrollados son los siguientes:
- SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS.
- MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M. **- SUMINISTRO E**
INSTALACIÓN BALDOSA GRANITO 33 X 33 PULIDO, INCLUYE PULIDO Y BRILLADO. **- SUMINISTRO E INSTALACIÓN**
ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA. **- SUMINISTRO E INSTALACION**
ENCHAPE CERAMICO BRILLANTE 25 X 35 CM O APROX.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA. **-**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18. **- ESTUCO SOBRE PAÑETE.**
- BASE PINTURA PARA BLANQUEAR FACHADAS TIPO 2 A 1 MANO.

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Las actividades ejecutadas durante el periodo, pese a no encontrarse programadas, corresponden al levantamiento de muros en sistema liviano (Muros en superboard) en el shut de basuras.



5. Generales: De acuerdo con lo anterior, en el Comité de Obra N.° 6 se realizó la alerta respecto a la entrega de este frente, la cual estaba programada para el 19 de enero, fecha que no será cumplida. Por lo tanto, se solicita al gestor territorial iniciar acercamientos con la institución, informando que se espera la entrega del frente para la última semana de enero de 2026.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se evidencia una unidad sanitaria, se evidencia el cerramiento en buen estado, se acopiaron los materiales de construcción en el frente y anteriormente se realizó la disposición adecuadamente del RCD respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

FIRMAS

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 100 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	03-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	03-nov-25	$ 4.755.494,21	0,22%	0,00%	$ -	$ 4.755.494,21	0,22%	$ 4.755.494,21	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8.125.912,59	0,38%	0,80%	$ 16.977.206,64	$ (8.851.294,05)	0,60%	$ 12.881.406,80	0,80%	$16.977.206,64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5.288.020,00	0,25%	1,02%	$ 21.771.422,72	$ (16.483.402,72)	0,85%	$ 18.169.426,80	1,82%	$38.748.629,36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17.444.983,27	0,82%	1,13%	$ 23.997.772,21	$ (6.552.788,94)	1,67%	$ 35.614.410,07	2,94%	$62.746.401,57
9	sem 9	01-dic-25	$ 40.343.446,53	1,89%	1,80%	$ 38.340.052,51	$ 2.003.394,02	3,56%	$ 75.957.856,60	4,74%	$101.086.454,08
10	sem 10	08-dic-25	$ 79.444.682,79	3,73%	1,43%	$ 30.382.417,28	$ 49.062.265,51	7,29%	$ 155.402.539,39	6,17%	$131.468.871,36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108.209.197,15	5,08%	2,69%	$ 57.402.366,83	$ 50.806.830,32	12,37%	$ 263.611.736,54	8,86%	$188.871.238,19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69.900.889,80	3,28%	2,91%	$ 62.085.827,21	$ 7.815.062,59	15,64%	$ 333.512.626,34	11,77%	$250.957.065,40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75.956.528,24	3,56%	1,49%	$ 31.686.383,67	$ 44.270.144,57	19,21%	$ 409.469.154,58	13,26%	$282.643.449,07
14	sem 14	05-ene-26	$ 89.212.283,49	4,18%	5,66%	$ 120.616.837,44	$ (31.404.553,95)	23,39%	$ 498.681.438,07	18,92%	$403.260.286,51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83.223.770,74	3,90%	0,00%	$ -	$ 83.223.770,74	27,30%	$ 581.905.208,81		$403.260.286,51
16	sem 16	19-ene-26	$ 152.231.709,97	7,14%	0,00%	$ -	$ 152.231.709,97	34,44%	$ 734.136.918,78		$403.260.286,51
17	sem 17	26-ene-26	$ 114.051.601,68	5,35%	0,00%	$ -	$ 114.051.601,68	39,79%	$ 848.188.520,46		$403.260.286,51
18	sem 18	02-feb-26	$ 97.149.131,29	4,56%	0,00%	$ -	$ 97.149.131,29	44,34%	$ 945.337.651,75		$403.260.286,51
19	sem 19	09-feb-26	$ 123.336.874,83	5,79%	0,00%	$ -	$ 123.336.874,83	50,13%	$ 1.068.674.526,58		$403.260.286,51
20	sem 20	16-feb-26	$ 144.354.651,09	6,77%	0,00%	$ -	$ 144.354.651,09	56,90%	$ 1.213.029.177,67		$403.260.286,51
21	sem 21	23-feb-26	$ 133.044.130,87	6,24%	0,00%	$ -	$ 133.044.130,87	63,14%	$ 1.346.073.308,54		$403.260.286,51
22	sem 22	02-mar-26	$ 302.192.068,33	14,17%	0,00%	$ -	$ 302.192.068,33	77,32%	$ 1.648.265.376,87		$403.260.286,51
23	sem 23	09-mar-26	$ 188.077.906,58	8,82%	0,00%	$ -	$ 188.077.906,58	86,14%	$ 1.836.343.283,45		$403.260.286,51
24	sem 24	16-mar-26	$ 83.278.260,58	3,91%	0,00%	$ -	$ 83.278.260,58	90,04%	$ 1.919.621.544,03		$403.260.286,51
25	sem 25	23-mar-26	$ 87.605.509,23	4,11%	0,00%	$ -	$ 87.605.509,23	94,15%	$ 2.007.227.053,26		$403.260.286,51
26	sem 26	30-mar-26	$ 36.671.729,02	1,72%	0,00%	$ -	$ 36.671.729,02	95,87%	$ 2.043.898.782,28		$403.260.286,51
27	sem 27	06-abr-26	$ 67.465.761,55	3,16%	0,00%	$ -	$ 67.465.761,55	99,04%	$ 2.111.364.543,83		$403.260.286,51
28	sem 28	13-abr-26	$ 10.504.787,87	0,49%	0,00%	$ -	$ 10.504.787,87	99,53%	$ 2.121.869.331,70		$403.260.286,51
29	sem 29	20-abr-26	$ 10.012.682,84	0,47%	0,00%	$ -	$ 10.012.682,84	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$403.260.286,51
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$403.260.286,51
31	sem 31	04-may-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$0,00
32	sem 32	11-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
33	sem 33	18-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
34	sem 34	25-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
35	sem 35	01-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
36	sem 36	08-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
37	sem 37	15-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
38	sem 38	22-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
39	sem 39	29-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
40	sem 40	06-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
41	sem 41	13-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
42	sem 42	20-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
43	sem 43	27-jul-26		0,00%	0,00%			**100,00%**	**$ 2.131.882.014,54**		
			$ 2.131.882.014,54	**100,00%**	**18,92%**						

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Lunes: Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de trabajo, sin ejecución de actividades durante la jornada.



Lunes: Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de trabajo, sin ejecución de actividades durante la jornada.



Martes: Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de trabajo, sin ejecución de actividades durante la jornada.



Martes: Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de trabajo, sin ejecución de actividades durante la jornada.



Se evidencia la ejecución de actividades de pintura en las cerchas y rejas correspondientes a la cubierta del aula CRIL. Se prevé la finalización de dichas actividades en el transcurso de la jornada.



Se evidencia la ejecución de actividades de pintura en las cerchas y rejas correspondientes a la cubierta del aula CRIL. Se prevé la finalización de dichas actividades en el transcurso de la jornada.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el correcto embalaje del material derivado del retiro de la cubierta existente, correspondiente a residuos catalogados como material peligroso, dando cumplimiento a los protocolos de manejo, almacenamiento temporal



Viernes: Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de trabajo durante la jornada; no obstante, se constata que la actividad correspondiente fue finalizada en su totalidad.



Viernes: Se evidencia la ausencia de personal operativo en el frente de trabajo durante la jornada.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se observa el inicio de la instalación de la perfilería metálica destinada al soporte de la cubierta.



Se observa el inicio de la instalación de la perfilería metálica (platinas), así como el desarrollo de las actividades correspondientes al armado de la viga corona.



Se observa el desarrollo de la mampostería de distribución, así como la ejecución de las instalaciones hidráulicas internas correspondientes.



Se evidencia la ejecución del remate de las cintas en los vanos de la ventanería del bloque café.



Se evidencia la ejecución del remate de las cintas en los vanos de la ventanería del bloque café.



Se observa el desarrollo de la mampostería de distribución, así como la ejecución de las instalaciones hidráulicas internas correspondientes.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se observa el avance en la ejecución de la mampostería (cuchillas), así como el armado de la viga corona.



Se observa el inicio de los trabajos correspondientes al proceso de instalación de la nueva cubierta en las aulas amarillas.



Se observa que se está realizando la instalación de la perfilería metálica y el refuerzo de las cerchas existentes en las aulas amarillas,.



Se observa la instalación de la perfilería metálica y de las cerchas nuevas correspondientes a la cubierta de la biblioteca.



Se observa el inicio de la instalación de la perfilería metálica destinada al soporte de la cubierta.



Se observa el inicio de la instalación de la perfilería metálica (platinas), así como el desarrollo de las actividades correspondientes al armado de la viga corona.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se observa la toma de niveles necesaria para la ejecución del alzado de los muros de mampostería.



Se observa la colocación del acero de refuerzo en los muros de mampostería para la ejecución de las dovelas.



Se observa la instalación de la perfilería metálica y de las cerchas nuevas correspondientes a la cubierta de la biblioteca, al igual que la instalacion de platinas.



Se observa el desarrollo de la mampostería de distribución, así como la ejecución de las instalaciones hidráulicas internas correspondientes.



Se observa que la perfilería metálica correspondiente a la nueva cubierta de las aulas amarillas se encuentra en proceso de limpieza y aplicación de pintura.



Se observa la instalación de la perfilería metálica y de las cerchas nuevas correspondientes a la cubierta de la biblioteca.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se observa el desarrollo de la mampostería de distribución, así como la ejecución de las instalaciones hidráulicas internas correspondientes.



Se observa el desarrollo de la mampostería de distribución, así como la ejecución de las instalaciones hidráulicas internas correspondientes.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el desarrollo de las redes hidráulicas e hidrosanitarias correspondientes a la batería de baños de primaria.



Se evidencia el desarrollo de la aplicación del mástico para la instalación del piso en vinisol.



Se evidencia el desarrollo de la reparación de las regatas en los muros de mampostería de la batería de baños de bachillerato.



Se evidencia el desarrollo de la apertura del vano para la nueva puerta del auditorio en las aulas múltiples.



Se evidencia el desarrollo de la reestructuración de las cajas de inspección correspondientes a la batería de baños de primaria.



Se evidencia el desarrollo del pañete en la batería de baños de bachillerato, específicamente en el área de hombres.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el desarrollo de la reparación de regatas en la batería de baños de bachillerato.



Se evidencia el desarrollo en su totalidad del pañete de la batería de baños de bachillerato de mujeres; queda pendiente el afinado de los muros y la verificación de la escuadra.



Se evidencia que se realizó la finalización de la aplicación del mástico en las tres (03) aulas infantiles, quedando la superficie preparada para la instalación del revestimiento correspondiente.



Se evidencia que se dará inicio a la instalación del revestimiento (Vinisol).



Se evidencia que se está realizando la reestructuración de las instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias de la batería de baños de primaria (mujeres), con un avance aproximado del 90 %.



Se evidencia la aplicación de pintura en la estructura nueva de la cubierta de las aulas múltiples.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que la estructura de la cubierta de las aulas múltiples presenta elementos salientes; en consecuencia, se solicita al contratista realizar el recorte del material excedente y el adecuado remate del área intervenida.

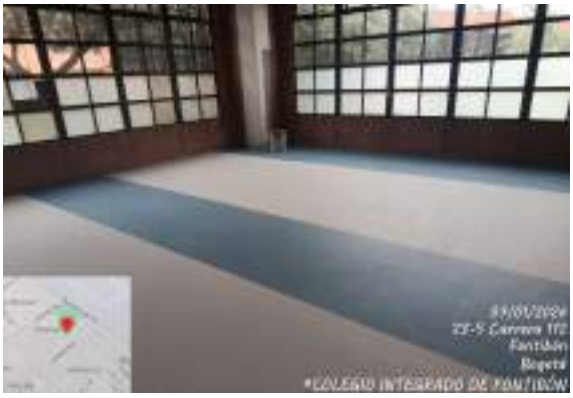

Se evidencia la instalación del revestimiento (Vinisol) en una de las aulas infantiles.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia la ejecución de la pintura del cárcamo.



Se evidencia la ejecución de la pintura del cárcamo.



Se evidencia el desarrollo de los remates y la aplicación de pintura en los puntos fijos del área interna.



Se evidencia el desarrollo de los remates y la aplicación de pintura en los puntos fijos del área interna.



Se evidencia el desarrollo del remate de los filos del cárcamo ubicado en el costado izquierdo de la cancha.



Se evidencia el desarrollo del remate de los filos del cárcamo ubicado en el costado izquierdo de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el desarrollo de los remates y la aplicación de pintura en los puntos fijos del área interna.



Se evidencia el desarrollo de los remates y la aplicación de pintura en los puntos fijos del área interna.



Se evidencia el desarrollo del remate de los filos del cárcamo ubicado en el costado derecho de la cancha.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el desarrollo de las actividades de limpieza y aplicación de pintura en las cerchas de las aulas azules.



Se evidencia el desarrollo de las actividades de limpieza y aplicación de pintura en las cerchas de las aulas azules.



Se evidencia el hallazgo de una fisura en el área de la fachada, en la mampostería; la misma deberá ser revisada y evaluada conjuntamente con el contratista y el supervisor.



Se evidencia el desarrollo de las actividades de limpieza y aplicación de pintura en las cerchas de las aulas azules.



Se evidencia el desarrollo de los resanes y reparaciones en los muros,



Se evidencia el desarrollo de los resanes y reparaciones en los muros,

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**


SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el desarrollo de los resanes y reparaciones en los muros,

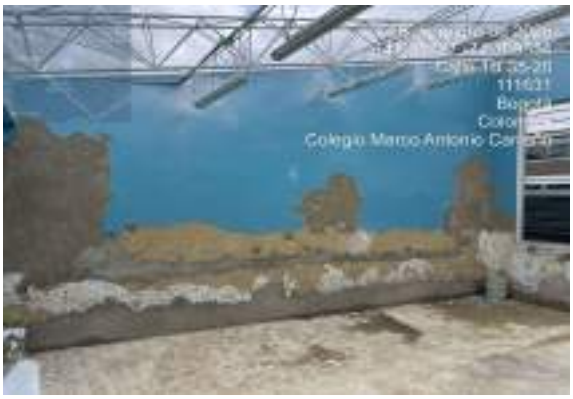

Se evidencia el desarrollo de los resanes y reparaciones en los muros,



Se evidencia el retiro de la cubierta en las áreas donde se encuentran ubicados el rack y la sala de sistemas.



Se evidencia el retiro de la cubierta en las áreas donde se encuentran ubicados el rack y la sala de sistemas.



Se evidencia el retiro de la cubierta del aula utilizada como centro de acopio de materiales y escombros.



Se evidencia que el enchape del hall de distribución presenta desprendimientos.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el desarrollo de las cuchillas, como parte de las actividades de mampostería.



Se evidencia que se realizó la demolición de las columnas de amarre de la baranda.



Se evidencia el retiro de la cubierta del área correspondiente a la coordinación.



Se evidencia el desarrollo de las cuchillas, como parte de las actividades de mampostería.



Se evidencia el desarrollo de la ampliación del cerramiento en lámina de teja de zinc con polisombra.



Se evidencia el desarrollo de la prolongación de las columnas y el amarre de la viga corona.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se está realizando el armado de la viga corona.



Se evidencia el desarrollo de la prolongación de las columnas y el amarre de la viga corona.



Se evidencia la continuacion del desarrollo del pañete en los muros, se encuentra pendiente el proceso de afinado.



Se realiza el proceso de aplicación de los puntos de nivelación del pañete; asimismo, se evidencia que se llevó a cabo el rayado de los muros de mampostería como preparación para la ejecución del acabado.



Se evidencia la continuacion del desarrollo del pañete en los muros, se encuentra pendiente el proceso de afinado.



Se evidencia el desarrollo de la prolongación de las columnas y el amarre de la viga corona.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza la reinstalación de la canal, con amarre a la estructura nueva, garantizando su correcta fijación.



Se realiza el proceso de encorozado en los cuatro (04) módulos.



Se realiza la reinstalación de la canal, con amarre a la estructura nueva, garantizando su correcta fijación.



Se realiza el proceso de encorozado en los cuatro (04) módulos.



Se realiza el proceso de instalación de la perfilería para el alzado de los muros en sistema liviano y se avanza en la instalación de las láminas de Superboard.



Se realiza el proceso de encorozado en los cuatro (04) módulos.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 14 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 14 (Consecutivo) **DEL** 5/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 11/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 100 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza el proceso de encorozado en los cuatro (04) módulos.



Se evidencia que se a avanzado la limpieza y pintura de las perfileria metalica correspondiente a la nueva cubierta.



Se realiza el proceso de encorozado en los cuatro (04) módulos.



Se realiza el proceso de instalación de la perfilería para el alzado de los muros en sistema liviano y se avanza en la instalación de las láminas de Superboard.



Se realiza el proceso de encorozado en los cuatro (04) módulos.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 107 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoria**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.455.237.837,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
Valor Adicion:	$ 380.000.000,00	**Valor Adicion:**	
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	03/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	03/10/2025
Fecha de Vencimiento:	02/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	02/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	4,62%	25,30%	Obra Física Ejecutada (%)	20,26%	39,90%
Valor de la Obra programada:	$ 113.361.838,42	$ 621.105.023,11	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 497.501.335,43	$ 979.710.046,62

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	20,68%	19,64%	14,61%
Durante el periodo	4,62%	20,26%	
Acumulado actual	25,30%	39,90%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	7,08%	0,90%	6,18%	30,01%	60,52%	-30,51%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	3,09%	11,21%	-8,12%	19,33%	46,20%	-26,87%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	1,26%	28,34%	-27,08%	28,18%	91,93%	-63,75%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	2,04%	40,24%	-38,20%	21,29%	62,93%	-41,64%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	2,61%	37,58%	-34,97%	20,05%	49,68%	-29,63%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0,19%	13,78%	-13,59%	41,85%	28,62%	13,23%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	16,05%	9,79%	6,26%	65,40%	47,42%	17,98%
			4,62%	20,26%	-15,65%	32,30%	55,33%	-23,03%

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.835.237.837,00
VALOR PARCIAL 1	$ 88.202.201,00	
VALOR PARCIAL 2		
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 88.202.201,00	
SUMAS IGUALES	$ 2.747.035.636,00	$ 2.747.035.636,00


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 88.202.201,00	$ 88.202.201,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	25,30%	39,90%	14,61%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	107	16

CURVA S

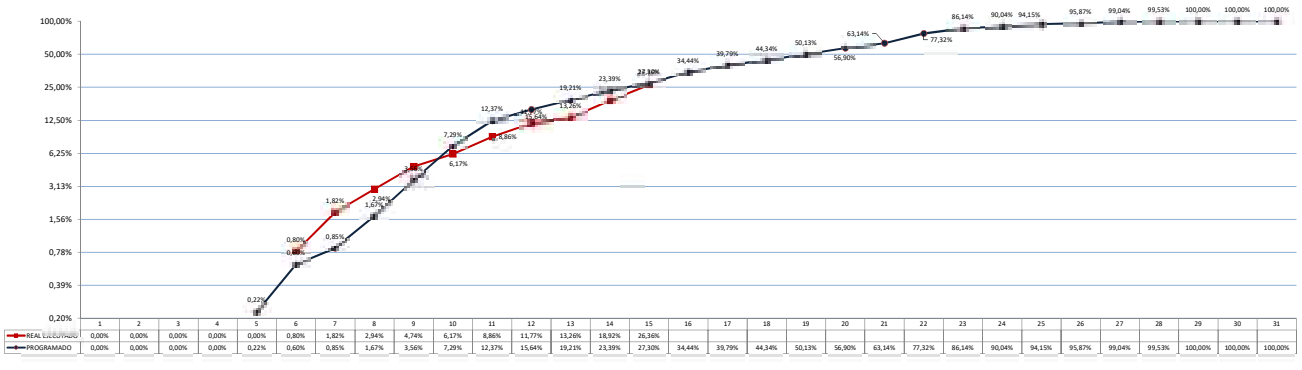

GENERALIDADES EN RELACION A LOS 07 FRENTES DE TRABAJO

1.Comite de obra N°7: Se lleva a cabo el comité de obra N.7 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría y el contratista de obra. (se levanta Acta de reunión).

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia que las actividades correspondientes a las dos áreas intervenidas han avanzado de la siguiente manera:
En el área de la sala CRIL, se realizaron labores de limpieza debido a condiciones climáticas adversas que ocasionaron inundaciones en el espacio, con el fin de permitir la continuidad de las actividades de resane y aplicación de pintura de fondeo en los muros, en la otra área a intervenir (La Casona), se evidencia el avance en el proceso de demolición y excavación del primer punto de los tres requeridos para la intervención estructural.

2. Seguridad Social y SST: Durante las revisiones realizadas se constató que, en algunas jornadas, no se encontraban en ejecución actividades de obra, manteniéndose las condiciones observadas en las supervisiones previas y sin evidencia de la presencia de personal operativo en las frentes intervenidos. Posteriormente, se verificó la ejecución de actividades puntuales de adecuación en el área de bilingüismo. No obstante, debido a condiciones climatológicas adversas, algunas actividades de resane y estucado quedaron pendientes de finalización, las cuales deberán ser culminadas una vez se presenten condiciones favorables para garantizar la adecuada calidad de los acabados.
Se contó con la presencia de la profesional de SST el día 13 de enero de 2026, con el fin de realizar la charla correspondiente y la supervisión programada. Sin embargo, debido a que en dicha fecha no se presentó personal del área operativa, no fue posible llevar a cabo el proceso previsto, quedando la actividad pendiente para su posterior reprogramación.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 0,90% en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 7,08% para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 6,18%, donde se evidencia atrasos en las actividades de la casona que corresponden a la intervencion estructural de esta y las actividades en referencia al sala CRIL no han avanzado segun lo esperado debido a los eventos climaticos presentados.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades situadas en la casona no han presentado desarrollo en referencia al proceso estructural.
Los Items no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- DESMONTE DE RED ELÉCTRICA.
ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI
- SUMINISTRO E INSTALACION
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PVC-S 3"

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se ha presentado un avance en referencia al desarrollo de actividades del los muros de la sala CRIL.



5. Generales: Durante el transcurso de la semana se evidenció la baja presencia de personal operativo en las áreas intervenidas, adicionalmente, las condiciones climáticas no permitieron el avance normal de las actividades en la sala CRIL.
Se observa la llegada de materiales para la ejecución de la cubierta de la sala CRIL, tales como cubierta tipo sándwich, canal y perfilería galvanizada. Durante el Comité de Obra N.° 6, el contratista informó que, para el montaje de dicha cubierta, es necesario realizar un análisis y planteamiento previo, debido a la falta de espacio disponible para su instalación.
Así mismo, durante el comité, el supervisor solicitó dar celeridad a la intervención del área de La Casona, especificamente en lo relacionado con la intervención estructural y con las obras a ejecutar respecto a la bajante de aguas lluvias, informando que estas deberán ser encauzadas y direccionadas hacia el cárcamo.

6. Ambiental: se realizó recorrido en el frente, los sumideros cercanos cuentan con su debida protección, se realizó el embalaje establecido e las tejas de asbesto, se acopiaron los RCDs generados por las demoliciones, tener en cuenta que está cerca de las zonas verdes y a unos individuos arbóreos, pero se ve mucho desorden por las grandes cantidades que se encuentran en el frente, se recomienda realizar la disposición adecuada del material respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: A la fecha, se evidencia que la ejecución de las actividades en la institución se desarrolla de la siguiente manera:
Batería de baños: Se observa el levantamiento de los muros divisorios de los espacios principales, los cuales definen la distribución de las áreas, así como el avance en el proceso de pañete de los mismos. De igual manera, se evidencia que la instalación de los perfiles galvanizados correspondientes a la cubierta continúa, aunque con un ritmo ligeramente más lento en comparación con la semana anterior.
Biblioteca: Se observa la continuidad en el desarrollo de las actividades relacionadas con la cubierta, especificamente en la instalación de la perfilería y las platinas, con el fin de dar paso posteriormente a la aplicación de la pintura de estos elementos.
Bloque amarillo (aulas): Se evidencia la finalización del proceso de instalación de los perfiles, encontrándose actualmente en la etapa de aplicación de pintura. Adicionalmente, se avanzó en la instalación de la canal y se aplicó la primera capa de pintura correspondiente.
Bloque café (aulas): Se continúa con la ejecución de la reparación de las cintas en concreto de los vanos, como parte de las actividades de mantenimiento y adecuación de este bloque, actividad que se espera finalizar en el transcurso de la presente semana. Así mismo, se dio inicio a las actividades de pintura mediante la aplicación de la pintura de fondeo en la fachada, con miras a la posterior aplicación del color definido en el Comité de Obra N.° 7.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de labores trabajos de mampostería en el área de los baños, así como en el pañete de muros, vigas y en el cubrimiento de las redes hidráulicas y sanitarias.
Se realizó la verificación del personal presente en obra. Así mismo, se verificó el desmonte del tanque con el fin de dar continuidad a las labores de mampostería; durante las actividades, se constató el uso adecuado de los EPP por parte del personal. Se evidencia la visita y acompañamiento de la inspectora SST, quien realizó la supervisión del uso y estado del equipo de protección personal, así como la socialización de riesgos locativos y la realización de charlas preventivas dirigidas al personal operativo. Durante la jornada, los trabajadores solicitaron dotación adicional de elementos de protección, especificamente guantes.
En relación con los equipos de acceso, se realizó la inspección de un andamio que presenta fallas en uno de sus frenos de seguridad, evidenciándose que a la fecha no se ha efectuado la corrección correspondiente. En función de esta condición, se realizó el cambio a andamios fijps para realizar la ejecución de trabajos en altura.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 11,21% en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 3,09% para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo superior de un 8,12% , donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes a la batería de baños y el avance en la pintura correspondiente a la perfilería de la cubierta.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades correspondientes a la cubierta presentan un atraso acumulado, el cual ha venido incrementándose progresivamente, generando un retraso significativo en el cumplimiento de la programación establecida.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIO PVCP DE 1/2".
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4".
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS.
- FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20.
INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH.
- SUMINISTRO E

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Las actividades que presentan mayor avance corresponden a las ejecutadas al interior de la batería de baños, en referencia a las redes hidraulicas e hidrosanitarias. Al igual que el desarrollo de cierta actividades que son derivadas del retiro de cubierta existente.



5. Generales: Durante el Comité de Obra N.° 7 se definieron los colores de pintura que se aplicarán en cada uno de los bloques a intervenir, estableciéndose la siguiente distribución:
• Biblioteca: Gris
• Aulas infantiles: Amarillo
• Bloque principal:
o Fachada del hall de acceso y fachada sobre la calle 13: Gris
o Fachada de la batería de baños y fachada de la portería: Amarillo
• Batería de baños: Blanco
Teniendo en cuenta lo anterior y las contingencias presentadas en la institución, se programa como fecha de entrega del bloque principal y de las aulas infantiles el día 26 de enero de 2026. Para esta fecha, las únicas actividades pendientes corresponderán a la instalación de las rejas de protección en las aulas café y a las reparaciones que deben ejecutarse al interior de las aulas del bloque principal. Dado que la fachada será restaurada posteriormente, se autoriza por parte del supervisor la aplicación de pintura en los muros que serán intervenidos.
Finalmente, se realizó una visita a la institución con el supervisor, el contratista y la directora de interventoría, con el fin de revisar el avance de las actividades, en la cual se confirmó la fecha de entrega de las aulas mencionadas. Durante esta visita también se revisó el área de la batería de baños, donde se evidenció que los diseños presentan inconvenientes en la apertura de las puertas de las divisiones. En atención a esta situación, el supervisor propone la reubicación de los lavamanos hacia el exterior de dichas áreas; en consecuencia, el contratista deberá elaborar y presentar el esquema correspondiente a esta modificación.

6. Ambiental: Se verifico el cerramiento en buen estado, Se hizo el procedimiento adecuado con las cubiertas de asbesto ya que cuentan con el embalaje de estas en vinipel, se reportó el ingreso de material al frente, los cuales están acopiados debidamente al igual que los RCDs generados por las demoliciones pero se ve mucho desorden por las grandes cantidades que se encuentran, se recomienda hacer la protección a los sumideros cerca y realizar la disposición adecuadamente el material respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Batería de baños de bachillerato: Se evidencia la finalización de las actividades de pañete y la continuidad en las labores de enchape de pisos y muros. En este sentido, se finalizó en su totalidad la aplicación de boquilla en el piso de la batería de hombres y se registra un avance aproximado del 50 % en la batería de mujeres. En relación con los muros, el enchape en ambas baterías presenta un avance estimado entre el 50 % y el 75 %.
Batería de baños de primaria: En la batería de baños primaria, área de niños, se realizó el levantamiento de los muros en mampostería correspondientes a la fachada y se llevó a cabo la fundida de las tapas de la caja de inspección; de igual manera, se avanzó en las actividades de pañete. En la batería de baños de niñas se finalizaron las actividades de plomería y se continuó con la reparación de regatas y la ejecución del pañete. Así mismo, se avanzó en el armado de la malla electrosoldada para la placa de contrapiso.
Aula múltiple: Se evidencia que, a nivel interno, se finalizaron las actividades de instalación relacionadas con la perfilería y los refuerzos de las cerchas, y se continuó con la aplicación de pintura en el área. En el sector del alero se están ejecutando refuerzos en los apoyos y se evidencia la llegada de material correspondiente a la canal y a la pintura de la misma.
Aulas infantiles: Se evidencia la finalización total de la instalación del piso y del guardaescoba en vinisol. No obstante, se identifica la necesidad de realizar una jornada de aseo general en estas áreas.

2. Seguridad Social y SST: Se realizó la verificación en los componentes de acabados, mamposteria, instalaciones sanitarias e hidráulicas y estructura de cubierta. Se realizó la verificación del personal presente en obra. Así mismo, se supervisan las actividades de montaje de las estructuras de las cubiertas, constatando el uso adecuado y permanente de los EPP. Se evidenció la presencia de la inspectora SST, quien realizó la verificación de la dotación del personal del área operativa. Así mismo, se llevó a cabo la charla de seguridad enfocada en riesgo locativo, orientada a la prevención de incidentes durante la ejecución de las actividades en obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 28,34 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 1,26 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 27,08 % , donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes a las aulas infantiles correspondientes a la instalacion del piso en vinisol y el guardaescoba en PVC, igualmente se observa un avance en las areas del enchape de los muros y piso de la bateria de baños de bachillerato (Hombres y mujeres).

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se han desarrollado actividades correspondientes al piso y guardaescoba de las aulas infantiles y el desarrollo de enchapes de muro y piso de la bateria de baños de bachillerato.



5. Generales: Observaciones derivadas del avance de las actividades y de la visita realizada por el supervisor, en compañía del contratista y la interventoría:
• Se debe realizar la entrega de las aulas múltiples a la dirección en el transcurso de la próxima semana.
• El contratista se encuentra realizando la reparación del hallazgo señalado por la directora de interventoría, relacionado con la platina del apoyo del alero de la cubierta de las aulas múltiples.
• Teniendo en cuenta la contingencia y la necesidad de brindar apoyo a la institución, se deberá realizar la instalación de siete (07) unidades de baterías de baños portátiles y priorizar la ejecución de las actividades en las baterías de baños de bachillerato.
• Se realizó la revisión de la caja de inspección principal y del pozo exterior, evidenciándose que no se requiere la limpieza mediante vactor. Se identifica que el nivel de salida del tubo se encuentra por encima del nivel de la caja, lo cual genera la salida del agua por rebose. En atención a lo anterior, el supervisor solicita el sellado y marcación de las cajas, y que estas se finalicen hasta donde las condiciones de ejecución lo permitan.

6. Ambiental: Se verifico el cerramiento en buen estado, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica, se acopiaron los RCDs generados por las demoliciones al igual de los materiales que ingresaron al frente adecuadamente, sin afectación de las zonas verdes, ni sumideros, pero se recomienda solo mantener un sitio de acopio de residuos y hacer la disposición adecuadamente de los RCDs respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Puertas de aulas: Se evidencia que se realizó la pintura de las puertas y marcos correspondientes al primer nivel. De acuerdo con lo anterior, se espera dar continuidad a estas actividades en el segundo nivel.
Escenario deportivo: Se realizó la instalación de las canchas de fútbol y baloncesto, para lo cual se llevó a cabo la fundida de los dados que garantizan la estabilidad de estas estructuras. Se encuentra pendiente la instalación de los tableros. Así mismo, se continúa trabajando en la reparación de los flos exteriores de los cárcamos; en consecuencia, permanecen pendientes las actividades de pintura y demarcación de la cancha.
Cubierta: Se evidencia que se realizó la instalación del manto pendiente en la cubierta, como parte de las actividades de terminación de este sistema.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, se evidenciaron actividades de la aplicación de pintura en las puertas de acceso de las instituciones, con lo cual se culmina la fase de acabados del primer nivel. Se realizó la verificación del personal presente en obra, identificándose como hallazgo que los trabajadores aún no cuentan con la dotación completa requerida para el desarrollo de sus labores. No obstante, se evidenció que el personal porta casco, botas de seguridad y guantes.
En este sentido, se hace el llamado al contratista para completar de manera inmediata la dotación del personal, conforme a lo establecido en la normatividad vigente.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 40,24 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 2,04 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 38,20 % , donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes al desarrollo de actividades en la el escenario deportivo, el cual se encuentra casi finalizado.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se han desarrollado actividades correspondientes al desarrollo del escenario deportivo en su totalidad, teniendo en cuenta la fecha de entrega de este.



5. Generales: Se evidencia que se realizan ciertas observaciones de acuerdo a las necesidades de la institución.
• El escenario deportivo deberá ser entregado por parte del contratista antes del 26 de enero de 2026.
• Durante el Comité de Obra N.° 7 se solicita dar prioridad al ingreso de personal, teniendo en cuenta que las actividades correspondientes a puntos fijos no han presentado avances, así como aquellas relacionadas con la cubierta que aún se encuentran pendientes por finalizar.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se encuentra el cerramiento en buenas condiciones con su señalización adecuada, se ubican materiales de construcción acopiados adecuadamente, por lo que se recomendó si se llega a generar residuos RCD disponer el material a un centro de aprovechamiento, al igual se recomendó al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Bloque principal: Se evidencia que en el área del laboratorio y en el aula N.° 3 se presenta la aparición de fisuras, motivo por el cual se dio inicio al proceso de cosido de las mismas. Así mismo, en las áreas donde se finalizó el resane de los muros a intervenir, se evidenció la aplicación de la pintura de fondeo en dos (02) aulas. De manera paralela, se continúa con el proceso general de reparación de muros.
Aula independiente: Se realizó el levantamiento de las cuchillas en mampostería, incluyendo las columnas de amarre correspondientes. Posteriormente, se ejecutó el encofrado para la fundida de la viga corona y se procedió con el desencofrado de la misma, conforme a las actividades estructurales programadas.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de fundición de la viga cinta correspondiente al aula externa, así como en los trabajos de resane de los salones y su preparación para la posterior instalación de correas y cubiertas. Con respecto a las actividades SST el cerramiento perimetral no se ha completado en su totalidad; no obstante, se realizó la reparación de los tramos existentes, logrando que el cerramiento quedara completamente rígido y estable, mejorando las condiciones de seguridad y control del área intervenida.
Así mismo, se evidenció la ejecución de trabajos en altura bajo la supervisión directa de la SST, verificando el cumplimiento de los procedimientos establecidos, el uso adecuado de los sistemas de protección contra caídas y la correcta implementación de las medidas preventivas. Adicionalmente, se realizó la reposición de EPP deteriorados, tales como guantes y gafas de seguridad, garantizando que el personal cuente con EPP en buen estado y acordes a las actividades desarrolladas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 2,61 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 37,58 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 34,97 %, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes a actividades de cubierta y a la reparacion y fondeo de los muros internos de las aulas.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se han desarrollado actividades para realizar la instalacion de la perfileria correspondiente al montaje de la nueva cubierta.



5. Generales: Se evidencia que se realizan ciertas observaciones de acuerdo a las necesidades de la institución durante la visita realizada en compañía de contratista, el supervisor y la interventoría:
• El supervisor informó que, de acuerdo con el alcance del contrato, se debe tener en cuenta la cubierta del segundo nivel; sin embargo, considerando las intervenciones actualmente en ejecución, este frente no deberá ser intervenido hasta tanto no se finalicen los demás frentes de trabajo.
• La directora de interventoría indicó que, en el área donde las cerchas presentan desprendimiento o levantamiento, se deberá realizar una revisión por parte del estructural para definir el sistema adecuado de apoyo.
• Se informa que el color definido para el acabado final del hall es gris.
• Debido al alto deterioro de la pintura en la patera y el antepecho de la fachada posterior del bloque principal, el supervisor autoriza la intervención de estos elementos por mayores cantidades.
• Se informa que el ítem autorizado para las puertas no incluía los marcos; no obstante, debido al deterioro de uno de ellos, se autoriza su reemplazo.
• Por parte de la interventoría se realizaron llamados de atención en relación con el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, el contratista realizo el desmantelamiento de todas las cubiertas, la cuales contaban con el embalaje establecido y posteriormente el 16 de enero se hizo la disposición de estas mediante el gestor autorizado, se realizó el cerramiento adecuado en el frente, se asigna una zona de acopio temporal y delimitada para los escombros que cumple, al igual se recomendo al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Oficinas administrativas: Se evidencia la realización de actividades de pañete en general, que incluyen el proceso de zafarreado, la aplicación de líneas de nivelación y la ejecución del pañete. De igual manera, se llevaron a cabo actividades de desencofrado de la viga corona.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de fundición de las vigas corona correspondientes a la ampliación del segundo piso de la institución. Durante la revisión realizada se constató la disposición de las formaletas en obra, debido a que el personal presente no se encontraba desarrollando trabajos. Se ordenó proceder con el retiro de estas dentro de los próximos 3 días. Adicionalmente, se evidenció que el contratista no ha suministrado los EPP a dos de sus trabajadores, incumpliendo las obligaciones establecidas en materia de SST. Esta condición incrementa de manera significativa el nivel de riesgo para el personal y terceros, razón por la cual se refuerza la decisión de mantener la suspensión de actividades hasta tanto se realice la regularización total del personal, se cuente con la aprobación correspondiente por parte de la Interventoría y se garantice la dotación completa de los EPP exigidos.
En consecuencia, se remitió al contratista el oficio correspondiente, en el cual se dejaron consignadas las observaciones anteriormente descritas, así como las instrucciones y requerimientos necesarios para el levantamiento de la suspensión, una vez se verifique el cumplimiento integral de los requisitos contractuales y de SST.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 13,78 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 0,19 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 13,59 %, donde se evidencia que se han desarrollado actividades derivadas de la nueva cubierta.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se evidencia que el desarrollo de actividades se encuentra en el area de la cubierta y las actividades derivadas de esta (Cuchillas e instalacion de perfileria).



5. Generales: Durante los recorridos realizados por los inspectores se identificaron varios hallazgos relacionados con la presencia de personal, la disposición de residuos y la ejecución de actividades:
• Durante la semana, en general, no hubo presencia de personal autorizado; o, cuando estuvo presente, no contaba con la autorización de la interventoría. Por esta razón, las labores debieron ser suspendidas en varias ocasiones. Además, se observó que cierto personal presente en obra no contaba con la correcta dotación de elementos de protección personal (EPP).
• Se evidencia la acumulación de elementos correspondientes a canaletas, rejillas, ventanería antigua, entre otros, los cuales aún no han sido retirados.
• Se constató la ejecución de actividades por parte de personal no autorizado, situación que representa un incumplimiento de los protocolos de seguridad y control establecidos.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica se realizó el debido mantenimiento al cerramiento perimetral, se acopiaron los materiales de construcción adecuadamente, se realizó la debida disposición a las tejas de asbesto el día 16 de enero, pero se recomienda garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
04 Módulos (Oficinas administrativas): Se evidencia que, teniendo en cuenta la finalización de la reinstalación de la perfileria galvanizada de la cubierta, se procedió con la reinstalación de la cubierta tipo sándwich.
Igualmente, se observó un avance en la ejecución de los acabados internos, comenzando con el piso, donde se completó la fundida del sobrepiso y la reparación del bordillo externo para el ingreso a los módulos. De manera paralela, se desarrolló la modulación del piso y se inició la instalación del mismo. También se avanzó en la aplicación de la primera capa de estuco como parte de los acabados de los muros internos.
Shut de basuras: Se evidencia la finalización del levantamiento de la perfileria correspondiente a los muros en sistema liviano y la instalación de las láminas con las dilataciones correspondientes en la primera cara. Además, se realizó la fundida de dos (02) de las tres (03) rampas previstas para el recorrido de la basura.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades relacionadas con el encoframiento del shut de basuras. En relación con las actividades SST se realizó la entrega de los EPP al personal de nuevo ingreso que no contaba con ellos, garantizando el cumplimiento de las medidas básicas de SST. Adicionalmente, se efectuó la verificación del estado y condiciones de los andamios utilizados en la obra, con el fin de confirmar su adecuado funcionamiento, estabilidad y conformidad con la normatividad vigente, asegurando así condiciones seguras para la ejecución de las actividades.
Durante el periodo reportado se remite al contratista mediante el oficio PROBINTEC-LOTE6-190 los lineamientos de Seguridad y Salud en el Trabajo por inicio de actividades académicas donde se busca garantizar la seguridad de los estudiantes, personal docente, administrativo y de obra, mediante el control de riesgos, la adecuada señalización, el uso obligatorio de EPP, el mantenimiento de áreas de circulación seguras, el cerramiento de los frentes de obra y el cumplimiento de las medidas de SST durante la convivencia entre actividades académicas y obras en ejecución.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 9,79% en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 16,05% para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo infeiror de un 6,26%, se informa que este bajo porcentaje se debe al retraso que presentamos en ambos frentes (Shut de basuras y modulos) esto se debe a los reprocesos y que no se ha realizo un plan de contingencia para la atencion del retraso presentado.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades que no presentan desarrollo de actividades hacen referencia a un tema electrico y al desarrollo de acabados de pisos y muros, al igual que la instalacion de puertas.
Los items no desarrollados son los siguientes:
- MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE.
- MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4".
- UMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENOS.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER.
GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PERSIANA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLL ROLLED LISA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA SIN MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18.
20 X 20 PLÁSTICA.
SOSCO DE 4" A 3".
MANOS.
MANOS.
- PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A DOS MANOS.
- PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM.
-
- SUMISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN
-
-
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA REGISTRO DE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON
- VINILO TIPO 1 A TRES
- PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Las actividades ejecutadas durante el periodo, pese a no encontrarse programadas y estar programadas en un periodo anterior su desarrollo actual y la revision de cantidades generan una cantidad adicional de estas.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 107 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16



5. Generales: Hallazgos durante los recorridos de inspección:
• Se evidenció que, en ciertas actividades, el personal no hacía uso de los elementos de protección personal (EPP), incumpliendo los protocolos de seguridad establecidos.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se evidencia una unidad sanitaria, se evidencia el cerramiento en buen estado, se acopiaron los materiales de construcción en el frente, se recomienda hacer la mezcla de concreto en batea metálica y/o plástico para evitar riesgos en la zona y anteriormente se realizó la disposición adecuadamente del RCD respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	03-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	03-nov-25	$ 4.755.494,21	0,22%	0,00%	$ -	$ 4.755.494,21	0,22%	$ 4.755.494,21	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8.125.912,59	0,38%	0,80%	$ 16.977.206,64	$ (8.851.294,05)	0,60%	$ 12.881.406,80	0,80%	$16.977.206,64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5.288.020,00	0,25%	1,02%	$ 21.771.422,72	$ (16.483.402,72)	0,85%	$ 18.169.426,80	1,82%	$38.748.629,36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17.444.983,27	0,82%	1,13%	$ 23.997.772,21	$ (6.552.788,94)	1,67%	$ 35.614.410,07	2,94%	$62.746.401,57
9	sem 9	01-dic-25	$ 40.343.446,53	1,89%	1,80%	$ 38.340.052,51	$ 2.003.394,02	3,56%	$ 75.957.856,60	4,74%	$101.086.454,08
10	sem 10	08-dic-25	$ 79.444.682,79	3,73%	1,43%	$ 30.382.417,28	$ 49.062.265,51	7,29%	$ 155.402.539,39	6,17%	$131.468.871,36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108.209.197,15	5,08%	2,69%	$ 57.402.366,83	$ 50.806.830,32	12,37%	$ 263.611.736,54	8,86%	$188.871.238,19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69.900.889,80	3,28%	2,91%	$ 62.085.827,21	$ 7.815.062,59	15,64%	$ 333.512.626,34	11,77%	$250.957.065,40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75.956.528,24	3,56%	1,49%	$ 31.686.383,67	$ 44.270.144,57	19,21%	$ 409.469.154,58	13,26%	$282.643.449,07
14	sem 14	05-ene-26	$ 89.212.283,49	4,18%	5,66%	$ 120.616.837,44	$ (31.404.553,95)	23,39%	$ 498.681.438,07	18,92%	$403.260.286,51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83.223.770,74	3,90%	7,45%	$ 158.783.369,63	$ (75.559.598,89)	27,30%	$ 581.905.208,81	26,36%	$562.043.656,14
16	sem 16	19-ene-26	$ 152.231.709,97	7,14%	0,00%	$ -	$ 152.231.709,97	34,44%	$ 734.136.918,78		$562.043.656,14
17	sem 17	26-ene-26	$ 114.051.601,68	5,35%	0,00%	$ -	$ 114.051.601,68	39,79%	$ 848.188.520,46		$562.043.656,14
18	sem 18	02-feb-26	$ 97.149.131,29	4,56%	0,00%	$ -	$ 97.149.131,29	44,34%	$ 945.337.651,75		$562.043.656,14
19	sem 19	09-feb-26	$ 123.336.874,83	5,79%	0,00%	$ -	$ 123.336.874,83	50,13%	$ 1.068.674.526,58		$562.043.656,14
20	sem 20	16-feb-26	$ 144.354.651,09	6,77%	0,00%	$ -	$ 144.354.651,09	56,90%	$ 1.213.029.177,67		$562.043.656,14
21	sem 21	23-feb-26	$ 133.044.130,87	6,24%	0,00%	$ -	$ 133.044.130,87	63,14%	$ 1.346.073.308,54		$562.043.656,14
22	sem 22	02-mar-26	$ 302.192.068,33	14,17%	0,00%	$ -	$ 302.192.068,33	77,32%	$ 1.648.265.376,87		$562.043.656,14
23	sem 23	09-mar-26	$ 188.077.906,58	8,82%	0,00%	$ -	$ 188.077.906,58	86,14%	$ 1.836.343.283,45		$562.043.656,14
24	sem 24	16-mar-26	$ 83.278.260,58	3,91%	0,00%	$ -	$ 83.278.260,58	90,04%	$ 1.919.621.544,03		$562.043.656,14
25	sem 25	23-mar-26	$ 87.605.509,23	4,11%	0,00%	$ -	$ 87.605.509,23	94,15%	$ 2.007.227.053,26		$562.043.656,14
26	sem 26	30-mar-26	$ 36.671.729,02	1,72%	0,00%	$ -	$ 36.671.729,02	95,87%	$ 2.043.898.782,28		$562.043.656,14
27	sem 27	06-abr-26	$ 67.465.761,55	3,16%	0,00%	$ -	$ 67.465.761,55	99,04%	$ 2.111.364.543,83		$562.043.656,14
28	sem 28	13-abr-26	$ 10.504.787,87	0,49%	0,00%	$ -	$ 10.504.787,87	99,53%	$ 2.121.869.331,70		$562.043.656,14
29	sem 29	20-abr-26	$ 10.012.682,84	0,47%	0,00%	$ -	$ 10.012.682,84	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$562.043.656,14
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$562.043.656,14
31	sem 31	04-may-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$0,00
32	sem 32	11-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
33	sem 33	18-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
34	sem 34	25-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
35	sem 35	01-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
36	sem 36	08-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
37	sem 37	15-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
38	sem 38	22-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
39	sem 39	29-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
40	sem 40	06-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
41	sem 41	13-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
42	sem 42	20-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
43	sem 43	27-jul-26		0,00%	0,00%			**100,00%**	**$ 2.131.882.014,54**		
			$ 2.131.882.014,54	**100,00%**	**26,36%**						

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realizó la limpieza de la sala CRIL, debido a que, como consecuencia de las lluvias y al encontrarse sin cubierta, el área presentó inundación.



Se evidencia que se realizó la limpieza de la sala CRIL, debido a que, como consecuencia de las lluvias y al encontrarse sin cubierta, el área presentó inundación.



Se evidencia que durante los dos (02) primeros días de la semana el área denominada La Casona no presentó avances en la ejecución de actividades.



Se evidencia que se está realizando el resane y la aplicación de la capa de pintura de fondeo en los muros de la sala CRIL



Se evidencia que se están realizando los procesos de demolición y excavación en el primero de los tres puntos del área de la Casona, conforme a las actividades programadas para este frente.



Se evidencia la llegada de material correspondiente a la cubierta de la sala CRIL.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia la llegada de material correspondiente a la canal de la sala CRIL.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se está avanzando en la actividad correspondiente a los filos de la ventanería del bloque Café.



Se avanza en la instalación de perfilería galvanizada en la cubierta de la biblioteca.



Se avanza en la instalación de perfilería galvanizada en la cubierta de las aulas amarillas.



Se avanza en la ejecución de la mampostería de la batería de baños, correspondiente a la división de los espacios principales.



Se evidencia el proceso de soldadura de las platinas correspondientes a la cubierta de la biblioteca.



Se evidencia que el andamio multidireccional presenta fallas continuas en uno de los sistemas de aseguramiento; en consecuencia, se suspende su funcionamiento hasta tanto se realice la corrección correspondiente.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se da inicio a las actividades de pañete, mediante la aplicación de los puntos de nivelación correspondientes.



Se evidencia que se da inicio a la actividad de fondeo del bloque Café, como etapa previa a la aplicación de la pintura final u oficial.



Se evidencia el proceso de soldadura de las platinas correspondientes a la cubierta de la biblioteca.



Se evidencia el avance de las actividades de pañete en la batería de baños.



Se evidencia que se da inicio a la actividad de fondeo del bloque Café, como etapa previa a la aplicación de la pintura final u oficial.



Se evidencia que se da inicio a la actividad de fondeo del bloque Café, como etapa previa a la aplicación de la pintura final u oficial.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA


CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

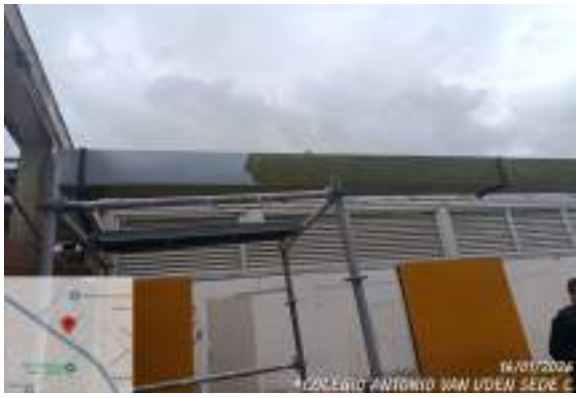

Se evidencia la instalación de la canal galvanizada en el área de las aulas amarillas.



Se evidencia la llegada de material correspondiente al cambio de cubierta.



Se evidencia el avance de las actividades de pañete en la batería de baños.



Se evidencia el retiro por parte de la entidad reguladora.



Se avanza en la instalación de perfilería galvanizada en la cubierta de la bateria de baños.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza la finalización de las actividades en las aulas infantiles correspondientes a la instalación del piso y el guardaescoba en vinisol.



Se realiza la finalización de las actividades en las aulas infantiles correspondientes a la instalación del piso y el guardaescoba en vinisol.



Se realiza la finalización de las actividades en las aulas infantiles correspondientes a la instalación del piso y el guardaescoba en vinisol.



Se evidencia la finalización de la estructura interna de las aulas múltiples, correspondiente al cambio de cubierta, incluyendo la instalación y la aplicación de pintura de los elementos estructurales.



Se evidencia la finalización de la estructura interna de las aulas múltiples, correspondiente al cambio de cubierta, incluyendo la instalación y la aplicación de pintura de los elementos estructurales.



Se evidencia el inicio de las actividades correspondientes al pañete de la batería de baños de primaria.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 | **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el inicio de las actividades de mampostería de fachada correspondientes a la batería de baños de primaria.



Se evidencia el inicio de las actividades relacionadas con la instalación de pisos en la batería de baños de bachillerato (hombres).



Se evidencia la instalación del enchape en los muros de la batería de baños de bachillerato (mujeres),



Se evidencia que se realiza la aplicación del sello de juntas (boquilla) posterior a la finalización de la instalación del piso en la batería de baños de bachillerato (hombres).



Se evidencia el inicio de las actividades de mampostería de fachada correspondientes a la batería de baños de primaria.



Se evidencia la instalación del enchape en los muros de la batería de baños de bachillerato (mujeres),

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia, en relación con la instalación de la perfilería de la cubierta en las aulas múltiples, la presencia de detalles exteriores que afectan la fachada.



Se evidencia la instalación del enchape en los muros de la batería de baños de bachillerato (mujeres).



Se evidencian las actividades de mampostería de fachada correspondientes a la batería de baños de primaria.



Se evidencia la instalación del enchape en los muros de la batería de baños de bachillerato (Hombres).



Se evidencia el inicio de las actividades relacionadas con la instalación de pisos en la batería de baños de bachillerato (Mujeres).



Se evidencia el avance de las actividades de pañete en la batería de baños de primaria (niñas).

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia la llegada de la canal correspondiente a las aulas múltiples, destinada a la continuidad de las actividades del sistema de cubierta y evacuación de aguas lluvias.



Se evidencia la ejecución de la actividad de pintura de la canal correspondiente a las aulas múltiples.



Se evidencia que se está realizando la fundida de las tapas de las cajas de inspección de la batería de baños de primaria (niños).

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia la aplicación de pintura en las siete (07) puertas y sus marcos correspondientes al primer nivel,



Se evidencia la aplicación de pintura en las siete (07) puertas y sus marcos correspondientes al primer nivel,



Se realiza la reinstalación de las hojas de las puertas previamente pintadas, correspondientes al primer nivel.



Se evidencia la instalación de los marcos de las canchas; continúa pendiente la instalación de los tableros correspondientes.



Se evidencia el remate de los filos externos correspondientes al cárcamo del lado derecho, como parte de las actividades de terminación de este elemento.



Se evidencia que se realizó la instalación de las canchas del escenario deportivo y se fundieron los dados de soporte correspondientes, garantizando la estabilidad de las estructuras instaladas.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realizó el correcto embalaje y la adecuada disposición de los materiales peligrosos, específicamente la teja de asbesto.



Se evidencia que el cerramiento presenta afectaciones en relación con su estabilidad.



Se evidencia que se realizó el correcto embalaje y la adecuada disposición de los materiales peligrosos, específicamente la teja de asbesto.



Se evidencia que se está realizando, en las áreas del laboratorio y del aula N.° 3, la costura de las fisuras que se han pronunciado.



Se evidencia que en el área del cuarto independiente se realizó el levantamiento de las cuchillas en mampostería, dejando el espacio previsto para la ejecución de las columnas de amarre.



Se evidencia que se realiza la reparación del cerramiento en lámina de teja de zinc con polisombra, con el fin de restablecer su estabilidad y funcionalidad.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que al interior de las aulas se está realizando la aplicación de la pintura de fondeo, como actividad previa a la aplicación del acabado final.



Se observa la llegada de material correspondiente a la cubierta.



Se observa que se realiza el armado correspondiente para la posterior fundida de la viga corona del aula independiente.



Se observa que se realizó la fundida y el posterior desencofrado de la viga corona del aula independiente.



Se evidencia que al interior de las aulas se está realizando la aplicación de la pintura de fondeo, como actividad previa a la aplicación del acabado final.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que no se ha realizado el retiro de elementos correspondientes a canaletas, rejillas, ventanería antigua, entre otros.



Se evidencia la presencia de personal utilizando EPP; sin embargo, dicho personal no cuenta con la autorización correspondiente por parte de la interventoría.



Se evidencia la ejecución de actividades de pañete y afinado, realizadas por personal que no cuenta con la autorización correspondiente por parte de la interventoría.



Se evidencia la ejecución de actividades de pañete y afinado, realizadas por personal que no cuenta con la autorización correspondiente por parte de la interventoría.



Se evidencia la ejecución de actividades desencofrado de la viga corona, realizadas por personal que no cuenta con la autorización correspondiente por parte de la interventoría.



Se evidencia la ejecución de actividades de pañete y afinado, realizadas por personal que no cuenta con la autorización correspondiente por parte de la interventoría.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia la presencia de personal en obra no autorizado por la interventoría y que no cuenta con los elementos de protección personal (EPP) suministrados por el contratista,

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se da inicio a las actividades correspondientes a la ejecución del sobrepiso.



Se evidencia que se realizó la reinstalación de la cubierta tipo sándwich, posterior a la reinstalación de los perfiles galvanizados.



Se evidencia que se está realizando la reparación del bordillo exterior de los cuatro (04) módulos correspondientes a las oficinas administrativas.



Se finalizan las actividades correspondientes al sobrepiso de los cuatro (04) módulos de las oficinas administrativas.



Se evidencia que se realizó la reinstalación de la cubierta tipo sándwich, posterior a la reinstalación de los perfiles galvanizados.



Se evidencia que se fundieron las rampas correspondientes a la movilización de los carros de basura internos, cumpliendo con la especificación de un ancho mínimo de 1,20 m.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 15 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 15 (Consecutivo) **DEL** 12/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 18/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 107 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se fundieron las rampas correspondientes a la movilización de los carros de basura internos, cumpliendo con la especificación de un ancho mínimo de 1,20 m.



Se evidencia que se está realizando la aplicación de la primera capa de estuco en el área de los cuatro (04) módulos correspondientes a las oficinas administrativas, como parte del proceso de acabados de los muros.



Se evidencia que se está realizando la instalación de la primera cara de los muros en sistema liviano (Superboard), respetando las dilataciones establecidas de acuerdo con lo definido en el Comité de Obra N.° 7.



Se evidencia que se está realizando la instalación de la primera cara de los muros en sistema liviano (Superboard), respetando las dilataciones establecidas de acuerdo con lo definido en el Comité de Obra N.° 7.



Se evidencia que se está realizando la instalación de la primera cara de los muros en sistema liviano (Superboard), respetando las dilataciones establecidas de acuerdo con lo definido en el Comité de Obra N.° 7.



Se evidencia que se está realizando la modulación y se da inicio a la instalación del enchape en los cuatro (04) módulos correspondientes a las oficinas administrativas, como parte de las actividades de terminación de estos espacios.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8155097

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa)

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato)

LOTE COP: 16

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA


Contratista:	CONSORCIO EL MILAGROSO 2025	**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S
RL del consorcio	RAFAEL MOGOLLÓN RODRÍGUEZ	**RL de Interventoría**	SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155097	**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931
Objeto	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 16"	**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6
Valor Inicial :	$ 2.455.237.837,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00
AIU	33,88% $ 831.834.579,18	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00
COSTO DIRECTO	$ 1.623.403.257,82	**Valor Total del Contrato:**	$ 935.305.594,00
OFERTADO	$ 2.333.628.557,00		
EMERGENCIAS	$ 100.000.000,00		
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$ 2.433.628.557,00		
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$ 21.609.280,00		
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$ 121.609.280,00		
Valor adicional No. 1:	$ 380.000.000,00		
Valor inicial No. 1 emergencias:	$ 200.000.000,00		
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$ 180.000.000,00		
VALOR TOTAL INICIAL MAS EMERGENCIA	$ 2.835.237.837,00		
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$ 321.609.280,00		
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$ 2.513.628.557,00		
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES	**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES
Fecha de Iniciación:	03/10/2025	**Fecha de Iniciación:**	03/10/2025
Fecha de Vencimiento:	02/05/2026	**Fecha de Vencimiento:**	02/05/2026

AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		ACUMULADO
Obra programada (%)	4,51%	33,72%	Obra Física Ejecutada (%)	15,14%	70,70%
Valor de la Obra programada:	$ 110.801.376,10	$ 827.976.348,29	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 371.687.933,70	$ 1.735.818.075,93

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	29,21%	55,56%	36,98%
Durante el periodo	4,51%	15,14%	
Acumulado actual	33,72%	70,70%	

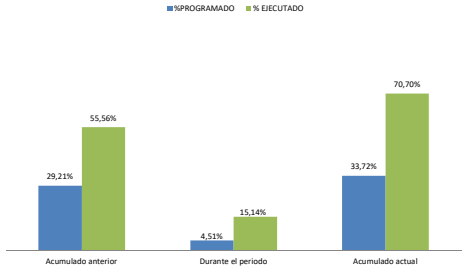

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	%PROGRAMADO ACUMULADO	%EJECUTADO ACUMULADO	%DIFERENCIA ACUMULADO
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	6,45%	0,69%	-5,76%	36,46%	61,20%	24,74%
920	FONTIBON	ANTONIO VAN UDEN - SEDE C	1,97%	65,74%	63,77%	21,29%	111,94%	90,65%
901	FONTIBON	INSTITUTO TECNICO INTERNACIONAL . SEDE A	4,09%	27,60%	23,51%	41,32%	119,53%	78,21%
1408	LOS MARTIRES	REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA - SEDE B	3,83%	5,45%	1,62%	25,11%	68,38%	43,27%
1632	PUENTE ARANDA	MARCO ANTONIO CARREÑO SILVA - SEDE B	2,84%	3,91%	1,07%	22,89%	53,59%	30,70%
1614	PUENTE ARANDA	JULIO ARMERO GARAVITO - SEDE B	0,19%	1,06%	0,87%	42,04%	29,68%	-12,36%
1603	PUENTE ARANDA	CULTURA POPULAR - SEDE C	12,22%	1,52%	-10,70%	77,62%	48,95%	-28,67%
			4,51%	15,14%	10,63%	38,10%	70,47%	32,36%

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1616	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 8.789.206,00	$ 8.789.206,00	$ -
1609	PUENTE ARANDA	SILVERIA ESPINOSA DE RENDON - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 17.578.413,00	$ 17.578.413,00	$ -
1612	PUENTE ARANDA	EL JAZMIN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
914	FONTIBON	RODRIGO ARENAS BETANCOURT - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
915	FONTIBON	INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A	0,00%	100,00%	100,00%	$ 1.953.157,00	$ 1.953.157,00	$ -
929	FONTIBON	MARIA JOSEFA CANELONES - SEDE A	0,00%	0,00%	0,00%	$ 10.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
909	FONTIBON	VILLEMAR EL CARMEN - SEDE B	0,00%	100,00%	100,00%	$ 35.000.000,00	$ -	$ 35.000.000,00
					87,50%	$ 79.180.247,00	$ 321.609.280,00	$ (242.429.033,00)

AVANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.455.237.837,34
VALOR PARCIAL 1	$ 88.202.201,00	
VALOR PARCIAL 2		
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 88.202.201,00	
SUMAS IGUALES	$ 2.367.035.636,34	$ 2.367.035.636,34


INDICADOR FINANCIERO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
	$ 88.202.201,00	$ 88.202.201,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% DE AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
	33,72%	70,70%	36,98%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	RETRASO
	114	42

CURVA S

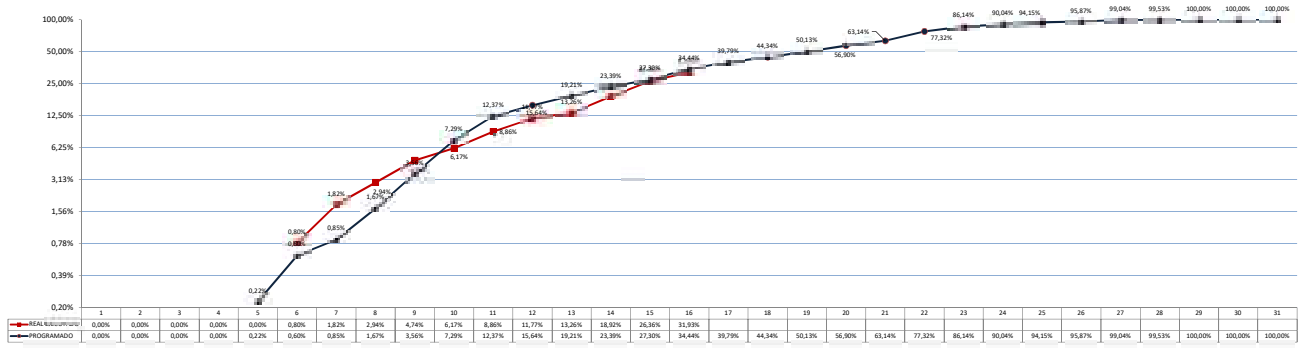

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REAL ACUMULADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,80%	1,82%	2,94%	4,74%	6,17%	8,86%	11,77%	13,26%	18,92%	26,36%	31,93%															
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,22%	0,60%	0,85%	1,67%	3,56%	7,29%	12,37%	15,64%	19,21%	23,39%	27,30%	34,44%	39,79%	44,34%	50,13%	56,90%	63,14%	77,32%	86,14%	90,04%	94,15%	95,87%	99,04%	99,53%	100,00%	100,00%	100,00%

GENERALIDADES EN RELACION A LOS 07 FRENTES DE TRABAJO

1.Comite de obra N°8: Se lleva a cabo el comité de obra N.8 solicitado por la supervisión; este cuenta con la participación del Supervisor del contrato, la Interventoría, el contratista de obra, los gestores territoriales de fontibon y el director local de fontibon. (se levanta Acta de reunión).

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 114 días

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se evidencia que las actividades correspondientes a las dos áreas intervenidas han presentado los siguientes avances:
Sala CRIL: En esta área se desarrollaron actividades asociadas a la cubierta, especificamente la instalación y pintura de la perfilería galvanizada, necesaria para el posterior montaje de la cubierta. Así mismo, se ejecutó la instalación de la viga canal, la cual será conectada a las bajantes de aguas lluvias existentes, con el fin de garantizar el adecuado manejo y evacuación de las aguas.
La Casona: En el punto correspondiente a demolición y excavación, se dio inicio al armado de la primera zapata, requerida para el refuerzo estructural contemplado dentro del alcance de la intervención.

2. Seguridad Social y SST: Durante las revisiones realizadas se constató que, en el aula bilingüe se verificaron labores de reforzamiento de estructura para la futura instalación de la cubierta, así como el relleno de juntas de baldosas en la zona de guarda escobas y el traslado de material cerámico al interior del edificio, manteniendo el área con adecuada organización y almacenamiento. Con respecto a las actividades SST se observó que los cerramientos perimetrales de la obra se encuentran en buen estado, debidamente instalados y correctamente señalizados, lo cual garantiza una adecuada delimitación del área intervenida y contribuye a la protección del personal y la comunidad educativa.
Adicionalmente, se evidenció el uso adecuado de EPP por parte del personal operativo durante la ejecución de las labores de construcción y las actividades de manejo de residuos, sin que se presentaran incidentes ni situaciones asociadas a condiciones inseguras durante el periodo evaluado.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 0,69% en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 6,45% para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 5,76%, donde se evidencia atrasos en las actividades de cubierta de la sala CRIL.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades situadas en la casona no han presentado desarrollo en referencia al proceso estructural.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- **FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**
- **SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH**

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se ha presentado un avance en referencia al desarrollo de actividades del los muros de la sala CRIL.



5. Generales: Durante el Comité de Obra N.° 8, el Director Local de Fontibón solicitó información relacionada con las aulas, teniendo en cuenta que estas son puntos de votación, razón por la cual se indicó que deben estar entregadas a más tardar el 08 de marzo de 2026.
Así mismo, durante el recorrido realizado el día viernes por parte de los gestores territoriales, el supervisor designado por la Secretaría de Educación y la Dirección de Interventoría, en compañía del rector de la institución, se solicitó priorizar la intervención del aula CRIL, estableciendo una fecha probable de entrega para el 20 de febrero de 2026.
En el área de La Casona, la Dirección de Interventoría informó que la viga canal instalada no cumple con las condiciones técnicas requeridas, presentando deficiencias en sus anclajes, motivo por el cual se solicitó al contratista corregir dichos detalles de manera prioritaria.
Adicionalmente, y por solicitud de la Dirección de Obra, se aclaró que las intervenciones en el área de La Casona corresponden a obras de mitigación y no de mejoramiento, razón por la cual se consultó sobre las aulas que podrían quedar disponibles para uso. Al respecto, se informó que ninguna de las aulas puede ser habilitada en su estado actual. No obstante, se identificó que una de las aulas cuenta con una puerta en el costado intervenido; teniendo en cuenta que esta puede quedar en uso, el supervisor autorizó la modificación del acceso en el costado opuesto, mediante la instalación de una nueva puerta, con el fin de dejar el aula operativa. Esta actividad fue autorizada, aclarando que su ejecución se realizará al finalizar las obras actualmente en curso.

6. Ambiental: Se realizó recorrido en el frente, los sumideros cercanos cuentan con su debida protección, se acopiaron los RCDs generados por las demoliciones, tener en cuenta que está cerca de las zonas verdes y a unos individuos arbóreos y posteriormente se realizó la disposición adecuada del material respecto a las especificaciones técnicas y ambientales al igual que garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: A la fecha, se evidencia que la ejecución de las actividades en la institución se desarrolla de la siguiente manera:
Batería de baños: Se observa la ejecución de actividades correspondientes a la instalación de la perfilería galvanizada y la aplicación de pintura en color blanco, como etapa previa para la instalación de la nueva cubierta. Adicionalmente, se realizó la demolición de un muro, de conformidad con el nuevo planteamiento aprobado para la redistribución de la batería de baños de hombres.
Biblioteca: Teniendo en cuenta la priorización de otros frentes de trabajo orientados a la entrega de áreas durante el presente período, no se ejecutaron actividades en este frente.
Bloque amarillo (aulas): Considerando que este bloque se encontraba programado para entrega en la semana del 26 de enero, con motivo del inicio de actividades escolares, se realizaron las siguientes labores:
• Instalación de las redes eléctricas correspondientes.
• Instalación de puertas y ventanería, conforme a los diseños y colores aprobados en comité de obra.
• Finalización de la pintura exterior de la perfilería galvanizada e instalación de la cubierta tipo sándwich.
• En el área de fachada, se culminó el cambio de láminas en superboard, incluyendo remates y aplicación de pintura conforme al color autorizado.
• Al interior, se finalizó la pintura general de las aulas.
Bloque café (aulas): En el área exterior se finalizó la pintura de fondeo y la pintura final de las cuatro fachadas. Así mismo, se realizó la instalación de la ventanería, quedando pendiente una de las aulas. De manera complementaria, se ejecutó la pintura interior de los muros, con el fin de dejar las aulas en condiciones de entrega y el jardín vertical fue instalado por parte de la institución.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se constató el despeje del área donde previamente se encontraban almacenadas tejas y otros materiales, los cuales fueron reorganizados y trasladados a la biblioteca, permaneciendo únicamente en el sitio las tejas destinadas al cerramiento ubicado en el costado de la cancha, garantizando así el orden del área y la reducción de riesgos asociados al almacenamiento inadecuado de materiales.
Así mismo, se verificó la culminación del cerramiento con polisombra para los 8 baños portátiles, así como el avance en las adecuaciones asociadas a su correcta instalación, contribuyendo a la delimitación de las zonas de uso y a la seguridad de los usuarios.
Adicionalmente, se evidenció la presencia de personal en los diferentes frentes de obra y la ejecución de actividades de demolición del muro interno de la infraestructura del baño, encontrándose estas labores a la espera del traslado de los puntos de conexión de agua y desagüe. De igual forma, se observaron actividades relacionadas con el manejo de materiales para cerramientos, las cuales están catalogadas como tareas de riesgo que requieren el uso EPP para su correcta y segura ejecución.
Finalmente, se realizó la entrega de EPP por parte de la inspectora SST al personal que se encontraba pendiente de dotación el día 23 de enero, en horas de la mañana, dejando constancia de la respectiva entrega.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 65,74% en la ejecución de las actividades, frente a un valor esperado del 1,97 % para el período evaluado. Esto refleja un desarrollo superior de un 63,77 % , donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes a las aulas infatiles y el bloque alianza.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades correspondientes a la cubierta presentan un atraso acumulado y el desarrollo de trasciego de materiales al area de la bateria de baños.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- **TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA.**
- **FLANCHE LAMINA GALVANIZADA.**

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Las actividades que presentan mayor avance corresponden a las ejecutadas en el desarrollo del cierre y finalizacion de el bloque alianza y bloque infantil.



5. Generales: En general, y como parte del proceso de entrega, se realizó aseo general de las aulas y del mobiliario. Se identificaron algunos detalles menores, los cuales serán atendidos y finalizados durante la semana posterior.
Durante el Comité de Obra N.° 8, se informó al Director Local de Fontibón que las aulas de la institución serían entregadas el lunes 26 de enero. De acuerdo con lo anterior, se indicó que la única área pendiente para el proceso de votaciones programado para el 08 de marzo de 2026 sería la biblioteca, la cual será entregada de manera completa y a cabalidad.
Adicionalmente, se realizó la recolección de residuos de chatarra por parte de una entidad autorizada y se llevó a cabo una jornada general de orden y aseo en toda la institución, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el regreso a clases.
En relación con los cerramientos, se efectuó la movilización y organización de los existentes y se ejecutó el cerramiento requerido para la instalación de los baños portátiles. los cuales ingresaron a la obra el dia dominoo.

6. Ambiental: Se verifico el cerramiento en buen estado, se reporta el retiro de chatarra, se evidencian RCDs generados por las demoliciones acopiados y debidamente en lonas, se recomienda realizar la disposición adecuadamente el material respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Batería de baños de bachillerato: Se evidencia que, en ambas áreas (hombres y mujeres), se realizó en su totalidad la instalación del enchape de muros y pisos. Posteriormente, se llevó a cabo una jornada de orden y aseo, con el fin de dar inicio a la ejecución de la media caña en gravilla mona, actividad que se desarrolló en el área de mujeres. Adicionalmente, se dio inicio a la instalación de la tubería MT correspondiente.
Batería de baños de primaria: En el área de niñas, se observa el avance en la ejecución y fundida de la placa de contrapiso, así como el desarrollo de las actividades de pañete de muros. En el área de niños, se finalizó el muro de fachada y la fundida de las tapas de las cajas de inspección.
Aula múltiple: Se realizó el levantamiento del muro del vano de la puerta existente en mampostería y se finalizaron los remates de la perfilería galvanizada, permitiendo continuar con la instalación de la cubierta, la cual fue ejecutada en su totalidad durante el periodo.
Aulas infantiles: Se realizó la finalización de las aulas, incluyendo jornada de aseo general, posterior a lo cual se efectuó la entrega formal mediante acta a la rectora de la institución, en compañía del supervisor y la dirección de obra. Por parte de la institución, se realizó el retiro de los muebles de carpintería en madera.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se realizaron labores de enchape en los baños de bachillerato y se ha instalado media caña de granito en el baño de mujeres. Se verificó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del personal presente en obra, constatando la aplicación de los procedimientos establecidos. Así mismo, se realizó la supervisión del uso adecuado y permanente de los EPP durante la ejecución de las diferentes actividades, asegurando su correcta utilización conforme a los riesgos identificados y a los lineamientos del SG-SST.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 27,60 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 4,09 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 23,51 %, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes a la instalacion de la cubierta de las aulas multiples.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades correspondientes a la cubierta presentan un atraso acumulado, el cual ha venido incrementándose progresivamente, generando un retraso significativo en el cumplimiento de la programación establecida.
Los ítems no desarrollados a la fecha son los siguientes:
- **TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA.**
- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 3/4" INSTALADO EMBEBIDO EN MURO.**
- **ESTUCO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).**

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se han desarrollado actividades correspondientes a la media caña de la bateria de baños de bachillerato, al igual que la instalacion de la cubierta y la canal de esta.



5. Generales: Adicionalmente, se efectuó la revisión y adecuación de los cerramientos existentes, así como la ejecución del cerramiento requerido para la instalación de las baterías de baños portátiles, implementadas como plan de contingencia. Dichas unidades ingresaron a la institución el día sábado.
Finalmente, por parte del Director Local, se solicitó que las aulas se encuentren habilitadas para el día 08 de marzo de 2026, con el fin de garantizar el desarrollo del proceso electoral. En atención a lo anterior, se solicitó dar celeridad a las actividades del aula múltiple, frente a lo cual el contratista confirmó que dicho espacio será entregado oportunamente.

6. Ambiental: Durante el periodo reportado se realizaron labores de enchape en los baños de bachillerato y se ha instalado media caña de granito en el baño de mujeres. Se verificó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del personal presente en obra, constatando la aplicación de los procedimientos establecidos. Así mismo, se realizó la supervisión del uso adecuado y permanente de los EPP durante la ejecución de las diferentes actividades, asegurando su correcta utilización conforme a los riesgos identificados y a los lineamientos del SG-SST.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Puertas de aulas: Se continuó con las actividades de pintura de las puertas correspondientes al segundo nivel. Durante la verificación en obra, se evidenció un incremento en la cantidad total de puertas intervenidas, pasando de 41 a 48 unidades, situación que deberá ser tenida en cuenta para los ajustes administrativos y contractuales correspondientes.
Escenario deportivo: Se realizó en su totalidad la instalación de los tableros de las canchas. Adicionalmente, se avanzó en la pintura de la cancha, no obstante, se identificó la necesidad de realizar retoques en los dados de soporte y en el remate del cárcamo, el cual, si bien fue ejecutado, presenta deficiencias en el recorte que deberán ser corregidas. Así mismo, se evidenció la presencia de suciedad en algunas áreas, pese a que previamente se había solicitado la ejecución de una jornada de orden y aseo, la cual no se ha llevado a cabo en su totalidad.
Cubierta: Durante la revisión general de la institución, se observó la presencia de humedad en las áreas donde se realizó el cambio del manto de la cubierta. Cabe resaltar que esta situación había sido advertida previamente por la directora de interventoría, quien indicó que la instalación parcial del manto podría generar este tipo de afectaciones.
Puntos fijos: Se ejecutaron actividades de resane y detalles en fachadas, debido a las afectaciones ocasionadas por la humedad. Una vez finalizadas estas labores, se evidenció el avance en la aplicación de la pintura exterior en las áreas intervenidas.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se dio continuidad a las actividades de pintura en los puntos fijos y en las puertas de la infraestructura intervenida, así como la culminación de los trabajos de impermeabilización del techo, garantizando la protección de la estructura frente a filtraciones y agentes externos. Adicionalmente, se realizó la limpieza de la canal de desagüe, contribuyendo al correcto funcionamiento del sistema de evacuación de aguas lluvias.
Así mismo, se ejecutaron trabajos de soldadura y pintura, los cuales fueron desarrollados bajo las medidas de seguridad correspondientes, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de labores. En materia de SST, se realizó la entrega de EPP al personal operativo por parte de la inspectora SST, asegurando que los trabajadores cuenten con la dotación adecuada para el desarrollo seguro de sus funciones y el control de los riesgos asociados a las actividades ejecutadas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 5,45 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 3,83 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 1,62 %, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes al desarrollo de la reparacion y la pintura del punto fijo.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se han desarrollado actividades corresondientes al desarrollo de pintura y resane de puntos fios en relacion a la pintura exterior.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155097**

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

[illegible] ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE LA SEMANA: Se realizó [illegible] actividades de replanteo, instalación de perfilería y retiro de piezas de [illegible] de pintura.



5. Generales: Se recuerda al contratista que, a la fecha, las áreas intervenidas no han sido recibidas formalmente, y que únicamente se han realizado revisiones parciales, por lo cual cualquier ajuste o corrección requerida deberá ser atendida antes de su entrega oficial.
Teniendo en cuenta la próxima entrega del escenario deportivo, se solicitó durante el comité de obra el retiro del cerramiento provisional; sin embargo, esta actividad no fue finalizada debido a que, en la última revisión, el broche se encontraba instalado, situación que deberá ser corregida.
Finalmente, se deja constancia de que no se evidenciaron avances en relación con la limpieza de las mallas de la cubierta, ni en la atención a la humedad presentada en el área de los baños, actividades que continúan pendientes y requieren pronta intervención.

6. Ambiental: Se verifico el cerramiento en buen estado, se verifica que la mezcla de concreto se realizó en batea metálica, se reporta la disposición de los RCDs generados por las demoliciones, sin afectación de las zonas verdes, ni sumideros, pero se recomienda solo mantener un sitio de acopio de materiales respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Bloque principal: Se evidencia que, a la fecha, no se han ejecutado las reparaciones de las fisuras identificadas en los muros del aula N.° 3 y del laboratorio. No obstante, se observa el avance en las actividades de remate de filos y de las áreas superiores de los muros. De manera paralela, se dio inicio a la instalación de perfilería galvanizada y al refuerzo de las cerchas, así como a la aplicación de pintura, la cual fue ejecutada en su totalidad en el costado derecho de las aulas.
En el área del hall, se evidenció que no se ha realizado el retiro del enchape existente. Frente a la consulta realizada por el contratista respecto a si debía retirarse en su totalidad, se informó que dicha actividad se encuentra autorizada por el supervisor del contrato, por lo cual deberá ejecutarse conforme a lo indicado.
Adicionalmente, se evidenció el retiro de las puertas de acceso con sus respectivos marcos. El color y acabado final de estos elementos deberán ser definidos en el Comité de Obra N.° 9.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se continúa con los trabajos de soldadura de las vigas para la posterior instalación de la cubierta, así como con el alistamiento de los muros, con respecto a las actividades SST se evidenció la reestructuración del cerramiento perimetral de la obra, con el fin de optimizar y controlar de manera segura el ingreso y la salida de materiales, garantizando el orden en las áreas de circulación y reduciendo posibles interferencias con la comunidad educativa.
Adicionalmente, se realizó la instalación de láminas de madera en el cerramiento exterior como medida preventiva y de control, con el objetivo de eliminar los filos expuestos de las láminas metálicas y mitigar el riesgo de cortes o lesiones, especialmente para los estudiantes, personal educativo y demás que circulan en el área de influencia del proyecto.
Así mismo. durante la visita se evidenció la eiecución de trabaios en altura. contando con la supervisión permanente de la insnectora SST. quien verificó el cumplimiento de los permisos de trabaio. el uso adecuado de los elementos de protección personal v la aplicación de las medidas de control necesarias para la prevención de incidentes y accidentes laborales.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 3,91 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 2,84 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 1,07 %, donde se evidencia que se han realizado actividades no programadas correspondientes a actividades derivadas de cubierta en referencia a la viga cinta y estructura de esta, igualmente en la reparacion de muros para el blanqueo de este.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se han desarrollado actividades para realizar la instalacion de la perfileria correspondiente al montaje de la nueva cubierta, al igual que el desarrollo de la viga cinta para la instalacion de esta. En el area de los muros el avance de los resanes.



5. Generales: Durante el recorrido, el supervisor solicitó dar celeridad a las actividades en esta institución, teniendo en cuenta que se está interviniendo un bloque completo. Al respecto, el residente de obra informó que, durante la semana siguiente, se realizará la instalación de la cubierta, lo cual permitirá dar inicio a la instalación de los pisos en las aulas intervenidas.
Finalmente, se deja constancia de que, a la fecha, el contratista no ha confirmado el tipo de piso que será instalado en el aula de sistemas. Cabe recordar que, por parte del supervisor, se indicó que, en caso de ser necesario, se autoriza la instalación de porcelanato, con el fin de mejorar las condiciones funcionales y de durabilidad de dicho espacio.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se realizó el cerramiento adecuado en el frente, se acopiaron los materiales de construcción y los RCD, pero se evidencia grandes cantidades por lo que se recomienda disponer adecuadamente todos los residuos y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente, al igual se recomendo al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Oficinas administrativas: Se evidenció el desarrollo de dos actividades principales. En primer lugar, se continuó con la ejecución de los trabajos de pañete, los cuales presentan un avance significativo y se espera su próxima finalización. En segundo lugar, se avanzó en la ejecución de la viga corona, incluyendo las actividades de armado del refuerzo, instalación de formaleta, fundida y desencofrado, estimándose la finalización de este proceso durante la semana siguiente.
2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades las cuchillas perimetrales de la institución correspondientes al segundo piso, incluyendo la aplicación de su respectivo pañete. Con respecto a las actividades de SST, se informa que el personal presente en obra realizó su ingreso una vez el subcontratista remitió la totalidad de la documentación requerida, la cual fue revisada y validada de manera satisfactoria tanto por la interventoría.
Así mismo, el miércoles 21 de enero de 2026 se llevó a cabo la entrega formal EPP al personal autorizado, incluyendo uniforme de dotación, gafas de seguridad, casco, botas de seguridad y tapabocas, dejando constancia de su entrega y socializando la obligatoriedad de su uso permanente durante la ejecución de las actividades.
Por otra parte, se evidenció la reestructuración del cerramiento de la obra con el objetivo de instalar una puerta rígida que permita un control más seguro del acceso, así como la conformación de un nuevo cerramiento destinado a disponer de un espacio adecuado y organizado para el almacenamiento y manejo de la cubierta y las canaletas utilizadas en el proyecto, reduciendo riesgos asociados al desorden y a la manipulación de materiales.
Adicionalmente, durante la inspección se observó que las polisombras instaladas en las ventanas exteriores de la institución no se encuentran en condiciones óptimas, por lo cual se realizó el respectivo llamado de atención al contratista, solicitando su reparación o reemplazo oportuno con el fin de mantener las medidas de protección y prevención de riesgos hacia la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 1,06 % en la ejecución de las actividades, frente a un avance esperado del 0,19 % para el periodo evaluado. Esto representa una desviación positiva del 0,87 %, donde se evidencia que se han desarrollado actividades derivadas de la cubierta en referencia a la viga cinta.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Se evidencia que el desarrollo de actividades son derivadas de la cubierta (Viga cinta).



5. Generales: Adicionalmente, se evidenció la restructuración del cerramiento con el fin de permitir el ingreso a clases de la institución. No obstante, se realiza la recomendación de ajustar el sistema de cierre de la puerta, dado que actualmente no cuenta con un broche adecuado que garantice la correcta articulación con el sistema de cerramiento. Así mismo, se efectuó un llamado de atención respecto al orden y aseo al interior del cerramiento, debido a la acumulación considerable de chatarra. Al respecto, el contratista informó que dicha chatarra sería retirada el día viernes, situación que fue verificada y cumplida.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica, se realizó el debido mantenimiento al cerramiento perimetral, se acopiaron los materiales de construcción y los RCD, pero se evidencia grandes cantidades por lo que se recomienda disponer adecuadamente todos los residuos y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO CULTURA POPULAR - SEDE C (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la semana se ejecutaron actividades por frentes de trabajo al interior de la institución educativa, conforme se detalla a continuación:
Cuatro (04) módulos – Oficinas administrativas: Se evidencia la continuidad en la instalación del enchape, dando inicio a las aulas N.° 2 y N.° 3, así como la instalación del guardaescoba en el aula N.° 1. De manera paralela, se continuó con la aplicación del estuco exterior en la totalidad de la culata, y se dio inicio a la aplicación del estuco exterior en la fachada principal.
Shut de basuras: Se observa la continuidad en el levantamiento de muros en sistema liviano; sin embargo, el avance registrado durante el período no es significativo, por lo cual se solicitará al contratista dar celeridad a estas actividades, a fin de evitar afectaciones al cronograma general del proyecto.

2. Seguridad Social y SST: Se realizo recorrido en el frente, se verifica que la mezcla de concreto se realiza en batea metálica, se realizó el debido mantenimiento al cerramiento perimetral, se acopiaron los materiales de construcción y los RCD, pero se evidencia grandes cantidades por lo que se recomienda disponer adecuadamente todos los residuos y garantizar jornadas de orden y aseo periódicamente.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: A la fecha, la institución presenta un avance físico del 1,52 % en la ejecución de las actividades programadas, frente a un valor esperado del 12,22 % para el periodo evaluado. Esto refleja un desarrollo inferior de un 10,70 %, se informa que este bajo porcentaje se debe al retraso que presentamos en ambos frentes (Shut de basuras y modulos) esto se debe a los reprocesos y que no se ha realizo un plan de contingencia para la atencion del retraso presentado. Se informa que a la fecha las actividades de la institucion se debieron haber finalizado.

4.1. Actividades programadas NO ejecutadas: Se evidencia que las actividades que no presentan desarrollo de actividades hacen referencia a un tema electrico y al desarrollo de acabados de pisos y muros, al igual que la instalacion de puertas.
Los items no desarrollados son los siguientes:
- MANTENIMIENTO Y PINTURA DE MARCOS METÁLICOS EN LÁMINA COLDROLLED.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 3/4".
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED DE SOBREPONER 120 X 30CM, 40 W.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO LED 2X18W.
- SUMIISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJA EN GRAVILLA LAVADA MONA ANCHO= 30 CM.
- VINILO TIPO 1 A TRES MANOS. **- PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS.**
- PINTURA EPOXICA A 3 MANOS. INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO.
- PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS.
- PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 Ml).

4.2. Actividades EJECUTADAS a la fecha: Las actividades ejecutadas durante el periodo, pese a no encontrarse programadas y estar programadas en periodos anteriores su desarrollo actual y la revision de cantidades generan una cantidad adicional de estas.



5. Generales: Durante la revisión de los cerramientos existentes, se evidenció que algunos presentan deterioro y requieren reparación. Adicionalmente, por solicitud del rector de la institución, se indicó la necesidad de replantear el cerramiento, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para el inicio de las actividades escolares.
Así mismo, el día domingo el contratista realizó una jornada de orden y aseo, así como el reubicado del cerramiento correspondiente a las oficinas administrativas. No obstante, conforme al planteamiento del supervisor del contrato, se solicitó al contratista finalizar completamente estas labores durante la semana siguiente.
Finalmente, se aclara que durante la presente semana la institución debía registrar la finalización de la programación contractual; en consecuencia, a partir de esta fecha, el proyecto presentará atraso frente al cronograma aprobado, situación que deberá ser atendida mediante la adopción de medidas correctivas por parte del contratista.

6. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, Se evidencia una unidad sanitaria, se evidencia el cerramiento en buen estado, se acopiaron los materiales de construcción en el frente, se recomienda hacer la mezcla de concreto en batea metálica y/o plástico para evitar riesgos en la zona y anteriormente se realizó la disposición adecuadamente del RCD respecto a las especificaciones técnicas y ambientales.

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ING. CRISTIAN BARRERA DONCELL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

	PROGRAMACIÓN				REAL			ACUMULADO			
INFORME	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	% PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	sem 1	03-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
2	sem 2	13-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
3	sem 3	20-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
4	sem 4	27-oct-25	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	0,00%	$ -	0,00%	$0,00
5	sem 5	03-nov-25	$ 4.755.494,21	0,22%	0,00%	$ -	$ 4.755.494,21	0,22%	$ 4.755.494,21	0,00%	$0,00
6	sem 6	10-nov-25	$ 8.125.912,59	0,38%	0,80%	$ 16.977.206,64	$ (8.851.294,05)	0,60%	$ 12.881.406,80	0,80%	$16.977.206,64
7	sem 7	17-nov-25	$ 5.288.020,00	0,25%	1,02%	$ 21.771.422,72	$ (16.483.402,72)	0,85%	$ 18.169.426,80	1,82%	$38.748.629,36
8	sem 8	24-nov-25	$ 17.444.983,27	0,82%	1,13%	$ 23.997.772,21	$ (6.552.788,94)	1,67%	$ 35.614.410,07	2,94%	$62.746.401,57
9	sem 9	01-dic-25	$ 40.343.446,53	1,89%	1,80%	$ 38.340.052,51	$ 2.003.394,02	3,56%	$ 75.957.856,60	4,74%	$101.086.454,08
10	sem 10	08-dic-25	$ 79.444.682,79	3,73%	1,43%	$ 30.382.417,28	$ 49.062.265,51	7,29%	$ 155.402.539,39	6,17%	$131.468.871,36
11	sem 11	15-dic-25	$ 108.209.197,15	5,08%	2,69%	$ 57.402.366,83	$ 50.806.830,32	12,37%	$ 263.611.736,54	8,86%	$188.871.238,19
12	sem 12	22-dic-25	$ 69.900.889,80	3,28%	2,91%	$ 62.085.827,21	$ 7.815.062,59	15,64%	$ 333.512.626,34	11,77%	$250.957.065,40
13	sem 13	29-dic-25	$ 75.956.528,24	3,56%	1,49%	$ 31.686.383,67	$ 44.270.144,57	19,21%	$ 409.469.154,58	13,26%	$282.643.449,07
14	sem 14	05-ene-26	$ 89.212.283,49	4,18%	5,66%	$ 120.616.837,44	$ (31.404.553,95)	23,39%	$ 498.681.438,07	18,92%	$403.260.286,51
15	sem 15	12-ene-26	$ 83.223.770,74	3,90%	7,45%	$ 158.783.369,63	$ (75.559.598,89)	27,30%	$ 581.905.208,81	26,36%	$562.043.656,14
16	sem 16	19-ene-26	$ 152.231.709,97	7,14%	5,56%	$ 118.625.799,96	$ 33.605.910,01	34,44%	$ 734.136.918,78	31,93%	$680.669.456,10
17	sem 17	26-ene-26	$ 114.051.601,68	5,35%	0,00%	$ -	$ 114.051.601,68	39,79%	$ 848.188.520,46		$680.669.456,10
18	sem 18	02-feb-26	$ 97.149.131,29	4,56%	0,00%	$ -	$ 97.149.131,29	44,34%	$ 945.337.651,75		$680.669.456,10
19	sem 19	09-feb-26	$ 123.336.874,83	5,79%	0,00%	$ -	$ 123.336.874,83	50,13%	$ 1.068.674.526,58		$680.669.456,10
20	sem 20	16-feb-26	$ 144.354.651,09	6,77%	0,00%	$ -	$ 144.354.651,09	56,90%	$ 1.213.029.177,67		$680.669.456,10
21	sem 21	23-feb-26	$ 133.044.130,87	6,24%	0,00%	$ -	$ 133.044.130,87	63,14%	$ 1.346.073.308,54		$680.669.456,10
22	sem 22	02-mar-26	$ 302.192.068,33	14,17%	0,00%	$ -	$ 302.192.068,33	77,32%	$ 1.648.265.376,87		$680.669.456,10
23	sem 23	09-mar-26	$ 188.077.906,58	8,82%	0,00%	$ -	$ 188.077.906,58	86,14%	$ 1.836.343.283,45		$680.669.456,10
24	sem 24	16-mar-26	$ 83.278.260,58	3,91%	0,00%	$ -	$ 83.278.260,58	90,04%	$ 1.919.621.544,03		$680.669.456,10
25	sem 25	23-mar-26	$ 87.605.509,23	4,11%	0,00%	$ -	$ 87.605.509,23	94,15%	$ 2.007.227.053,26		$680.669.456,10
26	sem 26	30-mar-26	$ 36.671.729,02	1,72%	0,00%	$ -	$ 36.671.729,02	95,87%	$ 2.043.898.782,28		$680.669.456,10
27	sem 27	06-abr-26	$ 67.465.761,55	3,16%	0,00%	$ -	$ 67.465.761,55	99,04%	$ 2.111.364.543,83		$680.669.456,10
28	sem 28	13-abr-26	$ 10.504.787,87	0,49%	0,00%	$ -	$ 10.504.787,87	99,53%	$ 2.121.869.331,70		$680.669.456,10
29	sem 29	20-abr-26	$ 10.012.682,84	0,47%	0,00%	$ -	$ 10.012.682,84	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$680.669.456,10
30	sem 30	27-abr-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$680.669.456,10
31	sem 31	04-may-26	$ -	0,00%	0,00%	$ -	$ -	100,00%	$ 2.131.882.014,54		$0,00
32	sem 32	11-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
33	sem 33	18-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
34	sem 34	25-may-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
35	sem 35	01-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
36	sem 36	08-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
37	sem 37	15-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
38	sem 38	22-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
39	sem 39	29-jun-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
40	sem 40	06-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
41	sem 41	13-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
42	sem 42	20-jul-26		0,00%	0,00%			100,00%	$ 2.131.882.014,54		
43	sem 43	27-jul-26		0,00%	0,00%			**100,00%**	**$ 2.131.882.014,54**		
			$ 2.131.882.014,54	**100,00%**	**31,93%**						

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 | **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia la llegada de material para dar inicio al armado de la zapata para la intervencion estructural de la casona.



Se evidencia el movimiento del material para la cubierta, teniendo en cuenta el ingreso de los estudiantes.



Se evidencia que se estan realizando actividades de pintura para la canal galvanizada del aula CRIL.



Se evidencia la excavacion para la ejecucion de actividades estructurales.



Se da inicio a la instalacion de la canal galvanizada del aula CRIL.



Se da inicio al armado de la zapata.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia el desarrolllo de las actividades estructurales.



Se esta realizando la instalacion de la perfileria galvanzida y pintando para poder dar incio a la instalacion de la cubierta en el aula CRIL.

x



Se realiza el revoque del guardaescoba en el aula CRIL.



Se evidencia el armado en su totalidad de la zapata, pendiente los amarres.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia la instalacion y pintura de perfileria galvanizada en el area de la bateria de baños.



Se evidencia en el area de las aulas infantiles el cambio de laminas de superboard en el area exterior.



Se evidencia que se finaliza la instalacion de la canal galvanizada en las aulas infantiles.



Se evidencia la instalacion y pintura de la perfileria galvanizada y el refuerzo de la cercha en las aulas infantiles.



Se da inicio a la demolicion del muro de la bateria de baños de niños, de acuerdo a lo anteriormente hablado con el supervisor.



Se continua el proceso de fondeo de la fachada del bloque alianza.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza pintura de los vanos de las puertas de las aulas infantiles.



Se continua el proceso de fondeo de la fachada del bloque alianza.



Se observa que se realizo la instalacion de la cubierta de las aulas infantiles.



Se evidencia que se da inicio a la pintura del bloque de las aulas infantiles, de acuerdo al color autorizado.



Se evidencia que se da inicio a la instalacion de ventanas del bloque alianza.



Se realiza la instalacion de cerramiento para la bateria de baños portatiles, de acuerdo a la contingencia.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se empieza a dar color a las fachadas del bloque alianza, de acuerdo a lo autorizado en comité.



Se empieza a dar color a las fachadas del bloque alianza, de acuerdo a lo autorizado en comité.



Se empieza a dar color a las fachadas del bloque alianza, de acuerdo a lo autorizado en comité, igualmente se puede observar que se realizo el retiro de la cubierta intermedia.



Se evidencia la instalacion de ventanas en el bloque de aulas infantiles.



Se da inicio al proceso de instalacion de apartos electricos de las aulas infantiles.



Se realiza la instalacion del jardin vertical del bloque alianza.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO ANTONIO VAN UDEN - SEDE C (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se da inicio a la instalacion de ventanas del bloque alianza.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que por parte de la institucion se dio incio a la disposición de los muebles de carpinteria de madera.



Se realiza la entrega de las aulas infantiles a la rectora sin pendientes.



Se realiza la entrega de las aulas infantiles a la rectora sin pendientes.



Se realiza la entrega de las aulas infantiles a la rectora sin pendientes.



Se finaliza la pintura de los refuerzos de las cerchas y de la perfileria galvanizada instalada.



Se funde la placa de la bateria de baños de primaria, el area de las niñas.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se continua la actividad del muros en mamposteria de la bateria de baño de primaria, el area de niños.



Se evidencia que se estan realizando las actividades correctivas de las perfileria galvanizada, de acuerdo a lo recomendado por la direccion de interventoria.



Se evidencia el cerramiento de la bateria de baños portatiles se esta ejecutando.



Se evidencia que se esta realizando el levantamiento del muro en el area del vano de la puerta del auditorio.



Se evidencia el avance en el pañete de la bateria de baños de primaria, area de niñas.



Se evidencia que se esta realizando aseo en la bateria de baños de bachilletaro (Mujeres y hombres), teniendo ne cuenta que se finalizo la instalacion del enchape de muros y y piso.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO TECNICO INTERNACIONAL - SEDE A (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se esta realizando aseo en la bateria de baños de bachilletaro (Mujeres y hombres), teniendo ne cuenta que se finalizo la instalacion del enchape de muros y y piso.



Se finalizo la reestrcuturacion del cerramiento de las aulas multiples y se finalizo el cerramiento de las baterias de baños portatiles.



Se evidencia el avance en la bateria de baños de bachillerato en relacion a la media caña en gravilla mona.



Se evidencia que se da inicio a la instalacion de tuberia en MT.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se realizo el levantamiento del cerramiento, a la fecha sigue pendiente realizar el retiro de una seccion (Broche).



Se evidencia que se esta realizando las reparaciones de la pintura en el area del carcamo, se debe mejorar el recorte.




Se observa suciedad en la pintura de la cancha, la cual a la fecha no se encuentra recibida.



Se observa suciedad en la pintura de la cancha, la cual a la fecha no se encuentra recibida.



Se evidencia que las areas donde se encuentran los dados de instalacion de las canchas no se ha realizo el remate de pintura.

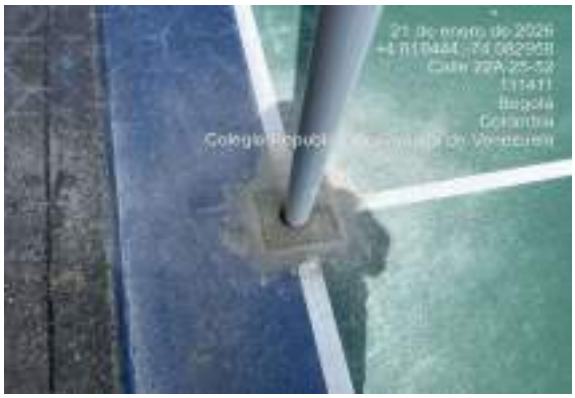

Se evidencia que las areas donde se encuentran los dados de instalacion de las canchas no se ha realizo el remate de pintura.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO REPUBLICA DE VENEZUELA - SEDE B (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se esta realizando la pintura de las puertas de la segunda planta.



Se evidencia que se esta realizando la pintura de las puertas de la segunda planta.



Se evidencia que se estan pintando los puntos fijos en el area exterior, de acuerdo al color autorizado.



Se evidencia que se estan pintando los puntos fijos en el area exterior, de acuerdo al color autorizado.



Se evidencia que se estan pintando los puntos fijos en el area exterior, de acuerdo al color autorizado.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia que se esta dando inicio al pañete de la cuchilla y la viga cinta.



Se realiza llamado de atencion por el material de chatarra presente en obra, de acuerdo al residente se realizara la actividad de recoleccion el viernes.



Se evidencia que se finalizo el pañete interno de las cuchillas y la viga cinta del aula de orientacion.



Se evidencia la instalacion de la perfileria galvanizada en las aulas del bloque principal dl costado derecho en varias aulas de este.



Se evidencia la instalacion de la perfileria galvanizada en las aulas del bloque principal dl costado derecho en varias aulas de este.



Se finalizo el pañete de las cuchillas y de la viga cinta del aula de orientacion.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO MARCO ANTONIO CARREÑO - SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se evidencia la instalacion de la perfileria galvanizada en las aulas del bloque principal dl costado derecho en varias aulas de este.



Se evidencia la instalacion de la perfileria galvanizada en las aulas del bloque principal dl costado derecho en varias aulas de este.



Se evidencia la instalacion de la perfileria galvanizada en las aulas del bloque principal dl costado derecho en varias aulas de este.



Se evidencia la instalacion de la perfileria galvanizada en las aulas del bloque principal dl costado derecho en varias aulas de este.



Se observa que se realizo la reestructuracion del cerramiento contiguo al escenario deportivo.



Se realiza el retiro de las puertas de acceso al bloque principal de ambos lados y la puerta y marco del aula de orientacion.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 16 **LOTE COP No 16**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 16 (Consecutivo) **DEL** 19/1/2026 (dd-mm-aa) **AL** 25/1/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 114 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155097 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 16

COLEGIO JULIO GARAVITO ARMERO - SEDE B (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)



Se realiza llamado de atencion por el material que permanece en la institucion, se informa por parte del residente que sera retirado el dia viernes.




Se evidencia que se continua con las actividades de pañete en muro y cuchillas.



Se evidencia el encofrado de la viga cinta, para proxima fundida.



Se evidencia que se avanzan actividades de aplicación para puntos de nivelacion de pañete.

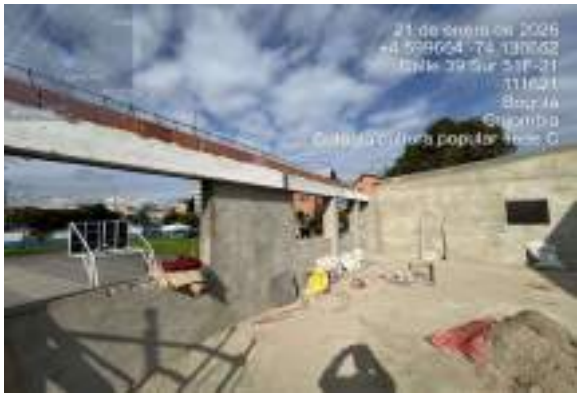

Se evidencia el armado de la viga cinta, para enconfrado y fundida.



Se evidencia que al cerramiento se le realizo las actividades de reparacion y restructuracion.
