| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** | **CÓDIGO: GA-GC-FR- 081** |
| | **FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO** | **VERSIÓN: 001**<br>**FECHA: 12-08-2025** |
| | | **Página: 1 de 3** |

FLORENCIA 27 DE FEBRERO DE 2026

*Doctora*
***ANGIE CAROLINA ROJAS RIVAS***
*Director técnico Contratación*
Gobernación del Caquetá

R/ Magda Sánchez
03/Marzo/2026
5:30 pm.

Asunto : solicitud modificación contractual

Se solicita modificación, prórroga del contrato No. **202500000951** de fecha 12/11/2025, dejando constancia que con la presente modificación no se ve alterada la matriz de riesgo del estudio previo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° DEL CONTRATO** | **202500000951** | **PROCESO DE CONTRATACION N°** | DC-IN-CMA-014-2025 |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INTERVENRORIA LA MONTAÑITA Y SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2025 | **IDENTIFICACION** | 902.005.234-1 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.** | | |
| **VALOR INICIAL** | CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($199.242.833,00) M/CTE incluidos todos los impuestos y descuentos de ley.) | **INVERSIÓN** | X |
| | | **FUNCIONAMIENTO** | |
| | | **N° PROYECTO** | 2025000000180127 |
| | | **RUBRO** | 6.2.3.2.02.02.008.19101-2.2.8.3.00-21-21022102015-210201500-2024006180127 |
| **FECHA DE INICIO** | *04/12/2025* | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 03/03/2026 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | *NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO* | | |
| **TIPO DE SOLICITUD** | *N/A* | | |
| **VALOR DE LA ADICION** | *N/A* | | |
| **VALOR Y FECHA DEL CDP** | *N/A* | | |
| **NUEVO VALOR DEL CONTRATO** | *N/A* | | |

| | |
|---|---|
| **TIEMPO A PRORROGAR** | *2 MESES* |
| **NUEVA FECHA TERMINACION** | *04/05/2026* |

| **DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES**<br>*Si hay lugar a más de una modificación, agregar las casillas que correspondan* | | | |
|---|---|---|---|
| **MODIFICACION N°** | N/A | **FECHA** | N/A |
| **VALOR DE LA ADICION** | N/A | **TIEMPO ADICIONADO** | N/A |
| **NUEVO VALOR** | N/A | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. de CDP** | 2025071374 | **Fecha de expedición** | 22/07/2025 |
| **Valor** | | | ($199.242.833,00) |

## DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Revisados los antecedentes contractuales, el estado actual de ejecución, los soportes allegados por el contratista y el **concepto favorable de viabilidad emitido por la Interventoría**, se evidencia que:

- Las circunstancias expuestas por el contratista corresponden a hechos ajenos a su voluntad, relacionados con limitaciones logísticas derivadas de la salida a vacaciones colectivas de proveedores estratégicos, lluvias intensas en el área de ejecución del proyecto y cronograma de ejecución RETIE.

- Dichas situaciones afectaron de manera objetiva el desarrollo normal del cronograma contractual, sin que se configure incumplimiento imputable al contratista.

- La prórroga solicitada no modifica el objeto ni el valor del contrato, limitándose exclusivamente a la ampliación del plazo para garantizar la correcta y completa ejecución del objeto contractual.

## JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRAMITE CONTRACTUAL

Revisados los antecedentes contractuales, el estado actual de ejecución, los soportes allegados por el contratista y el concepto favorable de viabilidad emitido por la Interventoría, se evidencia que:

- Las circunstancias expuestas por el contratista corresponden a hechos ajenos a su voluntad, relacionados con limitaciones logísticas derivadas de la salida a vacaciones colectivas de proveedores estratégicos y lluvias intensas en el área de ejecución del proyecto.

- Dichas situaciones afectaron de manera objetiva el desarrollo normal del cronograma contractual, sin que se configure incumplimiento imputable al contratista.

- La prórroga solicitada no modifica el objeto ni el valor del contrato, limitándose exclusivamente a la ampliación del plazo para garantizar la correcta y completa ejecución del objeto contractual.

**SUSTENTO LEGAL Y/O SOPORTE JURIDICO QUE SUSTENTA LA MODIFICACION**

**PRORROGA**

De conformidad con los artículos 3, 32 y 40 de **la Ley 80 de 1993**, la actividad contractual del Estado debe orientarse al cumplimiento de los fines estatales, garantizando la continua y eficiente prestación del servicio público. El plazo contractual, en tanto elemento accidental del contrato, **puede ser modificado por acuerdo de las partes,** siempre que ello resulte necesario para asegurar la adecuada ejecución del objeto contractual y la satisfacción del interés general.

En el presente caso, las circunstancias acreditadas y debidamente soportadas:

- Son **imprevisibles y ajenas al contratista**.
- No obedecen a incumplimiento imputable.
- Impactaron de manera objetiva el cronograma inicialmente previsto.

sí mismo, la prórroga solicitada **no altera el objeto ni el valor del contrato**, limitándose exclusivamente a extender el término de ejecución por sesenta (60) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo vigente, con el propósito de permitir la culminación integral, técnica y adecuada de las obligaciones contractuales, lo cual resulta razonable, proporcional y acorde con el interés público comprometido.

**ANEXOS A LA SOLICITUD**

Con la presente solicitud, **CERTIFICAMOS** que se verificó el estado actual del proyecto CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ con BPIN 2025000000180127 y que esta modificación no altera las condiciones iniciales y alcance del mismo (metas, indicadores, productos, localización etc.); igualmente certificamos que se respeta los límites legales de orden temporal, formal y material.

Cordialmente,

| POR LA ENTIDAD | POR LA SUPERVISIÓN |
|---|---|
| NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |

**Transcribió:**
*Luis Antonio Vesga Rueda*
*Contrato prestación de servicios 202600000288*
*Secretaria de Infraestructura*
Gobernación del Caquetá

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ | **GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** | **CÓDIGO: GA-GC-FR- 081** |
| | **FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO** | **VERSIÓN: 001** |
| | | **FECHA: 12-08-2025** |
| | | **Página: 1 de 3** |

FLORENCIA 27 DE FEBRERO DE 2026

R/Magda Sánchez
03/Marzo/2026
5:30 pm.

*Doctora*
***ANGIE CAROLINA ROJAS RIVAS***
*Director técnico Contratación*
Gobernación del Caquetá

Asunto: solicitud modificación contractual

Se solicita modificación, prórroga del contrato No. **202500000890** de fecha 24 de septiembre del 2025, dejando constancia que con la presente modificación no se ve alterada la matriz de riesgo del estudio previo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° DEL CONTRATO** | **202500000890** | **PROCESO DE CONTRATACION N°** | DC-IN-LP-017-2025 |
| **CONTRATISTA** | PERSONA NATURAL | **IDENTIFICACION** | 91.210.294 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ** | | |
| **VALOR INICIAL** | DOS MIL CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS ($ 2.056.568.304,00) M/CTE | **INVERSIÓN** | X |
| | | **FUNCIONAMIENTO** | |
| | | **N° PROYECTO** | 2025000000180127 |
| | | **RUBRO** | 6.2.3.2.02.02.006.04-101-2.2.8.3.00-21-2102-2102015-210201500-2024006180127 |
| **FECHA DE INICIO** | *04/12/2025* | **FECHA DE TERMINACIÓN** | 03/03/2026 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | *CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2025* | | |
| **TIPO DE SOLICITUD** | *N/A* | | |
| **VALOR DE LA ADICION** | *N/A* | | |
| **VALOR Y FECHA DEL CDP** | *N/A* | | |
| **NUEVO VALOR DEL CONTRATO** | *N/A* | | |
| **TIEMPO A PRORROGAR** | *2 MESES* | | |

| | |
|---|---|
| **NUEVA FECHA TERMINACION** | *O4/05/2026* |

| **DATOS DE MODIFICACIONES ANTERIORES**<br>*Si hay lugar a más de una modificación, agregar las casillas que correspondan* | | | |
|---|---|---|---|
| **MODIFICACION N°** | N/A | **FECHA** | N/A |
| **VALOR DE LA ADICION** | N/A | **TIEMPO ADICIONADO** | N/A |
| **NUEVO VALOR** | N/A | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. de CDP** | 2025071376 | **Fecha de expedición** | 22/07/2025 |
| **Valor** | | | ($2.056.568.304,00) |

## DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Revisados los antecedentes contractuales, el estado actual de ejecución, los soportes allegados por el contratista y el **concepto favorable de viabilidad emitido por la Interventoría**, se evidencia que:

- Las circunstancias expuestas por el contratista corresponden a hechos ajenos a su voluntad, relacionados con limitaciones logísticas derivadas de la salida a vacaciones colectivas de proveedores estratégicos, lluvias intensas en el área de ejecución del proyecto y cronograma RETIE.
- Dichas situaciones afectaron de manera objetiva el desarrollo normal del cronograma contractual, sin que se configure incumplimiento imputable al contratista.
- La prórroga solicitada no modifica el objeto ni el valor del contrato, limitándose exclusivamente a la ampliación del plazo para garantizar la correcta y completa ejecución del objeto contractual.

## JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRAMITE CONTRACTUAL

Revisados los antecedentes contractuales, el estado actual de ejecución, los soportes allegados por el contratista y el concepto favorable de viabilidad emitido por la Interventoría, se evidencia que:

- Las circunstancias expuestas por el contratista corresponden a hechos ajenos a su voluntad, relacionados con limitaciones logísticas derivadas de la salida a vacaciones colectivas de proveedores estratégicos, lluvias intensas en el área de ejecución del proyecto y cronograma RETIE.
- Dichas situaciones afectaron de manera objetiva el desarrollo normal del cronograma contractual, sin que se configure incumplimiento imputable al contratista.
- La prórroga solicitada no modifica el objeto ni el valor del contrato, limitándose exclusivamente a la ampliación del plazo para garantizar la correcta y completa ejecución del objeto contractual.

## SUSTENTO LEGAL Y/O SOPORTE JURIDICO QUE SUSTENTA LA MODIFICACION

**PRORROGA**

De conformidad con los artículos 3, 32 y 40 de **la Ley 80 de 1993**, la actividad contractual del Estado debe orientarse al cumplimiento de los fines estatales, garantizando la continua y eficiente prestación del servicio público. El plazo contractual, en tanto elemento accidental del contrato, **puede ser modificado por acuerdo de las partes,** siempre que ello resulte necesario para asegurar la adecuada ejecución del objeto contractual.

En el presente caso, las circunstancias acreditadas:

- Son **imprevisibles y ajenas al contratista**,
- No obedecen a incumplimiento imputable,
- Impactaron de manera objetiva el cronograma inicialmente previsto.

Así mismo, la prórroga solicitada **no altera el objeto ni el valor del contrato**, limitándose exclusivamente a extender el término de ejecución por sesenta (60) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo vigente, con el propósito de permitir la culminación integral, técnica y adecuada de las obligaciones contractuales, lo cual resulta razonable, proporcional y acorde con el interés público comprometido.

## ANEXOS A LA SOLICITUD

Con la presente solicitud, **CERTIFICAMOS** que se verificó el estado actual del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", con BPIN 2025000000180127 y que esta modificación no altera las condiciones iniciales y alcance del mismo (metas, indicadores, productos, localización etc.); igualmente certificamos que se respeta los límites legales de orden temporal, formal y material.

Cordialmente,

| POR LA ENTIDAD | POR LA INTERVENTORÍA |
|---|---|
| **NIDIA CAROLINA TAMAYO BUITRAGO**<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCRTURA | **JOSE MANUEL ARCE FERNÁNDEZ**<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSÉ DEL FRAGUA 2025 |

**transcribió:**
*Luis Antonio Vesga Rueda*
*Contrato prestación de servicios 202500000283*
*Secretaria de Infraestructura*
Gobernación del Caquetá

**CONSORCIO INTERVENTORÍA LA MONTAÑITA Y SAN JOSE DEL FRAGUA 2025**

Florencia, Caquetá, 27 de febrero de 2026

Señores
**GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**
Secretaría de Infraestructura
Ciudad

**Asunto:** Concepto de viabilidad sobre solicitud de prórroga del contrato.

**Referencia:**
Contrato de Obra No. **202500000890**
Proceso: **DC-IN-LP-017-2025**
Contratista: **Hilmon Merchan Suarez**
Contrato de Interventoría No. **202500000951**

Respetados señores:

En cumplimiento de las funciones de Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Jurídica y Ambiental, y una vez analizada la solicitud presentada por el contratista mediante la cual solicita la prórroga del Contrato de Obra No. 202500000890, me permito emitir el siguiente concepto:

1. **Análisis de la solicitud**

- Luego de revisar la comunicación presentada por el contratista y los hechos expuestos, esta Interventoría evidencia que:
- Se presentaron lluvias intensas durante diecisiete (17) días en enero de 2026, según boletines del IDEAM, afectando la ejecución segura de trabajos en altura y movilización de materiales.
- Se presentó un periodo muerto de despacho de materiales por vacaciones colectivas de proveedores (CAMELECO, INGAL DE OCCIDENTE, CABLECOL) entre el 20 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, equivalente a trece (13) días sin traslaparse con el periodo de lluvias.
- Se requiere un plazo de treinta (30) días para la certificación RETIE una vez finalice la obra, según comunicación de la empresa RETIE Y RETILAP SAS, en las condiciones de servicio.
- Los hechos expuestos son externos a la voluntad del contratista y no configuran incumplimiento imputable.

2. **Concepto técnico–administrativo–jurídico**

Esta Interventoría concluye que:

La prórroga solicitada es **PROCEDENTE y VIABLE**, en razón a que:

- Corresponde a circunstancias externas y no atribuibles al contratista.

- Se fundamenta en hechos externos (climáticos, logísticos y normativos) que afectan la continuidad de la ejecución.
- Permite garantizar la adecuada culminación del objeto contractual en condiciones técnicas y de seguridad apropiadas, especialmente en cumplimiento del RETIE
- De conformidad con lo establecido en la cláusula Quinta, el plazo de ejecución del contrato No, 202500000890, se aprueba la prórroga del plazo contractual por el termino de sesenta (60) días calendario.

**3. Recomendación**

En virtud de lo anterior, esta Interventoría recomienda a la Entidad Contratante:

1. Aprobar la prórroga del Contrato de Obra No. 202500000890 por sesenta (60) días calendario, en los términos solicitados por el contratista.
2. Suscribir el acta de prorroga correspondiente.
3. Adelantar los trámites administrativos necesarios para formalizar la medida.

Se aclara que el presente concepto constituye recomendación técnica de la Interventoría, siendo la decisión final competencia exclusiva de la Gobernación del Caquetá.

**1. Solicitud de prórroga contrato de interventoría**

Teniendo en cuenta que el contrato de interventoría es concomitante y depende directamente de la ejecución del contrato de obra, se solicita igualmente la prórroga del contrato de interventoría en los mismos términos y durante el mismo período autorizado para la obra.

Atentamente,

**JOSE MANUEL ARCE FERNÁNDEZ**
**CONSORCIO INTERVENTORIA LA MONTAÑITA Y SAN JOSE DEL FRAGUA.**
Representante Legal
C.C. 18.520.422 de Dosquebradas
M.P. QN205-109608
Tel: 322 555 41 02 – 310 408 25 10
Florencia – Caquetá

Fecha: 27 de febrero del 2026

Ingeniero
JOSE MANUEL ARCE FERNÁNDEZ
Representante legal
Consorcio Interventoría La Montañita y San José del Fragua 2025
Florencia – Caquetá

**Referencia:** Solicitud de prórroga de tiempo del Contrato de Obra Pública No. 202500000890 proceso contractual DC-IN-LP-017-2025

Yo, HILMON MERCHAN SUÁREZ, contratista del contrato que tiene por objeto: "**CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ**", con fecha de inicio 04 de diciembre de 2025 y fecha de terminación inicial 03 de marzo de 2026, me permito solicitar prórroga del plazo contractual con fundamento en las siguientes situaciones técnicas debidamente soportadas:
La presente solicitud obedece a situaciones externas, ajenas a la voluntad del contratista, que han afectado de manera directa e ininterrumpida el avance físico y administrativo de la obra. A continuación, se presentan los soportes técnicos y documentales que justifican la ampliación del plazo:

1. **AFECTACIÓN POR CONDICIONES CLIMÁTICAS ADVERSAS (LLUVIAS)**

De acuerdo con los boletines meteorológicos emitidos por el IDEAM, durante el mes de enero de 2026 se presentaron precipitaciones recurrentes en el área de influencia del proyecto, registrándose diecisiete (17) días con presencia de lluvias. Estas condiciones climáticas afectaron directamente la accesibilidad a las veredas rurales donde se ejecuta el proyecto, particularmente en zonas no carreteables y de alta pendiente, generando:

- Dificultades para el transporte de materiales y equipos.
- Restricción en el ingreso de personal técnico a los frentes de trabajo.
- Riesgos en trabajos en altura y maniobras de montaje de estructuras.

## 2. RETRASOS EN EL SUMINISTRO DE MATERIALES POR PARTE DE PROVEEDORES

Durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026, se presentó una ventana crítica de baja o nula capacidad de despacho por parte de los principales proveedores de insumos eléctricos, debido a vacaciones colectivas y horarios especiales de fin de año, situación debidamente comunicada por las empresas proveedoras. (Ver Anexo II)

Esta circunstancia generó limitaciones significativas en el suministro oportuno de materiales esenciales para la ejecución de actividades programadas, particularmente aquellas relacionadas con:

- Instalación de redes de media tensión.
- Tendido de conductores de baja tensión.
- Montaje de estructuras y accesorios eléctricos.

Avance en frentes que dependían directamente del abastecimiento de insumos específicos.

La indisponibilidad temporal de materiales afectó la continuidad operativa en campo y produjo una disminución sustancial en el rendimiento programado del proyecto, impactando el cronograma contractual vigente.

## 3. TIEMPO REQUERIDO PARA LA CERTIFICACIÓN RETIE

Una vez finalizada la ejecución de la obra, se requiere un plazo adicional de treinta ocho (38) días calendario para cumplir con el proceso de certificación RETIE, tal como lo ha comunicado formalmente la empresa certificadora R&R Condiciones del Servicio. Este proceso incluye:

- Inspección técnica (primera visita)
- Subsanación de no conformidades (si aplica)
- Emisión de certificados de conformidad

## 4. CÁLCULO DE LA ADICIÓN DE TIEMPO SOLICITADA

| CONCEPTO | DÍAS |
|---|---|
| **A.** Tiempo por condiciones de lluvia (Enero) | **17 días** |
| **B.** Periodo muerto de materiales | **13 dias** |
| **C.** Certificación RETIE (I Visita, subsanación y emisión de certificados) | **30 días** |
| **TOTAL, DÍAS ADICIONALES SOLICITADOS (A+B+C)** | **60 días** |

Las circunstancias descritas son ajenas a la voluntad del contratista, se encuentran debidamente soportadas y tuvieron incidencia directa en la ejecución del contrato, afectando la programación inicialmente aprobada.

Por lo anterior, respetuosamente se solicita se autorice la ampliación del plazo contractual por sesenta (60) días calendario, contados a partir del vencimiento del plazo vigente, con el fin de garantizar la correcta culminación del objeto contractual bajo condiciones técnicas, normativas y de calidad exigidas.

Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier requerimiento adicional.

Atentamente,

**HILMON MERCHAN SUAREZ**
Nombre del Representante Legal:
C. C. No: 91.210.294 expedida en Bucaramanga- Santander
CL 17 N° 11 - 48 - Centro
hilmon7020@hotmail.com
3106092314
Florencia Caquetá
**ANEXOS**

Fecha: 27 de febrero del 2026

## INFORME TÉCNICO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y PLUVIOMÉTRICAS

| | |
|---|---|
| **No. De Contrato:** | 202500000890 del 24 de octubre de 2024 |
| **Contratante:** | Departamento del Caquetá |
| **Contratista:** | HILMON MERCHAN SUAREZ |
| **Objeto:** | "CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AEREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NUCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" |
| **Valor:** | $2.056.578.304,00 |
| **Plazo:** | 3 meses a partir de la firma del Acta de Inicio |
| **Anticipo:** | 40% del valor total del contrato. (**$ 822.627.322**) OCHOCIENTOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS ($ 822.627.322,00) PESOS M/CTE. |
| **Fecha de Inicio:** | 04 de diciembre de 2025 |
| **Fecha de finalización** | 03 de marzo de 2026 |

Este informe analiza las precipitaciones ocurridas en el municipio de San José del Fragua y La Montañita durante el mes de enero de 2026. Los datos fueron recolectados a partir de boletines meteorológicos emitidos por el IDEAM y el objetivo es evaluar el impacto de las lluvias en la obra que se realiza en dicho municipio, asegurando que el cronograma y la seguridad sean considerados ante las condiciones climáticas.

Datos Recopilados:

Durante el mes de enero, se registraron lluvias de diferentes intensidades, desde ligeras hasta fuertes. Los boletines abarcan del 1 al 31 donde se describen las siguientes condiciones:

1. **Precipitaciones bajas**: Se registraron lluvias ligeras, entre 4 a 6 mm, **en cuatro (4) días**, estos son los días en los cuales se presentas las bajas precipitaciones el 3, 4, 7, 12 de enero.

2. **Precipitaciones moderadas**: Días con acumulados de entre 6 a 8 mm se observaron **en cuatro (4) días**: el 2, 13, 14, 24 de enero. Estas precipitaciones fueron distribuidas de manera uniforme a lo largo del mes.

3. **Precipitaciones más intensas**: Días con acumulados de entre 8 a 30 mm se observaron **en nueve (9) días,** el 1, 5, 11, 15, 16, 19, 28, 29 y 30 de enero

# BOLETINES METEOROLÓGICOS DE 001-030

| Reportes de precipitaciones y alertas en el municipio de San José del Fragua | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Boletín No. | No. Ilustración | Fecha | Link |
| Se presentan precipitaciones entre 8 a 10 mm en el todo el territorio | 001 | 1 | 1/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/001_itd_enero_01_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 6 a 8 mm en el todo el territorio | 002 | 2 | 2/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/002_itd_enero_02_2026%20(3).pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 4 a 6 mm en todo el territorio | 003 | 3 | 3/03/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/003_itd_enero_03_2026%20(3).pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 4 a 6 mm en todo el territorio | 004 | 4 | 4/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/004_itd_enero_04_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 4 a 8 mm en todo el territorio | 005 | 5 | 5/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/005_itd_enero_05_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 10 a 15 mm en todo el territorio | 006 | 6 | 6/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/006_itd_enero_06_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 2 a 4 mm en todo el territorio | 007 | 7 | 7/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/007_itd_enero_07_2026%20(1).pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 4 a 6 mm en todo el territorio | 009 | 8 | 9/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/009_itd_enero_09_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 2 a 4 mm en todo el territorio | 010 | 9 | 10/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/010_itd_enero_10_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 2 a 4 mm en todo el territorio | 011 | 10 | 11/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/011_itd_enero_11_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 6 a 10 mm en todo el territorio | 012 | 11 | 12/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/012_itd_enero_12_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 4 a 6 mm en todo el territorio | 013 | 12 | 13/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/013_itd_enero_13_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 6 a 8 mm en todo el territorio | 014 | 13 | 14/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/014_itd_enero_14_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 6 a 8 mm en todo el territorio | 015 | 14 | 15/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/015_itd_enero_15_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 6 a 15 mm en todo el territorio | 016 | 15 | 16/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/016_itd_enero_16_2026.pdf |

CEL: 310 609 2314
E-MAIL: hilmon7020@hotmail.com
DIREC: CALLE 17 N.11-48 CENTRO

| Reportes de precipitaciones y alertas en el municipio de San José del Fragua | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Boletín No. | No. Ilustración | Fecha | Link |
| Se presentan precipitaciones entre 6 a 15 mm en todo el territorio | 019 | 16 | 19/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/019_itd_enero_19_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 6 a 8 mm en todo el territorio | 024 | 17 | 24/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/024_itd_enero_24_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 15 a 30 mm en todo el territorio | 028 | 18 | 28/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/028_itd_enero_28_2026.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 15 a 30 mm en todo el territorio | 029 | 19 | 29/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/029_itd_enero_29_2026_0.pdf |
| Se presentan precipitaciones entre 8 a 15 mm en todo el territorio | 030 | 20 | 30/01/2026 | file:///C:/Users/Usuario-CT/Downloads/030_itd_enero_30_2026.pdf |

El informe incluye veinte (20) ilustraciones que documentan los eventos meteorológicos más relevantes del mes de enero del año en curso. Estas imágenes sirven como evidencia visual para analizar el impacto de las lluvias en la zona donde se realiza la ejecución del proyecto.

Ilustración 1.


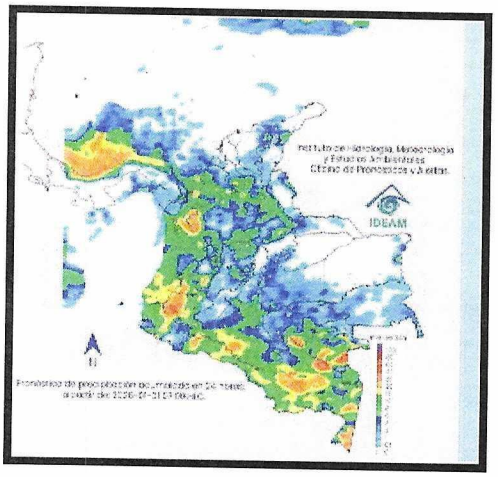



Ilustración 2.

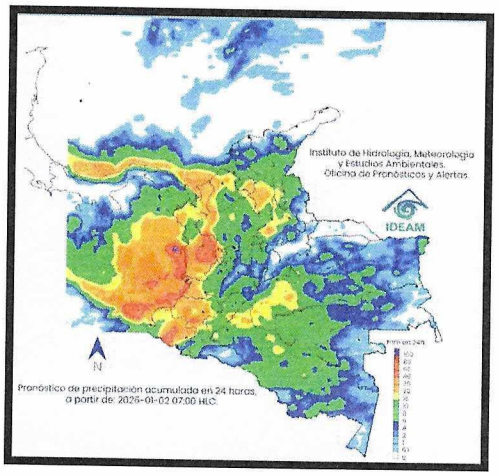


CEL: 310 609 2314
E-MAIL: hilmon7020@hotmail.com
DIREC: CALLE 17 N.11-48 CENTRO

Ilustración 3.

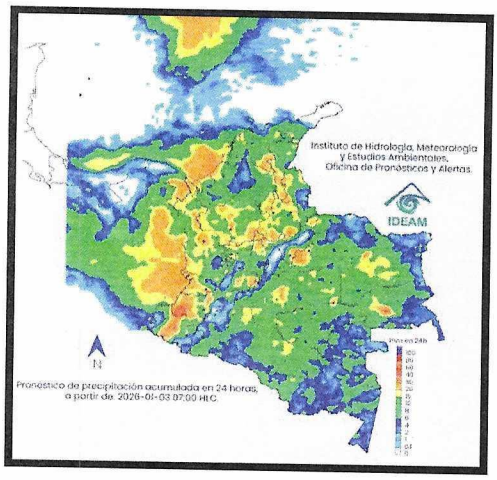



Ilustración 4.

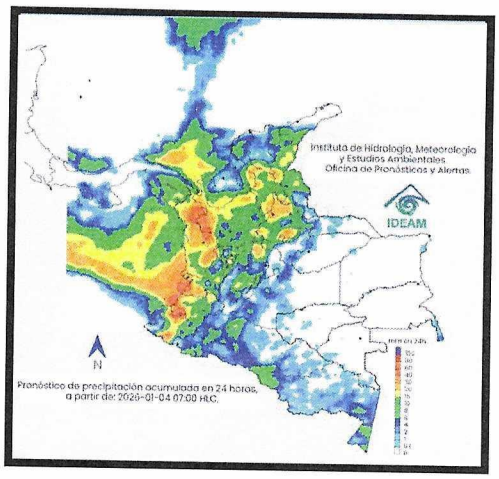



Ilustración 5.


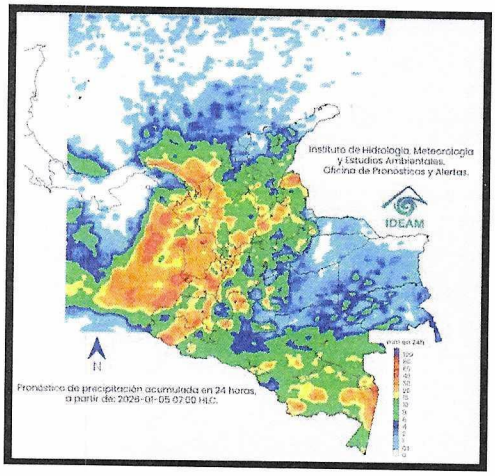



Ilustración 6.

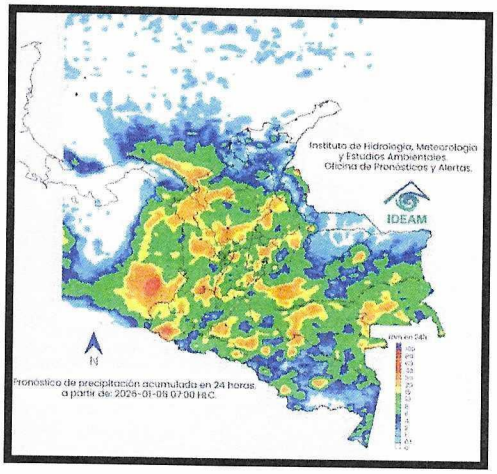


**CEL: 310 609 2314**
**E-MAIL: hilmon7020@hotmail.com**
**DIREC: CALLE 17 N.11-48 CENTRO**

Ilustración 7.

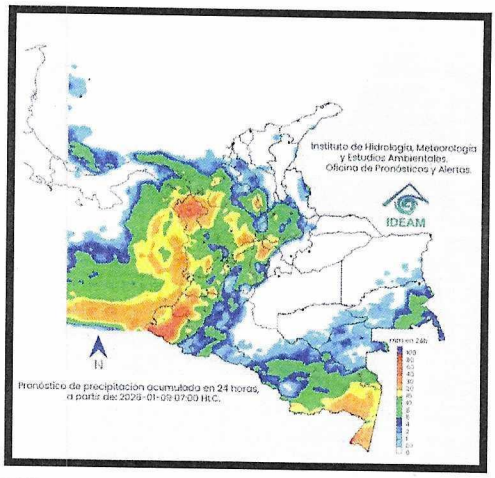



Ilustración 8.

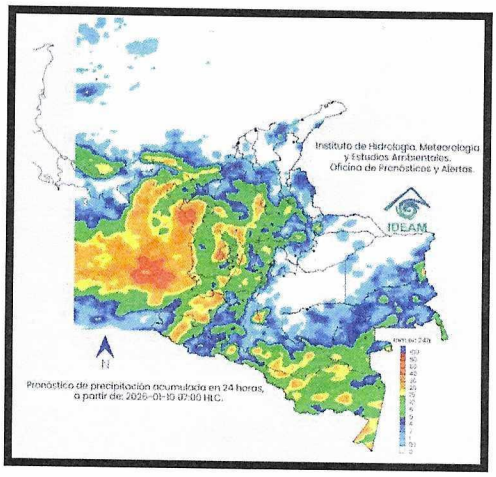



Ilustración 9.

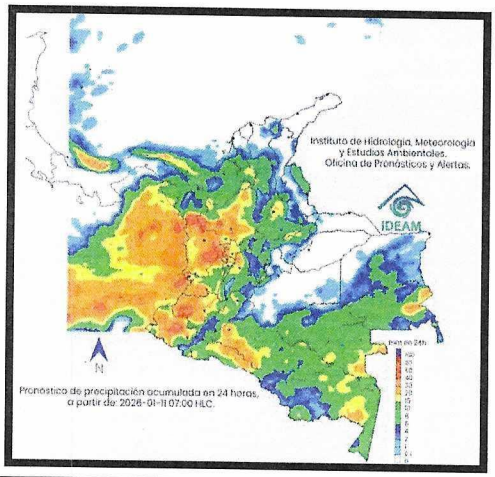



Ilustración 10.

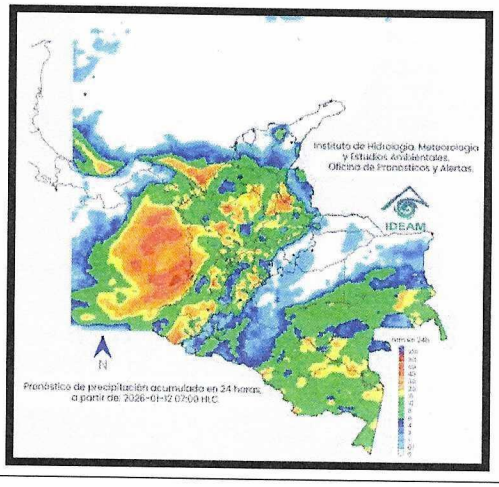



Ilustración 11.


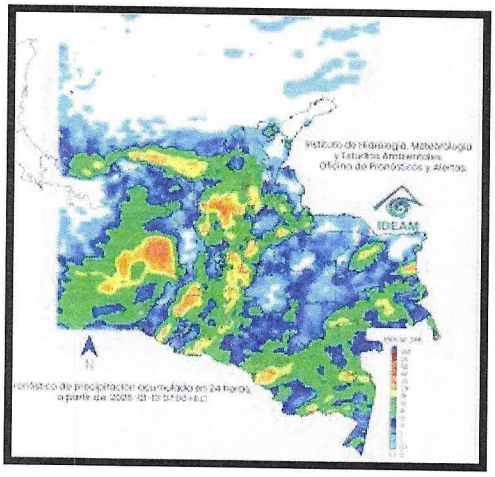



Ilustración 12.

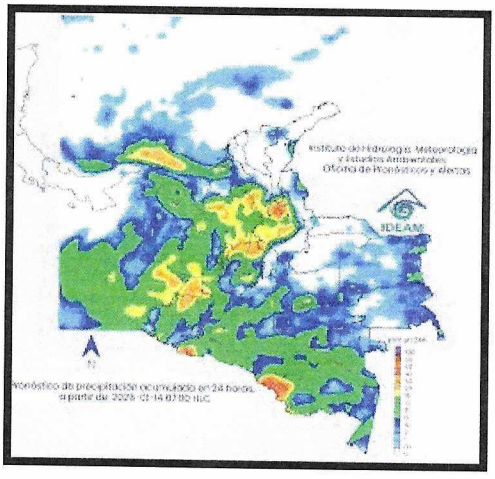


**CEL: 310 609 2314**
**E-MAIL: hilmon7020@hotmail.com**
**DIREC: CALLE 17 N.11-48 CENTRO**

Ilustración 13.

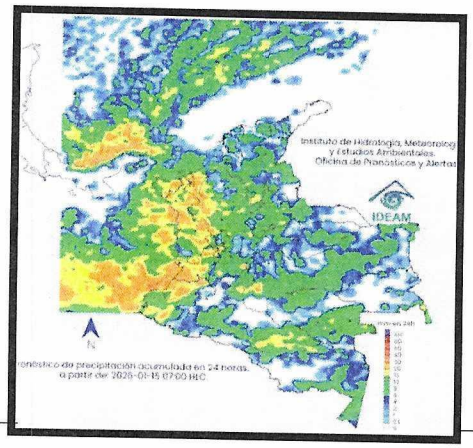



Ilustración 14.

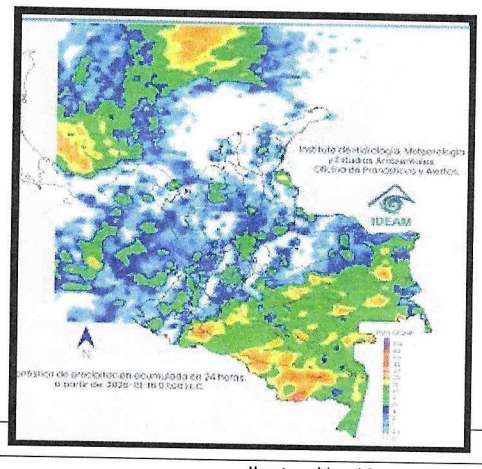



Ilustración 15.

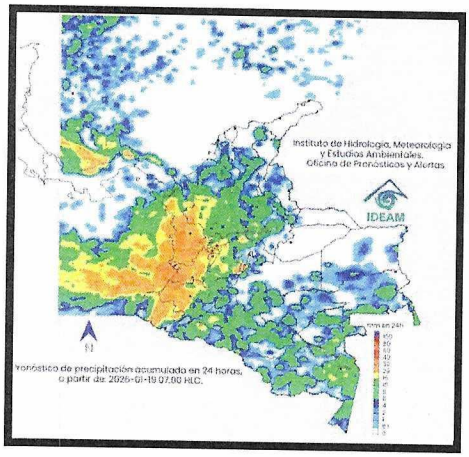



Ilustración 16.

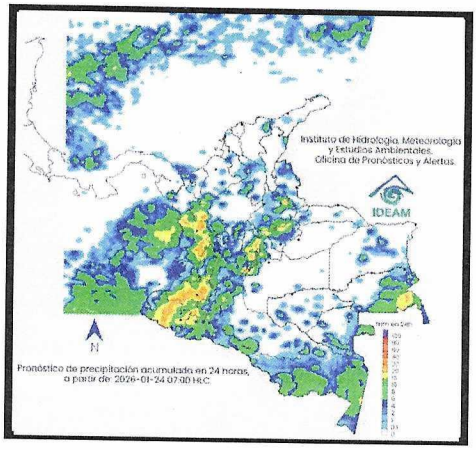



Ilustración 17.


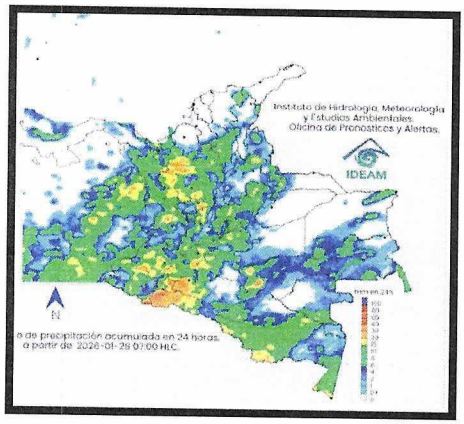



Ilustración 18.

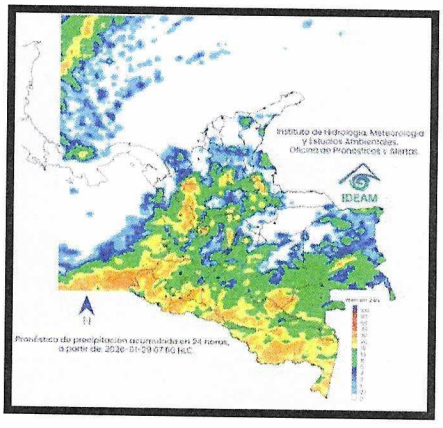


**CEL: 310 609 2314**
**E-MAIL: hilmon7020@hotmail.com**
**DIREC: CALLE 17 N.11-48 CENTRO**

Ilustración 19.


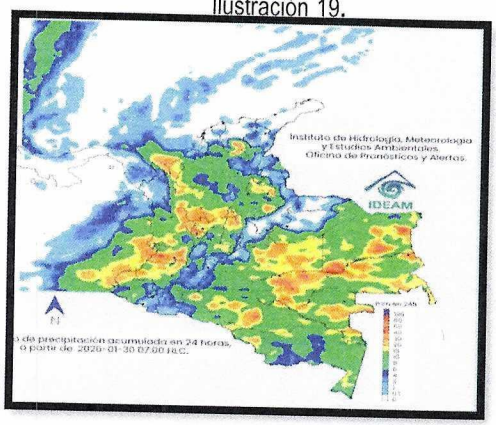



Ilustración 20.

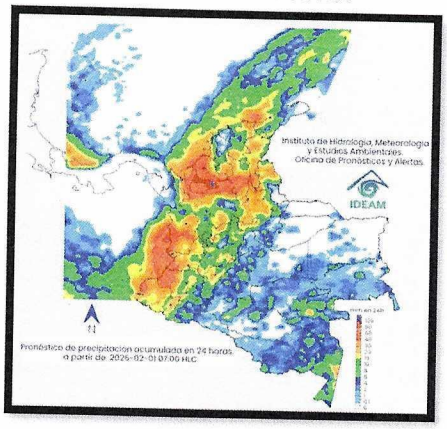


## ANÁLISIS DE PRECIPITACIONES

Con base en los boletines meteorológicos emitidos por el **IDEAM**, correspondientes al periodo comprendido entre el 01 al 31 de del 2026, se evidencia la ocurrencia de precipitaciones de diferentes intensidades en el municipio de San José del Fragua.

Durante el periodo analizado se identificaron:

- Días con presencia de lluvias: 17 días.
- Días con presencia de lluvias muy bajas: tres (3) días, con condiciones secas aprovechables para obra: 11 días.

Lo anterior representa que el 60.7% de los días del mes se vieron afectados por eventos de lluvia, mientras que únicamente el 39.3 % presentaron condiciones relativamente favorables para la ejecución de actividades constructivas.

Las precipitaciones registradas oscilaron entre 4 mm y 30 mm, presentándose eventos de lluvias moderadas a fuertes que generaron saturación del suelo, encharcamientos y riesgos operativos.

## AFECTACIÓN DIRECTA A LA OBRA

Las condiciones descritas anteriormente hacen técnicamente inviable la ejecución segura y eficiente lo es las actividades del proceso de certificación asociado debido a que incrementar significativamente los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Fecha: 26 de febrero del 2026

Ingeniero
JOSE MANUEL ARCE FERNÁNDEZ
Representante legal
Consorcio Interventoría La Montañita y San José del Fragua 2025
Florencia – Caquetá

**Referencia:** Justificación de retrasos en avance de obra por periodos muertos en despacho de materiales Obra Pública No. 202500000890

Por medio de la presente y en calidad de contratista de obra, me permito comunicarles los periodos muertos identificados en el despacho de materiales, los cuales impactaron el avance programado de obra de los periodos del mes de diciembre y enero respectivamente, tal como se conoce a través de las comunicaciones oficiales emitidas por los proveedores durante las últimas semanas.

De acuerdo con la información suministrada oficialmente por nuestros proveedores, se han presentado los siguientes periodos de inactividad en la cadena de suministro y despacho:

1. **Vacaciones colectivas de personal comercial y operativo**

- Empresa: **CAMELECO**
  Periodo sin despachos ni atención operativa: del 20 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026.
- Reanudación de actividades: a partir del 6 de enero de 2026.3
- Días sin despacho **17 días**

2. **Horario especial y suspensión temporal de despachos**

- Empresa: **INGAL DE OCCIDENTE S.A.S**
- Periodo sin atención: del 27 de diciembre de 2025 al 12 de enero de 2026.
- Reanudación de atención: 13 de enero de 2026.
- Días sin despacho **17 días**

3. **Vacaciones colectivas y activación de tienda virtual**

- Empresa: **CABLECOL**
- Periodo sin atención comercial presencial: del 1 al 18 de enero de 2026.
- Días sin despacho **18 días**

Como se puede observar, durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, se presenta una ventana crítica de baja o nula capacidad de despacho por parte de los proveedores, lo que ha limitado la llegada de insumos necesarios para continuar con el avance de las actividades programadas. Con base en lo anterior, se establece un periodo muerto de **trece (13)** días calendario durante los cuales no fue posible recibir materiales esenciales para la continuidad de las labores en obra, especialmente aquellas actividades cuyo avance depende directamente del suministro oportuno de insumos.

Esta situación, ajena a la voluntad del contratista, afectó el cumplimiento del cronograma inicialmente previsto, por lo que se solicita comedidamente a la interventoría tener en cuenta esta justificación para los efectos de evaluación de plazos, reprogramación de actividades y posibles impactos en el plan de trabajo.

Adjuntamos a la presente los comunicados oficiales emitidos por los proveedores, en los cuales se evidencia la suspensión de despachos y atención operativa durante los periodos indicados.

Atentamente,

**HILMON MERCHAN SUAREZ**
Nombre del Representante Legal:
C. C. No: 91.210.294 expedida en Bucaramanga- Santander
Dirección de correo: CL 17 N° 11 - 48 - Centro
Correo electrónico:hilmon7020@hotmail.com
Celular: 3106092314
Ciudad: Florencia Caquetá
Anexo: PROVEEDORES (I-II-III)

CAMELECO®
calidad y servicio con energía
Materiales Eléctricos para Construcción e Infraestructura

Bogotá, 17 diciembre de 2025.

Estimados:
**CLIENTES CAMELECO**

**REFERENCIA: COMUNICADO SALIDA A VACACIONES DE COMERCIAL ENCARGADO.**

Reciban un cordial saludo,

Por medio del presente, me pongo en contacto con ustedes para comunicarles que estaremos disfrutando de vacaciones colectivas desde el día 20 de diciembre de 2025 hasta el próximo lunes 5 de enero de 2026.

Durante este periodo, no se realizará despacho de material ni atención de solicitudes operativas, las cuales serán retomadas a partir de la fecha de regreso.

Los datos de contacto se mantendrán sin cambios; sin embargo, las solicitudes y requerimientos serán atendidos una vez se reanuden las actividades.

Agradezco su comprensión.

Cordialmente,

**Alexandro Olivar Quintero.**
**Asesor Comercial**
**CAMELECO SAS**

INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE
Nit :901020151-8
CALLE 3 TRANSVERSAL 4-222
Celular: 602-3872686
PALMIRA-Colombia

# ¡INICIAMOS LABORES 2026!

Expresamos que, debido a temporada de fin de año, nuestros horarios habituales sufrirán cambios, informamos a nuestros clientes con el propósito de que programen oportunamente sus solicitudes y compras.

Horario especial:

24 de diciembre de 2025: 8:00 a.m 12:00 p.m

27 de diciembre de 2025: 8:00 a.m 12:00 p.m

A partir del 27 entraremos en temporada de fin de año y retornaremos nuestra atención el día 13 de enero del 2026 horario habitual.

Agradecemos su comprensión y les deseamos un Prospero año Nuevo.

Cordialmente,

**DIRECCION COMERCIAL**
**INGAL DE OCCIDENTE**

Comunicado Cablecol 2026

Servicio al ClienteCablecol
Para: Usted

Cablecol


## ¡INICIAMOS LABORES 2026!

Nuestros ejecutivos comerciales se encuentran en vacaciones colectivas hasta el **18 de enero de 2026.**

Sin embargo, nuestra tienda virtual estará activa a partir del **13 de enero 2026**, donde podrás realizar pedidos, consultar precios e inventario.

La política comercial de diciembre de 2025 se encontrará vigente hasta el 31 de enero de 2026.

Cualquier inquietud referente a la tienda virtual comuníquese al **320 831 2483.**



Este email fue enviado a hilmon7020@hotmail.com

Si ya no desea recibir estos emails, puede darse de baja aquí

Fecha: 25 de febrero del 2026

Señor(es): HILMON MERHAN SUAREZ
NIT: 91.210.294
Dirección: Calle 17N 11-48 Florencia
Correo: hilmon7020@hotmail.com

Estimado cliente,

La presente es para informarle que nuestra empresa realizará la revisión e inspección de las redes eléctricas en media y baja tensión y de los transformadores instalados correspondientes al proyecto: "***CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.***
.

Dentro de la propuesta presentada y aprobada por ustedes, se adjunta el cronograma asociado a las labores de inspección, el cual se detalla en la tabla No. 01. Dicho cronograma contempla el alcance de la revisión técnica correspondiente a los siguientes componentes de la infraestructura eléctrica:

- Red de media tensión (MT)
- Red de baja tensión (BT)
- Estructuras terminales
- Transformadores

Es importante destacar que el área geográfica donde se desarrolla el proyecto presenta perfiles de elevación considerables, así como zonas no carreteables, lo cual implica un esfuerzo logístico y operativo adicional para la ejecución de los recorridos de inspección y verificación en campo.

El producto final de este proceso se materializa en un entregable que consigna, por nuestra parte, la verificación y comprobación del cumplimiento normativo aplicable a cada uno de los elementos antes mencionados. Dicho entregable se estructura en un dossier técnico que contempla las siguientes fases:

**FASE DE REVISIÓN**: Comprende la revisión documental exhaustiva de los soportes técnicos, normativos y administrativos aportados, así como la verificación en campo de las condiciones reales de la infraestructura (redes MT/BT, estructuras terminales y transformadores) durante las visitas programadas.

**FASE DE SUBSANACIÓN**: Una vez identificadas las observaciones o hallazgos durante la revisión, se procede a la gestión de ajustes y correcciones por parte de los responsables, con el acompañamiento necesario para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

**Fase de emisión de certificados**: Finalmente, una vez verificada y subsanada la totalidad de los aspectos técnicos y documentales, se realiza la aprobación definitiva, el cargue de los certificados de conformidad y su correspondiente entrega formal.

Esto nos permite informar que se estima un tiempo para la revisión de las redes eléctricas construidas y los transformadores instalados y la elaboración de informes y emisión de certificados de conformidad es de treinta (30) días calendario, una vez finalizado la ejecución de la obra.

Agradecemos su amable comprensión, en aras de no ocasionar ningún problema para la entrega de su contrato al operador de red

Cordialmente

**ING. JHON WILLIAM DOMÍNGUEZ**
DIRECTOR COMERCIAL
RETIE Y RETILAP SAS
ANEXO: CRONOGRAMA

## CRONOGRAMA DE VISITA

| CRONOGRAMA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO No. 202500000890: " CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN CON MONTAJE DE SUBESTACIONES AÉREAS PARA LA COMUNIDAD ALTOS DE MORITY Y NÚCLEOS EN LAS VEREDAS SEMILLAS DE PAZ, LA INDIA Y AGUA BLANCA MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA Y LA VEREDA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" | | | MENSUAL | | |
| Item | ACTIVIDAD | km | MARZO | ABRIL | |
| 1 | RED DE MEDIA TENSIÓN A 13200 VOLTIOS-km | 8,51 | 82,00% | 18,00% | |
| 2 | RED DE BAJA TENSIÓN A 220/120 VOLTIOS- km | 13,23 | 89,00% | 11,00% | |
| 3 | TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS-Und. | 17 | 79,00% | 21,00% | |
| 4 | PUESTA A TIERRA BT-Und. | 54 | 95,00% | 5,00% | |
| | | Fecha de Inicio | 4/03/2026 | Feha Final | 3/04/2026 |
| | | | 30 dias | | |
| 4 | TRANSFORMACIÓN 13200/220/120 VOLTIOS-Und | | | | |
| | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 5 KVA | 12 | | | |
| | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 10 KVA | 1 | | | |
| | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15 KVA | 1 | | | |
| | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 25 KVA | 3 | | | |
| | TOTAL | 17 | | | |

Tabla 1. Cronograma del Alcance RETIE
