Agencia Nacional de Seguridad Vial

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA A LA GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV. Zona 5

del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2025
Versión 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° PA 100-2025
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN IPN

CONSORCIO SEÑALIZACION IPN

INCOPLAN S.A. INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION INGEPLAN.CO

Febrero de 2026

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 6
GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS

del 14 de septiembre al 13 de octubre del 2025

versión 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA PA 100-2025

Objeto del Contrato:
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV. Zona 5

Elaboró: **DIANA MILENA HURTADO V** **PROFESIONAL SOCIAL**	**Aprobó:** **ROGER RODRÍGUEZ MORENO** **DIRECTOR**
Firma:	**Firma:** ROGER RODRIGUEZ M

Febrero de 2026

REVISIONES AL DOCUMENTO

DOCUMENTO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 6 GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS - Versión 2

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	REVISADO POR	FECHA
1	Versión para emisión de documento	Director de Interventoría	Febrero 05 de 2026
2	Atención de observaciones de la ANSV	Director de Interventoría	Febrero 11 de 2026

Nota: si aparece una nueva versión, favor anular la versión anterior, escribiendo "OBSOLETO" en la portada

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. OBJETIVOS 7
2.1. Objetivo general 7
2.2. Objetivos específicos 8
3. GENERALIDADES DEL CONTRATO 8
4. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 10
5. PERSONAL SOCIAL PARA EL PROYECTO 10
6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO 12
7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 15
8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA. 16
9. COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL 20
9.1. Recorrido de inicio para la identificación del área de influencia y elaboración del directorio de actores. 20
9.1.1. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores. 23
9.2. Cartografía Social 28
9.3. Documento Lectura Territorial y Caracterización del área de influencia por punto viabilizado 29
10. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 32
10.1. Reuniones informativas 32
10.1.1. Reunión de inicio. 33
10.1.2. Reunión de cierre. 38
10.1.3. Reuniones extraordinarias 43
10.2. Volantes 43
10.3. Afiches 48
10.4. Valla Móvil 51
10.5. Monitoreo de medios de comunicación 57
10.6. Talleres de sensibilización en buenas prácticas de seguridad vial 57
10.7. Avance de Obra 63
11. COMPONENTE DE GESTIÓN HUMANA O CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA REGIONAL 64
12. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS EN INTERVENCIÓN 65

12.1. Levantamiento actas de vecindad de inicio y actas de vecindad de cierre. 66
12.2. Actas de aceptación. 71
12.3. Actas de entorno. 73
12.4. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD) 79
13. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 80
13.1. Cronograma de actividades 80
13.2. Comités de seguimiento y mesas de trabajo 81
13.3. Comité Integral semanal 83
13.4. Reporte semanal 84
13.5. Informes mensuales 90
13.6. Informe final 91
13.7. Otros Entregables 91
13.8. Seguimiento y trazabilidad de la correspondencia enviada y recibida 94
13.9. Verificación del uso de formatos establecidos por la ANSV 95
14. TABLA DE ANEXOS 96
15. CONCLUSIONES 99
16. RECOMENDACIONES 99

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Datos generales del Contrato 8
Tabla 2 Personal Social de Interventoría 11
Tabla 3 Personal social del Contratista avalado por la Interventoría 11
Tabla 4 Localización del proyecto por departamentos 12
Tabla 5 Población beneficiada del proyecto 15
Tabla 6 Entregables de la ejecución del componente gestión social 17
Tabla Visitas de reconocimiento departamento del Caquetá 21
Tabla 8 Consolidado de Visitas de apropiación realizadas al 13/10/2025 23
Tabla 9 Desarrollo de directorios de actores del 14/09/2025 al 13/10/2025 25
Tabla 10 Consolidado de Cartografía Social al 13/10/2025 28
Tabla 11 Entregables de Lectura Territorial y Caracterización del área de influencia del 14/09/2025 al 13/10/2025 30

Tabla 12 Trazabilidad de presentaciones(PPT) de inicio, aprobadas en el periodo del 14/09/2025 al 13/10/2025 33
Tabla 13 Reuniones de Inicio realizadas del 14/09/2025 al 13/10/2025 34
Tabla 14 Trazabilidad de presentaciones(ppt) de cierre, aprobadas en el periodo del 14/09/2025 al 13/10/2025 39
Tabla 15 Reuniones de Cierre realizadas del 14/09/2025 al 13/10/2025....40
Tabla 16 Consolidado de volantes de convocatoria a reunión de inicio entregados a la comunidad al 13/10/2025 ...44
Tabla 17 Consolidado de volantes de convocatoria a reunión de cierre entregados a la comunidad al 13/10/2025 ..46
Tabla 18 Afiches del contrato instalados entre el 14/09/2025 y el 13/10/2025 48
Tabla 19 Consolidado de vallas móviles del contrato instaladas entre el 14/09/2025 y el 13/10/2025....51
Tabla 20 Verificación de instalación de valla móvil en el periodo del 14/09/2025 al 13/10/2025 52
Tabla 21 Trazabilidad de trámites de aprobación de piezas de comunicación para inicio y cierre de puntos de implementación desarrolladas entre el 14/09/2025 y el 13/10/2025 54
Tabla 22 Consolidado de realización de talleres de sensibilización en seguridad vial del 14/09/2025 al 13/10/2025.58
Tabla 23 Avance de obra 63
Tabla 24 Reporte de constancia de residencia solicitados por el Contratista de obra....65
Tabla 25 Consolidado actas de vecindad de inicio del 14/09/2025 al 13/10/2025....66
Tabla Consolidado actas de vecindad de cierre del 14/09/2025 al 13/10/2025 68
Tabla 27 Consolidado de puntos con Actas de aceptación del periodo 14/09/2025 al 13/10/2025....71
Tabla 28 Consolidado de entrega de Actas de Entorno levantadas por punto de intervención 73
Tabla 29 Reporte de gestión social y comunicaciones en comités semanales....83
Tabla 30 Consolidado de reportes y programación de actividades semanales del Contratista PA-027-2025 85
Tabla 31 Consolidado de reportes y programación de actividades semanales de Interventoría PA-100-2025 85
Tabla 32 Anexos del Informe Mensual Social N°6 Interventoría 96

íNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Localización general de sitios a intervenir 12
Ilustración 2 Cronograma general del Contratista, versión 2 80
Ilustración 3 Bitácora digital del componente social, revisión y seguimiento 89
Ilustración 4 Correo electrónico de Interventoría de fecha 16/09/2025 94

1. INTRODUCCIÓN

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) impulsa el programa “obras por la vida” con el propósito es mitigar la accidentalidad en las vías de orden nacional y municipal a través de la implementación de señalización vial y acciones pedagógicas tendientes al fortalecimiento en la cultura del cuidado e importancia del uso adecuado de la señalización vial.

La Interventoría Consorcio Señalización IPN, ejecuta el contrato N° PA 100-2025 cuyo objeto es REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV Zona 5, con el cual se ejercen funciones de seguimiento, control, acompañamiento y vigilancia de las acciones desarrolladas por el Contratista Consorcio Fernac, responsable del contrato de obra N° PA-027-2025 cuyo objeto es: IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV – ZONA 5.

En el marco de cumplimiento a las obligaciones contractuales estimadas para los contratos de Interventoría N° PA 100-2025 y de obra N° PA-027-2025 se presenta a la entidad contratante el Informe Mensual de Interventoría el cual contiene las acciones de seguimiento a las actividades ejecutadas por el Contratista en el mes N°6 que corresponde al periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025.

Lo anterior, estructurado bajo el planteamiento del Plan de Acción de Interventoría - PAI aprobado por la ANSV el 11 de julio de 2025 con radicado No. 20253000066851, el cual se basa en el documento contractual Apéndice E “ESPECIFICACIONES PARA EL COMPONENTE DE GESTIÓN SOCIAL Y COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS”

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas al Contratista de obra, las cuales están consignadas en el Apéndice E “Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas”.

2.2. Objetivos específicos

- Verificar el desarrollo del Plan de Gestión Social (v2) del Contratista de obra aprobado por la Interventoría, en el marco de las Obligaciones Generales y Específicas del Contratista, atendiendo los procesos y lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV

- Presentar los consolidados por cada uno de los componentes propios de las obligaciones contractuales del componente de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, teniendo como referencia el acompañamiento realizado en el periodo correspondiente al Informe Mensual N° 6 del Contratista, el cual fue revisado y aprobado por la Interventoría en versión 2 con el oficio generado el 07 de noviembre de 2025 mediante consecutivo 2025-IN022-3686.

(Ver tabla de anexos – Anexo 1 IMS N°6 CO trazabilidad, documento y comunicado de aprobación)

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO

A continuación, se brinda los datos generales de los contratos de Interventoría N° PA 100-2025 y de obra N° PA-027-2025

Tabla 1 Datos generales del Contrato

DATOS DEL CONTRATANTE – AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	
COORDINACIÓN TÉCNICA	Giovanna M. Naranjo
COORDINACIÓN SOCIAL	Luisa Fernanda Yáñez Agudelo
DATOS DE LA INTERVENTORÍA CONSORCIO SEÑALIZACION IPN	
N° DEL CONTRATO	PA -100-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto es implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV. zona 5
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.278.647.628
PLAZO DE EJECUCIÓN	10,5 diez meses y medio
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 de abril del 2025

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13 de febrero de 2026
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	Edgar Arturo Gamboa Rivera
RESIDENTE TÉCNICO	Manuel Ricardo Ramirez Daniel Steven León
PROFESIONAL SOCIAL	Diana Milena Hurtado Venegas
PROFESIONAL AMBIENTAL	Javier Augusto Castillo
PROFESIONAL SST	Luisa Fernanda Toro
DATOS DEL CONTRATISTA – CONSORCIO FERNAC	
N° DEL CONTRATO	PA - 027-2025
OBJETO DEL CONTRATO	Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV – Zona 5
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.800.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	10,5 diez meses y medio
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 de abril del 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	13 de febrero de 2026
DIRECTOR DE OBRA	David Francisco Ferreira Gómez
RESIDENTE TÉCNICO	Julián Federico Ferreira Cuellar Juan Camilo Arrieta Abuabara
PROFESIONAL SOCIAL	Alejandra Rivera Muñoz
PROFESIONAL SOCIAL	Amanda Villareal Izquierdo
PROFESIONAL AMBIENTAL	Yessica Tatiana Londoño Cuellar
PROFESIONAL SST	Liceth Daniela Merchán Jessica Katherine Rubiano Pedraza

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

4. MARCO NORMATIVO Y LEGAL

En el marco de la ejecución de los contratos de Interventoría N° PA 100-2025 y de obra N° PA-027-2025, los Consorcios titulares regulan la totalidad de sus acciones bajo el marco normativo establecido desde ANSV la entidad contratante, el cual se relaciona a continuación:

- Constitución Política de Colombia 1991, artículos N° 01, 02, 07, 08, 13, 49, 95, 79, 103,104, 105, 310 y 365.
- Ley 21 de 1991, por la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la O.I.T., Ginebra 1989.
- Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre Mecanismos de Participación Ciudadana.
- Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo - Ley de Planeación Participativa.
- Decreto 1429 de 1995, reglamentario de la Ley 142 de 1994 (control social).
- Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial.
- Ley 393 de 1997, Acción de Cumplimiento.
- Ley 472 de 1998 por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo.
- Directiva Presidencial No. 10 de 2002, para que la comunidad en general realice una eficiente participación y control social a la gestión administrativa.
- Derechos Humanos de Tercera Generación o Derechos Colectivos. Ley 743 de 2002, Organismos de Acción Comunal.
- Ley 1381 de 2010, Ley de Lenguas Nativas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos lingüísticos y los de sus hablantes.
- Ley 1755 de 2015 por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición.
- Ley 850 de 2003 por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas.
- Decreto 2623 de 2009, por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano.
- Ley 23 de 1982, por el cual se regula el derecho de autor.

5. PERSONAL SOCIAL PARA EL PROYECTO

Con el propósito de garantizar la realización de las actividades que hacen parte del componente de gestión social y comunicaciones estratégicas previstas para de Interventoría N° PA 100-2025 y de obra N° PA-027-2025, se establece la participación de profesionales sociales que contribuyan a la recolección y entrega de los soportes de seguimiento a las acciones adelantadas por parte de la empresa Contratista, donde propenda por la transparencia y trazabilidad

a la ejecución de actividades contractuales dadas desde el Apéndice E "Especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas".

En la siguiente tabla se relaciona el equipo de trabajo presentado por las partes para la ejecución de las actividades del área social del proyecto cuyos soportes de aprobación y respectivas hojas de vida se presentaron en el informe N°1 de Interventoría social; con corte al 13 de julio de 2025 se ha mantenido la plantilla de profesionales aprobadas desde el inicio del contrato:

Tabla 2 Personal Social de Interventoría

Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	% de dedicación
DIANA MILENA HURTADO VENEGAS	Profesional Social	d.hurtado@incoplan-proyectos.com	3125106755	100%
ENLACE DE CONSULTA DE LA HOJA DE VIDA DE LA PROFESIONAL SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA		001OPV-INT-ZO5-PYE-GEA-007HVDianaHurtado-V001		
CONCEPTO DE APROBACIÓN		Radicado No. 20253000062181 - 07 de febrero de 2025, enlace 001OPV-ASV-ZO5-PQE-GEA-001-R0062181		

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Tabla 3 Personal social del Contratista avalado por la Interventoría


Nombre y apellido	Cargo	Correo electrónico	Teléfono	% de dedicación
MARYITH ALEJANDRA RIVERA MUÑOZ	Profesional Social	social5ansv.fernac@gmail.com	3143256316	100%
AMANDA ELIZABET VILLARREAL IZQUIERDO	Profesional Social	social5ansv.fernac@gmail.com	313 8906602	100%
ENLACE DE CONSULTA DE LAS HOJAS DE VIDA DEL CONTRATISTA (Corresponde al equipo social las carpetas N°10 y 10.1)		001OPV-CTA-ZO5-PYE-GEA-003-Personal_Profesional_minimo-V001		
CONCEPTO DE APROBACIÓN		Comunicado No. 2025-IN022-0980 - 09 de abril de 2025, enlace 001OPV-INT-ZO5-COE-GEA-000-0980RtaHvPersonalMin-V001		

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

6. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

Para el caso puntual de los contratos de Interventoría N° PA 100-2025 y de obra N° PA-027-2025, el programa "Obras por la vida" de la ANSV contempla la intervención en puntos específicos en los departamentos de Caquetá, Cauca, Huila, Nariño y Valle del Cauca - zona 5.
En la ilustración 1 se detalla la localización general de los puntos priorizados entregados por la ANSV por cada departamento de la zona 5:

Ilustración 1 Localización general de sitios a intervenir

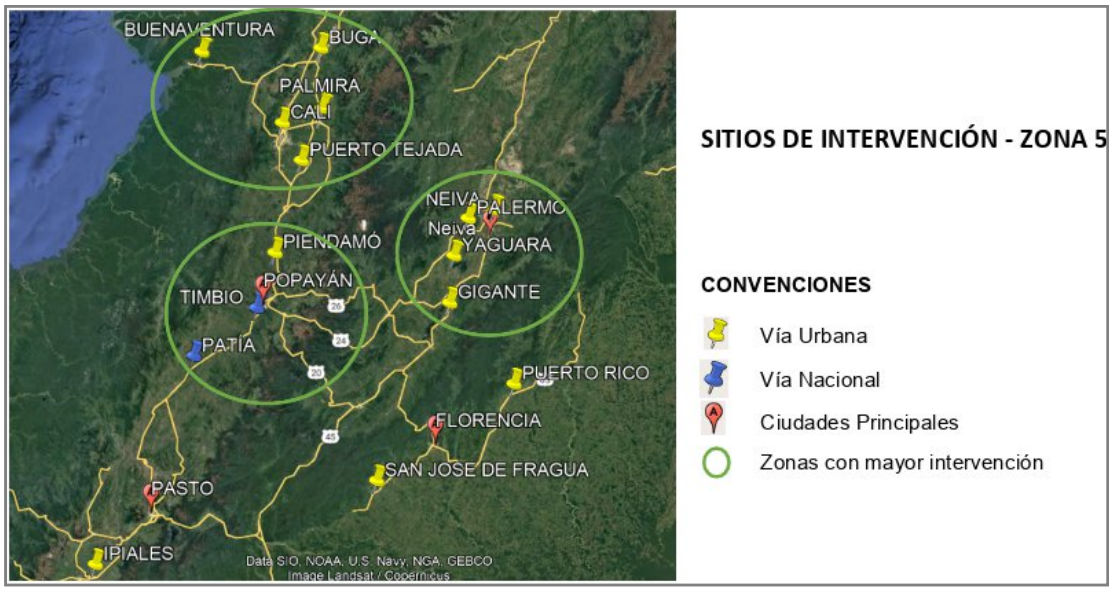

Fuente: Google Earth **Propia** – Consorcio Señalización IPN

Cada uno de los puntos a intervenir es manejado mediante convenio entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los Entes Territoriales encargados del mantenimiento de la vía, ya sea en área rural o en el área urbana. En la siguiente tabla se presentan detalles de localización de los puntos priorizados:

Tabla 4 Localización del proyecto por departamentos

CONVENIO N°	ENTE TERRITORIAL	MUNICIPIO	UBICACIÓN	CÓDIGO
CAQUETÁ				
ANSV-057-2024	Gobernación del Caquetá	San José del Fragua	Carera 5 con Calle 5	18610-004
		San José del Fragua	Carrera 4 con Calle 4	18610-003

CONVENIO N°	ENTE TERRITORIAL	MUNICIPIO	UBICACIÓN	CÓDIGO
		San José del Fragua	Carrera 4 con Calle 3	18610-002
		San José del Fragua	Carrera 4 con Calle 5	18610-001
		Puerto Rico	Carrera 13 con Calle 6	18592-001
		El Paujil	Sin información	18256-002
CAUCA				
ANSV-092-2024	Alcaldía Municipal del Patía e INVIAS	Patía	Institución educativa Bachillerato Patía sede la concentración Segizmundo Zapata Ríos	19532-001
ANSV-069-2024	Alcaldía Municipal Puerto Tejada	Puerto Tejada	Sector el Plátano intersección a nivel	19573-001
ANSV-085-2024	Alcaldía Municipal de Timbío e INVIAS	Timbío	Intersección Vía Panamericana con Vereda El Hato	19807-009
ANSV-068-2024	Alcaldía Municipal de Piendamó	Piendamó	Terminal de transportes Calle 7 No. 8-07.	19548-001
	Alcaldía Municipal de Piendamó e INVIAS	Piendamó	Carrera 4 No.5-65 – Vía a Silvia. (antiguo hospital) Carrera 4 Calle 5	19548-008
HUILA				
ANSV-014-2025	Instituto de Tránsito y Transportes del Huila	Gigante	Tramo carrera 7 con calle 12	41306-001
		Gigante	Calle 3 entre carrera 7 y 8	41306-002
		Gigante	I.E. Ismael Perdomo Borrero Sede principal. Carrera 7 No 1-11 B. la Regadera	41306-005
		Yaguará	Carrera 8 entre calles 5 y 5A	41885-002
		Yaguará	Calle 3 con carrera 8	41885-003
		Yaguará	Carrera 8 con calle 4	41885-004
ANSV-040-2024	Alcaldía de Palermo	Palermo	Carrera 7 con Calle 12 - B. Panamá	41524-006

CONVENIO N°	ENTE TERRITORIAL	MUNICIPIO	UBICACIÓN	CÓDIGO
		Palermo	Calle 42 entre carreras 10 y 8B. Amborco	41524-002
ANSV-039-2024	Alcaldía de Neiva	Neiva	Tramo Calle 7 A entre carreras 7 A y 16 (880 Metros)	41001-006
NARIÑO				
ANSV-070-2024	Alcaldía de Ipiales	Ipiales	Calle 13 entre Carreras 6 y 11	52356-263
		Ipiales	Carrera 4 con Calles 17 A /17 / 15 / 14 / 13	52356-268
		Ipiales	Avenida las Lajas entre Carrera 6 - Calle 4	52356-269
VALLE DEL CAUCA				
ANSV-053-2024	Alcaldía de Guadalajara de Buga	Buga	Carrera 9 frente al 22-51	76111-006
ANSV-086-2024	Alcaldía de Palmira	Palmira	Calle 18 entre carreras 18 y 32	76520-004
ANSV-015-2025	Gobernación del Valle del Cauca	Buenaventura	Carrera 66 Desde PR 107+644 hasta PR 109+476	76109-001
		Buenaventura	Carrera 66 desde el PR 106+000 hasta el PR 106+872	76109-002
ANSV-021-2025	Alcaldía de Cali	Cali	Calle 13 con Carrera 10	76001-014
		Cali	Calle 72A entre Carrera 7C y Carrera 7E (Centro Docente Central Providencial)	76001-019
		Cali	Calle 112 con Carrera 23	76001-022
		Cali	Avenida 3N Calle 34 Norte	76001-012

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN con información obtenida del Radicado ANSV No. 0253000033881 - Entrega de información y documentos disponibles para la ejecución de los contratos de obra No. PA-027-2025 e Interventoría No. PA100-2025. Programa “Obras por la Vida”.

7. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

El programa "Obras por la vida" busca favorecer la totalidad de actores viales involucrados en la dinámica de los diferentes departamentos del país, para el caso puntual de la zona 5 otorgada a los contratos de Interventoría N° PA 100-2025 y de obra N° PA-027-2025, el desarrollo de actividades involucra los departamentos Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Huila y Caquetá por lo cual, se determinó como población beneficiaria directa los habitantes residentes de estos municipios y como población beneficiaria indirecta las personas que hacen uso de las vías nacionales.

A continuación, se relacionan los beneficiarios directos del proyecto a nivel de municipios, de acuerdo con los puntos de implementación priorizados por el proyecto OPV de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Tabla 5 Población beneficiada del proyecto

Departamento	Municipio	N° Habitantes
Caquetá	San José del Fragua	11.364
	Puerto Rico	24.395
	El Paujil	13.014
Cauca	Puerto Tejada	40.244
	Piendamó	33.431
Huila	Gigante	22.871
	Yaguará	7.380
	Palermo	24.243
	Neiva	314.526
Nariño	Ipiales	105.517
Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	115.821
	Palmira	302.642
	Buenaventura	258.445
	Cali	1.822.896

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN con información obtenida del **censo DANE 2018**
Nota aclaratoria: las cifras de población fueron tomadas desde la página oficial del DANE sitios.dane.gov.co/cnpv/#!/

8. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATISTA.

El Consorcio Señalización IPN en su ejercicio de interventor brinda acompañamiento constante durante la ejecución del contrato N° PA 100-2025 "Realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, social, ambiental y jurídica al contrato cuyo objeto es implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados por la agencia nacional de seguridad vial – ANSV. zona 5", siendo garantes de los principios de calidad, oportunidad y correlación con la ciudadanía, a partir de la puesta en marcha de actividades sociales realizadas con la ciudadanía donde se entregue información oportuna y la atención efectiva de inquietudes, solicitudes y requerimientos que conciernen al objeto contractual del programa Obras por la Vida.

De acuerdo con los lineamientos de la Gestión Social de la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV y las exigencias consignadas en el apéndice E dispuestos para los contratos de Interventoría N° PA 100-2025 y de obra N° PA-027-2025, la profesional encargada del componente social de la Interventoría realiza mes a mes el seguimiento de las diferentes actividades del componente de Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas ejecutadas por el Contratista para el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a través de las evidencias tales como: registro fotográfico, recorridos de obra, entrega de volantes, instalación de afiches, comunicados emitidos al Contratista, etc., reportados de manera periódica dentro de los informes semanales y mensuales.

De esta manera, el Informe Mensual de Interventoría Social N°6 corresponde al periodo contractual del 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, en este informe se desarrolla el Plan de Acción de Interventoría - PAI, el cual está encaminado a cumplir con los siguientes criterios:

- **ESTUDIO:** La Interventoría y Contratista de obra realizan mesas de trabajo de conformidad a lo requerido durante el desarrollo del contrato, con el objetivo de planificar de manera previa las acciones para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales. De igual manera, en cuanto se requiera la Interventoría estudiará la(s) propuesta(s) y emitirá su concepto al respecto, para que en coordinación con el Contratista de obra se tomen medidas ante la implementación de acciones que se realicen con la comunidad para el desarrollo del proyecto.
- **SUPERVISIÓN:** La Interventoría realiza constante seguimiento a cada una de las actividades programadas, a través de visitas a obra, asistencia a reuniones, acompañamiento, mesas de trabajo y demás espacios, generando los soportes respectivos.
- **VISITAS DE CAMPO**: La profesional del área social de Interventoría realiza acompañamiento a las actividades en campo conforme lo requiera el proyecto y con la programación informada por el Contratista de obra.
- **EVALUACIÓN:** Esta actividad se desarrolla permanentemente durante la intervención social del proyecto, permitiendo verificar el cumplimiento de los objetivos de las actividades planteadas, así como el cumplimiento de la normatividad requerida por la ANSV.

- **COMITÉ INTEGRAL:** La Interventoría social asiste y participa en los espacios semanales convocados por la ANSV para seguimiento a las actividades sociales, de igual manera vela por que el área social del Contratista de obra asista y participe en estos espacios.
- **COMITÉ SOCIAL:** Se realiza seguimiento a las actividades de gestión social del Contratista de obra, el equipo de profesionales del área social del Contratista de obra, presenta un balance de las actividades realizadas durante la semana en cada uno de los componentes de gestión social, por su parte, la Interventoría realiza apreciaciones sobre dichas actividades. De acuerdo con la dinámica propia del proyecto los comités se llevarán a cabo quincenalmente entre la Interventoría y el Contratista de obra.
- **MESAS DE TRABAJO:** Este tipo de espacios se realizan de acuerdo con la dinámica del proyecto con el objetivo de mantener una comunicación fluida con el Contratista de obra para brindar acompañamiento y seguimiento a las acciones de gestión social desarrolladas.
- **PRODUCTOS ENTREGABLES:** A continuación, se presentan los entregables contractuales durante la vigencia del contrato de obra N° PA-027-2025 a los cuales se realiza seguimiento:

Tabla 6 Entregables de la ejecución del componente gestión social

Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice	Actividades	Responsable
Metodología	Propuesta metodológica plan de gestión social	15 días calendario	elaboración del plan metodológico	Profesionales sociales del Contratista e Interventoría
			remisión datos para atención a la ciudadanía	
Lectura Territorial	Visita inicial a los puntos de intervención	8 días calendario posterior a la visita a los puntos	elaboración del directorio de actores	Profesionales sociales del Contratista e Interventoría
	Cartografía social	3 días calendario posterior al desarrollo de la actividad en cada punto	cartografía social	Profesionales sociales del Contratista e Interventoría
Comunicación y Divulgación	Reuniones de inicio	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Reuniones de inicio	Profesionales sociales del Contratista e Interventoría
	Reuniones de	3 días hábiles siguientes al	Reuniones de cierre	Profesionales sociales del

Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice	Actividades	Responsable
	cierre	desarrollo de la actividad		Contratista e Interventoría
	Reuniones extraordinarias	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Solo en caso de ser requeridas	Profesionales sociales del Contratista
	Volantes de inicio	3 días calendario previo desarrollo de la reunión	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	Profesionales sociales del Contratista
	Volantes de cierre	3 días calendario previo desarrollo de la reunión	Entrega de 100 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	Profesionales sociales del Contratista
	Afiches	3 días calendario previo al desarrollo de la reunión	Instalación de 10 unidades por punto mayor a 3 hectáreas	Profesionales sociales del Contratista
	Vallas	Durante la implementación	Instalación de -1 unidad por punto activo	Profesionales sociales del Contratista
	Talleres de sensibilización	3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con niños	Profesionales sociales del Contratista e Interventoría
		3 días hábiles siguientes al desarrollo de la actividad	Talleres de sensibilización con adultos	Profesionales sociales del Contratista e Interventoría
	Monitoreo de medios	Semanal y mensual en los reportes formales	Seguimiento a noticias relacionadas con el programa	Profesionales sociales del Contratista e Interventoría
Gestión humana y contratación de mano de obra	Certificados de residencia de entidades locales	10% del personal vinculado debe ser residente de la zona de influencia del proyecto su relación se detallará de manera semanal y mensual en los reportes formales	Gestión ante entidades locales para emisión de certificados de residencia del personal vinculado a la obra.	Profesionales sociales del Contratista

Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice	Actividades	Responsable
Acompañamiento social actividades técnicas en intervención	Inventario para actas	8 días calendario posterior a la visita a los puntos	Inventario para actas	Profesionales sociales del Contratista
	Actas de vecindad de inicio	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de inicio	Profesionales sociales del Contratista
	Actas de aceptación	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de aceptación	Profesionales sociales del Contratista
	Actas de entorno	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de entorno	Profesionales sociales del Contratista
	Actas de vecindad de cierre	2 días calendario después del levantamiento de la información	Actas de vecindad de cierre	Profesionales sociales del Contratista
	Registro fotográfico de los tramos intervenidos	Semanal y mensual en los reportes formales	Registro fotográfico de los tramos intervenidos	Profesionales sociales del Contratista
Atención de (PQRSD)	Registro de PQRSD	15 días calendario, posterior a la recepción de la PQRSD	Registro en el formato y entrega de respuesta a los peticionarios	Profesionales sociales de Contratista e Interventoría
Seguimiento y reportes	Participación en los comités de obra semanales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités de obra semanales	Profesionales sociales de Contratista e Interventoría
	Comités sociales	Semanal y mensual en los reportes formales	Comités sociales	Profesionales sociales de Contratista e Interventoría
	Mesas de trabajo	Semanal y mensual en los reportes formales	Mesas de trabajo	Profesionales sociales de Contratista e Interventoría
	Informe semanal	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe semanal	Profesionales sociales de Contratista e Interventoría

Programa	Producto	Tiempo de entrega de soportes según apéndice	Actividades	Responsable
	Informe mensual	Semanal y mensual en los reportes formales	Informe mensual	Profesionales sociales de Contratista e Interventoría
	Informe final	Una vez finalizado el proceso constructivo y acorde a lo determinado entre la Interventoría y el Contratista	Informe final	Profesionales sociales de Contratista e Interventoría

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

9. COMPONENTE DE LECTURA TERRITORIAL

El componente de Lectura Territorial que se encuentra inmerso en el documento contractual Apéndice E - Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas tiene como objetivo identificar de fuentes primarias las problemáticas viales que se presentan en los lugares donde se ejecutará el proyecto. De esta manera, el Contratista de obra a través de la caracterización y la cartografía social obtiene una mejor visión de los puntos de intervención, así como, las características de la población residente y transeúnte en los tramos que hacen parte de las implementaciones.

La Interventoría realiza seguimiento a la totalidad de las actividades programadas por el Contratista para su implementación bajo los parámetros requeridos por la ANSV, garantizando la adecuada atención y comunicación con la ciudadanía.

A continuación, se detallan las acciones para el cumplimiento de las obligaciones contractuales:

9.1. Recorrido de inicio para la identificación del área de influencia y elaboración del directorio de actores.

Para este periodo el contrato avanza en etapa de implementación de obra en puntos apropiados, sin embargo, se realizaron visitas de reconocimiento de los seis (6) puntos entregados por la ANSV localizados en los municipios de El Paujil, Puerto Rico y San José del Fragua, en el departamento del Caquetá, que se encontraban pendientes por ejecutar, es de aclarar que la programación de las visitas mencionadas se concertó previamente con el ente territorial.

De esta manera, a continuación, se detalla la actividad de visitas de reconocimiento en la tabla 7:

Tabla 7 Visitas de reconocimiento departamento del Caquetá

CONVENIO	ANSV-057-2024	**DEPARTAMENTO**	Caquetá
CODIGO	18256-002	**MUNICIPIO**	El Paujil
FECHA	15-09-2025		
UBICACIÓN / DIRECCION			
Carrera 4 con Calle 3			
CONVENIO	ANSV-057-2024	**DEPARTAMENTO**	Caquetá
CODIGO	18592-001	**MUNICIPIO**	Puerto Rico
FECHA	15-09--2025		
UBICACIÓN / DIRECCION			
Carrera 13 con Calle 6			
CONVENIO	ANSV-057-2024	**DEPARTAMENTO**	Caquetá
CODIGO	18610-004	**MUNICIPIO**	San José del Fragua
FECHA	16-09-2025		
UBICACIÓN / DIRECCION			
Carrera 5 con Calle 5			

CONVENIO	ANSV-057-2024	**DEPARTAMENTO**	Caquetá
CODIGO	18610-003	**MUNICIPIO**	San José del Fragua
FECHA	16-09-2025		
UBICACIÓN / DIRECCION			
Carrera 4 con Calle 4			
CONVENIO	ANSV-057-2024	**DEPARTAMENTO**	Caquetá
CODIGO	18610-002	**MUNICIPIO**	San José del Fragua
FECHA	16-09-2025		
UBICACIÓN / DIRECCION			
Calle 4 con Calle 3			
CONVENIO	ANSV-057-2024	**DEPARTAMENTO**	Caquetá
CODIGO	18610-001	**MUNICIPIO**	San José del Fragua
FECHA	16-09--2025		
UBICACIÓN / DIRECCION			
Carrera 4 Calle 5			

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Como soporte de las actividades en campo, el Contratista de obra por punto visitado cuenta con los siguientes formatos diligenciados:

- Registro de asistencia en el formato de la ANSV - Código: ANSV-GIP-FO-06
- Acta de visita de reconocimiento inicial durante la etapa de apropiación de los diseños priorizados en el marco de los convenios con los municipios beneficiarios del proyecto.

Ver Tabla de Anexos - Anexo 2 Actas de visita de apropiación

9.1.1. Visita preliminar y elaboración de directorio de actores.

- **Visita preliminar de identificación del área de influencia**

A la fecha, se han visitado los treinta y un (31) puntos priorizados por el programa Obras por la Vida - OPV en la zona 5. De los puntos visitados, once (11) han sido desapropiados, por lo cual se consideran viabilizados para este periodo veinte (20) puntos para ser implementados con la ejecución del contrato de obra PA-027-2025.

A continuación, en la tabla 7 se detalla el consolidado de visitas de apropiación del contrato, se presenta en color rojo los puntos desapropiados o No apropiados hasta la fecha: 52356-263 de Ipiales, 19532-001 de Patía, 19807-009 de Timbío, 19548-001 de Piendamó, 76001-014, 76001-022, 76001-019 de Cali, 18610-001, 18610-002, 18610-003, 18610-004 de San José del Fragua

Tabla 8 Consolidado de Visitas de apropiación realizadas al 13/10/2025

Departamento	Municipio	Código del punto	Fecha de visita de apropiación	Observaciones
Caquetá	San José del Fragua	18610-001 18610-002 18610-003 18610-004	16-09-2025	No apropiado
	Puerto Rico	18592-001	15-09-2025	Viabilizado, en proceso de firma del acta de apropiación
	El Paujil	18256-002	15-09-2025	Viabilizado, en proceso de firma del acta de apropiación
Cauca	Patía	19532-001	27-05-2025	Desapropiado
	Puerto Tejada	19573-001	18-06-2025	Viabilizado, con acta de apropiación

Departamento	Municipio	Código del punto	Fecha de visita de apropiación	Observaciones
	Timbío	19807-009	26-05-2025	Desapropiado
	Piendamó	19548-001 19548-008	26-05-2025	Desapropiado - Viabilizados, en estudio técnico del diseño. Requiere trámite de PMT con INVIAS
Huila	Gigante	41306-001 41306-002 41306-005	06-06-2025	Viabilizados con acta de apropiación
	Yaguará	41885-002 41885-003 41885-005	06-06-2025	Viabilizados, con acta de apropiación
	Palermo	41524-002 41524-006	05-06-2025	Viabilizados, con acta de apropiación
	Neiva	41001-006	04-06-2025	Viabilizado, con acta de apropiación
Nariño	Ipiales	52356-263 52356-268 52356-269	28-05-2025	– Desapropiado – Viabilizados, en proceso de firma del acta de apropiación
Valle del Cauca	Buga	76111-006	19-06-2025	Viabilizado, con compromisos de adecuación por parte del ente territorial
	Palmira	76520-004	19-05-2025	Viabilizado, con acta de apropiación
	Buenaventura	76109-001 76109-002	20-06-2025	Viabilizados, en proceso de firma del acta de apropiación. Requiere trámite de PMT con INVIAS
	Cali	76001-019 76001-014 76001-022 76001-012	20-05-2025 21-05-2025	– 3 puntos desapropiados Con compromisos de adecuación por parte del ente territorial.

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

- **Elaboración de directorios de actores:**

En las actividades de reconocimiento del área de influencia la Interventoría acompañó al Contratista en su gestión para realizar la verificación de las entidades locales, instituciones educativas, centros de salud, comerciantes, etc.,

presentes en el área de influencia de los puntos en fase de apropiación; como insumo para elaborar cada directorio de actores.

En el periodo del presente informe la Interventoría recibió consolidados de directorio de actores en el formato establecido por la Entidad 001OPV-CTA-NA-FOR-GEA-051-DirectorioActores-V0, como anexo del entregable Lectura Territorial para los puntos Yaguará 41885-002, 41885-003 y 41885-004, los cuales fueron revisados en SharePoint 2C que remitió el Contratista de obra, al corte del presente periodo estos Directorios no presentaron observaciones de parte de la Interventoría, su trazabilidad se describe a continuación en la Tabla 9.

Tabla 9 Desarrollo de directorios de actores del 14/09/2025 al 13/10/2025

Depto.	Municipio	Punto visitado	Estado D.A	N° de Actores registrados	Observación / Trazabilidad
Huila	Yaguará	41885-002	APROBADO pendiente cargue en SharePoint 3P	10	**10/10/2025** recibido enlace a SharePoint 2C **13/10/2025** sin observaciones de Interventoría
		41885-003	APROBADO pendiente cargue en SharePoint 3P	11	**10/10/2025** recibido enlace a SharePoint 2C **13/10/2025** sin observaciones de Interventoría
		41885-004	APROBADO pendiente cargue en SharePoint 3P	10	**10/10/2025** recibido enlace a SharePoint 2C **13/10/2025** sin observaciones de Interventoría
TOTAL, ENTREGAS REPORTADAS EN EL MES					**3**
ENTREGAS REPORTADAS EN EL PERIODO ANTERIOR					**12**
TOTAL, DIRECTORIOS ACUMULADOS EN EL PROYECTO					**15**

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Para el mes N°6 de ejecución se cuenta con 15 directorios de actores realizados y entregados por el Contratista de obra.

Por otra parte, al corte del 13 de octubre se recibieron los ajustes de los directorios de actores de los municipios que fueron observados por la profesional social de Interventoría en los periodos de los informes mensuales N° 3, 4 y 5**,** los cuales se encuentran aprobados por la interventoría e incorporados en las Lecturas Territoriales correspondientes, su trazabilidad se presenta más adelante, en la tabla 11 “Entregables de Lectura Territorial”. Es de aclarar que los directorios aprobados en este periodo de informe se encuentran cargados en el SharePoint 3P:

- Buga 76111-006 001OPV-CTA-ZO5-DAC-GSO-015-DirectorioVDCBUG-V001
- Puerto Tejada 19573-001001OPV-CTA-ZO5-DAC-GSO-008-DirectorioPTJ-V002
- Palermo 41524-002 001OPV-CTA-ZO5-DAC-GSO-010-DirectorioPLM002-V001
- Gigante 41306-001 001OPV-CTA-ZO5-DAC-GSO-006-DirectorioGGT001-V002


De esta manera, en la ejecución del contrato se cuenta con 12 Directorios de Actores aprobados y 3 Directorios de Actores para ser Subsanados por el Contratista de obra: Gigante 41306-002, 41306-005 y Palermo 41524-006

Nota: La Interventoría lleva registro mensual de los indicadores de cumplimiento teniendo como referencia el acumulado de 31 puntos con visita de reconocimiento y apropiación realizada para este proyecto, como se mencionó anteriormente, 11 de estos puntos fueron desapropiados o no viabilizados, por lo que para el presente periodo se evalúan los indicadores sobre 20 puntos priorizados para el programa Obras por la Vida OPV Zona 5.

✔ **Indicadores de cumplimiento**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° total de directorio de actores realizados durante el contrato (15) / N° de puntos visitados y viabilizados para implementación (20) *100	75%
PRODUCTIVIDAD	N° de directorio de actores realizados en el periodo para el Depto. Huila (3) / N° de directorio de actores requeridos en el Depto. Huila (3) *100	**100%**
RESULTADO	N° total de directorio de actores aprobados en el contrato (12) / N° total de puntos priorizados para el contrato (20) *100	60%

✔ **Gráficas de consolidado general de elaboración y aprobación de directorios de actores**

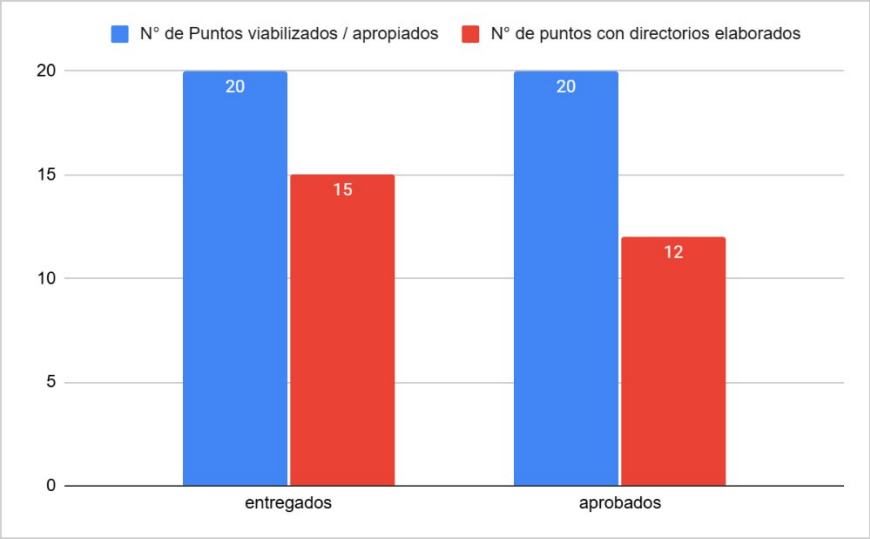


Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

En cuanto a la gestión del Contratista de obra, se registra el cumplimiento de 15 directorios de Actores elaborados y entregados a la Interventoría 75% sobre 20 puntos visitados y apropiados hasta el momento en visita de reconocimiento. En cuanto a indicadores de resultado, teniendo como base el total de 20 puntos que hasta la fecha se han viabilizado para el contrato, se da un porcentaje de cumplimiento de 60% por los 12 Directorios de Actores elaborados y aprobados por la Interventoría.

Nota: Para los indicadores de productividad se tiene en cuenta los directorios de actores realizados por departamento en el periodo reportado.

- ✔ **Gráfica de consolidado de elaboración de directorios de actores por Departamento**

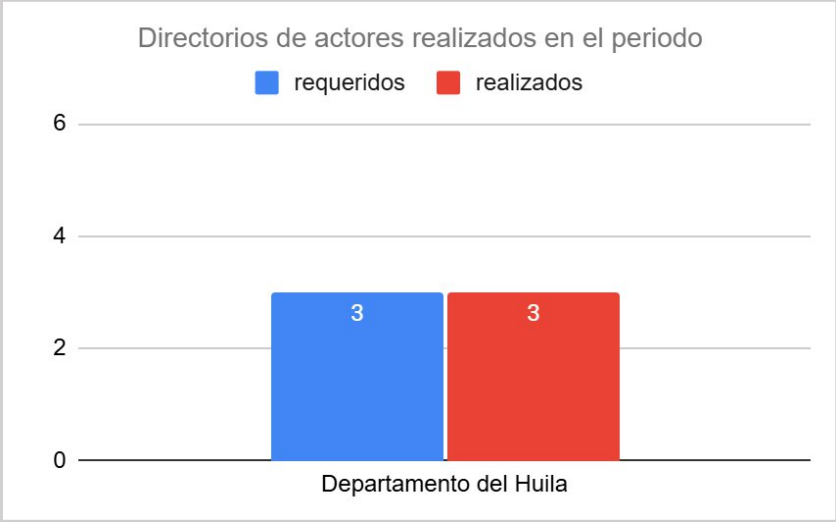

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Para el periodo reportado en este informe se presenta porcentaje de cumplimiento en productividad por departamentos del 100% en Huila con 3 directorio entregado de 3 requeridos

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista y Anexo 5 correspondencia enviada - trazabilidad.

Cumpliendo con las funciones de seguimiento, la Interventoría verifica y continuará registrando en los informes mensuales posteriores que el producto Directorio de Actores se encuentre relacionado en los informes mensuales del Contratista, con sus respectivas actualizaciones según la necesidad y dinámica del proyecto respondiendo a lo estipulado por el Contratista en su plan de gestión social, haciendo uso del formato entregado por la Entidad: 001OPV-CTA-NA-FOR-GEA-051-DirectorioActores-V0.

9.2. Cartografía Social

Para el período comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, el equipo social del Contratista no ejecutó actividades de Cartografía Social. De tal manera que el consolidado de Cartografía Social adelantadas durante la ejecución del contrato se mantiene en 14 puntos con esta actividad ejecutada, lo cual se resume en la siguiente tabla:

Tabla 10 Consolidado de Cartografía Social al 13/10/2025

Depto.	Municipio Cod. Punto	Fecha de realización	N° asistentes	Observación
TOTAL, CARTOGRAFÍAS REPORTADAS EN EL MES				0
CARTOGRAFÍAS REPORTADAS EN EL PERIODO ANTERIOR				14
TOTAL, CARTOGRAFÍAS ACUMULADAS EN EL PROYECTO				**14**

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Ver Tabla de anexos – Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista

9.3. Documento Lectura Territorial y Caracterización del área de influencia por punto viabilizado

El componente de Lectura Territorial establecido en el Apéndice E - Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas, tiene como objetivo identificar de fuentes primarias las problemáticas viales que se presentan en los lugares donde se ejecuta el programa Obras por la Vida -OPV. En cumplimiento de las funciones como Interventoría del Contrato de Obra No. PA-027-2025, la Interventoría realiza la revisión documental consignada en el documento entregable "Lectura Territorial" por cada uno de los puntos viabilizados para la implementación de la señalización vial.

Conforme a lo dispuesto en el Plan de Gestión Social v-2 del Contratista de obra - *Tabla 3 - Componente Lectura Territorial,* este entregable contiene: Caracterización, Directorio de actores y Cartografía social, los cuales consolidan la Lectura Territorial.

Para el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, el Contratista de obra radicó a la Interventoría el entregable Lectura Territorial de tres (3) puntos viabilizados: Yaguará 41885-002, 41885-003 y 41885-004, mediante correo electrónico con fecha 10 de octubre de 2025, al corte del periodo informado, 13 de octubre, estos entregables se encontraban en revisión de la Interventoría.

Ver Tabla de anexos – Anexo 1 IMS N°6 del Contratista- v2

Contando con las doce (12) Lecturas Territoriales entregadas hasta el periodo anterior (mes 5), este entregable tiene un acumulado para el contrato de quince (15) Lecturas Territoriales con revisión de la Interventoría, de los cuales nueve (9) entregables han sido aprobados durante el contrato, así:

Reportados en los informes de ejecución N° 3, 4 y 5

- Palmira 76520-004, Piendamó 19548-008, Ipiales 52356-268 / 52356-269, Neiva 41001-006

Aprobados en el periodo del presente informe N° 6 (ver Anexo 5 correspondencia enviada y trazabilidad)

- 23/09/2025 Buga 76111-006 enlace: 001OPV-CTA-ZO5-LTR-GSO-016-LecturaVDCBUG-V001
- 23/09/2025 Palermo 41524-002 enlace 001OPV-CTA-ZO5-LTR-GSO-011-LecturaPLM002-V002
- 03/10//2025 Gigante 41306-001 001OPV-CTA-ZO5-LTR-GSO-007-LecturaGGT001-V002
- 09/10/2025 Puerto Tejada 19573-001 001OPV-CTA-ZO5-LTR-GSO-009-LecturaPTJ-V003

Por otra parte, para el periodo del presente informe los restantes seis (6) entregables de Lectura Territorial se encuentran en atención de observaciones a cargo del contratista: Yaguará 41885-002/ 003/ 004, Gigante 41306-002 /005 y Palermo 41524-006

Nota: En la tabla de consolidado N° 11 se detalla la trazabilidad de los documentos Lectura Territorial radicados por el Contratista de obra junto con la trazabilidad correspondiente:

Tabla 11 Entregables de Lectura Territorial y Caracterización del área de influencia del 14/09/2025 al 13/10/2025

Departamento / Municipio		Punto visitado	Fecha y Radicado de entrega - v1	Observaciones de Interventoría	Fecha y Radicado de entrega - v2	Aprobación de la Interventoría
Huila	Yaguará	41885-002	10/10/2025 mediante correo electrónico	13/10/2025 en revisión de Interventoría	Pendiente	Pendiente
	Yaguará	41885-003	10/10/2025 mediante correo electrónico	13/10/2025 en revisión de Interventoría	Pendiente	Pendiente
	Yaguará	41885-004	10/10/2025 mediante correo electrónico	13/10/2025 en revisión de Interventoría	Pendiente	Pendiente
TOTAL, ENTREGAS REPORTADAS EN EL MES					3	
ENTREGAS REPORTADAS PERIODO ANTERIOR					12	
TOTAL, ENTREGADOS ACUMULADOS EN EL PROYECTO					**15**	

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN


Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista y Anexo 5 correspondencia enviada y trazabilidad

✔ **Indicadores de cumplimiento entregables de Lectura Territorial y caracterización del área de influencia por punto viabilizado**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° total de documentos "Lectura Territorial" realizados y entregados (15) / N° acumulado de puntos visitados y apropiados (20) *100	75%
PRODUCTIVIDAD	N° de documentos "Lectura Territorial" entregados en el periodo del Depto. Huila (3) / N° de documentos "Lectura Territorial" requeridos en el Depto. Huila (3) *100	100%
RESULTADO	N° total de puntos a intervenir con documentos "Lectura Territorial" aprobados (9) / N° total de puntos viabilizados y apropiados para el contrato (20) *100	45%

Nota: Para los indicadores de gestión se tiene en cuenta los documentos "Lectura territorial" realizados por el Contratista de obra y entregados a la Interventoría para revisión.

✔ **Gráficas de consolidado general de documentos de Lectura Territorial entregados y aprobados**

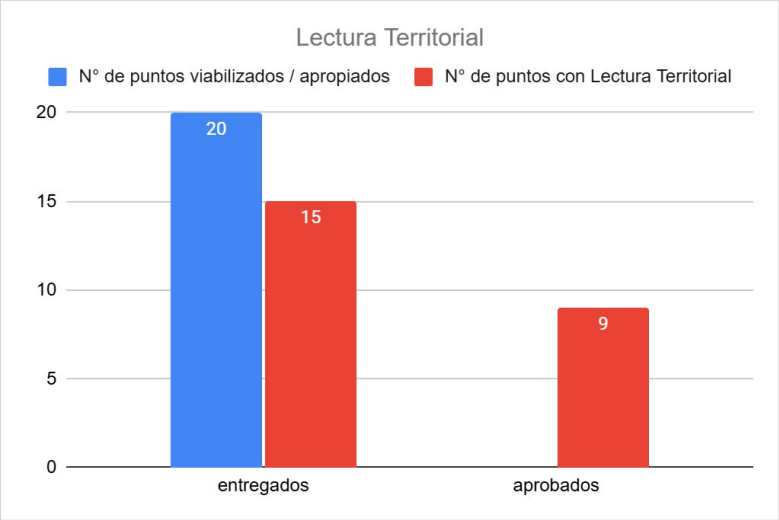


Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

En cuanto a la gestión del Contratista, se registra el cumplimiento de 15 documentos de Lectura Territorial entregados para revisión de la Interventoría con porcentaje de cumplimiento del 75% sobre 20 puntos apropiados para implementación hasta el momento. Respecto al indicador de resultado, teniendo como base el total de 20 puntos viabilizados para el programa Obras por la Vida - OPV de la Zona 5, se da un porcentaje de cumplimiento de 45% por la aprobación de 9 documentos de Lectura Territorial durante el contrato.

Nota: Para los indicadores de productividad se tiene en cuenta los documentos de Lectura Territorial entregados por el Contratista de obra a la Interventoría por cada departamento durante el periodo de reporte.

✔ **Gráfica de consolidado de entregables de Lectura Territorial de los puntos viabilizados por Departamento**

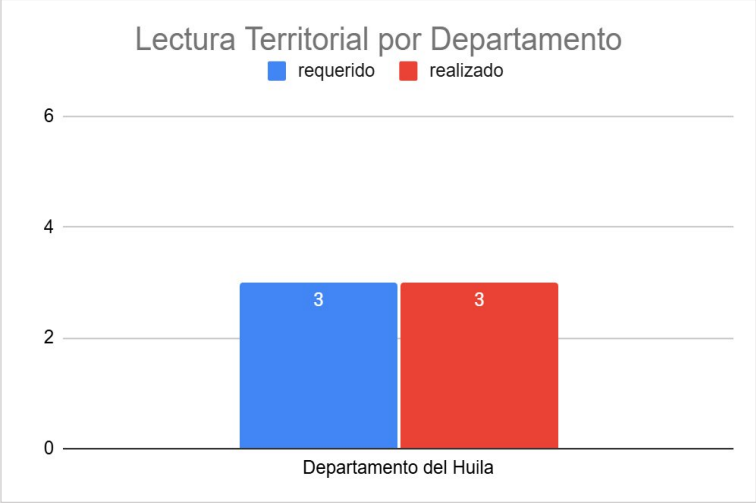

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

De acuerdo con lo descrito en la tabla 11, para este periodo se presenta porcentaje de cumplimiento en productividad por departamentos, con la entrega de documentos de Lectura territorial con un 100% en Huila con 3 Lecturas Territoriales de 3 requeridas.

10. COMPONENTE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Con el desarrollo de este componente se busca mantener informada a la comunidad de forma oportuna, eficaz y verás constantemente sobre el desarrollo de las implementaciones a realizar en cada uno de los puntos. La finalidad de este componente es lograr que el Contratista de obra entregue información a la comunidad tanto escrita como verbal siendo este el garante de la transparencia del proceso, a partir de la entrega de datos verídicos, oportunos y de primera mano.

10.1. Reuniones informativas

En el periodo del presente informe, el contrato continuó en etapa de implementación por lo que se realizaron las gestiones necesarias para el desarrollo de reuniones informativas dirigidas a la comunidad, en cumplimiento con los requerimientos previos al inicio de actividades de implementación de señalización vial. La Interventoría realizó seguimiento y acompañamiento a las actividades de *Reunión de Inicio y cierre* programadas por el Consorcio Fernac; estos espacios de socialización se gestionaron una vez se contó con acta de apropiación de los diseños y cronograma de implementación por parte del componente técnico del proyecto.

10.1.1. Reunión de inicio.

En cumplimiento del Apéndice E - Componente de Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas, se establece la realización de una reunión de inicio en la totalidad de los puntos viabilizados para ejecutar actividades de obra de señalización vial, esto con el fin presentar a la comunidad en general las implementaciones a realizar en cada uno de los puntos.

Previo al desarrollo de las reuniones de cierre la interventoría realizó revisión de la herramienta de apoyo visual a utilizar en la socialización:

- **Logística de medios visuales (Presentación PPT para socialización de inicio)**

Utilizando la plantilla de archivo Power Point de la Agencia para las reuniones de socialización con comunidad, se realizaron observaciones y ajustes a la presentación elaborada por el Contratista de obra para las reuniones de inicio de los municipios Gigante, Yaguará y Piendamó remitida posteriormente a la supervisión del proyecto para los avales respectivos, cuya trazabilidad de revisión y aprobación se describe a continuación en la tabla 12:

Tabla 12 Trazabilidad de presentaciones (PPT) de inicio, aprobadas en el periodo del 14/09/2025 al 13/10/2025

Depto.	Municipio / Cod. Punto	Fecha de entrega v--1	Observaciones de Interventoría	Fecha de entrega - v2	Fecha de remisión a la ANSV	Observaciones y/o Aprobación de la ANSV
Huila	Gigante 41524-002 y 41524-005	15/09/2025 Correo electrónico del CO	15/09/2025 en Correo electrónico	16/09/2025 ajustado, en correo electrónico	16/09/2025 mediante correo electrónico de INT	16/09/2025 recibo y aprobación de ANSV en correo electrónico
			Enlace en SharePoint 3P: 001OPV-CTA-ZO5-PST-GSO-010-PresentacionGGT002y005-V002.pptx			
	Gigante 41524-001	15/09/2025 Correo electrónicod el CO	15/09/2025 en Correo electrónico	16/09/2025 en correo electrónico, con ajustes	16/09/2025 en correo electrónico de INT	16/09/2025 recibo y aprobación de ANSV en correo electrónico.
			Enlace en SharePoint 3P: 001OPV-CTA-ZO5-PST-GSO-009-PresentacionGGT001-V002.pptx			
Cauca	Piendamó 19548-008	29/09/2025 Correo electrónico del CO	29/09/2025 en Correo electrónico	29/09/2025 ajustado, en correo electrónico	29/09/2025 mediante correo electrónico de INT	30/09/2025 recibo y aprobación de ANSV en correo electrónico.
			001OPV-CTA-ZO5-PST-GSO-012-PresentaciónInicioPDM008-V002.pptx			
Huila	Yaguará 41885-002 41885-003 y	07/10/2025 Correo electrónico	09/10/2025 Correo electrónico	09/10/2025 ajustado, en correo electrónico	10/10/2025 Correo electrónico	10/10/2025 Correo electrónico

Depto.	Municipio / Cod. Punto	Fecha de entrega v--1	Observaciones de Interventoría	Fecha de entrega - v2	Fecha de remisión a la ANSV	Observaciones y/o Aprobación de la ANSV
	41885-004	del CO	**Enlace en SharePoint 3P:** 001OPV-CTA-ZO5-PST-GSO-015-PresentaciónInicioHUI-YGR002-003-004-V002.pptx			
TOTAL, PRESENTACIONES DE CIERE REPORTADAS EN EL MES					**4**	

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Ver Tabla de anexos - Anexo 5 correspondencia enviada, trazabilidad

- **Socialización de inicio de obra a la comunidad**

Durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, se llevaron a cabo reuniones de inicio en los municipios priorizados de Gigante (41306-001 / 002 y 005), Piendamó 19548-008 y Yaguará (41885-002 / 003 y 004):

Tabla 13 Reuniones de Inicio realizadas del 14/09/2025 al 13/10/2025

Depto.	Municipio / Cod. Punto	Fecha de reunión	N° de Asistentes	N° de PQRSD	Soportes de la reunión - Trazabilidad
Huila	Gigante 41524-002	18/09/2025	15	0	No remitidos por el contratista
	Gigante 41524-005	18/09/2025	18	0	No remitidos por el contratista
	Gigante 41524-001	20/09/2025	22	0	No remitidos por el contratista
Cauca	Piendamó 19548-008	03/10/2025	16	0	No remitidos por el contratista
Huila	Yaguará 41885-002	13/10/2025	10	0	No remitidos por el contratista
	Yaguará 41885-003		10	0	No remitidos por el contratista
	Yaguará 41885-004		10	0	No remitidos por el contratista
TOTAL, ASISTENTES					**101**
TOTAL, SOCIALIZACIONES DE INICIO REPORTADAS EN EL MES					**7**
SOCIALIZACIONES DE INICIO REPORTADAS PERIODO ANTERIOR					8
TOTAL, SOCIALIZACIONES DE INICIO ACUMULADAS EN EL PROYECTO					**15**

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Contando con las ocho (8) socializaciones de inicio realizadas en periodos anteriores, al corte del 13 de octubre se tiene un acumulado de quince (15) socializaciones de inicio ejecutadas para el proyecto.

En cuanto a los soportes de las siete (7) socializaciones, el Contratista de obra no radicó en este periodo los correspondientes a lo ejecutado entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, sin embargo, remitió mediante correos electrónicos actas de reuniones subsanadas, las cuales constituyen los entregables de soporte de socializaciones de inicio realizadas en periodos anteriores (mes 3 y mes 4), su trazabilidad para el presente periodo, mes 6 de ejecución, se describe a continuación:

- Palermo 41524-002: 17/09/2025 remitido con ajustes por el CO // 19/09/2025 verificado y aprobado por interventoría. **Enlace**: 001OPV-CTA-ZO5-AIO-GSO-003-Palermo002-V002
- Palermo 41524-006: 17/09/2025 remitido con ajustes por el CO // 20/09/2025 verificado y aprobado por interventoría. **Enlace** 001OPV-CTA-ZO5-AIO-GSO-004-Palermo006-V002
- Ipiales 52356-269: 16/09/2025 remitido con ajustes por el CO // 18/09/2025 verificado y aprobado por Interventoría y se solicita registro fotográfico para firma // 20/09/2025 // CO adjunta formato de registro fotográfico y se firma por parte de Interventoría .**Enlace:** 001OPV-CTA-ZO5-AIO-GSO-002-Ipiales269-V001
- Neiva 41001-006: 25/09/2025 remitido con ajustes por el CO // 29/09/2025 verificado y aprobado por interventoría. **Enlace**: 001OPV-CTA-ZO5-AIO-GSO-005-ReunionInicioHuiNVA-V001


✔ **Indicadores de cumplimiento entregables de Reunión de inicio por punto viabilizado**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTION	N° total de socializaciones de inicio realizadas durante el periodo (7) / N° de puntos requeridos para socialización por inicio de implementación de señalización en el periodo (7) *100	100%
PARTICIPACION	N° de asistentes a la socialización de inicio del punto Gigante -002 (15) / N° de convocados para la socialización (100) *100	15%
	N° de asistentes a la socialización de inicio del punto Gigante -005 (18) / N° de convocados para la socialización (100) *100	18%
	N° de asistentes a la socialización de inicio del punto Gigante -001 (22) / N° de convocados para la socialización (100) *100	22%
	N° de asistentes a la socialización de inicio del punto Piendamó -008 (16) / N° de convocados para la socialización (100) *100	16%
	N° de asistentes a la socialización de inicio del punto Yaguará 002 (10) / N° de convocados para la socialización (60) *100	17%
	N° de asistentes a la socialización de inicio del punto Yaguará 003 (10) / N° de convocados para la socialización (60) *100	17%

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
	N° de asistentes a la socialización de inicio del punto Yaguará 004 (10) / N° de convocados para la socialización (60) *100	17%
PRODUCTIVIDAD	N° total de socializaciones de inicio realizadas del Depto. Cauca (1) / N° de puntos apropiados para implementación en el Depto. Cauca (1) *100	100%
	N° total de socializaciones de inicio realizadas del Depto. Huila (6) / N° de puntos apropiados para implementación en el Depto. Cauca (6) *100	100%
RESULTADO	N° total de puntos a intervenir con reunión de inicio realizada en el contrato (15) / N° total de puntos viabilizados y apropiados para el contrato (20) *100	75%
	N° total de puntos con actas de reunión de inicio aprobadas durante el contrato (7) / N° total de puntos viabilizados y apropiados para el contrato (20) *100	35%

Nota: Para los indicadores de resultado se tiene en cuenta el número total de socializaciones de inicio realizadas durante el contrato y el número total de puntos con acta de socialización de inicio aprobada, sobre el total de puntos viabilizados:


✔ **Gráfica de consolidado de socializaciones y actas de inicio al 13 de octubre de 2025**

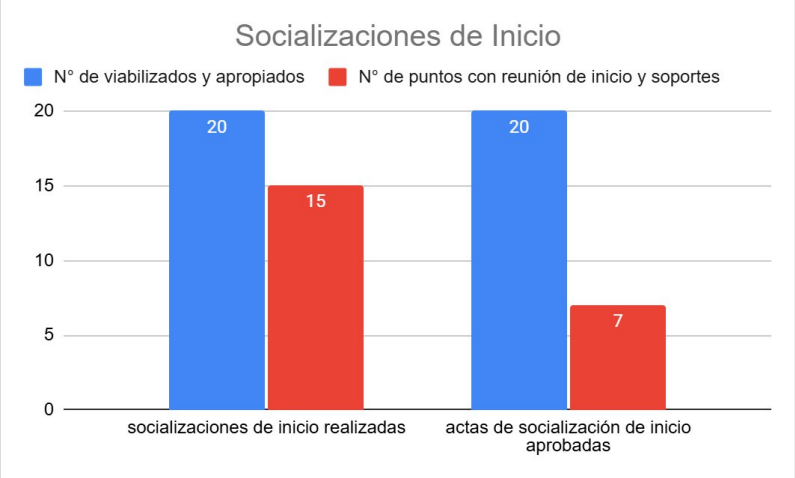

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Se cuenta con un 75% de cumplimiento en la realización de socializaciones de inicio, sin embargo, el porcentaje de cumplimiento de soportes de reunión entregados y aprobados (acta de reunión, listado de asistencia, registro fotográfico) se encuentra en 35% ya que, terminado el corte del periodo, el Contratista de obra no hizo entrega de todas las actas de reunión que se ejecutaron durante el contrato.


✔ **Gráfica de participación de la comunidad en socializaciones del periodo**

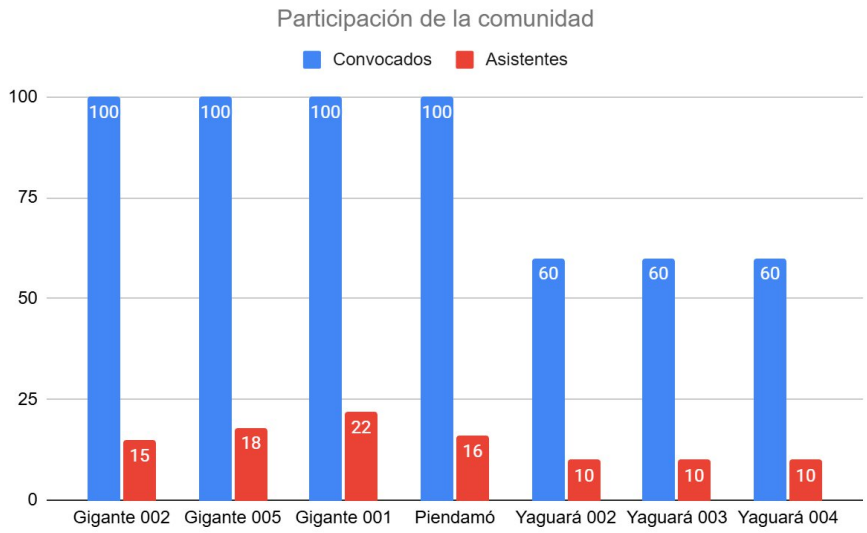

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

El indicador de participación en la socialización de inicio para este periodo muestra porcentajes de cumplimiento entre el 15% y 22% lo cual se considera bajo respecto a la convocatoria realizada mediante entrega física de volantes de invitación, aunque se resalta que se ha cumplido con el mínimo de quórum establecido por la entidad para reuniones con comunidad.

✔ **Gráfica de socializaciones del periodo, por Departamento**

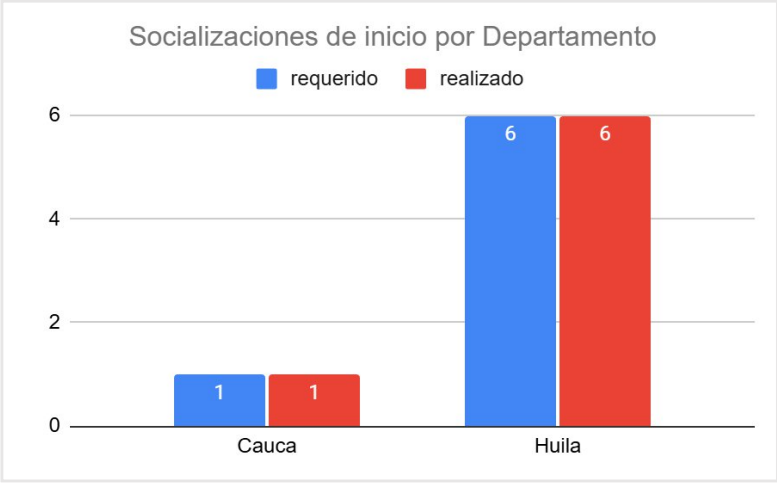

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Con la realizacion de las socializaciones de inicio reportadas en este perido, se dió alcance al 100% de socializaciones previas a la implementación de señalización requeridas para los departamentos del Huila y Cauca.

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista

- **Nota: Solicitud de medidas flexibles para el municipio de Yaguará**

Se resalta que, para el municipio de Yaguará se gestionó ante la ANSV la solicitud de aplicar medidas flexibles para el mínimo requerido de quórum, entrega de volantes de convocatoria, valla móvil y talleres de sensibilización en seguridad vial; esto debido a que los tres (3) puntos se encuentran contiguos y que los líderes del área de influencia han manifestado experiencias con poca participación de la comunidad en convocatorias del municipio. Dicha gestión se soporta con los comunicados oficiales del Contratista, Interventoría y la ANSV, con la siguiente trazabilidad:

- **16/09/2025** el Contratista de obra remitió solicitud de ajustes respecto al Apéndice E, para el municipio de Yaguará, en comunicado 2025-CF-OF-159
- **18/09/2025** la Interventoría remitió análisis y propuesta de flexibilización a la entidad ANSV, con el fin de que pudiera evaluarse la solicitud del Contratista de obra de ajustes respecto al Apéndice E,para el municipio de Yaguará, mediante comunicado 2025-IN022-2937
- **23/09/2025** la ANSV emitió respuesta a lo solicitado informando viabilidad de la propuesta de flexibilización de número de volantes por punto (60), número de talleres para los puntos (4 con NNA y 1 con Adultos), unificación de valla móvil y quórum de 10 personas para reuniones, mediante Radicado No. 20253000093841
- **29/09/2025** la profesional social de Interventoría presentó al equipo social lo concluido con la solicitud realizada para las actividades sociales por realizar en los puntos de Yaguará, las cuales se proyectaron para remitir al Contratista de obra en comunicado oficial posteriormente.

Ver Tabla de Anexos - Anexo 5 correspondencia enviada y trazabilidad

10.1.2. Reunión de cierre.

Desde el Apéndice E Componente de Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas, se establece que el Contratista de obra debe desarrollar reunión de socialización de cierre de las actividades desarrolladas en cada punto apropiado en la ejecución del programa Obras por la Vida - OPV de la Zona 5, esta actividad se debe realizar en la totalidad de puntos intervenidos.

Previo al desarrollo de las reuniones de cierre la interventoría realizó revisión de la herramienta de apoyo visual a utilizar en la socialización:

- **Logística de medios visuales (Presentación PPT)**

Utilizando la plantilla de archivo Power Point de la Agencia para las reuniones de socialización de cierre con comunidad, se realizaron observaciones y ajustes a las presentaciones elaboradas por el Contratista de obra para tres (3) reuniones de cierre: Palermo 41524-002, 41524-006 y Puerto Tejada 19573-001, remitida posteriormente a la supervisión del proyecto para los avales respectivos, el consolidado de trazabilidad se describe a continuación:

Tabla 14 Trazabilidad de presentaciones(ppt) de cierre, aprobadas en el periodo del 14/09/2025 al 13/10/2025

Depto.	Municipio / Cod. Punto	Fecha de entrega v--1	Observaciones de Interventoría	Fecha de entrega - v2	Fecha de remisión a la ANSV	Observaciones y/o Aprobación de la ANSV
Huila	Palermo 41524-002	29/09/2025 Correo electrónico	01/10/2025 Correo electrónico	01/10/2025 Correo electrónico	02/10/2025 Correo electrónico	02/10/2025 Recibo y aprobación en correo electrónico
			Enlace en SharePoint 3P: 001OPV-CTA-ZO5-PST-GSO-013-PresentaciónCierrePLM002-V002.pdf			
	Palermo 41524-006	29/09/2025 Correo electrónico	01/10/2025 Correo electrónico	01/10/2025 Correo electrónico	02/10/2025 Correo electrónico	02/10/2025 Recibo y aprobación en correo electrónico
			Enlace en SharePoint 3P: 001OPV-CTA-ZO5-PST-GSO-014-PresentaciónCierrePLM006-V002.pdf			
Cauca	Puerto Tejada 19573-001	28/09/2025 Correo electrónico	29/09/2025 Correo electrónico	29/09/2025 Correo electrónico	29/09/2025 Correo electrónico	29/09/2025 En revison de la Supervisión
			Enlace en SharePoint 3P: 001OPV-CTA-ZO5-PST-GSO-011-PresentaciónCierrePTJ-V002.pptx			
TOTAL, PRESENTACIONES DE CIERE REPORTADAS EN EL MES			**3**			

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Ver Tabla de anexos - Anexo 5 correspondencia enviada, trazabilidad

- **Socialización de cierre de obra a la comunidad**

En el periodo del presente informe se realizaron reuniones de socialización de cierre con la comunidad de los puntos Palermo 41524-002, 41524-006 y Puerto Tejada 19573-001 logrando para el registro de asistencia, el quórum requerido por parte de la comunidad, dichas socializaciones contaron con el acompañamiento de Interventoría, autoridad municipal y líderes. El Contratista de obra remitió a la interventoría acta de reunión con los soportes correspondientes, en la tabla siguiente se relaciona la trazabilidad:

Tabla 15 Reuniones de Cierre realizadas del 14/09/2025 al 13/10/2025

Depto.	Municipio / Cod. Punto	Fecha de reunión	N° de Asistentes	N° de PQRSD	Soportes de la reunión - Trazabilidad
Huila	Palermo 41524-002	03/10/2025	19	0	**06/10/2025** Acta y anexos radicados por el CO en 2C **08/10/2025** Observacionesde INT en editable 2C **09/10/2025** Ajustes del Contratista **09/10/2025** Aprobación de Interventoría
			Enlace:001OPV-CTA-ZO5-ARE-GSO-024-ReunionCierreHUI-PLM002-V002		
	Palermo 41524-006	03/10/2025	16	0	**06/10/2025** Acta y anexos radicados por el CO en 2C **08/10/2025** Observacionesde INT en editable 2C **09/10/2025** Ajustes del Contratista **09/10/2025** Aprobación de Interventoría
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ARE-GSO-025-ReunionCierreHUI-PLM006-V002		
Cauca	Puerto Tejada 19573-001	03/10/2025	18	0	**05/10/2025** Acta y anexos radicados por el CO en 2C **06/10/2025** Observacionesde INT en editable 2C **06/10/2025** Ajustes del Contratista **07/10/2025** Aprobación de Interventoría
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ARE-GSO-019-ReunionCierreCUC-PTJ-V001		

Total, Asistentes	**53**
TOTAL, SOCIALIZACIONES DE CIERRE REPORTADAS EN EL MES	3
SOCIALIZACIONES DE CIERRE REPORTADAS EN EL PERIODO ANTERIOR	1
TOTAL, SOCIALIZACIONES DE CIERRE ACUMULADAS EN EL PROYECTO	**4**

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 y Anexo 5 correspondencia enviada, trazabilidad


✔ **Indicadores de cumplimiento entregables de Socialización de Cierre por punto implementado**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTION	N° total de socializaciones de cierre realizadas durante el periodo (3) /	100%

	N° de puntos requeridos para socialización por terminación de implementación de señalización en el periodo (3) *100	
PARTICIPACION	N° de asistentes a la socialización de cierre del punto Palermo 41524-002 (19) / N° de convocados para la socialización (100) *100	19%
	N° de asistentes a la socialización de cierre del punto Palermo 41524-006 (16) / N° de convocados para la socialización (100) *100	16%
	N° de asistentes a la socialización de cierre del punto Puerto Tejada 19573-001 (18) / N° de convocados para la socialización (100) *100	18%
PRODUCTIVIDAD	N° total de socializaciones de cierre realizadas del Depto. Huila (2) / N° de puntos apropiados para implementación en el Depto. Huila (9) *100	22,2%
	N° total de socializaciones de cierre realizadas del Depto.Cauca (1) / N° de puntos apropiados para implementación en el Depto. Cauca (2) *100	50%
RESULTADO	N° total de puntos a intervenir con socialización de cierre en el contrato (4) / N° total de puntos apropiados para implementación en el contrato (20) *100	20%
	N° total de puntos con actas de reunión de cierre aprobadas en el contrato (4) / N° total de puntos con apropiados para implementación en el contrato (20) *100	20%

Nota: Para los indicadores de gestión se tiene en cuenta el total de reuniones de socialización de cierre realizadas por el contratista con relación al total de con actividades de implementación (obra) terminada. En cuanto a los indicadores de productividad se tiene en cuenta el número total de socializaciones realizadas por cada departamento del programa Obras por la Vida OPV - Zona 5.


✔ **Gráfica de socializaciones de cierre requeridas en el periodo y por Departamento**

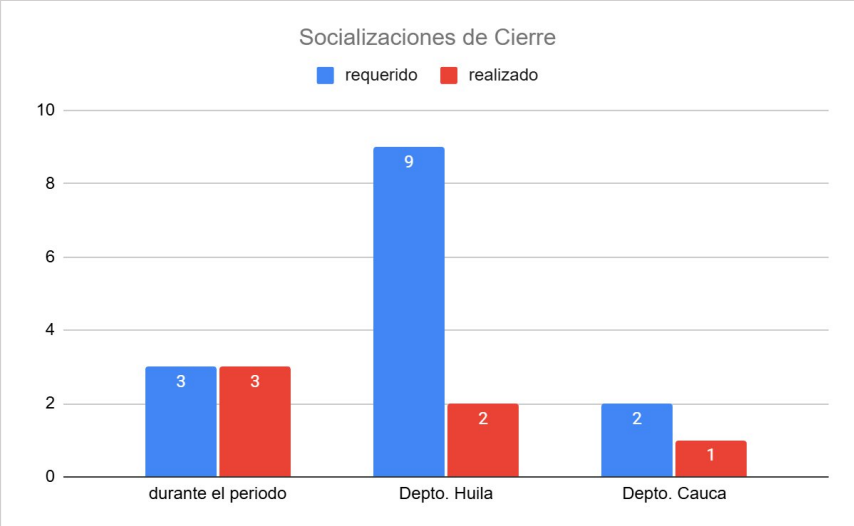

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Al cierre del periodo reportado en este informe se tiene un porcentaje de cumplimiento del 100% de gestión de reuniones de socialización de cierre sobre tres (3) puntos con implementación de señalización finalizada, con indicador de productividad del 22,2% que corresponde a dos (2) socialización realizada de nuve (9) requeridas para el Departamento del Huila y del 50% con una (1) socializacion realiada de dos (2) requeridas para el Departamento del Cauca.

- ✔ **Gráfica de participación en las socializaciones de cierre requeridas en el periodo**

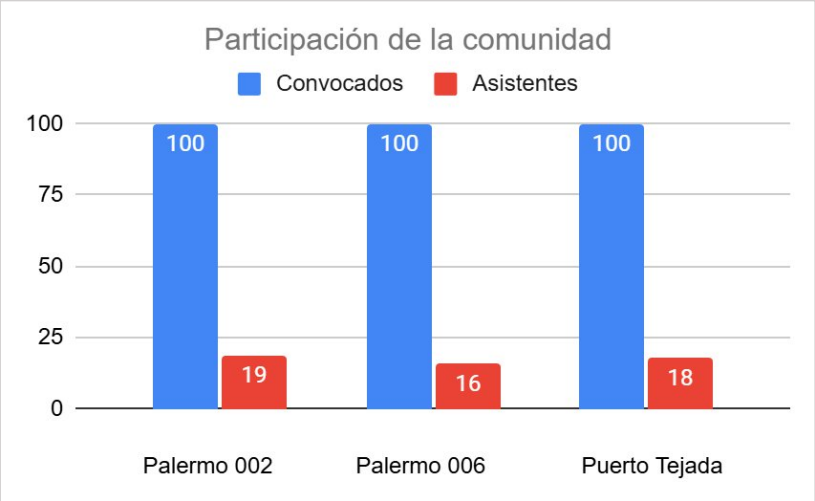


Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

El indicador de participación en las tres (3) socializaciones de cierre para este periodo muestra porcentajes entre el 16% y el 19% lo cual se considera bajo respecto a la convocatoria realizada mediante entrega física de volantes de invitación, aunque se resalta que se ha cumplido con el mínimo de quórum establecido para reuniones con comunidad.

Nota: Para los indicadores de resultado se tiene en cuenta el número total de socializaciones de cierre realizadas durante el contrato y el número total de puntos con acta de socialización de cierre aprobada, sobre en número total de socializaciones de cierre realizadas:

- ✔ **Gráfica consolidada de socializaciones de cierre realizadas durante el contrato al 13 de octubre de 2025**

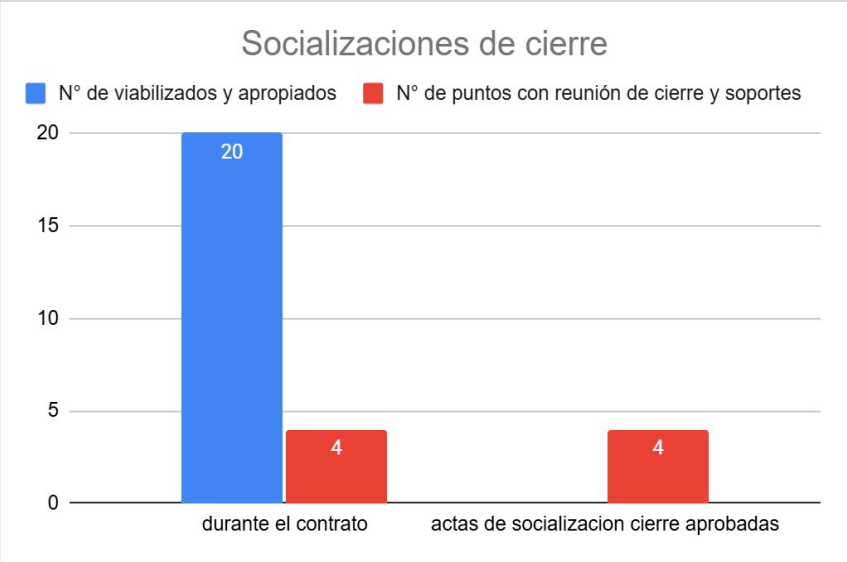

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Teniendo en cuenta el total de veinte (20) puntos viabilizados para implementación, se cuenta con un 20% de cumplimiento en la ejecución de socializaciones de cierre, lo que corresponde a cuatro (4) socializaciones con comunidad realizada al término de las actividades de obra; los soportes de estas reuniones fueron entregados por el contratista y cuentan con aprobación de interventoría por lo que su indicador de resultado se evalúa con cumplimiento del 20%.

10.1.3. Reuniones extraordinarias

En el periodo del presente informe no se realizaron actividades relacionadas con reuniones informativas extraordinarias con la comunidad de los puntos viabilizados.

10.2. Volantes

Para la convocatoria a las reuniones de socialización con comunidad el Contratista de obra debe elaborar, producir y distribuir 100 volantes para convocar a las reuniones de cada uno de los puntos a implementar. A partir del diseño final de las piezas que remitió el Contratista vía correo electrónico, esta Interventoría revisó y/o observó el material, posteriormente en correo electrónico se remitieron las piezas a la supervisión de la ANSV, para su revisión y aprobación. De esta manera, la trazabilidad de revisión y aprobación del material se desglosa más adelante en la tabla 19.

- ***Convocatoria para socialización de inicio***

En el periodo del presente informe, 14 de septiembre al 13 de octubre de 2025, se reportan a continuación los volantes para convocatoria a reunión de inicio requeridas dentro del periodo:

Tabla 16 Consolidado de volantes de convocatoria a reunión de inicio entregados a la comunidad al 13/10/2025

Tipo de pieza	Municipio / Cod. punto	Lugar de Entrega	Fecha de entrega	Cantidad	Fecha de reunión
Volante Reunión de inicio	Gigante 41306-001	Área de influencia	17/09/2025	100	**20/09/2025**
Volante Reunión de inicio	Gigante 41306-002	Área de influencia	15/09/2025	100	**18/09/2025**
Volante Reunión de inicio	Gigante 41306-005	Área de influencia	15/09/2025	100	**18/09/2025**
Volante Reunión de inicio	Piendamó 19548-008	Área de influencia	30/09/2025	100	**03/10/2025**
Volante Reunión de inicio	Yaguará 41885-002	Área de influencia	11/10/2025	60	**13/10/2025**
Volante Reunión de inicio	Yaguará 41885-003	Área de influencia	11/10/2025	60	**13/10/2025**
Volante Reunión de inicio	Yaguará 41885-004	Área de influencia	11/10/2025	60	**13/10/2025**
TOTAL, REPORTADO EN EL MES				580	
REPORTADOS EN EL PERIODO ANTERIOR				800	
TOTAL, VOLANTES DE INICIO ACUMULADOS EN EL PROYECTO				**1380**	

Fuente: Formato Registro de Divulgación – Consorcio Fernac

Se evalúa la oportunidad de entrega de las piezas de convocatoria a la comunidad conforme a lo establecido en el apéndice E Componente de Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas - 5.2.1.2 Actividades y productos entregables : *"El (la) profesional social del Contratista deberá convocar a la comunidad con al menos tres (3) días calendario de anterioridad"*, para ello en la tabla anterior se encuentra la columna Fecha de reunión, demarcada con seguimiento tipo semáforo, lo que permite identificar el estado de cumplimiento de convocatorias anticipadas. La interventoría solicitó al equipo social contar con los tiempos de anticipación suficientes para gestionar las piezas de comunicacion, de tal manera que la convocatoria la realice en los tiempos indicados.

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 y Anexo 5 correspondencia enviada, trazabilidad


✔ **Indicadores de cumplimiento**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° total de volantes aprobados para reunión de inicio en el periodo (7) / N° de volantes tramitados para reunión de inicio en el periodo (7) *100	100%

	N° total de convocatorias realizadas dentro del tiempo requerido (4) / N° de volantes tramitados para reunión de cierre en el periodo (7) *100	57%
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de inicio entregados en el periodo (580) / N° de volantes de inicio programados para entrega en el periodo (580) *100	100%
RESULTADO	N° de volantes de inicio entregados en el contrato (1380) N° de volantes de cierre requeridos en el contrato para el total de puntos viabilizados y apropiados para el contrato (1880) *100	73%

Nota: Para los indicadores de gestión se tiene en cuenta el número de volantes que se aprobaron en el periodo del informe para la realización de la socialización de cierre y la convocatoria realizada dentro de los tiempos requeridos.

- ✔ **Gráfica de consolidado de volantes de inicio aprobados y convocatorias realizadas al 13 de octubre de 2025**

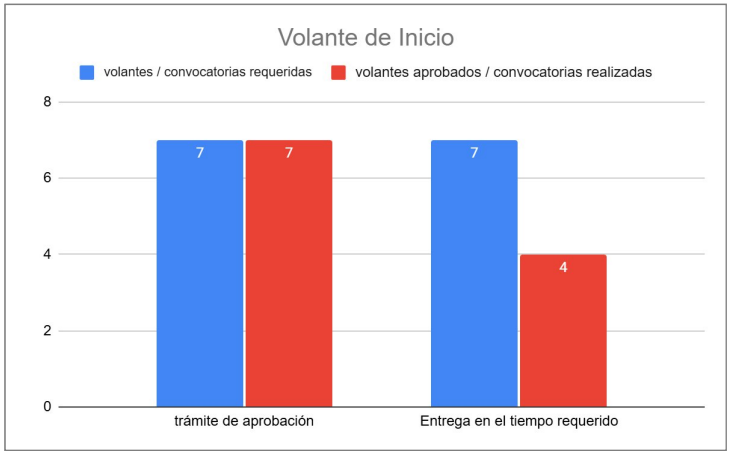


Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Para este periodo, el Contratista cumplió con el 100% de los trámites para aprobación de volantes de convocatoria a las reuniones de cierre programadas entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025; el indicador de convocatoria se encuentra en un 57% de cumplimiento dado que realizó la entrega del volante de invitación fuera del tiempo mínimo establecido para los puntos de Yaguará.

Nota: El indicador de productividad tiene en cuenta el número de volantes distribuidos para la realización de las socializaciones de inicio programadas por el Contratista de obra al corte del 13 de octubre de 2025 y el total de volantes de convocatoria que se requiere entregar para el contrato:

- ✔ **Gráfica de consolidado de volantes de cierre entregados a la comunidad.**

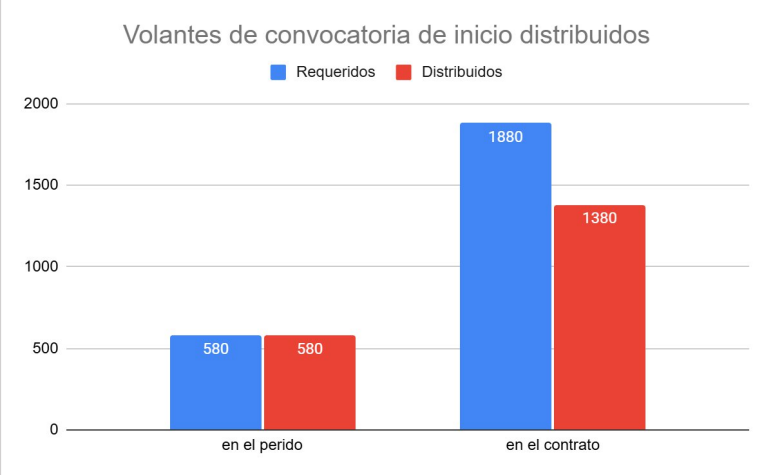

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Se encuentra cumplido con 100% el indicador de aprobación del volante de cierre para el periodo del reporte, Mientras que cumple con el 73% de los volantes entregados para la socialización de inicio de la implementación esperada en todos los puntos del contrato.

- ***Convocatoria para socialización de cierre***

En el periodo del presente informe, 14 de septiembre al 13 de octubre de 2025, se reporta la convocatoria a reunión de cierre de los puntos implementados en Puerto Tejada y Palermo, como se enuncian a continuación en la tabla 17:

Tabla 17 Consolidado de volantes de convocatoria a reunión de cierre entregados a la comunidad al 13/10/2025

Tipo de pieza	Municipio / Cod. punto	Lugar de Entrega	Fecha de entrega	Cantidad	Fecha de reunión
Volante Reunión de cierre	Puerto Tejada 19573-001	Área de influencia	30/09/2025	100	**03/10/2025**
Volante Reunión de cierre	Palermo 41524-002	Área de influencia	02/10/2025	100	**03/10/2025**
Volante Reunión de cierre	Palermo 41524-006	Área de influencia	02/10/2025	100	**03/10/2025**
TOTAL, REPORTADO EN EL MES				300	
REPORTADOS PERIODO ANTERIOR				100	
TOTAL, VOLANTES DE CIERRE ACUMULADO EN EL PROYECTO				**400**	

Fuente: Formato Registro de Divulgación – Consorcio Fernac

Se evalúa la oportunidad de entrega de las piezas de convocatoria a la comunidad conforme a lo establecido en el apéndice E Componente de Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas - 5.2.1.2 Actividades y productos

entregables : *"El (la) profesional social del Contratista deberá convocar a la comunidad con al menos tres (3) días calendario de anterioridad"*, para ello en la tabla anterior se encuentra la columna Fecha de reunión, demarcada con seguimiento tipo semáforo, lo que permite identificar el estado de cumplimiento de convocatorias anticipadas. La interventoría solicitó al equipo social del contratista de obra cumplir con los tiempos de convocatoria a la comunidad.


Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 y Anexo 5 correspondencia enviada, trazabilidad

✔ **Indicadores de cumplimiento**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° total de volantes aprobados para reunión de cierre en el periodo (3) / N° de volantes tramitados para reunión de inicio en el periodo (3) *100	100%
	N° total de convocatorias realizadas dentro del tiempo requerido (1) / N° de volantes tramitados para reunión de cierre en el periodo (3) *100	33,3%
PRODUCTIVIDAD	N° de volantes de cierre entregados en el periodo (300) / N° de volantes de cierre programados para entrega en el periodo (300) *100	100%
RESULTADO	N° de volantes de cierre entregados en el contrato (400) N° de volantes de cierre requeridos en el contrato para el total de puntos viabilizados y apropiados para el contrato (1880) *100	21%

Nota: Para los indicadores de gestión se tiene en cuenta el número de volantes que se aprobaron en el periodo del informe para la realización de la socialización de cierre y la convocatoria realizada dentro de los tiempos requeridos.

✔ **Gráfica de consolidado de volantes de cierre aprobados y convocatorias realizadas al 13 de octubre de 2025**

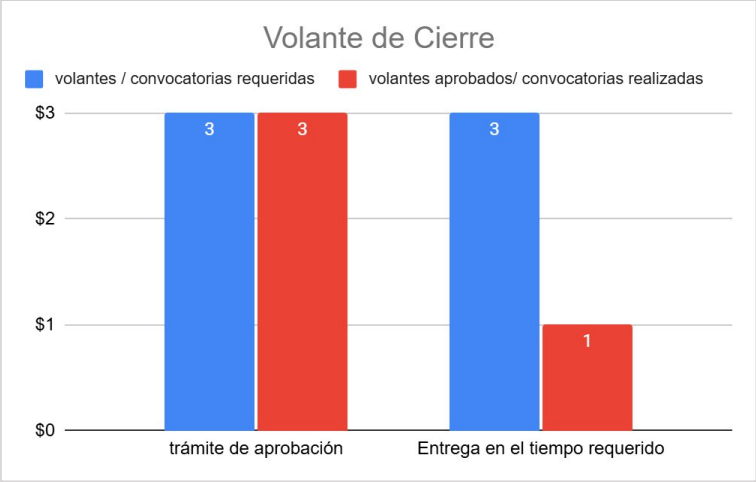


Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Para este periodo, el Contratista de obra cumplió con el 100% de los trámites para aprobación de volantes de convocatoria a las reuniones de cierre programadas entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre; el indicador de convocatoria se encuentra en un 33,3% de cumplimiento dado que realizó la entrega de volantes de invitación fuera del tiempo mínimo establecido para los puntos de Palermo 002 y 006.

Nota: El indicador de productividad tiene en cuenta el número de volantes distribuidos para la realización de las socializaciones de cierre programadas al corte del 13 de octubre de 2025 y el total de volantes de convocatoria que se requiere entregar para el contrato:

✔ **Gráfica de consolidado de volantes de cierre entregados a la comunidad.**

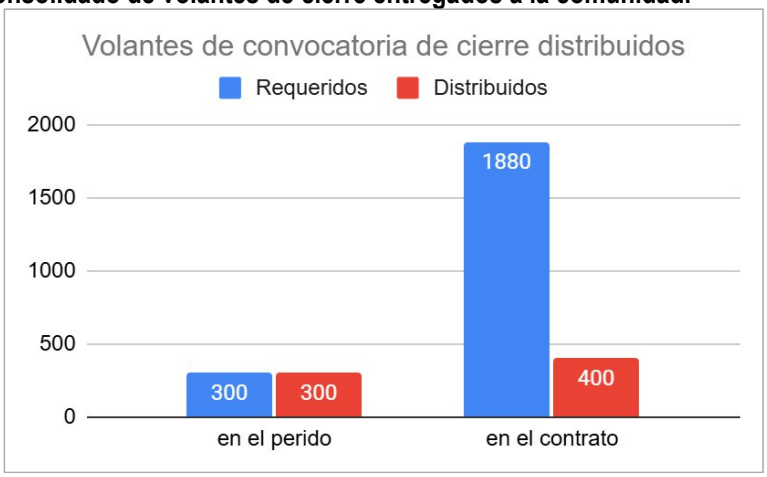

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Se encuentra cumplido con 100% el indicador de aprobación del volante de cierre para el periodo del reporte, Mientras que cumple con el 21 de los volantes entregados para la socialización de cierre de la implementación esperada en todos los puntos del contrato.

10.3. Afiches

En el periodo del presente informe, 14 de septiembre al 13 de octubre de 2025, se reporta el trámite de revisión y aprobación de afiches del contrato mediante correo electrónico, para los puntos viabilizados en Gigante 41306-001 / 002 y 005, Piendamó 19548-008 y Yaguará 41885-002 / 003 y 004. De tal manera que en la tabla 18, se reporta la instalación de nuevos afiches para el contrato.

Tabla 18 Afiches del contrato instalados entre el 14/09/2025 y el 13/10/2025

Tipo de pieza	Municipio	Lugar de Instalación	Fecha de instalación	Cantidad Instalados
Afiche del contrato	Gigante 41306-001	Área de influencia	17/09/2025	10
Afiche del contrato	Gigante 41306-002	Área de influencia	15/09/2025	10
Afiche del contrato	Gigante 41306-005	Área de influencia	15/09/2025	10
Afiche del contrato	Piendamó 19548-008	Área de influencia	30/09/2025	10
Afiche del contrato	Yaguará 41885-002	La administración municipal no permitió instalar los afiches del contrato en el área aferente de los tramos a intervenir, informándole al contratista de obra que la normativa vigente direcciona al control de la contaminación visual en el municipio oponiéndose al uso del espacio público para la instalación de los afiches, argumentando que podría ir en contravía de la sensibilización con respecto a la no instalación de información en el espacio público que ya se ha generado. Acatando lo reglamentado por la administración municipal, se dejaron algunos afiches del proyecto en locales comerciales que recibieron el material sin compromiso de fijación dentro del establecimiento.		
Afiche del contrato	Yaguará 41885-003			
Afiche del contrato	Yaguará 41885-004			
TOTAL, AFICHES INSTALADOS REPORTADO EN EL MES				**40**
AFICHES INSTALADOS REPORTADOS PERIODO ANTERIOR				80
TOTAL, AFICHES INSTALADOS ACUMULADOS EN EL PROYECTO				**120**

Fuente: Formato entrega de piezas de divulgación – Consorcio Señalización IPN


Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°5 - v2

✔ **Indicadores de cumplimiento**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° total de afiches aprobados para inicio de actividades en el periodo (7) / N° de afiches requeridos para inicio de actividades en el periodo (7) *100	100%
PRODUCTIVIDAD	N° total de afiches instalados en el periodo (40) / N° de afiches requeridos para ser instalados en el periodo (40) *100	100%
RESULTADO	N° de afiches instalados en el contrato (120) / N° de afiches requeridos en el contrato para el total de puntos entregados por la ANSV y viabilizados (170) *100	70%

Nota: Para los indicadores de gestión se tiene en cuenta el número de afiches que se aprobaron previo a la realización de socializaciones de inicio con corte al 13 de octubre de 2025.

✔ **Gráfica de consolidado de trámite de afiches con aprobación al 13 de octubre de 2025**

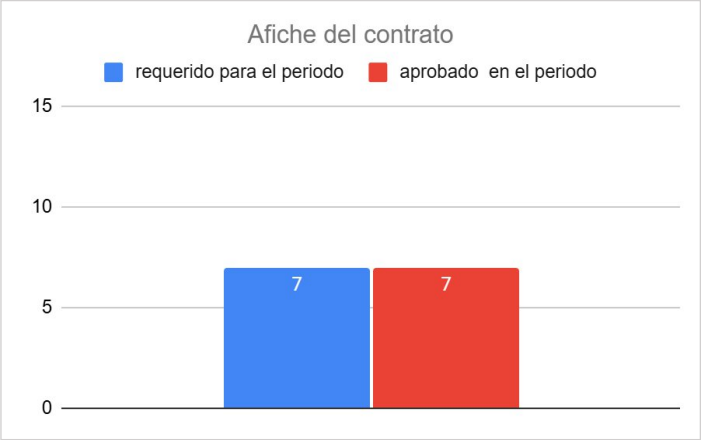


Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

El Contratista de obra dio cumplimiento con el trámite del 100% de afiches para instalación previa al inicio de las actividades de obra que se requirieron durante el período del informe.

Nota: Para los indicadores de productividad se tiene en cuenta el número de afiches que fueron instalados previo a la realización de las socializaciones de inicio programadas al corte del 13 de octubre de 2025 teniendo como base el número de afiches requeridos para los puntos con programación de inicio y el total de afiches que se requiere entregar para el contrato de acuerdo con los puntos visitados y viabilizados para su implementación.

✔ **Gráfica de consolidado de afiches instalados durante el contrato.**

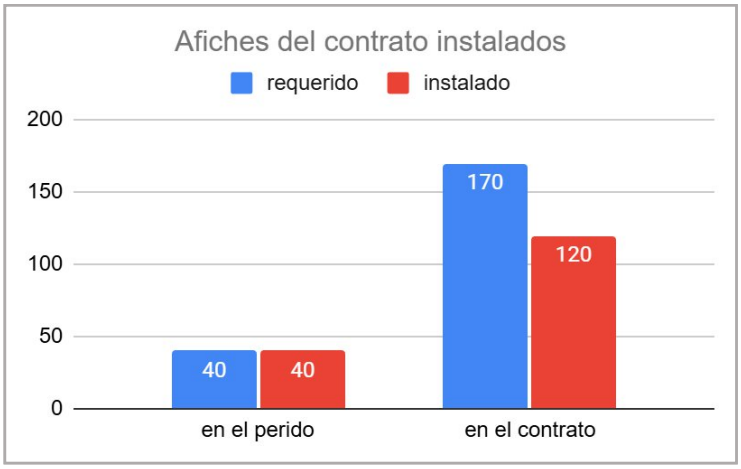

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Del total de afiches esperados para instalación durante el periodo reportado, el Contratista tuvo un cumplimiento del 100%, de acuerdo con los soportes registrados en el entregable de piezas de divulgación; se registra un 70% de cumplimiento en la instalación de afiches esperados para la ejecución del contrato.

Se aclara que, adas las restricciones encontradas en el municipio de Yaguará, no se instalaron afiches del contrato por lo que no se tiene en cuenta en los indicadores de cumplmiento el número requerido para los puntos implementados pues se el impedimento se debió a factores ajenos al Contratista de obra.

10.4. Valla Móvil

En el periodo del presente informe, 14 de septiembre al 13 de octubre de 2025, se adelantó el trámite de revisión y aprobación del diseño de la valla móvil del contrato parra los puntos viabilizados en Gigante 41306-001 /002 y 005, Piendamó 19548-008 y Yaguará 41885-002 / 003 y 004 cuyo trámite de aprobación se realizó mediante correo electrónico, como se describe mas adelante en la tabla 21 “trazabilidad de de trámites de aprobación de piezas de comunicación”.

Para este periodo se reportó la instalación de las vallas móviles en los puntos donde se ejecutaron actividades de obra, como se describe a continuación, se aclara que las gestiones de aprobación correspondientes se adelantaron en periodos anteriores (mes 3 y 4):

Tabla 19 Consolidado de vallas móviles del contrato instaladas entre el 14/09/2025 y el 13/10/2025

Tipo de pieza	Municipio	Lugar de Instalación	Fecha de instalación	Cantidad Instalados
Valla Móvil	Puerto Tejada 19573-001	Vehículo del Contratista de Obra	14/09/2025	1
Valla Móvil	Neiva 41001-006	Vehículo del Contratista de Obra	03/10/2025	1
Valla Móvil	Gigante 41306-001	Vehículo del Contratista de Obra	08/10/2025	1
TOTAL, VALLAS MÓVILES INSTALADAS REPORTADO EN EL MES				3
VALLAS MÓVILES INSTALADAS REPORTADOS PERIODO ANTERIOR				5
TOTAL, VALLAS MÓVILES INSTALADAS ACUMULADOS EN EL PROYECTO				**8**

Nota: Conforme a la dinámica de actividades de implementación, al término del periodo del presente informe el Contratista de obra mantuvo instaladas las vallas móviles en los puntos en obra en ejecución.

– Verificación de Instalación de vallas móviles:

La Interventoría realizó la verificación periódica de la instalación de una (1) valla móvil por frente de obra; de esta manera, se presenta en la tabla 20 el consolidado de verificación de instalación de cuatro (4) vallas móviles dispuestas en los puntos del contrato en que se encontraban en ejecución durante este periodo:

Tabla 20 Verificación de instalación de valla móvil en el periodo del 14/09/2025 al 13/10/2025

Depto.	Municipio	Fecha reportada	Fecha de verificación	Observaciones
Cauca	Puerto Tejada 19573-001	14/09/2025	**17/09/2025**	
Huila	Palermo 41524-006	26/08/2025 **(viene del periodo anterior)**	**22/09/2025**	

Depto.	Municipio	Fecha reportada	Fecha de verificación	Observaciones
Huila	Neiva 41001-006	03/10/2025	**03/10/2025**	
Huila	Gigante 41306-001	08/10/2025	**10/10/2025**	

Fuente: Archivo de Interventoría – Consorcio Señalización IPN


✔ **Indicadores de cumplimiento.**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
PRODUCTIVIDAD	N° total de vallas móviles instalados en el periodo (3) / N° de total de vallas móviles requeridas para los puntos en ejecución durante el periodo (3) *100	100%
RESULTADO	N° de vallas móviles instalados durante el contrato (8) / N° total de vallas requeridas en el contrato para el total de puntos viabilizados y apropiados (18)*100	44,4%

Nota: Para el indicador de productividad se tiene en cuenta el número de vallas móviles que fueron instaladas al corte del 13 de octubre de 2025 teniendo como base el número de vallas requeridas para los puntos en ejecución, por su parte, el indicador de resultado evalúa sobre un total de 18 vallas móviles que se requieren instalar para el contrato,

resaltando que, como se mencionó anteriormente en la Nota “Solicitud de medidas flexibles para el municipio de Yaguará” (pág 37) para los tres puntos contiguos se instalaría una sola valla móvil.

✔ **Gráfica de consolidado de vallas móviles instaladas durante el contrato.**

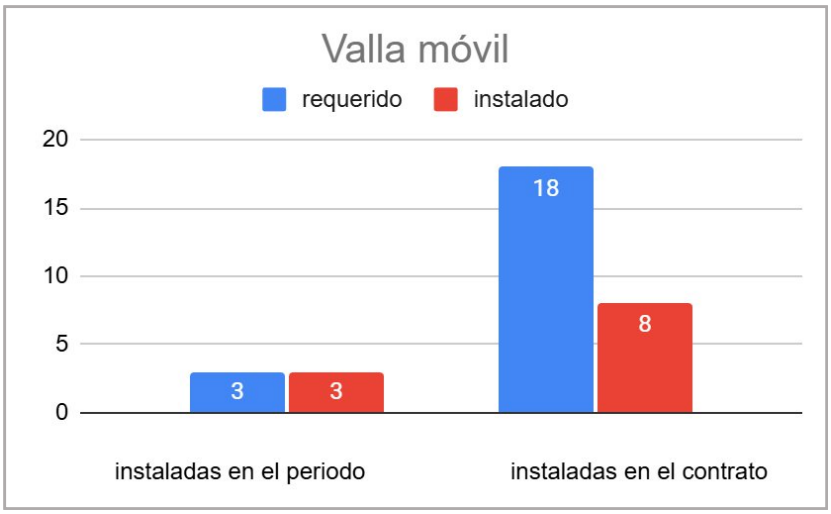

Fuente: *Propia – Consorcio Señalización IPN*

Del total de vallas móviles requeridas para instalación durante el periodo reportado, el Contratista tuvo un cumplimiento del 100%, se registra un 44,4% de cumplimiento en la instalación de vallas móviles esperadas para la ejecución del contrato.

- **TRAZABILIDAD DE TRÁMITE DE APROBACIÓN DE LAS PIEZAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN.**

Como se mencionó en los numerales 10.2, 10.3 y 10.4, el trámite de aprobación de las piezas de comunicación se realizó de manera conjunta, respondiendo a la programación prevista por el área técnica del programa Obras por la Vida – OPV Zona 5. En este periodo se desarrolló lo correspondiente para la aprobación del volante de convocatoria a la socialización de inicio de Gigante, Piendamó y Yaguará como para la socialización de cierre los puntos de Puerto Tejada y Palermo.

Adicionalmente se registra la aprobación de piezas de comunicación Afiche y Valla Móvil para los tres puntos a implementar en el municipio de Gigante 41306-001/ 002 y 005 cuyo trámite inició en el anterior periodo (mes 5); adicionalmente la trazabilidad de entrega, revisión, ajuste y aprobación durante la ejecución del contrato del mes N° 6 para los puntos de Piendamó y Yaguará 41885-002 / 003 y 004, se presenta a continuación:

Tabla 21 Trazabilidad de trámites de aprobación de piezas de comunicación para inicio y cierre de puntos de implementación desarrolladas entre el 14/09/2025 y el 13/10/2025

Depto.	Municipio / Cod. Punto	Tipo de Pieza	Fecha de entrega v-1	Observaciones de Interventoría	Fecha de entrega - v2	Fecha de remisión a la ANSV	Observaciones y/o Aprobación de la ANSV
Huila	Gigante 41306-001	Volante de socialización de inicio, Afiche y Valla móvil	11/09/2025 Correo electrónico	12/09/2025 Correo electrónico	N/A	12/09/2025 Correo electrónico	**15/09/2025** Recibo y aprobación
				Enlaces: 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-028-VolanteGGT001-V001.pdf 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-027-AficheGGT001-V001.pdf 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-027-AficheGGT001-V001.pdf			
	Gigante 41306-002	Volante de socialización de inicio, Afiche y Valla móvi	11/09/2025 Correo electrónico	12/09/2025 Correo electrónico	N/A	12/09/2025 Correo electrónico	**15/09/2025** Recibo y aprobación
				Enlaces: 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-031-VolanteGGT002-V001.pdf 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-030-AficheGGT002-V001.pdf 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-029-VallaGGT002-V001.pdf			
	Gigante 41306-005	Volante de socialización de inicio, Afiche y Valla móvi	11/09/2025 Correo electrónico	12/09/2025 Correo electrónico	N/A	12/09/2025 Correo electrónico	**15/09/2025** Recibo y aprobación
				Enlaces: 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-034-VolanteGGT005-V001.pdf 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-033-AficheGGT005-V001.pdf 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-032-VallaGGT005-V001.pdf			
Cauca	Piendamó 19548-008	Volante de socialización de inicio, Afiche y Valla móvil	27/09/2025 Correo electrónico /09/2025 Correo electrónico	29/09/2025 Correo electrónico	29/09/2025 Correo electrónico	29/09/2025 Correo electrónico	**29/09/2025** Recibo y aprobación
				Enlaces: 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-044-VolantePDM008-V002 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-043-AfichePDM008-V001.pdf 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-042-VallaPDM008-V002.pdf			
Cauca	Puerto Tejada	Volante de socialización de cierre	29/09/2025 Correo electrónico	29/09/2025 Correo electrónico	29/09/2025 Correo electrónico	29/09/2025 Correo electrónico	**30/09/2025** Recibo y aprobación
				Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-045-VolanteCierrePTJ-V004			
Huila	Palermo 41524-002	Volante de socialización	29/09/2025 Correo	30/09/2025 Correo	30/09/2025 Correo	30/09/2025 Correo	**30/09/2025** Recibo y aprobación

Depto.	Municipio / Cod. Punto	Tipo de Pieza	Fecha de entrega v-1	Observaciones de Interventoría	Fecha de entrega - v2	Fecha de remisión a la ANSV	Observaciones y/o Aprobación de la ANSV
		de cierre	electrónico	electrónico	electrónico	electrónico	
				Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-046-VolanteCierrePLM002-V004			
	Palermo 41524-006	Volante de socialización de cierre	29/09/2025 Correo electrónico	30/09/2025 Correo electrónico	30/09/2025 Correo electrónico	30/09/2025 Correo electrónico	**30/09/2025** Recibo y aprobación
				Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-047-VolanteCierrePLM006-V004			
Huila	Yaguará 41885-002 Yaguará 41885-003 Yaguará 41885-004	Volante de socialización de inicio, Afiche y Valla móvil	07/10/2025 Correo electrónico	09/10/2025 Correo electrónico	09/10/2025 Correo electrónico	10/10/2025 Correo electrónico	**10/10/2025** Recibo y aprobación
				001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-035-VolanteYGR002-V002.pdf 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-038-VolanteYGR003-V002.pdf 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-040-VolanteYGR004-V002.pdf 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-037-AficheYGR-V001 001OPV-CTA-ZO5-VIF-GSO-036-VallaYGR002-003-004-V003.pdf			
TOTAL, PUNTOS CON PIEZAS DE COMUNICACIÓN APROBADAS EN EL MES						**10**	


Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

✓ **Indicadores de Cumplimiento**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° total de puntos con piezas de comunicación aprobadas en el periodo actividades de implementación (10) / N° de piezas de comunicación requeridas para trámite en el periodo (10) *100	100%

Ver Tabla de anexos - Anexo 5 correspondencia enviada, trazabilidad

✔ **Gráfica de piezas de comunicación aprobadas en el periodo.**

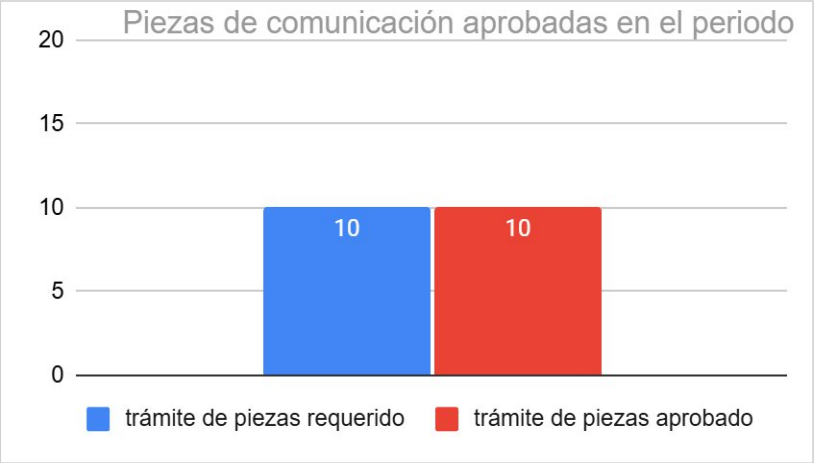

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Respecto a los indicadores de gestión para el periodo reportado (14 de septiembre al 13 de octubre de 2025), se cumple con el 100% de trámites de piezas de comunicación aprobadas que se requirieron durante el mes N° 6 de ejecución de obra.

10.5. Monitoreo de medios de comunicación

El Contratista de obra no reportó durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, publicaciones, noticias o contenidos relacionados con el proyecto “Obras por la Vida” en los canales revisados de los municipios priorizados, ni contenidos relacionados con el tema de orden público en los departamentos de la zona 5.

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N° 6 - v2 del Contratista de Obra

La Interventoría realizó la verificación del monitoreo de medios de comunicación que debe realizar el equipo social del Contratista, verificando los soportes presentados. Para este periodo no se reporta información del programa Obras por la Vida – OPV que compete en redes sociales de los entes territoriales o en medios locales.

10.6. Talleres de sensibilización en buenas prácticas de seguridad vial

En el periodo del presente informe se realizaron actividades de taller de sensibilización para los puntos de Palermo 41524-002 / 006, Gigante 41306-001 / 002 / 005, Ipiales 52356- 268 /269, Piendamó 19548-008 y Yaguará 41885-002 / 003 / 004 en los que se contó con el quórum mínimo requerido. Los soportes de la actividad (registro fotográfico, listado de asistencia y gestión de convocatoria) se recopilan en el acta de cada taller que debe entregar el Contratista

de obra; el registro consolidado de cada actividad y el estado de entrega de los soportes de la actividad se describen a continuación en la tabla 21:

Tabla 22 Consolidado de realización de talleres de sensibilización en seguridad vial del 14/09/2025 al 13/10/2025

Fecha	Municipio / punto	Tema	Población objeto	N° de Asistentes	Quórum mínimo	Soportes de la actividad- Trazabilidad
20/09/2025	Gigante 41524-001	Taller de seguridad vial	Adultos	22	15	Al cierre del presente periodo, el Contratista de Obra no remitió acta de taller con soportes.
		Total, Asistentes		**22**		
24/09/2025		Taller de seguridad vial	NNA	15	15	Al cierre del presente periodo, el Contratista de Obra no remitió acta de taller con soportes.
		Total, Asistentes		**15**		
22/09/2025	Ipiales 52356-268	Taller de seguridad vial	NNA	25	15	07/10/2025 – Radicado CO **09/10/2025** – Observado de Interventoría
		Total, Asistentes		**25**		
22/09/2025		Taller de seguridad vial	Adultos	25	15	07/10/2025 – Radicado CO **09/10/2025** – Observado de Interventoría
		Total, Asistentes		**25**		
22/09/2025	Ipiales 52356-269	Taller de seguridad vial	NNA	28	15	07/10/2025 – Radicado CO **09/10/2025** – Observado de Interventoría
		Total Asistentes		**28**		
22/09/2025		Taller de seguridad vial	Adultos	20	15	07/10/2025 – Radicado CO **09/10/2025** – Observado de Interventoría
		Total Asistentes		**20**		
23/09/2025	Gigante 41524-005	Taller de seguridad vial	NNA	15	15	Al cierre del presente periodo, el Contratista de Obra no remitió acta de taller con soportes.

Fecha	Municipio / punto	Tema	Población objeto	N° de Asistentes	Quórum mínimo	Soportes de la actividad- Trazabilidad
		Total Asistentes		**15**		
23/09/2025		Taller de seguridad vial	Adultos	15	15	Al cierre del presente periodo, el Contratista de Obra no remitió acta de taller con soportes.
		Total Asistentes		**15**		
23/09/2025	Gigante 41524-002	Taller de seguridad vial	NNA	15	15	Al cierre del presente periodo, el Contratista de Obra no remitió acta de taller con soportes.
		Total Asistentes		**15**		
24/09/2025		Taller de seguridad vial	Adultos	15	15	Al cierre del presente periodo, el Contratista de Obra no remitió acta de taller con soportes.
		Total Asistentes		**15**		
26/09/2025	Palermo 41524-002	Taller de seguridad vial	NNA	15	15	05/10/2025 – Radicado CO **07/10/2025** – Observado Interventoría 08/10/2025 – Ajustes del CO **09/10/2025** – Aprobación de Interventoría
		Total Asistentes		**15**		
		Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ARE-GSO-020-TallerninoHUIPLM002-V002.pdf				
26/09/2025		Taller de seguridad vial	Adultos	15	15	05/10/2025 – Radicado CO **07/10/2025** – Observado Interventoría 08/10/2025 – Ajustes del CO **09/10/2025** – Aprobación de Interventoría
		Total Asistentes		**15**		
		Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ARE-GSO-021-TalleradultosHUIPLM002-V002.pdf				
26/09/2025	Palermo 41524-006	Taller de seguridad vial	NNA	15	15	05/10/2025 – Radicado CO **07/10/2025** – Observado Interventoría 08/10/2025 – Ajustes del CO **09/10/2025** – Aprobación de Interventoría
		Total Asistentes		**15**		


Fecha	Municipio / punto	Tema	Población objeto	N° de Asistentes	Quórum mínimo	Soportes de la actividad- Trazabilidad
		Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ARE-GSO-022-TallerninoHUIPLM006-V002.pdf				
26/09/2025		Taller de seguridad vial	Adultos	15	15	05/10/2025 – Radicado CO **07/10/2025** – Observado Interventoría 08/10/2025 – Ajustes del CO **09/10/2025** – Aprobación de Interventoría
		Total Asistentes		**15**		
		Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ARE-GSO-023-TalleradultosHUIPLM006-V002.pdf				
03/10/2025	Piendamó 19548-008	Taller de seguridad vial	NNA	22	15	Al cierre del presente periodo, el Contratista de Obra no remitió acta de taller con soportes.
		Total Asistentes		**22**		
03/10/2025		Taller de seguridad vial	Adultos	15	15	Al cierre del presente periodo, el Contratista de Obra no remitió acta de taller con soportes.
		Total Asistentes		**15**		
13/10/2025	Yaguará 41885-002 41885-003 41885-004	Taller de seguridad vial	Adultos	14	10	Al cierre del presente periodo, el Contratista de Obra no remitió acta de taller con soportes.
		Total Asistentes		**14**		
TOTAL, TALLERES DE SEGURIDAD VIAL NNA EN EL MES					8	
TOTAL, TALLERES DE SEGURIDAD VIAL ADULTOS EN EL MES					9	
TOTAL, ASISTENTES					**303**	

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 y Anexo 5 Correspondencia enviada trazabilidad

- ✓ **Indicadores de Cumplimiento**


INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° total de talleres de sensibilización dirigidos a NNA en los puntos de implementación (8) / N° de talleres de sensibilización dirigidos a NNA requeridos para los puntos priorizados y viabilizados (19) *100	42%


	N° total de talleres de sensibilización ejecutados, dirigidos a población adulta en los puntos de implementación (9) / N° de talleres de sensibilización dirigidos a población adulta para los puntos priorizados y viabilizados (16) *100	56%
PARTICIPACION	N° de asistentes al taller de sensibilización NNA del punto Gigante 001 (15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización Adultos del punto Gigante 001(15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización NNA del punto Ipiales 268 (25) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	166%
	N° de asistentes al taller de sensibilización Adultos del punto Ipiales 268 (25) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	166%
	N° de asistentes al taller de sensibilización NNA del punto Ipiales 269 (28) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	186%
	N° de asistentes al taller de sensibilización Adultos del punto Ipiales 269 (20) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	133%
	N° de asistentes al taller de sensibilización NNA del punto Gigante 005 (15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización Adultos del punto Gigante 005 (15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización NNA del punto Gigante 002 (15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización Adultos del punto Gigante 002 (15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización NNA del punto Palermo 002(15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización Adultos del punto Palermo 002 (15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización NNA del punto Palermo 006 (15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización Adultos del punto Palermo 006 (15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización NNA del punto Piendamó (22) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	146%
	N° de asistentes al taller de sensibilización Adultos del punto Piendamó (15) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (15) *100	100%
	N° de asistentes al taller de sensibilización Adultos del punto Yaguará 002 /003/ 004 (14) / N° de asistentes requeridos por quórum mínimo (10) *100	140%

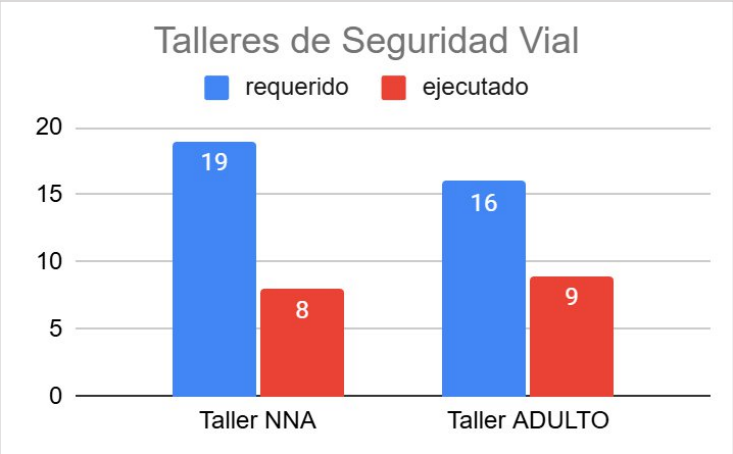

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Respecto a los indicadores de gestión para el periodo reportado (14 de septiembre al 13 de octubre de 2025), el contrato de obra avanza con el 42% de ejecución de talleres de seguridad vial dirigidos a población NNA y 56% de ejecución de talleres de seguridad vial dirigidos a población Adulta, sobre el total de puntos priorizados y que, a la fecha cuentan con viabilidad de implementación.

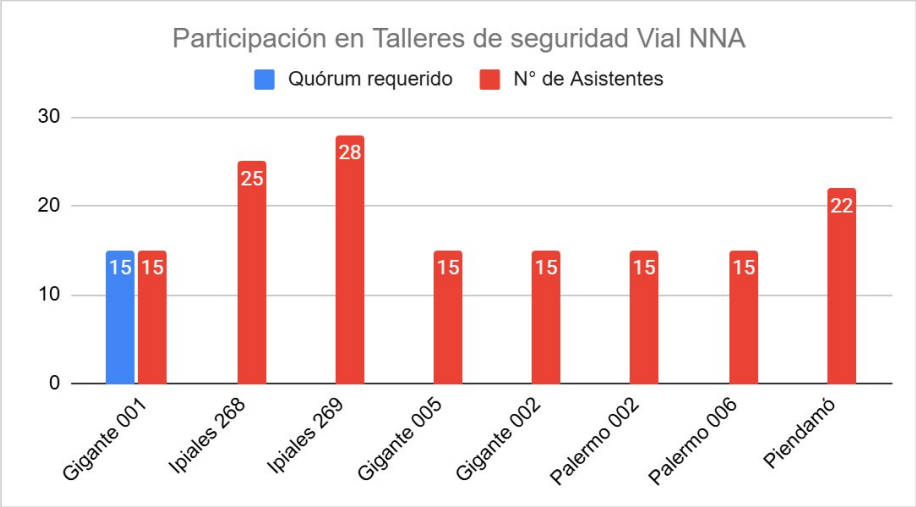

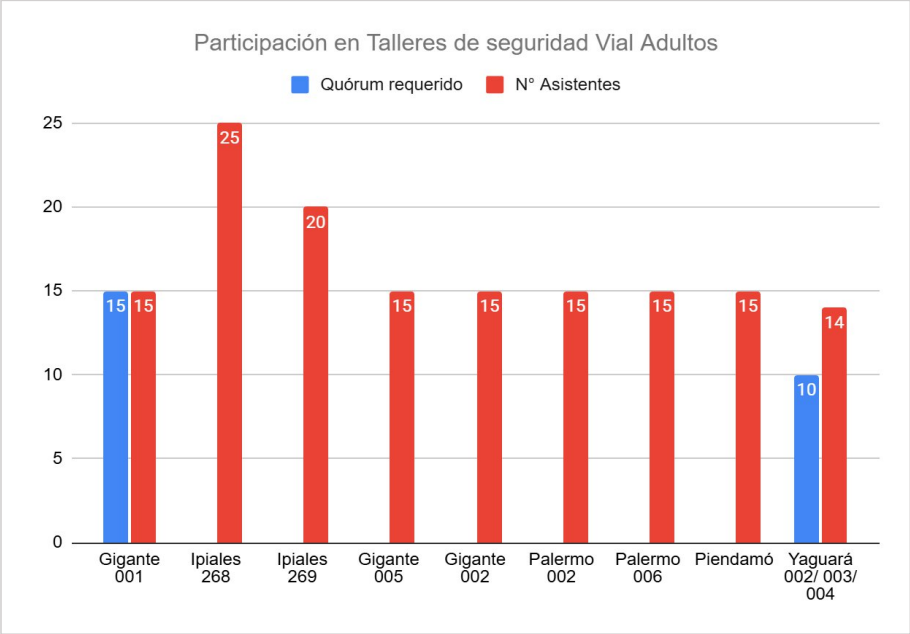

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN



Respecto a los indicadores de participación de la comunidad del área de influencia en los talleres de sensibilización en seguridad vial, encontramos que se dio cumplimiento al quórum requerido y en puntos como Ipiales y Piendamó se superó el quórum requerido de 15 personas para el desarrollo de esta actividad, es así como se observa el cumplimientos del 166%, 186% y 146% de asistencia en el taller dirigido a población infantil – niños, niñas y adolescentes NNA. En cuanto a la participación a los talleres dirigidos a población adulta, fue superado el quórum requerido en los puntos de Ipiales y Yaguará con 166%, 133% y 140% de cumplimiento.

10.7. Avance de Obra

Conforme a lo establecido en el apéndice E de gestión social y comunicaciones, la Interventoría realiza seguimiento al suministro diario de la información actualizada del avance de las obras, desde la firma del acta de inicio hasta su terminación, incluyendo tres (03) fotografías y video del antes, durante y después del punto de intervención.

Durante el presente periodo de reporte, 14 de septiembre al 13 de octubre de 2025 el Contratista de obra suministró en medios digitales a la Interventoría técnica el registro fotográfico con tomas aéreas (Dron) para ser remitidos a la ANSV; Para el informe de gestión social correspondiente al mes de ejecución N° 6 se comparte una selección de tomas del antes, durante y después para los puntos en ejecución de Palermo 41524-002 y 41524-006:

Tabla 23 Avance de obra

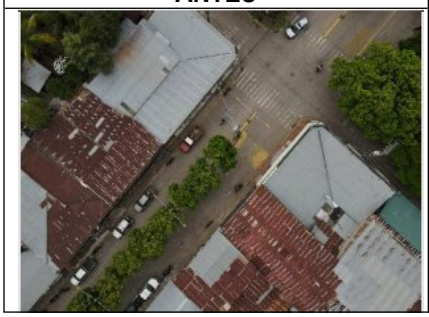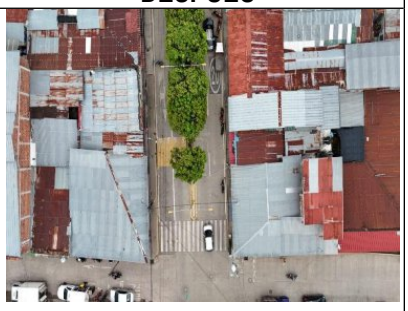41524-002 Palermo		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		
41524-006 Palermo		
ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

Fuente: Tabla 15. Avance de obra - IMS N°6 - v2 (Ver anexo 1)

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista de Obra

11. COMPONENTE DE GESTIÓN HUMANA O CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA REGIONAL

Con el inicio de actividades de implementación de obra, el Contratista informó gestiones durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, para la contratación de personal vulnerable y mano de obra no calificada en el marco del proyecto, indicando que se recepcionaron las cartas y trámites pertinentes relacionados con la contratación de personal vulnerable y mano de obra no calificada en el marco del proyecto.

De acuerdo con lo evidenciado en el IMS N°6 del Contratista de obra, cuenta con las constancias de 5 trabajadores vinculados al Consorcio Fernac, los trabajadores se relacionan en la "*Tabla 16 Gestión Humana"* del mencionado informe. Adicionalmente, el contratista informó que su equipo interdisciplinario adelantó gestiones con las Alcaldías Municipales y sus dependencias competentes, con el propósito de acceder a las bases de datos de población vulnerable, a fin de facilitar su priorización en los procesos de vinculación laboral. Sin embargo, las entidades territoriales informaron que los procedimientos administrativos necesarios para la validación y depuración de dicha

información requieren tiempos adicionales, lo que limitó su disponibilidad en los plazos previstos para la ejecución del proyecto.

No obstante, se contó en este periodo con contratación de personal local dentro del área de influencia, tanto para los equipos operativos de obra como para los profesionales de apoyo. Como se evidencia en el IMS N°6 del contratista, se tuvo en el periodo de reporte la vinculación de un equipo de 44 personas, de las cuales 5 corresponden a población vulnerable, equivalente al 11,36%, cifra que supera el mínimo del 10% establecido en el Apéndice E de las obligaciones contractuales.

Tabla 24 Reporte de constancia de residencia solicitados por el Contratista de obra

Tabla 16 Gestión Humana.

CARGO	NOMBRE COMPLETO	POBLACIÓN VULNERABLE O MANO DE OBRA REGIONAL.
Auxiliar operativo	Jennifer Paola Añasco Calambas	Desplazamiento forzado
Tecnólogo dibujo	Juan Diego Alarcón Dussan	Joven / Residente del Huila
Auxiliar operativo	José Jamir Vera	Discapacitado / Desplazado
Auxiliar operativo	Fabián Taquinaz Inseca	Desplazamiento forzado
Ingeniera Ambiental	Yessica Tatiana Londoño Cuellar	Residente del Huila

Fuente: Tabla 16 Gestión Humana - IMS N°6 - v2 (Ver anexo 1)

A medida que avance la implementación de señalización en los puntos apropiados por el Contratista, desde la integralidad de la Interventoría hará la revisión de las vinculaciones y retiros reportadas por el Contratista y verificados por el componente SST de Interventoría, así como la verificación de los certificados de residencia o de condición de vulnerabilidad aportados por el Contratista, dichos certificados serán de conocimiento de la Agencia y anexados en cada informe mensual.

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista de Obra

12. ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS EN INTERVENCIÓN

La Interventoría realiza seguimiento de la realización de actividades de responsabilidad del área técnica del Contratista de obra que requieren apoyo de gestión social, quien actúa como interlocutor entre el área técnica y la comunidad facilitando el desarrollo de las implementaciones de señalización vial requeridas para el programa Obras por la Vida.

En el periodo del presente informe comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, se adelantó la gestión correspondiente al levantamiento de las actas de vecindad y aceptación. Interventoría verificó el uso de los

formatos establecidos por la ANSV GEA-047 y GEA-050 y el desarrollo de estas actividades lideradas por el área técnica, en compañía de la gestión social;

12.1. Levantamiento actas de vecindad de inicio y actas de vecindad de cierre.

- Actas de vecindad de inicio:

Para el presente informe, se reporta el acompañamiento al área técnica para el levantamiento de actas de vecindad de inicio de los puntos Gigante 41524-001 /002 y 005 para el departamento del Huila.

A continuación, en la tabla 25 se registra la trazabilidad de entrega del Contratista de obra y revisión de los entregables "acta de vecindad de inicio" por parte de la Interventoría.

Tabla 25 Consolidado actas de vecindad de inicio del 14/09/2025 al 13/10/2025

Depto.	Municipio / Cod. punto	N° actas de vecindad	Fecha ADV de inicio	Fecha ADV de cierre	Observaciones / Trazabilidad
Huila	Gigante 41524-001	**6**	**20/09/2025** **25/09/2025**	pendiente	**08/10/2025** radicado en correo electrónico por el Contratista **09/10/2025** observaciones de Interventoría
		Enlace en SharePoint 3P: ADV Inicio 001OPV-CTA-ZO5-ADV-GSO-075-ActasdeVecindadInicioGGT001-V001.pdf			
	Gigante 41524-002	**12**	**20/09/2025** **22/09/2025** **23/09/2025**	pendiente	**08/10/2025** radicado en correo electrónico por el Contratista **13/10/2025** en revisión de Interventoría
		Enlace en SharePoint 3P: ADV Inicio 001OPV-CTA-ZO5-ADV-GSO-076-ActasdeVecindadInicioGGT002-V001.pdf			
	Gigante 41524-005	**12**	**20/09/2025** **23/09/2025**	pendiente	**09/10/2025** radicado en correo electrónico por el Contratista **13/10/2025** en revisión de Interventoría
		Enlace en SharePoint 3P: ADV Inicio 001OPV-CTA-ZO5-ADV-GSO-077-ActasdeVecindadInicioGGT005-V001.pdf			

N° DE PUNTOS CON ACTAS DE VECINDAD DE INICIO EN EL MES	**3**
N° DE PUNTOS CON ACTAS DE VECINDAD DE INICIO PERIODO ANTERIOR	8
TOTAL, N° DE PUNTOS CON ACTAS DE VECINDAD DE INICIO EN EL CONTRATO	11

Depto.	Municipio / Cod. punto	N° actas de vecindad	Fecha ADV de inicio	Fecha ADV de cierre	Observaciones / Trazabilidad


N° DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO EN EL MES	**30**
N° DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO EN EL PERIODO ANTERIOR	63
TOTAL, N° DE ACTAS DE VECINDAD DE INICIO EN EL CONTRATO	93

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista y Anexo 5 Correspondencia enviada, trazabilidad.

✔ **Indicadores de cumplimiento ADV de inicio**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLI MIENTO
GESTION	N° Total de actas de vecindad de inicio realizadas en el periodo (30) / N° Total de actas de vecindad de inicio requeridas en el período (30)	100%
PRODUCTIVIDAD	N° Total de puntos con actas de vecindad inicio realizadas para el Depto. del Huila en el periodo (3) / N° Total de puntos viabilizados y requeridos para el Depto. del Huila (6)	50%
RESULTADO	N° Total puntos con actas de vecindad inicio realizadas en el periodo (3) / N° Total de puntos con actas de vecindad de inicio requeridas para el periodo (3)	100%
	N° Total puntos con actas de vecindad inicio realizadas para el contrato (11) / N° Total de puntos visitados y viabilizados (20)	55%


✔ **Gráfica ADV de inicio realizadas en el periodo y consolidado al 13/10/2025**

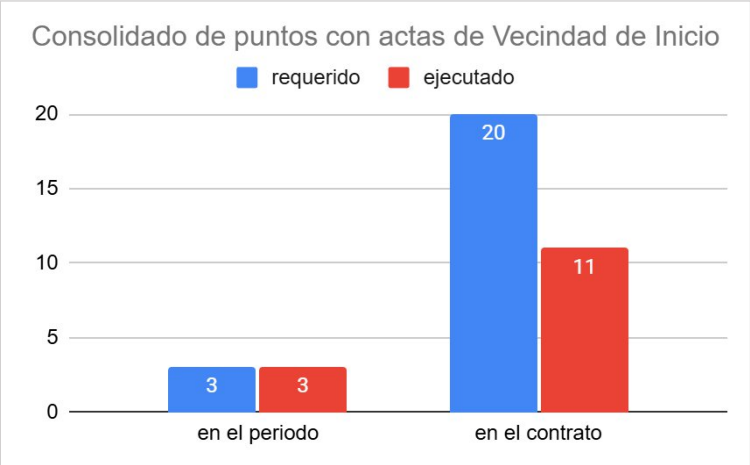

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

En cuanto a indicadores de gestión, se refiere el cumplimiento del 100% en la realización de actas de vecindad requeridas para el periodo del informe de acuerdo con las características de la implementación en el punto de Neiva y los dos puntos de Ipiales. Como resultado general del contrato, la realización de actas de vecindad en once (11) puntos viabilizados corresponde a un indicador de cumplimiento del 55%.

✔ **Gráfica ADV de inicio realizadas en el periodo por Departamento**

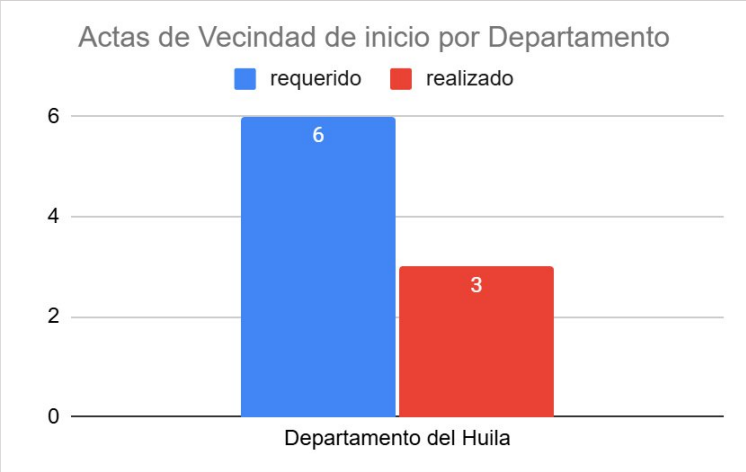

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Respecto a los indicadores de productividad en realización de actas de vecindad en los puntos viabilizados, por departamento corresponde al cumplimiento del 50% en el departamento del Huila.

- Actas de vecindad de cierre:

Debido a la terminación de obra para los puntos Palermo 41524-002 y 41524-006, para el presente periodo, se realizó el acompañamiento al componente técnico en el cierre de actas de vecindad, lo cual se registra a continuación en la tabla 26 que consolida el seguimiento que implementa la Interventoría (columna resaltada en amarillo), a partir del inicio de la etapa de implementación:

Tabla 26 Consolidado actas de vecindad de cierre del 14/09/2025 al 13/10/2025

Depto.	Municipio / Cod. punto	N° actas de vecindad	Fecha ADV de inicio	Fecha ADV de cierre	Observaciones / Trazabilidad
Huila	Palermo 41524-002	11	01/08/2025	**02/10/2025**	**06/10/2025** remite actas de cierre en correo electrónico **07/10/2025** aprobación y firma de residente técnico de INT
		Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADV-GSO-074-ActaVecindadCierreHUIPLM002-V001.pdf			

Depto.	Municipio / Cod. punto	N° actas de vecindad	Fecha ADV de inicio	Fecha ADV de cierre	Observaciones / Trazabilidad
Huila	Palermo 41524-006	1	04/08/2025	**02/10/2025**	**03/10/2025** remite actas de cierre en correo electrónico **04/10/2025** aprobación y firma de residente técnico de INT
		Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADV-GSO-073-ActaVecindadCierreHUIPLM006-V001.pdf			


N° DE PUNTOS CON ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE EN EL MES	2
N° DE PUNTOS CON ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE PERIODO ANTERIOR	2
TOTAL, N° DE PUNTOS CON ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE EN EL CONTRATO	**4**
N° DE ACTAS DE VECINDAD CIERRE EN EL MES	12
N° DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE EN EL PERIODO ANTERIOR	32
TOTAL, N° DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE EN EL CONTRATO	**44**

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista y Anexo 5 Correspondencia enviada, trazabilidad

✔ **Indicadores de cumplimiento ADV de cierre**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLI MIENTO
GESTION	N° Total de actas de vecindad de cierre realizadas en el periodo (12) / N° Total de actas de vecindad de cierre requeridas en el período (12)	100%
PRODUCTIVIDAD	N° Total de puntos con actas de vecindad de cierre realizadas para el Depto. del Huila en el periodo (2) / N° Total de puntos implementados para el Depto. del Huila (9)	22,2%
RESULTADO	N° Total puntos con actas de vecindad de cierre realizadas en el periodo (2) / N° Total de puntos con actas de vecindad de cierre requeridas para el periodo (2)	100%
	N° Total puntos con actas de vecindad de cierre realizadas para el contrato (4) / N° Total de puntos viabilizados y apropiados para implementación (20)	20%


✔ **Gráfica ADV de cierre realizadas en el periodo y consolidado al 13/10/2025**

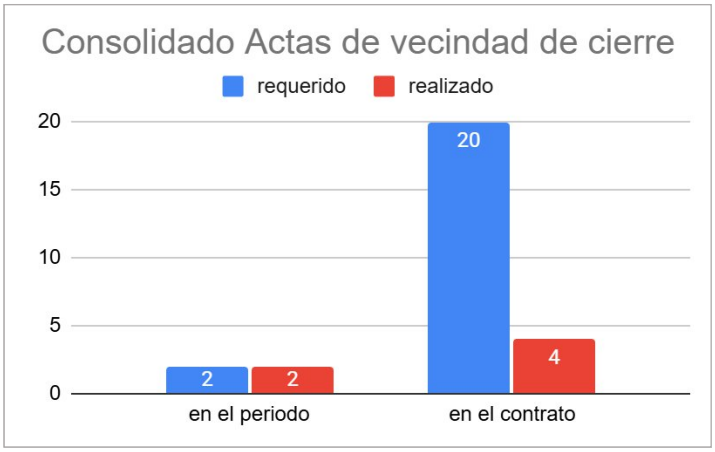

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

En cuanto a indicadores de gestión, se refiere el cumplimiento del 100% en la realización de actas de vecindad requeridas para el periodo dada la terminación de actividades de obra en los puntos de Palermo 002 y 006. Como resultado general del contrato, la realización de actas de vecindad de cierre en cuatro (4) puntos viabilizados corresponde a un indicador de cumplimiento del 20%

✔ **Gráfica ADV de cierre realizadas en el periodo por Departamento**

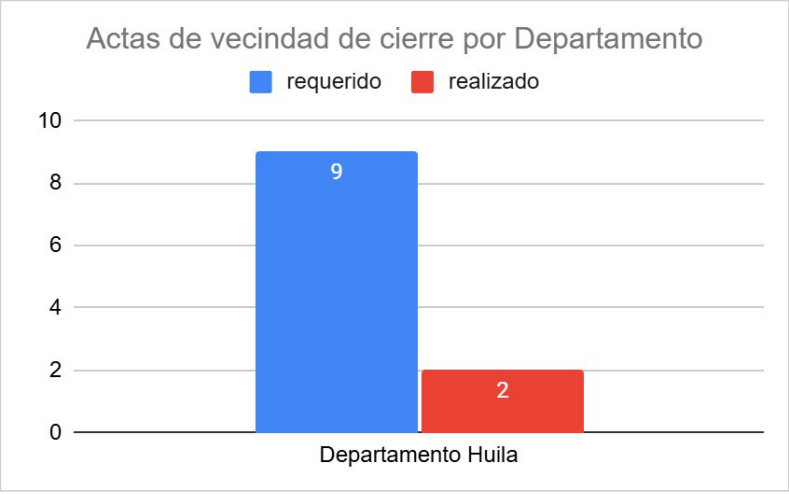

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Respecto a indicadores de productividad en realización de actas de vecindad de cierre en los puntos implementados, por departamento corresponde al cumplimiento del 22,2% en el departamento del Huila.

12.2. Actas de aceptación.

En el periodo del presente informe el Contratista de obra realizó actividades con respecto al levantamiento de actas de aceptación, en los predios del área de influencia de los puntos en Gigante 41524-001 /002 y 005

A continuación, en la tabla 27 se presenta el consolidado de actas de aceptación realizadas y presentados por el Contratista de obra en el periodo del presente informe.

Tabla 27 Consolidado de puntos con Actas de aceptación del periodo 14/09/2025 al 13/10/2025

Depto.	Municipio / Cod. punto	N° de actas de aceptación	Fecha Acta de aceptación	Observaciones / Trazabilidad
Huila	Gigante 41524-001	6	20/09/2025 y 25/09/2025	**08/10/2025** radicado en correo electrónico por el Contratista **09/10/2025** observaciones de Interventoría
		Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-AAC-GSO-003-ActasAceptacionGGT001-V001.pdf		
	Gigante 41524-002	12	20/09/2025, 22/09/2025 y 23/09/2025	**08/10/2025** radicado en correo electrónico por el Contratista **13/10/2025** en revisión de Interventoría
		Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADV-GSO-076-ActasdeVecindadInicioGGT002-V001.pdf		
	Gigante 41524-005	12	20/09/2025 y 23/09/2025	**09/10/2025** radicado en correo electrónico por el Contratista **13/10/2025** en revisión de Interventoría
		Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADV-GSO-077-ActasdeVecindadInicioGGT005-V001.pdf		

N° DE PUNTOS CON ACTAS DE ACEPTACIÓN EN EL MES	3
N° DE PUNTOS CON ACTAS DE ACEPTACIÓN PERIODO ANTERIOR	**8**
TOTAL, N° DE PUNTOS CON ACTAS DE ACEPTACIÓN EN EL CONTRATO	**11**
N° DE ACTAS DE ACEPTACIÓN EN EL MES	30
N° DE ACTAS DE ACEPTACIÓN EN EL PERIODO ANTERIOR	63
TOTAL, N° DE ACTAS DE ACEPTACIÓN EN EL CONTRATO	**93**


Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 y Anexo 5 Correspondencia enviada, trazabilidad

Desde la Interventoría se realiza acompañamiento constante a cada socialización, así como, se verificará los soportes de gestión elaborados por el Contratista donde se evidencie que la comunidad cuenta con la información relacionada a los diseños, haciendo uso del formato establecido por la ANSV GEA-048. El porcentaje de cumplimiento estará sujeto a la programación de socializaciones de diseños que realice el Contratista por municipio.

✔ **Indicadores de cumplimiento.**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTION	N° Total de actas de aceptación realizadas en el periodo (30) N° Total de actas de aceptación requeridas en el período (30)	100%
PRODUCTIVIDAD	N° Total de puntos con actas de aceptación realizadas para el Depto. Huila (3) / N° Total de puntos visitados y viabilizados para el Depto. Huila (6)	50%
RESULTADO	N° Total puntos con actas de aceptación realizadas en el periodo (3) / N° Total de puntos con actas de aceptación requeridas para el periodo (3)	100%
	N° Total puntos con actas de aceptación realizadas para el contrato (11) N° Total de puntos visitados y viabilizados (20)	55%


✔ **Gráfica actas de aceptación en el periodo y consolidado al 13/10/2025**

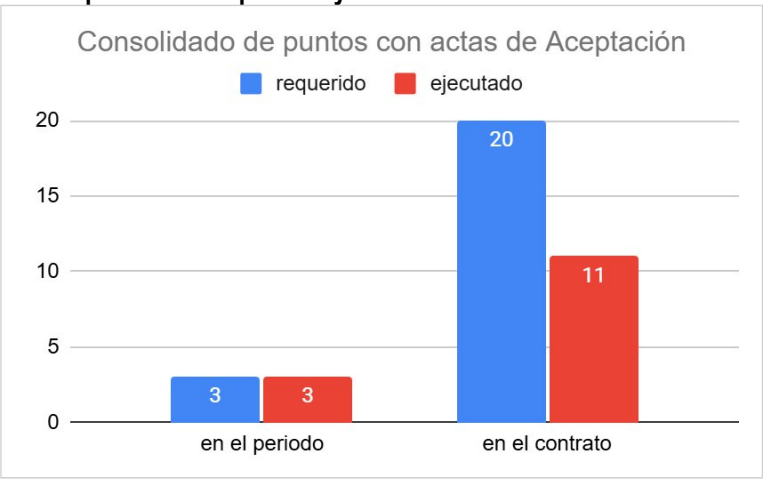

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

En cuanto a indicadores de gestión y resultado, se refiere el cumplimiento del 100% en la realización de actas de aceptación requeridas para el periodo del informe de acuerdo con las características de la implementación en los puntos Gigante. La realización de actas de aceptación en once (11) puntos viabilizados corresponde a un indicador de cumplimiento del 55%.

✔ **Gráfica actas de aceptación realizadas en el periodo por Departamento**

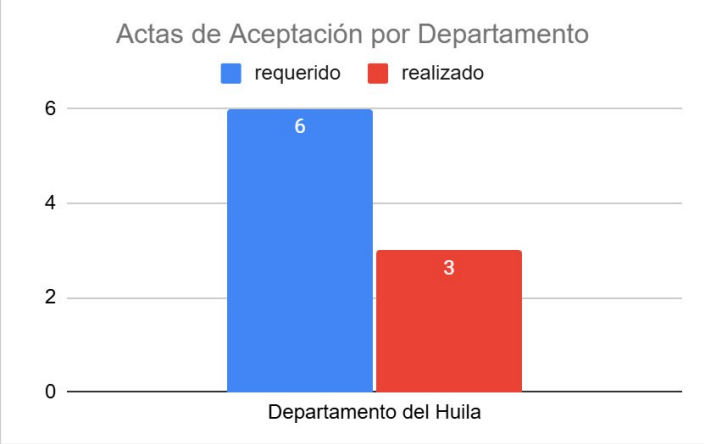

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

Respecto a indicadores de productividad en realización de actas de aceptación en los puntos viabilizados, por departamento corresponde al cumplimiento del 50% en el departamento del Huila.

12.3. Actas de entorno.

De acuerdo con el Apéndice E – Gestión Social y Comunicaciones, el Acta de Entorno es un documento que se levanta antes del inicio de las implementaciones a través de un recorrido en el cual se busca realizar un diagnóstico del estado del espacio público (pavimento, escalinatas y escaleras, accesos a predios, sumideros, zonas verdes, entre otros). La actividad de recorrido se desarrolló en cada uno de los puntos por el Contratista en compañía del representante del Ente Territorial y del residente técnico de la Interventoría, desde el componente social se realiza el seguimiento al cumplimiento de este requerimiento previo al inicio de actividades de obra.

En el periodo del presente informe el Contratista de obra radicó mediante correo electrónico a la Interventoría los soportes de las actividades de actas de entorno en los municipios de Ipiales, Neiva, Gigante, Yaguará y Buenaventura. En la siguiente tabla se relaciona el consolidado de soportes de actas de entorno, con su respectiva trazabilidad de entrega a la Interventoría para revisión:

Tabla 28 Consolidado de entrega de Actas de Entorno levantadas por punto de intervención

Depto.	Municipio / Cod. punto	Fecha de elaboración	N° de actas de entorno	Estado del entorno	Observaciones / Trazabilidad
Nariño	Ipiales 52356-268	28/05/2025	1	Pavimento rígido en regular estado superficial, con evidencias de desgaste, fisuras menores y pérdida o ausencia de demarcación vial. Accesos a	15/09/2025 remitido archivo 2C por el CO 15/09/2025 observaciones INT 21/09/2025 ajustes remitidos por

Depto.	Municipio / Cod. punto	Fecha de elaboración	N° de actas de entorno	Estado del entorno	Observaciones / Trazabilidad
				predios públicos y privados, los cuales generan interrupciones en la continuidad del andén y afectan la uniformidad del flujo peatonal. Sumideros en buen estado. No cuenta con zonas verdes formales, ni jardines, ni cobertura vegetal significativa	el CO 23/09/2025 revisado y firmado por el residente técnico de INT
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-006-ActaEntornoIPL268-V002.pdf		
	Ipiales 52356-269	28/05/2025	1	Pavimento rígido en regular estado superficial, con evidencias de desgaste, fisuras menores y pérdida o ausencia de demarcación vial. Accesos a predios, tanto públicos como privados, los cuales generan interrupciones en la continuidad del andén y afectan la uniformidad del flujo peatonal. Sumideros sin obstrucciones aparentes. Entorno predominantemente urbano, con uso comercial y vehicular, en el cual no se observaron areas destinadas a vegetacion, arborizacion urbana o mobiliario verde.	15/09/2025 remitido archivo 2C por el CO 15/09/2025 observaciones INT 21/09/2025 ajustes remitidos por el CO 23/09/2025 revisado y firmado por el residente técnico de INT
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-007-ActaEntornoIPL269-V002.pdf		
Huila	Neiva 41001-006	04/06/2025	**1**	Pavimento flexible en regular estado superficial con evidencias de desgaste, fisuras y pérdida o ausencia de demarcación vial. A lo largo del punto se identifican múltiples accesos a predios, tanto públicos como privados, los cuales generan interrupciones en la continuidad del andén y afectan la uniformidad del flujo peatonal. Sumideros en buen estado. Presencia de arboles aislados en andenes y separadores	15/09/2025 remitido archivo 2C por el CO 15/09/2025 sin observaciones INT 16/09/2025 remsion en PDF por el CO para firmas 23/09/2025 revisado y firmado por el residente técnico de INT
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-008-ActaEntornoNVA-V001		

Depto.	Municipio / Cod. punto	Fecha de elaboración	N° de actas de entorno	Estado del entorno	Observaciones / Trazabilidad
	Gigante 41524-001	10/10/2025	**1**	Pavimento rígido en regular estado superficial con evidencias de desgaste, fisuras y pérdida o ausencia de demarcación vial. A lo largo del punto se identifican múltiples accesos a predios privados, los cuales generan interrupciones en la continuidad del andén y afectan la uniformidad del flujo peatonal. No se evidencian sumideros. En andenes y antejardines, se evidencio la presencia de arboles aislados en algunos tramos.	10/10/2025 remitido archivo 2C por el CO 13/10/2025 en revisión de INT
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-009-ActaEntornoHUIGGT001-V001		
	Gigante 41524-002	06/06/2025	**1**	Pavimento rígido en regular estado superficial con evidencias de desgaste, fisuras y pérdida o ausencia de demarcación vial. A lo largo del punto se identifican múltiples accesos a predios privados, los cuales generan interrupciones en la continuidad del andén y afectan la uniformidad del flujo peatonal. No se evidencian sumideros. En andenes y antejardines, se evidencio la presencia de arboles aislados en algunos tramos rodeados o protegidos por bordillos	10/10/2025 remitido archivo 2C por el CO 13/10/2025 en revisión de INT
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-010-ActaEntornoHUIGGT002-V002.pdf		
	Gigante 41524-005	06/06/2025	**1**	Pavimento rígido en regular estado superficial con evidencias de desgaste, fisuras y pérdida o ausencia de demarcación vial. A lo largo del punto se identifican múltiples accesos a predios privados, los cuales generan interrupciones en la continuidad del andén y afectan la uniformidad del flujo peatonal. No se evidencian sumideros. En andenes y antejardines, se evidencio la presencia de arboles aislados en algunos tramos rodeados o protegidos por bordillos	10/10/2025 remitido archivo 2C por el CO 13/10/2025 en revisión de INT

Depto.	Municipio / Cod. punto	Fecha de elaboración	N° de actas de entorno	Estado del entorno	Observaciones / Trazabilidad
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-011-ActaEntornoHUIGGT005-V002.pdf		
	Yaguará 41885-002	06/06/2025	**1**	Pavimento rígido y flexible en regular estado superficial con evidencias de desgaste, fisuras y pérdida o ausencia de demarcación vial. A lo largo del punto se identifican múltiples accesos a predios privados, los cuales generan interrupciones en la continuidad del andén y afectan la uniformidad del flujo peatonal. Sumideros en buen estado, presencia de árboles aislados en andenes, separadores y antejardines.	13/10/2025 remitido archivo 2C por el CO 13/10/2025 en revisión de INT
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-012-ActaEntornoHUIYGR002-V001		
	Yaguará 41885-003	06/06/2025	**1**	Pavimento rígido y flexible en regular estado superficial con evidencias de desgaste, fisuras y pérdida o ausencia de demarcación vial. A lo largo del punto se identifican múltiples accesos a predios privados, los cuales generan interrupciones en la continuidad del andén y afectan la uniformidad del flujo peatonal. Sumideros en buen estado, presencia de árboles aislados en andenes, separadores y antejardines.	13/10/2025 remitido archivo 2C por el CO 13/10/2025 en revisión de INT
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-013-ActaEntornoHUIYGR003-V001		
	Yaguará 41885-004	06/06/2025	**1**	Pavimento rígido y flexible en regular estado superficial con evidencias de desgaste, fisuras y pérdida o ausencia de demarcación vial. A lo largo del punto se identifican múltiples accesos a predios privados, los cuales generan interrupciones en la continuidad del andén y afectan la uniformidad del flujo peatonal. Sumideros en buen estado, presencia de árboles aislados en andenes, separadores y antejardines.	13/10/2025 remitido archivo 2C por el CO 13/10/2025 en revisión de INT


Depto.	Municipio / Cod. punto	Fecha de elaboración	N° de actas de entorno	Estado del entorno	Observaciones / Trazabilidad
			Enlace: 001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-014-ActaEntornoHUIYGR004-V001		
Valle del Cauca	Buenaventura 76109-001	20/06/2025	**1**	Pavimento flexible en regular estado superficial con evidencias de desgaste, fisuras y pérdida o ausencia de demarcación vial. A lo largo del punto se identifican múltiples accesos a predios privados, no se evidencia presencia de sumideros para la evacuación de aguas; sin embargo, se observa la existencia de un caños que cumplen parcialmente la función de drenaje superficial del área. Zonas verdes no formales en un costado, entorno predominantemente urbano, con uso comercial y vehicular.	13/10/2025 remitido archivo 2C por el CO 13/10/2025 en revisión de INT
			Enlace:001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-015-ActaEntornoVDCBUE001-V001.pdf		
	Buenaventura 76109-002	20/06/2025	**1**	Pavimento flexible en regular estado superficial con evidencias de desgaste, fisuras y pérdida o ausencia de demarcación vial. Se identifican accesos a predios privados, no se evidencia presencia de sumideros para la evacuación de aguas; sin embargo, se observa la existencia de un caños que cumplen parcialmente la función de drenaje superficial del área. zona verde a lado y lado de la via en gran parte del punto.	13/10/2025 remitido archivo 2C por el CO 13/10/2025 en revisión de INT
			Enlace:001OPV-CTA-ZO5-ADE-GSO-016-ActaEntornoVDCBUE002-V001.pdf		

N° DE PUNTOS CON ACTAS DE ENTORNO RADICADAS EN EL MES	**11**
N° DE PUNTOS CON ACTAS DE ENTORNORADICADAS EN EL PERIODO ANTERIOR	**5**
TOTAL, N° DE PUNTOS CON ACTAS DE ENTORNO RADICADAS PARA EL CONTRATO	**16**

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista y Anexo 5 Correspondencia recibida, trazabilidad


✔ **Indicadores de cumplimiento.**

INDICADOR	FÓRMULA	CUMPLIMIENTO
GESTIÓN	N° Total de actas entorno radicadas en el periodo (11) N° Total de actas de entorno requeridas en el período (11) *100	100%
PRODUCTIVIDAD	N° Total de puntos con actas de entorno realizadas para el Depto. Nariño (2) / N° Total de puntos visitados y viabilizados para el Depto. Nariño (2)	100%
	N° Total de puntos con actas de entorno realizadas para el Depto. Huila (7) / N° Total de puntos visitados y viabilizados para el Depto. Huila (7)	100%
	N° Total de puntos con actas de entorno realizadas para el Depto. Valle del Cauca (2) / N° Total de puntos visitados y viabilizados para el Depto. Valle del Cauca (4)	50%
RESULTADO	N° Total puntos con actas de entorno radicadas para el contrato (16) N° Total de actas de entorno requeridas para el total de puntos entregados por la ANSV y apropiados para implementación (20)	80%

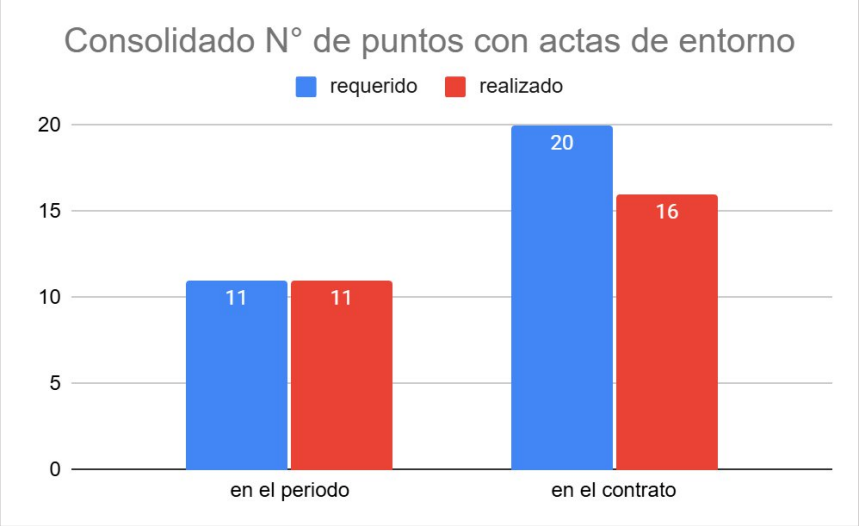

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

En cuanto a indicadores de gestión, se refiere el cumplimiento del 100% en la radicación de actas de entorno requeridas para la implementación en los puntos Ipiales, Neiva, Gigante, Yaguará y Buenaventura . Como resultado general del contrato, la realización de actas de aceptación en dos puntos viabilizados corresponde al cumplimiento del 80% en esta actividad.

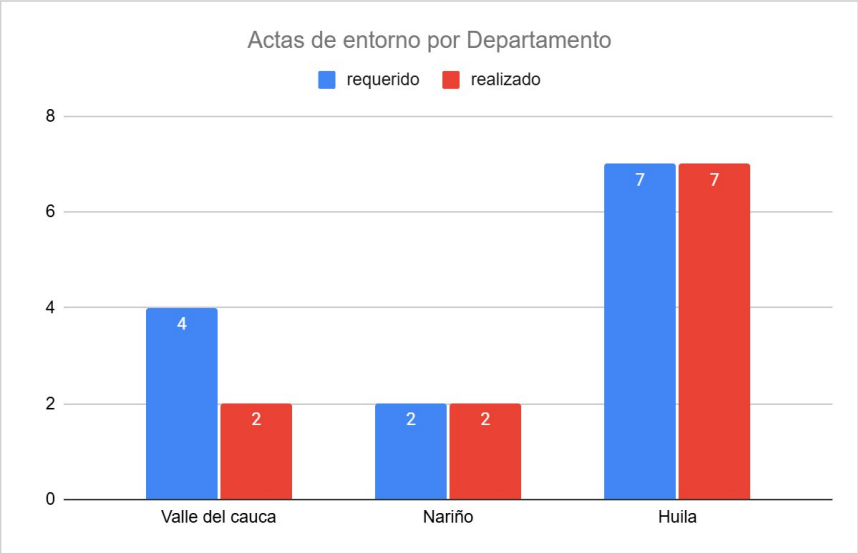

Fuente: Propia – Consorcio Señalización IPN

En cuanto a la entrega de actas de entorno por Departamentos, a la fecha el contratista dio cumplimientodel 100% con las actas de entorno de los departamentos de Huila y Nariño, y en un 50% con el departamento Valle del Cauca

12.4. Gestión para atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (PQRSD)

El área de gestión social busca establecer comunicación veraz, clara, precisa y constante con la comunidad localizada en el área de influencia de las implementaciones, por medio del suministro de datos Contratista de obra a los miembros de la comunidad, en aras de la atención a PQRSD que se presenten durante la vigencia del contrato.
A la fecha no se han reportado PQRSD por parte del equipo social del Contratista de obra.

Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista

Interventoría hará seguimiento al sistema de atención implementado por el ejecutor del contrato de obra PA-027-2025 mediante los canales de atención informados en su Plan de Gestión Social, a saber:
correo electrónico: social5ansv.fernac@gmail.com
teléfono / WhatsApp 3143256316 o 313 8906602
Se verificará el uso del formato de la ASNV GEA-054 para el registro de las PQRSD que se alleguen al Contratista de obra.

13. MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Este componente pretende mantener comunicación constante entre la entidad contratante, Interventoría y Contratista frente a los seguimientos pactados para cumplimiento de los contratos, lo cual se efectuará durante la vigencia del proyecto.

La Interventoría hizo revisión, evaluación y seguimiento a los documentos entregados por el Contratista, entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, que se enumeran a continuación.


- Aprobación del Informe mensual social N° 4 - v2 del Contratista de obra
- Revisión y observaciones del Informe mensual social N° 5 del Contratista de obra, verificación de ajustes y aprobación en versión 2
- Verificación de los soportes de actividades con comunidad, actas de vecindad y aceptación, Actas de entorno.
- Participación en Comités de Seguimiento Semanal
- Trámite de aprobación de piezas de comunicación

A continuación, se detalla la totalidad de reportes y documentos a los que se realiza seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice E Componente de Gestión Social y Comunicaciones Estratégicas:

13.1. Cronograma de actividades

El Contratista de obra presentó con el Plan de Gestión Social – versión 2 el cronograma general de actividades para el desarrollo del componente social. La aceptación para seguimiento de este cronograma se dio con la aprobación del PGS v2 mediante comunicado 2025-IN022-1353 de Interventoría:

Ilustración 2 Cronograma general del Contratista, versión 2

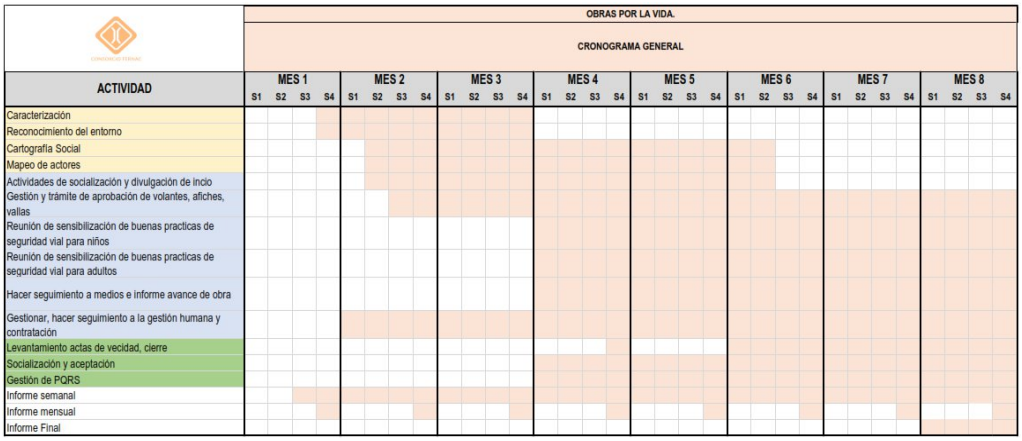


Fuente: Consorcio Fernac PGS v2, comunicado 2025-CF-OF-043

De acuerdo con el cronograma del Contratista de obra, en el mes 06 de ejecución del contrato se ha dado cumplimiento a la ejecución de actividades sociales de Reconocimiento del entorno y gestiones para desarrollar Cartografía social y consolidar el Directorio de actores de los puntos visitados en fase de apropiación, así como el desarrollo de talleres de seguridad vial; este cronograma se encuentra dentro de los anexos del informe mensual social N° 2 - v página 49.

13.2. Comités de seguimiento y mesas de trabajo

Los espacios de seguimiento realizados tanto con la ANSV como con el Contratista de obra han sido acordados con las partes de acuerdo con la dinámica del contrato. Entre el 14 de septiembre y el 13 de octubre de 2025, dadas las actividades de campo del equipo del Contratista e Interventoría se mantuvo la comunicación y atención de necesidades del contrato en razón a ello; se indican las más relevantes a continuación cada una con su respectivo soporte:

- 16 de septiembre de 2025 en conversación con el equipo social del Contratista de obra, utilizando canales digitales se realizó la actualización del balance de actividades sociales, para presentar en el comité de obra semanal



Fuente: Propia - Consorcio Señalización IPN

- 30 de septiembre de 2025, se realizó visita al municipio de Ipiales, por solicitud de la secretaría de movilidad del municipio para atender al señor concejal Jaime Revelo, quien había manifestado tener inconformidades ante la instalación de dispositivos de control en zonas particulares. A la reunión acordada no hizo presencia el sr. concejal, dejando lo sucedido en acta de reunión del municipio.

Ver Tabla de anexos: Anexo 5 Correspondencia recibida, trazabilidad - Reunión Sec. Movilidad Ipiales 30/09/2025 001OPV-INT-ZO5-ARE-GEA-001-ActaReuniónIpiales-V001




Fuente: Propia - Consorcio Señalización IPN

- **Seguimiento Social entre Contratista, Interventoría y ANSV Z5 OPV**

– 10 de octubre de 2025 mediante reunión virtual en plataforma Teams se realizó comité de seguimiento social en conjunto con directores de obra e interventoría y profesionales de la supervisión social y técnica de la ANSV, con el fin de dar claridad a la gestión de entrega de documentos pendientes y/o con demoras en la atención de observaciones y cargue el SharePoint3P, con el compromiso de realizar las gestiones pertinentes con prontitud.

Ver Tabla de anexos: Anexo 5 Correspondencia recibida, trazabilidad – Acta de comité 10/10/2025 001OPV-INT-ZO5-ARE-GEA-004-ActaReunion10-V001

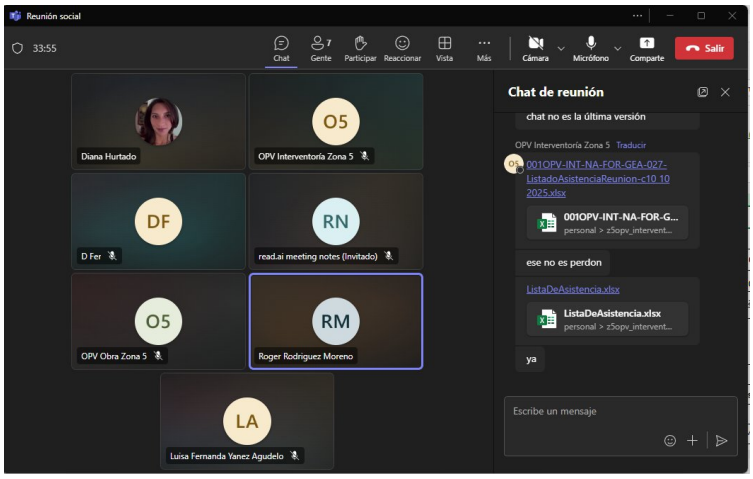

Fuente: Propia - Consorcio Señalización IPN



13.3. Comité Integral semanal



La Interventoría social ha participado en los comités integrales semanales que se realizan con los profesionales y especialistas de las diferentes áreas involucradas en el proyecto de implementación de señalización para los puntos

priorizados de la zona 5; en estos espacios desde el área social se informa los avances de la gestión social adelantada por el Contratista de obra.

A continuación, se presenta el reporte realizado por la profesional social de Interventoría en los comités de seguimiento semanal correspondientes al periodo 14 de septiembre al 13 de octubre de 2025, tal como aparecen cargadas en el SharePoint 3P:

Tabla 29 Reporte de gestión social y comunicaciones en comités semanales

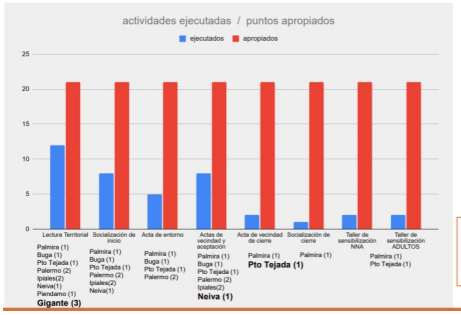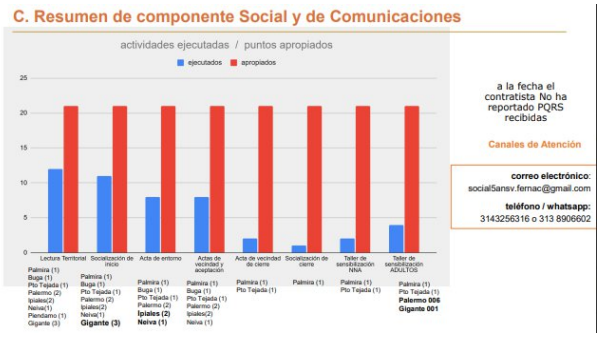Comité N°	Fecha	Reporte
23	2025/09/17	**C. Resumen de componente Social y de Comunicaciones**  **D. Resumen de actividades componente SST** **Actividades de la semana en Palermo e Ipiales** Inspección de herramientas Inspección de Vehículos (cinco) Inspección de Maquinaria y Equipos (seis) Inspección de EPP y cambio de los mismos Se llevó a cabo capacitación de prevención y conservación auditiva La interventoría dio la aprobación de la cuadrilla N° 7 - ingreso de cinco personas La interventoría dio el aval de los informes **N° 3 y 4** desde la parte SST. El día 16 de septiembre se recepciona una información de la Agencia donde solicita ajustar la actualización de de la matriz legal, implementación, el cual se debe ver reflejado en el informe 5 de cada uno de los proponentes (contratista e interventoría)
24	2025/09/24	**C. Resumen de componente Social y de Comunicaciones** 

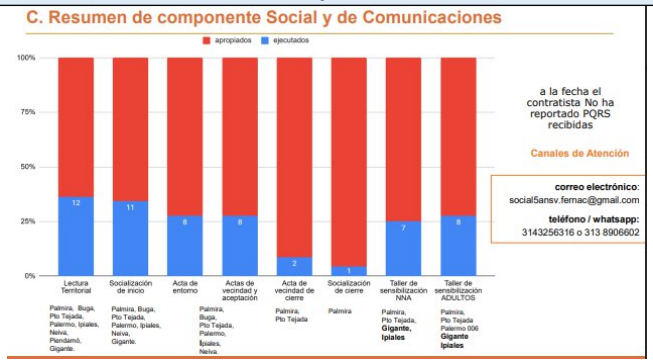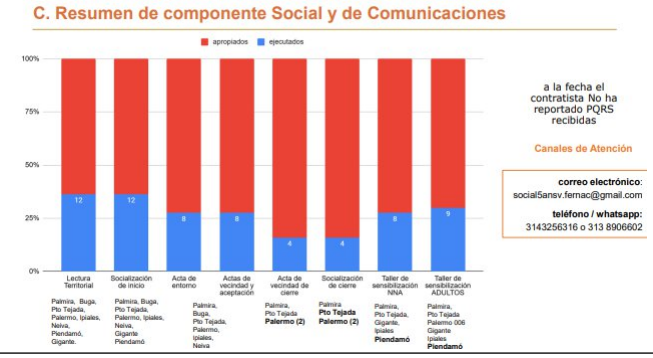Comité N°	Fecha	Reporte
25	2025/10/01	
26	2025/10/08	

Ver Tabla de anexos - Anexo 3 Participación en comité de seguimiento integral

13.4. Reporte semanal

Tanto Contratista de obra como Interventoría reportan semanalmente actividades adelantadas para dar cumplimiento del plan de gestión social presentado ante la ANSV y conforme a lo requerido desde el Apéndice de Gestión Social y Comunicaciones.

La Interventoría revisa y emite concepto ante los reportes enviados por el Contratista de obra de manera semanal cuando es requerido. A continuación, se presenta consolidado de reportes semanales correspondientes al mes N° 6 de ejecución del proyecto:

Tabla 30 Consolidado de reportes y programación de actividades semanales del Contratista PA-027-2025

N°	Periodo reportado	
23	15/09/2025	21/09/2025
24	22/09/2025	28/09/2025
25	29/09/2025	05/10/2025
26	06/10/2025	12/10/2025

Fuente: Propia – archivo Consorcio Señalización IPN

Como Interventoría social, se incluyó el reporte semanal de actividades en el formato establecido:

Tabla 31 Consolidado de reportes y programación de actividades semanales de Interventoría PA-100-2025

N°	Periodo reportado		Actividades reportadas	Programación de actividades
23	15/09/2025	21/09/2025	Revisión de documentación cargada en SharePoint 2C del contratista: Actas de entorno Neiva, Palermo e Ipiales, Actas de vecindad de cierre de Puerto Tejada, Actas de taller de Puerto Tejada, Lectura Territorial Puerto Tejada, Buga y Actas de reunión de inicio de Palermo 006 y 002 e Ipiales 269 // Informe mensual social N°4 versión 2 fue aprobado con la atención de observaciones realizadas por el contratista de obra. Realizada la gestión con la entidad, se envió correo electrónico al contratista confirmándole que los formatos para entrevista semiestructurada a implementar post intervención de obra, se encuentran cargados en la carpeta de formatos del contrato, en la misma carpeta se encuentra el formato de Invitación resaltando que para efectos de generar la invitación correspondiente, sea compartido a esta interventoría con 3 días de anticipación a la entrega de la invitación los datos completos y suficientes para generar el respectivo documento; lo cual aplica para las entrevistas Ex-ante. Se aprobaron piezas de comunicación para los 3 puntos de Gigante 41306-001/002/005 (valla móvil, afiche y volante) el contratista distribuyó volantes y afiches el 15 y 17 de septiembre // se realizaron reuniones de inicio en este punto, el 18 y 20 de septiembre de acuerdo con la programación entregada. Asistencia a las reuniones de inicio: Gigante 005 con la	- Seguimiento al desarrollo de las actividades diagnósticas faltantes. - Validar el reconocimiento del entorno físico y social realizado por el equipo social del Contratista. - Revisar la pertinencia y cobertura del mapeo de actores clave a nivel comunitario e institucional. - Verificar permanencia del equipo social completo. - Seguimiento a la resolución de solicitudes recibidas para modificar aspectos requeridos en Apéndice E en la ejecución de actividades sociales en Yaguará y Puerto Tejada

N°	Periodo reportado		Actividades reportadas	Programación de actividades
			participación de 18 personas de la comunidad, Gigante 002 con la participación de 15 personas de la comunidad, Gigante 001 con la participación de 22 de la comunidad. Dentro de las actividades ejecutadas por el contratista para la semana se encuentran los Talleres de sensibilización en seguridad vial dirigidos a población adulta, los cuales se realizaron en Gigante (41306-001) con la participación de 22 personas de la comunidad y Palermo (006) en la que participaron 15 personas de la comunidad. Ante las solicitudes de unificar actividades sociales para los 3 puntos de Yaguará por ser contiguos, flexibilizar la entrega de volantes y quórum de reuniones así como reducir el número de talleres de sensibilización, y de realizar reunión de cierre virtual del punto Puerto Tejada la interventoría revisó conforme a lo establecido por el apéndice E - Gestión Social y comunicaciones y emitió concepto dirigido a la ANSV con el fin de que sea contemplado y proceder con los avales, si es el caso, de la supervisión del proyecto. comunicados radicados Yaguará 2025-IN022-2937 18/09/2025 y Pto Tejada 2025-IN022-2958 19/09/2025	
24	22/09 /2025	28/09/ 2025	Revisión de documentación cargada en SharePoint 2C del contratista: Distribución de piezas de comunicación de NEIVA, PALERMO - 41524-002 y 41524-006 solicitando corregir nombre del archivo, Lectura territorial de Buga aprobada para cargue en carpeta 3P. Se remitieron actas de entorno de Palermo 002 y 006, Ipiales 268 y 269 y Neiva, revisadas y firmadas por el apoyo técnico de la interventoría. Elaboración de informe mensual N°2 de interventoría, remitido internamente para posterior envío a la ANSV. Se programó visita para reunión en Ipiales el 30 de septiembre de 2025 a las 3:00 p.m. con el ente territorial y comunidad con el fin de dejar soportes de la solicitud de la comunidad y el ente territorial de no intervención en sitios específicos. Actividades ejecutadas por el contratista: Talleres de sensibilización en seguridad vial dirigidos a población en edad escolar y población adulta, los cuales se realizaron en Gigante 001, 002 y 005 con participación de 15 NNA por taller; en Gigante	-Seguimiento al desarrollo de las actividades diagnósticas faltantes, asegurando que se cumpla la metodología definida en el Plan de Gestión Social. - Validar el reconocimiento del entorno físico y social realizado por el equipo social del Contratista con lo documentos que remita para revisión - Revisar la pertinencia y cobertura del mapeo de actores clave a nivel comunitario e institucional. - Verificar el cumplimiento del Contratista con la permanencia del equipo social completo. - Seguimiento a la resolución de solicitudes recibidas para modificar aspectos requeridos en Apéndice E en la

N°	Periodo reportado		Actividades reportadas	Programación de actividades
			005 y 002 dirigidos a adultos con la participación de 15 personas en cada uno. En Ipiales 268 y 269 con participación de 20 estudiantes de la IE Siglo XIX, 28 estudiantes de la IE Mentes Creativas, 25 estudiantes de la IE San Felipe Neri y 25 estudiantes de la IE Mixto San Felipe Neri. Ante las solicitudes de unificar actividades sociales para los 3 puntos de Yaguará por ser contiguos, flexibilizar la entrega de volantes y quórum de reuniones, así como reducir el número de talleres de sensibilización, y de realizar reunión de cierre virtual del punto Puerto Tejada la ANSV se pronunció mediante los radicados No. 20253000093841 y No. 20253000093861 dando aval a las consideraciones expresadas por la interventoría ante cada uno de los casos.	ejecución de actividades sociales en Yaguará y Puerto Tejada - Visita a puntos 268 y 269 en Ipiales, reunión programada con el ente territorial
25	29/09 /2025	05/10/ 2025	Revisión de documentación cargada en SharePoint 2C del contratista: Presentación PPT para las reuniones de cierre de Puerto Tejada y Palermo 002 - 006, así como la reunión de inicio de Piendamó. Se remitieron actas de entorno de Palermo 002 y 006, Ipiales 268 y 269 y Neiva, revisadas y firmadas por el apoyo técnico de la interventoría. Frente a las inconformidades de un ciudadano en el municipio de Ipiales, que impidió realizar la implementación de señalización en puntos específicos, el equipo social y técnico de interventoría y contratista realizó acercamiento en terreno para dar manejo a las inconformidades del Concejal Jaime Revelo, sin embargo este no se presentó a la reunión citada, de tal forma que, en compañía de la secretaría de movilidad se dejó acta de constancia; los funcionarios de la secretaría compartieron el acta de recorrido en la que se le informó al sr Revelo los pormenores del proyecto atendiendo sus inquietudes, producto de dicho recorrido la secretaría de movilidad determinó no insistir en lograr la aceptación del líder de la comunidad pues se mostraron intereses de carácter político que no corresponden a los principios del convenio con la ANSV. Revisión del informe mensual N°5 - v1 del contratista, con observaciones. Actividades ejecutadas por el contratista: actas de vecindad de cierre de Palermo 002 y 006, Reunión de cierre de Palermo 002	- Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades diagnósticas de caracterización social faltantes, asegurando que se cumpla la metodología definida en el Plan de Gestión Social. - Validar el reconocimiento del entorno físico y social realizado por el equipo social del Contratista con lo documentos que remita para revisión - Revisar la pertinencia y cobertura del mapeo de actores clave a nivel comunitario e institucional. - Verificar el cumplimiento del Contratista con la permanencia del equipo social completo.

N°	Periodo reportado		Actividades reportadas	Programación de actividades
			con la participación de 19 asistentes de la comunidad,1 representantes de la Junta de Acción Comunal, 1 Vendedor de Palermo y 1 persona en representante Institución Educativa José Reinel Cerquera y1 representantes del ente territorial de Palermo // Reunión de cierre de Palermo 006 con participación de 16 asistentes de la comunidad, 1 representantes de la Junta de Acción Comunal y 1 representante del ente territorial de Palermo // Reunión de cierre de Puerto Tejada con la participación de 18 asistentes de la comunidad y 1 representante del ente territorial // Reunión de inicio de Piendamó con la participación de 16 personas de la comunidad // Taller de seguridad para niños con la participación de 22 niños y niñas de Institución Educativa Simón Bolívar San Cayetano // Taller de seguridad Vial para Adultos con la participación de 15 asistentes de la comunidad.	
26	06/10 /2025	12/10/ 2025	Revisión de documentación cargada en SharePoint 2C del contratista: Actas de cierre de Palermo 002 y 006, Acta de reunión de cierre de Puerto Tejada, actas de Talleres de seguridad Vial desarrollados en los puntos Ipiales 268 y 269 y en Palermo. En revisión de Interventoría la Lectura Territorial de Yaguará 41885-002 / 003/ 004. Interventoría recibió y tramitó Piezas de Comunicación y presentaciones para reuniones de inicio programadas por el contratista para: Yaguará: Centro de recursos educativos Rómulo Trujillo / 13 de octubre de 2025 / 03:00 p. m. Buenaventura: Caseta comunal Barrio Triunfo / 18 de octubre de 2025 / 02:00 p. m. Se realizó la revisión del informe mensual N°5 - v2 del contratista, con aprobación. Se realizó comité de seguimiento social informando documentación no recibida y estableciendo compromisos de entrega y se reportó al contratista problemas con el acceso a la bitácora social.	- Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades diagnósticas de caracterización social faltantes, asegurando que se cumpla la metodología definida en el Plan de Gestión Social. - Validar el reconocimiento del entorno físico y social realizado por el equipo social del Contratista con lo documentos que remita para revisión - Revisar la pertinencia y cobertura del mapeo de actores clave a nivel comunitario e institucional. - Verificar el cumplimiento del Contratista con la permanencia del equipo social completo.

Fuente: Propia – Archivo Consorcio Señalización IPN

Ver Tabla de Anexos - Anexo 4 Informes semanales

- **Bitácora social**

Interventoría realiza seguimiento a la bitácora social que el Contratista gestionará de manera virtual, a través de una carpeta compartida en la plataforma On Drive, asegurando el acceso oportuno y organizado por parte del equipo del proyecto y de la Interventoría. Esta herramienta metodológica lleva el registro sistemático, ordenado y cronológico de las actividades, interacciones y eventos desarrollados en el marco de la gestión social del proyecto.

Como se ha indicado en informes anteriores, se cuenta con enlace del archivo "Bitácora digital" que alimenta el equipo social del contratista en línea para revisión de la Interventoría: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fvw7WNB5fV8fQKVoX4bFruFC_tfgX6gGwU5pO6uv01w/edit?usp=sharing , esta es revisada periódicamente insertando comentarios de la Interventoría cuando la actividad reportada lo amerita, sin embargo, al terminar el periodo se reportó fallas en el acceso al enlace, solicitándole al contratista revisar y validad autorizaciones para continuar con la revisión correspondiente:

Ilustración 3 Bitácora digital del componente social, revisión y seguimiento

FECHA	PUNTO	MUNICIPIO	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES DE FERNAC	OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA
			pertienente repartir mas volantes para la reunión de cierre		
30/09/2025	1	Piendamó	Se realiza distribucion de Piezas de comunicacion de Piendamo 19548-008(10 Afiches, 100 volantes)- socializacion de inicio		
30/09/2025	1	ndamo 19548-(	Se realiza distribucion de Piezas de comunicacion de Piendamo 19548-008(100 volantes del PMT)		
01/10/2025	1	ndamo 19548-(	Se continua con la distribucion de volantes de PMT informacion de cierre de via parcial por ejecucion de Obra		
02/10/2025	6	Palermo 006	Se realiza distribución de piezas de comunicación socializacion de cierre y se distribuyen 100 volantes		
02/10/2025	2	Palermo 002	Se realiza distribución de piezas de comunicación volante de cierre y se distribuyen 100 volantes		
02/10/2025		Palermo 002	Se realiza ls actas de vecindad de cierre de Palermo 002		
02/10/2025		Palermo 006	Se realiza ls actas de vecindad de cierre de Palermo 006		
	8	ndamó 19548-(	Se realiza reunion de inicio de piendamo con la participacion de 16 participantes de la comunidad		
	8	ndamo 19548-(	Se realiza taller de seguridad para niños con la participación de 22 niños y niñas de Institucion Educativa Simon Bolivar San Cayetano		
	819548-008	Piendamo	Se Aplica entrevista evaluación de Impacto de Piendamo Instrumento D – Representante de la Comunidad Instrumento C – Representante del Municipio Instrumento B – Representante Autoridad de Tránsito Instrumento A – Representante Administrador Vial	Antes de encuesta de para evaluacion de impacto Programa Obras por la Vida, se hace firmar Concentimiento Informado	Se deja la anotación que el contratista no está remitiendo programación previa solicitada en correo electrónico del 16 de septiembre para emitir las invitaciones, cito: ***Es importante que, para efectos de generar la invitación correspondiente, sea compartido a esta interventoría con 3 días de anticipación a la entrega de la invitación los datos completos y suficientes para generar el respectivo documento; esto aplica para las entrevistas ex-ante.***
	8	ndamo 19548-(	Se raliza taller de seguridad Vial para Adultos con la		

Fuente: Propia – Archivo compartido Consorcio Fernac y Consorcio Señalización IPN

13.5. Informes mensuales

– Informes mensuales del Contratista de obra, Consorcio Fernac

Nota: Fuera del periodo correspondiente a las actividades que se reportan en el presente informe N°6 y para posibilitar la elaboración y entrega a la ANSV del presente informe de interventoría, se revisó y aprobó por la Interventoría el Informe Mensual N° 6 - versión 2 CO del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2025 con el oficio de consecutivo 2025-IN022-3686, generado el 07 de noviembre de 2025.

Ver tabla de anexos – Anexo 1 IMS N°6 trazabilidad y comunicado de aprobación

En lo correspondiente al estado consolidado de aprobación de informes mensuales sociales del Contratista de obra al corte del 13/10/2025, periodo reportado para este informe, se presenta a continuación su trazabilidad:

Informe Mensual N° 5 - versión 2 CO 14 de agosto al 13 de septiembre del 2025	19/09/2025 remitido en correo electrónico por el Contratista de Obra 29/09/2025 observaciones de Interventoría 02/10/2025 ajustada versión 2 por el Contratista de Obra 04/10/2025 Interventoría solicitó ajustes de forma y revisión de enlaces 04/10/2025 Ajustado y remitido para firmas por el CO 06/10/2025 aprobación de Interventoría **Ver Anexo 5** Correspondencia enviada y trazabilidad **Enlace:** 001OPV-CTA-ZO5-IFM-GSO-005-ComponenteSocial-V002
Informe Mensual N° 4 - versión 2 CO 14 de julio al 13 de agosto del 2025	15/09/2025 ajustado el Contratista de Obra 15/09/2025 aprobación de interventoría en correo electrónico **Ver Anexo 5** Correspondencia enviada y trazabilidad **Enlace:** 001OPV-CTA-ZO5-IFM-GSO-004-ComponenteSocial-V002.pdf
Informe Mensual N° 3 - versión 2 CO 14 de junio al 13 de julio del 2025	10/09/2025 INT aprobó en correo electrónico y remitió con firmas para cargue en SharePoint **Enlace:**001OPV-CTA-ZO5-IFM-GSO-003-ComponenteSocial-V002.pdf
Informe Mensual N° 2 - versión 2 CO 14 de junio al 13 de julio del 2025	28/07/2025 INT aprobó mediante el comunicado 2025-IN022-2211. 001OPV-INT-ZO5-COE-GSO-093-2211AprobacionInformeSocialN°2v2-V001 **Enlace:** 001OPV-CTA-ZO5-IFM-GSO-002-ComponenteSocial-V002.pdf
Informe Mensual N° 1 - versión 2 CO 14 de junio al 13 de julio del 2025	16/05/2025 INT aprobó mediante el comunicado 2025-IN022-1719. 001OPV-INT-ZO5-COE-GEA-045-1719ConcepAproIFM1v2-V001 **Enlace:** 001OPV-CTA-ZO5-IFM-GEA-001-InformeMensual-V002

Ver Tabla de anexos - Anexo 5 Correspondencia enviada, trazabilidad

– Informes mensuales de la Interventoría, Consorcio Señalización IPN

El reporte mensual de actividades del componente de gestión social y comunicaciones de la Interventoría se presenta a continuación:

Informe Mensual N° 5 - versión 3 INT 14 de agosto al 13 de septiembre del 2025	26/01/2026 verificación de atención de observaciones en mesa de trabajo, quedando aprobado el IMS N°5 de Interventoría versión 3 **Enlace** 001OPV-INT-ZO5-IFM-GSO-005-InformeSocial-V003
Informe Mensual N° 4 - versión 2 INT 14 de julio al 13 de agosto del 2025	06/01/2026 en correo electrónico por la profesional social del programa Obras por la Vida – OPV Zona 5.

	Enlace 001OPV-INT-ZO5-IFM-GSO-004-InformeSocial-V002.pdf
Informe Mensual N° 3 - versión 2 INT 14 de junio al 13 de julio del 2025	28/11/2025 en correo electrónico por la profesional social del programa Obras por la Vida – OPV Zona 5. **Enlace** 001OPV-INT-ZO5-IFM-GSO-003-InformeSocial-V002
Informe Mensual N° 2 - versión 2 INT 14 de junio al 13 de julio del 2025	14/11/2025 en correo electrónico por la profesional social del programa Obras por la Vida – OPV Zona 5. **Enlace** 001OPV-INT-ZO5-IFM-GSO-002-InformeSocial-V002
Informe Mensual N° 1 - versión 2 INT 14 de junio al 13 de julio del 2025	**11/07/2025** en correo electrónico por la profesional social del programa Obras por la Vida – OPV Zona 5. **Enlace** 001OPV-INT-ZO5-IFM-GSO-001-InformeSocial-V002 **anexos** 001OPV-INT-ZO5-ANX-GSO-001-InformeSocial-V002

13.6. Informe final

No aplica para este periodo.

Una vez culminadas las acciones constructivas, desde el área de Gestión Social de Contratista de obra e Interventoría, se elaborará un informe final, el cual incluirá la trazabilidad de las actividades realizadas durante la vigencia del contrato, este será elaborado con base en los parámetros entregados por la ANSV, en su estructura, deberá contener como mínimo la información solicitada para los informes mensuales.

13.7. Otros Entregables

- **Entrevista semiestructurada – Evaluación de impacto**

En cuanto a la implementación de entrevistas en el escenario Ex-ante, informó el Contratista de obra que la aplicación de la encuesta fue realizada por la profesional social del Consorcio Fernac, utilizando los formatos entregados por la ANSV, sin embargo, es deber de la Interventoría indicar que no se obtuvo programación alguna para el desarrollo de esta actividad y el formato de invitación no fue solicitado por el Contratista previo a la implementación de entrevistas.

– **Aplicación de entrevistas Ex-ante**:
En bitácora social y en informe mensual N°6 (Tabla 22) el equipo social del Contratista de obra reportó la ejecución de entrevistas con la aplicación de los siguientes instrumentos:

Tabla 22 Aplicación de Entrevista Semiestructurada Ex Ante

FECHA	MUNICIPIO	CODIGO DEL PUNTO	NOMBRE DEL ACTOR SOCIAL ENTREVISTADO	INSTRUMENTO APLICADO	AUTORIZO EL CONSENTIMIENTO	
					Audio	Foto
16/09/25	Neiva	41001-006	German Darío Sánchez	Instrumento A – Representante Administrador Vial	Si	Si
			Edna Johanna Cruz Bonilla	Instrumento B – Representante Autoridad de Tránsito	Si	Si
			Oscar Fabian Polania Dussan	Instrumento C – Representante del Municipio	Si	Si
09/08/25			Dora Lilia Rodríguez	Instrumento D – Representante de la Comunidad	Si	Si
18/09/25	Gigante	41524-002 41524-005	Francisco Javier Cubillos	Instrumento A – Representante Administrador Vial	Si	Si
			Leidy Johana Acosta	Instrumento B – Representante Autoridad de Tránsito	Si	Si
			Luis Carlos Peña	Instrumento C – Representante del Municipio	Si	Si
			Julio Cesar Campos	Instrumento D – Representante de la Comunidad	Si	Si
22/09/25	Yaguará	41885-004	Yan Franso López	Instrumento A – Representante Administrador Vial	No	Si
			Andrés Gómez Monje	Instrumento B – Representante Autoridad de Tránsito	No	Si
			María Alejandra Chavarro	Instrumento C – Representante del Municipio	No	Si
			Leidy Nataly Andrade	Instrumento D – Representante de la Comunidad	No	Si
03/10/25	Piendamó	19548-008	Arnohy Pechene Gutiérrez	Instrumento A – Representante Administrador Vial	No	Si
			Adrian Alberto Tombe Cantero	Instrumento B – Representante Autoridad de Tránsito	No	Si
			Edwin Elías Medoba Morera	Instrumento C – Representante del Municipio	No	Si
			Walter Rodriguez Flor	Instrumento D – Representante de la Comunidad	No	Si

Fuente: Informe Mensual social N°6 v-2 CO – Tabla 22 Aplicación de encuesta


Ver Tabla de anexos - Anexo 1 IMS N°6 - v2 del Contratista

Al cierre del presente periodo, el Contratista de obra no hizo entrega de análisis de resultados ni soportes de cuestionarios de las entrevistas ejecutadas, al respecto, la Interventoría continuó señalando en Bitácora Social lo siguiente:

> *"remitir invitaciones / no se está cumpliendo con informar a la interventoría la programación previa para acompañamiento"*

Adicionalmente, en correo electrónico se reiteró al Contratista de obra la necesidad de informar a la interventoría con anticipación la programación de entrevistas para generar las invitaciones y gestionar internamente el acompañamiento.

Ilustración 4 Correo electrónico de Interventoría de fecha 16/09/2025

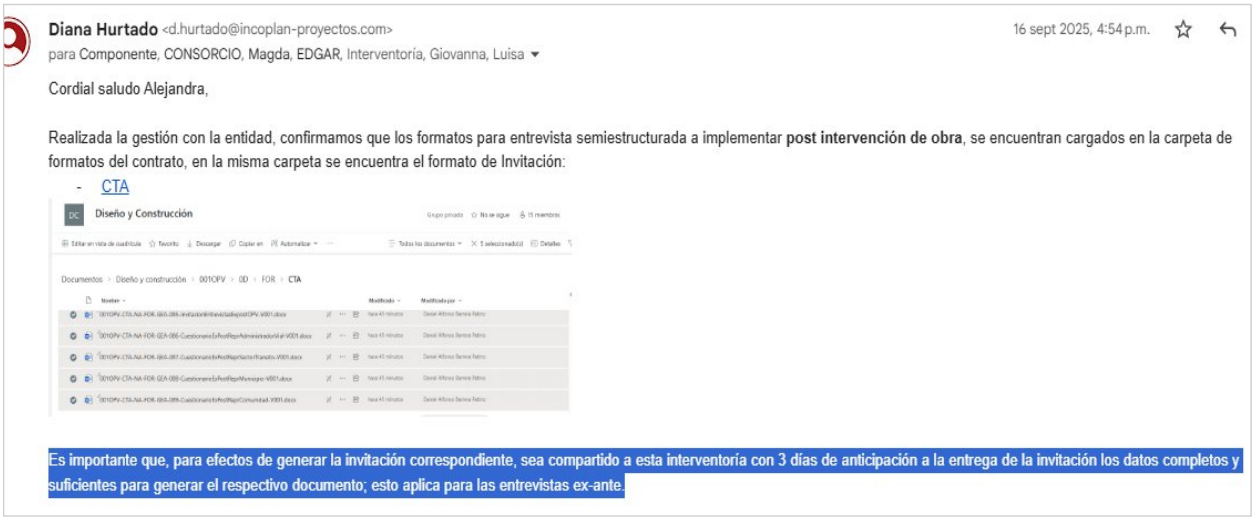

Fuente: Propia Consorcio Señalización IPN

- **Plan de Acción de Interventoría - PAI**

La Interventoría generó el documento Plan de Acción de Interventoría - PAI en el marco de cumplimiento a las obligaciones contractuales estimadas para los contratos de obra N° PA-027-2025 y de Interventoría N° PA 100-2025, tomando como referencia el Apéndice E "especificaciones para el componente de gestión social y comunicaciones estratégicas" documento contractual de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

El PAI detalla los componentes de la gestión social y los elementos de monitoreo, evaluación y seguimiento que implementa la Interventoría Consorcio Señalización IPN al contrato de obra asignado al Consorcio Fernac; este documento fue aprobado por la ANSV el 11 de julio de 2025 con radicado No. 20253000066851 001OPV-ASV-ZO5-PQE-GEA-001-R0054092, la trazabilidad del entregable se presentó en el IMS de Interventoría N° 3 – versión 2 **Enlace del PAI en SharePoint 3P**: 001OPV-INT-ZO4-POP-GSO-001-PlanAccionInterventoria-V002

13.8. Seguimiento y trazabilidad de la correspondencia enviada y recibida

Para este periodo, la remisión de oficios entre Contratista de obra e Interventoría social se redujo considerablemente, es así que para el periodo correspondiente del 14 de septiembre al 13 de octubre de 2025 no se reportan comunicados oficiales ya que se implementaron revisiones directamente en los documentos editables haciendo uso del SharePoint para la zona 5 y las aprobaciones se realizaron mediante notificación de correo electrónico, por lo que se registra la trazabilidad de revisiones de los entregables del componente de Gestión social en el anexo 5 de la tabla de anexos, denominado Correspondencia enviada y trazabilidad.

13.9. Verificación del uso de formatos establecidos por la ANSV

Una vez se de inicio a las actividades de gestión social con comunidad la profesional social de la Interventoría se encargará de verificar que sean utilizados los formatos vigentes establecidos por la entidad contratante para el desarrollo de las actividades contempladas en el Plan de Gestión Social como respuesta a los lineamientos del apéndice E contractual.

CTA-NA-FOR-GEA-004	Registro Fotográfico
CTA-NA-FOR-GEA-005	Acta de Reunión
CTA-NA-FOR-GEA-016	Informe Semanal
CTA-NA-FOR-GEA-047	Acta de Vecindad de Inicio
CTA-NA-FOR-GEA-048	Acta de Aceptación
CTA-NA-FOR-GEA-049	Acta de Entorno
CTA-NA-FOR-GEA-050	Acta de Vecindad de Cierre
CTA-NA-FOR-GEA-051	Directorio de Actores
CTA-NA-FOR-GEA-052	Registro de Divulgación de Información
CTA-NA-FOR-GEA-053	Entrega de Piezas de Comunicación
CTA-NA-FOR-GEA-054	Formato atención de PQRSD
CTA-NA-FOR-GEA-055	Formato Valla Móvil
CTA-NA-FOR-GEA-056	Formato Afiche
CTA-NA-FOR-GEA-057	Volante de Socialización diseño nuevo
CTA-NA-FOR-GEA-058	Volante de Socialización inicio de obra
CTA-NA-FOR-GEA-059	Volante de Socialización fin de obra
CTA-NA-FOR-GEA-064	Listado de Asistencia Reunión

CTA-NA-FOR-GEA-071	Plantilla ppt Reunión socialización de diseño
CTA-NA-FOR-GEA-072	Plantilla ppt Reunión inicio de obra
CTA-NA-FOR-GEA-073	Plantilla ppt Reunión fin de obra
CTA-NA-FOR-GEA-074	Plantilla ppt Taller de sensibilización

14. TABLA DE ANEXOS

Tabla 32 Anexos del Informe Mensual Social N°6 Interventoría

Anexos IMS 6		Enlace de consulta
Anexo 1 Informe mensual social N°6 del Contratista	Trazabilidad revisión y aprobación de IMS N°6 CO	001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-001-A1TrazabIMS6CO-V001.pdf
	Documento aprobado IMS N°6 versión 2	001OPV-CTA-ZO5-IFM-GSO-006-ComponenteSocial-V002
	Oficio de Aprobación 2025-IN022-3686	001OPV-INT-ZO5-COE-GEA-212-3686AprobaciónInformeSocial6-V001
Anexo 2 Actas de visita de apropiación	San José del Fragua 18610-004	001OPV-INT-ZO5-AVS-GSO-031-ActaVisitaSanJose004-V001.pdf
	San José del Fragua 18610-003	001OPV-INT-ZO5-AVS-GSO-030-ActaVisitaSanJose003-V001.pdf
	San José del Fragua 18610-002	001OPV-INT-ZO5-AVS-GSO-029-ActaVisitaSanJose002-V001.pdf
	San José del Fragua 18610-001	001OPV-INT-ZO5-AVS-GSO-028-ActaVisitaSanJose001-V001.pdf
	Puerto Rico 18592-001	001OPV-INT-ZO5-AVS-GSO-027-ActaVisitaPtoRico001-V001.pdf
	El Paujil 18256-002	001OPV-INT-ZO5-AVS-GSO-026-ActaVisitaElPaujil-V001.pdf
Anexo 3 Comité semanal	Comités de seguimiento semanal integral	M06
Anexo 4 Informes semanales	18 al 22 del Contratista	M06
	18 al 22 de la Interventoría	M06
Anexo 5 Correspondencia y trazabilidad de revisión y aprobación mediante correo electrónico	Lectura territorial, (directorio actores, caracterización y cartografía social)	Buga 76111-006 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabLectTerritorialBUG-V001.pdf Palermo 41524-002 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabLectTerritorialPLM002-V001.pdf Gigante 41306-001 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabLectTerritorialGGT001-V001.pdf Puerto Tejada 19573-001 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabLectTerritorialPTJ-V001.pdf

		Yaguará 41885-002 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabLecTerritorialYGR002-V001.pdf Yaguará 41885-003 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabLecTerritorialYGR003-V001.pdf Yaguará 41885-004 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabLecTerritorialYGR004-V001.pdf	
	Presentación PPT para reunión de inicio	Gigante 001 / 002 y 005 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabPPTInicioGGT001002004-V001.pdf Piendamó 19548-008 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabPPTInicioPDM-V001.pdf Yaguará 002 / 003 y 004 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabPPTInicioYGR002003004-V001.pdf	
	Actas de reunión de Inicio	Palermo 41524-002 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaInicioPLM002-V001.pdf Palermo 41524-006 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaInicioPLM006-V001.pdf Ipiales 52356-269 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaInicioIPL269-V001.pdf Neiva 41001-006 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaInicioNVA-V001.pdf	
	Gestión: solicitud del CO flexibilidad de requisitos para el municipio de Yaguará	Solicitud CO 2025-CF-OF-159	001OPV-CTA-ZO5-COE-GEA-159-GestionYaguara-V002
		Análisis y propuesta INT a la ANSV 2025-IN022-2937	001OPV-INT-ZO5-COE-GEA-159-2937RtaGestionYaguará-V001
		Respuesta de la ANSV Rad. No. 20253000093841	001OPV-ASV-ZO5-PQE-GEA-235-Solicitud0093841
		Trazabilidad de respuesta al CO – correo electrónico	001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabRtaSolicitudFlexibYGR-V001.pdf
	Presentaciones para reunión de Cierre	Palermo 41524-002 y 006 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabPPTCierrePLM002006-V001.pdf Puerto Tejada 19573-001 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabPPTCierrePTJ-V001.pdf	
	Actas de reunión de cierre	Palermo 41524-002 y 006 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaCierrePLM002-V001.pdf Puerto Tejada 19573-001 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaCierrePTJ-V001.pdf	
	Aprobación Piezas de comunicación Volante Inicio / Afiche / Valla	Gigante 001 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabAprobPiezasInicioGGT001-V001.pdf Gigante 002 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabAprobPiezasInicioGGT002-V001.pdf Gigante 005 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabAprobPiezasInicioGGT005-V001.pdf Piendamó	

		001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabAprobPiezasInicioPDM-V001.pdf Yaguará 002/ 003/ 004 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabAprobPiezasInicioYGR002003004-V001.pdf
	Aprobación Piezas de comunicación Volante de Cierre	Cierre Pto Tejada 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabAprobPiezasInicioYGR002003004-V001.pdf Cierre Palermo 002/ 006 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabAprobPiezasCierrePaLM002y006-V001.pdf
	Talleres de Seguridad Vial	Ipiales 268 adultos 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabTalleresAdultIPL268-V001.pdf Ipiales 268 NNA 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabTalleresNnaIPL268-V001.pdf Ipiales 269 adultos 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabTalleresAdultIPL269-V001.pdf Ipiales 269 NNA 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabTalleresNnaIPL269-V001.pdf Palermo 002 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabTalleresNnaYAdultIPLM002-V001.pdf Palermo 006 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabTalleresNnaYAdultIPLM006-V001.pdf
	Actas vecindad de inicio y Actas de Aceptación	Gigante 001 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaVecInicioAceptacionGGT001-V001.pdf Gigante 002 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaVecInicioAceptacionGGT002-V001.pdf Gigante 003 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaVecInicioAceptacionGGT005-V001.pdf
	Actas de vecindad de cierre	Palermo 002 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaVecinCierrePLM002-V001.pdf Palermo 006 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaVecinCierrePLM006-V001.pdf
	Actas de Entorno	Ipiales 268 y 269 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaEntornoIPL268269-V001.pdf Neiva 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaEntornoNVA-V001.pdf Gigante 001 / 002 y 005 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaEntornoGGT001002003-V001.pdf Yaguará 002 / 003 y 004

		001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaEntornoYGR002003004-V001.pdf Buenaventura 001 y 002 001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabActaEntornoBUE001002-V001.pdf
	Acta de Comité social 10/10/2025	001OPV-INT-ZO5-ARE-GEA-004-ActaReunion10-V001 001OPV-INT-ZO5-LDA-GEA-004-ListaAsisComitéSocial-V001
	Reunión Sec. Movilidad Ipiales 30/09/2025	Acta del 30/09/2025 001OPV-INT-ZO5-ARE-GEA-001-ActaReuniónIpiales-V001
	Trazabilidad IMS N°4 v2 del CO	001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-AprobIFM4CO-V001.pdf
	Trazabilidad IMS N°5 v2 del CO	001OPV-INT-ZO5-EMA-GSO-006-TrazabAprobIFM5CO-V001.pdf

15. CONCLUSIONES

Respecto a los entregables de la ejecución de gestión social descritos en la tabla N°6 del presente informe, al 13 de octubre de 2025 (fecha de corte del periodo que se reporta), se ha dado cumplimiento al programa Metodología, que corresponde a la propuesta metodológica del Plan de Gestión Social PGS del contrato de obra y se cuenta con el Plan de Acción de Interventoría PAI aprobado.

Continúa en desarrollo el programa Lectura Territorial con las visitas de apropiación, realización de cartografía social, directorio de actores y caracterización del área de influencia, dando inicio a los programas de Comunicación y Divulgación y Acompañamiento social actividades técnicas en intervención. Para este periodo se registra mayor actividad del componente social relacionado con socializaciones y talleres de seguridad vial teniendo en cuenta la gestión previa con líderes sociales y entes territoriales.

16. RECOMENDACIONES

La Interventoría continuará ejerciendo la revisión de la implementación de los programas del Plan de Gestión Social y la ejecución de actividades para su cumplimiento a cargo de las profesionales designadas del Consorcio Fernac. Para el siguiente periodo se continuará realizando el acompañamiento a las visitas de apropiación en campo de acuerdo con la programación que allegue el Contratista de obra, por otra parte, la culminación de actividades de implementación de la señalización en algunos puntos ha permitido dar cierre a las actividades sociales, rescatando que a la fecha no se han recibido peticiones, quejar o reclamos de las comunidades inmersas en el área de influencia.

Una vez el Contratista de obra programe las actividades faltantes de diagnóstico, reunión con comunidad, así como la realización de los talleres de sensibilización, la Interventoría verificará que el equipo social desarrolle lo

correspondiente en cada punto de conformidad con los lineamientos Apéndice E y con lo establecido en el Plan de Gestión Social aprobado para el Contratista de obra..

De igual forma, el inicio de actividades de obra en los puntos faltantes requerirá, la realización de actividades preliminares en sincronía para no obstaculizar el avance de la implementación por parte del área técnica, por lo que la Interventoría estará atenta al desempeño y cumplimiento de las profesionales del equipo social ya que se ha evidenciado entrega tardía de documentos que tienen un plazo mínimo establecido en los documentos contractuales.

Se realizaron observaciones y llamados al Contratista de obra acerca de la programación de entrevistas semiestructuradas por parte del Consorcio Fernac, con el fin de propiciar el acompañamiento y seguimiento en estas actividades, que son insumo para la Evaluación de Impacto, Apéndice E y lo mismo ocurre con la programación de talleres.
