AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	87
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022** MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VIAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA: EL CASTILLO: PUERTO LLERAS: PUERTO LÓPEZ: RESTREPO, EL CALVARIO: CABUYARO: VISTA HERMOSA: PUERTO RICO: CUBARRAL: SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META **CONTRATO N° 774 22 PY 298-21 PARCIAL N°5 C1-3 C87**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
1.	Lista de chequeo	14420-14421
2.	Acta de pago de obra	14422-14427
3.	Memoria de cálculo obra	14428-14450
4.	Informe de obra	14451-14508
5.	Bitácora de obra	14509-14579

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	774 22 PY 298-21 PARCIAL N°5 C1-3 C87

Firma		Firma	
Nombre:	**JHON ALEXANDER FALLA**	Nombre:	**DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ**
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.com

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO Nº	774 DE 2022	PROYECTO Nº	20211005500299

PAGO PARCIAL	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
PLAN DE COBROS OBRA (Aplica en el primer pago)	112-ECP-FR-009	N/A
ACTA PAGO DE OBRA	112-ECP-FR-029	SI
MEMORIA DE CALCULO OBRA (Cantidades totales Ejecutadas por cada item contractual)	112-ECP-FR-027	SI
INFORME DE OBRA	112-ECP-FR-013	SI
BITACORA DE OBRA (Copia)	112-ECP-FR-022	SI
INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO OBRA (Si Aplica)	112-ECP-FR-030	N/A
FACTURA	-	SI
CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA (Vigencia 30 Dias)	-	SI
COPIA DE TARJETA PROFESIONAL Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE CONTADORES DE OBRA E INTERVENTORIA	-	SI
INFORME INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-017□	SI
ACTA RESUMEN DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO OBRA	112-ECP-FR-018	SI
ACTA RELACIÓN PERSONAL OBRA.	112-ECP-FR-008	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA. Del periodo a realizar el cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	112-ECP-FR-021	SI
CERTIFICADO DONDE INDIQUE CUAL ES EL PORCENTAJE (%) Y EL VALOR EJECUTADO DEL PROYECTO EN CADA MUNICIPIO. Lo anterior firmado por el Representante Legal de la Interventoria con el fin de calcular la retencion de ICA	-	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA: ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL OBRA 112-ECP-FR-021. Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal.	-	SI
CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	112-ECP-FR-019	SI
ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL	112-ECP-FR-020	SI
ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO (Elabora el Contratista)	130-GFI-FR-017	SI
VERIFICACIÓN EN SIGA - Cargue de INFORME MENSUAL OBRA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de vecindad, Plan de manejo de trafico, formato entrega de dotación y elementos de protección personal, implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, informe implementación PMA, Pagos al sistema de seguridad social integral del personal - INFORME MENSUAL INTERVENTORIA (Desde el inicio hasta la fecha de cobro, Acta de resumen de ensayos y pruebas de laboratorio, control de seguridad industrial, acta de seguimiento ambiental, acta control y seguimiento de seguridad social y parafiscal obra, bitacora, informe de especialistas) y todos los demas procedimientos o actos administrativos realizados en cumplimiento de la ejecución del proyecto. Todos los documentos de soporte del pago parcial, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de obra que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	Anexar Pantallazo	SI
VERIFICACIÓN EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR : el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto. (Anexar Pantallazo)	-	Si
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		SI

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14420

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA
PAGO PARCIAL

112-ECP-FR-173-V05
09/09/2024

CONTRATO Nº	774 DE 2022	PROYECTO Nº	2021005500298
PAGO PARCIAL		CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

***ANEXAR PANTALLAZO DEL CARGUE A SECOP Y CARGUE A SIGA**

OBSERVACIONES

Firma
Nombre:JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
M.P. 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 25202 - 125987 CND

Firma
Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
M.P. 25202-193880 CND

Firma
Nombre: OSCAR EDUARDO VIZCAINO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 143 2023 BPIN 2021005500298
M.P. 25202-78801 CND

Firma
Nombre: ANGELLY XAMIRA CHEEDIAK GUTIERREZ
RESPONSABLE DEL ARCHIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Nota: Una vez cumplido el proceso de verificación por cada responsable se debe firmar la lista de chequeo.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14421

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

ACTA PAGO DE OBRA

112-ECP-FR-029

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

14.422

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500298
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	005	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	13/12/2025 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 1.986.461.658,35
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	
FECHA DE INICIACIÓN:	6/09/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	lunes, 23 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	**PRELIMINARES**													
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0,54	$ 6.623.704,00	$ 3.576.800,00	0,540	$ 3.576.800,16	0,520	$ 3.444.326,00	0,000	$ 0,00	0,520	$ 3.444.326,00	96,30%
NP 11	CONCRETO 3500 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	0,00	$ 822.394,21	$ 0,00	23,95	$ 19.696.341,33	23,56	$ 19.375.607,59	0,00	$ 0,00	23,56	$ 19.375.607,59	98,37%
NP 12	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	0,00	$ 10.473,01	$ 0,00	1.553,040	$ 16.265.003,45	1.527,37	$ 15.996.161,28	0,00	$ 0,00	1.527,37	$ 15.996.161,28	98,35%
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 204.075,56	$ 0,00	130,450	$ 26.621.656,80	84,25	$ 17.193.365,93	0,00	$ 0,00	84,25	$ 17.193.365,93	64,58%
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 29.419,97	$ 0,00	77,000	$ 2.265.337,69	77,00	$ 2.265.337,69	0,00	$ 0,00	77,00	$ 2.265.337,69	100,00%
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	0,00	$ 51.614,61	$ 0,00	40,000	$ 2.064.584,40	25,00	$ 1.290.365,25	0,00	$ 0,00	25,00	$ 1.290.365,25	62,50%
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 121.341,26	$ 0,00	54,600	$ 6.625.232,80	54,60	$ 6.625.232,80	0,00	$ 0,00	54,60	$ 6.625.232,80	100,00%
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 149.391,80	$ 0,00	86,400	$ 12.907.451,52	85,20	$ 12.728.181,36	0,00	$ 0,00	85,20	$ 12.728.181,36	98,61%
NP 18	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO	UN	0,00	$ 788.976,77	$ 0,00	9,000	$ 7.100.790,93	5,00	$ 3.944.883,85	0,00	$ 0,00	5,00	$ 3.944.883,85	55,56%
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	0,00	$ 410.248,58	$ 0,00	9,000	$ 3.692.237,22	9,00	$ 3.692.237,22	0,00	$ 0,00	9,00	$ 3.692.237,22	100,00%
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	0,00	$ 327.733,23	$ 0,00	50,400	$ 16.517.754,79	50,40	$ 16.517.754,79	0,00	$ 0,00	50,40	$ 16.517.754,79	100,00%
NP 21	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	0,00	$ 155.855,64	$ 0,00	86,51	$ 13.483.071,42	73,34	$ 11.430.452,64	0,00	$ 0,00	73,34	$ 11.430.452,64	84,78%
NP 22	TUBERIA PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 11.720,68	$ 0,00	500,00	$ 5.860.340,00	500,00	$ 5.860.340,00	0,00	$ 0,00	500,00	$ 5.860.340,00	100,00%
NP 23	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	UND	0,00	$ 195.358,65	$ 0,00	12,000	$ 2.344.303,80	10,00	$ 1.953.586,50	0,00		10,00	$ 1.953.586,50	83,33%
	SUBTOTAL				$ 3.576.800,00		$ 139.020.906,31		$ 122.317.832,90		$ -		$ 122.317.832,90	
2	**EXCAVACIONES**													
2,1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	2.196,41	$ 61.667,00	$ 135.446.015,00	4.229,98	$ 260.865.175,66	3.888,67	$ 239.802.612,55	0,00	$ 0,00	3.888,67	$ 239.802.612,55	92,00%
2,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	42.830,00	$ 1.879,00	$ 80.477.570,00	87.973,88	$ 165.302.920,52	80.868,33	$ 151.951.592,02	47,00	$ 88.313,00	80.915,33	$ 152.039.905,02	91,96%
NP 24	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 84.124,31	$ 0,00	129,49	$ 10.893.256,90	116,57	$ 9.806.370,82	0,00	$ 0,00	116,57	$ 9.806.370,82	90,02%
	SUBTOTAL				$ 215.923.585,00		$ 436.861.353,08		$ 401.560.575,39		$ 88.313,00		$ 401.648.888,39	
3	**RELLENOS**													
3,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1.374,76	$ 159.913,00	$ 219.841.996,00	1.439,53	$ 230.199.560,89	1.275,36	$ 203.946.843,68	89,20	$ 14.264.239,60	1.364,56	$ 218.210.883,28	94,79%
3,2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	646,88	$ 171.884,00	$ 111.175.384,00	614,74	$ 105.651.675,36	0,00	$ 0,00	570,48	$ 98.044.974,72	570,48	$ 98.044.974,72	92,80%
3,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	75.811,50	$ 1.834,00	$ 139.038.291,00	96.405,70	$ 176.806.053,80	63.937,42	$ 117.261.227,64	24.672,03	$ 45.248.503,02	88.609,45	$ 162.509.730,66	91,91%

1442 23

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500298
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	005	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	13/12/2025 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 1.986.461.658,35
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISIÓN:**	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	
FECHA DE INICIACIÓN:	6/09/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	lunes, 23 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
NP 25	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	0,00	$ 38.725,39	$ 0,00	126,070	$ 4.882.109,92	101,21	$ 3.919.398,72	0,00	$ 0,00	101,21	$ 3.919.398,72	80,26%
NP 26	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO PESADO	M3	0,00	$ 49.919,79	$ 0,00	707,820	$ 35.334.225,78	649,55	$ 32.425.399,59	0,00	$ 0,00	649,55	$ 32.425.399,59	91,77%
	SUBTOTAL				$ 470.055.671,00		$ 552.875.625,73		$ 357.552.668,15		$ 157.557.717,34		$ 515.110.385,49	
4	BORDILLOS Y ANDENES													
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	1.341,74	$ 116.001,00	$ 155.643.182,00	172,33	$ 19.990.452,33	51,00	$ 5.916.051,00	0,00	$ 0,00	51,00	$ 5.916.051,00	29,59%
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 175.063,99	$ 0,00	890,76	$ 155.939.999,73	498,68	$ 87.353.429,73	104,42	$ 18.280.181,84	603,40	$ 105.633.611,57	67,74%
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 126.422,43	$ 0,00	222,00	$ 28.065.779,46	181,02	$ 22.884.988,28	0,00	$ 0,00	181,02	$ 22.884.988,28	81,54%
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	0,00	$ 142.218,71	$ 0,00	148,04	$ 21.054.057,83	61,00	$ 8.675.341,31	39,04	$ 5.552.218,44	100,04	$ 14.227.559,75	67,58%
	SUBTOTAL				$ 155.643.182,00		$ 225.050.289,35		$ 124.829.810,32		$ 23.832.400,28		$ 148.662.210,60	
5	CARPETA ASFÁLTICA													
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	4.955,11	$ 5.380,00	$ 26.658.492,00	4.098,22	$ 22.048.423,60	0,00	$ 0,00	2.081,42	$ 11.198.039,60	2.081,42	$ 11.198.039,60	50,79%
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	331,75	$ 1.102.453,00	$ 365.738.783,00	286,870	$ 316.260.692,11	0,00	$ 0,00	145,70	$ 160.627.402,10	145,70	$ 160.627.402,10	50,79%
5.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	17.980,80	$ 1.965,00	$ 35.332.272,00	24.269,20	$ 47.686.978,00	0,00	$ 0,00	12.478,50	$ 24.520.252,50	12.478,50	$ 24.520.252,50	51,42%
5.4	RENIVELACION DE POZOS DE INSPECCION	UN	5,00	$ 259.731,00	$ 1.298.655,00	14,00	$ 3.636.234,00	12,00	$ 3.116.772,00	0,00	$ 0,00	12,00	$ 3.116.772,00	85,71%
NP 4	PLACA CUBIERTA. - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	0,00	$ 2.686.253,17	$ 0,00	14,00	$ 37.607.544,38	14,00	$ 37.607.544,38	0,00	$ 0,00	14,00	$ 37.607.544,38	100,00%
NP 5	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000PSI DE ØINT=1.20ME=0.20M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	0,00	$ 606.102,55	$ 0,00	5,85	$ 3.545.699,92	2,05	$ 1.242.510,23	0,00	$ 0,00	2,05	$ 1.242.510,23	35,04%
NP 6	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	0,00	$ 368.438,44	$ 0,00	62,48	$ 23.019.908,77	62,48	$ 23.019.908,77	0,00	$ 0,00	62,48	$ 23.019.908,77	100,00%
NP 7	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	0,00	$ 4.885.868,41	$ 0,00	11,00	$ 53.744.552,51	11,00	$ 53.744.552,51	0,00	$ 0,00	11,00	$ 53.744.552,51	100,00%
NP 8	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 434.051,93	$ 0,00	3,32	$ 1.441.052,41	1,23	$ 533.883,87	0,00	$ 0,00	1,23	$ 533.883,87	37,05%
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 469.950,97	$ 0,00	13,99	$ 6.574.614,07	9,98	$ 4.690.110,68	2,41	$ 1.132.581,84	12,39	$ 5.822.692,52	88,56%
NP 10	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0,00	$ 528.694,83	$ 0,00	75,22	$ 39.768.425,11	69,39	$ 36.686.134,25		$ 0,00	69,39	$ 36.686.134,25	92,25%
	SUBTOTAL				$ 429.028.202,00		$ 555.336.124,88		$ 160.641.416,69		$ 197.478.276,04		$ 358.119.692,73	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500298
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	005	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	13/12/2025 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 1.986.461.658,35
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	
FECHA DE INICIACIÓN:	6/09/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	lunes, 23 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
6	SEÑALIZACIÓN													
6.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	523,27	$ 5.755,00	$ 3.011.418,85	1.620,00	$ 9.323.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	228,00	$ 38.728,00	$ 8.829.984,00	228,00	$ 8.829.984,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 428.288,00	$ 6.852.608,00	16,00	$ 6.852.608,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL				$ 18.694.010,85		$ 25.005.692,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	COSTO TOTAL PROYECTO				$ 1.292.921.451,00		$ 1.934.149.991,35		$ 1.166.902.303,45		$ 378.956.706,66		$ 1.545.859.010,11	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 986.962.939,69		$ 1.476.450.375,08		$ 890.765.117,14		$ 289.279.928,75		$ 1.180.045.045,89	
	ADMINISTRACIÓN 26,00%				$ 256.610.364,32		$ 383.877.097,52		$ 231.598.930,46		$ 75.212.781,47		$ 306.811.711,93	
	IMPREVISTOS 1,00%				$ 9.869.629,40		$ 14.764.503,75		$ 8.907.651,17		$ 2.892.799,29		$ 11.800.450,46	
	UTILIDAD 4,00%				$ 39.478.517,59		$ 59.058.015,00	60,95%	$ 35.630.604,69	19,08%	$ 11.571.197,15	79,93%	$ 47.201.801,84	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 305.958.511,31		$ 457.699.616,27		$ 276.137.186,31		$ 89.676.777,91		$ 365.813.964,22	
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)				$ 31.367.000,00		$ 52.311.667,00		$ 41.849.333,42		$ 0,00		$ 41.849.333,42	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 1.324.308.451,00		$ 1.986.461.658,35		$ 1.208.751.636,87		$ 378.956.706,66		$ 1.587.708.343,53	

CONDICIONES GENERALES		
VALOR CONDICIONES ORIGINALES		$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL		$ 662.153.207,35
VALOR TOTAL		$ 1.986.461.658,35
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 1.986.461.658,35
ANTICIPO	20%	$ 264.861.690,20
ANTICIPO ADICION	20%	$ 132.430.641,47
PRESENTE ACTA		$ 378.956.706,66
ACUMULADO		$ 1.587.708.343,53

CONDICIONES ACTUALIZADAS			
RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	$ 448.516.951,00	$ 89.703.390,20	$ 358.813.560,80
ACTA 2	$ 176.698.221,83	$ 35.339.644,37	$ 141.358.577,46
ACTA 3	$ 341.867.602,17	$ 68.373.520,43	$ 273.494.081,74
ACTA 4	$ 241.668.861,87	$ 48.333.772,37	$ 193.335.089,50
PRESENTE ACTA	**$ 378.956.706,66**	**$ 113.687.012,00**	**$ 265.269.694,66**
TOTALES	$ 1.587.708.343,53	$ 355.437.339,37	$ 1.232.271.004,16

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 1.587.708.343,53	79,93
POR EJECUTAR	$ 398.753.314,82	20,07
POR AMORTIZAR	$ 41.854.992,30	10,54
TOTALES	$ 1.986.461.658,35	100,00

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500298 (Registro Presupuestal No. 1236 de 29 de diciembre de 2022)					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 264.861.690,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.861.690,20
1	ACTA PARCIAL N° 1	$ 448.516.951,00	$ 89.703.390,20	$ 358.813.560,80	$ 623.675.251,00
2	ACTA PARCIAL N° 2	$ 176.698.221,83	$ 35.339.644,37	$ 141.358.577,46	$ 765.033.828,46
3	ACTA PARCIAL N° 3	$ 341.867.602,17	$ 68.373.520,43	$ 273.494.081,74	$ 1.038.527.910,20
4	ACTA PARCIAL N° 4	$ 241.668.861,87	$ 48.333.772,37	$ 193.335.089,50	$ 1.231.862.999,70

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500298 (Registro Presupuestal No. 1006 de 30 de Diciembre de 2024)					
ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO ADICION	$ 132.430.641,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 132.430.641,47
	PRESENTE ACTA	**$ 378.956.706,66**	**$ 113.687.012,00**	**$ 265.269.694,66**	**$ 397.700.336,13**

1425

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500298
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	005	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	13/12/2025 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 1.986.461.658,35
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	
FECHA DE INICIACIÓN:	6/09/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	lunes, 23 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%

RELACIÓN DE PAGOS PROYECTO N° 2021005500298 (Registro Presupuestal No. 1236 de 2022, No 1006 de 2024)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
	ANTICIPO	$ 264.861.690,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 264.861.690,20
1	ACTA PARCIAL N° 1	$ 448.516.951,00	$ 89.703.390,20	$ 358.813.560,80	$ 623.675.251,00
2	ACTA PARCIAL N° 2	$ 176.698.221,83	$ 35.339.644,37	$ 141.358.577,46	$ 765.033.828,46
	ANTICIPO ADICION	$ 132.430.641,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 897.464.469,93
3	ACTA PARCIAL N° 3	$ 341.867.602,17	$ 68.373.520,43	$ 273.494.081,74	$ 1.170.958.551,67
4	ACTA PARCIAL N° 4	$ 241.668.861,87	$ 48.333.772,37	$ 193.335.089,50	$ 1.364.293.641,16
	PRESENTE ACTA	**$ 378.956.706,66**	**$ 113.687.012,00**	**$ 265.269.694,66**	**$ 1.629.563.335,82**
	VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO	**$ 398.753.314,82**	**$ 41.854.992,30**	**$ 356.898.322,52**	**$ 1.986.461.658,35**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE**

NOTAS
1: El contador del contratista e interventor, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.
3. Que la interventoria certifica que el contratista CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022 identificado con el NIT 901.665.253-9 cumplio con la clausula 8 forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.
4. El contrato de obra N° 774 de 2022 representado legalmente por el CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, durante su ejecución ha tenido modificaciones en su conformación o cesión de derechos por parte de los consorciados: SI____ de fecha _____. NO X

1426

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	774 DE 2022	**PROYECTO N°**	2021005500298
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	005	**PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:**	13/12/2025 a 6/02/2026
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META	**OBJETO PROYECTO:**	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 41.724.944.646,73	**VALOR TOTAL DEL PROYECTO:**	$ 1.986.461.658,35
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORIA N°**	143 de 2023
NIT:	901.665.253-9	**INTERVENTORIA:**	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	ingeviasurbanas2022@gmail.com	**CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:**	cintervialmeta@gmail.com
SUPERVISOR:	OSCAR EDUARDO VIZCAINO DIAZ	**APOYO A LA SUPERVISION:**	
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORIA:	cintervialmeta@gmail.com	**CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°**	
FECHA DE INICIACIÓN:	6/09/2023	**FECHA PRESENTE ACTA:**	lunes, 23 de febrero de 2026

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 30/12/2024		OBRA EJECUTADA						
								ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día: **lunes, 23 de febrero de 2026**

Firma:
Nombre: YECID MAURICIO REINA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional: 25202-78610 CND

Firma:
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 25202-125987 CND

Firma:
Nombre: DELIA LISETH TRIANA AVILA
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 283729-T

Firma:
Nombre: MARINA MUÑOZ TOLEDO
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 273353 -T

Nota: en la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

14424

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027

GOBERNACIÓN DEL **META**

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

14428

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO Nº	**774 DE 2022**	**PROYECTO Nº**	**2021005500298**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL Nº 5**
CAPITULO:	**EXCAVACIONES**

Nº ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
2,2	**TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES**	**M3/KM**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	DISTANCIA KM	**EXPANSION**	**VOLUMEN**	**VOLUMEN TOTAL CON EXPANSION**	**TOTAL**
DEMOLICIONES (NP 9)	15,00	1,30	2,41	3,13	47,00
PASAN:				**SUBTOTAL**	47,00
				TOTAL	**47,00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 15202-093569 BYC

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14429

Villavicencio, Febrero 23 de 2026

CERTIFICADO

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTERVIAL META**, en virtud del contrato No.**143 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022**. Bajo el contrato No. **774 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto **MEJORAMIENTO DE LA VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META"**, con código BPIN **2021005500298**:

Que el descargue de disposición final del material de excavación que se genere en el proyecto fue determinado por la Alcaldía a quince kilómetros promedio del sector de la obra, en el cual no se generara afectaciones ambientales ya que es el mejoramiento de vía de acceso de los predios de la zona.

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia de los sectores a realizar la disposición final.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2026.

Atentamente,

Ing. **DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B.**
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL META 2022
Contrato de Interventoría No. 143 de 2023

Arq. **YECID MAURICIO REINA BRAVO**
Representante Legal
CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Contrato de Obra No. 774 de 2022



CALLE 19 # 41 – 39, VILLAVICENCIO - Meta

+(57) 608 663 27 59 +(57) 313 243 93 32 / cintervialmeta@gmail.com

1431

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 5**
CAPITULO:	**RELLENOS**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL
AJUSTE CALLE 19	CARTERA TOPOGRAFICA			8,80	8,80
AJUSTE CALLE 21	CARTERA TOPOGRAFICA			93,79	93,79
DESCUENTO ELEMENTOS			AREA	CANTIDAD	
SUMIDEROS		0,25	1,96	-14,00	-6,86
POZOS		0,25	2,01	-13,00	-6,53
PASAN:				SUBTOTAL	89,20
				TOTAL	**89,20**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 15202-093569 BYC

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14432

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA - PROYECTO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA - META

AJUSTE DE SUBBASE

ACTA PARCIAL N°5

REPORTE DE VOLUMENES -CORTE RELLENO Y MATERIALES — AJUSTE CALLE 19

ABSCISA	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
230				
	SUBBASE	0	0,00	0,00
235				
	SUBBASE	2,05	5,13	5,13
236,792				
	SUBBASE	**2,05**	**3,67**	**8,80**

JADER FRANDEY ENCISO REYES
M.P. 01-13410 CPNT
TOPOGRAFO

DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN
M.P. 01-13350 CPNT
TOPOGRAFO INTERVENTORIA

Calle No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

14433

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

CARTERA TOPOGRAFICA - PROYECTO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA - META

AJUSTE DE SUBBASE

ACTA PARCIAL N°5

REPORTE DE VOLUMENES -CORTE RELLENO Y MATERIALES — AJUSTE CALLE 21

ABSCISA	Area Type	Area	Inc.Vol.	Cum.Vol.
		Sq.m.	Cu.m.	Cu.m.
172,625				
	SUBBASE	3,76	9,87	0,00
175				
	SUBBASE	3,76	8,93	8,93
180				
	SUBBASE	3,76	18,80	27,73
185				
	SUBBASE	3,59	18,38	46,11
190				
	SUBBASE	2,46	15,13	61,24
195				
	SUBBASE	2,18	11,60	72,84
200				
	SUBBASE	3,10	13,20	86,04
205				
	SUBBASE	0	7,75	93,79
210				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
215				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
220				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
225				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
230				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
235				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
240				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
245				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
250				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
255				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
260				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
265				
	SUBBASE	0	0,00	93,79
273,39				
	SUBBASE	0	0,00	93,79

JADER FRANDEY ENCISO REYES
M.P. 01-13410 CPNT
TOPOGRAFO

DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN
M.P. 01-13350 CPNT
TOPOGRAFO INTERVENTORIA

Calle No 40-01
Lobby 2 Oficina 502
Tel: 608-6784738
ingeviasurbanas2022@gmail.com

14434



República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA

Nombre JADER FRANDEY ENCISO REYES

Cédula: 1,121,835,109

Licencia Profesional No: 01-13410

Resolución: 02-3411 - 28/10/2011

* Experiencia o fecha de grado: 04/10/2011

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA - VILLAVICENCIO



Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución Motivada y el Certificado de Vigencia
la documentación integral acredita al titular para ejercer la profesión
de TOPÓGRAFO en la República de Colombia de acuerdo a la
Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981

*La experiencia se contara a partir de la fecha de grado para
Los efectos de posesión de cargos públicos únicamente.

RUTH ELENA ACUÑA AGUDELO
PRESIDENTE

ELIANA MARIA AVILA JIMENEZ
DIRECTORA EJECUTIVA

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional
de Topografía. Email:info@cpnt.org. calle 33 No.7-27 Of.502 Tel:2881490

14435

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 596843/2025

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **JADER FRANDEY ENCISO REYES** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1121835109** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-13410** con fecha de expedición del **28 de Octubre de 2011.**

Que el(la) Señor(a) **JADER FRANDEY ENCISO REYES**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-13410** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los 5 **días del mes de Enero de 2026.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

14436

Esta tarjeta forma parte integral de la Licencia Profesional
Junto con la Resolución aprobatoria.
Esta tarjeta es documento público y junto con el Certificado de vigencia acredita al titular para ejercer la profesión de TOPOGRAFO en la República de Colombia de acuerdo con la Ley 70 de 1979 y el Decreto Reglamentario 690 de 1981.

Si esta tarjeta es encontrada, por favor, enviarla a la dirección de la oficina del Consejo Profesional Nacional de Topografía

Calle 42 N° 8 A - 69 Ofc 601. Tel. 2881490 - 2451694
http://cpnt.gov.co Bogotá - Colombia

Para cualquier información comunicarse con el Consejo Profesional Nacional de Topografía. Email: Info@cpnt.gov.co

---

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Nombre: DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN



Cédula: **1.022.926.959**

Licencia Profesional No: **01-13350**

Resolución: **02-3351 - 30/09/2011**

TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA
SENA

Presidente

14437

República de Colombia

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

Ley 70 / 79

CERTIFICADO DE VIGENCIA No: 598072/2025

EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFÍA

HACE CONSTAR

Que el(la) Señor(a) **DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN** , identificado(a) con cédula de ciudadanía **No. 1022926959** , se encuentra inscrito(a) en el Registro Único de Topógrafos RUTOPO del CPNT como **TECNÓLOGO EN TOPOGRAFÍA** de la Institución de Educación Superior **SENA** , bajo la Licencia Profesional **No. 01-13350** con fecha de expedición del **30 de Septiembre de 2011.**

Que el(la) Señor(a) **DAVID MAURICIO BUSTOS BARRAGAN**, tiene vigente su Licencia Profesional No. **01-13350** y a la fecha **NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** , que lo (la) inhabiliten en el ejercicio de su profesión.

Dada en Bogotá, D.C. a los **5 días del mes de Diciembre de 2025.**

LUIS ALEJANDRO ZAFRA JARAMILLO
Director Ejecutivo

***Firma del profesional**

*La firma del profesional es requerida para comprobar la anuencia de su participación en procesos contractuales. La falta de la firma del profesional NO invalida el certificado.

Notas 1- El anterior certificado no suple la Licencia Profesional para ejercer un cargo.
2- La validez del documento se puede verificar en la página web www.cpnt.gov.co a través del número de certificado de Vigencia.
3- Este certificado digital tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el Art. 2 de la Ley 527 de 1999, decreto 1747 de 2000 y Art. 6 Parágrafo 3 de la Ley 962 de 2005.

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 6**
CAPITULO:	**RELLENOS**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL
CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A	7,10	0,15	246,42		262,44
CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y CRA 17A	8,00	0,15	263,40		316,08
DESCUENTO ELEMENTOS			**AREA**	**CANTIDAD**	
SUMIDEROS		0,15	1,96	-14,00	-4,12
POZOS		0,15	2,01	-13,00	-3,92
PASAN:				**SUBTOTAL**	570,48
				TOTAL	**570,48**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 15202-093569 BYC

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14439

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 5**
CAPITULO:	**RELLENOS**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
3,3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DISTANCIA	ALTO	VOLUMEN	AREA	TOTAL
SUBBASE GRANULAR	37,40		89,20		3.336,08
BASE GRANULAR	37,40		570,48		21.335,95
PASAN:				**SUBTOTAL**	24.672,03
				TOTAL	**24.672,03**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 15202-093569 BYC

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14448

Villavicencio, Febrero 23 de 2026

CERTIFICADO

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTERVIAL META**, en virtud del contrato No.**143 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022**. Bajo el contrato No. **774 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto **MEJORAMIENTO DE LA VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META",** con código BPIN **2021005500298**:

Que la fuente de material utilizada en las actividades del proyecto corresponde al Rio Ariari, específicamente de la **MINA GUAYAQUIL,** situada en el municipio de Granada. Esta fuente es la mas cercana al proyecto mencionado aprobada por contar con el material con las características técnicas para este suministro de material pétreo.


Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la fuente de material.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2026.

Atentamente,

Ing. **DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B.**
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL META 2022
Contrato de Interventoría No. 143 de 2023

Arq. **YECID MAURICIO REINA BRAVO**
Representante Legal
CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Contrato de Obra No. 774 de 2022

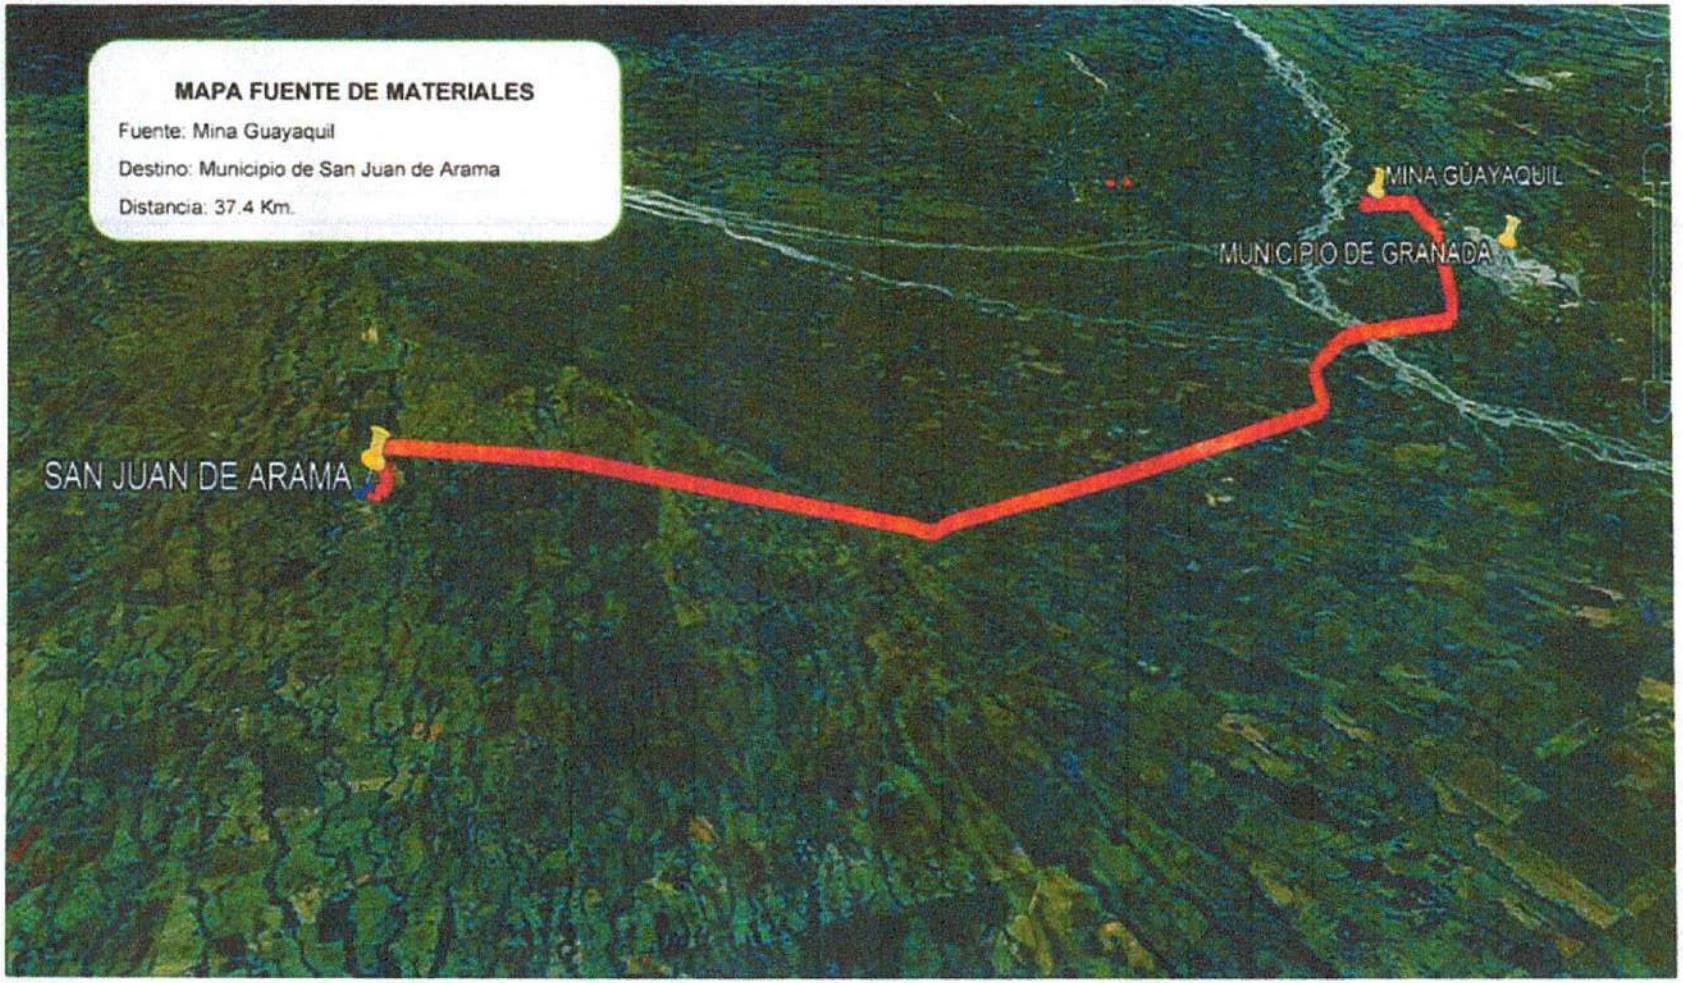

CALLE 19 # 41 – 39, VILLAVICENCIO - Meta

+(57) 608 663 27 59 +(57) 313 243 93 32 / cintervialmeta@gmail.com

14442

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 5**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL
CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y CRA 17A			10,66		10,66
CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y CRA 17A			93,76		93,76
PASAN:				SUBTOTAL	104,42
				TOTAL	104,42

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 15202-093569 BYC

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14443

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 5**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL
CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y CRA 17A			15,40		15,40
CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y CRA 17A			23,64		23,64
PASAN:				SUBTOTAL	39,04
				TOTAL	39,04

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 15202-093569 BYC

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.444

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA

112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 5**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL
CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y CRA 17A	8,00		263,40		2.107,20
DESCUENTO ELEMENTOS			**AREA**	**CANTIDAD**	
SUMIDEROS			1,96	-7,00	-13,72
POZOS			2,01	-6,00	-12,06
PASAN:				**SUBTOTAL**	2.081,42
				TOTAL	**2.081,42**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 15202-093569 BYC

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.445

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 5**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	ANCHO	ALTO	LONGITUD	VOLUMEN	TOTAL
CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y CRA 17A	8,00	0,07	263,40		147,50
DESCUENTO ELEMENTOS			AREA	CANTIDAD	
SUMIDEROS		0,07	1,96	-7,00	-0,96
POZOS		0,07	2,01	-6,00	-0,84
PASAN:				**SUBTOTAL**	145,70
				TOTAL	**145,70**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 15202-093569 BYC

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.446

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 5**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
5.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES				
	DISTANCIA KM	EXPANSION	VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL
CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y CRA 17A	84,60		147,50		12.478,50
PASAN:				**SUBTOTAL**	12.478,50
				TOTAL	**12.478,50**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 15202-093569 BYC

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14447

Villavicencio, Febrero 23 de 2026

CERTIFICADO

Nosotros, los abajo firmantes y representantes legales del **CONSORCIO INTERVIAL META**, en virtud del contrato No.**143 de 2023** como interventores y del **CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022**. Bajo el contrato No. **774 de 2022** como contratistas de obra, procedemos a certificar lo concerniente al proyecto **MEJORAMIENTO DE LA VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META",** con código BPIN **2021005500298**:

Que el asfalto a utilizar en las actividades del proyecto corresponde específicamente de la **PLANTA TRITURADOS & TRITURADOS LTDA**, situada en el municipio de Castilla La Nueva. Esta Planta es la más cercana al proyecto mencionado aprobada por contar con el material con las características técnicas para este suministro.

Se anexa al presente documento un plano que indica la distancia a la Planta.

Esta certificación se emite en la ciudad de Villavicencio, a los veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2026.

Atentamente,

Ing. **DAVID LEONARDO RODRIGUEZ B.**
Representante Legal
CONSORCIO INTERVIAL META 2022
Contrato de Interventoría No. 143 de 2023

Arq. **YECID MAURICIO REINA BRAVO**
Representante Legal
CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
Contrato de Obra No. 774 de 2022



CALLE 19 # 41 – 39, VILLAVICENCIO - Meta

+(57) 608 663 27 59 +(57) 313 243 93 32 / cintervialmeta@gmail.com

14449

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

MEMORIA DE CALCULO OBRA
112-ECP-FR-027-V05
09/09/2024

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**
FECHA DE INICIÓ:	6/09/2023	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	6/03/2026
OBJETO PROYECTO:	MEJORAMIENTO DE LA VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
CONTRATISTA :	CONSORCIO INGEVÍAS URBANAS 2022		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	143 DE 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META		

ACTA:	**ACTA PARCIAL N° 5**
CAPITULO:	**CARPETA ASFÁLTICA**

N° ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**
NP 9	**DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL**	**M3**

DESCRIPCIÓN	**DIMENSIONES**				
	AERA	**ALTO**	**CANTIDAD**	**VOLUMEN**	**TOTAL**
TAPA POZOS	2,01	0,20	6,00		2,41
PASAN:				**SUBTOTAL**	2,41
				TOTAL	**2,41**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE OBRA



Firma
Nombre: JHON ALEXANDER FALLA MUNAR
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Firma
Nombre: DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 25202-125987 CND

Firma
Nombre: JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Firma
Nombre: CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 15202-093569 BYC

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.450

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LOPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

INFORME DE OBRA

112-ECP-FR-013

GOBERNACIÓN DEL **META**

AGENCIA PARA LA **INFRAESTRUCTURA** DEL **META**
NIT. 900220547-5

14.451

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

INFORME PARCIAL No. 05

PROYECTO No. 2021005500298



CONTRATO DE OBRA No. 774 de 2022

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META."

2026

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14452

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

INFORME PARCIAL No. 05

Periodo de 13/12/2025 a 06/02/2026
Fecha de Presentación: 23/02/2026

INFORMACIÓN BÁSICA	
OBJETO CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LÓPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META.
CONTRATO DE OBRA No:	774 DE 2022
VALOR DEL CONTRATO:	$27.816.678.109,00
VALOR ADICIONAL No. 1:	$ 9.280.219.314,16
VALOR ADICIONAL No. 2:	$ 1.940.380.718,04
VALOR ADICIONAL No. 3:	$ 2.687.666.505,53
VALOR ACTUALIZADO:	$ 41.724.944.646,73
OBJETO PROYECTO:	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META".
VALOR DEL PROYECTO:	$ 1.324.308.451,00
VALOR ADICIONAL:	$ 662.153.207,35
VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.986.461.658,35
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022
CORREO ELECTRÓNICO:	ingeviasurbanas2022@gmail.com
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:	143 DE 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVIAL META
CORREO ELECTRÓNICO:	cintervialmeta@gmail.com

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/08/2023
PLAZO INICIAL:	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	13/03/2024
FECHA DE PRORROGA N°1:	01/03/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°1:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN PRORROGA N°1:	13/08/2024

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE PRORROGA N°2:	19/04/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°2:	23 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°2:	05/09/2024
FECHA DE PRORROGA N°3:	05/08/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°3:	05/11/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	29/10/2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN N°1:	2 MESES Y 1 DIA
FECHA DE REINICIO N°1:	30/12/2024
FECHA DE PRORROGA N°4:	30/12/2024
TIEMPO DE PRORROGA N°4:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 4	06/06/2025
FECHA DE PRORROGA N°5:	06/06/2025
TIEMPO DE PRORROGA N°5:	4 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA N°5:	06/10/2025
FECHA DE PRORROGA N°6:	15/09/2025
TIEMPO DE PRORROGA N°6:	8 MESES Y 1 DIA
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	07/06/2026
31 MESES	24 DIAS

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIO:	06/09/2023
PLAZO INICIAL:	3 MESES
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	05/12/2023
PRORROGA NO. 1:	04/12/2023
PLAZO PRORROGA No. 1	3 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 1:	05/03/2024
PRORROGA NO. 2:	01/03/2024
PLAZO PRORROGA NO. 2:	5 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA NO. 2:	05/08/2024
PRORROGA No. 3:	05/08/2024
PLAZO PRORROGA No. 3:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 3	05/10/2024
SUSPENSION No. 1	13/09/2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1:	3 MESES
AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N° 1:	29/10/2024

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.454

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
PLAZO DE AMPLIACIÓN N°1 A LA SUSPENSIÓN N°1:	17 DIAS
REINICIO N° 1:	30/12/2024
PRORROGA No. 4:	30/12/2024
PLAZO PRORROGA No. 4:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 4	22/03/2025
PRORROGA No. 5:	17/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 5:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 5:	22/05/2025
PRORROGA No. 6:	25/03/2025
PLAZO PRORROGA No. 6:	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 6:	6/06/2025
PRORROGA No. 7:	6/06/2025
PLAZO PRORROGA No. 7:	4 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 7:	6/10/2025
PRORROGA No. 8:	6/10/2025
PLAZO PRORROGA No. 8:	2 MESES
FECHA DE TERMINACION PRORROGA No. 8:	06/12/2025
PRORROGA No. 9:	05/12/2025
PLAZO PRORROGA No. 9:	3 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA PRORROGA No. 9:	6/03/2026
26 Meses	15 Días

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

El área donde se desarrollará el proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META", se encuentra ubicado en el Departamento del Meta en el Municipio de SAN JUAN DE ARAMA, es un municipio colombiano situado en el sur del departamento del Meta; está a 119 km de la capital Villavicencio y tiene una extensión de 1.163 km2.

El municipio de San Juan de Arama, que cuenta con 34.61 km de vías urbanas, tiene el 50% de éstas sin pavimentar; de acuerdo a una visita de campo se identificó que en el tramo de la Calle 22 entre Cra 16B y 17A, Calle 21 entre Cra 15 y 17A, y Calle 19 entre Cra 15 y 17A, existe 0,54km que requieren ser mejorados. Conociendo esta grave problemática por la que atraviesa el municipio, desde el departamento del Meta, se ha proyectado realizar el mejoramiento de una parte de la vía, la cual debe permitir obtener el mejor producto optimizando los recursos y

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14455

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

especificando recomendaciones de construcción, las cuales requieren un análisis concienzudo y práctico para implementar la mejor alternativa optimizando la relación costo-beneficio y aplicando nuevas tecnologías que estén acorde a las reglamentaciones vigentes, con esto se asegura la construcción plena y satisfactoria que impulse la región hacia un futuro más sostenible y con mayores posibilidades de desarrollo.

MUNICIPIO:	SAN JUAN DE ARAMA	**VEREDA:**	-
CORREGIMIENTO:	-	**BARRIO:**	La Esperanza
COMUNA:	-	**DEPARTAMENTO:**	META
COORDENADAS:	3°22´20´´ Norte, 73°52´34¨ Oeste		

MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA DEL PROYECTO



Ilustración 1. Ubicación Municipio de San Juan de Arama.

14456

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

A. INFORME TECNICO

1. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION No. 2 - 30/12/2024					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	KM	0,540	$ 6.623.704,00	$ 3.576.800,16
NP 11	CONCRETO 3500 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	M3	23,95	$ 822.394,21	$ 19.696.341,33
NP 12	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	1.553,04	$ 10.473,01	$ 16.265.003,45
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	130,45	$ 204.075,56	$ 26.621.656,80
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	77,00	$ 29.419,97	$ 2.265.337,69
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	ML	40,00	$ 51.614,61	$ 2.064.584,40
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	54,60	$ 121.341,26	$ 6.625.232,80
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	86,40	$ 149.391,80	$ 12.907.451,52
NP 18	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO	UN	9,00	$ 788.976,77	$ 7.100.790,93
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	9,00	$ 410.248,58	$ 3.692.237,22

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

454

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION No. 2 - 30/12/2024					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	50,40	$ 327.733,23	$ 16.517.754,79
NP 21	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	M3	86,51	$ 155.855,64	$ 13.483.071,42
NP 22	TUBERIA PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	500,00	$ 11.720,68	$ 5.860.340,00
NP 23	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	UND	12,00	$ 195.358,65	$ 2.344.303,80
	SUBTOTAL				**$ 139.020.906,31**
2	**EXCAVACIONES**				
2,1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	4.226,98	$ 61.667,00	$ 260.665.175,66
2,2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3/KM	87.973,88	$ 1.879,00	$ 165.302.920,52
NP 24	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	129,49	$ 84.124,31	$ 10.893.256,90
	SUBTOTAL				**$ 436.861.353,08**
3	**RELLENOS**				
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	1.439,53	$ 159.913,00	$ 230.199.560,89
3.2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	614,74	$ 171.864,00	$ 105.651.675,36
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	96.405,70	$ 1.834,00	$ 176.808.053,80
NP 25	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3	126,07	$ 38.725,39	$ 4.882.109,92
NP 26	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO PESADO	M3	707,82	$ 49.919,79	$ 35.334.225,76
	SUBTOTAL				**$ 552.875.625,73**
4	**BORDILLOS Y ANDENES**				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION No. 2 - 30/12/2024					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	172,33	$ 116.001,00	$ 19.990.452,33
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	890,76	$ 175.063,99	$ 155.939.999,73
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	222,00	$ 126.422,43	$ 28.065.779,46
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	148,04	$ 142.218,71	$ 21.054.057,83
	SUBTOTAL				**$ 225.050.289,35**
5	**CARPETA ASFÁLTICA**				
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	4.098,22	$ 5.380,00	$ 22.048.423,60
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	M3	286,87	$ 1.102.453,00	$ 316.260.692,11
5.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	24.269,20	$ 1.965,00	$ 47.688.978,00
5.4	RENIVELACION DE POZOS DE INSPECCION	UN	14,00	$ 259.731,00	$ 3.636.234,00
NP 4	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	UN	14,00	$ 2.686.253,17	$ 37.607.544,38
NP 5	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000PSI DE ØINT=1.20ME=0.20M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	ML	5,85	$ 606.102,55	$ 3.545.699,92
NP 6	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	M3	62,48	$ 368.436,44	$ 23.019.908,77
NP 7	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	ML	11,00	$ 4.885.868,41	$ 53.744.552,51
NP 8	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	3,32	$ 434.051,93	$ 1.441.052,41

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION No. 2 - 30/12/2024					
N° ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	13,99	$ 469.950,97	$ 6.574.614,07
NP 10	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	75,22	$ 528.694,83	$ 39.768.425,11
	SUBTOTAL				**$ 555.336.124,88**
6	**SEÑALIZACIÓN**				
6.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	ML	1.620,00	$ 5.755,00	$ 9.323.100,00
6.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	M2	228,00	$ 38.728,00	$ 8.829.984,00
6.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	16,00	$ 428.288,00	$ 6.852.608,00
	SUBTOTAL				**$ 25.005.692,00**
				COSTO TOTAL PROYECTO	**$1.934.149.991,35**
				VALOR COSTOS DIRECTOS	**$1.476.450.375,08**
				ADMINISTRACIÓN (26 %)	**$ 383.877.097,52**
				IMPREVISTOS (1 %)	**$ 14.764.503,75**
				UTILIDAD (4 %)	**$ 59.058.015,00**
				VALOR COSTOS INDIRECTOS	**$ 457.699.616,27**
				PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)	**$ 52.311.667,00**
				VALOR TOTAL OBRA	**$1.986.461.658,35**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14/160

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

AVANCE FÍSICO

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 06/09/2023 A 06/02/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
1	PRELIMINARES			
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	0,520	$ 3.444.326,00	96,30%
NP 11	CONCRETO 3500 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	23,56	$ 19.375.607,59	98,37%
NP 12	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	1.527,37	$ 15.996.161,28	98,35%
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	84,25	$ 17.193.365,93	64,58%
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	77,00	$ 2.265.337,69	100,00%
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	25,00	$ 1.290.365,25	62,50%
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	54,60	$ 6.625.232,80	100,00%
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	85,20	$ 12.728.181,36	98,61%
NP 18	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO	5,00	$ 3.944.883,85	55,56%
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	9,00	$ 3.692.237,22	100,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14461

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 06/09/2023 A 06/02/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	50,40	$ 16.517.754,79	100,00%
NP 21	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	83,20	$ 12.967.189,25	96,17%
NP 22	TUBERIA PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	500,00	$ 5.860.340,00	100,00%
NP 23	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	10,00	$ 1.953.586,50	83,33%
		Subtotal	**$ 123.854.569,51**	
2	**EXCAVACIONES**			
2.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	3.888,67	$ 239.802.612,89	92,00%
2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	81.124,70	$ 152.433.311,30	92,21%
NP 24	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	126,08	$ 10.606.393,00	97,37%
		Subtotal	**$ 402.842.317,19**	
3	**RELLENOS**			
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	1.364,56	$ 218.210.883,28	94,79%
3.2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	570,48	$ 98.044.974,72	92,80%
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	88.609,45	$ 162.509.731,30	91,91%
NP 25	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	101,21	$ 3.919.396,72	80,28%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14462

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 06/09/2023 A 06/02/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
NP 26	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO PESADO	649,55	$ 32.425.399,59	91,77%
		Subtotal	**$ 515.110.385,93**	
4	**BORDILLOS Y ANDENES**			
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	51,00	$ 5.916.051,00	29,59%
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	603,40	$ 105.633.611,57	67,74%
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	181,02	$ 22.884.988,28	81,54%
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	100,04	$ 14.227.559,75	67,58%
		Subtotal	**$ 148.662.210,60**	
5	**CARPETA ASFÁLTICA**			
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	2081,42	$ 11.198.039,60	50,79%
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	145,70	$ 160.627.402,10	50,79%
5.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	12478,50	$ 24.520.252,50	51,42%
5.4	RENIVELACION DE POZOS DE INSPECCION	12,00	$ 3.116.772,00	85,71%
NP 4	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	14,00	$ 37.607.544,38	100,00%

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14463

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

AVANCE FISICO				
ITEM	ACTIVIDADES	AVANCE MENSUAL PERIODO DE 06/09/2023 A 06/02/2026		
		CANTIDAD	VALOR TOTAL	%
NP 5	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000PSI DE ØINT=1.20ME=0.20M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	2,05	$ 1.242.510,23	35,04%
NP 6	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	62,48	$ 23.019.908,77	100,00%
NP 7	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	11,00	$ 53.744.552,51	100,00%
NP 8	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	1,23	$ 533.883,87	37,05%
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	12,39	$ 5.822.692,52	88,56%
NP 10	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	69,39	$ 36.686.134,25	92,25%
		Subtotal	**$ 358.119.692,73**	
6	**SEÑALIZACIÓN**			
6.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	0,00	$ 0,00	0,00%
6.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	0,00	$ 0,00	0,00%
6.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	0,00	$ 0,00	0,00%
		Subtotal	**$ 0,00**	
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)		$ 52.311.667,00	100,00%
	VALOR TOTAL		**$1.600.900.842,97**	**80,59%**

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14464

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
1	PRELIMINARES								
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO VÍAS INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE PRECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 3.576.800,16	0,00%	$ 0,00	96,30%	$ 3.444.326,00
NP 11	CONCRETO 3500 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 19.696.341,33	0,00%	$ 0,00	98,37%	$ 19.375.607,59
NP 12	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 16.265.003,45	0,00%	$ 0,00	98,35%	$ 15.996.161,28
NP 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 26.621.656,80	0,00%	$ 0,00	64,58%	$ 17.193.365,93
NP 14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 2" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 2.265.337,69	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 2.265.337,69
NP 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC-P 3" RDE 21-200 PSI UNION PLATINO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 2.064.584,40	0,00%	$ 0,00	62,50%	$ 1.290.365,25
NP 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 160MM Ø6" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 6.625.232,80	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 6.625.232,80
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200 MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 12.907.451,52	0,00%	$ 0,00	98,61%	$ 12.728.181,36
NP 18	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 7.100.790,93	0,00%	$ 0,00	55,56%	$ 3.944.883,85

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
NP 19	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLA YEE PVC Ø 200 MM X 160 MM (8" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 3.692.237,22	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 3.692.237,22
NP 20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 16.517.754,79	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 16.517.754,79
NP 21	CAMADA EN ARENA PARA CIMENTACION DE TUBERIAS	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 13.483.071,42	0,00%	$ 0,00	96,17%	$ 12.967.189,25
NP 22	TUBERIA PVC PF + UAD 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 5.860.340,00	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 5.860.340,00
NP 23	ACOMETIDA DOMICILIARIA ACUEDUCTO 2 x 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION MANGUERA, ACCESORIOS)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 2.344.303,80	0,00%	$ 0,00	83,33%	$ 1.953.586,50
2	**EXCAVACIONES**								
2.1	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 260.665.175,66	0,00%	$ 0,00	92,00%	$ 239.802.612,89
2.2	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 165.302.920,52	0,00%	$ 0,00	92,21%	$ 152.433.311,30
NP 24	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 10.893.256,88	0,00%	$ 0,00	97,37%	$ 10.606.393,00
3	**RELLENOS**								
3.1	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 230.199.560,89	0,00%	$ 0,00	94,79%	$ 218.210.883,28
3.2	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 105.651.675,36	0,00%	$ 0,00	92,80%	$ 98.044.974,72

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 176.808.053,80	0,00%	$ 0,00	91,91%	$ 162.509.731,30
NP 25	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 4.882.109,92	0,00%	$ 0,00	80,28%	$ 3.919.396,72
NP 26	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO PESADO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 35.334.225,76	0,00%	$ 0,00	91,77%	$ 32.425.399,59
4	**BORDILLOS Y ANDENES**								
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 19.990.452,33	0,00%	$ 0,00	29,59%	$ 5.916.051,00
NP 1	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 155.939.999,73	0,00%	$ 0,00	67,74%	$ 105.633.611,57
NP 2	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 28.065.779,46	0,00%	$ 0,00	81,54%	$ 22.884.988,28
NP 3	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 21.054.057,83	0,00%	$ 0,00	67,58%	$ 14.227.559,75
5	**CARPETA ASFÁLTICA**								
5.1	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	50,00%	$ 11.024.211,80	100,00%	$ 22.048.423,60	50,79%	$ 11.198.039,60	50,79%	$ 11.198.039,60

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
5.2	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	50,00%	$ 158.130.346,05	100,00%	$ 316.260.692,11	50,79%	$ 160.627.402,10	50,79%	$ 160.627.402,10
5.3	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	50,00%	$ 23.844.489,00	100,00%	$ 47.688.978,00	51,42%	$ 24.520.252,50	51,42%	$ 24.520.252,50
5.4	RENIVELACION DE POZOS DE INSPECCION	14,29%	$ 519.462,00	100,00%	$ 3.636.234,00	0,00%	$ 0,00	85,71%	$ 3.116.772,00
NP 4	PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 37.607.544,38	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 37.607.544,38
NP 5	CILINDRO EN CONCRETO DE 4000PSI DE ØINT=1.20ME=0.20M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA	64,96%	$ 2.303.189,69	100,00%	$ 3.545.699,92	0,00%	$ 0,00	35,04%	$ 1.242.510,23
NP 6	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 23.019.908,77	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 23.019.908,77
NP 7	SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA,E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4"	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 53.744.552,51	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 53.744.552,51
NP 8	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	62,95%	$ 907.168,54	100,00%	$ 1.441.052,41	0,00%	$ 0,00	37,05%	$ 533.883,87
NP 9	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	28,66%	$ 1.884.503,39	100,00%	$ 6.574.614,07	0,00%	$ 0,00	88,56%	$ 5.822.692,52
NP 10	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	7,75%	$ 3.082.290,86	100,00%	$ 39.768.425,11	0,00%	$ 0,00	92,25%	$ 36.686.134,25
6	SEÑALIZACIÓN								

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	PROGRAMADO				EJECUTADO			
		MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
6.1	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
6.2	DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN MANUAL CON EQUIPO COMPRESOR.	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
6.3	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 75 X 75 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (INCLUYE IVA)	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 52.311.667,00	0,00%	$ 0,00	100,00%	$ 52.311.667,00
	TOTALES	**10,15%**	**$ 201.695.661,33**	**98,74%**	**$ 1.961.455.967,28**	**9,88%**	**$ 196.345.694,20**	**80,59%**	**$ 1.600.900.842,97**

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO 1 (SEP 2023)	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00
PERIODO 2 (OCT 2023)	4,66%	$ 92.507.326,66	4,66%	$ 92.507.326,66	4,66%	$ 92.507.326,66	4,66%	$ 92.507.326,66
PERIODO 3 (NOV 2023)	17,92%	$ 356.009.624,34	22,58%	$ 448.516.951,00	17,92%	$ 356.009.624,34	22,58%	$ 448.516.951,00
PERIODO 4 (DIC 2023)	0,00%	$ 0,00	22,58%	$ 448.516.951,00	0,00%	$ 0,00	22,58%	$ 448.516.951,00
PERIODO 5 (ENE 2024)	0,00%	$ 0,00	22,58%	$ 448.516.951,00	0,00%	$ 0,00	22,58%	$ 448.516.951,00
PERIODO 6 (FEB 2024)	0,00%	$ 0,00	22,58%	$ 448.516.951,00	0,00%	$ 0,00	22,58%	$ 448.516.951,00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

469

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO 7 (MARZ 2024)	0,04%	$ 835.207,20	22,62%	$ 449.352.158,20	0,04%	$ 835.207,20	22,62%	$ 449.352.158,20
PERIODO 8 (ABRIL 2024)	0,00%	$ 0,00	22,62%	$ 449.352.158,20	0,00%	$ 0,00	22,62%	$ 449.352.158,20
PERIODO 9 (MAYO 2024)	0,00%	$ 0,00	22,62%	$ 449.352.158,20	0,00%	$ 0,00	22,62%	$ 449.352.158,20
PERIODO 10 (JUN 2024)	8,85%	$ 175.863.014,61	31,47%	$ 625.215.172,83	8,85%	$ 175.863.014,61	31,47%	$ 625.215.172,83
PERIODO 11 (JUL 2024)	0,00%	$ 0,00	31,47%	$ 625.215.172,83	0,00%	$ 0,00	31,47%	$ 625.215.172,83
PERIODO 12 (AGOS 2024)	1,01%	$ 20.000.000,00	32,48%	$ 645.215.172,83	1,01%	$ 20.000.000,00	32,48%	$ 645.215.172,83
PERIODO 13 (SEP 2024)	0,00%	$ 0,00	32,48%	$ 645.215.172,83	0,00%	$ 0,00	32,48%	$ 645.215.172,83
PERIODO 14 (ENER 2025)	0,00%	$ 0,00	32,48%	$ 645.215.172,83	0,00%	$ 0,00	32,48%	$ 645.215.172,83
PERIODO 15 (FEB 2025)	7,06%	$ 140.247.559,97	39,54%	$ 785.462.733,63	7,06%	$ 140.247.559,97	39,54%	$ 785.462.733,63
PERIODO 16 (MARZ 2025)	10,03%	$ 199.161.608,10	49,57%	$ 984.624.341,71	10,03%	$ 199.161.608,10	49,57%	$ 984.624.341,71
PERIODO 17 (ABRIL 2025)	4,89%	$ 97.057.077,53	54,45%	$ 1.081.681.419,24	4,89%	$ 97.057.077,53	54,45%	$ 1.081.681.419,24
PERIODO 18 (MAYO 2025)	0,00%	$ 0,00	54,45%	$ 1.081.681.419,24	0,00%	$ 0,00	54,45%	$ 1.081.681.419,24
PERIODO 19 (JUN 2025)	0,00%	$ 0,00	54,45%	$ 1.081.681.419,24	0,00%	$ 0,00	54,45%	$ 1.081.681.419,24
PERIODO 20 (JUL 2025)	4,34%	$ 86.209.319,23	58,79%	$ 1.167.890.738,47	4,34%	$ 86.209.319,23	58,79%	$ 1.167.890.738,47
PERIODO 21 (AGOS 2025)	2,15%	$ 42.628.167,84	60,94%	$ 1.210.518.906,31	2,15%	$ 42.628.167,84	60,94%	$ 1.210.518.906,31
PERIODO 22 (SEP 2025)	0,00%	$ 0,00	60,94%	$ 1.210.518.906,31	0,00%	$ 0,00	60,94%	$ 1.210.518.906,31

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298


MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
PERIODO 23 (OCT 2025)	0,00%	$ 0,00	60,94%	$ 1.210.518.906,31	0,00%	$ 0,00	60,94%	$ 1.210.518.906,31
PERIODO 24 (NOV 2025)	0,00%	$ 0,00	60,94%	$ 1.210.518.906,31	0,00%	$ 0,00	60,94%	$ 1.210.518.906,31
PERIODO 25 (DIC 2025)	7,27%	$ 144.509.618,87	68,21%	$ 1.355.028.525,18	0,58%	$ 11.425.230,00	61,51%	$ 1.221.944.136,31
PERIODO 26 (ENERO 2026)	20,37%	$ 404.731.780,77	88,59%	$ 1.759.760.305,95	9,19%	$ 182.611.012,46	70,71%	$ 1.404.555.148,77
PERIODO 27 (FEBRERO 2026)	10,15%	$ 201.695.661,33	98,74%	$ 1.961.455.967,28	9,88%	$ 196.345.694,20	80,59%	$ 1.600.900.842,97
PERIODO 28 (MARZO 2026)	1,26%	$ 25.005.692,00	100,00%	$ 1.986.461.658,45				

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

Grafica Avance Físico

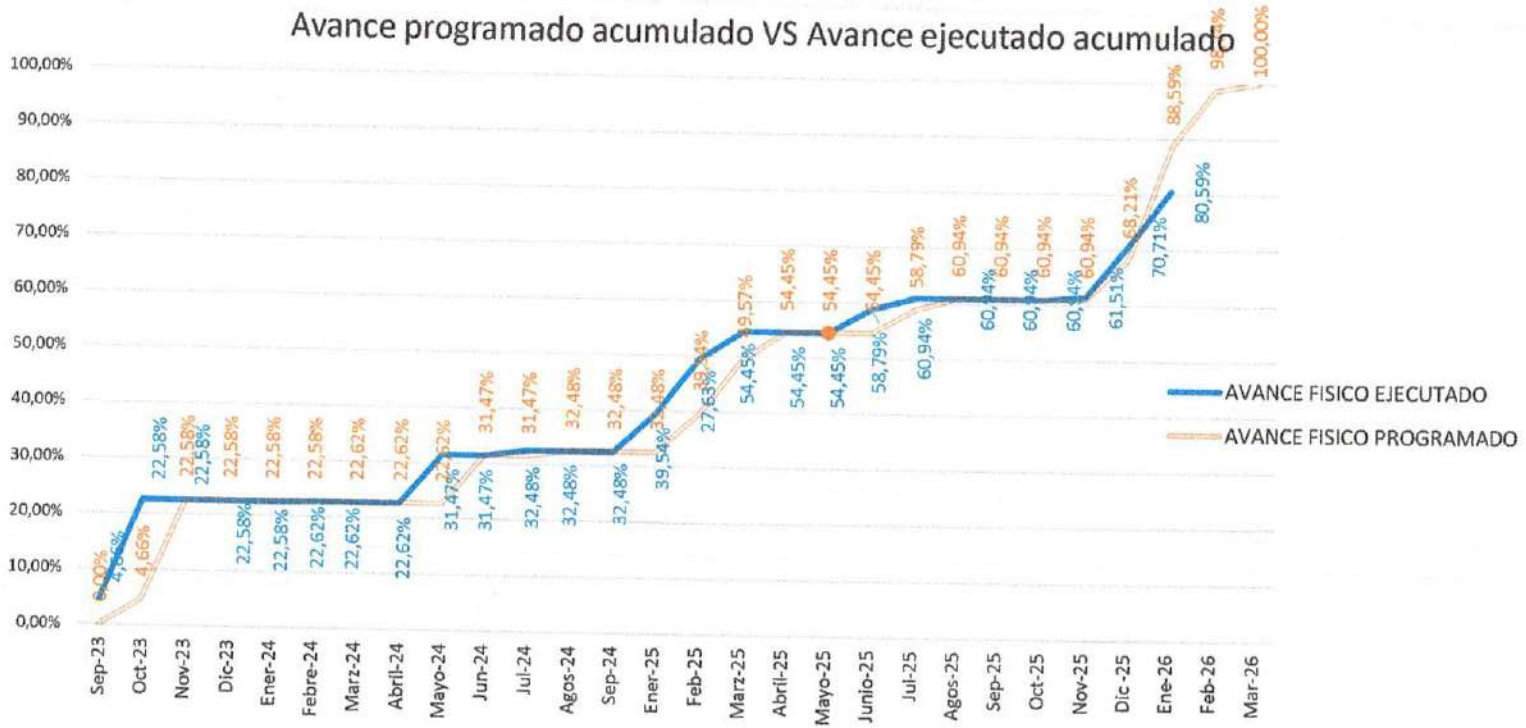

Se tiene un avance programado acumulado del **98,74%** y se cuenta con un avance ejecutado acumulado de **80,59%.**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

2. GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL

No aplica para el presente informe.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Comités de Obra y Reuniones

No aplica para el presente informe

FECHA	OBJETIVO
N/A	N/A

3. PROBLEMAS PRESENTADOS Y MECANISMOS DE SOLUCIÓN PROPUESTOS

No aplica para el presente informe

4. ESTADO DEL TIEMPO

No aplica para el presente informe
Frecuencia.

ESTADO	N° DE DÍAS
NUBLADO	N/A
TORMENTA	N/A
LLUVIOSO	N/A
SOLEADO	N/A

B. CUMPLIMIENTO DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. PROCESO CONSTRUCTIVO

2. 2 TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES.

El transporte del material granular se realizó desde la mina autorizada, es transportado en volquetas hasta el sitio de la obra.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14473

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

3.1 SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.

El material se dispuso en un cordón de sección uniforme donde fue necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad óptima de compactación. Después de humedecido, se extendió en todo el ancho previsto en una capa de espesor uniforme que permitió obtener el espesor y el grado de compactación exigidos. En todo caso, la cantidad de material extendido fue de 15 cm por capa lo que no superó los 20 cm de espesor ni fue menor a 10 cm. El material extendido mostró una distribución granulométrica uniforme, sin segregaciones evidentes.

Una vez que el material extendido de la sub base granular tuvo la humedad apropiada, se conformó y se compactó con el equipo de compactación adecuado, hasta que alcanzo la densidad seca especificada por el ensayo de Proctor modificado tomado en el laboratorio.
La compactación se efectuó longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de la mitad del ancho del rodillo compactador.

3.2 BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR

La base fue extendida en capas de espesor no mayor de 0,15 m, medidos antes de la compactación. Cada capa de base se oreo y humedeció artificialmente y se mezcló sucesivamente hasta que alcanzo la humedad óptima en todo el material y se compacto hasta obtener una densidad mínima del 100% de la densidad seca máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado como promedio de los ensayos realizados, y ningún valor individual fue inferior al 98% del mismo.
Una vez que el material extendido de la base granular tuvo la humedad apropiada, se conformó ajustándose a los lineamientos y secciones típicas del proyecto, y se compacto con el equipo aprobado por la Interventoría, hasta alcanzar la densidad seca especificada en el proyecto. La compactación se efectuó de manera longitudinal, comenzando por los bordes exteriores y aprobado por la interventoría, hasta alcanzar la densidad seca especificada en el proyecto.

3.3 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR

El transporte del material granular se realizó desde la mina autorizada, es transportado en volquetas hasta el sitio de la obra, dicho transporte se hace cumpliendo con las especificaciones técnicas y evitando la proliferación de partículas.

N.P. 1 SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

La actividad comprendió en el suministro e instalación del sardinel de piezas prefabricadas tipo A-10 80X50X20 cm el cual se realiza inicialmente con la localización y replanteo, teniendo localizada

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14474

la zona se procede con la excavación siempre teniendo en cuenta la cota rasante del asfalto de la estructura del diseño del pavimento, posterior se alistó la base con mortero de pega, instalado el mortero se instala el sardinel y en los espacios entre los mismos, se aplicó nuevamente mortero de pega. Todos los procedimientos se hicieron con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución, se tuvo en cuenta los alineamientos, cotas, pendientes, secciones y espesores indicados, las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

N.P. 3 BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

La actividad comprendió en el suministro de sardinel en concreto de piezas prefabricadas tipo A-100 60X50X20 cm el cual se realiza inicialmente con la localización y replanteo, teniendo localizada la zona se procede con la excavación siempre teniendo en cuenta la cota rasante del asfalto de la estructura del diseño del pavimento, posterior se alistó la base con mortero de pega, instalado el mortero se instala el bordillo y en los espacios entre los mismos, se aplicó nuevamente mortero de pega. Todos los procedimientos se hicieron con la mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución, se tuvo en cuenta los alineamientos, cotas, pendientes, secciones y espesores indicados, las normas vigentes, especificaciones técnicas de fabricantes de materiales y equipos, y teniendo en cuenta los planos del proyecto específico.

5.1 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 O CRL-1

Previo al inicio de la imprimación, se comprobó que la superficie sobre la cual se efectuó el riego, cumpliera con todos los requisitos especificados en cuanto a conformación, compactación y acabado de la base y que esta, no tuviera exceso de humedad. La superficie que se imprimó, se limpió cuidadosamente de polvo, barro seco, suciedad y cualquier material suelto que pudiera ser perjudicial. Se corroboró que toda la superficie de la base quedara completamente cubierta por la emulsión asfáltica CRL-1. Esta actividad de riego se realizó con ayuda de la marmita (equipo irrigador).

5.2 MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN

Se extendió la mezcla densa en caliente a lo largo de la vía y se compactó adecuadamente hasta la densidad mínima especificada en las normas. La mezcla se extendió con finisher, con el espesor indicado según diseño. La compactación se realizó con vibro compactador de doble rodillo y se hizo en tres fases: la primera pasada se hizo sobre la carpeta recién colocada, la segunda fase se realizó con vibro, antes de que se enfriara la mezcla para obtener la densidad requerida, la compactación final se usó compactador neumático y se hizo garantizando que la temperatura de la mezcla densa en caliente permitiera la eliminación de cualquier marca de la compactación.

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

5.3 TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

La mezcla asfáltica se trasporto en volquetas desde la planta asfáltica hasta el sitio de la obra. Las volquetas iban debidamente carpadas para mantener la temperatura de la mezcla asfáltica.

N.P. 9 DEMOLICION CONCRETO REFORZADO INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL

La actividad de demolición de concreto reforzado, consistió en realizar la localización y replanteo de la zona a intervenir, posteriormente se procede a ubicar el martillo y comenzar con la demolición del concreto reforzado, finalizada la actividad se realizó el cargue de las demoliciones realizadas del sumidero, el cual se llevó a cabo el cargue del material sobrante, ubicado en el lugar indicado de recolección. La actividad fue realizada de acuerdo a las especificaciones técnicas, con la mano de obra, equipos y herramientas necesarias para su correcta ejecución.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

- **ENERO 2026**

Sub base granular

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Ensayo caracterización		
Proctor	13/01/2026	INV–E–142-13
Densidades	15/01/2026	INV-E-161

Base granular

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Ensayo Caracterización		
Granulometría	08/01/2026	E-123
Límite líquido	08/01/2026	E-125
Índice de plasticidad	08/01/2026	E-125 y E-126
Desgaste en la máquina de los ángeles	08/01/2026	E-218
Degradación por abrasión en el equipo microdeval	08/01/2026	E-238
Evaluación de la resistencia mecánica por método del 10%	08/01/2026	E-224
Durabilidad Perdida – (Sulfato de Sodio)	08/01/2026	E-220
Durabilidad Perdida – (Sulfato de Magnesio)	08/01/2026	E-220
Equivalente de arena	08/01/2026	E-133

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14426

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Contenido de terrones de arcilla y partículas deleznables	08/01/2026	E-211
Índice de alargamiento y aplanamiento	08/01/2026	E-230
Caras fracturadas	08/01/2026	E-227
CBR	08/01/2026	E-148
Proctor	23/01/2026	INV–E–142-13
Densidades	26/01/2026 28/01/2026	INV-E-161
otros (Especificar)	-	-

- **FEBRERO DE 2026**

Mezcla densa en caliente

DESCRIPCION / ENSAYO	FECHA	NORMA
Marshall	04-02-2026	Tabla 450-10/11
estabilidad	04-02-2026	E-748
flujo	04-02-2026	E-748
Porcentaje de Asfalto	04-02-2026	E-732
Granulometría	04-02-2026	E-782

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
N/A	N/A	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14477

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

- **DICIEMBRE 2025**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	16.67%
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	50%
MERY JOHANA INFANTE	PROFESIONAL EN SST	33.33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	INGENIERO AMBIENTAL	8.33%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS O VÍAS	8.33%
JENNY PAOLA MAYORGA HINESTROZA	INSPECTOR DE OBRA	50%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPÓGRAFO	8.33%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
CARLOS ANTONIO GRISALES MEDINA	CADENERO	100%
EINER ELIECER GONZALEZ ROJAS	OFICIAL DE OBRA	100%
JORGE ELIECER GAITAN	OFICIAL DE OBRA	100%
LUIS ALBERTO MORALES MARIN	AYUDANTE DE OBRA	100%
SEBASTIAN ZAMBRANO ARIAS	AYUDANTE DE OBRA	100%
ANA MARYORY GONZALEZ ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS ANDRES CASTRO SIERRA	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE AFRANIO VARGAS MORENO	AYUDANTE DE OBRA	100%
LUIS EDUARDO CORTES LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
WILMER IBAÑEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%

- **ENERO 2026**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	16.67%
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	50%
MERY JOHANA INFANTE	PROFESIONAL EN SST	33.33%

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14478

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	INGENIERO AMBIENTAL	8.33%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS O VÍAS	8.33%
JENNY PAOLA MAYORGA HINESTROZA	INSPECTOR DE OBRA	50%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPÓGRAFO	8.33%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
CARLOS ANTONIO GRISALES MEDINA	CADENERO	100%
EINER ELIECER GONZALEZ ROJAS	OFICIAL DE OBRA	100%
JORGE ELIECER GAITAN	OFICIAL DE OBRA	100%
LUIS ALBERTO MORALES MARIN	AYUDANTE DE OBRA	100%
SEBASTIAN ZAMBRANO ARIAS	AYUDANTE DE OBRA	100%
ANA MARYORY GONZALEZ ROJAS	AYUDANTE DE OBRA	100%
CARLOS ANDRES CASTRO SIERRA	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE AFRANIO VARGAS MORENO	AYUDANTE DE OBRA	100%
LUIS EDUARDO CORTES LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
WILMER IBAÑEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%

- **FEBRERO 2026**

PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
JHON YASHIM ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	16.67%
JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON	RESIDENTE DE OBRA	50%
MERY JOHANA INFANTE	PROFESIONAL EN SST	33.33%
KATWIN ADRIANA REINA HINESTROZA	INGENIERO AMBIENTAL	8.33%
CARLOS ANDRES PEREZ JAGUA	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS O VÍAS	8.33%
JENNY PAOLA MAYORGA HINESTROZA	INSPECTOR DE OBRA	50%
JADER FRANDEY ENCISO REYES	TOPÓGRAFO	8.33%

PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
CARLOS ANTONIO GRISALES MEDINA	CADENERO	100%
LUIS ALBERTO MORALES MARIN	AYUDANTE DE OBRA	100%

14479

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

NOMBRE	CARGO	% DEDICACION PERSONA- MES
SEBASTIAN ZAMBRANO ARIAS	AYUDANTE DE OBRA	100%
ANA MARYORY GONZALEZ ROJAS	AXILIAR VIAL	100%
CARLOS ANDRES CASTRO SIERRA	AYUDANTE DE OBRA	100%
JOSE AFRANIO VARGAS MORENO	AYUDANTE DE OBRA	100%
LUIS.EDUARDO CORTES LOPEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%
WILMER IBAÑEZ SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA	100%

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presentan las siguientes planillas de seguridad social:

- **NOVIEMBRE 2025:**

Se presentan las planillas de pago: **92333391 - 92333987 - 91827893 - 9494872958**

- **DICIEMBRE 2025:**

Se presentan las planillas de pago **4326562 - 4344736 - 4326285 - 9496784654**

3. GESTIÓN SOCIAL

- **DICIEMBRE 2025**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	17
Empleos directos generados:	17
Empleados indirectos generados:	0

- **ENERO 2026**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	17
Empleos directos generados:	17
Empleados indirectos generados:	0

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

- **FEBRERO 2026**

EMPLEO	CANTIDAD
Total, empleos generados:	15
Empleos directos generados:	15
Empleados indirectos generados:	0

4. CLASIFICACIÓN DEMOGRÁFICA DE LOS EMPLEOS GENERADO

- **DICIEMBRE 2025**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (edad)	18 a 27 años	2
Etaria (edad)	28 a 37 años	8
Etaria (edad)	38 a 47 años	4
Etaria (edad)	48 años o mas	3
Total		**17**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	13
Género	Femenino	4
Total		**17**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14481

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

- **ENERO 2026**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (edad)	18 a 27 años	2
Etaria (edad)	28 a 37 años	8
Etaria (edad)	38 a 47 años	4
Etaria (edad)	48 años o mas	3
Total		**17**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	13
Género	Femenino	4
Total		**17**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

- **FEBRERO 2026**

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (edad)	18 a 27 años	2
Etaria (edad)	28 a 37 años	6
Etaria (edad)	38 a 47 años	4
Etaria (edad)	48 años o mas	3
Total		**15**
Grupos étnicos	Población Indígena	0
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	0
Grupos étnicos	Población Raizal	0
Total		**0**
Género	Masculino	11
Género	Femenino	4
Total		**15**
Población Vulnerable	Desplazados	0
Población Vulnerable	Discapacitados	0
Población Vulnerable	Víctimas	0
Total		**0**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14482

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURÍDICA DEL PROYECTO

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

- **CONTRATO 774 DE 2022**

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
PRORROGA No. 1 (CONTRATO) **01/03/2024**	5 MESES	Se suscribió la prórroga No. 1 para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos No. 20211301012240, 2021005500296, 2021005500294, 2021005500297, 2021005500309, 2021005500293, 2021005500298, 2021005500302, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500303.	N/A
PRORROGA No. 2 (CONTRATO) **19/04/2024**	23 DIAS	Teniendo en cuenta los plazos de ejecución de los diferentes proyectos que conforman el contrato de obra No. 774 de 2022, se suscribió la prórroga No. 2 al contrato para garantizar la ejecución y cumplimiento de los plazos establecidos referente al proyecto No. 2021005500293	N/A
PRORROGA No. 3 (CONTRATO) **05/08/2024**	2 MESES	Se suscribió la prórroga No. 3 para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos No. 20211301012240, 2021005500296, 2021005500294, 2021005500309, 2021005500293, 2021005500298, 2021005500302, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500303, 2021005500299.	N/A
SUSPENSIÓN No. 1 (CONTRATO) **29/10/2024**	2 MESES 1 DIA	En aras que todos los proyectos que conforman el contrato de obra No. 774 de 2022 requieren la inclusión de actividades no contempladas dentro del presupuesto inicial, conforme a las diferentes problemáticas que se han presentado durante el tiempo de ejecución, requiriendo el trámite, viabilidad y suscripción de una modificación, por mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, ocasionando la suspensión de los mismos, se solicitó la viabilidad y aprobación de la Suspensión No. 1 al Contrato de obra No. 774 de 2022 por un término de Dos (2) meses y Un (1) día, tiempo estimado que será suficiente para adelantar ante la entidad contratante la gestión y sean subsanados los hechos que dieron origen a la suspensión.	N/A
REINICIO No. 1 (CONTRATO) **30/12/2024**	NO APLICA	Teniendo en cuenta que a la fecha ya se superaron los motivos que llevaron a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 774 de 2022 se realizó la aprobación para el reinicio a los proyectos No. 2021005500302, 2021005500296, 20211301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298, por lo cual se lleva a cabo el reinicio del contrato de obra	N/A

1476

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
		No. 774 de 2022.	
PRORROGA No. 4 (CONTRATO) **30/12/2024**	5 MESES	Durante la ejecución de los proyectos No. BPIN 2021005500302, 2021005500296, 20211301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal, por lo cual se realiza la suscripción de prórroga N° 4 al contrato de obra.	N/A
PRORROGA No. 5 (CONTRATO) **06/06/2025**	4 MESES	Debido de las problemáticas justificadas de los proyectos BPIN No. 20211301012240, 2021005500296, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298, 2021005500302, 2021005500308, 2021005500303, hechos que constituyen una demora considerable en los tiempos de ejecución y por ende, en el avance contractual, siendo necesario contar con más tiempo para poder cumplir con el cronograma propuesto se solicita la viabilidad de la prórroga a los proyectos mencionados por un término de cuatro (4) meses.	N/A
PRORROGA No. 6 (CONTRATO) **15/09/2025**	8 MESES Y 1 DIA	Durante la ejecución del proyecto No. BPIN 2021005500297, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal, por lo cual se realiza la suscripción de prórroga N° 6 al contrato de obra.	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
ADICIÓN No.1 (CONTRATO) **30/12/2024**	$ 9.280.219.314,16	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500302, 2021005500296, 20211301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 9.280.219.314,16, y prórroga en tiempo para cada uno de los proyectos, por lo cual se realiza la suscripción de la modificación N°4 y prórroga N° 4 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos.	N/A

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
ADICIÓN No.2 (CONTRATO) **15/09/2025**	$ 1.940.380.718,04	Durante la ejecución del proyecto de BPIN N° 2021005500297, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 1.940.380.718,04, y prórroga en tiempo para el proyecto, por lo cual, se realiza la suscripción de la modificación N°5 y prórroga N°6 al contrato de obra, para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados del proyecto en mención.	N/A
ADICIÓN No.3 (CONTRATO) **12/12/2025**	$ 2.687.666.505,53	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500299 y BPIN N° 2021005500309 , se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 2.687.666.505,53, y prórroga en tiempo para cada proyecto, por lo cual, se realiza la suscripción de la modificación N°6 al contrato de obra, para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados del proyecto en mención.	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
MODIFICACION No. 1 (CONTRATO) 06/06/2024	$27.816.678.109,00	Se suscribió la Modificación No. 1 por mayores y menores cantidades e ítems no previstos de los proyectos BPIN No. 2021005500302, 2021005500303, 2021005500298, 2021005500293.	N/A
MODIFICACION No. 2 (CONTRATO) 14/06/2024	$27.816.678.109,00	Se suscribió la Modificación No. 2 por mayores y menores cantidades e ítems no previstos de los proyectos BPIN No. 2021005500296, 2021005500294, 20211301012240.	N/A
MODIFICACION No. 3 (CONTRATO) 20/06/2024	$27.816.678.109,00	Se suscribió la Modificación No. 3 por mayores y menores cantidades e ítems no previstos de los proyectos BPIN No. 2021005500308, 2021005500304.	N/A
MODIFICACIÓN No.4 (CONTRATO) 30/12/2024	$37.096.897.423,16	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500302, 2021005500296, 20211301012240, 2021005500303, 2021005500308, 2021005500304, 2021005500294, 2021005500293, 2021005500298, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 9.280.219.314,16, y prórroga en tiempo para cada uno de los proyectos, por lo cual se realiza la suscripción de la modificación N°4 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados referente a los proyectos El Contrato de Obra 774 de 2022.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
MODIFICACIÓN No.5 (CONTRATO) **15/09/2025**	$ 39.037.278.141,20	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500297, se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 1.940.380.718,04, y prórroga en tiempo para el proyecto, por lo cual se realiza la suscripción de la modificación N°5 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados del proyecto en mención.	N/A
MODIFICACIÓN No.6 (CONTRATO) **12/12/2025**	$41.724.944.646,73	Durante la ejecución de los proyectos de BPIN N° 2021005500299 (CALVARIO) y BPIN N° 2021005500309 (SAN JUANITO), se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal de $ 2.687.666.505,53, y prórroga en tiempo para cada proyecto, por lo cual se realiza la suscripción de la modificación N°6 al contrato de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento debido a los diferentes inconvenientes presentados de los proyectos en mención.	N/A

- **PROYECTO 2021005500298**

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
PRORROGA No. 1 (PROYECTO) **04/12/2023**	3 MESES	Se presentaron atrasos en la aprobación del Plan de Manejo de Transito – PMT el cual fue radicado el 11 de septiembre del 2023 y aprobado el 04 de octubre del 2023, por lo que las actividades de obra no podían dar inicio. Se presentaron atrasos en la renovación de la autorización de la disposición final de materiales provenientes de la excavación ubicado la cual fue generada el 17 de octubre 2023, ocasionando atrasos en el inicio de las excavaciones. De igual forma, durante el mes de octubre y noviembre 2023 se presentaron altas precipitaciones, lo que genero bajos rendimientos durante el inicio de las excavaciones.	N/A
PRORROGA No.2 (PROYECTO) **01/03/2024**	5 MESES		
PRORROGA No. 3 (PROYECTO) **05/08/2024**	2 MESES	Teniendo en cuenta las necesidades que se evidenciaron en campo, surge la necesidad de suscribir acta de Modificación No. 1 del proyecto, donde se realizó el balance de mayores y menores cantidades de obra, así como la inclusión de actividades No Previstas, las cuales son necesarias para la correcta ejecución y alcance del mismo. Por lo anterior, es necesario prorrogar el plazo de ejecución con el fin de poder culminar las actividades faltantes basados en tiempos necesarios en los diferentes procesos constructivos.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

934 h1

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	**TIEMPO (MESES / DIAS)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
SUSPENSIÓN No. 1 (PROYECTO) **13/09/2024**	3 MESES	A la fecha de la presente en aras que todos los proyectos que conforman el contrato de obra No. 774 de 2022 requieren la inclusión de actividades no contempladas dentro de las actividades iniciales del presupuesto, conforme a las diferentes problemáticas que se han presentado durante el tiempo de ejecución, requiriendo el trámite, viabilidad y suscripción de una modificación, por mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, ocasionando la suspensión de los mismos	N/A
AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No. 1 (PROYECTO) **29/10/2024**	17 DIAS	Teniendo en cuenta los inconvenientes que originaron la suscripción de la Suspensión No. 1 de los proyectos con BPIN No. 20211005500298 ; a la fecha de la presente dichos inconvenientes continúan y se encuentra en trámite la suscripción de la modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos, los cuales, generaran una adición presupuestal al valor inicial de los proyectos, por lo que no han sido subsanados en su totalidad; motivo por el cual, se solicita la Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1	N/A
REINICIO No. 1 (PROYECTO) **30/12/2024**	N/A	Teniendo en cuenta que a la fecha ya se superaron los motivos que llevaron a la suspensión No. 1 del contrato de obra No. 774 de 2022; se realizó aprobación de reinicio a los proyectos de BPIN N° 2021005500302 (SAN LUIS DE CUBARRAL), BPIN N° 2021005500296 (PUERTO LLERAS), BPIN N°20211301012240 (CABUYARO), BPIN N°2021005500303 (PUERTO RICO), BPIN N°2021005500308 (EL CASTILLO), BPIN N° 2021005500304 (SAN CARLOS DE GUAROA), BPIN N° 2021005500294 (PUERTO LÓPEZ), BPIN No. 2021005500293 (RESTREPO), BPIN N°2021005500298 (SAN JUAN DE ARAMA), por lo cual se lleva a cabo el reinicio del contrato de obra No. 774 de 2022.	N/A
PRORROGA No. 4 (PROYECTO) **30/12/2024**	2 MESES	Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal y una prórroga por dos (02) meses y la inclusión de ítems no previstos al proyecto BPIN No. 20211005500298 del contrato de obra No. 774 de 2022	
PRORROGA No. 5 (PROYECTO) **17/03/2025**	2 MESES	Una vez superadas las causales que dieron origen a la suspensión de los proyectos BPIN 2021005500298, se firmó acta de reinicio el día 30 de diciembre de 2024, con lo cual, se procedió a la socialización del reinicio de la obra con la comunidad, coordinando con las autoridades municipales las actividades necesarias, en cumplimiento de los requisitos correspondientes para el inicio de actividades físicas en campo; lo cual se llevó a cabo el día 20 de febrero del año en curso, en el municipio de San Juan de Arama, acordándose con la comunidad realizar la verificación de las actas de vecindad inicialmente realizadas con los propietarios de los predios circundantes, para de esta manera proceder a la ejecución de las actividades, obligando a la disposición de tiempo adicional a la programación de la obra. Así mismo, se informa que en el municipio de San Juan de Arama , después de tres (3) meses de no desarrollo de actividades en obra, por suspensión suscrita, se evidencia en campo que, parte de las labores de estructura	N/A

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
		de pavimento (sub base granular) en la que se dejó la vía intervenida, presenta algunas condiciones técnicas de deterioro por acción de lluvia y tránsito de vehículos, que deben ser verificadas y atendidas, por lo cual, ha sido necesario proceder al chequeo con la topografía, con el fin de establecer y cuantificar la variación de las condiciones en los niveles de instalación del material de sub-base granular, garantizando las condiciones y especificaciones técnicas según el diseño establecido para la vía. Por lo tanto, estas labores de chequeo y verificación por la topografía y el personal en campo, las cuales son necesarias, tanto para la estabilidad de la obra, como para dar continuidad a las demás actividades requeridas en la ejecución del proyecto, han generado una afectación en la programación de obra, siendo necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes conforme a los procesos constructivos.	
PRORROGA No. 6 (PROYECTO) **25/03/2025**	15 DIAS	Teniendo en cuenta las dificultades presentadas para la adquisición de material granular requerido para el proyecto y la disponibilidad de maquinaria, necesarias e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos y el desarrollo de las actividades conforme a la programación de obra, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.	N/A
PRORROGA No. 7 (PROYECTO) **06/06/2025**	4 MESES	Debido a las fuertes lluvias presentadas durante los meses transcurridos en el presente año, las cuales han generado crecientes y desbordamientos de los ríos del departamento del Meta, se han presentado afectaciones en el municipio de San Juan de Arama, de igual forma ha afectado la ejecución de actividades tales como excavación manual, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos según lo estipulado en la norma INVIAS Art. 320, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.	N/A
PRORROGA No. 8 (PROYECTO) **06/10/2025**	2 MESES	Debido a la continuidad de la temporada invernal que se ha presentado a lo largo y ancho del departamento del Meta afectando factores como el transporte, vías, economía y la ejecución de las obras civiles. En tal sentido, la ejecución del proyecto se vio afectada debido a las condiciones climáticas. Toda vez que se siguen los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto Nacional de vías (INVIAS), especificamente lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras 2022 en su artículo 320 y 330. La ejecución de actividades se ha visto afectada tales como excavación mecánica para el respectivo cajeo de vías en intervención, extendido y compactación de material granular correspondiente a SUB BASE, afectando directamente los rendimientos de obra y la adquisición de material granular requerido para el proyecto, los cuales son necesarios e indispensables para la ejecución de acuerdo a los procesos constructivos, por consiguiente, genera atrasos considerables; motivo por el cual, es necesario prorrogar el plazo de ejecución, con el fin de poder culminar las actividades faltantes.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

23/241

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
PRORROGA No. 9 (PROYECTO) **05/12/2025**	3 MESES	Debido a las altas precipitaciones presentadas en el transcurso del año en el departamento del Meta, los cuales afectaron sectores como el transporte, economía, y la ejecución de obras en diferentes municipios, tal como fue resaltado por algunos medios noticiosos del país y fue manifestado por las autoridades departamentales, declarándose la situación de calamidad pública, mediante el Decreto No. 078 de 2025 del 21 de marzo de 2025. Esta temporada invernal, generó atrasos significativos en las operaciones mineras, es decir, para la extracción de material pétreo y por consiguiente la clasificación y suministro de material granular y mezcla asfáltica; cabe aclarar que, la disponibilidad de material granular en la obra es indispensable para la ejecución de las actividades de conformación de la vía.	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL No Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
ADICION No 1 (PROYECTO) **30/12/2024**	$ 662.153.207,35	Se suscribió la Adición No. 1 al proyecto de obra para garantizar la ejecución y cumplimiento del objeto del mismo, teniendo en cuenta la inclusión de actividades no contempladas dentro de las actividades iniciales del presupuesto.	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
MODIFICACION No. 1 (PROYECTO) **06/06/2024**	$ 1.324.308.451,00	Al realizar las respectivas verificaciones a los estudios y diseños se evidencia la necesidad de generar la sustitución del ítem para la conformación de la vía, toda vez que en las condiciones contractuales actuales, está contemplado el ítem BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM, el cual , no es utilizado en la totalidad de la vía, sino estrictamente en las intersecciones; así mismo, es necesario adicionar el ítem SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-85 80X35X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

68h1

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	**VALOR ACTUALIZADO ($)**	**JUSTIFICACIÓN**	**FOLIO N°**
		La modificación antes descrita, obedece a que luego de verificar las dimensiones y capacidades de las piezas prefabricadas, la más óptima para garantizar el confinamiento de la vía es el sardinel tipo A-10, bordillo tipo A-85, bordillo tipo A-100 el cual es agregado dentro del presente trámite. Adicionalmente, se debe generar ajuste del ítem para la conformación de la vía, dado que en las condiciones contractuales está contemplado el ítem 5. CARPETA ASFÁLTICA dentro del cual algunos ítems aumentan las cantidades y otros las disminuyen, de igual forma, es necesario agregar algunos ítems que son imprescindibles para la ejecución y buen funcionamiento de las vías, tales como: PLACA CUBIERTA - POZO INSPECCION D=1,20M (CONCRETO F'c = 28 MPa REFORZ. ELAB. EN OBRA, E=0,20M, INC. TAPA DD SIST. SEGURIDAD), CILINDRO EN CONCRETO DE 4000PSI DE ØINT=1.20ME=0.20M FUNDIDO EN SITIO PARA CAMARA DE INSPECCION. INCLUYE PELDAÑOS SEGÚN NORMA SUMINISTRADA, DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MECÁNICO, SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO 4000 PSI REFORZADO ELAB. OBRA, E=0.20M, SEC 1.0*1.0M, REJILLA EN PERFIL U 3X1.1/2X1/4".	
MODIFICACION No. 2 (PROYECTO) **30/12/2024**	$ 1.986.461.658,35	Durante la ejecución del proyecto se ha logrado identificar la necesidad de realizar una modificación de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos con adición presupuestal por un valor de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 662.153.207,35) y una prórroga por dos (02) meses al proyecto BPIN No. 2021005500293 del contrato de obra No. 774 de 2022.	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1440

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

2. GARANTÍAS:

Para la ejecución del contrato de obra No. 774 de 2022 por parte del CONSORCIO INGEVIAS URBANAS 2022, el cual cuenta con las pólizas de la empresa SEGUROS MUNDIAL, mediante póliza de Cumplimiento No. CV-100030690 y póliza Responsabilidad Civil Extracontractual No. CV-100007789, que garantizan la ejecución del proyecto. A continuación, se describe cada una de las pólizas.

Pólizas Firma del Contrato

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	1
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	10/05/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	26/12/2022	26/01/2024	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	26/12/2022	26/01/2024	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	26/12/2022	26/07/2026	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	26/07/2023	26/07/2028	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	26/07/2023	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Acta de Inicio

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	3
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	3
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	08/09/2023
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	14/08/2023	13/09/2024	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	14/08/2023	13/09/2024	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	14/08/2023	14/03/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/03/2024	14/03/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	14/03/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Prorroga 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	4
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	4
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	18/03/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	01/03/2024	13/02/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	01/03/2024	13/02/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	01/03/2024	13/08/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/08/2024	13/08/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	13/08/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Prorroga 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	5
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	5
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	30/04/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.492

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

GARANTÍAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	19/04/2024	08/03/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/04/2024	08/03/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2024	08/09/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/09/2024	05/09/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/09/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Modificación No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	6
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	6
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/07/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	06/06/2024	08/03/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	06/06/2024	08/03/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2024	08/09/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/09/2024	05/09/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/09/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Modificación No. 2 y 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	7
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	7
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/7/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	20/06/2024	08/03/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	20/06/2024	08/03/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	20/06/2024	08/09/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/09/2024	05/09/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/09/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Firma de Prorroga No. 3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	8
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	8
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	27/08/2024
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	05/08/2024	05/05/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	05/08/2024	05/05/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	05/08/2024	05/11/2027	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	05/11/2024	05/11/2029	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	05/11/2024	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Según Acta de suspensión N°1 y Acta de Reinicio N° 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	9
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	9
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/02/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14494

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	30/12/2024	06/07/2025	$ 2.781.667.810,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30/12/2024	06/07/2025	$ 5.563.335.621,80
PRESTACIONES SOCIALES	30/12/2024	06/01/2028	$ 1.390.833.905,45
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/01/2025	06/01/2030	$ 2.781.667.810,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	06/01/2025	$ 1.390.833.905,45

Pólizas Según Acta de modificación N° 4, Adición N°1, Prorroga N°4

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	10,11
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	10,11
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	04/02/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	30/12/2024	06/12/2025	$ 3.709.689.748,32
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	30/12/2024	06/12/2025	$ 7.419.379.496,63
PRESTACIONES SOCIALES	30/12/2024	06/06/2028	$ 1.854.844.874,16
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/06/2025	06/06/2030	$ 3.709.689.748,32
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	06/06/2025	$ 1.854.844.874,16

Pólizas Prorroga No. 5

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	12
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	12
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17/06/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14495

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	06/06/2025	06/04/2026	$ 3.709.689.748,32
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	06/06/2025	06/04/2026	$ 7.419.379.496,63
PRESTACIONES SOCIALES	06/06/2025	06/10/2028	$ 1.854.844.874,16
ESTABILIDAD DE LA OBRA	06/10/2025	06/10/2030	$ 3.709.689.748,32
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	06/10/2025	$ 1.854.844.874,16

Pólizas Según Acta Modificación N° 5 Adición No. 2 y Prorroga N°6

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	13 – 14 – 15 – 16
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	13 – 14 – 15 – 16
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	10/11/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	15/09/2025	07/12/2026	$ 3.903.727.814,12
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	07/12/2026	$ 7.807.455.628,24
PRESTACIONES SOCIALES	15/09/2025	07/06/2029	$ 1.951.863.907,06
ESTABILIDAD DE LA OBRA	07/06/2026	07/06/2031	$ 3.903.727.814,12
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	07/06/2026	$ 1.951.863.907,06

Pólizas Según Acta Modificación N° 6 y Adición No. 3.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100030690
ANEXO N°	17
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	CV-100007789
ANEXO N°	17-18 - 19
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	17/12/2025
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	15/09/2025	07/12/2026	$ 4.172.494.464,60
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	15/09/2025	07/12/2026	$ 8.344.988.929,20
PRESTACIONES SOCIALES	15/09/2025	07/06/2029	$ 2.086.247.232,30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	07/06/2026	07/06/2031	$ 4.172.494.464,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/12/2022	07/06/2026	$ 2.086.247.232,30

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
ANTICIPO	156330423	21/11/2023	-	$ 264.861.690,20	-	-	-
PARCIAL 1	165328224	23/01/2024	22,58%	$ 448.516.951,00	$ 89.703.390,20	-	$ 358.813.560,80
PARCIAL 2	180392224	22/07/2024	8,90%	$ 176.698.221,83	$ 35.339.644,37	-	$ 141.358.577,46
ANTICIPO ADICIONAL	191143725	12/02/2025	-	$ 132.430.641,00	-	-	-
PARCIAL 3	195486325	8/05/2025	17,21%	$ 341.867.602,17	$ 68.373.520,43	-	$ 273.494.081,74
	195486425	8/05/2025				-	
PARCIAL 4	213884225	12/12/2025	12,17%	$ 241.668.861,37	$ 48.333.772,37	-	$ 193.335.089,50
	213888825						
TOTALES			60,85%	$ 1.208.751.636,87	$ 241.750.327,37	-	$ 967.001.309,50

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: *13/12/2025 AL 06/02/2026*

Avance físico ejecutado **80.59%** y avance financiero ejecutado **60.85%**

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.497

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
2.2	EXCAVACIONES	EJECUTADO	%
	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	47,00 M3/KM	0,05%



OBSERVACIONES
El material sobrante de la excavación es cargado en volquetas, para que sea dispuesto en el punto aprobado para disposición de sobrantes y escombros.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14.498

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.1	RELLENOS	EJECUTADO	%
	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	89,20 M3	6,20%



OBSERVACIONES
Se realiza instalación de subbase granular clase B en vía intervenida, cumplimiento especificación técnica.

14499

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.2	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
	BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	570,48 M3	92,80%



OBSERVACIONES


Se realiza instalación de la base granular clase B en vía intervenida, cumplimiento especificación técnica.

14500

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
3.3	**RELLENOS**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	24.672,03 M3/KM	25,59%

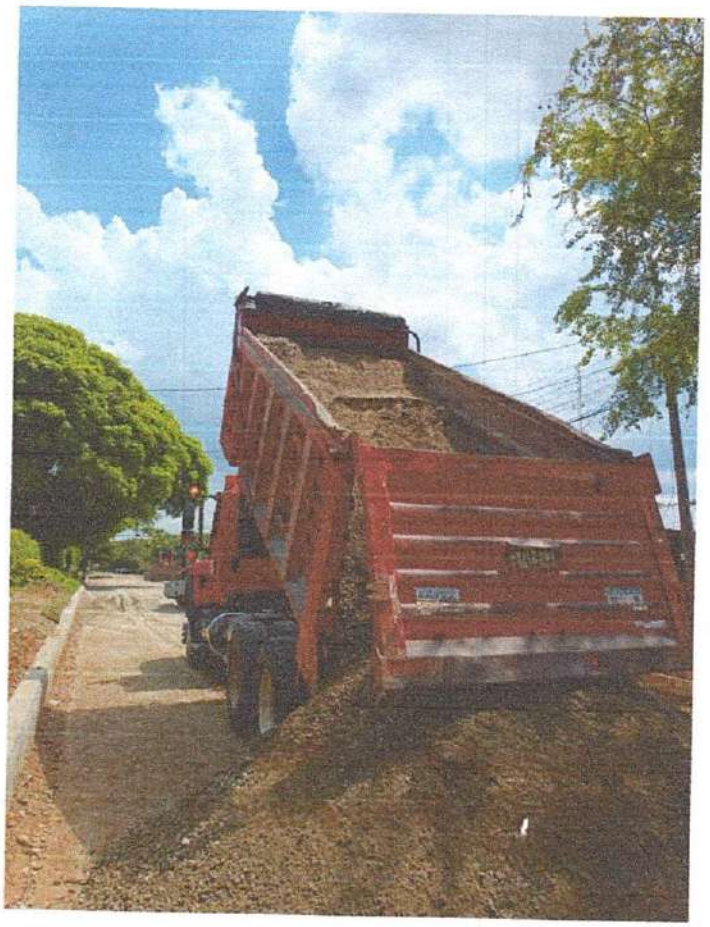

OBSERVACIONES
El material granular que se requiere en las vías intervenidas es cargado y transportado en volqueta, desde el sitio de la mina, hasta la obra y se dispone en las vías a intervenir.

14501

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P 1	**BORDILLOS Y ANDENES**	**EJECUTADO**	**%**
	SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	104,42 ML	11,72%



OBSERVACIONES
Se realizo la instalación del sardinel tipo A-10, en las vías intervenidas.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14502

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P 3	**BORDILLOS Y ANDENES**	**EJECUTADO**	**%**
	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	39,04 ML	26,37%



OBSERVACIONES

Se realizo la instalación del bordillo tipo A-100, en las vías intervenidas.

GOBERNACIÓN DEL META


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14803.

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5.1	CARPETA ASFÁLTICA	EJECUTADO	%
	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	2.081,42 M2	50,79%

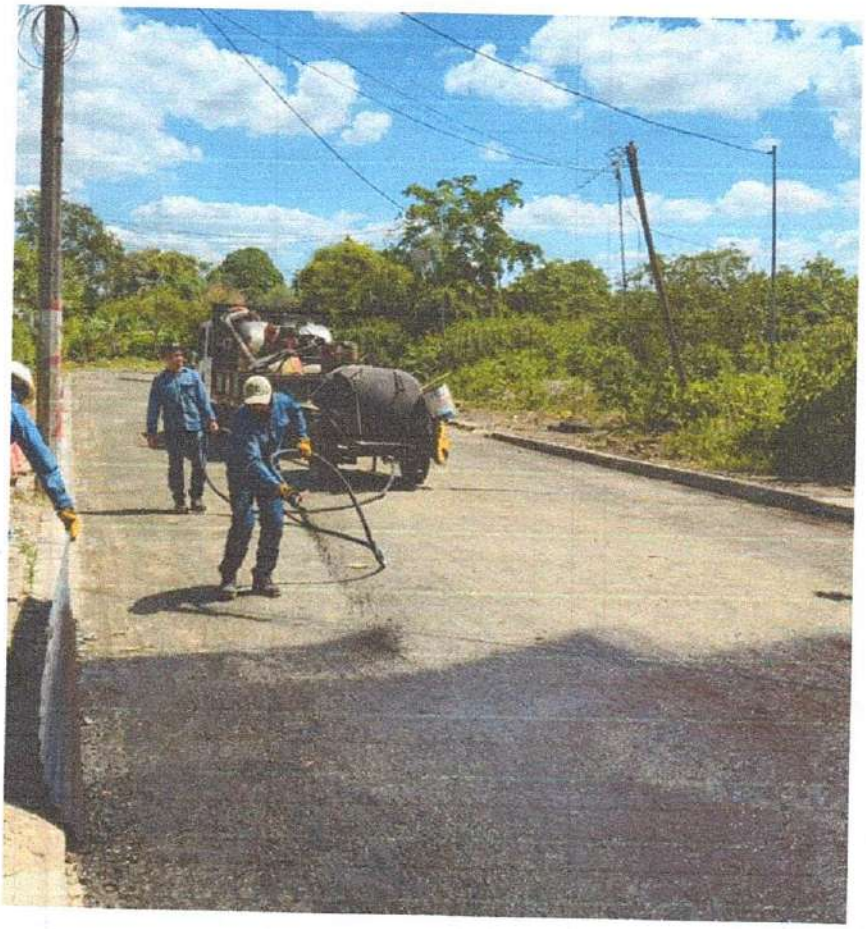

OBSERVACIONES
Se realiza imprimación con emulsión asfáltica de rompimiento lento.


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14504

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5.2	CARPETA ASFÁLTICA	EJECUTADO	%
	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN.	145,70 M3	50,79%

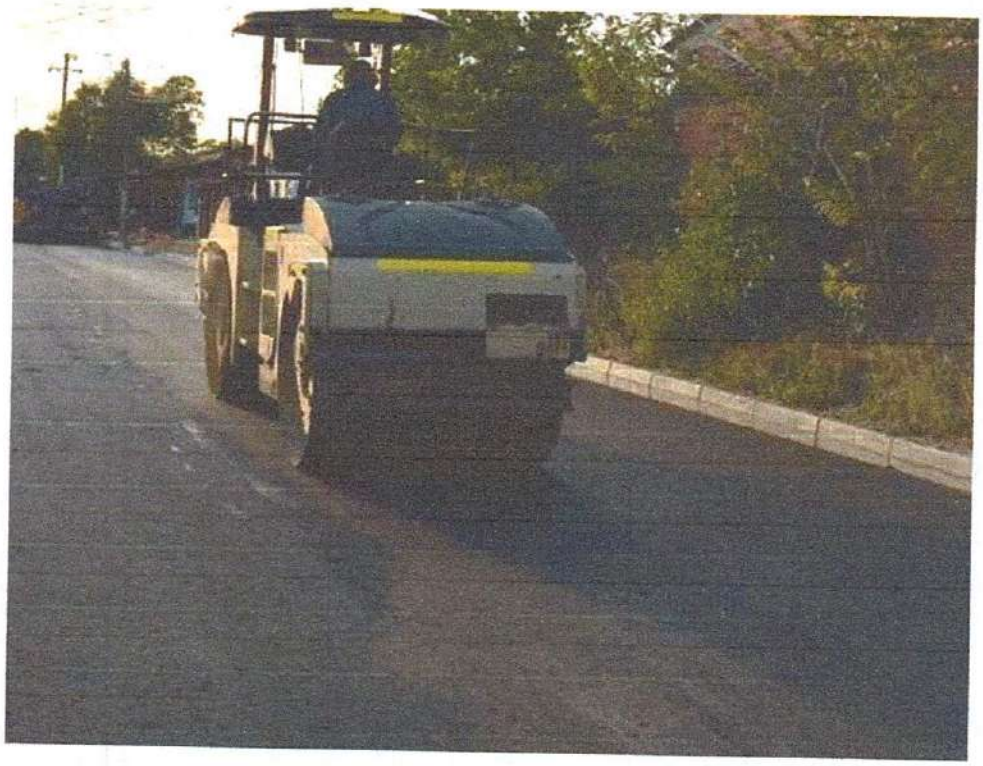

OBSERVACIONES
Se instala mezcla densa en caliente tipo MDC-19 según el espesor y ancho del perfil vial.

GOBERNACIÓN DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14505

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
5.3	**CARPETA ASFÁLTICA**	**EJECUTADO**	**%**
	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	12.478,50 M3/KM	51,42%



OBSERVACIONES

La mezcla asfáltica se trasporto en volquetas desde la planta asfáltica hasta el sitio de la obra. Las volquetas iban debidamente carpadas para mantener la temperatura de la mezcla asfáltica

GOBERNACIÓN DEL META


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14506

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
N.P 9	**CARPETA ASFÁLTICA**	**EJECUTADO**	**%**
	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	2,41 M3	17,23%

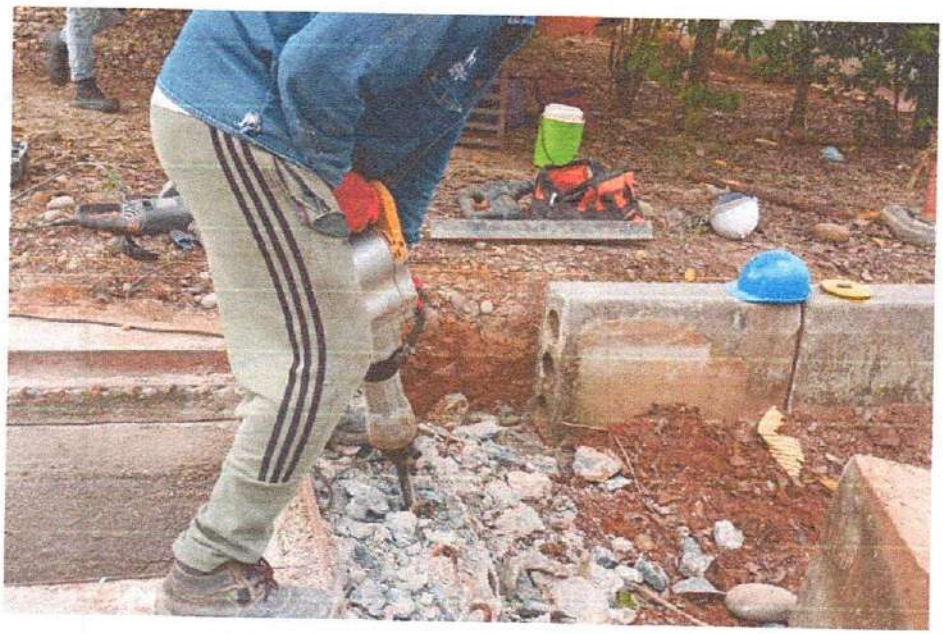

OBSERVACIONES

Se realizo la demolición del concreto reforzado correspondiente a los sumideros y placas cubierta de los pozos existentes; esto con el fin de mejorarlos.

GOBERNACIÓN DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14507

INFORME PARCIAL - No. 05

CONTRATO N°	**774 DE 2022**	**PROYECTO N°**	**2021005500298**

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- El avance generado en las actividades contractuales acumulado comprendido entre el periodo del 06 de septiembre 2023 al 06 de febrero de 2026 es del 80,59%.
- El presente cobro parcial, comprendido entre el periodo del 13 de diciembre del 2025 al 06 de febrero de 2026 corresponde al 19.08% por un valor de **TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 378.956.706,66).**
- Las actividades ejecutadas en el presente periodo han sido realizadas de acuerdo a los parámetros y especificaciones establecidas y han sido verificadas en terreno mediante el seguimiento diario en conjunto con la Interventoría.
- Los materiales empleados para la ejecución de las actividades han cumplido con la normatividad vigente, la cual puede ser verificada en los informes de laboratorio anexos al presente trámite.

H. ANEXOS

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 23 días del mes febrero del 2026.

Firmas

Nombre: **JHON ALEXANDER FALLA MUNAR**
Director de obra
N° Matrícula Profesional: 25202-78610 CND

Nombre: **JUAN DAVID CASTAÑEDA ALARCON**
Residente de obra
N° Matrícula Profesional: 041037-0659365 BYC

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14508

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LOPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

BITACORA DE OBRA (Copia)

112-ECP-FR-022

GOBERNACIÓN DEL **META**

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

14.509

INGEVIAS URBANAS
CONSORCIO

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LOPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META

BITACORA
DICIEMBRE DEL 2025

GOBERNACIÓN DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

14510

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	13	12	2025	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005000298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA SABADO, NO LABORADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

14511

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	13	12	2025	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA SABADO, NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-426746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	12	2025	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA DOMINGO, NO LABORADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	12	2025	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA DOMINGO, NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14514

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	15	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005800298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14515

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	18	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE CONTROLES PREVENTIVOS SEGÚN LA TAREA

SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE MEDIDAS EN CAMPO.

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-426746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 18B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14517

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	16	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LOS RIESGOS DE USAR JOYAS Y ALAJAS EN EL LUGA DE TRABAJO
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.
SE REALIZA EL CAMBIO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN MAL ESTADO. SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

1/15/18

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	17	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005600298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	17	12	2025	7:00 a. m.	6:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS DE TRABAJO
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.
LAS LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL DIA NO PERMITIERON LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093589 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4570

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	18	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14521

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	18	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE SEÑALIZACION Y DEMARCACION DE AREAS DE TRABAJO

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.

LAS LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL DIA NO PERMITIERON LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14522

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	19	12	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 18 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

4523

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	19	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LOS PUNTOS CIEGOS DE LA MAQUINARIA AMARILLA
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.
SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14524

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	20	12	2025	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	20210D6500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES.
NUBLADO				DIA SABADO, NO LABORADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14525

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	20	12	2025	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA SABADO, NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14526

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	21	12	2025	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA DOMINGO, NO LABORADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14527

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	21	12	2025	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA DOMINGO, NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093560 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14528

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	22	12	2025	7:00 a. m.	6:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO	X	X		MAÑANA Y TARDE NUBLADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	22	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE PREVENCION DE CAIDAS Y TROPIEZOS
SE REALIZA JORNADA DE ORDEN Y ASEO EN LOS FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 76610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

145530

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	23	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	23	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE PREVENCION DE CAIDAS Y TROPIEZOS
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.
SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 16202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14532

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	24	12	2025	7:00 a. m.	1:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14533

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	24	12	2025	7:00 a. m.	1:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE PROCURA HACER LAS COSAS BIEN EN EL TRABAJO

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	25	12	2025	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA FESTIVO, NO LABORADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14535

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	26	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSA
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14536

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	26	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE RESPETAR ZONAS DE SEGURIDAD
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.
LAS LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL DIA NO PERMITIERON LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14537

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	27	12	2025	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA SABADO, NO LABORADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14538

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	27	12	2025	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA SABADO, NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14539

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	28	12	2025	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA DOMINGO, NO LABORADO.
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14540

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	25	12	2025	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA FESTIVO, NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	28	12	2025	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA DOMINGO, NO LABORADO.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78810 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-126087 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14542

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	29	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	29	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE ENTRENAMIENTO AL TRABAJADOR NUEVO
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.
SE REALIZA EL CAMBIO DE CINTA DE SEÑALIZACIÓN EN MAL ESTADO. SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14544

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	30	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500293
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14545

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	30	12	2025	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE TODOS LOS ACCIDENTES TIENEN UNA CAUSA
SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.
SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 16202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-126987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14546

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	31	12	2025	7:00 a. m.	1:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X			
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL				VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO				ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE				NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14547

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	31	12	2025	7:00 a. m.	1:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14548

INGEVIAS URBANAS CONSORCIO	**MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE ARAMA; EL CASTILLO; PUERTO LLERAS; PUERTO LOPEZ; RESTREPO, EL CALVARIO; CABUYARO; VISTA HERMOSA; PUERTO RICO; CUBARRAL; SAN JUANITO Y SAN CARLOS DE GUAROA EN EL DEPARTAMENTO DEL META**

BITACORA

ENERO DEL 2026

GOBERNACIÓN DEL **META**

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL **META**
NIT. 900220547-5

14549

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	01	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	202100500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA FESTIVO, NO LABORADO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14550

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	01	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA FESTIVO, NO LABORADO

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428748CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14551

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	02	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500288
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE LLUVIOSO
TORMENTA				
LLUVIOSO	X	X		
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES
MAESTRO			
OFICIAL	2	SI	
OPERARIO			
AYUDANTE	6	SI	
SISO	1	SI	
TOPÓGRAFO	1	SI	
CADENERO/NIVELADOR	1	SI	
INSPECTOR DE OBRA	1	SI	
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI	
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI	

EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ESTACION TOTAL	1	
NIVEL	1	

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14552

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	02	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE MANEJO DE EMERGENCIA

NO SE REALIZAN ACTIVIDADES EN CAMPO DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL DÍA.

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO EN OFICINA.

SE MANTIENE LA SEÑALIZACION EN LAS VIAS INTERVENIDAS.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-426746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 76610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14553

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	03	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023	PROYECTO N°	2021005600298
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				
TORMENTA				DIA SABADO, NO LABORADO
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14554

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	03	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA SABADO, NO LABORADO

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota. Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14555

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	04	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA DOMINGO, NO LABORADO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14556

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	04	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA DOMINGO, NO LABORADO

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14557

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	05	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500288
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	2	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE	6	SI		NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	SE EJECUTA EL EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB- BASE, CONSIDERANDO EL ESPESOR SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.		SI	SI
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	SE REALIZA EL TRANSPORTE PARA EL ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR DE SUB BASE PARA LA ESTRUCTURA DE LA VÍA.		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14558

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	05	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS
Se realiza transporte en volqueta, de material granular correspondiente a Sub base Clase B norma INVIAS desde la mina hasta la obra.
Se realiza el extendido, nivelación y compactación de la Sub-Base de manera uniforme sobre la superficie previamente preparada, confome a los parametros establecidos en el diseño, según la estructura del pavimento.
Se realizaron actividades de obra manteniendo la señalización durante y después de la jornada, dando cumplimiento al PMT

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78810 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125937 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14559

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	08	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	2	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE	6	SI		NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	SE EJECUTA EL EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB- BASE, CONSIDERANDO EL ESPESOR SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.		SI	SI
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	SE REALIZA EL TRANSPORTE PARA EL ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR DE SUB BASE PARA LA ESTRUCTURA DE LA VÍA.		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14560

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	06	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES
SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE MEDIDAS DE AUTOCUIDADO
Se continua con transporte en volqueta, de material granular corresponidente a Sub base Clase B norma INVIAS desde la mina hasta la obra.
Se realiza el extendido, nivelación y compactación de la Sub-Base de manera uniforme sobre la superficie previamente preparada, confome a los parametros establecidos en el diseño, según la estructura del pavimento.
Se realizaron actividades de obra manteniendo la señalización durante y después de la jornada, dando cumplimiento al PMT

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14561

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	07	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005600298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	2	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE	6	SI		NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR.	M3	SE EJECUTA EL EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB- BASE, CONSIDERANDO EL ESPESOR SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.		SI	SI
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	SE REALIZA EL TRANSPORTE PARA EL ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR DE SUB BASE PARA LA ESTRUCTURA DE LA VÍA.		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14562

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	07	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE LEVANTAMIENTO ADECUADO DE CARGA

Se continua con transporte en volqueta, de material granular corresponidente a Sub base Clase B norma INVIAS desde la mina hasta la obra.

Se realiza el extendido, nivelación y compactación de la Sub-Base de manera uniforme sobre la superficie previamente preparada, confome a los parametros establecidos en el diseño, según la estructura del pavimento

Se realizaron actividades de obra manteniendo la señalización durante y después de la jornada, dando cumplimiento al PMT

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14563.

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	08	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL	2	SI		NIVEL	1	
OPERARIO	1	SI				
AYUDANTE	6	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	SE REALIZA EL TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALGRANULAR DE BASE PARA LA ESTRUCTURA DE LA VÍA.		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14564

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	08	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE PELIGRO EN EXCAVACIONES

Se transporta el material granular correspondiente a Base Clase B, norma INVIAS, desde la mina hasta el sitio de obra, asegurando su correcto acopio. Posteriormente, se toman muestras en obra, para el respectivo ensayo de caracterización en laboratorio; asegurando la validación independiente de las propiedades del material.

Se mantiene la señalización en las vías intervenidas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
[redacted]e:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14565

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	09	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	2	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE	6	SI		NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE EJECUTA EL EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB- BASE, CONSIDERANDO EL ESPESOR SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.		SI	SI
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	SE HACE EN TRANSPORTE EN VOLQUETAS DEL MATERIAL GANULAR DE BASE CLASE B DEL PUNTO DE COMPRA (MINA) HASTA LA OBRA.		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14566

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	09	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

Se continua con transporte en volqueta, de material granular correspondiente a base Clase B norma INVIAS desde la mina hasta la obra.

Se continua el extendido, nivelación y compactación de la Sub-Base de manera uniforme sobre la superficie previamente preparada, confome a los parametros establecidos en el diseño, según la estructura del pavimento.

Se realizaron actividades de obra manteniendo la señalización durante y después de la jornada, dando cumplimiento al PMT

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14567

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	10	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021006500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA SABADO, NO LABORADO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14568

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	10	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA SABADO, NO LABORADO

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093689 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78810 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14569

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-022-V06
09/09/2024

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	28 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				DIA DOMINGO, NO LABORADO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14570

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	11	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA DOMINGO, NO LABORADO

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14571

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	12	01	2026	-	-

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005000298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				DIA FESTIVO, NO LABORADO
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO				
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO						
OFICIAL						
OPERARIO						
AYUDANTE						
SISO						
TOPÓGRAFO						
CADENERO/NIVELADOR						
INSPECTOR DE OBRA						
AUXILIAR DE TRANSITO						
ING. RESIDENTE DE OBRA						

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14572

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	12	01	2026	-	-

OBSERVACIONES GENERALES

DIA FESTIVO, NO LABORADO

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

14573

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	13	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005600298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	2	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE	6	SI		NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (CUMO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (BUNO)
SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE EJECUTA EL EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB- BASE, CONSIDERANDO EL ESPESOR SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14574

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	13	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se realiza el extendido, nivelación y compactación de la Sub-Base de manera uniforme sobre la superficie previamente preparada, confome a los parametros establecidos en el diseño, según la estructura del pavimento

Se realizaron actividades de obra manteniendo la señalización durante y después de la jornada, dando cumplimiento al PMT

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14575

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	14	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 15 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				MOTONIVELADORA	1	
OFICIAL	2	SI		VIBROCOMPACTADOR	1	
OPERARIO	1	SI		ESTACION TOTAL	1	
AYUDANTE	6	SI		NIVEL	1	
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	SE EJECUTA EL EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUB- BASE, CONSIDERANDO EL ESPESOR SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO.		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14596

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
SAN JUAN DE ARAMA	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	14	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Se realiza el **extendido, nivelación y compactación de la Sub-Base** de manera uniforme sobre la superficie previamente preparada, confome a los parametros establecidos en el diseño, según la estructura del pavimento.

Se realizaron actividades de obra manteniendo la señalización durante y después de la jornada, dando cumplimiento al PMT

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional. 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14577

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	15	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	774 DE 2022	PROYECTO N°	2021005500298
CONTRATO INTERVENTORIA N°	143 de 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS QUE COMPRENDE LA CALLE 22 ENTRE CRA 16B Y 17A, CALLE 21 ENTRE CRA 15 Y 17A, Y CALLE 19 ENTRE CRA 15 Y 17A EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA, META		
TIEMPO DE EJECUCION	26 MESES Y 16 DIAS.		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES:
NUBLADO				MAÑANA Y TARDE SOLEADA
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
MAESTRO				ESTACION TOTAL	1	
OFICIAL				NIVEL	1	
OPERARIO						
AYUDANTE	6	SI				
SISO	1	SI				
TOPÓGRAFO	1	SI				
CADENERO/NIVELADOR	1	SI				
INSPECTOR DE OBRA	1	SI				
AUXILIAR DE TRANSITO	1	SI				
ING. RESIDENTE DE OBRA	1	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
SARDINEL DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-10 80X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	CONTINUA LA INSTALACION DE SARDINELTIPO A-10. LAS PIEZAS DE PREFABRICADOS SE DISPONEN CONFORME A LA PLANIFICACIÓN DE OBRA, SIGUIENDO EL DISEÑO ESTABLECIDO Y LAS INDICACIONES TÉCNICAS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN		SI	SI
BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-100 60X50X20 CM. INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	SE REALIZA LA INSTALACION DE BORDILLO TIPO A-100. LAS PIEZAS DE PREFABRICADOS SE DISPONEN CONFORME A LA PLANIFICACIÓN DE OBRA, SIGUIENDO EL DISEÑO ESTABLECIDO Y LAS INDICACIONES TÉCNICAS PARA SU CORRECTA FIJACIÓN		SI	SI

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14578

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
SAN JUAN DE ARAMA	15	01	2026	7:00 a. m.	5:00 p. m.

OBSERVACIONES GENERALES

SE INICIA LA JORNADA CON CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SOBRE PLANTAS DE RECICLAJE

Se realiza la instalacion del bordillo A-100 y sardinel A-10, previamente preparando la superficie de apoyo, asegurando una base estable y nivelada para el adecuado asentamiento de las piezas. se verifica la alineación y cotas de nivel con equipo de topografia y nivel para mantener la uniformidad en la instalación.

Se realiza en campo la toma de densidades en la sub-base granular Clase B instalada por el metodo del cono de arena, conforme a la normativa INVIAS, verificando que se alcanzan los porcentajes óptimos de compactación exigidos para garantizar estabilidad de la estructura de pavimento.

Se mantiene la señalización en las vías intervenidas.

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
BRAYAN DAVID ROJAS SUAREZ	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional : 25202-428746CND	
CARLOS AUGUSTO BENAVIDES MENDIVELSO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 15202093569 BYC	
JHON ALEXANDER FALLA MUNAR	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202- 78610 CND	
DAVID LEONARDO RODRIGUEZ BERMUDEZ	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	N° Mat. Profesional: 25202-125987 CND	

Cuando se presentan visitas de profesionales especializados o otras entidades, se registran observaciones generales y se firma a continuación:

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

14579
