pCONTRATO DE OBRA N° LP-019-2023

"CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE."

GOBERNACION DE SUCRE

INFORME ACTA PARCIAL N°2

MANÁ CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 901.548.710-2
R/L MARIA JULIA FAYAD PADILLA
CONTRATISTA DE OBRA

OCTUBRE DE 2024

Contenido

CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES 3

INTRODUCCIÓN 3

LOCALIZACIÓN 4

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 7

CAPITULO II 11

ASPECTOS CONTRACTUALES 11

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA 11

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 13

CAPITULO III 31

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO 31

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 31

REGISTRO FOTOGRAFICOS 33



CAPITULO I. ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN

Los espacios públicos, tales como parques lineales, son espacios que integran la conservación del patrimonio cultural y natural con la recreación y el esparcimiento, cumpliendo funciones como la preservación del patrimonio tangible e intangible, promoción de la diversidad cultural a través de eventos y actividades, educación patrimonial y conciencia ciudadana, desarrollo comunitario, impulso al turismo cultural sostenible, conservación del medio ambiente y protección de la biodiversidad.

Estos espacios requieren un enfoque integral que combine la planificación urbana, la gestión cultural y la conservación del medio ambiente.

El presente documento corresponde al informe de obra de contrato N° LP-019-2023, donde se describe el avance de obra general y las actividades ejecutadas en el periodo de tiempo comprendido entre el 11 agosto de 2024 y en 31 de octubre de 2024.

Objeto:	"CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE"
Contratista:	MANÁ CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 901.548.710-2 R/L MARIA JULIA FAYAD PADILLA
Interventor:	CONSTRUCCIONES BETANIS S.A.S NIT 901465043-0 R/L JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ



Supervisor: JULIO CÉSAR VILLEGAS SADDER
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN
Secretaría de Infraestructura

En el informe se describen las actividades desarrolladas por el Contratista enmarcadas dentro del contrato de obra, con el fin de determinar el avance de las distintas actividades durante el periodo de ejecución de la obra, se especifican además las dificultades que se presentaron en obra durante este periodo y las soluciones planteadas en campo para su cabal desarrollo.

Por último, se anexa un registro fotográfico de cada una de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución del proyecto antes mencionado.

LOCALIZACIÓN

Corozal, un municipio ubicado en el departamento de Sucre, Colombia, presenta una serie de características geográficas, demográficas y económicas que lo convierten en un centro neurálgico para la región Caribe.

Desde el punto de vista geográfico, Corozal se encuentra situado en la subregión de Sabanas, a una distancia de 13 kilómetros de Sincelejo, capital del departamento, y a 8 kilómetros de los municipios de Los Palmitos y San Juan de Betulia. Esta proximidad facilita la interconexión y el flujo de personas, bienes y servicios.

En términos demográficos, Corozal cuenta con una población de 71,548 habitantes según el censo de 2022, lo que lo convierte en el municipio más

poblado de la subregión. Esta concentración poblacional genera una demanda significativa de servicios y oportunidades económicas.

Desde una perspectiva histórica, Corozal fue creado como uno de los primeros departamentos del Estado Soberano de Bolívar mediante la ley del 13 de noviembre de 1857. Posteriormente, fue transformado en provincia el 26 de diciembre de 1862, con la ciudad de Corozal como cabecera durante la época de los Estados Unidos de Colombia. Esta trayectoria histórica ha generado un patrimonio cultural y arquitectónico significativo en la región.



Ilustración 1: Localización del municipio de Corozal

El Municipio de Corozal tiene los siguientes límites:

Norte: con los municipios de Morroa y Los Palmitos.

Sur: con el municipio de El Roble.

Oriente: con los municipios de San Juan de Betulia y Sincé.

Occidente: con los municipios de Sampués y Sincelejo.

El municipio de Corozal se caracteriza por la presencia de una red hidrográfica temporal, compuesta por arroyos y cañadas que se activan durante eventos pluviales, generando flujos superficiales que causan erosión debido a la deforestación previa en las microcuencas. En temporada invernal, se forman represas y jagüeyes que almacenan agua superficial. Los arroyos temporales más relevantes son:

1. Arroyo Grande de Corozal: nace en el Cerro de San Antonio (Sincelejo) y desemboca en el Caño de Santiago Apóstol, ubicado en la parte norte de Corozal. Su recorrido inicial es oriental, luego suroriental, y atraviesa la parte sur del casco urbano, formando la microcuenca del Arroyo Grande.

2. Arroyo La Dorada: se origina en el corregimiento de Chapinero (Hacienda el Socorro), en la parte central del municipio, y fluye de sur a occidente. Es el arroyo más caudaloso, y su recorrido genera desbordamientos significativos en Chapinero, los cuales se aprovechan para almacenar agua en estanques y jagüeyes para consumo humano y animal.

3. Arroyo La Laguna: ubicado en el suroccidente de Corozal, nace en el corregimiento de Chapinero (Villa Ruby) y se extiende hacia el suroriente, siendo afluente del Arroyo Grande, que desemboca en el río San Jorge.

En cuanto al patrimonio y la cultura, Corozal se caracteriza por su arquitectura de estilo republicano, neoclásico y vanguardista de los años 60 y 70, así como por mantener construcciones clásicas de estilo típico hechas en bahareque y paja. Los primeros estilos están, en su mayoría, en torno de



la plaza central o parque principal y hacia la periferia se va observando el contraste que genera el mantenimiento de las construcciones más autóctonas; la Catedral San José de Corozal con su imponente arquitectura colonial y de estilo republicano con ropajes en finos mármoles y otros materiales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La alternativa de solución seleccionada consiste en un proyecto a través del cual se realizará la intervención de un espacio público en el Municipio de Corozal, que consiste en la construcción de los parques lineales que se encuentran ubicados al costado de la Iglesia San José en el centro del municipio, el área total a intervenir es 952,37m2 distribuidos de la siguiente manera: 548, 1 Om2 que corresponde al parque de la calle 28 y 404,27m2 que corresponde al parque de la calle 29 compuesto en su mayoría por zonas de recreación pasiva y zonas verdes.

De manera general el proyecto consta de los siguientes componentes:

- Construcción de zonas de recreación pasiva.
- Construcción de zonas verdes.

Dentro de las cuales se ejecutarán las siguientes actividades como son los preliminares, excavaciones, cimentación de estructuras, sobre nivel, acabados, al igual que la dotación de bancas en concreto, canecas para la basura, instalaciones hidrosanitarias e instalaciones eléctricas.

El proyecto cumple con las normatividades arquitectónicas relacionadas a los espacios de circulación y acceso, en especial aquellas que establecen mecanismos de integración y funcionalidad para las personas con

movilidad reducida: 4139, 4143, 4144 , 4201 , 4279, 4695, 4774, 4902, 4904, 5017, 5610, además a nivel estructural cumple con el reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR-1 O), los estudios de suelos Titulo H, los diseño lumínicos y eléctricos RETIE Y RETILAP, diseños Hidrosanitarios resolución 0330, RAS 2000 Y NTC 1500 .



Ilustración 2: Render Proyecto

El boulevard de la calle 28 cuenta con dos monumentos el primero corresponde a un busto de Aníbal Badel y el segundo es un monumento de una farola en acero forjado:



Ilustración 3: Monumento Anibal Badel



Ilustración 4: Monumento Farola

El boulevard de la calle 29 también cuenta con dos monumentos que corresponde al monumento Monseñor Carmelo Percy y a la virgen.



Ilustración 5: Monumento Monseñor Carmelo Percy



Ilustración 6: Monumento Virgen

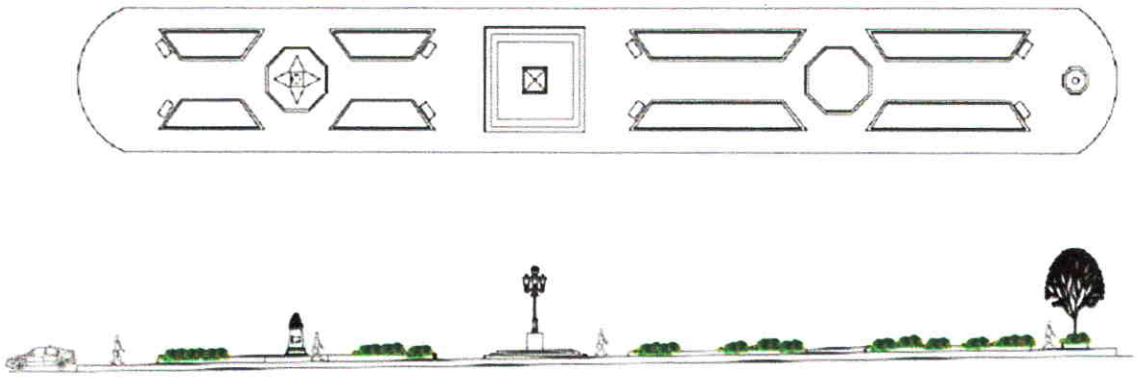


Ilustración 7: Vista en Planta General y Corte Boulevard Calle 28

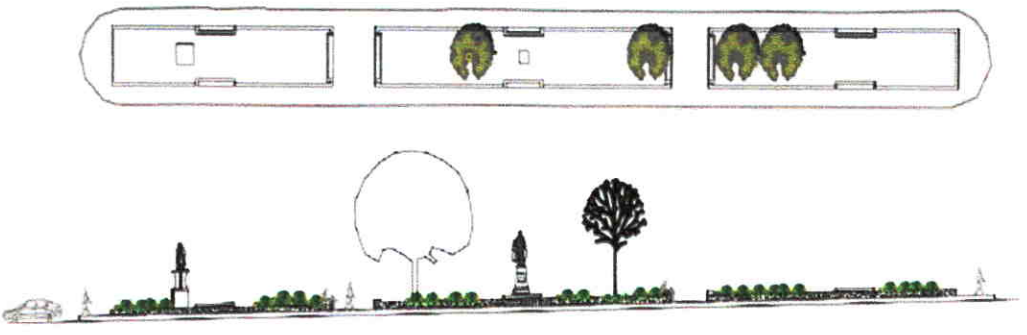


Ilustración 8: Vista en Planta General y Corte Boulevard Calle 29


CAPITULO II

ASPECTOS CONTRACTUALES

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° LP-019-2023

CONTRATANTE	**GOBERNACION DE SUCRE**
CONTRATO DE OBRA N°	**LP-019-2023**
CONTRATISTA	**MANÁ CONSTRUCCIONES S.A.S.** **NIT 901.548.710-2**



	R/L MARIA JULIA FAYAD PADILLA
INTERVENTORIA	**CONSTRUCCIONES BETANIS S.A.S** **NIT 901465043-0** **R/L JOSE JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ**

OBJETO

"CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

PLAZO INICIAL: SEIS (6) meses

PLAZO ADICIONAL: No Aplica

Fecha de Acta de Inicio	14/05/2024	**Fecha de Acta de Finalización**	**13/11/2024**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 907.491.333

VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO: $0

Valor del Anticipo	$ 00,00

ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

SEGÚN FECHA DE ACTA DE INICIO

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**		**ESTADO**
		DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento del contrato	$ 90.749.133.30	14/05/2024	14/03/2025	VIGENTE
Pagos salarios, prestacionales	$ 90.749.133.30	14/05/2024	12/11/2027	VIGENTE





Estabilidad de la obra	$ 90.749.133.30	12/11/2024	12/11/2029	VIGENTE
RCE	$260.000.000,00	14/05/2024	12/11/2024	VIGENTE

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

El Contrato de Obra N° LP-019-2023 que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE"; tiene un valor inicial de $ 907.491.333

1. BOULEVARD CALLE 28						
1,1	**PRELIMINARES**					
1.1.1	DEMOLICION MUROS JARDINERAS ALTURA APROX. 0,4m ANCHO APROX DE 0,20M NO INCLUYE RETIRO	ML	186,82	$ 19.443,85	$ 3.632.499,34
1.1.2	DEMOLICION BORDILLOS ALT. PROMEDIO 0,3M ANCHO DE 0,15M NO INCLUYE RETIRO	ML	141,7	$ 12.961,54	$ 1.836.650,00
1.1.3	DEMOLICION PLANTILLA DE PISO NO INCLUYE RETIRO	M2	371,13	$ 12.961,54	$ 4.810.415,77
1.1.4	DESMONTE DE BANCAS NO INCLUYE RETIRO	UND	8	$ 6.481,54	$ 51.852,31
1.1.5	DEMOLICION DE CIMENTACION DE JARDINERAS EXISTENTE NO INCLUYE RETIRO	ML	186,82	$ 40.972,31	$ 7.654.446,52
1.1.6	RETIRO DE TIERRA NEGRA DE JARDINERAS EXISTENTE	M3	42,41	$ 23.239,23	$ 985.678,08
1.1.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURA APOYO PEDESTAL MONUMENTO LAMPARA NO INCLUYE RETIRO ALT APROX= 0,40M	M2	37,73	$ 12.961,54	$ 489.024,59
1.1.8	DESMONTE DE POSTES Y LAMPARAS NO INCLUYE RETIRO	UND	1	$ 43.206,92	$ 43.206,92
1.1.9	RETIRO ESCOMBROS	M3	131,35	$ 23.239,23	$ 3.052.582,88
1.1.10	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	548,1	$ 4.307,69	$ 2.361.046,15
				SUBTOTAL	$ 24.917.402,56
1.2	**EXCAVACIÓN**				




1.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	173,32	$	32.281,54	$	5.594.878,07
1.2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA	M3	50,58	$	87.259,23	$	4.413.739,43
1.2.3	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	136,44	$	23.239,23	$	3.170.769,01
1.2.4	ENTIBADO EN MADERA H=1,05M PARA PROTECCIÓN DE PAVMENTO	ML	141,94	$	49.887,69	$	7.081.059,05
					SUBTOTAL	$	20.260.445,56
1.3	**CIMENTACIONES Y RELLENOS**						
1.3.1	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2 H=1,4m 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	60,90	$	1.047.298,46	$	63.778.720,75
1.3.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0,35MX0,35M 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	14,44	$	749.015,38	$	10.812.336,68
1.3.3	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	KG	4973,37	$	8.633,08	$	42.935.457,33
1.3.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 25X25	M2	337,21	$	7.612,31	$	2.566.967,59
1.3.5	RAMPA EN CONCRETO DE 3000PSI E=0,10M (No incluye refuerzo) incluye acabado en piedra china	M2	1,81	$	78.047,69	$	140.891,69
1.3.6	RELLENO MATERIAL DEL SITIO	M3	59,61	$	12.664,62	$	754.998,51
1.3.7	RELLENO TIERRA NEGRA JARDINERAS	M3	42,38	$	53.291,54	$	2.258.388,82
1.3.8	SOLADO DE 0,05M EN CONCRETO DE 2000PSI	M2	113,55	$	38.191,54	$	4.336.725,58
					SUBTOTAL	$	127.584.486,95
1.4	**SOBRE NIVEL LEVANTES Y PISOS**						
1.4.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E=0,02M	M2	164,98	$	29.383,85	$	4.847.629,40
1.4.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO CON DILITACIONES DE 0,05M EN PIEDRA CHINA N°2	M2	335,40	$	80.653,85	$	27.051.525,83
1.4.3	LEVANTE DE MURO DOBLE EN BLOQUE 0,15 RELLENO EN CONCRETO DE 2500PSI	ML	117,84	$	172.311,54	$	20.305.191,69
1.4.4	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.07 M NO INCLUYE REFUERZO	M2	335,40	$	50.726,15	$	17.013.694,03
					SUBTOTAL	$	69.218.040,96
1.5	**ACABADOS**						
1.5.1	PINTURA KORAZA PARA ALFAJIA H=0,05M ANCHO 0,35M (2 MANOS) GRIS BASALTO	ML	117,84	$	13.302,31	$	1.567.543,94
1.5.2	IMPERMEABILIZACION IMPRIMANTE A JARDINERAS	M2	35,352	$	64.093,08	$	2.265.818,46



1.5.3	GRANITO ABUJARDADO PARA JARDINERA	ML	117,84	$ 104.961,54	$ 12.368.667,69
1.5.4	PINTURA PARA MONUMENTOS EXISTENTES	UND	2	$ 67.817,69	$ 135.635,38
1.5.5	ALFAJIA PARA JARDINERA H=0,05M ANCHO 0,35M	ML	117,84	$ 46.929,23	$ 5.530.140,55
				SUBTOTAL	$ 21.867.806,02
1.6	**DOTACIONES**				
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS	UND	2	$ 514.929,23	$ 1.029.858,46
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABICADAS EN CONCRETO L=1,20M ANCHO=0,45M ALTO 0,45M SIN ESPALDAR	UND	7	$ 980.145,38	$ 6.861.017,69
				SUBTOTAL	$ 7.890.876,15
1.7	**PAISAJISMO**				
1.7.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE BAJA ALTURA	UND	30	$ 22.057,69	$ 661.730,77
1.7.2	EMPRADIZACION DE JARDINERAS	M2	141,26	$ 17.130,00	$ 2.419.783,80
				SUBTOTAL	$ 3.081.514,57
1,8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
1.8.1	ACOMETIDA PRINCIPAL 2X#8F+1X#18N AL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRENZADA HASTA GABINETE INTEMPERIE EN POSTE - TUBO IMC 1" - CAPACETE - CORAZA LIQUID TIGHT - CONECTORES Y CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1	$ 1.390.889,23	$ 1.390.889,23
1.8.2	TABLERO GENERAL TIPO INTEMPERIE CON CONTROL DE ILUMINACIÓN.	UND	1	$ 1.798.376,92	$ 1.798.376,92
1.8.3	ALIMENTADOR PARA ILUMINACIÓN PARCIAL EN 1X#12F+1X#12N +1X#12T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN	ML	150	$ 10.558,46	$ 1.583.769,23
1.8.4	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES Y CIRCUITOS - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	140	$ 163.019,23	$ 22.822.692,31
1.8.5	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.3X0.3X0.3 MTS	UND	15	$ 287.690,77	$ 4.315.361,54
1.8.6	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO FAROL ANTIQUE SYLVANIA 30 W O SIMILAR	UND	15	$ 222.933,85	$ 3.344.007,69
1.8.7	POSTE TIPO A.P. 4 METROS PARA LUMINARIAS ANTIQUE 30 W TIPO FAROL	UND	15	$ 1.292.424,62	$ 19.386.369,23



1.8.8	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. TIPO FAROL ANTIQUE 30 W SYLVANIA O SIMILAR	UND	16	$ 1.555.730,00	$ 24.891.680,00
1.8.9	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.6X0.6X0.6 MTS	UND	1	$ 341.964,62	$ 341.964,62
1.8.10	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CIRCUITOS EN PARQUE	ML	15	$ 54.340,00	$ 815.100,00
1.8.11	SUM. E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPPERWELD 5/8"X2.4 MTS	UND	5	$ 306.432,31	$ 1.532.161,54
1.8.12	SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G PARA SPT	UND	5	$ 51.267,69	$ 256.338,46
				SUBTOTAL	$ 82.478.710,77
1,9	**REDES DE DISTRIBUCIÓN - REDES DESAGUES**				
1.9.1	PUNTO ACOMETIDA DE CONEXIÓN A REDES DE ACUEDUCTO. INCLUYE TUBERÍAS Y MEDIDOR DE CAUDAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ESP, CAJA PARA EL MEDIDOR Y VÁLVULA DE CONTROL, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA ESP	UND	1	$ 859.193,85	$ 859.193,85
1.9.2	TUBERÍA PVC Ø 3/4" - RDE 11	ML	44	$ 22.776,15	$ 1.002.150,77
1.9.3	TUBERÍA PVC Ø 1/2" - RDE 9	ML	9	$ 19.493,08	$ 175.437,69
1.9.4	CODO 45° DE 3/4"	UND	1	$ 2.422,31	$ 2.422,31
1.9.5	TEE DE 3/4"	UND	2	$ 1.804,62	$ 3.609,23
1.9.6	UNION DE 3/4"	UND	7	$ 919,23	$ 6.434,62
1.9.7	CODO 90° DE 3/4"	UND	2	$ 1.351,54	$ 2.703,08
1.9.8	BUJE SOLDADO 3/4" X 1/2"	UND	3	$ 890,00	$ 2.670,00
1.9.9	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 1/2"	UND	3	$ 28.300,00	$ 84.900,00
1.9.10	PUNTO LLAVE DE MANGUERA	UND	3	$ 82.104,62	$ 246.313,85
1.9.11	CAJA PARA VÁLVULA DE CONTROL DE JARDINERA. MÍNIMO 0,4 X 0,4 M, H MÍNIMA 0,5 M. CON TAPA METÁLICA ASEGURABLE. INCLUYE VÁLVULA 1/2" PARA AISLAMIENTO, ACCESORIOS CONEXIONES	UND	3	$ 328.143,85	$ 984.431,54
1.9.12	TUBERÍA AGUAS LLUVIAS Ø 3"	ML	14	$ 35.933,08	$ 503.063,08
1.9.13	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,6 X 0,6 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	3	$ 394.636,92	$ 1.183.910,77
1.9.14	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,4 X 0,4 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M,	UND	3	$ 279.070,77	$ 837.212,31



	PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS				
1.9.15	RELLENO FILTRANTE. CAPA DE SOPORTE DE LAS PLANTAS: ARENA 30% - MATERIAL DE COMPOST O TIERRA ORGÁNICA 70%, SEGÚN REQUISITOS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS EN EL PAISAJISMO. ESPESOR DE 40 A 60 CM, SEGÚN REQUISITOS DE PAISAJISMO. ESTA CAPA PUEDE SER LA MISMA QUE SE EMPLEE EN EL RESTO DE LA JARDINERA, O USARSE SOLO EN EL ÁREA DE RELLENO FILTRANTE. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m.	M2	12	$ 27.454,62	$ 329.455,38
1.9.16	RELLENO FILTRANTE. ARENA LAVADA DE 0,5 A 1 MM, CON MENOS DE 3% DE LIMOS O ARCILLAS. ESPESOR 10 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	12	$ 10.960,77	$ 131.529,23
1.9.17	RELLENO FILTRANTE. GRAVA LIMPIA - DE 5 MM A 20 MM – ESPESOR 45 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	12	$ 65.199,23	$ 782.390,77
1.9.18	REJILLA DE 0,6mx0,6m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	3	$ 36.747,69	$ 110.243,08
1.9.19	REJILLA DE 0,4mx0,4m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	3	$ 36.747,69	$ 110.243,08
1.9.20	CAMA DE GRAVA PARA REGISTRO SANITARIO	M2	1,56	$ 14.955,38	$ 23.330,40
				SUBTOTAL	$ 7.381.645,02
SUBTOTAL BOULEVARD CALLE 28					**$ 364.680.928,56**
2. BOULEVARD CALLE 29					
2.1	**PRELIMINARES**				
2.1.1	DEMOLICION MUROS JARDINERAS ALTURA APROX. 0,4m ANCHO APROX DE 0,20M NO INCLUYE RETIRO	ML	132,43	$ 19.443,85	$ 2.574.948,55
2.1.2	DEMOLICION BORDILLOS ALT. PROMEDIO 0,3M ANCHO DE 0,15M NO INCLUYE RETIRO	ML	144,76	$ 12.961,54	$ 1.876.312,31
2.1.3	DEMOLICION PLANTILLA DE PISO NO INCLUYE RETIRO	M2	185,57	$ 12.961,54	$ 2.405.272,69
2.1.4	DESMONTE DE BANCAS NO INCLUYE RETIRO	UND	10	$ 6.481,54	$ 64.815,38
2.1.5	DEMOLICION DE CIMENTACION DE JARDINERAS EXISTENTE NO INCLUYE RETIRO	ML	132,43	$ 40.972,31	$ 5.425.962,71



2.1.6	RETIRO DE TIERRA NEGRA DE JARDINERAS EXISTENTE	M3	68,06	$	23.239,23	$	1.581.559,24
2.1.7	DESMONTE DE POSTES Y LAMPARAS NO INCLUYE RETIRO	UND	3	$	43.206,92	$	129.620,77
2.1.8	RETIRO ESCOMBROS	M3	78,85	$	23.239,23	$	1.832.444,59
2.1.9	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	404,27	$	4.307,69	$	1.741.470,77
					SUBTOTAL	$	17.632.407,00
2.2	**EXCAVACIÓN**						
2.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	183,21	$	32.281,54	$	5.914.321,64
2.2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA	M3	31,65	$	87.259,23	$	2.761.793,92
2.2.3	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	146,72	$	23.239,23	$	3.409.715,25
2.2.4	ENTIBADO EN MADERA H=1,05M PARA PROTECCIÓN DE PAVMENTO	ML	145,1	$	49.887,69	$	7.238.704,15
					SUBTOTAL	$	19.324.534,97
2.3	**CIMENTACIONES Y RELLENOS**						
2.3.1	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2 H=1,25m 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	57,93	$	1.047.298,46	$	60.674.152,70
2.3.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0,35MX0,35M 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	16,98	$	749.015,38	$	12.718.992,80
2.3.3	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	KG	5227,25	$	8.633,08	$	45.127.268,55
2.3.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 25X25	M2	247,92	$	7.612,31	$	1.887.243,32
2.3.5	RAMPA EN CONCRETO DE 3000PSI E=0,10M (No incluye refuerzo) incluye acabado en piedra china	M2	12,72	$	78.047,69	$	992.766,65
2.3.6	RELLENO MATERIAL DEL SITIO	M3	60,942	$	12.664,62	$	771.806,99
2.3.7	RELLENO TIERRA NEGRA JARDINERAS	M3	34,719	$	53.291,54	$	1.850.228,92
2.3.8	SOLADO DE 0,05M EN CONCRETO DE 2000PSI	M2	116,08	$	38.191,54	$	4.433.273,78
					SUBTOTAL	$	128.455.733,72
2.4	**SOBRE NIVEL LEVANTES Y PISOS**						
2.4.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E=0,02M	M2	83,17	$	29.383,85	$	2.443.913,25
2.4.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO CON DILITACIONES DE 0,05M EN PIEDRA CHINA N°2	M2	198,28	$	80.653,85	$	15.992.286,58
2.4.3	LEVANTE DE MURO DOBLE EN BLOQUE 0,15 RELLENO EN CONCRETO DE 2500PSI	ML	138,62	$	172.311,54	$	23.885.825,46



2.4.4	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.07 M NO INCLUYE REFUERZO	M2	198,28	$	50.726,15	$	10.058.133,96
					SUBTOTAL	$	52.380.159,25
2.5	**ACABADOS**						
2.5.1	PINTURA KORAZA PARA ALFAJIA H=0,05M ANCHO 0,35M (2 MANOS) GRIS BASALTO	ML	138,62	$	11.569,23	$	1.603.726,77
2.5.2	IMPERMEABILIZACION IMPRIMANTE A JARDINERAS	M2	41,586	$	64.093,08	$	2.665.374,70
2.5.3	GRANITO ABUJARDADO PARA JARDINERA	ML	138,62	$	104.961,54	$	14.549.768,46
2.5.4	PINTURA PARA MONUMENTOS EXISTENTES	UND	2	$	67.817,69	$	135.635,38
2.5.5	ALFAJIA PARA JARDINERA H=0,05M ANCHO 0,35M	ML	138,62	$	46.929,23	$	6.505.329,97
					SUBTOTAL	$	25.459.835,28
2.6	**DOTACIONES**						
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS	UND	2	$	514.929,23	$	1.029.858,46
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABICADAS EN CONCRETO L=1,20M ANCHO=0,45M ALTO 0,45M SIN ESPALDAR	UND	10	$	980.145,38	$	9.801.453,85
					SUBTOTAL	$	10.831.312,31
2.7	**PAISAJISMO**						
2.7.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE BAJA ALTURA	UND	30	$	22.057,69	$	661.730,77
2.7.2	EMPRADIZACION DE JARDINERAS	M2	115,73	$	17.130,00	$	1.982.454,90
					SUBTOTAL	$	2.644.185,67
2.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**						
2.8.1	ACOMETIDA PRINCIPAL 2X#8F+1X#18N AL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRENZADA HASTA GABINETE INTEMPERIE EN POSTE - TUBO IMC 1" - CAPACETE - CORAZA LIQUID TIGHT - CONECTORES Y CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	1	$	1.390.889,23	$	1.390.889,23
2.8.2	TABLERO GENERAL TIPO INTEMPERIE CON CONTROL DE ILUMINACIÓN.	UND	1	$	1.798.376,92	$	1.798.376,92
2.8.3	ALIMENTADOR PARA ILUMINACIÓN PARCIAL EN 1X#12F+1X#12N +1X#12T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN	ML	120	$	10.558,46	$	1.267.015,38



2.8.4	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES Y CIRCUITOS - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	70	$	163.019,23	$	11.411.346,15
2.8.5	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.3X0.3X0.3 MTS	UND	6	$	287.690,77	$	1.726.144,62
2.8.6	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO EXTERIOR RALED I 59 W ROY ALPHA O SIMILAR	UND	6	$	222.933,85	$	1.337.603,08
2.8.7	POSTE TIPO A.P. GALVANIZADO 10 METROS DE 3" PARA LUMINARIAS TIPO EXTERIOR - CERTIFICADO RETILAP	UND	6	$	2.018.466,15	$	12.110.796,92
2.8.8	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. STREET LIGHT 35W SYLVANIA O SIMILAR	UND	6	$	841.037,69	$	5.046.226,15
2.8.9	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. STREET LIGHT 43W SYLVANIA O SIMILAR	UND	6	$	910.343,85	$	5.462.063,08
2.8.10	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.6X0.6X0.6 MTS	UND	1	$	341.964,62	$	341.964,62
2.8.11	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CIRCUITOS EN PARQUE	M	7	$	54.340,00	$	380.380,00
2.8.12	SUM. E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPPERWELD 5/8"X2.4 MTS	UND	5	$	306.432,31	$	1.532.161,54
2.8.13	SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G PARA SPT	UND	5	$	51.267,69	$	256.338,46
					SUBTOTAL	$	44.061.306,15
2.9	**REDES DE DISTRIBUCIÓN - REDES DESAGUES**						
2.9.1	PUNTO ACOMETIDA DE CONEXIÓN A REDES DE ACUEDUCTO. INCLUYE TUBERÍAS Y MEDIDOR DE CAUDAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ESP, CAJA PARA EL MEDIDOR Y VÁLVULA DE CONTROL, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA ESP	UND	1	$	859.193,85	$	859.193,85
2.9.2	TUBERÍA PVC Ø 3/4" - RDE 11	ML	41	$	22.776,15	$	933.822,31
2.9.3	TUBERÍA PVC Ø 1/2" - RDE 9	ML	4	$	19.493,08	$	77.972,31
2.9.4	TEE REDUCIDA 3/4" X 1/2"	UND	1	$	2.889,23	$	2.889,23
2.9.5	TEE DE 3/4"	UND	1	$	1.804,62	$	1.804,62
2.9.6	UNION DE 3/4"	UND	6	$	919,23	$	5.515,38
2.9.7	CODO 90° DE 3/4"	UND	2	$	1.351,54	$	2.703,08
2.9.8	BUJE SOLDADO 3/4" X 1/2"	UND	1	$	890,00	$	890,00
2.9.9	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 1/2"	UND	3	$	28.300,00	$	84.900,00
2.9.10	PUNTO LLAVE DE MANGUERA	UND	4	$	82.104,62	$	328.418,46



2.9.11	CAJA PARA VÁLVULA DE CONTROL DE JARDINERA. MÍNIMO 0,4 X 0,4 M, H MÍNIMA 0,5 M. CON TAPA METÁLICA ASEGURABLE. INCLUYE VÁLVULA 1/2" PARA AISLAMIENTO, ACCESORIOS CONEXIONES	UND	3	$	328.143,85	$	984.431,54
2.9.12	TUBERÍA AGUAS LLUVIAS Ø 3"	ML	12	$	35.933,08	$	431.196,92
2.9.13	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,6 X 0,6 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	6	$	394.636,92	$	2.367.821,54
2.9.14	RELLENO FILTRANTE. CAPA DE SOPORTE DE LAS PLANTAS: ARENA 30% - MATERIAL DE COMPOST O TIERRA ORGÁNICA 70%, SEGÚN REQUISITOS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS EN EL PAISAJISMO. ESPESOR DE 40 A 60 CM, SEGÚN REQUISITOS DE PAISAJISMO. ESTA CAPA PUEDE SER LA MISMA QUE SE EMPLEE EN EL RESTO DE LA JARDINERA, O USARSE SOLO EN EL ÁREA DE RELLENO FILTRANTE. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m.	M2	16	$	27.454,62	$	439.273,85
2.9.15	RELLENO FILTRANTE. ARENA LAVADA DE 0,5 A 1 MM, CON MENOS DE 3% DE LIMOS O ARCILLAS. ESPESOR 10 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	16	$	10.960,77	$	175.372,31
2.9.16	RELLENO FILTRANTE. GRAVA LIMPIA - DE 5 MM A 20 MM – ESPESOR 45 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	16	$	65.199,23	$	1.043.187,69
2.9.17	REJILLA DE 0,6mx0,6m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	6	$	36.747,69	$	220.486,15
2.9.18	CAMA DE GRAVA PARA REGISTRO SANITARIO	M2	2,16	$	14.955,38	$	32.303,63
					SUBTOTAL	$	7.992.182,86
SUBTOTAL BOULEVARD CALLE 29						**$**	**308.781.657,21**

COSTO DIRECTO		**$**	**673.462.585,78**
ADMINISTRACIÓN	25%	$	168.365.646,00
UTILIDAD	1%	$	6.734.626,00
IMPREVISTOS	4%	$	26.938.503,43
SUBTOTAL OBRA		**$**	**875.501.361,21**

PGIO	-	$	25.989.972,00

CERTIFICADO RETIE	-	$	3.000.000,00
CERTIFICADO RETILAP	-	$	3.000.000,00

VALOR TOTAL	**$**	**907.491.333,00**

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas de manera general a la fecha de la presente acta parcial N°2

1. BOULEVARD CALLE 28						
1,1	**PRELIMINARES**					
1.1.1	DEMOLICION MUROS JARDINERAS ALTURA APROX. 0,4m ANCHO APROX DE 0,20M NO INCLUYE RETIRO	ML	186,82	$	3.632.499,34	100,00%
1.1.2	DEMOLICION BORDILLOS ALT. PROMEDIO 0,3M ANCHO DE 0,15M NO INCLUYE RETIRO	ML	141,70	$	1.836.650,00	100,00%
1.1.3	DEMOLICION PLANTILLA DE PISO NO INCLUYE RETIRO	M2	371,13	$	4.810.415,77	100,00%
1.1.4	DESMONTE DE BANCAS NO INCLUYE RETIRO	UND	8,00	$	51.852,31	100,00%
1.1.5	DEMOLICION DE CIMENTACION DE JARDINERAS EXISTENTE NO INCLUYE RETIRO	ML	186,82	$	7.654.446,52	100,00%
1.1.6	RETIRO DE TIERRA NEGRA DE JARDINERAS EXISTENTE	M3	42,41	$	985.678,03	100,00%
1.1.7	DEMOLICION DE ESTRUCTURA APOYO PEDESTAL MONUMENTO LAMPARA NO INCLUYE RETIRO ALT APROX= 0,40M	M2	0,00	$	-	0,00%
1.1.8	DESMONTE DE POSTES Y LAMPARAS NO INCLUYE RETIRO	UND	0,00	$	-	0,00%
1.1.9	RETIRO ESCOMBROS	M3	120,15	$	2.792.193,58	91,47%
1.1.10	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	246,65	$	1.062.492,31	45,00%
	SUBTOTAL		$		22.826.227,85	
1.2	**EXCAVACIÓN**					
1.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	134,13	$	4.329.922,75	77,39%
1.2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA	M3	0,00	$	-	0,00%
1.2.3	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	105,06	$	2.441.513,58	77,00%
1.2.4	ENTIBADO EN MADERA H=1,05M PARA PROTECCIÓN DE PAVMENTO	ML	141,94	$	7.081.059,05	100,00%



			SUBTOTAL	$	13.852.495,38	
1.3	**CIMENTACIONES Y RELLENOS**					
1.3.1	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2 H=1,4m 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	60,90	$	63.780.476,31	100,00%
1.3.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0,35MX0,35M 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	0,00	$	-	0,00%
1.3.3	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	KG	3511,68	$	30.316.597,91	70,61%
1.3.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 25X25	M2	0,00	$	-	0,00%
1.3.5	RAMPA EN CONCRETO DE 3000PSI E=0,10M (No incluye refuerzo) incluye acabado en piedra china	M2	0,00	$	-	0,00%
1.3.6	RELLENO MATERIAL DEL SITIO	M3	59,61	$	754.998,51	100,00%
1.3.7	RELLENO TIERRA NEGRA JARDINERAS	M3	0,00	$	-	0,00%
1.3.8	SOLADO DE 0,05M EN CONCRETO DE 2000PSI	M2	113,55	$	4.336.649,19	100,00%
			SUBTOTAL	$	99.188.721,92	
1.4	**SOBRE NIVEL LEVANTES Y PISOS**					
1.4.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E=0,02M	M2	0,00	$	-	0,00%
1.4.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO CON DILITACIONES DE 0,05M EN PIEDRA CHINA N°2	M2	0,00	$	-	0,00%
1.4.3	LEVANTE DE MURO DOBLE EN BLOQUE 0,15 RELLENO EN CONCRETO DE 2500PSI	ML	0,00	$	-	0,00%
1.4.4	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.07 M NO INCLUYE REFUERZO	M2	0,00	$	-	0,00%
			SUBTOTAL	$	-	
1.5	**ACABADOS**					
1.5.1	PINTURA KORAZA PARA ALFAJIA H=0,05M ANCHO 0,35M (2 MANOS) GRIS BASALTO	ML	0,00	$	-	0,00%
1.5.2	IMPERMEABILIZACION IMPRIMANTE A JARDINERAS	M2	0,00	$	-	0,00%
1.5.3	GRANITO ABUJARDADO PARA JARDINERA	ML	0,00	$	-	0,00%
1.5.4	PINTURA PARA MONUMENTOS EXISTENTES	UND	0,00	$	-	0,00%
1.5.5	ALFAJIA PARA JARDINERA H=0,05M ANCHO 0,35M	ML	0,00	$	-	0,00%
			SUBTOTAL	$	-	



1.6	**DOTACIONES**				
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS	UND	0,00	$ -	0,00%
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABICADAS EN CONCRETO L=1,20M ANCHO=0,45M ALTO 0,45M SIN ESPALDAR	UND	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL		$ -	
1.7	**PAISAJISMO**				
1.7.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE BAJA ALTURA	UND	0,00	$ -	0,00%
1.7.2	EMPRADIZACION DE JARDINERAS	M2	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL		$ -	
1,8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
1.8.1	ACOMETIDA PRINCIPAL 2X#8F+1X#18N AL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRENZADA HASTA GABINETE INTEMPERIE EN POSTE - TUBO IMC 1" - CAPACETE - CORAZA LIQUID TIGHT - CONECTORES Y CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.2	TABLERO GENERAL TIPO INTEMPERIE CON CONTROL DE ILUMINACIÓN.	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.3	ALIMENTADOR PARA ILUMINACIÓN PARCIAL EN 1X#12F+1X#12N +1X#12T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN	ML	0,00	$ -	0,00%
1.8.4	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES Y CIRCUITOS - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	0,00	$ -	0,00%
1.8.5	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.3X0.3X0.3 MTS	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.6	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO FAROL ANTIQUE SYLVANIA 30 W O SIMILAR	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.7	POSTE TIPO A.P. 4 METROS PARA LUMINARIAS ANTIQUE 30 W TIPO FAROL	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.8	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. TIPO FAROL ANTIQUE 30 W SYLVANIA O SIMILAR	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.9	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.6X0.6X0.6 MTS	UND	0,00	$ -	0,00%



1.8.10	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CIRCUITOS EN PARQUE	ML	0,00	$ -	0,00%
1.8.11	SUM. E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPPERWELD 5/8"X2.4 MTS	UND	0,00	$ -	0,00%
1.8.12	SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G PARA SPT	UND	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL	$	-	
1,9	**REDES DE DISTRIBUCIÓN - REDES DESAGUES**				
1.9.1	PUNTO ACOMETIDA DE CONEXIÓN A REDES DE ACUEDUCTO. INCLUYE TUBERÍAS Y MEDIDOR DE CAUDAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ESP, CAJA PARA EL MEDIDOR Y VÁLVULA DE CONTROL, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA ESP	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.2	TUBERÍA PVC Ø 3/4" - RDE 11	ML	0,00	$ -	0,00%
1.9.3	TUBERÍA PVC Ø 1/2" - RDE 9	ML	0,00	$ -	0,00%
1.9.4	CODO 45° DE 3/4"	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.5	TEE DE 3/4"	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.6	UNION DE 3/4"	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.7	CODO 90° DE 3/4"	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.8	BUJE SOLDADO 3/4" X 1/2"	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.9	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 1/2"	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.10	PUNTO LLAVE DE MANGUERA	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.11	CAJA PARA VÁLVULA DE CONTROL DE JARDINERA. MÍNIMO 0,4 X 0,4 M, H MÍNIMA 0,5 M. CON TAPA METÁLICA ASEGURABLE. INCLUYE VÁLVULA 1/2" PARA AISLAMIENTO, ACCESORIOS CONEXIONES	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.12	TUBERÍA AGUAS LLUVIAS Ø 3"	ML	0,00	$ -	0,00%
1.9.13	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,6 X 0,6 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.14	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,4 X 0,4 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	0,00	$ -	0,00%

1.9.15	RELLENO FILTRANTE. CAPA DE SOPORTE DE LAS PLANTAS: ARENA 30% - MATERIAL DE COMPOST O TIERRA ORGÁNICA 70%, SEGÚN REQUISITOS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS EN EL PAISAJISMO. ESPESOR DE 40 A 60 CM, SEGÚN REQUISITOS DE PAISAJISMO. ESTA CAPA PUEDE SER LA MISMA QUE SE EMPLEE EN EL RESTO DE LA JARDINERA, O USARSE SOLO EN EL ÁREA DE RELLENO FILTRANTE. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m.	M2	0,00	$ -	0,00%
1.9.16	RELLENO FILTRANTE. ARENA LAVADA DE 0,5 A 1 MM, CON MENOS DE 3% DE LIMOS O ARCILLAS. ESPESOR 10 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	0,00	$ -	0,00%
1.9.17	RELLENO FILTRANTE. GRAVA LIMPIA - DE 5 MM A 20 MM – ESPESOR 45 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	0,00	$ -	0,00%
1.9.18	REJILLA DE 0,6mx0,6m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.19	REJILLA DE 0,4mx0,4m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	0,00	$ -	0,00%
1.9.20	CAMA DE GRAVA PARA REGISTRO SANITARIO	M2	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL	$	-	
SUBTOTAL BOULEVARD CALLE 28					
2. BOULEVARD CALLE 29					
2.1	**PRELIMINARES**				
2.1.1	DEMOLICION MUROS JARDINERAS ALTURA APROX. 0,4m ANCHO APROX DE 0,20M NO INCLUYE RETIRO	ML	132,43	$ 2.574.948,55	100,00%
2.1.2	DEMOLICION BORDILLOS ALT. PROMEDIO 0,3M ANCHO DE 0,15M NO INCLUYE RETIRO	ML	144,76	$ 1.876.312,31	100,00%
2.1.3	DEMOLICION PLANTILLA DE PISO NO INCLUYE RETIRO	M2	185,57	$ 2.405.272,69	100,00%
2.1.4	DESMONTE DE BANCAS NO INCLUYE RETIRO	UND	10,00	$ 64.815,38	100,00%
2.1.5	DEMOLICION DE CIMENTACION DE JARDINERAS EXISTENTE NO INCLUYE RETIRO	ML	132,43	$ 5.425.962,71	100,00%
2.1.6	RETIRO DE TIERRA NEGRA DE JARDINERAS EXISTENTE	M3	68,06	$ 1.581.559,79	100,00%
2.1.7	DESMONTE DE POSTES Y LAMPARAS NO INCLUYE RETIRO	UND	3,00	$ 129.620,77	100,00%



2.1.8	RETIRO ESCOMBROS	M3	78,85	$	1.832.413,35	100,00%
2.1.9	TRAZADO Y REPLANTEO	M2	404,27	$	1.741.470,77	100,00%
	SUBTOTAL		$		17.632.376,32	
2.2	**EXCAVACIÓN**					
2.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN	M3	183,21	$	5.914.300,66	100,00%
2.2.2	RELLENO MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO CON RANA	M3	29,74	$	2.595.089,52	93,96%
2.2.3	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	146,72	$	3.409.659,94	100,00%
2.2.4	ENTIBADO EN MADERA H=1,05M PARA PROTECCIÓN DE PAVMENTO	ML	145,10	$	7.238.704,15	100,00%
	SUBTOTAL		$		19.157.754,28	
2.3	**CIMENTACIONES Y RELLENOS**					
2.3.1	CONCRETO PARA MURO DE CONTENCIÓN TIPO 2 H=1,25m 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	57,93	$	60.674.152,70	100,00%
2.3.2	CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACIÓN 0,35MX0,35M 4000 PSI (No incluye refuerzo)	M3	16,98	$	12.718.992,80	100,00%
2.3.3	ACERO REFUERZO 60.000 PSI.	KG	5227,25	$	45.127.252,91	100,00%
2.3.4	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 25X25	M2	235,20	$	1.790.414,77	94,87%
2.3.5	RAMPA EN CONCRETO DE 3000PSI E=0,10M (No incluye refuerzo) incluye acabado en piedra china	M2	0,00	$	-	0,00%
2.3.6	RELLENO MATERIAL DEL SITIO	M3	60,94	$	771.806,99	100,00%
2.3.7	RELLENO TIERRA NEGRA JARDINERAS	M3	0,00	$	-	0,00%
2.3.8	SOLADO DE 0,05M EN CONCRETO DE 2000PSI	M2	116,08	$	4.433.273,78	100,00%
	SUBTOTAL		$		125.515.893,96	
2.4	**SOBRE NIVEL LEVANTES Y PISOS**					
2.4.1	PAÑETE 1:4 IMPERMEABILIZADO E=0,02M	M2	83,17	$	2.443.854,48	100,00%
2.4.2	PISO EN TABLON VITRIFICADO CON DILITACIONES DE 0,05M EN PIEDRA CHINA N°2	M2	0,00	$	-	0,00%
2.4.3	LEVANTE DE MURO DOBLE EN BLOQUE 0,15 RELLENO EN CONCRETO DE 2500PSI	ML	138,62	$	23.885.825,46	100,00%
2.4.4	PLANTILLA CONCRETO 3.000 PSI E=0.07 M NO INCLUYE REFUERZO	M2	198,28	$	10.057.981,78	100,00%
	SUBTOTAL		$		36.387.661,73	



2.5	**ACABADOS**				
2.5.1	PINTURA KORAZA PARA ALFAJIA H=0,05M ANCHO 0,35M (2 MANOS) GRIS BASALTO	ML	0,00	$ -	0,00%
2.5.2	IMPERMEABILIZACION IMPRIMANTE A JARDINERAS	M2	0,00	$ -	0,00%
2.5.3	GRANITO ABUJARDADO PARA JARDINERA	ML	0,00	$ -	0,00%
2.5.4	PINTURA PARA MONUMENTOS EXISTENTES	UND	0,00	$ -	0,00%
2.5.5	ALFAJIA PARA JARDINERA H=0,05M ANCHO 0,35M	ML	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL			$ -	
2.6	**DOTACIONES**				
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICAS	UND	0,00	$ -	0,00%
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION BANCAS PREFABICADAS EN CONCRETO L=1,20M ANCHO=0,45M ALTO 0,45M SIN ESPALDAR	UND	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL			$ -	
2.7	**PAISAJISMO**				
2.7.1	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS DE BAJA ALTURA	UND	0,00	$ -	0,00%
2.7.2	EMPRADIZACION DE JARDINERAS	M2	0,00	$ -	0,00%
	SUBTOTAL			$ -	
2.8	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				
2.8.1	ACOMETIDA PRINCIPAL 2X#8F+1X#18N AL DESDE PUNTO DE CONEXIÓN EN RED TRENZADA HASTA GABINETE INTEMPERIE EN POSTE - TUBO IMC 1" - CAPACETE - CORAZA LIQUID TIGHT - CONECTORES Y CINTA DE ACERO INOXIDABLE	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.2	TABLERO GENERAL TIPO INTEMPERIE CON CONTROL DE ILUMINACIÓN.	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.3	ALIMENTADOR PARA ILUMINACIÓN PARCIAL EN 1X#12F+1X#12N +1X#12T Cu EN AISLAMIENTO THHN/THWN	ML	0,00	$ -	0,00%
2.8.4	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CANALIZACIÓN PRINCIPAL ALIMENTADORES Y CIRCUITOS - CRUCE DE VÍA CON EQUIPO TUNELADOR O TOPO	ML	0,00	$ -	0,00%



2.8.5	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.3X0.3X0.3 MTS	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.6	SALIDA PARA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO EXTERIOR RALED I 59 W ROY ALPHA O SIMILAR	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.7	POSTE TIPO A.P. GALVANIZADO 10 METROS DE 3" PARA LUMINARIAS TIPO EXTERIOR - CERTIFICADO RETILAP	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.8	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. STREET LIGHT 35W SYLVANIA O SIMILAR	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.9	LUMINARIA TIPO EXTERIOR. STREET LIGHT 43W SYLVANIA O SIMILAR	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.10	REGISTRO DE INSPECCIÓN 0.6X0.6X0.6 MTS	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.11	TUBO PVC TIPO PESADO 1" - CIRCUITOS EN PARQUE	M	0,00	$ -	0,00%
2.8.12	SUM. E INSTALACIÓN DE VARILLA COOPPERWELD 5/8"X2.4 MTS	UND	0,00	$ -	0,00%
2.8.13	SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 G PARA SPT	UND	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL		$ -	
2.9	**REDES DE DISTRIBUCIÓN - REDES DESAGUES**				
2.9.1	PUNTO ACOMETIDA DE CONEXIÓN A REDES DE ACUEDUCTO. INCLUYE TUBERÍAS Y MEDIDOR DE CAUDAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES DE LA ESP, CAJA PARA EL MEDIDOR Y VÁLVULA DE CONTROL, SEGÚN LAS INDICACIONES DE LA ESP	UND	0,00	$ -	0,00%
2.9.2	TUBERÍA PVC Ø 3/4" - RDE 11	ML	41,00	$ 933.822,31	100,00%
2.9.3	TUBERÍA PVC Ø 1/2" - RDE 9	ML	4,00	$ 77.972,31	100,00%
2.9.4	TEE REDUCIDA 3/4" X 1/2"	UND	1,00	$ 2.889,23	100,00%
2.9.5	TEE DE 3/4"	UND	1,00	$ 1.804,62	100,00%
2.9.6	UNION DE 3/4"	UND	6,00	$ 5.515,38	100,00%
2.9.7	CODO 90° DE 3/4"	UND	2,00	$ 2.703,08	100,00%
2.9.8	BUJE SOLDADO 3/4" X 1/2"	UND	1,00	$ 890,00	100,00%
2.9.9	VÁLVULA DE COMPUERTA Ø 1/2"	UND	3,00	$ 84.900,00	100,00%
2.9.10	PUNTO LLAVE DE MANGUERA	UND	3,00	$ 246.313,85	75,00%
2.9.11	CAJA PARA VÁLVULA DE CONTROL DE JARDINERA. MÍNIMO 0,4 X 0,4 M, H MÍNIMA 0,5 M. CON TAPA METÁLICA ASEGURABLE. INCLUYE VÁLVULA 1/2" PARA AISLAMIENTO, ACCESORIOS CONEXIONES	UND	0,00	$ -	0,00%



2.9.12	TUBERÍA AGUAS LLUVIAS Ø 3"	ML	12,00	$ 431.196,92	100,00%
2.9.13	REGISTROS SANITARIOS Y DE AGUAS LLUVIAS, DE 0,6 X 0,6 M, EN MAMPOSTERÍA, PROFUNDIDAD < 1 M, PARA RECIBO DE DRENAJE SUPERFICIAL DE JARDINERAS	UND	0,00	$ -	0,00%
2.9.14	RELLENO FILTRANTE. CAPA DE SOPORTE DE LAS PLANTAS: ARENA 30% - MATERIAL DE COMPOST O TIERRA ORGÁNICA 70%, SEGÚN REQUISITOS DE LAS ESPECIES SELECCIONADAS EN EL PAISAJISMO. ESPESOR DE 40 A 60 CM, SEGÚN REQUISITOS DE PAISAJISMO. ESTA CAPA PUEDE SER LA MISMA QUE SE EMPLEE EN EL RESTO DE LA JARDINERA, O USARSE SOLO EN EL ÁREA DE RELLENO FILTRANTE. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m.	M2	0,00	$ -	0,00%
2.9.15	RELLENO FILTRANTE. ARENA LAVADA DE 0,5 A 1 MM, CON MENOS DE 3% DE LIMOS O ARCILLAS. ESPESOR 10 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	0,00	$ -	0,00%
2.9.16	RELLENO FILTRANTE. GRAVA LIMPIA - DE 5 MM A 20 MM – ESPESOR 45 CM. ÁREA SUPERFICIAL 2mx2m	M2	0,00	$ -	0,00%
2.9.17	REJILLA DE 0,6mx0,6m PARA REGISTRO SANITARIO	UND	0,00	$ -	0,00%
2.9.18	CAMA DE GRAVA PARA REGISTRO SANITARIO	M2	0,00	$ -	0,00%
		SUBTOTAL		$ 1.788.007,69	
SUBTOTAL BOULEVARD CALLE 29					

COSTO DIRECTO		**$ 336.349.139,13**
ADMINISTRACIÓN		$ 84.087.285,00
UTILIDAD		$ 3.363.491,00
IMPREVISTOS		$ 13.453.965,57
SUBTOTAL OBRA		**$ 437.253.880,70**

PGIO		$ 25.989.972,00
CERTIFICADO RETIE		
CERTIFICADO RETILAP		

VALOR TOTAL		**$ 463.243.853,00**

CAPITULO III

AVANCE GENERAL DEL PROYECTO

Corresponde a las actividades de obra ejecutadas en el periodo de tiempo comprendido entre el 11 agosto de 2024 y el 31 de octubre de 2024 con base en el valor del contrato de obra **($907.491.333,00**) y el valor de las actividades acumuladas hasta la fecha por valor de **$ 225.044.426,00** para un porcentaje de avance de **51,05%**

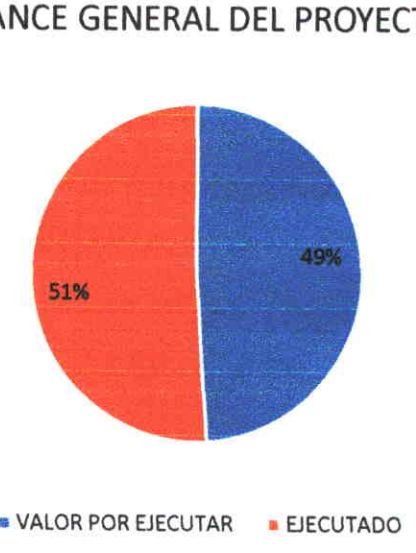


Ilustración 9: Avance general del proyecto

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


- Se determina entre el contratista e interventoría que el avance físico de la obra en el tiempo comprendido entre el 11 agosto de 2024 y el 31 de octubre de 2024 es del **51,05%,** continuando satisfactoriamente las actividades definidas dentro del contrato inicial, priorizando el beneficio y comodidad brindado a la comunidad del área de intervención.


MARIA JULIA FAYAD PADILLA

R/L MANÁ CONSTRUCCIONES S.A.S.


NIT 901.548.710-2

REGISTRO FOTOGRAFICOS

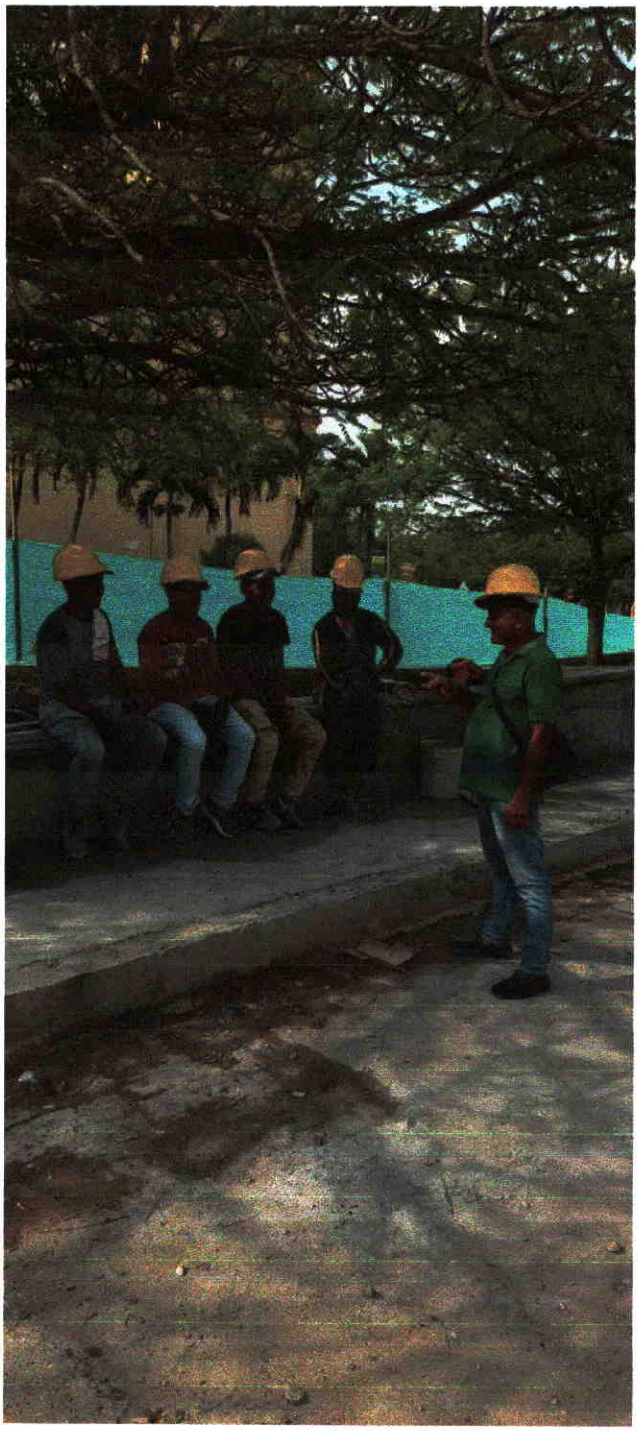


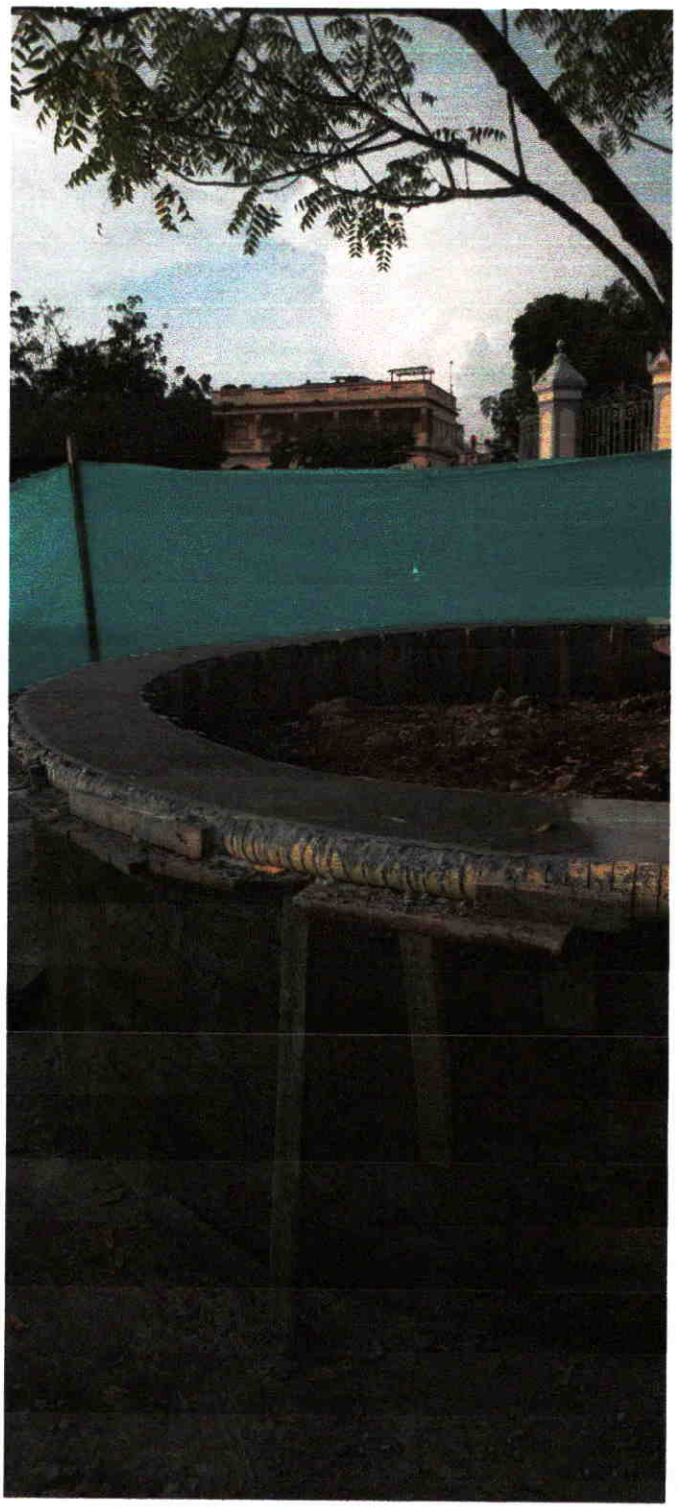

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 321
parquesl

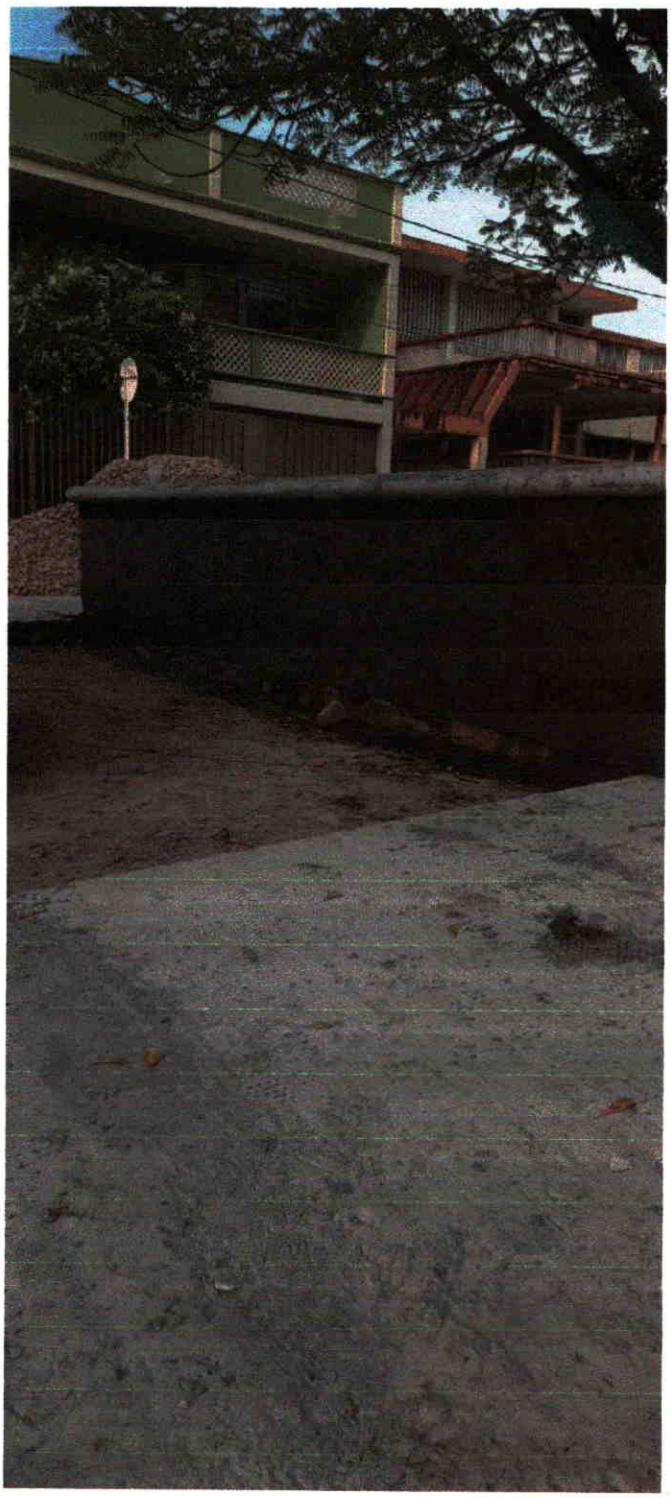


Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 321 [illegible]
parqueslineadescorazar@gmail.com

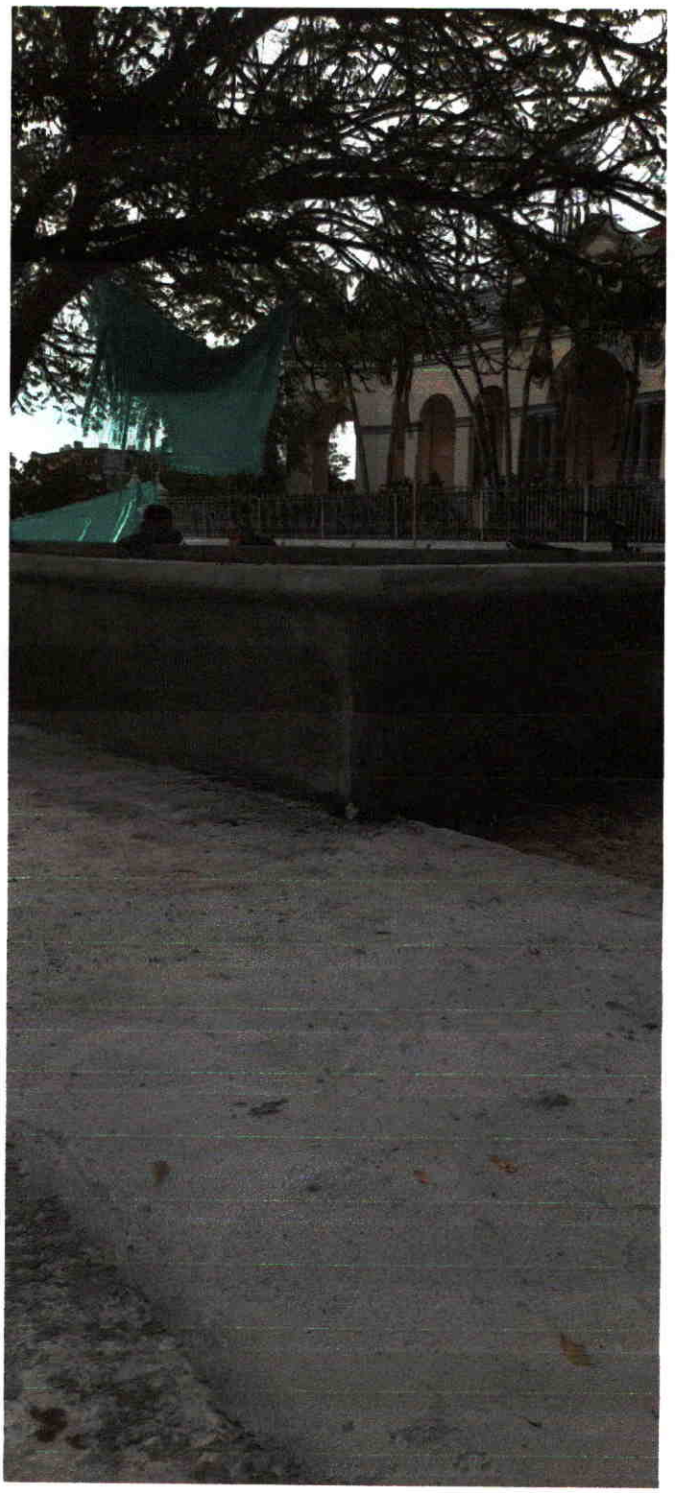

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 321 [illegible]56 350
parqueslinealescorozal@gmail.com



Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 321
parqueslineales

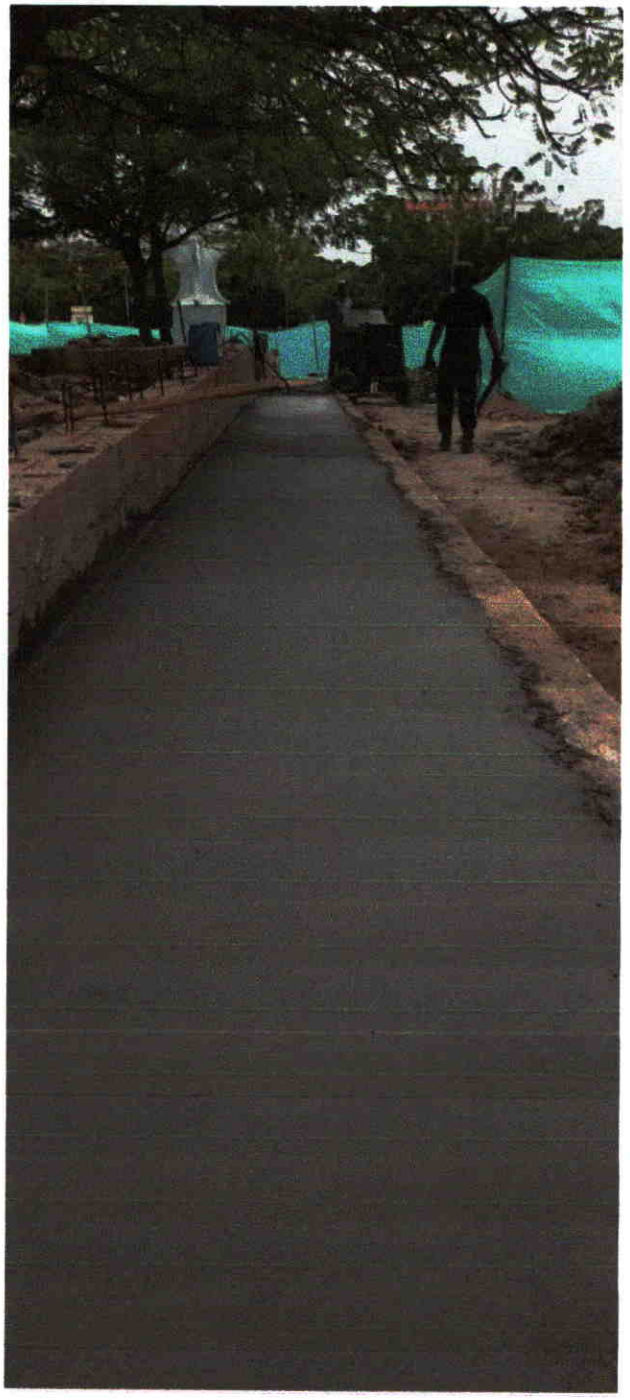

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Coloso – Sucre
Cel: 3214456330
parqueslineales@gmail.com



BITÁCORA

Carrera 5 # 7 – 7. Calle Real. Colosó – Sucre
Cel: 3214456330
parqueslinealescorozal@gmail.com

16- AGOSTO -2024

- ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA: SOLEADO
  TARDE: SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO OFICIAL, AYUDANTES.

- ACTIVIDADES: VERIFICANDO NIVELES PARA CONTINUAR FORMALETEANDO MURO CONTENCIÓN BOULEVARD CALLE 28
  EXCAVACIÓN BOULEVARD CALLE 29, SOLADO Y ARMADO ACERO DE ZAPATA.

17- AGOSTO -2024

- ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA LLUVIAS PARCIALES.
  TARDE: ——

- PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO OFICIAL, AYUDANTES.

- ACTIVIDADES: APLOME DE FORMALETAS MURO CONTENCIÓN BOULEVARD CALLE 28
  FUNDIDA ZAPATA BOULEVARD CALLE 29
  ARMADO ACERO MURO BOULEVARD CALLE 29.

19 - AGOSTO - 2024.

- ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA. SOLEADO
  TARDE: SOLEADO

- PERSONAL EN OBRA: RESIDENTE DE OBRA, MAESTRO OFICIAL, AYUDANTES.

- ACTIVIDADES:
  - Fundida muro de Contención Calle 28
  - Armado Acero de refuerzo Calle 29.
  - Excavación para muro de contención Calle 29

20 - Agosto - 2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado

- Personal: Director, Residente, maestro, 2 oficiales, 6 ayudantes

- Actividades:
  - Fundida muro de contención Calle 28
  - Armado acero de refuerzo para muro de contención Calle 29
  - Excavación para muro de contención - Calle 29

21 - Ago - 2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado
- Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes, siso.
- Actividades: _ Armado acero de refuerzo y excavación para muro de contención - Calle 29.
  _ Fundida muro de contención - Calle 28
  _ Fundida talón muro de contención - Calle 28.

22 - Ago - 2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Llovizna.
- Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes
- Actividades: _ Armado acero de refuerzo y excavación para muro de contención - calle 29.
  _ Fundida muro de contención y excavación para muro de contención - Calle 28

23 - Ago - 2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado.

- Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes
- Actividades: _ Armado acero de refuerzo y excavaciones para muro de contención - alrededores parques
_ Fundida muro de contención - Calle 28

- 24 - Ago - 2024
- Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Lluvioso
- Personal: Director, residente, maestros, oficiales, ayudantes
- Actividades: Fundida muro de contención calle 28

- 26 - Ago - 2024
- Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
- Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes
- Actividades: _ Excavación para muro de contención - Calle 29
_ Armado acero de refuerzo - Calle 29
_ Armado acero de refuerzo - Calle 28
_ Excavación para muro de contención - Calle 28

27 - Ago - 2024.

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado
- Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes
- Actividades: Armado acero de refuerzo y excavación para muro de contención - Calle 28 y 29
  Fundida muro de contención - Calle 28 y 29.

28 - Ago - 2024


- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado
- Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes
- Actividades: Armado acero de refuerzo y excavación para muro de contención - Calle 28 y Calle 29.
  Fundido muro de contención - Calle 28 y Calle 29.


29 - Ago - 2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado

- Personal: Director, residente, oficiales, maestros, ayudantes

- Actividades: _ Armado acero de refuerzo y excavación para muro de contención - Calle 28 y 29.
  _ Fundida muro de contención - Calle 28 y 29.






- 30 de agosto de 2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado

- Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudante

- Actividades: _ Armado acero de refuerzo y excavaciones para muro de contención - Calle 28 y 29
  _ Fundido muro de contención - Calle 28 y 29







31 - Ago - 2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

Personal: Director, residentes, maestros, oficiales, ayudantes

Actividades: Excavación para muros de contención - Calle 28 y 29





02 - Sep - 2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

Personal: Director, residentes, maestros, oficiales, ayudantes

Actividades: _ Armado acero de refuerzo y excavacion para muro de contención - Calle 28 y 29
_ Fundida muro de contención - Calle 28 y 29.






03 - Sep - 2024

Tiempo: Mañana → Soleado
→ Soleado

Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudante.

. Actividades: _ Armado acero de refuerzo y excavación para muro de contención - Calle 28 y 29.
_ Fundida muro de contención - Calle 28 y 29





. 04 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

. Personal: Director, residente, maestros, oficiales, ayudantes

. Actividades: _ Armado acero de refuerzo y excavación para muro de contención - Calle 28 y 29.
_ Fundido muro de contención - Calle 28 y 29.

. 05 de septiembre de 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

. Personal: Director, residente, maestros, oficiales, ayudantes

. Actividades: _ Excavación para muro de contención - Calle 29
_ Fundido muro de contención - Calle 29




. 06 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

. Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes

. Actividades: - Excavación para viga de cimentación de muro jardinera - Calle 29
- Excavación para muro de contención - Calle 28 y 29
- Fundida muro de contención - Calle 28 y 29

. 07 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Lluvia
Tarde → Lluvia

. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes

. Actividades: - No se realizaron actividades por lluvia.

09 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes.

. Actividades: - Excavación para viga de cimentación muro de jardineras - Calle 29.
- Excavación para muro de contención - Calle 28 y 29
- Fundida muro de contención - Calle 28 y 29.

. 10 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes, siso

. Actividades realizadas: - Excavación para viga de cimentación para vigas de muro jardineras - Calle 29
- Excavación y armado acero de refuerzo para muro de contención - Calle 29
- Fundida muro de contención - Calle 28 y 29.

11-Sep-2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado
- Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
- Actividades: - Excavación para vigas de cimentación muros de jardineras - Calle 29
  - Fundida muro de contención - Calle 29 y 28
  - Armado acero de refuerzo para muro de contención - Calle 29

12 de sep de 2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado
- Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
- Actividades: - Excavación para viga de cimentación muros de jardineras - Calle 29
  - Fundidos muros de contención - Calle 29
  - Armado acero de refuerzo para vigas de cimentación - Calle 29

. 13 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

. Personal: Residente, maestro, oficial, ayudantes

. Actividades: - Excavación para viga de cimentación muro de jardineras Calle 29
- Armado acero de refuerzo viga de cimentación Calle 29
- Fundida muro de contención - Calle 29 y 28

. 14 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

. Personal: Residente, maestro, oficiales ayudantes

. Actividades: - Excavación para viga de cimentación muro de jardineras - Calle 29
- Armado acero de refuerzo viga de cimentación - Calle 29
- Fundido muro de contención - Calle 29 y 28

15 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

. Personal: Residente, oficiales, ayudantes, maestro

. Actividades: Excavación para viga de cimentación muro de jardineras - Calle 29.
- Armado acero de refuerzo viga de cimentación
- Fundida muro de contención

16 - Sep - 2024

* No se realizaron actividades.

17 - Sep - 2024


. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado

. Personal: Residente, oficiales, ayudante, maestro

. Actividades: - Excavación para viga de cimentación para muro de jardineras / Calle 29
- Armado acero de refuerzo para viga de cimentación

18 - Sep - 2024


- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado
- Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes, siso
- Actividades: - Relleno con material del sitio - Calle 28 y 29
  - Excavación viga de cimentación - Calle 29
  - Armado acero de refuerzo viga de cimentación - Calle 29
  - Fundida viga de cimentación - Calle 29






- 19 de sep./2024

- Tiempo: Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Lloviznq
- Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
- Actividades: - Relleno con material del sitio, Calle 28 y 29
  - Excavación viga de cimentación, calle 29
  - Armado acero de refuerzo viga de cimentación, calle 29
  - Fundida viga de cimentación





- 20 - Sep - 2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado
- Personal: Residente, oficiales, maestro, ayudantes
- Actividades: - Relleno con material del sitio, Calle 28 y 29.
  - Armado de acero de refuerzo y fundida de viga de cimentación, calle 29.




.21 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
. Actividades: Relleno con material de sitio, calle 28 y 29.




.23 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
. Actividades: _ Relleno con material de sitio calle 28 y 29
_ Armado acero de refuerzo y fundida viga de cimentación, calle 29





.24 - Sep - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
. Actividades: _ Relleno con material de sitio, calle 28 y 29
_ Armado acero de refuerzo y fundida viga de cimentación, calle 29.


- Fundida cabezal muro de contención, Calle 28 y 29.
- Armado acero di refuerzo para muro di jardineras, calle 29.





25 - Sep - 2024


- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado
- Personal: Residente, oficiales, maestro, ayudantes, sisa.
- Actividades: - Relleno con material del sitio, calle 28 y 29
  - Fundida cabeza muro de contención, calle 28 y 29
  - Armado de acero para muro de jardineras, calle 29
  - Armado acero di refuerzo para viga di cimentación
  - Fundida viga di cimentación, calle 29.






26 - Sep - 2024

- Tiempo: Mañana → Lluvioso
  Tarde → Nublado
- Personal: Residente, oficiales, maestro, ayudantes
- Actividads: Relleno con material del sitio, Calle 29 y 28
  - Fundida cabezal muro de contención, calle 28 y 29
  - Armado acero di refuerzo para muro de jardineras
  - Fundida viga di cimentación para muros de jardineras.





27- Sep- 2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, oficiales, ayudantes, maestro
Actividades: - Armado acero de refuerzo para muro de jardineras y viga de cimentación, calle 29.
- Fundida viga de cimentación, calle 29

28 - Sep - 2024


Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, ayudantes, oficiales, maestros.
Actividades: - Armado acero de refuerzo para muro de jardi... y viga de cimentación, Calle 29.
- Fundida viga de cimentación, calle 29.

30 - Sep - 2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: - Armado acero de refuerzo para muro de jardinera... y viga de cimentación, calle 29
- Fundida viga de cimentación, calle 29.

01 - Oct - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Residente, director, piso, maestro, oficiales, ayudante
. Actividades: - Levante muro de jardinera, calle 29
- Instalación red acueducto tubería 3/4"
- Armado acero de refuerzo para muro de jardinera y viga de cimentación, calle 29
- Fundida viga de cimentación, calle 29.





02 - Oct - 2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes
. Actividades: - Levante muro de jardineras, Calle 29
- Instalación red acueducto tubería 3/4"
- Armado acero de refuerzo para muro de jardinera y viga de cimentación, calle 29.
- Fundida viga de cimentación





03 - Oct - 2024


. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes.

. Actividades: _ Levante muro de jardineras, calle 29.
_ Instalación red de acueducto tubería 3/4", calle 29
_ Armado acero de refuerzo para viga de cimentación y muro de jardinera, calle 29




. 04-Oct-2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
. Actividades: _ Levante muro de jardineras, calle 29
_ Armado acero de refuerzo para muro de jardineras y viga de cimentación, Calle 29
_ Fundida viga de cimentación, Calle 29




. 05-Oct-2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
. Actividades: _ Levante muro jardinero, Calle 29
_ Armado acero de refuerzo muro de jardineras, Calle 29
_ Fundida viga de cimentación, calle 29




07-Oct-2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, oficiales, maestro, ayudantes
Actividades: - Levante muro de jardineras, calle 29
- Armado acero de refuerzo muro de jardineras, calle 29
- Relleno con material seleccionado, calle 29




08-Oct-2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Lloviena
Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades realizadas: - Levante muro de jardineras, calle 29.
- Relleno or material seleccionado, calle 29
- Armado acero de refuerzo para muro de jardinera, calle 29.



09-Oct-2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, oficiales, ayudantes, maestro
Actividades: - Levante muro de jardineras, calle 29
- Relleno material seleccionado, calle 29
- Instalación red de conducto tubería 1/2", calle 29



10 - Oct - 2024

Tiempo: Mañana → ~~Fuerte~~ Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: - Levante muro de jardineras, calle 29
- Relleno con material seleccionado, calle 29
- Excavación para registros desagüe hidrosanitario, calle 29
- Fundida viga de cimentación, calle 29

11 - Oct - 2024

Tiempo: Mañana → Lluvia
Tarde → Lluvia
Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: No se realizaron actividades por fuertes lluvias

12 - Oct - 2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: Levante muro de jardineras, calle 29.

14-Oct-2024

Tiempo: Soleado
Personal: Residente, oficiales, maestro, ayudantes
Actividades: - Levante muro jardineras, calle 29
- Relleno con material seleccionado, calle 29
- Instalación de malla electrosoldada y fundida de plantilla, calle 29

15-Oct-2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: - Levante muro jardineras, calle 29
- Relleno con material seleccionado, calle 29
- Instalación malla electrosoldada y fundida de plantilla


16-OCt-2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Director, residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: Levante muro de jardineras, calle 29
- Relleno con material seleccionado, calle 29
- fundida plantilla, calle 29
- Instalación acero de refuerzo para plantilla, calle 29.




17+ Oct - 2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: - Levante muro jardineras, calle 29.
- Relleno material seleccionado, calle 29
- Instalación malla electrosoldada y fundida de plantilla, calle 29




18-Oct-2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, oficiales, maestro, ayudantes
Actividades: - Levante muro jardineras, calle 29
- Relleno material seleccionado, calle 29
- Instalación malla electrosoldada y fundida de plantilla, calle 29




. 19-Oct-2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
. Actividades: _ Levante muro de jardineras, calle 29
_ Fundida plantilla, calle 29




. 21-Oct-2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
. Actividades: _ Armado de formaleta y acero de refuerzo para alfajía calle 29
_ Fundida plantilla, calle 29




. 22-Oct-2024

. Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
. Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
. Actividades: _ Construcción de alfajía, calle 29
_ Pañete en muros de jardinera, calle 29




23-Oct-2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: _ Construcción de alfajía, calle 29
_ Pañete ambas caras, calle 29




24-Oct-2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Soleado
Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: _ Construcción de alfajía, calle 29
_ Pañete ambas caras muro de jardinera, calle 29



25-Oct-2024

Tiempo: Mañana → Lluvia
Tarde → Lluvia.
* No se registraron actividades



26 - Oct - 2024

- Tiempo: Mañana → Lluvioso
  Tarde → Lluvia

* No se registraron actividades

28 - Oct - 2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Soleado
- Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
- Actividades: _ Construcción de alfajía, calle 29
  _ Pañete ambas caras muros de jardineras, calle

29 - Oct - 2024

- Tiempo: Mañana → Soleado
  Tarde → Lluvia
- Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
- Actividades: _ Construcción de jardineras, calle 29
  _ Pañete ambas caras muros de jardineras, calle 29.

62 64

30-Oct-2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Lluvia.
Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: _ Construcción de alfajía, calle 29
_ Pañete ambas caras muro de jardinera, cal

31-Oct-2024

Tiempo: Mañana → Soleado
Tarde → Lluvia
Personal: Residente, maestro, oficiales, ayudantes
Actividades: _ Construcción de alfajía, calle 29.
_ Pañete ambas caras muro de jardinera, calle

INFORME PGIO

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO MC-010-2024

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE".

CONTRATISTA

MANA CONTRUCCIONES

INFORME PGIO N°1 DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	CONTRATO OBRA: MC-010-2024
	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
	INFORME PGIO No. 01

INFORMACION DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	**GOBERNACION DE SUCRE**
CONTRATISTA DE OBRA	**MANA CONSTRUCCIONES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	**CONSTRUCCIONES BETANIA SAS**
VALOR DEL CONTRATO ($)	**$ 907.491.333,00**
PLAZO EJECUCION	**6 MESES**
UBICACIÓN DEL PROYECTO	
CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27	**COROZAL SUCRE**

CONTRATISTA:	CONTRATO OBRA: MC-010-2024
	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
	INFORME PGIO No. 01

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. **GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** 4
2. **OBIETIVOS:** 4
3. **RESUMEN EJECUTIVO** 5
4. **ACTIVIDADES EJECUTADAS** 6
5. **VERIFICACION DE AFILIACIONES EPS, ARL Y AFP** 6
6. **CAPACITACIONES.** 6
7. **EVIDENCIA CHARLAS SST Y AMBIENTAL** 7
8. **INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO** 7
9. **MANEJO E INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS** 8
10. **INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** 8
11. **ACCIDENTES DE TRABAJO** 12
12. **MANEJO DE RESIDUOS** 13
13. **SEÑALIZACION** 15
14. **FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS** 16
15. **CONTROLES EN LOS FACTORES DE RIESGOS ENCONTRADOS** 17
16. **ANEXOS** 18

CONTRATISTA:	CONTRATO OBRA: MC-010-2024
MANÁ CONSTRUCCIONES	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
	INFORME PGIO No. 01

1. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La seguridad y salud en el trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión más importante para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud en el trabajo, que debe estar sincronizada con los planes de calidad, gestión ambiental, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo, productividad y desarrollo del talento humano y la reducción de costos operacionales.

Es por ello que se ha implementado en todas las actividades desarrolladas el cumplimiento del Decreto 1072 del 2015, el cual establece el seguimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, para lograr una reducción de costos en la presencia de accidentes de trabajo y/o Enfermedad de Origen Laboral, impactos ambientales, buscando mejorar la calidad de los servicios y ante todo disponer de ambientes de trabajo sano para los que allí trabajan.

El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población trabajadora respecto a su salud y el medio ambienta laboral así, como para dar cumplimiento a la normatividad vigente.

2. OBIETIVOS:

- Establecer mecanismos que permitan cuidar la integridad física y emocional de cada uno de los trabajadores presentes en el proyecto.
- Dar amplio cumplimiento a las medidas de promoción y prevención establecidas por la empresa, garantizando la mitigación de factores de riesgos existentes.
- Verificar las medidas de intervención estipuladas para controlar los riesgos.
- Minimizar la producción de residuos sólidos en obra.
- Minimizar el impacto ambiental negativo en la ejecución del proyecto.
- Controlar el uso racional del agua potable durante el desarrollo de la obra.
- Controlar el uso racional de energía eléctrica para el desarrollo de las actividades que necesiten del recurso.
- Retirar del proyecto todos los residuos peligrosos producto de las actividades desarrolladas.

- Suministrar a todos los trabajadores herramientas y equipos en óptimas condiciones para la ejecución de las actividades programadas, garantizando la integridad física, para minimizar o eliminar los riesgos
- Promover la gestión ambiental en el proyecto

3. RESUMEN EJECUTIVO

La seguridad y salud en el trabajo según la Organización Mundial de la Salud es una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores, mediante la prevención y control de las enfermedades y accidentes, al mismo tiempo que se busca detectar y eliminar factores y condiciones que ponen en peligro, riesgo incidente o accidente la salud y seguridad en el trabajo; entendiéndose por peligro toda fuente o acto con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad.

- Riesgo: es la probabilidad de que el daño, lesión o enfermedad ocurra,
- Incidente: Suceso repentino que se dé a causa del desarrollo del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión, invalidez o la muerte.
- Accidente: Se produce durante la ejecución de órdenes por parte del empleador donde se incluye el traslado del empleado al lugar de trabajo o residencia si el transporte es del empleador. Dentro de los casos descritos anteriormente, también se pueden presentar los no accidentes, los cuales son considerados si el trabajador desarrolla actividades diferentes a las estipuladas en el contrato, a menos que actúe bajo órdenes del empleador.

Durante la ejecución del proyecto se veló por la integridad, física y psicológica de todos los trabajadores, realizando actividades de promoción y prevención, identificando los riesgos existentes y determinando controles con la eficacia en la prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedad de tipo laboral, cumpliendo los lineamientos de acuerdo a la normatividad vigente en temas de seguridad y salud en el trabajo y el área.

CONTRATISTA:	CONTRATO OBRA: MC-010-2024
	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
	INFORME PGIO No. 01

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

5. VERIFICACION DE AFILIACIONES EPS, ARL Y AFP

La vinculación a la seguridad social es obligatoria para todos los trabajadores que desarrollen actividades dentro de cualquier proyecto, lo cual se cumplió según lo estipulado con la ley durante la realización de las actividades de construcción ejecutadas en esta obra. Se Anexa Afiliación Y planilla de Seguridad Social **Anexo 1**

Nombre del Trabajador	Cargo
DAVID RODRIGUEZ	AUXILIAR
JOSE LUIS DIAZ	AUXILIAR
CRISTIAN GONZALEZ	AUXILIAR
DAGOBERTO HERNANDEZ	AUXILIAR
OSCAR MEDINA	AUXILIAR
JUAN GOMEZ	MAESTRO

6. CAPACITACIONES.

Las charlas de seguridad se dictan al inicio de la jornada laboral para mantener al personal al tanto de las recomendaciones básicas para evitar incidente de trabajo y ayudar a que los trabajadores reconozcan y corrijan los riesgos en el lugar de trabajo. Alguno de los temas que se han tratado durante las charlas son los siguientes:

- ✓ Inducción Seguridad en el Lugar de Trabajo
- ✓ Manejo de cargas higiene postural
- ✓ Uso adecuado de EPP
- ✓ Prevención de Riesgos laborales
- ✓ Manejo ambiental

Ver **Anexo 2**

7. EVIDENCIA CHARLAS SST Y AMBIENTAL





8. INSPECCIONES DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO

MARCO LEGAL Y TECNICO

Decreto 1072 de 2015:

Las empresas conforme a los requisitos legales deben establecer un método sistemático para el desarrollo, implementación, realización y seguimiento de inspecciones para identificar toda condición peligrosa o practica subestándar que pueda causar lesiones o enfermedades laborales, daño en el ambiente de trabajo

9. MANEJO E INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

Durante la ejecución de la obra, se emplean varias herramientas, tanto manuales como mecánicas con el objetivo de minimizar sobre esfuerzos y proponer rendimiento en la realización de cada actividad. Para el control de estas se realizaron inspecciones preoperacionales, encontrando todo en buen estado apto para su uso, además es importante mantener las herramientas menores de trabajo en completo orden, mantener las áreas recogidas.

10. INSPECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


INSPECCION DE BOTIQUIN Y KIT PARA CONTROLAR DERRAME DE SUSTANCIAS






CONTRATISTA:	CONTRATO OBRA: MC-010-2024
MANÁ CONSTRUCCIONES	**OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
	INFORME PGIO No. 01

INSPECCION DE EXTINTORES

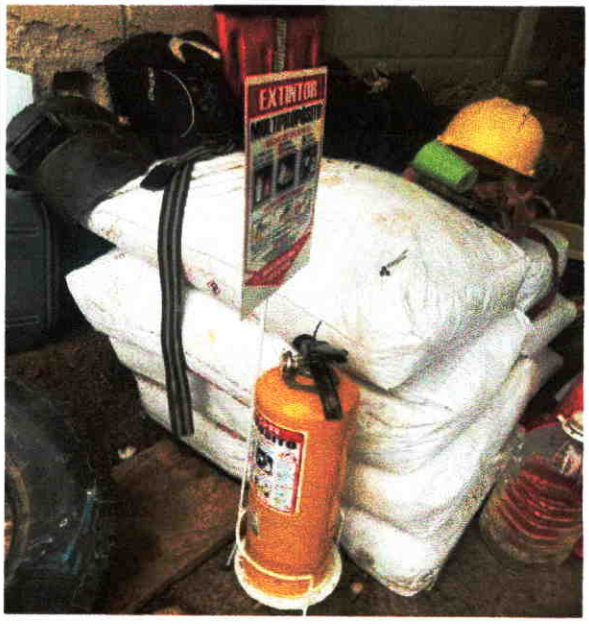

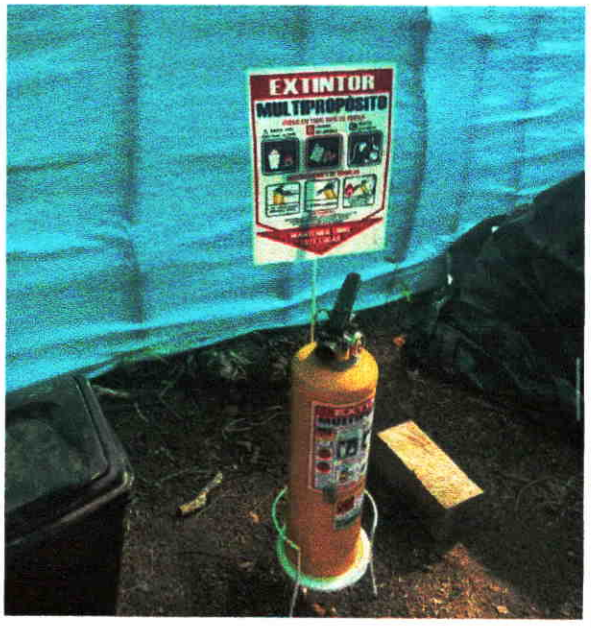

CONTRATISTA:	CONTRATO OBRA: MC-010-2024
MANÁ CONSTRUCCIONES	**OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
	INFORME PGIO No. 01



CAMILLA





Ver Anexo 3 Inspecciones

CONTRATISTA:	CONTRATO OBRA: MC-010-2024
MANÁ CONSTRUCCIONES	**OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
	INFORME PGIO No. 01

DOTACION


Se doto a los trabajadores con los siguientes elementos:

- ✓ Overol manga larga
- ✓ Casco de seguridad
- ✓ Barbuquejo
- ✓ Guantes
- ✓ Tapaboca
- ✓ Bota de caucho

USO OBLIGATORIO ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: Se realizo la verificación que el personal cumpla con la norma del uso obligatorio de EPP, además de la ropa adecuada durante toda la jornada de trabajo





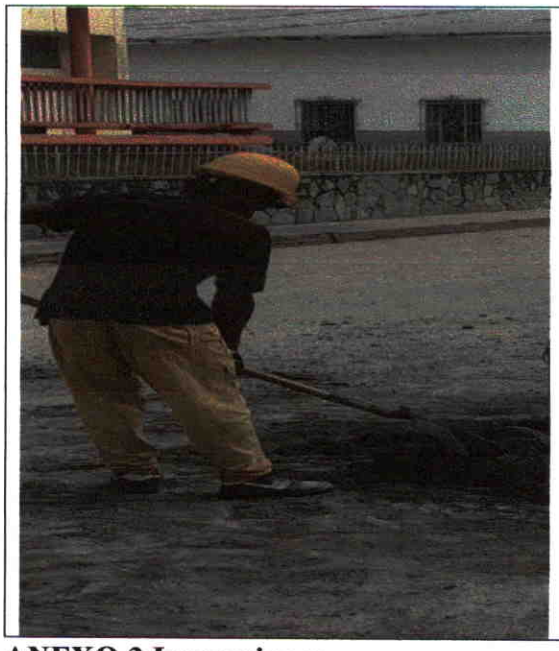

ANEXO 3 Inspecciones

11. ACCIDENTES DE TRABAJO

La ley 1562 de 2012 (Sistema General de Riesgos Laborales) en su artículo 3 nos define un accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. **(DURANTE EL TIEMPO EJECUTADO DE LA OBRA NO SE HAN PRESENTADO ACCIDENTES LABORALES).**

INDICADORES	FORMULA	DATO
Índice de Frecuencia de AT	(Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0%
Índice de Severidad de AT	(Número de días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes + número de días cargados en el mes / Número de trabajadores en el mes) * 100	0%
Incidencia de EL	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	0%
Prevalencia EL	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo «Z» / Promedio de trabajadores en el periodo «Z») * 100.000	0%

12. MANEJO DE RESIDUOS


Se mantienen las zonas de trabajo limpias y ordenadas, esto con el fin de optimizar el uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo, y en general, por conservar un entorno más seguro para toda la población vinculada directa o indirectamente al proyecto.

Es de resaltar que en la obra no se generaron residuos peligrosos, por lo que no fue necesario usar canecas de color rojo

CONTRATISTA:	CONTRATO OBRA: MC-010-2024
MANÁ CONSTRUCCIONES	**OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
	INFORME PGIO No. 01






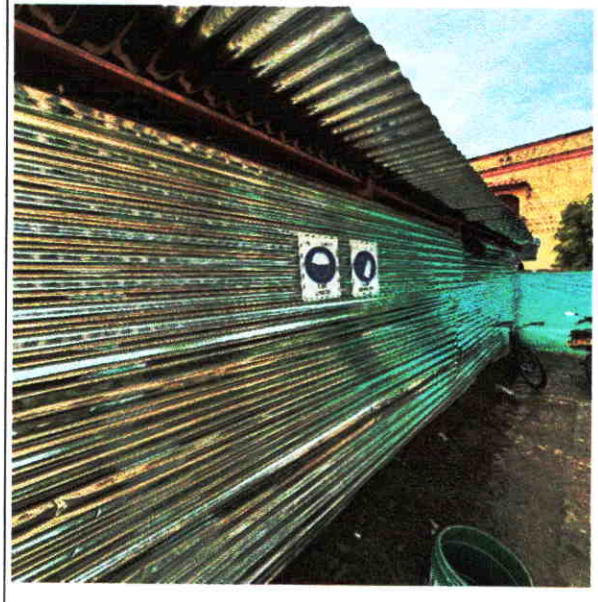





CONTRATISTA:	CONTRATO OBRA: MC-010-2024
MANÁ CONSTRUCCIONES	**OBJETO:** "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
	INFORME PGIO No. 01

13. SEÑALIZACION, DEMACRACIONES Y DELIMITACIONES

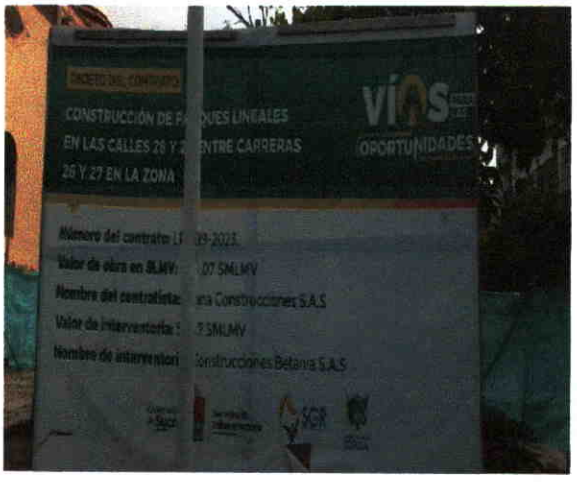



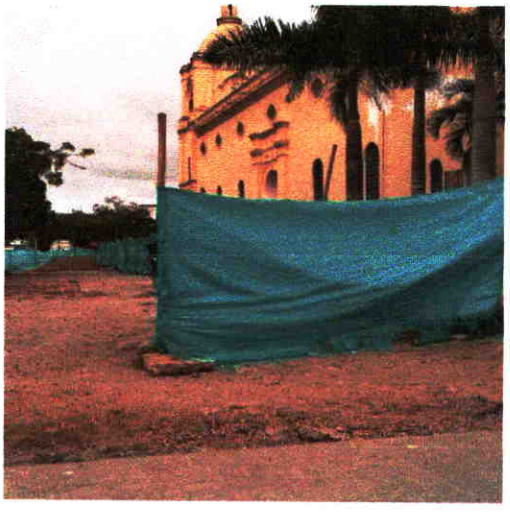

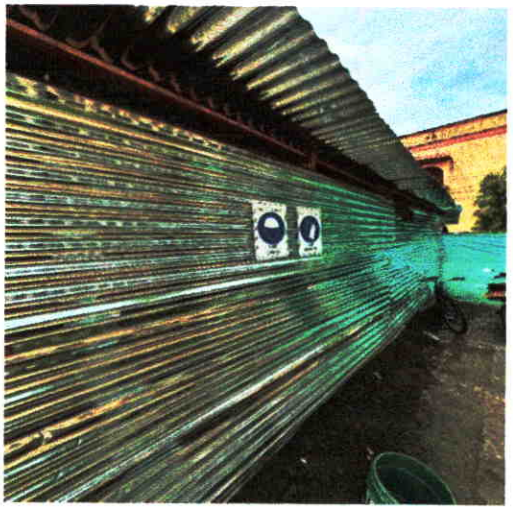

14. RIESGOS ENCONTRADOS

- ✓ **RIESGO PSICOSOCIAL:** Ambiente de trabajo, aspectos personales del trabajador y su entorno social, en un momento dado pueden generar cargas que afectan la salud, el rendimiento en el trabajo y la producción laboral. Como bien se explica en lo anterior, esto también puede ser ocasionado por falta herramientas y EPP en el momento de iniciar las labores y la exigencia del trabajo con el tiempo.

- ✓ **RIESGO BIOMECÁNICO:** agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, o los elementos de trabajo a la fisonomía humana, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas y/o peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre esfuerzo, así como posturas y movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. Este riesgo se hace presente en el momento en el que el trabajador realiza posturas inadecuadas en el momento de realizar uso de guadañadora, fumigadora y herramientas manuales, como lo es el machete

- ✓ **RIESGO QUÍMICO:** Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el organismo, bien sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones sistémicas, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición, en este caso puedes ser generado por el uso de gasolina y aceites

- ✓ **RIESGO FISICO:** Radiaciones ionizantes, no ionizantes, iluminación, ruido, vibraciones, altas temperaturas. Contagios, pandemia, contaminación. (TRABAJO A LA INTEMPERIE).

- ✓ **RIESGO LOCÁTIVO**: Pisos, escaleras, barandas, plataformas, falta de orden y aseo. Señalización y demarcación deficiente, inexistente o inadecuada.

- ✓ **RIESGO ELÉCTRICO**: uso de instalaciones eléctricas, conexión de máquinas y herramientas, conexiones defectuosas, conexiones no autorizadas.

- ✓ **RIESGO MECÁNICO:** uso de máquinas cortadoras, pulidoras, taladros, mezclador, herramientas de mano como martillo picos palas entre otras.

- ✓ **RIESGO NATURAL:** es la probabilidad, pequeña o grande, de que la población de una zona sufra un daño o una catástrofe como consecuencia de un proceso natural, en la obra, o en general en la comunidad.

Ver Matriz de Peligros. Anexo 4

15. CONTROLES EN LOS FACTORES DE RIESGOS ENCONTRADOS

- ✓ **El factor de riesgo psicosocial**, como toda empresa debe estar comprometida con la seguridad y salud de sus trabajadores, el contratista promueva el buen ambiente laboral, que se organicen los tiempos debidos de trabajo teniendo en cuenta el descanso oportuno de los trabajadores durante la jornada de trabajo. (Pausas activas)

- ✓ **El factor de riesgo biomecánico**, aquí el control ejercido es realizar capacitaciones a los trabajadores durante las charlas sobre higiene postural, levantamiento de cargas y posturas inadecuadas, para evitar lesiones musculares.

- ✓ **El factor de riesgo físico**, la presencia de este factor es notoria en el momento en que nuestros empleados realizan tareas con exposición al sol ¿Cómo ejercemos el control sobre este tipo de factor? Por medio de pausas activas y rotación del personal, e hidratación.

- ✓ **El factor de riesgo Mecánico**, se realizan charlas de seguridad sobre autocuidado y manipulación de máquinas.

Se realizan charlas de seguridad a todos los trabajadores sobre los riesgos específicos a los que se encuentran expuestos, movimientos repetitivos, uso de máquina y herramientas manuales y eléctricas. Así mismo, se realizan charlas sobre el uso adecuado de herramientas, actos y condiciones inseguras, autocuidado, la importancia del uso de los Elementos de Protección Personal y también a identificar los riesgos a los cuales se exponen diariamente, para ejercer control sobre ellos.

CONTRATISTA:	CONTRATO OBRA: MC-010-2024
	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUES LINEALES EN LAS CALLES 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 26 Y 27 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
	INFORME PGIO No. 01

JOSE MERCADO RIOS
CC: 92542885
RESIDENTE SST
LIC 044

REPRESENTANTE LEGAL

16. ANEXOS

- ✓ Anexo 01 Planillas_Seguridad_Social
- ✓ Anexo 02 Capacitaciones
- ✓ Anexo 03 Inspecciones y entrega de EPP
- ✓ Anexo 4 Matriz de Peligros.

EPS | sura

ARL | sura

Medellín, 08 de Julio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JUAN CARLOS GOMEZ.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%	
C1005583484	GONZALEZ GONZALEZ CRISTIAN CAMILO	04/07/2024		41150162	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10055834842419035242

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/07/2024 09:47:22 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.89.39, 198.143.41.34, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS | sura

ARL | sura

Medellín, 08 de Julio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JUAN CARLOS GOMEZ.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%	
C1103858188	HERNANDEZ DOMINGUEZ DAGOBERTO DE JESUS	04/07/2024		10199129	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C11038581882419034926

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/07/2024 09:42:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.89.39, 192.230.86.11, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS | sura

ARL | sura

Medellín, 08 de Julio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JUAN CARLOS GOMEZ.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%	
C7597892	RODRIGUEZ DIAZ DAVID JOSE	04/07/2024		159137P1	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C75978922419034169

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/07/2024 09:29:29 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.89.39, 198.143.41.34, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS | sura

ARL | sura

Medellín, 08 de Julio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JUAN CARLOS GOMEZ.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%	
C92554159	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	04/07/2024		i9164w21	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C925541592419035396

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/07/2024 09:49:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.89.39, 198.143.41.34, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EPS | sura

ARL | sura

Medellín, 08 de Julio de 2024

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de JUAN CARLOS GOMEZ.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL SUCRE		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96%	
C92552308	MEDINA ARRIETA OSCAR IVAN	04/07/2024		174o1631	DEPENDIENTE	EN COBERTURA

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C925523082419035476

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 08/07/2024 09:51:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.51.89.39, 198.143.41.34, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

SOPORTE DE NOVEDADES DE REINGRESOS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

nueva eps
RECIBIDO PARA ESTUDIO EN LA EPS
NOMBRE DIEGO CABRERA SALLA
CLAVE ASESOR C1310
FECHA

CÓDIGO ASESOR Y/O PROMOTOR
C1310

AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS														
PRIMER APELLIDO	RODRIGUEZ	SEGUNDO APELLIDO	DIAZ	PRIMER NOMBRE	DAVID	SEGUNDO NOMBRE	JOSE							
7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CC	8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	7597892							9. SEXO BIOLÓGICO		X		
SEXO DE IDENTIFICACIÓN	F	X	T	NB	10. FECHA NACIMIENTO	11	10	1973	PAÍS DE NACIMIENTO	COLOMBIA	11. NACIONALIDAD	COLOMBIANA		

ANEXO COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	ZONA	TELÉFONO MÓVIL
COROZAL	SUCRE	URBANA	3003428989

TELÉFONO FIJO	EXT.	CORREO ELECTRÓNICO	IPS	IPS ODONTOLÓGICA
		DAVIDRODRIGUEZDIAZ@YAHOO.COM	7139	7139

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

39. Nombre o Razón Social	40. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	41. Número documento de identidad	DV	42. Tipo de aportante o pagador de pensiones
CONSORCIO VIAS OE 2021	NIT	901581118	0	DEPENDIENTE

43. UBICACIÓN O DIRECCIÓN	TIPO NOMENCLATURA	COMPLEMENTO DIRECCIÓN		
CLL 16 C # 13-16			SINCELEJO	SUCRE

				FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL				CARGO	OCUPACIÓN	SALARIO
CONTABILIDADCONSORCIOVIASOE@GMAIL.COM	TELÉFONO	6649696	TELÉFONO FIJO	EXT.	02	07	2024	OBRERO	EMPLEADO	$ 1.300.000

VIGILADO Supersalud

IX. FIRMAS

David Rodriguez	Andres Dominguez
61. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario cuando aplique	62. Aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No de Radicación: 70215-00011684-SM

Fecha de Radicación: 02/07/2024

I. DATOS DE TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]	A. Individual: -Cotizante o Cabeza de Familia [X] -Beneficiario o Afiliado [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	[ ]

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y Nombres			
GONZALEZ	GONZALEZ	CRISTIAN	CAMILO
7. Tipo de Documento de Identidad	**8. Número del documento de identidad**	**9. Sexo**	**10. Fecha de Nacimiento**
CC	1005583484	Femenino [ ] Masculino [X]	27/09/2002

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de Población Especial
06	Tipo [ ] Condición [ ]	0	9

15. Administradora de Riesgos Laborales -	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
SURAMERICANA DE SEGUROS	NO APLICA	1300000

18. Residencia			
CARRERA 30 N 25-20	2859696	3014143447	GONZALEZGON3484@GMAIL.COM
COROZAL (Municipio/Distrito)	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	12 DE ENERO (Localidad/Comuna)	SUCRE (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente

Apellidos y Nombres			
20. Tipo de Documento de identidad	**21. Número del documento de identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de Nacimiento**
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados

24.	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

25.	Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

29.	Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo		Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32.	Datos de residencia	Zona		Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado (a registrar por la EPS)
	Municipio/Distrito	Urban	Rural			
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

		34. Nombre de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C			
B	1		
B	2		
B	3		
B	4		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón	36. Tipo de Documento de identidad	37.Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO VIAS OE 2021	NI	901581118	Empleador

39. Ubicación				
CALLE PRINCIPAL ZONA (Dirección)	6649696 (Teléfono)	contabilidadconsorcioviasoe@gmail.com (Correo electrónico)	SINCELEJO (Municipio/Distrito)	SUCRE (Departamento)

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [x] 13. Movilidad: [x] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]		0 2 0 7 2 0 2 4

43. EPS anterior	44. Motivo de Traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [x] 46. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [x] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o de cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la EPS envie información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación, colectiva institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC
  Cantidad: 0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0 Total 0
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos del funcionario que realiza la validación		
Tipo documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No de Radicación: 70215-00011694-SM

Fecha de Radicación: 02/07/2024

I. DATOS DE TRÁMITE

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]	B. Colectiva [ ] A. Individual: -Cotizante o Cabeza de Familia [X] -Beneficiario o Afiliado [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	[ ]

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y Nombres			
HERNANDEZ	DOMINGUEZ	DAGOBERTO	DE JESUS
7. Tipo de Documento de Identidad	**8. Número del documento de identidad**	**9. Sexo**	**10. Fecha de Nacimiento**
CC	1103858188	Femenino [ ] Masculino [X]	29/12/2004

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de Población Especial
06	Tipo [ ] Condición [ ]	0	5

15. Administradora de Riesgos Laborales -	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
SURAMERICANA DE SEGUROS	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	1300000

18. Residencia			
LA JOSEFINA		3015688873	DAGOBERTO2023HERNANDEZ@GMAIL.COM
COROZAL (Municipio/Distrito)	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	COROZAL (Localidad/Comuna)	SUCRE (Departamento)

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente

Apellidos y Nombres			
20. Tipo de Documento de identidad	**21. Número del documento de identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de Nacimiento**
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados

24.	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

25.	Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

29.	Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo		Condición	
			F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32.	Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urban	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

		34. Nombre de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C			
B	1		
B	2		
B	3		
B	4		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón	36. Tipo de Documento de identidad	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO VIAS OE 2021	NI	901581118	Empleador

39. Ubicación				
CALLE PRINCIPAL ZONA (Dirección)	6649696 (Teléfono)	contabilidadconsorciovíasoe@gmail.com (Correo electrónico)	SINCELEJO (Municipio/Distrito)	SUCRE (Departamento)

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [x] 13. Movilidad: [x] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]		0 2 0 7 2 0 2 4

43. EPS anterior	44. Motivo de Traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [x] 46. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [x] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o de cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación, colectiva institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC
  Cantidad: 0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0 Total 0
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos del funcionario que realiza la validación			
Tipo documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario	

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

No de Radicación: 70215-00011690-SM

Fecha de Radicación: 02/07/2024

Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

I. DATOS DE TRÁMITE

1. Tipo de Trámite	2. Tipo de Afiliación	3. Régimen
A. Afiliación [X] B. Reporte de Novedades [ ]	A. Individual: -Cotizante o Cabeza de Familia [X] -Beneficiario o Afiliado [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De Oficio [ ]	A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]

4. Tipo de Afiliado	5. Tipo de Cotizante	Código (a registrar por la EPS)
A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ]	A. Dependiente [X] B. Independiente [ ] C. Pensionado [ ]	[ ]

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia) A. AFILIACIÓN

6. Apellidos y Nombres			
MEDINA	ARRIETA	OSCAR	IVAN
7. Tipo de Documento de Identidad	**8. Número del documento de identidad**	**9. Sexo**	**10. Fecha de Nacimiento**
CC	92552308	Femenino [ ] Masculino [X]	23/10/1996

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales

11. Etnia	12. Discapacidad	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de Población Especial
06	Tipo [ ] Condición [ ]	[ ]	9

15. Administradora de Riesgos Laborales -	16. Administradora de Pensiones	17. Ingreso Base de Cotización - IBC
SURAMERICANA DE SEGUROS	PORVENIR	1300000

18. Residencia			
SAN FERNANDO MZ C LT 9		3012484764	
COROZAL	Zona: Urbana [X] Rural [ ]	11 DE NOVIEMBRE	SUCRE
Municipio/Distrito		Localidad/Comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente

Apellidos y Nombres			
20. Tipo de Documento de identidad	**21. Número del documento de identidad**	**22. Sexo**	**23. Fecha de Nacimiento**
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]	

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados

24.	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

25.	Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo		28. Fecha de nacimiento
			Femenino	Masculino	
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

Datos complementarios

29.	Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad			Condición	
			Tipo F	N	M	T	P
B1							
B2							
B3							
B4							
B5							

32.	Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urban	Zona Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado (a registrar por la EPS)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS			Código de la IPS (a registrar por la EPS)
C			
B	1		
B	2		
B	3		
B	4		

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón	36. Tipo de Documento de identidad	37.Número del documento de identificación	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
CONSORCIO VIAS OE 2021	NI	901581118	Empleador

39. Ubicación				
CALLE PRINCIPAL ZONA	6649696	contabilidadconsorcioviasoe@gmail.com	SINCELEJO	SUCRE
Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento

mutualser
Atención sin tanta vuelta
NIT 806.008.394-7

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código [ ]
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [ ] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- [ ] 10. Terminación de relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [x] 13. Movilidad: [x] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Tipo de documento de identidad		Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha
[ ]		Femenino [ ] Masculino [ ]		0 2 0 7 2 0 2 4

EPS anterior	44. Motivo de Traslado Código [ ]	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- [x] 46. Declaraciones de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [x] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [x] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [x] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [x] 51. Autorización para que que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [x] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o de cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [x] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación, colectiva institucional o de Oficio

IX. ANEXOS

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC
  Cantidad: 0 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0 Total 0
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN			68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
Código del municipio	Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel		

70. Datos del funcionario que realiza la validación		
Tipo documento de identidad [ ]	Número del documento de identidad	71. Firma del funcionario

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capitulo VII del formulario

MANÁ CONSTRUCCIONES	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, REUNIONES E INDUCCION	CÓDIGO: F-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 10/05/2024

TEMA	Inducción SST
EXPOSITOR(A)	Jair Mendoza Ac.
FECHA Y HORA	17/06/24
LUGAR	Parque Corozal

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	FIRMA
1	Josadvis Diaz M	92. 554.759	Jo. Diz
2	Heriberto Hernandez O	1.103.858.188	
3	Cristian Gonzalez	1005.583.484	Cristian G.
4	Oscar Ivan Medina P	92552308	
5	Daguid Rodriguez	7591892	Daguid.
6	Heberlades Velasquez	72509324	
7	Juan C. Gomez	92517006	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

MANÁ CONSTRUCCIONES	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, REUNIONES E INDUCCION	CÓDIGO: F-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 10/05/2024

TEMA	Prevencion de AT
EXPOSITOR(A)	Jose Prado Km.
FECHA Y HORA	25/06/24
LUGAR	Parque Corozal

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	FIRMA
1	Jose Luis Diaz M.	92.554.159	
2	Dagoberto Hernandez O.	1.103.858.188	
3	Cristian Gonzalez	1.005.583.484	Cristian G.
4	Oscar Ivan Medina P.	92352308	
5	David Rodriguez	1503842	David
6	Alcibiades Velasquez	92509324	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			



MANÁ CONSTRUCCIONES	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, REUNIONES E INDUCCION	CÓDIGO: F-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 10/05/2024

TEMA	Gestion Ambiental
EXPOSITOR(A)	Jose Tamara — Jose Mercado
FECHA Y HORA	26/07/2024 7: AM
LUGAR	PARQUE COLINA

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	FIRMA
1	Jose Luis Diaz M	92554139	Jose Diaz
2	Oscar Gonzalez	1005583484	
3	Dalvis Bolivar	71577892	
4	Abelardo Velasquez	1250924	
5	Juan Gomez	92517066	
6	Alberto Heredia D	1103858188	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

MANÁ CONSTRUCCIONES	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, REUNIONES E INDUCCION	CÓDIGO: F-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 10/05/2024

TEMA	Gestion Ambiental
EXPOSITOR(A)	Jose Tamayo — Jose Mercado
FECHA Y HORA	26/07/2024 7 AM
LUGAR	PARQUE COCUSAL

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	FIRMA
1	Jose Luis Diaz M	92554119	Jose Diaz
2	Oscar Gonzalez	1005583484	
3	Dalvis Rodriguez	75778892	
4	Abelardo Velasquez	12509324	
5	Juan Gomez	92517066	
6	Alberto Heredia D	1103858188	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

MANÁ CONSTRUCCIONES	FORMATO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES, REUNIONES E INDUCCION	CÓDIGO: F-01
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 10/05/2024

TEMA	Manejo de cargas.
EXPOSITOR(A)	Jose Murillo Ln.
FECHA Y HORA	22/07/2024.
LUGAR	Parte Lateral campamento

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° IDENTIFICACION	FIRMA
1	José Luis Díaz	9255419	Jose Diaz
2	Cristian Gonzalez	1005583414	Cristian G.
3	Oscar Juan Medina	92552308	
4	David Rodriguez	7597892	
5	Alberto Vergara	92509324	
6	Juan E. Gomez	92517006	Juan E. J.
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

MANÁ CONSTRUCCIONES

REGISTRO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

F-06

VERSION 01

FECHA	NOMBRE	DOCUMENTO IDENTIDAD	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (ANOTAR EN LA CASILLA LA CANTIDAD ENTREGADA)															FIRMA DEL TRABAJADOR
			PROTECCION RESPIRATORIA	GAFAS DE SEGURIDAD	PROTECTOR AUDITIVO	GORRO	CASCO	TAPA BOCAS N95	DELANTAL	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE LATEX	CALZADO	OTROS	SUMINISTRO	REPOSISCION		
24-06-2024	DAVID RODRIGUEZ DIAZ	7'597.892		X			X				X							David R
24-06-2024	JOSE LUIS DIAZ MARTINEZ	92'551.959		X			X				X							Jose Diaz
24-06-2024	CRISTIAN GONZALEZ C.	1.005.583 484		X			X				X							Cristian G.
24-06-2024	DIEGOBERTO HERNANDEZ	1.103 858.188		X			X				X							Diegoberto Hernandez
24-06-2024	OSCAR HOYOS	92'552.308		X			X				X							

DECLARO QUE HE RECIBIDO LA INFORMACION NECESARIA PARA EL USO ADECUADO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL, EN LAS MISMA FORMA EN COMO ME COMPROMETO A CUIDARLOS, PRESERVARLOS Y USARLOS DURANTES MIS JORNADAS LABORALES. EL USO NO ADECUADO DE LOS ELEMENTOSDE PROTECCION INDIVIDUAL O MAL USO POR PARTE DEL EMPLEADO SOBREVINIENDO UN EVENTO NO DESEADO EXONERA A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

Powered by CamScanner

DISTRIBUCIONES
Y DOTACIONES R.A.C

FICHA TÉCNICA

BOTAS DE SEGURIDAD DIELÉCTRICAS RAC 620

Características:

Botín en cuero diseñado especialmente para calzado de seguridad industrial.

Con puntera en composite y suela en poliuretano bidensidad con capacidad dieléctrica.

Disponible en color negro. tallas: 34-45.





Materiales:

Cuero mocasin mate curtido al cromo.
Espesor 1.8 a 2.0 mm
Resistente al desgarre de 120n.
Deteriodo a la abrasión.
Resistente a fluidos y a la humedad.



Puntera:

Puntera de fibra de vidrio Composite.

Cordones:

En Poliéster de 1.00 m.

Hilo:

100 % Nylon con una resistencia de 9400 gr y 470 por 3 - 1440
Multifilamento continuo.
Resistente a la humedad y con elasticidad moderna.



Ojálete:

En Plástico.

Suela:

Poliuretano bidensidad de inyección directa al corte.
Antideslizante, que garantiza absorción de impacto.
Resistente a hidrocarburos con capacidad dieléctrica.
Prueba de tensión aplicada (Kv - 18.02).
Corriente de fuga: 0.29.
Tiempo: 60.
Disrupción: No.
Corriente por arriba del máximo: No.



Garantía:

4 meses en condiciones normales de trabajo.

Prueba de dieléctricidad:

Universidad Nacional, Universidad del valle.


Prueba aplicada:

Tensión con medida de corriente de fuga.

3M (ANSI Z89.1 – 2003)

Casco de Seguridad 3M

Modelo Americana c/Mega Ratchet

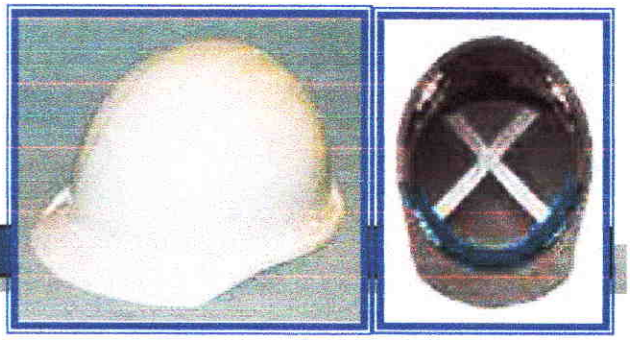

Hoja Técnica

Descripción

El casco de seguridad 3M es más que un simple equipo de protección individual.

Está aprobado para la protección de la cabeza contra peligros de impacto y penetración, así como de descargas eléctricas.

El casco de seguridad 3M Americana brinda mayor seguridad y confort al usuario gracias a su peso reducido y tamaño ideal, así como características tales como bandas de nylon en sistema de cuatro puntos de suspensión, material absorbente de sudor, sistema ratchet para ajuste, etc.

Aplicaciones

El casco de seguridad 3M está sugerido para tareas que impliquen riesgo de caída vertical de objetos, instalaciones eléctricas expuestas, instalaciones con objetos sobresalientes, contacto con elementos a elevada temperatura, salpicadura de sustancias químicas, de acuerdo a la norma ANSI Z89.1-2003, en ambientes como los encontrados en:

- Minería, Petróleo y Gas
- Construcción
- Refinería
- Plantas químicas
- Industria de la madera
- Industria metal-mecánica
- Manufactura en general

Aprobaciones

Aprobado por la Occupational Safety and Health Administration **(OSHA)** de Estados Unidos; y la American National Standard Institute **(ANSI)** bajo la especificación de la norma **ANSI Z89.1-2003**, clase E, excediendo G y C.

Características

- Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano.
- Capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (Clase E).
- Posse banda de sudor recambiable.
- Posee canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras.
- Suspensión de 4 puntos con probada atenuación en la transmisión de energía.
- Sistema Mega-Ratchet (ajuste por perilla) que se adapta a diferentes diámetros de cabeza, permitiendo un adecuado ajuste para trabajos exigentes.
- Permite el acoplamiento de las orejeras 3M Peltor H9P3E, H7P3E y H10P3E, o de protector facial.
- De acuerdo a ANSI Z89.1-2003, incluye nombre de fabricante, norma, clase y tipo de casco en altorrelieve con el mismo material del casco. De la misma manera incluye la fecha de fabricación. Igualmente el laboratorio acreditado para prueba.
- Disponible en diferentes colores: blanco, azul, amarillo, verde, naranja.

Limitaciones de uso

Al igual que todo equipo de protección personal, los cascos de seguridad tienen límites de protección, por lo que la primera opción es controlar el riesgo en la fuente, evitando la exposición al mismo.

Se deberá revisar el buen estado del equipo antes de cada uso; un buen cuidado del mismo incluirá la no exposición a la intemperie por periodos largos (almacenamiento), ya que la radiación UV e IR podrían afectarlo.

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal, pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.


Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Para mayor información:

3M Perú S.A.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
Telf. 224-2728 Fax 224-3171
Contactos: Zona Norte: (044) 94937-5633 / (076) 97633-1236
Zona Centro: (01) 99751-0742 / (01) 98915-5208
Zona Sur: (054) 95937-5623 / (054) 95935-6834
Pág. Web: www.3m.com/occsafety / www.3m.com/mining/peru
E-mail: 3mperu@mmm.com

Colombia

División Salud Ocupacional
Gafas de Seguridad
Marco Negro
3M 1710T
05/06/2013

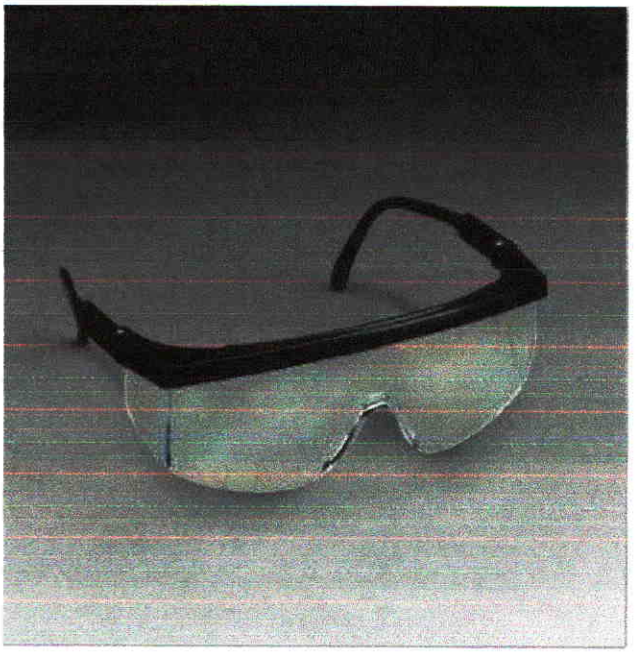

Hoja Técnica

Descripción

Lente de seguridad 3M **1710 T** claro antiempañante para la protección contra impacto. y rayos ultravioleta. Tratamiento anti ralladura. Marco en nylon liviano, con lentes laterales para mayor visibilidad. Cuatro posiciones de ajuste para mejor acoplamiento. Lentes transparentes en policarbonato. Cumple con las normas técnicas ANSI Z87.1. (Alto impacto)

Composición

Los lentes de seguridad 1710 de 3M(MR) cuentan con un marco liviano de color negro y micas transparentes. Son de estilo contemporáneo y cuentan con cuatro posiciones ajustables.

- Cumplen con la norma ANSI Z87.1-2003.

Especificaciones (Características Técnicas)

Cubrimiento lateral para mayor visibilidad, protección y la aceptación del usuario.

· Ofrece protección frente a impacto de partículas de alta velocidad.
· Protección contra la radiación UV.
· Construcción liviana.
· Tratamiento anti-rayadura para una mayor duración de los lentes y una mejora en la visión.

· Lentes en policarbonato, altamente resistentes al impacto.
· No son resistentes a salpicaduras de solventes químicos.
· Cumple con los requerimientos físicos y ópticos de la norma ANSI Z87.1. como protector de alto impacto.

Usos y Aplicaciones

En cualquier rubro de la industria donde exista riesgo de:
· Radiación UV
· Alto impacto

Instrucciones de Uso

Usar en situaciones que impliquen riesgo para los ojos tales como impacto y radiación UV.
· Este producto no es suministrado con ningún tipo de accesorios.
· Es importante que el producto sea almacenado correctamente, en una bolsa caja protectora.
· Realice un chequeo permanente a sus gafas para notar oportunamente defectos como raspaduras, perforaciones o cualquier otro daño físico que pueda reducir notablemente el nivel de protección a impacto con el que cuentan las gafas. En caso de ser así, el producto debe ser inmediatamente cambiado.
•

Precauciones y Primeros Auxilios

Las gafas no deben ser utilizadas con marcos formulados, ya que existe la posibilidad que cualquier impacto pueda ser transmitido a estos, lo que puede llegar a ser un riesgo para el portador.
· Mantenga el producto alejado de solventes, vapores orgánicos y materiales corrosivos, ya que estos pueden reducir significativamente la protección al impacto.
· Almacene el producto a Temperaturas entre 5°y 40℃.

Vida Util del Producto

Notas Especiales

Limpieza:

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Deben limpiarse con un paño suave no abrasivo, preferiblemente humedecido en agua y deben dejarse secar a temperatura ambiente.
Puede también utilizarse un paño específico para la limpieza de oculares. No utilizar sustancias tales como gasolina, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos.

Notas:

· Para prevenir lesiones oculares graves, consulte al personal de seguridad o a su supervisor para cerciorarse de estar usando la protección adecuada para los ojos.
· Antes de ser usado, se debe determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Advertencias:

· Los lentes oscuros de policarbonato no se deben usar cuando se realizan trabajos de

soldadura, fundición o cualquier otro trabajo en donde los ojos estén expuestos a niveles dañinos de radiación.

Condiciones de Transporte

NOTAS:	**Datos Técnicos :**	Todas las propiedades físicas y recomendaciones están basadas en pruebas que se consideran representativas, sin embargo, no implican garantía alguna.
	Uso del Producto :	El usuario es responsable de la determinación del uso particular del producto y su método de aplicación, 3M DESCONOCE CUALQUIER GARANTIA EXPRESA O IMPLICITA O AJUSTES PARA PROPOSITOS PARTICULARES.
	Indemnizaciones :	Este producto ha sido probado en cuanto a defectos. 3M se compromete únicamente a reemplazar la cantidad de producto que se comprueba defectuoso ó la devolución del dinero a precio de compra.
	Limite de Responsabilidad :	3M no se hace responsable por daños directos , indirectos o incidentales o consecuentes derivados del uso indebido, negligencia, estricta responsabilidad o cualquier otra teoría legal Las anteriores responsabilidades no podrán ser cambiadas excepto mediante algún acuerdo escrito, firmado por alguna persona de 3M

3M BOGOTA
Avenida El Dorado No. 75-93; Tel: 4161666 - 4161655; Fax: 4161677

3M BARRANQUILLA

3M MEDELLIN

3M CALI

Nit: **860.002.693-3**
Consulte Más Información en Nuestro Web Site **http://www.3m.com.co**
Tambien puede contactarnos a través de Nuestro PBX : **4108555**
Desde fuera de Bogotá totalmente gratis a la línea: **018000113636 o 018000113M3M**

© 3M 2006. Todos los Derechos Reservados.

DISTRIBUCIONES
Y DOTACIONES R.A.C

FICHA TÉCNICA
GUANTES DE VAQUETA REFORZADOS

Características:

Fabricados con vaqueta sencilla flexible, con refuerzo de cuero en la palma. Protegen las manos en actividades donde hay exposición a manipulación de elementos pesados, cargas, fresadores, etc.

Materiales:

Vaqueta de cuero de res. (vacuno), curtido al cromo color amarillo.
Hilo: poliester calibre 30, **Medida**: 21 - 24 cm.

Aplicaciones:

Procesos de soldadura, contacto con superficies calientes moderadas, abrasión, corte, penetración, manipulacion de herramientas pesadas, construcción, obras.

Instrucciones de uso:

Colocación:

1) Posicione el equipo en forma en que el puño esté frente a los dedos de la mano.
2) Proceda a pasar por el puño los dedos, tirando con la otra mano el puño hacia el antebrazo, hasta pasar totalmente la mano.
3) Ajuste los dedos acondicionando el equipo a la mano.

Retiro:

Evitar que la piel de la mano tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.

Reposición:

El equipo de protección personal requerirá ser cambiado cuando termine su vida útil, o cuando ya no ofrece garantías por el desgaste o saturación por las maniobras realizadas. El tiempo de vida útil esta determinado por parámetros como (La operación, el nivel de riesgo, el tiempo de exposición y la forma de uso y/o abuso del EPP.

Almacenamiento:

Se recomienda que durante su almacenamiento no se expongan o estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

Restricciones:

Prohibido estrictamente su uso en tareas con riesgos químicos (álcalis, ácidos, etc, eléctricos, con exceso de humedad.

Limpieza:

Puede ser lavado por un proceso de limpieza industrial.



Precauciones:

No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva y en operaciones con riesgos químicos y eléctricos.
No se deberá usar esté equipo si está mojado, húmedo, roto o descosido ya que se atentaría contra la seguridad personal del usuario.
No usarse en operaciones no recomendadas en el análisis de riesgo, se deberá, consultar al departamento de seguridad de la empresa para diagnosticar y validar sus aplicaciones y usos en forma adecuada

Limitaciones:

Esté EPP es una especialidad por lo que no se deberá considerar como de uso general, ya que está limitado para proteger únicamente de Chispas de soldadura que salen proyectadas a la región del pecho y Abdomen. La utilización en operaciones donde exista otro tipo de riesgo puede causar lesiones, ser obstáculo en las actividades operaciones y / o deteriorar prematuramente o hasta inutilizar el equipo.
El diseño del equipo otorga protección únicamente el brazo (no las manos)

Revisiones:

Una vez que sea verificado que el equipo es confiable para la siguiente jornada de trabajo deberá ser conservado en un lugar libre de riesgos del medio ambiente, evitar almacenar junto con equipos y ropa de trabajo nuevo, alimentos y herramientas.

Disposicion final:

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.
El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.
La determinación en la disposición final es responsabilidad del depto. De ecología de la empresa, el usuario final, deberá considerar el cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

Detalles:

Marca: RAC. **Color:** Gris. **Empaque:** unidad por empaque.
Talla: Unica.

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST - FORMATO INSPECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO	F-03 Versión: 01 10/05/2024 Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 24/09/2024	Hora: 8:00 AM	Area	OPERATICA : PARQUE COROZAL
Inspección realizada por:		Nombre responsable del area:	

LISTA DE CHEQUEO							
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE				OBSERVACIONES
		Buena	Regular	Malo	No Aplica	
1	**PELIGROS FISICOS**					
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural.	X				
1.2	Las luminarias están en buen estado.	X				
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado.				X	
1.4	Hay buena ventilación en el área.	X				
1.5	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db).	X				
1.6	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador).	X				
1.7	La temperatura es confortable.	X				
2	**PELIGROS LOCATIVOS**					
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado).	X				
2.2	Escaleras /rampas en buen estado (paso manos, antideslizantes).	X				
2.3	Pisos en buen estado.	X				EN CAMPAMENTO ORGAIZADO
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas).				X	
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras).	X				
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc).	X				
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito.	X				
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?				X	
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones.				X	
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**					
3.1	Cables eléctricos debidamente entubados.	X				
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado.	X				
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	X				
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga.	X				
3.5	Cables en buen estado.	X				
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados.	X				
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos.	X				
3.8	Existe señalización de peligros.	X				

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST - FORMATO INSPECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO	F-03 Versión: 01 10/05/2024

4	**PELIGROS DE SEGURIDAD**					
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área.	X				
4.2	Extintores de carga vigente.	X				
4.3	Extintores libre de obstaculos.	X				
4.4	Existe señalización de extintores.	X				
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia.	X				
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X				
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).	X				
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	X				
4.9	Hay botiquin y control de consumo.		X			
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencia a la mano?.	X				
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X				
5	**PELIGROS BIOLOGICOS**					
5.1	El area esta libre de insectos y roedores.	X				
6	**PELIGROS BIOMECANICO**					
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	X				
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador o comando o plano de trabajo respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	X				
6.3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base	X				
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los limites permisibles	X				
7	**ORDEN Y ASEO**					
7.1	El área se encuentra organizada.	X				
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta.	X				
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X				
7.4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X				
8	**SANEAMENTO BASICO**					
8.1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza.	X				
8.2	Luminarias de baños en buen estado.				X	
8.3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	X				
8.4	Estan los inodoros limpios en buen estado.	X				
8.5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.				X	

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST - FORMATO INSPECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO	F-03 Versión: 01 10/05/2024

9	**PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)**					
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado				X	
9,2	Archivo en buen estado				X	
10	**PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)**					
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X				
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X				
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente , Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X				
10,4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X				
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X				

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	No aplica	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Horno microondas. (Si aplica)				X	
	Nevera. (Si aplica)				X	
	Cafetera. (Si aplica)				X	
	Aire Acondicionado. (Si aplica)				X	
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)				X	
	Computador. (Si aplica)				X	
	Otro.				X	
11.2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia.				X	
	El area cuenta con las Hojas de seguridad.				X	
	Otro.				X	

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

	FORMATO INSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CÓDIGO	F-20
NIANÁ CONSTRUCCIONES		VERSIÓN	01
		FECHA	10/05/2024

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN						DESCRIPCIÓN
		GAFAS	GUANTES	BOTAS	MASCARILLA	CASCO	OTRO	
José Luis Diaz	Auxiliar	OK	OK	OK	NA	OK		
Juan Gomez	Auxiliar Mantto	OK	OK	OK	NA	OK		
David Rodriguez	Auxiliar	OK	OK	OK	NA	OK		
Oscar Ivan Medina	Auxiliar	OK	OK	OK	NA	OK		
Rafael Hernando	Auxiliar	OK	OK	NA	NA	OK		Orden pos-covid
Alfredo Velazquez	AUX.	OK	OK	OK	OK	OK		

RESPONSABLE	CARGO	FECHA
José Mendoza	RSST	27/06/24

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST - FORMATO INSPECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO	F-93 Versión: 01 10/06/2014 Página 1 de 1

Fecha de inspección: 27/06/14	Hora: 8:00AM	Area	Parqueadero (operativo)
Inspección realizada por: José Mercado.		Nombre responsable del area	Juan Bonet

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CUMPLE				OBSERVACIONES
		Bueno	Regular	Malo	No Aplica	
1	**PELIGROS FISICOS**					
1.1	Existe buena iluminacion artificial y natural	✓				
1.2	Las luminarias están en buen estado	✓				
1.3	Las persianas, cortinas o protección de vidrios esta en buen estado				✓	
1.4	Hay buena ventilación en el área	✓				
1.5	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales inferiores a 85 db)	✓				
1.6	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador)	✓				
1.7	La temperatura es confortable	✓				Hidratacion
2	**PELIGROS LOCATIVOS**					
2.1	Los muros estan en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado)	✓				
2.2	Escaleras, rampas en buen estado (pasa manos, antideslizantes)				✓	
2.3	Pisos en buen estado	✓				
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas)				✓	
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras)	✓				en campamento OK.
2.6	Areas de circulación despejadas (escaleras, zonas de transito en almacen, etc)	✓				
2.7	Están claramente demarcadas las Áreas de trabajo y rutas de tránsito		✓			optimotes externo. Segun PMT
2.8	En general se observan las sillas en buen estado?	✓				
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones					
3	**PELIGROS ELÉCTRICOS**					
3.1	Cables eléctricos debidamente aislados	✓				
3.2	Los empalmes o conexiones estan en buen estado	✓				
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	✓				
3.4	Se observa cajas o toma corriente sin sobrecarga				✓	
3.5	Cables en buen estado	✓				
3.6	Los tableros, cajas y circuitos estan identificados				✓	
3.7	Los tableros y cajas estan libres de obstáculos				✓	
3.8	Existe señalización de peligros	✓				(P).



MANA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST - FORMATO INSPECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO	F-03 Version: 01 10/10/2024

4	**PELIGROS DE SEGURIDAD**					
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área	✓				
4.2	Extintores de carga vigente		✓			Falta (1) Señalizar.
4.3	Extintores libre de obstáculos	✓				
4.4	Existe señalización de extintores	✓				
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia	✓				
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	✓				Señalizar
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP).					
4.8	Hay camilla en el área. (Solo si es necesaria).	✓				
4.9	Hay botiquín y control de consumo	✓				
4.10	Se tiene la lista de teléfonos de emergencias a la mano?	✓				
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	✓				
5	**PELIGROS BIOLOGICOS**					
5.1	El area esta libre de insectos y roedores		✓			
6	**PELIGROS BIOMECANICO**					
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	✓				
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador o comando o plano de trabajo respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentre a la misma altura de los ojos del trabajador)	✓				
6.3	Silla en buenas condiciones, espaldar, asiento, patas o base				✓	
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permitidos	✓				
7	**ORDEN Y ASEO**					
7.1	El área se encuentra organizada	✓				Marco es combas por Ing. Ambiental.
7.2	Se realiza la clasificación de residuos sólidos en forma correcta	✓				
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas	✓				
7.4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento	✓				
8	**SANEAMIENTO BASICO**					
8.1	Servicios higiénicos en buen estado y limpieza	✓				
8.2	Luminarias de baños en buen estado	✓				
8.3	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa	✓				
8.4	Estan los inodoros limpios en buen estado	✓				
8.5	Se tienen regaderas o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios	✓				



	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST - FORMATO INSPECCIÓN DE AREAS DE TRABAJO	F-63 Versión: 01 1/09/2024

9	PELIGRO MECANICO (HERRAMIENTAS DE OFICINA)					
9,1	Equipos y herramientas de oficina en buen estado	✓				
9,2	Archivo en buen estado	✓				
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)					
10,1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad	✓				
10,2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos	✓				
10,3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral	✓				
10,4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	✓				
10,5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP	✓				

11	MEDIO AMBIENTE	BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	No aplica	OBSERVACIONES
11,1 Agua y energía	Horno microondas (Si aplica)				✓	
	Nevera (Si aplica)				✓	
	Cafetera (Si aplica)				✓	
	Aire Acondicionado (Si aplica)				✓	
	Impresora / fotocopiadora (Si aplica)				✓	
	Computador (Si aplica)				✓	
	Otro				✓	
11,2 Sustancias químicas	El area cuenta con las tarjetas de emergencia				✓	
	El area cuenta con las Hoja de seguridad				✓	
	Otro				✓	

OBSERVACIONES

Firma responsable inspección

Firma responsable del area o COPASST

SGSST MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

MX-01
VERSION 00
28/03/2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 17/06/2022 | RESPONSABLE: JOSE MERCADO ROA | PERIODO CORTE:

PROCESO	ACTIVIDAD/ CARGO	RUTINARIA O NO-RUTINARIA	PELIGRO		EFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES			EVALUACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS PARA ESTABLECER CONTROLES			MEDIDAS DE INTERVENCIÓN				
			DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN		Fuente	Medio	Persona								No. EXPUESTOS	PEOR CONSECUENCIA	EXISTENCIA REQUISITO LEGAL ESPECIFICO ASOCIADO (SI o NO)	Eliminación	Sustitución	Cabinas de Ingeniería	Cambios administrativos, señalizaciones, advertencias	Equipos y EPP
ADMINISTRATIVO	GERENCIA	RUTINARIA	CONDICIONES DE LA TAREA	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, CANSANCION, IRRITABILIDAD, TENSION MUSCULAR	PROGRAMA PSICOSOCIAL	AREA DE TRABAJO CON BUENAS CONDICIONES DE ILUMINACION, VENTILACION Y NO RUIDO	DESCANSOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, CAPACITACIONES	2	3	B	Medio	25	150	B	Aceptable	10	ANSIEDAD Y DEPRESION	SI				Elaborar Programa de riesgo Psicosocial	
		RUTINARIA	CARGA ESTATICA SENTADO	BIOMECANICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR, ESTRÉS	SILLA ERGONOMICA	INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	10	HERNIA DISCAL	SI				Program de Riesgo Biomecanico	
		RUTINARIA	POSTURAS CRITICAS	BIOMECANICO	DOLORES ARTICULARES, TUNEL DEL CARPO		INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	10	HERNIA DISCAL	SI				Program de Riesgo Biomecanico	
		Programa de Riesgo Biomecanico	RIESGO PUBLICO	DE SEGURIDAD	HERIDAS, GOLPES, ESTRÉS		SISTEMA DE LOCALIZACION - GPS	CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	2	4	B	Medio	10	80	A	Aceptable	10	HERIDAS GRAVES	SI					
		RUTINARIA	DE TRANSITO	DE SEGURIDAD	HERIDAS, GOLPES, ESTRES		SISTEMA DE LOCALIZACION - GPS	CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	2	4	B	Medio	10	80	A	Aceptable	10	HERIDAS GRAVES	SI				Program de seguridad Vial	
		RUTINARIA	CONDICIONES DE LA TAREA	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, CANSANCION, IRRITABILIDAD, TENSION MUSCULAR		AREA DE TRABAJO CON BUENAS CONDICIONES DE ILUMINACION, VENTILACION Y NO RUIDO	DESCANSOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS, CAPACITACIONES	2	4	B	Medio	10	80	A	Aceptable	10	ANSIEDAD Y DEPRESION	SI				Elaborar Programa de riesgo Psicosocial	
		RUTINARIA	CARGA ESTATICA SENTADO	BIOMECANICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR, ESTRÉS	SILLA ERGONOMICA	INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO		2	4	B	Medio	10	80	A	Aceptable	10	HERNIA DISCAL	SI					
	AREA DE ADMINISTRATIVOS (TALENTO HUMANOS, TESORERIA, JEFES)	RUTINARIA	CARGA ESTATICA SENTADO	BIOMECANICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR, ESTRÉS	SILLA ERGONOMICA	INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO		2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	10	HERNIA DISCAL	SI					
		RUTINARIA	POSTURAS CRITICAS	BIOMECANICO	DOLORES ARTICULARES, TUNEL DEL CARPO		INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	10	HERNIA DISCAL	SI					
		RUTINARIA	CONDICIONES DE LA TAREA	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, CANSANCION, IRRITABILIDAD, TENSION MUSCULAR			DESCANSOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	10	ANSIEDAD Y DEPRESION	SI				Elaborar Programa de riesgo Psicosocial	
		RUTINARIA	RIESGO PUBLICO	DE SEGURIDAD	HERIDAS, GOLPES, ESTRÉS		ACOMPAÑAMIENTO POR PERSONAL DE LA ZONA	ACOMPAÑAMIENTO POR PERSONAL DE LA ZONA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	10	HERIDAS GRAVES	SI					
		RUTINARIA	MECANICO	DE SEGURIDAD	GOLPES, CONTUCIONES, ATRAPAMIENTOS FRACTURAS Y TRAUMAS		REALIZACION DE ASEO RUTINARIO / SEÑALIZACION		2	4	B	Medio	10	80	A	Aceptable	10	FRACTURAS	SI					
		RUTINARIA	RADIACIONES NO IONIZANTES	FISICO	CANSANCION VISUAL, CEFALEA	MONITORES CON FILTRO			2	4	B	Medio	10	80	A	Aceptable	10	CEFALEA	SI					
	SUPERVISORES Y JEFES	RUTINARIA	CONDICIONES DE LA TAREA	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, CANSANCION, IRRITABILIDAD, TENSION MUSCULAR			DESCANSOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS	2	4	B	Medio	10	80	A	Aceptable	4	ANSIEDAD Y DEPRESION	SI				Elaborar Programa de riesgo Psicosocial	
		RUTINARIA	LOCATIVO	DE SEGURIDAD	CHOQUE, GOLPES, HERIDAS, FRACTURAS	PROCEDIMIENTO DE ESPACIOS CONFINADOS	INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP	6	4	M	Muy Alto	25	600	I	No Aceptable	4	MUERTE	SI			Establecer Areas de vida o trabajo	Emplear permisos de trabajo, curso de trabajo en alturas	Uso de Cuestonadores de Oxigeno
		RUTINARIA	MATERIAL PARTICULADO	QUIMICO	ASMA, EPOC, ENFERMEDADES RESPIRATORIAS		MEDICIONES AMBIENTALES	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP	2	4	B	Medio	60	200	B	Aceptable	4						EXAMENES OCUPACIONALES CON ESPIROMETRIA	
		RUTINARIA	RADIACIONES NO IONIZANTES	FISICO	CALOR, DESHIDRATACION, CANSANCIO, FATIGA			HIDRATACION	2	4	B	Medio	10	80	A	Aceptable	4	GOLPE DE CALOR	SI					
		RUTINARIA	LOCATIVO	DE SEGURIDAD	CHOQUE, GOLPES, CONTUCIONES Y FRACTURAS, MUERTE	MANTENIMIENTON DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ASEO RUTINARIO DEL AREA	CAPACITACION EN ORDEN Y ASEO	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	4	FRACTURAS	SI					
		RUTINARIA	CARGA ESTATICA	BIOMECANICO	ESTRÉS, LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR, CALAMBRES				2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	4	HERNIA DISCAL	SI					

	RUTINARIA	CARGA DINAMICA	BIOMECANICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR			CHARLAS MANEJO DE CARGAS	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	4	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	RIESGO PUBLICO	DE SEGURIDAD	HERIDAS, GOLPES, ESTRES		ACOMPAÑAMIENTO POR PERSONAL DE LA ZONA	ACOMPAÑAMIENTO POR PERSONAL DE LA ZONA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	4	HERIDAS GRAVES	SI						
	RUTINARIA	PICADURAS Y MORDEDURAS DE ANIMALES	BIOLOGICO	SHOCK ANAFILACTICO, ALERGIAS, EDEMAS, HERIDAS EN PIEL, HEMORRAGIAS		INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP	6	2	12	Alto	25	300	B	Aceptable	4	choque anafilactico	SI						
	RUTINARIA	RADIACIONES NO IONIZANTES	FISICO	CALOR, DESHIDRATACION, CANSANCIO, FATIGA			HIDRATACION	2	4	B	Medio	10	80	M	Aceptable	4	GOLPE DE CALOR	SI						
AUXILIAR AMBIENTAL	RUTINARIA	LOCATIVO	DE SEGURIDAD	CAIDAS, GOLPES, CONTUSIONES Y FRACTURAS, MUERTE	MANTENIMIENTOM DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ASEO RUTINARIO DEL AREA SEÑALIZACION	CAPACITACION EN ORDEN Y ASEO	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	1	FRACTURAS	SI						
	RUTINARIA	CARGA ESTATICA	BIOMECANICO	ESTRES, LUMBALGIA, TENSION MUSCULAR, CALAMBRES				2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	1	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	BIOMECANICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR, SINDROME DEL TUNEL DEL CRIPO			PAUSAS ACTIVAS	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	1	SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO	SI						
	RUTINARIA	CONTENIDO DE LA TAREA	PSICOSOCIAL	ESTRES CEFALEA TENSION MUSCULAR GASTRITIS		COMITE DE CCL	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP PAUSAS ACTIVAS	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	1	ANSIEDAD Y DEPRESION	SI				Elaborar Programa de riesgo Psicosocial		
	RUTINARIA	MECANICO	DE SEGURIDAD	GOPES, CONTUSIONES, ATRAPAMIENTOS FRACTURAS Y TRAUMAS		INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP	6	2	12	Alto	25	300	B	Aceptable	1	Hepatitis B	SI						
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RUTINARIA	LOCATIVO	DE SEGURIDAD	CAIDAS, GOLPES, CONTUSIONES Y FRACTURAS, MUERTE	MANTENIMIENTOM DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ASEO RUTINARIO DEL AREA SEÑALIZACION	CAPACITACION EN ORDEN Y ASEO	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	2	FRACTURAS	SI						
	RUTINARIA	CARGA ESTATICA	BIOMECANICO	ESTRES, LUMBALGIA, TENSION MUSCULAR, CALAMBRES				2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	2	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	MOVIMIENTOS REPETITIVOS	BIOMECANICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR SINDROME DEL TUNEL DEL CRIPO			PAUSAS ACTIVAS	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	2	SINDROME DEL TUNEL DEL CARPO	SI						
	RUTINARIA	CONTENIDO DE LA TAREA	PSICOSOCIAL	ESTRES CEFALEA TENSION MUSCULAR GASTRITIS		COMITE DE CCL	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP PAUSAS ACTIVAS	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	2	ANSIEDAD Y DEPRESION	SI				Elaborar Programa de riesgo Psicosocial		
	RUTINARIA	MECANICO	DE SEGURIDAD	GOPES, CONTUSIONES, ATRAPAMIENTOS FRACTURAS Y TRAUMAS		INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP	6	2	12	Alto	25	300	B	Aceptable	2	Hepatitis B	SI						
SOLDADOR	RUTINARIA	LOCATIVO	DE SEGURIDAD	CAIDAS, GOLPES, CONTUSIONES Y FRACTURAS, MUERTE	MANTENIMIENTOM DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ASEO RUTINARIO DEL AREA	CAPACITACION EN ORDEN Y ASEO	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	5	FRACTURAS	SI						
	RUTINARIA	MANEJO DE CARGA	BIOMECANICO	LUMBALGIAS, HERNIAS DISCALES		MANEJO MECANICO DE CARGA	CAPACITACIONES	2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	5	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	CARGA ESTATICA	BIOMECANICO	ESTRES, LUMBALGIA, TENSION MUSCULAR, CALAMBRES				2	4	B	Medio	25	200	B	Aceptable	5	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	TRABAJO EN CALIENTE	FISICO	QUEMADURAS, CHOQUE ELECTRICO	MANTENIMIENTOM DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		CAPACITACIONES EPP	2	4	B	Medio	28	200	B	Aceptable	5	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	VAPORES Y GASES	QUIMICO	QUEMADURAS, CHOQUE ELECTRICO	MANTENIMIENTOM DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		CAPACITACIONES EPP	2	4	B	Medio	27	216	B	Aceptable	5	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	ELECTRICO	DE SEGURIDAD	QUEMADURAS, CHOQUE ELECTRICO	MANTENIMIENTOM DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		CAPACITACIONES EPP	2	4	B	Medio	28	224	B	Aceptable	5	HERNIA DISCAL	SI						

OPERATIVOS

	RUTINARIA	CARGA DINAMICA	BIOMECANICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR			CHARLAS MANEJO DE CARGAS	2	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	5	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	MECANICO	DE SEGURIDAD	GOPES, CONTUSIONES, ATRAPAMIENT DE FRACTURAS Y TRAUMAS		INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP	6	2	12	Alto	25	300	8	Aceptable	5	Hepatitis B	SI						
OPERADORES DE MAQUINAS,T DESCANSAR, SECRETARIA DE BASCULA	RUTINARIA	LOCATIVO	DE SEGURIDAD	CAIDAS, GOLPES, CONTUSIONES Y FRACTURAS, MUERTE	MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	ASEO RUTINARIO DEL AREA	CAPACITACION EN ORDEN Y ASEO	2	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	7	FRACTURAS	SI						
	RUTINARIA	MANEJO DE CARGA	BIOMECANICO	LUMBALGIAS, HERNIAS DISCALES		MANEJO MECANICO DE CARGA	CAPACITACIONES	3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	7	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	CARGA ESTATICA	BIOMECANICO	ESTRES, LUMBALGIS, TENSION MUSCULAR, CALAMBRES				3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	7	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	CARGA DINAMICA	BIOMECANICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR			CHARLAS MANEJO DE CARGAS	2	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	7	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	MECANICO	DE SEGURIDAD	GOPES, CONTUSIONES, ATRAPAMIENTOS FRACTURAS Y TRAUMAS		INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP	6	2	12	Alto	25	300	8	Aceptable	7	Hepatitis B	SI						
OPERADOR	RUTINARIA	EXPOSICION O CONTACTO CON VIRUS, BACTERIAS, HONGOS PARASITOS, PICADURA Y MORDEDURA DE ANIMALES	BIOLOGICO	ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS COVID-19		ORDEN Y ASEO	VACUNACION CAPACITACIONES EXAMENES OCUPACIONALES PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	8	COVID-19 ENVENENAMI ENTOPOS SERPIENTES	SI						
JEFE SOLDADOR	RUTINARIA	EXPOSICION O CONTACTO CON VIRUS, BACTERIAS, HONGOS PARASITOS, PICADURA Y MORDEDURA DE ANIMALES	BIOLOGICO	ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS COVID-19		ORDEN Y ASEO	VACUNACION CAPACITACIONES EXAMENES OCUPACIONALES PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	8	COVID-19 ENVENENAMI ENTOPOS SERPIENTES	SI						
	RUTINARIA	MECANICO	DE SEGURIDAD	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR, HERIDAS ATRAPAMIENTOS			DESCANSOS LEGALMENT ESTABLECIDOS	3	4	8	Medio	10	80	4	Aceptable	4	ANSIEDAD Y DEPRESION	SI						
	RUTINARIA	CONDICIONES DE LA TAREA	PSICOSOCIAL	ESTRÉS, CANSANCIO, IRRITABILIDAD, TENSION MUSCULAR			DESCANSOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS	3	4	8	Medio	10	80	4	Aceptable	4	ANSIEDAD Y DEPRESION	SI				Elaborar Programa de riesgo Psicosocial		
	RUTINARIA	LOCATIVO	DE SEGURIDAD	CAIDAS, GOLPES, HERIDAS, FRACTURAS	PROCEDIMIENTO DE ESPACIOS CONFINADOS	INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP	3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	1	MUERTE	SI			Establecer bases de vida o tripode	Emplear permisos de trabajo, curso de trabajo en alturas		Uso de Cuatrenadores de Oxigeno
CONDUCTOR Y AXULIAR DE RUTA	RUTINARIA	EXPOSICION O CONTACTO CON VIRUS, BACTERIAS, HONGOS PARASITOS, PICADURA Y MORDEDURA DE ANIMALES	BIOLOGICO	ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS COVID-19		ORDEN Y ASEO	VACUNACION CAPACITACIONES EXAMENES OCUPACIONALES PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	8	COVID-19 ENVENENAMI ENTOPOS SERPIENTES	SI						
CONDUCTOR Y AXULIAR DE RUTA	RUTINARIA	MECANICO	DE SEGURIDAD	ACCIDENTES DE TRANSITO, CAIDAS, GOLPES, CONTUSIONES, MUERTE	REVISION DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTOS		CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	4	FRACTURAS	SI						
	RUTINARIA	RIESGO PUBLICO	DE SEGURIDAD	ACCIDENTES DE TRANSITO, FRACTURAS, MUERTE	REVISION DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTOS		CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	4	HERIDAS GRAVES	SI						
	RUTINARIA	MANEJO DE VEHICULOS	DE SEGURIDAD	ACCIDENTES DE TRANSITO, FRACTURAS, MUERTE	REVISION DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTOS		CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	4	FRACTURAS	SI						
	RUTINARIA	POSTURAS CRITICAS	BIOMECANICO	DOLORES ARTICULARES, TUNEL DEL CARPO	REVISION DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTOS		CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	4	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	POSTURAS PROLONGADAS	BIOMECANICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR, ESTRES	REVISION DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTOS		CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	3	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	4	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	VIBRACIONES	FISICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR	REVISION DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTOS		CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	3	4	8	Medio	10	80	4	Aceptable	4	POLITRAUMA TISMO Y MUERTE	SI						
	RUTINARIA	CONDICIONES DE LA TAREA	PSICOSOCIAL	ESTRES, IRRITABILIDAD, CANSANCIO	REVISION DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTOS		DESCANSOS LEGALMENTE ESTABLECIDOS	3	4	8	Medio	10	80	4	Aceptable	4	ANSIEDAD Y DEPRESION	SI				Elaborar Programa de riesgo Psicosocial		
SERVICIOS GENERALES	RUTINARIA	POSTURAS PROLONGADAS DE PIE	BIOMECANICO	LUMBAGOS, TENSION MUSCULAR	[illegible]		CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	2	4	8	Medio	25	200	8	Aceptable	7	HERNIA DISCAL	SI						
	RUTINARIA	PICADURAS Y MORDEDURAS DE ANIMALES	BIOLOGICO	SHOCK ANAFILACTICO, ALERGIAS, ESCOZOR, HERIDAS EN PIEL, HEMORRAGIAS		INSPECCIONES DE AREAS DE TRABAJO	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP	6	2	12	Alto	25	300	8	Aceptable	1	choque anafilactico	SI						

		RUTINARIA	VIRUS, BACTERIAS, HONGOS, PARASITOS	BIOLOGICO	ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS - COVID-19		INSPECCIONES DE RIESGS DE TRABAJO	CAPACITACION, INDUCCION, ENTRENAMIENTO Y EPP	6	3	12	Alto	25	300			1	Hepatitis B	SI					
		RUTINARIA	LIQUIDOS, VAPORES	QUIMICO	QUEMADURAS, DERMATITIS POR CONTACTO, ASMA, ETC			CAPACITACIONES Y USO DE EPP	2	3	6	Medio	25	150			4	ASMA Y CANCER OCUPACIONAL	SI				EXAMENES OCUPACIONALES CON ESPIROMETRIA	
	TODO EL PERSONAL		RIESGO PUBLICO	DE SEGURIDAD	CAIDAS, GOLPES, FRACTURAS Y QUEMADURAS			ACCIDENTAMIENTO POR PERSONAL DE LA ZONA	2	4	8	Medio	25	200			20	HERIDAS GRAVES	SI					
	VISITAS A LAS INSTALACIONES Y AREA EN CONSTRUCCION		RIESGO PUBLICO	DE TRANSITO	ACCIDENTES DE TRANSITO, FRACTURAS, MUERTE			CAPACITACIONES, INDUCCION Y REINDUCCION	2	4	8	Medio	25	200			20	HERIDAS GRAVES	SI					
	VISITAS A LAS INSTALACIONES Y AREA EN CONSTRUCCION		MECANICO	DE SEGURIDAD	CAIDAS, GOLPES, HERIDAS, FRACTURAS	REVISION DE VEHICULOS/ MANTENIMIENTOS		ELEMENTS DE PROTECCION PERSONAL AL VISITANTE	2	4	8	Medio	25	200			20	FRACTURAS	SI					

Tabla 2. Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de deficiencia	ND	Significado
Muy Alto (MA)	10	Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Alto (A)	6	Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o ambos.
Medio (M)	2	Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es moderada, o ambos.
Bajo (B)	No se asigna valor	No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.

Tabla 3. Determinación del nivel de exposición

Nivel de exposición	NE	Significado
Continua (EC)	4	La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF)	3	La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional (EO)	2	La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE)	1	La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de Consecuencias	NC	Significado
		Daños Personales
Mortal o Catastrófico (M)	100	Muerte (s)
Muy grave (MG)	60	Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)
Grave (G)	25	Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L)	10	Lesiones que no requieren hospitalización

NOTA Para evaluar el nivel de consecuencias, tenga en cuenta la consecuencia directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548710	2	MANA CONSTRUCCIONES SAS	A	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	0111	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 5 NUMERO 7 7 CL REAL COLOSO		9632587		NOTIENE@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	8633347850	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.470.500	197.900	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	8633347850	2024-09-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN						SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7597892	RODRIGUEZ DIAZ DAVID JOSE	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
2	CC 15171005	CASTRO VANEGAS CIRO ARTURO	3.500.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	CCF DE SUCRE-CCF41	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S	1131201
3	CC 92509324	VELASQUEZ SIERRA ALCIBIADES	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
4	CC 92523825	CALONGE PIZZIRUSSO GIOVANNY	2.500.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.500.000	100.000	CCF DE SUCRE-CCF41	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	1131201
5	CC 92552308	MEDINA ARRIETA OSCAR IVAN	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
6	CC 92554159	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
7	CC 1005583484	GONZALEZ GONZALEZ CRISTIAN CAMILO	1.300.000	F															0				30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
8	CC 1103858188	HERNANDEZ DOMINGUEZ DAGOBERTO DE JESUS	1.300.000	F															0				30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548710	2	MANA CONSTRUCCIONES SAS	A	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	0111	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 5 NUMERO 7 7 CL REAL COLOSO		9632587			NOTIENE@GMAIL COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-08	2024-09	8633347850	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.470.500	197.900	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	8633347850	2024-09-04	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	2.208.000	0	102.200	0	2.310.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	976.000	0	45.100	0	1.021.100
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.024.000	0	47.400	0	1.071.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	9.700	0	217.700
EPS(Administradoras: 4)				8	552.000	0	25.800	0	577.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	140.000	0	6.500	0	146.500
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	4	208.000	0	9.700	0	217.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	152.000	0	7.100	0	159.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	52.000	0	2.500	0	54.500
ARP(Administradoras: 1)				8	960.600	0	44.400	0	1.005.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	960.600	0	44.400	0	1.005.000
CCF(Administradoras: 1)				8	552.000	0	25.500	0	577.500
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	8	552.000	0	25.500	0	577.500
Gran Total					4.272.600	0	197.900	0	4.470.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548710	2	MANA CONSTRUCCIONES SAS	A	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	0111	Juridica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
70-1	CR 5 NUMERO 7 7 CL REAL COLOSO		9632587			NOTIENE@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	8633347860	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.379.400	106.800	AvVillas
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
8	8633347860	2024-10-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 7597892	RODRIGUEZ DIAZ DAVID JOSE	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
2	CC 15171005	CASTRO VANEGAS CIRO ARTURO	3.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	3.500.000	560.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.500.000	140.000	CCF DE SUCRE-CCF41	3.500.000	140.000	3.500.000	243.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.083.600	S	1131201
3	CC 92509324	VELASQUEZ SIERRA ALCIBIADES	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
4	CC 92523825	CALONGE PIZZIRUSSO GIOVANNY	2.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.500.000	100.000	CCF DE SUCRE-CCF41	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	1131201
5	CC 92552308	MEDINA ARRIETA OSCAR IVAN	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
6	CC 92554159	DIAZ MARTINEZ JOSE LUIS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
7	CC 1005583484	GONZALEZ GONZALEZ CRISTIAN CAMILO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001
8	CC 1103858188	HERNANDEZ DOMINGUEZ DAGOBERTO DE JESUS	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.300.000	52.000	CCF DE SUCRE-CCF41	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	1711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901548710	2	MANA CONSTRUCCIONES SAS	A	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	0111	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
70-1	CR 5 NUMERO 7 7 CL REAL COLOSO		9632587			NOTIENE@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	8633347860	E	2024-11-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.379.400	106.800	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
8	8633347860	2024-10-03	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				8	2.208.000	0	55.200	0	2.263.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208.000	0	5.200	0	213.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	976.000	0	24.400	0	1.000.400
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.024.000	0	25.600	0	1.049.600
EPS(Administradoras: 4)				8	552.000	0	13.800	0	565.800
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	4	208.000	0	5.200	0	213.200
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	152.000	0	3.800	0	155.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	140.000	0	3.500	0	143.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	52.000	0	1.300	0	53.300
ARP(Administradoras: 1)				8	960.600	0	24.000	0	984.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	8	960.600	0	24.000	0	984.600
CCF(Administradoras: 1)				8	552.000	0	13.800	0	565.800
CCF DE SUCRE	CCF41	892200015	5	8	552.000	0	13.800	0	565.800
Gran Total					4.272.600	0	106.800	0	4.379.400
