ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA No. 2

CONTRATO No. 242 - 2025

TIPO DE CONTRATO: OBRA

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA : VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS.

SUPERVISOR: MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

PERÍODO A PAGAR: DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025. AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.

En Guaduas - Cundinamarca, a los DIEZ (10) días del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron el señor VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR Representante Legal de VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS con Nit. 901.617.488 – 8 , y la Arquitecta MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO Secreataria de Planeación en su calidad de Supervisora Delegada, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	COD	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA PARCIAL No. 1		PRESENTE ACTA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
				CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1		**PRELIMINARES**										
1.1	1,8	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	66,00	$ 32.738,00	$ 2.160.708,00	66,00	$ 2.160.708,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.2	1,41	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	102,30	$ 14.383,00	$ 1.471.381,00	74,43	$ 1.070.475,00	27,87	$ 400.906,00	0,00	$ -
1.3	1,1	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (SUMIDEROS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M3	2,01	$ 214.897,00	$ 431.943,00	0,00	$ -	2,01	$ 431.943,00	0,00	$ -
1.4	1,2	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0,00	$ 75.202,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2		**EXCAVACIONES, RELLENOS Y ENTIBADOS**										
2.1	2,8	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	364,50	$ 28.229,00	$ 10.289.377,00	224,0162550	$ 6.323.754,86	140,4804275	$ 3.965.622,14	0,00	$ -
2.2	2,9	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	30,69	$ 120.711,00	$ 3.704.621,00	19,53	$ 2.357.486,00	11,16	$ 1.347.135,00	0,00	$ -
2.3	2,5	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	78,68	$ 182.030,00	$ 14.322.120,00	50,75	$ 9.238.350,15	27,13	$ 4.938.145,85	0,80	$ 145.624,00
2.4	3,2	SUBBASE GRANULAR	M3	0,00	$ 202.174,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.5	2,3	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	89,30	$ 30.937,00	$ 2.762.612,00	56,83	$ 1.758.026,00	32,47	$ 1.004.586,00	0,00	$ -
2.6	2,2	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	42,00	$ 42.017,00	$ 1.764.714,00	24,00	$ 1.008.408,00	18,00	$ 756.306,00	0,00	$ -
3		**OBRAS DE ARTE**										
3.1	4,4	CONCRETOS f´c =3500 PSI (BASES)	M3	5,43	$ 803.220,00	$ 4.363.493,00	0,00	$ -	5,43	$ 4.363.493,00	0,00	$ -
3.2	4,5	CONCRETOS f´c =3500 PSI (ELEVACIONES)	M3	8,33	$ 962.513,00	$ 8.018.215,00	0,00	$ -	7,43	$ 7.151.472,00	0,90	$ 866.743,00
3.3	4,4	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	13,33	$ 344.404,00	$ 4.589.183,00	0,00	$ -	13,33	$ 4.589.183,00	0,00	$ -
3.4	4,52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1448,58	$ 8.494,00	$ 12.304.222,00	0,00	$ -	854,27	$ 7.256.143,53	594,31	$ 5.048.078,47
4		**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**										
4.1	3,28	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	0,00	$ 225.738,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2	4,1	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,00	$ 1.125.786,00	$ 1.125.786,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.125.786,00	0,00	$ -
4.3	4,2	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE	ML	3,00	$ 955.600,00	$ 2.866.800,00	0,00	$ -	3,00	$ 2.866.800,00	0,00	$ -
4.4	4,3	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,00	$ 1.119.287,00	$ 1.119.287,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.119.287,00
4.5	4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0,00	$ 10.980,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.6	4,1	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	0,00	$ 4.143.449,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5		**VARIOS**										
5.1	***	ASEO Y LIMPIEZA	M2	379,00	$ 2.961,00	$ 1.122.219,00	0,00	$ -	0,00	$ -	379,00	$ 1.122.219,00
		ÍTEMS NO PREVISTOS										
NP1		REJILLA EN ACERO 1.00 M PARA CAJAS DE INSPECCION	UN	3,00	$ 490.820,00	$ 1.472.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.472.460,00
NP2		TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20"	ML	66,00	$ 361.439,00	$ 23.854.974,00	42,00	$ 15.180.438,00	24,00	$ 8.674.536,00	0,00	$ -
		COSTOS DIRECTOS				**$ 97.744.115,00**		**$ 39.097.646,02**		**$ 48.872.057,52**		**$ 9.774.411,50**
		COSTOS INDIRECTOS				**$ 32.255.558,00**		**$ 12.902.223,19**		**$ 16.127.778,98**		**$ 3.225.555,80**
		ADMINISTRACIÓN		26%		$ 25.413.470,00		$ 10.165.387,96		$ 12.706.734,96		$ 2.541.346,99
		IMPREVISTOS		2%		$ 1.954.882,00	40,00%	$ 781.952,92	50,00%	$ 977.441,15	10,00%	$ 195.488,23
		UTILIDAD		5%		$ 4.887.206,00		$ 1.954.882,30		$ 2.443.602,88		$ 488.720,58
		AJUSTE AL PESO				$ -		$ -		$ -		$ -
		COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$ 129.999.673,00**		**$ 51.999.869,20**		**$ 64.999.836,50**		**$ 12.999.967,30**

Recibo 4-02-26 15:29pm Despacho

Archivar

Contratación

ACTA DE RECIBO PARCIAL

ACTA No. 2

CONTRATO No. 242 - 2025

TIPO DE CONTRATO: OBRA

OBJETO: MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA : VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS.

SUPERVISOR: MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO - SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

PERÍODO A PAGAR: DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025. AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.

En Guaduas - Cundinamarca, a los DIEZ (10) días del mes de DICIEMBRE del año 2025 se reunieron el señor VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR Representante Legal de VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS con Nit. 901.617.488 – 8 , y la Arquitecta MARÍA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO Secreataria de Planeación en su calidad de Supervisora Delegada, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO:	$	129.999.673,00	**V/R ANTICIPO:**	-
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO:	$	129.999.673,00	**% ANTICIPO :**	-
VALOR ADICIONES:	$	-	**% RETEGARANTIA**	-
V/R ACTUAL CONTRATO:	$	129.999.673,00		

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	N.A.	$ 51.999.869,20	40,00%	-	-	$ 51.999.869,20	
2	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	N.A.	$ 64.999.836,50	50,00%	-	-	$ 64.999.836,50	$ 12.999.967,30
	TOTAL		$ 116.999.705,70	90,00%	-	-	$ 116.999.705,70	$ 12.999.967,30

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.
NIT. No. 901.617.488 - 8.

EL SUPERVISOR:

Firma:
Nombre: ARQ. MARÍA ANGELICA MARTINEZ S.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

Nota:
* En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
* Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
* Si se presenta variación en algunos valores es por manejo de decimasles ocultos.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.			
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA						CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA		ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS						102,30		74,43	27,87	0,00
ITEM No.	DESCRIPCION						UNIDAD DE MEDIDA			LOCALIZACIÓN	
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION						M2			GUADUAS - CUNDINAMARCA	

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACION TUBERIA	18,00	1,5485	-	1,00	27,87
Subtotal					27,87
TOTAL					27,87

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:

NOMBRE: **ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.**
SECRETARIA DE PLANEACION

CONTRATISTA:

FIRMA:

NOMBRE: **VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS**
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.			
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA						CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA		ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS						2,01		0,00	2,01	0,00

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIZACIÓN
1.3	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (SUMIDEROS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM).	M3	GUADUAS - CUNDINAMARCA

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
Cuneta existente	13,40	1,00	0,15	1,00	2,01
Subtotal					2,01
TOTAL					2,01

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACION

CONTRATISTA:

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES


FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.	
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA						CANTIDAD ACTUAL	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA / POR EJECUTAR
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS						364,50	224,02	140,48 / 0,00

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIZACIÓN
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	GUADUAS - CUNDINAMARCA

ESQUEMA



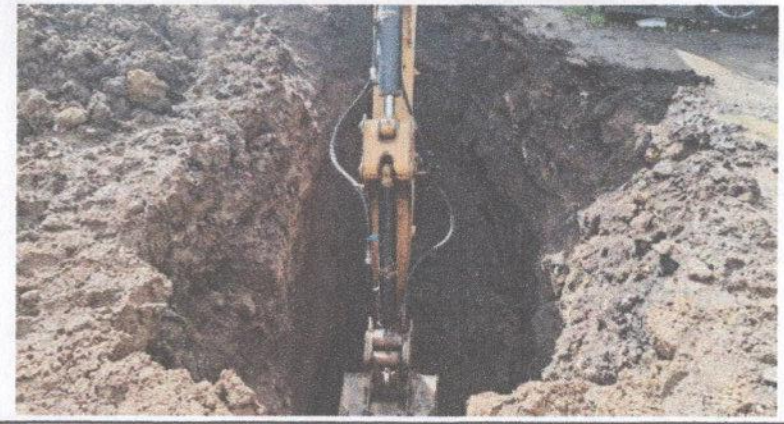

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACION TUBERIA	18,00	1,53	3,01	1,00	82,9837450
CAJA DE INSPECCION	2,00	2,00	3,10	1,00	12,40
POZO DE INSPECCION	2,50	2,50	3,30	1,00	20,63
DISIPADOR	7,20	1,60	2,12	1,00	24,47
				Subtotal	140,4804275
				TOTAL	140,4804275

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACION.

CONTRATISTA:

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

5


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1


FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.	
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA						CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA / POR EJECUTAR
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS						30,69	19,53	11,16 / 0,00

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIZACIÓN
2.2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	GUADUAS - CUNDINAMARCA

ESQUEMA

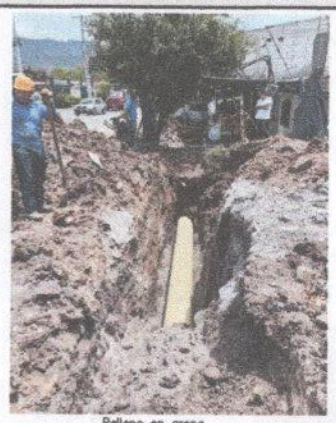

Relleno en arena



DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAMA INSTALACION DE TUBERIA	24,00	1,10	0,15	1,00	3,96
COBERTURA DE TUBO	24,00	0,50	0,60	1,00	7,20
Subtotal					11,16
TOTAL					11,16

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACION.

CONTRATISTA:


FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.			
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA						CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA		ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS						78,68		50,75	27,13	0,80
ITEM No.	DESCRIPCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA			LOCALIZACIÓN	
2.3	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"						M3			GUADUAS - CUNDINAMARCA	

ESQUEMA

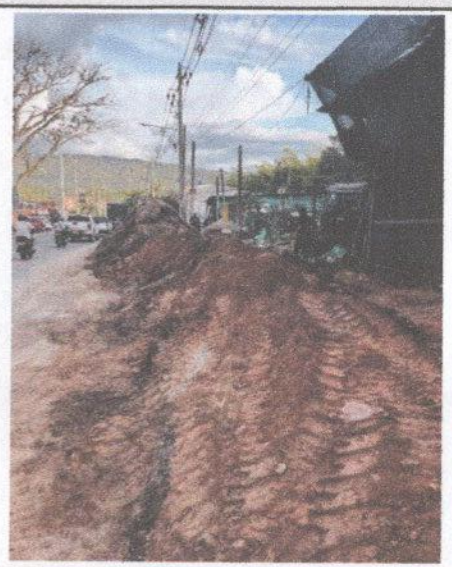

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO SUPERIOR DE TUBERIA	20,90	1,10	1,18	1,00	27,13
Subtotal					27,13
TOTAL					27,13

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACIÓN.

CONTRATISTA:

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES


FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025	AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA								
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS								

CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR
89,30	56,83	32,47	0,00

ITEM No.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIZACION
2.5	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	GUADUAS - CUNDINAMARCA

ESQUEMA

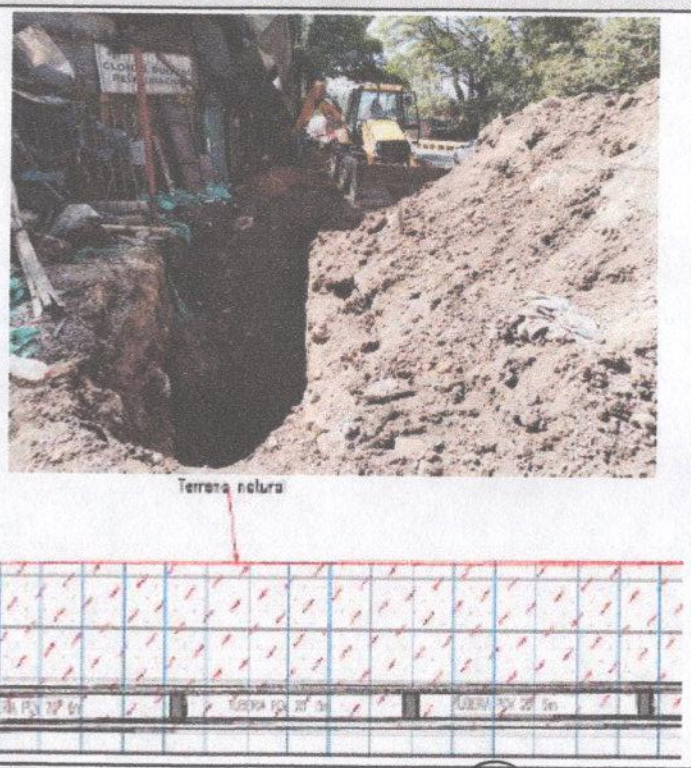

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
RELLENO SUPERIOR DE TUBERIA	24,00	1,10	1,23	1,00	32,47
Subtotal					32,47
TOTAL					32,47

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACION.

CONTRATISTA:

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.			
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA						CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR	
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS						42,00	24,00	18,00	0,00	
ITEM No.	DESCRIPCION						UNIDAD DE MEDIDA		LOCALIZACION		
2.6	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)						M2		GUADUAS - CUNDINAMARCA		

ESQUEMA



DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACION TUBERIA	3,00	-	3,00	2,00	18,00
Subtotal					18,00
TOTAL					18,00

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACION.

CONTRATISTA:


FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.	
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA						CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA / POR EJECUTAR
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS						5,43	0,00	5,43 / 0,00
ITEM No.	DESCRIPCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA		LOCALIZACIÓN
3.1	CONCRETOS f c =3500 PSI (BASES)						M3		GUADUAS - CUNDINAMARCA

ESQUEMA

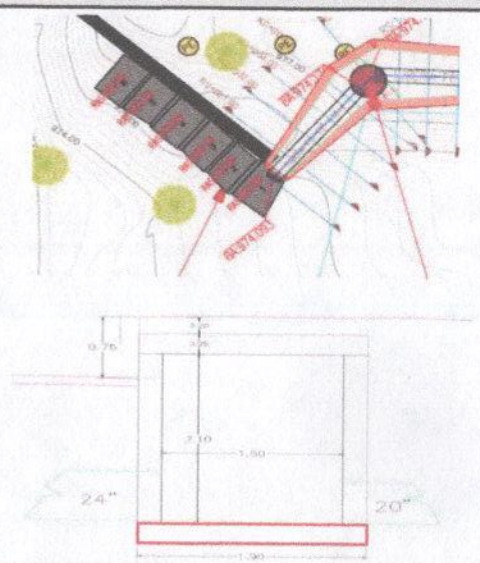

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESCALAS DISIPADOR	1,20	1,50	0,20	6,00	2,16
ESCALAS CARAS FRONTALES	0,20	1,50	0,20	6,00	0,36
PLACA BASE CAJA DE INSPECCION	1,90	1,90	0,25	1,00	0,90
CUNETAS	13,40	1,00	0,15	1,00	2,01
Subtotal					5,43
TOTAL					5,43

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO
SECRETARIA DE PLANEACION.

CONTRATISTA:

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.


MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.			
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA						CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA		ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS						8,33		0,00	7,43	0,90
ITEM No.	DESCRIPCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA			LOCALIZACIÓN	
3.2	CONCRETOS f c =3500 PSI (ELEVACIONES)						M3			GUADUAS - CUNDINAMARCA	

ESQUEMA



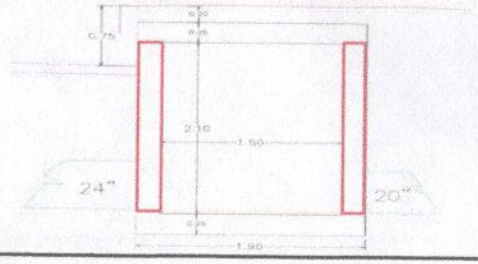

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ALETAS DISIPADOR	1,20	1,40	0,20	12,00	4,03
TAPAS SUPERIORES DISIPADOR	1,20	1,50	0,10	3,00	0,54
PANTALLAS CAJA DE INSPECCION	2,10	1,90	0,20	2,00	1,60
	2,10	1,50	0,20	2,00	1,26
Subtotal					7,43
TOTAL					7,43

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACION.

CONTRATISTA:

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA							
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS							

CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR
13,33	0,00	13,33	0,00

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIZACIÓN
3.3	CONCRETO CICLOPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	GUADUAS - CUNDINAMARCA

ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESTABILIZACION DISIPADOR	1,20	1,60	1,00	6,00	11,52
ESTABILIZACION BASE CAJA	1,90	1,90	0,50	1,00	1,81
Subtotal					13,33
TOTAL					13,33

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACION.

CONTRATISTA:

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

12

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES


FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA							
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS							

CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR
1448,58	0,00	854,27	594,31

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIZACIÓN
3.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	GUADUAS - CUNDINAMARCA

ESQUEMA

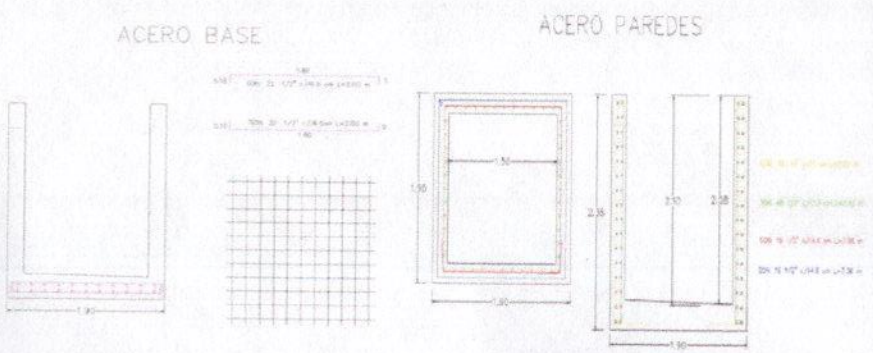

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CANTIDAD	CANTIDAD	PESO	TOTAL
DISIPADOR		Pasos	x pasos		
ACERO TRASVERSAL BASE INFERIOR Y	4,10	6	6	0,994	146,71
ACERO TRASVERSAL BASE SUPERIOR	3,90	6	6	0,994	139,56
ACERO LONGITUDINAL BASE	4,25	7	2	0,994	59,14
ACERO LONGITUDINAL BASE	3,85	7	2	0,994	53,58
ACERO LONGITUDINAL ALETAS	1,30	24	144	0,994	186,06
ACERO VERTICAL ALETA INICIAL	1,55		6	0,994	9,24
ACERO TRASVERSAL TAPA SUPERIOR	1,40	3	6	0,994	25,05
ACERO LONG TAPA SUPERIOR	1,20	3	7	0,994	25,05
CUNETAS	**Longitud**	**Cantidad**	**Unidad**	**Peso**	
	m	**Cuneta**	**X Cuneta**		
CUNETA ACERO LONG	13,30	1,00	5	0,994	66,10
CUNETA ACERO TRASVERSAL	0,95	1,00	67	0,56	35,64
CAJA	**Longitud**	**Cantidad**	**5**	**Peso**	
	m	**Barras**	**parrilla**		
PLACA BASE	2,00	11	4	0,994	87,47
ACERO VERTICAL PANTALLAS	2,92	1,78	4	0,994	20,64

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES


FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:			"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA							
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS							

CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR
1,00	0,00	1,00	0,00

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIZACIÓN
4.2	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	GUADUAS - CUNDINAMARCA

ESQUEMA

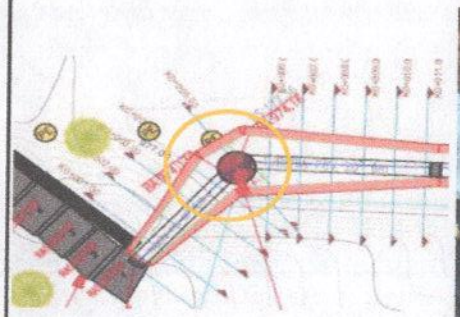



DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
POZO DE INSPECCION	-	-	-	1	1,00
Subtotal					1,00
TOTAL					1,00

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACION.

CONTRATISTA:


FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES

FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.			
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"				
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA						CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR	
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS						66,00	42,00	24,00	0,00	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN						UNIDAD DE MEDIDA		LOCALIZACIÓN		
NP2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20"						ML		GUADUAS - CUNDINAMARCA		

ESQUEMA

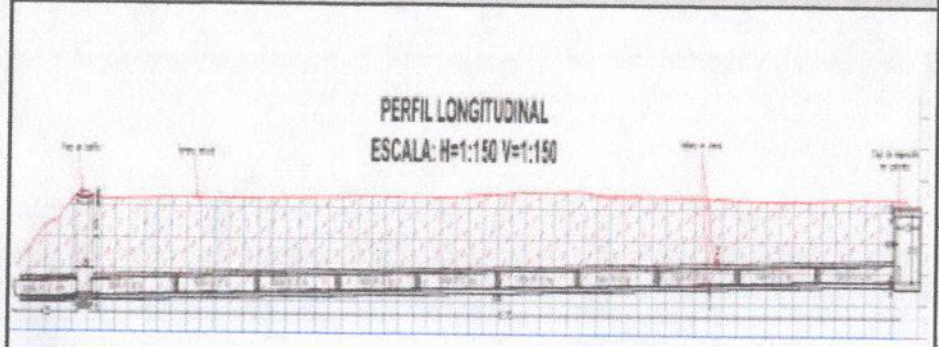

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA PRINCIPAL DE DESCARGA	24,00	-	-	1	24,00
Subtotal					24,00
TOTAL					24,00

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACION.

CONTRATISTA:

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

15

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES


FORMATO	
CÓDIGO	CCE-EICP-FM-12
VERSIÓN	3
PÁGINA	1 DE 1

FECHA:	DIA	10	MM	12	AA	2025	PERIODO:	DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2025.
CONTRATO:	242 DE 2025				OBJETO:		"MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA							
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS							

CANTIDAD ACTUAL CONTRATADA	ACTA ANTERIOR	PRESENTE ACTA	POR EJECUTAR
3,00	0,00	3,00	0,00

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	LOCALIZACIÓN
4.3	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE	ML	GUADUAS - CUNDINAMARCA

ESQUEMA





DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
POZO DE INSPECCION	-	-	3,00	1	3,00
Subtotal					3,00
TOTAL					3,00

OBSERVACIONES:

SUPERVISOR:

FIRMA:
NOMBRE: ARQ. MANIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO.
SECRETARIA DE PLANEACION.

CONTRATISTA:

FIRMA:
NOMBRE: VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
R.L. VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR.

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS		INFORME DE ACTIVIDADES	
		VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN 09/12/2025

CONTRATO No.	242 - 2025				
RIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN:	DESDE: 02/12/2025	HASTA:09/12/2025		No. DE PAGO:	2
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS			C.C. / NIT	901.617.488 - 8
OBJETO DEL CONTRATO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA".			PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
				FECHA DE INICIO:	12/09/2025
				FECHA DE TERMINACIÓN	11/12/2025
BRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO	CARGO:		SECRETARIA DE PLANEACION	

INFORMACIÓN FINANCIERA

CDP No.	2025000402	VALOR CDP	$130.000.000,00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:
REGISTRO PPTAL No.	2025000719	VALOR REGISTRO	$129.999.673,00	
ALOR INICIAL CONTRATADO:	$129.999.673,00	VALOR PAGOS EFECTUADOS:	$ 0,00	90,00%
ADICIONES:	$0,00	VALOR PRESENTE PERIODO:	$ 64.999.836,50	
VALOR TOTAL CONTRATO:	$129.999.673,00	VALOR EJECUTADO:	$ 116.999.705,70	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
Mantener a sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social, parafiscales y ARL durante toda la obra la ejecucion del servicio.	Pagos de seguridad social anexos al informe de avance parcial N°2 con el personal aceptado en la propuesta	CERTIFICACION DE PAGOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Mantener a sus trabajadores debidamente informados e identificados durante toda la ejecución del contrato.	Personal con su respectiva dotacion reglamentaria	PERSONAL DE DOTACIÓN
Utilizar materiales de óptima calidad	Se anexan certificados de calidad de materiales	INSTALACION DE MATERIALES OPTIMOS Y DE CALIDAD, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Todos los trabajadores deben contar con certificación de Trabajo Seguro en Alturas según la actividadque realicen y el trabajo que desempeñe dentro del proyecto una vez se adjudique el presente proceso.	No aplica	NO APLICA
El respectivo control y seguimiento al desarrollode las obras hasta su entrega a satisfacción a la entidad.	Informe de avance parcial No. 2.	SE LOGRO REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE OBRA.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

MES	PLANILLA	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	APORTES A SALUD	APORTES A PENSIÓN	APORTES A RIESGOS	CCF
OCTUBRE	9523785005	22/11/2025	$ 3.344.000	$ 456.000	$ 1.822.400	$ 609.600	$ 456.000
NOVIEMBRE	98745517845	22/12/2025	$ 2.462.200	$ 342.000	$ 1.366.800	$ 411.400	$ 342.000

ANEXOS	ADJUNTA: CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURÍDICA O NATURAL

CUENTA DE COBRO	SI	NO X	DATOS DE LA FACTURA	SI X	NO
			No. DE FACTURA:	FVE - 133	
			RESOLUCIÓN DIAN:	18764096475357	
			FECHA:	11/12/2025	
			VALOR:	$ 64.999.836,50	

FIRMA DEL SUPERVISOR	SE ANEXA INFORME CONTENIDO

INFORME ACTA PARCIAL No. 02

CONTRATO DE OBRA No. 242 DE 2025

PERIODO:
02 DE DICIEMBRE A 09 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO:
"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA"

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA

CONTRATISTA:
VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS

GUADUAS CUNDINAMARCA – DICIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS....3
1.1 INTRODUCCIÓN. 3
1.2 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL....4
1.3 LOCALIZACIÓN GENERAL....5
1.4 ESTADO DE PÓLIZAS 6
1.4.1 Pólizas según suscripción del contrato. 6
1.4.2 Pólizas según acta de inicio....7
1.5 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL....7
1.5.1. Listado de personal....7
1.6 ACTAS DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO 8
2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS....9
2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS. 9
2.2. AVANCE DEL CONTRATO....24
3. ASPECTOS FINANCIEROS....27
3.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO....27
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 28
5. ANEXOS 30

1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1.1 INTRODUCCIÓN.

Con el Contrato de Obra No. 242 de 2025 se enmarca en la ejecución del proyecto de "Mejoramiento y adecuación del sistema de alcantarillado de aguas lluvias en el barrio San José del municipio de Guaduas, Cundinamarca", cuyo objetivo principal es garantizar un manejo eficiente de las aguas pluviales y mejorar la infraestructura urbana para prevenir inundaciones y daños a la vía pública y a la vivienda de los habitantes del sector. Esta intervención surge como respuesta a una problemática histórica del barrio San José, donde la acumulación de aguas lluvias ocasiona afectaciones recurrentes en la movilidad, genera riesgos sanitarios y contribuye al deterioro de la infraestructura, impactando directamente la calidad de vida de la comunidad. La obra comprende la adecuación de la red de drenaje, la construcción y rehabilitación de sumideros y canales, así como la optimización de los sistemas de evacuación de aguas, permitiendo una gestión integral del recurso hídrico. Su ejecución no solo tiene un efecto técnico y ambiental, sino también social, al fortalecer la resiliencia del barrio frente a eventos climáticos, reducir riesgos para la población y contribuir a la sostenibilidad urbana.

De manera articulada, esta obra se constituye en un aporte concreto al cumplimiento de las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Municipal, ya que responde directamente a los objetivos estratégicos de mejorar la infraestructura básica y los servicios públicos, promover el bienestar de la comunidad y garantizar la sostenibilidad ambiental. Al ejecutarse, se cumplen metas específicas relacionadas con la reducción de riesgos por inundaciones, la optimización de la gestión de aguas lluvias y la mejora de la calidad de vida de los habitantes, consolidando la visión del municipio de Guaduas como un territorio organizado, resiliente y sostenible. Además, la intervención se alinea con políticas y lineamientos de alcance local, regional, departamental y nacional, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y asegurando que los recursos públicos generen impactos positivos y medibles en el desarrollo del municipio.

El presente Informe es el sustento del Acta Parcial No. 02, corresponde al seguimiento técnico, administrativo y financiero del Contrato de Obra No. 242 de 2025, suscrito entre el Municipio de Guaduas, Cundinamarca, como entidad contratante, y el contratista Víctor Camargo & B Construcciones S.A.S. El objeto contractual consiste en el *"Mejoramiento y adecuación del sistema de alcantarillado de aguas lluvias en el barrio San José del municipio de Guaduas, Cundinamarca"*, con un valor total de: **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($129.999.673,00) M/CTE**. y un plazo de ejecución de tres (03) meses, contados a partir del 12 de septiembre de 2025, fecha de suscripción del Acta de Inicio.

Este informe presenta el avance físico y financiero de la obra correspondiente al periodo comprendido entre el 02 de diciembre y el 09 de diciembre de 2025, fecha en la que se realiza el corte y la presentación del Informe Parcial No. 02. Durante este lapso de tiempo se ejecutaron actividades que alcanzan un valor acumulado de: **CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA**

CENTAVOS ($116.999.705,70) M/CTE. Equivalente al 90.00% de ejecución del contrato, contando con el aval por parte de la supervisión de la Arq. Angélica Martínez, delegada por la Secretaría de Planeación Municipal. Cabe señalar que dentro de este periodo se incorpora la Modificatoria No. 1, suscrita el 28 de noviembre de 2025, como parte integral del proceso de ejecución, la cual no modifico el valor del contrato.

El propósito de este informe es documentar los avances alcanzados, detallar las actividades desarrolladas, verificar el cumplimiento técnico y financiero y asegurar la calidad del proceso constructivo, facilitando el control y seguimiento del proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado de aguas lluvias en el Barrio San José.

1.2 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA CONTRACTUAL.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	OBRA
PROCESO SECOP II:	SAMC – 011 – 2025.
CONTRATO No.:	242 – 2025.
CONTRATANTE:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADUAS. R.L.: DIEGO ARIEL JIMENEZ. NIT: 899.999.701-4
CONTRATISTA:	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS. R.L.: VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR. NIT:901.617.488 – 8.
OBJETO:	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE GUADUAS, CUNDINAMARCA".
SUPERVISOR:	ARQ. ANGELICA MARTINEZ. SECRETARIA DE PLANEACIÓN.
VALOR:	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($129.999.673.00) M/CTE.
FORMA DE PAGO:	TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO.
PLAZO DE EJECUCION:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	AGOSTO 22 DE 2025
FECHA DE INICIO:	SEPTIEMBRE 12 DE 2025.
FECHA DE TERMINACION:	DICIEMBRE 11 DE 2025.
FECHA DE MODIFICATORIA No. 1:	NOVIEMBRE 28 DE 2025.
FECHA ACTA PARCIAL No. 01:	DICIEMBRE 2 DE 2025
VALOR ACTA PARCIAL No. 01:	CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

	SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($51.999.869,20) M/CTE
PORCENTAJE ACTA PARCIAL No. 1:	40.00 %
FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02:	DICIEMBRE 09 DE 2025
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02:	SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($64.999.836,50) M/CTE.
PORCENTAJE PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02:	50.00 %
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($116.999.705,70) M/CTE.
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	90.00 %
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($12.999.967,30) M/CTE.
PORCENTAJE POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	10.00 %
CDP No.:	2025000402 de 12 de junio de 2025.
RP No.:	2025000719 del 22 de agosto de 2025.

1.3 LOCALIZACIÓN GENERAL

Guaduas es un municipio del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Bajo Magdalena. Se encuentra a aproximadamente 110 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de 2 horas y 30 minutos de viaje en automóvil. Este municipio es conocido por su clima cálido y su riqueza histórica, siendo el lugar de nacimiento de Policarpa Salavarrieta, una heroína de la independencia de Colombia.

Las obras del contrato se ejecutan en el barrio San Jose paralelas a la ruta nacional 56, las cuales buscan solucionar la problemática de las aguas lluvias en tiempo de invierno, que anegan los predios aledaños y generan inconvenientes a la comunidad en cuanto a movilidad.

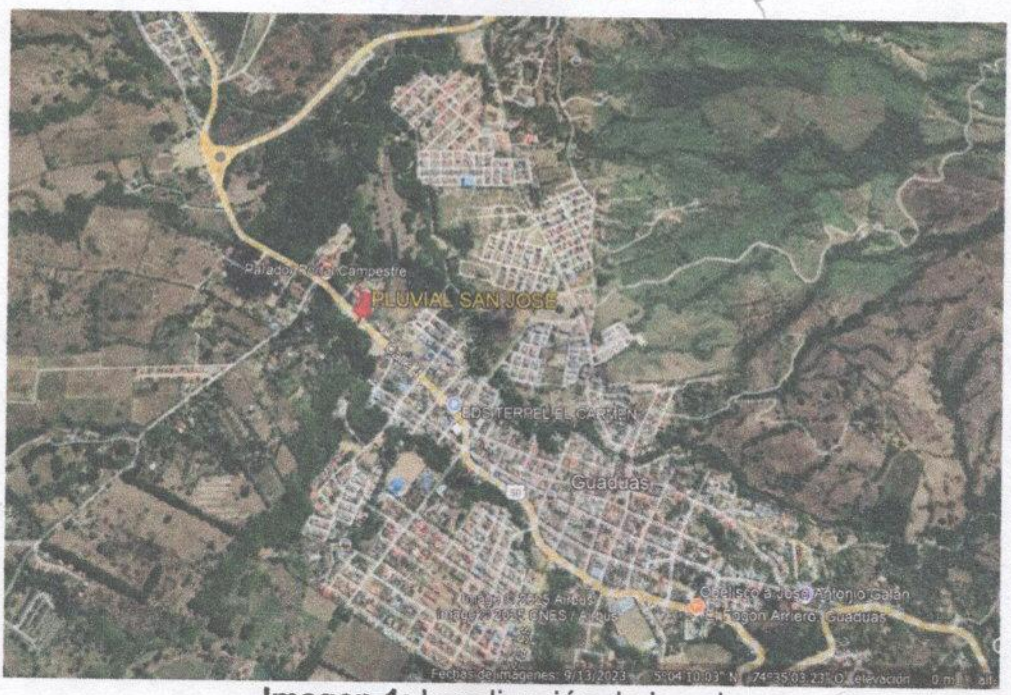


Imagen 1: Localización de las obras.

1.4 ESTADO DE PÓLIZAS

A continuación, se presenta el estado de las pólizas del contrato las cuales se encuentran vigentes y pagadas a la aseguradora.

1.4.1 Pólizas según suscripción del contrato.

Póliza POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL.
Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.
Póliza No. CV-100053222 anexo 0 y CV-100014883 anexo 0.
Fecha de expedición. 22 de agosto de 2025.

GARANTIA	VIGENCIA	%	VALOR
Cumplimiento del contrato	Desde 22/08/2025 hasta 22/05/2026.	10%	$12.999.967.30
Prestaciones Sociales	Desde 22/08/2025 hasta 22/11/2028.	10%	$12.999.967.30
Estabilidad de la obra	Desde 22/11/2025 hasta 22/11/2030.	20%	$25.999.934.60
Predios, labores y operaciones.	Desde 22/11/2025 hasta 22/11/2025.	200 SMLMV	$284.700.000.00

1.4.2 Pólizas según acta de inicio.

Póliza POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL.
Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA.
Póliza No. CV-100053222 anexo 2 y CV-100014883 anexo 2.
Fecha de expedición: 19 de septiembre de 2025.

GARANTIA	VIGENCIA	%	VALOR
Cumplimiento del contrato	Desde 12/09/2025 hasta 12/06/2026.	10%	$12.999.967.30
Prestaciones Sociales	Desde 12/09/2025 hasta 13/12/2028.	10%	$12.999.967.30
Estabilidad de la obra	Desde 13/12/2025 hasta 13/12/2030.	20%	$25.999.934.60
Predios, labores y operaciones.	Desde 12/12/2025 hasta 13/12/2025.	200 SMLMV	$284.700.000.00

1.5 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Durante la ejecución del contrato la empresa realizo el pago de salarios y aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y pago de parafiscales (CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR) como se puede evidenciar en las planillas anexas.

1.5.1. Listado de personal.

Durante el periodo del presente informe, en la obra estuvo presente personal relacionado a continuación, el cual se encuentra afiliado al sistema de seguridad social.

NOMBRE COMPLETO	No. DE CEDULA	CARGO
JUAN CAMILO CHIVATA ALVARADO.	4.264.116	Director de obra
SEBASTIAN ORTEGON G.	7.179.641	Residente de Obra
JAIDER ALEXANDER USECHE.	1.072.748.412	Tecnólogo de obra
ADRIANO LADINO GONZALEZ	17.307.674	Maestro de Obra
LUIS OSORIO	17.319.554	Ayudante de obra
JOHAN SERRRANO	1.120.358.857	Ayudante de obra
SAMUEL ARCILA	1.120.355.695	Ayudante de obra

1.6 ACTAS DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO

A continuación, se relacionan las actas de seguimiento realizadas en el periodo que comprende el presente informe.

DESCRIPCIÓN	FECHA
ACTA No. 1 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA No. 2 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	13 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA No. 3 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	22 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA No. 4 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA No. 5 DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	5 DE DICIEMBRE DE 2025

2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS.

A continuación, se describen las cantidades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el *02 de diciembre de 2025 y el 09 de diciembre de 2025,* tiempo en el cual se ejecutaron las siguientes actividades:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.
1	**PRELIMINARES**		
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	27,87
1.3	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (SUMIDEROS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M3	2,01
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y ENTIBADOS**		
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	140,4804275
2.2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	11,16
2.3	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	27,13
2.5	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	32,47
2.6	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	18,00
3	**OBRAS DE ARTE**		
3.1	CONCRETOS f´c =3500 PSI (BASES)	M3	5,43
3.2	CONCRETOS f´c =3500 PSI (ELEVACIONES)	M3	7,43
3.3	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	13,33
3.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	854,27
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**		
4.2	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,00
4.3	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE	ML	3,00
NP2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20"	ML	24,00

A continuación, se muestra el registro fotográfico de las actividades ejecutadas con sus respectivas cantidades.

ITEM 1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
102,30 M2	27,87 M2	100%






DESCRIPCIÓN: Localización y replanteo con elementos de precisión en zonas de excavación e intervención del proyecto

OBSERVACIÓN: El ítem de *LOCALIZACION Y REPLANTEO* se encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No. 02.

ITEM 1.3	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (SUMIDEROS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
2,01 M3	2,01 M3	100%

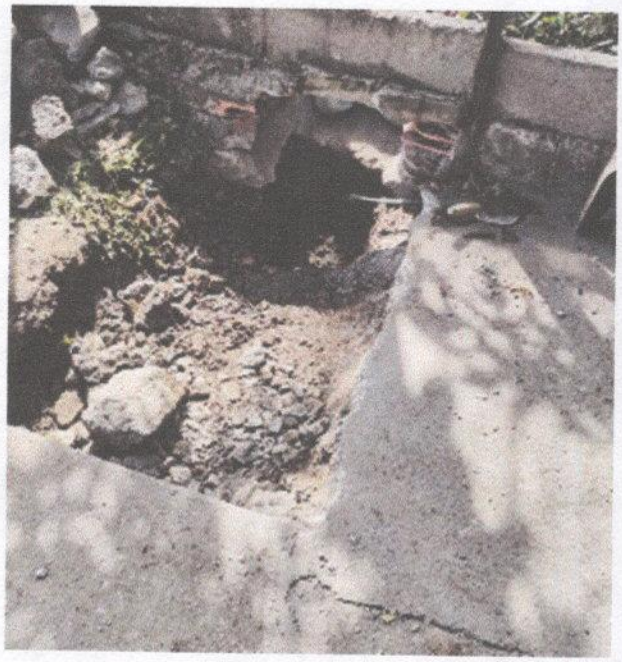



DESCRIPCIÓN: Demolición manual de concreto estructural en las zonas contempladas del proyecto.

OBSERVACIÓN: El ítem de *DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL* se encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No. 02.

ITEM 2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
364,50 M3	140,4804275 M3	100%







DESCRIPCIÓN: Excavación y retiro de material para las zonas donde se va a instalar la tubería.

OBSERVACIÓN: El ítem de *EXCAVACIONES VARIAS* se encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No. 02.

ITEM 2.2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
30,69 M3	11,16 M3	100%

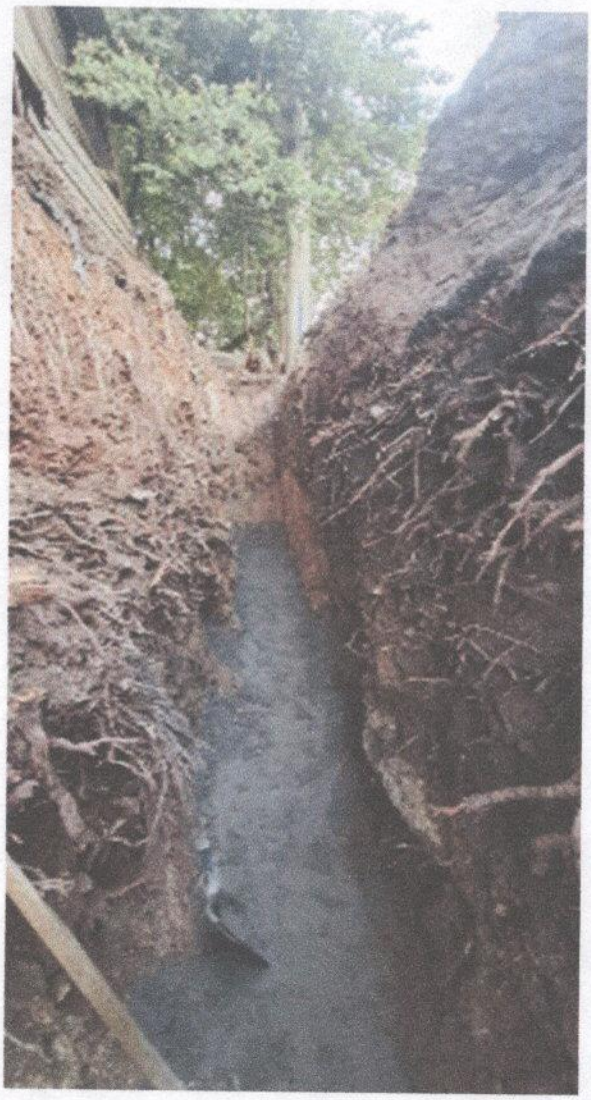


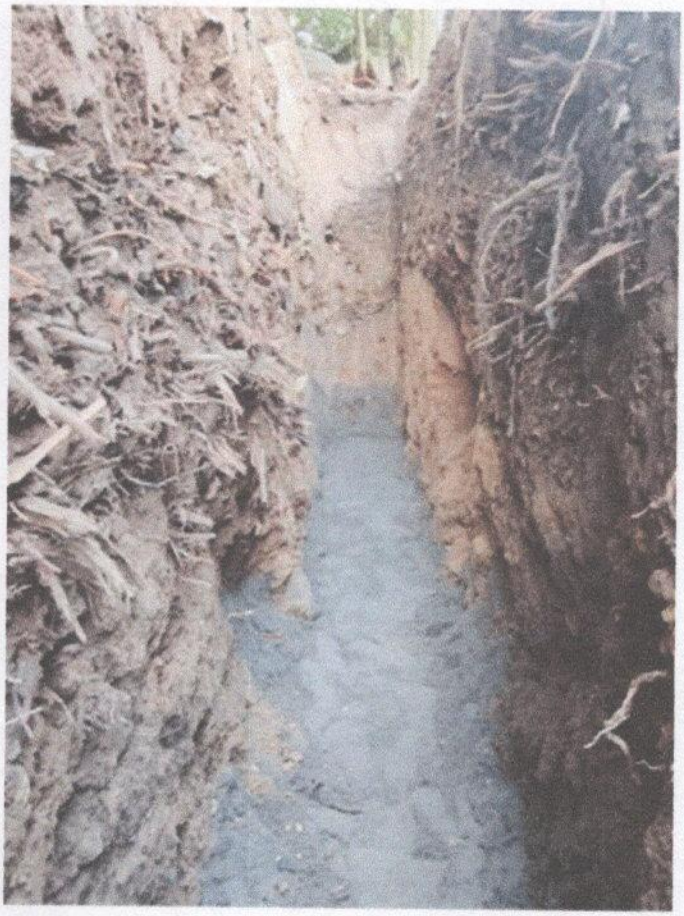


DESCRIPCIÓN: Camada con relleno con arena de peña para la protección y estabilidad de la tubería.

OBSERVACIÓN: El ítem de *RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA* para la cama de la tubería instalada se encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No. 02.

ITEM 2.3	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
78,68 M3	27,13 M3	98,98%

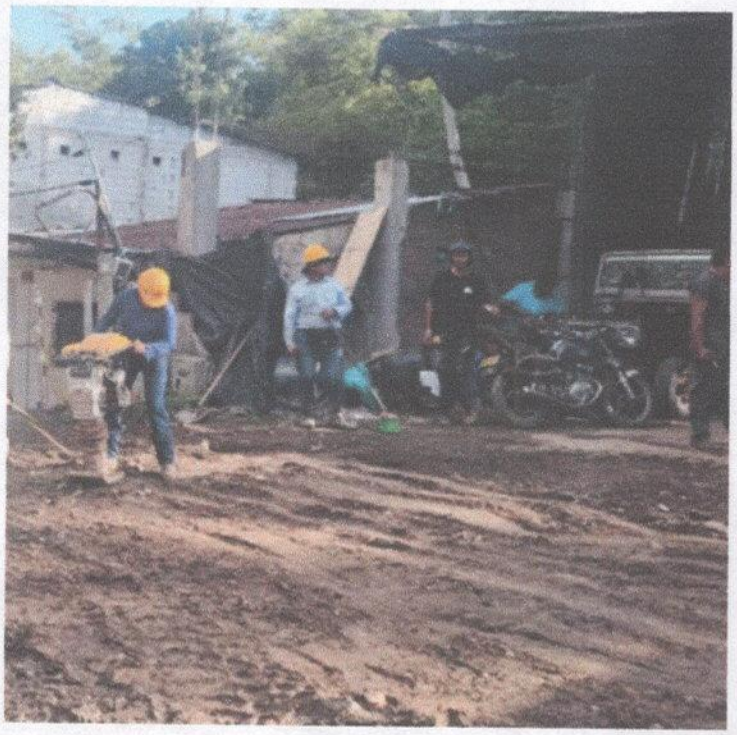

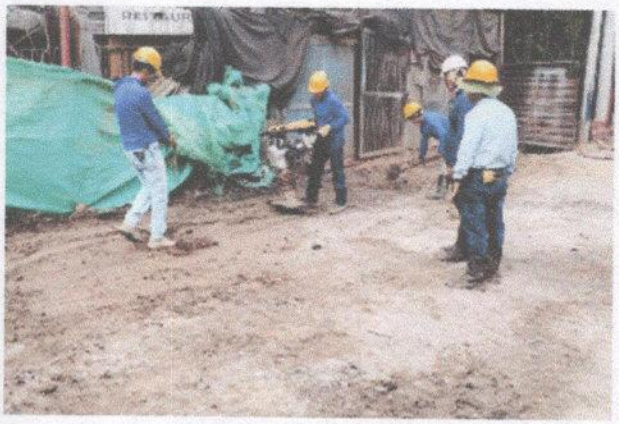

DESCRIPCIÓN: Relleno tipo 2" y compactación manual con equipo liviano en las zonas donde se instaló tubería.

OBSERVACIÓN: El ítem de *RELLENO TIPO 2 "RECEBO"* se encuentra al 98,98% a la fecha de la parcial. No. 02.

ITEM 2.5	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
89,30 M3	32,47 M3	100%





DESCRIPCIÓN: Relleno con material proveniente de la excavación para el recubrimiento de la tubería.

OBSERVACIÓN: El ítem de *RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN* se encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No. 02.

ITEM 2.6	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
42,00 M2	18,00 M2	100%






DESCRIPCIÓN: Entibado en las zonas de excavación para el control y protección de la seguridad del personal en el área de intervención.

OBSERVACIÓN: El ítem de *ENTIBADO* se encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No. 02.

ITEM 3.1	CONCRETOS f´c =3500 PSI (BASES)	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
5,43 M3	5,43 M3	100%



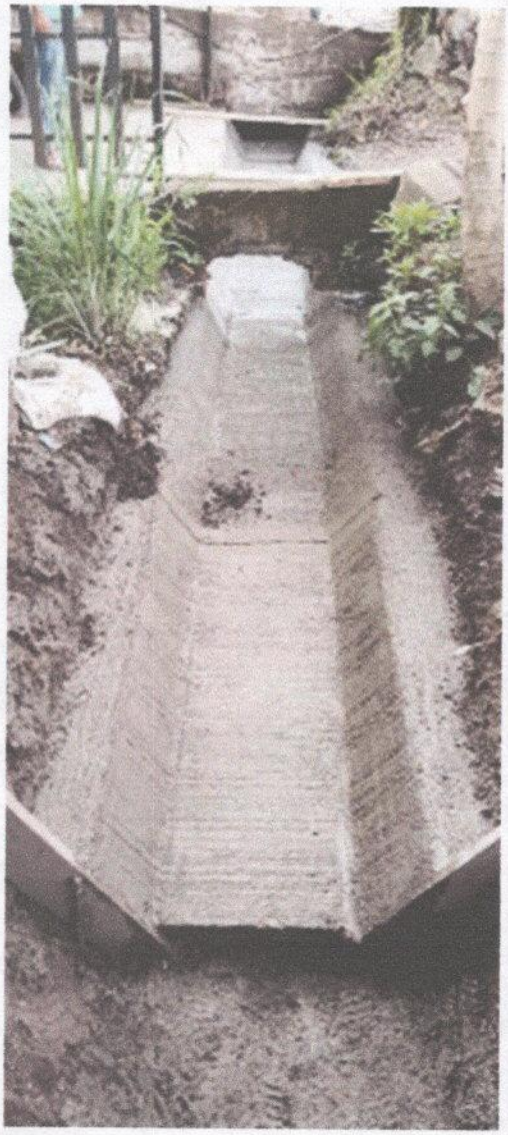


DESCRIPCIÓN: Elaboración de bases en concreto para conformación del disipador.

OBSERVACIÓN: El ítem de *CONCRETOS f´c =3500 PSI (BASES)* se encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No. 02.

ITEM 3.2	CONCRETOS f´c =3500 PSI (ELEVACIONES)	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
8,33 M3	7,43 M3	89,19%




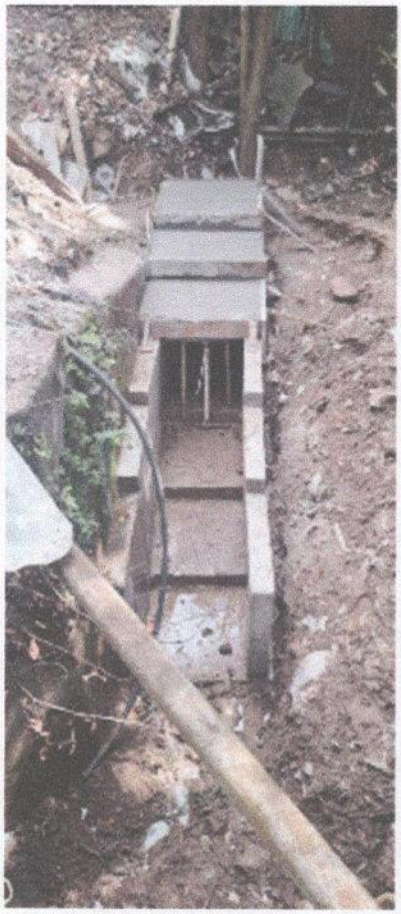

DESCRIPCIÓN: Elevaciones en concreto para conformación de disipador.

OBSERVACIÓN: El ítem de *CONCRETOS f´c =3500 PSI (ELEVACIONES)* se encuentra al 89,19% a la fecha de la parcial. No. 02.

ITEM 3.3	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
13,33 M3	13,33 M3	100%

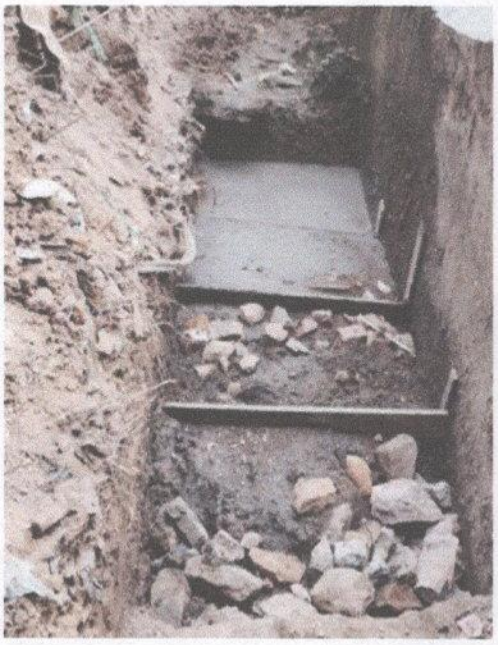



DESCRIPCIÓN: Concreto ciclópeo para cimiento de disipador.

OBSERVACIÓN: El ítem de *CONCRETO CICLÓPEO se* encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No.02

ITEM 3.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
1448,58 M3	854,27 M3	58,97%





DESCRIPCIÓN: Figurado y armado del acero para elaboración de sumidero.

OBSERVACIÓN: El ítem de *SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO se* encuentra al 58,97% a la fecha de la parcial. No. 02.

ITEM 4.2	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
1 UN	1 UN	100%






DESCRIPCIÓN: Elaboración de placa de fondo del pozo en concreto.

OBSERVACIÓN: El ítem de *PLACA DE FONDO POZO se* encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No.02

ITEM 4.3	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
3 ML	3 ML	100%




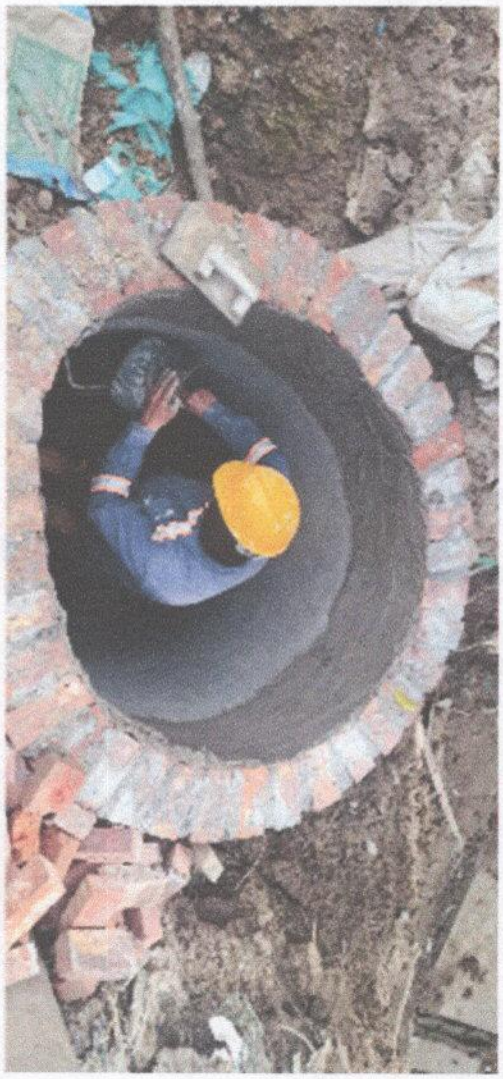

DESCRIPCIÓN: Elaboración de pozo en ladrillo tolete.

OBSERVACIÓN: El ítem de *CILINDRO POZO EN LADRILLO se* encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No. 02.

N.P.2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20"	
CANTIDAD CONTRATO	**CANTIDAD EJECUTADA**	**% EJECUTADO ACUMULADO**
66,00 ML	24,00 ML	100%

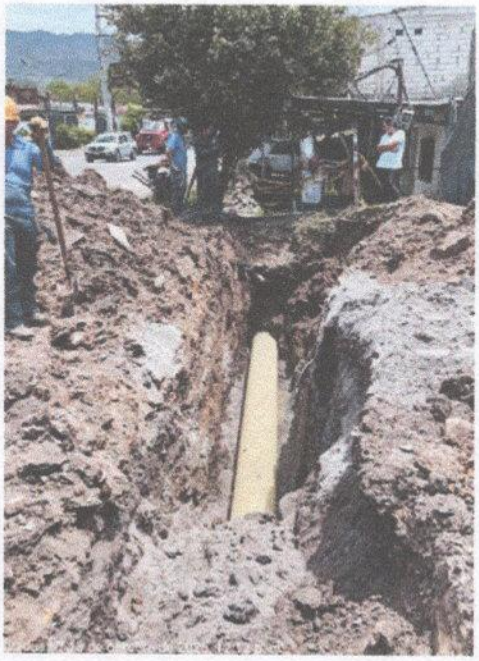



DESCRIPCIÓN: Instalación de tubería en PVC 20" para el alcantarillado llegada y conexión al pozo.

OBSERVACIÓN: El ítem de *TUBERIA PVC ALCANTARILLADO* se encuentra al 100% a la fecha de la parcial. No. 02.

En ejecución se registra un avance del 50.00%, correspondiente a **SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($64.999.836,50) M/CTE.** con las actividades descritas anteriormente.

2.2. AVANCE DEL CONTRATO

A continuación, se presenta el avance del contrato hasta el 09 de diciembre de 2025 de acuerdo a lo ejecutado desde el 02 de septiembre de 2025.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACTA PARCIAL No. 1		PRESENTE ACTA		PENDIENTE POR EJECUTAR	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**PRELIMINARES**										
1.1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	ML	66,00	$ 32.738,00	$ 2.160.708,00	66,00	$2.160.708,00	0,00	$ -	0,00	$ -
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISION	M2	102,30	$ 14.383,00	$ 1.471.381,00	74,43	$1.070.475,00	27,87	$ 400.906,00	0,00	$ -
1.3	DEMOLICION CONCRETO ESTRUCTURAL (SUMIDEROS) (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	M3	2,01	$ 214.897,00	$ 431.943,00	0,00	$ -	2,01	$ 431.943,00	0,00	$ -
1.4	DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	0,00	$ 75.202,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y ENTIBADOS**										
2.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	364,50	$ 28.229,00	$ 10.289.377,00	224,0162550	$6.323.754,86	140,4804275	$3.965.622,14	0,00	$ -
2.2	RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PEÑA"	M3	30,69	$ 120.711,00	$ 3.704.621,00	19,53	$2.357.486,00	11,16	$1.347.135,00	0,00	$ -
2.3	RELLENO TIPO 2 "RECEBO"	M3	78,68	$ 182.030,00	$ 14.322.120,00	50,75	$9.238.350,15	27,13	$4.938.145,85	0,80	$ 145.624,00
2.4	SUBBASE GRANULAR	M3	0,00	$ 202.174,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.5	RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN	M3	89,30	$ 30.937,00	$ 2.762.612,00	56,83	$1.758.026,00	32,47	$1.004.586,00	0,00	$ -

2.6	ENTIBADO TIPO 2 (1/7 UTILIZACIONES)	M2	42,00	$ 42.017,00	$ 1.764.714,00	24,00	$1.008.408,00	18,00	$ 756.306,00	0,00	$ -
3	**OBRAS DE ARTE**										
3.1	CONCRETOS f´c =3500 PSI (BASES)	M3	5,43	$ 803.220,00	$ 4.363.493,00	0,00	$ -	5,43	$4.363.493,00	0,00	$ -
3.2	CONCRETOS f´c =3500 PSI (ELEVACIONES)	M3	8,33	$ 962.513,00	$ 8.018.215,00	0,00	$ -	7,43	$7.151.472,00	0,90	$ 866.743,00
3.3	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN	M3	13,33	$ 344.404,00	$ 4.589.183,00	0,00	$ -	13,33	$4.589.183,00	0,00	$ -
3.4	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1448,58	$ 8.494,00	$ 12.304.222,00	0,00	$ -	854,27	$7.256.143,53	594,31	$5.048.078,47
4	**ALCANTARILLADO - SUMIDEROS Y POZOS**										
4.1	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 16"	ML	0,00	$ 225.738,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2	PLACA DE FONDO POZO D=1.7M, E=0.25M (CONCRETO 3000 PSI CON REFUERZO)	UN	1,00	$ 1.125.786,00	$ 1.125.786,00	0,00	$ -	1,00	$1.125.786,00	0,00	$ -
4.3	CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.20M, E=0.25M (INC. PAÑETE	ML	3,00	$ 955.600,00	$ 2.866.800,00	0,00	$ -	3,00	$2.866.800,00	0,00	$ -
4.4	CUBIERTA POZO D= 1.7M, E=0.20M C0NCRETO 3000 PSI CON REFUERZO (INCLUYE ARO Y TAPA HF)	UN	1,00	$ 1.119.287,00	$ 1.119.287,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$1.119.287,00
4.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 1800 (ESTABILIZACIÓN, FILTRO Y SEPARACIÓN)	M2	0,00	$ 10.980,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.6	SUMIDERO FUNDIDO EN SITIO SL-250	UN	0,00	$ 4.143.449,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5	**VARIOS**										
5.1	ASEO Y LIMPIEZA	M2	379,00	$ 2.961,00	$ 1.122.219,00	0,00	$ -	0,00	$ -	379,00	$1.122.219,00
	ÍTEMS NO PREVISTOS										
NP1	REJILLA EN ACERO 1.00 M PARA CAJAS DE INSPECCION	UN	3,00	$ 490.820,00	$ 1.472.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$1.472.460,00
NP2	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 20"	ML	66,00	$ 361.439,00	$ 23.854.974,00	42,00	$15.180.438,00	24,00	$8.674.536,00	0,00	$ -
COSTOS DIRECTOS					**$ 97.744.115,00**	**40,00%**	**$39.097.646,02**	**50,00%**	**$48.872.057,52**	**10,00%**	**$9.774.411,50**
COSTOS INDIRECTOS					**$ 32.255.558,00**		**$12.902.223,19**		**$16.127.778,98**		**$3.225.555,80**

Calle 22 No. 13 – 08 Avenida Los Libertadores; Tel: 322 273 7255
SAN JUAN DE ARAMA – META
victorcamargoconstruccionessas@gmail.com

ADMINISTRACIÓN		26%		$ 25.413.470,00		$10.165.387,96		$12.706.734,96		$2.541.346,99
IMPREVISTOS		2%		$ 1.954.882,00		$ 781.952,92		$ 977.441,15		$ 195.488,23
UTILIDAD		5%		$ 4.887.206,00		$ 1.954.882,30		$ 2.443.602,88		$ 488.720,58
AJUSTE AL PESO				$ -		$ -		$ -		$ -
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS				**$ 129.999.673,00**		**$51.999.869,20**		**$64.999.836,50**		**$12.999.967,30**

Según el cuadro anterior, se puede verificar el avance físico y financiero total acumulado del 90.00 % equivalente a un valor por: **CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($116.999.705,70) M/CTE.** Con esto se evidencia el cumplimiento progresivo del cronograma y la ejecución ordenada de las fases constructivas incluidas dentro del alcance contractual. Faltando por ejecutar un 10% total del contrato, equivalente a un valor de: **DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($12.999.967,30) M/CTE.**

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Los registros presupuestales que amparan el presente contrato a la fecha no tienen ajustes, y son los siguientes de acuerdo con los estudios previos; **CDP No.:** 2025000402 de 12 de junio de 2025 y **RP No.:** 2025000719 del 22 de agosto de 2025.

Forma de pago: La entidad pagará al contratista mediante pagos parciales por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste, así:

UN PRIMER PAGO equivalente al 40% del valor total del contrato el cual se realizará una vez haya ejecutado el 40% del valor contractual de las actividades establecidas en el presupuesto oficial y recibidas a satisfacción por el Supervisor del contrato, previa presentación del acta parcial suscrita entre las partes acompañada del informe del contratista, presentación de cuenta de cobro o factura comercial, certificación de pagos a seguridad social y aportes parafiscales con ocasión del contrato.

UN SEGUNDO PAGO por el valor del (50%) del valor del contrato a la ejecución del (90%) de las actividades contratadas, previa presentación del informe del Contratista con visto bueno por parte del Supervisor y demás requisitos dispuestos en las normas de contratación estatal.

UN PAGO FINAL Correspondiente al (10%) que será cancelado cuando se haya ejecutado el cien por ciento (100%) de las actividades contractuales, a entera satisfacción del municipio, previa liquidación del contrato.

A continuación, se presenta el resumen financiero del contrato hasta el 09 de diciembre de 2025, fecha de corte de la presente acta parcial del contrato.

RESUMEN FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 129.999.673.00
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 51.999.869,20
PORCENTAJE ACTA PARCIAL No. 01:	40.00 %
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02	$ 64.999.836,50
PORCENTAJE PRESENTE ACTA PARCIAL No. 02:	50.00%
VALOR EJECUTADO ACUMULADO:	$ 116.999.705,70
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO:	90.00 %
VALOR POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 12.999.967,30
PORCENTAJE POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	10.00 %

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis correspondiente al Acta Parcial No. 02 permite establecer que la ejecución del Contrato de Obra No. 242 de 2025 presenta un desarrollo favorable, evidenciando un avance acumulado del 90.00%, equivalente a un valor de: **CIENTO DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($116.999.705,70) M/CTE.** Este progreso refleja que las actividades ejecutadas entre el 02 y el 09 de diciembre de 2025 se realizaron conforme a lo programado, manteniendo coherencia con las especificaciones técnicas, los planos aprobados y los lineamientos establecidos por la supervisión designada por la Secretaría de Planeación Municipal.

Durante el periodo evaluado se verificó que las obras ejecutadas cumplen con los estándares de calidad definidos para garantizar la eficiencia del sistema de drenaje pluvial proyectado. Las intervenciones adelantadas contribuyen directamente al mejoramiento de la infraestructura de manejo de aguas lluvias en el barrio San José, disminuyendo la vulnerabilidad frente a eventos de acumulación de aguas, fortaleciendo la resiliencia del sector y respondiendo a los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal.

Asimismo, se resalta que la Modificatoria No. 01, suscrita el 28 de noviembre de 2025, fue incorporada al proceso sin generar alteración en el valor contractual y sin afectar el ritmo de ejecución. Su aplicación se desarrolló dentro del marco establecido por la entidad contratante, permitiendo la continuidad operativa y administrativa del contrato.

En términos financieros y administrativos, se constató el adecuado cumplimiento de los procedimientos exigidos, incluyendo la entrega oportuna de información, soportes de obra y registros necesarios para el correcto seguimiento del proyecto. El valor ejecutado en el presente corte, correspondiente al Acta Parcial No. 02, por un valor de: **SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($64.999.836,50) M/CTE.** Equivalente al 50.00% del total contractual.

Finalmente, con un saldo pendiente por ejecutar equivalente al 10.00%, que corresponde a un valor de: **DOCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA CENTAVOS ($12.999.967,30) M/CTE.** Se proyecta que la ejecución restante podrá desarrollarse dentro del plazo establecido, garantizando la culminación satisfactoria del contrato. El avance logrado a la fecha refleja una ejecución ordenada, conforme a los criterios técnicos, financieros y administrativos, y orientada al cumplimiento integral del objeto contractual en beneficio de la comunidad del barrio San José.

Estas conclusiones reflejan el compromiso del contratista Víctor Camargo & B Construcciones S.A.S. con la correcta ejecución, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, reafirmando la disposición permanente de trabajar de manera articulada con la supervisión y la Administración Municipal para asegurar el éxito del proyecto y su aporte al bienestar de la comunidad del barrio San José.

Atentamente,

VICTOR BENISIO CAMARGO AGUILAR
Representante Legal.
VICTOR CAMARGO IB CONSTRUCCIONES S.A.S.

5. ANEXOS

- Certificado de pago de seguridad y parafiscales.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 9 de ley 828 de 2003, el suscrito **CONTADOR** de la sociedad **VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con **NIT: 901.617.488 – 8**, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente Acta Parcial No. 2 del contrato No. 242 de 2025 comprendida del 2 de diciembre de 2025 al 9 de diciembre de 2025, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en San Juan de Arama a los Dos (02) días del mes de Diciembre de 2025.

HOOWER OTERO RUBIO.
CONTADOR
Víctor Camargo & B Construcciones SAS.
CP TP. No. 276996 – T
C.C. 1.120.352.787 de Granada Meta.

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

276996-T



HOOWER
OTERO RUBIO
C.C. 1120352787
RES. INSCRIPCION 2519 DEL 28/12/2020
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

298859 **312047**

Identificación Pública S.A. 1805142/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

781 0D2CF0Z893EC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HOOWER OTERO RUBIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1120352787 de GRANADA (META) Y Tarjeta Profesional No 276996-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.120.352.787

OTERO RUBIO
APELLIDOS

HOOWER
NOMBRES

Hoower Otero
FIRMA

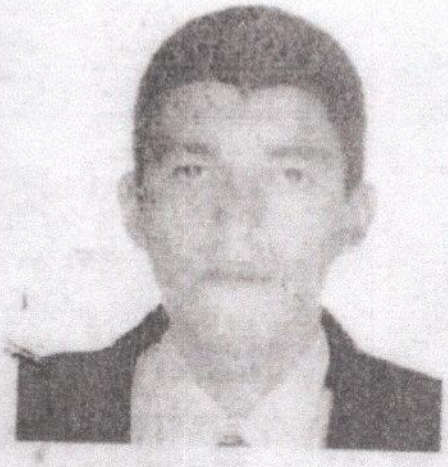



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-ENE-1986
GRANADA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

11-MAY-2004 GRANADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5203500-69128942-M-1120352787-20040923 07544 04266B 02 159239054

X

VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS
NIT: 901.617.488 – 8
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.
(PERSONA JURÍDICA)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 9 de ley 828 de 2003, el suscrito **CONTADOR** de la sociedad **VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con **NIT: 901.617.488 – 8**, certifica que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la presente Acta Parcial No. 2 del contrato No. 242 de 2025 comprendida del 2 de diciembre de 2025 al 9 de diciembre de 2025, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en San Juan de Arama a los Once (11) días del mes de Diciembre de 2025.

HOOWER OTERO RUBIO.
CONTADOR
Víctor Camargo & B Construcciones SAS.
CP TP. No. 276996 – T
C.C. 1.120.352.787 de Granada Meta.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901617488	8	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 N 13-08	SAN JUAN DE ARAMA-META	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1994842172	9523785005	E	2025/22/11	2025/22/11	BANCOLOMBIA	0	$3,344,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)							$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$609,600		$0	$0		$3,344,000
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Ciudad: SAN JUAN DE ARAMA Depto: META (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
1	CC	4264116	CHIVATA JUAN		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,50	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	7179641	ORTEGON SEBASTIAN		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,50	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (6 Afiliados)							$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$594,600		$0	$0		$2,645,400
Ciudad: SAN JUAN DE ARAMA Depto: META (6 Afiliados)							$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$594,600		$0	$0		$2,645,400
3	CC	1072748412	USECHE JAIDER		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,50	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	17307674	LADINO ADRIANO		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,50	6.960%	$99,10	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	17319544	OSORIO LUIS		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,50	6.960%	$99,10	30	$0	$0	SI	$440,900
6	CC	1120358857	SERRANO JOHAN		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,50	6.960%	$99,10	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	1120355695	ARCILA SAMUEL		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,50	6.960%	$99,10	30	$0	$0	SI	$440,900
8	CC	14318841	HURTADO EFRAIN		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,50	6.960%	$99,10	30	$0	$0	SI	$440,900
Total			**Afiliados(8)**				$11,388,000	$1,822,400			$11,388,000	$456,000			$11,388,000	$456,000			$11,388,000		$609,600		$0	$0		$3,344,000

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

53

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901617488	8	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 N 13-08	SAN JUAN DE ARAMA-META	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1994842172	9523785005	E	2025/22/11	2025/22/11	BANCOLOMBIA	0	$3,344,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$1,822,400	$0	$0	$1,822,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$609,600	$0	$0	$609,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	8	$609,600	$0	$0	$609,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
COMPENSAR	CCF24	892,000,146	3	8	$456,000	$0	$0	$456,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$456,000	$0	$0	$456,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS EPS	EPS006	900,156,264	2	5	$285,000	$0	$0	$285,000
TOTAL				8	$3,344,000	$0	$0	$3,344,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901617488	8	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 N 13-08	SAN JUAN DE ARAMA-META	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2003457145	98745517845	E	2025/12/22	2025/12/22	BANCOLOMBIA	0	$2,462,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)							$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$411,400		$0	$0		$2,462,200
Centro de Trabajo: RIESGO 1 (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
Ciudad: SAN JUAN DE ARAMA Depto: META (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$15,000		$0	$0		$698,600
1	CC	4264116	CHIVATA JUAN		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
2	CC	7179641	ORTEGON SEBASTIAN		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	0.522%	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (4 Afiliados)							$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$396,400		$0	$0		$1,763,600
Ciudad: SAN JUAN DE ARAMA Depto: META (6 Afiliados)							$5,694,000	$911,200			$5,694,000	$228,000			$5,694,000	$228,000			$5,694,000		$396,400		$0	$0		$1,763,600
3	CC	1072748412	USECHE JAIDER		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	17307674	LADINO ADRIANO		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
5	CC	17319544	OSORIO LUIS		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
	CC	14318841	HURTADO EFRAIN		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS006	30	$1,423,500	$57,000	CCF24	30	$1,423,500	$57,000	14-1	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total	**Afiliados(6)**						$8,541,000	$1,366,800			$8,541,000	$342,000			$8,541,000	$342,000			$8,541,000		$411,400		$0	$0		$2,462,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901617488	8	VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 22 N 13-08	SAN JUAN DE ARAMA-META	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-12	2003457145	98745517845	E	2025/12/22	2025/12/22	BANCOLOMBIA	0	$2,462,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$1,366,800	$0	$0	$1,366,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$411,400	$0	$0	$411,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$411,400	$0	$0	$411,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$342,000	$0	$0	$342,000
COMPENSAR	CCF24	892,000,146	3	6	$342,000	$0	$0	$342,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$342,000	$0	$0	$342,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS EPS	EPS006	900,156,264	2	4	$228,000	$0	$0	$228,000
TOTAL				6	$2,462,200	$0	$0	$2,462,200

2025/12/22 04:42 PM

VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901617488-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CL 22 13 08, San Juan De Arama, Meta, Colombia
Tel. 3222737255

Autorización facturación electrónica No. 18764096475357 válida desde 2025-08-01 hasta 2026-08-01 rango desde FVE-126 hasta FVE-500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	**899999701-4**
Nombre o Razón Social:	**MUNICIPIO DE GUADUAS**
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	**diego123jimenez@hotmail.com**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	**FVE - 133**
Fecha Emisión	**11/12/2025 17:33:42-05:00**
Fecha Vencimiento	
Moneda	**COP Colombia, Pesos**
Forma de Pago:	**Contado**
Medio de Pago:	**Transferencia Débito Bancaria**
Total de Lineas:	**4**

#	Código	Descripción	U. M	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1	VALOR DEL ACTA PARCIAL NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA NO. 242 DE 2025. CORRESPONDIENTE AL 50% DE EJECUCION DEL CONTRATO (Pago Parcial)	WSD	1,00	$48.872.057,51				0,00	$48.872.057,51
2	AIU1	ADMINISTRACION	EA	1,00	$12.706.734,96				0,00	$12.706.734,96
3	AIU2	IMPREVISTOS	EA	1,00	$977.441,15				0,00	$977.441,15
4	AIU3	UTILIDAD	EA	1,00	$2.443.602,88				0,00	$2.443.602,88

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$64.999.836,50
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$64.999.836,50

CUFE:	204caad75a76798459187ba24ff399f14300f36be00f6800cc436993e320d22869ded6d0585c0291f3aa52d1a8db1d10
Total con letra:	(sesenta y cuatro millones novecientos noventa y nueve mil ochocientos treinta y seis pesos cincuenta centavos)

CONSIGNAR CUENTA DE AHORROS BANCO AGRARIO # 4-453-23-00441-4

Firma Digital: kSUgEaOVyZK86hfIkRiIMUzZGgmS5ifqNNgTfSzqitpbAn2K3TIED9ccEvPzCHow
N1KutB+J+aczl7bDpYzl3G+vFJK5eB2D6om+U2YFyRTYQRusfN
2gZlgWzP6Be0Td d2Nv8HR2LF+vQb1lcvRdkyb/HaeKOJqk0Q7/xRkxRxg0kF/MGh5SqsKHvl8G9tVf XmS111/al+kwngLWytJV2ATUMBjEzPE0khW
PRcXpVZakogTT+inr3SBYVgiL2eoo JgqXJ1GZjd76e9J44kuzBY4XVkPLJfLBhqC91ZDdS614UxbLraiipdzZkovqJMXJ AvUCo1hc9SuDp3Lshoma
dA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141043100657

(415)7707212489984(8020) 000014104310065 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 7 4 8 8	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	San Juan de Arama 6 8 3

41. Dirección principal
CLL 22 13 08

42. Correo electrónico VICTORCAMARGOCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 2 7 3 7 2 5 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 2 0 7 0 1	3 8 1 2	2 0 2 2 0 7 0 1	3 8 1 1	4 9 2 3		0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAMARGO AGUILAR VICTOR BENISIO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 12-06-2025 11:12:18AM

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: VICTOR CAMARGO Y B CONSTRUCCIONES SAS, identificado(a) con NIT JURIDICAS No. 9016174888, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-453-23-00441-4, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en SAN JUAN DE ARAMA, a los nueve (09) días del mes de mayo de 2023, con destino a: SOLICITUD DEL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
OF. SAN JUAN DE ARAMA-META

FIRMA AUTORIZADA

DIRECTOR (A) OFICINA

59

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

INFORME DE SUPERVISION

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
24 de diciembre de 2025	MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO SECRETARIA DE PLANEACIÓN	

II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION

Nombre:	
Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
VICTOR CAMARGO & B CONSTRUCCIONES SAS	901.617.488-8

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	C.P.S.	Convenio	Fecha: DD/MES/AÑO	Contrato No.
X			12/09/2025	242-2025
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición
12/09/2025			3 MESES	

OBJETO

"EJECUTAR LA DEMOLICIÓN EN LOS PROCESOS POR INFRACCIÓN A LAS NORMAS URBANÍSTICAS EN LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA".

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
2/12/2025	9/12/2025	2

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Mantener a sus trabajadores afiliados a la Seguridad Social, parafiscales y A.R.L durante toda la ejecución del Servicio	Cumple, CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
Mantener a sus trabajadores debidamente uniformados e identificados durante toda la ejecución del contrato	Cumple, PERSONAL CON DOTACIÓN
Utilizar materiales de óptima calidad	Cumple, INSTALACIÓN DE MATERIALES OPTIMOS Y DE CALIDAD, CUMPLIENDO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Todos los trabajadores deben contar con certificación de Trabajo seguro en alturas según la actividad que realicen y el trabajo que desempeñen dentro del proyecto una vez se adjudique el presente proceso	No aplica
El respectivo control y seguimiento al desarrollo de las obras hasta su entrega a satisfacción a la entidad	Cumple, logró realizar las actividades de acuerdo al cronograma de obra.

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, la empresa contratista y su contador certifican, que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002, segun certificación adjunta

Firma del supervisor
MARIA ANGELICA MARTINEZ SALGUERO
SECRETARIA DE PLANEACION
