eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MP 239	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	RONDA N°2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUNTO DE CÁMARA CAI 8 CAI KENEDDY

FECHA DE INICIO **14 / 11 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Al momento de realizar inspección del punto de cámara, se evidencia fallas funcionales en la UPS y en su relé de gabinete.

ACTIVIDAD REALIZADA

Cámara Fija IP Tipo Bala: Se realiza inspección inicial del estado y funcionalidad de la cámara fija, encontrándose en correcto funcionamiento, con transmisión de video estable y condiciones físicas adecuadas, sin evidenciar anomalías en sus parámetros de operación ni en su estructura. Posteriormente Se realiza proceso de limpieza aplicando líquido desengrasante con el uso de paño antiestático, con el fin de remover residuos, garantizar la correcta visibilidad del lente y preservar las condiciones de operación de los equipos.

UPS y Switch: Se realiza inspección técnica de estado y operatividad de los equipos, verificando parámetros de funcionamiento y condiciones físicas, encontrando que la UPS presenta problemas funcionales. Dicho reporte se realizó en el acta de afectación de bolsa AB 009 del informe 3 y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la supervisión. Como actividad complementaria, se lleva a cabo mantenimiento preventivo de superficie, mediante la aplicación de líquido desengrasante y paño antiestático, con el propósito de remover partículas contaminantes, mitigar riesgos de acumulación de polvo y asegurar la continuidad funcional de los equipos y se aplicó limpiador de circuitos electrónicos.

Gabinete: Se inspeccionó el estado físico del gabinete tanto al interior como al exterior encontrándolo en óptimas condiciones, se revisó la chapa de la puerta hallándola sin ninguna novedad, por otra parte, se verificó el correcto estado y funcionamiento del empaque de la puerta que evita el ingreso del agua o insectos. Se aplico liquido lubricante en las bisagras de la puerta y en algunos componentes mecánicos del gabinete. Adicionalmente se realizó limpieza al interior y exterior del mismo con aire de baja presión y posteriormente con líquido desengrasante aplicado con paño antiestático; durante el proceso no se evidenciaron signos de corrosión. Adicionalmente se identificó que el relé del gabinete presenta falla funcional. Dicho reporte se realizó acta de afectación de bolsa AB 098 del informe 3 y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la supervisión

Protecciones (DPS, IP): Se inspeccionó el estado físico de los elementos de protección: DPS Breaker y borneras de conexión; después de realizadas las respectivas mediciones, se pudo constatar que no presentaban novedades en su correcto funcionamiento. Se realizaron mediciones de voltaje y se obtuvo un resultado dentro del rango de operación del equipo; se realizó ajuste de tornillos de las borneras verificando las conexiones de bornes y terminales. Estos elementos quedaron en normal operación.

Transformador de aislamiento y protecciones: Se inspeccionó el estado del transformador encontrándolo en condiciones óptimas físicas; se realizaron mediciones de voltaje obteniendo un resultado dentro del rango de operación adecuado, por último, se realizó ajuste de las borneras y terminales.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8079954 - **longitud:** -75.6718997 - **altitud:** 1442 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






eLATIN
14/11/2025
4.8078572 -75.67205983333334
Altitud:1446.4msnm


eLATIN
14/11/2025
4.807818983333333 -75.67212638333334
Altitud:1452.0msnm


eLATIN
14/11/2025
4.807809450000001 -75.67211605000001
Altitud:1452.3msnm


eLATIN
14/11/2025
4.807839783333334 -75.67214126666666
Altitud:1451.3msnm


eLATIN
14/11/2025
4.80782605 -75.67213543333334
Altitud:1455.8msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8079482 -75.6719757
Altitud:1441.5msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.8076506000000006 -75.67227363333333
Altitud:1483.6msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025


eLATIN
14/11/2025

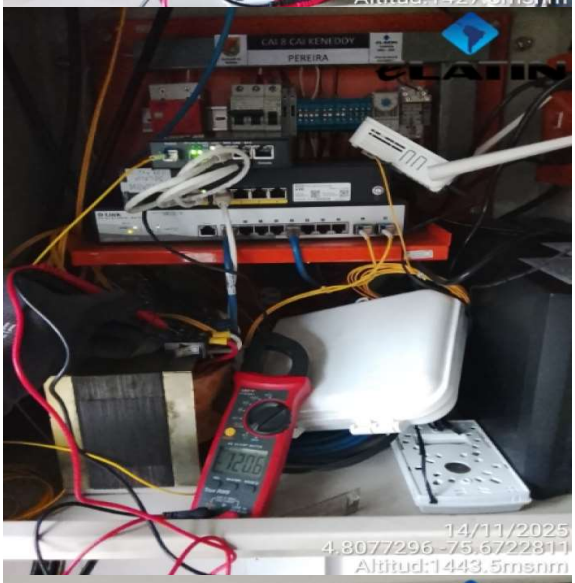

eLATIN
14/11/2025
4.807803666666667 -75.67227605
Altitud:1447.0msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.8078854833333333 -75.67218296666667
Altitud:1443.0msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
Altitud:1427.8msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.8079981833333333 -75.67226361666667
Altitud:1427.8msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.807894016666666 -75.67227046666667
Altitud:1459.5msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.8077296 -75.6722811
Altitud:1443.5msnm


eLATIN
14/11/2025
4.807836583333334 -75.67216731666667
Altitud:1448.6msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.807836583333334 -75.67216731666667
Altitud:1448.6msnm

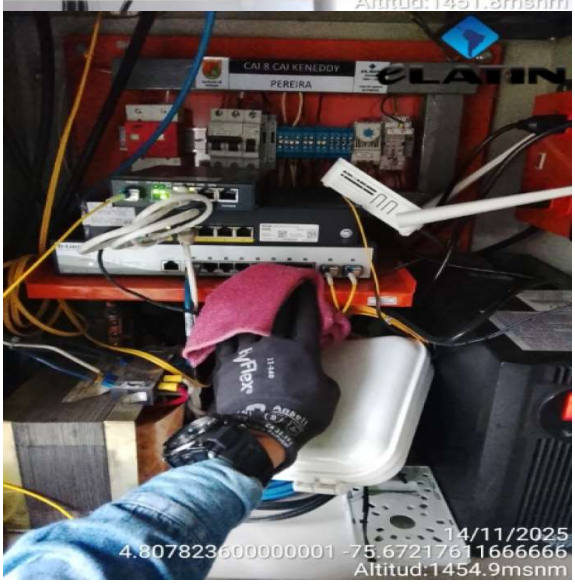

eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.8078330000000005 -75.67218906666668
Altitud:1449.1msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.80788295 -75.67218133333334
Altitud:1450.2msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.8078082 -75.67216523333333
Altitud:1451.8msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8078082 -75.67216523333333
Altitud:1451.8msnm


eLATIN
14/11/2025
4.807823600000001 -75.67217611666666
Altitud:1454.9msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.807823600000001 -75.67217611666666
Altitud:1454.9msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.807823600000001 -75.67217611666666
Altitud:1454.9msnm


CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
eLATIN
14/11/2025
4.807825283333333 -75.67219391666666
Altitud:1448.5msnm


eLATIN
14/11/2025
4.807819966666667 -75.67221503333333
Altitud:1446.4msnm

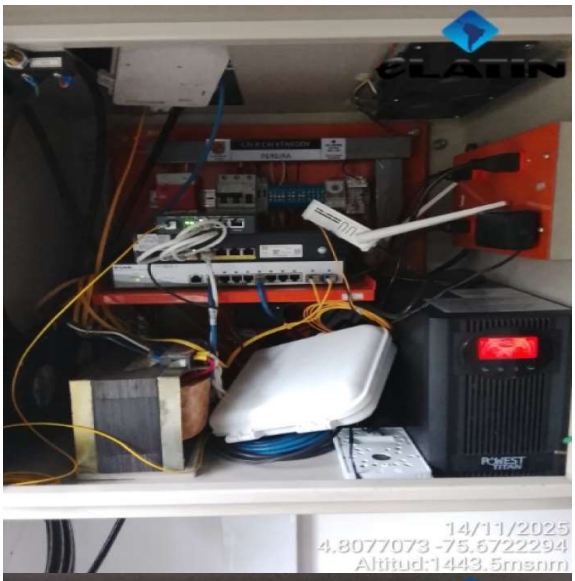

eLATIN
14/11/2025
4.8078214500000005 -75.67221063333334
Altitud:1451.4msnm


eLATIN
14/11/2025
4.807822883333333 -75.67220101666666
Altitud:1450.8msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.807817866666666 -75.67219833333334
Altitud:1449.0msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.807813933333334 -75.6721952
Altitud:1447.6msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.80781685 -75.6721381
Altitud:1448.0msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8077073 -75.6722294
Altitud:1443.5msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.807785766666667 -75.67216271666666
Altitud:1487.7msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.8077266 -75.6722317
Altitud:1444.0msnm


eLATIN
14/11/2025
4.8077258 -75.6722259
Altitud:1444.0msnm


eLATIN
CAI 8 CAI KENEDDY
PEREIRA
14/11/2025
4.8077258 -75.6722259
Altitud:1444.0msnm





OBSERVACIONES	
Se evidenció que la UPS presenta problemas funcionales. Dicho reporte se realizó en el acta de afectación de bolsa AB 099 del informe 3 y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la supervisión. Adicionalmente, se identificó que el relé del gabinete presenta falla funcional. Dicho reporte se realizó en el acta de afectación de bolsa AB 098 del informe 3 y se encuentra pendiente de aprobación por parte de la supervisión.	
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS	FIRMA
Nombre José Sebastián Mayoral **C.C** 1.120.217.147 **Cargo** Ingeniero de Soporte **Teléfono** 3127095797	Sebastián Mayoral
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO	FIRMA
Nombre Sebastián Madrid **C.C** 9.861.041 **Cargo** Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana **Teléfono** 3117076440	
