eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	MC 110	EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:	PUNTO DE CÁMARA P29 GLORIETA CALLE 50 - CÁMARA DOMO PTZ

FECHA DE INICIO 03 / 12 / 25

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 138 del informe 5, se le informó a la supervisión sobre el estado de la cámara PTZ, donde el equipo se encuentra energizada y con conectividad de red activa a nivel de red mediante protocolo (Ping) hacia su dirección IP; sin embargo, no genera imagen de video, mostrando únicamente una pantalla negra. Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de la cámara PTZ de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 138 del informe 5 donde

Se realizó la desinstalación de la cámara tipo PTZ con falla, con su respectiva fuente de poder (adaptador de corriente).
Se desinstaló el acople existente debido a que no era compatible con la nueva cámara a instalar.
Se instaló el nuevo acople.
Se realizó la instalación de la nueva cámara tipo PTZ.
Se instaló una (1) fuente de poder totalmente nueva la cual fue conectada a la UPS.
Se conectó la cámara tipo PTZ al Switch de punto de cámara.
Se realizaron pruebas de conectividad, calibración de video, recorrido y funcionalidad.

Característica del equipo instalado:

Marca: DAHUA
Modelo: DH-SD5A232GB-HNR
Cantidad: 1
Número de serie: BG0D03CPAJ143B0

Una vez concluidas las pruebas de manera exitosa, la cuadrilla se retira del punto de cámara sin novedad.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.807415 - **longitud:** -75.723435 - **altitud:** 1334 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO






eLATIN
03/12/2025
4.807395 -75.72344
Altitud:1340.3msnm


eLATIN
03/12/2025
4.807313333333333 -75.72353333333334
Altitud:1372.7msnm

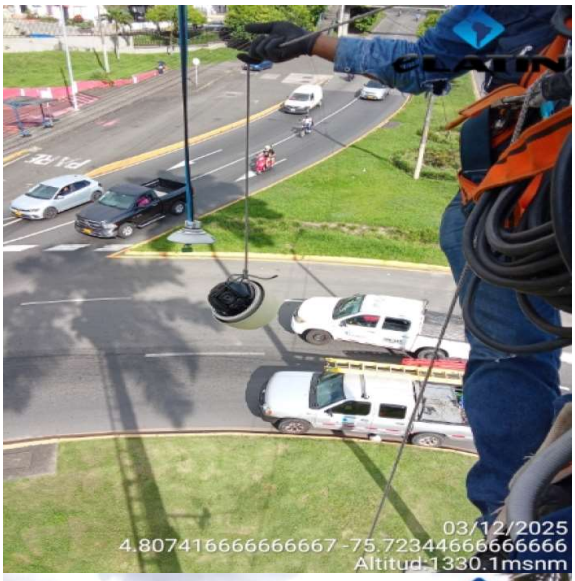

eLATIN
03/12/2025
4.8075033333333333 -75.723485
Altitud:1370.8msnm


eLATIN
03/12/2025
4.807918 -75.7232607
Altitud:1330.0msnm


eLATIN
03/12/2025
4.807413333333333 -75.72344166666667
Altitud:1324.0msnm

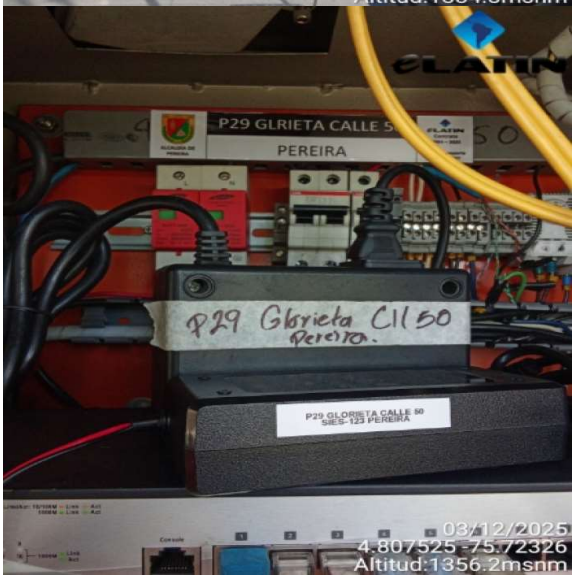

eLATIN
03/12/2025
4.807431666666666 -75.72346333333333
Altitud:1326.8msnm


eLATIN
03/12/2025
4.8077487 -75.7227768
Altitud:1335.0msnm

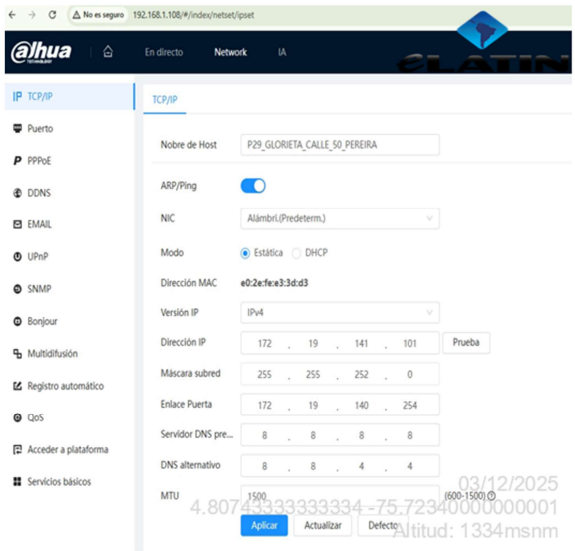

eLATIN
03/12/2025
4.807416666666667 -75.72344666666666
Altitud:1330.1msnm

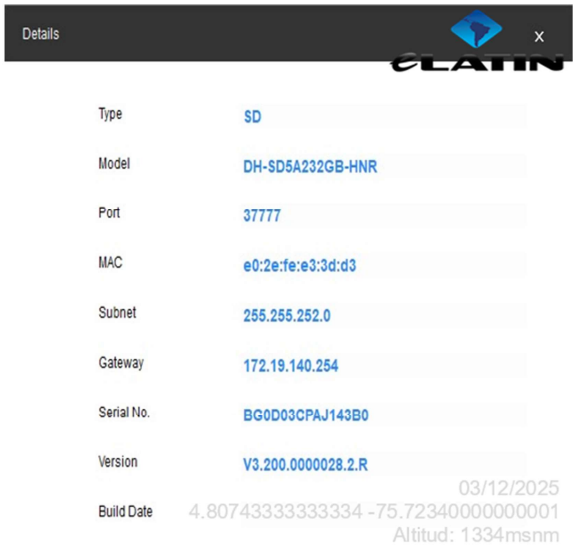

eLATIN
03/12/2025
4.807433333333334 -75.72340000000001
Altitud:1334.3msnm

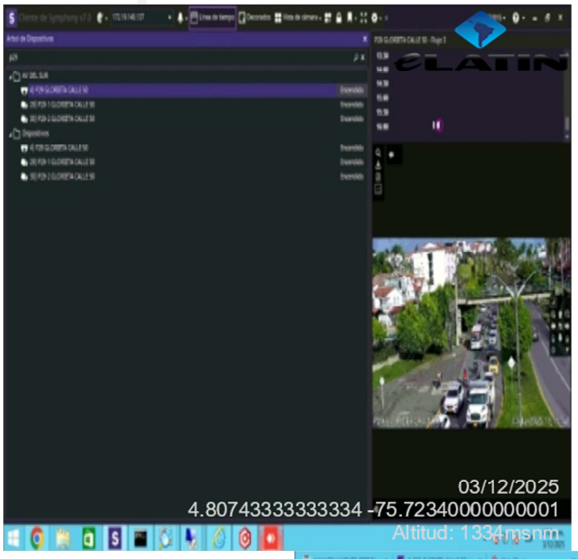

eLATIN
03/12/2025
4.807401666666666 -75.72338333333333
Altitud:1332.8msnm

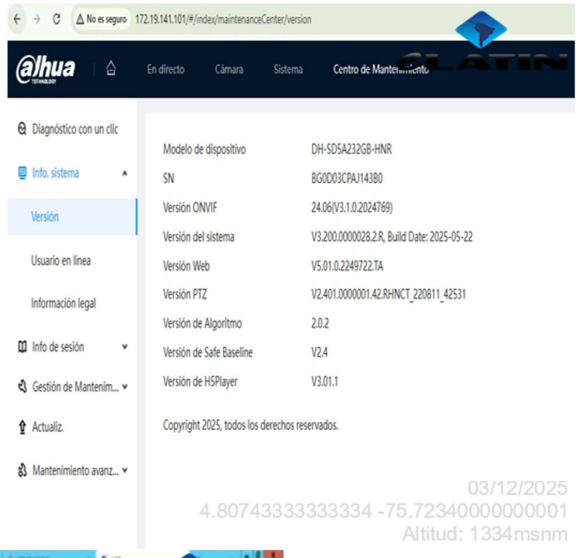

eLATIN
P29 GLRIETA CALLE 5
PEREIRA
P29 Glrieta C1150
Pereira.
P29 GLORIETA CALLE 50
SIES- 123 PEREIRA
03/12/2025
4.807525 -75.72326
Altitud:1356.2msnm

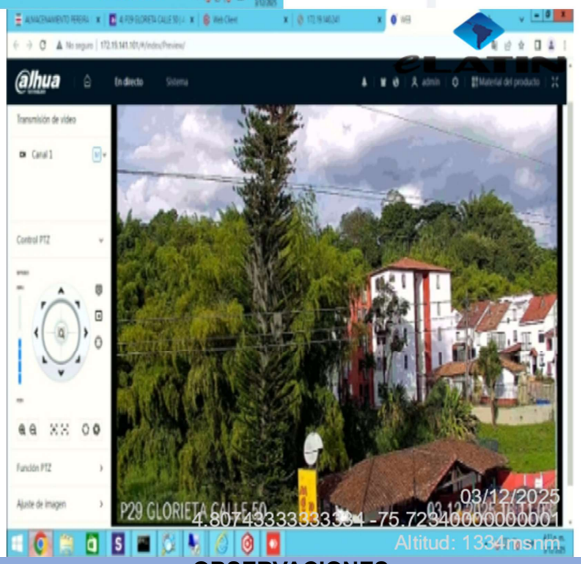

eLATIN
03/12/2025
4.807424999999999 -75.72342499999999
Altitud:1331.3msnm











OBSERVACIONES	
Luego de ejecutarse las labores de instalación, se restablece el servicio de transmisión de video en el punto de cámara.	
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS	FIRMA
Nombre José Sebastián Mayoral **C.C** 1.120.217.147 **Cargo** Ingeniero de Soporte **Teléfono** 3127095797	Sebastián Mayoral
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO	FIRMA
Nombre Sebastián Madrid **C.C** 9.861.041 **Cargo** Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana **Teléfono** 3117076440	
