eLATIN	ACTA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO No. 3984-2025	Sistema de Gestión de Calidad	
		FORMATO N°:	FT-MET-001
		Fecha:	Febrero 01/2020
		Versión:	3

ACTA N°	**MC 116**	**EQUIPO/ SISTEMA INTERVENIDO:**	**PUNTO DE CÁMARA P92 POBLADO 1 - TERMOSTATO GABINETE PUNTO DE CÁMARA**

FECHA DE INICIO **12 / 12 / 25**

NOVEDADES PRELIMINARES

Se realizó el diagnóstico de la falla y mediante el acta de afectación de bolsa N° AB 068 del informe 2, se le informó a la supervisión sobre la condición del termostato del gabinete de punto de cámara el cual presentaba un daño por sobrecalentamiento (componente quemado). Después de la aprobación por parte del supervisor del contrato, se procedió a realizar la instalación de los elementos requeridos.

ACTIVIDAD REALIZADA

A solicitud de la supervisión, se realiza la instalación de un (1) termostato de gabinete de punto de cámara de acuerdo al acta de afectación de bolsa AB 068 del informe 2, garantiza la estabilidad térmica de los equipos electrónicos alojados, previniendo fallas por estrés térmico, sobrecalentamiento de fuentes de alimentación, switches de comunicaciones y demás módulos activos, así como la formación de condensación por desbalance térmico.

GEOLOCALIZACIÓN:	**latitud:** 4.8023771550721 - **longitud:** -75.703836682914 - **altitud:** 1329 **m**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



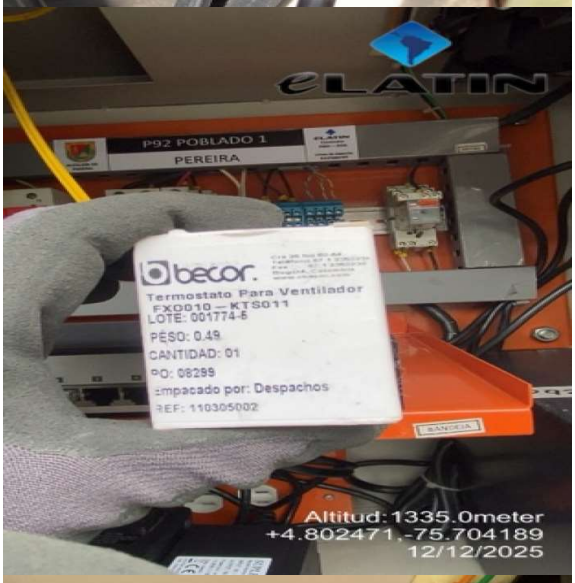







eLATIN
AXIAL FAN
Altitud:1311.6meter
+4.802473,-75.703950
12/12/2025


eLATIN
P92 POBLADO 1
PEREIRA
Altitud:1311.9meter
802501,-75.703909
12/12/2025


eLATIN
P92 POBLADO 1
PEREIRA
becor.
Termostato Para Ventilador
FX0010 – KTS011
LOTE: 001774-6
PESO: 0.49
CANTIDAD: 01
PO: 08299
Empacado por: Despachos
REF: 110305002
Altitud:1335.0meter
+4.802471,-75.704189
12/12/2025


eLATIN
becor.
Termostato Para Ventilador
Altitud:1335.0meter
+4.802484,-75.704134
12/12/2025


eLATIN
P92 POBLADO 1
PEREIRA
Altitud:1312.6meter
+4.802601,-75.703746
12/12/2025


eLATIN
Altitud:1335.0meter
+4.802518,-75.704028
12/12/2025



OBSERVACIONES		
Finalmente, se garantiza la estabilidad térmica de los equipos electrónicos, previniendo fallas por estrés térmico, sobrecalentamiento de fuentes de alimentación, switches de comunicaciones y demás módulos activos, así como la formación de condensación por desbalance térmico.		
FUNCIONARIO QUE ENTREGA – ELATIN SAS		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	José Sebastián Mayoral 1.120.217.147 Ingeniero de Soporte 3127095797	Sebastián Mayoral
FUNCIONARIO QUE RECIBE– SUPERVISOR DEL CONTRATO		FIRMA
Nombre **C.C** **Cargo** **Teléfono**	Sebastián Madrid 9.861.041 Subsecretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana 3117076440	
