INFORME MENSUAL DE OBRA N°001

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 063-2025

OBJETO: “RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.

CONTRATISTA:
CONSORCIO BUGRE 2025

CONTRATANTE:
CORPORACION AUTONOMA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE CVS

PERIODO
24 DE OCTUBRE A 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades ejecutadas en el marco del proyecto que plantea Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra que se adelanta en el municipio de Cerete, Córdoba, cuyo objeto es el **"RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**. Esta intervención tiene como finalidad optimizar las condiciones de proyecto que plantea que se mejorarán las condiciones ambientales del sector, se mitigarán los eventos de inundación y se coadyuvará en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio de Cereté específicamente en el punto tres bocas de la vereda Caracas.

Con su ejecución, se espera optimizar la sección hidrahilica en los caños Bugre, Cotorra y Culebra.

Durante el periodo que abarca este informe, se ejecutaron las actividades de obra programadas conforme al cronograma establecido y en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto. Entre las principales labores desarrolladas, se resalta la conformación de taludes, extracion de material sedimentado y optimización de la sección hidrahulica, todo debidamente realizado según el diseño hidrahulico aprobado.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de recuperación ambiental se llevará a cabo en el municipio de Cerete, localizado en la región Caribe de Colombia, dentro de la subregión de las Sabanas del departamento de Córdoba. El Municipio de Cereté se ubica en la cuenca hidrográfica del Río Sinú, en la zona denominada Medio Sinú, por su ubicación se constituye como epicentro de intercomunicaciones y centro de interconexión vial de la Troncal de Occidente a escasos 18 kilómetros de la capital del Departamento de Córdoba, la ciudad de Montería, y en la misma vía a 9 kilómetros se encuentra el aeropuerto ‘’Los Garzones’’.

El Municipio de Cereté tiene aproximadamente una extensión de 27.880 ha, de las cuales están dedicadas a actividades del sector primario 26.736 ha (agricultura 16.010 ha y Ganadería 10.753 ha) que corresponden al 96% del total del área de Municipio, 226 ha el 0.81% están representadas en humedales, el resto del área del Municipio el 3.19% están representadas por usos urbanos.

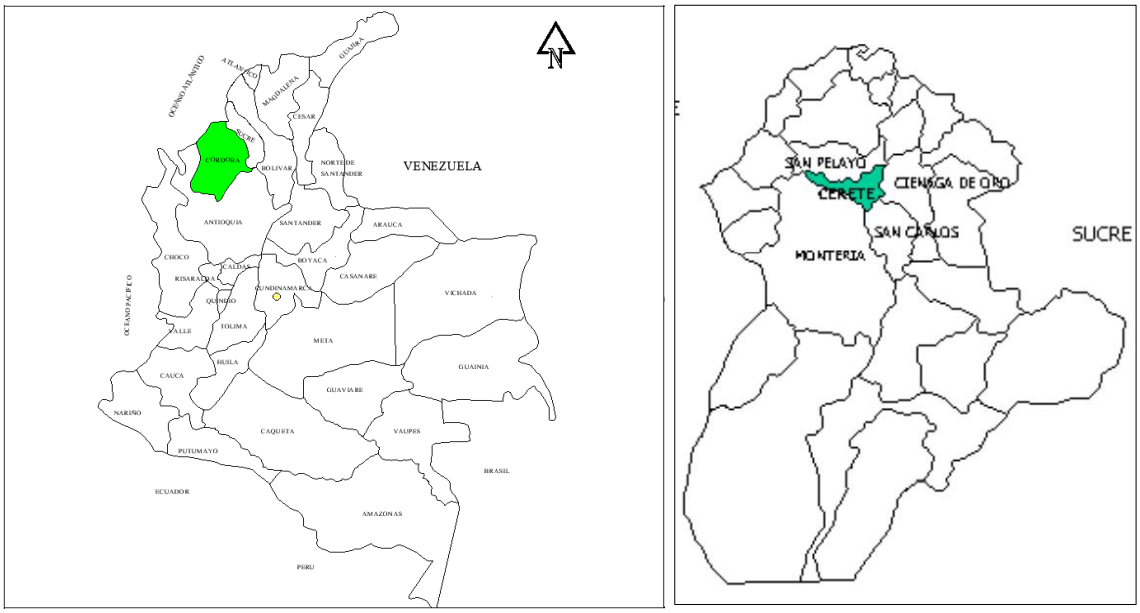


Ilustración 1 Localización general del proyecto.

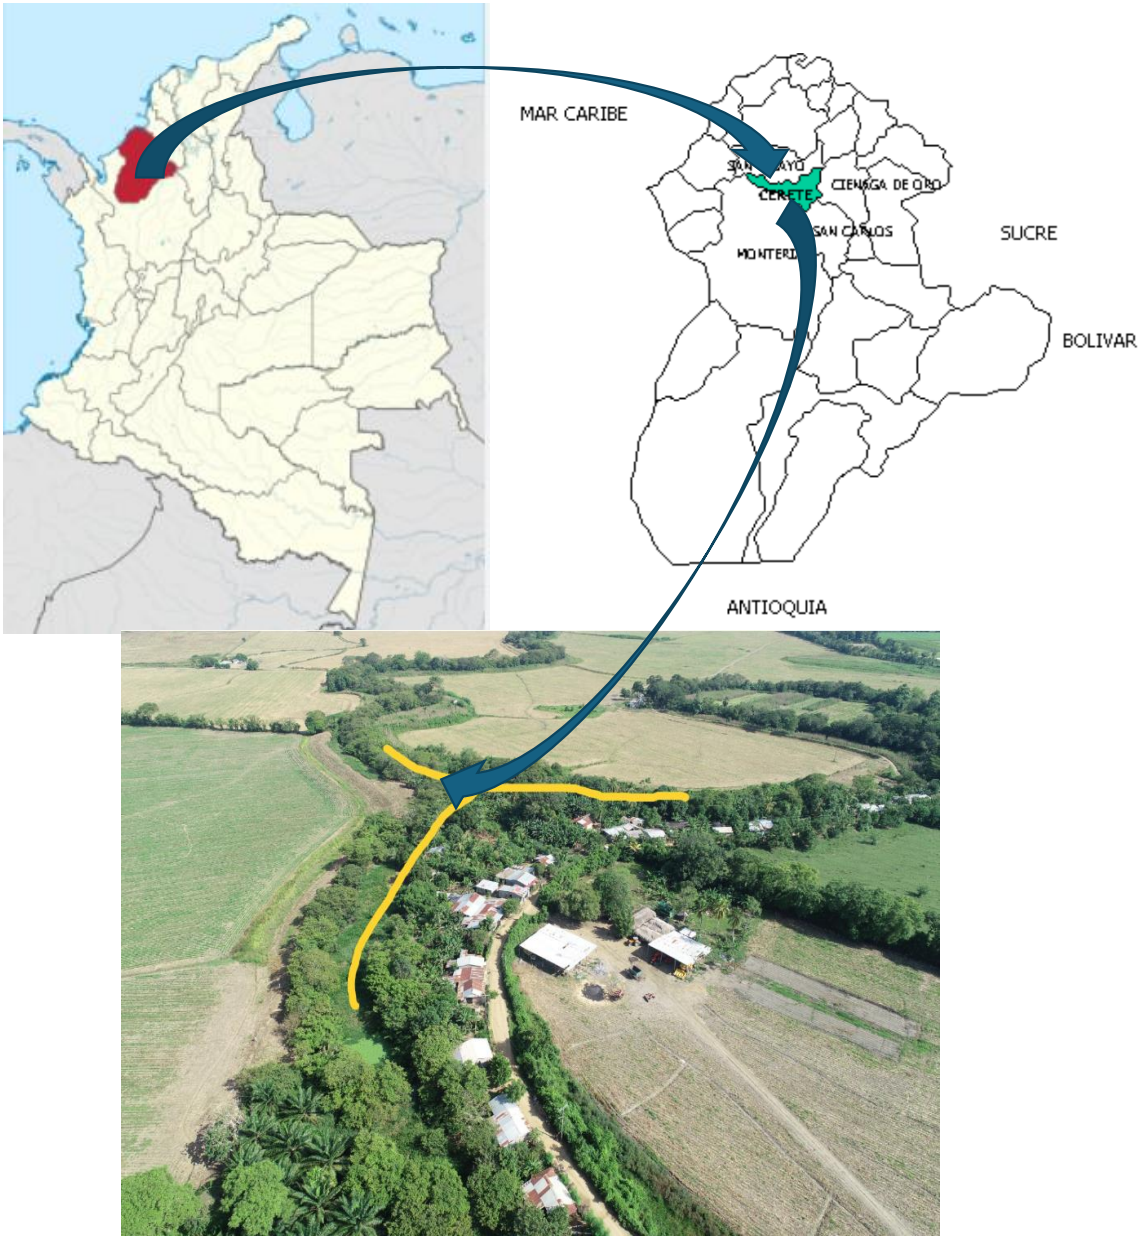


Ilustración 2 Localización especifica del proyecto.

ALCANCE DEL PROYECTO

Las tramos para intervenir con la conformación de talud y extracción de material se encuentran comprendidas en 3 tramos, mismos que suman un total de 813.44, se muestra un resumen del alcance del proyecto de pavimentación a ejecutar.

DESCRIPCION	ABSCISAS	DISTANCIA	ALTERNATIVA
TRAMO 1 CAÑO BUGRE	K0+180	180 m	CONFORMACION DE TALUD-EXTRACCION DE MATERIAL
TRAMO 2 CAÑO CULEBRA	K0+197	197 m	CONFORMACION DE TALUD-EXTRACCION DE MATERIAL
TRAMO 3 CAÑO COTORRA	K0+239	239 m	CONFORMACION DE TALUD-EXTRACCION DE MATERIAL

Tabla 1 Alcance del proyecto

SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO

Durante el mes de ejecución del proyecto, se logró un avance significativo en las actividades de obra contempladas en el cronograma, consolidando progresos importantes en la conformación de taludes, Retiro de material proveniente de la excavación, Entre las labores más destacadas de este periodo se encuentran la conformación optimización de la sección hidrahulica, actividad clave para asegurar la capacidad de soporte y estabilidad de la taludes.

Asimismo, se realizó el transporte de diversos materiales contaminantes extraidos del caño como plásticos, material vegetal, garantizando su oportuna disposición en el lugar indicado por la alcaldía para la disposición de estos residuos.


DESCRIPCION DEL PROYECTO

Recuperar la conectividad hidrológica y ecosistémica del Caño Bugre en el municipio de Cereté.


El objeto del proyecto, se logrará mediante la optimización del cauce del caño aguas prietas conformando un canal trapezoidal. El caño presenta una sección hidráulica poco definida en la que se presenta un intercambio de flujo con sistemas cenagosos y redes de drenaje pluvial.

- Aumentar la capacidad hidráulica del cauce.
- Incrementar la cultura ambiental de las comunidades.


SECCIÓN TÍPICA CAÑO BUGRE
(K0+008.98 – K0+050.00)
(K0+165.86 – K0+360.00)




SECCIÓN TÍPICA CAÑO BUGRE
(K0+050.00 – K0+089.87)
(K0+109.59 – K0+165.86)




SECCIÓN TÍPICA CAÑO BUGRE
(K0+089.87 – K0+109.59)



SECCIÓN TÍPICA CAÑO CULEBRA
(K0+008.02 – K0+070.01)
(K0+104.20 – K0+193.44)



SECCIÓN TÍPICA CAÑO CULEBRA
(K0+070.01 – K0+104.20)






Ilustración 3 Diseño cauce y conformación de talud secciones tipicas

PRESUPUESTO DE OBRA Y ACTIVIDADES A EJECUTAR

A continuación, se presentan las actividades a ejecutar en el proyecto de **RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA**, son las siguientes:

"RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".					
PRESUPUESTO OBRAS					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VR. PARCIAL**
1	**Preliminares**				
1.1	Localización, trazado y replanteo	m	606,00	$ 3.296,0	$ 1.997.376,0
2	**Movimientos de Tierra**				
2.1	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	m3	19.450,00	$ 18.015,0	$ 350.391.750,0
2.2	Retiro de material proveniente de la excavación. Distancia mayor de 1.000 metros.	m3	24.313,00	$ 3.037,0	$ 73.838.581,0

VALLA INFORMATIVA.

El contratista de obra presento las propuestas para el diseño de la valla ante la Corporación, a la fecha se encuentra aprobada por la supervisión del proyecto.



Ilustración 1. Propuesta de valla informativa.



Fotografía 1. valla informativa.

INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

➢ INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	***063 DE 2025.***
OBJETO:	*RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.*
VALOR:	*QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS ($558.145.182)*
PLAZO DE EJECUCIÒN:	*DOS (02) MESES*
CONTRATANTE:	*CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE – CVS*
CONTRATISTA:	*CONSORCIO BUGRE 2025*
INTERVENTOR:	*VELASQUEZ CABEZA E INGENIERIA SAS*
FECHA DE INICIO	*24 DE OCTUBRE DE 2025*

Tabla 3 Información general del contrato

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO



Fotografía 1. Socialización del proyecto.



Fotografía 2. Invitación a Socialización del Proyecto.

MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

EQUIPOY MAQUINARIA	CANTIDAD
Estación Total	1
Nivel Automático	2
Equipo GPS	1
RTK	1
GPS	1
Retro – Excavadora.	2
Volquetas	2
Mini cargador	2

Tabla 2. Equipo contrato de obra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	PAGADO/TRAMITE	ESTADO	SALDO PENDIENTE POR PAGAR
Anticipo	$ 558.141.182,32	$ 223.258.073	Pago de anticipo 21/11/2025	$ 334.887.109,32
ACTA No. 1		NO SE HA TRAMITADO ACTAS DE COBRO		
TOTAL	$ 558.141.182,32	$ $ 334.887.109,32	EN TRAMITE	$ 334.887.109,32

Tabla 3. Relación de Pagos Contrato de Obra.

➢ RELACIÓN DEL PERSONAL

A continuación, se presenta el personal profesional del contratista, relacionados exigido para la ejecución del proyecto de acuerdo con los pliegos de condiciones entregados por la entidad contratante:

DESCIPCION	NOMBRE	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	50%
RESIDENTE DE OBRA	MOISES ALFONSO MARTINEZ ISAZA	100%
PROFESIONAL SISO	JOSE DAVID PEREZ LINARES	50%
TRABAJO SOCIAL	YERIS EUGENIA LONDOÑO POLO	50%

Tabla 4 Relación de personal

Se adjunta planillas pagadas de seguridad social del personal de obra.

GARANTIAS DEL CONTRATO

➢ GARANTIA SEGÚN CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relaciona las pólizas expedidas de acuerdo con las exigencias del contrato de obra:

N° de póliza	Cumplimiento	5344101041371	
	Responsabilidad civil extracontractual	5340101013573	
Riesgo	**Valor Asegurado**	**Vigencia DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 111.629.036,40	23/10/2025	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$223.258.072,80	23/10/2025	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	$55.814.518,20	23/10/2025	30/10/2028
Estabilidad y calidad de las obras	$ 111.629.036,40	Vigencia de2 años 0 Meses 0 Dias.	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
Predios Labores Y Operaciones	$ 711.750.000	23/10/2025	30/12/2025
Contratistas y Subcontratistas	$ 711.750.000	23/10/2025	30/12/2025
Vehículos propopios y no propios.	$ 711.750.000	23/10/2025	30/12/2025
Responsacibilidad Civil Patronal	$ 711.750.000	23/10/2025	30/12/2025
Daño Emergente y Lucro Cesante.	$ 711.750.000	23/10/2025	30/12/2025
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 711.750.000	23/10/2025	30/12/2025

Tabla 5 Pólizas según contrato de obra

- **GARANTIA SEGÚN ACTA DE INICIO**

A continuación, se relaciona las pólizas expedidas de acuerdo con las exigencias del contrato de obra:

N° de póliza	Cumplimiento	5344101041371	
	Responsabilidad civil extracontractual	5340101013573	
Riesgo	**Valor Asegurado**	**Vigencia DESDE**	**HASTA**
Cumplimiento del contrato	$ 111.629.036,40	24/10/2025	01/07/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	$223.258.072,80	24/10/2025	01/07/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnización laborales	$55.814.518,20	24/10/2025	31/12/2028
Estabilidad y calidad de las obras	$ 111.629.036,40	Vigencia de2 años 0 Meses 0 Dias.	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
Predios Labores Y Operaciones	$ 711.750.000	24/10/2025	31/12/2025
Contratistas y Subcontratistas	$ 711.750.000	24/10/2025	31/12/2025
Vehículos propopios y no propios.	$ 711.750.000	24/10/2025	31/12/2025
Responsacibilidad Civil Patronal	$ 711.750.000	24/10/2025	31/12/2025
Daño Emergente y Lucro Cesante.	$ 711.750.000	24/10/2025	31/12/2025
Perjuicios Extrapatrimoniales	$ 711.750.000	24/10/2025	31/12/2025

Tabla 5 Pólizas según acta de inicio

CRONOGRAMA DE OBRA

A continuación, se presenta la programación para la ejecución de las actividades contempladas para el presente proyecto:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No	ACTIVIDADES:	SEMANAS								Total actividad	
		MES 1				MES 2					
		1	2	3	4	5	6	7	8	Semanas	%
1	Localización, trazado y replanteo									2	16,7
2	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.									6	50,0
3	Retiro de material proveniente de la excavación. Distancia mayor de 1.000 metros.									4	33,3
	TOTAL:									12	100%

AVANCE DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 24 De Octubre Al 24 De Noviembre, el contratista ejecuto el **60%** de avance representado financieramente en **$334.887192,2** se presentan a continuación las actividades ejecutadas:

DESCRIPCIÓN	EJECUTADO ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	EJECUTADO PERIODO 1 ACTUAL	FALTA POR EJECUTAR	EJECUTADO ACUMULADO TOTAL
Porcentaje ejecutado	0,00%	60%	40%	100%
Valor ejecutado	60%	$ 334.887.109,32	$ 223.258.073	$ 558.145.182

- **LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO**

se procede a realizar el trazado para, verificar que cumpla con las cotas, pendientes especificadas en los documentos del proyecto. De la siguiente manera.

- **Reconocimiento del área**
    - Visita al sitio para identificar el recorrido del caño, su longitud, ancho, profundidad y estado actual.
    - Identificación de zonas críticas como obstrucciones, erosión, desbordes o puntos de difícil acceso.

- **Revisión de información existente**
    - Análisis de planos, croquis, fotografías o registros previos del caño, si los hubiera.
    - Consulta de límites de predios, servidumbres y normativas ambientales aplicables.

- **Localización del eje del caño**
    - Marcación del eje central del caño siguiendo su recorrido natural o definido en planos.
    - Identificación de puntos de inicio y fin del tramo a intervenir.

- **Trazado del área de limpieza**
    - Delimitación del ancho de intervención, incluyendo taludes, márgenes y zonas de seguridad.
    - Marcado de áreas donde se retirarán sedimentos, residuos y vegetación.

- **Replanteo de niveles**
    - Verificación de pendientes naturales para asegurar el correcto escurrimiento del agua.
    - Marcación de cotas o niveles de referencia que guiarán la profundidad de la limpieza.
- **Señalización del área de trabajo**
    - Colocación de estacas, cintas, pintura u otros elementos visibles para definir claramente la zona de intervención.
    - Señalización preventiva para evitar el ingreso de personas ajenas a la obra.

- **Identificación de interferencias**
    - Ubicación de tuberías, cables, alcantarillas u otras estructuras existentes que puedan verse afectadas.
    - Ajuste del trazado para evitar daños a infraestructuras cercanas.

- **Definición de accesos y zonas de acopio**
  - Determinación de rutas de ingreso de personal y maquinaria.
  - Señalamiento de áreas temporales para el acopio de material extraído.


- **Registro y validación**
  - Elaboración de croquis o acta de replanteo con las medidas y puntos definidos.
  - Aprobación por parte del responsable técnico o supervisor antes de iniciar la limpieza.

- **OPTIMIZACIÓN DE LA SECCIÓN HIDRÁULICA DEL CAUCE EN TIERRA. INCLUYE EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN Y RECTIFICACIÓN DE TALUDES.**

Limpieza y desbroce del cauce
Antes de intervenir con maquinaria se realizan:
Retiro de vegetación, maleza y arbustos.
Extracción de basura, escombros y sedimentos sueltos.
Retiro de obstrucciones naturales (troncos, ramas, piedras).
Objetivo: permitir el acceso y definir el trazo para la excavación.
Corte y conformación de taludes con la pendiente establecida (1:1, 1.5: que dictamino el estudio geotécnico).
Eliminación de resaltes, socavaciones o taludes irregulares.
Redistribución del material excavado si es apto para la conformación.
Compactación ligera en taludes para evitar erosión superficial.
Objetivo hidráulico:
Obtener un flujo más uniforme.
Reducir pérdidas por fricción.
Evitar socavaciones locales y deslizamientos.

- **RETIRO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. DISTANCIA MAYOR DE 1.000 METROS.**

Se Uso la retroexcavadora para el Acopio temporal que fue necesario.
Verificación de que el material esté dentro de las especificaciones permitidas para disposición.
Desplazamiento con volquetas dando Cumplimiento a la rutas autorizadas, para la disposición del material
Se realizo el Vertimiento ordenado en el botadero autorizado.
Se Nivelo y se extendido el material a botar y con el debido Cumplimiento de normas ambientales para la protección de suelos.

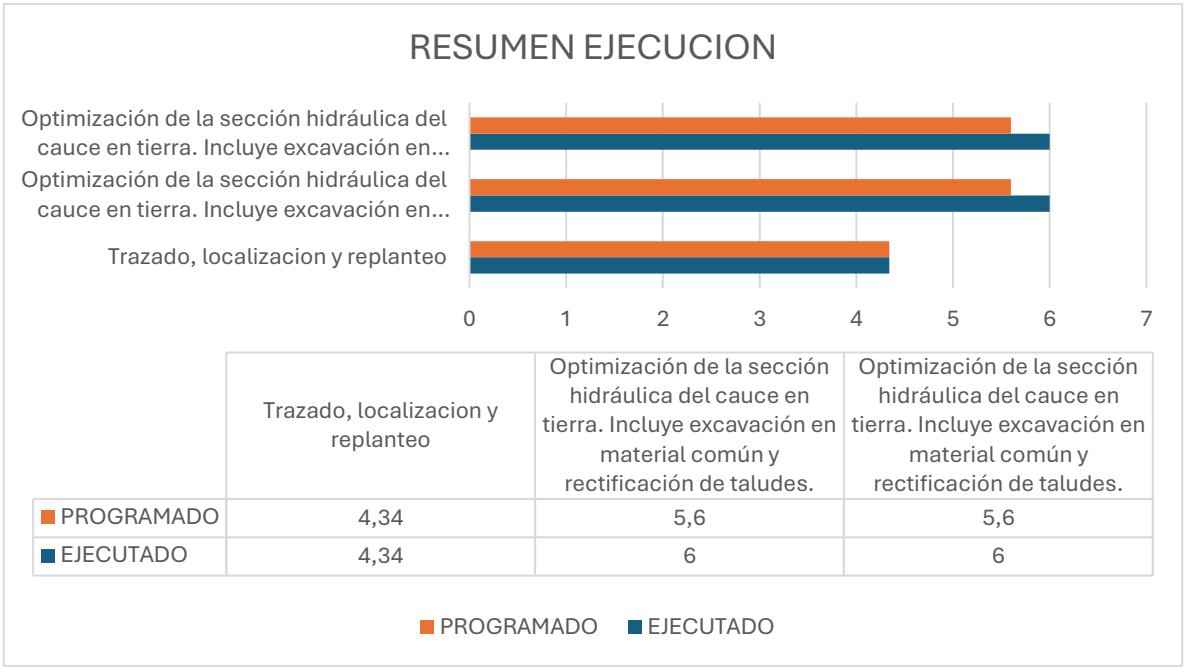

	Trazado, localizacion y replanteo	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.	Optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra. Incluye excavación en material común y rectificación de taludes.
PROGRAMADO	4,34	5,6	5,6
EJECUTADO	4,34	6	6

Gráfico Indicadores de seguimiento periodo 1.








Ilustración 1 antes de la intervención








Ilustración 2 durante la intervencion






















Ilustración 3 tramos intervenidos


CONCLUSIÓN GENERAL

- La actividad de localización y replanteo para la limpieza del caño de aguas se desarrolló de manera satisfactoria, permitiendo identificar con precisión el trazado, la ubicación y las condiciones del sistema de conducción existente. Gracias a este proceso previo, fue posible definir correctamente los puntos de intervención, minimizar riesgos durante la ejecución y optimizar los recursos humanos y materiales. El replanteo efectuado garantizó que las labores de limpieza se realizaran conforme a los parámetros técnicos establecidos, contribuyendo al adecuado funcionamiento hidráulico del caño, a la prevención de obstrucciones futuras y a la mejora del sistema de drenaje en general.

- La optimización de la sección hidráulica del cauce en tierra, mediante la excavación en material común y la rectificación de taludes, permitió restituir y mejorar la capacidad de conducción del caudal, garantizando un flujo adecuado del agua y reduciendo el riesgo de desbordamientos e inundaciones. Estas intervenciones contribuyen a la estabilidad geométrica del cauce, minimizan procesos de erosión y socavación, y aseguran un comportamiento hidráulico más eficiente, especialmente durante eventos de lluvia intensa. Asimismo, la correcta disposición del material excavado y el perfilado final del cauce favorecen la sostenibilidad de la obra y facilitan la implementación de medidas de protección y mantenimiento a largo plazo

CONCLUSIONES

- El día 24 de Octubre de 2025 se realizó suscripción del acta de inicio, de esta manera iniciando el proyecto de mejoramiento.
- Nos encontramos al día con el pago de la planilla de seguridad social del personal.
- Se estableció la veeduría.
- Se indentifico y se acomulo en un sector provisto para ello el material plástico.
- Se finalizo con la actividad de excavación de material común.
- En el presente informe se presenta un avance de obra del **60%** de avance representado financieramente en **$ 334.887192,2**



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
C.C N° 78.038.056 de Cienaga de oro-Córdoba
REP. LEGAL CONSORCIO BUGRE 2025

ANEXOS

PLANILLA.DE.SEGURIDAD.SOCIAL

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902000686
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BUGRE 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 13 63 60 CA 1 URB CASTILLA	TELÉFONO:	7856645
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997736979**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		9			
ESTADO:		GUARDADA			

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 53.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 53.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 107.100
		SUBTOTAL:	4	**$ 214.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 41.900
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 41.900
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 83.700
		SUBTOTAL:	4	**$ 167.500**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 53.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 53.600**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	4	$ 93.400
		SUBTOTAL:	4	**$ 93.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	4	$ 27.000
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	4	$ 40.300
		SUBTOTAL:		**$ 67.300**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 596.100**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	902000686
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO BUGRE 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	CR 13 63 60 CA 1 URB CASTILLA	TELÉFONO:	7856645
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7997738610**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
ESTADO:		GUARDADA			

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 455.600
		SUBTOTAL:	4	**$ 911.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 178.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 356.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 712.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8910800051	CCF16	CCF16-COMFACOR	4	$ 228.000
		SUBTOTAL:	4	**$ 228.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	4	$ 396.400
		SUBTOTAL:	4	**$ 396.400**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	4	$ 114.000
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	4	$ 171.200
		SUBTOTAL:		**$ 285.200**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 2.532.800**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

ANEXOS

BITACORA

Bitacora de obra

Inicio de Actividades

24 de Octubre

Dia Soleado

Se inicia los trabajos, reunion
Contratista, e interventoria para
Ordinar las actividades a realizar
se inicia con reptantes de limpieza.
con maquinaria y. intervencion de Gatos
(Cotorra) (Bugre) (Culebra)
Personal: Ing. Residente, topografo
Siso, trabajador Social
Siso: inducion a operadores y
Personal a trabajos en obra
Luisa Martinez Diana Patricia
Ing Residente Pinto Interventoria

25 de octubre (Sabado)
Dia: Soleado

trabajo de limpieza y replante
Con maquinaria

Personal: Ing. Residente topografo
Sisto, trabajador Obra

Holger Carbajal
Ing. Residente

Jorge Rodriguez
Ing. Interventor

26 de Octubre (Domingo)
No se trabaja

Bitacora de obra

27 de octubre (Lunes)

trabajo de limpieza y Replanteo. Con maquina retro Con orruga

Personal: ing, Residente, topografo Siso, trabajadores de

Moises Martinez
Ing. Residente

Jorge Rodriguez
Divinteruentor

Bitacora de obra
28 de octubre (martes)

Dia: Soleado

trabajos de limpieza retiro de material Colmatado:
Se inicia con Cano Cotorra

personal: ing Residente, interventoria topografo

Luis Martinez
ing. Residente

Diego Rodriguez
Dir interventoria

Bitacora de obra
24 de octubre. (miercoles)
Pk: Solear

Limpieza y retiro de material
Cano cotarra, Longitud de 268,81
Ancho Corona 24 m y 18 m de
base.

Personal: Ing. Residente, Interventoria
Topografia

Muñoz Martin
Ing. Residente

Diego Padrigo
Interventoria

Situación de obra

Día: Jueves 30 de octubre (jueves

Se sigue con trabajo de retiro de material con retiro con arrugo en canto cortina. Secado de 24 m de ancho cortina

Personal: Ing. Residente, topógrafo, inspector SISO

Luis Martinez
Ing Residente

Jorge Rodriguez
Inspector

Practica de obra
31 de octubre (viernes)
Dic: Salesa

Inicio de dia con inventario de
cabales y trabajo de limpieza
y ordenar y de Materiales con
Pedro: Mientras tanto Sara realiza
Visita a viviendas
Personal: Ing. Residente topografo
Sisa, trabajo Sara

Moises Martin
Ing Residente

Jorge Pedriza
Inventario

Bitácora de obra

1 de Noviembre (Sábado)

* Siguen con trabajos de Retiro de Material en Campo Capitanejo después de Material Sobrante.

* Seca Siguen con charla en la Comunidad

Personal: Ing Res, * Seca, topógrafo

Marisol Martínez
Ing. Residente

Jorge Rodríguez
Inspector

Bitacora de obra

2 de Noviembre (Martes)

Cato Cadavid con un avance de 80 mts, perfil del talud 1.1.5 con cuneta corona 24m

Personal: 1 Ing. Residente, 1 Secretaria topografo

Jhon Fredy Muñoz Ing. Residente

Jhon Fredy Rodriguez Inspector

Bitacora de obra

3 de Noviembre (Entrada)

El dia de hoy se realizo el retiro de material en Caño Cotica.

Personal: Ing. Residente, topografo, intervencion

Muro Martinez
Ing. Residente

Jorge Pedroza
Intervencion

Bitacora de Obra
4 de Noviembre (Miércoles)

Se Sigue Con interiores de Cocina
Estuvo Con un avance de
130 m. Retiro de Materiales
Sobrantes. Retiro de Arboles
que interfieren.
Personal: Ing Residente, topografo
inspector

Luisa Martes
Ing. Residente

Jorge Pedraza
Inspector

Norma

Bitacora de obra

5 de Noviembre (Miercoles)

Dia: Soleado

Avance en Carga Cotorra de 190 m! Perforacion y retiro de Klaten

Personal: Ing. Residente topografo Interventoría, Sisa

Moises Murillo Jorge Rodriguez

Ing Residente Interventor

Bitácora de obra

6 de Noviembre (Sábado)

Día: Lluvioso

Se inicia trabajo desde las 9:40 am por lluvia parte del taludeo y cateo cobertura y retiro de Materiales

Personal: Ing Residente Topógrafo Inspectores SIG

Musse Mutis
Ing Residente

Jorge Pedro
Inspector

Bitacora de obra

7 de Noviembre (Domingo)

No se trabajo

Bitacora de obra

8 de Noviembre (Lunes)

Dia: Soleado

Inc.

Inicio de trabajos de retiro de Material Con Volcos,

Siendo 11:00 Am se Sigue Con Perfilamiento Faltante.

Retiro de Arboles que interfieren

Personal: Ing Residente, topografo, Inspector

Maquina: Volco, Retro excavadora

Ing. Residente

Ing. Residente

Bitacora de obra
de Movimiento (Standard)
Dia: Sabado

avance de 230 mt; se sigue
retirando material y llenar
con volquetas

Personal: Ing Residente - topogr
Interventor

maquina: Volco - Retro con arpon

Nurse Martin
Ing Residente

Arq. Rodriguez
Interventor

Bitacora de obra

9 de Noviembre (Domingo)

Dia: Soleado

Avance 260 mt, Siend 6 4pm, Retiro material con Vactor, Se finaliza Anchura Cercano a base. (Ko+000.000 - Ko+260)

Personal: Ing. Residente, topografo, Interventor

Ing. Residente

Ing. Interventor

Bitacora de obra

10 de Noviembre (Luna)

Dia: Soleado

Se inicia con la intervencion de Cano bogue, (340 mL), Anch de Corona dedicada a una base de (Ko+ 000.00 _ Ko+ 89.87), (Ko+109.59 - Ko+ 340.00) de 18m. y (Ko+89.87 - Ko+109.59) a una base dedicada a 14.5). Maquinar con retro excavadora inicia Limpieza desde Ko.

Personal: ing. Residente, topografo, inspector

Maquinaria: Retro excavadora,

Moises Martinez
ing. Residente

Luis Rodriguez
interventor

Bitacora de obra
11 de Noviembre (Martes)

Dia: Nublado

No se inician los trabajos por lluvia se reinician el dia 12 a las 10:00 Am con limpieza de la matacan.

Personal: Ing residente, topografo e inspector.

Maquinaria: Retro excavadora

Luis Rodriguez
Inspector

Ing residente

Bitacora de obra

12 de Noviembre (Miercoles)

Dia: Soleado

30 mts lineales de avance en Canal bugrol | Limpiez y retiro de Materiales

personal: ing Residente topografo
Intervantor, Sisa

Moises Martinez
ing Residente

Luis Rodriguez
Intervantor

Bitacora de obra

13 de Noviembre (Viernes)

Dia: Sabado,

Trabajo de retiro de Material y proceder a perdida Lado derecho. Volcar Tepan Sienl las 10:00 Am para retiro de material, topografia revisa Cerca

Personal: Ing. Residente. topografia Interventoria

Jose Plasting
Ing. Residente

Jose Rodriguez
Interventor

Norma

Bitacora de obra

14 de Noviembre (viernes)

Dia: Soleado

Se inicia dia con los trabajos en cada bugar y limpieza y retiro de Materiales topografia revisa los Corte a realizar.

Personal: Ing Residente topografo, interventoria

Moises Martinez
Ing. Residente

Luis Rodriguez
interventor.

Ataco de Ayu
15 de Noviembre (sabado)

Dia: Soleado.

avance de 110 mt cada bugy
se retira materia y se perfila.
f. Socio realiza localizacion
a vivienda asentada en el centro

personal: 1 ing residente, 1 interventor
f. Socio, 5 isso

Ing residente
Ing Rodrigo
interventor

Bitacora de obra

16 de Noviembre (Domingo)

Dia: Soleado

Avance: 150 ml Linea (bagre)
Retiro material y limpieza
Se trabajo hasta la 1pm
Personal: ing residente topografo
inventario

Mario Martinez
ing Residente

Luis Rodriguez
inteventor

Bitacora de obra

17 de Noviembre (Lunes)

Dia: Soleado

Avanzo 200mts perfilamiento y Limpieza en Cano bogue conservan ancho base 18m Retro de Aibdo Apostado en Cajas

Personal: Ing Residente, interventor supervisor

Jorge Prado
Ing. Residente

Luis Pabon
Interventor

Bitacora de obra

13 de Noviembre (Martes)

Pk: Solera

Avance 250 mts

Perforacion y Retro Matera

Apoyo de Papirita para Retro

de materia del Volco

Equipos: Retroconorruga, volco

Mario Martinez
my Residente

Luis Rodriguez
Interventor

Bitacora de Obra

19 de Noviembre (Viernes)
Dia: Nublado

Guanece de 280 mt. por
Luces Iluvias.
No se trabajo en la tarde
no pagado reviso Corte
Personal: ing. Residente interventoria
topografia.

Ing. Residente

Ing. Interventoria

Bitacora de obra

20 de Noviembre (Jueves)

Dia: Soleado

Avance: 320 mts

Limpieza y retiro de materiales

Personal: Ing Residente, int

Jose Martinez
Ing Residente

Luis Rodriguez
interventor

Bitacora de obra
Zona de Noviembre (Loreto)
Día: Sabado

Se finaliza Rotina, el tiempo en Cano bueno. total intervenido 340 mL.

Personal: Ing Residente, interventor topografo

Maria Martinez
Ing Residente

Luis Rodriguez
interventor


Bitácora de Obra

22 de Noviembre (sabado)

Dia: Soleado.

Problema de Maquinaria No se trabajo

Pendiente de talud



Mayor Cantidad de Material

Disponibilidad Inmediata

Norma

Bitacora de obra

23 de Noviembre (Domingo)

No se trabajo

Bitacora de obra

24 de Noviembre (Lunes)

trabajo de Revisa de propuesta para inicio Cano Colorado And corona: 18m y base de 10 y 12m.

Se inica Limpieza 11:00 Am

Moise Martin
ing Residente

Luis Rodriguez
Interventor

Bitacora de obra

28 de Noviembre (Lunes)

Pedro de Materiales, Pertiamos
Con un avance de poliza,
Se procede a retirar arboles
apostados en cano, que interfieren
trabajo. Topografo revisa Cotas
Personal: Ing Residente topografo
Inspector

Luis Martinez
Ing. Residente

Luis Rodriguez
Inspector

Personería de
CERETÉ

RESOLUCIÓN No. 085 DE NOVIEMBRE 13 DE 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, CÓRDOBA, LA VEEDURÍA CIUDADANA SOBRE **"RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**

EL PERSONERO MUNICIPAL DE CERETÉ,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las contenidas en la Ley 850 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 270, establece que la ciudadanía puede participar en la vigilancia de la gestión pública y de los resultados de la administración, promoviendo la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.

Que el artículo 178, numeral 22, de la Ley 136 de 1994, señala que es función del Personero Municipal promover la creación y el funcionamiento de las veedurías ciudadanas y comunitarias.

Que, en el Despacho de la Personería Municipal de Cereté, se radicó el día 05 de noviembre de 2025 solicitud de constitución y creación de la **"VEEDURÍA CIUDADANA SOBRE LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**, con el objeto de ejercer control social y vigilancia preventiva y posterior sobre la ejecución del **Contrato de Obra No. 063-2025**, celebrado entre la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS y el Consorcio Bugre 2025, identificado con NIT 902.000.686-4, cuyo representante legal es Rafael Eduardo Montes Navas, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.038.056 de Ciénaga de Oro – Córdoba.

Que el objeto del contrato es la **"Recuperación ambiental y de la conectividad ecosistémica** e hidrológica de un tramo del caño Bugre en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba".

Que, conforme al acta de constitución del 30 de octubre de 2025, suscrita en el barrio Caracas, sector Tres Bocas, un grupo plural de ciudadanos del municipio de Cereté conformaron la mencionada veeduría ciudadana, con fundamento en los artículos 270 de la Constitución Política, 100 de la Ley 134 de 1994, y la Ley 850 de 2003.

Que fueron elegidos como miembros de la Veeduría Ciudadana los siguientes ciudadanos:

NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	DIRECCIÓN / SECTOR	CELULAR
LUIS ALFONSO ESPINOZA RHENALS	78.019.984	Presidente	Barrio Caracas – Cereté	323 507 55 63
JORGE LUIS YANES ORTIZ	1.064.994.211	Vocal	Barrio Caracas – Cereté	321 569 29 39
SERGIO SAMIR ORTIZ MERLANO	1.064.995.131	Vocal	Barrio Caracas – Cereté	311 714 56 42

Scanned with CamScanner

Personería de
CERETÉ

Que la documentación presentada, consistente en el acta de constitución de la veeduría, las fotocopias de las cédulas de ciudadanía de los integrantes y copia del Contrato de Obra No. 063-2025, cumple con los requisitos exigidos por la Ley 850 de 2003 para su reconocimiento e inscripción.

Que conforme al artículo 3° de la Ley 850 de 2003, corresponde al Personero Municipal de Cereté registrar las veedurías ciudadanas de su jurisdicción y llevar el registro público de las mismas.

Que esta veeduría ejercerá su función de vigilancia dentro del territorio del municipio de Cereté, en el departamento de Córdoba, con el fin de garantizar la transparencia en la gestión pública y la correcta aplicación de los recursos destinados al proyecto mencionado.

Por lo anterior, el suscrito **Personero Municipal de Cereté,**

RESUELVE:

PRIMERO: Reconocer y crear la **"VEEDURÍA CIUDADANA SOBRE LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**, como organismo de control social de carácter preventivo y ciudadano.

SEGUNDO: Reconocer como miembros de la veeduría a los siguientes ciudadanos:

LUIS ESPINOSA RHENALS –	C.C. No. 78.019.984 – Presidente
JORGE ORTIZ –	C.C. No. 1.064.994.211 – Vocal
SERGIO ORTIZ –	C.C. No. 1.064.995.131 – Vocal

TERCERO: *Establecer como tiempo de duración de la veeduría ciudadana el período de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución.*

CUARTO: Determinar como domicilio de la veeduría ciudadana el municipio de Cereté, Vereda Caracas, sector Tres Bocas, departamento de Córdoba, República de Colombia.

QUINTO: Ordenar la inscripción de la presente veeduría ciudadana en el Registro Público de Veedurías de la Personería Municipal de Cereté, conforme a lo dispuesto en la Ley 850 de 2003.

CÚMPLASE.

Dada en Cereté, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

ANDRES FELIPE SANTOS GOMEZ
Personero Municipal de Cereté

ITEM	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
ELABORÓ	*Andrés Felipe Peralta Vesga*	*Contratista*	
REVISÓ Y APROBÓ	*Andres Felipe Santos Gómez*	*Personero Municipal*	

Scanned with CamScanner

ANEXOS

ACTAS.AUDITORIAS.VISIBLE

AUDITORIA VISIBLE 002

DEL CONTRATO DE OBRA N° 063 de 2025

OBJETO: "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FECHA:	HORA DE INICIO:	HORA DE FINALIZACION:
04/12/2025	9:00 A.M	11:30 A.M.

RESPONSABLE:	LUGAR:
CONSORCIO BUGRE 2025 VELASQUEZ CABEZA E INGENERIA S.A.S	VEREDA TRES BOCAS -CERETE

OBJETIVO: realizar auditoria visible donde lo principal es que los beneficiarios, funcionarios de la alcaldía municipal, ente contratante y veeduría ciudadana vigilen la ejecución de la obras para prevenir irregularidades y garantizar que se cumplan a cabalidad con el objeto del contrato, conforme a la optimización del cauce incluido en el informe técnico, de la obra que se realiza en el caño Bugre, caño culebra y caño cotorra del municipio de cerete,

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludos de bienvenida e instalación de la reunión.
2. Oración
3. Presentación de los participantes
4. Intervención por parte del Consorcio Bugre 2025.
5. Intervención de la Interventoría Velásquez Cabeza E Ingeniera S.A.S.
6. Intervención de la comunidad
7. refrigerio
8. Recorrido por la obra.

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA.

1. La reunión se inició con las palabras de bienvenida y oración por parte del Representante de la interventoría**.- (**VELASQUEZ CABEZA E INGENIERIA SAS) el Ing. HERNAN VELASQUEZ CABEZA, seguidamente procedió a verificar el quorum e instalo la auditoria con el objetivo de vigilar, recorrer e inspeccionar la ejecución, cada una de las actividades técnicas y funcionalidad de la obra para prevenir irregularidades y garantizar que se cumplan a cabalidad con el objeto del contrato, se realiza en el caño Bugre, caño culebra y caño cotorra del municipio de cerete.

2. La Intervención por parte de la obra (CONSORCIO BUGRE 2025) estuvo a cargo del Ing. RAFAEL MONTES NAVAS, donde inicialmente el ing, explico los conceptos técnicos de la ejecución de la obra tales como:

    - Avance en cada uno de los caños
    - Descapotes
    - Conformación de talud
    - Material sedimentado extraído

3. Intervención por parte de la interventoría el Ing. HERNAN VELASQUEZ CABEZA donde procede a corroborar toda la parte técnica que se está realizando en obra.

4. Realiza la intervención el secretario de planeación municipal el ing. Jorge Abraham Assis, donde le manifiesta a la comunidad el aprovechamiento, del caño en cada uno de los predios y el impacto que tendrá la obra en la comunidad.

5. Se escucha a la comunidad, donde agradecen por la excelente intervención que se le esta realizando al caño y toma la palabra el presidente de la junta de acción comunal donde agradece y se compromete con la comunidad a darle muy buen uso a esta fuente, a mantenerlo limpio.

6. Se cierran las intervenciones con un refrigerio y posteriormente procedemos a desplazarnos al lugar de los trabajos.

Se agradece por la participación a esta veeduría y se da por finalizada la misma.

NOTA: se adjunta actas de asistencia de interventoría y de obra.

Adjunto registro fotográfico.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

VELÁSQUEZ CABEZA
INGENIERÍA S.A.S

REGISTO ASISTENCIA AUDITORIA VISIBLE #2

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Departamento	CÓRDOBA	Municipio	CERETÉ	Acta No.	
Lugar	VEREDA CARACAS - TRES VOCAS.	Fecha	4 DE DICIEMBRE DE 2025	No. Asistentes :	

Objeto de la reunion: AUDITORÍA VISIBLE

Ord	Nombres y apellidos	Cédula	Vereda / Barrio /corregimieto/entidad/agremiación /otro	Actividad / Cargo	Telefono	Correo Electrónico	Firma
	Alejandro Espinosa Alvarez.	1064981252	Cerete	SPI	3148640047	Spinosalvarez487@Hotmail.com	Alejandro Espinosa
	Euclides J. Ruiz Martinez	1003454087	Montelibano	GUS	3023344546	euclidesruiz805@gmail.com	
	Luis Eduardo Nuñez	78019984	Corregimiento	Presidente J.A.C	323 508 58 63	luisdocel0296@gmail.com	
	Maria Camila Ce.	1062402854	CVS	CVS	3017867775		
	Samir DIAZ	78.034578			3145779545		
	Felix Moreno	98631653			3206667886		FELIX
	Jesus David estrada	1003188120			3233580986		JESUS Estrada

VELÁSQUEZ CABEZA INGENIERÍA S.A.S

REGISTO ASISTENCIA AUDITORIA VISIBLE #2

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Departamento: CÓRDOBA | Municipio: CERETÉ | Acta No.:

Lugar: VEREDA CARACAS - TRES VOCAS. | Fecha: 4 DE DICIEMBRE DE 2025 | No. Asistentes:

Objeto de la reunion: AUDITORÍA VISIBLE

Ord	Nombres y apellidos	Cédula	Vereda / Barrio /corregimieto/entidad/agremiación /otro	Actividad / Cargo	Telefono	Correo Electrónico	Firma
	Yon Carlos Leyo	78743364	Bugre		3136517703		Yancarlos Leyo
	Luis miguel narvaez	78053191	Bugre		3106028279		
	Emiro Pablo Gonzalez	78025185	Bugre		3113923656		Emiro Pablo Gonzalez
	Gustavo Castrillo	78019182	Bugre		3113198208		Castrillo
	Dani hernandez	1064993466	Bugre		3146144060		Dany Hernandez Soto
	Dani Ortiz	30687669	Bugre		3145118881		Dani Ortiz
	Sergio Ortiz	1064995135	Bugre		3117145642		Sergio Ortiz
	Jorge yanez	1064994211	Bugre		3215692939		Jorge yanez

VELÁSQUEZ CABEZA INGENIERÍA S.A.S

REGISTO ASISTENCIA AUDITORIA VISIBLE #2

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTÉMICA E HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA" TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Departamento: CÓRDOBA | Municipio: CERETÉ | Acta No.:

Lugar: VEREDA CARACAS - TRES VOCAS. | Fecha: 4 DE DICIEMBRE DE 2025 | No. Asistentes :

Objeto de la reunion: AUDITORÍA VISIBLE

Ord	Nombres y apellidos	Cédula	Vereda / Barrio /corregimieto/entidad/agremiación /otro	Actividad / Cargo	Telefono	Correo Electrónico	Firma
	Liz marina vega				3125577982		Liz marina Vega

ANEXOS

POLIZAS.SEGÚN..CONTRATO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101041371	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	10	2025	23	10	2025	00:00	30	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO BUGRE 2025		NIT: 902.000.686-4
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 63 - 60 CA 1 URB CASTILLA CAMPESTRE	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO:	3105116622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION		NIT: 891.000.627-0
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO	7829950

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A RECUPERACION AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTEMICA E HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA 063 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS Y CONSORCIO BUGRE 2025.

NTOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23/10/2025	30/06/2026	$111,629,036.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	23/10/2025	30/06/2026	$223,258,072.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23/10/2025	30/12/2028	$55,814,518.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$111,629,036.40

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ITC INTERCONSULTING S.A.S.	901448717-4	20.00
MIRAFLOREZ CIVILES S.A.S.	901611331-3	80.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,576,568.00	$ ******20,000.00	$ *****303,348.00	$ *********1,899,917.00	$ ******502,330,663.80	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101041371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670061053305

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000061053051

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
24/10/2025 03:27p.m.

RECIBIMOS DE: CONSORCIO BUGRE 2025 — NIT. 902.000.686

LA SUMA DE: Un millones ochocientos noventa y nueve mil novecientos diecisiete pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000061053051

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MONTERIA-44-101041371-0-1	$1,596,569.00		$303,348.00	$1,899,917.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 1,899,917.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 1,899,917.00
OTROS:

TRANSACCION: 0006105305

TOTAL: $1,899,917.00

CAJERO: PAGUESTADO

10/24/2025 3:39:38PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101041371	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	10	2025	23	10	2025	00:00	30	12	2028	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BUGRE 2025		NIT: 902.000.686-4
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 63 - 60 CA 1 URB CASTILLA CAMPESTRE	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO: 3105116622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION		NIT: 891.000.627-0
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TELÉFONO 7829950

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB | pse | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO Aplica para Transferencias

Bancolombia Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

CS034102 ****0182 Horario Normal
CC*****5445 24/10/25 15:27 T 474
FAUS 1101580197913
Valor Efectivo:1,899,917.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:1,899,917.00
2121 21641RecaudoWebService1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013573	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	10	2025	23	10	2025	00:00	30	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BUGRE 2025	NIT: 902.000.686-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 13 NRO. 63 - 60 CA 1 URB CASTILLA CAMPESTRE	MONTERIA, CORDOBA	3105116622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION	NIT: 891.000.627-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	MONTERIA, CORDOBA	7829950

BENEFICIARIO: 891000627 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A RECUPERACION AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTEMICA E HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA 063 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS Y CONSORCIO BUGRE 2025.

ASEGURADOS: CONSORCIO BUGRE 2025, NIT: 902.000.686-4 Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE -CVS-, NIT: 891.000.627-0.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE -CVS-, NIT: 891.000.627-0.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**23/10/2025**	**30/12/2025**	**$711,750,000.00**
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**23/10/2025**	**30/12/2025**	**$711,750,000.00**
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV**	**23/10/2025**	**30/12/2025**	**$711,750,000.00**

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ITC INTERCONSULTING S.A.S.	901448717-4	20.00
MIRAFLOREZ CIVILES S.A.S.	901611331-3	80.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****331,500.00	$ *******3,000.00	$ ******63,555.00	$ **********398,055.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101013573

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013573	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	10	2025	23	10	2025	00:00	30	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO BUGRE 2025		**NIT: 902.000.686-4**
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 63 - 60 CA 1 URB CASTILLA CAMPESTRE	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3105116622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION		**NIT: 891.000.627-0**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7829950

BENEFICIARIO: 891000627 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/10/2025	30/12/2025	$711,750,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/10/2025	30/12/2025	$711,750,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	23/10/2025	30/12/2025	$711,750,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101013573

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670061053111

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000061053116

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
24/10/2025 03:29p.m.

RECIBIMOS DE: CONSORCIO BUGRE 2025 — NIT. 902.000.686

LA SUMA DE: Trescientos noventa y ocho mil cincuenta y cinco pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000061053116

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
AGENCIA MONTERIA-40-101013573-0-1	$334,500.00		$63,555.00	$398,055.00

FORMA DE PAGO

Efectivo - $ 398,055.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 398,055.00
OTROS:

TRANSACCION: 0006105311

TOTAL: $398,055.00

CAJERO: PAGUESTADO

10/24/2025 3:39:42PM

172.16.10.23

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013573	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	10	2025	23	10	2025	00:00	30	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CONSORCIO BUGRE 2025	NIT: 902.000.686-4	
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 63 - 60 CA 1 URB CASTILLA CAMPESTRE	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	3105116622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION	NIT: 891.000.627-0	
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	7829950
BENEFICIARIO:		

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB | pse | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER | éxito | MOVIIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

Banco de Bogota 341 Oficina Parque Come
CS034102 ****0162 Horario Normal
CC*****5445 24/10/25 15:28 T 478
SEGUROS DEL ESTADO S.A. CEO 1783
FAUS 11015801979920
Valor Efectivo:398,055.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor ND:0.00
Valor Total:398,055.00
2121 21641RecaudoWebService1

Scanned with CamScanner

ANEXOS

POLIZAS.SEGÚN.ACTA.DE.INICIO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101041371	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	12	2025	24	10	2025	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BUGRE 2025	NIT: 902.000.686-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 13 NRO. 63 - 60 CA 1 URB CASTILLA CAMPESTRE	MONTERIA, CORDOBA	3105116622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION	NIT: 891.000.627-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	MONTERIA, CORDOBA	7829950

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL AFIANZADO, REFERENTE A RECUPERACION AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTEMICA E HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA 063 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS Y CONSORCIO BUGRE 2025.

NTOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA TIENE UNA DURACION DE DOS (2) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL Y DEFINITIVO DE LAS OBRAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/10/2025	01/07/2026	$111,629,036.40	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/10/2025	01/07/2026	$223,258,072.80	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/10/2025	31/12/2028	$55,814,518.20	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		$111,629,036.40	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS CITADAS, SEGUN ACTA DE INICIO DE 24 DE OCTUBRE DE 2025.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***1,576,568.00	$ ******20,000.00	$ *****303,348.00	$ *********1,899,917.00	$ ******502,330,663.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101041371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-44-101041371	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	12	2025	24	10	2025	00:00	31	12	2028	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO BUGRE 2025 — IDENTIFICACIÓN **NIT: 902.000.686-4**

DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 63 - 60 CA 1 URB CASTILLA CAMPESTRE — **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 3105116622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION — IDENTIFICACIÓN **NIT: 891.000.627-0**

DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS — **CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA — **TELÉFONO:** 7829950

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ITC INTERCONSULTING S.A.S.	901448717-4	20.00
MIRAFLOREZ CIVILES S.A.S.	901611331-3	80.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-44-101041371

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013573	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	12	2025	24	10	2025	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CONSORCIO BUGRE 2025	NIT: 902.000.686-4	CR 13 NRO. 63 - 60 CA 1 URB CASTILLA CAMPESTRE	MONTERIA, CORDOBA	3105116622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION	NIT: 891.000.627-0	CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	MONTERIA, CORDOBA	7829950

BENEFICIARIO: 891000627 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO POR DAÑOS MATERIALES Y LESIONES PERSONALES CAUSADOS A TERCEROS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AFIANZADO, EN VIRTUD DE LOS DISPUESTO EN EL ARTICULO 2341 DE NUESTRO CODIGO CIVIL, REFERENTE A RECUPERACION AMBIENTAL Y DE LA CONECTIVIDAD ECOSISTEMICA E HIDROLOGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO BUGRE EN EL MUNICIPIO DE CERETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

CONTRATO DE OBRA 063 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS Y CONSORCIO BUGRE 2025.

ASEGURADOS: CONSORCIO BUGRE 2025, NIT: 902.000.686-4 Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE -CVS-, NIT: 891.000.627-0.

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE -CVS-, NIT: 891.000.627-0.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/10/2025	31/12/2025	$711,750,000.00	
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/10/2025	31/12/2025	$711,750,000.00	
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/10/2025	31/12/2025	$711,750,000.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS CITADAS, SEGUN ACTA DE INICIO DE 24 DE OCTUBRE DE 2025.

LOS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****331,500.00	$ *******3,000.00	$ ******63,555.00	$ **********398,055.00	$ ******711,750,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
AGENCIA DE SEGUROS TE ASEGURAMOS BI	174376	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101013573

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013573	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	12	2025	24	10	2025	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO BUGRE 2025		**NIT: 902.000.686-4**
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 63 - 60 CA 1 URB CASTILLA CAMPESTRE	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3105116622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION		**NIT: 891.000.627-0**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7829950

BENEFICIARIO: 891000627 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/10/2025	31/12/2025	$711,750,000.00	
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/10/2025	31/12/2025	$711,750,000.00	
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/10/2025	31/12/2025	$711,750,000.00	

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101013573

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MONTERIA	AGENCIA MONTERIA	53	53-40-101013573	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	12	2025	24	10	2025	00:00	31	12	2025	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO BUGRE 2025		**NIT: 902.000.686-4**
DIRECCIÓN: CR 13 NRO. 63 - 60 CA 1 URB CASTILLA CAMPESTRE	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	3105116622

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION		**NIT: 891.000.627-0**
DIRECCIÓN: CR 6 NRO. 6 - 25 LOS BONGOS	**CIUDAD:** MONTERIA, CORDOBA	**TELÉFONO:**	7829950

BENEFICIARIO: 891000627 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - LA CORPORACION

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ITC INTERCONSULTING S.A.S.	901448717-4	20.00
MIRAFLOREZ CIVILES S.A.S.	901611331-3	80.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO.2 - 17 - TELEFONO: 7813230 - MONTERIA

53-40-101013573

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
