Arenas y Triturados del Caney SAS
Nit: 900.757.395-8

INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
PERIODO
DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026



CONTRATO No. 3777 DE 2025

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA".
CONTRATISTA: ATRICA SAS
NIT: 900.757.395-8

INTERVENTORIA: YOU ARE SERVICES S.A.S.
NIT: 901796967-0

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META
SECRETARIA DE GESTION DEL RIESGO

SUPERVISOR
ING. MARISTELLA SANTANA TORRES

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

TABLA DE CONTENIDO

INFORME ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 1

1. INTRODUCCIÓN 5

2. OBJETIVO GENERAL 5

2.1. Objetivos Específicos. 5

3.1. Antecedentes y/o Necesidades 6

3.2. Finalidad del proyecto 6

3.3. Localización 7

3.4. Alcance del Proyecto 8

3.5. Alcance del Proyecto 8

4.1. Organigrama General del Contrato 9

4.2. Información General del Contrato de Obra 10

4.3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO 10

5.1. Programación de Obra 14

5.2. Grafica Avance Físico Vs Avance Programado 16

5.3. Actividades ejecutadas en el periodo del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026 17

5.4. Avance Financiero 33

6.2. Personal Operativo 34

6.3. Relación de Equipo 42

7.1. Estado Financiero Contrato de Obra 359 de 2023 43

7.2. Estado Administrativo de la Obra 45

7.3. Estado Administrativo: Control de Calidad de la Obra y Certificados de Calidad de Equipos, Materiales y Maquinaria 45

7.4. Estado Administrativo de la Obra 45

7.5. Estado Administrativo: Control de Calidad de la Obra y Certificados de Calidad de Equipos, Materiales y Maquinaria 45

8. Gestión Técnica y Documental 45

8.1. Actas Generadas durante el periodo del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026 45

9. Obligaciones Contractuales 46

9.1. Cumplimiento de la ejecución del Objeto del Contrato. 46

9.2. Uso responsable y eficiente de los Recursos del Contrato. 46

9.3. Verificación del uso de recursos exclusivamente para actividades del contrato 46

9.4. Cumplimiento de los términos del contrato y pliego de condiciones 46

9.5. Presentación de cronograma detallado de actividades 47

9.6. Programa de medidas ambientales y plan de manejo constructivo 47

9.7. Prioridad de contratación de mano de obra local 47

9.8. Cumplimiento de seguridad social y parafiscal 47

9.9. Informes y documentación mensual 47

9.10. Obrar con lealtad y buena fe 48

9.11. Mantenimiento de reserva profesional 48

9.12. Facturación de acuerdo al estatuto tributario 48

9.13. Prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato 48

9.14. Acta de liquidación del contrato 48

9.15. Modificaciones Contractuales 48

9.16. Mantenimiento de Garantías. 48

9.17. Suspensión y reinicio del contrato 48

9.18. Aportes a los sistemas de seguridad social 49

9.19. Compromiso con la salud ocupacional y la seguridad industrial durante la ejecución del contrato 49

9.20. Obligaciones de transparencia en relación a la composición societaria y acuerdos de accionistas 49

9.21. Responsabilidades laborales, tributarias y ambientales del contratista 49

9.22. Informes de Investigaciones Penales de los Directivos del Contratista 49

9.23. Notificación de Procesos Concursales o de Liquidación del Contratista 49

9.24. Plan de Calidad Específica del Proyecto 50

9.25. Ejecución de la Obra según el Diseño Entregado 50

9.26. Bitácora de Avances y Registros Necesarios en la Obra 50

9.27. Reglamentos de Seguridad y Prevención de Riesgos de Accidentes 50

9.28. Garantía de Elementos Adecuados 50

9.29. Aprobación de Materiales y Fuentes de Abastecimiento por la Interventoría. 51

9.30. Verificación y control de calidad de materiales y trabajos 51

9.31. Verificación de planos y diseños: responsabilidades del contratista 51

9.32. Acreditación y suministro de equipo necesario para el cumplimiento del contrato 51

9.33. Presentación de informes mensuales, parciales y final del contrato 51

9.34. Divulgación del proyecto: instalación de valla informativa y lineamientos a seguir 51

9.35. Presentación de informes de la obra para el municipio 52

9.36. Implementación de turnos de trabajo para cumplir con la Ley 1682 de 2013. 52

9.37. Garantía de equipo profesional para acompañamiento técnico del proyecto. 52

9.38. Atención a requerimientos de la comunidad durante la ejecución del proyecto..... 52

9.39. Trámite adecuado para cambios y modificaciones en los diseños del proyecto..... 52

9.40. Gestión y obtención de permisos y licencias necesarias para la ejecución del proyecto. 53

9.41. Gestión social del proyecto, incluyendo socialización y atención de peticiones. 53

9.42. Otras responsabilidades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual. 53

9.43. Acato de directrices de supervisor, apoyo técnico e interventor.... 53

10. Problemas presentados y soluciones planteadas 53

11. Conclusiones 54

12. Anexos..... 54

1. INTRODUCCIÓN

Por medio del presente informe acta parcial de obra No.1, se relacionan las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 19 de noviembre de 2025 al 14 de enero de 2026 , correspondiente al contrato No. 3777-2025, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA". Como contratistas de obra, el ATRICA SAS se complace en informar sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de obra.

Se relaciona de manera detallada las actividades realizadas durante los periodos a partir del inicio de obra, proyecto que tuvo acta de inicio el 19 de NOVIEMBRE de 2025 mediante orden de servicio N° 011 y así dar a conocer el progreso en la ejecución del contrato No. 3777 de 2025. Cabe mencionar que las actividades llevadas a cabo fueron desarrolladas con el mayor cuidado y cumpliendo con las normas técnicas, seguridad y salud en el trabajo establecidas en el sector de la construcción.

2. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general del presente informe de acta parcial No 01 es demostrar que el ATRICA SAS está cumpliendo en su totalidad con las obligaciones establecidas en la minuta del Contrato No 3777-2025, con objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA". A través de este informe se busca demostrar la gestión eficiente y responsable del consorcio en la ejecución de la obra.

2.1. Objetivos Específicos.

- Presentar un informe detallado de las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.
- Demostrar el avance de las actividades de construcción y la ejecución de los trabajos programados, identificando y describiendo las actividades ejecutadas y las próximas actividades a realizar.
- Evaluar el cumplimiento de los plazos establecidos en la planificación de la obra y en la minuta del contrato.
- Identificar y describir los posibles riesgos y obstáculos que se han presentado durante la ejecución de la obra y las acciones tomadas por el ATRICA SAS para mitigarlos y evitar retrasos en la obra.
- Presentar un informe de los recursos humanos, técnicos y financieros utilizados en la ejecución de la obra, y su relación con el presupuesto y los cronogramas establecidos en el contrato.

- Evaluar el impacto social y ambiental de la obra en la comunidad y en el entorno donde se ejecuta la obra.

3. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

3.1. Antecedentes y/o Necesidades

En el marco de la calamidad pública declarada tras el colapso del puente Villa Julia, esta infraestructura estratégica conecta la Comuna 1 con el centro de Villavicencio, siendo un eje fundamental para la movilidad urbana y el desarrollo local. El 1 de julio de 2025, el fallo del puente generó una emergencia vial significativa que afectó gravemente el transporte público y la circulación general, aunque afortunadamente no se registraron víctimas.

Frente a esta situación, la reconstrucción del puente comenzó en noviembre de 2025, bajo la supervisión y coordinación conjunta de la Secretaría de Infraestructura y la Oficina de Gestión del Riesgo, quienes están a cargo de restablecer la movilidad y garantizar la seguridad estructural. Además, se identificó la necesidad urgente de establecer protocolos claros de mantenimiento preventivo y una gestión documental rigurosa que asegure la trazabilidad de los procesos técnicos, registros de inspección y cuadros maestros, lo cual es fundamental para respaldar la toma de decisiones y evitar futuras emergencias similares. El puente conecta la Avenida Alfonso López y cruza el Caño Parrado, puntos clave para la circulación y el acceso en la ciudad.

3.2. Finalidad del proyecto

El Contrato de Obra No. 3777 de 2025 "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA" tiene como finalidad ejecutar obras que mitiguen los riesgos de desastres asociados a la infraestructura vial en el sector Villa Julia, específicamente en la conexión vial que atraviesa el Caño Parrado y conecta la Avenida Alfonso López. Esto implica construir una estructura nueva para garantizar la seguridad, estabilidad y continuidad del servicio vial, restableciendo la movilidad urbana en un punto estratégico de Villavicencio.


Además, el proyecto busca reducir la vulnerabilidad ante futuros eventos adversos mediante la implementación de medidas técnicas y de gestión que permitan una adecuada mitigación del riesgo, asegurando la protección de la comunidad y la optimización de la circulación vial. Todo esto se realiza en el marco de la calamidad pública declarada, con el fin de atender la emergencia generada por el colapso del puente y evitar impactos sociales, económicos y ambientales negativos.

3.3. Localización

Villavicencio está ubicada en Colombia, siendo la capital del departamento del Meta, en la región de la Orinoquía. Se encuentra en el piedemonte de la Cordillera Oriental, al noroccidente del Meta, sobre la margen derecha del río Guatiquía. La ciudad está situada aproximadamente a 86 kilómetros al sureste de Bogotá, a una altitud media de 467 metros sobre el nivel del mar, y es un importante centro comercial y urbano de los Llanos Orientales.

Límites del Municipio:

- Norte: Municipio de Restrepo y El Calvario
- Sur: Acacías y San Carlos de Guaroa
- Oriente: Municipio de Puerto López
- Occidente: limita con el departamento del Cundinamarca
- Extensión total: 1.328 km²
- Coordenadas: 4°8'31""N 73°37'35"O
- Altitud: 467 MSNM (Metros Sobre el Nivel del Mar), con una temperatura media: 24 °C.

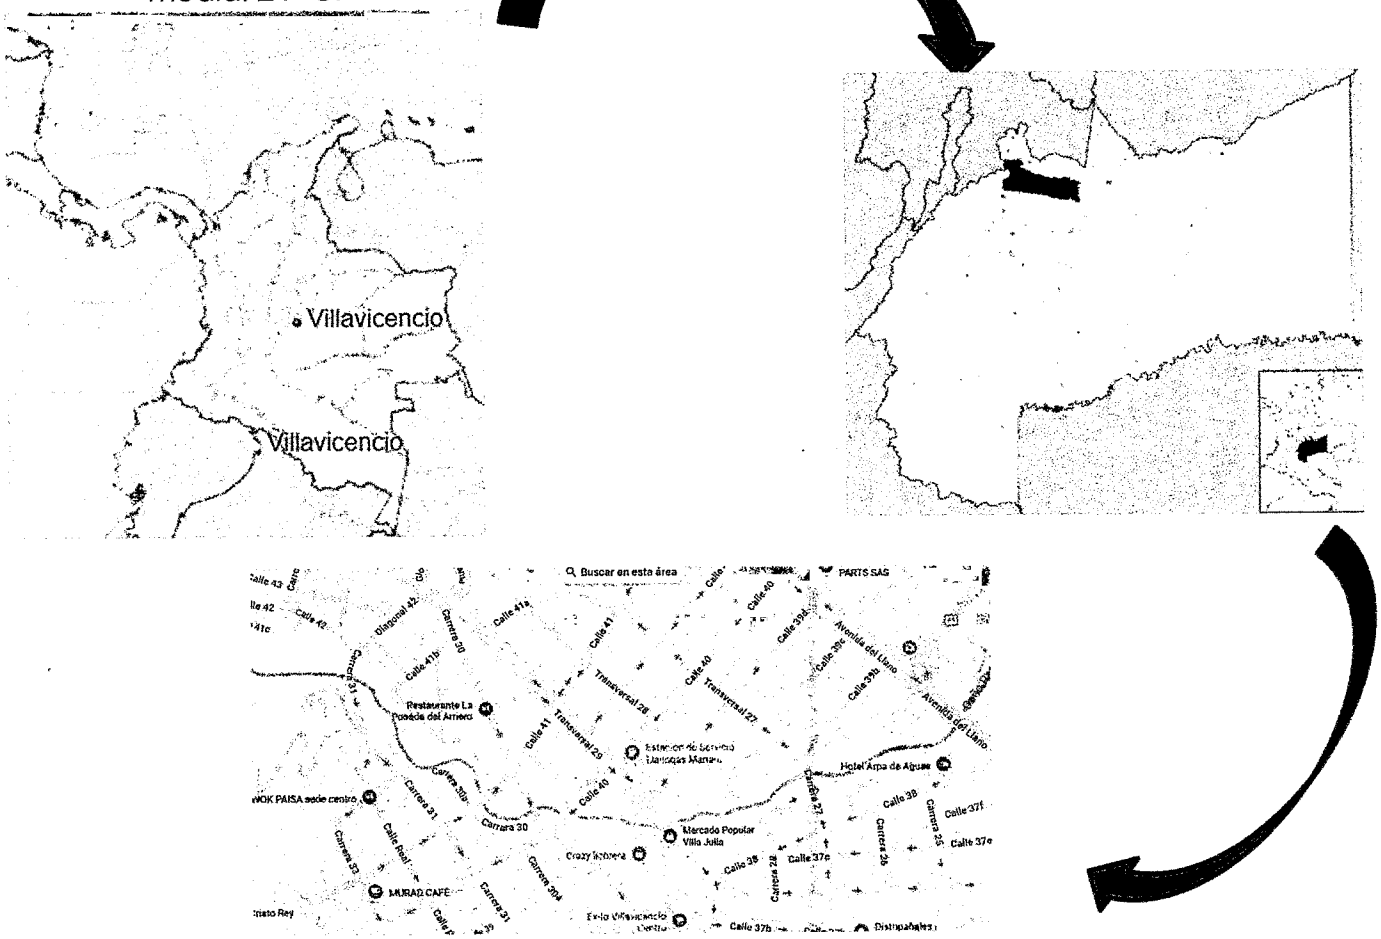

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

3.4. Alcance del Proyecto

El alcance del contrato 3777 consiste en la ejecución de obras civiles destinadas a la mitigación del riesgo de desastres y la recuperación de la conectividad vial en el sector Villa Julia, sobre el Caño Parrado en Villavicencio. Esto incluye la estabilización del cauce, control de erosión, reconstrucción de la infraestructura colapsada, adecuación de accesos provisionales y permanentes, así como la implementación de medidas técnicas que garanticen la seguridad de la población y la continuidad de la movilidad en un corredor estratégico de la ciudad. El contratista debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en normas nacionales como la NSR-10, RAS 2000 e ICONTEC, además de las disposiciones ambientales y de seguridad ocupacional vigentes.


Asimismo, el contrato contempla la responsabilidad integral del contratista en la planeación, ejecución y control de calidad de las obras, incluyendo la gestión ambiental (manejo de escombros, ruido, polvo y tránsito), la señalización de obra, la seguridad industrial y la implementación de programas de salud ocupacional. El plazo de ejecución es de ocho meses y el valor asciende a $10.816.022.226.00 millones, financiados con recursos del Sistema General de Regalías. En síntesis, el alcance abarca tanto la construcción física de las obras como la aplicación de medidas técnicas, ambientales y sociales que aseguren la resiliencia del sector y el bienestar de la comunidad afectada.

3.5. Alcance del Proyecto

Obras físicas terminadas: reconstrucción del puente y conexión vial en el Caño Parrado – sector Villa Julia.
Estabilización hidráulica y geotécnica: control de erosión, protección de taludes y cauce.
Obras provisionales: accesos, campamentos, bodegas y señalización de obra, retirados al finalizar.
Plan de Manejo Ambiental aprobado y ejecutado (escombros, ruido, polvo, tránsito).
Plan de Manejo de Tránsito autorizado por la Secretaría de Movilidad.
Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial implementado (EPP, brigada de emergencia, capacitaciones).
Documentación técnica y de calidad: reportes de cumplimiento de normas ICONTEC, NSR-10 y RAS 2000.
Certificaciones ambientales y de disposición de residuos emitidas por autoridades competentes.
Cronogramas y listados de personal/equipos presentados y aprobados por la interventoría.

4. CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1. Organigrama General del Contrato

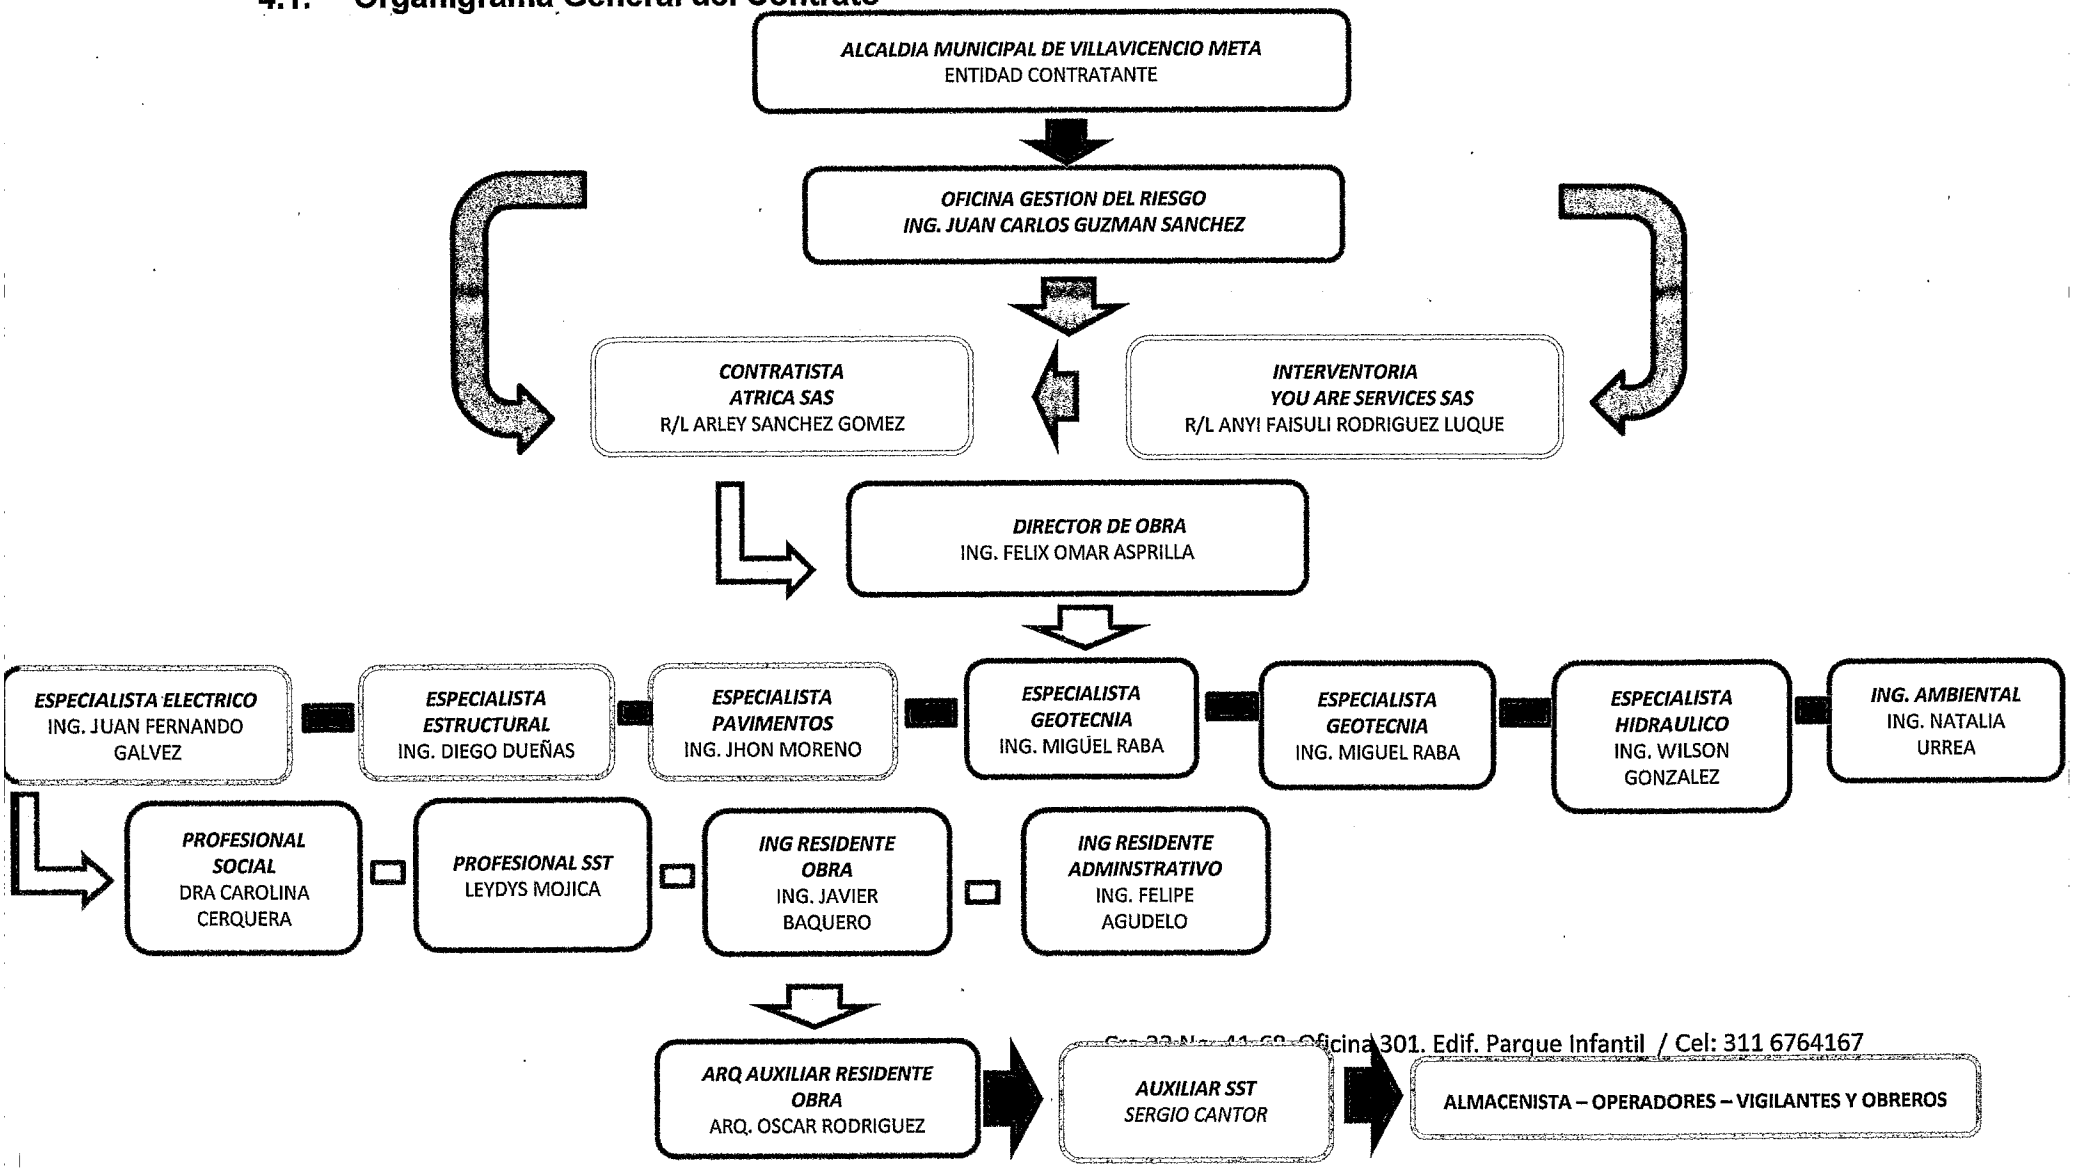

4.2. Información General del Contrato de Obra

ORDEN DE SERVICIO No.	011 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO DE OBRA No.	3777 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2025
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"
CONTRATISTA	ATRICA SAS
NIT	900.757.395-8
REPRESENTANTE LEGAL	ARLEY SANCHEZ GOMEZ
CEDULA	17.345.360 DE VILLAVICENCIO META
EMAIL	Atricapuente2025@gmail.com
INTERVENTORIA	YOU ARE SERVICES
NIT	901.796.967-0
REPRESENTANTE LEGAL	ANYI FAISULI RODRIGUEZ LUQUE
CEDULA	1.121.903.954
EMAIL	cgyouareservices@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10.816.022.226.00
VALOR ADICION	N/A
VALOR ACTUALIZADO CONTRATO	$ 10.816.022.226.00
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (08) MESES
FECHA DE INICIO ORDEN DE SERVICIO 011	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE ACTA DE INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION ORDEN DE SERVICIO 011	18 DE JULIO DE 2026
FERCHA DE TERMINACION SEGÚN ACTA DE INICIO	14 DE AGOSTO DE 2026
SUPERVISOR DEL CONTRATO	ING MARISTELLA SANTANA TORRES

4.3. DOCUMENTOS DEL CONTRATO

4.3.1. Aspectos Legales (Pólizas y Garantías)

El ATRICA SAS suscribió con la compañía de SEGUROS DEL ESTADO SA la garantía única de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales y la garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual derivada del cumplimiento, una vez suscrita la orden de servicio del 19 de noviembre de 2025 cuyo objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA"

Arenas y Triturados del Caney SAS
Nit: 900.757.395-8

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	**30-44-101067439**
ANEXO No.	**0**
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO No	**30-44-101025473**
ANEXO No.	**0**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD	**20 DE NOVIEMBRE DE 2025**

GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2025	19/11/2026	$ 2.163.204.445.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	19/11/2025	19/07/2029	$ 540.801.111.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/11/2025	19/11/2026	$ 5.408.011.113.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		$ 2.163.204.445.20
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	19/11/2025	19/07/2029	$ 711.750.000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	19/11/2025	19/07/2029	$ 711.750.000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	19/11/2025	19/07/2029	$ 711.750.000.00

Se actualizan las condiciones de las garantías de acuerdo con la suscripción del contrato N° 3777

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	**30-44-101067439**
ANEXO No.	**1**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD	**25 DE NOVIEMBRE DE 2025**

GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/11/2025	19/11/2026	$ 2.163.204.445.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	19/11/2025	19/07/2026	$ 540.801.111.30

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	19/11/2025	19/11/2026	$ 5.408.011.113.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		$ 2.163.204.445.20

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	**30-44-101067439**
ANEXO No.	**2-3**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD	**25 DE NOVIEMBRE DE 2025**

GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/12/2025	12/12/2026	$ 2.163.204.445.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/12/2025	12/08/2026	$ 540.801.111.30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/12/2025	12/12/2026	$ 5.408.011.113.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		$ 2.163.204.445.20

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO No.	**30-44-101025473**
ANEXO No.	**1-2**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD	**25 DE NOVIEMBRE DE 2025**

GARANTIAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	12/12/2025	11/08/2026	$ 711.750.000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	12/12/2025	11/08/2026	$ 711.750.000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	12/12/2025	11/08/2026	$ 711.750.000.00

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS
Nit: 900.757.395-8

Se actualizan las condiciones de las garantías de acuerdo con la suscripción del acta de inicio del 15 de diciembre de 2025

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	**30-44-101067439**
ANEXO No.	**4-5**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD	**17 DE DICIEMBRE DE 2025**

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/12/2025	15/12/2026	$ 2.163.204.445.20
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	15/12/2025	15/12/2026	$ 5.408.011.113.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/12/2025	14/08/2026	$ 540.801.111.30
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		$ 2.163.204.445.20

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO No.	**30-44-101025473**
ANEXO No.	**3-4**
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
FECHA DE APROBACION ENTIDAD	**17 DE DICIEMBRE DE 2025**

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
COBERTURAS	**DESDE**	**HASTA**	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	15/12/2025	14/08/2026	$ 711.750.000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	15/12/2025	14/08/2026	$ 711.750.000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS (10% DEL VALOR DE LA PERDIDA, MINIMO 1.0 SMMLV)	15/12/2025	14/08/2026	$ 711.750.000.00

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS
Nit: 900.757.395-8

5. AVANCE DEL PROYECTO

5.1. Programación de Obra

PROGRAMADO					EJECUTADO			
MENSUAL		ACUMULADO			MENSUAL		ACUMULADO	
CONDICIONES SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 011								
	%	$	%	$	%	$	%	$
MES 1 (19 NOV-14 DIC)	1.35%	$ 145,914,086.14	1.35%	$ 145,914,086.14	6.26%	$ 677,419,037.00	6.26%	$ 677,419,037.00
MES 2 (15 DIC-14 ENE)	9.63%	$1,041,418,393.93	10.98%	$ 1,187,332,480.07	2.42%	$ 262,099,349.00	8.69%	$ 939,518,386.00
MES 3 (15 ENE-14 FEB)	9.38%	$1,014,388,212.49	20.36%	$ 2,201,720,692.56				
MES 4 (15 FEB-14 MAR)	9.64%	$1,042,384,145.20	29.99%	$ 3,244,104,837.76				
MES 5 (15 MAR-14 ABRIL)	37.99%	$4,108,664,969.69	67.98%	$ 7,352,769,807.45				
MES 6 (15 ABRI-14 MAYO)	10.77%	$1,164,346,256.32	78.75%	$ 8,517,116,063.77				
MES 7 (15 MAYO-14 JUNIO)	8.36%	$ 903,841,488.52	87.10%	$ 9,420,957,552.29				
MES 8 (15 JUNIO-18 JULIO)	12.90%	$1,395,064,672.82	100%	$ 10,816,022,226				
TOTALES	100%		100.00%	$10,816,022,226			8.69%	$ 939,518,386.00

Para el presente periodo de ejecución del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026 se realizaron las siguientes actividades las cuales reflejan el avance reportado según lo ejecutado.

1.0 PRELIMINARES

- COMISION DE TOPOGRAFIA PERMANENTE - MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN
- CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI
- CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC
- DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)
-DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
-DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL
-TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES

2.0 OBRAS DE MITIGACION

- CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA
-AUTOBOMBA PARA CONCRETO
- TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES
- ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS

3.0 CIMENTACION

- CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.50 M, ØEXT= 1.80 M PROFUNDIDAD MAYOR A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO
-MANEJO DE AGUA EN EXCAVACION BOMBA SUMERGIBLE DE 4 PULGADAS
-ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE

COMPONENTE SST
- PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (T09)
- Inducción, trabajo en alturas, emergencias, primeros auxilios
- Entrega de equipos certificados según riesgo
- Vallas, cintas, avisos, conos, mallas y reflectivos
- Botiquines, extintores, camillas, kits antiderrames

COMPONENTE SST
- TRABAJADORA SOCIAL (T09)
- manejo de la infraestructura de predios y servicios publicos AUXILIAR DE INGENIERIA (actas de vecindad) (T15)
- atencion a la comnunidad PGS-6,1-18


COMPONENTE AMBIENTAL
- capacitacion y concienciacion para el personal de obra DAGA-1.2-02
- manejo integral de materiales de construccion PAC -2.1-04 (instalacion de puntos ecologicos para el manejo de residuos solidos convencionales generados en los frentes de obra)
- manejo y disposicion final de escombros DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (ESCOMBROS)
- Instalación, Funcionamiento, y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (BAÑOS DE OBRA)

- Instalación, Funcionamiento, y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (BAÑOS DE OBRA)

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO
- Auxiliar de trafico

Arenas y Triturados del Caney SAS
Nit: 900.757.395-8

5.2. Grafica Avance Físico Vs Avance Programado

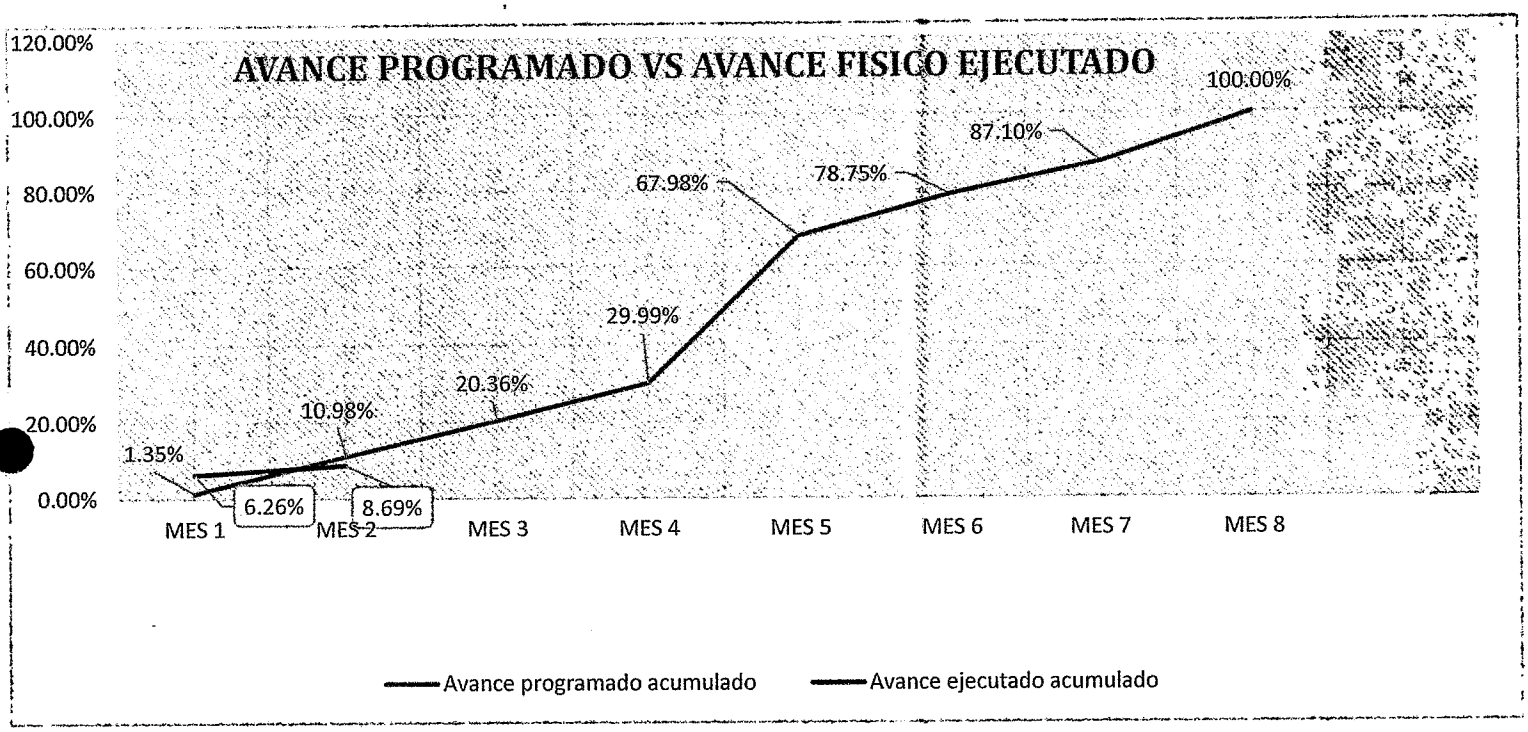

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

5.3. Actividades ejecutadas en el periodo del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026

		CONDICIONES INICIALES				PRESENTE ACTA		% EJECUCION
	DESCRIPCION	UNID	CANT	V.UNIT	V. TOTAL	CANT	V.TOTAL	
1.0 PRELIMINARES								
1.01	COMISION DE TOPOGRAFIA PERMANENTE	MES	8.00	$ 24,729,963.95	$ 197,839,712.00	1.87	46,245,033.00	23.38%
1.02	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	M	200.00	$ 131,630.00	$ 26,326,000.00	197.85	26,042,996.00	98.93%
1.03	CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	UND	1.00	$ 6,547,018.00	$ 6,547,018.00	1.00	6,547,018.00	100.00%
1.04	CORTES PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M	24.96	$ 14,216.00	$ 354,831.00	0.00	0.00	0.00%
1.05	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	117.96	$ 360,662.00	$ 42,543,690.00	28.68	10,343,786.00	24.31%
1.06	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	89.67	$ 551,985.00	$ 49,496,495.00	0.50	275,993.00	0.56%
1.07	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	24.00	$ 621,024.00	$ 14,904,576.00	1.27	788,700.00	5.29%
1.08	DESMONTE DE TUBERIAS DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS	M	60.00	$ 20,739.74	$ 1,244,385.00	0.00	0.00	0.00%
1.09	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	39.00	$ 310,280.00	$ 12,100,920.00	4.35	1,349,718.00	11.15%
				SUB TOTAL	**$ 351,357,627.00**	**SUB TOTAL**	**91,593,244.00**	
2.0 OBRAS DE MITIGACION								
2.01	CANALIZACION RIO (BULLDOZER TIPO D8K CAT)	HR	152.00	$ 519,863.00	$ 79,019,176.00	0.00	0.00	0.00%
2.02	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 4" 11 HP AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	19.00	$ 255,831.00	$ 4,860,789.00	0.00	0.00	0.00%
2.03	MATERIAL DE ARRASTRE CRUDO INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	914.40	$ 99,018.00	$ 90,542,059.00	0.00	0.00	0.00%

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

2.04	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	162.00	$ 939,625.00	$	152,219,250.00	19.20	18,040,800.00	11.85%
2.05	DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 3: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) Y PVC	M3	90.00	$ 415,506.00	$	37,395,540.00	0.00	0.00	0.00%
2.06	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	40.28	$ 890,777.00	$	35,880,498.00	0.00	0.00	0.00%
2.07	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	8.00	$ 1,199,664.00	$	9,597,312.00	0.00	0.00	0.00%
2.08	MORTERO DE ALTA DENSIDAD PARA SELLADO Y RELLENO DE FISURAS PARA CONCRETO	M3	0.45	$ 38,326,581.56	$	17,246,962.00	0.00	0.00	0.00%
2.09	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	499.44	$ 97,780.28	$	48,835,385.00	11.52	1,126,429.00	2.31%
2.1	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	232.20	$ 110,398.00	$	25,634,416.00	0.00	0.00	0.00%
2.11	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 2.01 - 4.00 M INCLUYE CARGUE	M3	348.30	$ 167,270.00	$	58,260,141.00	0.00	0.00	0.00%
2.12	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H = 4.01 - 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	184.00	$ 250,069.00	$	46,012,696.00	0.00	0.00	0.00%
2.13	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	128.00	$ 310,280.00	$	39,715,840.00	0.00	0.00	0.00%
2.14	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE2:RECUBRIMIENTO DE ALEACION Zn-5A1- MM	M3	2779.00	$ 404,307.00	$	1,123,569,153.00	0.00	0.00	0.00%
2.15	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	8615.43	$ 2,343.00	$	20,185,952.00	0.00	0.00	0.00%
2.16	REVESTIMIENTO PARA GAVIONES EN CONCRETO 20.7MPa (3000PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	124.86	$ 1,236,480.00	$	154,386,893.00	0.00	0.00	0.00%
2.17	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	466.37	$ 10,961.00	$	5,111,882.00	0.00	0.00	0.00%
2.18	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000KG/CM2,500MPA. FIGURADO, ARMADO,	KG	2417.71	$ 11,720.00	$	28,335,561.00	0.00	0.00	0.00%

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

	COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN							
2.19	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	124.86	$ 65,675.61	$ 8,200,257.00	11.52	756,583.00	9.23%
2.2	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 3 DIAS	M3	170.00	$ 79,465.11	$ 13,509,069.00	0.00	0.00	0.00%
				SUB TOTAL	**$ 1,998,518,831.00**	**SUB TOTAL**	**19,923,812.00**	
3.0. CIMENTACION								
3.01	CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.50 M, ØEXT= 1.80 M PROFUNDIDAD MAYOR A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	150.00	$ 1,643,518.00	$ 246,527,700.00	117.45	193,031,189.00	78.30%
3.02	CONSTRUCCIÓN PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO IN SITU D= 1.50 M CONCRETO TREMIE 27.6 MPa - 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	150.00	$ 4,622,534.79	$ 693,380,218.00	0.00	0.00	0.00%
3.03	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACION BOMBA SUMERGIBLE DE 4 PULGADAS	DIA	90.00	$ 269,581.53	$ 24,262,337.00	90.00	24,262,337.00	100.00%
3.04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	77.00	$ 310,280.00	$ 23,891,560.00	61.85	19,190,818.00	80.32%
3.05	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	301.50	$ 97,780.28	$ 29,480,756.00	0.00	0.00	0.00%
3.06	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	301.50	$ 65,675.61	$ 19,801,196.00	0.00	0.00	0.00%
3.07	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 3 DIAS	M3	157.50	$ 79,465.11	$ 12,515,755.00	0.00	0.00	0.00%
3.08	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	63,315.00	$ 10,961.00	$ 693,995,715.00	43,583.44	477,718,086.00	68.84%
				SUB TOTAL	**$ 1,743,855,237.00**	**SUB TOTAL**	**714,202,430.00**	
4.0 SUPERESTRUCTURA								
4.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	739.85	$ 49,004.00	$ 36,255,609.00	0.00	0.00	0.00%
4.02	TABLERO EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	91.44	$ 1,735,402.00	$ 158,685,159.00	0.00	0.00	0.00%
4.03	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A709 (FABRICACION TRANSPORTE Y MONTAJE)	KG	84769.45	$ 48,409.81	$ 4,103,673,138.00	0.00	0.00	0.00%

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

4.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS EN NEOPRENO 0,6X0,6X0,096 M DUREZA 60 REFORZADA CON 5 LAMINAS DE ACERO INTERMEDIAS DE 3MM	UND	10.00	$ 2,207,600.00	$	22,076,000.00	0.00	0.00	0.00%
4.05	JUNTA DE PLACA DENTADA A=0.30M LAMINA HR A36 19MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M	45.72	$ 597,970.00	$	27,339,188.00	0.00	0.00	0.00%
4.06	COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	205.74	$ 1,824,169.00	$	375,304,530.00	0.00	0.00	0.00%
4.07	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	60304.68	$ 10,961.00	$	660,999,597.00	0.00	0.00	0.00%
4.08	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	123.00	$ 310,280.00	$	38,164,440.00	0.00	0.00	0.00%
4.09	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	297.18	$ 97,780.28	$	29,058,345.00	0.00	0.00	0.00%
4.10	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 14 DIAS	M3	91.44	$ 56,860.25	$	5,199,302.00	0.00	0.00	0.00%
4.11	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	205.74	$ 65,675.61	$	13,512,100.00	0.00	0.00	0.00%
				SUB TOTAL	**$**	**5,470,267,408.00**	**SUB TOTAL**	**0.00**	
5.0 ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
5.01	EXCAVACION MECANICA PARA CAJAS VIAS INCLUYE CARGUE	M3	585.20	$ 64,011.00	$	37,459,237.00	0.00	0.00	0.00%
5.02	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3-KM	21591.59	$ 2,343.00	$	50,589,095.00	0.00	0.00	0.00%
5.03	SUBBASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	292.60	$ 170,983.00	$	50,029,626.00	0.00	0.00	0.00%
5.04	BASE GRANULAR CLASE C NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	175.56	$ 183,752.00	$	32,259,501.00	0.00	0.00	0.00%
5.05	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL	M3	369.30	$ 85,450.00	$	31,556,685.00	0.00	0.00	0.00%

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

	CON EQUIPO LIVIANO							
5.06	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3-KM	2771.87	$ 2,729.00	$ 7,564,433.00	0.00	0.00	0.00%
5.07	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	M2	1474.40	$ 11,047.00	$ 16,287,697.00	0.00	0.00	0.00%
5.08	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	147.44	$ 1,429,173.00	$ 210,717,267.00	0.00	0.00	0.00%
5.09	BORDILLO FUNDIDO EN SITIO E=0.15 M B=0.20 H=0.55 M CONCRETO REFORZADO 3000 PSI - 20.7 MPa MEZCLA EN OBRA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	388.00	$ 186,305.00	$ 72,286,340.00	0.00	0.00	0.00%
5.1	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	98.00	$ 310,280.00	$ 30,407,440.00	0.00	0.00	0.00%
				SUB TOTAL	**$ 539,157,321.00**	**SUB TOTAL**	**0.00**	
6.0 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL								
6.01	LINEA DE DEMARCACIÓN VÍAL CON PINTURA ACRILICA EN FRÍO (ML) E=0.12 M. INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	M	388.00	$ 6,632.00	$ 2,573,216.00	0.00	0.00	0.00%
6.02	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	10.00	$ 410,046.00	$ 4,100,460.00	0.00	0.00	0.00%
6.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA TUBERÍA A.N. PESADO 2" INCLUYE 3 HOR CADA 0.36 M VT CD 1.5 M	M	40.00	$ 284,722.00	$ 11,388,880.00	0.00	0.00	0.00%
				SUB TOTAL	**$ 18,062,556.00**	**SUB TOTAL**	**0.00**	
7.0 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO								
7.01	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	541.34	$ 49,004.00	$ 26,527,825.00	0.00	0.00	0.00%
7.02	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN COMPACTACIÓN MANUAL	M3	493.98	$ 42,321.00	$ 20,905,728.00	0.00	0.00	0.00%

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

7.03	RELLENO CON ARENA	M3	51.20	$ 138,031.00	$ 7,067,187.00	0.00	0.00	0.00%
7.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS D=36" incluye nivelacion de precision.	M	50.00	$ 2,476,503.00	$ 123,825,150.00	0.00	0.00	0.00%
7.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 16" incluye nivelacion de precision.	M	25.00	$ 373,278.00	$ 9,331,950.00	0.00	0.00	0.00%
7.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 14" incluye nivelacion de precision.	M	15.00	$ 309,233.00	$ 4,638,495.00	0.00	0.00	0.00%
7.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 12" incluye nivelacion de precision.	M	15.00	$ 215,193.00	$ 3,227,895.00	0.00	0.00	0.00%
7.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 10" incluye nivelacion de precision.	M	15.00	$ 153,280.00	$ 2,299,200.00	0.00	0.00	0.00%
7.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC PARA ALCANTARILLADOS 8" incluye nivelacion de precision.	M	15.00	$ 105,617.00	$ 1,584,255.00	0.00	0.00	0.00%
7.1	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - PRESIÓN TRABAJO 200PSI-12" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 576,300.00	$ 23,052,000.00	0.00	0.00	0.00%
7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - PRESIÓN TRABAJO 200PSI-10" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 416,469.00	$ 16,658,760.00	0.00	0.00	0.00%
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - PRESIÓN TRABAJO 200PSI-8" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 266,089.00	$ 10,643,560.00	0.00	0.00	0.00%
7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - PRESIÓN TRABAJO 200PSI-	M	40.00	$ 161,044.00	$ 6,441,760.00	0.00	0.00	0.00%

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

	6" INCLUYE INST ACCESORIOS								
7.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - PRESIÓN TRABAJO 200PSI-4" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 82,123.00	$	3,284,920.00	0.00	0.00	0.00%
7.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC UNIÓN MECÁNICA PARA ACUEDUCTOS - PRESIÓN TRABAJO 200PSI-3" INCLUYE INST ACCESORIOS	M	40.00	$ 63,730.00	$	2,549,200.00	0.00	0.00	0.00%
7.16	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	90.00	$ 310,280.00	$	27,925,200.00	0.00	0.00	0.00%
				SUB TOTAL	**$**	**289,963,085.00**	**SUB TOTAL**	**0.00**	
8.0 COMPLEMENTARIOS									
8.01	LUMINARIA LED ALUMBRADO PUBLICO 35W REF. SYLVANIA TIPO SHARK O SIMILAR. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	8.00	$ 2,641,544.00	$	21,132,352.00	0.00	0.00	0.00%
8.02	SEPARADOR EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1.84	$ 1,997,309.44	$	3,675,049.00	0.00	0.00	0.00%
				SUBTOTAL	**$**	**24,807,401.00**	**SUB TOTAL**	**0.00**	
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA INCLUYE AIU 36 %			**$**	**10,435,989,466.00**		**825,719,486.00**	
ITEM	**SUBPROGRAMA DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**TIEMPO (MESES)**	**DEDIC %**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		
				COMPONENTE SST					
1.00	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (T09)	MES	1.00	8.00	100.0%	$ 2,500,000.00	$ 20,000,000.00	1.87	4,675,000.00	23.38%
2.00	Inducción, trabajo en alturas, emergencias, primeros auxilios	EVENTO	1.00	8.00		$ 2,000,000.00	$ 16,000,000.00	1.87	3,740,000.00	23.38%
3.00	Entrega de equipos certificados según riesgo	LOTE	1.00	1.00		$ 20,000,000.00	$ 20,000,000.00	1.00	20,000,000.00	100.00%
4.00	Vallas, cintas, avisos, conos, mallas y reflectivos	LOTE	1.00	1.00		$ 4,000,000.00	$ 4,000,000.00	1.00	4,000,000.00	100.00%
5.00	Botiquines, extintores, camillas, kits antiderrames	LOTE	1.00	1.00		$ 3,000,000.00	$ 3,000,000.00	1.00	3,000,000.00	100.00%
	atencion de emergencia ambiental, según PGA	EVENTO	1.00	1.00		$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00	0.00	0.00	0.00%
				SUBTOTAL			**$ 64,500,000.00**	**SUB TOTAL**	**35,415,000.00**	
				COMPONENTE SOCIAL					
1.00	TRABAJADORA SOCIAL (T09)	MES	1.00	8.00	100.0%	$ 3,000,000.00	$ 24,000,000.00	1.87	5,610,000.00	23.38%

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

2.00	manejo de la infraestructura de predios y servicios publicos AUXILIAR DE INGENIERIA (actas de vecindad) (T15)	MES	1.00	1.00	100.0%	$ 4,500,000.00	$	4,500,000.00	1.00	4,500,000.00	100.00%
3.00	atencion a la comunidad PGS-6,1-18	MES	1.00	8.00	100.0%	$ 2,000,000.00	$	16,000,000.00	1.87	3,740,000.00	23.38%
4.00	de informacion y divulgacion PGS-6,2-19	MES	1.00	2.00	100.0%	$ 3,500,000.00	$	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
					SUBTOTAL		**$**	**51,500,000.00**	**SUB TOTAL**	**13,850,000.00**	
	COMPONENTE AMBIENTAL										
1.00	capacitacion y concienciacion para el personal de obra DAGA-1.2-02	UND/MES	1.00	8.00	100.0%	$ 2,000,000.00	$	16,000,000.00	1.87	3,740,000.00	23.38%
	cumplimiento de los requisitos legales DAGA-1.3-03	UND/MES	1.00	8.00	100.0%	$ 2,000,000.00	$	16,000,000.00		0.00	0.00%
2.00	manejo integral de materiales de construccion PAC -2.1-04 (instalacion de puntos ecologicos para el manejo de residuos solidos convencionales generados en los frentes de obra)	UND/MES	1.00	8.00	100.0%	$ 2,000,000.00	$	16,000,000.00	1.87	3,740,000.00	23.38%
3.00	manejo y disposicion final de escombros DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (ESCOMBROS)	TON	2,820.05		100.0%	$ 31,000.00	$	87,421,550.00	1,082.90	33,569,900.00	38.40%
	manejo y disposicion final de escombros DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (ESCOMBROS)	TON	555.91		100.0%	$ 31,000.00	$	17,233,210.00	0.00	0.00	0.00%
4.00	Recuperación de áreas afectadas RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA	UND/MES	1.00	8.00	100.0%	$ 500,000.00	$	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00%
5.00	Instalación, Funcionamiento, y Desmantelamiento de Campamentos y Sitios de Acopio MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS (BAÑOS DE OBRA)	UND/MES	2.00	8.00	100.0%	$ 1,200,000.00	$	19,200,000.00	0.47	4,512,000.00	23.50%
					SUBTOTAL		**$**	**175,854,760.00**	**SUB TOTAL**	**45,561,900.00**	
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO										
1.00	AUXILIAR DE TRAFICO	UND	4.00	8.00	100.0%	$ 2,550,000.00	$	81,600,000.00	0.93	18,972,000.00	23.25%
1.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$	592,000.00	0.00	0.00	0.00%
2.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$	592,000.00	0.00	0.00	0.00%
3.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$	592,000.00	0.00	0.00	0.00%

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

4.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$	592,000.00	0.00	0.00	0.00%
5.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$	592,000.00	0.00	0.00	0.00%
6.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$	592,000.00	0.00	0.00	0.00%
7.00	CODIGO MATERIAL NO. 22802003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$	592,000.00	0.00	0.00	0.00%
8.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$	592,000.00	0.00	0.00	0.00%
9.00	CODIGO MATERIAL NO. 22801003 APU AIM - FACTOR 1.10	UND	2.00			$ 296,000.00	$	592,000.00	0.00	0.00	0.00%
0.00	CODIGO MATERIAL NO. 20701002 APU AIM - FACTOR 1.10		500.00			$ 2,500.00	$	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00%
						SUBTOTAL	**$**	**88,178,000.00**	**SUB TOTAL**	**18,972,000.00**	
						COSTO TOTAL OBRA	**$**	**10,816,022,226.00**		**939,518,386.00**	**8.69%**

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Con base en esta acta, se identificará de manera individual cada ítem ejecutado que se incluye para cobro en esta acta parcial.

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.01	COMISION DE TOPOGRAFIA PERMANENTE	MES	8.00	$ 24,729,963.95	1.87	46,245,033.00	23.38%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.02	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	M	200.00	$ 131,630.00	197.85	26,042,996.00	98.93%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.03	CAMPAMENTO DE 18 M2 CERRAMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA EN TEJA DE ZINC	UND	1.00	$ 6,547,018.00	1.00	6,547,018.00	100.00%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.05	DEMOLICIÓN PAVIMENTO FLEXIBLE (CARPETA ASFALTICA)	M3	117.96	$ 360,662.00	28.68	$ 10,343,786.00	24.31%

Arenas y Triturados del Caney SAS
Nit: 900.757.395-8

287

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.06	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	89.67	$ 551,985.00	0.50	$ 275,993.00	0.56%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.07	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	24.00	$ 621,024.00	1.27	$ 788,700.00	5.29%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.09	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	39.00	$ 310,280.00	4.35	$ 1,349,718.00	11.15%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
2.04	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	162.00	$ 939,625.00	19.20	$ 18,040,800.00	11.85%

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
2.09	AUTOBOMBA PARA CONCRETO	M3	499.44	$ 97,780.28	11.52	$ 1,126,429.00	2.31%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
2.19	ACELERAMIENTO DE CONCRETOS A 7 DIAS	M3	124.86	$ 65,675.61	11.52	$ 756,583.00	9.23%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
3.01	CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.50 M, ØEXT= 1.80 M PROFUNDIDAD MAYOR A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M	150.00	$ 1,643,518.00	117.45	193,031,189.00	78.30%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
3.03	MANEJO DE AGUA EN EXCAVACION BOMBA SUMERGIBLE DE 4 PULGADAS	DIA	90.00	$ 269,581.53	90.00	24,262,337.00	100.00%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

3.04	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ	77.00	$ 310,280.00	61.85	19,190,818.00	80.32%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
3.08	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	63,315.00	$ 10,961.00	43,583.44	477,718,086.00	68.84%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.00	PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (T09)	MES	1.00	$ 2,500,000.00	1.87	4,675,000.00	23.38%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
2.00	Inducción, trabajo en alturas, emergencias, primeros auxilios	EVENTO	1.00	$ 2,000,000.00	1.87	3,740,000.00	23.38%

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
3.00	Entrega de equipos certificados según riesgo	LOTE	1.00	$ 20,000,000.00	1.00	$ 20,000,000.00	100.00%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
4.00	Vallas, cintas, avisos, conos, mallas y reflectivos	LOTE	1.00	$ 4,000,000.00	1.00	$ 4,000,000.00	100.00%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
5.00	Botiquines, extintores, camillas, kits antiderrames	LOTE	1.00	$ 3,000,000.00	1.00	$ 3,000,000.00	100.00%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.00	TRABAJADORA SOCIAL (T09)	MES	8.00	$ 3,000,000.00	1.87	5,610,000.00	23.38%

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
2.00	manejo de la infraestructura de predios y servicios publicos AUXILIAR DE INGENIERIA (actas de vecindad) (T15)	MES	1.00	$ 4,500,000.00	1.00	$ 4,500,000.00	100.00%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
3.00	atencion a la comnunidad PGS-6,1-18	MES	1.00	$ 2,000,000.00	1.87	3,740,000.00	23.38%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.00	capacitacion y concienciacion para el personal de obra DAGA-1.2-02	UND/MES	1.00	$ 2,000,000.00	1.87	3,740,000.00	23.38%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
2.00	manejo integral de materiales de construccion PAC -2.1-04 (instalacion de puntos ecologicos para el manejo de residuos	UND/MES	1.00	$ 2,000,000.00	1.87	3,740,000.00	23.38%

	solidos convencionales generados en los frentes de obra)						

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
3.00	manejo y disposicion final de escombros DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (ESCOMBROS)	TON	2,820.05	$ 31,000.00	1,082.90	33,569,900.00	38.40%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
5.00	manejo y disposicion final de escombros DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (ESCOMBROS)	TON	2,820.05	$ 31,000.00	1,082.90	33,569,900.00	38.40%

CONDICIONES INICIALES					ACTA PARCIAL No.1		
N.° ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	CANT EJECUTADA	VALOR DE COBRO	% DE EJECUCION
1.00	AUXILIAR DE TRAFICO	UND	4.00	$ 2,550,000.00	0.93	18,972,000.00	23.25%

5.4. Avance Financiero

El avance financiero actual del Contrato de Obra No. 3777 de 2025 es del 8.74 % según actas la presente acta parcial relacionada a continuación.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10,816,022,226.00
VALOR ANTICIPO	$ 5,408,011,113.00
VALOR ACTA PARCIAL N°1 (EN PROCESO DE PAGO)	$ 678,469,649.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$939,518,386.00
VALOR POR EJECUTAR	$ 9,876,503,840.00
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	8.69%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	91.31%

6. ESTADO TECNICO DE LA OBRA

6.1. Personal Profesional de obra

Durante el periodo de corte del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026 , continuaron vinculados al desarrollo del contrato de obra No. 3777 de 2025 el siguiente personal profesional ofertado y de apoyo:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DIAS LABORADOS	NO. PLANILLA
John Evaristo Moreno Clavijo	86.088.911	Especialista en pavimentos	Sanitas	Colpensiones	Axa Colpatria	19 de noviembre 2025		30	92503209
Diego Ernesto Dueñas Puentes	7.162.583	Especialista Estructural	Compensar	Colpensiones	Positiva	19 de noviembre 2025		30	35478649
Miguel Ángel Raba Moyano	79.424.348	Especialista Geotecnia			Axa Colpatria	19 de noviembre 2025		30	1835183
Wilson Alexander González Riveros	86.066.292	Especialista Hidráulico	Sanitas	Protección	Axa Colpatria	19 de noviembre 2025		30	9497108099
Juan Fernando Gálvez Flórez	80.112.917	Especialista Eléctrico			Axa Colpatria	19 de noviembre 2025		30	9496868444
Dina Natalia Urrea Serna	1.121.935.643	Profesional Ambiental	Sanitas	Colpensiones	Axa Colpatria	19 de noviembre 2025		30	9495641229
Sandra Carolina Cerquera	40.448.629	Profesional Social	Sanitas	Protección	Positiva	19 de noviembre 2025		30	9495117502
Félix Omar Asprilla	86065444	Director de obra			Axa Colpatria	19 de noviembre 2025		30	6002960745
Leydys Diana Mojica Martínez	40329287	Profesional SST	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	19 de noviembre 2025		30	7996923813

6.2. Personal Operativo

Durante el mes de Septiembre con periodo de corte del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026, se encuentran vinculados al desarrollo del contrato de obra No. 3777 de 2025 el siguiente personal técnico y operativo ATRICA SAS :

MES DE NOVIEMBRE

N.	NOMBRE	CEDULA	CARGO	No. Planilla noviembre 2025	INGRESO	RETIRO	EPS	AFP	ARL
1	CANTOR JIMENEZ SERGIO ANDRES	1121907404	Inspector HSE	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria
2	RODRIGUEZ BENITEZ OSCAR LEONARDO	121910888	Arquitecto Residente Auxiliar	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria
3	AGUDELO GUTIERREZ JORDAN FELIPE	1121912005	Residente Administrativo	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria
4	MORALES SANCHEZ ABEL	7319696	Controlador Personal y Trafico	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Nueva EPS	No obliga a pagar pensión por edad	Axa Colpatria
5	GONZALEZ PARRADO EFRAIN	7344917	Maestro	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria
6	CUBILLOS GUERRERO JAIRO ALIIO	79609436	Operador Minicargador	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Salud Total	Protección	Axa Colpatria
7	ASPRILLA GAITAN FELIX OMAR	86065444	Director de obra	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Sanitas	Colpensiones	Axa Colpatria
8	LOPEZ GALVIS JESUS ANTONIO	5913589	Conductor de Volqueta	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Sanitas	Pensión de Vejez Activa	Axa Colpatria
9	BAQUERO HERRERA JAVIER	86041245	Ingeniero Residente	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Nueva EPS	Protección	Axa Colpatria
10	URREGO AYA JAMES OSWALDO	116664816	Operador Retro	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Famisanar	Porvenir	Axa Colpatria
11	PALACIOS MORENO RICARDO ELIECER	86046532	Topógrafo	**7997707839**	19 de noviembre del 2025		Sanitas	Colpensiones	Axa Colpatria
12	MATOMA JOSE ENRIQUE	17346769	Oficial	**7997707839**	20 de noviembre del 2025		Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria
13	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL	122920278	Ayudante	**7997707839**	20 de noviembre del 2025		Cajacopi	Colpensiones	Axa Colpatria

	ANDRES								
14	GOMEZ ALONSO OMAR	79752027	Oficial	**7997707839**	20 de noviembre del 2025		Salud Total	Protección	Axa Colpatria
15	DIAZ AVENDAÑO WILBER	86057285	Oficial	**7997707839**	20 de noviembre del 2025		Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria
16	DIAZ AVENDAÑO WILLIAM	86067341	Ayudante	**7997707839**	20 de noviembre del 2025		Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria
17	TREJOS RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	1115910157	Ayudante	**7997707839**	21 de noviembre del 2025		Salud Total	Colpensione	Axa Colpatria
18	CAMACHO ALVAREZ DIANA KATHERINE	1000731137	Almacenista	**7997707839**	22 de noviembre del 2025		Sanitas	Colpensiones	AXA Colpatria
19	VELANDIA GARCIA OSCAR IVAN	86080207	Ayudante	**7997707839**	24 de noviembre del 2025		Nueva EPS	Protección	Axa Colpatria
20	VILLALBA ROJAS DUMAR ALEXI	1006697993	Oficial	**7997707839**	24 de noviembre del 2025		Nueva EPS	Porvenir	Axa Colpatria
21	DIAZ HOYOS FABIAN ANDRES	121870576	Ayudante	**7997707839**	24 de noviembre del 2025		Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria
22	SOTO BETANCUR JAINOVER	1122116133	Oficial	**7997707839**	24 de noviembre del 2025		Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria
23	HERNANDEZ ROJAS DAVID GONZALO	1193225083	Ayudante	**7997707839**	24 de noviembre del 2025		Capital Salud	Protección	Axa Colpatria
24	CUBILLOS TORRES VICTOR FIDEL	17327299	Maestro	**7997707839**	24 de noviembre del 2025		Salud Total	Indemnización sust/dev saldos	Axa Colpatria
25	GARZON ARISTOBULO	17335153	Controlador Personal y Trafico	**7997707839**	24 de noviembre del 2025		Sanitas	Colpensiones	Axa Colpatria
26	CAMPAZ ABENDAÑO JOSE ARVEY	86039564	Oficial	**7997707839**	24 de noviembre del 2025		Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria
27	ARBOLEDA CELIS JULIAN CAMILO	1006861119	Ayudante	**7997707839**	25 de noviembre del 2025		Cajacopi	Porvenir	Axa Colpatria
28	BELTRAN MARTINEZ LUIS FERNANDO	121952237	Cadenero	**7997707839**	25 de noviembre del 2025		Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria
29	ROJAS CUELLAR LEVID	83231706	Ayudante	**7997707839**	25 de noviembre del 2025		Nueva EPS	Protección	Axa Colpatria

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

296

DICIEMBRE

NOMBRE	CEDULA	CARGO	EPS	AFP	ARL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DIAS LABORADOS	NO. PLANILLA
Cantor Jiménez Sergio Andrés	1121907404	Inspector SST	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	19 / NOV / 2025		30	6002960745
Rodríguez Benítez Oscar Leonardo	1121910888	Arquitecto Residente Auxiliar	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	19 / NOV / 2025		30	6002960745
Agudelo Gutiérrez Jordán Felipe	1121912005	Residente Administrativo	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	19 / NOV / 2025		30	6002960745
Morales Sánchez Abel	7319696	Controlador Personal y Trafico	Nueva EPS	No obliga a pagar pensión por edad	Axa Colpatria	19 / NOV / 2025	17/12/2025	17	6002960745
González Parrado Efraín	7344917	Maestro	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	19 / NOV / 2025		30	6002960745
Cubillos Guerrero Jairo Alirio	79609436	Operador Minicargador	Salud Total	Protección	Axa Colpatria	19 / NOV / 2025		30	6002960745
López Galvis Jesús Antonio	5913589	Conductor de Volqueta	Sanitas	Pensión de Vejez Activa	Axa Colpatria	19 / NOV / 2025		30	6002960745
Baquero Herrera Javier	86041245	Ingeniero Residente	Nueva EPS	Protección	Axa Colpatria	19 / NOV / 2025		30	6002960745
Urrego Aya James Oswaldo	116664816	Operador Retro	Famisanar	Porvenir	Axa Colpatria	19 / NOV / 2025		30	6002960745
Palacios Moreno Ricardo Eliecer	86046532	Topógrafo	Sanitas	Colpensiones	Axa Colpatria	19 / NOV / 2025		30	6002960745
Matoma José Enrique	17346769	Oficial	Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria	20 / NOV / 2025		30	6002960745
Rodríguez Rodríguez Miguel Andrés	122920278	Ayudante	Cajacopi	Colpensiones	Axa Colpatria	20 / NOV / 2025		30	6002960745
Gómez Alonso Omar	79752027	Oficial	Salud Total	Protección	Axa Colpatria	20 / NOV / 2025		30	6002960745
Díaz Avendaño Wilber	86057285	Oficial	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	20 / NOV / 2025		30	6002960745
Díaz Avendaño William	86067341	Ayudante	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	20 / NOV / 2025		30	6002960745
Trejos Rodríguez	1115910157	Ayudante	Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria	21 / NOV / 2025		30	6002960745

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Andrés Felipe									
Camacho Álvarez Diana Katherine	1000731137	Almacenista	Sanitas	Colpensiones	Axa Colpatria	22 / NOV / 2025		30	6002960745
Velandia García Oscar Iván	86080207	Ayudante	Nueva EPS	Protección	Axa Colpatria	24 / NOV / 2025	30/12/2025	30	6002960745
Villalba Rojas Dumar Alexi	1006697993	Oficial	Nueva EPS	Porvenir	Axa Colpatria	24 / NOV / 2025		30	6002960745
Díaz Hoyos Fabián Andrés	121870576	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	24 / NOV / 2025		30	6002960745
Soto Betancur Jainover	1122116133	Oficial	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	24 / NOV / 2025		30	6002960745
Hernández Rojas David Gonzalo	1193225083	Ayudante	Capital Salud	Protección	Axa Colpatria	24 / NOV / 2025		30	6002960745
Cubillos Torres Víctor Fidel	17327299	Maestro	Salud Total	Indemnización sust/dev saldos	Axa Colpatria	24 / NOV / 2025		30	6002960745
Garzón Aristóbulo	17335153	Controlador Personal y Trafico	Sanitas	Colpensiones	Axa Colpatria	24 / NOV / 2025		30	6002960745
Campaz Abendaño José Arbey	86039564	Oficial	Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria	24 / NOV / 2025		30	6002960745
Arboleda Celis Julián Camilo	1006861119	Ayudante	Cajacopi	Porvenir	Axa Colpatria	25 / NOV / 2025	30/12/2025	30	6002960745
Beltrán Martínez Luis Fernando	121952237	Cadenero	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	25 / NOV / 2025		30	6002960745
Rojas Cuellar Levid	83231706	Ayudante	Nueva EPS	Protección	Axa Colpatria	25 / NOV / 2025		30	6002960745
Custodio Silva Enciso	2990938	Ayudante	capital salud	Colpensiones	Axa Colpatria	1/DIC/2025		29	6002960745
Wilson Diaz Avendaño	86067736	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Axa Colpatria	1/DIC/2025		30	6002960745
Miguel Alberto Moreno Ospina	17310033	AUX Almacén	S/Total	Colpensiones	Axa Colpatria	3/DIC/2025		28	6002960745
Diana Jasmín Ardila Bolaños	1121912083	Auxiliar Administrativa	Nueva EPS	Protección	Axa Colpatria	4/12/2025		27	6002960745
Jesús Alfonso Arturo Valenzuela	4439222	Ayudante	S/Total	Porvenir	Axa Colpatria	11/DIC/2025		20	6002960745
Arnold Stivens Cortes Ladino	1121855478	Ayudante	Cajacopi	Porvenir	Axa Colpatria	11/DIC/2025	30/12/2025	20	6002960745

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

298

Leisder Asdrúbal Giraldo	1121827310	Ayudante	Capital Salud	Protección	Axa Colpatria	11/DIC/2025		20	6002960745
Jeferson Yadir Ortega Casanova	1121918963	Ayudante	Cajacopi	Porvenir	Axa Colpatria	13/DIC/2025		18	6002960745
Jhoan Andres Pérez	1121851865	Ayudante	Cajacopi	Protección	Axa Colpatria	18/DIC/2025		13	6002960745
Isidro Romero Piñeros	17340693	Oficial	Capital Salud	Colpensiones	Axa Colpatria	18/DIC/2025		13	6002960745
Raúl Antonio Henao	5952517	Ayudante	Sanitas	Porvenir	Axa Colpatria	18/DIC/2025		13	6002960745
Mario Acosta Rodríguez	79348961	Ayudante	Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria	18/DIC/2025		13	6002960745
Félix Eduardo Castro Parra	14234048	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	20/12/2025	30/12/2025	12	6002960745
Michael Stiven Requiniva Orjuela	1122511456	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Axa Colpatria	06/01/2026			
Camilo Andrés Diaz Castro	1122516814	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	06/01/2026			
Crisanto Hernandez Barreto	86059052	Ayudante	Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria	06/01/2026			
Jose David Romero Cancelada	1234788092	Oficial	Nueva EPS	Porvenir	Axa Colpatria	07/01/2026			
Jairo Quiroga	5570122	Ayudante	Famisanar	Protección	Axa Colpatria	9/01/2026			
Leonardo Fabio Mora Morales	79554253	Controlador Vial	Cajacopi	Porvenir	Axa Colpatria	9/01/2026			
Héctor Cuellar Moreno	1121888306	Ayudante	Cajacopi	Porvenir	Axa Colpatria	06/01/2026			

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS
Nit: 900.757.395-8

299

PERSONAL CONTRATISTA JM

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EPS	AFP	ARL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DÍAS LABORADOS	No. DE PLANILLA
Cristian Fabian Ortiz Paramo	1122121569	Oficial	Compensar	Protección	Axa Colpatria	27/11/2025		18	35972595
Gustavo Jesús Márquez Bermúdez	7.141.304	Oficial	Nueva EPS	Protección	Axa Colpatria	27/11/2025	20/12/2025	22	35972595
Bairon Eduardo González Lombana	1121934833	Ayudante	Medimas	Porvenir	Axa Colpatria	27/11/2025		30	35972595
Jairo Moreno	17344087	Supervisor administrativo	Nueva Eps	Protección	Axa Colpatria	27/11/2025		30	35972595
Juan David Ureña Reina	1.029.981.121	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	27/11/2025		30	35972595
Juan Carlos Suarez Hernandez	1111758103	Pilero	Nueva EPS	Protección	Axa Colpatria	29/11/2025	20/12/2025	22	35972595
Jose Hilé Mosquera Waldo	71.975.585	Pilero	Nueva EPS	Colpensiones	Axa Colpatria	29/11/2025	18/12/2025	19	35972595
Luis Hernán Murillo Rivas	98670705	Pilero	Nueva EPS	Protección	Axa Colpatria	30/11/2025	22/12/2025	30	35972595

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Arenas y Triturados del Caney SAS

Nit: 900.757.395-8

300

Juan Efrén Rivas Longa	11707003	Pilero	Protección	Colpensiones	Axa Colpatria	30/11/2025	22/12/2025	22	35972595
Jhon Jaime Gil Valencia	71937289	Pilero	Salud Total	Colpensiones	Axa Colpatria	30/11/2025	22/12/2025	22	35972595
Estarlin Asprilla Mosquera	1003942583	Pilero	Nueva Eps	Porvenir	02/12/2025	04/12/2025	06/12/2025	2	35972595
Brayan del Jesús Pombo Mejía	1104436826	Pilero	Sura	Porvenir	02/12/2025	02/12/2025	24/12/2025	22	35972595
Alexander Mosquera Ibarquen	1017178065	Pilero	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	4/12/2025	6/12/2025	2	35972595
Elbert Ibarguen Albornoz	82382202	Pilero	Sura	Colpensiones	Axa Colpatria	4/12/2025	26/12/2025	22	35972595
Cristian Fernando Potes Sánchez	1003787786	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Axa Colpatria	9/12/2025	22/12/2025	13	35972595
Weimar Machado Palomeque	1193141130	Pilero	Nueva EPS	Porvenir	Axa Colpatria	9/12/2025		22	35972595
Wilberto Almonacid Rojas	1.117.535.869	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	19/12/2025		12	35972595
Divier Enrique Mendoza Romero	1070816233	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	19/12/2025		12	35972595

Cra 32 No. 41-68 Oficina 301. Edif. Parque Infantil / Cel: 311 6764167
E-mail: atricapuente2025@gmail.com
Villavicencio - Meta

Amilkar David Suarez Añez	PPT 6217592	Ayudante	Mutual Ser EPS	Porvenir	Axa Colpatria	19/12/2025		12	35972595
Rosmen Tumay De Dios	1115857906	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Axa Colpatria	19/12/2025		12	35972595
Kevin Humberto Londoño Carvajal	1121965387	Ayudante	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	29/12/2025		22	35972595
Javier León Vargas	93085792	Oficial	Salud Total	Porvenir	Axa Colpatria	29/12/2025		22	35972595
Juan Sebastian Escarria	1113783370	Ayudante	Coosalud	Porvenir	Axa Colpatria	6/01/2025			
Jaime de Jesús Contreras	92554713	Ayudante	Famisanar	Porvenir	Axa Colpatria	6/01/2025			
Kelvy de Jesús Tovar	27653220	Ayudante	Nueva EPS	Porvenir	Axa Colpatria	6/01/2025			
Jarly Ruiz Martínez	1137219669	Ayudante	Coosalud	Porvenir	Axa Colpatria	6/01/2025			
Javier Eduardo Alayon Villada	1125476796	Ayudante	Cajacopi	Colpensiones	Axa Colpatria	6/01/2025			

PERSONAL CONTRATISTA INGEAS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	EPS	AFP	ARL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DÍAS LABORADOS	No. DE PLANILLA
Hermes Adelmo Parrado Molano	1122648057	Oficial De Obra	Salud Total	Porvenir	Positiva	21/12/2025		19	6333932
Cenen Isauro Parrado Molano	1122648632	Ayudante De Obra	Famisanar	Porvenir	Positiva	21/12/2025	30/12/2026	8	6333932
Ferney Esquivel Ramírez	93.422.072	Ayudante De Obra	Salud Total	Porvenir	Positiva	21/12/2025		19	6333932
José Humberto Lambona Tovar	11.424.224	Ayudante De Obra	Nueva EPS	Colfondos	Positiva	23/12/2025		17	6333932
Santos Reyes Turriago	3.017.531	Ayudante De Obra	Sanitas	Protección	Positiva	27/12/2025		14	6333932

6.3. Relación de Equipo

Dentro de la Maquinaria y Equipos empleados por el contratista para la ejecución del proyecto en este periodo comprendido entre el 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026 tenemos:

DESCRIPCION DEL EQUIPO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Pluma grua eléctrica	2	Buen estado – En uso
Pluma grua diesel	3	Buen estado – En uso
Mini cargador Caterpillar	1	Buen estado – En Uso
Retroexcavadora jcb Enllantada	1	Buen estado – En uso
Equipo Estación Topográfica	1	Buen estado – En uso
Nivel de Precisión Topográfico	1	Buen estado – En uso

Compactador Tipo Canguro - Dimacro	1	Buen estado – En Uso
Vibrador para Concreto	4	Buen estado – En uso
Mezcladora para concreto de un bulto	4	Buen estado – En Uso
Martillo Demoledor Eléctrico	15	Buen estado – En Uso
Martillo compresor	4	Buen estado – En Uso
Formaleta Metálica para camisa (juego)	10	Buen estado – En uso

7. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL

7.1. Estado Financiero Contrato de Obra 359 de 2023

7.1.1. Descripción Financiera Contrato

DESCRIPCION	VALOR
VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA 3777 DE 2025	$ 10,816,022,226.00

7.1.2. Relación de pagos, Contrato de obra 359 de 2023

A la fecha se encuentra en tramite la presente acta parcial de cobro

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 10,816,022,226.00
VALOR ANTICIPO	$ 5,408,011,113.00
VALOR ACTA PARCIAL N°1 (EN PROCESO DE PAGO)	$ 678,469,649.00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$939,518,386.00
VALOR POR EJECUTAR	$ 9,876,503,840.00
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO	8.69%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	91.31%

7.1.3. Fuentes de Financiación (Registro Presupuestal Contrato de Obra 3777 de 2025)

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
NIT. 892099324-3
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 7952

Vigencia: 2.025 Fecha de Compromiso: 15 de diciembre de 2025

Beneficiario ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY S.A.S Nit: 900757395 - 8
No. C.D.P. : 6589 Fecha de Expedición del C.D.P.: 10 de diciembre de 2025 Con Formalidades Plenas
Tipo de Compromiso Obras
Contrato: 3777 Fecha: 12/12/2025 Vence: 31/12/2025
Objeto: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y CONEXIÓN VIAL EN EL CAÑO PARRADO SECTOR VILLA JULIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA CDP SPGR 4525; RP 4225
Cto. Utilidad : OFICINA DE GESTION DEL RIESGO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversión		
99 - 2 - 3.45.03.1000.027 - 2025500010004 - 2.2.8.1.00 - 67	BPIN 2025500010004 Construcción de obras para la mitigación del riesgo de desastres y conexión vial en el caño parrado sector villa julia en el municipio de villavicencio, meta Recurso de la Nación - Destinación Específica Sistema General de Regalías - Adq Directa SSF Clasificadores 450345030220-53290-2025500010004-210150001 -2.2.8.1.00 -5.816.022.226,00	5.816.022.226,00
99 - 2 - 3.45.03.1000.027 - 2025500010004 - 2.2.8.1.00 - 671	BPIN 2025500010004 Construcción de obras para la mitigación del riesgo de desastres y conexión vial en el caño parrado sector villa julia en el municipio de villavicencio, meta Recurso de la Nación - Destinación Específica Sistema General de Regalías - Adq Directa - Gobierno Clasificadores 450345030220-53290-2025500010004-210150001 -2.2.8.9.00 5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Total Compromisos	$10.816.022.226,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Rezago	$10.816.022.226,00
Valor Total Prog.	$10.816.022.226,00

ALEZANDRA MONCADA GAMBOA
Directora Presupuesto

7.2. Estado Administrativo de la Obra

7.3. Estado Administrativo: Control de Calidad de la Obra y Certificados de Calidad de Equipos, Materiales y Maquinaria

El presente documento establece el estado administrativo del presente contrato. En este sentido, se detalla el control de calidad implementado en la obra, así como los certificados de calidad de materiales y maquinaria.

7.4. Estado Administrativo de la Obra

7.5. Estado Administrativo: Control de Calidad de la Obra y Certificados de Calidad de Equipos, Materiales y Maquinaria

El presente documento establece el estado administrativo del presente contrato En este sentido, se detalla el control de calidad implementado en la obra, así como los certificados de calidad de materiales y maquinaria utilizados en el proceso constructivo.

7.5.1. Control de Calidad de la Obra:

El control de calidad del presente contrato se relaciona con el plan de inspección y ensayos el cual fue presentado y aprobado por interventoría y va anexo al presente informe

7.5.2. Certificados de Calidad de Equipos, Materiales y Maquinaria:

Se han obtenido y verificado los certificados de calidad correspondiente a los equipos, material y maquinaria utilizados. Dichos certificados han garantizado que los elementos empleados cumplan con los estándares de calidad exigidos y son aptos para su uso en la obra, para el periodo de obra que corresponde del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026 2025.

8. Gestión Técnica y Documental

8.1. Actas Generadas durante el periodo del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026

Durante este periodo se generaron las siguientes Actas y correspondencia:

DOCUMENTO	FECHA	TEMA TRATADO
Acta de Comité Técnico de Obra No. 1	27 de noviembre 2025	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
Acta de Comité Técnico de Obra No. 2	04 de diciembre de 2025	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
Acta de Comité Técnico de Obra No. 3	12 de diciembre de 2025	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
Acta de Comité Técnico de Obra No. 4	15 de diciembre 2025	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
Acta de Comité Técnico de Obra No. 5	18 de diciembre de 2025	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES
Acta de Comité Técnico de Obra No. 6	08 de enero de 2025	SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

9. Obligaciones Contractuales.

9.1. Cumplimiento de la ejecución del Objeto del Contrato.

Durante el periodo contractual del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026, se puede evidenciar mediante el presente informe mensual de obra, que se ha venido ejecutando el contrato de obra pública No. 3777 de 2025 en forma idónea, oportuna, eficaz, eficiente, bajo las especificaciones técnicas de diseño contratadas.

9.2. Uso responsable y eficiente de los Recursos del Contrato.

En el presente informe mensual de obra con corte del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026, se evidencia que el contrato se ha ejecutado con responsabilidad y se pueden verificar los documentos allegados, los cuales soportan el cumplimiento del mismo.

9.3. Verificación del uso de recursos exclusivamente para actividades del contrato

Como se mencionó en el punto anterior, en el presente informe se pueden verificar los documentos allegados, los cuales soportan el cumplimiento de las actividades y los recursos destinados.

9.4. Cumplimiento de los términos del contrato y pliego de condiciones

Durante el periodo contractual del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026, se evidencia mediante el presente informe que se ha venido desarrollando el objeto del contrato conforme a los términos de la orden de servicio.

9.5. Presentación de cronograma detallado de actividades

A la fecha se mantiene vigente la programación correspondiente a la fecha de inicio de la orden de servicio 011 del 19 de noviembre de 2025

9.6. Programa de medidas ambientales y plan de manejo constructivo

En cumplimiento de esta actividad, se aporta el programa de medidas ambientales como componente del contrato

Se anexa informe de plan de gestión ambiental

9.7. Prioridad de contratación de mano de obra local

En cumplimiento de esta obligación, continua la contratación de personal oriundo del municipio de Villavicencio meta, veredas, centros poblados y corregimientos cercanos al área de influencia del proyecto para mano de obra No calificada, el cual se da cumplimiento al componente de gestión social para la ejecución del proyecto.

9.8. Cumplimiento de seguridad social y parafiscal

Se da cumplimiento OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, "*Vincular a todo el personal en forma previa a la iniciación de labores al sistema integral de seguridad social y cumplir el pago oportuno de sus aportes al mismo al igual de los parafiscales*", se adjuntan las planillas de seguridad social y certificación de parafiscales del personal contratado, periodo correspondiente del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026, tanto los vinculados directamente bajo el ATRICA SAS como los contratistas que hacen parte del proyecto como apoyo técnico y profesional.

9.9. Informes y documentación mensual

Se ha cumplido con esta obligación estipulada dentro del contrato, realizando la entrega oportuna de los informes mensual de obra No.01 y 02 asi mimo como el correspondientes a las fechas del 19 de noviembre al 14 de diciembre de 2025 y del 15 de diciembre al 14 de enero de 2026 respectivamente



308

9.10. Obrar con lealtad y buena fe

En atención a esta obligación, se ha obrado con lealtad en el desarrollo del contrato de obra 3777 de 2025, cumpliendo técnica, jurídica, administrativa y financieramente a la fecha con el objeto del contrato.

9.11. Mantenimiento de reserva profesional

Para este periodo contractual se ha mantenido la reserva profesional de la información suministrada para el desarrollo del contrato.

9.12. Facturación de acuerdo al estatuto tributario

A la fecha del presente informe, se realiza la presente acta parcial por lo que se hace necesario la presentación de este documento

9.13. Prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato

A la fecha de ejecución de este periodo no se a realizado ningún acta administrativo de prorroga do con esta, teniendo como fecha de terminación 18 de julio del 2026

9.14. Acta de liquidación del contrato

Para este periodo el contrato aún no se encuentra en etapa de liquidación, puesto a que estamos en etapa de ejecución de obra

9.15. Modificaciones Contractuales

A la fecha del presente informe no se ha realizado ningún acto administrativo que implique la modificación del contrato

9.16. Mantenimiento de Garantías.

En cumplimiento de esta obligación se han mantenido vigentes todas las garantías que amparan el contrato, tal como se observa en las Pólizas que reposan en la carpeta contractual, adicionalmente se mantiene la relación en el presente informe de las pólizas de cumplimiento a favor de entidades estatales y de Responsabilidad Civil Extracontractual,

9.17. Suspensión y reinicio del contrato

En este periodo no se realizó ningún tipo de suspensión o reinicio

9.18. Aportes a los sistemas de seguridad social

En cumplimiento a esta obligación se aportan las planillas de Seguridad Social y aportes Parafiscales del mes de noviembre y diciembre de 2025 del personal vinculado al ATRICA SAS. Y así como las planillas de los subcontratistas presentes en este periodo.

Estas planillas se anexan en el correspondiente informe del componente SST

9.19. Compromiso con la salud ocupacional y la seguridad industrial durante la ejecución del contrato

Como soporte de cumplimiento de esta actividad, se anexa el informe de Seguridad y salud en el Trabajo de los dos periodos descritos anteriormente informe 1 e informe 2.

9.20. Obligaciones de transparencia en relación a la composición societaria y acuerdos de accionistas

Para este periodo contractual no hay información adicional para informar, diferente a la que ya conoce la entidad y fue aportada en los documentos que reposan en la oferta.

9.21. Responsabilidades laborales, tributarias y ambientales del contratista

Para la ejecución y cumplimiento de esta obligación se aportan las planillas de seguridad social del personal a cargo y que ha intervenido en este periodo de ejecución.

9.22. Informes de Investigaciones Penales de los Directivos del Contratista

No se presentaron situaciones referentes a investigaciones penales, imposición de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Consorcio que debieran ser informadas.

9.23. Notificación de Procesos Concursales o de Liquidación del Contratista

No se presentaron situaciones referentes a iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación que debieran ser informadas.

9.24. Plan de Calidad Específica del Proyecto

Para la ejecución del presente contrato de obra, se radicó el plan de calidad solicitado.

9.25. Ejecución de la Obra según el Diseño Entregado

Para el cumplimiento de esta obligación, el contratista se remite específicamente a los diseños de la consultoría realizada por la entidad contratante el cual es remitida nosotros a través de la interventoría, el cual es revisada y analizada por cada uno de los especialistas y se informa a esta sobre la necesidad de realizar ajustes a los diseños y la complementación de estudios para la realización de estos.

9.26. Bitácora de Avances y Registros Necesarios en la Obra

Para el cumplimiento del presente informe se adjunta copia de la correspondiente bitácora del periodo ejecutado del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026.

9.27. Reglamentos de Seguridad y Prevención de Riesgos de Accidentes

Dentro del informe de Seguridad y Salud en el Trabajo para el periodo del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026, se acreditan las medidas de señalización vial y normas de seguridad industrial adoptadas durante la ejecución de las actividades.

De igual forma se realizan las respectivas inspecciones de seguridad de manera obligatoria y diaria en campo, medición de la frecuencia de accidentalidad laboral, severidad de la accidentalidad laboral, tareas de alto riesgo, con el fin de reducir los factores de riesgo que puedan aumentar los índices de accidentalidad de la ejecución del contrato de obra.

Se anexa informe sst

9.28. Garantía de Elementos Adecuados

Se acredita la entrega de Elementos de Protección Personal a trabajadores de primer uso y se realiza seguimiento al tiempo de uso de estos, garantizando la seguridad de los actores en campo.

9.29. Aprobación de Materiales y Fuentes de Abastecimiento por la Interventoría.

Dentro de los oficios recibidos por parte de la interventoría, relacionados en la correspondencia recibida, hacen la solicitud de la información de los proveedores de materiales asi mismo como la del laboratorio encargado de la realización de los ensayos y pruebas que den lugar al plan de inspección y ensayos presentado.

9.30. Verificación y control de calidad de materiales y trabajos

Durante este periodo se realizan los controles pertinentes a las actividades ejecutadas y relacionadas dentro del plan de inspección y ensayos .

9.31. Verificación de planos y diseños: responsabilidades del contratista

En cumplimiento a esta obligación, la documentación referente recibida el 22 de noviembre es recibida y evaluada por cada uno de los especialistas presentados y aprobados para la ejecución de este proyecto

9.32. Acreditación y suministro de equipo necesario para el cumplimiento del contrato

En cumplimiento a esta obligación, se acredito el equipo necesario para el cumplimiento del objeto del contrato, el cual ha venido siendo autorizado y aprobado por la interventoría.

9.33. Presentación de informes mensuales, parciales y final del contrato

En cumplimento a esta actividad, se presenta el presente informe acta parcial de obra No.1 correspondiente al periodo del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026, con todos sus soportes de cumplimiento dentro del término establecido el cual a su vez es el informe correspondiente al acta parcial N°2 siendo el mismo periodo de ejecución de la misma y cumpliendo con las obligaciones, donde especifican cobros mensuales hasta el 90 % del presupuesto.

9.34. Divulgación del proyecto: instalación de valla informativa y lineamientos a seguir

A la fecha no se ha dado respuesta del requerimiento hecho por nosotros a la entidad, para que se nos entregue el diseño dimensional y la información requerida dentro de esta , para la instalación en obra.

9.35. Presentación de informes de la obra para el municipio

En cumplimiento de esta actividad, se realiza el presente informe el cual contiene:

La presentación mensual de informes de la obra para el Municipio, en medio físico con sus correspondientes anexos : laboratorios, registro fotográfico de los sectores intervenidos, relación de personal, pagos al SGSST, entre otros componentes .

9.36. Implementación de turnos de trabajo para cumplir con la Ley 1682 de 2013.

Para este periodo se dio cumplimiento a lo establecido en el inciso 2° artículo 17 de la Ley 1682 de 2013, respecto de los turnos de trabajo que se presentaron durante el periodo.

9.37. Garantía de equipo profesional para acompañamiento técnico del proyecto.

En cumplimiento de esta actividad, se presenta a la interventoría los soportes que demuestran la idoneidad necesaria para la ejecución del contrato de cada uno de los especialistas requeridos.

9.38. Atención a requerimientos de la comunidad durante la ejecución del proyecto.

Durante este periodo se ejecuta el plan de gestión social consignado en el presente contrato donde se le da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que impliquen a la comunidad.

Se anexa informe de plan de gestión social

9.39. Trámite adecuado para cambios y modificaciones en los diseños del proyecto.

Dentro de las obligaciones como contratistas de revisar la información suministrada mediante cada uno de los especialistas, se evidenciaron ajustes a los diseños y estudios o información adicional, necesaria para estos los cuales fueron aceptados y aprobados por la interventoria.

9.40. Gestión y obtención de permisos y licencias necesarias para la ejecución del proyecto.

Por la naturalidad del presente contrato no se necesita licencia de construcción y debido a la necesidad urgente por motivo de calamidad publica el permiso de ocupación de cause no fue necesario para el inicio de las labores, pero si es un requerimiento que solicita la autoridad ambiental , el cual esta a cargo de la entidad contratante el cual para este contrato es GESTION DEL RIESGO.

A la fecha se encuentra en tramite dicho permiso

9.41. Gestión social del proyecto, incluyendo socialización y atención de peticiones.

Durante este periodo se ejecuta el plan de gestión social consignado en el presente contrato donde se le da cumplimiento a cada uno de los requerimientos que impliquen a la comunidad.

Se anexa informe de plan de gestión social

9.42. Otras responsabilidades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

En cumplimiento a esta obligación se han atendido las demás actividades con relación al objeto contractual.

9.43. Acato de directrices de supervisor, apoyo técnico e interventor.

En atención a esta obligación, se han acatado todas las directrices dadas por la supervisión, el apoyo técnico y la interventoría.

10. Problemas presentados y soluciones planteadas

A la fecha de presentación del presente informe, no se evidencian problemas que afecten la ejecución del proyecto.

11. Conclusiones

- **Avance físico y financiero acorde a la programación**

  Durante el periodo del 19 NOVIEMBRE DE 2025 AL 14 DE ENERO DE 2026 se ejecutaron actividades preliminares y de cimentación, alcanzando un avance físico y financiero del 8.69 % cercano al programado (10.98% acumulado), lo que evidencia una gestión adecuada de recursos y cronogramas.

- **Implementación de medidas técnicas y ambientales**

  Se han aplicado protocolos de seguridad industrial, salud ocupacional y manejo ambiental (disposición de escombros, control de ruido y tránsito), cumpliendo con las normas NSR-10, RAS 2000 e ICONTEC, lo que garantiza la calidad y sostenibilidad de la obra.

- **Gestión documental y administrativa organizada**

  El informe refleja una adecuada trazabilidad documental mediante actas, correspondencia y registros técnicos, lo que fortalece la transparencia y facilita la supervisión de la interventoría y la Secretaría de Gestión del Riesgo.

- **Impacto positivo en la mitigación del riesgo y la movilidad**

  Las obras ejecutadas en este segundo periodo contribuyen a la recuperación de la conectividad vial en el sector Villa Julia y a la reducción de la vulnerabilidad frente a futuros desastres, generando beneficios inmediatos para la comunidad y el entorno urbano de Villavicencio.

12. Anexos

- Bitácora
- Resultados de laboratorio
- Componente SST
- Componente social
- Componente ambiental
- Plan de manejo de transito

revisado y aprobado

FELIX OMAR ASPRILLA GAITAN
CC. 86.065.444 DE VILLAVICENCIO
DIRECTOR DE OBRA
ATRICA SAS
