ACTA DE ENTREGA MANTENIMIENTO ELECTRICO IE VILLA DEL SOCORRO

27/11/2025

Se instalan **18 suiches nuevos** en baños de estudiantes y en salones del primero y segundo piso de las sedes intervenidas, debido al deterioro y a la ausencia de los mismos. La instalación incluye suministro de materiales y mano de obra especializada.



Antes




Después

Se instalan **10 tomas eléctricas** en el salón de informática del segundo piso de la sede principal y se realiza el tendido de cableado correspondiente, garantizando la correcta distribución eléctrica del aula.



Antes

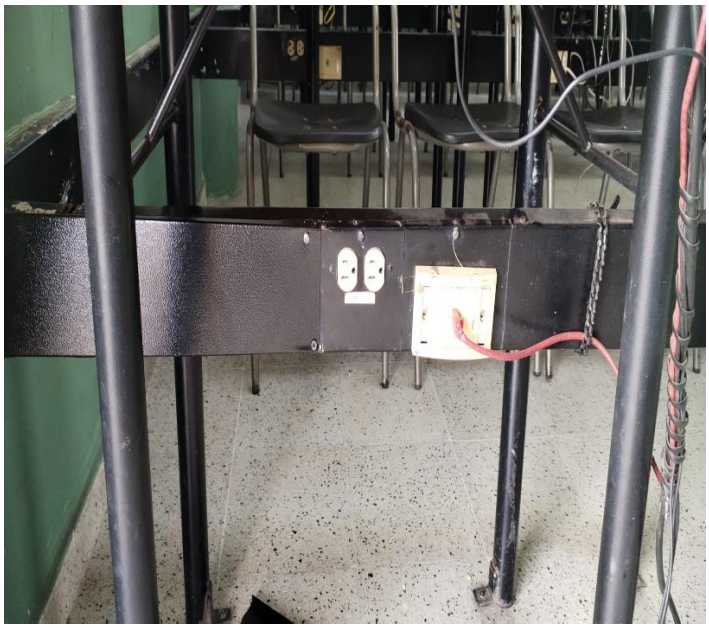

Después

Se cambian **2 lámparas LED de 120 cm** en el restaurante de la sede principal debido a fallas por corto circuito. Se reemplaza igualmente el cableado, instalando **4 metros de cable positivo y 4 metros de cable negativo** por cada punto intervenido.







Antes **Después**

Se realiza el **cambio de 15 tomas eléctricas** en los salones 1, 2 y 3 de la sede principal, incluyendo el reemplazo del cableado deteriorado para evitar descargas y garantizar la seguridad eléctrica de los espacios..








Antes **Después**

Se reemplazan **13 lámparas LED de 48W (120×30 cm)** en el corredor del primer piso de la sede Villa Niza, debido a daños por humedad y fallas en balastros.



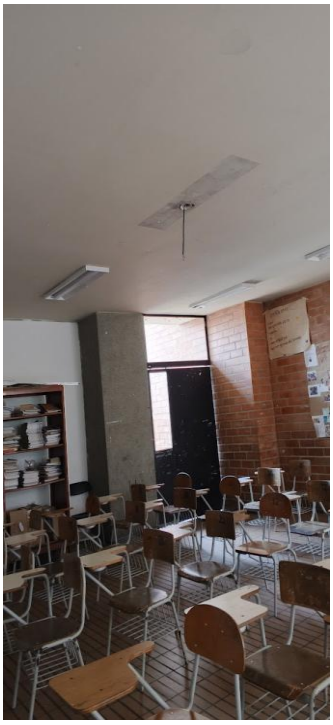

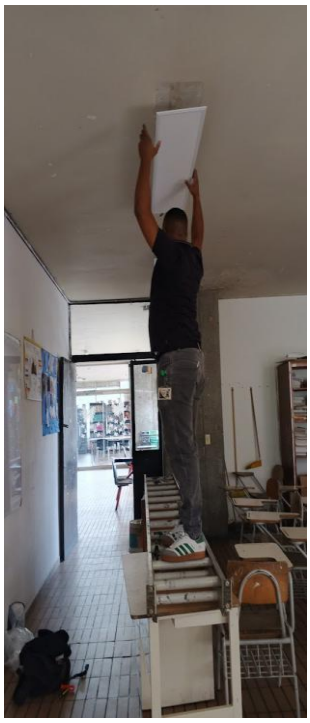

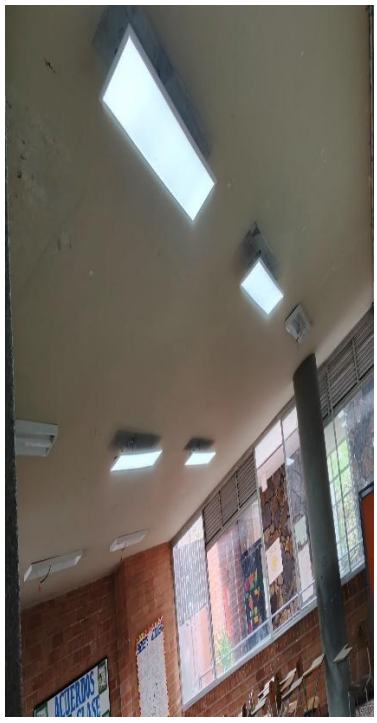

Antes **Después**

Se cambian 3 lámparas LED de 48W en los baños de la sede Villa Niza, debido a deterioro generado por humedades y fallas internas.









Antes **Después**

Se reemplazan **19 tubos LED T8 de 18W y 120 cm** en las aulas del segundo piso de la sede La Fidel, debido a quemado y mal funcionamiento de los anteriores.




Antes






Después

Se cambian **4 tubos LED T8 de 18W** en la tienda escolar de la sede principal, debido a fallas por humedad y quemado.




Antes

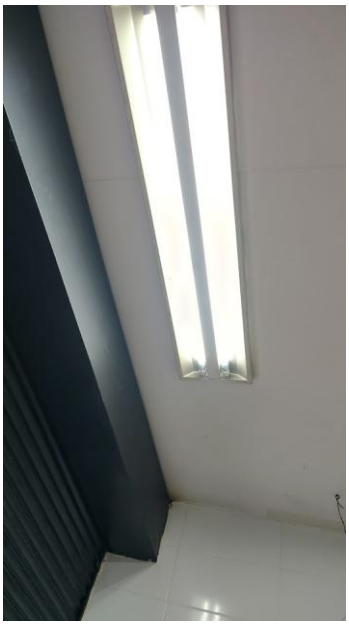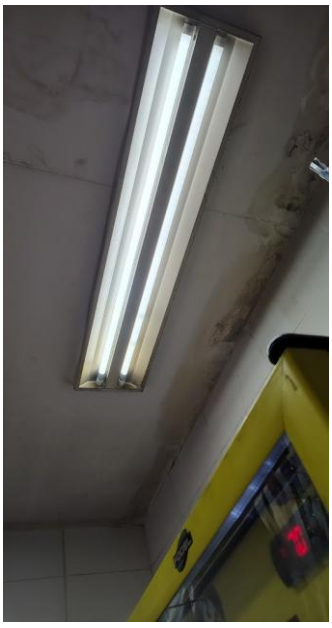



Después

Se instalan **3 lámparas LED planas de 54W** en la tienda escolar, como reemplazo de luminarias que presentaban descargas y riesgo eléctrico.




Antes

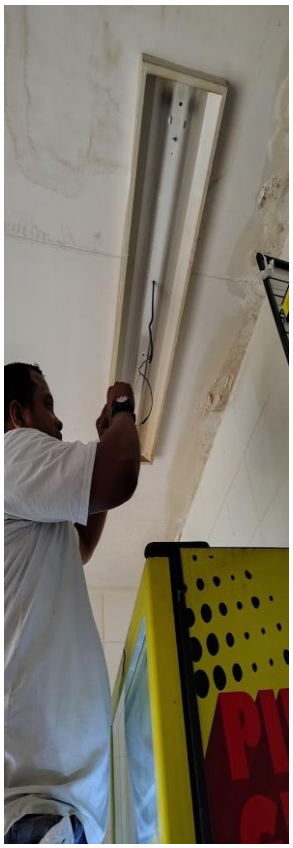



Después

Se cambian **3 lámparas LED de 48W** en la secretaría de la sede principal, debido a falla total y agotamiento de su vida útil.





Antes

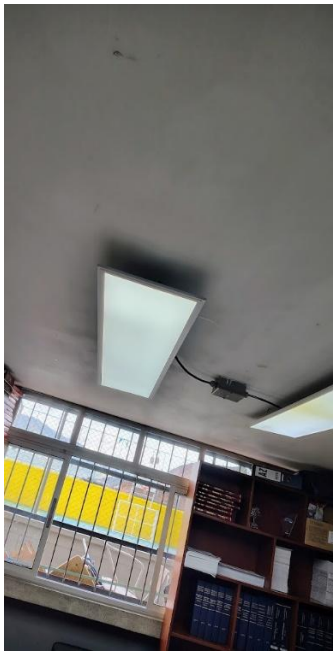Después



Se reemplazan **11 lámparas LED de 48W (120×30 cm)** en el cuarto piso de la sede Villa Niza, debido a humedad en la cubierta y fallas en balastros.



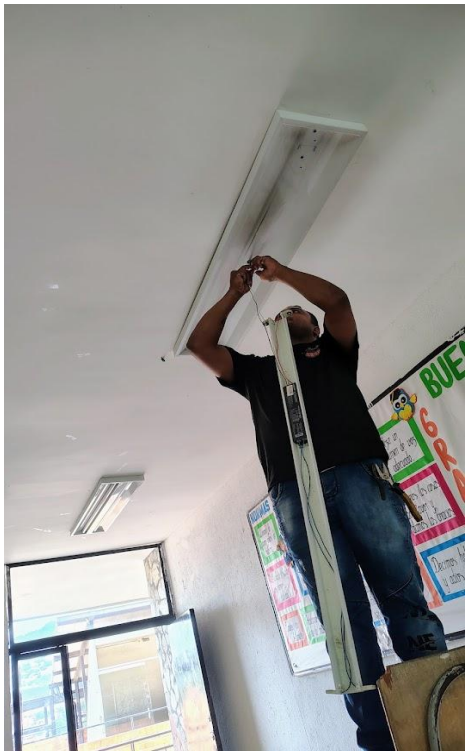

Antes

Después

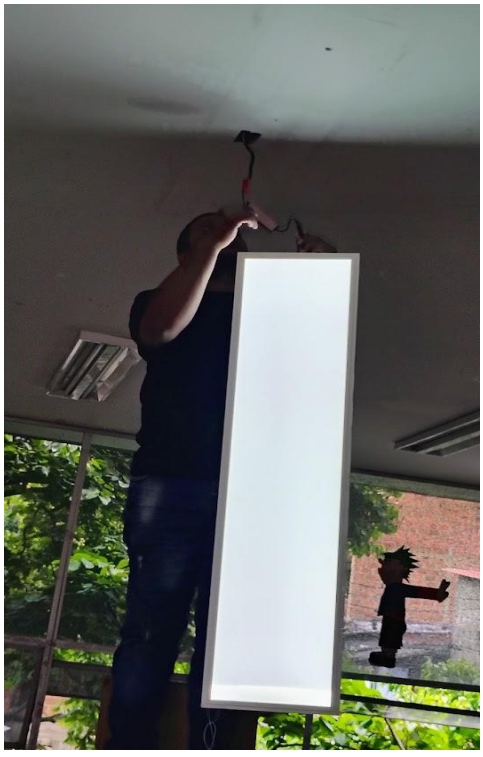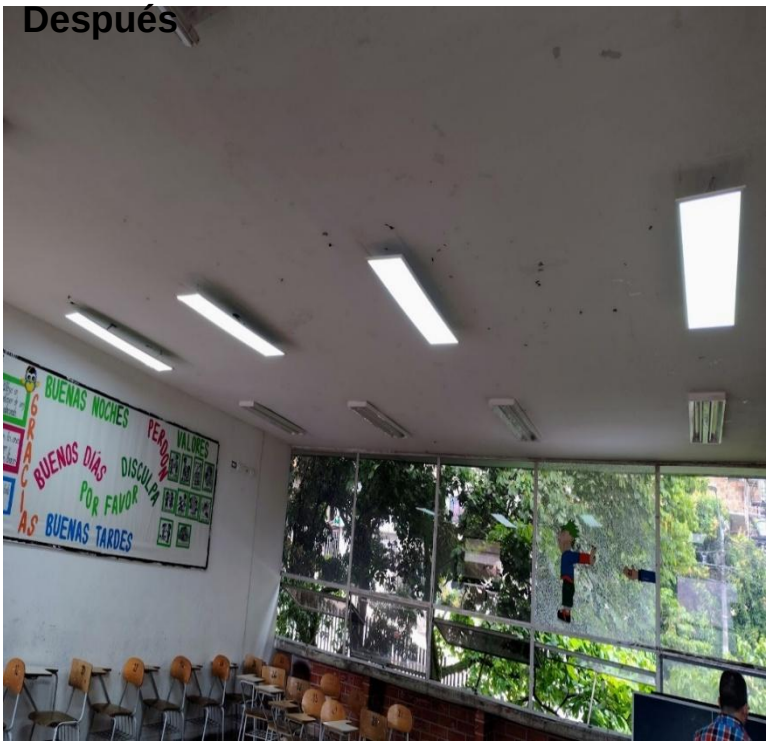Se instala un sistema de aire acondicionado tipo mini split, incluyendo el suministro del equipo, la instalación eléctrica requerida, el tendido de cableado, la adecuación del punto de conexión y la mano de obra especializada.

La intervención se realiza en la sala de sistemas de la sede principal, garantizando el correcto funcionamiento del equipo, su fijación estructural y la puesta en marcha del sistema, con el objetivo de asegurar condiciones adecuadas de temperatura para el funcionamiento de los equipos informáticos.

JUAN CAMILO HERNANDEZ RESTREPO

C.C. 1017151309

ENTREGA



RECIBE Rector
