INFORME EJECUTIVO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°936-2025

Clase de Contrato:	Convenio Interadministrativo No. 936-2025.
Objeto	**AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE UN TRAMO EN EL COLECTOR LA ITALIA SECTOR PALMAR EN LA ELIMINACION DE 4 PUNTOS DE VERTIMIENTO SEGÚN PSMV 2023-2032 DE ACUERDO A LA RESOLUCION N°1667 DEL 02 DE JUNIO 2023 Y LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA VERTIMIENTOS DOMESTICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E., EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL.**
Partes:	**MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL** NIT 891.480.033-4 **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL** (EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E) NIT 800.050.603-7
Supervisor del municipio	**LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO** Secretario de Infraestructura.
Representante Legal EMPOCABAL	**OSCAR JAVIER VASCO GIL**
Valor	QUINIENTOS QUINCE MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. **($515.756.460,00)** INCLUIDO IVA. De los cuales el Municipio aportará la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE **($359.215.600,00)** y la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABALESP – E.I.C.E, aportará la suma de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON M/CTE **($156.540.860,00)**.
CDP MUNICIPIO N°	**1584 de 2025**

RP MUNICIPIO N°	**2001 de 2025**
CDP EMPOCABAL N°	**250771** DEL OCTUBRE DE 2025
Plazo de Ejecución	55 Dias sin superar el 31 de diceimbre de 2025.
Fecha De Inicio:	13 de noviembre de 2025
Fecha Terminación inical:	31 de diciembre 2025
Prorroga:	3 meses
Fecha de terminacion final:	31 de marzo de 2026

BALANCE DEL CONVENIO		
APORTE MUNICIPIO	$ 359.215.600,00	
APORTE EMPOCABAL	$ 156.540.860,00	
DESEMBOLSO NETO N°1 MUNICIPIO		$ 103.274.485,00
DESCUENTO IMPUESTO DE TIMBRE N°1		$ 1.796.078,00
DESCUENTO TASA PRODEPORTE N°1		$ 2.694.117,00
DESEMBOLSO N°1 EMPOCABAL		$ 46.962.258,00
DESEMBOLSO NETO N°2 MUNICIPIO		$ 105.070.563,00
DESCUENTO TASA PRODEPORTE N°1		$ 2.694.117,00
DESEMBOLSO N°2 EMPOCABAL		$ 46.962.258,00
SALDO POR TRASNFERIR MUNICIPIO		$ 143.686.240,00
SALDO POR TRASNFERIR EMPOCABAL		$ 62.616.344,00

SUMAS IGUALES	**$ 515.756.460,00**	**$ 515.756.460,00**

INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

Contrato de Interventoría N°:	005-2025
Contratista:	JONNATHAN GUTIÉRREZ JURADO
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO EN EL COLECTOR LA ITALIA SECTOR PALMAR EN LA ELIMINACION DE 4 PUNTOS DE VERTIMIENTO SEGÚN PSMV 2023-2032 DE ACUERDO A LA RESOLUCION N°1667 DEL 02 DE JUNIO 2023 Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE VERTIMIENTOS DOMÉSTICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E., EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL– DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Valor Contrato:	$ 78.896.440
Anticipo (30%):	N/A
Adición(es):	N/A
Valor Total Contrato:	$ 78.896.440
Plazo:	Dos (2) Meses
Prórroga(s):	Cuarenta y Tres (43) días calendario
Plazo Total:	Dos (2) meses
Suspensión(es):	03 de febrero de 2026
Reinicio(s):	N/A
Fecha de Iniciación:	15 de diciembre de 2025
Fecha de Terminación:	12 de febrero de 2026
Supervisor:	Arq. María Yuliana Giraldo Echeverry

Contrato de Obra N°:	004-2025
Contratista:	F&F INGENIERIA SRC S.A.S
Objeto:	"CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE VERTIMIENTOS DOMESTICOS PARA LAS AREAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y


	AREAS COMUNES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.E.I.C.E."
Valor Contrato:	$ 80.351.344
Anticipo (30%):	$ 24.105.403,20
Adición(es):	N/A
Valor Total Contrato:	$ 80.351.344
Plazo:	Un (1) mes
Prórroga(s):	Trece (13) días calendario
Plazo Total:	Un (1) mes
Suspensión(es):	07 de enero de 2026
Reinicio(s):	N/A
Fecha de Iniciación:	15 de diciembre de 2025
Fecha de Terminación:	13 de Enero de 2026
Interventor:	Ing. Jonnathan Gutiérrez Jurado
Supervisor:	Arq. María Yuliana Giraldo Echeverry

Contrato de Obra N°:	005-2025
Contratista:	CARLOS GERMAN LOAIZA GARCIA
Objeto:	"CONSTRUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 4 PUNTOS DE VERTIMIENTO SEGÚN PSVM 2.023 - 2.032 DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN No 1667 DEL 02 DE JUNIO DE 2.023 DE UN TRAMO DEL COLECTOR PARALELO A LA QUEBRADA ITALIA, BARRIO EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"
Valor Contrato:	$ 355.535.805
Anticipo (30%):	$ 106.660.741,50
Adición(es):	N/A
Valor Total Contrato:	$ 355.535.805
Plazo:	Dos (2) meses
Prórroga(s):	Cuarenta y Tres (43) días calendario
Plazo Total:	Dos (2) meses
Suspensión(es):	03 de febrero de 2026
Reinicio(s):	N/A
Fecha de Iniciación:	15 de diciembre de 2025
Fecha de Terminación:	12 de febrero de 2026
Interventor:	Ing. Jonnathan Gutiérrez Jurado
Supervisor:	Arq. María Yuliana Giraldo Echeverry


INFORME DE EJECUCION

Nº CONTRATO	OBJETO	$ AVANCE CONTRATO	% AVANCE CONTRATO	% AVANCE CONVENIO
CO 004-2025	"CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE VERTIMIENTO DOMESTICO PARA LAS AREAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y AREAS COMUNES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P – E.I.C.E"	$ 54.591.073,39	67,89%	10,58%
DE OBRA N°005-2025	"CONSTRUCCIÓN Y ELIMINACIÓN DE 4 PUNTOS DE VERTIMIENTO SEGÚN PSVM 2.023 - 2.032 DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN No 1667 DEL 02 DE JUNIO DE 2.023 DE UN TRAMO DEL COLECTOR PARALELO A LA QUEBRADA ITALIA, BARRIO EL PALMAR DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, DEPARTAMENTO DE RISARALDA"	$ 252.933.032,95	70,98%	49,04%
DE INTERVENTORIA N°005-2025	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UN TRAMO EN EL COLECTOR LA ITALIA SECTOR PALMAR EN LA ELIMINACION DE 4 PUNTOS DE VERTIMIENTO SEGÚN PSMV 2023-2032 DE ACUERDO A LA RESOLUCION N°1667 DEL 02 DE JUNIO 2023 Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE VERTIMIENTOS DOMÉSTICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P. – E.I.C.E., EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL– DEPARTAMENTO DE RISARALDA	$ 57.852.656,38	73,23%	11,22%
		TOTAL, PORCENTAJE CONVENIO		**70,84%**
		VALOR EJECUTADO CONVENIO		**$ 365.376.762,72**

Contrato de obra N°004-2025

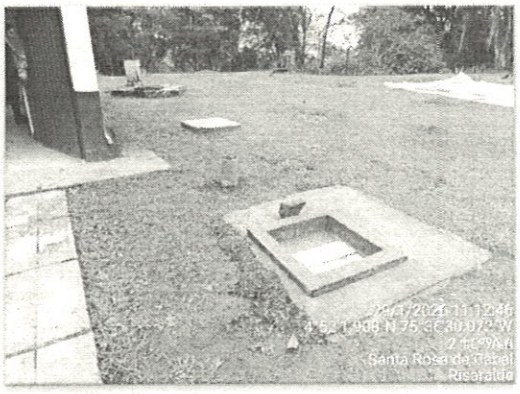
SISTEMA SEPTICO PLANTA DE TRATAMIENTO EMPOCABAL	
	
	
	


29/1/2026 11:16:33
4°52'2.304"N 75°36'29.13"W
2 ±C°ºÁ ñ
Santa Rosa de Cabal
Risaralda




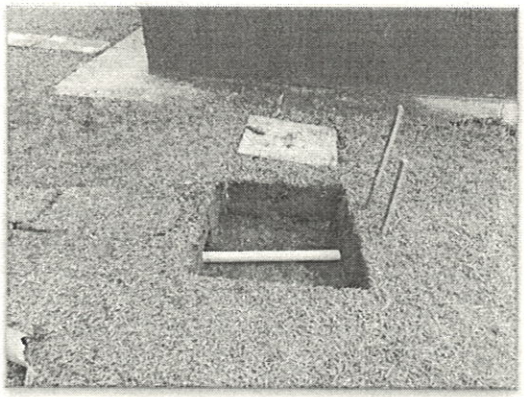








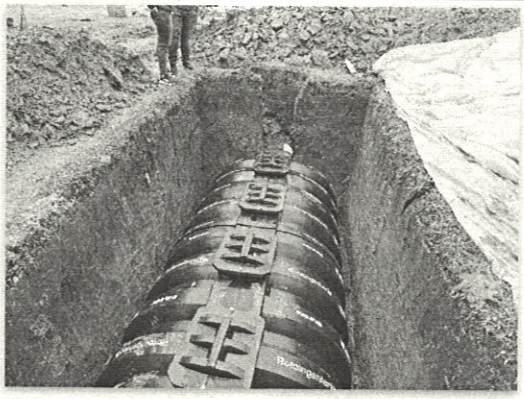


Contrato de obra N°005-2025

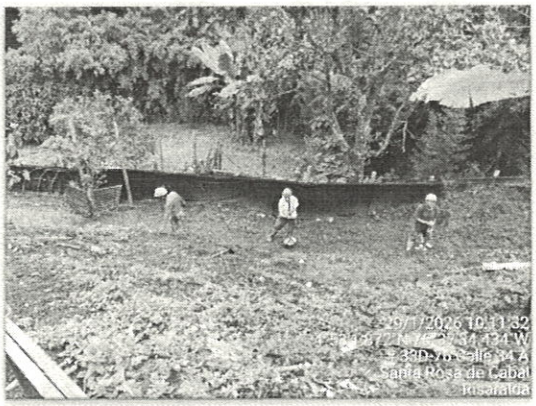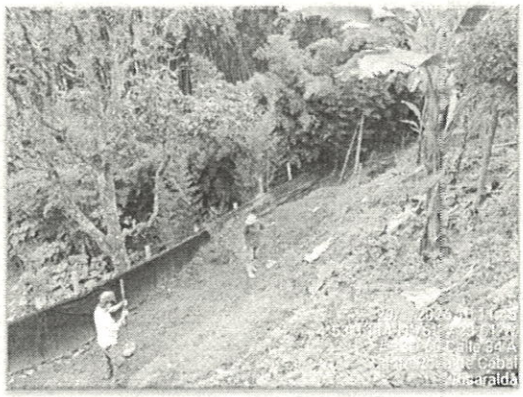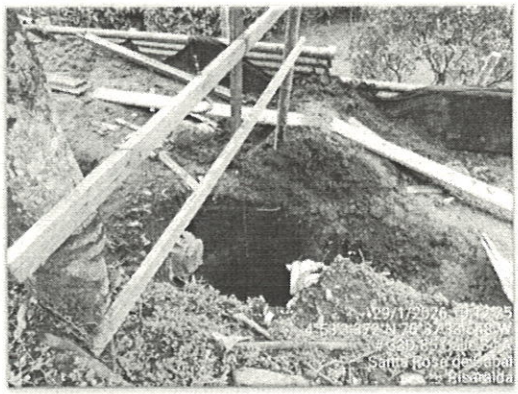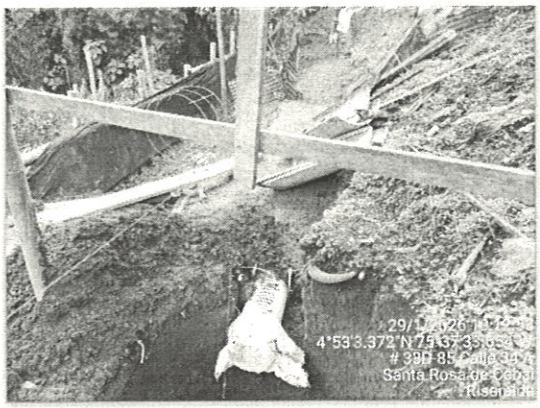COLECTOR DEL PALMAR	
	
	
	

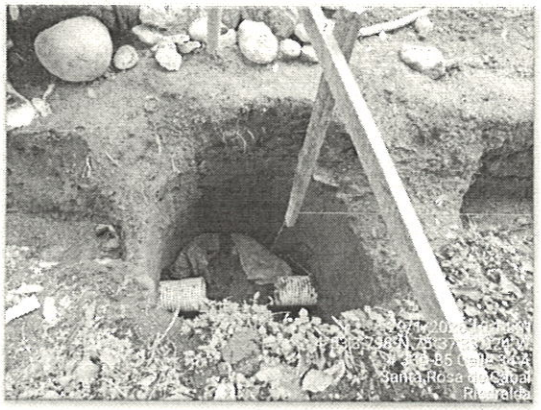

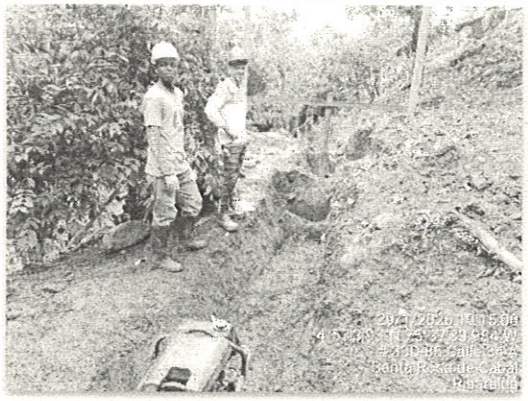

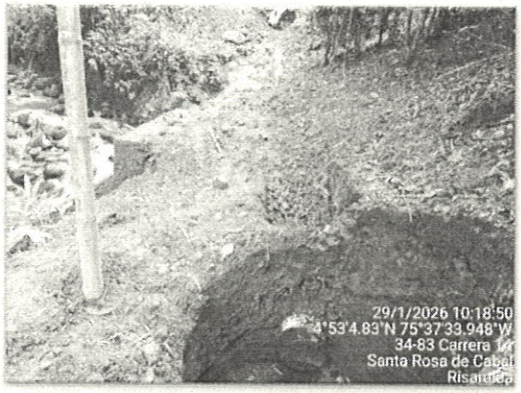



MARÍA YULIANA GIRALDO ECHEVERRY
Directora Acueducto y Alcantarillado
EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.

Proyectó:
Jeison Andres Asorilla Lopez
Contratista Dirección de Acueducto y Alcantarillado

