
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**1**	**Localización y replanteo**		**UND:**	**m2**

Registro fotográfico

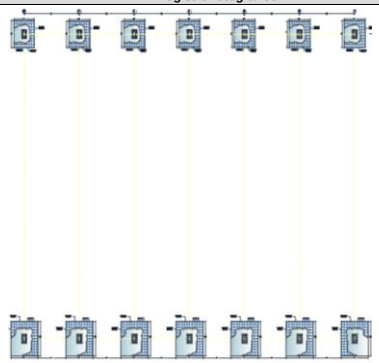

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
Cimentación Eje B	34,1	3,00			1,00	m2	102,30
Cimentación Eje A	34,1	3,00			1,00	m2	102,30
Muro de conteción graderia	29,5	1,3			1,00	m2	38,35
Graderia	29,0	5,10			1,00	m2	147,90
Cesped sintetico	30	19			1,00	m2	570,00
Rampa de acceso	15	1,3			1,00	m2	19,50

NOTA:

TOTAL **980,35**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**2**	**Demolición losa de concreto existente**		**UND:**	**m2**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
Para nivelación y adecuación de placa	8	3	0,10		1,00	m2	24,00
Zapata eje B7	1,5	1,5	0,10		4,00	m2	9,00
Zapata eje B2	1,5	1,2	0,10		4	m3	7,20
Losa escaleras existentes eje B3	2,5	1,2	0,10		1,00	m4	3,00

NOTA:

TOTAL **43,20**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**3**	**Excavación a maquina en material común**		**UND:**	**m3**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA			

NOTA:

TOTAL **0,00**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**4**	**Excavación a mano**	**UND:**	**m3**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
Zapatas A1 y A7	2,40	2,00	1,40		2,00	m3	13,44
Zapatas A2, A3, A4, A5 y A6	2,30	2,00	1,40		5,00	m3	32,20
Zapata B1	3,00	2,60	3,05		1,00	m3	23,79
Zapata B2	3,00	2,60	2,73		1,00	m3	21,26
Zapata B3	2,50	2,60	2,90		1,00	m3	18,85
	0,50	2,60	0,65		1,00	m3	0,85
Zapata B4, B5, B6 y B7	3,00	2,60	1,25		4,00	m3	39,00
Muro contención - graderías							
pantalla, puntera y mejoramiento	29,5	1	1,30		1,00	m3	38,35
Tacón	29,5	0,25	0,40		1,00	m3	2,95
Talón y mejoramiento	29,5	0,4	0,50		1,00	m3	5,90
Excavación para tuberia aguas lluvias	96,28	0,4	0,50		1,00	m3	19,26
Excavaciòn para cajas de inspecciòn	0,80	0,8	0,80		5,00	m3	2,56
Corte de talud y conformación de gradas							248,01
EJE A - FILTRO (ENCONTRADO EN SITIO)	30,50	0,50	0,60		1,00	m3	9,15

NOTA:

TOTAL **475,55**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**5**	**Desalojo de sobrantes**	**UND:**	**m3**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	fac exp			

NOTA:

TOTAL **0,00**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**6**	**Recebo para base y estructuras**	**UND:**	**m3**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
Mejoramiento de suelo ZAPATA B1	3	2,60	0,50		1,00	M3	3,90

NOTA:

TOTAL **3,90**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**7**	**Solado en concreto de limpieza E=0,05 m**		**UND:**	**m2**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
Zapatas A1 y A7	2,40	2,00	0,05		2,00	m3	9,60
Zapatas A2, A3, A4, A5 y A6	2,30	2,00	0,05		5,00	m3	23,00
Zapatas B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7	3,00	2,60	0,05		7,00	m3	54,60
Muro contención graderías - limpieza y mejoramiento	30,5	1	0,10		2,00	m3	61,00
NOTA:							
						TOTAL	**148,20**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**8**	**Concreto 3000 PSI para zapatas**		**UND:**	**m3**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
Zapatas A1 y A7	2,40	2,00	0,45		2,00	m3	4,32
Zapatas A2, A3, A4, A5 y A6	2,30	2,00	0,45		5,00	m3	10,35
Zapatas B1 y B7	3,00	2,60	0,65		2,00	m3	10,14
Zapatas B2, B3, B4, B5 y B6	3,00	2,60	0,60		5,00	m3	23,40
Para muro de contención gradas							
Puntera y tálon	30,50	1,25	0,25		1,00	m3	9,53
Tacón	30,50	0,25	0,40		1,00	m3	3,05
NOTA:							
						TOTAL	**60,79**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**9**	**Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI**		**UND:**	**m3**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
En Eje B entre ejes 1, 2 y 3	4,75	0,40	0,50		2,00	m3	1,90
NOTA:							
						TOTAL	**1,90**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**11**	**Pedestales y columnas en concreto de 3000 PSI**	**UND:** **m3**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7	0,80	0,50	1,00		7,00	m3	2,80
Pedestal B1, B2 y B3	0,80	0,50	5,65		3,00	m3	6,78
Pedestal B4, B5, B6 y B7	0,80	0,50	3,65		4,00	m3	5,84
Pantalla muro de contención - graderia	30,50	0,15	1,20		1,00	m3	5,49
	30,50	0,10	1,20		0,50	m3	1,83

NOTA:

TOTAL **22,74**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**12**	**Acero de refuerzo 60000**	**UND:** **kg**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	TIPO R	PESO NO	N° BARRA			
Zapatas A1 y A7 - parrilla superior e inferior	2,70	N° 5	1,55	18,00	2,00	kg	150,85
	2,00	N° 5	1,55	20,00	2,00	kg	124,16
Zapatas A2, A3, A4, A5 y A6 - parrilla superior e inferior	2,70	N° 5	1,55	18,00	5,00	kg	377,14
	2,00	N° 5	1,55	20,00	5,00	kg	310,40
Zapatas B1, B2, B3, B4, B5, B6 y B7 - parrilla superior e inferic	3,00	N° 6	2,24	22,00	7,00	kg	1032,57
	3,00	N° 6	2,24	26,00	7,00	kg	1220,31
Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7 - Ref vertical	1,85	N° 6	2,24	4,00	7,00	kg	115,77
	1,85	N° 5	1,55	16,00	7,00	kg	321,57
Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7 - Estribo principal	2,40	N° 3	0,56	14,00	7,00	kg	131,71
Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7 - Estribo auxiliar 1	2,00	N° 3	0,56	14,00	7,00	kg	109,76
Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7 - Estribo auxiliar 2	1,50	N° 3	0,56	14,00	7,00	kg	82,32
Pedestal A1, A2, A3, A4, A5, A6 y A7 - gancho	0,60	N° 3	0,56	28,00	7,00	kg	65,86
Pedestal B1, B2 y B3 - Ref vertical	6,70	N° 6	2,24	4,00	3,00	kg	179,69
	6,70	N° 5	1,55	16,00	3,00	kg	499,12
Pedestal B1, B2 y B3 - Estribo principal	2,40	N° 3	0,56	63,00	3,00	kg	254,02
Pedestal B1, B2 y B3 - Estribo auxiliar 1	2,00	N° 3	0,56	63,00	3,00	kg	211,68
Pedestal B1, B2 y B3 - Estribo auxiliar 2	1,50	N° 3	0,56	63,00	3,00	kg	158,76
Pedestal B1, B2 y B3 - gancho	0,60	N° 3	0,56	126,00	3,00	kg	127,01
Pedestal B4, B5, B6 y B7 - Ref vertical	4,65	N° 6	2,24	4,00	4,00	kg	166,28
	4,65	N° 5	1,55	16,00	4,00	kg	461,88
Pedestal B1, B2 y B3 - Estribo principal	2,40	N° 3	0,56	42,00	4,00	kg	225,79
Pedestal B1, B2 y B3 - Estribo auxiliar 1	2,00	N° 3	0,56	42,00	4,00	kg	188,16
Pedestal B1, B2 y B3 - Estribo auxiliar 2	1,50	N° 3	0,56	42,00	4,00	kg	141,12
Pedestal B1, B2 y B3 - gancho	0,60	N° 3	0,56	84,00	4,00	kg	112,90
Viga de cimentación							
Longitudinal	9,00	N° 6	2,24	6,00	1,00	kg	120,69
	3,60	N° 6	2,24	6,00	1,00	kg	48,28
Estribo principal	1,60	N° 3	0,56	71,00	1,00	kg	63,62
Gancho Auxiliar	0,60	N° 3	0,56	71,00	1,00	kg	23,86
Muro de contención graderia - despiese por tramo de 6mt							
Talon y puntera Ref longitudinal parrilla superior e inferior	6,00	N° 4	0,99	12,00	5,00	kg	357,84
Talon y puntera Ref transversal parrilla superior e inferior	1,45	N° 3	0,56	48,00	5,00	kg	194,88
Pantalla y tacón Ref longitudinal cara exterior e interior	6,00	N° 3	0,56	14,00	5,00	kg	235,20
	6,00	N° 4	0,99	2,00	5,00	kg	59,64
Pantalla y tacón Ref vertical cara interior	2,30	N° 4	0,99	40,00	5,00	kg	457,24
Barras de transferencia - acero liso	0,40	N° 8	3,97	2,00	4,00	kg	12,71

NOTA:

TOTAL **8342,79**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		
ITEM N°:	**13**	**Placa en concreto E= 8 cm en concreto de 3000 PSI para losa de graderia**	**UND: m2**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)


LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO				
Placa de circulación - Nivel + 1.00 de cancha	29,50	1,35			1,00	m2	39,83
Huellas	29,00	0,70			2,00	m2	40,60
Contra huella	29,00	0,40			2,00	m2	23,20
Rampa de acceso	15,00	1,30			1,00	m2	19,50
NOTA:							
						TOTAL	**123,13**


DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**15**	**Estructura metálica columnas y cerchas, incluye perfilería, templetes, riostras**	**UND: kg**

Registro fotográfico





Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg			
ESTRUC RED 4" x 6mm - columnas cara externa eje A y B	56,28			16,0	1,00	kg	900,48
ESTRUC RED 4" x 6mm - columnas cara interna eje A y B	76,86			16,0	1,00	kg	1229,76
ESTRUC RED 4" X 6mm - inicio cordon inferior a los 2 lados (4 secciones)	56,00			16,0	1,00	kg	896,00
ESTRUC RED 4" x 3mm - celocias de columnas	101,50			7,3	1,00	kg	740,95
ESTRUC RED 4" x 3mm - viga transversal	157,50			7,3	1,00	kg	1149,75
ESTRUC RED 4" x 3mm - cordon inferior	140,00			7,3	1,00	kg	1022,00
ESTRUC RED 2 1/2" x 3mm - cordon superior	208,88			4,5	1,00	kg	935,78
ESTRUC RED 1 1/2" x 3mm - diagonales entre cord sup y cord inferior	280,28			4,1	1,00	kg	1135,13
ESTRUC RED 1 1/2" x 3mm - verticales entre cord sup y cord inferior	203,00			4,1	1,00	kg	822,15
Varilla redonda lisa 5/8" - para cortavientos entre cerchas	5,48			1,6	112,00	kg	952,21
Varilla redonda lisa 5/8" - crucetas entre colúmnas	6,46			1,6	16,00	kg	160,41
Conexiones contravientos - Angulo L 2 1/2" x 1/4"	0,10			6,2	256,00	kg	157,95
Perfil C - 160x60x15x2,5mm	32,90			6,0	30,00	kg	5922,00
Porta correa - ángulo L 2"x3/16"	0,16			3,6	210,00	kg	121,97
Templetes de correas - ángulo L 1.1/2 x 3/16"	1,00			2,7	174,00	kg	466,32
Conexión templertes - angulo L 2"x3/16"	0,12			3,6	348,00	kg	151,59
Pernos de anclaje ø = 3/4"	0,70			2,2	112	kg	175,22
Platinas base espesor 3/4"	0,70	0,40	0,02	7850,0	14,00	kg	586,21
Viga IPE 160 - cortante	0,30			15,8	14,00	kg	66,36
Rigidizador 83x100x10mm	0,10	0,01	0,10	7850,0	112,00	kg	87,92
NOTA:							
						TOTAL	**17680,17**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**16**	**Cubierta para polideportivo en teja sin trasplapo tipo standing seam calibre 24, ancho de bandeja = 50cm, y altura 1 1/2" con set de fijacion completo propio de la marca de la teja**	**UND: m2**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg			
CUBIERTA CURVA	32,90	30,20			1,00	m2	993,58
							0,00
							0,00
							0,00
NOTA:							
						TOTAL	**993,58**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**18**	**Canal en lamina galvanizada calibre 20**		**UND:**	**ml**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg			
Eje 1	33,00					ml	0,00
Eje 2	33,00					ml	0,00

NOTA:

TOTAL **0,00**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**19**	**Bajante aguas lluvias en tuberia sanitaria 4" incluye accesorios**		**UND:**	**ml**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg			
Eje A			4,57			ml	0,00
Eje B			8,00			ml	0,00

NOTA:

TOTAL **0,00**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**20**	**Tuberia aguas lluvias 6" incluye accesorios**		**UND:**	**ml**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg			
EJE A	31,69				1,00		31,69
Eje 1	27,34				1,00		27,34
Eje B	31,25				1,00		31,25
Descole	6,00				1,00		6,00

NOTA:

TOTAL **96,28**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**21**	**Cajilla de inspección 0,6*0,6**	**UND:** **und**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg			
EJE A 1					2,00	UND	2,00
EJE A 7					1,00	UND	1,00
EJE B 1					1,00	UND	1,00
EJE B 7					1,00	UND	1,00

NOTA:

TOTAL **5,00**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**22**	**Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, de tercera generación, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho**	**UND:** **m2**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg			
	29,50	19,50			1,00	m2	575,25
	3,50	1,00			2,00	m2	7,00

NOTA:

TOTAL **582,25**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**24**	**Ajustes a los estudios y diseños para la adecuacion de la cubierta, graderias y unidad sanitaria del polideportivo sector comercio y servicios, el cual incluye: Levantamiento Topográfico planimétrico y altimétrico, Estudio de**	**UND:** **und**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg			
					1,00	und	1,00

NOTA:

TOTAL **1,00**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**25**	**Implementación del Plan de Manejo Ambiental Nota: PARA ESTE ÍTEM NO APLICA AU.**	**UND:**	**und**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg			
					1,00	und	1,00

NOTA:

TOTAL **1,00**

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO CONSTRUCCIONES
SENA REGIONAL NARIÑO

CONTRATO N°:	**CO1.PCCNTR.8397539-2025**	**OBJETO:**	Contratar las adecuaciones del polideportivo, que incluye cubierta, graderías y camerinos, ubicado en el sector comprendido entre los ambientes de formación de Agroindustria y Comercio y Servicios del Centro Internacional de Producción Limpia Lope – SENA Regional Nariño.
SUPERVISOR:	**Jhon Eduardo Sierra Chavez - Técnico G03 Infraestructura y Logística**		

ITEM N°:	**INP 01**	**Relleno compactado mecanicamente con material de sitio proveniente de excavación**	**UND:**	**m3**

Registro fotográfico

Mantenimiento Complejo regional SENA, Pasto (Nariño)

LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANTIDAD	UNIDAD	MEDIDA TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	kg			
Sobre zapatas							
Zapatas A1 y A7	2,40	2,00	1,05		2,00	m3	10,08
Zapatas A2, A3, A4, A5 y A6	2,30	2,00	1,05		5,00	m3	24,15
menos volumen de pedestal	0,80	0,50	1,00		-7,00	m3	-2,80
Zapatas B1, B2 y B3	3,00	2,60	2,75		3,00	m3	64,35
menos pedestales B1, B2 y B3	0,80	0,50	2,75		-3,00	m3	-3,30
Zapatas B4, B5, B6 y B7	3,00	2,60	0,65		4,00	m3	20,28
menos pedestales B4, B5, B6 y B7	0,80	0,50	0,65		-4,00	m3	-1,04
Para muro de conteción graderias							
Area de puntera	30,50	0,60	1,20		1,00	m3	21,96
Area de talón	30,50	0,40	0,20		1,00	m3	2,44
Adecuación cancha (acentamiento)	15,00	5,00	0,15		1,00	m3	11,25
EJE A - FILTRO (ENCONTRADO EN SITIO)	30,50	0,50	0,60		1,00	m3	9,15

TOTAL **156,52**

Presento:

FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Aprobo:

ING. VICTOR ENRIQUE ERAZO MENDOZA
INTERVENTORIA DE OBRA
