
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración
1		**CONSTRUCCIÓN CUBIERTA POLIDEPORTIVO - GRAERIAS E INST GRAMA SINTETICA**	**94,67 días**
2		**PREELIMINARES (RETIROS DE PLACAS EXISTENTES)**	**36,33 días**
3		Localización y replanteo	1 día
4		Demolición losa de concreto existente	3 días
5		**EXCAVACIONES**	**18,67 días**
6		Excavación a maquina en material común	2 días
7		Excavación a mano	16 días
8		**DESALOJAMIENTO**	**5 días**
9		Desalojo de sobrantes	5 días
10		**CIMENTACION**	**25,67 días**
11		Relleno compactado mecanicamente con material de sitio proveniente de excavación	8 días
12		Solado en concreto de limpieza E=0,05 m	4 días
13		Concreto 3000 PSI para zapatas	4 días
14		Vigas de cimentación en concreto de 3000 PSI	2 días
15		Pedestales y columnas en concreto de 3000 PSI	6 días
16		**ARMADO DE ACERO**	**20 días**
17		Acero de refuerzo 60000	20 días
18		**ELEMENTOS EN CONCRETO DE GRADERIA**	**6 días**
19		Placa en concreto E= 8 cm en concreto de 3000 PSI para losa de graderia	6 días
20		**ESTRUCTURA METALICA**	**60 días**
21		Estructura metálica columnas y cerchas, incluye perfilería, templetes, riostras	60 días
22		**CUBIERTA E INSTALACIONES DE LA MISMA**	**7 días**
23		Cubierta para polideportivo en teja sin trasplapo tipo standing seam calibre 24, ancho de bandeja = 50cm, y altura 1 1/2" con set de fijacion completo propio de la marca de la teja	7 días
24		Canal en lamina galvanizada calibre 20	2 días
25		Bajante aguas lluvias en tuberia sanitaria 4" incluye accesorios	2 días
26		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**5 días**
27		Tuberia aguas lluvias 6" incluye accesorios	2 días
28		Cajilla de inspección 0,6*0,6	5 días
29		**CAMPO DE JUEGO**	**9 días**
30		Grama sintética en fibra artificial de polietileno fibrilado, de tercera generación, incluye un riego con arena de sílice y grano de caucho	9 días
31		**MANEJO AMBIENTAL**	**93 días**
32		Implementación del Plan de Manejo Ambiental	93 días



Proyecto: Programacion Marzo
Fecha: jue 26/02/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ
R.L TRANSFORMAR INGENIEROS SAS

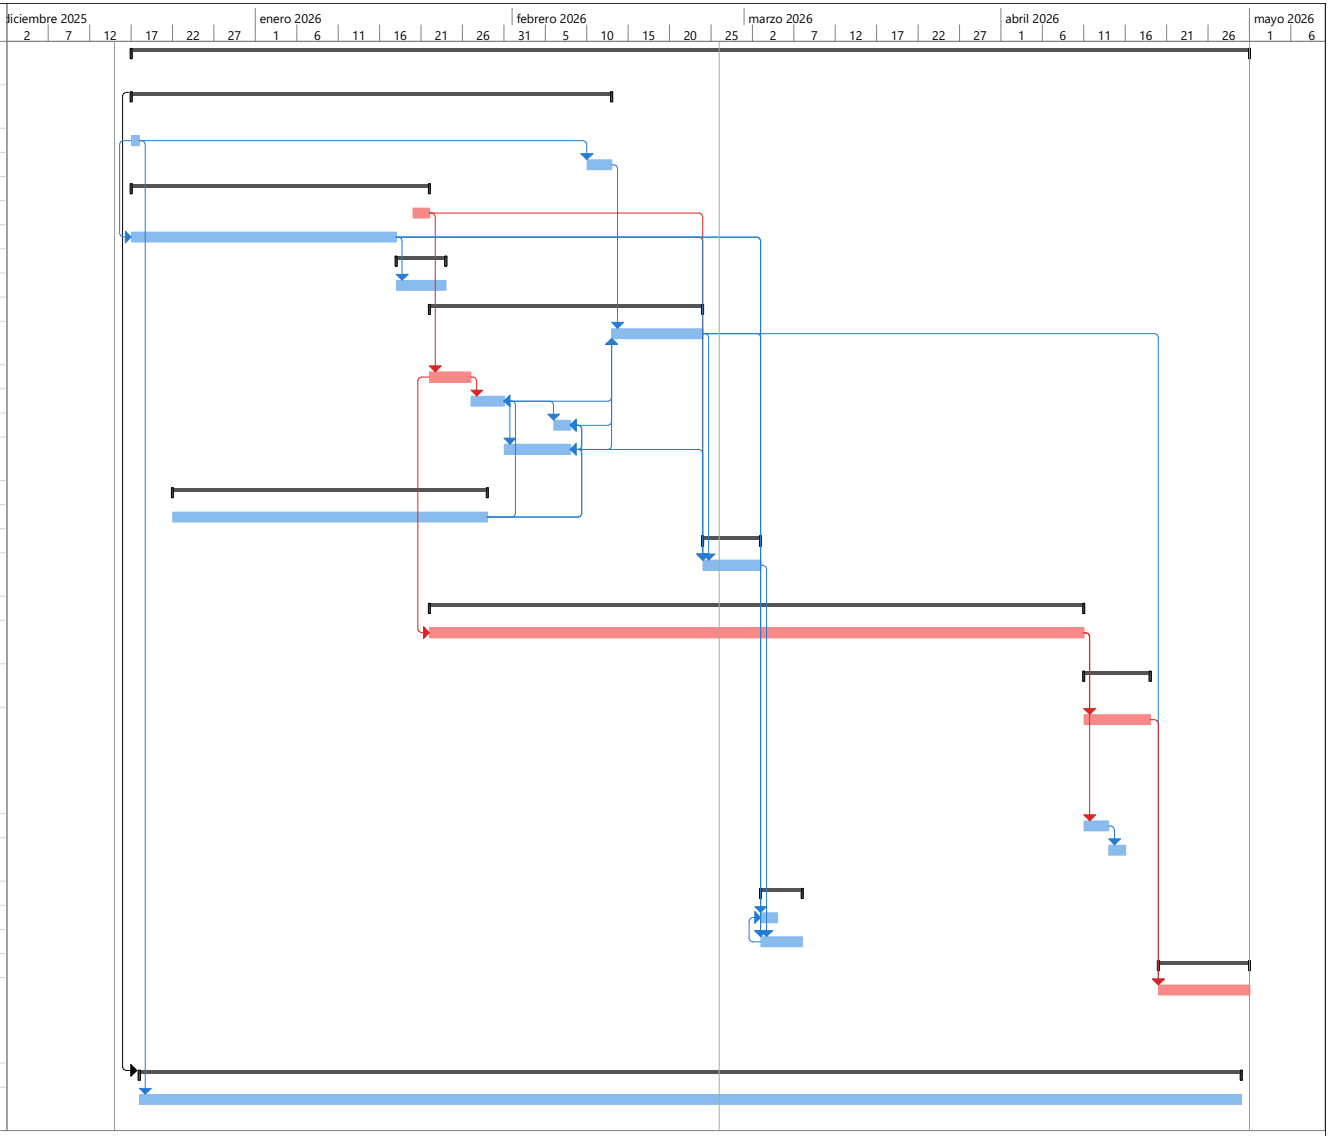

Proyecto: Programacion Marzo
Fecha: jue 26/02/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	

FRANCISCO JAVIER VIVEROS PAZ
R.L TRANSFORMAR INGENIEROS SAS
