DESCRIPCION GENERAL			
ACTA No.	43		
CIUDAD Y FECHA	SAN JUAN DE PASTO, 30 DE ENERO DE 2026		
HORA INICIO	3:00 PM	**HORA FIN**	04:30 PM
LUGAR	AUDITORIO CEDENAR S.A. E.S.P.		
TEMA	CIERRE PROYECTO FAER GGC-1206-2023 Y ANALISIS DE FACTORES DE FUERZA MAYOR		

ASISTENTES E INVITADOS

Las firmas de los asistentes a la presente reunión se adjuntan al presente documento en formato escaneado, las cuales hacen parte integral de la presente acta para todos los efectos administrativos y contractuales.

ORDEN DEL DÍA

1. Estado general del proyecto FAER GGC-1206-2023.
2. Presentación del avance físico consolidado.
3. Exposición de los contratistas sobre factores de retraso ocurridos en diciembre de 2025 y enero de 2026.
4. Identificación de actividades pendientes de cierre técnico, administrativo y operativo.
5. Impacto de los factores de fuerza mayor en la terminación y cierre del proyecto.
6. Definición de acciones y compromisos condicionados a la normalización de condiciones.
7. Observaciones finales y cierre de la reunión

DESARROLLO

Contexto general del proyecto

En el marco de las obligaciones contractuales derivadas del convenio FAER GGC-1206-2023, y de conformidad con las funciones de seguimiento y control establecidas para la interventoría, se llevó a cabo reunión presencial con el fin de revisar el estado actual del proyecto, particularmente en lo relacionado con su fase de cierre.

La presente reunión se convocó con el propósito de evaluar el estado general de ejecución, identificación de las actividades pendientes de cierre y la presentación por parte de los contratistas de obra, de las situaciones presentadas durante los meses recientes que han incidido en la terminación oportuna del proyecto.

DESARROLLO

Estado de avance físico del proyecto

Durante la reunión se presentó el estado general de ejecución del proyecto FAER GGC-1206-2023, indicando que, a la fecha de la misma, el proyecto alcanza un avance físico global del 85,8 %, lo cual evidenciaba la ejecución mayoritaria de las actividades constructivas previstas en el alcance contractual. Se dejó constancia de que las obras civiles y eléctricas principales asociadas a la construcción de la infraestructura de distribución se encontraban ejecutadas en su mayor parte, reflejando el cumplimiento significativo de los objetivos técnicos del proyecto.

Así mismo, se informó que aún se encontraban pendientes actividades propias de la fase de cierre técnico, administrativo y operativo, las cuales hacen parte de la ruta crítica para la finalización del convenio, dentro de las que se destacan, entre otras:

- Cargue y validación de formatos SPARD.
- Codificación definitiva de los activos.
- Matriculación de usuarios beneficiarios.
- Ejecución de pruebas técnicas finales.
- Elaboración y suscripción de actas de entrega.
- Energización definitiva de las obras ejecutadas.
- Liquidación final de los contratos de obra.

Se aclaró que dichas actividades se encuentran interrelacionadas entre sí, de tal forma que la no culminación de alguna de ellas impide el cierre integral de cada uno de los contratos asociados y, en consecuencia, afecta directamente el cierre del convenio FAER GGC-1206-2023 en su conjunto, dado el carácter global y consolidado de sus etapas finales.

Exposición y valoración del impacto de los factores de retraso por fuerza mayor

Durante la reunión, los contratistas expusieron las situaciones presentadas durante los meses recientes, especialmente de diciembre de 2025 y enero de 2026, las cuales incidieron de manera directa en el desarrollo normal de las actividades pendientes de cierre del proyecto FAER GGC-1206-2023.

Se dejó constancia de que dichas situaciones correspondieron a eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito, ajenos a la voluntad de las partes, que generaron afectaciones significativas en la movilidad, el acceso a las zonas de intervención y las condiciones de seguridad requeridas para la ejecución de las actividades incluidas en la ruta crítica de cierre del convenio.

Como resultado de lo anterior, se evidenció que la ocurrencia de dichos eventos imposibilitó la ejecución continua y coordinada de actividades técnicas, administrativas y operativas tales como la legalización de activos, la matriculación de usuarios, la ejecución de pruebas finales, la elaboración de actas de entrega y la energización definitiva de las obras, afectando directamente el cierre integral de los contratos asociados.

DESARROLLO

En este sentido, se concluyó que las dificultades presentadas durante el periodo mencionado no obedecieron a retrasos imputables a la ejecución contractual ordinaria, sino a circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles, que impactaron de manera directa el cumplimiento de los plazos previstos para la finalización del proyecto.

A continuación, se relacionan de manera enunciativa los principales eventos reportados por los contratistas, que incidieron en el desarrollo del proyecto durante el periodo señalado:

- Conflicto armado, enfrentamientos y condiciones adversas de orden público
- Intensas precipitaciones y derrumbos en vías
- Bloqueos de vías por protestas sociales

Evaluación del estado temporal del convenio y solicitudes de prórroga

En el desarrollo de la reunión se realizó la revisión del estado temporal del convenio FAER GGC-1206-2023, con énfasis en la Etapa 2 – Actividades de Construcción y Suministro de Obra, dentro de la cual se encuentra contemplada la Actividad 8: Acta de recibo de obras, cuyo plazo de ejecución se encuentra establecido hasta el 07 de marzo de 2026.

A partir del análisis del avance físico alcanzado, de las actividades pendientes de cierre que hacen parte de la ruta crítica del convenio y de los factores de fuerza mayor expuestos y valorados en el punto anterior, se evaluó el tiempo requerido para la culminación integral de dichas actividades, una vez se restablezcan las condiciones normales de acceso, movilidad y seguridad.

Como resultado de esta evaluación, los contratistas manifestaron que se identifica como necesario un plazo adicional estimado de ciento cincuenta (150) días, con el fin de permitir la ejecución completa y ordenada de las actividades de cierre técnico, administrativo y operativo del proyecto, incluyendo la legalización de activos, la matriculación de usuarios, las pruebas finales, la entrega formal y la energización definitiva.

En consecuencia, los contratistas solicitaron que se evalúe la procedencia de una prórroga del convenio por el término señalado, dejando constancia de que dicha ampliación se fundamenta en la ocurrencia de eventos de fuerza mayor y en la afectación directa de la ruta crítica del cierre.

Finalmente, se dejó constancia de que la situación expuesta y la solicitud de prórroga deberán ser puestas en conocimiento de la entidad competente, con el fin de que se realice la evaluación correspondiente ante el Ministerio de Minas y Energía, de conformidad con los procedimientos y competencias establecidos en el marco del convenio FAER.

Conclusiones y cierre de la reunión

Como conclusión de la reunión, se dejó constancia de que el proyecto FAER GGC-1206-2023 presenta un avance físico global del 85,8 %, con las principales actividades constructivas ejecutadas para la mayoría de contratos de obra, encontrándose actualmente en fase de cierre técnico, administrativo y operativo.

DESARROLLO
Así mismo, se concluyó que las actividades pendientes de cierre hacen parte de la ruta crítica del convenio, y que su no culminación dentro del plazo inicialmente previsto se encuentra directamente asociada a la ocurrencia de eventos de fuerza mayor presentados durante los meses recientes, los cuales afectaron de manera significativa las condiciones de acceso, movilidad y seguridad necesarias para su ejecución. En este sentido, se dejó constancia de la solicitud elevada por los contratistas para la evaluación de una prórroga del convenio por un término estimado de ciento cincuenta (150) días, la cual deberá ser analizada por la instancia competente, conforme a los procedimientos establecidos y previa comunicación al Ministerio de Minas y Energía. Finalmente, se dejó constancia de que los compromisos anteriormente relacionados, en el marco de las competencias de cada una de las partes, y serán objeto de seguimiento conforme a los mecanismos y espacios definidos dentro del convenio FAER GGC-1206-2023.

COMPROMISOS U OBSERVACIONES		
DESCRIPCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA LÍMITE**
Remitir a la Interventoría la relación consolidada de eventos de fuerza mayor ocurridos durante los meses de diciembre y enero, con sus respectivos soportes.	Contratistas de obra	02/02/2026
Consolidar y remitir a la supervisión del convenio el informe Acta de Cronograma y Acta de la reunión, con el análisis del estado del proyecto y la solicitud de evaluación de prórroga.	Interventoría	04/02/2026
Elevar ante la instancia competente la información relacionada con la solicitud de prórroga del convenio FAER GGC-1206-2023, para su evaluación conforme a los procedimientos establecidos.	Oficina Transición Energética	07/02/2026
Continuar con el avance de las actividades de cierre que sea posible ejecutar, una vez se cuente con condiciones de acceso, movilidad y seguridad adecuadas.	Contratistas de obra	Sujeto a normalización de condiciones

Anexo: Lista de asistencia

607

CEDENAR	REGISTRO DE ASISTENCIA	Universidad Tecnológica de Pereira	Código: F-02 Versión: 01 FA: 01/11/2024

CONTRATO No.:	FAER GGC-1206-2023		
OBJETO:	Construccion redes MT-BT Roberto Payan Nariño		
CONTRATISTA:	36 Contratistas derivados Obra	**INTERVENTORIA:**	UTP
MUNICIPIO:	Ruto	**FECHA:**	30- Enero - 2026
HORA DE INICIO:	3:00pm.	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	

SELECCIONE CON UNA X EL REGISTRO DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR Y/O LEGALIZAR

ACTA DE REUNIÓN: (X) **TÉCNICO:** ( ) **CALIDAD:** ( ) **AMBIENTAL:** ( ) **SST:** ( ) **GESTIÓN SOCIAL:** ( ) **OTRO:** ( )

NOMBRE ACTIVIDAD: Revision estado proyecto y contratos derivados

TEMAS TRATADOS:

Revisión estado actual del proyecto y revisión actividades pendientes para valorar el curso contractual ajustado a la vigencia del convenio FAER GGC-1206-2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

No.	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Fabio Giovanni Monchoguay	87065378	Ing. Residente Hee Ingeniería	
2	Henry España Q.	79625312	HEE Ingeniería SAS	
3	Juan Camilo Burgos Quintero	1004215002	Ing. Proyectos	Camilo Burgos
4	Brayan Alexander Charfuelan Erira	1053869176	Prof. Apoyo.	
5	JAIRO FERNANDO COJIGAS CORDOBA	12994 TG+	R-L	
6	Oscar Mauricio Arroyo	93299022	R. L.	
7	Wilmar Cabrera	1085258922	Ing. Residente	Wilmar Cabrera
8	Julio Cordoba Ramos	98216035	Dll Proyectos	
9	Sofia Acosta Corrales	36.751.250.	Profesional ISSE	Sofia Acosta
10	Bolivar Gomez Insuasti.	75065793	Prof Esp C.T	
11	Cristian Murillo Delgado	12.977.223	Jefe DCP	
12	Juan Carlos Rivera Gonzalez	5203805	Sub. G. Energetica (e)	
13	CESAR JAVIER CORDOBA B.	1081994450	ING. RES.	
14	Jose Luis Munoz Munoz	1088972299	Ing. R.L	
15	Jorge Luis Ortiz Hoyos	1088975752	Ing Res	
16	Mayerli Perez Rodriguez.	1.089.031.707.	Apoyo HSE Interventoria	
17	Juan Camilo Pantoja Zuñiga	1061.772.641	Interventoria UTP	
18	Jorge Luis Erazo A	1085274103	Apoyo UTP	
19				
20				

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

VARIABLE	B	R	M
DISPOSICIÓN DEL GRUPO			
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO			
PARTICIPACION DEL GRUPO			
ORDEN Y RESPETO			

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

- Elevar solicitud general al Ministerio relativa a la ampliación del plazo por 120 dias frente a los factores de retraso expuestos

NOMBRE RESPONSABLE:

CARGO RESPONSABLE: Apoyo UTP

FIRMA:

CEDENAR	REGISTRO DE ASISTENCIA	Universidad Tecnológica de Pereira	Código: F-02 Versión: 01 FA: 01/11/2024

CONTRATO No.:	FAER GGC-1206-2023		
OBJETO:	Construcion redes MT-BT Roberto Payan, Nariño		
CONTRATISTA:	36 contratistas derivados Obra	**INTERVENTORIA:**	UTP
MUNICIPIO:	Pasto	**FECHA:** 26-01-26	30 Enero 2026
HORA DE INICIO:	3:00 pm.	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	

SELECCIONE CON UNA X EL REGISTRO DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR Y/O LEGALIZAR

ACTA DE REUNIÓN: (X) **TÉCNICO:** ( ) **CALIDAD:** ( ) **AMBIENTAL:** ( ) **SST:** ( ) **GESTIÓN SOCIAL:** ( ) **OTRO:** ( )

NOMBRE ACTIVIDAD: Revisión estado Convenio y contratos derivados

TEMAS TRATADOS:

Revisión estado actual del proyecto y revision actividades pendientes para valorar el curso contractual ajustado a la vigencia del convenio FAER GGC-1206-2023

REGISTRO DE ASISTENCIA

No.	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	JAIRO ALBERTO MENESES	9558163	Gerente Renovatio	
2	Francisco Javier Rivera A.	98139058	R. L	
3	FAIVER ERICK GOMEZ	1087486081	Contratista T.E	
4	René Fernando -	1010206175	Contratistas.	
5	Daniel Alircio Palacios	1085317493	Contratista	
6	Manuela Alejandra Guaranguay Solarte	1143864867	Contratista	
7	David Canchala Obando	1085305307	Ing. Coordinador	
8	Andres Felipe Pazos Aguirre	1085272492	Ing Director proyectos	
9	Elmer Eduardo Paz Davila	98417430	J.R.L	
10	Johan Edgar Vallejo Chavez	1084847538	Coordinador Proyecto	
11	Sebastian Rosero M.	1.081.594.536	coordinador Proyecto	
12	Daniel Ramos Toro	1085316977	Residente Obras Electricas	
13	Yolanda Diaz Delgado	1082657127	SST	
14	Uriel Duarte	1124316325	Apoyo tecnico	
15	Jesus Hidalgo	12751169	R.L. UNIFORCE SAS	
16	Omar Eraso	10021637	R/L Diseños	
17	DIEGO ARDASSO B	7.160.984	R/L BONDUSTRO	
18	Carlos Andy Paz Velasco	1072365	SOA ENERGIA	
19	Bairon Ruano	1085330797	Omar F. Eraso	
20	Esteban Martinez Castro	1033815760	Rep legal - Prisecom	

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

VARIABLE	B	R	M
DISPOSICIÓN DEL GRUPO			
ADAPTABILIDAD AL CAMBIO			
PARTICIPACION DEL GRUPO			
ORDEN Y RESPETO			

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

- Elevar solicitud general al Ministerio relativa a la ampliación del plazo por 120 dias frente a los factores de retraso expuestos

NOMBRE RESPONSABLE:

CARGO RESPONSABLE: Apoyo UTP **FIRMA:**

CEDENAR Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	Universidad Tecnológica de Pereira	Código: FR-10
			Versión: 01
			Vigencia: 01/11/2024

CONTRATO No: FAER GGC - 1206 - 2023

OBJETO: Reunión presencial con contratistas de los proyectos FAER GGC-1206-2023 en Roberto Payan



DESCRIPCIÓN IMAGEN: Asistentes reunión presencial el día 30 de enero de 2026



DESCRIPCIÓN IMAGEN: Asistentes reunión presencial

ANEXO 3
REGISTRO INFORMATIVO

Soporte No. 1

Infobae: 3 de noviembre de 2025

https://www.infobae.com/colombia/2025/11/03/destruyeron-14-toneladas-de-explosivos-que-pertenecian-a-las-disidencias-del-ejercito-bolivariano/



infobae

COLOMBIA

Destruyeron 14 toneladas de explosivos que pertenecían a las disidencias del Ejército Bolivariano

Granadas, morteros caseros y minas antipersonal fueron inutilizados con la supervisión del Grupo Marte del Ejército Nacional y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA

Por Lina Muñoz Medina

03 Nov, 2025 06:47 p.m. CO

El Ejército Nacional y la Mapp-OEA destruyen 14 toneladas de explosivos entregados por la Cneb en Nariño, fortaleciendo el proceso de paz en Colombia - crédito Ejército Nacional

En Nariño, técnicos en antiexplosivos del Grupo Marte del Ejército Nacional de Colombia, acompañados por observadores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA), completaron la eliminación de 14 toneladas de explosivos que fueron entregados por las disidencias conocidas como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb).

Te puede interesar:
Menores de edad mataron de 17 puñaladas a un hombre que iba de polizón en un camión de carga en la vía Bogotá-Villavicencio: quedó en video

Según informó *Blu Radio*, **el operativo tuvo lugar en el sector rural de La Laguna, municipio de Roberto Payán**, como parte de los compromisos alcanzados en los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en *Facebook* y en nuestro *WhatsApp Channel*

Te puede interesar:
Joven contó el infierno que vivió al "enamorarse" de su profesor: así la habría manipulado el docente, que continúa ejerciendo

La intervención incluyó la destrucción de granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones, morteros caseros y cientos de minas antipersonal. El material bélico inutilizado representa uno de los decomisos más importantes en la región en los últimos años.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
AREANDINA
Únete a
la generación
que transforma
Matrícúlate aquí

Lo Último | Colombia

Soporte No. 2

Pares: 17 de diciembre de 2025
https://www.pares.com.co/balance-de-acciones-armadas-en-narino-2025/

diciembre 17, 2025

Balance de acciones armadas en Nariño, 2025

Paz Seguridad y Derechos Humanos



A pesar de los avances en materia de construcción de paz que se han logrado gracias a los Diálogos Regionales de Paz, la violencia armada en Nariño continúa estando vigente y activa, manifestándose en desplazamientos masivos, enfrentamientos entre grupos ilegales y ataques dirigidos contra la Fuerza Pública y la población civil. Durante 2025 persistieron disputas por el control de las economías ilícitas y de corredores estratégicos, lo que mantiene altos niveles de riesgo humanitario. En este sentido, los diálogos han abierto espacios de interlocución, pero no han logrado frenar del todo la dinámica violenta de grupos armados que continúan disputándose el poder territorial, evidenciando que la construcción de paz en el departamento avanza, pero aún enfrenta desafíos profundos y estructurales.

El panorama de Nariño durante 2025 ha estado marcado por una paradoja, a la par que avanzan las mesas de diálogo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que se adelanta, principalmente en el Telembí y la mesa con Comuneros del Sur que se adelanta en Abades, la confrontación armada por el control territorial se mantiene. Mientras el Ejército Nacional avanza en la recuperación del territorio, los grupos armados buscan nuevos territorios y rutas: la reconfiguración geográfica del conflicto se traduce en hechos violentos que terminan recayendo sobre la población civil.

Durante 2025 las subregiones más afectadas por acciones armadas fueron Cordillera, Sanquianga y Telembí, destacándose los municipios de Cumbitara y El Charco, que han sido una bisagra importante en la geografía de las economías ilícitas. Así mismo se han registrado acciones armadas, cuyas consecuencias son casi siempre desplazamientos y confinamientos de la población, en municipios como Barbacoas, Cumbal, Ipiales, Iscuandé, Leiva, Magüí Payán, Ricaurte y Sotomayor, todos municipios estratégicos por ser paso obligado entre regiones.

Soporte No. 3

Infobae: 25 de diciembre de 2025

https://www.infobae.com/colombia/2025/12/23/viajeros-en-narino-quedaron-atrapados-en-tiroteo-entre-disidencias-de-las-farc-y-el-ejercito-en-la-via-panamericana-pusieron-explosivos-en-la-carretera/

infobae

VIVO Colombia vs. Chile Hace 8 minutos | Trends Álex Saab Repatriación de colombianos Iván Cepeda Petro ONU Gustavo Bolívar

COLOMBIA >

Viajeros quedaron atrapados en tiroteo entre disidencias de las Farc y el Ejército en la vía Panamericana: pusieron explosivos en la carretera

Las acciones desplegadas durante la madrugada evitaron la detonación de explosivos y permitieron el restablecimiento gradual de la circulación entre Pasto y Chachagüí

Por Jhoan Pardo

+ Seguir en

23 Dic, 2025 11:15 a.m. CO

Guardar



PUBLICIDAD
Anuncios Google
Dejar de ver anuncio
¿Por qué este anuncio? ⓘ

Los enfrentamientos dejaron la vía Panamericana bloqueada por un par de horas - crédito Ejército Nacional

Amargo inicio de la Navidad para decenas de viajeros que quedaron atrapados en las primeras horas del 23 de diciembre en medio de enfrentamientos entre el Ejército Nacional y las disidencias de las Farc en la vía Panamericana, en el departamento de Nariño.




Te puede interesar:
Menores de edad mataron de 17 puñaladas a un hombre que iba de polizón en un camión de carga en la vía Bogotá-Villavicencio: quedó en video

Según informó la institución militar, el hecho se desencadenó cuando miembros de la estructura Franco Benavides, perteneciente a las disidencias de las Farc, intentaron tomarse el corredor vial e instalar explosivos en la carretera entre Pasto y Chachagüí, justo en vísperas de las fiestas navideñas.

Soporte No. 4

CNC Ipiales: 6 de febrero de 2026

https://www.facebook.com/watch/?v=2738171839870216

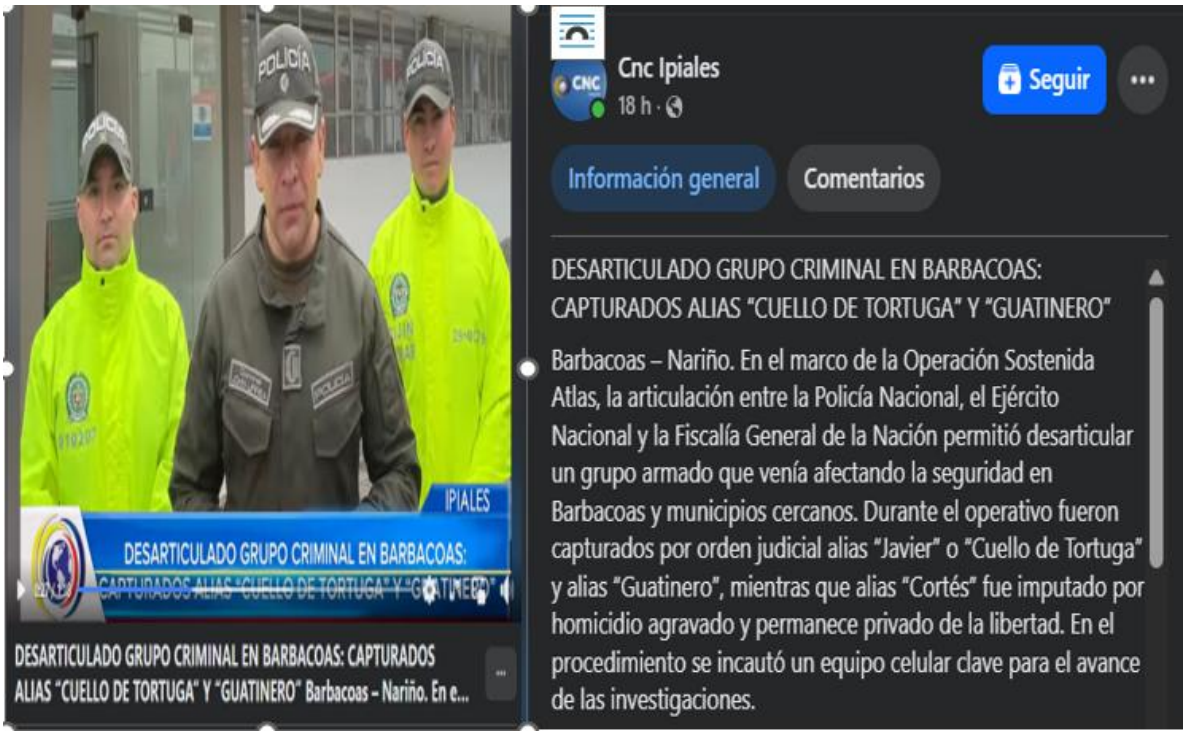

Soporte No. 5

Alerta Nariño: 20 de noviembre de 2025

https://www.facebook.com/watch/?v=840968682008627



Soporte No. 6

El Tiempo: 4 de febrero de 2026

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/lluvias-intensas-mantienen-pasos-restringidos-en-vias-de-narino-en-la-panamericana-hacia-el-cauca-autoridades-atienden-puntos-criticos-3529781

NOTICIA

Lluvias intensas mantienen pasos restringidos en vías de Nariño; en la Panamericana hacia el Cauca, autoridades atienden puntos críticos

Según reportes de Invías hay afectaciones en varios corredores viales de la red nacional.



En el corredor hacia el Cauca se han presentado deslizamientos de tierra que han ocasionado afectaciones a la movilidad. Foto: Invías

Mauricio De la Rosa
04.02.2026 17:59 | Actualizado: 04.02.2026 17:59

Soporte No. 7

El Tiempo: 10 de noviembre de 2025

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/indigenas-del-pueblo-awa-bloquean-al-via-que-de-pasto-conduce-a-tumaco-protesta-pacifica-advierte-la-amenaza-del-conflicto-armado-en-sus-territorios-3509746

EL TIEMPO
SUSCRÍBETE
INICIAR SESIÓN

NOTICIA

Indígenas del pueblo Awá bloquean la vía entre Pasto y Tumaco en protesta pacífica por la amenaza del conflicto armado en sus territorios

La economía en Tumaco empieza a sufrir ante el desabastecimiento de productos y mercancías.



Más de un centenar de personas se agolparon sobre este importante corredor vial que comunica a la capital nariñense con su zona portuaria. Foto: Particular

Mauricio De la Rosa

18.11.2025 11:57 | Actualizado: 18.11.2025 11:57
