	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P. LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL APOYO DE GESTIÓN A LA SUPERVISIÓN		IN-FT-58 Versión: 03 Septiembre 01 de 2025
Nº CONTRATO:	006 DE 2026	**INFORME :**	ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 20.000.000,00**		
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META - EDESA S.A. E.S.P."		
CONTRATISTA:	**EIMAR ADRIÁN VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ**		

	DESCRIPCION	SI	N/A
1	**APOYO DE GESTIÓN A LA SUPERVISIÓN:**		
a	Informe de ejecución de contrato de prestación de servicios - CN-FT-56	X	
b	IN-FT-15 Informe inversión y buen manejo del anticipo del presente mes con soportes		X
c	IN-FT-55 acta visita de apoyo a la supervisión	X	
d	Correspondencia enviada y recibida	X	
e	IN-FT-59 certificación de aportes a sistema de seguridad social - Apoyo a la Supervisión	X	
f	Actas de Comité	X	
g	IN-FT-12 - Informe Ejecutivo	X	
h	Informe de Supervision OP-FT-39	X	

Firma Responsable: _____

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventorías
EDESA S.A. E.S.P.

FECHA DEL INFORME:	03 DE MARZO DE 2026

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO:

NÚMERO DE PROCESO:	SUO-006-2026
NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO:	006 DEL 02 DE ENERO DE 2026
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO:	"PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META - EDESA S.A. E.S.P.".
NOMBRE DEL CONTRATISTA CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	EIMAR ADRIÁN VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ C.C. No. 86.075.095 DE VILLAVICENCIO (META)
CONDICIONES INICIALES	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIO:	05 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	04 DE MAYO DE 2026
PRORROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES	
CESION:	N/A
PRORROGA:	N/A
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (4) MESES
ADICION:	N/A
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($20.000.000,00)
SUSPENSION:	N/A
REINICIO:	N/A
MODIFICATORIA / ACLARATORIA:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	04 DE MAYO DE 2026

2 DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL (generales)	DESCRIPCIÒN DE CUMPLIMIENTO
1.	Suscribir acta de inicio una vez se cumplan los requisitos para la ejecución.	Se firmó el acta de inicio el día 05 de enero de 2026.
2.	Utilizar todos sus conocimientos en el apoyo a EDESA. S.A. E.S.P. y ejercer sus actividades con honestidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, utilicé todos mis conocimientos profesionales y ejercí mis actividades con honestidad, eficiencia y calidad, dentro de un ambiente de cordialidad y respeto para los demás.
3.	Guardar la debida reserva y confidencialidad sobre los documentos que le sean entregados o tenga conocimiento con ocasión de la ejecución del contrato. Además, abstenerse de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDESA. S.A. E.S.P., ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a cargo de la entidad.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, mantuve absoluta reserva y confidencialidad sobre la información y los documentos de los contratos que se manejan en EDESA S.A. E.S.P. De igual manera no realice declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EDESA. S.A. E.S.P., y tampoco tome decisiones o inicie acciones que generen obligaciones a cargo de EDESA S.A. E.S.P.
4.	Afiliarse al sistema de seguridad social integral.	Se realizó la afiliación al sistema de seguridad social integral y ARL.
5.	Realizar los pagos mensuales por concepto de seguridad social integral (Salud, pensión y riesgos), sobre el 40% bruto del valor mensual. En ningún caso la base gravable podrá ser menor al salario mínimo mensual legal vigente.	Se realizó el pago mensual por concepto de seguridad social integral (Salud, pensión y riesgos), sobre el 40% del valor mensual y en los términos señalados en la Ley. Planilla de pago No. 9499760358, correspondiente al mes de Mes de Enero de 2026.
6.	Entregar al supervisor del contrato informe mensual de las actividades adjuntando copia legible de planilla pagada de aporte al Sistema de Seguridad Social integral en los términos señalados en la Ley.	Se entregó al supervisor del contrato el informe mensual de las actividades del periodo correspondiente entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026 y se adjuntó copia del soporte de pago de la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social integral dentro de los términos señalados en la Ley.
7.	El contratista debe demostrar buen manejo de las relaciones interpersonales, ser diligente y responsable.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, demostré buen manejo de las relaciones interpersonales, ser diligente y responsable.

8.	Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y presentar los informes mensuales de ejecución contractual.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, suscribí las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y presente el informe mensual de ejecución contractual.
9.	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, no accedí a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
10.	Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución de este.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, he sido responsable con las obligaciones contractuales y el cumplimiento de las mismas.
11.	Asumir todos los costos que genere la legalización del contrato.	Durante la legalización del contrato de prestación de servicios profesionales, asumí todos los costos derivados de este.
12.	Realizar las demás obligaciones de acuerdo con su competencia profesional y que sean inherentes al objeto contractual.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se realizó el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo a mi competencia profesional.
13.	Dar noticia inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis en la ejecución del contrato.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, no se presentó ninguna novedad que genere parálisis en la ejecución del objeto contractual.
14.	Realizar entrega de elementos utilizados o entregados para desarrollar el objeto del contrato al supervisor, una vez finalice el contrato.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, no se hizo entrega de elementos para el desarrollo del objeto contractual.

No.	OBLIGACION CONTRACTUAL (especificas)	DESCRIPCIÒN DE CUMPLIMIENTO
1.	Apoyar a la Coordinación de interventoría en dar oportuna respuesta a los requerimientos que las entidades de control realicen a la entidad.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, no se me asignó esta actividad.
2.	Realizar el apoyo y/o acompañamiento en las visitas técnicas que se requieran a los proyectos en ejecución desarrollados por EDESA S.A. E.S.P.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, no se me asignó esta actividad.

3.	Revisar el aspecto técnico, las novedades de los contratos (anticipos, prorrogas, suspensiones, modificaciones, adicionales, terminaciones, recibos, liquidaciones) y demás que le sean encomendados, dado el visto bueno para la firma del Coordinador de interventorías y/o Director técnico Operativo.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se realizó la revision de los siguientes actos administrativos: • Se revisó la documentación correspondiente al informe mensual de Interventoría del mes de marzo de 2025, del Contrato de Interventoría No. 102 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAMAL DEPARTAMENTO DEL META". • Se revisó la documentación correspondiente al informe mensual de Obra del mes de marzo de 2025, del Contrato de obra No. 101 de 2022, cuyo objeto es: "AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAMAL DEPARTAMENTO DEL META". • Se revisó la documentación correspondiente al recibo final del Contrato de Interventoría No. 102 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAMAL DEPARTAMENTO DEL META". • Se revisó la documentación correspondiente a las actas de Reinicio No. 1 del Contrato de Obra No. 110 de 2024, cuyo objeto es: "AMPLIACION Y OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE URIBE - META" y Contrato de Interventoría No. 111 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META".

		• Se revisó la documentación correspondiente a las actas de ampliación No. 1 de la suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. 105 de 2024, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO EL RUBI MUNICIPIO DE LA MACARENA - META" y Contrato de Interventoría No. 104 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO EL RUBÍ DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA - META". • Se revisó la documentación correspondiente al informe mensual de Interventoría del mes de noviembre de 2025, del Contrato de Interventoría No. 052 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN".
4.	Apoyar a la Coordinador de interventorías en la elaboración de cierres de expedientes contractuales que se requieran a fin de buscar el saneamiento de proyectos de vigencias anteriores.	En el periodo comprendido entre el entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se apoyó a la coordinación de interventorías en trámites correspondientes a solicitudes y revisiones del expediente contractual del Contrato de Interventoría No. 271 de 2010, cuyo objeto es: "GERENCIA ASESORA E INTERVENTORIA PARA ADELANTAR LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES TECNICAS, LEGALES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS A LOS ACTORES VINCULADOS AL PLAN DEPARTAMENTAL PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PDA DEL DEPARTAMENTO DEL META".

5.	Apoyar y revisar el seguimiento de los procesos de supervisión de los proyectos en la ejecución por parte de EDESA S.A. E.S.P. y que están a cargo de la Coordinación de Interventoría y/o de la Dirección Técnica Operativa.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se apoyó a la dirección técnica operativa y coordinación de interventoría, en el seguimiento al proceso de Recibo Final del Contrato de Interventoría No. 102 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADAMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTAMENTO DEL META".
6.	Asistir a reuniones cuando sea requerido por la empresa.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, asistí a las siguientes reuniones: • Reunión de seguimiento a la ejecución de actividades del Contrato de Obra No. 110 de 2024, cuyo objeto es: "AMPLIACION Y OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE URIBE - META" y Contrato de Interventoría No. 111 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE – META", reunión que se llevó a cabo el día 19 de enero de 2026. • Reunión de seguimiento a la ejecución de actividades del Contrato de Obra No. 110 de 2024, cuyo objeto es: "AMPLIACION Y OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE URIBE - META" y Contrato de Interventoría No. 111 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE – META", reunión que se llevó a cabo el día 29 de enero de 2026.

		• Reunión convocada por la Dirección Técnica Operativa de EDESA S.A. E.S.P., para revisar avance de los contratos de obra e Interventoría, reunión que se llevó a cabo el día 14 de enero de 2026.
7.	Mantener absoluta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, mantuve absoluta reserva y confidencialidad sobre la información y los documentos de los contratos que se manejan en EDESA S.A. E.S.P.
8.	Apoyar la elaboración de los diferentes documentos de carácter técnico que requieran cada una de las fases del proceso pre - contractual / contractual / post contractual.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, no se me asignó esta actividad.
9.	Realizar el acompañamiento en la ejecución de los proyectos de agua potable y saneamiento básico desarrollados por EDESA. S.A. E.S.P.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se realizó acompañamiento a la coordinación de interventoría en la socialización del Contrato de Obra No. 117 de 2025, cuyo objeto es: "OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CHINATA SECTOR LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META" y Contrato de Interventoría No. 135 de 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CHINATA SECTOR LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META", socialización la cual fue realizada el día 28 de enero de 2026.
10.	Proyectar la respuesta a los oficios, derechos de petición y solicitudes de información trasladados para su trámite, dentro de los plazos y términos de la ley.	Durante el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se proyectaron los siguientes oficios: • Se proyecta oficio No. E.170.4.0004.2026 de fecha 13 de enero de 2026, cuyo asunto corresponde a Reiteración por SEGUNDA VEZ Informe mensual de actividades mes de

		NOVIEMBRE DE 2025 del Contrato de Interventoría No. 111 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META". • Se proyecta oficio No. E.170.4.0005.2026 de fecha 13 de enero de 2026, cuyo asunto corresponde a observaciones Informe mensual mes de Marzo de 2025, correspondiente al Contrato de Interventoría No. 102 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTAMENTO DEL META". • Se proyecta oficio No. E.170.4.0008.2026 de fecha 15 de enero de 2026, cuyo asunto corresponde a citación comité de obra Contrato de Obra No. 110 de 2024, cuyo objeto es: "AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META" y Contrato de Interventoría No. 111 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META". • Se proyecta oficio No. E.170.4.0009.2026 de fecha 16 de enero de 2026, cuyo asunto corresponde a citación comité técnico Contrato de Interventoría No. 076 de 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALC SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALC PLUVIAL DE ÁREAS DE DRENAJE DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR - CLL 15 Y CORREDORES VIALES CRAS 43 Y

		39 CON DESCARGA A CAÑO BUQUE, TAMBIÉN SECTORES PERTENECIENTES A LAS COMUNA 6 Y 7 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". • Se proyecta oficio No. E.170.4.0010.2026 de fecha 19 de enero de 2026, cuyo asunto corresponde a Citación comité técnico Contrato de Interventoría No. 076 de 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALC SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALC PLUVIAL DE ÁREAS DE DRENAJE DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR - CLL 15 Y CORREDORES VIALES CRAS 43 Y 39 CON DESCARGA A CAÑO BUQUE, TAMBIÉN SECTORES PERTENECIENTES A LAS COMUNA 6 Y 7 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". • Se proyecta oficio No. E.170.4.0012.2026 de fecha 21 de enero de 2026, cuyo asunto corresponde a Reprogramación comité técnico Contrato de Interventoría No. 076 de 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALC SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALC PLUVIAL DE ÁREAS DE DRENAJE DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR - CLL 15 Y CORREDORES VIALES CRAS 43 Y 39 CON DESCARGA A CAÑO BUQUE, TAMBIÉN SECTORES PERTENECIENTES A LAS COMUNA 6 Y 7 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". • Se proyecta oficio No. E.170.4.0014.2026 de fecha 22 de enero de 2026, cuyo asunto corresponde a Observaciones Trámite Recibo Final del Contrato de Interventoría No. 102 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL

		MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTAMENTO DEL META". • Se proyecta oficio No. E.170.4.0016.2026 de fecha 23 de enero de 2026, cuyo asunto corresponde a Solicitud Información canales de comunicación para notificaciones Contrato de Interventoría No. 135 de 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CHINATA SECTOR LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META". • Se proyecta oficio No. E.170.4.0017.2026 de fecha 23 de enero de 2026, cuyo asunto corresponde a Respuesta oficio No. CE-CO-117-2025-01-2026 de fecha 22 de enero de 2026, Contrato de Interventoría No. 135 de 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CHINATA SECTOR LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META". • Se proyecta oficio No. I.170.4.0019.2026 de fecha 23 de enero de 2026, cuyo asunto corresponde a Viabilidad Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. 104 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO EL RUBÍ DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA - META".
11.	Apoyar en el seguimiento de los procesos de supervisión de los proyectos en ejecución por parte de EDESA S.A. E.S.P. y que están a cargo de la Coordinador de interventorías.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se realizó la revisión de los documentos entregados por la Coordinador de interventorías, correspondiente a los proyectos designados para hacer sus respectivas observaciones y solicitudes.

12.	Apoyar en la elaboración de informes de los convenios y/o contratos administrativos que estén suscritos por EDESA S.A. E.S.P. y cuya supervisión de la ejecución este a cargo de la Coordinador de interventorías.	En el periodo comprendido entre el entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, no se me asignó esta actividad.
13.	Apoyar técnicamente a EDESA S.A. E.S.P. en el desarrollo y/o formulación de necesidades para la elaboración de proyectos de agua potable y saneamiento básico que puedan ser desarrollados por la empresa.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, no se me asignó esta actividad.
14.	Apoyar, solicitando a la interventoría del proyecto "AMPLIACION Y OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE URIBE - META", la correcta revisión de los informes de obra y en general de toda la documentación que se reporte del avance del contratista de obra, so pena de iniciar los procesos a que haya lugar el contratista de interventoría, la cual estará a cargo del apoyo a la supervisión y deberá coordinar con COORDINACIÓN DE INTERVENTORÍA.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se realizó seguimiento a la ejecución de actividades del contrato de obra No. 110 de 2024, cuyo objeto es: "AMPLIACION Y OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE URIBE - META", en el cual se evidenció el avance en la ejecución de actividades técnicas claves, tales como: Mástil metálico galvanizado de 9 m con brazo retorneado. suministro e instalación y Suministro de herramientas para operación de plantas de tratamiento. De igual manera se solicitó al Contratista de Interventoría, por segunda vez la entrega del Informe mensual de Interventoría correspondiente al mes de Noviembre de 2025.
15.	Apoyar a la revisión de informes de interventoría, modificaciones, suspensiones, prorrogas y demás tramites que se realicen del contrato de interventoría del proyecto "AMPLIACION Y OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE URIBE - META".	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se realizó la revision del Acta de Reinicio No. 1, correspondiente al Contrato de Obra No. 110 de 2024, cuyo objeto es: "AMPLIACION Y OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE URIBE - META" y Contrato de Interventoría No. 111 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE – META".

16.	Las demás que por ley o contrato le correspondan, así como las estipuladas en el Acuerdo No. 004 de 2013 por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Empresa de Servicios Públicos del Meta "EDESA S.A. E.S.P." normas generales de contratación de la Empresa y las que se desprenden de la naturaleza del contrato.	En el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, atendí las actividades que se me designaron de acuerdo a mi competencia profesional y que son inherentes al objeto contractual.

Como contratista de la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A. E.S.P., declaro que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del presente periodo llevadas a cabo con responsabilidad, diligencia y acatando las normas de seguridad y salud en el trabajo establecidas para este tipo de contrato; además, del cumplimiento a lo estipulado en la norma y certifico bajo la gravedad de juramento que realicé los pagos correspondientes y en debida forma de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social correspondientes, con los ingresos provenientes del contrato.

EIMAR ADRIÁN VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ
C.C. No. 86.075.095 de Villavicencio (Meta)
Contratista

3 CERTIFICACIÒN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación de los documentos requeridos para el pago, la supervisora certifica que el contratista cumplió en el periodo del 01 al 30 del mes enero de 2026, con el pago conforme a los documentos soportes de Aportes Obligatorios al Sistema de Seguridad Social (SALUD, PENSION y ARL) correspondiente a los ingresos provenientes del Contrato de Prestación de Servicios suscrito con la Empresa de Servicios Públicos del Meta EDESA S.A.E.S.P., materia del presente pago.

La certificación la realizo previa verificación del pago por los medios electrónicos de la Planilla del pago a la Seguridad Social, PILA Planilla Integrada de Liquidación de Aportes al pago a la Seguridad Social, correspondiente a la planilla de Nº 9499760358 pagada el 20 de febrero de 2026, con pago a SALUD (Salud Total), PENSIONES (Protección) y ARL (ARL Sura). Correspondiente al mes ENERO de 2026 adjunta en dos (2) folios.

CONCEPTO	VALOR
PERIODO COTIZADO	ENERO DE 2026
IBC (INGRESO BASE DE COTIZACIÓN)	$2.100.00,00
NÚMERO DE PLANILLA	9499760358
FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA	20/FEBRERO/2026
VALOR PAGADO EN SALUD	$262.500,00
VALOR PAGADO EN PENSIÓN	$336.000,00
VALOR PAGADO EN ARL	$51.200,00
VALOR TOTAL PAGADO	$649.700,00

4 **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:

CONCEPTO	DEBE	HABER
VALOR (INICIAL) DEL CONTRATO	$20.000.000,00	
VALOR ADICIONES (Si aplica)	N/A	N/A
VALOR PAGOS REALIZADOS	$0,00	$0,00
VALOR A PAGAR ACTUALMENTE	$0,00	$5.000.000,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	$0,00	$15.000.000,00
SUMAS IGUALES	**$20.000.000,00**	**$20.000.000,00**

5 **CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA**: En mi calidad de supervisor(a) Certifico que el contratista hizo entrega en medio físico y digital de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución.

6 **CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR:** En atención a la verificación del desarrollo contractual y cumplimiento de las obligaciones desempeñadas durante la ejecución del mismo, en mi calidad de supervisor(a) y conforme a las funciones financieras, administrativas y técnicas de vigilancia que me invisten y en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación (acuerdo 004 de 2013), así como las contenidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P., me permito certificar el cumplimiento contractual a satisfacción.

Por medio del presente escrito certifico en mi calidad de SUPERVISOR(A) del contrato No. 006 de 2026, que, el contratista, durante este periodo, cumplió a satisfacción las actividades descritas en el presente informe que corresponde al pago parcial del periodo del 05 de enero al 04 de febrero de 2026, así mismo, las relativas al pago de seguridad social integral, razón por la cual se autoriza el pago parcial No. 1 por el valor de *CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000,00)*.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALIX MILENA CASTRO CALDERON
CARGO DEL SUPERVISOR: Coordinadora de Interventorías
SUPERVISOR

Nota: La responsabilidad en la verificación, certificación y reporte del cumplimiento de objeto contratado, esta única y exclusivamente en cabeza del supervisor(a) designado por ello se recomienda la revisión de la información reportada en el presente informe.

V.B. SECOP

V°B° Contratación

VB Archivo
O.A.C. EDESA.SAESP
Yesica castillo
V°B° Archivo
Funcionaria Autorizada

ANEXOS - EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS



edesa	**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.**	GOBERNACIÓN DEL META	IN - FT - 55
	ACTA VISITA DE APOYO DE GESTIÓN A LA SUPERVISIÓN		Versión: 02
			Noviembre 11 de 2022

PROYECTO BPIN:	2023005500284				
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°:	111	**DE**	2024		
NOMBRE DEL INTERVENTOR Y R.L.	CONSORCIO INTER URIBE 2025 - NIT. 901.902.254-3 R/L MICHELL FIERRO CRUZ - C.C. No. 86.068.223				
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META"			**Lugar:**	URIBE (META)
				Fecha:	29 DE ENERO DE 2026
				Hora Inicio:	9:00 A.M.
				Hora Fin:	12:30 P.M.
CONTRATO DE SUPERVISIÓN N°:	006 DE 2026				
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	EIMAR ADRIÁN VELÁSQUEZ GUTIÉRREZ				

DESARROLLO DE LA VISITA

En la visita se evidencia la asistencia de los profesionales minimos requeridos de obra e interventoría, se evidencia realizando la actividad correspondiente a encofrado de los muros del sedimentador y del filtro, así como el suministro e instalación de mástiles metálicos galvanizado de 9 m con brazo retorneado, actividades necesarias para el avance estructural y funcional del proyecto y suministro de herramientas para operacion de plantas de tratamiento; se revisan planos los cuales estan en fisico en obra, y se verifica espesores y alturas. Así mismo, informan los profesionales que en cada fundida se toman muestras de calidad de los concretos, cuyos resultados de resistencia para concreto impermeabilizado estan dando el porcentaje esperado para resistencia de 4000 PSI. Para el transporte de material se puede ver el tractor que sirve de trasiego para la subida de todos los materiales, así como del retiro de material sobrante de la excavación. Además se puede ver el uso de la dotación y elementos de protección personal (EPP) de todos los colaboradores.

PROYECTO BPIN:	2023005500284

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA REALIZADA POR EL SUPERVISOR DE LA INTERVENTORIA













	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.		IN - FT - 55
edesa	ACTA VISITA DE APOYO DE GESTIÓN A LA SUPERVISIÓN	META	Página 3 de 3

SEGUIMIENTO AL PERSONAL MINIMO REQUERIDO DE LA INTERVENTORIA

CARGO	NOMBRE	PRESENTE DURANTE LA VISITA	
		SI	NO
Director de Interventoria	MICHELL FIERRO CRUZ	X	
Residente de Interventoria	LUIS ALEJANDRO DIAZ BERNAL	X	
Inspector de Interventoria	LEONARDO JAVIER PARRADO LOPEZ	X	
Profesional o Técnico SST	ANA SOLANYI JIMENEZ SANTAMARIA	X	
Topografo			X
Cadenero			X
sonal social			X
etc			

EL PROFESIONAL O TECNICO EN SST ACREDITA QUE EL PERSONAL DE INTERVENTORIA ESTA AFILIADO ACTUALMENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
SI	X
NO	

LA INTERVENTORIA DETALLA EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA	
PORCENTAJE (%) EJECUTADO	41,64%
PORCENTAJE (%) PROGRAMADO	44,68%
PORCENTAJE (%) RETRASO	-3,04%

LA INTERVENTORIA CUMPLE CON		
COMPROMISO / OBLIGACIÓN	SI	NO
Bitacora	X	
Informes mensuales		X
Actas de Visita de Obra	X	
Actas de Comites de Obra Participativos con la Comunidad		X
Compromisos adquiridos en ites técnicos previos	X	

COMENTARIOS DE LA SUPERVISIÓN:

Las causales de retraso y que representan el 3,04% sobre la reprogramación con respecto al reinicio No. 1 de fecha 14 de Enero de 2026, obedecen principalmente a la falta de frentes de trabajo para ejecutar las actividades programadas en el mes de enero de 2026.

Se recuerda que la entrega de los informes mensuales de obra e interventoría, es dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El porcentaje ejecutado versus el porcentaje programado tomado en la presente visita corresponde a los porcentajes presentado por la interventoria en el informe ejecutivo para el corte al 29 de enero de 2026 y se encuentra conciliado entre la obra y la interventoria.

COMPROMISOS DERIVADOS DE LA VISITA	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A

Ing. EIMAR ADRIAN VELASQUEZ GUTIERREZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Ing. MICHELL FIERRO CRUZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Villavicencio, 13 de Enero de 2026 E.170.4.0004.2026

Señores:
CONSORCIO INTER - URIBE 2025
NIT. 901.902.254-3
Atn.: Rep. Legal MICHELL FIERRO CRUZ
Correo: gerenciamunrha@gmail.com
Calle 47 BIS No. 28-36 Piso 2
La Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 111 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META".

Asunto: Reiteración por *SEGUNDA VEZ* Informe mensual de actividades mes de NOVIEMBRE DE 2025 del contrato de la referencia.

Cordial saludo;

Dando alcalce al oficio No. E.170.4.0412.2025 de fecha 15 de diciembre de 2025, desde la Coordinación de Interventoría de EDESA S.A. E.S.P., en el marco del acompañamiento al Contrato de Interventoría No. 111 de 2024 y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la **CLAUSULA NOVENA - OBLIGACIONES DEL CONSULTOR,** del contrato relacionado en la referencia, por medio de la presente se *REITERA POR SEGUNDA VEZ* al contratista **CONSORCIO INTER - URIBE 2025,** con NIT. 901.902.254-3, la entrega inmediata del informe mensual de interventoria correspondiente al periodo del mes de **NOVIEMBRE DE 2025**, para lo cual se concede un término máximo de tres (3) dias hábiles contados a partir de la fecha para la entrega de dicha documentación.

Agradecemos la atención al presente escrito y la celeridad en su respuesta y cumplimiento a lo requerido.

Cordialmente,

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
EDESA S.A. E.S.P.

Firma	
Nombre:	Ing. Eimar Adrián Velásquez Gutiérrez
Cargo:	CPS-006 DE 2026
	Proyectó

Villavicencio, 13 de Enero de 2026 E.170.4.0005.2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL MONTECRISTO
NIT. 901.621.219-9
Rep. Legal JUAN CARLOS PRIETO
Correo: ut.montecristo@gmail.com
Calle 38 No. 32-41 oficina 404 Barrio Centro
La Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 102 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Observaciones Informe mensual mes de Marzo de 2025.

Cordial Saludo:

De manera atenta, desde la Coordinación de Interventoría de EDESA S.A. E.S.P., en el marco del acompañamiento al Contrato de Interventoría No. 102 de 2022, se permite hacer devolución del informe mensual correspondiente al mes de marzo de 2025; teniendo en cuenta que en la verificación de la documentación presentada se generaron las siguientes observaciones, las cuales se relacionan a continuación:

OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

1. Cada una de las carpetas se deben presentar debidamente rotuladas y marcadas.

2. Formato IN-FT-25 - LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA, se debe corregir el valor del contrato de interventoría, según observaciones plasmadas en el documento.

3. Formato IN-FT-25 - LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA, se debe corregir el nombre del contratista, según observaciones plasmadas en el documento.

4. Formato IN-FT-25 - LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA, debe ser firmado por el Director de Interventoría según lo establece el formato señalado. (descargar formato IN-FT-25 del sistema de gestión de calidad de la pagina www.edesaesp.com.co).

5. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, numeral 3.2 INFORMACIÓN

GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA páginas 9 y 10 de 178, se debe corregir el plazo inicial establecido en el contrato y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de interventoría, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

6. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, en la página 15 de 178, la fotografía relacionada no corresponde al equipo mencionado.

7. De igual manera en la página 16 de 178, no se deben dejar espacios en blanco respecto al equipo que se pretende relacionar.

8. De igual manera en la página 17 de 178, la fotografía relacionada no corresponde al equipo mencionado.

9. En el informe de seguimiento de medidas Ambientales numeral 2.4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA, se debe corregir el plazo inicial establecido en el contrato y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de obra, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

10. De igual manera en el Informe de seguimiento de medidas Ambientales numeral 2.5 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, se debe corregir el plazo inicial establecido en el contrato y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de interventoría, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DE OBRA

1. Cada una de las carpetas se deben presentar debidamente rotuladas y marcadas.

2. Formato IN-FT-20 - LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL OBRA, se debe corregir el valor del contrato de obra, según observaciones plasmadas en el documento.

3. Formato IN-FT-20 - LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL OBRA, debe ser firmado por el Director de Interventoría según lo establece el formato señalado. (descargar formato IN-FT-20 del sistema de gestión de calidad de la pagina www.edesaesp.com.co).

4. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, numeral 3.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA páginas 11 y 12 de 234, se debe corregir el plazo inicial establecido en el contrato y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de obra, para lo cual se

adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

5. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, numeral 3.4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA páginas 12 y 13 de 234, se debe corregir el plazo inicial establecido en el contrato y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de interventoría, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

6. En el informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de Interventoría, no se debe utilizar el formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, toda vez que dicho formato no corresponde al citado informe.

7. En el informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de Interventoría, numeral 3.2 CONTROL AFILIACIÓN PERSONAL DE INTERVENTORÍA - MES MARZO 2025, se deben realizar las correcciones en el documento, teniendo en cuenta lo solicitado en el oficio No. E.170.4.0383-2025 de fecha 25 de Noviembre de 2025.

8. De igual manera en el informe Mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de Interventoría, numeral 5.1 ACTIVIDADES EN OBRA, se deben realizar las correcciones según observaciones plasmadas en el documento.

9. Formato IN-FT-11 - CERTIFICACIÓN APORTES SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL, falta firma del Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL MONTECRITO, contratista de interventoría.

10. En el informe Mensual de seguimiento de medidas Ambientales de Interventoría, numeral 2.4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA páginas 6 y 7, se debe corregir el plazo inicial establecido en el contrato y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de obra, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

11. De igual manera en el informe Mensual de seguimiento de medidas Ambientales de Interventoría, numeral 2.5 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA páginas 7 y 8, se debe corregir el plazo inicial establecido en el contrato y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de interventoría, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

12. En el informe Mensual de obra, numeral 1.01.1. INFORMACIÓN BASICA páginas 4 y 5 de 155, se debe incluir la palabra INICIAL al plazo de ejecución quedando así: PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL, y a su vez se debe relacionar la cronología

del contrato según el acta de terminación del contrato de obra, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

13. En el Informe Mensual de SST de obra, numeral 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 101 DE 2022, página 7 de 38, se debe incluir la palabra INICIAL al plazo de ejecución quedando así: PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL, y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de obra, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

14. En el Informe Mensual de Actividades del componente Ambientald de obra, numeral 1. GENERALIDADES Tabla 1: Ejecución contrato, se debe incluir la palabra INICIAL al plazo de ejecución quedando así: PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL, y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de obra, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

15. En el Informe Gestión Social de obra, numeral 3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA N° 101 DE 2022, página 5 de 10, se debe incluir la palabra INICIAL al plazo de ejecución quedando así: PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL, y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de obra, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

NOTA: *Se solicita que, una vez realizados los ajustes a las observaciones, se deje detrás de cada hoja corregida, la hoja con el error, para poder verificar la información.*

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
EDESA S.A. E.S.P.

Firma	
Nombre:	Ing. Eimar Adrián Velásquez Gutiérrez
Cargo:	CPS-006 DE 2026
Proyectó	

Villavicencio, 15 de Enero de 2026

E.170.4.0008.2026

Señores:
CONSORCIO PTAP URIBE
NIT. 901.902.283-7
Atn.: Rep. Legal YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA
Correo: uribeptap@gmail.com
Calle 46 No. 32-17 Barrio El Triunfo
La Ciudad

Señores:
CONSORCIO INTER - URIBE 2025
NIT. 901.902.254-3
Atn.: Rep. Legal MICHELL FIERRO CRUZ
Correo: gerenciamunrha@gmail.com
Calle 47 BIS No. 28-36 Piso 2
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 110 DE 2024, cuyo objeto es: "AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 111 DE 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META".

Asunto: Citación comité de obra contratos de la referencia.

Cordial saludo;

Desde la Coordinación de Interventoría de EDESA S.A. E.S.P., en el marco del acompañamiento al Contrato de Interventoría No. 111 de 2024 y en cumplimiento de las obligaciones establecidas de los contratos relacionados en la referencia, por medio de la presente me permito convocar a comité de obra el dia lunes 19 de enero de 2026 a las 11:00 AM, en las instalaciones de EDESA S.A. E.S.P., con el fin de tratar temas importantes respecto al avance de las obras objeto del contrato en referencia.

Agradecemos la atención al presente escrito.

Cordialmente,

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
EDESA S.A. E.S.P.

Firma	
Nombre:	Ing. Eimar Adrián Velásquez Gutiérrez
Cargo:	CPS-006 DE 2026
	Proyectó

Villavicencio, 16 de Enero de 2026 E.170.4.0009.2026

Señores:
CONSORCIO INTER CIVARA
NIT. 901.965.543-7
Atn.: Rep. Legal HENRY GUTIÉRREZ CÉSPEDES
Correo: consorciointercivara@gmail.com
Calle 26C No. 43A-26 Barrio Buque
La Ciudad

CONSORCIO CIVILES S.A.S.
NIT. 901.894.747-7
Atn.: Rep. Legal MAURICIO ANDRES GONZALEZ JARAMILLO
Correo: consorciocivilessas@gmail.com
Calle 26C No. 43A-26 Barrio Buque
Integrante **CONSORCIO INTER CIVARA** - Participación: 80%
La Ciudad

VARA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 901.206.076-3
Atn.: Rep. Legal DIANA MILENA VELÁSQUEZ CASTRO
Correo: varasas73@gmail.com
Calle 47 BIS No. 28-36 Piso 2
Integrante **CONSORCIO INTER CIVARA** - Participación: 20%
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 076 DE 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALC SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALC PLUVIAL DE ÁREAS DE DRENAJE DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR - CLL 15 Y CORREDORES VIALES CRAS 43 Y 39 CON DESCARGA A CAÑO BUQUE, TAMBIÉN SECTORES PERTENECIENTES A LAS COMUNA 6 Y 7 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

Asunto: Citación comité técnico contrato de la referencia.

Cordial saludo;

Desde la Coordinación de Interventoría de EDESA S.A. E.S.P., en el marco del acompañamiento al Contrato de Interventoría No. 076 de 2025, y teniendo en cuenta el informe semanal del 05 al 10 de enero de 2026 (anexo a la presente) presentado por el profesional de apoyo a la supervision, para lo cual esta coordinación de interventoria ve

con gran preocupación que a la fecha del mencionado informe no se evidencia ningun avance durante dicha semana, además de lo anterior la obra presenta un *RETRASO* del **56%** en la ejecución de las actividades programadas, y con fecha de terminacion del contrato según el acta de inicio suscrita para el próximo 28 de enero de 2026, restando tan solo trece (13) dias calendarios para la terminacion de las obras objeto de la interventoría, para lo cual solicitamos de su presencia tanto del Representante Legal e integrantes del **CONSORCIO INTER CIVARA**, a un comité técnico para el proximo lunes 19 de enero de 2026 a las 09:00 AM en las instalaciones de EDESA S.A. E.S.P., cabe resaltar que en dicho comité se debe contar con la participación del equipo de profesionales que forman parte integral de la propuesta presentada a la entidad.

Por ultimo, informarles que dicho comité es indelegable para lo cual esperamos contar con su presencia.

Agradecemos la atención al presente escrito.

Cordialmente,

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
EDESA S.A. E.S.P.

ANEXO: INFORME SEMANAL DEL 05 AL 10 DE ENERO DE 2026 - EN CUATRO (4) FOLIOS.

Firma	
Nombre:	Ing. Eimar Adrián Velásquez Gutiérrez
Cargo:	CPS-006 DE 2026
	Proyectó

Villavicencio, 19 de Enero de 2026 E.170.4.0010.2026

Señores:
CONSORCIO INTER CIVARA
NIT. 901.965.543-7
Atn.: Rep. Legal HENRY GUTIÉRREZ CÉSPEDES
Correo: consorciointercivara@gmail.com
Calle 26C No. 43A-26 Barrio Buque
La Ciudad

CONSORCIO CIVILES S.A.S.
NIT. 901.894.747-7
Atn.: Rep. Legal MAURICIO ANDRES GONZALEZ JARAMILLO
Correo: consorciocivilessas@gmail.com
Calle 26C No. 43A-26 Barrio Buque
Integrante **CONSORCIO INTER CIVARA** - Participación: 80%
La Ciudad

VARA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 901.206.076-3
Atn.: Rep. Legal DIANA MILENA VELÁSQUEZ CASTRO
Correo: varasas73@gmail.com
Calle 47 BIS No. 28-36 Piso 2
Integrante **CONSORCIO INTER CIVARA** - Participación: 20%
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 076 DE 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALC SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALC PLUVIAL DE ÁREAS DE DRENAJE DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR - CLL 15 Y CORREDORES VIALES CRAS 43 Y 39 CON DESCARGA A CAÑO BUQUE, TAMBIÉN SECTORES PERTENECIENTES A LAS COMUNA 6 Y 7 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

Asunto: Citación comité técnico contrato de la referencia.

Cordial saludo;

Desde la Coordinación de Interventoría de EDESA S.A. E.S.P., en el marco del acompañamiento al Contrato de Interventoría No. 076 de 2025, y teniendo en cuenta el informe semanal del 05 al 10 de enero de 2026 (anexo a la presente) presentado por el profesional de apoyo a la supervision, para lo cual esta coordinación de interventoria ve

con gran preocupación que a la fecha del mencionado informe no se evidencia ningun avance durante dicha semana, además de lo anterior la obra presenta un *RETRASO* del **56%** en la ejecución de las actividades programadas, y con fecha de terminacion el próximo 28 de enero de 2026 según acta de inicio suscrita, faltando tan solo diez (10) dias calendario para la terminacion de las obras objeto de la interventoría, para lo cual solicitamos de su presencia tanto del Representante Legal e integrantes del **CONSORCIO INTER CIVARA**, a un comité técnico para el proximo miercoles 21 de enero de 2026 a las 09:00 AM en las instalaciones de EDESA S.A. E.S.P., cabe resaltar que en dicho comité se debe contar con la participación del equipo de profesionales que forman parte integral de la propuesta presentada a la entidad.

Por ultimo, informarles que dicho comité es indelegable para lo cual esperamos contar con su presencia.

Agradecemos la atención al presente escrito.

Cordialmente,

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
EDESA S.A. E.S.P.

ANEXO: INFORME SEMANAL DEL 05 AL 10 DE ENERO DE 2026 - EN CUATRO (4) FOLIOS.

Firma	
Nombre:	Ing. Eimar Adrián Velásquez Gutiérrez
Cargo:	CPS-006 DE 2026
	Proyectó

Villavicencio, 21 de Enero de 2026 E.170.4.0012.2026

Señores:
CONSORCIO INTER CIVARA
NIT. 901.965.543-7
Atn.: Rep. Legal HENRY GUTIÉRREZ CÉSPEDES
Correo: consorciointercivara@gmail.com
Calle 26C No. 43A-26 Barrio Buque
La Ciudad

CONSORCIO CIVILES S.A.S.
NIT. 901.894.747-7
Atn.: Rep. Legal MAURICIO ANDRES GONZALEZ JARAMILLO
Correo: consorciocivilessas@gmail.com
Calle 26C No. 43A-26 Barrio Buque
Integrante **CONSORCIO INTER CIVARA** - Participación: 80%
La Ciudad

VARA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT. 901.206.076-3
Atn.: Rep. Legal DIANA MILENA VELÁSQUEZ CASTRO
Correo: varasas73@gmail.com
Calle 47 BIS No. 28-36 Piso 2
Integrante **CONSORCIO INTER CIVARA** - Participación: 20%
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 076 DE 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALC SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALC PLUVIAL DE ÁREAS DE DRENAJE DE LA AVENIDA CIRCUNVALAR - CLL 15 Y CORREDORES VIALES CRAS 43 Y 39 CON DESCARGA A CAÑO BUQUE, TAMBIÉN SECTORES PERTENECIENTES A LAS COMUNA 6 Y 7 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

Asunto: Reprogramación comité técnico contrato de la referencia.

Cordial saludo;

Desde la Coordinación de Interventoría de EDESA S.A. E.S.P., en el marco del acompañamiento al Contrato de Interventoría No. 076 de 2025, y teniendo en cuenta el informe semanal del 05 al 10 de enero de 2026 (anexo a la presente) presentado por el profesional de apoyo a la supervision, para lo cual esta coordinación de interventoria ve

con gran preocupación que a la fecha del mencionado informe no se evidencia ningun avance durante dicha semana, además de lo anterior la obra presenta un *RETRASO* del **56%** en la ejecución de las actividades programadas, y con fecha de terminacion el próximo 28 de enero de 2026 según acta de inicio suscrita, faltando tan solo ocho (8) dias calendario para la terminacion de las obras objeto de la interventoría, para lo cual solicitamos de su presencia tanto del Representante Legal e integrantes del **CONSORCIO INTER CIVARA**, a un comité técnico para el dia de mañana jueves 22 de enero de 2026 a las 02:00 PM en las instalaciones de EDESA S.A. E.S.P., cabe resaltar que en dicho comité se debe contar con la participación del equipo de profesionales que forman parte integral de la propuesta presentada a la entidad.

Por ultimo, informarles que dicho comité es indelegable para lo cual esperamos contar con su presencia.

Agradecemos la atención al presente escrito.

Cordialmente,

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
EDESA S.A. E.S.P.

ANEXO: INFORME SEMANAL DEL 05 AL 10 DE ENERO DE 2026 - EN CUATRO (4) FOLIOS.
C.C. Ing. VIVIANA DEL PILAR VALDES DIAZ - CPS 075 DE 2025 - APOYO A LA SUPERVISIÓN.

Firma	
Nombre:	Ing. Elmar Adrián Velásquez Gutiérrez
Cargo:	CPS-006 DE 2026
	Proyectó

Villavicencio, 22 de Enero de 2026

E.170.4.0014.2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL MONTECRISTO
NIT. 901.621.219-9
Rep. Legal JUAN CARLOS PRIETO
Correo: ut.montecristo@gmail.com
Calle 38 No. 32-41 oficina 404 Barrio Centro
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 102 de 2022, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTAMENTO DEL META".

Asunto: Observaciones Trámite Recibo Final de Interventoría.

Cordial Saludo:

De manera atenta, desde la Coordinacion de Interventoria de EDESA S.A. E.S.P., en el marco del acompañamiento al Contrato de Interventoría No. 102 de 2022, se permite hacer devolución del trámite de Recibo Final del contrato citado en la referencia, teniendo en cuenta que en la verificación de la documentación presentada se generaron observaciones las cuales corresponden a:

OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

1. En el Formato IN-FT-69 - LISTA DE CHEQUEO RECIBO DE INTERVENTORÍA, en la fila de INTERV./SUPERV.: se debe incluir el dato N/A, según observaciones plasmadas en el documento.
2. De igual manera en el Formato IN-FT-69 - LISTA DE CHEQUEO RECIBO DE INTERVENTORÍA, en la fila de CONTRATO DE INTERVENTORIA/APOY. SUPERVISIÓN No.: se debe incluir el dato N/A, según observaciones plasmadas en el documento.
3. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 2 de 584, numeral 5.9 AVANCE FINANCIERO DE OBRA, se debe corregir la numeración del contenido.
4. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 3 de 584, numeral 11. PROBLEMAS PRESENTADOS, SOLUCIONES ADOPTADAS Y CONCLUSIONES, se debe corregir la numeración del contenido.
5. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, numeral 3.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA, páginas 11 y 12 de 584, se debe corregir el plazo inicial establecido en el contrato y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de obra, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.
6. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, numeral 3.4 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA páginas 12 y 13 de 584, se debe corregir el plazo inicial establecido en el contrato y a su vez se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de interventoría, para lo cual se adjunta una

copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.

7. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, numeral 4.1 ASPECTOS AMBIENTALES página 14 de 584, se debe corregir el año de suscripción del contrato de obra, según observaciones plasmadas en el documento.
8. De igual manera en el Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, en la página 18 de 584, la fotografía relacionada no corresponde al equipo mencionado.
9. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL página 76 de 584, se debe verificar con el Acta de Recibo Final de obra el valor total ejecutado del proyecto y el porcentaje de avance de obra.
10. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, en la cuadro de avance total acumulado de obra, páginas 76 a 115 de 584, se solicita no dejar espacios en blanco en las unidades, cantidades, valores y porcentajes; según observaciones plasmadas en el documento.
11. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, en la cuadro de avance total acumulado de obra, páginas 76 a 115 de 584, se solicita revisar las cantidades de avance total acumulado, toda vez que en varios items las cantidades ejecutadas superan las cantidades establecidas según el acta de modificación No. 04 del 31 de Mayo de 2024, por consiguiente dichas cantidades no pueden ser mayores a las establecidas según la ultima actualización de cantidades de obra a ejecutar, para lo cual se debe revisar el acta de recibo final de obra para validar dicha información.
12. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, numeral 5.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO, página 139 de 584, se solicita revisar en el item INP-1.6.3.16 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas, ver observaciones plasmadas en el documento.
13. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 194 de 584, se solicita revisar en el item 2.7.2 la unidad de medida establecida en el cuadro, toda vez que se evidencia un error en dicha unidad de medida consignada, ver observaciones plasmadas en el documento.
14. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 196 de 584, se solicita revisar en el item 2.7.6 la unidad de medida establecida en el cuadro, toda vez que se evidencia un error en dicha unidad de medida consignada, ver observaciones plasmadas en el documento.
15. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 197 de 584, se solicita revisar en el item 2.7.7 la unidad de medida establecida en el cuadro, toda vez que se evidencia un error en dicha unidad de medida consignada, ver observaciones plasmadas en el documento.
16. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 237 de 584, se solicita revisar en el item 2.4.13 el porcentaje (%) ejecutado establecido en el cuadro, toda vez que se evidencia un error en dicho cálculo del porcentaje ejecutado, ver observaciones plasmadas en el documento.
17. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 238 de 584, se solicita revisar en el item 3.2.1 el porcentaje (%) ejecutado establecido en el cuadro, toda vez que se evidencia un error en el símbolo porcentaje, ver observaciones plasmadas en el documento.
18. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 240 y 241 de 584, se solicita revisar en los items INP 3.2.6-C e INP 3.2.7 el porcentaje (%) ejecutado establecido en el cuadro, toda vez que falta el símbolo porcentaje (%), ver observaciones plasmadas en el documento.
19. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 248 y 249 de 584, se solicita revisar en los items INP 3.6.3-C, 3.7.2 e INP 3.7.3-C la unidad de medida establecida en el cuadro, toda vez que se evidencia un error en dicha unidad de medida consignada, ver

observaciones plasmadas en el documento.

20. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 251 de 584, se solicita revisar en los items 3.8.3 e INP 3.8.4-C la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, cantidad ejecutada y % ejecutado, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas, ver observaciones plasmadas en el documento.
21. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 253 y 254 de 584, se solicita revisar en los items INP 3.8.8-E y 3.9.1 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, cantidad ejecutada y % ejecutado, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas, ver observaciones plasmadas en el documento.
22. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 256 de 584, se solicita revisar en el item INP 3.9.8-E la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, cantidad ejecutada y % ejecutado, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas, ver observaciones plasmadas en el documento.
23. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, una vez revisado el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, se evidencia que en la página 256 de 584, falta el detalle del item INP-3.9.9-C denominado ESCALERA TIPO GATO.
24. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 266 y 267 de 584, se solicita revisar en los items INP 4.2.1.6-E e INP 4.1.2.7 la unidad de medida establecida en el cuadro, toda vez que se evidencia un error en dicha unidad de medida consignada, ver observaciones plasmadas en el documento.
25. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 282 de 584, se solicita revisar en el item INP 4.1.7.3 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencia error en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, de igual manera se debe corregir la unidad de medida de dicho item, ver observaciones plasmadas en el documento.
26. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 291 de 584, se solicita cambiar la fotografía relacionada en el item 4.2.4.1, toda vez que la fotografía no corresponde a la actividad mencionada, ver observaciones plasmadas en el documento.
27. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 292 de 584, se solicita cambiar la fotografía relacionada en los items 4.2.5.1 y 4.2.6.1, toda vez que la fotografía no corresponde a la actividad mencionada, ver observaciones plasmadas en el documento.
28. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 305 de 584, se solicita revisar en el item INP 4.2.7.3 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencia error en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
29. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 308, 309, 310, 311, y 312 de 584, se solicita revisar en los items 4.3.6, 4.3.7, 4.3.10, 4.3.11, INP 4.3.13-E, INP 4.3.14-E, INP 4.3.16-E e INP 4.3.17-E la unidad de medida establecida en el cuadro, toda vez que se evidencia un error en dicha unidad de medida consignada, ver observaciones plasmadas en el documento.
30. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 317 de 584, se solicita revisar en el item INP 5.2.9-C la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencia error en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.

31. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 321 de 584, se solicita revisar en el item 5.5.1 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad ejecutada, toda vez que no fue consignada dicha cantidad, ver observaciones plasmadas en el documento.
32. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 324 de 584, se solicita corregir el item 5.6.8, toda vez que no es INP 5.6.8, ver observaciones plasmadas en el documento.
33. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 329 de 584, se solicita cambiar la fotografía relacionada en el item INP 5.6.23, toda vez que la fotografía no corresponde a la actividad mencionada, ver observaciones plasmadas en el documento.
34. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 342 de 584, se solicita revisar en el item 6.3.2 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencia error en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, además de lo anterior la fotografía no corresponde a la actividad mencionada, ver observaciones plasmadas en el documento.
35. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 370 de 584, se solicita revisar en el item 7.4.1 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, cantidad ejecutada y % ejecutado, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
36. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 378 de 584, se solicita revisar en el item 7.7.2 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencia error en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
37. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 382 de 584, se solicita revisar en el item 8.1.2 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencia error en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
38. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 383 de 584, se solicita revisar en el item 8.2.1 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, cantidad ejecutada y % ejecutado, toda vez que se evidencia error en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
39. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 384 de 584, se solicita revisar en los items 8.2.4 e INP 8.2.5-C la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, cantidad ejecutada y % ejecutado, toda vez que se evidencia error en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
40. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 385 y 386 de 584, se solicita revisar en los items 8.3.2, 8.3.3 y 8.3.4 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, cantidad ejecutada y % ejecutado, toda vez que se evidencia error en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
41. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 388, 389, 390 y 391 de 584, se solicita revisar en los items 8.5.1, 8.6.1, 8.6.2, 8.7.1, 8.8.1 y 8.8.3 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, cantidad ejecutada y % ejecutado, toda

vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.

42. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 411 de 584, se solicita revisar en el item 10.4.2 el porcentaje (%) ejecutado establecido en el cuadro, toda vez que se evidencia un error en dicho cálculo del porcentaje ejecutado, ver observaciones plasmadas en el documento.
43. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 413 de 584, se solicita revisar en el item INP 10.5.5-C la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
44. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 417 y 418 de 584, se solicita revisar en los items 11.1.3.2 y 11.1.3.6 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, cantidad ejecutada y % ejecutado, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
45. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 419 de 584, se solicita cambiar la fotografía relacionada en el item INP 11.1.4.2, toda vez que la fotografía no corresponde a la actividad mencionada, ver observaciones plasmadas en el documento.
46. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 423 de 584, se solicita revisar en el item 11.2.1.2 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, toda vez que se evidencia error en dicha cantidad consignada según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
47. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 423, 424, 425, 426 y 427 de 584, se solicita revisar en los items 11.2.2.1, 11.2.2.2, 11.2.2.3, INP 11.2.2.5-C, INP 11.2.2.6-C, INP 11.2.3.3, INP 11.2.3.4-E e INP 11.2.3.5-C la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
48. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 432 de 584, se solicita revisar en el item 11.4.2.1 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final, toda vez que se evidencia error en dicha cantidad consignada según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
49. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 434 de 584, se solicita revisar en el item INP 11.4.2.4-C la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
50. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 436 y 437 de 584, se solicita revisar en los items INP 12.1.3-C, 12.1.4-C y 12.1.5-C la unidad de medida establecida en el cuadro de cada uno de los items mencionados con anterioridad, toda vez que se evidencia un error en dicha unidad de medida consignada, ver observaciones plasmadas en el documento.

51. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 444 de 584, se solicita revisar en el item 12.3.1 el % ejecutado en el cuadro, toda vez que se evidencia error en el calculo de dicho porcentaje ejecutado y a su vez se debe corregir la unidad de medida de dicho item, ver observaciones plasmadas en el documento.
52. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 443 de 584, se solicita revisar en el item 12.3.2 el % ejecutado en el cuadro, toda vez que se evidencia error en el calculo de dicho porcentaje ejecutado, ver observaciones plasmadas en el documento.
53. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 447 de 584, se solicita revisar en el item INP 12.6.1 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
54. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 457 de 584, se solicita incluir fotografía en el item 13.1.17, toda vez que no se evidencia fotografía correspondiente a la actividad registrada, ver observaciones plasmadas en el documento.
55. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 461, 462 y 463 de 584, se solicita revisar en el item 13.2.4, 13.2.6, 13.2.7 y 13.2.9 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, además la unidad de medida no corresponde a la real, ver observaciones plasmadas en el documento.
56. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 469 de 584, se solicita revisar en el item INP 13.5.16-C la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
57. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 479 de 584, se solicita revisar en el item 13.11.1 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
58. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 492 y 493 de 584, se solicita revisar en los items 14.6.2 e INP 14.6.4-C la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
59. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 496 de 584, se solicita revisar en el item 15.1.1 la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.
60. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, páginas 514 y 515 de 584, se solicita revisar en los items INP 15.9.4-C e INP 15.9.7-C la cantidad establecida en el cuadro como cantidad Acta de Recibo Final y cantidad ejecutada, toda vez que se evidencian inconsistencias en dichas cantidades consignadas según el cuadro de actividades y cantidades ejecutadas establecido en el numeral 5.7 AVANCE FISICO FINAL, ver observaciones plasmadas en el documento.

61. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 517 de 584, se solicita revisar en el item 16 la unidad de medida establecida en el cuadro, toda vez que se evidencia un error en dicha unidad de medida consignada, ver observaciones plasmadas en el documento.
62. Formato IN-FT-13 - INFORME DETALLADO, página 584 de 584, se evidencia que falta la firma del Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL MONTECRISTO, ver observaciones plasmadas en el documento.

OBSERVACIONES SST

1. Adjuntar formato IN-FT-11 certificacion de aportes de seguridad social y planillas de seguridad social correspondiente al periodo de enero 2024.
2. El formato IN-FT-11, correspondiente al período de enero, febrero y marzo de 2025, deberá contar con la firma del supervisor correspondiente.
3. La certificacion generada por el contador publico debe indicar la fecha de incio a terminación de las actividades supervisadas,
4. Se debe adjuntar copia de la cedula de ciudadanía del contador publico y actualizar la certificación de la junta de contadores.

OTROS DOCUMENTOS RECIBO FINAL DE INTERVENTORÍA

1. Revisada la documentación según lista de chequeo faltan Planos record en fisico y en medio magnetico, debidamente firmados y aprobados por obra e interventoria.
2. De igual manera falta Acta de Recibo Final en Excel firmada por las partes IN-FT-40 (Obra).
3. En el acta de Recibo final de Interventoría formato IN-FT-27, se debe relacionar la cronología del contrato según el acta de terminación del contrato de interventoría, para lo cual se adjunta una copia de la misma al respaldo de dicho documento para su verificación.
4. De igual manera en cuanto a la fecha del acta de Recibo final de Interventoría formato IN-FT-27, se debe actualizar la fecha de suscripción de la misma.

NOTA: *Se solicita que, una vez realizados los ajustes a las observaciones, se deje detrás de cada hoja corregida, la hoja con el error, para poder verificar la información.*

Agradezco su atención.

Cordialmente,

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
EDESA S.A. E.S.P.

Firma		Firma	
Nombre:	Ing. Elmar Adrian Velásquez Gutiérrez	Nombre:	Eliana María Uribe Baquero
Cargo:	CPS-006 DE 2026	Cargo:	Profesional Esp. SST
Proyectó		Revisó	

Villavicencio, 22 de Enero de 2026

Ingeniera:
MIRIAN NEISE PASTRAN MORENO
Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.
La Ciudad

Referencia: Contrato de Interventoría No. 111 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META".

Asunto: Certificación de cumplimiento experiencia cambio Auxiliar de Ingeniería y Profesional en Salud ocupacional de Interventoría Contrato de la referencia.

Cordial saludo Respetada Ingeniera:

Teniendo en cuenta el desarrollo de actividades del contrato de Interventoría No. 111 de 2024 y cumpliendo con el sistema de gestión documental de la entidad contratante, todos aquellos que hacen parte del proceso. La Coordinadora de Interventorías certifica el cumplimiento de la experiencia para el cambio del Auxiliar de Ingenieria y Profesional en salud ocupacional para ejecutar el contrato de la referencia, de acuerdo a los requisitos exigidos en los estudios previos y la documentación entregada por el contratista de Interventoría mediante radicado No. 0088 del 22 de enero de 2026, basándose en el principio de la buena fé, se relacionan a continuación:

De acuerdo a lo establecido en la Solicitud de Única Oferta No. 114 de 2024 del presente proceso, se describen los requisitos mínimos que debe cumplir el Residente de Interventoría para el personal mínimo de interventoría:

3.4.3.1.Planta equipo principal mínima de personal profesional

El perfil requerido para cada integrante del equipo mínimo será el siguiente:

CARGO	CANTIDAD	MESES	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	11	50%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1	8	100%
INGENIERO SANITARIO O AMBIENTAL	1	4	5%
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	4	5%
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA	1	8	10%
INGENIERO ELÉCTRICO Y/O MECANICO Y/O ELECTROMECÁNICO Y/O ELECTRÓNICO	1	4	5%
INGENIERO QUÍMICO	1	2	10%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	4	10%
INGENIERO DE COSTOS, PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	1	8	5%
ABOGADO	1	4	10%
CONTADOR	1	11	10%
AUXILIAR DE INGENIERIA	1	8	50%
PERSONAL TECNICO			
TOPOGRAFO INSPECTOR	1	4	50%
INSPECTOR DE OBRA	1	8	50%
LABORATORISTA INSPECTOR	1	1	20%

CARGO	CANTIDAD	MESES	DEDICACION
PERSONAL ADMINISTRATIVO			
SECRETARIA	1	8	50%
PERSONAL AUXILIAR TECNICO			
CADENERO 1	1	4	50%
CADENERO 2	1	4	50%
CONDUCTOR	1	6	50%

Nota: Entendiendo que, en la proyección del presupuesto del presente proceso, al ser realizado por el municipio, no se tuvo en cuenta el perfil para el cargo de Topógrafo, por ende, a pesar de estar determinado por *Estudio del Sector*, no es posible solicitarlo al no estar contemplado ni presupuestado inicialmente.

El personal requerido para el desarrollo de la interventoría deberá cumplir con la dedicación exigida y con una experiencia general y especifica de acuerdo con los siguientes requerimientos según aplique para los profesionales descritos en el cuadro anterior, dejando claro que los que no estén mencionados no hacen parte del equipo de trabajo.

- ✓ **AUXILIAR DE INGENIERÍA**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P.
EDESA S.A. E.S.P.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 111 DE 2024

VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL $288.430.302,00 - Equivalente a 229,56 SMMLV

PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA		
YASSER ESNEIDER CASALLAS CARRANZA	AUXILIAR DE INGENIERÍA	50%	Ingeniero Civil	5,88 años (calculada desde la fecha de expedición de su matrícula profesional, 29 de enero de 2020 hasta la fecha de la carta de intención, 21 de enero de 2026)	CERTIFICACIÓN:	PRIAR S.A.S.	
					OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE URIBE, DEPARTAMENTO DEL META".	
					CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERÍA	
					FECHA DE INICIO:	30/12/2020	1,44 Años
					FECHA DE TERMINACIÓN:	31/05/2022	
					VR CONTRATO:	$7.284.213.199,71	7.284,21 SMMLV
					CERTIFICACIÓN:	PRIAR S.A.S.	
					OBJETO:	"MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL BARRIO PINARES EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META".	
					CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERÍA	
					FECHA DE INICIO:	29/10/2020	0,17 Años
					FECHA DE TERMINACIÓN:	29/12/2020	
					VR CONTRATO:	$5.321.326.669,25	6.062,10 SMMLV
					CERTIFICACIÓN:	CONSORCIO INTERJIREH	
					OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VÍA MITÚ - MONFORTH, QUINTA ETAPA, MUNICIPIO DE MITU Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLACA HUELLA EN LA VÍA TARAIRA - PUERTO ALEGRIA, MUNICIPIO DE TARAIRA, DEPARTAMENTO DEL VAUPES".	
					CARGO:	AUXILIAR DE INGENIERÍA	
					FECHA DE INICIO:	3/02/2020	0,67 Años
					FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2020	
					VR CONTRATO:	N/A	N/A

OBSERVACIONES:	DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA EL PROFESIONAL PROPUESTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LA SOLICITUD DE UNICA OFERTA No. 114 DE 2024 Y SE APRUEBA HOJA DE VIDA.

✓ **PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. E.S.P.
EDESA S.A. E.S.P.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 111 DE 2024
VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL $298.430.902,00 - Equivalente a 229,56 SMMLV

PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

PROFESIONAL	CARGO	DEDICACIÓN	PROFESION	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA		
ANA SOLANYI JIMENEZ SANTAMARIA	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	100%	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	7,53 años (calculada desde la fecha de expedición de su licencia profesional, 10 de julio de 2018 hasta la fecha de la carta de intención, 21 de enero de 2026)	CERTIFICACIÓN:	UNIÓN TEMPORAL INTER-PTAP LEJANIAS	
					OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE FUENTE ALTERNA DE SUMINISTRO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEJANIAS".	
					CARGO:	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL (HSEQ)	
					FECHA DE INICIO:	1/09/2022	0,42 Años
					FECHA DE TERMINACIÓN:	31/01/2023	
					VR CONTRATO:	$ 767.803.071,00	661,90 SMMLV
OBSERVACIONES:	DE CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA, EL PROFESIONAL PROPUESTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LA SOLICITUD DE UNICA OFERTA No. 11 DE 2024 Y DE IGUAL MANERA TENIENDO EN CUENTA EL ACTA MODIFICATORIA No. 02 DEL 04 DE JUNIO DE 2025, EN LA CUAL SE INCORPORA EL PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL PARA ATENDER TODAS LAS FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO, PARA LO CUAL LA EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL, SE REALIZA SOBRE EL PERFIL ESTABLECIDO PARA EL CARGO DEL INGENIERO AMBIENTAL O SANITARIO, PERO CON FUNCIONES EN SALUD OCUPACIONAL, TODA VEZ QUE EL TIEMPO ESTABLECIDO PRESUPUESTAL PARA EL INGENIERO AMBIENTAL O SANITARIO YA FUE SUPERADO; Y SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ACTA MODIFICATORIA No. 02 DEL 04 DE JUNIO DE 2025, LO QUE RESTA DEL PLAZO CONTRACTUAL REQUIERE DEL ACOMPAÑAMIENTO UNICAMENTE DEL PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL DE LA INTERVENTORÍA Y SE APRUEBA HOJA DE VIDA.						

Lo anterior se certifica con el fin de dar inicio a las actividades contractuales por parte de los profesionales presentados para los cargos de Auxiliar de Ingeniería y Profesional en Salud Ocupacional de Interventoría.

Cordialmente;

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
EDESA S.A. E.S.P.

Firma	
Nombre:	Ing. Elmar Adrián Velásquez Gutiérrez
Cargo:	CPS-006 DE 2026
Proyectó	

Villavicencio, 23 de Enero de 2026 E.170.4.0016.2026

Señores:
CONSORCIO INACUM
NIT. 902.017.479-0
Atn.: Rep. Legal JUAN CARLOS LOZANO LEON
Contratista de Interventoría
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 135 DE 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CHINATA SECTOR LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META".

Asunto: Solicitud Información canales de comunicación para notificaciones contrato de la referencia.

Cordial saludo;

Desde la Coordinación de Interventoría de EDESA S.A. E.S.P., en el marco del acompañamiento al Contrato de Interventoría No. 135 de 2025, me permito solicitar se dé a conocer los canales de comunicación por parte del **CONSORCIO INACUM**, para notificaciones directas relacionadas con el Contrato de Interventoría No. 135 de 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CHINATA SECTOR LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META", dicha información es la siguiente:

- ✓ Persona de contacto.
- ✓ Numero de contacto telefónico.
- ✓ Direccion de correspondencia.
- ✓ Correo electrónico.

Agradecemos la atención al presente escrito.

Cordialmente,

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
EDESA S.A. E.S.P.

Firma	
Nombre:	Ing. Eimar Adrián Velásquez Gutiérrez
Cargo:	CPS-006 DE 2026
	Proyectó

Villavicencio, 23 de Enero de 2026

E.170.4.0017.2026

Señores:
CONSORCIO INACUM
NIT. 902.017.479-0
Atn.: Rep. Legal JUAN CARLOS LOZANO LEON
Contratista de Interventoría
La Ciudad

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 135 DE 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CHINATA SECTOR LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META".

Asunto: Respuesta oficio No. CE-CO-117-2025-01-2026 de fecha 22 de enero de 2026.

Cordial saludo;

Desde la Coordinación de Interventoría de EDESA S.A. E.S.P., en el marco del acompañamiento al Contrato de Interventoría No. 135 de 2025, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA CHINATA SECTOR LOMA LINDA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LLERAS - META", me permito informar que es la interventoría externa la encargada de avalar y/o aprobar el diseño de la valla informativa, la cual debe cumplir con los parámetros establecidos en la Resolución 090 de fecha 28 de Febrero de 2025.

Agradecemos la atención al presente escrito.

Cordialmente,

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
EDESA S.A. E.S.P.

Firma	
Nombre:	Ing. Elmar Adrián Velásquez Gutiérrez
Cargo:	CPS-006 DE 2026
	Proyectó

Villavicencio, 23 de enero de 2026 I.170.4.0019.2026

Ingeniera:
MIRIAN NEISE PASTRAN MORENO
Gerente
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.
La Ciudad

Asunto: Viabilidad Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1 contrato de la referencia.

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 104 DE 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO EL RUBÍ DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA - META".

Cordial saludo:

Por medio de la presente me permito dar viabilidad a la solicitud de Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. 104 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO EL RUBÍ DEL MUNICIPIO DE LA MACARENA - META", toda vez que se realizó la revisión de la documentación por parte del coordinador de interventorias y se viabilizó la Ampliación No. 1 de la Suspensión No. 1 del contrato con el fin de continuar con el seguimiento y control que trata el objeto contractual tal como se menciona en la minuta del Contrato de Interventoría No. 104 de 2024.

Lo anterior, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el contratista de obra, en el cual expresan la necesidad de Ampliar la suspensión No. 1 del Contrato de Obra No. 105 de 2024, debido a las siguientes causales:

". Durante la fase de ejecución del proyecto objeto de interventoría, se identificó una condición no prevista en los estudios y diseños iniciales, consistente en la existencia de un puente vehicular ubicado en el sitio proyectado para la construcción de la bocatoma. Esta situación imprevista afecta directamente el desarrollo de las actividades de obra, al requerir la modificación de las cantidades y especificaciones técnicas con el fin de garantizar la funcionalidad del sistema de captación y el cumplimiento del objeto contractual.

En la modificación No.1 de mayores y menores cantidades e inclusión de Items no previstos al contrato de obra No. 105 de 2024, radicada ante la entidad el 13 de junio de 2025 mediante oficio INT-2025-035, la Secretaría Técnica del OCAD PAZ realiza la verificación de la lista de requisitos para el registro de ajuste 130101-OCAD PAZ fecha de la revisión 23 de julio de 2025, Anuncio Visita de seguimiento proyecto BPIN 20221301010228 - LA MACARENA, META - ACUEDUCTO EL RUBI - solicitud de ajuste fecha 25 de julio de 2025, se realiza la visita en el centro poblado El Rubí, municipio de La Macarena, Meta el día 29 de julio de 2025, se entrega el informe de visita de seguimiento a proyectos de inversión financiados por el SGR el día 12 de agosto de 2025, se realiza la nuevo la entrega de la modificación

No.1 de mayores y menores cantidades e inclusión de ítems no previstos al contrato de obra No. 105 de 2024, radicada ante la entidad el 23 de septiembre de 2025 mediante oficio INT-2025-049 y se aprueba el día 7 de octubre de 2025.

En atención a la modificación No. 2 y adición No. 1 al contrato de obra, radicada ante la Secretaría Técnica del OCAD PAZ el 20 de noviembre de 2025 mediante oficio INT-2025-055, se realiza la revisión de la documentación y se procede a la devolución mediante oficio E.170.001.2026 de fecha 7 de enero de 2026 la Entidad Contratante solicitó al contratista de obra la subsanación de observaciones técnicas formuladas a dicha modificación, se realiza la entrega de la documentación subsanada mediante el oficio INT-RUBI-058 radicado el día 22 de enero de 2026, el cual actualmente se encuentran en proceso, por lo anterior no ha sido posible culminar el trámite de aprobación dentro del término correspondiente a la Suspensión No. 1. En consecuencia, y con el fin de garantizar la correcta ejecución del contrato, el cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema General de Regalías y la imposibilidad técnica y jurídica de reanudar actividades sin la aprobación previa de la modificación, se justifica la ampliación No. 1 de la suspensión No. 1 del contrato de obra por un término de dos (2) meses contados a partir del 25 de enero de 2026 hasta el 24 de marzo de 2026, para proceder con la aprobación definitiva de la modificación del proyecto por parte del OCAD PAZ.

En atención a lo anterior, y considerando que la ejecución de la obra y, por consiguiente, las actividades de interventoría, se encuentran supeditadas a la aprobación de la modificación presentada, se hace necesario ampliar la suspensión del Contrato de Interventoría No. 104 de 2024, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, la correcta ejecución técnica del proyecto y el uso adecuado de los recursos del Sistema General de Regalías.

Por lo tanto, se solicita la AMPLIACIÓN No. 1 DE LA SUSPENSIÓN No. 01 DEL CONTRATO No. 104 DE 2024 (Ampliación No.1 de la Suspensión No. 01), por un término de dos (2) meses calendario contados a partir del 25 de enero de 2026 hasta el 24 de marzo de 2026 o hasta tanto se culmine el trámite de aprobación de la modificación ante el OCAD PAZ."

Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita la autorización para la Ampliación No 1 de la Suspensión No. 1 del Contrato de Interventoría No. 104 de 2024, por un periodo de DOS (2) MESES, contados a partir del día 25 de enero de 2026 y hasta el 24 de marzo de 2026, ya que esta es la encargada del control y vigilancia técnica, administrativa y financiera del contrato de obra.

Cordialmente;

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría

Firma	
Nombre	Ing. Edgar Adrián Velásquez Gutiérrez
Cargo	CPS-095-2026
Proyectó	

Villavicencio, 03 de marzo de 2026

El Suscrito Coordinador de Interventorías en calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios N° 006 del 2026, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META - EDESA S.A. E.S.P.", mediante el apoyo a la Gestión de Supervisión de la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. - EDESA S.A. E.S.P.

CERTIFICA

Que el contrato de orden de prestación de servicios N° 006 del 2026, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META - EDESA S.A. E.S.P.", mediante el apoyo a la Gestión de Supervisión de la Empresa de Servicios Públicos del Meta S.A. E.S.P. - EDESA S.A. E.S.P., cumple con los pagos de salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo con los soportes presentados durante el periodo comprendido entre (01/ENERO/2026) al (31/ENERO/2026) y los mismos fueron liquidados conforme a la propuesta económica aprobada por EDESA S.A. E.S.P. y verificados por la Profesional de Apoyo SST de la Dirección Técnica Operativa.

VALOR TOTAL CONTRATO	TIEMPO EJECUCIÓN	VALOR MENSUAL	IBC COTIZACION 40%	SALUD 12,5%	PENSION 16%	ARL 2,436 %	N° planilla
$20.000.000,00	CUATRO (4) MESES	$5.000.000,00	$2.100.000,00	$262.500,00	$336.000,00	$51.200,00	9499760358 Enero de 2026

Lo anterior dando cumplimiento al artículo 2.2.4.3.2 Obligatoriedad de las cotizaciones, Decreto1072 de 2015.

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventorías
Supervisor

Vo.Bo: _____
Eliana María Uribe Baquero
Profesional SST Edesa

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86075095		VELASQUEZ GUTIERREZ EIMAR ADRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 B 15 02 MZ 4 CS 11 CONJ R VISCAYA	VILLAVICENCIO-META	6651954	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	78220720	9499760358	I	2026/02/23	2026/02/20	NEQUI	0	$649,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	86075095	VELASQUEZ GUTIERREZ EIMAR ADRIAN	X																	230201	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$262,500		0	$0	$0	14-11	30	$2,100,000	$51,200	0	$0	$0	No	$649,700
Total	**Afiliados(1)**																						$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$262,500			$0	$0			$2,100,000	$51,200		$0	$0		$649,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 86075095		VELASQUEZ GUTIERREZ EIMAR ADRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 4 B 15 02 MZ 4 CS 11 CONJ R VISCAYA	VILLAVICENCIO-META	6651954	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	78220720	9499760358	I	2026/02/23	2026/02/20	NEQUI	0	$649,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$336,000	$0	$0	$336,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$336,000	$0	$0	$336,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$51,200	$0	$0	$51,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$51,200	$0	$0	$51,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,500	$0	$0	$262,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$262,500	$0	$0	$262,500
TOTAL				1	$649,700	$0	$0	$649,700

ACTAS DE COMITÉ

ACTA No.
FECHA: 19 DE ENERDO DE 2026
HORA: 11:00 AM
LUGAR: EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-URIBE 2025
No. CONTRATO INTERVENTORIA: 111 DE 2024

CONTRATO No.	110 DE 2024
OBJETO	"AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE – META"
CONTRATISTA	CONSORCIO PTAP URIBE
VALOR	$ 3.730.373.180,00
PLAZO	ONCE (11) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	26 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	14 DE ENERO DE 2026
PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	20 DE MARZO DE 2026
%EJECUCION A LA FECHA	40, 12 %

DESARROLLO DEL COMITÉ

INFORME DE INTERVENTORIA:

Inicia el Ing Michell Fierro Director de interventoría manifestando que la obra a la fecha presenta un atraso del 2% aproximadamente lo cual no es significativo pero para este mes el avance según la programación aumenta significativamente.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

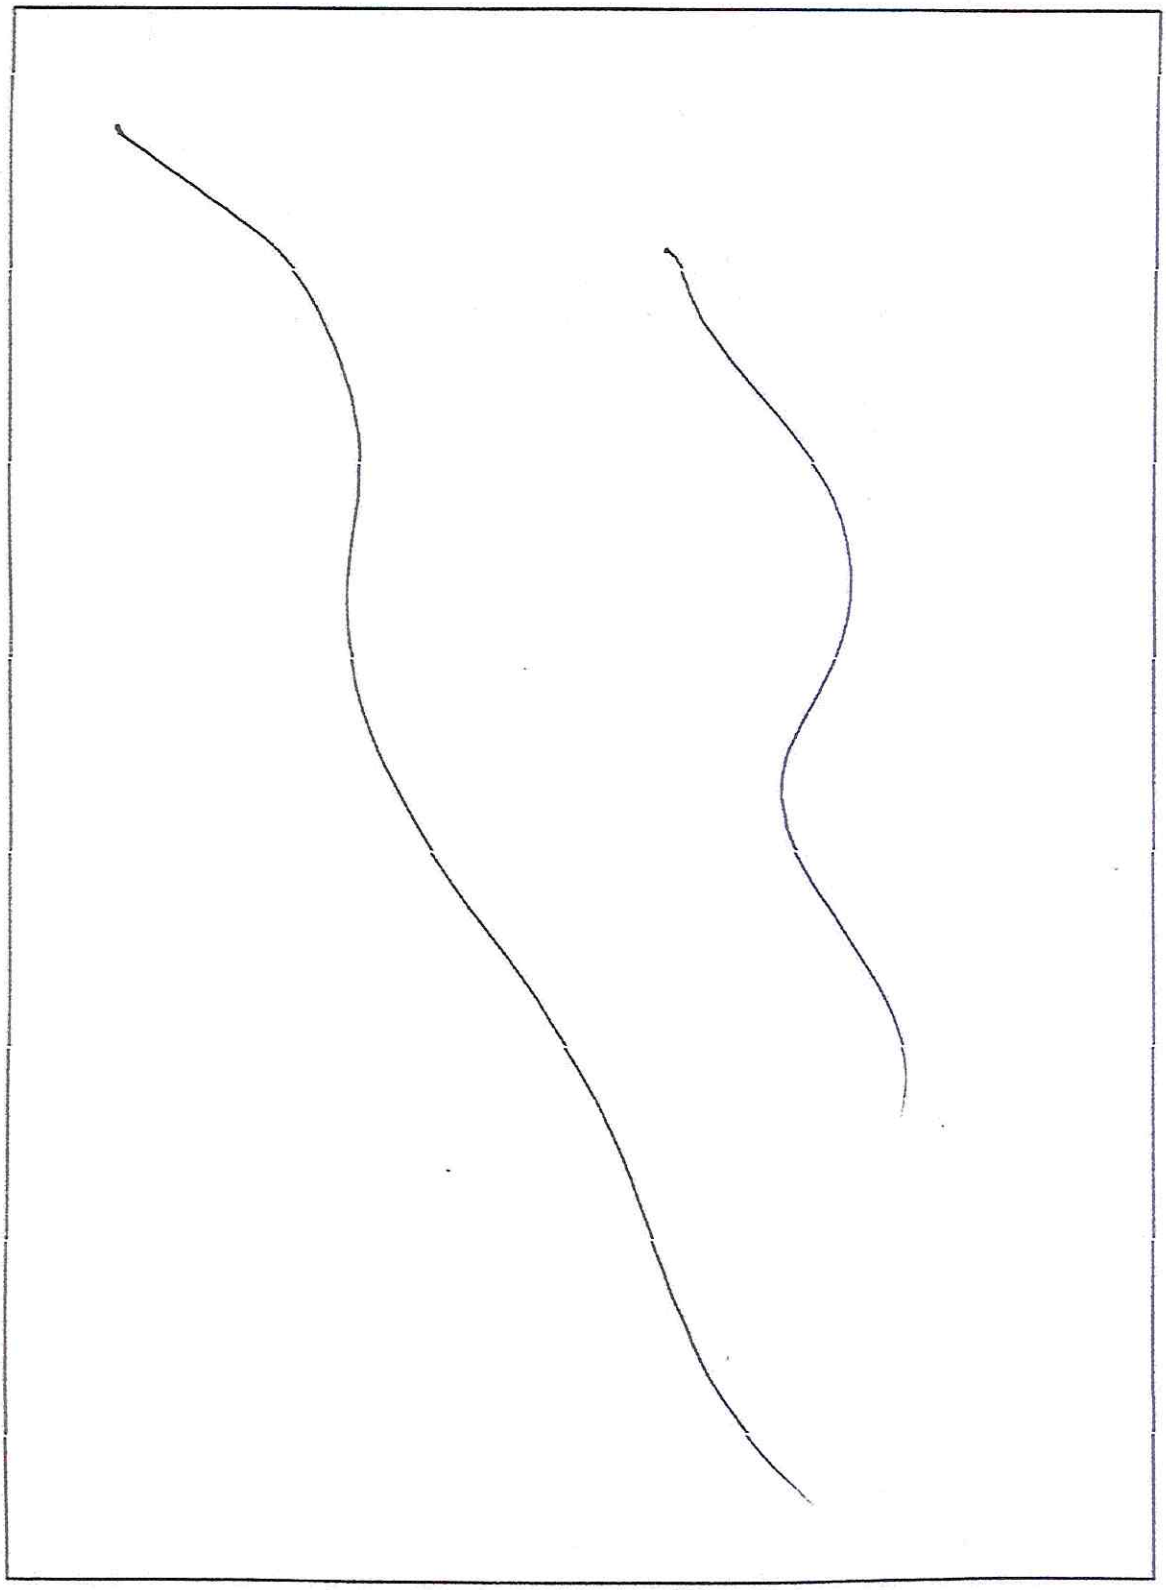

INFORME DEL CONTRATISTA:

El contratista de Obra manifiesta que ya se tiene comprado gran parte del suministro de la iluminación, y que hará llegar las ordenes de operación y cartas de despacho por parte de los proveedores.

En la actualidad se esta realizando un balance al contrato que se espera radicar en quince (15) días aproximadamente

El contratista manifiesta que hay unas inconsistencia en los Apu. referente a las cantidades que se contemplan y con el fin de tener una mayor claridad se elevara la consulta hasta la Consultoria.

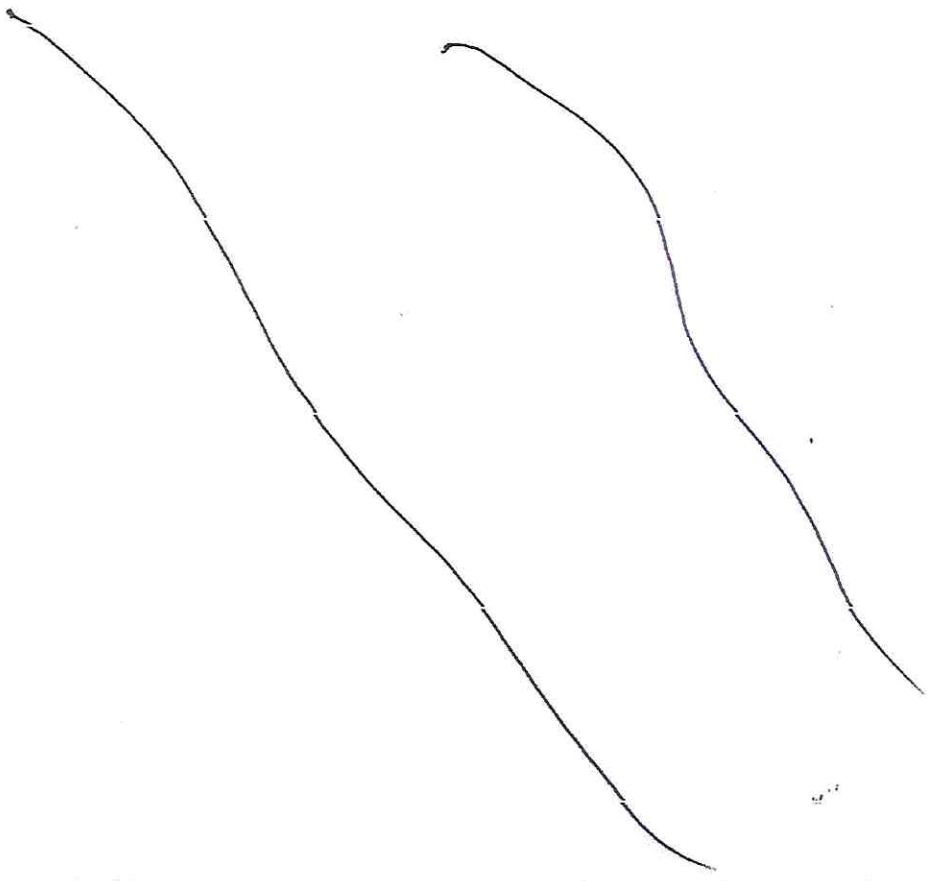

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA D.T.O.	RESPONSABLES
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	
Entrega Informe Mensual Nov - Miercoles 21 Enero	Contratista Obra
Entrega Informe Mensual Dic - Jueves 22 Ene	Contratista Obra
Entrega polizas de reinicio - Jueves 22 Ene	Contratista Obra
Entrega Informe Mesual Dic - Martes 27 Ene	Interventoria
Balance de Obra - 2 febrero	Contratista Obra

Asistencia

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Michel Fierro	Dir. interventoria	[illegible]
[illegible]	R.L. [illegible]	[illegible]
Omar Adrian Velazquez	Apoyo Coordinación Interv.	[illegible]
Alix Milena Castro C	coord. Interventoria	[illegible]
Alejandro Diez	Residente Interventoría	[illegible]

Powered by CamScanner

ACTA No.
FECHA: 29 DE ENERDO DE 2026
HORA: 10:00 AM
LUGAR: PTAP URIBE
INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-URIBE 2025
No. CONTRATO INTERVENTORIA: 111 DE 2024

CONTRATO No.	110 DE 2024
OBJETO	"AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE – META"
CONTRATISTA	CONSORCIO PTAP URIBE
VALOR	$ 3.730.373.180,00
PLAZO	ONCE (11) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION	26 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE SUSPENSION	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	14 DE ENERO DE 2026
PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	20 DE MARZO DE 2026
%EJECUCION A LA FECHA	41, 64 %

DESARROLLO DEL COMITÉ

INFORME DE INTERVENTORIA:

Inicia la intervención el Ing Michell Fierro director de Interventoría haciendo mención respecto al avance de la obra, que para el presente mes se espera el avance en el tema de suministros, que se está a la espera de la entrega de la modificación que quedó como compromiso para el día 2 de febrero de 2026. De igual forma que se reitera la entrega de las programaciones de entrega por parte de los proveedores. Se hace la salvedad que quedan menos de dos meses de ejecución y se requiere aumentar los frentes de trabajo para cumplir con los tiempos del contrato

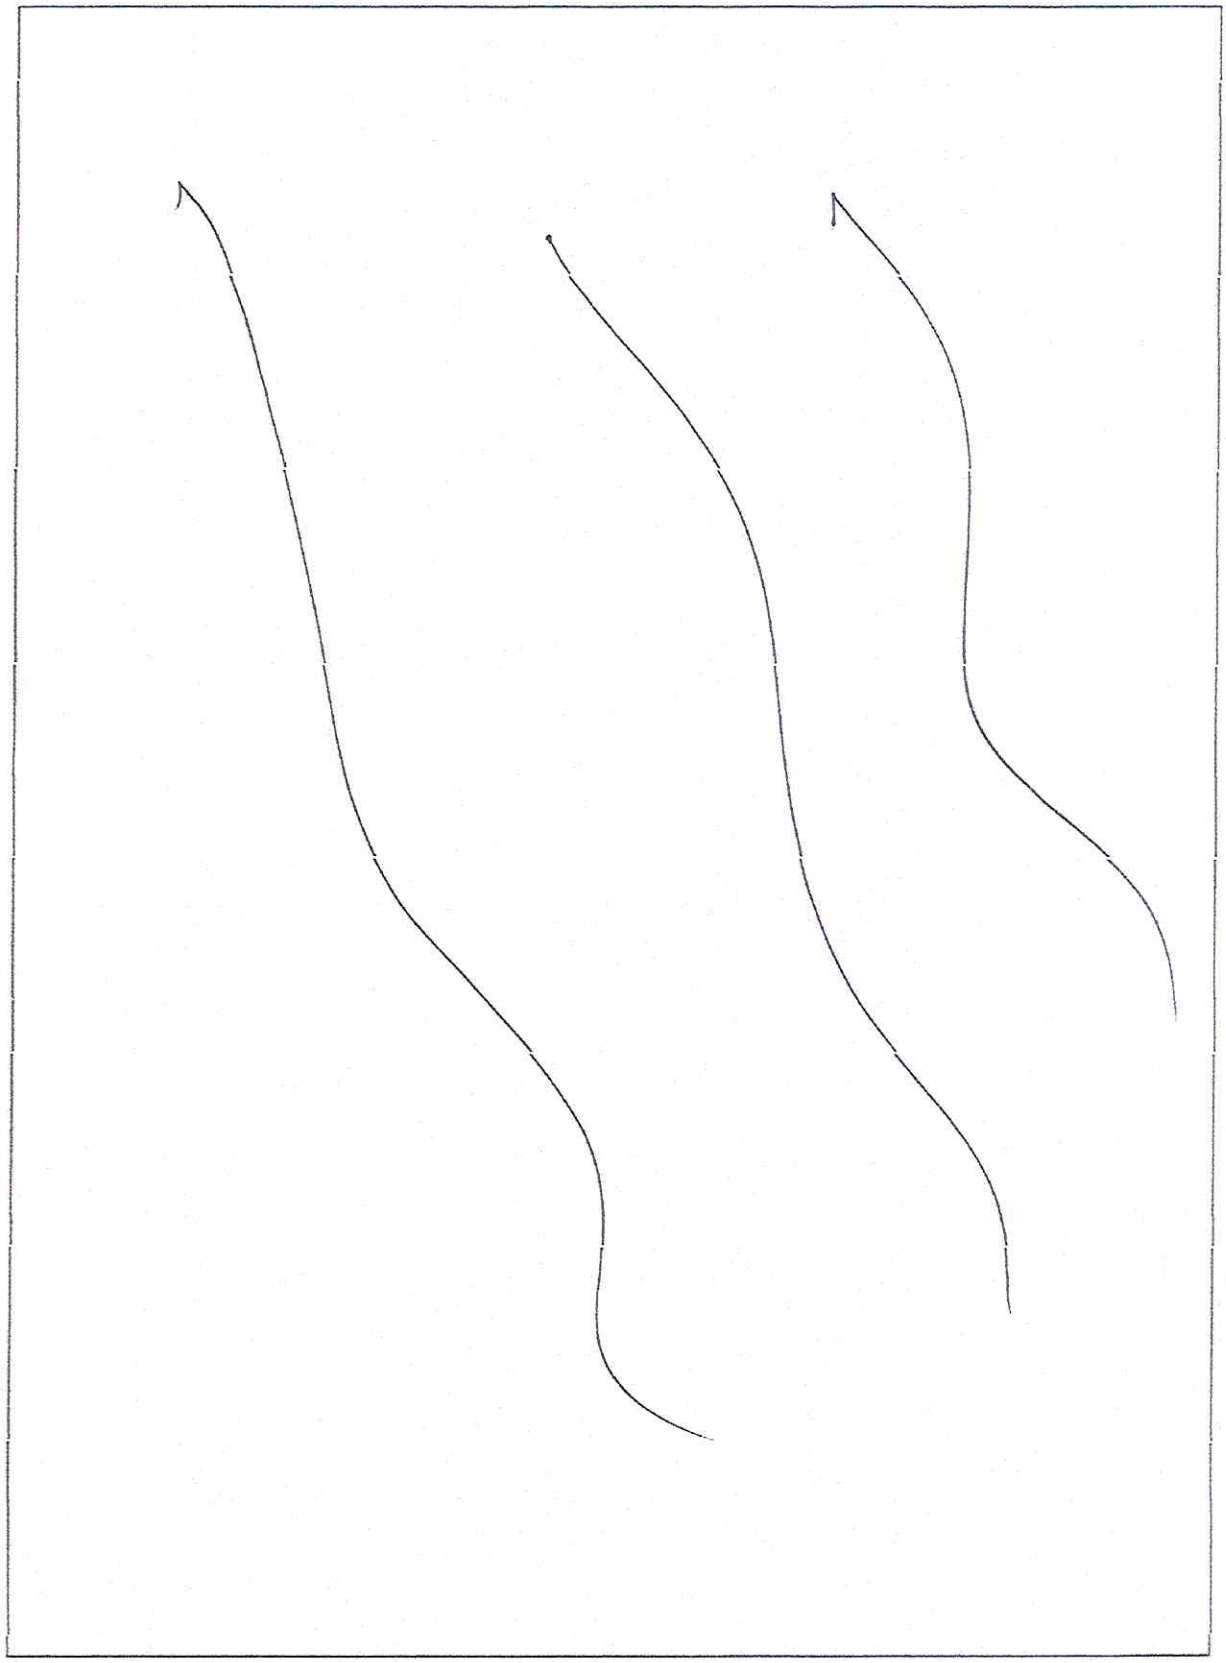

INFORME DEL CONTRATISTA:

Inicia el recorrido por los techos de secado, donde se encuentra finalizada la obra civil, se hace mención que se está a la espera de las cartas por parte de los proveedores para dar contestación al oficio remitido por la interventoría. Se indica que la proxima semana inician a llegar los luminarias y parte de los suministros, lo cual genera un avance significativo del contrato.

Se procede a ir a la revisión de los acabados del concreto donde se evidencio que ya se realizo la correccion por parte del contratista de obra.

En las estructuras de filtración, sedimentación y floculación se encuentran instalando formaleta para los muros con altura entre 3 y 6 m. El contratista manifiesta que por la complejidad del acceso a la planta el proceso de mezcla y vaciado de concreto se realiza de forma manual, por lo tanto el avance es un poco menor al previsto. Manifiesta iniciar labores de vaciado de concreto el día miercoles

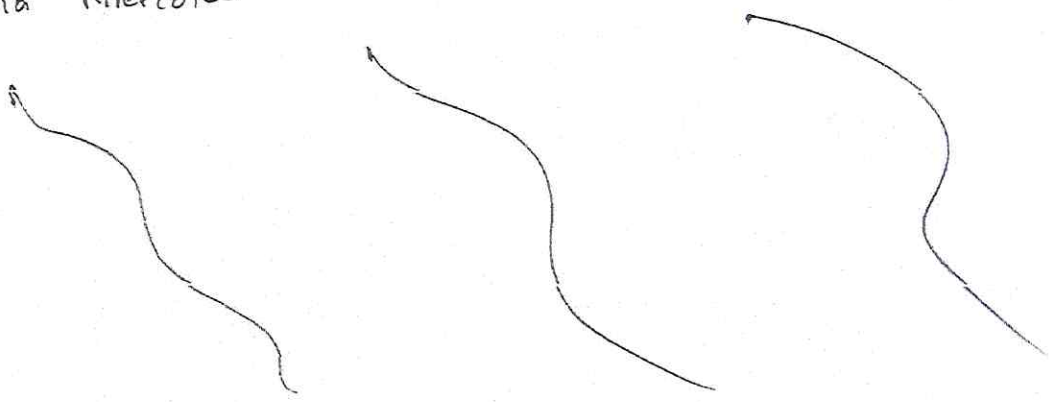

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA D.T.O.	RESPONSABLES
COMPROMISOS ADQUIRIDOS	

Asistencia

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Elmar Velásquez G.	Apoyo a Supervisión	
Luis Alejandro Díaz	Residente Interventoría	
	Dir Obra	
Michel Fiallo	Dir Inter	

	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META EDESA S.A. E.S.P.		IN - FT - 12
edesa	INFORME EJECUTIVO	META	Version: 03
			Agosto 3 de 2020

INFORMACIÓN GENERAL

INFORME No.	19	MES:	ENERO	AÑO:	2026	BPIN:	2023005500284	PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
CONTRATO DE OBRA No.	110 DE 2024	OBJETO:	"AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META".						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	111 DE 2024	NOMBRE:	CONSORCIO INTER - URIBE 2025 - NIT. 901.902.254-3 R/L MICHELL FIERRO CRUZ - C.C. No. 86.068.223					FECHA DEL INFORME	
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	OCAD		PDA		RECURSOS PROPIOS	X	CONVENIO		5/02/2026

1. LOCALIZACION DEL PROYECTO

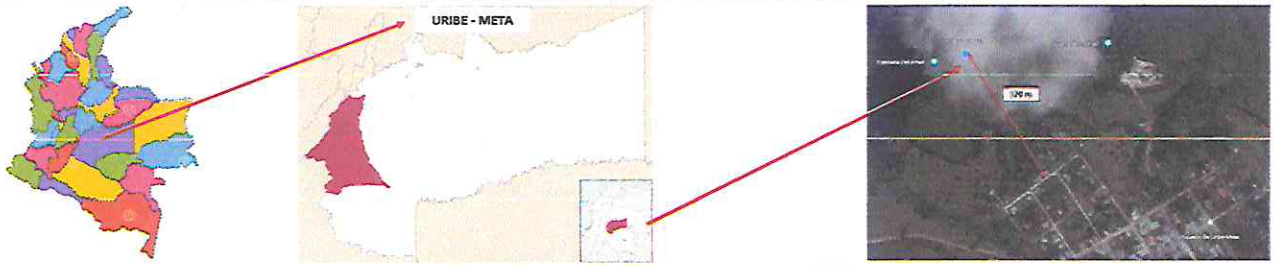

2. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DEL CONTRATO:	31 DE DICIEMBRE DE 2024	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 3.730.373.180,00	FECHA ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1:	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	ONCE (11) MESES	VALOR ADICIONAL AL CONTRATO:	$ 0,00	VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1:	$ 1.328.507.704,00
FECHA DE INICIO:	27 DE MARZO DE 2025	FECHA DE TERMINACION INICIAL:	26 DE FEBRERO DE 2026	AVANCE FISICO PORCENTUAL:	41,64%
PRORROGA 1:	N/A	FECHA DE SUSPENCION No. 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2025 (22 DIAS)	AVANCE FINANCIERO PORCENTUAL:	35,61%
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 3.730.373.180,00	FECHA DE REINICIO No. 1:	14 DE ENERO DE 2026		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PTAP URIBE - NIT 901.902.283-7	NUEVA FECHA DE TERMINACION:	20 DE MARZO DE 2026		
PLAZO TRANSCURRIDO:	NUEVE (9) MESES Y CATORCE (14) DIAS	VALOR DEL ANTICIPO:	$ 1.119.111.954,00		
EJECUCIÓN FISICA DEL CONTRATO:	$ 1.553.228.577,00	REPRESENTANTE LEGAL:	YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA		
AVANCE FINANCIERO:	$ 1.329.507.704,00	PLAZO RESTANTE:	UN (1) MES Y DIECISEIS (16) DIAS		

3. REPRESENTACION GRAFICA DE LOS AVANCES

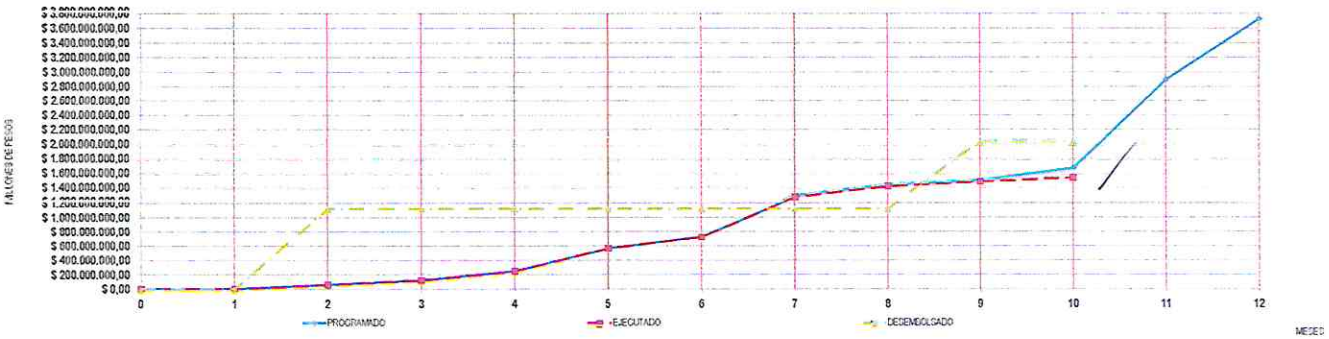

El avance programado se proyecta segun programacion aprobada en Project.

4. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para este periodo se desarrollaron las siguientes actividades:

La ejecución física para el mes de enero de 2026 corresponde al capitulo número 2. RED ELECTRICA: Mastil metalico galvanizado de 9m con brazo retornado, suministro e instalacion.
De igual manera se ejecuto el capitulo de suministro de equipos y laboratorio, correspondiente al item: suministro de herramientas para operacion de plantas de tratamiento.

El contrato a la fecha tiene un retraso en cuanto a la programación de obra del [illegible] *frente a la programación presentada por el contratista, sin embargo ya después de nueve (9) meses y catorce (14) días transcurridos de ejecución y que en cuanto a tiempo le restan un (1) mes y dieciseis (16) días del plazo establecido; adelantar trabajos de refuerzo para cumplir con los plazos y el avance establecido, de conformidad con la Reprogramación presentada a la fecha de reinicio No. 1 del contrato.*

5. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	VALOR UNITARIO	AVANCE MES(ES) ANTERIOR(ES)			AVANCE MES ACTUAL			AVANCE TOTAL		
					CANTIDAD MES(ES) ANTERIOR(ES)	VALOR MES(ES) ANTERIOR(ES)	% AVANCE MES(ES) ANTERIOR(ES)	CANTIDAD MES ACTUAL	VALOR MES ACTUAL	% AVANCE MES ACTUAL	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% AVANCE TOTAL ACUMULADO
1	OBRA CIVIL												
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES												
1.1.1	Cerramiento en tela verde H:2m, postes cada 2.5m	ML	200,00	$ 37.891,00	200,00	$7.578.200,00	100,00%				200,00	$7.578.200,00	100,00%
1.1.2	Red electrica provisional L:50m	UN	1,00	$ 4.646.964,00	1,00	$4.646.964,00	100,00%				1,00	$4.646.964,00	100,00%
1.1.3	Instalación provisional de acueducto L:30m	UN	1,00	$ 1.714.206,00	1,00	$1.714.206,00	100,00%				1,00	$1.714.206,00	100,00%
1.1.4	Manejo de aguas en excavaciones (incluye 2 motobombas de 4")	MES	6,00	$ 12.871.285,00	6,00	$77.227.710,00	100,00%				6,00	$77.227.710,00	100,00%
1.1.5	Tala, desenraizado de árbol, incluye retiro y disposicion final de material .	UN	15,00	$ 1.646.725,00	15,00	$24.700.875,00	100,00%				15,00	$24.700.875,00	100,00%
1.2	TRATAMIENTO PRELIMINAR												
1.2.1	Localización y replanteo para estructuras hidráulicas	M2	22,65	$ 7.711,20	22,65	$174.659,00	100,00%				22,65	$174.659,00	100,00%
1.2.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	22,65	$ 29.966,00	22,65	$656.080,00	100,00%				22,65	$656.080,00	100,00%
1.2.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	14,85	$ 41.951,00	14,85	$622.972,00	100,00%				14,85	$622.972,00	100,00%
1.2.4	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	39,22	$ 76.466,60	39,22	$2.999.020,00	100,00%				39,22	$2.999.020,00	100,00%
1.2.5	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	8,57	$ 30.025,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.2.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	4,41	$ 34.878,20	4,41	$153.813,00	100,00%				4,41	$153.813,00	100,00%
1.2.7	Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	1,37	$ 1.025.375,40	1,37	$1.404.764,00	100,00%				1,37	$1.404.764,00	100,00%
1.2.8	Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	1,57	$ 1.470.707,00	1,57	$2.309.010,00	100,00%				1,57	$2.309.010,00	100,00%
1.2.9	Concreto impermeab. 4000 PSI para rampla de acceso, elab. En obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,00	$ 1.468.200,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.2.10	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	4,76	$ 2.167.251,80	4,76	$10.316.119,00	100,00%				4,76	$10.316.119,00	100,00%

1.2.11	Cinta PVC d=22cm (incluye instalación)	ML	17,90	$ 67.051,60	17,90	$1.200.224,00	100,00%				17,90	$1.200.224,00	100,00%
1.2.12	Escalera tipo gato para estructuras hidraulicas	ML	4,65	$ 316.610,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.2.13	Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC EBxEL L=0.50m, Z=0.30m	UN	1,00	$ 934.801,00	1,00	$934.801,00	100,00%				1,00	$934.801,00	100,00%
1.2.14	Suministro e instalación de pasamuro con codo de 4x90° en AC EBxEL L=0.50m, Z=0.25m	UN	1,00	$ 1.308.527,00	1,00	$1.308.527,00	100,00%				1,00	$1.308.527,00	100,00%
1.2.15	Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hídrica aledaña. Incluye bomba para llenado y vaciado de estructura, verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante	UN	1,00	$ 4.943.873,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.2.16	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	894,60	$ 12.173,00	894,60	$10.889.966,00	100,00%				894,60	$10.889.966,00	100,00%
1.3	**FLOCULACION**												
1.3.1	Localización y replanteo para estructuras hidraulicas	M2	48,94	$ 7.711,20	48,94	$377.386,00	100,00%				48,94	$377.386,00	100,00%
1.3.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	48,94	$ 29.966,00	48,94	$1.467.596,00	100,00%				48,94	$1.467.596,00	100,00%
1.3.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	77,57	$ 41.951,00	77,57	$3.254.139,00	100,00%				77,57	$3.254.139,00	100,00%
1.3.4	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	9,79	$ 76.466,60	9,79	$748.608,00	100,00%				9,79	$748.608,00	100,00%
1.3.5	Relleno material seleccionado proveniente de la excavacion (incluye compactación c/0.20m)	M3	21,64	$ 30.025,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.3.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	38,58	$ 34.878,20	38,58	$1.345.601,00	100,00%				38,58	$1.345.601,00	100,00%
1.3.7	Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	3,43	$ 1.025.375,40	3,43	$3.517.038,00	100,00%				3,43	$3.517.038,00	100,00%
1.3.8	Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	10,18	$ 1.470.707,00	10,18	$14.971.797,00	100,00%				10,18	$14.971.797,00	100,00%
1.3.9	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	29,89	$ 2.167.251,80	29,89	$64.779.156,00	100,00%				29,89	$64.779.156,00	100,00%
1.3.10	Concreto impermeab. 4000PSI para placa entrepiso, elab. obra, elevaciones h<3.0 (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	1,42	$ 2.070.012,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.3.11	Concreto ciclópeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamaño max. 3", para estructuras	M3	2,37	$ 1.518.825,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.3.12	Pañete impermeabilizado (incluye filos)	M2	8,10	$ 59.651,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.3.13	Escalera tipo gato para estructuras hidraulicas	ML	33,95	$ 316.610,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.3.14	Suministro e instalación de tapas en lamina alfajor	M2	0,98	$ 497.356,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.3.15	Cinta PVC d=22cm (incluye instalación)	ML	0,98	$ 67.051,60	0,98	$65.711,00	100,00%				0,98	$65.711,00	100,00%
1.3.16	Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC ELxEL L=0.30m, Z=0.15m	UN	2,00	$ 494.210,00	2,00	$988.420,00	100,00%				2,00	$988.420,00	100,00%
1.3.17	Suministro e instalación de pasamuro 8" en AC ELxEL L=0.30m, Z=0.15m	UN	2,00	$ 841.863,00	2,00	$1.683.726,00	100,00%				2,00	$1.683.726,00	100,00%
1.3.18	Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hídrica aledaña. Incluye bomba para llenado y vaciado de estructura, verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante	UN	1,00	$ 4.943.873,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.3.19	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	5.808,60	$ 12.173,00	5.808,60	$70.708.088,00	100,00%				5.808,60	$70.708.088,00	100,00%
1.4	**SEDIMENTACION**												
1.4.1	Localización y replanteo para estructuras hidráulicas	M2	40,41	$ 7.711,20	40,41	$311.619,00	100,00%				40,41	$311.619,00	100,00%
1.4.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	40,41	$ 29.966,00	40,41	$1.170.516,00	100,00%				40,41	$1.170.516,00	100,00%
1.4.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	112,65	$ 41.951,00	112,65	$4.725.780,00	100,00%				112,65	$4.725.780,00	100,00%
1.4.4	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	8,08	$ 76.466,60	8,08	$617.950,00	100,00%				8,08	$617.950,00	100,00%
1.4.5	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	27,23	$ 30.025,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.4.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	73,84	$ 34.878,20	73,84	$2.575.406,00	100,00%				73,84	$2.575.406,00	100,00%
1.4.7	Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	2,83	$ 1.025.375,40	2,83	$2.901.812,00	100,00%				2,83	$2.901.812,00	100,00%
1.4.8	Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	8,81	$ 1.470.707,00	8,81	$12.956.929,00	100,00%				8,81	$12.956.929,00	100,00%
1.4.9	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	23,57	$ 2.167.251,80	23,57	$51.082.125,00	100,00%				23,57	$51.082.125,00	100,00%
1.4.10	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	10,02	$ 2.355.042,20	10,02	$23.597.523,00	100,00%				10,02	$23.597.523,00	100,00%
1.4.11	Concreto impermeab. 4000PSI para placa entrepiso, elab. obra, elevaciones h<3.0 (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,89	$ 2.070.012,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.4.12	Concreto impermeab. 4000 PSI para canales, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	1,74	$ 2.385.120,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.4.13	Concreto ciclópeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamaño max. 3", para estructuras	M3	1,72	$ 1.518.825,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.4.14	Pañete impermeabilizado (incluye filos)	M2	10,09	$ 59.651,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.4.15	Escalera tipo gato para estructuras hidraulicas	ML	13,80	$ 316.610,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.4.16	Cinta PVC d=22cm (incluye instalación)	ML	49,60	$ 67.051,60	49,60	$3.325.759,00	100,00%				49,60	$3.325.759,00	100,00%
1.4.17	Suministro e instalación de pasamuro 8" en AC EBxEL L=0.40m, Z=0.25m	UN	2,00	$ 1.875.280,00	2,00	$3.750.560,00	100,00%				2,00	$3.750.560,00	100,00%
1.4.18	Suministro e instalación de pasamuro 8" en AC EBxEB L=0.72m, Z=0.25m	UN	2,00	$ 3.225.113,00	2,00	$6.450.226,00	100,00%				2,00	$6.450.226,00	100,00%
1.4.19	Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC EBxEL L=0.59m, Z=0.28m	UN	4,00	$ 992.529,00	4,00	$3.970.116,00	100,00%				4,00	$3.970.116,00	100,00%
1.4.20	Suministro e instalación de pasamuro 3" en AC EBxEL L=0.45m, Z=0.28m	UN	2,00	$ 763.869,00	2,00	$1.527.738,00	100,00%				2,00	$1.527.738,00	100,00%
1.4.21	Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hídrica aledaña. Incluye bomba para llenado y vaciado de estructura, verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante	UN	1,00	$ 4.943.873,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.4.22	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	6.304,20	$ 12.173,00	6.304,20	$76.741.027,00	100,00%				6.304,20	$76.741.027,00	100,00%
1.5	**FILTRO**												
1.5.1	Localización y replanteo para estructuras hidráulicas	M2	42,17	$ 7.711,20	42,17	$325.181,00	100,00%				42,17	$325.181,00	100,00%
1.5.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	42,17	$ 29.966,00	42,17	$1.221.496,00	100,00%				42,17	$1.221.496,00	100,00%
1.5.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	66,31	$ 41.951,00	66,31	$2.781.771,00	100,00%				66,31	$2.781.771,00	100,00%
1.5.4	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	6,59	$ 76.466,60	6,59	$503.915,00	100,00%				6,59	$503.915,00	100,00%
1.5.5	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	16,55	$ 30.025,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.5.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	40,86	$ 34.878,20	40,86	$1.425.123,00	100,00%				40,86	$1.425.123,00	100,00%
1.5.7	Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	2,31	$ 1.025.375,40	2,31	$2.368.617,00	100,00%				2,31	$2.368.617,00	100,00%
1.5.8	Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	6,62	$ 1.470.707,00	6,62	$9.736.080,00	100,00%				6,62	$9.736.080,00	100,00%
1.5.9	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	32,31	$ 2.167.251,80	32,31	$70.023.906,00	100,00%				32,31	$70.023.906,00	100,00%
1.5.10	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	12,13	$ 2.355.042,20	12,13	$28.566.662,00	100,00%				12,13	$28.566.662,00	100,00%
1.5.11	Suministro e instalación de antracita para medio filtrante	M3	1,84	$ 1.562.769,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.5.12	Suministro e instalación de arena malla 30-40 para medio filtrante	M3	1,22	$ 1.101.262,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.5.13	Suministro e instalación de gravilla seleccionada de 1/2"	M3	0,90	$ 106.333,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.5.14	Escalera tipo gato para estructuras hidraulicas	ML	24,00	$ 316.610,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.5.15	Cinta PVC d=22cm (incluye instalación)	ML	80,70	$ 67.051,60	80,70	$5.411.064,00	100,00%				80,70	$5.411.064,00	100,00%
1.5.16	Suministro e instalación de pasamuro 6" en AC EBxEL L=0.45m, Z=0.15m	UN	6,00	$ 824.201,00	6,00	$4.945.206,00	100,00%				6,00	$4.945.206,00	100,00%
1.5.17	Suministro e instalación de pasamuro 3" en AC EBxEL L=0.41m, Z=0.15m	UN	6,00	$ 683.333,00	6,00	$4.099.998,00	100,00%				6,00	$4.099.998,00	100,00%
1.5.18	Suministro e instalación de pasamuro 6" en AC ELxEL L=0.30m, Z=0.15m	UN	6,00	$ 672.762,00	6,00	$4.036.572,00	100,00%				6,00	$4.036.572,00	100,00%
1.5.19	Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC ELxEL L=0.43m, Z=0.15m	UN	1,00	$ 571.332,00	1,00	$571.332,00	100,00%				1,00	$571.332,00	100,00%
1.5.20	Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hídrica aledaña. Incluye bomba para llenado y vaciado de estructura, verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante	UN	1,00	$ 4.943.873,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.5.21	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	7.148,40	$ 12.173,00	7.148,40	$87.017.473,00	100,00%				7.148,40	$87.017.473,00	100,00%
1.6	**TANQUE CONTACTO DE CLORO**												
1.6.1	Localización y replanteo para estructuras hidráulicas	M2	35,86	$ 7.711,20	35,86	$276.524,00	100,00%				35,86	$276.524,00	100,00%
1.6.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	35,86	$ 29.966,00	35,86	$1.038.721,00	100,00%				35,86	$1.038.721,00	100,00%
1.6.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	10,48	$ 41.951,00	10,48	$439.646,00	100,00%				10,48	$439.646,00	100,00%
1.6.4	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	36,17	$ 76.466,60	36,17	$2.765.797,00	100,00%				36,17	$2.765.797,00	100,00%
1.6.5	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	2,82	$ 30.025,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.6.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	5,47	$ 34.878,20	5,47	$190.784,00	100,00%				5,47	$190.784,00	100,00%

1.6.7	Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	2,51	$ 1.025.375,40	2,51	$2.573.692,00	100,00%				2,51	$2.573.692,00	100,00%
1.6.8	Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	4,90	$ 1.470.707,00	4,90	$7.206.464,00	100,00%				4,90	$7.206.464,00	100,00%
1.6.9	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	5,04	$ 2.167.251,80	5,04	$10.922.949,00	100,00%				5,04	$10.922.949,00	100,00%
1.6.10	Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	3,92	$ 1.988.504,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.6.11	Cinta PVC d=22cm (incluye instalación)	ML	33,60	$ 67.051,60	33,60	$2.252.934,00	100,00%				33,60	$2.252.934,00	100,00%
1.6.12	Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC ELxEL L=0.47m, Z=0.15m	UN	1,00	$ 596.687,00	1,00	$596.687,00	100,00%				1,00	$596.687,00	100,00%
1.6.13	Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC ELxEL L=0.40m, Z=0.125m	UN	1,00	$ 551.705,00	1,00	$551.705,00	100,00%				1,00	$551.705,00	100,00%
1.6.14	Suministro e instalación de pasamuro 3" en AC ELxEL L=0.40m, Z=0.125m	UN	1,00	$ 413.760,00	1,00	$413.760,00	100,00%				1,00	$413.760,00	100,00%
1.6.15	Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hídrica aledaña. Incluye bomba para llenado y vaciado de estructura, verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante	UN	1,00	$4.943.873,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.6.16	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	1.208,00	$ 12.173,00	1.208,00	$14.704.984,00	100,00%				1.208,00	$14.704.984,00	100,00%
1.7	ESPESADOR DE LODOS												
1.7.1	Localización y replanteo para estructuras hidraulicas	M2	34,18	$ 7.711,20	34,18	$263.569,00	100,00%				34,18	$263.569,00	100,00%
1.7.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	34,18	$ 28.966,00	34,18	$990.058,00	100,00%				34,18	$990.058,00	100,00%
1.7.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	64,24	$ 41.951,00	64,24	$2.694.932,00	100,00%				64,24	$2.694.932,00	100,00%
1.7.4	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	6,84	$ 76.466,60	6,84	$523.032,00	100,00%				6,84	$523.032,00	100,00%
1.7.5	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	37,82	$ 30.025,80	37,82	$1.135.576,00	100,00%				37,82	$1.135.576,00	100,00%
1.7.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	26,42	$ 34.878,20	26,42	$921.482,00	100,00%				26,42	$921.482,00	100,00%
1.7.7	Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	2,39	$ 1.025.375,40	2,39	$2.450.647,00	100,00%				2,39	$2.450.647,00	100,00%
1.7.8	Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	2,02	$ 1.470.707,00	2,02	$2.970.828,00	100,00%				2,02	$2.970.828,00	100,00%
1.7.9	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	2,30	$ 2.167.251,80	2,30	$4.984.679,00	100,00%				2,30	$4.984.679,00	100,00%
1.7.10	Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	1,17	$ 1.988.504,00	1,17	$2.326.550,00	100,00%				1,17	$2.326.550,00	100,00%
1.7.11	Concreto ciclópeo 60% concreto simple f'c 21MPa + 40% piedra tamaño max. 3", para estructuras	M3	0,41	$ 1.518.825,00	0,41	$622.718,00	100,00%				0,41	$622.718,00	100,00%
1.7.12	Pañete impermeabilizado (incluye filos)	M2	3,03	$ 59.651,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.7.13	Cinta PVC d=22cm (incluye instalación)	ML	39,00	$ 67.051,60	25,40	$1.703.111,00	65,13%				25,40	$1.703.111,00	65,13%
1.7.14	Suministro e instalación de pasamuro 6" en AC ELxEL L=0.35m, Z=0.10m	UN	2,00	$ 713.996,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.7.15	Suministro e instalación de pasamuro 4" en AC ELxEL L=0.35m, Z=0.10m	UN	2,00	$ 501.332,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.7.16	Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hídrica aledaña. Incluye bomba para llenado y vaciado de estructura, verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante	UN	2,00	$4.943.873,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.7.17	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	658,60	$ 12.173,00	653,60	$7.956.273,00	99,21%				653,60	$7.956.273,00	99,21%
1.8	LECHOS DE SECADO												
1.8.1	Localización y replanteo para estructuras hidraulicas	M2	66,58	$ 7.711,20	66,58	$513.412,00	100,00%				66,58	$513.412,00	100,00%
1.8.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	66,58	$ 28.966,00	66,58	$1.928.556,00	100,00%				66,58	$1.928.556,00	100,00%
1.8.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	122,88	$ 41.951,00	122,88	$5.154.939,00	100,00%				122,88	$5.154.939,00	100,00%
1.8.4	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	16,92	$ 76.466,60	16,92	$1.293.815,00	100,00%				16,92	$1.293.815,00	100,00%
1.8.5	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	35,03	$ 30.025,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.8.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	66,92	$ 34.878,20	66,92	$2.334.049,00	100,00%				66,92	$2.334.049,00	100,00%
1.8.7	Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	5,55	$ 1.025.375,40	4,79	$4.911.548,00	86,31%				4,79	$4.911.548,00	86,31%
1.8.8	Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	6,29	$ 1.470.707,00	6,29	$9.250.747,00	100,00%				6,29	$9.250.747,00	100,00%
1.8.9	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	11,28	$ 2.167.251,80	11,28	$24.446.600,00	100,00%				11,28	$24.446.600,00	100,00%
1.8.10	Cinta PVC d=22cm (incluye instalación)	ML	57,20	$ 67.051,60	57,20	$3.835.352,00	100,00%				57,20	$3.835.352,00	100,00%
1.8.11	Fabricación, transporte, montaje y pintura de estructura metálica en acero estructural ASTM A-36	KG	680,17	$ 26.640,60	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.8.12	Suministro e instalacion cubierta en teja de policarbonato masterrnil opal o similar. No incluye estructura	M2	39,16	$ 151.479,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.8.13	Suministro e instalación de material filtrante compuesto por bloque, arena malla 30-40 en una capa de espesor de 30cm, geotextil NT 1500, gravilla seleccionada 1/2" en una capa de espesor de 45cm	M2	19,20	$ 469.003,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.8.14	Caja inspección 0.70x0.70m, concreto ref. 3000 PSI elab.en obra, h=0.70m , e=0.07m (inc. excavación, formaleta 1/3 usos)	UN	6,00	$ 448.246,40	6,00	$2.689.478,00	100,00%				6,00	$2.689.478,00	100,00%
1.8.15	Prueba de estanqueidad en estructuras con un volumen de agua menor o igual a 1500 m3, con agua tomada de la fuente hídrica aledaña. Incluye bomba para llenado y vaciado de estructura, verificación, correccion, sellado y reparación de fugas hasta cumplir con las condiciones de calidad de la entidad contratante	UN	1,00	$4.943.873,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.8.16	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	2.100,40	$ 12.173,00	2.100,40	$25.565.553,00	100,00%				2.100,40	$25.565.553,00	100,00%
1.9	EDIFICIO DE OPERACIONES												
1.9.1	Pintura vinilo T. Coraza exterior 3 manos	M2	147,40	$ 22.404,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.9.2	Pintura tipo 1 s/muro (alta calidad)	M2	284,20	$ 16.598,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.9.3	Suministro e instalacion puerta en aluminio anodizado 1.50m x 2.00m	UN	1,00	$ 2.118.898,60	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.9.4	Limpieza de pisos incluye acido muriatico e hidrolavadora	M2	85,31	$ 6.502,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.9.5	Limpieza de vidrios manual	M2	7,40	$ 4.969,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10	TANQUE DE ALMACENAMIENTO												
1.10.1	Localización y replanteo para estructuras hidraulicas	M2	1,50	$ 7.711,20	1,50	$11.567,00	100,00%				1,50	$11.567,00	100,00%
1.10.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	1,50	$ 28.966,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.3	Excavación manual en conglomerado h < 1.50m	M3	1,15	$ 46.508,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.4	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	0,30	$ 76.466,60	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.5	Retiro sobrantes de excavación	M3	1,15	$ 34.878,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.6	Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,10	$ 1.025.375,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.7	Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,30	$ 1.470.707,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.8	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,25	$ 2.167.251,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.9	Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,15	$ 1.988.504,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.10	Cinta PVC d=22cm (incluye instalación)	ML	3,30	$ 67.051,60	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.11	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	70,00	$ 12.173,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.12	Limpieza de muros interiores H < 3m, con hidrolavadora y producto sikaguard 719w.	M2	349,62	$ 62.801,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.13	Limpieza de muros interiores H > 3m, con hidrolavadora y producto sikaguard 719w.	M2	67,45	$ 103.765,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.14	Limpieza de muros exteriores H < 3m, con hidrolavadora y producto sikaguard 719w.	M2	221,01	$ 47.411,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.15	Limpieza de muros exteriores H > 3m, con hidrolavadora y producto sikaguard 719w.	M2	82,85	$ 67.883,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.16	Reparacion de grietas con aplicación de adhesivo epóxico para muros interiores H<3.0m con producto SikaDur 35 Hi - Mod LV o similar.	ML	6,05	$ 191.115,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.17	Reparacion de grietas con aplicación de adhesivo epóxico para muros interiores H>3.0m con producto SikaDur 35 Hi - Mod LV o similar.	ML	2,30	$ 199.972,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.18	Reparacion de grietas con aplicación de adhesivo epóxico para muros exteriores H<3.0m con producto SikaDur 35 Hi - Mod LV o similar.	ML	6,82	$ 178.417,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.19	Reparacion de grietas con aplicación de adhesivo epóxico para muros exteriores H>3.0m con producto SikaDur 35 Hi - Mod LV o similar.	ML	5,20	$ 191.213,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%

1.10.20	Aplicación de capa inhibidora de corrosion para muros interiores H<3.0m con producto Sika FerroGard 903 Plus o similar	M2	349,62	$ 104.489,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.21	Aplicación de capa inhibidora de corrosion para muros interiores H>3.0m con producto Sika FerroGard 903 Plus o similar	M2	67,45	$ 113.345,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.22	Aplicación de capa inhibidora de corrosion para muros exteriores H<3.0m con producto Sika FerroGard 903 Plus o similar	M2	221,01	$ 98.833,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.23	Aplicación de capa inhibidora de corrosion para muros exteriores H>3.0m con producto Sika FerroGard 903 Plus o similar	M2	82,85	$ 104.804,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.24	Aplicación de mortero de reparacion y nivelacion para muros interiores H<3.0m con producto Sika Top 122 o similar.	M2	349,62	$ 167.714,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.25	Aplicación de mortero de reparacion y nivelacion para muros interiores H>3.0m con producto Sika Top 122 o similar.	M2	67,45	$ 176.571,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.26	Aplicación de mortero de reparacion y nivelacion para muros exteriores H<3.0m con producto Sika Top 122 o similar.	M2	221,01	$ 162.058,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.27	Aplicación de mortero de reparacion y nivelacion para muros exteriores H>3.0m con producto Sika Top 122 o similar.	M2	82,85	$ 167.976,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.28	Aplicación de capa impermeable protectora para muros interiores H<3.0m con producto Sikaguard 62 o similar	M2	349,62	$ 167.891,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.29	Aplicación de capa impermeable protectora para muros interiores H>3.0m con producto Sikaguard 62 o similar	M2	67,45	$ 176.747,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.30	Aplicacion de recubrimiento protector y decorativo para muros exteriores H<3.0 con producto SikaColor C o similar.	M2	221,01	$ 47.040,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.10.31	Aplicacion de recubrimiento protector y decorativo para muros exteriores H>3.0 con producto SikaColor C o similar.	M2	82,85	$ 50.145,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.11	**CASETA DE QUIMICOS**												
1.11.1	Desmonte y retiro de puerta y ventana (incluye marcos)	M2	1,00	$ 86.556,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.11.2	Suministro e instalación teja policarbonato perfil trapezoidal tipo ajota. No incluye estructura	M2	16,95	$ 116.933,81	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.11.3	Suministro e instalación de piso pared blanco 20.5cmx20.5cm linea para laboratorios y baños	M2	40,95	$ 87.513,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.11.4	Pintura vinilo T. Corazo exterior 3 manos	M2	60,55	$ 22.404,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.11.5	Pintura tipo 1 s/muro (alta calidad)	M2	25,95	$ 16.598,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.11.6	Suministro e instalación puerta batiente doble en aluminio cold rolled Cal. 18 con ancho de 2.00m y alto de 2.10m. incluye marco, bisagras y cerradura con chapa yale 987 de sobreponer.	M2	1,00	$ 870.520,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.11.7	Suministro e instalacion de vidrio transparente liso de 4mm	M2	2,40	$ 101.916,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12	**POZO DE BOMBEO**												
1.12.1	Localización y replanteo para estructuras hidráulicas	M2	10,72	$ 7.711,20	10,72	$ 82.664,00	100,00%				10,72	$82.664,00	100,00%
1.12.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	10,72	$ 28.966,00	10,72	$ 310.516,00	100,00%				10,72	$310.516,00	100,00%
1.12.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	22,10	$ 41.951,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12.4	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	2,15	$ 76.466,60	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12.5	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	16,67	$ 30.025,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	5,34	$ 34.878,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12.7	Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,82	$ 1.025.375,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12.8	Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,38	$ 1.470.707,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12.9	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	1,25	$ 2.167.251,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12.10	Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,05	$ 1.988.504,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12.11	Cinta PVC d=22cm (incluye instalación)	ML	7,33	$ 67.051,60	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12.12	Suministro e instalación de tapas en lamina alfajor	M2	1,80	$ 696.298,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.12.13	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	201,60	$ 12.173,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.13	**PASARELA - PTAP**												
1.13.1	Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, elevaciones 3.0<h<6.0 m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	5,85	$ 2.226.694,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.13.2	Suministro e instalación de baranda en acero al carbon, pasamanos T 1 1/2" paral 1 1/2" baranda 1 1/2". incluye pintura y anticorrosivo	ML	74,29	$ 427.421,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.13.3	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	819,00	$ 12.173,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.14	**MACROMEDIDOR**												
1.14.1	Localización y replanteo para estructuras hidráulicas	M2	10,73	$ 7.711,20	10,73	$ 82.741,00	100,00%				10,73	$82.741,00	100,00%
1.14.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	10,73	$ 28.966,00	10,73	$ 310.805,00	100,00%				10,73	$310.805,00	100,00%
1.14.3	Excavación mecánica en conglomerado h < 3.0m	M3	13,63	$ 41.951,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.14.4	Relleno material seleccionado tamaño máximo 2" (incluye cargue, acarreo y compactación c/0.20m)	M3	2,15	$ 76.466,60	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.14.5	Relleno material seleccionado proveniente de la excavación (incluye compactación c/0.20m)	M3	6,77	$ 30.025,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.14.6	Retiro sobrantes de excavación	M3	6,86	$ 34.878,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.14.7	Concreto 2000 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,75	$ 1.025.375,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.14.8	Concreto impermeab. 4000 PSI para placa piso, elab. en obra (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,81	$ 1.470.707,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.14.9	Concreto impermeab. 4000PSI para muros, elab. obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,79	$ 2.167.251,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.14.10	Concreto 4000 PSI para placa entrepiso, elab. en obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta 1/4 usos y colocación)	M3	0,48	$ 1.988.504,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.14.11	Cinta PVC d=22cm (incluye instalación)	ML	8,80	$ 67.051,60	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.14.12	Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)	KG	210,00	$ 12.173,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.15	**OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS**												
1.15.1	Limpieza general del cerramiento en malla eslabonada	ML	199,22	$ 48.798,00	196,25	$9.576.608,00	98,51%				196,25	$9.576.608,00	98,51%
1.15.2	Descapote manual (incluye retiro d=5km)	M2	2.053,48	$ 28.966,00	2.004,82	$58.071.616,00	97,63%				2.004,82	$58.071.616,00	97,63%
1.15.3	Suministro e instalación de grama trenza. Incluye tierra negra E=20cm	M2	2.053,48	$ 85.264,00	2.004,82	$170.938.972,00	97,63%				2.004,82	$170.938.972,00	97,63%
1.15.4	Suministro y siembra flor loora roja H:0.30m	UN	250,00	$ 14.784,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
1.15.5	Suministro y siembra flor duranta H:0.30m	UN	250,00	$ 10.584,00	250,00	$2.646.000,00	100,00%				250,00	$2.646.000,00	100,00%
	TOTAL OBRA CIVIL			**$ 1.696.662.318,00**									
2	**COMPONENTE ELECTRICO**												
2.1	**RED ELECTRICA**												
2.1.1	Localizacion y replanteo red electrica	KM	0,20	$ 420.157,78	0,20	$84.032,00	100,00%				0,20	$84.032,00	100,00%
2.1.2	Puesta a tierra para transformador	UN	1,00	$ 2.391.279,84	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.3	Puesta a tierra terminal de baja tension suministro e instalación	UN	1,00	$ 2.691.453,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.4	Luminaria led solar alumbrado publico 80w-9600lm	UN	15,00	$ 4.751.653,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.5	Mástil metálico galvanizado de 9 m con brazo retorneado. suministro e instalación	UN	15,00	$ 3.150.581,00	0,00	$0,00	0,00%	10,00	$31.505.810,00	66,67%	10,00	$31.505.810,00	66,67%
2.1.6	Acometida parcial cable encauchetado 3x14 awg cu suministro e instalación	ML	114,00	$ 24.294,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.7	Acometida parcial 3 no10+1no10+no12l suministro e instalación	ML	119,00	$ 45.514,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.8	Acometida parcial 3no12+1no12 +1no14l suministro e instalación	ML	50,00	$ 42.265,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.9	Salida para toma corriente doble con polo a tierra suministro e instalación	PTO	6,00	$ 161.011,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.10	Salida toma trifasico (3no 10+1no 10 1no 14l), l= 10m suministro e instalación	PTO	10,00	$ 294.726,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.11	Salida para toma gfci suministro e instalación	PTO	3,00	$ 221.872,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.12	Salida de lampara 110 v l= 6m suministro e instalación	PTO	10,00	$ 163.815,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.13	Bombilla 110 v 15 w sumistro e instalación	UN	10,00	$ 55.670,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.14	Reflector led 200w ip 65 uso exterior suministro e instalación	UN	2,00	$ 430.247,44	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.15	Tablero parcial 10 circuitos, incluye breaker suministro e instalación	UN	1,00	$ 1.120.401,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.16	Tablero dosificadoras de cal ccm certificado retie incluye 4 contactores 3rt1024, 4 guardamotores 0,63-1A, 4 breaker riel 3x30,2 breaker riel 2x15, barrajes fffnt 75A, muletillas 3 posiciones, pilotos, analizador de red, 3 cts, totalizador, canaleta, cable y terminales. suministro e instalación	UN	1,00	$ 17.385.530,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.17	Tablero dosificadoras de cloro y bombeo ccm certificado retie incluye 4 contactores 3rt1024, 4 guardamotores 0,63-1A, 4 breaker riel 3x30,2 breaker riel 2x15, barrajes fffnt 75A, muletillas 3 posiciones, pilotos, analizador de red, 3 cts, totalizador, canaleta, cable y terminales. suministro e instalación	UN	1,00	$ 21.165.530,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.18	Caja de inspección tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en marco metalico	UN	4,00	$ 648.517,51	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%

2.1.19	Ducto pvc 3/4" suministro e instalación	ML	60,00	$ 3.983,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.20	Ducto pvc 1" suministro e instalación	ML	80,00	$ 3.983,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.1.21	Ducto PVC 2" suministro e instalación	ML	10,00	$ 10.671,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.2	[illegible]												
2.2.1	Planta electrica cabinada 10kva trifasica motor diesel transferencia automatica	UN	1,00	$ 31.255.000,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.2.2	Acometida parcial 3 no6+1no2 ducto pvc 1 1/2" suministro e instalación	ML	10,00	$ 90.646,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3	**SISTEMA SOLAR 10 Kw**												
2.3.1	Localización y replanteo redes incluye comisión topográfica, carlera y planos	ML	10,00	$ 5.925,38	10,00	$59.254,00	100,00%				10,00	$59.254,00	100,00%
2.3.2	Puesta a tierra terminal de baja tension suministro e instalación	UN	1,00	$ 513.509,14	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.3	Tablero de proteccion con 6 breaker bifasicos de 2 x 20 a 220 vac, 1 breaker bifasico de 2 x 50 a 220 vac, en gabinete metalico tipo exterior	UN	1,00	$ 1.152.024,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.4	Suministro e instalación de medidor bidireccional bifasico activa/reactiva 5-100	UN	1,00	$ 2.123.746,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.5	Cable solar para extensión panel a microinversor	UN	12,00	$ 53.579,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.6	Cable triplex 2*10+1*10 (2*6+1*6mm)	ML	18,00	$ 25.605,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.7	Acometida parcial 2 no8+1no12 ducto pvc 1"	ML	10,00	$ 36.706,31	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.8	Bajante con tubo conduit metalico 1" l=6m suministro e instalación	UN	1,00	$ 104.991,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.9	Panel solar 445 watts 40,9 vmp monocristalino. suministro e instalación.	UN	24,00	$ 2.468.012,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.10	Estructura soporte panel fotovoltaico	UN	24,00	$ 391.690,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.11	Microinversor 1500 w 220v	UN	6,00	$ 2.904.200,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.12	Bus cable yc600 para microinversor inc tapon entrada	UN	6,00	$ 274.225,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.13	Unidad de comunicación microinversores yc 600	UN	1,00	$ 2.021.764,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
2.3.14	Caja de inspección tipo cs 274 - ap 274, incluye tapa en marco metalico	UN	2,00	$ 648.517,51	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
	TOTAL SISTEMA SOLAR 10 Kw			**$ 313.491.348,94**									
3	**EQUIPAMIENTO**												
3.1	**CAJA DE ENTRADA Y FLOCULADORES**												
3.1.1	Suministro e instalacion union universal en HD (4")	UN	1,00	$ 373.328,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.2	Suministro e instalacion valvula compuerta elastica (vastago no ascendente) en HD - extremos bridados (4") con rueda de manejo	UN	1,00	$ 1.818.771,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.3	Suministro e instalación de vertedero de pared delgada en acero inoxidable 304 en calibre 10 con apertura para paso de agua. Incluye soportería para anclaje	M2	0,05	$ 5.155.606,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.4	Suministro e instalacion de compuerta deslizante en acero al carbon 0.10x0.10 vastago de extensión en acero inoxidable y columna de maniobra h=2.10m	UN	2,00	$ 11.059.405,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.5	Suministro e instalacion de compuerta deslizante en acero al carbon 0.20x0.20 vástago de extensión en acero inoxidable y columna de maniobra h=1.70m	UN	2,00	$ 11.934.146,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.6	Suministro e instalación de codos floculantes esquineros en PRFV espesor de 5mm, con agujeros en pestañas de 10mm de diametro cada 200mm. Apertura para salida de agua altura de 0.40m, ancho de 0.10m y largo de 0.10m con sistema para instalación de adaptadores de control de gradientes	UN	6,00	$ 536.483,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.7	Suministro e instalacion de codos floculantes esquineros en PRFV espesor de 5mm, con agujeros en pestañas de 10mm de diametro cada 200mm. Apertura para salida de agua altura de 0.40m, ancho de 0.12m y largo de 0.12m con sistema para instalación de adaptadores de control de gradientes	UN	6,00	$ 603.457,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.8	Suministro e instalacion de codos floculantes esquineros en PRFV espesor de 5mm, con agujeros en pestañas de 10mm de diametro cada 200mm. Apertura para salida de agua altura de 0.40m, ancho de 0.20m y largo de 0.20m con sistema para instalación de adaptadores de control de gradientes	UN	6,00	$ 659.768,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.9	Suministro e instalacion de adaptadores en PRFV espesor de 5mm para el control de gradientes en codos floculantes esquineros con ancho de 0.10m y largo de 0.10m. Apertura del adaptador para salida final de agua: Ancho de 0.06m y largo de 0.06m, según planos de detalles para un caudal de 7.35LPS	UN	6,00	$ 137.942,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.10	Suministro e instalacion de adaptadores en PRFV espesor de 5mm para el control de gradientes en codos floculantes esquineros con ancho de 0.12m y largo de 0.12m. Apertura del adaptador para salida final de agua: Ancho de 0.07m y largo de 0.07m, según planos de detalles para un caudal de 7.35LPS	UN	6,00	$ 143.539,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.11	Suministro e instalacion de adaptadores en PRFV espesor de 5mm para el control de gradientes en codos floculantes esquineros con ancho de 0.20m y largo de 0.20m. Apertura del adaptador para salida final de agua: Ancho de 0.13m y largo de 0.13m, según planos de detalles para un caudal de 7.35LPS	UN	6,00	$ 152.202,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.12	Suministro e instal. tuberia PVC extremos lisos para acueductos - Presión Trab. 200PSI- 4" (Inc. unión e instal acces.)	ML	40,38	$ 132.178,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.13	Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° EXLISOS PVC/AC (100mm) 4"	UN	7,00	$ 169.123,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.14	Suministro e instalacion de TEE PVC SCH80 (100mm) 4"	UN	13,00	$ 233.954,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.15	Suministro e instalacion de BRIDA PVC SOLDAR 4"	UN	12,00	$ 225.640,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.16	Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco acero inox. 4"	UN	6,00	$ 543.780,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.1.17	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVCS de 6"	ML	6,00	$ 136.688,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2	**SEDIMENTADORES**												
3.2.1	Suministro e instalacion de compuerta deslizante en acero al carbon 0.20x0.20 vástago de extensión en acero inoxidable y columna de maniobra h=2.05m	UN	2,00	$ 13.401.831,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.2	Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 6"	ML	2,60	$ 233.954,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.3	Suministro e instalación de Kit Silla Tee 6 x 6" de PVC para alcantarillados (incluye acondicionador y adhesivo)	UN	4,00	$ 289.789,92	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.4	Suministro e instalacion de tuberia PVCP-Presión Trabajo 200PSI-6", perforaciones de 2". incluye soportería	ML	7,36	$ 206.392,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.5	Suministro e instalacion tapon PVCS 6"	UN	4,00	$ 109.046,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.6	Suministro e instalacion niple ELxEL 4" L=0.33m en acero al carbon	UN	4,00	$ 865.541,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.7	Suministro e instalacion de codo 45° en AC de 4"	UN	4,00	$ 443.854,60	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.8	Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco acero inox. 4"	UN	4,00	$ 543.780,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.9	Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 4"	UN	4,00	$ 491.765,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.10	Suministro e instalacion niple ELxEL 3" L=0.55m en acero al carbon	UN	2,00	$ 843.541,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.11	Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco acero inox. 3"	UN	4,00	$ 419.477,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.12	Suministro e instalacion brida ciega en HD (6")	UN	2,00	$ 842.296,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.13	Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 8"	UN	4,00	$ 459.085,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.14	Suministro e instalación de modulos de sedimentación acelerada de H=1.04m fabricados en polipropileno	M2	9,24	$ 1.281.324,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.2.15	Suministro e instalacion de soporte para tuberia de distribucion de agua floculada en angulo en acero 3"x3"x1/4", L=0.40m, incluye anclaje con epoxico y pernos para fijacion de tuberia	UN	4,00	$ 100.786,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3	**FILTROS**												
3.3.1	Suministro e instalacion de compuerta deslizante en acero al carbon 0.20x0.20 vástago de extensión en acero inoxidable y columna de maniobra h=0.65m	UN	6,00	$ 11.178.398,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.2	Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco acero inox. 6"	UN	6,00	$ 911.584,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.3	Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° EXLISOS PVC/AC (150mm) 6"	UN	12,00	$ 459.283,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.4	Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 6"	ML	9,24	$ 141.625,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.5	Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco acero inox. 3"	UN	6,00	$ 419.477,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.6	Suministro e instalacion tee PVCS 3"	UN	4,00	$ 29.456,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.7	Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° EXLISOS PVC/AC (75mm) 3"	UN	6,00	$ 113.463,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.8	Suministro e instal. tuberia PVC extremos lisos para acueductos - Presión Trab. 200PSI- 3" (Inc. unión e instal acces.)	ML	5,70	$ 79.827,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.9	Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 3"	UN	6,00	$ 162.855,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.10	Suministro e instalacion de compuerta deslizante en acero al carbon 0.15x0.15 vástago de extensión en acero inoxidable y	UN	6,00	$ 12.635.054,60	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.11	Suministro de instalacion de falso fondo semiparabolico en lamina fabricada en PRFV espesor 6mm, con costillas de refuerzo cada 0.50m. Incluye 64 boquillas ranuradas por m2, soporteria antiflotante con recubrimiento en pintura a base de fibra de vidrio yelco azul y sellos en extremos en angulo 2"x 1/8"	M2	4,00	$ 2.667.143,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.3.12	Suministro e instalacion de canaleta de lavado en PRFV de Ancho=0.20m, L=0.80m y Alto=0.25m. Incluye sistema de fijacion.	UN	6,00	$ 698.951,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4	**TANQUE CONTACTO DE CLORO**												
3.4.1	Suministro e instal. tuberia PVC extremos lisos para acueductos - Presión Trab. 200PSI- 4" (Inc. unión e instal acces.)	ML	1,50	$ 132.178,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%

3.4.2	Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° EXLISOS PVC/AC (100mm) 4"	UN	3,00	$ 169.123,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.3	Suministro e instalacion de TEE PVC SCH80 (100mm) 4"	UN	1,00	$ 233.954,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.4	Suministro e instalacion union universal en HD (4")	UN	4,00	$ 373.328,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.5	Suministro e instalacion union universal en HD (3")	UN	1,00	$ 303.527,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.6	Suministro e instalacion valvula compuerta elastica (vastago no ascendente) en HD - extremos lisos (4") con rueda de manejo	UN	2,00	$ 1.436.875,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.7	Suministro e instalacion de pantalla en lamina PRFV con espesor de 5mm con terminado en yelco gelcoat azul. Incluye soportes laterales, soportes superiores y soportes inferiores	M2	42,84	$ 1.966.133,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.8	Suministro e instalacion de soportes longitudinales para todo el sistema fabricado en angulo de 1-1/2"x1/4" en aluminio. Incluye chazos plasticos con tornillos en acero inoxidable	ML	8,80	$ 220.759,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.9	Suministro e instalacion de soportes longitudinales para todo el sistema fabricado en platina de 1-1/2"x1/4" en aluminio. Incluye remaches	ML	3,50	$ 116.952,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.10	Suministro e instalacion union universal en HD (6")	UN	1,00	$ 562.306,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.11	Suministro e instalacion de tuberia PVC unión mecánica para acueductos -Presión Trabajo 160PSI- 6"	ML	10,61	$ 141.625,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.12	Suministro e instalacion de TEE PVC SCH80 (150mm) 6"	UN	1,00	$ 735.192,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.4.13	Suministro e instalacion valvula compuerta elastica (vastago no ascendente) en HD - extremos lisos (6") con rueda de manejo	UN	2,00	$ 2.172.529,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5	**LECHOS DE SECADO**												
3.5.1	Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 90° EXLISOS PVC/AC (100mm) 4"	UN	13,00	$ 169.123,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.2	Suministro e instal. tuberia PVC extremos lisos para acueductos - Presión Trab. 200PSI- 4" (inc. unión e instal acces.)	ML	26,50	$ 132.178,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.3	Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco acero inox. 4"	UN	6,00	$ 543.788,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.4	Suministro e instalacion tapón soldado PVCP 4"	UN	6,00	$ 82.088,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.5	Suministro e instalacion de tuberia PVCP-Presión Trabajo 200PSI- 4", perforaciones de 1/2".	ML	15,60	$ 136.263,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.6	Suministro e instalacion de TEE PVC SCH80 (100mm) 4"	UN	5,00	$ 233.954,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.7	Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 4"	UN	12,00	$ 225.040,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.8	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVCS de 4"	ML	23,70	$ 71.956,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.9	Suministro e instalacion codo 90° PVCS 4"	UN	2,00	$ 32.715,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.10	Suministro e instalacion semicodo 45° PVCS 4"	UN	1,00	$ 36.239,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.11	Suministro e instalacion tee PVCS 4"	UN	2,00	$ 45.569,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.12	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVCS de 2"	ML	5,40	$ 45.186,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.13	Suministro e instalacion semicodo 45° PVCS 2"	UN	1,00	$ 15.824,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.5.14	Suministro e instalación valvula de bola en PVC radial con dos universales soldar 2"	UN	1,00	$ 364.535,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6	**ESPESADORES DE LODOS**												
3.6.1	Suministro e instalacion union universal en HD (6")	UN	2,00	$ 562.306,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.2	Suministro e instalación válvula mariposa cuerpo HD, disco acero inox. 6"	UN	2,00	$ 911.584,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.3	Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 6"	UN	2,00	$ 361.610,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.4	Suministro e instalacion union universal en HD (4")	UN	2,00	$ 373.328,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.5	Suministro e instalación valvula mariposa cuerpo HD, disco acero inox. 4"	UN	2,00	$ 543.788,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.6	Suministro e instalación de BRIDA PVC SOLDAR 4"	UN	4,00	$ 225.040,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.7	Suministro e instalacion codo 90° PVCS 4"	UN	2,00	$ 32.715,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.8	Suministro e instalacion de tuberia sanitaria PVCS de 6"	ML	49,51	$ 136.680,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.9	Suministro e instalacion codo 90° PVCS 6"	UN	2,00	$ 210.105,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.10	Suministro e instalacion semicodo 45° PVCS 6"	UN	3,00	$ 110.958,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.11	Suministro e instalacion codo 22.5° PVCS 6"	UN	3,00	$ 256.161,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.12	Suministro e instalacion tee PVCS 6"	UN	1,00	$ 296.930,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.6.13	Suministro e instalacion yee PVCS 6"	UN	1,00	$ 242.581,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.7	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**												
3.7.1	Suministro e instalacion de bomba sumergible Q=1.00LPS, Altura dinámica total=6.76m. Motor eléctrico monofásico 110V	UN	2,00	$ 3.624.935,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.7.2	Suministro e instal. tuberia PVC extremos lisos para acueductos - Presión Trab. 200PSI- 1 1/2" (inc. unión e instal acces)	ML	23,60	$ 26.009,20	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.7.3	Suministro e instalacion codo 90° PVCP 1 1/2"	UN	6,00	$ 21.336,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.7.4	Suministro e instalacion semicodo 45° PVCP 1 1/2"	UN	1,00	$ 22.432,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.7.5	Suministro e instalación valvula de bola en PVC radial con dos universales soldar 1-1/2"	UN	2,00	$ 274.898,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.7.6	Suministro e instalacion de Cheque cortina de 1 1/2" incluye adaptadores macho en PVC	UN	2,00	$ 463.512,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.7.7	Suministro e instalacion de adaptador macho de 2" en PVC	UN	2,00	$ 19.166,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.7.8	Suministro e instalacion de tanque plastico de 1000Lt. Incluye flotador	UN	1,00	$ 1.096.001,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.7.9	Suministro e instal. tuberia PVC extremos lisos para acueductos - Presión Trab. 200PSI- 2" (inc. unión e instal acces.)	ML	0,80	$ 38.725,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8	**POZO DE BOMBEO**												
3.8.1	Suministro e instalacion de bomba sumergible Q=2LPS, Altura dinámica total=15.74m. Motor eléctrico trifásico 220V	UN	2,00	$ 14.904.596,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8.2	Suministro e instalacion de codo 90° en AC de 2"	UN	4,00	$ 232.745,80	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8.3	Suministro e instalación de valvula de retención (cheque) extremos bridados 2" en HD, disco en acero inoxidable	UN	2,00	$ 1.258.678,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8.4	Suministro e instalacion valvula compuerta elastica (vastago no ascendente) en HD - extremos bridados (2") con rueda de manejo	UN	2,00	$ 967.767,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8.5	Suministro e instalacion union de desmontaje autoportante en HD (2")	UN	2,00	$ 793.624,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8.6	Suministro e instalacion de tee en AC de 2"	UN	1,00	$ 290.998,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8.7	Suministro e instalacion de brida en AC slip on 150LB de 2"	UN	27,00	$ 272.630,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8.8	Suministro e instalación de tuberia en AC SCH40 C/C 2"	ML	7,00	$ 195.559,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8.9	Suministro e instalacion union universal en HD (2")	UN	1,00	$ 313.769,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8.10	Suministro e instal. tuberia PVC extremos lisos para acueductos - Presión Trab. 200PSI- 2" (inc. unión e instal acces.)	ML	57,70	$ 38.725,40	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.8.11	Suministro e instalacion de CODO PVC SCH80 45° EXLISOS PVC/AC (50mm) 2"	UN	2,00	$ 95.736,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.9	**MACROMEDIDOR**												
3.9.1	Desmonte y reubicacion de accesorios para macromedidor de 4"	UN	1,00	$ 1.093.117,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.9.2	Desmonte y retiro de tuberia en PVC de 2" a 4"	ML	52,13	$ 6.377,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.10	**SISTEMAS DE DOSIFICACION**												
3.10.1	Suministro e instalación de sistema de dosificación de cal con una estructura tipo SKID en acero inoxidable para soporte de dos bombas dosificadoras. Incluye: 2 bombas dosificadoras presión máx. 7bar y caudal máx. 20L/Hr. 2 agitadores mecánicos con paletas en acero inoxidable potencia motor de 1HP y RPM 1800 sin reducción. 2 filtros Y en PVC. 2 válvula de alivio de presión PVC 3/4". 2 válvula de contrapresión PVC 1/2". 2 cilindros de calibración en PVC. 2 manómetros con protector químico con rango de medición de 0 a 200PSI. 2 tanques en PRFV de 500Lt con tapa y soporte para agitador. 1 tablero para protección eléctrica del sistema. Accesorios y tornillería para su correcta instalación	UN	1,00	$ 72.669.355,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%

3.10.2	Suministro e instalación de sistema de dosificación de sulfato con una estructura tipo SKID en acero inoxidable para soporte de dos bombas dosificadoras. Incluye: 2 bombas dosificadoras presión máx. 2bar y caudal máx. 60Lt/Hr. 2 agitadores mecánicos con paletas en acero inoxidable potencia motor de 1HP y RPM 1800 sin reducción. 2 filtros Y en PVC. 2 válvula de alivio de presión PVC 1/2". 2 válvula de contrapresión PVC 1/2". 2 cilindros de calibración en PVC. 2 manómetros con protector químico con rango de medición de 0 a 200PSI. 2 tanques en PRFV de 1000Lt con tapa y soporte para agitador. 1 tablero para protección eléctrica del sistema. Accesorios y tornillería para su correcta instalación	UN	1,00	$ 79.509.817,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.10.3	Suministro e instalación de sistema de dosificación de hipoclorito de sodio en estructura tipo SKID en acero inoxidable para soporte de dos bombas dosificadoras. Incluye: 2 bombas dosificadoras presión máx. 10bar y caudal máx. 4Lt/Hr. 2 agitadores mecánicos con paletas en acero inoxidable potencia motor de 1HP y RPM 1800 sin reducción. 2 filtros Y en PVC. 2 válvula de alivio de presión PVC 1/2". 2 válvula de contrapresión PVC 1/2". 2 cilindros de calibración en PVC. 2 manómetros con protector químico con rango de medición de 0 a 200PSI. 2 tanques en PRFV de 100Lt con tapa y soporte para agitador. 1 tablero para protección eléctrica del sistema. Accesorios y tornillería para su correcta instalación	UN	1,00	$ 58.117.977,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.10.4	Linea de dosificación de preparación de sulfato entre el 10% al 20% con longitud de 30m en tuberia CPVC de 1/2". Incluye accesorios y válvulas	UN	1,00	$ 818.238,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.10.5	Linea de dosificación de preparación de cal entre el 10% al 20% con longitud de 30m en tuberia CPVC de 1/2". Incluye accesorios y válvulas	UN	1,00	$ 818.238,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
3.10.6	Linea de dosificación de preparación de hipoclorito de sodio entre el 10% al 20% con longitud de 30m en tuberia CPVC de 1/2". Incluye accesorios y válvulas	UN	1,00	$ 818.238,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
	TOTAL EQUIPAMIENTO			**$ 719.383.081,00**									
4	**ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA**												
4.1	**PERSONAL TECNICO Y COSTOS DE LABORATORIOS (Ensayos de laboratorio)**												
4.1.1	Arranque y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua potable, incluye acompañamiento permanente de personal tecnico, profesional y caracterizaciones por medio de ensayos de laboratorios de manera quincenal en la entrada y salida del sistema de tratamiento	MES	1,00	$ 28.175.200,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
	TOTAL ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA			**$ 28.175.200,00**									
5	**TRANSPORTE**												
5.1	**TRANSPORTE DE INSUMOS Y MATERIALES DESDE TRAYECTO NO CARRETEABLE**												
5.1.1	Viaje por medio de un tractor sencillo con capacidad de carga de 4.0Ton desde punto no carreteable al sitio del proyecto en un tramo de 0.2KM. Incluye ayudantes para cargue y descargue del material	VJE	257,00	$ 51.465,00	257,00	$13.226.505,00	100,00%				257,00	$13.226.505,00	100,00%
	TOTAL TRANSPORTE			**$ 51.465,00**									
	AVANCE DE ACTIVIDADES			TOTAL COSTO OBRA (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	$ 1.142.337.980,00	40,12%	$31.505.010,00	1,11%	$ 1.173.843.789,00	41,23%			
				A.I.U. (31%)	$ 354.124.774,00		$9.766.801,00		$ 363.891.575,00				
				COSTO TOTAL	$ 1.496.462.754,00		$41.272.611,00		$ 1.537.735.364,00				
6	**SUMINISTRO**												
6.1	**SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y HERRAMIENTAS PARA OPERACIÓN**												
6.1.1	Suministro de equipos para laboratorio para plantas de tratamiento de agua potable (PTAP)	UN	1,00	$ 57.474.014,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
6.1.2	Suministro de herramientas para operación de plantas de tratamiento	UN	1,00	$ 12.296.200,00	0,00	$0,00	0,00%	1,00	$12.296.200,00	100,00%	1,00	$12.296.200,00	100,00%
6.2	**SUMINISTRO DE ADAPTADORES DE CODOS FLOCULANTES**												
6.2.1	Suministro de adaptadores en PRFV espesor de 5mm para el control de gradientes en codos floculantes esquineros con ancho de 0.10m y largo de 0.10m. Apertura del adaptador para salida final de agua: Ancho de 0.07m y largo de 0.07m, según planos de detalles para un caudal de 9.40LPS	UN	6,00	$ 114.534,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
6.2.2	Suministro de adaptadores en PRFV espesor de 5mm para el control de gradientes en codos floculantes esquineros con ancho de 0.12m y largo de 0.12m. Apertura del adaptador para salida final de agua: Ancho de 0.10m y largo de 0.10m, según planos de detalles para un caudal de 9.40LPS	UN	6,00	$ 129.695,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
6.2.3	Suministro de adaptadores en PRFV espesor de 5mm para el control de gradientes en codos floculantes esquineros con ancho de 0.20m y largo de 0.20m. Apertura del adaptador para salida final de agua: Ancho de 0.15m y largo de 0.15m, según planos de detalles para un caudal de 9.40LPS	UN	6,00	$ 131.860,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
	ACTIVIDADES DE SUMINISTRO			TOTAL SUMINISTRO (6)	$ 0,00	0,00%	$12.296.200,00	0,42%	$ 12.296.200,00	0,42%			
				A (26%)	$ 0,00		$3.197.012,00		$ 3.197.012,00				
				COSTO TOTAL	$ 0,00		$15.493.212,00		$ 15.493.212,00				
	Inspeccion y tramite red de media y/o baja tensión y certificación RETIE - RED DE MB, BT Y USO FINAL	GL	1,00	$ 8.000.000,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
	Inspeccion y tramite red de media y/o baja tensión y certificación RETIE - SISTEMA FOTOVOLTAICO 10.66KW	GL	1,00	$ 3.000.000,00	0,00	$0,00	0,00%				0,00	$0,00	0,00%
	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIONES			TOTAL CERTIFICACIONES	$ 0,00	0,00%	$0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%			
				COSTO TOTAL	$ 0,00		$0,00		$ 0,00				
	VALOR TOTAL DE OBRA + AIU + SUMINISTRO + CERTIFICACIONES				**$1.496.462.754,00**	40,12%	**$56.765.823,00**	1,52%	**$1.553.228.577,00**	41,64%			

Nota: En caso de adicional al contrato y la fuente de financiación sea diferente, se debe anexar cuadro de avance y grafica independiente.

6. COMPARACIÓN PORCENTUAL AVANCE

AVANCE PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE ACTUAL ACUMULADO	% DE RETRASO O AVANCE	AVANCE MES ACTUAL
44,68%	41,64%	-3,04%	1,52%

7. ASPECTO JURIDICO CONTRACTUAL

POLIZAS DE GARANTIA

CONCEPTO	VIGENTE	DESDE	HASTA	VALOR	OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SI	27-mar.-2025	24-jun.-2026	$ 746.074.636,00	Nota: La vigencia de las polizas se ajustan a la firma del acta de inicio, la ultima actualización del contrato.
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	SI	27-mar.-2025	24-jun.-2026	$ 1.119.111.954,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	SI	27-mar.-2025	24-feb.-2029	$ 746.074.636,00	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	24-feb.-2026	24-feb.-2031	$ 1.119.111.954,00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI	27-mar.-2025	24-jun.-2026	$ 373.037.318,00	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	27-mar.-2025	25-feb.-2026	$ 427.050.000,00	

ACTAS REALIZADAS			CONTRATOS ADICIONALES			PRORROGAS			
CONCEPTO	FECHA	CAUSAL(ES)	Nº	VALOR	CAUSAL(ES)	Nº	TIEMPO	FECHA	CAUSAL(ES)
ACTA DE VISITA INICIAL	4-mar.-2025	INSPECCION INICIAL							
ACTA DE SOCIALIZACION	4-mar.-2025	SOCIALIZAR COMUNIDAD BENEFICIARIA							
ACTA DE INICIO	27-mar.-2025	INICIO DE OBRA							
ACTA DE SUSPENSION No. 1	23-dic.-2025	FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO							
ACTA DE REINICIO No. 1	14-ene.-2026	SUPERADAS LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN No. 1							

8. INFORMACION FINANCIERA

Nº	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONCEPTO	FECHA	PORCENTAJE	VALOR	AMORTIZACION	NETO PAGADO	ACUMULADO	SALDO ACTUAL
1	RECURSOS PROPIOS	ACTA PARCIAL No. 1	25-nov-2025	35,01%	$ 1.320.507.704,00	$ 398.552.311,00	$ 923.955.393,00	$ 1.320.507.704,00	$ 2.401.035.470,00

9. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

Se evidencia acompañamiento siso, ambiental y social por parte del contratista.

Esta interventoria realiza el seguimiento técnico, SST, ambiental, administrativo y financiero de la obra.

Continua la constante de la baja disponibilidad de mano de obra no calificada por alta demanda en la zona. Se sugiere reforzar convocatoria local

Se realizo seguimiento a la delimitacion y señalizacion en la zona de trabajo para prevenir accidentes.

Se realiza traslado por medio de tractor del material sobrante de la excavación, ya que las volquetas no tienen acceso hasta la PTAP; este trasporte no esta incluido en el contrato pero se hace necesario ya que no hay otra manera para disponer de este material.

Elaborado por:

ING. MICHELL FIERRO CRUZ
Director de Interventoria
CONTRATO No. 111 DE 2024

10. REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCIÓN: Formaletada para encofrado de los muros del sedimentador y filtro de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).



DESCRIPCIÓN: Formaletada para encofrado de los muros del sedimentador y filtro de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).



DESCRIPCIÓN: Visita de obra realizada el dia 29 de enero de 2026, conjuntamente entre Contratista de obra, Interventoria y Apoyo a la supervisión.



DESCRIPCIÓN: Visita de obra realizada el dia 29 de enero de 2026, conjuntamente entre Contratista de obra, Interventoria y Apoyo a la supervisión.



DESCRIPCIÓN: Suministro de mastil metalico galvanizado para red electrica.



DESCRIPCIÓN: Suministro de mastil metalico galvanizado para red electrica.



DESCRIPCIÓN: Suministro de mastil metalico galvanizado para red electrica.



DESCRIPCIÓN: Suministro de herramientas para operación de planta de tratamiento.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 006 DE 2026

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL META - EDESA S.A. E.S.P.

INFORME No. 1



"PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROYECTOS EN EJECUCION DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META - EDESA S.A. E.S.P."

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 006 DE 2026

ENERO DE 2026

edeea	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO INFORME DE SUPERVISIÓN	META	OP-FT-39 Version: 04 Octubre 8 de 2025

		PERIODO COMPRENDIDO			
Fecha Informe	5/02/2026	Desde	5/01/2026	Hasta	4/02/2026

INFORMACION DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

Código BPIN	Objeto del proyecto
2023005500284	"AMPLIACION Y OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META"

SEGUIMIENTO Y CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL A LOS CONTRATOS SUSCRITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

CONTRATISTA

Contrato de Obra N°	Nombre	Representante Legal	Nit
110 DE 2024	CONSORCIO PTAP URIBE	YOLANDA JEANETH CUESTA BOTIVA	901.902.283-7

Dirección	Ciudad	Email
Clle 46 # 32-17 Barrio Triunfo	VILLAVICENCIO	uribeptap@gmail.com

Fecha de Inicio	Plazo Inicial	Valor Inicial
27 DE MARZO DE 2025	ONCE (11) MESES	$ 3.730.373.180,00

Fecha de Terminación Inicial	26 DE FEBRERO DE 2026

	Fecha del Acta	Desde	Hasta	Plazo días	Motivo
Acta de Suspensión N° 1	19 DE DICIEMBRE DE 2025	23 DE DICIEMBRE DE 2025	13 DE ENERO DE 2026	22,00	Festividades o celebraciones locales
Acta de Ampliación N° X a la Suspensión N° X	N/A	N/A	N/A	-	SELECCIONE EL MOTIVO

Acta de Reinicio N° 1	Fecha del Acta	14 DE ENERO DE 2026		
Acta de Modificación en Tiempo (Prorroga) N° X	Fecha del Acta: N/A	Desde: N/A	Plazo: N/A	Motivo: SELECCIONE EL MOTIVO
Acta de Modifcatoria de Cantidades de Obra N° X	Fecha del Acta	N/A		

Acta de Modificatoria en Valor N° X	Fecha del Acta	Valor de Adición	Valor de Reducción	Valor Ajustado del Contrato / Valor Actual
	N/A	$ -	$ -	$ 3.730.373.180,00

Fecha de Terminación Final	20 DE MARZO DE 2026	
Acta de Terminación	Fecha del Acta	N/A
Acta de Recibo Final de Obra	Fecha del Acta: N/A	Valor Final Ejecutado Según Acta de Recibo Final: $ -
Acta de Liquidación	Fecha del Acta: N/A	Valor de Acta de Liquidación: $ -

INTERVENTORIA

Contrato de Interventoría N°	Nombre	Representante Legal	Nit
111 DE 2024	CONSORCIO INTER - URIBE 2025	MICHELL FIERRO CRUZ	901.902.254-3

Dirección	Ciudad	Email
CALLE 47 BIS #28-36 PISO 2	VILLAVICENCIO	GERENCIAMUNRHA@GMAIL.COM

Fecha de Inicio	Plazo Inicial	Valor Inicial
27 DE MARZO DE 2025	ONCE (11) MESES	$ 298.430.902,00

Fecha de Terminación Inicial	26 DE FEBRERO DE 2026

	Fecha del Acta	Desde	Hasta	Plazo días	Motivo
Acta de Suspensión N° 1	19 DE DICIEMBRE DE 2025	23 DE DICIEMBRE DE 2025	13 DE ENERO DE 2026	22,00	Festividades o celebraciones locales
Acta de Ampliación N° X a la Suspensión N° X	N/A	N/A	N/A	-	SELECCIONE EL MOTIVO

Acta de Reinicio N° 1	Fecha del Acta	14 DE ENERO DE 2026		
Acta de Modificación en Tiempo (Prorroga) N° X	Fecha del Acta: N/A	Desde: N/A	Plazo: meses/días	Motivo: MOTIVOS

Acta de Modificatoria en Valor N° X	Fecha del Acta	Valor de Adición	Valor de Reducción	Valor Ajustado del Contrato / Valor Actual
	N/A	$ -	$ -	$ 298.430.902,00

Fecha de Terminación Final	20 DE MARZO DE 2026	
Acta de Terminación	Fecha del Acta	N/A
Acta de Recibo Final de Interventoría	Fecha del Acta: N/A	Valor Final Ejecutado Según Acta de Recibo Final: $ -
Acta de Liquidación	Fecha del Acta: N/A	Valor de Acta de Liquidación: $ -

APOYO A LA SUPERVISIÓN

CPS N°	Nombre	Documento de identidad
006 DE 2026	EIMAR ADRIAN VELASQUEZ GUTIERREZ	86.075.095

Dirección: CARRERA 6 No. 9-88	Ciudad	Email
	RESTREPO (META)	ing.civil-2011@hotmail.com

Fecha de Inicio	Plazo Inicial	Valor Inicial
05 DE ENERO DE 2026	CUATRO (4) MESES	$ 20.000.000,00

Fecha de terminación Inicial	04 DE MAYO DE 2026

	Fecha del Acta	Desde	Hasta	Plazo días	Motivo
Acta de Suspensión N° X	N/A	N/A	N/A	-	SELECCIONE EL MOTIVO
Acta de Ampliación N° X a la Suspensión N° X	N/A	N/A	N/A	-	SELECCIONE EL MOTIVO

Acta de Reinicio N° X	Fecha del Acta	N/A		
Acta de modificación en Tiempo (Prorroga) N° X	Fecha del Acta: N/A	Desde: N/A	Plazo: meses/días	Motivo: SELECCIONE EL MOTIVO

Acta de Modificatoria en Valor N° X	Fecha del Acta	Valor de Adición	Valor de Reducción	Valor Ajustado del Contrato / Valor Actual
	N/A	$ -	$ -	$ 20.000.000,00

Fecha de Terminación Final	N/A	
Acta de Terminación	Fecha del Acta	N/A

CONTROL DE POLIZAS

CONTRATISTA

AMPAROS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN ACTA DE INICIO					
	NÚMERO DE POLIZA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN DE LAS POLIZAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-44-101061908 ANEXO 1 Y 2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	27-Mar-25	24-Jun-26	$ 746.074.636,00	21 DE ABRIL DE 2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			27-Mar-25	24-Jun-26	$ 1.119.111.954,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL			27-Mar-25	24-Feb-29	$ 746.074.636,00	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA			24-Feb-26	24-Feb-31	$ 1.119.111.954,00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS			27-Mar-25	24-Jun-26	$ 373.037.318,00	

AMPAROS DE R.C.E	NÚMERO DE POLIZA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN DE LAS POLIZAS
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	30-40-101023106 ANEXO 1 Y 2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	27-Mar-25	25-Feb-26	$ 427.050.000,00	21 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA						
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL						
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS						
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE						
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES						

INTERVENTORIA

AMPAROS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN ACTA DE INICIO					
	NÚMERO DE POLIZA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN DE LAS POLIZAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-44-101061884 ANEXO 1 Y 2	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	27-Mar-25	30-Jun-26	$ 59.686.180,40	21 DE ABRIL DE 2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO			27-Mar-25	30-Aug-26	$ 89.529.270,60	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL			27-Mar-25	24-Feb-29	$ 59.686.180,40	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS			25-Feb-26	24-Feb-31	$ 59.686.180,40	

APOYO A LA SUPERVISIÓN

AMPAROS DE CUMPLIMIENTO	SEGÚN (REFERENCIAR LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DE POLIZAS REALIZADA Y APROBADA)					
	NÚMERO DE POLIZA	NOMBRE DE LA ASEGURADORA	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN DE LAS POLIZAS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Contrato No. 113 de 2025, CLAUSULA DECIMA PRIMERA - GARANTIAS: De conformidad con el parágrafo segundo del articulo 31 del acuerdo 004 de 2013 en los contratos cuya cuantia sea inferior a 50 SMMLV no es obligatoria la exigencia de garantias por consiguiente y teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, valor y forma de pago se prescindirá de las mismas.
CALIDAD DEL SERVICIO			N/A	N/A	N/A	
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO			N/A	N/A	N/A	

CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS CONTRACTUALES

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA INTERVENTORÍA

	CUMPLIMIENTO
Cumplimiento compromisos del comité de seguimiento	X
Informe detallado del mes enero del año 2026	X
Informe mensual de gestión de seguridad y salud en el trabajo	X
IN-FT-11 Certificación aportes sistemas seguridad social	X
IN-FT-12 Informe ejecutivo mensual	X
IN-FT-15 Informe inversión y buen manejo de anticipo	X

SEGUIMIENTO A LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA INTERVENTORÍA

El contrato de interventoria No. 111 de 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO AMPLIACION Y OPTIMIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA URIBE - META", presentó y cumple con los pagos de salud, pensión y riesgos laborales de acuerdo con el personal y los soportes presentados durante el periodo comprendido entre el (05/enero/2026) y (04/febrero/2026).

CONCEPTO DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante el presente periodo comprenido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, la interventoría ejecutada mediante el contrato No. 111 de 2024, cumplió con las obligaciones propias del contrato llevando a cabo el control y seguimiento de las actividades ejecutadas mediante el contrato de obra No. 110 de 2024.

edeea	INFORME DE CONTROL Y SEGUIMIENTO	META	OP-FT-39
	INFORME DE SUPERVISIÓN		Version: 04
			Octubre 8 de 2025

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL REALIZADAS POR EL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se realizó el apoyo a la supervisión que realiza EDESA S.A. E.S.P. a la interventoria llevando a cabo el control y seguimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de interventoría No. 111 de 2024, teniendo en cuenta las indicaciones y recomendaciones realizadas por el supervisor delegado por la entidad las cuales se encuentran enmarcadas en el manual de supervisión vigente de la entidad.

Durante el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se realizó el seguimeinto a la interventoría ejecutada mediante el contrato de interventoría No. 111 de 2024, gestionando mediante visitas de obra, revisión de informes ejecutivos y solicitudes de informes de avance semanal el control de los avances y/o atrasos generados al contrato objeto de supervisión.

De igual manera durante el periodo comprendido entre el 05 de enero al 04 de febrero de 2026, se realizó el respectivo acompañamiento en la ejecución de las actividades para el desarrollo del proyecto.

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

AVANCE FINANCIERO COMPONENTE DE OBRA

Valor Total del Contrato de Obra	Valor Pagado a la fecha	Valor Pendiente por girar	AVANCE FINANCIERO
$ 3.730.373.180,00	$ 2.049.067.347,00	$ 1.681.305.833,00	54,93%

AVANCE FINANCIERO COMPONENTE DE INTERVENTORIA

Valor Total del Contrato de Interventoría	Valor Pagado a la fecha	Valor Pendiente por girar	AVANCE FINANCIERO
$ 298.430.902,00	$ 163.918.158,92	$ 134.512.743,08	54,93%

AVANCE FINANCIERO COMPONENTE DE APOYO A LA SUPERVISION

Valor Total del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales (Apoyo a la Supervisión)	Valor Pagado a la fecha	Valor Pendiente por girar	AVANCE FINANCIERO
$ 20.000.000,00	$ -	$ 20.000.000,00	0,00%

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

Valor total del Contratado del Proyecto	Valor Pagado del Proyecto	Valor pendiente por girar del Proyecto	AVANCE FINANCIERO
$ 4.048.804.082,00	$ 2.212.985.505,92	$ 1.835.818.576,08	54,66%

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA DEL PROYECTO

% Programado de la Obra	Valor Ejecutado Actual de la Obra	Porcentaje de Retraso de Obra	% AVANCE FISICO DE OBRA
44,68%	$ 1.553.228.577,00	-3,04%	41,64%

SE ANEXA EL INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA IN-FT-12, QUE SUSTENTA EL AVANCE FISICO DE LA OBRA Y LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

FIRMA

Ing. EMAR ADRIAN VELASQUEZ GUTIERREZ
Profesional de Apoyo a la Supervisión
Contrato de Prestación de Servicios No. 006 de 2026

Ing. ALIX MILENA CASTRO CALDERON
Coordinadora de Interventoría
Supervisora
EDESA S.A. E.S.P.

ANEXOS Y SOPORTES DOCUMENTALES

- COPIA DE INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORIA IN-FT-12
- ACTAS DE VISITA DE SUPERVISION IN-FT-55
- COPIA DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA
- DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
- ANEXO 1 CD CON TODA LA DOCUMENTACION DIGITALIZADA
- OTROS
