

CONSORCIO URBANOVA SED
NIT 901.784.778-3
CRA 7 155C 20 OFICINA 3301
Tel: (601) 6798709
Bogotá - Colombia
contabilidad@novaurbano.com

Factura electrónica de venta
No. FE 17

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C. "S.E.D."		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	(031) 3241000
Dirección	Avenida el dorado No. 66-63	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 12:28
Expedición	02/12/2025, 12:28
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta No. 16 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.5698312 de 2023, cuyo objeto es Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito	1.00	2,565,491,618.33

Total items: 1

Total Bruto	2,565,491,618.33
Total a Pagar	2,565,491,618.33

Valor en Letras:
Dos mil quinientos sesenta y cinco millones cuatrocientos noventa y un mil seiscientos dieciocho pesos m/cte con treinta y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,565,491,618.33

Observaciones:
PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2025 AL CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2025 VALOR TOTAL INCLUIDO AIU =$ 2.565.491.618,33 AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (30%) = $ 769.647.485,00NETO A PAGAR PRESENTE ACTA = $ 1.795.844.133,00 REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 384215406 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE CONSORCIO URBANOVA SED CON NIT 901.784.778-3 URBANISCOM S.A.S.2% NOVA URBANO SAS 93% HARVEY ACUÑA CAVIEDES 5%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764076657741 aprobado en 20240806 prefijo FE desde el número 1 al 60 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.60
CUFE: bc1d7049678e2b7d2951bef098ab635e468d9b961875b43d28afb2a4d4d9d2c036457ad3dd16595fc12408d3f5325779

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA PARCIAL NO. 16

«Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito».

BOGOTÁ D.C.

5 NOVIEMBRE DE 2025 AL 4 DICIEMBRE 2025

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN:	El predio destinado a la construcción del COLEGIO GENERAL SANTANDER se encuentra ubicado en la calle 159 8-56, localidad de Usaquén en Bogotá
ÁREA ÚTIL DEL PREDIO:	5425,43 m2
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN:	9.242,54 m2
ACTA INICIO:	5 de agosto de 2024
PLAZO ESTABLECIDO PARA EJECUCIÓN:	18 meses
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL:	4 de febrero de 2026

Prefactura

CONSORCIO URBANOVA SED
NIT 901.784.778-3
CR 7 155 C 20 OF 3301
Tel: (601) 6798709
Bogotá - Colombia
administración@novaurbano.com

PRE FACTURA DE VENTA
No. PRE - FE 16

Señores	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA D.C. "S.E.D."		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	
Dirección	Avenida el dorado No. 66-63	**Ciudad**	BOGOTA D.C.

Fecha y hora Factura	
Generación	05/12/2025, 12:00
Expedición	05/12/2025, 12:00
Vencimiento	05/12/2025, 12:00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta No. 16 del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.5698312 de 2023, cuyo objeto es Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito	1	$ 2.565.491.618,33

Total ítems: 1

Total Bruto	$ 2.565.491.618,33
IVA 19%	
IVA 0%	
Total a pagar	$ 2.565.491.618,33

Valor en letras:

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

Condiciones de pago:
Transferencia

Observaciones:

PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2025 AL CUATRO (04) DE DICIEMBRE DE 2025

VALOR TOTAL INCLUIDO AIU =	$ 2.565.491.618,33
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (30%) =	$ 769.647.485,00
AJUSTE AL PESO =	-$ 0,33
NETO A PAGAR PRESENTE ACTA =	$ 1.795.844.133,00

REALIZAR TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 384215406 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE CONSORCIO URBANOVA SED CON NIT 901.784.778-3

CONSORCIO URBANOVA SED - NIT. 901.784.778-3
CONSORCIADOS
URBANISCOM S.A.S.2%
NOVA URBANO SAS 93%
HARVEY ACUÑA CAVIEDES 5%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764076657741 aprobado en 20240806 prefijo FE desde el número 1 al 60 Vigencia: 24 Meses**

Actividad Económica 4290 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Tarifa 7.6

CUFE:

Fabricante: Software y proveedor tecnologico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electronica ver en el XML

Resolucion de facturacion

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764076657741

(415)7707212489984(8020) 001876407665774 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 8 4 7 7 8	3				

11. Razón social
CONSORCIO URBANOVA SED

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
CR 7 # 155 C - 20 OF 3301

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-08-06 / 01:14:22 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ACUÑA CAVIEDES HARVEY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79058668 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO URBANOVA SED

997. Fecha formalización 2024-08-06/13:14:22

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764076657741

(415)7707212489984(8020) 001876407665774 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 7 8 4 7 7 8	3				

11. Razón social

CONSORCIO URBANOVA SED

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO URBANOVA SED CR 7 # 155 C - 20 OF 3301	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	1	60	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Acta de Interventoría para autorizar pagos

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 16

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312 DE DICIEMBRE 28 DE 2023

Correspondiente al periodo: del 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2025, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de diciembre del 2025, se reunieron las siguientes personas: EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA, identificada con **C.C 1.118.537.436 de YOPAL** en su calidad de Representante Legal de LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S. identificado con NIT 900.436.622-8 en calidad de Interventor, y HARVEY ACUÑA CAVIEDES, identificado con **C.C No. 79.058.668 de ENGATIVÁ,** en su calidad de Representante Legal de CONSORCIO URBANOVA SED identificado con NIT 901.784.778-3 en su condición de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	$40.020.746.260,00
FORMA DE PAGO:	La Entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado. Nota: La Entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato, el cual se hará a la liquidación del contrato.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga omodificaciones):	18 MESES
FECHA DE INICIO:	05/agosto /2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	04/febrero/2026
INTERVENTOR:	LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

Logia 3
Desarrollo de Proyectos e Ideas

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Interventoría verificó el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como la vigencia de las pólizas del contrato y las constancias de pagos parafiscales para el presente periodo, por lo que se procede a autorizar el pago No. 16, el cual corresponde a un valor de $1.795.844.133.00 (MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE) el porcentaje total de avance del contrato a la fecha es de 56,31%.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONTRATISTA
HARVEY ACUÑA CAVIEDES
Representante Legal
CONSORCIO URBANOVA SED

INTERVENTOR
EHIDA JULIET RAMÍREZ GUINA
Representante Legal
LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S.

Acta parcial

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA PARCIAL No. 16

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 5 de noviembre de 2025 al 4 de diciembre de 2025

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312 de 2023

CONTRATISTA : CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECCION : Cra 7 #155c-20 OF 3301

C.C. ó NIT : 901.784.778-3

TELEFONO : 601 6798709

INTERVENTOR : LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

DIRECCION : Carrera 51 # 64- 83 OF 201

C.C. ó NIT : 900.436.622-8

TELEFONO : 601 3656724

OBJETO: Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

LOCALIZACION : COLEGIO GENERAL SANTANDER

VR. INICIAL : $ 40.020.746.260,00

ANTICIPO (30%) $ 12.006.223.878,00

VR. ADICIONAL :

VR. FINAL : $ 40.020.746.260,00

PLAZO INICIAL : 18 MESES

FECHA INICIACION : 5 de agosto de 2024

FECHA TERMINAC.INICIAL : 4 de febrero de 2026

PLAZO ADICIONAL :

TIEMPO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL : 18 MESES

FECHA FINAL : 4 de febrero de 2026

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
3500	26-oct-23	6431	28-dic-23	$ 12.495.830.797,00			
9	1-ene-24	42	1-ene-24	$ 15.625.203.356,00	$ 2.136.368.156,00	$ 1.795.844.133,00	$ 340.524.023,00
27	1-ene-25	321	1-ene-25	$ 11.899.712.107,00	$ 11.899.712.107,00		$ 11.899.712.107,00
TOTAL				$ 40.020.746.260,00	$ 14.036.080.263,00	$ 1.795.844.133,00	$ 12.240.236.130,00

VALOR TOTAL A PAGAR $ 1.795.844.133,00 MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	**PRELIMINARES**											
1,1	**REPLANTEO**											
1.1.1	Localización, trazado y replanteo con elementos de precisión.	m²	6.014,99	$ 2.771,00	$ 16.667.537,00			6.014,99	$ 16.667.537,29	6.014,99	$ 16.667.537,29	100,00%
1.1.2	Descapote manual y retiro, de acuerdo con la geología local descrita en el informe de suelos.	m³	541,56	$ 72.079,00	$ 39.035.103,00			503,78	$ 36.311.958,62	503,78	$ 36.311.958,62	93,02%
1,2	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**											
1.2.1	Demolición de pavimentos en concreto y/o adoquín de arcilla o concreto, espesor hasta 15cm. Incluye retiro de RCD y disposición final.	m²	1.611,51	$ 52.069,00	$ 83.909.714,00			1.611,51	$ 83.909.714,19	1.611,51	$ 83.909.714,19	100,00%
1.2.2	Demolición de cañuelas, cunetas y/o cárcamos en concreto para recolección de aguas lluvias, hasta un a=0.5m y e=0.4m.	m	179,47	$ 54.837,00	$ 9.841.596,00			179,47	$ 9.841.596,39	179,47	$ 9.841.596,39	100,00%
1.2.3	Desmonte de cubiertas en tejas de láminas metálicas de bajo calibre con desmonte de la perfilería para la subestructura de cubierta. Incluye disposición final.	m²	2.068,28	$ 17.521,00	$ 36.238.334,00			1.000,10	$ 17.522.752,10	1.000,10	$ 17.522.752,10	48,35%
1.2.4	Demolición manual y con maquinaría pesada de edificaciones con estructura en pórticos de concreto y muros en mampostería en ladrillos huecos de arcilla. Incluye el retiro y suspensión de redes eléctricas, luminarias, tomacorrientes, equipos, redes hidro sanitarias, redes de gas y cualquier otra red existente; el retiro de las tuberías incluye el de los conductores a su interior. Incluye el desmonte de puertas y ventanas en cualquier material. Incluye la demolición de pisos y/o placas aéreas de piso y contrapiso. Incluye el desmonte de muebles fijos, aparatos hidrosanitarios, retiro de mobiliario dotacional, etc. Incluye la demolición de la estructura en concreto de la edificación, así como la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo , también incluye la demolición de las escaleras o elementos de circulación vertical. Incluye el desmonte de divisiones o cerramientos en muros livianos. Incluye la demolición de muros divisiorios o de fachada en mampostería de ladrillos huecos de arcilla. Incluye la disposición final de cada uno de los tipos de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.	m²	2.065,76	$ 123.744,00	$ 255.625.405,00			2.065,76	$ 255.625.405,44	2.065,76	$ 255.625.405,44	100,00%
1.2.5	Demolición de cimentaciones superficiales de edificaciones de uno y dos niveles en concreto reforzado hasta 1.5m de profundidad. Incluye la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo y la disposición final de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.	m²	1.695,68	$ 41.893,00	$ 71.037.122,00			1.613,64	$ 67.600.220,52	1.613,64	$ 67.600.220,52	95,16%
1.2.6	Demolición de estructuras aisladas en concreto reforzado con sus cimentaciones. Incluye la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo y la disposición final de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.	m³	47,41	$ 131.593,00	$ 6.238.824,00			47,41	$ 6.238.824,13	47,41	$ 6.238.824,13	100,00%
1.2.7	Retiro y disposición final de puntos de recolección de residuos o canecas de basura, l=2m x a=0.6m x h=1.2m.	Und	4,00	$ 31.661,00	$ 126.644,00			4,00	$ 126.644,00	4,00	$ 126.644,00	100,00%
1.2.8	Desmonte y disposición final de juegos infantiles de 2.00m x 3.00m.	Und	1,00	$ 482.628,00	$ 482.628,00							
1.2.9	Desmonte y disposición final de estructuras de canchas deportivas con arco y soporte para tablero.	Und	2,00	$ 388.851,00	$ 777.702,00							
1.2.10	Demolición de muro de cerramiento en mampostería confinada, incluye demolición de la cimentación superficial hasta una profundidad de 1.5m bien sea corrida o aislada. Incluye retiro de RCD y disposición final. A ejecutar en fase final de obra.	m²	694,31	$ 36.357,00	$ 25.243.029,00							
1.2.11	Demolición y retiro de cerramiento en reja metálica, incluye demolición de la cimentación superficial hasta una profundidad de 1.5m bien sea corrida o aislada. A ejecutar en fase final de obra.	m²	384,94	$ 26.398,00	$ 10.161.646,00							
1.2.12	Retiro y disposición final de postes metálicos de Ø4", incluye retiro de malla liviana.	m	31,50	$ 6.728,00	$ 211.932,00							
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
2,1	**EXCAVACIONES**											
2.1.1	Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio autorizado).	m³	6.098,74	$ 61.276,00	$ 373.706.392,00			6.098,74	$ 373.706.392,24	6.098,74	$ 373.706.392,24	100,00%
2,2	**RELLENOS**											
2.2.1	Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y compactación).	m³	695,68	$ 111.457,00	$ 77.538.406,00			695,68	$ 77.538.405,76	695,68	$ 77.538.405,76	100,00%
2.2.2	B15 - Suministro e instalación de sub-base granular, según estudio de suelos. Espesor y acabado según pliego de condiciones.	m³	894,23	$ 146.743,00	$ 131.221.993,00							
2.2.3	Suministro e instalación de geotextil NT2000.	m²	4.471,17	$ 11.440,00	$ 51.150.185,00							
3	**ESTRUCTURAS**											
3,1	**SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN**											
3.1.1	Suministro e instalación de pilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.5m, de 24.5MPa. (Incluye prehuecos, excavación, retiro de material, transporte, armado y desmonte de equipos, no incluye acero).	m	4.105,68	$ 351.239,00	$ 1.442.074.938,00							
3.1.2	Suministro e instalación de pilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.8m, de 24.5MPa. (Incluye prehuecos, excavación, retiro de material, transporte, armado y desmonte de equipos, no incluye acero).	m	3.717,00	$ 755.639,00	$ 2.808.710.163,00							
3.1.3	Suministro e instalación de concreto de limpieza de 14.5MPa, e=0,05m.	m²	658,58	$ 43.841,00	$ 28.872.806,00			658,58	$ 28.872.805,78	658,58	$ 28.872.805,78	100,00%

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
3.1.4	Suministro e instalación de dados de cimentación en concreto reforzado de 28MPa.	m³	1.351,50	$ 920.532,00	$ 1.244.098.998,00			1.062,93	$ 978.461.078,76	1.062,93	$ 978.461.078,76	78,65%
3.1.5	Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 28MPa (incluye vibrado y curado). No incluye acero.	m³	51,59	$ 924.431,00	$ 47.691.395,00			51,59	$ 47.691.395,29	51,59	$ 47.691.395,29	100,00%
3.1.6	Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 35MPa (incluye vibrado y curado). No incluye acero.	m³	11,75	$ 984.328,00	$ 11.565.854,00							
3.1.7	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Cimentación.	kg	905.356,01	$ 6.606,00	$ 5.980.781.802,00			432.384,50	$ 2.856.332.007,00	432.384,50	$ 2.856.332.007,00	47,76%
3.1.8	Suministro e instalación de muros de contención y tanques en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto.	m³	164,02	$ 818.121,00	$ 134.188.206,00			132,29	$ 108.229.227,09	132,29	$ 108.229.227,09	80,65%
3.1.9	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros de contención y tanques en concreto.	kg	22.447,15	$ 6.606,00	$ 148.285.873,00							
3.1.10	Descabece de pilotes en concreto 24.5MPa h=2m Ø0.5m.	Und	134,00	$ 116.651,00	$ 15.631.234,00							
3.1.11	Descabece de pilotes en concreto 24.5MPa h=2m Ø0.8m.	Und	131,00	$ 188.101,00	$ 24.641.231,00							
3.1.12	Suministro e instalación de zarpas de cimentación de muros en concreto reforzado de 28MPa.	m³	53,36	$ 920.532,00	$ 49.119.588,00							
3,2	**SUPERESTRUCTURA - CONCRETO**											
3.2.1	Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto.	m³	567,93	$ 981.657,00	$ 557.512.460,00	65,64	$ 64.435.965,48	426,89	$ 419.059.556,73	492,53	$ 483.495.522,21	86,72%
3.2.2	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla.	kg	138.267,91	$ 6.606,00	$ 913.397.813,00			138.267,91	$ 913.397.813,46	138.267,91	$ 913.397.813,46	100,00%
3.2.3	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Nivel sótano.	m³	3,75	$ 981.657,00	$ 3.681.214,00			3,75	$ 3.681.213,75	3,75	$ 3.681.213,75	100,00%
3.2.4	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas nivel sótano.	kg	1.121,43	$ 6.606,00	$ 7.408.167,00							
3.2.5	Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel.	m³	8,92	$ 886.558,00	$ 7.908.097,00			8,92	$ 7.908.097,36	8,92	$ 7.908.097,36	100,00%
3.2.6	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placas de contrapiso de sótano y primer nivel.	kg	588,38	$ 6.606,00	$ 3.886.838,00							
3.2.7	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel.	m³	62,82	$ 981.657,00	$ 61.667.693,00			62,97	$ 61.814.941,29	62,97	$ 61.814.941,29	100,24%
3.2.8	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas primer nivel.	kg	18.786,15	$ 6.606,00	$ 124.101.307,00							
3.2.9	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	m³	247,01	$ 1.039.665,00	$ 256.807.652,00			247,01	$ 256.807.651,65	247,01	$ 256.807.651,65	100,00%
3.2.10	Suministro e instalación de Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa segundo nivel.	kg	29.658,63	$ 6.606,00	$ 195.924.910,00							
3.2.11	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	m³	44,81	$ 981.657,00	$ 43.988.050,00			44,81	$ 43.988.050,17	44,81	$ 43.988.050,17	100,00%
3.2.12	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas segundo nivel.	kg	13.400,31	$ 6.606,00	$ 88.522.448,00							
3.2.13	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.	m³	307,96	$ 1.039.665,00	$ 320.175.233,00			307,96	$ 320.175.233,40	307,96	$ 320.175.233,40	100,00%
3.2.14	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa tercer nivel.	kg	38.895,59	$ 6.606,00	$ 256.944.268,00							
3.2.15	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.	m³	46,44	$ 981.657,00	$ 45.588.151,00			46,44	$ 45.588.151,08	46,44	$ 45.588.151,08	100,00%
3.2.16	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas tercer nivel.	kg	13.887,76	$ 6.606,00	$ 91.742.543,00							
3.2.17	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	m³	271,75	$ 1.039.665,00	$ 282.528.964,00			271,75	$ 282.528.963,75	271,75	$ 282.528.963,75	100,00%
3.2.18	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa cuarto nivel.	kg	36.566,78	$ 6.606,00	$ 241.560.149,00							
3.2.19	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	m³	46,18	$ 981.657,00	$ 45.332.920,00			36,53	$ 35.859.930,21	36,53	$ 35.859.930,21	79,10%
3.2.20	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas cuarto nivel.	kg	13.810,00	$ 6.606,00	$ 91.228.860,00							
3.2.21	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Quinto nivel.	m³	276,37	$ 1.039.665,00	$ 287.332.216,00	72,99	$ 75.885.148,35	203,38	$ 211.447.067,70	276,37	$ 287.332.216,05	100,00%
3.2.22	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa quinto nivel.	kg	41.328,28	$ 6.606,00	$ 273.014.618,00							
3.2.23	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Quinto nivel.	m³	54,41	$ 981.657,00	$ 53.411.957,00			17,69	$ 17.365.512,33	17,69	$ 17.365.512,33	32,51%
3.2.24	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas quinto nivel.	kg	16.271,16	$ 6.606,00	$ 107.487.283,00							
3.2.25	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Sexto nivel.	m³	465,34	$ 1.039.665,00	$ 483.797.711,00	159,47	$ 165.795.377,55			159,47	$ 165.795.377,55	34,27%
3.2.26	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa sexto nivel.	kg	59.687,52	$ 6.606,00	$ 394.295.757,00							
3.2.27	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Sexto nivel.	m³	42,62	$ 981.657,00	$ 41.838.221,00							
3.2.28	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas sexto nivel.	kg	12.745,40	$ 6.606,00	$ 84.196.112,00							
3.2.29	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cubierta.	m³	331,88	$ 1.039.665,00	$ 345.044.020,00							
3.2.30	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa cubierta.	kg	45.516,58	$ 6.606,00	$ 300.682.527,00							
3.2.31	Suministro e instalación de columna en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Nivel sótano.	m³	18,89	$ 925.087,00	$ 17.474.893,00							
3.2.32	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas nivel sótano.	kg	4.869,53	$ 6.606,00	$ 32.168.115,00							
3.2.33	Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel y sótano.	m³	622,12	$ 983.094,00	$ 611.602.439,00	42,27	$ 41.555.383,38	379,30	$ 372.887.554,20	421,57	$ 414.442.937,58	67,76%
3.2.34	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa primer nivel.	kg	45.016,76	$ 6.606,00	$ 297.380.717,00							

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
3.2.35	Suministro e instalación de columna en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel.	m³	25,68	$ 925.087,00	$ 23.756.234,00									
3.2.36	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas primer nivel.	kg	6.619,88	$ 6.606,00	$ 43.730.927,00									
3.2.37	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	m³	79,80	$ 983.094,00	$ 78.450.901,00									
3.2.38	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa segundo nivel.	kg	11.085,03	$ 6.606,00	$ 73.227.708,00									
3.2.39	Suministro e instalación de columna en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	m³	25,38	$ 925.087,00	$ 23.478.708,00									
3.2.40	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas segundo nivel.	kg	6.542,55	$ 6.606,00	$ 43.220.085,00									
3.2.41	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.	m³	186,53	$ 983.094,00	$ 183.376.524,00									
3.2.42	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa tercer nivel.	kg	22.773,19	$ 6.606,00	$ 150.439.693,00									
3.2.43	Suministro e instalación de columna en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.	m³	16,40	$ 925.087,00	$ 15.171.427,00									
3.2.44	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas tercer nivel.	kg	4.227,65	$ 6.606,00	$ 27.927.856,00									
3.2.45	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	m³	56,64	$ 983.094,00	$ 55.682.444,00									
3.2.46	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa cuarto nivel.	kg	6.934,00	$ 6.606,00	$ 45.806.004,00									
3.2.47	Suministro e instalación de columna en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	m³	15,90	$ 925.087,00	$ 14.708.883,00									
3.2.48	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas cuarto nivel.	kg	4.098,76	$ 6.606,00	$ 27.076.409,00									
3.2.49	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cubierta.	m³	119,51	$ 983.094,00	$ 117.489.564,00									
3.2.50	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa cubierta.	kg	13.715,41	$ 6.606,00	$ 90.603.998,00									
3.2.51	A2 - Suministro e instalación de escalera en concreto reforzado de 28 Mpa. Cantidad y disposición del refuerzo, tipos de anclaje a la estructura, dimensiones y espesor según cálculos y diseño estructural. Vaciado sobre formaleta metálica, acabado según detalle arquitectónico.	m³	36,38	$ 983.094,00	$ 35.764.960,00			36,38	$ 35.764.959,72	36,38	$ 35.764.959,72	100,00%		
3,3	**SUPERESTRUCTURA - ACERO**													
3.3.1	Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para vigas, viguetas y correas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. (Incluye perfiles tubulares, platinas y soldadura E7018, limpieza de superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + acabado en pintura epóxica color RAL9017 "negro tráfico", pernos de conexión ASTM A354).	kg	25.670,54	$ 18.552,00	$ 476.239.858,00			491,16	$ 9.112.000,32	491,16	$ 9.112.000,32	1,91%		
3.3.2	Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para columnas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. (Incluye perfiles tubulares, platinas y soldadura E7018, limpieza de superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + acabado en pintura epóxica color RAL9017 "negro tráfico", pernos de conexión ASTM A354).	kg	1.314,06	$ 18.552,00	$ 24.378.441,00									
4	**MUROS Y PAÑETES**													
4,1	**MUROS MAMPOSTERÍA**													
4.1.1	C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	m²	2.783,35	$ 211.390,00	$ 588.372.357,00	297,76	$ 62.943.486,40	700,47	$ 148.072.353,30	998,23	$ 211.015.839,70	35,86%		
4.1.2	Suministro e instalación de muro en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, montado en zig zag con aparejo completo, color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.	m²	530,87	$ 308.767,00	$ 163.915.137,00									
4.1.3	Suministor e instalación de muro en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, aparejo calado con desplazamiento a medios, color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.	m²	376,84	$ 172.941,00	$ 65.171.086,00									
4.1.4	C12 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x14x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	m²	525,06	$ 221.504,00	$ 116.302.890,00									
4.1.5	Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm.	m²	4.016,08	$ 49.441,00	$ 198.559.011,00	223,68	$ 11.058.962,88	881,06	$ 43.560.487,46	1.104,74	$ 54.619.450,34	27,51%		
4.1.6	C19 - Suministro e instalación de muro calado en espina en Ladrillo Tolete Gran Formato color Cobrizo 39x11.5x5 cm de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas intercaladas dispuestas en forma de espina de pescado con un 1 cm de pega entre ellos segun diseño arquitectónico. Repellado a ras con emboquillado del mismo tono del ladrillo a 1 cm de profundidad y lavado con hidrófugo. Adovelados con Suministro e instalación de acero de refuerzo en sentido vertical según cálculo estructural y anclados al borde de placa a una profundidad mínima a 10 veces el diámetro de la varilla, mediante epóxico. Las ventanas para el adovelado deben realizarse por la cara que no quede a la vista, en la longitud completa, y cubrirse con chapa una vez llenado. Recomendaciones para la disposición, instalación y destribución del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	m²	251,76	$ 240.712,00	$ 60.601.653,00									
4.1.7	C4 - Suministro e instalación de canal de vidrio translucido en forma de "Taslapado" con 6 mm de espesor, 26.02 cm de ancho, pestaña de 4 cm, aleta de 4.01 y moduladas a una longitud de 1.00 m para reemplazo en caso de daño.De Textura Transluz y color natular. instalación de configuración traslapada (a una cara), con dilataciones de 1 mm entre canales y sellamiento de silicona. Perfil superior tipo c y perfil inferior tipo angulo doble y empaque en poliuretano.	m²	513,93	$ 204.106,00	$ 104.896.197,00									
4.1.8	Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato.	und	2.357,00	$ 19.158,00	$ 45.155.406,00	585,00	$ 11.207.430,00	1.772,00	$ 33.947.976,00	2.357,00	$ 45.155.406,00	100,00%		
4.1.9	Suministro e instalación de columnetas, viguetas y/o vigas cinta en concreto de 21MPa para confinamiento de muros en mampostería.	m³	9,27	$ 937.290,00	$ 8.688.678,00									
4.1.10	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Vigas cinta.	kg	741,37	$ 6.606,00	$ 4.897.490,00									
4.1.11	Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de refuerzo.	m	12.500,00	$ 20.538,00	$ 256.725.000,00	1.056,69	$ 21.702.299,22	3.170,87	$ 65.123.328,06	4.227,56	$ 86.825.627,28	33,82%		
4,2	**MUROS LIVIANOS**													
4.2.1	C3 - Suministro e instalación de divisiones interiores en policarbonato multicell Danpal de 16 mm ancho 1040mm color clear con acabado softlite DG +conectores autoportante U70 cada 1040 mm para vencer luz de 3 mts+ UPD y ángulos de aluminio (acabado Gris nopal) perimetrales para enmarcar el producto. Perfil inferior instalado al nivel del mortero de nivelación y anclado mediante tornillería a la estructura de piso, techo y pared. Ref: Danpal de 16 mm ancho 1040mm color clear con acabado softlite DG o equivalente.	m²	59,60	$ 220.562,00	$ 13.145.495,00									
4.2.2	Suministro e instalación de muro acústico formados por paneles en lámina de madera aglomerada con perforaciones del 30.42% y ranuras de 3.2mm, @16mm, paneles de 0.6m x 1.2m, acabado con chapilla de madera natural especie Flormorado nacional, tabebuia rosea, humedad relativa entre 0% a 15%, e=16mm; instalado completamente a nivel con puntilla sin cabeza. Estructurado con perales de madera, sección de 1" x 2", armados @0.6m. Incluye acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de roca, e=1", densidad de 100kg/m³, instalada entre los perales de madera. Referencia RP16 similar o equivalente.	m²	78,51	$ 518.750,00	$ 40.727.063,00									

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
4.2.3	Suministro e instalación de muro en lámina de fibrocemento e=10mm, doble cara e=0.11m, acabado liso, uniones y filos resanados; instalado completamente a plomo. Estructurado con rieles y parales de acero galvanizado ASTM A653 forma en c, 3-5/8"y 3-1/2" respectivamente, calibre 20, armado cada 50cm en una dirección. Anclado con tornillería de cabeza o fulminantes.	m²	9,46	$ 158.480,00	$ 1.499.221,00									
4.2.4	Suministro e instalación de muro en lámina de madera aglomerada con recubrimiento melamínico resistente a la humedad RH, referencia Rovere o equivalente, e=18mm, instalado con cinta doble faz con espuma de polietileno y adhesivo acrílico de 1mm; adicionalmente instalado con chazo expandible plástico para mampostería de 1/4" con tornillo para madera aglomerada #6 1-5/8" irizado.	m²	423,55	$ 133.511,00	$ 56.548.584,00									
4.2.5	Suministro e instalación de muro de recubrimiento en lámina metálica de acero cold rolled, calibre 14, fabricada con planchas de acero. Estructurado con perfiles tubulares de acero negro, 50mm x 50mm x 2mm. Recubrimiento con dos capas de pintura anticorrosiva y tres capas de pintura en esmalte aplicada con aerógrafo color RAL9017 "negro tráfico".	m²	509,22	$ 198.172,00	$ 100.913.146,00									
4.2.6	Suministro e instalación de muro autoportante para cuartos fríos en paneles tipo sándwich, e=100mm, construidos en caras externas con láminas de acero calibre 26, núcleo de poliisocianurato (PIR), acabado en pintura a base de poliéster color RAL9002 "Blanco gris", sistema de encastre tipo machimbrado.	m²	68,31	$ 370.649,00	$ 25.319.033,00									
4.2.7	Suministro e instalación de muro en paneles acústicos formados por listones de madera aglomerada recubiertos con chapilla de madera natural especie Flormorado Nacional tabebuia rosea, listones de 3cm x 6cm colocados @6cm, formato de panel de 0.6m x 1.2m, humedad relativa entre 0% a 15%, e=45mm; instalado completamente a plomo con puntilla sin cabeza. Estructurado con parales de madera, sección de 1" x 2", armados @0.6m. Incluye acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de roca, e=1", instalada entre los parales de madera.	m²	235,81	$ 372.858,00	$ 87.923.645,00									
4,3	**PAÑETES**													
4.3.1	Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm.	m²	4.992,84	$ 23.525,00	$ 117.456.561,00	358,19	$ 8.426.419,75	1.611,37	$ 37.907.479,25	1.969,56	$ 46.333.899,00	39,45%		
4.3.2	Suministro e instalación de estuco plástico, tres manos, incluye filos y dilataciones.	m²	9.597,28	$ 16.020,00	$ 153.748.426,00									
5	**IMPERMEABILIZACIONES**													
5,1	**CUBIERTAS**													
5.1.1	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización líquido multicapa con solución de asfaltos refinados. Primera capa de imprimante a base de asfaltos refinados de alta adherencia, una mano, color negro, aplicado con rodillo. Segunda y cuarta capa de solución densa de asfaltos refinados reforzada con elastómeros, adhesivos y compuestos plastificantes, con protección impermeable con aditivo anti-raíz, dos manos, resistente al vapor, color negro, aplicado con brocha o llana metálica. Tercera capa con tela de refuerzo de poliéster no tejido, color negro, extendido sobre primera capa de solución densa.	m²	250,00	$ 85.226,00	$ 21.306.500,00									
5.1.2	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización para cubiertas planas rígidas con membrana de policloruro de vinilo (PVC) de alta calidad con refuerzo en fibra de vidrio no tejido, e=1.5mm.	m²	299,23	$ 201.894,00	$ 60.412.742,00									
5,2	**TANQUES**													
5.2.1	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización en muros para tanques de agua con membrana de PVC, e=4.5mm. Primera capa en membrana sintética no tejida 100% de polipropileno 1800, e=1.5mm. Segunda capa en tiras de 10cm para cambios de sentido en lámina de acero galvanizado con recubrimiento en PVC a una cara y con recubrimiento epóxico en la otra, e=1.8mm, acabado de PVC color gris claro. Tercera capa en membrana impermeabilizante de PVC plastificado reforzado con armadura de poliéster, e=1.2mm, color gris.	m²	850,00	$ 255.289,00	$ 216.995.650,00									
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS**													
6,1	**ACOMETIDA**													
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua fría desde el medidor totalizador hasta la llegada a los cuartos de bombas y los tanques de almacenamiento. Se incluye acometida tanque incendio.													
6.1.1	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	5,13	$ 127.637,00	$ 654.778,00									
6.1.2	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/2"	m	130,00	$ 47.221,00	$ 6.138.730,00									
6.1.3	Suministro e instalación de flotador mecanico bola grande 1-1/2"	Und	3,00	$ 399.554,00	$ 1.198.662,00									
6.1.4	Suministro e instalación de válvula antifraude 1-1/2"	Und	2,00	$ 572.889,00	$ 1.145.778,00									
6.1.5	Suministro e instalación de relleno en material seleccionado	m³	11,97	$ 37.870,00	$ 453.304,00			11,97	$ 453.303,90	11,97	$ 453.303,90	100,00%		
6.1.6	Suministro e instalación de niple pasamuros acero inox. 1-1/2"	Und	3,00	$ 356.662,00	$ 1.069.986,00									
6.1.7	Suministro e instalación de medidor totalizador 1-1/2"	Und	1,00	$ 952.396,00	$ 952.396,00									
6.1.8	Suministro e instalación de medidor agua potable 1-1/2"	Und	1,00	$ 2.459.563,00	$ 2.459.563,00									
6.1.9	Suministro e instalación de medidor incendio 1-1/2"	Und	1,00	$ 2.467.087,00	$ 2.467.087,00									
6.1.10	Suministro e instalación de registro corte RED WHITE 1-1/2"	Und	3,00	$ 571.917,00	$ 1.715.751,00									
6.1.11	Suministro e instalación de caja medidor para totalizador	Und	1,00	$ 1.937.951,00	$ 1.937.951,00									
6.1.12	Suministro e instalación de nicho medidores AP + PCI	Und	1,00	$ 473.624,00	$ 473.624,00									
6.1.13	Suministro e instalación de tubería PVC-S 2"	m	6,00	$ 51.419,00	$ 308.514,00			6,00	$ 308.514,00	6,00	$ 308.514,00	100,00%		
6.1.14	Suministro e instalación de sifón PVC-S 2"	Und	1,00	$ 93.951,00	$ 93.951,00									
6.1.15	Suministro e instalación de cheque hidro 1 1/2"	Und	1,00	$ 373.676,00	$ 373.676,00									
6.1.16	Suministro e instalación de registro bola P.D. 1 1/2"	Und	2,00	$ 334.622,00	$ 669.244,00									
6.1.17	Suministro e instalación de universal H.G. 1 1/2"	Und	1,00	$ 81.175,00	$ 81.175,00									
6.1.18	Suministro e instalación de unión dresser 1 1/2"	Und	1,00	$ 81.175,00	$ 81.175,00									
6.1.19	Excavación manual	m³	17,10	$ 75.507,00	$ 1.291.170,00			17,10	$ 1.291.169,70	17,10	$ 1.291.169,70	100,00%		
6,2	**CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**													
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del cuarto de bombas de agua potable. Se incluye recirculación, lavado y rebose.													
6.2.1	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 4"	m	4,00	$ 230.187,00	$ 920.748,00									
6.2.2	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 3"	m	3,00	$ 179.511,00	$ 538.533,00									
6.2.3	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2-1/2"	m	6,00	$ 152.318,00	$ 913.908,00									
6.2.4	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2"	m	1,00	$ 97.420,00	$ 97.420,00									
6.2.5	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/2"	m	3,00	$ 77.931,00	$ 233.793,00									
6.2.6	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/4"	m	3,00	$ 73.686,00	$ 221.058,00									
6.2.7	Suministro e instalación de tubería PVCP 1/2"	m	1,00	$ 26.903,00	$ 26.903,00									
6.2.8	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 3"	Und	2,00	$ 2.896.453,00	$ 5.792.906,00									
6.2.9	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2-1/2"	Und	3,00	$ 141.390,00	$ 424.170,00									
6.2.10	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2"	Und	1,00	$ 899.162,00	$ 899.162,00									
6.2.11	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/2"	Und	1,00	$ 563.120,00	$ 563.120,00									
6.2.12	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/4"	Und	1,00	$ 433.272,00	$ 433.272,00									
6.2.13	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1/2"	Und	1,00	$ 108.152,00	$ 108.152,00									
6.2.14	Suministro e instalación de cheque hidro 2-1/2"	Und	3,00	$ 689.969,00	$ 2.069.907,00									
6.2.15	Suministro e instalación de cheque cortina 1-1/4" perforado	Und	1,00	$ 363.883,00	$ 363.883,00									
6.2.16	Suministro e instalación de universal H.G. 1-1/4"	Und	1,00	$ 152.902,00	$ 152.902,00									
6.2.17	Suministro e instalación de unión flexible metálica 3"	Und	2,00	$ 255.799,00	$ 511.598,00									
6.2.18	Suministro e instalación de unión flexible metálica 2-1/2"	Und	3,00	$ 231.123,00	$ 693.369,00									
6.2.19	Suministro e instalación de válvula de pie 3"	Und	2,00	$ 692.949,00	$ 1.385.898,00									

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
6.2.20	Suministro e instalación de copa excéntrica 3" x 2"	Und	2,00	$ 360.849,00	$ 721.698,00							
6.2.21	Suministro e instalación de copa concéntrica 2-1/2" x 2"	Und	2,00	$ 10.991,00	$ 21.982,00							
6.2.22	Suministro e instalación de brida acero (individual) 3"	Und	12,00	$ 131.110,00	$ 1.573.320,00							
6.2.23	Suministro e instalación de brida acero (individual) 2-1/2"	Und	22,00	$ 116.758,00	$ 2.568.676,00							
6.2.24	Suministro e instalación de manométro antivibratorio	Und	2,00	$ 129.993,00	$ 259.986,00							
6.2.25	Suministro e instalación de soporte para tubería de succión	Und	2,00	$ 189.682,00	$ 379.364,00							
6.2.26	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4"	Und	1,00	$ 615.673,00	$ 615.673,00							
6.2.27	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 3"	Und	2,00	$ 526.889,00	$ 1.053.778,00							
6.2.28	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 2"	Und	1,00	$ 421.150,00	$ 421.150,00							
6.2.29	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 1-1/2"	Und	1,00	$ 357.336,00	$ 357.336,00							
6,3	**CUARTO DE BOMBAS AGUA LLUVIA**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del cuarto de bombas de agua lluvia. Se incluye recirculación, lavado y rebose.											
6.3.1	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 4"	m	10,00	$ 230.187,00	$ 2.301.870,00							
6.3.2	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 3"	m	4,00	$ 179.511,00	$ 718.044,00							
6.3.3	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2"	m	1,00	$ 97.420,00	$ 97.420,00							
6.3.4	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/2"	m	3,00	$ 77.931,00	$ 233.793,00							
6.3.5	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/4"	m	4,00	$ 73.686,00	$ 294.744,00							
6.3.6	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1/2"	m	1,00	$ 46.423,00	$ 46.423,00							
6.3.7	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 4"	Und	1,00	$ 3.559.306,00	$ 3.559.306,00							
6.3.8	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 3"	Und	6,00	$ 2.896.453,00	$ 17.378.718,00							
6.3.9	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2"	Und	1,00	$ 899.162,00	$ 899.162,00							
6.3.10	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/2"	Und	1,00	$ 563.120,00	$ 563.120,00							
6.3.11	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/4"	Und	1,00	$ 433.272,00	$ 433.272,00							
6.3.12	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1/2"	Und	1,00	$ 108.152,00	$ 108.152,00							
6.3.13	Suministro e instalación de cheque hidro 4"	Und	1,00	$ 3.445.334,00	$ 3.445.334,00							
6.3.14	Suministro e instalación de cheque hidro 3"	Und	3,00	$ 1.172.422,00	$ 3.517.266,00							
6.3.15	Suministro e instalación de cheque cortina 1-1/4"	Und	1,00	$ 363.883,00	$ 363.883,00							
6.3.16	Suministro e instalación de universal H.G. 1-1/4"	Und	1,00	$ 152.902,00	$ 152.902,00							
6.3.17	Suministro e instalación de unión flexible metálica 4"	Und	1,00	$ 317.487,00	$ 317.487,00							
6.3.18	Suministro e instalación de unión flexible metálica 3"	Und	3,00	$ 255.799,00	$ 767.397,00							
6.3.19	Suministro e instalación de válvula de pie 3"	Und	3,00	$ 692.949,00	$ 2.078.847,00							
6.3.20	Suministro e instalación de copa excéntrica 3" x 2"	Und	3,00	$ 360.849,00	$ 1.082.547,00							
6.3.21	Suministro e instalación de copa concéntrica 3" x 2"	Und	3,00	$ 360.849,00	$ 1.082.547,00							
6.3.22	Suministro e instalación de brida acero (individual) 4"	Und	3,00	$ 180.947,00	$ 542.841,00							
6.3.23	Suministro e instalación de brida acero (individual) 3"	Und	18,00	$ 131.110,00	$ 2.359.980,00							
6.3.24	Suministro e instalación de manométro antivibratorio	Und	3,00	$ 129.993,00	$ 389.979,00							
6.3.25	Suministro e instalación de soporte para tubería de succión	Und	3,00	$ 189.682,00	$ 569.046,00							
6.3.26	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4"	Und	1,00	$ 615.673,00	$ 615.673,00			1,00	$ 615.673,00	1,00	$ 615.673,00	100,00%
6.3.27	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 3"	Und	3,00	$ 526.889,00	$ 1.580.667,00			2,00	$ 1.053.778,00	2,00	$ 1.053.778,00	66,67%
6.3.28	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 2"	Und	1,00	$ 421.150,00	$ 421.150,00							
6.3.29	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 1-1/2"	Und	1,00	$ 357.336,00	$ 357.336,00							
6,4	**RED GENERAL AGUA POTABLE**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua potable desde la salida del cuarto de bombas hasta la llegada a cada punto hidráulico.											
6.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2-1/2"	m	55,00	$ 96.174,00	$ 5.289.570,00							
6.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2"	m	108,00	$ 62.340,00	$ 6.732.720,00							
6.4.3	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/2"	m	38,00	$ 47.576,00	$ 1.807.888,00							
6.4.4	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/4"	m	30,00	$ 40.740,00	$ 1.222.200,00							
6.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1"	m	121,00	$ 34.219,00	$ 4.140.499,00							
6.4.6	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 3/4"	m	287,00	$ 29.916,00	$ 8.585.892,00							
6.4.7	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1/2"	m	616,00	$ 26.605,00	$ 16.388.680,00							
6.4.8	Suministro e instalación de registro bola 2"	Und	1,00	$ 540.372,00	$ 540.372,00							
6.4.9	Suministro e instalación de registro bola 1-1/2"	Und	1,00	$ 279.914,00	$ 279.914,00							
6.4.10	Suministro e instalación de registro bola 1"	Und	1,00	$ 68.641,00	$ 68.641,00							
6.4.11	Suministro e instalación de registro bola 3/4"	Und	20,00	$ 52.851,00	$ 1.057.020,00							
6.4.12	Suministro e instalación de registro bola 1/2"	Und	49,00	$ 34.712,00	$ 1.700.888,00							
6.4.13	Suministro e instalación de llave de manguera 1/2"	Und	5,00	$ 85.357,00	$ 426.785,00							
6,5	**RED GENERAL AGUA LLUVIA REUTILIZADA**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua lluvia reutilizada desde la salida del cuarto de bombas hasta la llegada a cada punto hidráulico.											
6.5.1	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 4"	m	55,00	$ 198.210,00	$ 10.901.550,00							
6.5.2	Suministro e instalación de tubería PVC-P 3"	m	56,00	$ 126.691,00	$ 7.094.696,00							
6.5.3	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2-1/2"	m	51,00	$ 96.174,00	$ 4.904.874,00							
6.5.4	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2"	m	75,00	$ 62.340,00	$ 4.675.500,00							
6.5.5	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/2"	m	168,00	$ 47.576,00	$ 7.992.768,00							
6.5.6	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/4"	m	320,00	$ 40.740,00	$ 13.036.800,00							
6.5.7	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1"	m	8,00	$ 34.219,00	$ 273.752,00							
6.5.8	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1/2"	m	106,00	$ 26.605,00	$ 2.820.130,00							

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
6.5.9	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 3/4"	m	38,00	$ 29.916,00	$ 1.136.808,00								
6.5.10	Suministro e instalación de registro bola 2-1/2"	Und	1,00	$ 769.816,00	$ 769.816,00								
6.5.11	Suministro e instalación de registro bola 2"	Und	1,00	$ 540.372,00	$ 540.372,00								
6.5.12	Suministro e instalación de registro bola 1-1/2"	Und	12,00	$ 279.914,00	$ 3.358.968,00								
6.5.13	Suministro e instalación de registro bola 1-1/4"	Und	17,00	$ 72.437,00	$ 1.231.429,00								
6.5.14	Suministro e instalación de registro bola 3/4"	Und	6,00	$ 52.851,00	$ 317.106,00								
6.5.15	Suministro e instalación de registro bola 1/2"	Und	2,00	$ 34.712,00	$ 69.424,00								
6,6	**RED DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE**												
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua caliente desde la salida del calentador hasta cada conexión con el punto de agua caliente.												
6.6.1	Suministro e instalación de tubería CPVC 1"	m	3,00	$ 44.453,00	$ 133.359,00								
6.6.2	Suministro e instalación de tubería CPVC 3/4"	m	8,00	$ 30.759,00	$ 246.072,00								
6.6.3	Suministro e instalación de tubería CPVC 1/2"	m	13,00	$ 22.325,00	$ 290.225,00								
6.6.4	Suministro e instalación de cheque hidro 1"	Und	1,00	$ 206.647,00	$ 206.647,00								
6.6.5	Suministro e instalación de registro bola 1"	Und	1,00	$ 68.641,00	$ 68.641,00								
6.6.6	Suministro e instalación de calentador eléctrico 16l/min	Und	1,00	$ 1.850.645,00	$ 1.850.645,00								
6,7	**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**												
	Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de dirección de horizontal en la red, a vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el accesorio de cambio de dirección) Incluye el paral, la recamara, el tapones para prueba de la instalación de suministro y los adaptadores que sean requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta.												
6.7.1	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable de 1/2" - PVC	Und	130,00	$ 72.298,00	$ 9.398.740,00								
6.7.2	Suministro e instalación de llave de manguera 1/2"	Und	5,00	$ 85.357,00	$ 426.785,00								
6,8	**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA LLUVIA REUTILIZADA**												
	Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de dirección de horizontal en la red, a vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el accesorio de cambio de dirección) Incluye el paral, la recamara, el tapones para prueba de la instalación de suministro y los adaptadores que sean requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta.												
6.8.1	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 1-1/4" - PVC	Und	58,00	$ 93.658,00	$ 5.432.164,00								
6.8.2	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 1/2" - PVC	Und	16,00	$ 74.001,00	$ 1.184.016,00								
6.8.3	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 3/4" - PVC	Und	19,00	$ 72.298,00	$ 1.373.662,00								
6,9	**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE**												
	Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. (Se incluye accesorio de cambio de dirección). Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de dirección de horizontal en la red, a vertical en el paral de abastecimiento. Incluye el paral, la recamara, el tapon para prueba de la instalación de suministro de agua caliente y los adaptadores que sean requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta.												
6.9.1	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable caliente de 1/2" - CPVC	Und	7,00	$ 86.097,00	$ 602.679,00								
6.9.2	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable caliente de 1" - CPVC	Und	1,00	$ 100.285,00	$ 100.285,00								
6.10	**RAMALES DE AGUAS LLUVIAS**												
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos horizontales en cubierta y terrazas. Se incluyen tramos de piso 1.												
6.10.1	Suministro e instalación de tubería PVC-S 6"	m	103,00	$ 201.466,00	$ 20.750.998,00			32,45	$ 6.537.571,70	32,45	$ 6.537.571,70	31,50%	
6.10.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4"	m	229,00	$ 96.878,00	$ 22.185.062,00			23,20	$ 2.247.569,60	23,20	$ 2.247.569,60	10,13%	
6.10.3	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3"	m	574,00	$ 75.937,00	$ 43.587.838,00			63,01	$ 4.784.790,37	63,01	$ 4.784.790,37	10,98%	
6.10.4	Suministro e instalación de tragante 8" x 6"	Und	12,00	$ 215.993,00	$ 2.591.916,00								
6.10.5	Suministro e instalación de tragante 6" x 4"	Und	4,00	$ 77.903,00	$ 311.612,00								
6.10.6	Suministro e instalación de tragante 4" x 3"	Und	12,00	$ 60.371,00	$ 724.452,00								
6.10.7	Suministro e instalación de sifón con rejilla para desagüe 4"	Und	4,00	$ 135.168,00	$ 540.672,00								
6.10.8	Suministro e instalación de sifón con rejilla para desagüe 3"	Und	82,00	$ 105.472,00	$ 8.648.704,00								
6.10.9	Excavación manual	m³	113,50	$ 75.507,00	$ 8.570.045,00								
6.10.10	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	18,90	$ 127.637,00	$ 2.412.339,00			1,04	$ 132.742,48	1,04	$ 132.742,48	5,50%	
6.10.11	Suministro e instalación de relleno en material seleccionado	m³	94,60	$ 37.870,00	$ 3.582.502,00			1,63	$ 61.728,10	1,63	$ 61.728,10	1,72%	
6.10.12	Suministro e instalación de pases en viga 4"	Und	50,00	$ 31.945,00	$ 1.597.250,00								
6.10.13	Suministro e instalación de pases en viga 3"	Und	200,00	$ 24.418,00	$ 4.883.600,00			12,00	$ 293.016,00	12,00	$ 293.016,00	6,00%	
6,11	**BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS**												
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales de aguas lluvias correspondiente a las bajantes de aguas lluvias hasta conectar a los ramales horizontales en todos los pisos.												
6.11.1	Suministro e instalación de tubería PVC-S 6"	m	117,00	$ 201.466,00	$ 23.571.522,00								
6.11.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4"	m	90,00	$ 96.878,00	$ 8.719.020,00								
6.11.3	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3"	m	24,00	$ 75.937,00	$ 1.822.488,00								
6.11.4	Suministro e instalación de junta de expansión 6"	Und	8,00	$ 161.684,00	$ 1.293.472,00								
6.11.5	Suministro e instalación de junta de expansión 4"	Und	12,00	$ 94.378,00	$ 1.132.536,00								
6.11.6	Suministro e instalación de junta de expansión 3"	Und	2,00	$ 84.972,00	$ 169.944,00								
6,12	**RED EXTERIOR DE AGUAS LLUVIAS**												
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de las redes generales de aguas lluvias del proyecto en zonas verdes y/o duras interconectadas por cajas y/o pozos de inspección.												
6.12.1	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 12"	m	57,00	$ 207.967,00	$ 11.854.119,00								

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.	
6.12.2	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 10"	m	69,00	$ 159.152,00	$ 10.981.488,00								
6.12.3	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 8"	m	35,00	$ 121.896,00	$ 4.266.360,00			16,20	$ 1.974.715,20	16,20	$ 1.974.715,20	46,29%	
6.12.4	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 6"	m	26,00	$ 78.946,00	$ 2.052.596,00								
6.12.5	Excavación manual	m³	145,86	$ 75.507,00	$ 11.013.451,00								
6.12.6	Suministro e instalación de relleno cama de triturado	m³	22,44	$ 204.640,00	$ 4.592.122,00								
6,13	**RAMALES DE AGUAS NEGRAS**												
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos horizontales de aguas residuales en todos los pisos hasta la entrega a cajas de inspección o pozos eyectores.												
6.13.1	Suministro e instalación de tubería PVC-S 6"	m	7,00	$ 201.466,00	$ 1.410.262,00			7,00	$ 1.410.262,00	7,00	$ 1.410.262,00	100,00%	
6.13.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4"	m	468,00	$ 96.878,00	$ 45.338.904,00			280,67	$ 27.190.748,26	280,67	$ 27.190.748,26	59,97%	
6.13.3	Suministro e instalación de tubería PVC-S 2"	m	293,00	$ 51.419,00	$ 15.065.767,00			93,48	$ 4.806.648,12	93,48	$ 4.806.648,12	31,90%	
6.13.4	Excavación manual	m³	126,00	$ 75.507,00	$ 9.513.882,00								
6.13.5	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	31,50	$ 127.637,00	$ 4.020.566,00			7,20	$ 918.986,40	7,20	$ 918.986,40	22,86%	
6.13.6	Suministro e instalación de pases en viga 2"	Und	50,00	$ 27.324,00	$ 1.366.200,00								
6.13.7	Suministro e instalación de pases en viga 4"	Und	50,00	$ 57.772,00	$ 2.888.600,00								
6,14	**BAJANTES DE AGUAS NEGRAS**												
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales desde la conexión con las colgantes principales bajo primer piso hasta piso 6.												
6.14.1	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4"	m	178,00	$ 96.878,00	$ 17.244.284,00			51,94	$ 5.031.843,32	51,94	$ 5.031.843,32	29,18%	
6.14.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S 2"	m	25,00	$ 51.419,00	$ 1.285.475,00								
6.14.3	Suministro e instalación de junta de expansión 4"	Und	14,00	$ 94.378,00	$ 1.321.292,00								
6,15	**RED EXTERIOR DE AGUAS RESIDUALES**												
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de las redes generales de aguas lluvias del proyecto en zonas verdes y/o duras interconectadas por cajas y/o pozos de inspección.												
6.15.1	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 6"	m	132,00	$ 78.946,00	$ 10.420.872,00								
6.15.2	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 4"	m	23,00	$ 40.149,00	$ 923.427,00								
6.15.3	Excavación manual	m³	77,50	$ 75.507,00	$ 5.851.793,00								
6.15.4	Suministro e instalación de relleno cama en triturado	m³	15,50	$ 204.640,00	$ 3.171.920,00								
6.15.5	Suministro e instalación de relleno en material seleccionado	m³	62,00	$ 37.870,00	$ 2.347.940,00								
6,16	**SALIDAS SANITARIAS**												
	Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de aguas residuales domesticas de los aparatos sanitarios o puntos de descarga. Comprende el tramo vertical desde la boca de conexión del aparato hasta el accesorio de conexión con la red horizontal. Incluye los tapones temporales para prueba y protección de la instalación de desagues y los adaptadores complementarios que se requieran para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta.												
6.16.1	Suministro e instalación de punto de salida sanitaria de agua sanitaria de 2" - PVCS	Und	149,00	$ 82.373,00	$ 12.273.577,00			30,00	$ 2.471.190,00	30,00	$ 2.471.190,00	20,13%	
6.16.2	Suministro e instalación de punto de salida sanitaria de agua sanitaria de 4" - PVCS	Und	150,00	$ 120.210,00	$ 18.031.500,00			25,00	$ 3.005.250,00	25,00	$ 3.005.250,00	16,67%	
6,17	**RAMALES Y COLUMNAS DE VENTILACIÓN Y REVENTILACIÓN**												
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales, horizontales y desvíos de las bajantes de ventilaciones y reventilaciones, desde la conexión con las colgantes principales bajo primer piso hasta cubierta.												
6.17.1	Suministro e instalación de tubería PVC L 4"	m	39,00	$ 82.249,00	$ 3.207.711,00								
6.17.2	Suministro e instalación de tubería PVC L 3"	m	108,00	$ 60.060,00	$ 6.486.480,00								
6.17.3	Suministro e instalación de tubería PVC L 2"	m	179,00	$ 44.013,00	$ 7.878.327,00			72,01	$ 3.169.376,13	72,01	$ 3.169.376,13	40,23%	
6.17.4	Suministro e instalación de válvula minivent 2"	Und	22,00	$ 217.373,00	$ 4.782.206,00								
6.17.5	Suministro e instalación válvula maxivent 4"	Und	4,00	$ 364.953,00	$ 1.459.812,00								
6,18	**DESAGÜE DE SÓTANO**												
6.18.1	Suministro e instalación de tubería PVCS 4"	m	48,00	$ 96.878,00	$ 4.650.144,00								
6.18.2	Suministro e instalación de tubería PVCS 2"	m	25,00	$ 51.419,00	$ 1.285.475,00								
6.18.3	Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.8m x l=0.8m x h=0.6m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.	Und	6,00	$ 855.079,00	$ 5.130.474,00								
6.18.4	Suministro e instalación de cárcamo con rejilla B=0.30m H=0.20m	Und	5,00	$ 317.188,00	$ 1.585.940,00								
6.18.5	Suministro e instalación de cárcamo con rejilla B=0.20m H=0.20m	Und	5,00	$ 275.946,00	$ 1.379.730,00								
6,19	**DESCARGA POZO EYECTOR**												
6.19.1	Suministro e instalación de tubería PVCS 3"	m	327,00	$ 75.643,00	$ 24.735.261,00								
6.19.2	Suministro e instalación de cheque hidro 3"	Und	12,00	$ 1.172.422,00	$ 14.069.064,00								
6.19.3	Suministro e instalación de registro bola tipo pesado 3"	Und	12,00	$ 1.119.197,00	$ 13.430.364,00								
6.19.4	Suministro e instalación de unión DRESSER 3"	Und	12,00	$ 220.305,00	$ 2.643.660,00								
6.19.5	Suministro e instalación de relleno de material seleccionado	m³	10,50	$ 37.870,00	$ 397.635,00								
6.19.6	Excavación manual	m³	15,00	$ 75.507,00	$ 1.132.605,00								
6.19.7	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	4,50	$ 127.637,00	$ 574.367,00								
6.20	**TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**												
6.20.1	Suministro e instalación de tapón PVC S 4"	Und	122,00	$ 10.575,00	$ 1.290.150,00								
6.20.2	Suministro e instalación de tapón PVC S 2"	Und	209,00	$ 4.839,00	$ 1.011.351,00								
6.20.3	Suministro e instalación de tapón PVC P 1 1/4"	Und	58,00	$ 8.120,00	$ 470.960,00								
6.20.4	Suministro e instalación de tapón PVC P 3/4"	Und	19,00	$ 4.004,00	$ 76.076,00								
6.20.5	Suministro e instalación de tapón PVC P 1/2"	Und	151,00	$ 2.328,00	$ 351.528,00								
6,21	**SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS**												

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
6.21.1	Equipo agua potable SEGÚN EETT.	Und	1,00	$ 4.960.992,00	$ 4.960.992,00							
6.21.2	Equipo agua lluvia SEGÚN EETT.	Und	1,00	$ 4.960.992,00	$ 4.960.992,00							
6.21.3	Equipo eyector aguas residuales. SEGÚN EETT.	Und	4,00	$ 4.960.992,00	$ 19.843.968,00							
6.21.4	Equipo eyector aguas lluvias. SEGÚN EETT.	Und	2,00	$ 4.960.992,00	$ 9.921.984,00							
6,22	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA AN Y ALL**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del cuarto de bombas de agua incendio. Se incluye cabezal de pruebas.											
6.22.1	Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.6m x l=0.6m x h=0.6m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.	Und	13,00	$ 491.095,00	$ 6.384.235,00							
6.22.2	Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.8m x l=0.8m x h=0.4m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.	Und	6,00	$ 781.496,00	$ 4.688.976,00							
6.22.3	Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=1m x l=1m x h=0.8m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.	Und	1,00	$ 1.131.457,00	$ 1.131.457,00							
6.22.4	Suministro e instalación de pozo de inspección en concreto y mampostería Ø=1.20m. Tapa de concreto según la NP-024 de la EAAB. Cono de reducción en concreto reforzado de 28MPa. Muro en mampostería de ladrillo tolete, unidades de 6cm x 12cm x 24cm, aparejo tipo soga, pegado con mortero f'c 17.5MPa, impermeabilización exterior con mortero de pañete, e=10mm, incluye geotextil para filtración de subdrenajes NS-088. Recubrimiento interior en mortero de pañete f'c 12.5MPa, e=10mm. Placa de fondo en concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en plano Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.	Und	2,00	$ 7.327.273,00	$ 14.654.546,00							
6.22.5	Cárcamo con rejilla B=0.30m H=0.25m	Und	163,00	$ 325.267,00	$ 53.018.521,00							
6.22.6	Cárcamo con rejilla B=0.20m H=0.25m	Und	24,00	$ 291.230,00	$ 6.989.520,00							
6.22.7	Suministro e instalación de trampa de grasas en concreto y mampostería, dimensiones internas, l=1.2m x a=0.8m x h=1.85m. Tapa en lámina de acero al carbono. Muros en mampostería de ladrillo tolete, unidades de 6cm x 12cm x 24cm, aparejo tipo soga, pegado con mortero f'c 17.5MPa, impermeabilización interior con mortero de pañete impermeabilizado, e=10mm. Placa de fondo en concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en plano Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.	Und	2,00	$ 746.412,00	$ 1.492.824,00							
6.22.8	Suministro e instalación de caja de aforo en concreto reforzado, dimensiones internas, l=1.2m x a=1.2m x h=1.2m. Tapa en lámina de acero al carbono. Muros en concreto reforzado de 28MPa. Placa de fondo en concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en plano Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.	Und	1,00	$ 670.856,00	$ 670.856,00							
6,23	**CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIO**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.											
6.23.1	Tuberia acero sch 40 ranurada 6"	m	14,00	$ 295.099,00	$ 4.131.386,00							
6.23.2	Tuberia acero sch 40 ranurada 4"	m	8,00	$ 234.661,00	$ 1.877.288,00							
6.23.3	Tuberia acero sch 40 ranurada 2 1/2"	m	2,00	$ 160.658,00	$ 321.316,00							
6.23.4	Tuberia acero sch 40 ranurada 1 1/2"	m	5,00	$ 88.556,00	$ 442.780,00							
6.23.5	Accesorios acero ranurados 6"	Und	8,00	$ 327.301,00	$ 2.618.408,00							
6.23.6	Accesorios acero ranurados 4"	Und	4,00	$ 86.394,00	$ 345.576,00							
6.23.7	Accesorios acero ranurados 2 1/2"	Und	2,00	$ 40.440,00	$ 80.880,00							
6.23.8	Accesorios acero ranurados 1 1/2"	Und	4,00	$ 17.713,00	$ 70.852,00							
6.23.9	Acople rigido 6"	Und	20,00	$ 73.946,00	$ 1.478.920,00							
6.23.10	Acople rigido 4"	Und	10,00	$ 41.229,00	$ 412.290,00							
6.23.11	Acople rigido 2 1/2"	Und	5,00	$ 35.029,00	$ 175.145,00							
6.23.12	Acople rigido 1 1/2"	Und	10,00	$ 25.487,00	$ 254.870,00							
6.23.13	Válvula de corte 1 1/2"	Und	2,00	$ 572.643,00	$ 1.145.286,00							
6.23.14	Válvula compuerta osky 6"	Und	1,00	$ 1.763.083,00	$ 1.763.083,00							
6.23.15	Válvula mariposa ulfm 6"	Und	2,00	$ 1.725.177,00	$ 3.450.354,00							
6.23.16	Cheque cortina ulfm 6"	Und	1,00	$ 952.227,00	$ 952.227,00							
6.23.17	Cheque cortina ulfm 1 1/2"	Und	1,00	$ 433.133,00	$ 433.133,00							
6.23.18	Lamina antivortice 6"	Und	1,00	$ 2.112.185,00	$ 2.112.185,00							
6.23.19	Cabezal de pruebas 4 x 2 salidas de 2.1/2"	Und	1,00	$ 2.085.139,00	$ 2.085.139,00							
6.23.20	Valvula de alivio 3"	Und	1,00	$ 1.949.386,00	$ 1.949.386,00							
6.23.21	Copa excentrica 1"x1 1/2"	Und	1,00	$ 215.628,00	$ 215.628,00							
6.23.22	Copa concentrica 1"x1 1/2"	Und	1,00	$ 11.395,00	$ 11.395,00							
6.23.23	Niple pasamuros acero inox. 6"	Und	2,00	$ 939.605,00	$ 1.879.210,00							
6.23.24	Manometro antivibratorio	Und	2,00	$ 129.513,00	$ 259.026,00							
6,24	**RED DE CONTRA INCENDIO**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de gas desde los reguladores de primera etapa hasta los reguladores de segunda etapa. Se incluye tubería y accesorios de nicho de regulador de primera etapa.											
6.24.1	Tubería pead 4"	m	47,00	$ 289.336,00	$ 13.598.792,00							
6.24.2	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 6"	m	44,00	$ 213.160,00	$ 9.379.040,00			33,20	$ 7.076.912,00	33,20	$ 7.076.912,00	75,45%
6.24.3	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 4"	m	394,00	$ 171.224,00	$ 67.462.256,00			122,71	$ 21.010.897,04	122,71	$ 21.010.897,04	31,14%
6.24.4	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 3"	m	646,00	$ 152.520,00	$ 98.527.920,00	53,81	$ 8.207.101,20	214,12	$ 32.657.582,40	267,93	$ 40.864.683,60	41,48%
6.24.5	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 1/2"	m	1.702,00	$ 88.621,00	$ 150.832.942,00	260,55	$ 23.090.201,55	475,16	$ 42.109.154,36	735,71	$ 65.199.355,91	43,23%
6.24.6	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2"	m	289,00	$ 74.878,00	$ 21.639.742,00			9,95	$ 745.036,10	9,95	$ 745.036,10	3,44%
6.24.7	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/2"	m	459,00	$ 90.868,00	$ 41.708.412,00	37,50	$ 3.407.550,00	66,47	$ 6.039.995,96	103,97	$ 9.447.545,96	22,65%
6.24.8	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/4"	m	600,00	$ 63.247,00	$ 37.948.200,00	70,80	$ 4.477.887,60	202,62	$ 12.815.107,14	273,42	$ 17.292.994,74	45,57%
6.24.9	Tuberia acero negro sch 40 roscada 1"	m	387,00	$ 47.868,00	$ 18.524.916,00			26,95	$ 1.290.042,60	26,95	$ 1.290.042,60	6,96%
6.24.10	Accesorio pead	Und	11,00	$ 81.974,00	$ 901.714,00							
6.24.11	Transicion hdpe a tuberia metalica	Und	5,00	$ 1.996.130,00	$ 9.980.650,00							
6.24.12	Accesorio ranurado 6"	Und	10,00	$ 327.104,00	$ 3.271.040,00			3,00	$ 981.312,00	3,00	$ 981.312,00	30,00%
6.24.13	Accesorio ranurado 4"	Und	78,00	$ 86.294,00	$ 6.730.932,00			30,00	$ 2.588.820,00	30,00	$ 2.588.820,00	38,46%

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
6.24.14	Accesorio ranurado 3"	Und	170,00	$ 54.601,00	$ 9.282.170,00	4,00	$ 218.404,00	33,00	$ 1.801.833,00	37,00	$ 2.020.237,00	21,76%		
6.24.15	Accesorio ranurado 2 1/2"	Und	447,00	$ 40.443,00	$ 18.078.021,00	62,00	$ 2.507.466,00	87,00	$ 3.518.541,00	149,00	$ 6.026.007,00	33,33%		
6.24.16	Accesorio ranurado 2"	Und	131,00	$ 26.058,00	$ 3.413.598,00			7,00	$ 182.406,00	7,00	$ 182.406,00	5,34%		
6.24.17	Accesorio ranurado 1.1/2"	Und	66,00	$ 17.726,00	$ 1.169.916,00			2,00	$ 35.452,00	2,00	$ 35.452,00	3,03%		
6.24.18	Accesorio ranurado 1.1/4"	Und	64,00	$ 15.586,00	$ 997.504,00									
6.24.19	Acople rigido 6"	Und	110,00	$ 73.946,00	$ 8.134.060,00			9,00	$ 665.514,00	9,00	$ 665.514,00	8,18%		
6.24.20	Acople rigido 4"	Und	985,00	$ 41.229,00	$ 40.610.565,00			43,00	$ 1.772.847,00	43,00	$ 1.772.847,00	4,37%		
6.24.21	Acople rigido 3"	Und	1.615,00	$ 39.765,00	$ 64.220.475,00	14,00	$ 556.710,00	77,00	$ 3.061.905,00	91,00	$ 3.618.615,00	5,63%		
6.24.22	Acople rigido 2 1/2"	Und	4.255,00	$ 35.233,00	$ 149.916.415,00	98,00	$ 3.452.834,00	158,00	$ 5.566.814,00	256,00	$ 9.019.648,00	6,02%		
6.24.23	Acople rigido 2"	Und	723,00	$ 31.532,00	$ 22.797.636,00			8,00	$ 252.256,00	8,00	$ 252.256,00	1,11%		
6.24.24	Acople rigido 1 1/2"	Und	1.148,00	$ 25.487,00	$ 29.259.076,00	9,00	$ 229.383,00	23,00	$ 586.201,00	32,00	$ 815.584,00	2,79%		
6.24.25	Acople rigido 1 1/4"	Und	150,00	$ 26.239,00	$ 3.935.850,00	30,00	$ 787.170,00	69,00	$ 1.810.491,00	99,00	$ 2.597.661,00	66,00%		
6.24.26	STRAP 3"	Und	116,00	$ 54.601,00	$ 6.333.716,00									
6.24.27	STRAP 2 1/2"	Und	140,00	$ 40.443,00	$ 5.662.020,00									
6.24.28	STRAP 2"	Und	47,00	$ 26.058,00	$ 1.224.726,00									
6.24.29	STRAP 1 1/2"	Und	92,00	$ 17.726,00	$ 1.630.792,00									
6.24.30	STRAP 1 1/4"	Und	199,00	$ 15.534,00	$ 3.091.266,00									
6.24.31	Accesorios acero roscados 1"	Und	45,00	$ 11.430,00	$ 514.350,00									
6.24.32	SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2"	Und	2,00	$ 1.815.070,00	$ 3.630.140,00									
6.24.33	CHEQUE (UL/FM) 4"	Und	2,00	$ 1.868.608,00	$ 3.737.216,00									
6.24.34	Estación de control + reductora de presión 3"	Und	9,00	$ 7.759.367,00	$ 69.834.303,00									
6.24.35	Estación de control + reductora de presión 2 1/2"	Und	1,00	$ 6.732.322,00	$ 6.732.322,00									
6.24.36	ROCIADORES PENDENT k=5.6	Und	474,00	$ 53.022,00	$ 25.132.428,00									
6.24.37	ROCIADORES PENDENT k=8.0	Und	19,00	$ 128.519,00	$ 2.441.861,00									
6.24.38	ROCIADORES PENDENT k=8.0 TEMPERATURA INTERMEDIA	Und	9,00	$ 128.519,00	$ 1.156.671,00									
6.24.39	ROCIADORES UP-RIGHT k=5.6	Und	244,00	$ 53.022,00	$ 12.937.368,00									
6.24.40	ROCIADORES UP-RIGHT k=8.0	Und	25,00	$ 128.519,00	$ 3.212.975,00									
6.24.41	Escudos para rociadores	Und	771,00	$ 15.787,00	$ 12.171.777,00									
6.24.42	Puntos hidraulicos rociadores	Und	771,00	$ 74.296,00	$ 57.282.216,00									
6.24.43	Válvula expulsora de aire (ul/fm) 2"	Und	4,00	$ 270.832,00	$ 1.083.328,00									
6.24.44	Extintor de tipo co2 de 10lb	Und	2,00	$ 98.701,00	$ 197.402,00									
6.24.45	Soporte sencillo ul/fm 6"	Und	20,00	$ 33.847,00	$ 676.940,00									
6.24.46	Soporte sencillo ul/fm 4"	Und	172,00	$ 29.080,00	$ 5.001.760,00			105,00	$ 3.053.400,00	105,00	$ 3.053.400,00	61,05%		
6.24.47	Soporte sencillo ul/fm 3"	Und	281,00	$ 29.080,00	$ 8.171.480,00	16,00	$ 465.280,00	58,00	$ 1.686.640,00	74,00	$ 2.151.920,00	26,33%		
6.24.48	Soporte sencillo ul/fm 2 1/2"	Und	740,00	$ 29.080,00	$ 21.519.200,00	91,00	$ 2.646.280,00	125,00	$ 3.635.000,00	216,00	$ 6.281.280,00	29,19%		
6.24.49	Soporte sencillo ul/fm 2"	Und	126,00	$ 27.846,00	$ 3.508.596,00									
6.24.50	Soporte sencillo ul/fm 1 1/2"	Und	200,00	$ 27.846,00	$ 5.569.200,00	37,50	$ 1.044.225,00			37,50	$ 1.044.225,00	18,75%		
6.24.51	Soporte sencillo ul/fm 1 1/4"	Und	261,00	$ 27.846,00	$ 7.267.806,00	30,00	$ 835.380,00	46,00	$ 1.280.916,00	76,00	$ 2.116.296,00	29,12%		
6.24.52	Soporte sencillo ul/fm 1"	Und	169,00	$ 28.397,00	$ 4.799.093,00									
6.24.53	Soporte sísmico transversal ul/fm 6"	Und	4,00	$ 463.431,00	$ 1.853.724,00									
6.24.54	Soporte sísmico longitudinal ul/fm 6"	Und	2,00	$ 463.431,00	$ 926.862,00									
6.24.55	Soporte sísmico transversal ul/fm 4"	Und	34,00	$ 438.756,00	$ 14.917.704,00									
6.24.56	Soporte sísmico longitudinal ul/fm 4"	Und	17,00	$ 438.756,00	$ 7.458.852,00									
6.24.57	Soporte sísmico transversal ul/fm 3"	Und	54,00	$ 401.743,00	$ 21.694.122,00									
6.24.58	Soporte sísmico longitudinal ul/fm 3"	Und	27,00	$ 401.743,00	$ 10.847.061,00									
6.24.59	Soporte sísmico transversal ul/fm 2 1/2"	Und	142,00	$ 377.068,00	$ 53.543.656,00									
6.24.60	Soporte sísmico longitudinal ul/fm 2 1/2"	Und	71,00	$ 377.068,00	$ 26.771.828,00									
6.24.61	Soporte cuatro vías ul/fm 4"	Und	18,00	$ 876.444,00	$ 15.775.992,00									
6.24.62	Pintura de tubería 6"	m	44,00	$ 27.730,00	$ 1.220.120,00									
6.24.63	Pintura de tubería 4"	m	394,00	$ 23.769,00	$ 9.364.986,00									
6.24.64	Pintura de tubería 3"	m	646,00	$ 22.344,00	$ 14.434.224,00									
6.24.65	Pintura de tubería 2 1/2"	m	1.702,00	$ 20.698,00	$ 35.227.996,00									

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
6.24.66	Pintura de tubería 2"	m	289,00	$ 18.782,00	$ 5.427.998,00							
6.24.67	Pintura de tubería 1 1/2"	m	459,00	$ 17.523,00	$ 8.043.057,00							
6.24.68	Pintura de tubería 1 1/4"	m	600,00	$ 16.412,00	$ 9.847.200,00							
6.24.69	Pintura de tubería 1"	m	387,00	$ 14.386,00	$ 5.567.382,00							
6.24.70	Excavación manual	m³	21,15	$ 75.507,00	$ 1.596.973,00							
6.24.71	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	3,53	$ 127.637,00	$ 450.559,00							
6.24.72	Suministro e instalación de relleno de material seleccionado	m³	17,63	$ 37.870,00	$ 667.648,00							
6,25	**SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO, ESTACIONES DE MANGUERA Y VÁLVULAS PARA BOMBEROS**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.											
6.25.1	Suministro e instalación de gabinete clase II	Und	17,00	$ 1.699.402,00	$ 28.889.834,00							
6.25.2	Toma fija para bomberos 2.1/2"	Und	13,00	$ 975.139,00	$ 12.676.807,00							
6,26	**SUMINISTRO DE EQUIPOS**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.											
6.26.1	Bomba principal con motor eléctrico 500gpm@140 psi (incluye accesorios y tablero de control)	Und	1,00	$ 47.621.134,00	$ 47.621.134,00							
6.26.2	Bomba jockey con motor eléctrico 5 gpm @150psi. (incluye accesorios y tablero de control)	Und	1,00	$ 6.525.631,00	$ 6.525.631,00							
6,27	**RED DE GAS MEDIA PRESIÓN**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.											
6.27.1	Tubería acero cu-l 1"	m	8,00	$ 82.955,00	$ 663.640,00							
6.27.2	Tubería acero cu-l 3/4"	m	23,00	$ 49.818,00	$ 1.145.814,00							
6.27.3	Tubería acero cu-l 1/2"	m	61,00	$ 33.830,00	$ 2.063.630,00							
6.27.4	Tubería acero galvanizado sch. 40 3/4"	m	2,00	$ 27.311,00	$ 54.622,00							
6.27.5	Tubería polietileno 3/4"	m	70,00	$ 70.537,00	$ 4.937.590,00							
6.27.6	Valvula bola 1"	Und	1,00	$ 72.562,00	$ 72.562,00							
6.27.7	Valvula bola 1/2"	Und	3,00	$ 34.811,00	$ 104.433,00							
6.27.8	Universal 3/4"	Und	1,00	$ 32.074,00	$ 32.074,00							
6.27.9	Elevador 3/4"	Und	1,00	$ 107.620,00	$ 107.620,00							
6.27.10	Medidor de gas g-6 (incluye montaje)	Und	1,00	$ 1.192.933,00	$ 1.192.933,00							
6.27.11	Medidor de gas g-10 (incluye montaje)	Und	1,00	$ 1.713.954,00	$ 1.713.954,00							
6.27.12	Plaqueta de identificación	Und	4,00	$ 12.338,00	$ 49.352,00							
6.27.13	Regulador de primera etapa Q=20.52m3/h	Und	1,00	$ 453.966,00	$ 453.966,00							
6.27.14	Excavación manual	m³	14,70	$ 75.507,00	$ 1.109.953,00							
6.27.15	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	2,10	$ 127.637,00	$ 268.038,00							
6.27.16	Suministro e instalación de relleno de material seleccionado	m³	12,60	$ 37.870,00	$ 477.162,00							
6,28	**RED DE GAS BAJA PRESION**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.											
6.28.1	Tubería acero cu-l 1"	m	11,00	$ 82.955,00	$ 912.505,00							
6.28.2	Tubería acero cu-l 3/4"	m	24,00	$ 49.818,00	$ 1.195.632,00							
6.28.3	Tubería acero cu-l 1/2"	m	63,00	$ 33.830,00	$ 2.131.290,00							
6.28.4	Encamisado dielectrico 1"	Und	11,00	$ 15.366,00	$ 169.026,00							
6.28.5	Encamisado dielectrico 3/4"	Und	24,00	$ 18.872,00	$ 452.928,00							
6.28.6	Encamisado dielectrico 1/2"	Und	63,00	$ 23.880,00	$ 1.504.440,00							
6.28.7	Valvula bola 1"	Und	2,00	$ 72.562,00	$ 145.124,00							
6.28.8	Valvula bola 3/4"	Und	3,00	$ 52.851,00	$ 158.553,00							
6.28.9	Valvula bola 1/2"	Und	12,00	$ 34.811,00	$ 417.732,00							
6.28.10	Regulador de segunda etapa q=0.40m3/h	Und	3,00	$ 498.569,00	$ 1.495.707,00							
6.28.11	Regulador de segunda etapa q=14.52m3/h	Und	1,00	$ 587.772,00	$ 587.772,00							
6,29	**PUNTOS DE GAS**											
	Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.											
6.29.1	Conexión estufa enana 3/4"	Und	2,00	$ 184.812,00	$ 369.624,00							
6.29.2	Conexión sartén basculante 1"	Und	1,00	$ 301.993,00	$ 301.993,00							
6.29.3	Conexión marmita 3/4"	Und	1,00	$ 184.812,00	$ 184.812,00							
6.29.4	Conexión horno combi 1"	Und	1,00	$ 301.993,00	$ 301.993,00							
6.29.5	Conexión mechero 1/2"	Und	12,00	$ 125.965,00	$ 1.511.580,00							

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL													
7,1	SALIDAS DE ILUMINACIÓN													
7.1.1	Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo luminoso 125 o más, Autonomía de 90 minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	163,00	$ 141.556,00	$ 23.073.628,00	65,50	$ 9.271.918,00			65,50	$ 9.271.918,00	40,18%		
7.1.2	Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	117,00	$ 193.594,00	$ 22.650.498,00	46,00	$ 8.905.324,00			46,00	$ 8.905.324,00	39,32%		
7.1.3	Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	615,00	$ 58.006,00	$ 35.673.690,00	273,50	$ 15.864.641,00			273,50	$ 15.864.641,00	44,47%		
7.1.4	Suministro e Instalación de luminaria reflector LED 70W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 8000 lm, IRC 70, vida útil mayor a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	24,00	$ 155.598,00	$ 3.734.352,00									
7.1.5	Suministro e Instalación de reflector LED de 200 W, 6500 K, 100-240 V, IP 67, flujo luminoso mayor a 2000 lm, IRC 80, vida útil mayor a 10,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	16,00	$ 286.010,00	$ 4.576.160,00									
7.1.6	Suministro e Instalación de luminaria lineal LED de 40W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 3200 lm, IRC 80, vida útil mayor a 10,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	606,00	$ 405.822,00	$ 245.928.132,00	217,50	$ 88.266.285,00			217,50	$ 88.266.285,00	35,89%		
7.1.7	Suministro de materiales e instalación de AVISO Salida de Emergencia. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	60,00	$ 132.916,00	$ 7.974.960,00									
7.1.8	Suministro de materiales e instalación de luminaria tipo Bala LED 6W IP7 tipo exterior. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	92,00	$ 218.808,00	$ 20.130.336,00									
7.1.9	Suministro e instalación de soporte metálico en L para reflector exterior, incluye soporte y tornillería para su correcto anclaje, pintura para exterior.	Und	24,00	$ 38.725,00	$ 929.400,00									
7.1.10	Suministro e Instalación de luminaria Panel de 60x60 LED 40W, 6500 K, 100-240 v, IRC 70, 3200 Lm, vida útil mayor a 20,000 H. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. Material certificado, garantizado e instalado según reglamentación NTC 2051	Und	50,00	$ 198.617,00	$ 9.930.850,00									
7.1.11	Suministro e instalación de campana led 100W, 5700 k, 100-277 v, irc 70, 18700 lm, vida útil 50,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	9,00	$ 546.047,00	$ 4.914.423,00									
7.1.12	Suministro e Instalación de luminaria lineal LED 2,4 mts de 80W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 6200 lm, IRC 80, vida útil mayor a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. .	Und	55,00	$ 751.210,00	$ 41.316.550,00									
7.1.13	Suministro e Instalación de luminaria aro de diametro, diametro 2mts de 150W, 2700 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 4000 lm, IRC 80, vida útil mayor a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. .	Und	3,00	$ 149.442,00	$ 448.326,00									
7.1.14	Suministro e instalación de poste metálico 6 mts altura, incluye base, hicada, brazo para dos reflettores y demás accesorios para su puesta en servicio.	Und	3,00	$ 1.317.785,00	$ 3.953.355,00									
7,2	SALIDAS ELÉCTRICAS													
7.2.1	Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	223,00	$ 183.462,00	$ 40.912.026,00	39,90	$ 7.320.133,80	54,60	$ 10.017.025,20	94,50	$ 17.337.159,00	42,38%		
7.2.2	Suministro de materiales e instalación de salida para bala LED tipo exterior en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	92,00	$ 134.654,00	$ 12.388.168,00			57,60	$ 7.756.070,40	57,60	$ 7.756.070,40	62,61%		
7.2.3	Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	1,00	$ 183.363,00	$ 183.363,00			1,00	$ 183.363,00	1,00	$ 183.363,00	100,00%		
7.2.4	Suministro de materiales e instalación de salida para reflector LED (70W) en tubería conduit IMC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	24,00	$ 250.691,00	$ 6.016.584,00									
7.2.5	Suministro de materiales e instalación de salida para reflector LED (200W) en tubería conduit EMT/PVC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	16,00	$ 179.685,00	$ 2.874.960,00	9,60	$ 1.724.976,00			9,60	$ 1.724.976,00	60,00%		
7.2.6	Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro (40 W,80 W, campana 100w, aro 150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	673,00	$ 179.685,00	$ 120.928.005,00	223,20	$ 40.105.692,00	210,00	$ 37.733.850,00	433,20	$ 77.839.542,00	64,37%		
7.2.7	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 2x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	107,00	$ 191.027,00	$ 20.439.889,00			1,00	$ 191.027,00	1,00	$ 191.027,00	0,93%		
7.2.8	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor doble en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	16,00	$ 218.022,00	$ 3.488.352,00			6,00	$ 1.308.132,00	6,00	$ 1.308.132,00	37,50%		
7.2.9	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor doble conmutable en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 4x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	1,00	$ 260.262,00	$ 260.262,00									
7.2.10	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor conmutable en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	6,00	$ 198.584,00	$ 1.191.504,00									
7.2.11	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	176,00	$ 196.998,00	$ 34.671.648,00			30,80	$ 6.067.538,40	30,80	$ 6.067.538,40	17,50%		
7.2.12	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en muro o piso en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, tapa con empaque , cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	70,00	$ 149.959,00	$ 10.497.130,00									
7.2.13	Suministro de materiales e instalación de salida para seca manos red normal en muro en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. No Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	12,00	$ 148.070,00	$ 1.776.840,00									
7.2.14	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente GFCI red normal en muro en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	56,00	$ 231.469,00	$ 12.962.264,00			3,20	$ 740.700,80	3,20	$ 740.700,80	5,71%		
7.2.15	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente bifásica red normal en muro en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato sin grado de protección especial, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica doble fondo 2400 e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	4,00	$ 236.158,00	$ 944.632,00									
7.2.16	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente trifásica red normal en muro en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato 32A sin grado de protección especial, cable de Cu HFFR-LS No. 5x12 AWG, caja metálica doble fondo 2400 e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	4,00	$ 279.348,00	$ 1.117.392,00									
7.2.17	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal de piso para cargador de baterías planta eléctrica proyectado en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato con tapa para instalación en piso, cable trenzado de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase azul, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 12 -	Und	1,00	$ 714.619,00	$ 714.619,00									
7.2.18	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en muro en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 mts Tubería, 6 mts cableado	Und	34,00	$ 190.488,00	$ 6.476.592,00									
7.2.19	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en muro en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 mts Tubería, 6 mts cableado	Und	30,00	$ 257.514,00	$ 7.725.420,00									
7.2.20	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en canalización perimetral. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 3	Und	148,00	$ 120.623,00	$ 17.852.204,00									

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL			
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
7.2.21	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en canalización perimetral. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 3	Und	147,00	$ 105.667,00	$ 15.533.049,00							
7.2.22	Suministro de materiales e instalación de salida para sensor de movimiento en techo en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye sensor con configuración día/noche y temporizador , cable Cu HFFR-LS No. 2x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	183,00	$ 318.130,00	$ 58.217.790,00	59,00	$ 18.769.670,00	6,50	$ 2.067.845,00	65,50	$ 20.837.515,00	35,79%
7.2.23	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en piso tipo exterior en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, tapa tipo intemperie, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	7,00	$ 450.664,00	$ 3.154.648,00							
7.2.24	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor triple en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 4x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	3,00	$ 250.324,00	$ 750.972,00							
7.2.25	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal tipo Tamper resistant en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	36,00	$ 196.908,00	$ 7.088.688,00							
7.2.26	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red regulada tipo Tamper resistant en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	12,00	$ 226.967,00	$ 2.723.604,00							
7,3	**CANALIZACIONES ELÉCTRICAS**											
7.3.1	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm semipesada, para sostener cable MT en celda de transformador, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m	6,00	$ 145.085,00	$ 870.510,00							
7.3.2	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m	240,00	$ 238.280,00	$ 57.187.200,00	42,57	$ 10.143.579,60	197,43	$ 47.043.620,40	240,00	$ 57.187.200,00	100,00%
7.3.3	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 40 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m	90,00	$ 261.309,00	$ 23.517.810,00							
7.3.4	Suministro e instalación canalización perimetral metálica de 12 x 5 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye línea SPT cable No. 10 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m	203,00	$ 91.397,00	$ 18.553.591,00							
7.3.5	Suministro e instalación de caja de paso metálica 60x60x15 cm de transición. Incidencia de accesorios fijación y soporte.	Und	2,00	$ 310.948,00	$ 621.896,00							
7.3.6	Suministro e instalación de caja de paso metálica 40x40x15 cm de transición. Incidencia de accesorios fijación y soporte.	Und	4,00	$ 178.237,00	$ 712.948,00							
7.3.7	Suministro e instalación de tubería conduit IMC 3" desde planta y transformador hasta T-RES-SCI. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	22,00	$ 227.192,00	$ 4.998.224,00							
7.3.8	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3" desde caja de paso a Tableros . Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	18,00	$ 147.799,00	$ 2.660.382,00							
7.3.9	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 2" subientes a tableros. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	35,00	$ 74.961,00	$ 2.623.635,00							
7.3.10	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 1/2" hasta Tableros de Distribución. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	48,00	$ 86.599,00	$ 4.156.752,00							
7.3.11	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1" a tableros. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	40,00	$ 31.203,00	$ 1.248.120,00							
7.3.12	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 20x20x15 cm. Se incluye incidencia de soportería, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.	Und	21,00	$ 78.420,00	$ 1.646.820,00							
7.3.13	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm. Se incluye incidencia de soportería, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.	Und	10,00	$ 60.762,00	$ 607.620,00							
7.3.14	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1Ø1" para ramales de tomacorrientes. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	210,00	$ 31.003,00	$ 6.510.630,00							
7.3.15	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3/4" para ramales de iluminación. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	640,00	$ 28.701,00	$ 18.368.640,00			538,70	$ 15.461.228,70	538,70	$ 15.461.228,70	84,17%
7.3.16	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3/4" para ramales de tomacorrientes. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	350,00	$ 28.701,00	$ 10.045.350,00							
7.3.17	Suministro e instalación de tubería conduit IMC 3/4" para ramales de iluminación exterior. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	180,00	$ 43.511,00	$ 7.831.980,00							
7.3.18	Suministro e instalación de tubería conduit PVC 3/4" para ramales de iluminación y tomacorrientes. No incluye regata en piso ni resanes de obra civil).Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	420,00	$ 8.208,00	$ 3.447.360,00							
7.3.19	Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1" para ramales de iluminación y tomacorrientes. Mo incluye regata en piso ni resanes de obra civil).Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	310,00	$ 8.878,00	$ 2.752.180,00							
7.3.20	Suministro e instalación de bajante IMC de 3/4" para cable Al 1/0 desnudo , Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	368,00	$ 43.189,00	$ 15.893.552,00							
7.3.21	Suministro e instalación de tubería PVC de 1" para cable Cu 1/0 desnudo de bajantes a cajas de paso de tierra, Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	75,00	$ 10.412,00	$ 780.900,00							
7.3.22	Suministro e instalación de caja 4"x4" tipo intemperie para cambio de bajante Al a Cu, Incluye cola de cable para conexión a estructura de acuerdo a detalle. Se incluye incidencia de soportería y fijación, conector bimetálico para cable Al 1/0 a Cu 1/0 AWG	m	15,00	$ 121.323,00	$ 1.819.845,00							
7.3.23	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 20 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m	300,00	$ 209.821,00	$ 62.946.300,00							
7.3.24	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 60 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	Und	25,00	$ 151.861,00	$ 3.796.525,00							
7,4	**SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA**											
7.4.1	Suministro e instalación de base y punta captadora de 100 cm, se incluye base con ángulo ajustable, accesorios de fijación y sujeción.	m	12,00	$ 216.166,00	$ 2.593.992,00							
7.4.2	Suministro e instalación de Alambrón Al 8mm, se incluye incidencia de conectores snap o parecidos, se incluye accesorios de fijación y sujeción .	m	431,00	$ 19.877,00	$ 8.566.987,00							
7.4.3	Suministro e instalación de base y punta captadora de 60 cm, se incluye base con ángulo ajustable, accesorios de fijación y sujeción.	Und	8,00	$ 195.629,00	$ 1.565.032,00							
7.4.4	Suministro e instalación de cable Cu 1/0, se incluye incidencia de conectores de cable Cu 1/0 a Cu 2/0 en caja AP274.	m	45,00	$ 64.349,00	$ 2.895.705,00							
7.4.5	Suministro e instalación de cable Cu 2/0, se incluye incidencia de conectores para empalmes para equipotencializar las mallas de puesta a tierra y sistema de apantallamiento.	m	150,00	$ 41.639,00	$ 6.245.850,00			14,00	$ 582.946,00	14,00	$ 582.946,00	9,33%
7.4.6	Suministro e instalación de varilla de cobre 2,4 mts x 5/8", incluye soldadura exotérmica con cable Cu 1/0 dentro de caja AP274 para sistema de apantallamiento.	Und	15,00	$ 668.921,00	$ 10.033.815,00			3,00	$ 2.006.763,00	3,00	$ 2.006.763,00	20,00%
7.4.7	Suministro e instalación de malla puesta a tierra sistema de potencia de 6x6m, 9 grillas, de cable Cu 2/0 desnudo, 5 varillas cobre 2,4 m x 5/8", incluye 2 cajas AE 281 para inspección, soldaduras exotérmicas, incluye excavación necesaria aprox. 75 cm profundidad para enterrar el cable, no incluye tratamiento de terreno adicional.	Und	1,00	$ 5.963.551,00	$ 5.963.551,00							
7.4.8	Suministro e instalación de caja de inspección AE 281 30X30 cm para inspección de sistema de apantallamiento y puesta a tierra.	Und	15,00	$ 364.222,00	$ 5.463.330,00							
7.4.9	Suministro e instalación mástil de 2 m para sistema de apantallamiento, incluye sistema de fijación a piso y base para punta captadora	Und	4,00	$ 688.524,00	$ 2.754.096,00							
7,5	**CANALIZACIONES CIVILES**											
7.5.1	Suministro e instalación de caja de inspección CS276.	Und	2,00	$ 5.525.531,00	$ 11.051.062,00							
7.5.2	Suministro e instalación de caja de inspección CS275.	Und	4,00	$ 2.481.202,00	$ 9.924.808,00							
7.5.3	Suministro e instalación de caja de inspección CS274.	Und	6,00	$ 1.412.626,00	$ 8.475.756,00							
7.5.4	Suministro de materiales y construcción de Cárcamo en Cuartos Técnicos, con dimensiones de altura 40 x 40 cm ancho. Incluye tapa en lamina de alfajor.	m	10,00	$ 648.043,00	$ 6.480.430,00							

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
7.5.5	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Ø6" desde bajante M.T. hasta Caja CS276 entrada a Subestación. Incluye pasacables de baja tensión, excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	40,00	$ 777.385,00	$ 31.095.400,00			38,20	$ 29.696.107,00	38,20	$ 29.696.107,00	95,50%		
7.5.6	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Ø4" Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA desde Cárcamo a ductos eléctricos , arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	80,00	$ 333.022,00	$ 26.641.760,00									
7.5.7	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 3Ø4" entre Cajas CS275 a cuarto tableros, Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	35,00	$ 257.585,00	$ 9.015.475,00									
7.5.8	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 2Ø2" acometidas subterráneas a bombas hidráulicas, cuartos técnicos desde caja CS274, Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	70,00	$ 133.399,00	$ 9.337.930,00									
7.5.9	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 3Ø3" desde cajas CS275 a cuartos técnicos, para cableado y comunicaciones cuartos TIC .Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, relleno , terminales tipo campana para ductos.	m	15,00	$ 182.047,00	$ 2.730.705,00									
7.5.10	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 6Ø4" incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas Codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	35,00	$ 397.859,00	$ 13.925.065,00									
7.5.11	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 6Ø6" para red M.T. exterior incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas Codensa desde cárcamo a ductos eléctricos , arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	25,00	$ 730.779,00	$ 18.269.475,00									
7.5.12	Suministro e instalación de caja de inspección CS280.	Und	3,00	$ 5.509.756,00	$ 16.529.268,00			1,00	$ 5.509.756,00	1,00	$ 5.509.756,00	33,33%		
7,6	**ALIMENTADORES ELÉCTRICOS (HFFR-LS)**													
7.6.1	Suministro e instalación de acometida en cable XLPE 15 KV 3x185 mm2 Al, apantallado en hilos desde punto conexión físico CODENSA hasta Subestación, Puentes entre celdas de M.T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	85,00	$ 345.608,00	$ 29.376.680,00									
7.6.2	Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo interior para cable XLPE 15 KV 185 mm2 Al desde punto conexión físico CODENSA hasta Celda Triplex, Puentes entre celdas de M.T. Se incluye accesorios de fijación y soporte.	Juego	3,00	$ 1.258.052,00	$ 3.774.156,00									
7.6.3	Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo exterior para cable XLPE 15 KV 185 mm2 Al desde punto conexión físico CODENSA hasta Celda Triplex, Puentes entre celdas de M.T. Se incluye accesorios de fijación y soporte.	Juego	1,00	$ 1.258.052,00	$ 1.258.052,00									
7.6.4	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X(3X400 KCMIL F + 350 KCMIL N) + 2/0 T desde Transformador a TGD. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	38,00	$ 2.864.754,00	$ 108.860.652,00									
7.6.5	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X(3X4/0 MCM F + 4/0 MCM N) + 2/0 T desde TGD y Planta Eléctrica a TTA. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	26,00	$ 1.452.513,00	$ 37.765.338,00									
7.6.6	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS (3x4/0 AWG F + 2/0 AWG N) + 4 T desde TTRANSFORMADOR A TTA-SCI - TRES-SCI. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	200,00	$ 482.673,00	$ 96.534.600,00									
7.6.7	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x8 AWG F + 8 AWG N + 10 T para TGD-ID Barraje Normal, TRES-ASC 1, TGD-SEC Barraje Respaldado, TGD-SEC Barraje respaldado, TRES-SOT y TRES-ASC 2. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	130,00	$ 49.302,00	$ 6.409.260,00									
7.6.8	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X4 AWG F + 4 AWG N + 8 T para TGD-PRI Barraje Normal y TGD a Inversor. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	142,00	$ 122.971,00	$ 17.461.882,00									
7.6.9	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x6 AWG F + 6 AWG N + 8 T para TGD-AUD y TGD-ID Barraje Respaldado . Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	64,00	$ 76.136,00	$ 4.872.704,00									
7.6.10	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x6 AWG F + 4 AWG N + 8 T para TGD-SEC Barraje Normal y TGD-PRO Barraje respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	20,00	$ 87.528,00	$ 1.750.560,00									
7.6.11	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X1/0 AWG F + 1/0 AWG N + 6 T para TRES-BOM. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	50,00	$ 277.117,00	$ 13.855.850,00									
7.6.12	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 1/0 AWG N + 6 T para TRES-COC. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	19,00	$ 211.117,00	$ 4.011.223,00									
7.6.13	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 2 AWG N + 6 T para TGD-PRI Barraje Normal, TGD-SIS Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	165,00	$ 188.673,00	$ 31.131.045,00									
7.6.14	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x4/0 F+ 4/0 AWG N + 4 AWG T para TGD-PRI Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	72,00	$ 525.261,00	$ 37.818.792,00									
7.6.15	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X4 AWG F + 2 AWG N + 8 T para TGD-PRO Barraje Normal. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	10,00	$ 139.887,00	$ 1.398.870,00									
7.6.16	Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 2x10 AWG + No 12 AWG T para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales (CIRCUITOS LEJANOS DE TABLEROS MÁS DE 30 METROS HASTA LA PRIMER TOMA). Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	m	1.200,00	$ 18.101,00	$ 21.721.200,00									
7.6.17	Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	m	3.870,00	$ 14.302,00	$ 55.348.740,00									
7.6.18	Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG para conexión de circuitos ramales de iluminación. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	m	1.450,00	$ 12.037,00	$ 17.453.650,00									
7.6.19	Suministro e instalación de cable trenzado Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase roja , tierra aislada verde para conexión de circuitos ramales regulados. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	m	2.520,00	$ 17.093,00	$ 43.074.360,00									
7.6.20	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x4/0 F+ 4/0 AWG N + 4 AWG T para TGD-PRE Barraje Normal. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	120,00	$ 525.261,00	$ 63.031.320,00									
7.6.21	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X10 AWG F + 10 AWG N + 10 AWG T para Bomba Jockey, TGD-PRO Regulado, TGD-ID Regulado, TRES-COM, Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	70,00	$ 34.693,00	$ 2.428.510,00									
7.6.22	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X300 KCMIL F + 300 KCMIL N + 20 T desde Transformador a TTA SCI y Bomba Jockey. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	31,00	$ 1.032.166,00	$ 31.997.146,00									
7.6.23	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 2 AWG N + 8 T para TGD-PRI Barraje Normal, TGD-SIS Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	50,00	$ 321.667,00	$ 16.083.350,00									
7,7	**TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS**													
7.7.1	Suministro e instalación de barraje de tierras 14 entradas para celdas en subestación, Cuarto B.T , incluye aisladores. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 927.777,00	$ 927.777,00									
7.7.2	Suministro e instalación de barraje de kit tierras para Rack principal , incluye aisladores, incluye 50 mts cable 8 desnudo hasta malla puesta a tierra. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 971.647,00	$ 971.647,00									
7.7.3	Suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico TTA según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 21.282.707,00	$ 21.282.707,00									
7.7.4	Suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico TTA-SCI según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	3,00	$ 35.702.439,00	$ 107.107.317,00									
7.7.5	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 9.781.284,00	$ 9.781.284,00									
7.7.6	Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 42 circuitos para breakers enchufables con espacio para totalizador. De acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 990.972,00	$ 990.972,00									
7.7.7	Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 18 circuitos para breakers enchufables con espacio para totalizador. De acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 630.534,00	$ 630.534,00									
7.7.8	Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 12 circuitos para breakers enchufables con espacio para totalizador. De acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 615.424,00	$ 615.424,00									
7.7.9	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRE según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 19.074.314,00	$ 19.074.314,00	1,00	$ 19.074.314,00			1,00	$ 19.074.314,00	100,00%		
7.7.10	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRO según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 10.543.757,00	$ 10.543.757,00	1,00	$ 10.543.757,00			1,00	$ 10.543.757,00	100,00%		
7.7.11	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-ID según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 9.772.655,00	$ 9.772.655,00	1,00	$ 9.772.655,00			1,00	$ 9.772.655,00	100,00%		
7.7.12	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRI según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 14.245.047,00	$ 14.245.047,00	1,00	$ 14.245.047,00			1,00	$ 14.245.047,00	100,00%		
7.7.13	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SEC según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 12.240.182,00	$ 12.240.182,00	1,00	$ 12.240.182,00			1,00	$ 12.240.182,00	100,00%		
7.7.14	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-AUD según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 9.317.328,00	$ 9.317.328,00	1,00	$ 9.317.328,00			1,00	$ 9.317.328,00	100,00%		
7.7.15	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SIS según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 13.712.611,00	$ 13.712.611,00	1,00	$ 13.712.611,00			1,00	$ 13.712.611,00	100,00%		
7.7.16	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TRES-BOM según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, barraje y breakers.	Und	1,00	$ 4.377.260,00	$ 4.377.260,00	1,00	$ 4.377.260,00			1,00	$ 4.377.260,00	100,00%		

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
7.7.17	Suministro e instalación Caja con programador de horario electrónico, 4 contactor trifásico 3x30A, 4 breaker riel 1x20A. (Control ilm exterior)	Und	2,00	$ 3.681.098,00	$ 7.362.196,00							
7.7.18	Suministro e instalación Cofre tipo intemperie con control de iluminación, contactor trifásico 3x20A, breaker riel 1x20A, botón push para encendió (iluminación canchas).	Und	1,00	$ 1.310.663,00	$ 1.310.663,00							
7,8	**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS Y SONIDO - EQUIPOS ACTIVOS**											
7.8.1	Suministro e instalación de servidor grabador de vídeo rackeable, 64 canales de video, capacidad de acceso y configuración remoto, capacidad hasta 48 TB memoria grabando a 15 FPS - 2 MP - 15 días, Procesador mínimo Core i7-4770S 3,1 GHz, Tarjeta de vídeo 4GB de video en RAM, Dual Gigabit LAN ports, RAM mínima de 8GB (4x2) Dual channel, RAID protección de información opcional.	Und	1,00	$ 7.291.790,00	$ 7.291.790,00							
7.8.2	Suministro e instalación de disco duro 6 TB especializado para CCTV	Und	1,00	$ 1.415.268,00	$ 1.415.268,00							
7.8.3	Suministro e instalación de pantalla LED 43", mouse y teclado para manejo y configuración del sistema de CCTV.	Und	1,00	$ 7.333.759,00	$ 7.333.759,00							
7.8.4	Switch PoE 48 puertos mín. 300 W, puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.	Und	7,00	$ 6.762.923,00	$ 47.340.461,00							
7.8.5	Switch PoE 24 puertos mín. 300 W, puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.	Und	4,00	$ 4.710.784,00	$ 18.843.136,00							
7.8.6	Suministro e instalación de Cámara tipo bullet 2 MP - 1080 P - FHD, capacidad de 25 fps, lente focal 3,8 mm, infrarroja, sensibilidad mín. 0,09 Color y 1,6 B/W. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	1,00	$ 694.876,00	$ 694.876,00							
7.8.7	Suministro e instalación de Cámara tipo FishEye 3MP H.264 WDR Pro IP Camera. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	3,00	$ 1.683.665,00	$ 5.050.995,00							
7.8.8	Suministro e instalación de cámara tipo minidomo 2 MP - 1080 P - FHD, capacidad de 25 fps, lente focal 2,8 mm, infrarroja, sensibilidad mín. 0,09 Color y 1,6 B/W. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	4,00	$ 682.626,00	$ 2.730.504,00							
7.8.9	Suministro e instalación de Access Point IEEE 802,11g, 2,4 - 5 GHz, 300 Mbps, configurable a modo cliente, puente y repetidor y/o dual	Und	1,00	$ 1.292.261,00	$ 1.292.261,00							
7.8.10	Suministro e instalación de equipo de sonido multizona mínimo 3 zonas, amplificador rango de potencia 1500 W o similar.	Und	1,00	$ 2.069.947,00	$ 2.069.947,00							
7.8.11	Suministro e instalación de caja o cofre tipo interior con amplificador para señal comunitaria TV, con ajuste de ganancia y regulación de pendiente, amplificador de canales analógicos y digitales (TD), incluye accesorios de sujeción, fijación y conexión,	Und	1,00	$ 419.680,00	$ 419.680,00							
7.8.12	Suministro e instalación de Gabinete rack de piso con 42 UR incluye organizador vertical, kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	4,00	$ 3.875.394,00	$ 15.501.576,00							
7.8.13	Suministro e instalación de Gabinete rack de piso de 36 UR incluye, kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	1,00	$ 3.058.542,00	$ 3.058.542,00							
7.8.14	Suministro e instalación de Organizador horizontal 2 UR	Und	8,00	$ 213.471,00	$ 1.707.768,00							
7.8.15	Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos Cat 6A	Und	7,00	$ 2.976.111,00	$ 20.832.777,00							
7.8.16	Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6A	Und	4,00	$ 1.589.252,00	$ 6.357.008,00							
7.8.17	Suministro e instalación de Patch Cord Cat 6A Azul/Rojo de 5 ft (Dentro de Gabinete)	Und	1,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00							
7.8.18	Suministro e instalación de bandeja porta equipos. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	4,00	$ 102.053,00	$ 408.212,00							
7.8.19	Suministro e instalación de bandeja de fibra de 6-12 hilos. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	4,00	$ 972.362,00	$ 3.889.448,00							
7.8.20	Suministro e instalación de tapa ciega para conectores de fibra	Und	10,00	$ 55.290,00	$ 552.900,00							
7.8.21	Suministro e instalación de Kit Fan Out LC/LC para fibra multimodo OM3. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. (por par)	Und	5,00	$ 171.269,00	$ 856.345,00							
7.8.22	Suministro e instalación de Conectores LC para fibra multimodo, incluye Conectorizacion (par)	Und	8,00	$ 25.635,00	$ 205.080,00							
7.8.23	Suministro e instalación de PDU vertical para rack, con 10 tomacorrientes	Und	4,00	$ 313.810,00	$ 1.255.240,00							
7.8.24	Suministro e instalación de Cable HDMI de 12 mts (visualización CCTV)	Und	1,00	$ 82.542,00	$ 82.542,00							
7.8.25	Suministro e instalación de Patch Cord de fibra óptica LC/LC (par)	Und	5,00	$ 143.310,00	$ 716.550,00							
7.8.26	Certificación de Conectorizacion de fibra óptica (por par)	Und	9,00	$ 55.520,00	$ 499.680,00							
7.8.27	Suministro e instalación de parlante pasivo para techo redondo 50W o similar, con sensibilidad de 90 dB o más. (Para instalar en el Aula Múltiple o comedor)	Und	1,00	$ 156.486,00	$ 156.486,00							
7.8.28	Suministro e instalación de parlante pasivo para techo 100W o similar, con sensibilidad de 90 dB o más. (Para instalar en pasillos)	Und	6,00	$ 257.167,00	$ 1.543.002,00							
7.8.29	Suministro e instalación de Gabinete rack de muro de 13 UR incluye, kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	1,00	$ 1.779.079,00	$ 1.779.079,00							
7.8.30	Configuración Circuito Cerrado de Televisión.	Und	1,00	$ 11.634.388,00	$ 11.634.388,00							
7,9	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO**											
7.9.1	Suministro e instalación de tubería EMT conduit de 3/4" para conexión de cableado de SDI. Incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación, cajas de paso con tapa para conexión de cada uno de los equipos. Prom (cada 8 mts una salida)	m	1.260,00	$ 28.645,00	$ 36.092.700,00							
7.9.2	Suministro e instalación de cable antiflama certificado 1x2x16 AWG. Incluye incidencia de accesorios fijación.	m	3.528,00	$ 3.643,00	$ 12.852.504,00							
7.9.3	Suministro e instalación de detector de humo. Incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida.	Und	1,00	$ 437.092,00	$ 437.092,00							
7.9.4	Suministro e instalación de detector de calor (cocina). Incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte , caja metálica de la salida	Und	1,00	$ 978.357,00	$ 978.357,00							
7.9.5	Suministro e instalación de estación manual. Incluye incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida	Und	1,00	$ 662.974,00	$ 662.974,00							
7.9.6	Suministro e instalación de luz electrobioscopia con sirena. Incluye incidencia accesorios de conexión y soporte. , caja metálica de la salida	Und	1,00	$ 364.493,00	$ 364.493,00							
7.9.7	Suministro e instalación de módulo de monitor.	Und	1,00	$ 342.945,00	$ 342.945,00							
7.9.8	Suministro e instalación de modulo aislador.	Und	2,00	$ 429.473,00	$ 858.946,00							
7.9.9	Suministro e instalación de fuente de alimentación luz estroboscópica / sirena con 2 baterías de 12V 7Amp - Batería	Und	3,00	$ 1.682.879,00	$ 5.048.637,00							
7.9.10	Suministro e instalación de Panel de Control con capacidad para 4 lazos, cap. 200 sensores por lazo mín. Incluye incidencia accesorios de conexión y soporte. (Incluye configuración)	Und	1,00	$ 11.382.245,00	$ 11.382.245,00							
7.9.11	Programación del sistema, capacitación y manual de operación del sistema y puesta en marcha	Und	1,00	$ 4.079.130,00	$ 4.079.130,00							
7.9.12	Suministro e instalación de Stopper Acrílico W/O Horn. Listado UL y FM. Incluye incidencia de accesorios y conexión y soporte.	Und	1,00	$ 423.184,00	$ 423.184,00							
7.10	**SALIDAS DE COMUNICACIONES**											
7.10.1	Suministro e instalación salida de datos/Tel VoIP para toma RJ 45 Cat 6A, incluye caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, faceplate sencillo, JackCat 6A azul, 3 mts de tubería EMT 3/4" , 3 mts de Cable UTP Cat 6A	Und	1,00	$ 194.765,00	$ 194.765,00							
7.10.2	Suministro e instalación salida de datos/Tel VoIP para toma RJ 45 Cat 6A en canaleta, incluye troquel lógico, faceplate sencillo, JackCat 6A datos, 3 mts de tubería EMT 3/4" , 3 mts de Cable UTP Cat 6A	Und	1,00	$ 171.914,00	$ 171.914,00							
7.10.3	Suministro e instalación salida de sonido, incluye caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, faceplate sencillo, 4 mts de tubería EMT 3/4" , 3 mts de Cable UTP Cat 6A	Und	1,00	$ 154.132,00	$ 154.132,00							
7.10.4	Suministro e instalación de toma HDMI, incluye caja Rawelt 4x4" con tapa, faceplate para HDMI, Conectorizacion de conector hembra HDMI, 5 mts de tubería EMT 1" , 6 mts de Cable HDMI	Und	1,00	$ 374.130,00	$ 374.130,00							
7.10.5	Suministro e instalación de salida vacía para toma de TV, incluye aparato, incluye tubería EMT 3/4", caja fundida en aluminio y tapaciega, no incluye cableado.	Und	1,00	$ 156.229,00	$ 156.229,00							
7.10.6	Suministro e instalación de Patch Cord Cat 6A de 5 ft (Para cada salida y dentro del gabinete)	Und	1,00	$ 54.213,00	$ 54.213,00							
7.10.7	Suministro e instalación salida vacía de datos/DMX para control sonido y e iluminación auditorio para toma rj 45 Cat 6A, incluye caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, faceplate sencillo, 3 mts de tubería emt 3/4"	Und	1,00	$ 196.372,00	$ 196.372,00							

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.		
7,11	**CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES**													
7.11.1	Suministro e instalación de tubería EMT 2" entre rack y ducto cerrado, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	m	30,00	$ 73.570,00	$ 2.207.100,00									
7.11.2	Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2" entre rack y ducto cerrado, entre bandejas, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	m	15,00	$ 88.508,00	$ 1.327.620,00									
7.11.3	Suministro e instalación de tubería EMT 1" (UTP compartido coaxial), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	m	350,00	$ 31.436,00	$ 11.002.600,00									
7.11.4	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	m	425,00	$ 28.590,00	$ 12.150.750,00									
7.11.5	Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" (Cuartos TIC) en piso o muro , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.	m	810,00	$ 8.452,00	$ 6.846.120,00									
7.11.6	Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/2" (cuartos TIC) en piso o muro , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.	m	89,00	$ 20.181,00	$ 1.796.109,00									
7.11.7	Suministro e instalación de cable UTP Cat 6A LSZH.	m	1,00	$ 5.264,00	$ 5.264,00									
7.11.8	Certificación de punto datos Cat 6A	Und	1,00	$ 14.982,00	$ 14.982,00									
7.11.9	Suministro e instalación de fibra multimodo OM3 tipo exterior, 12 hilos	m	1,00	$ 22.365,00	$ 22.365,00									
7.11.10	Suministro e instalación tubería EMT 3/4" para cableado de TV (solo canalización no se contempla cable Coaxial ni UTP), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas doble ala, uniones y terminales	m	320,00	$ 28.602,00	$ 9.152.640,00									
7.11.11	Suministro e instalación tubería EMT 3/4" para cableado de sonido (solo canalización no se contempla cable), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas doble ala, uniones y terminales	m	180,00	$ 28.645,00	$ 5.156.100,00									
7.11.12	Suministro e instalación de cable coaxial RG6, incluye accesos de conexión y derivación. Splitters entre otros. (Puede cambiar dependiendo el servicio u operador).	m	80,00	$ 3.369,00	$ 269.520,00									
7.11.13	Suministro e instalación de cable de sonido 2x16AWG desoxigenado libre de halógenos, incluye accesos de conexión.	m	800,00	$ 4.147,00	$ 3.317.600,00									
7,12	**SISTEMA FOTOVOLTAICO**													
7.12.1	Suministro e instalación de panel solar monocristalino de 350 W , 38,6 V, 9 A, incluye par de conectores MC4 macho/hembra para paneles solares.	Und	54,00	$ 1.407.477,00	$ 76.003.758,00									
7.12.2	Suministro e instalación de estructura para panel solar en aluminio para cubierta plana, con 10° inclinación sur	Und	54,00	$ 376.249,00	$ 20.317.446,00									
7.12.3	Suministro e instalación de tubería IMC 3/4", incluye cajas de paso tipo exterior y accesorios de fijación	m	130,00	$ 43.491,00	$ 5.653.830,00									
7.12.4	Suministro e instalación de coraza americana 3/4", incluye cajas de paso tipo exterior y accesorios de fijación, uniones y curvas necesarias para su instalación	m	54,00	$ 26.110,00	$ 1.409.940,00									
7.12.5	Suministro e instalación de cableado XLPE tipo solar FV para 1 kV, 90°C, 2x12 AWG + 12 Desnudo tierra para conexión de paneles solares, incluye conectores y accesorios para conexionado.	m	280,00	$ 27.410,00	$ 7.674.800,00									
7.12.6	Suministro e instalación de combiner Box o caja de conexiones, con fusibles de 10 A, Interruptor DC de 2x30A, DPS y demás elementos de acuerdo con diagrama unifilar.	Und	2,00	$ 4.281.962,00	$ 8.563.924,00									
7.12.7	Suministro e instalación de Inversor tipo On-Grid 20 KW	Und	1,00	$ 25.399.077,00	$ 25.399.077,00									
7.12.8	Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2" entre inversor y tableros TRES-INF, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	m	45,00	$ 86.988,00	$ 3.914.460,00									
7.12.9	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X6 AWG F + 6 AWG N + 8 T de Inversor a TRES-INF. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	55,00	$ 70.375,00	$ 3.870.625,00									
7.12.10	Suministro e instalación de Caja moldeada y breaker tipo industrial de 3x60A para inversor.	Und	1,00	$ 570.192,00	$ 570.192,00									
7.12.11	Tramite ante operador hasta energización y aprobación proyecto sistema fotovoltaico	Und	1,00	$ 4.432.589,00	$ 4.432.589,00									
7.12.12	Suministro e Instalación Smart Meter en caja metálica, incluye cableado apantallado 3x16 AWG hasta el inversor, incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte.	Und	1,00	$ 2.162.938,00	$ 2.162.938,00									
7.12.13	Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/4" en piso o muro , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.	m	15,00	$ 15.717,00	$ 235.755,00									
7.12.14	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 2x8 AWG F + 10 T Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	5,00	$ 32.437,00	$ 162.185,00									
7.12.15	Suministro e Instalación cable apantallado 3x16AWG para Smart Meter, incluye accesorios de fijación y conexión.	m	120,00	$ 11.828,00	$ 1.419.360,00									
7,13	**EQUIPOS**													
7.13.1	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado o Mini Split para cuarto técnico biblioteca, capacidad de 12,000 btu, incluye instalación de unidad exterior o condensadora, canalizaciones necesarias y cableado para su funcionamiento.	Und	1,00	$ 2.506.960,00	$ 2.506.960,00									
7,14	**EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES**													
7.14.1	Suministro e instalación de Celda Dúplex M.T. en aire de acuerdo a norma CTS503 17,5 kV, 630 A, 3F 3 Hilos. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 19.674.424,00	$ 19.674.424,00									
7.14.2	Suministro e instalación de Celda de protección M.T. en aire de acuerdo a norma CTS503-1 17,5 kV, 630 A, 3F 3 Hilos. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 21.515.736,00	$ 21.515.736,00									
7.14.3	Suministro e instalación de Celda de Medida M.T. en aire de acuerdo a norma AE325 17,5 kV, 630 A, 3F 3 Hilos (Se incluye CTs, PTs y medidor). Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	$ 31.221.541,00	$ 31.221.541,00									
7.14.4	Suministro e instalación de Celda M.T. para transformador de 225 kVA CTS518-2. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación, rieles para transformador y frenos.	Und	1,00	$ 7.445.729,00	$ 7.445.729,00									
7.14.5	Suministro e instalación de planta Diesel tipo stand by, de 175kW/200 kVA, efectivos a nivel Bogotá, nivel de tensión 208v/120v con caseta insonora y tanque patín de 300 lts, motor 6 cilindros con gobernador electrónico, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento con ducto de desfogue 27 mts .	Und	1,00	$ 178.726.796,00	$ 178.726.796,00									
7.14.6	Suministro e instalación de transformador tipo seco 225 kVA clase H, Dyn5, tipo abierto, factor K=1, sensores térmicos, DPS 15 KV, 11,4 kV / 208V ..	Und	1,00	$ 57.859.384,00	$ 57.859.384,00									
7.14.7	Suministro e instalación de vestida de poste con base en la norma LA218, incluye bajante IMC de 6" para cable M.T. en poste existente , 6 mts de bajante, Se incluye incidencia de soportería y accesorios de conexión para cable XLPE con líneas de M.T., cortacircuitos, curva PVC 6", accesorios de derivación y fijación.	Und	1,00	$ 8.829.777,00	$ 8.829.777,00									
7,15	**U.P.S.**													
7.15.1	Suministro e instalación de Regulador 15 KVA trifásica Vin 208V, Vout 208V/120V .Se incluye material de conexionado (puente cable encauchetado 4x8 AWG 6 mts), accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	3,00	$ 10.787.356,00	$ 32.362.068,00									
7.15.2	Suministro e instalación de Regulador 5 KVA trifásica Vin 208V, Vout 208V/120V. Se incluye material de conexionado (puente cable encauchetado 4x2 AWG 6 mts), accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	1,00	$ 9.329.344,00	$ 9.329.344,00									
7,16	**COMPLEMENTOS Y PROVISIONALES DE OBRA**													
7.16.1	Máquina de trabajo seguro en alturas - 10 metros - Brazo mecánico o similar (para instalaciones de iluminación exterior y en postes	Und	1,00	$ 10.055.418,00	$ 10.055.418,00			1,00	$ 10.055.418,00	1,00	$ 10.055.418,00	100,00%		
7.16.2	Suministro e instalación de poste 12 mts 1050 kg para provisional de obra, incluye vestida de poste, estructura aérea tipo LA218, bajante en IMC 6" , incluye accesorios de fijación, herrajes, crucetas, Cable ACSR 60 mts	Und	1,00	$ 14.020.148,00	$ 14.020.148,00			1,00	$ 14.020.148,00	1,00	$ 14.020.148,00	100,00%		
7.16.3	Suministro e instalación de transformador de 75 KVA, Refrigeración ON/AN, Conexión DYS, 13200/208/120 Voltios, Montaje en Poste, Incluye accesorios DPS, anclaje y fijación.	Und	1,00	$ 22.949.430,00	$ 22.949.430,00			1,00	$ 22.949.430,00	1,00	$ 22.949.430,00	100,00%		
7.16.4	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos de 2ϕ4" PVC Conduit para tableros de distribución, Tipo TDP corrugado. Incluye excavación Zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según Normas, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros. Materiales certificados RETIE	m	80,00	$ 213.141,00	$ 17.051.280,00			19,50	$ 4.156.249,50	19,50	$ 4.156.249,50	24,38%		
7.16.5	Suministro e instalación de cable Cu 3x4/0 F + 1x4/0 N + 2T AWG HFFR-LS, acometida desde Transformador a Tablero de Distribución pasando por armario de medida. Se incluye material de conexión e incidencia de bornas estañadas, accesorios de fijación, soporte y conexión.	m	54,00	$ 492.290,00	$ 26.583.660,00									
7.16.6	Suministro e instalación de Tablero de Medida indirecta norma CODENSA AE319. Incluye breaker industrial 3x300A, CT's de 300:5 A y accesorios de fijación. Se incluye Medidor.	Und	1,00	$ 6.614.115,00	$ 6.614.115,00			1,00	$ 6.614.115,00	1,00	$ 6.614.115,00	100,00%		
7.16.7	Suministro e instalación de tablero de distribución general autosoportado, protegido con muro en ladrillo y techo, tipo intemperie(índice de protección IP 55 o 56, protección de 3x300 A, incluye 4 protecciones 3x50A, una protección de 175 A.	Und	1,00	$ 34.301.367,00	$ 34.301.367,00			1,00	$ 34.301.367,00	1,00	$ 34.301.367,00	100,00%		
7.16.8	Suministro e instalación de acometidas en cable Cu THHN 3x6 AWG F + 1x6 AWG N + 1x8T AWG, desde Tablero general de distribución Provisional a tableros. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. Material Certificado, garantizado e instalado Según reglamento NTC 2050	m	154,00	$ 78.582,00	$ 12.101.628,00									

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
7.16.9	Suministro e instalación de acometidas en cable Cu THHN 3x2/0 AWG F + 1x2/0/ AWG N + 1x6T AWG, desde Tablero general de distribución Provisional a tablero Torre Grúa o carga de mayor consumo. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. Material Certificado, garantizado e instalado Según reglamento NTC 2050	m	51,00	$ 341.275,00	$ 17.405.025,00									
7.16.10	Suministro e instalación de tubería PVC 1Ø1-3" para cada tablero. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	90,00	$ 89.834,00	$ 8.085.060,00									
7.16.11	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra provisional de obra grilla de 4x4 m, 4 varillas Cu 5/8", soldaduras exotérmicas, caja inspección 30x30 cm, excavaciones y conexiones necesarias.	Und	1,00	$ 4.064.452,00	$ 4.064.452,00			1,00	$ 4.064.452,00	1,00	$ 4.064.452,00	100,00%		
8	**INSTALACIONES MECÁNICAS**													
8,1	**ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE VERTICAL**													
8.1.1	Elemento mecánico de movilidad vertical peatonal capacidad 10 personas, 7 paradas, 535 kg capacidad de carga, velocidad de 1.0m/s.	Und	1,00	$ 82.819.938,00	$ 82.819.938,00									
8.1.2	Malacate de cocina en acero inoxidable de dos niveles.	Und	1,00	$ 30.844.082,00	$ 30.844.082,00									
9	**CARPINTERÍA**													
9,1	**PUERTAS**													
9.1.1	P01A Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilíndrica de manija color cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.80m x h=2.53m.	Und	6,00	$ 1.373.425,00	$ 8.240.550,00									
9.1.2	P01B Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilíndrica de manija color cromado mate similar o equivalente, acabado base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.90m x h=2.53m.	Und	4,00	$ 1.545.104,00	$ 6.180.416,00									
9.1.3	PR02A Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.58m x h=2.53m.	Und	1,00	$ 6.928.307,00	$ 6.928.307,00									
9.1.4	PR02B Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.81m x h=2.53m.	Und	3,00	$ 7.373.421,00	$ 22.120.263,00									
9.1.5	PR02C Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.83m x h=2.53m.	Und	1,00	$ 7.412.126,00	$ 7.412.126,00									
9.1.6	PR03 Suministro e instalación de puerta pivotante de 2 hojas accionables con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.2m x h=2.53m.	Und	1,00	$ 2.322.337,00	$ 2.322.337,00									
9.1.7	P04 Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color naranja RAL2017 al exterior y color gris nopal hacia el interior. a=1.20m x h=2.53m.	Und	1,00	$ 3.558.420,00	$ 3.558.420,00									
9.1.8	P05 Suministro e instalación de puerta corrediza de 3 hojas entamboradas en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, cerradura de incrustar pico de loro color negro. a=3.60m x h=3.00m.	Und	8,00	$ 10.393.221,00	$ 83.145.768,00									
9.1.9	PR06 Suministro e instalación de puerta plegable de 8 hojas accionables en dos sentidos, en acero ASTM A36 o acero estructural al carbono, marco en bastidor tubular de 100mm x 50mm, celosía en platinas de acero ASTM A36 e=3/8" x a=2", cerradura inferior seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=13.80m x h=3.00m.	Und	1,00	$ 31.668.236,00	$ 31.668.236,00									
9.1.10	P07 Suministro e instalación de puerta pivotante de 2 hojas accionables con pivote superior e inferior y un tramo de panel fijo en lamina de acero cold rolled calibre 18, marcos en perfil tubular de acero cold rolled de 30mm x 50mm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura intermedia grado 1 cromada, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=6.70m x h=3.36m. Puerta a=3.55m - Módulo fijo a=3.15m.	Und	1,00	$ 16.109.197,00	$ 16.109.197,00									
9.1.11	PR08 Suministro e instalación de puerta plegable de 5 hojas entamboradas, en acero ASTM A36 o acero estructural al carbono, marco en bastidor tubular de 100mm x 50mm, celosía en platinas de acero ASTM A36 e=3/8" x a=2", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=5.69m x h=2.50m.	Und	1,00	$ 10.881.175,00	$ 10.881.175,00									
9.1.12	P09A Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilíndrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.80m x h=3.00m.	Und	1,00	$ 1.628.568,00	$ 1.628.568,00									
9.1.13	P09B Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilíndrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.70m x h=3.00m.	Und	33,00	$ 1.424.997,00	$ 47.024.901,00									
9.1.14	P09C Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilíndrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.90m x h=3.00m.	Und	10,00	$ 1.832.139,00	$ 18.321.390,00									
9.1.15	P09D Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilíndrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.20m x h=3.00m.	Und	1,00	$ 2.442.851,00	$ 2.442.851,00									
9.1.16	P10 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con líneas de repujado troquelado horizontal, cerradura de seguridad grado 1 acabado cromado mate similar o equivalente, manija vertical de 30cm en perfil tubular redondo de acero negro de 1", acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.15m x h=3.00m.	Und	8,00	$ 2.341.066,00	$ 18.728.528,00									
9.1.17	P11 Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color naranja RAL2017 al exterior y color gris nopal hacia el interior. a=1.20m x h=3.00m.	Und	15,00	$ 4.219.470,00	$ 63.292.050,00									
9.1.18	PR12 Suministro e instalación de cerramiento fijo en perfiles tubulares redondos de acero estructural al carbono con recubrimiento galvanizado ASTM A653, solo perfiles verticales de Ø2" @0.18m, acabado en recubrimiento de dos capas de anticorrosivo y tres capas de pintura base esmalte color RAL9005 "negro intenso". a=9.35m x h=2.86m.	Und	1,00	$ 19.074.000,00	$ 19.074.000,00									
9.1.19	P13 Suministro e instalación de una puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18; ventanilla media en vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, a=0.16m x h=0.8m, cerradura cilíndrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, marquete redondeado y burlete en neopreno para prevención de machucones, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.20m x h=2.23m.	Und	32,00	$ 1.815.852,00	$ 58.107.264,00									
9.1.20	P14 Suministro e instalación de puerta pivotante de 1 hoja con pivote superior e inferior en lamina de acero cold rolled calibre 18, marcos en perfil tubular de acero cold rolled de 30mm x 50mm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura de seguridad intermedia grado 1 cromada, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.77m x h=3.00m.	Und	1,00	$ 4.061.795,00	$ 4.061.795,00									
9.1.21	P15 Suministro e instalación de puerta plegable de 5 hojas entamboradas en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, cerradura de incrustar pico de loro color negro. Incluye sistema de rieles y herrajes para accionamiento de puerta en acero inoxidable. a=4.65m x h=3.00m.	Und	1,00	$ 9.981.936,00	$ 9.981.936,00									
9.1.22	P16 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica de acero y recubiertas en lámina de acero cold rolled calibre 18, cerradura de seguridad similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=3.72m x h=3.05m.	Und	1,00	$ 7.699.031,00	$ 7.699.031,00									
9.1.23	P17 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica de acero y recubiertas en lámina de acero cold rolled calibre 18, cerradura de aeguridad similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.40m x h=2.10m.	Und	1,00	$ 4.844.989,00	$ 4.844.989,00									
9.1.24	P18A Suministro e instalación de puerta batiente de 2 hojas en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19 similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=2.05m x h=2.10m.	Und	1,00	$ 5.045.783,00	$ 5.045.783,00									
9.1.25	P18B Suministro e instalación de puerta batiente de 2 hojas en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19 similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=2.10m x h=2.10m.	Und	1,00	$ 5.168.851,00	$ 5.168.851,00									
9.1.26	P19 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica de acero y recubiertas en lámina de acero cold rolled calibre 18, cerradura de seguridad similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.80m x h=2.10m.	Und	2,00	$ 2.564.994,00	$ 5.129.988,00									

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
9.1.27	P20 Suministro e instalación de puerta corrediza de 6 hojas entamboradas (accionables a dos lados) en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, cerrojo de seguridad B60 grado 1, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1". Incluye cajón en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente para ocultamiento de hojas. a=8.18m x h=3.05m.	Und	1,00	$ 24.009.305,00	$ 24.009.305,00									
9.1.28	P21 Suministro e instalación de puerta plegable de 10 hojas entamboradas (accionables a dos lados) en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, manija de incrustar rectangular en aluminio. Incluye cajón en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente para ocultamiento de hojas. a=10.25m x h=3.00m.	Und	1,00	$ 29.591.813,00	$ 29.591.813,00									
9.1.29	PR22 Suministro e instalación de puerta pivotante de 1 hojas con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.00m x h=2.53m.	Und	1,00	$ 1.935.281,00	$ 1.935.281,00									
9.1.30	PV05 - Suministro e instalación de una puerta pivotante de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18; marco en perfil de acero cold rolled de 3cm de ancho, cerrojo de seguridad acabado cromado mate similar o equivalente, marquetes redondeados y burlete en neopreno para prevención de machucones, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.77m x h=2.10m.	Und	1,00	$ 2.522.244,00	$ 2.522.244,00									
9.1.31	P23 - Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilíndrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.5m x h=3.00m.	Und	2,00	$ 1.017.855,00	$ 2.035.710,00									
9,2	**VENTANAS**													
9.2.1	V01A - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.15m x h=0.5m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	2,00	$ 2.200.416,00	$ 4.400.832,00									
9.2.2	V02A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.90m h=1.72m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	2,00	$ 639.805,00	$ 1.279.610,00									
9.2.3	V03A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.45m h=3.06m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	14,00	$ 569.129,00	$ 7.967.806,00									
9.2.4	V03B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.50m h=3.06m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	14,00	$ 632.365,00	$ 8.853.110,00									
9.2.5	V04 - Suministro e instalación de ventana compuesta con rejilla superior, panel fijo de ventana y panel fijo en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en lámina lisa de acero galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con estructura interna en perfiles de acero negro de 4cm x 4cm, armados @1m en vertical y @0.5m en horizontal. Módulo de ventana de interlocución, a=1.08m x h=1.57m con marco en perfilería de acero negro de 4cm x 4cm, vidrio templado y laminado 3mm + 3mm. Acabado general con recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	$ 7.997.562,00	$ 7.997.562,00									
9.2.6	V05A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.45m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 1.892.757,00	$ 1.892.757,00									
9.2.7	V05B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.60m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 1.936.774,00	$ 1.936.774,00									
9.2.8	V06 - Suministro e instalación de ventana fija por módulo fijo inferior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=11.35m h=0.9m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montantes verticales @1.88m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 5mm + 5mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 4.221.968,00	$ 4.221.968,00									
9.2.9	V07A - Suministro e instalación de ventana fija tipo rejilla en perfilería de acero negro, a=6.70m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de acero negro de 50mm x 100mm, montantes verticales @0.95m, montante horizontal h=1.2m del piso. Panel enmarcado con ángulos de acero ASTM A36 1" x 1/8", recubierto con paneles en malla expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	10,00	$ 8.307.555,00	$ 83.075.550,00									
9.2.10	V07B - Suministro e instalación de ventana fija tipo rejilla en perfilería de acero negro, a=6.80m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de acero negro de 50mm x 100mm, montantes verticales @0.96m, montante horizontal h=1.2m del piso. Panel enmarcado con ángulos de acero ASTM A36 1" x 1/8", recubierto con paneles en malla expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	2,00	$ 8.431.538,00	$ 16.863.076,00									
9.2.11	V08A - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.56m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 1.309.864,00	$ 1.309.864,00									
9.2.12	V08B - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.70m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	2,00	$ 1.342.847,00	$ 2.685.694,00									
9.2.13	V08C - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.15m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 1.448.861,00	$ 1.448.861,00									
9.2.14	V08D - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.30m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 1.484.199,00	$ 1.484.199,00									
9.2.15	V08E - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.45m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	3,00	$ 1.519.538,00	$ 4.558.614,00									
9.2.16	V08F - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.60m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 1.554.875,00	$ 1.554.875,00									
9.2.17	V08G - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	10,00	$ 1.578.434,00	$ 15.784.340,00									
9.2.18	V08H - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=8.10m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 1.908.255,00	$ 1.908.255,00									
9.2.19	V08I - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.40m h=2.22m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	26,00	$ 367.020,00	$ 9.542.520,00									
9.2.20	V08J - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.50m h=2.22m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	26,00	$ 458.775,00	$ 11.928.150,00									
9.2.21	V09 - Suministro e instalación de ventana compuesta con rejilla superior y panel fijo en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en lámina lisa de acero galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con estructura interna en perfiles de acero negro de 4cm x 4cm, armados @1m en vertical y @0.5m en horizontal. Acabado general con recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	$ 13.846.525,00	$ 13.846.525,00									
9.2.22	V10A - V10B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos, ventana proyectante lateral en perfilería de aluminio sistema 'stick' y lámina de acero cold rolled, a=6.08m h=0.50m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	2,00	$ 1.575.269,00	$ 3.150.538,00									
9.2.23	V11A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana corrediza superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.93m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Riel de desplazamiento en aluminio con sello anti condensación.	Und	1,00	$ 6.112.865,00	$ 6.112.865,00									

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
9.2.24	V11B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana corrediza superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.94m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Riel de desplazamiento en aluminio con sello anti condensación.	Und	1,00	$ 6.125.264,00	$ 6.125.264,00							
9.2.25	V12A - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.40m h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 12.749.808,00	$ 12.749.808,00							
9.2.26	V12B - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.41m h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 12.769.730,00	$ 12.769.730,00							
9.2.27	V12C - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.96m h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 13.865.416,00	$ 13.865.416,00							
9.2.28	V13 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=3.33m x h=0.5m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	$ 1.129.819,00	$ 1.129.819,00							
9.2.29	V14 - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.16m h=1.80m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 3.094.870,00	$ 3.094.870,00							
9.2.30	V15A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes inferiores y módulos de ventana fija superiores en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=2.10m. Marco y montantes intermedios verticales @1.11m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.	Und	15,00	$ 5.815.281,00	$ 87.229.215,00							
9.2.31	V16 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes inferiores y módulos de ventana fija superiores en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.40m h=2.10m. Marco y montantes intermedios verticales @1.07m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.	Und	2,00	$ 4.686.943,00	$ 9.373.886,00							
9.2.32	V17A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.40m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	4,00	$ 1.259.178,00	$ 5.036.712,00							
9.2.33	V17B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	16,00	$ 1.562.315,00	$ 24.997.040,00							
9.2.34	V18 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.10m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	2,00	$ 1.562.315,00	$ 3.124.630,00							
9.2.35	V19 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=22.55m x h=1.03m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate. Módulo inicial y final a=1.23m, módulos intermedios de 1m de ancho.	Und	1,00	$ 16.620.481,00	$ 16.620.481,00							
9.2.36	V20 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.41m h=0.80m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.26m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	6,00	$ 3.663.783,00	$ 21.982.698,00							
9.2.37	V21A - V21B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.40m h=0.80m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.26m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	13,00	$ 1.678.905,00	$ 21.825.765,00							
9.2.38	V22A - Suministro e instalación de ventana compuesta fija con módulos proyectantes laterales en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=8.40m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 3.124.629,00	$ 3.124.629,00							
9.2.39	V23A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.41m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 4.986.305,00	$ 4.986.305,00							
9.2.40	V23B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.05m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 3.732.817,00	$ 3.732.817,00							
9.2.41	V24 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.65m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 6.175.275,00	$ 6.175.275,00							
9.2.42	V25 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y superior y ventana proyectante intermedia en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.78m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana proyectante de h=0.60m.	Und	150,00	$ 967.147,00	$ 145.072.050,00							
9.2.43	V26 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo superior, ventana proyectante intermedia, y módulo inferior en celosía, en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.78m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana proyectante de h=0.60m. Celosía horizontal en lámina de aluminio 6003 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, h=1.2m.	Und	10,00	$ 1.385.763,00	$ 13.857.630,00							
9.2.44	V27 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y superior y ventana proyectante intermedia en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.78m h=4.62m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana proyectante de h=0.60m.	Und	24,00	$ 1.489.406,00	$ 35.745.744,00							
9.2.45	V28 - Suministro e instalación de ventana fija embebida en marco en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=7.08m h=4.97m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.20m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Marco para embebida de ventana en lámina de aluminio 6003 calibre 16 o 1.5mm, sección a=10cm x l=70cm.	Und	2,00	$ 13.675.148,00	$ 27.350.296,00							
9.2.46	V29 - Suministro e instalación de ventana horizontal tipo lucernario en vidrio laminado y templado con tratamiento de control solar, e=4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Resistencia a la flexión 180MPa, resistencia al impacto de una esfera de acero de 227gr que se deja caer a una altura de 3m, resistencia a la compresión 69MPa, resistencia al choque térmico h=200°C, protección contra rayos UV 98.10%, porcentaje de reflectancia 15.6%, factor U de 5.66 w/m²°C, porcentaje de transmitancia (SHGC) 66%, porcentaje de transmisión de luz visible (VLT) 47%.	Und	24,00	$ 3.028.118,00	$ 72.674.832,00							
9.2.47	V30A - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=2.30m x h=0.23m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	48,00	$ 313.277,00	$ 15.037.296,00							
9.2.48	V30B - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=1.70m x h=0.23m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	48,00	$ 231.553,00	$ 11.114.544,00							
9.2.49	PV05A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.94m h=2.10m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.21m. Paneles de vidrio templado incoloro e=10mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 4.607.661,00	$ 4.607.661,00							
9.2.50	PV05B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=3.31m h=2.10m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.66m. Paneles de vidrio templado incoloro e=10mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 3.087.319,00	$ 3.087.319,00							
9.2.51	PV15 - Suministro e instalación de ventana fija compuesta, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=2.05m x h=3.00m. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Panel de vidrio laminado y templado 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulo fijo a tope.	Und	1,00	$ 2.731.552,00	$ 2.731.552,00							
9.2.52	V01B - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.355m x h=0.5m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	$ 2.156.155,00	$ 2.156.155,00							
9.2.53	V02A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.90m h=2.20m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 818.356,00	$ 818.356,00							

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
9.2.54	V05C - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	5,00	$ 1.966.119,00	$ 9.830.595,00									
9.2.55	V05D - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=8.16m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	2,00	$ 2.394.557,00	$ 4.789.114,00									
9.2.56	V05E - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.40m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 1.584.633,00	$ 1.584.633,00									
9.2.57	V15B - V15C - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes inferiores y módulos de ventana fija superiores en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=2.58m. Marco y montantes intermedios verticales @1.11m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.	Und	8,00	$ 7.144.489,00	$ 57.155.912,00									
9.2.58	V17C - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.49m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 1.046.984,00	$ 1.046.984,00									
9.2.59	V17D - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.58m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	2,00	$ 1.534.332,00	$ 3.068.664,00									
9.2.60	V22A - Suministro e instalación de ventana compuesta fija con módulos proyectantes laterales en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.15m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 2.151.097,00	$ 2.151.097,00									
9.2.61	V23C - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.43m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 4.705.948,00	$ 4.705.948,00									
9.2.62	V23D - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 5.124.557,00	$ 5.124.557,00									
9.2.63	V31A - V31B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick' y módulos superiores en rejilla de lámina de acero galvanizado ASTM A653, a=6.70m h=1.05m. Marco de ventana en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Marco de rejilla perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	6,00	$ 4.166.172,00	$ 24.997.032,00									
9.2.64	V32 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=27m x h=0.71m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	$ 13.008.320,00	$ 13.008.320,00									
9.2.65	V33A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 5.124.557,00	$ 5.124.557,00									
9.2.66	V33B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 2.487.078,00	$ 2.487.078,00									
9.2.67	V34 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=16.17m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	2,00	$ 6.014.911,00	$ 12.029.822,00									
9.2.68	V35A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.31m h=1.03m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 2.260.521,00	$ 2.260.521,00									
9.2.69	V35B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.41m h=1.03m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 2.303.091,00	$ 2.303.091,00									
9.2.70	V36 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=1.40m h=3.00m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	2,00	$ 1.735.905,00	$ 3.471.810,00									
9.2.71	V37 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=3.63m h=3.00m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	$ 4.500.953,00	$ 4.500.953,00									
9.2.72	V38 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=0.56m x h=2.28m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	$ 866.398,00	$ 866.398,00									
9,3	**BARANDAS**													
9.3.1	E4 Suministro e instalación de baranda en acero y malla expandida, h=1.2m. Estructura tipo marco con balaustre, barandal inferior y pasamanos en platina de acero ASTM A36, sección de 2" x e=3/8" o 1cm, balaustres @0.675m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en malla expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.	m	129,36	$ 643.521,00	$ 83.245.877,00									
9.3.2	E4 Suministro e instalación de baranda en acero y malla expandida, h=1.2m. Estructura tipo marco con balaustre, barandal inferior y pasamanos en platina de acero ASTM A36, sección de 2" x e=3/8" o 1cm, balaustres @1,02m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en malla expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.	m	2,06	$ 545.256,00	$ 1.123.227,00									
9.3.3	Suministro e instalación de baranda en acero y lámina lisa, h=1.26m. Estructura tipo marco con balaustre, barandales en tubular de acero inoxidable 1", balaustres @0.92m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en lámina de acero cold rolled, calibre 12 o 2.5mm. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.	m	24,42	$ 703.155,00	$ 17.171.045,00									
9.3.4	Suministro e instalación de baranda con paneles de vidrio, h=0.90m, Estructura tipo marco con balaustre, barandales en tubular de acero inoxidable 1", balaustres @0.92m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en vidrio laminado y templado 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.76mm. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.	m	66,19	$ 386.681,00	$ 25.594.415,00									
9.3.5	Suministro e instalación baranda con paneles de vidrio a tope, h=1.2m. Paneles en vidrio laminado y templado 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.76mm, biselados en los bordes a 45° para instalación atope. Incluye herrajes de soporte.	m	27,00	$ 137.208,00	$ 3.704.616,00									
9,4	**PUERTAS VENTANAS**													
9.4.1	PV01 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 6 hojas (3 cuerpos dobles), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=5.70m x h=2.40m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente.	Und	2,00	$ 6.413.595,00	$ 12.827.190,00									
9.4.2	PV02A - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.30m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.	Und	10,00	$ 7.088.940,00	$ 70.889.400,00									
9.4.3	PV02B - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.0m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.	Und	2,00	$ 6.751.152,00	$ 13.502.304,00									
9.4.4	PV03A - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 1 fijo y 3 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.70m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio lamiando y templado de 5mm + 5mm de espesor.	Und	2,00	$ 7.539.070,00	$ 15.078.140,00									
9.4.5	PV03B - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 1 fijo y 3 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.70m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.	Und	4,00	$ 7.538.787,00	$ 30.155.148,00									
9.4.6	PV04 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 2 hojas con dintel en madera entamborada, puerta con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=1.70m x h=3.00m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente. Dintel de ventana en estructura de perfiles de acero estructural al carbono de 1-1/4" x 1-1/4", enchapados con tableros de madera aglomerada recubiertos con chapilla de madera natural de Haya africano.	Und	6,00	$ 2.831.487,00	$ 16.988.922,00									

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
9.4.7	PV06 - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 8 hojas, 6 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=12.02m x h=2.10m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor. Junta vertical en montantes o a tope @1.50m, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	$ 11.834.208,00	$ 11.834.208,00									
9.4.8	PV07 - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.41m x h=2.10m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.	Und	1,00	$ 6.310.922,00	$ 6.310.922,00									
9.4.9	PV08A - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulo fijo y módulo pivotante de 1 hoja, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=2.07m x h=3.00m, puerta de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente.	Und	1,00	$ 2.911.434,00	$ 2.911.434,00									
9.4.10	PV08B - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulo fijo y módulo pivotante de 1 hoja, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=2.26m x h=3.00m, puerta de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente.	Und	1,00	$ 3.178.667,00	$ 3.178.667,00									
9.4.11	PV09 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por ventanilla de interlocución y puerta batiente entamborada en lamina de acero cold rolled calibre 18, a=1.68m x h=3.00m. Puerta a=0.90m - Módulo fijo a=0.78m, marcos en perfil tubular de acero cold rolled de 30mm x 50mm, manija tipo Schlage referencia Júpiter, cerradura intermedia tipo Schlage referencia B60 grado 1 cromada. Módulo fijo con panel entamborado inferior con bastidores en tubulares de acero cuadrados de 1-1/4", recubiertos en ambas caras con láminas de acero cold rolled calibre 18, a=0.78m x h=0.96m. Nicho de ventanilla de interlocución en lámina de acero hot rolled e=3/8", a=0.78m x p=0.72m x h=2.04m. Ventanilla de interlocución en marco de perfiles de acero cold rolled calibre 18, ancho de 40mm, vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm con película de sandblasting interna, incluye 104 perforaciones en ventanilla. Acabado de todas las superficies metálicas en base anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000.	Und	1,00	$ 2.291.642,00	$ 2.291.642,00									
9.4.12	PV10 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 3 hojas (3 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.70m x h=3.00m, puertas de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfiles verticales intermedios de confinamiento y soporte en tubulares de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente.	Und	1,00	$ 9.423.484,00	$ 9.423.484,00									
9.4.13	PV11 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 2 hojas (3 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.70m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=1.20m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubulares de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente.	Und	1,00	$ 9.423.484,00	$ 9.423.484,00									
9.4.14	PV12 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por puerta batiente de una hoja y ventana compuesta por rejilla superior y panel fijo en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. VENTANA. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en lámina lisa de acero galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con estructura interna en perfiles de acero negro de 4cm x 4cm, armados @1m en vertical y @0.5m en horizontal. Acabado general con recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate. PUERTA, en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.07m x h=3.00m.	Und	1,00	$ 13.130.325,00	$ 13.130.325,00									
9.4.15	PV13 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 2 hojas (2 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.15m x h=3.00m, puertas de a=1.00m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubulares de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior seguridad.	Und	1,00	$ 9.071.861,00	$ 9.071.861,00									
9.4.16	PV14A - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 1 hoja (2 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=3.46m x h=3.00m, puerta de a=1.00m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulo fijo a tope. Cerradura de seguridad inferior .	Und	1,00	$ 4.866.456,00	$ 4.866.456,00									
9.4.17	PV14B - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 1 hoja (2 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=4.93m x h=3.00m, puerta de a=1.00m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulo fijo a tope. Cerradura de seguridad inferior.	Und	2,00	$ 6.933.997,00	$ 13.867.994,00									
9.4.18	PV16 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 2 hojas, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=1.68m x h=2.23m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior.	Und	2,00	$ 1.756.438,00	$ 3.512.876,00									
9.4.19	PV17 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes, 6 hojas pivotantes (12 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=26.77m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=0.86m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubular de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio templado de 10mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulos fijos a tope. Cerradura de seguridad inferior.	Und	1,00	$ 37.651.741,00	$ 37.651.741,00									
9.4.20	PV18 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes, 3 hojas pivotantes (1 módulo fijo adyacente), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.23m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=0.86m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubular de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio templado de 10mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulos fijos a tope. Cerradura de seguridad inferior.	Und	1,00	$ 8.762.434,00	$ 8.762.434,00									
10	**MOBILIARIO FIJO Y ACCESORIOS**													
10,1	**MUEBLES FIJOS**													
10.1.1	M01 - Mueble nicho - Suministro e instalación de mueble de almacenamiento y descanso en madera aglomerada con recubrimiento melaminico de l=1.40m x a=0.46m x h=3.00m, e=18mm, con recubrimiento melamínico exterior en color Rovere, similar o equivalente, cantos rígidos. Zócalo en madera h=25cm, con estructura interna de bastidores en madera. Módulo de almacenamiento con puerta batiente y entrepaños internos en madera aglomerada con recubrimiento melaminico color verde azulado, e=18mm, cantos rígidos. Enchape de muro en aglomerado melaminico color Rovere, e=6mm, d=0.74m x h=3.00m. Incluye herrajes, cerraduras y accesorios en acero inoxidable. Incluye cojín en tela impermeable con interior en espuma sintética, color blanco.	Und	10,00	$ 2.563.579,00	$ 25.635.790,00									
10.1.2	M02 - Mueble bajo - Suministro e instalación de mueble de almacenamiento y anotación en madera aglomerada con recubrimiento melaminico de l=5.35m x a=0.76m x h=2.23m, e=18mm, con recubrimiento melamínico exterior en color Rovere, similar o equivalente, cantos rígidos. Zócalo en madera h=25cm, con estructura interna de bastidores en madera. Módulo de almacenamiento con puerta batiente y entrepaños internos en madera aglomerada con recubrimiento melaminico color verde azulado, e=18mm, cantos rígidos. Enchape de muro en aglomerado melaminico color Rovere, e=6mm, d=0.74m x h=3.00m. Incluye herrajes, cerraduras y accesorios en acero inoxidable. Incluye cojín en tela impermeable con interior en espuma sintética, color blanco.	Und	26,00	$ 6.085.308,00	$ 158.218.008,00									
10,2	**ACCESORIOS DE BAÑO**													
10.2.1	Suministro e instalación de taza para sanitario en porcelana vitrificada sanitaria de fluxómetro, a=0.365m x l=0.644m x h=0.370m, consumo de 4.8lpd, color blanco, taza alongada de entrada posterior, antivandálica. Válvula antivandálica en acero inoxidable para fluxómetro, ø=7.4cm, consumo máximo de 4.8lpd, acabado antibacterial natural cromado con partículas ionizantes de plata, accionamiento automático tipo 'push'. Incluye sistema de fluxómetro oculto. Incluye asiento sanitario en polipropileno inyectado de alta densidad referencia forte, similar o equivalente, color blanco.	Und	52,00	$ 1.545.788,00	$ 80.380.976,00									
10.2.2	Suministro e instalación de orinal en porcelana vitrificada sanitaria, a=0.352m x p=0.3m x h=0.536m, consumo de 1.9lpd, entrada superior. Válvula de accionamiento tipo fluxómetro, consumo de 1.9lpd, acabado antibacterial en acero inoxidable, accionamiento tipo push.	Und	19,00	$ 1.101.481,00	$ 20.928.139,00									
10.2.3	Suministro e instalación de sanitario de tanque en porcelana vitrificada sanitaria, infantil, a=0.293m x l=0.573m x h=0.579m, consumo de 4.8lpd, color blanco. Incluye asiento y tapa sanitaria en polipropileno inyectado de alta densidad, similar o equivalente, color blanco.	Und	16,00	$ 814.672,00	$ 13.034.752,00									

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
10.2.4	Suministro e instalación de taza para sanitario en porcelana vitrificada sanitaria de fluxómetro, a=0.365m x l=0.644m x h=0.370m, consumo de 4.8lpd, color blanco, taza alongada de entrada posterior, antivandálica. Válvula antivandálica en acero inoxidable para fluxómetro, a=7.4cm, consumo máximo de 4.8lpd, acabado antibacterial natural cromado con partículas ionizantes de plata, accionamiento automático tipo 'push'. Incluye sistema de fluxómetro oculto. Incluye asiento sanitario en polipropileno inyectado de alta densidad referencia forte, similar o equivalente, color blanco.	Und	6,00	$ 1.691.989,00	$ 10.151.934,00								
10.2.5	Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada sanitaria, institucional de colgar similar o equivalente, a=0.539m x l=0.559m x h=0.194m, color blanco.	Und	9,00	$ 592.132,00	$ 5.329.188,00									
10.2.6	Suministro e instalación de mesón en quazar de 60cm de ancho con estructura metálica de soporte, incluye salpicadero y faldón según detalle, color blanco.	m	1,00	$ 894.610,00	$ 894.610,00									
10.2.7	Suministro e instalación de lavamanos esférico en quazar vaciado con mesón rectangular, poceta redonda de Ø 42cm, color blanco plano.	Und	82,00	$ 717.397,00	$ 58.826.554,00									
10.2.8	Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada sanitaria, institucional de colgar similar o equivalente, a=0.405m x l=0.410m x h=0.12m, color blanco. Incluye grifería de montaje de mesón para lavamanos monocontrol referencia Thames baja similar o equivalente, a=0.052m x l=0.125m x h=0.16m. Grifería con cuerpo en latón con acabado cromado, consumo máximo de 8.3lpm a 60psi, anclaje en material polimérico. Accionamiento por palanca.	Und	1,00	$ 956.524,00	$ 956.524,00									
10.2.9	Suministro e instalación de grifería de montaje empotrada en pared para lavamanos institucional de pico, tipo push, a=0.076m x l=0.24m x h=0.074m. Grifería con cuerpo en latón con acabado cromo, consumo máximo de 9.68lpm a 80psi, anclaje en material polimérico. Incluye push antivandálico incrustado a pared con cierre automático temporizado entre 5s a 9s, y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	82,00	$ 716.807,00	$ 58.778.174,00									
10.2.10	Suministro e instalación de dispensador de jabón de incrustar en lámina de acero inoxidable, a=0.201m x l=0.201m, h=0.14m. Capacidad de 1lt de jabón líquido, con 'push' antivandálico. Sujetado a la superficie mediante chazos expansivos.	Und	45,00	$ 475.599,00	$ 21.401.955,00									
10.2.11	Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en lámina de acero inoxidable grado 304, a=0.10m x l=0.28m, h=0.26m, anclado a muro con tornillos, con sistema de cerradura con llave.	Und	29,00	$ 367.134,00	$ 10.646.886,00									
10.2.12	Suministro e instalación de dispensador de papel en lámina de acero inoxidable 304, a=12cm, Ø26.5cm, capacidad de carga de rollos de papel de 9". Anclado a divisiones de baños con tornillería oculta.	Und	53,00	$ 206.745,00	$ 10.957.485,00									
10.2.13	Suministro e instalación de muro divisorio en panel fenólico HPL para baños, e=2cm. Acabado de panel en color RGB 201-172-144 veteado tipo madera en vertical. Instalados en la parte inferior sobre zócalos en perfiles en U en acero inoxidable, y rigidizados en la parte superior mediante barra estabilizadora en perfil en u en aluminio. Incluye accesorios y herrajes en acero inoxidable.	m²	117,83	$ 89.835,00	$ 10.585.258,00									
10.2.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias de cabinas sanitarias en acero inoxidable 304, calibre 20, reforzadas en puertas y muro frontal con perfiles galvanizados y estructura de poliestireno expandido.	m²	118,29	$ 973.776,00	$ 115.187.963,00									
10.2.15	Suministro e instalación de divisiones sanitarias entamboradas para orinales en cantiléver en acero inoxidable 304, calibre 20 a=0.6m x h=0.97m x e=2.5cm. Incluye sujeción mecánica a muro con tornillería	m²	4,81	$ 589.545,00	$ 2.835.711,00									
10.2.16	H1 - Suministro e instalación de barra abatible horizontal izquierda para discapacitados para uso en baños, de doble apoyo e instalación cercana a aparatos sanitarios. Barra fija a muro en lámina de Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 14 (espesor 1.9mm).Tubería redonda ornamental de diámetro 1-¼" (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm) con acabado externo satinado N° 4. Abatible horizontal Izquierda. Instalación según recomendaciones del fabricante.	Und	10,00	$ 922.328,00	$ 9.223.280,00									
10.2.17	H5 - Suministro e instalación de barra de discapacitados para baños, instalación en costados de aparatos sanitarios. (Prof:0.078M x A:0.600m x H:0.91m) Bridas de soporte con perforaciones para instalación a muro en lámina de Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 14 (espesor 1.9mm).Tubería redonda de diámetro 1-¼" (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm) con acabado externo satinado N° 4. . Instalación según recomendaciones del fabricante.	Und	21,00	$ 249.372,00	$ 5.236.812,00									
10.2.18	Suministro e instalación de grifería para lavaplatos monocontrol , a=0.107m x l=0.216m x h=0.352m. Grifería con cuerpo en latón con acabado en acero inoxidable, pico y manija en acero inoxidable, cuello flexible suave al tacto con graduación de 360°, consumo máximo de 8.3lpm. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	1,00	$ 785.748,00	$ 785.748,00									
10.2.19	Suministro e instalación de papelera en lámina de acero inoxidable 304, a=0.13m x l=0.31m, h=0.40m, capacidad de volumen de 12lt. Anclada a divisiones de baños con tornillería oculta.	Und	97,00	$ 621.979,00	$ 60.331.963,00									
10.2.20	Suministro e instalación de espejo de baño, a=2.01m x h=0.52m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata de fondo y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.	Und	2,00	$ 111.785,00	$ 223.570,00									
10.2.21	Suministro e instalación de espejo de baño, a=0.7m x h=0.9m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata de fondo y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.	Und	14,00	$ 70.673,00	$ 989.422,00									
10.2.22	Suministro e instalación de espejo de baño, a=1.02m x h=1.2m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata de fondo y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.	Und	2,00	$ 99.027,00	$ 198.054,00									
10.2.23	Suministro e instalación de espejo de baño con 10° de inclinación sobre la vertical, a=0.7m x h=0.8m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.	Und	4,00	$ 66.312,00	$ 265.248,00									
10.2.24	Suministro e instalación de toallero metálico tipo argolla en latón con acabado cromado referencia Koral, similar o equivalente, a=23.96cm x l=14.18cm x h=6.53cm.	Und	1,00	$ 141.217,00	$ 141.217,00									
10.2.25	Suministro e instalación de barra de seguridad vertical recta en acero inoxidable 304, Ø37mm, l=24", capacidad de carga de 200kg, anclado a muro con chazo plástico y tornillería	Und	6,00	$ 237.990,00	$ 1.427.940,00									
10,3	**EQUIPAMIENTO DE COCINA**													
10.3.1	Suministro e instalación de campana extractora en acero inoxidable grado 304, calibre 20, l=5m x p=1.5m x h=0.6m.	Und	1,00	$ 16.491.378,00	$ 16.491.378,00									
10.3.2	Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico en acero inoxidable grado 304, salpicadero de 0.1m, faldero de 5cm rematado en media curva, a=0.6m x p=0.6m.	Und	1,00	$ 1.857.677,00	$ 1.857.677,00									
10.3.3	Suministro e instalación de mesón con poceta en acero inoxidable grado 304, calibre 20, l=2.25m x p=0.65m, entrepaño en acero inoxidable a 25cm del piso, dos pocetas formadas con el mesón forma en V de l=0.6m x a=0.4m x p=0.3m, incluye salpicadero de 0.1m y faldero de 5cm rematado en media curva.	Und	1,00	$ 4.943.297,00	$ 4.943.297,00									
10.3.4	Suministro e instalación de mesón con poceta en acero inoxidable grado 304, calibre 20, l=4.73m x p=0.60m, entrepaño en acero inoxidable a 25cm del piso, dos pocetas formadas con el mesón forma en V de l=0.6m x a=0.4m x p=0.3m, incluye salpicadero de 0.1m y faldero de 5cm rematado en media curva.	Und	1,00	$ 10.379.980,00	$ 10.379.980,00									
10.3.5	Suministro e instalación de poceta fabricada in situ en mortero con acabado de granito pulido.	Und	1,00	$ 270.912,00	$ 270.912,00									
10.3.6	Suministro e instalación de grifería industrial en latón con acabado cromado, con sistema de pre-rinse, doble función, con cuello flexible para lavado normal o manguera para lavado especial.	Und	2,00	$ 1.352.624,00	$ 2.705.248,00									
10.3.7	H27 - Suministro e instalación de extractor centrífugo diseñado en alumino para aplicaciones de montaje en pared. Aspa plástica, Motor sellado montado en Balineras. Voltage 110v - Caudal 1.4 m3/s - Amperaje 1.3 amp. + Soporte perimetral metalitco. Tamaño aproximado 14 pulgadas según exigencia en proyectos de ventilación.	Und	1,00	$ 50.245.010,00	$ 50.245.010,00									
11	**ACABADOS**													
11,1	**PISOS**													
11.1.1	B6 - Suministro e instalación de pavimento Vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional GRIS GINGER suministrado en rollos de 2 m de ancho. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos químicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, partes 1 y 4) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del producto.	m²	281,75	$ 215.267,00	$ 60.651.477,00									
11.1.2	B1 - Suministro e instalación de pavimento Vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional suministrado en rollos de 2 m de ancho. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos químicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, partes 1 y 4) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presición para garantizar la vida Util del producto.	m²	564,95	$ 215.267,00	$ 121.615.092,00									
11.1.3	B2 - Suministro e instalación de piso en tableta Gres rectangular, formato 30.5x15 cm color Mocca, Disposición en junta perdida en el sentido corto de la tableta, con juntas de dilatación de 5mm en el sentido largo, color de junta mocca para uso institucional de alta resistencia Ref: Alfaquick Junta Ancha Mocca - Alfa o equivalente + Pegante mortero capa gruesa, adhesivo cementico para gres, terrazo o ceramica capa gruesa.	m²	3.100,01	$ 84.102,00	$ 260.717.041,00									
11.1.4	B3 - Suministro e instalación de piso en Baldosa de grano terrazo 30x30cm color Gris tipo ROCA Ref: 132749- B02 gris grano Danta 1-2 pulida 30x30 o equivalente que cumpla la norma NTC 2849, uso institucional y trafico intenso con dilatación en varilla plástica de igual color, bidireccionalmente cada 1.80m y boquilla de 3mm correspondiente al mismo color de la baldosa. Pulida y brillada a máquina. + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente. Instalación y modulación según detalle específico de pisos.	m²	3.818,87	$ 301.841,00	$ 1.152.691.540,00	636,80	$ 192.212.348,80	373,81	$ 112.831.184,21	1.010,61	$ 305.043.533,01	26,46%
11.1.5	B4 - Suministro e instalación de zócalo prefabricado de concreto pulido en forma de media caña, de uso institucional, con sección lateral 80mm x 62mm y longitud de 580mm, color gris Ref color: gris grano danta / ROCA o similar, con boquilla del mismo color del zócalo + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente.	m	660,15	$ 140.021,00	$ 92.434.863,00									

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
11.1.6	Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5MPa, e=0.04m.	m²	3.818,87	$ 36.605,00	$ 139.789.736,00	1.121,25	$ 41.043.356,25	817,66	$ 29.930.444,30	1.938,91	$ 70.973.800,55	50,77%
11.1.7	Suministro e instalación de piso para gramoquín lineal en ladrillo de arcilla gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, instalado de canto vertical, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, e=0.04m, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope.	m²	53,42	$ 213.377,00	$ 11.398.599,00							
11.1.8	Suministro e instalación de piso en adoquín de arcilla referencia Español, unidades de l=0.2m x a=0.1m x h=0.06m, color cobrizo, instalados por el canto con trabe a medios entre hileras. Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento y arena 1:5, e=4cm.	m²	1.081,09	$ 172.800,00	$ 186.812.352,00							
11.1.9	Suministro e instalación de piso en pintura epóxica base solvente de uno o dos componentes en proporción 1:1, tres manos, bajo VOC, color RAL3000 "rojo vivo" o RAL2017 "naranja" según ubicación de diseño arquitectónico.	m²	452,63	$ 46.613,00	$ 21.098.442,00							
11.1.10	Suministro e instalación de piso en láminas modulares de alfombra de fibras de nailon referencia Antron Lumena 6.6 similar o equivalente, e=3.48mm, formato de 45.72cm x 91.44cm, referencia de color Laurelhurst 12333 similar o equivalente. Pegado con adhesivo acrílico de alto 'tack'.	m²	206,31	$ 168.507,00	$ 34.764.679,00							
11.1.11	Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m.	m²	4.470,95	$ 49.216,00	$ 220.042.275,00			380,19	$ 18.711.431,04	380,19	$ 18.711.431,04	8,50%
11.1.12	Suministro e instalación de enchape sobre bordillo en adoquín de arcilla referencia Cuarto 26, unidades de l=0.26m x a=0.06m x h=0.06m, color cobrizo, instalados por el canto sin trabe. Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento y arena 1:5, e=4cm.	m	2.500,00	$ 53.055,00	$ 132.637.500,00							
11.1.13	Suministro e instalación de piso en adoquín de arcilla referencia Español, unidades de l=0.2m x a=0.1m x h=0.06m, color cobrizo, instalados por el canto sin trabe entre hileras. Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento y arena 1:5, e=4cm.	m²	38,68	$ 172.800,00	$ 6.683.904,00							
11.1.14	Suministro e instalación de piso en pintura epóxica base solvente antideslizante de uno o dos componentes en proporción 1:1, tres manos, bajo VOC, color RAL3000 "rojo vivo" o RAL2017 "naranja" según ubicación de diseño arquitectónico, con inclusión de arenilla de cuarzo para exteriores, 400gr/m².	m²	133,97	$ 47.901,00	$ 6.417.297,00							
11.1.15	Suministro e instalación de piso elevado tipo deck en madera natural de Teca, Tectona grandis, listones de madera e=1.8cm x a=8cm, 5mm de separación entre listones, Ei=105.000kg/cm², contenido de humedad < 12%, Fb=140kg/cm², Ftp=100kg/cm² y densidad de mínimo 600kg/m³. Incluye inmunizante, barniz de protección y capa de pintura para madera.	m²	72,10	$ 47.901,00	$ 3.453.662,00							
11,2	**CIELORRASOS**											
11.2.1	Suministro e instalación de cielorraso suspendido en lámina de fibrocemento e=6mm, acabado liso, uniones y filos resanados; instalado completamente a nivel. Estructurado con rieles o viguetas de acero galvanizado ASTM A653 forma en C, calibre 16, armado cada 80cm en una dirección, con alas de 25mm, alma de 65mm. Soportado con perfiles tipo omega de acero galvanizado ASTM A653, forma de sección trapezoidal, calibre 24, armado cada 60cm en una dirección, con un alma de 35mm, altura de 16mm. Incluye barrera de humedad con polietileno entre las omegas y sobre las placas de fibrocemento, e=0.05mm. Anclado con tornillería de cabeza o fulminantes.	m²	631,96	$ 72.322,00	$ 45.704.611,00							
11.2.2	Suministro e instalación de cielorraso suspendido en lámina de cartón yeso resistente a la humedad RH, e=1/2" o 12mm, uniones y filos resanados; instalado completamente a nivel. Estructurado con rieles o viguetas de acero galvanizado ASTM A653 forma en C, calibre 16, armado cada 80cm en una dirección, con alas de 25mm, alma de 65mm. Soportado con perfiles tipo omega de acero galvanizado ASTM A653. Forma de sección trapezoidal, calibre 16, armado cada 60cm en una dirección, con un alma de 35mm, altura de 16mm. Anclado con tornillería de cabeza o fulminantes.	m²	3.146,49	$ 80.948,00	$ 254.702.073,00							
11.2.3	Suministro e instalación de cielorraso suspendido, referencia '84R', con modulación en sentido longitudinal e instalación plana. Perfil '84R' en lámina de aluzinc, e=0.5mm, a=84mm x h=16mm, recubrimiento en pintura a base de poliéster color RAL9005 "negro intenso", montaje a estructura de cielorraso a presión. Estructurado con perfil en aluminio, referencia 'V4', sección trapezoidal, base mayor B=30mm, base menor b=12mm, h=48mm. Conexión a estructura principal mediante perfiles micrométricos.	m²	1.279,84	$ 305.046,00	$ 390.410.073,00							
11.2.4	Suministro e instalación de cielorraso suspendido de listones de aluzinc, referencia 'Baffle 100', con modulación en sentido longitudinal e instalación plana. Perfil Baffle 100 en lámina de aluzinc, calibre 0.6mm, forma trapezoidal b=25mm x B=43mm x h=100mm, instalados @100mm o paso 100mm, recubrimiento en pintura a base de poliéster color RAL9005 "negro intenso", montaje a estructura de cielorraso a presión. Estructurado con portapaneles de aluzinc h=75mm con perfiles de sujetación y tensores para anclaje a placa. Incluye acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de roca, e=1", densidad de 100kg/m³, instalada encima de los portapaneles.	m²	209,34	$ 767.010,00	$ 160.565.873,00							
11.2.5	Suministro e instalación de cielorraso en malla expandida de aluzinc, formato de paneles a=500mm x l=1000mm, 61% de área abierta, diagonal mayor=10mm, diagonal menor=5.5mm, ancho de vena=1.2mm, e=1mm, acabado en pintura a base de resina de poliéster color RAL 3000 "rojo vivo". Montado sobre perfilería en aluminio en perfiles con forma de J y L, h=15/16".	m²	159,80	$ 542.652,00	$ 86.715.790,00							
11,3	**ENCHAPES DE MUROS**											
11.3.1	Suministro e instalación de enchape tipo fachaleta en ladrillo de gran formato, unidades de 39cm x 3.5cm x 5cm, aparejo normal (tipo soga), color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta rehundida, incluye aditivo para mejora de adherencia y malla electrosoldada para anclaje de elementos. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.	m²	2.670,39	$ 172.381,00	$ 460.324.499,00							
11.3.2	C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo.	m	458,91	$ 279.947,00	$ 128.470.478,00	247,20	$ 69.202.898,40	79,77	$ 22.331.372,19	326,97	$ 91.534.270,59	71,25%
11.3.3	B5 - Suministro e instalación de enchape en Cerámica pared rec antartica blanca cu, formato 30x60 color blanco, acabado brillante, con boquilla cementica junta estrecha de 2.05mm con barrera en latex de protección anti hongos, color blanco junta estrecha súper blanco Concolor corona.Clasificada como CGSA según la norma NTC 6050-3.+ (adhesivo cementico) para interiores bajo en polvo, para instalación de revestimientos ceramicos (adhesivo cementico) interiores blanco, instalación según detalles especifico.	m²	1.440,11	$ 110.579,00	$ 159.245.924,00			194,17	$ 21.471.124,43	194,17	$ 21.471.124,43	13,48%
11,4	**PINTURA**											
11.4.1	D2 - Suministro e instalación de recubrimiento acrílico, super lavable e impermeable, Rápido secado, de excelente adherencia y excelente resistencia a la abrasión. Especial para recubrir, proteger fachadas y culatas, con acabado mate para superficies en concreto y acabados sobre mamposteria, mortero o fibro-cemento, Color Negro mate. D11 - Suministro e instalación de pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco. RAL 9010, tres manos, sobre muros y cielo.	m²	5.186,68	$ 16.377,00	$ 84.942.258,00							
11.4.2	D11 - Suministro e instalación de pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco. RAL 9010, tres manos, sobre muros y cielo.	m²	2.900,00	$ 18.019,00	$ 52.255.100,00							
11.4.3	D4 - Suministro e instalación de pintura tipo 1 base agua, de bajo olor, con propiedades antibacteriales y Antihongos, para ambientes interiores de alta higiene, resistencia al lavado y facilidad de limpieza, con resina para resistencia, con acabdo mate, Pintura Lavable.	m²	2.556,61	$ 22.041,00	$ 56.350.241,00							
11.4.4	Suministro e instalación de pintura antibacterial y evitamanchas, tipo 1, color según diseño, tres manos, bajo VOC, aplicada sobre cielorrasos.	m²	550,00	$ 23.684,00	$ 13.026.200,00							
11.4.5	D1 - Suministro e instalación de pintura impermeabilizante acrílica a base agua de alto desempeño para uso interior,con resinas acrílicas, fungicidas, antihongos y antimoho color Blanco. RAL 9010 , color según diseño, pintuco o equivalente, a 3 manos sobre muros. D6 - Suministro e instalación de pintura tipo 1 base agua, de bajo olor, con propiedades antibacteriales y Antihongos, para ambientes interiores de alta higiene, resistencia al lavado y facilidad de limpieza, con resina para resistencia, con acabado mate, Ref:407551271.	m²	600,00	$ 32.624,00	$ 19.574.400,00							
11.4.6	Suministro e instalación de pintura impermeabilizante hidrorepelente, resistente a una presión hidrostática negativa de 10psi, color blanco, dos manos, sobre cielorraso.	m²	320,00	$ 34.267,00	$ 10.965.440,00							
11.4.7	D10 - Suministro e instalación de esmalte sintético a base de aceite resistente al agua, con alta durabilidad y alto brillo. De fácil limpieza, resistencia y adherencia. Acabado Brillante en color rojo RAL 3000 ROJO VIVO. Producto formulado sin plomo y cloro.Esmalte Doméstico. D12 - Suministro e instalación de esmalte sintético a base de aceite resistente al agua, con alta durabilidad y alto brillo. De fácil limpieza, resistencia y adherencia. Acabado Brillante en color gris oscuro RAL 7035 Gris Luminoso. Producto formulado sin plomo y cloro, Esmalte Doméstico.	m²	533,82	$ 33.075,00	$ 17.656.097,00							
11,5	**FACHADA**											
11.5.1	C5 - Suministro e instalación de cortasol tipo fins forma rectangular plana, formada por dos chapas metalicas en su exterior en aluminio, acabado liso color negro mate en pintura poliester o o PVDF2. instalacion del panel con escuadras y perfiles corridos metalicos en el mismo acado del cortasol.	m	2.088,26	$ 230.206,00	$ 480.729.982,00							
11.5.2	Suministro e instalación de cortasol en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, aparejo normal (tipo soga a tercios), color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.	m²	671,40	$ 249.822,00	$ 167.730.491,00							
11.5.3	Suministro e instalación de lámina en acero cold rolled para recubrimiento en fachada, acabado en pintura a base de poliéster color negro mate RAL9005. Incluye dobleces de remate en filos o pestañas.	m²	850,00	$ 198.172,00	$ 168.446.200,00							
11,6	**CUBIERTA**											

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA						
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
11.6.1	Suministro e instalación de lámina de fibrocemento para base de soporte en techo, e=10mm, fijación contra bastidores metálicos y anclaje con tornillos autoperforantes con arandelas de neopreno. Incluye sellado de juntas flexibles e impermeables de instalación con poliuretano, similar o equivalente.	m²	325,43	$ 82.868,00	$ 26.967.733,00							
11.6.2	Suministro e instalación de teja reforzada con fibra de vidrio no tejida recubierta con cerámica de gránulos minerales y autosellante adhesivo, formato de 0.91m x 0.3m, e=1.5mm, referencia Moire Black CT-20 similar o equivalente. Incluye sistema de impermeabilización con una capa de imprimación en emulsión asfáltica en proporción de agua 1:1, y una capa de manto autoprotegido con foil de 2mm instalado con calor.	m²	325,43	$ 151.926,00	$ 49.441.278,00							
11.6.3	Suministro e instalación de cubierta en teja de lámina metálica en aluzinc tipo sandwich, módulo a=525mm, instalación plana por rollos rolados en campo. Cara exterior en lámina de aluzinc, calibre 24 o 0.6mm, acabado superior en pintura de PVDF color RAL7031 "gris azulado". Núcleo en lámina de poliuretano de baja densidad (30kg/m³ - 40kg/m³), e=5cm. Cara interior en lámina de aluzinc, calibre 24 o 6mm, acabado inferior en pintura a base de resina de poliéster RAL9010 "blanco puro".	m²	602,87	$ 165.736,00	$ 99.917.262,00							
11.6.4	E13 - Suministro e instalación de flanche en lámina metálica galvanizada cal. 18. Anclado directamente a la estructura o muro y sellado con silicona. Con anticorrosivo y Pintura a base de aceite, pintulux o equivalente color negro.	m	1.758,00	$ 13.812,00	$ 24.281.496,00							
12	URBANISMO Y PAISAJISMO											
12,1	ESPECIES HERBÁCEAS - MENORES											
12.1.1	Acanto - Acanthus mollis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	36,00	$ 3.084,00	$ 111.024,00							
12.1.2	Agapanto - Agapanthus africanus, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	48,00	$ 7.279,00	$ 349.392,00							
12.1.3	Algodoncillo - Asclepias, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	30,00	$ 21.591,00	$ 647.730,00							
12.1.4	Amaranto - Amaranthus, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	84,00	$ 12.338,00	$ 1.036.392,00							
12.1.5	Angiosanto - xxx, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	18,00	$ 22.208,00	$ 399.744,00							
12.1.6	Anturio ala de ángel - Anthurium marmoratum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	50,00	$ 46.883,00	$ 2.344.150,00							
12.1.7	Apio - Apium graveolens, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	144,00	$ 12.338,00	$ 1.776.672,00							
12.1.8	Balazo - Monstera deliciosa, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	45,00	$ 15.792,00	$ 710.640,00							
12.1.9	Bore grande - Alocasia macrorrhiza, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	35,00	$ 11.598,00	$ 405.930,00							
12.1.10	Borrachero - Brugmansia arborea, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	20,00	$ 30.845,00	$ 616.900,00							
12.1.11	Budelia - Buddleja davidii, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	45,00	$ 24.675,00	$ 1.110.375,00							
12.1.12	Caléndula - Calendula officinalis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	435,00	$ 20.974,00	$ 9.123.690,00							
12.1.13	Cebollín - Allium schoenoprasum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	66,00	$ 6.662,00	$ 439.692,00							
12.1.14	Copa de oro - Allamanda cathartica, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	45,00	$ 14.805,00	$ 666.225,00							
12.1.15	Curry - Helichrysum italicum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	18,00	$ 30.845,00	$ 555.210,00							
12.1.16	Filodendro uña de danta - Philodendron bipinnatifidum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	30,00	$ 36.766,00	$ 1.102.980,00							
12.1.17	Francesina - Brunfelsia pauciflora, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	40,00	$ 24.675,00	$ 987.000,00							
12.1.18	Helecho sarro - Cyathea caracasana, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	20,00	$ 96.234,00	$ 1.924.680,00							
12.1.19	Lágrima de bebé - Bacopa monnieri, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	96,00	$ 18.507,00	$ 1.776.672,00							
12.1.20	Lavanda - Lavandula spica, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	84,00	$ 22.208,00	$ 1.865.472,00							
12.1.21	Linaza - Linum usitatissimum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	230,00	$ 25.786,00	$ 5.930.780,00							
12.1.22	Liriope - Liriope muscari, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	50,00	$ 3.701,00	$ 185.050,00							
12.1.23	Maíz - Zea mays, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	96,00	$ 12.338,00	$ 1.184.448,00							
12.1.24	Maní forrajero - Arachis pintoi, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	45,00	$ 9.253,00	$ 416.385,00							
12.1.25	Menta - Mentha, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	84,00	$ 8.020,00	$ 673.680,00							
12.1.26	Mielenrama - Achillea millefolium, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	240,00	$ 8.513,00	$ 2.043.120,00							
12.1.27	Mussaenda - Mussaenda erythrophylla, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	80,00	$ 24.675,00	$ 1.974.000,00							
12.1.28	Pasto gordura - Melinis minutiflora, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	965,00	$ 12.338,00	$ 11.906.170,00							
12.1.29	Pasto gramalote - Axonopus scoparius, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	1.195,00	$ 12.338,00	$ 14.743.910,00							
12.1.30	Pasto mondo - Ophiopogon japonicus, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	731,00	$ 4.812,00	$ 3.517.572,00							
12.1.31	Pasto puntero - Hyparrhenia rufa, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	670,00	$ 12.338,00	$ 8.266.460,00							
12.1.32	Pennisetum - Pennisetum setaceum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	140,00	$ 8.390,00	$ 1.174.600,00							
12.1.33	Poleo - Mentha pulegium, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	90,00	$ 7.403,00	$ 666.270,00							
12.1.34	Quinua - Chenopodium quinoa, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	120,00	$ 12.338,00	$ 1.480.560,00							
12.1.35	Remolacha - Beta vulgaris, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	72,00	$ 12.338,00	$ 888.336,00							
12.1.36	Sabilón - Aloe, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	305,00	$ 12.215,00	$ 3.725.575,00							
12.1.37	Verbena - Verbena officinalis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	30,00	$ 14.805,00	$ 444.150,00							
12.1.38	Verbena negra - Stachytarpheta jamaicensis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	36,00	$ 9.253,00	$ 333.108,00							

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
12.1.39	Yerbabuena - Mentha spicata, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	370,00	$ 18.507,00	$ 6.847.590,00									
12.1.40	Suministro e instalación de sustrato en tierra abonada para siembra de especies, 66.6% de materia orgánica - 33.3% de arena.	m³	68,08	$ 110.736,00	$ 7.538.907,00									
12.1.41	Suministro e instalación de munch de corteza de pino #2	m³	10,00	$ 359.642,00	$ 3.596.420,00									
12,2	**ESPECIES ARBÓREAS - MAYORES**													
12.2.1	V01 - Aliso - Alnus glutinosa, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	5,00	$ 125.844,00	$ 629.220,00									
12.2.2	V02 - Amarrabollo - Meriania nobilis, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	3,00	$ 125.844,00	$ 377.532,00									
12.2.3	V03 - Chicalá - Tabebuia, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	1,00	$ 188.765,00	$ 188.765,00									
12.2.4	V04 - Yarumo - Cecropia peltata, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	2,00	$ 120.909,00	$ 241.818,00									
12.2.5	V05 - Sangregado - Croton draco, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	7,00	$ 168.902,00	$ 1.182.314,00									
12.2.6	V06 - Palma de cera - Ceroxylon quindiuense, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	3,00	$ 54.039,00	$ 162.117,00									
12.2.7	V07 - Pino romerón - Retrophyllum rospigliosii, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	4,00	$ 54.039,00	$ 216.156,00									
12.2.8	V08 - Pino hayuelo - Podocarpus oleifolius, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	5,00	$ 69.091,00	$ 345.455,00									
12.2.9	V09 - Mano de oso - Oreopanax bogotensis, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	3,00	$ 67.857,00	$ 203.571,00									
12.2.10	Suministro e instalación de sustrato en tierra abonada para siembra de especies, 66.6% de materia orgánica - 33.3% de arena.	m³	25,91	$ 110.736,00	$ 2.869.170,00									
12.2.11	Suministro e instalación de hidroretenedor + Abono, Terracottem	m²	25,92	$ 226.249,00	$ 5.864.374,00									
12,3	**MOBILIARIO URBANO**													
12.3.1	MU1 - Suministro e instalación de banca en concreto de alto desempeño reforzado con fibras de vidrio referencia BORÂ, capacidad de 2 a 3 personas, l=1.02m x a=1.00m x h=0.42m, color gris. Estructura en perfiles metálicos con acabado en pintura electrostática bicapa microtexturizada color gris nopal.	Und	16,00	$ 3.128.233,00	$ 50.051.728,00									
12.3.2	MU2 - Suministro e instalación de mesa en concreto de alto desempeño reforzado con fibras de vidrio referencia BORÂ forma de tronco de pirámide invertida, l=1.05m x a=1.04m x h=0.28m, color gris.	Und	4,00	$ 1.433.085,00	$ 5.732.340,00									
12.3.3	Suministro e instalación de biciparqueadero en concreto de alto desempeño reforzado con fibras de vidrio referencia MC 60° forma de tronco de pirámide inclinada, a=0.13m l=0.69m x h=0.90m, color gris.	Und	50,00	$ 729.828,00	$ 36.491.400,00									
12,4	**CERRAMIENTOS, CONCRETOS Y PREFABRICADOS**													
12.4.1	Suministro e instalación de bordillos en concreto reforzado de 21MPa, para confinamiento de jardines y zonas de pisos.	m³	741,98	$ 734.264,00	$ 544.809.203,00									
12.4.2	Suministro e instalación de loseta de piso en concreto prefabricado, referencia A55 tipo IDU - podotáctil alerta, e=10cm, losetas 39.8cm x 39.8cm x e=6cm, bicapa color amarillo. Pegado con mortero de asiento de arena de pozo y cemento 5:1, e=4cm. Sellado de juntas de instalación a tope con arena de pozo, e=2mm h=6cm.	m²	255,20	$ 143.606,00	$ 36.648.251,00									
12,5	**CANCHAS**													
12.5.1	Suministro e instalación de recubrimiento acrílico mono-componente para la regularización en capa fina, adición de áridos seleccionados con demarcación, color azul, canchas deportivas.	m²	840,40	$ 93.960,00	$ 78.963.984,00									
13	**SEÑALIZACIÓN**													
13,1	**INFORMATIVAS**													
13.1.1	A.1 - Suministro e instalación de señal informativa de área caliente.	Und	1,00	$ 50.255,00	$ 50.255,00									
13.1.2	A.2 - Suministro e instalación de señal informativa de área fría.	Und	1,00	$ 57.572,00	$ 57.572,00									
13.1.3	A.3 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de hombres.	Und	8,00	$ 68.592,00	$ 548.736,00									
13.1.4	A.4 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de mujeres.	Und	7,00	$ 75.909,00	$ 531.363,00									
13.1.5	A.5 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de personas con movilidad reducida.	Und	8,00	$ 83.226,00	$ 665.808,00									
13.1.6	A.6 - Suministro e instalación de señal informativa de baños mixtos.	Und	12,00	$ 90.544,00	$ 1.086.528,00									
13.1.7	A.7 - Suministro e instalación de señal informativa de cuarto técnico.	Und	27,00	$ 102.796,00	$ 2.775.492,00									
13.1.8	A.8 - Suministro e instalación de señal informativa de cuarto de aseo.	Und	7,00	$ 102.796,00	$ 719.572,00									
13.1.9	A.9 - Suministro e instalación de señal informativa indicativa de espacios.	Und	60,00	$ 102.796,00	$ 6.167.760,00									
13.1.10	A.10 - Suministro e instalación de señal informativa de símbolo.	Und	17,00	$ 94.159,00	$ 1.600.703,00									
13.1.11	A.11 - Suministro e instalación de señal informativa de rampa.	Und	1,00	$ 107.731,00	$ 107.731,00									
13,2	**REGLAMENTARIAS**													
13.2.1	B.1 - Suministro e instalación de señal reglamentaria de no usar ascensor en caso de emergencia.	Und	13,00	$ 107.731,00	$ 1.400.503,00									
13.2.2	B.2 - Suministro e instalación de señal reglamentaria para hablar en voz baja.	Und	2,00	$ 107.731,00	$ 215.462,00									
13,3	**PREVENTIVAS**													
13.3.1	C.1 - Suministro e instalación de señal preventiva de riesgo eléctrico.	Und	7,00	$ 102.796,00	$ 719.572,00									
13.3.2	C.2 - Suministro e instalación de señal preventiva de riesgo químico.	Und	1,00	$ 102.796,00	$ 102.796,00									
13,4	**EVACUACIÓN**													
13.4.1	D.1 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida.	Und	38,00	$ 185.975,00	$ 7.067.050,00									
13.4.2	D.2 - Suministro e instalación de señal de evacuación de punto de encuentro.	Und	4,00	$ 185.975,00	$ 743.900,00									
13.4.3	D.3 - Suministro e instalación de señal de evacuación para ruta de evacuación.	Und	32,00	$ 185.975,00	$ 5.951.200,00									
13.4.4	D.4 - Suministro e instalación de señal de evacuación en escaleras.	Und	28,00	$ 185.975,00	$ 5.207.300,00									
13.4.5	D.5 - Suministro e instalación de señal de evacuación para gabinete contra incendios.	Und	18,00	$ 183.507,00	$ 3.303.126,00									
13.4.6	D.6 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida de emergencia.	Und	21,00	$ 185.975,00	$ 3.905.475,00									
13.4.7	D.7 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida con pictograma.	Und	28,00	$ 185.975,00	$ 5.207.300,00									
13.4.8	D.8 - Suministro e instalación de señal de evacuación de botiquín.	Und	1,00	$ 102.796,00	$ 102.796,00									
13.4.9	D.9 - Suministro e instalación de señal de evacuación de camilla.	Und	1,00	$ 102.796,00	$ 102.796,00									
13.4.10	D.10 - Suministro e instalación de señal de evacuación táctil de percepción manual para barandas.	Und	26,00	$ 192.268,00	$ 4.998.968,00									

CONDICIONES ORIGINALES / OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
13.4.11	D.12 - Suministro e instalación de señal de evacuación para demarcación de equipos en franja texturizada.	m²	2,00	$ 235.449,00	$ 470.898,00							
13.4.12	D.13 - Suministro e instalación de señal de evacuación para demarcación de salida en franja de piso de alto contraste.	m²	7,00	$ 426.911,00	$ 2.988.377,00							
13,5	**TUBERÍA Y MAQUINARÍA**											
13.5.1	E.1 - Suministro e instalación de señal en 'sticker' reflectivo para tubos.	Und	7,00	$ 27.293,00	$ 191.051,00							
13.5.2	E.1 - Suministro e instalación de señal para identificación de tubos.	Und	7,00	$ 27.293,00	$ 191.051,00							
13,6	**PANELES Y PLANOS**											
13.6.1	F.1 - Suministro e instalación de señal de directorio general y de piso.	Und	16,00	$ 1.400.381,00	$ 22.406.096,00							
13.6.2	F.2 - Suministro e instalación de señal de cartelera de información.	Und	13,00	$ 1.277.005,00	$ 16.601.065,00							
13.6.3	F.3 - Suministro e instalación de señal de protocolo de lavado de manos.	Und	46,00	$ 107.731,00	$ 4.955.626,00							
14	**COMPROMISOS ESPECIALES ACUEDUCTO**											
14,1	**RECOMPOSICIÓN DE TUBERÍA**											
14.1.1	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. Incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra.	m	677,44	$ 110.836,00	$ 75.084.740,00			677,44	$ 75.084.739,84	677,44	$ 75.084.739,84	100,00%
14.1.2	Fresado y reposición de pavimento flexible e=0.14m.	m²	671,70	$ 219.354,00	$ 147.340.082,00							
14.1.3	Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio autorizado).	m³	1.565,57	$ 61.276,00	$ 95.931.867,00							
14.1.4	Alquiler de entibado metálico tipo deslizante (E2) (incluye colocación y transporte)	m²	1.655,42	$ 34.849,00	$ 57.689.732,00							
14.1.5	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	306,19	$ 127.637,00	$ 39.081.173,00							
14.1.6	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 10"	m	119,80	$ 159.152,00	$ 19.066.410,00							
14.1.7	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 8"	m	10,00	$ 121.896,00	$ 1.218.960,00							
14.1.8	Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y compactación).	m³	858,55	$ 111.457,00	$ 95.691.407,00							
14.1.9	B15 - Suministro e instalación de sub-base granular, según estudio de suelos. Espesor y acabado según pliego de condiciones.	m³	681,70	$ 146.743,00	$ 100.034.703,00							
14.1.10	Suministro e instalación de tubería PVC-P 6" para extensión de tubería de acueducto, incluye soldadura, sello, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	67,38	$ 354.521,00	$ 23.887.625,00							
14.1.11	Rehabilitación general de pozos existentes, hasta Ø1.2m. Escarificación de paredes interiores y reconstitución de pañete con mortero de cemento y arena 1:3. Recomposición de base y cañuelas en concreto de 21MPa. Retiro y recomposición de geotextil. Rehabilitación de tapa para pozo. No incluye excavación.	Und	6,00	$ 3.049.007,00	$ 18.294.042,00							
14.1.12	Retiro de tubería de concreto diámetro = 1,40m (incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	m	179,70	$ 177.340,00	$ 31.867.998,00							
14.1.13	Suministro e instalación de tubería en concreto reforzado Ø=60"; contempla sellos y demás elementos para su correcta instalación.	m	141,54	$ 3.515.761,00	$ 497.620.812,00							
	VALOR TOTAL CONTRATO				**$ 40.020.746.260,00**		**$ 1.111.050.322,21**		**$ 9.097.545.686,08**		**$ 10.208.596.008,29**	**25,51%**

OBRA ADICIONAL MAYORES CANTIDADES DE OBRA / OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	**PRELIMINARES**											
1,2	**DESMONTE Y DEMOLICIONES**											
1.2.1	Demolición de pavimentos en concreto y/o adoquín de arcilla o concreto, espesor hasta 15cm. Incluye retiro de RCD y disposición final.	m²		$ 52.069,00				851,94	$ 44.359.663,86	851,94	$ 44.359.663,86	
1.2.2	Demolición de cañuelas, cunetas y/o cárcamos en concreto para recolección de aguas lluvias, hasta un a=0.5m y e=0.4m.	m		$ 54.837,00				4,24	$ 232.508,88	4,24	$ 232.508,88	
1.2.4	Demolición manual y con maquinaría pesada de edificaciones con estructura en pórticos de concreto y muros en mampostería en ladrillos huecos de arcilla. Incluye el retiro y suspensión de redes eléctricas, luminarias, tomacorrientes, equipos, redes hidro sanitarias, redes de gas y cualquier otra red existente; el retiro de las tuberías incluye el de los conductores a su interior. Incluye el desmonte de puertas y ventanas en cualquier material. Incluye la demolición de pisos y/o placas aéreas de piso y contrapiso. Incluye el desmonte de muebles fijos, aparatos hidrosanitarios, retiro de mobiliario dotacional, etc. Incluye la demolición de la estructura en concreto de la edificación, así como la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo , también incluye la demolición de las escaleras o elementos de circulación vertical. Incluye el desmonte de divisiones o cerramientos en muros livianos. Incluye la demolición de muros divisiorios o de fachada en mampostería de ladrillos huecos de arcilla. Incluye la disposición final de cada uno de los tipos de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.	m²		$ 123.744,00				138,23	$ 17.105.133,12	138,23	$ 17.105.133,12	
1.2.6	Demolición de estructuras aisladas en concreto reforzado con sus cimentaciones. Incluye la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo y la disposición final de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.	m³		$ 131.593,00		7,30	$ 960.628,90	166,07	$ 21.853.649,51	173,37	$ 22.814.278,41	
2	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**											
2,1	**EXCAVACIONES**											
2.1.1	Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio autorizado).	m³		$ 61.276,00		773,01	$ 47.366.960,76	45,85	$ 2.809.504,60	818,86	$ 50.176.465,36	
2,2	**RELLENOS**											
2.2.1	Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y compactación).	m³		$ 111.457,00		331,70	$ 36.970.286,90	373,38	$ 41.615.814,66	705,08	$ 78.586.101,56	
3	**ESTRUCTURAS**											
3,1	**SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN**											
3.1.3	Suministro e instalación de concreto de limpieza de 14.5MPa, e=0,05m.	m²		$ 43.841,00				987,98	$ 43.314.031,18	987,98	$ 43.314.031,18	
3.1.5	Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 28MPa (incluye vibrado y curado). No incluye acero.	m³		$ 924.431,00				71,18	$ 65.800.998,58	71,18	$ 65.800.998,58	
3,2	**SUPERESTRUCTURA - CONCRETO**											
3.2.2	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla.	kg		$ 6.606,00		52.331,12	$ 345.699.378,72	353.002,68	$ 2.331.935.704,08	405.333,80	$ 2.677.635.082,80	
3.2.3	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Nivel sótano.	m³		$ 981.657,00				45,34	$ 44.508.328,38	45,34	$ 44.508.328,38	
3.2.5	Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel.	m³		$ 886.558,00		118,16	$ 104.755.693,28	9,26	$ 8.209.527,08	127,42	$ 112.965.220,36	
3.2.9	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	m³		$ 1.039.665,00		14,52	$ 15.095.935,80	297,57	$ 309.373.114,05	312,09	$ 324.469.049,85	
3.2.11	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	m³		$ 981.657,00				28,30	$ 27.780.893,10	28,30	$ 27.780.893,10	
3.2.13	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.	m³		$ 1.039.665,00				208,45	$ 216.718.169,25	208,45	$ 216.718.169,25	

CONDICIONES ORIGINALES

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
3.2.15	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.	m³		$ 981.657,00				3,96	$ 3.887.361,72	3,96	$ 3.887.361,72	
3.2.17	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	m³		$ 1.039.665,00		32,06	$ 33.331.659,90	32,10	$ 33.373.246,50	64,16	$ 66.704.906,40	
3.2.21	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Quinto nivel.	m³		$ 1.039.665,00		59,63	$ 61.995.223,95			59,63	$ 61.995.223,95	
3.2.51	A2 - Suministro e instalación de escalera en concreto reforzado de 28 Mpa. Cantidad y disposición del refuerzo, tipos de anclaje a la estructura, dimensiones y espesor según cálculos y diseño estructural. Vaciado sobre formaleta metálica, acabado según detalle arquitectónico.	m³		$ 983.094,00				16,74	$ 16.456.993,56	16,74	$ 16.456.993,56	
4	**MUROS Y PAÑETES**											
4,1	**MUROS MAMPOSTERÍA**											
4.1.8	Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato.	und		$ 19.158,00		274,00	$ 5.249.292,00			274,00	$ 5.249.292,00	
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS**											
6,1	**ACOMETIDA**											
6.1.5	Suministro e instalación de relleno en material seleccionado	m³		$ 37.870,00				30,25	$ 1.145.567,50	30,25	$ 1.145.567,50	
6.1.13	Suministro e instalación de tubería PVC-S 2"	m		$ 51.419,00				19,35	$ 994.957,65	19,35	$ 994.957,65	
6.1.19	Excavación manual	m³		$ 75.507,00				1.265,58	$ 95.560.149,06	1.265,58	$ 95.560.149,06	
6,3	**CUARTO DE BOMBAS AGUA LLUVIA**											
6.3.26	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4"	Und		$ 615.673,00				2,00	$ 1.231.346,00	2,00	$ 1.231.346,00	
6,13	**RAMALES DE AGUAS NEGRAS**											
6.13.1	Suministro e instalación de tubería PVC-S 6"	m		$ 201.466,00				48,97	$ 9.865.790,02	48,97	$ 9.865.790,02	
7	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL**											
7,2	**SALIDAS ELÉCTRICAS**											
7.2.3	Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und		$ 183.363,00		241,20	$ 44.227.155,60	193,40	$ 35.462.404,20	434,60	$ 79.689.559,80	
7,3	**CANALIZACIONES ELÉCTRICAS**											
7.3.2	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m		$ 238.280,00		82,70	$ 19.705.756,00			82,70	$ 19.705.756,00	
8	**INSTALACIONES MECÁNICAS**											
8,1	**ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE VERTICAL**											
8.1.1	Elemento mecánico de movilidad vertical peatonal capacidad 10 personas, 7 paradas, 535 kg capacidad de carga, velocidad de 1.0m/s.	Und		$ 82.819.938,00								
14	**COMPROMISOS ESPECIALES ACUEDUCTO**											
14,1	**RECOMPOSICIÓN DE TUBERÍA**											
14.1.1	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. Incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra.	m		$ 110.836,00				104,75	$ 11.610.071,00	104,75	$ 11.610.071,00	
	COSTO MAYORES CANTIDADES DE OBRA						**$ 715.357.971,81**		**$ 3.385.204.927,54**		**$ 4.100.562.899,35**	

OBRA ADICIONAL ACTIVIDADES NO PREVISTAS

OBRA EJECUTADA

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
	PRELIMINARES											
NP- 001	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO KELLY EN CONCRETO REFORZADO Ø 0.60 M, A PROFUNDIDADES MAYORES A 43 METROS (INCLUYE PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, TRANSPORTE, ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, INCLUYE CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA. NO INCLUYE ACERO NI CONCRETO NI EQUIPOS DE BOMBEO).	ML		$ 333.672,00				9.073,75	$ 3.027.656.310,00	9.073,75	$ 3.027.656.310,00	
NP. 002	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5 MPA FLUIDO PARA PILOTES (NO INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA PARA BOMBEO DE CONCRETO).	M3		$ 797.657,00				2.919,25	$ 2.328.560.197,25	2.919,25	$ 2.328.560.197,25	
NP. 003	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA PILOTES (INCLUYE AUTOBOMBA PARA BOMBEO DE CONCRETO)	M3		$ 882.918,00				456,50	$ 403.052.067,00	456,50	$ 403.052.067,00	
NP. 004	DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 24.5MPA H=2M Ø 0.60M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN		$ 185.475,00				171,00	$ 31.716.225,00	171,00	$ 31.716.225,00	
NP. 005	TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1	UN		$ 386.465,00				31,00	$ 11.980.415,00	31,00	$ 11.980.415,00	
NP. 006	TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.3	UN		$ 1.064.403,00				2,00	$ 2.128.806,00	2,00	$ 2.128.806,00	
NP. 007	Construcción de pilotes pre excavados tipo tornillo en concreto reforzado Ø0.30m, (Incluye prehuecos, excavación, retiro de material de excavacion, manejo y retiro de lodos, transporte, armado y desmonte de equipos, suministro de concreto y equipos de bombeo. No incluye suministro de acero.	ML		$ 251.233,00				2.962,60	$ 744.302.885,80	2.962,60	$ 744.302.885,80	
NP. 008	LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI MÁS STEELDECK E=12CM, INCLUYE LÁMINA COLABORANTE CAL 20 DE 2", ANDAMIO CERTIFICADO, REPLANTEO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE CORTANTE	m²		$ 254.980,00								
NP. 009	Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, H=0,28m, para cimentación de Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m.	ml		$ 72.227,00		160,52	$ 11.593.878,04	315,55	$ 22.791.229,85	476,07	$ 34.385.107,89	
NP. 010	Cargue y retiro de material de excavacion manual, incluye disposicion final en botaderos certificados	m³		$ 52.127,00				1.278,61	$ 66.650.103,47	1.278,61	$ 66.650.103,47	
NP. 011	Suministro e instalación de cable Al 3x350MCM F + 1x350MCM N + 1/0T AWG HFFR-LS serie 8000, acometida desde Transformador a Tablero de Distribución pasando por armario de medida. Se incluye material de conexión e incidencia de bornas estañadas, accesorios de fijación, soporte y conexión.	ml		$ 212.638,00				36,65	$ 7.793.182,70	36,65	$ 7.793.182,70	
NP. 012	Suministro e instalación de muro en mampostería a la vista de ladrillo portante de perforación vertical de 6cm x 24,5cm x 12cm, color Topo o cocoa o Similar liso. (incluye suministro, transporte e instalación)	m²		$ 212.042,00		108,56	$ 23.019.279,52	135,71	$ 28.776.219,82	244,27	$ 51.795.499,34	
NP. 013	Suministro e instalación de geotextil tejido T2100	m²		$ 11.484,00		1.211,18	$ 13.909.191,12	2.023,49	$ 23.237.759,16	3.234,67	$ 37.146.950,28	
NP. 014	Descabece de pilotes en concreto 28MPa h=0,30m Ø0.30m, incluye retiro de material	un		$ 46.370,00		10,00	$ 463.700,00	323,00	$ 14.977.510,00	333,00	$ 15.441.210,00	
NP. 015	Suministro e instalación de zócalo prefabricado de concreto pulido recto, de uso institucional, color gris Ref color: gris grano danta / ROCA o similar, con boquilla del mismo color del zócalo + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente.	ml		$ 48.786,00								

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA								
						PRESENTE ACTA		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO ACTUAL				
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	PRECIO UNITARIO TOTAL	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR. EJECUTADO	% EJEC.
NP. 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15	kg		$ 7.271,00		19.434,19	$ 141.305.995,49	51.710,56	$ 375.987.481,76	71.144,75	$ 517.293.477,25	
NP. 017	Suministro e instalación de sub-base granular reciclada incluye Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación Con Vibrocompactador.	m³		$ 229.877,00		421,87	$ 96.978.209,99	412,74	$ 94.879.432,98	834,61	$ 191.857.642,97	
NP. 018	Bloqueo y traslado de árboles - Categoria 1 hasta H = 5m (Incluye poda aérea, excavación lateral, corte de las raíces laterales o secundarias, aplicación de cicatrizante, amarre del bloque, destronque y traslado interno hasta el punto del trasplante)	un		$ 1.107.683,00		1,00	$ 1.107.683,00			1,00	$ 1.107.683,00	
NP. 019	Medidas de compensación de los impactos y efectos ambientales por los árboles viabilizados con ocasión de la tala autorizada en el acto administrativo Resolución No. 03030 del 26/12/24 y Resolución No. 00606 del 21/03/25, de acuerdo con lo liquidado en los conceptos técnicos SSFFS-13796 del 14 de diciembre de 2023 y SSFFS-01054 de 17 de marzo de 2025, respectivamente	UN		$ 105.776.632,00		1,00	$ 105.776.632,00			1,00	$ 105.776.632,00	
NP. 021	Suministro e instalación cinta PVC H=15cm, para sellado contra placa y muros de tanques en concreto	M		$ 92.605,00				105,05	$ 9.728.155,25	105,05	$ 9.728.155,25	
NP. 025	Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG + 8 AWG desde TBP PRI a TREG SEC. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ml		$ 65.471,00								
NP. 026	Suministro e instalación de acometida en cable 3x6 AWG + 6 AWG + 10 AWG desde TRES PRO a TRES ID. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ml		$ 81.196,00								
NP. 027	Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 4 AWG + 10 AWG desde TRES PRE a TBP PRE. Y desde TRES SIS a TBP SIS. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ml		$ 76.647,00								
NP. 028	Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG + 10 AWG desde TBP SIS a TREG SIS. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ml		$ 68.784,00								
NP. 031	Viga en concreto de 175KG canchada en mampostería h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	ml		$ 57.375,00		415,77	$ 23.854.803,75	1.432,26	$ 82.175.917,50	1.848,03	$ 106.030.721,25	
NP. 032	Suministro e instalación de Poyo en concreto de 3000PSI mezclado en obra, ancho hasta 20cm x alto hasta 21cm, bordes bocelados (Incluye mano de obra y materiales)	ml		$ 99.126,00				178,41	$ 17.685.069,66	178,41	$ 17.685.069,66	
NP. 033	Suministro e instalación Sello para junta entre mampostería y concreto. Espesor desde 2 hasta 3cm (Incluye mano de obra y materiales)	ml		$ 34.058,00								
NP. 034	Suministro e instalación de muro en mampostería de bloque estriado de arcilla de perforación vertical , unidades de 9cm x 23cm x 33 cm, aparejo tipo pandereta a medios, mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPA, espesor de 1cm (Ancho hasta 60cm)	ml		$ 49.568,00				84,68	$ 4.197.418,24	84,68	$ 4.197.418,24	
NP. 035	Suministro e instalación de viga aérea en voladizo en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.	m³		$ 1.700.910,00		156,64	$ 266.430.542,40	82,89	$ 140.988.429,90	239,53	$ 407.418.972,30	
NP. 036	Construcción de Micropilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.20m H=2m, (Incluye prehuecos, excavación, transporte, armado y desmonte de equipos, suministro de concreto). No incluye suministro de acero.	ml		$ 307.661,00		144,00	$ 44.303.184,00			144,00	$ 44.303.184,00	
NP. 037	Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø3/8" L:9cm	und		$ 12.845,00		805,00	$ 10.340.225,00	3.397,00	$ 43.634.465,00	4.202,00	$ 53.974.690,00	
NP. 038	Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L:12cm	und		$ 17.330,00								
NP. 039	Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø5/8" L:15cm	und		$ 26.126,00				136,00	$ 3.553.136,00	136,00	$ 3.553.136,00	
NP. 041	Suministro e instalación de Malla contra impacto para zona de canchas h=5m con bases en tubo redondo AN de 4"x3mmx1,20m, Columnas en tubo redondo AN de 3"x3mmx6m, Marco superior: Angulo de 1"1/2 x 1/8 ángulo de refuerzo 1"1/4 x1/8 repisada con platina de 3/4 x 1/8m y troquel de 30cm central y con 1/4 en cada esquina, Marco inferior: Marco en ángulo de 1"1/2 x 1/8, varilla lisa redonda de 3/4 cada 10cm. No incluye excavacion, ni viga de concreto, ni acero de refuerzo estructura	ml		$ 2.087.144,00								
NP. 042	Suministro e instalación de válvula solenoide de 1 1/2" 220 VAC para tanque de aguas lluvias	Und		$ 2.236.616,00								
COSTO MAYORES CANTIDADES DE OBRA							$ 739.083.324,31		$ 7.486.452.417,34		$ 8.225.535.741,65	

RESUMEN EJECUTIVO

VALOR TOTAL	$ 40.020.746.260,00	$ 2.565.491.618,33	$ 19.969.203.030,96	$ 22.534.694.649,29	56,31%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30,00%)	$ 12.006.223.878,00	$ 769.647.485,00	$ 5.990.760.912,00	$ 6.760.408.397,00	56,31%
VALOR A PAGAR		$ 1.795.844.133,33	$ 13.978.442.118,96	$ 15.774.286.252,29	
VALOR AJUSTE AL PESO A PAGAR EN ACTA		-$ 0,33	$ 0,04	-$ 0,29	
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO		$ 1.795.844.133,00	$ 13.978.442.119,00	$ 15.774.286.252,00	

SALDO DEL CONTRATO	$ 12.240.236.130,00	SALDO POR AMORTIZAR	$ 5.245.815.481,00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL

NOMBRE DE CONTRATISTA : CONSORCIO URBANOVA SED
C.C. O NIT : 901.784.778-3
REP. LEGAL : HARVEY ACUÑA CAVIEDES
C.C. : 79.058.668

NOMBRE DE INTERVENTORIA : LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
C.C. O NIT : 900.436.622-8
REP. LEGAL : EHIDA JULIETH RAMIREZ GUINA
C.C. : 1.118.537.436

MEMORANDO APROBACION DE PRECIOS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2024-119156
Fecha: 08-10-2024 - 20:03
Folios: 1 Anexos:
Radicador: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: QVRGW

Bogotá D.C., octubre de 2024

PARA: MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA
Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030

DE: MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE
Contratista - DCCEE

ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2024-109265 revisión ítems no previstos contrato No 5698312 de 2023 cuyo objeto corresponde a: *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICION TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría "LOGIA 3 ASOCIADOS SAS" quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría, y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU (28.41%) CONTRACTUAL
NP-01	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO KELLY EN CONCRETO REFORZADO Ø 0.60 M, A PROFUNDIDADES MAYORES A 43 METROS (INCLUYE PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, TRANSPORTE, ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, INCLUYE CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA. NO INCLUYE ACERO NI CONCRETO NI EQUIPOS DE BOMBEO).	M	$ 259.849,00	$ 333.672,00
NP-02	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5 MPA FLUIDO PARA PILOTES (NO INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA PARA BOMBEO DE CONCRETO).	M3	$ 621.180	$ 797.657

Se adjuntan los respectivos soportes de los no previstos relacionados.

Ítems propuestos por el contratista los cuales no fueron aprobados debido a que no cuentan con información para realizar su análisis y poder ser tramitados (Especificación Técnica, detalle y cotizaciones):

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACION
NP-03	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA PILOTES (INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA PARA BOMBEO DE CONCRETO)	Pendiente respuesta y validación por parte de la Interventoría frente a las observaciones efectuadas por la Entidad para continuar con el trámite.

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad No Previstos: Ing. Oscar Julián Olea S. - DCCEE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2024-123188
Fecha: 18-10-2024 - 18:45
Folios: 1 Anexos:
Radicador: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: 4275E

Bogotá D.C., octubre de 2024

PARA: MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA
Apoyo a la Supervisión del Contrato No CO1.PCCNTR.5696030

DE: MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE
Contratista - DCCEE

ASUNTO: Alcance a la respuesta I-2024-119156 revisión ítems no previstos contrato No CO1.PCCNTR.5698312 de 2023 cuyo objeto corresponde a: *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICION TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisada la documentación aportada concerniente al ítem no previsto, allegado por el contratista de obra, actividad que fue avalada por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S., quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez atendidas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, en la mesa de trabajo realizada el 16 de octubre/24 se concluye lo siguiente:

Actividad de obra en la cual la SED determina el valor unitario, por cuanto se encuentra dentro de los precios actuales de mercado:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU (28.41%) CONTRACTUAL
NP-03	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA PILOTES (INCLUYE AUTOBOMBA PARA BOMBEO DE CONCRETO)	M3	$ 687.149,00	$ 882.918,00

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos,

así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad valor ítem No Previsto: Ing. Oscar Julián Olea S. - DCCEE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2024-126306
Fecha: 25-10-2024 - 20:36
Folios: 1 Anexos:
Radicador: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: IY4N0

Bogotá D.C., octubre de 2024

PARA: MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA
Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030

DE: MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE
Contratista - DCCEE

ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2024-120386 revisión ítems no previstos contrato No 5698312 de 2023 cuyo objeto corresponde a: *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICION TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría "LOGIA 3 ASOCIADOS SAS" quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría, y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Ítems propuestos por el contratista y con los cuales la SED, está de acuerdo con el valor emitido por el contratista y aprobado por la interventoría, debido a que se encuentran incluidos en el LISTADO SED, razón por la cual los valores relacionados a continuación corresponden a los precios actuales del mercado para dichas actividades:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU (28.41%) CONTRACTUAL
NP-05	TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1	UN	$ 300.962,00	$ 386.465,00
NP-06	TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.3	UN	$ 828.910,00	$ 1.064.403,00

Se adjuntan los respectivos soportes de los no previstos relacionados.

Nota: Para el ítem No previsto NP-04 *"DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 24.5MPA H=2M Ø0.60M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL"* se remitieron observaciones por parte de la Dirección mediante correo electrónico el día 21 de octubre/24; una vez se reciban las respectivas aclaraciones y/o subsanaciones por parte del Proyecto se procederá con su revisión para dar alcance a la presente respuesta.

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de la ejecución de las actividades y cantidades, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,



MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad No Previstos: Ing. Oscar Julián Olea S. - DCCEE 

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2024-132117
Fecha: 08-11-2024 - 18:37
Folios: 1 Anexos:
Radicador: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: FM6I4

Bogotá D.C., noviembre de 2024

PARA: MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA
Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030

DE: MARÍA TERESA RODRÍGUEZ MIRKE
Contratista - DCCEE

ASUNTO: Alcance a respuesta I-2024-126306 revisión ítems no previstos contrato No 5698312 de 2023 cuyo objeto corresponde a: *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICION TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCION OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUEN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO".*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría "LOGIA 3 ASOCIADOS SAS" quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría, y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO COSTO DIRECTO INCLUIDO AIU (28.41%) CONTRACTUAL
NP-04	DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 24.5MPA H=2M Ø 0.60M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	$ 144.440,00	$ 185.475,00

*Se adjuntan los respectivos soportes de los no previstos relacionados.

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad No Previstos: Ing. Oscar Julián Olea S. - DCCEE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2025-5200
Fecha: 19-01-2025 - 17:11
Folios: 2 Anexos:
Radicador: MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: MIFDG

Bogotá D.C., enero de 2025

PARA: MARIA ESTELA HERRERA MENDOZA
Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030

DE: MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2024-149000 revisión ítems no previstos CONTRATO DE OBRA No. CO.1.PCCNTR 5698312, cuyo objeto corresponde a: *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO"*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisado el análisis de precio unitario de la actividad no prevista, allegada por el contratista de obra la cual fue aprobada por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS SAS quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU CONTRACTUAL DE 28.41%
NP – 07	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO TORNILLO EN CONCRETO REFORZADO Ø0.30M, (INCLUYE PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, TRANSPORTE, ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, SUMINISTRO DE CONCRETO Y EQUIPOS DE BOMBEO. NO INCLUYE SUMINISTRO DE ACERO.	M	$ 195.649,00	$ 251.233,00

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del

supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE

Radicado Nº I-2025-57543
Fecha: 08-05-2025 - 13:51
Folios: 1 Anexos:
Radicador: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co
opción CONSULTA TRÁMITE
con el codigo de verificación: EFQY8

Bogotá D.C., mayo de 2025

PARA: SANDRA XIMENA MENDIETA MORENO
Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030

DE: MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

ASUNTO: Alcance a respuesta I-2025-43469 revisión ítems no previstos CONTRATO DE OBRA No. CO.1.PCCNTR 5698312, cuyo objeto corresponde a: *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO"*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS SAS quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU CONTRACTUAL DE 28.41%
NP – 08	LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI MÁS STEELDECK E=12CM, INCLUYE LÁMINA COLABORANTE CAL 20 DE 2", ANDAMIO CERTIFICADO, REPLANTEO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE CORTANTE	M2	$ 198.567,00	$ 254.980,00
NP – 10	CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION MANUAL, INCLUYE DISPOSICION FINAL EN BOTADEROS CERTIFICADOS	M3	$ 40.594,00	$ 52.127,00
NP – 11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE AL 3X350MCM F + 1X350MCM N + 1/0T AWG HFFR-LS SERIE 8000, ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PASANDO POR ARMARIO DE MEDIDA. SE INCLUYE MATERIAL DE CONEXIÓN E INCIDENCIA DE BORNAS ESTAÑADAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, SOPORTE Y CONEXIÓN.	M	$ 165.593,00	$ 212.638,00
NP – 13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO T2100	M2	$ 8.943,00	$ 11.484

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU CONTRACTUAL DE 28.41%
NP – 14	DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 28MPA H=0,30M Ø0.30M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN	$ 36.111,00	$ 46.370,00
NP – 15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO PREFABRICADO EN GRANO DE MÁRMOL, COLOR GRIS REF COLOR: GRIS GRANO DANTA / ROCA O SIMILAR, CON BOQUILLA DEL MISMO COLOR DEL ZÓCALO + MEZCLA ADHESIVA CEMENTICA EN POLVO COMPUESTA POR CEMENTO GRIS, ÁRIDOS CON DOSIFICACIONES, GRANULOMETRÍA CONTROLADA Y ADITIVOS ESPECIALES REF: 350107 - 000 PEGA ROCA O EQUIVALENTE	M	$ 37.992,00	$ 48.786,00
NP – 16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15	Kg	$ 5.662,00	$ 7.271,00

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente

Ítems propuestos por el contratista los cuales no fueron aprobados debido a que no cuentan con información suficiente para realizar su análisis y poder ser tramitados (Especificación Técnica, detalle y cotizaciones):

ITEM	DESCRIPCION	OBSERVACION
NP – 09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE EN CONCRETO 3000PSI, E=0,10M, H=0,28M, PARA CIMENTACIÓN DE SÓTANO, INCLUYE PASES EN TUBERÍA PVC 1" CADA 1M	ítem pendiente para ser reevaluado por parte de contratista e interventoría
NP – 12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA A LA VISTA DE LADRILLO PORTANTE DE PERFORACIÓN VERTICAL, COLOR COCOA O SIMILAR.	ítem pendiente para ser reevaluado por parte de contratista e interventoría
NP – 17	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	ítem pendiente para ser reevaluado por parte de contratista e interventoría

El presente memorando se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto y/o apoyo a la supervisión con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y

calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,



MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad verificación valores ítems No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2025-122117
Fecha: 12-09-2025 - 17:47
Folios: 1 Anexos:
Radicador: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: S4MU8

Bogotá D.C., septiembre de 2025

PARA: SANDRA XIMENA MENDIETA MORENO
Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030

DE: MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2025-111512 revisión ítems no previstos CONTRATO DE OBRA No. CO.1.PCCNTR 5698312, cuyo objeto corresponde a: *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO"*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS SAS quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU CONTRACTUAL DE 28.41%
NP.009	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE EN CONCRETO 3000 PSI, E=0.10M, H=0.28M, PARA CIMENTACIÓN DE SÓTANO, INCLUYE PASES EN TUBERÍA PVC 1" CADA 1M.	M	$ 56.247,00	$ 72.227,00
NP.012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA A LA VISTA DE LADRILLO PORTANTE DE PERFORACIÓN VERTICAL DE 6CM X 24,5CM X 12CM, COLOR TOPO O COCOA O SIMILAR LISO. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN)	M2	$ 165.129,00	$ 212.042.00
NP.019	MEDIDAS DE COMPENSACIÓN DE LOS IMPACTOS Y EFECTOS AMBIENTALES POR LOS ÁRBOLES VIABILIZADOS CON OCASIÓN DE LA TALA AUTORIZADA EN EL ACTO ADMINISTRATIVO RESOLUCIÓN NO. 03030 DEL 26/12/24 Y RESOLUCIÓN NO. 00606 DEL 21/03/25, DE ACUERDO CON LO LIQUIDADO EN LOS CONCEPTOS TÉCNICOS SSFFS-13796 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SSFFS-01054 DE 17 DE MARZO DE 2025, RESPECTIVAMENTE	UN	$ 105.776.632,00	$ 105.776.632,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU CONTRACTUAL DE 28.41%
NP.021	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CINTA PVC H=15CM, PARA SELLADO CONTRA PLACA Y MUROS DE TANQUES EN CONCRETO	M	$ 72.117,00	$ 92.605,00
NP.031	VIGA EN CONCRETO DE 175KG CANCHADA EN MAMPOSTERÍA H=HASTA 15CM (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL)	M	$ 44.681,00	$ 57.375,00
NP.033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SELLO PARA JUNTA ENTRE MAMPOSTERÍA Y CONCRETO. ESPESOR DESDE 2 HASTA 3CM (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES)	M	$ 26.523,00	$ 34.058,00
NP.034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA DE BLOQUE ESTRIADO DE ARCILLA DE PERFORACIÓN VERTICAL, UNIDADES DE 9CM X 23CM X 33 CM, APAREJO TIPO PANDERETA A MEDIOS, MORTERO DE PEGA DE CEMENTO Y ARENA 1:3 F'CP 17.5 MPA, ESPESOR DE 1CM (ANCHO HASTA 60CM)	M	$ 38.601,00	$ 49.568,00

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto o quien este designe con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad valor ítems No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2025-129238
Fecha: 24-09-2025 - 18:38
Folios: 1 Anexos:
Radicador: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE con el codigo de verificación: 3BM89

Bogotá D.C., septiembre de 2025

PARA: SANDRA XIMENA MENDIETA MORENO
Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030

DE: MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2025-111512 y I-2025-120685 revisión ítems no previstos CONTRATO DE OBRA No. CO.1.PCCNTR 5698312, cuyo objeto corresponde a: *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO"*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS SAS quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU CONTRACTUAL DE 28.41%
NP.017	Suministro e instalación de sub-base granular reciclada incluye Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación Con Vibrocompactador.	M3	$ 179.018,00	$ 229.877,00
NP.036	Construcción de Micropilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.20m H=2m, (Incluye prehuecos, excavación, transporte, armado y desmonte de equipos, suministro de concreto). No incluye suministro de acero.	M	$ 239.593,00	$ 307.661,00
NP.041	Suministro e instalación de Malla contra impacto para zona de canchas h=5m con bases en tubo redondo AN de 4"x3mmx1,20m, Columnas en tubo redondo AN de 3"x3mmx6m, Marco superior: Angulo de 1"1/2 x 1/8 ángulo de refuerzo 1"1/4 x1/8 repisada con platina de 3/4 x 1/8m y troquel de 30cm central y con 1/4 en cada	M	$ 1.625.375,00	$ 2.087.144,00

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU CONTRACTUAL DE 28.41%
	esquina, Marco inferior: Marco en ángulo de 1"1/2 x 1/8, varilla lisa redonda de 3/4 cada 10cm. No incluye excavación, ni viga de concreto, ni acero de refuerzo estructura			
NP.042	Suministro e instalación de válvula solenoide de 1 1/2" 220 VAC para tanque de aguas lluvias	UN	$ 1.741.777,00	$ 2.236.616,00

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto o quien este designa con relación a los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación por parte del supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Igualmente, será responsabilidad del interventor del Contrato verificar la pertinencia de las actividades, cantidades y calidad de los insumos, así como la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,

MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad valor ítems No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Radicado Nº I-2025-133022
Fecha: 30-09-2025 - 19:00
Folios: 1 Anexos:
Radicador: OSCAR JULIAN OLEA SALGADO - 4300
Destino: 4300 - DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
Consulte el estado de su trámite en www.educacionbogota.edu.co opción CONSULTA TRÁMITE LRKH6

Bogotá D.C., septiembre de 2025

PARA: SANDRA XIMENA MENDIETA MORENO
Apoyo a la Supervisión Contrato No CO1.PCCNTR.5696030

DE: MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

ASUNTO: Respuesta a la solicitud I-2025-111512 y I-2025-120685 revisión ítems no previstos CONTRATO DE OBRA No. CO.1.PCCNTR 5698312, cuyo objeto corresponde a: *"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANISMO, DEMOLICIÓN TOTAL, CERRAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN OBRA NUEVA DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO GENERAL SANTANDER UBICADO EN LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, DEL DISTRITO CAPITAL, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO"*

En atención a la solicitud referenciada en el asunto y una vez revisados los análisis de precios unitarios de actividades no previstas, allegados por el contratista de obra los cuales fueron aprobados por la interventoría LOGIA 3 ASOCIADOS SAS quien ejerce la supervisión técnica, administrativa y financiera del contrato de obra y revisados por la supervisión del contrato de interventoría y una vez aclaradas las observaciones realizadas por el Grupo de Estudios Previos, se llevó a cabo la revisión, concluyendo lo siguiente:

Actividades de obra con las cuales la SED está de acuerdo con el valor unitario, por cuanto se encuentran dentro de los precios actuales de mercado:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU CONTRACTUAL DE 28.41%
NP.018	Bloqueo y traslado de árboles - Categoría 1 hasta H = 5m (Incluye poda aérea, excavación lateral, corte de las raíces laterales o secundarias, aplicación de cicatrizante, amarre del bloque, destronque y traslado interno hasta el punto del trasplante)	UN	$ 862.614,00	$ 1.1.07.683,00
NP.025	Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG + 8 AWG desde TBP PRI a TREG SEC. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	M	$ 50.986,00	$ 65.471,00
NP.026	Suministro e instalación de acometida en cable 3x6 AWG + 6 AWG + 10 AWG desde TRES PRO a TRES ID. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	M	$ 63.232,00	$ 81.196,00
NP.027	Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 4 AWG + 10 AWG desde TRES PRE a TBP PRE. Y desde TRES SIS a TBP	M	$ 59.689,00	$ 76.647,00

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO AVALADO COSTO DIRECTO	VALOR UNITARIO INCLUIDO AIU CONTRACTUAL DE 28.41%
	SIS. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.			
NP.028	Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG + 10 AWG desde TBP SIS a TREG SIS. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	M	$ 53.566,00	$ 68.784,00
NP.032	Suministro e instalación de Poyo en concreto de 3000PSI mezclado en obra, ancho hasta 20cm x alto hasta 21cm, bordes bocelados (Incluye mano de obra y materiales)	M	$ 77.195,00	$ 99.126,00
NP.035	Suministro e instalación de viga aérea en voladizo en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.	M3	$ 1.324.593,00	$ 1.700.910,00
NP.037	Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø3/8" L:9cm	UN	$ 10.003,00	$ 12.845,00
NP.038	Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L:12cm	UN	$ 13.496,00	$ 17.330,00
NP.039	Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø5/8" L:15cm	UN	$ 20.346,00	$ 26.126,00

* Se adjuntan análisis de precios unitarios, soportes y documentación correspondiente

El presente documento se constituye en una herramienta de referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos que la SED implementa.

El análisis se realizó teniendo en cuenta la información revisada y suministrada por el supervisor del proyecto, o por quien este designe, en relación con los análisis de precios unitarios, así como la verificación y aprobación efectuada por el supervisor del contrato de obra, por tal motivo se tomó como cierta y veraz la documentación recibida en esta área. Así mismo, es responsabilidad del interventor del Contrato verificar que la pertinencia de las actividades, cantidades, calidad de los insumos y la documentación allegada, sean acordes con las condiciones contractuales, la realidad del proyecto y estén enmarcadas dentro de los principios de economía y eficiencia de los recursos contratados.

Es importante aclarar que este grupo no tiene la facultad de aprobar gastos, prorrogar o adicionar recursos en los cuales deba incurrir el contratista para la debida ejecución del contrato, por lo tanto, el presente documento tiene como alcance la revisión, análisis y determinación del costo directo de las actividades no previstas, de acuerdo con las condiciones contractuales y valores actuales de mercado.

Cordialmente,



MARIA TERESA RODRIGUEZ MIRKE
Contratista DCCEE

Responsable viabilidad valor ítems No previstos No previstos: Oscar Julián Olea S. – Contratista – DCCEE 

Memorias de cantidades de obra

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO NOVAURBANO SED
DIRECTOR TECNICO ARQ. NELSON RIVAS
INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	1.2 DESMONTE Y DEMOLICIONES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.6 Demolición de estructuras aisladas en concreto reforzado con sus cimentaciones. Incluye la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo y la disposición final de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
VIGAS NIVEL 1- VIGA CABEZAL									-	-	
30	9,32	0,60	0,30	1,00	1,68					1,68	
27	4,08	0,60	0,30	1,00	0,73					0,73	
26	4,70	0,60	0,30	1,00	0,85					0,85	
25	4,40	0,60	0,30	1,00	0,79					0,79	
28	9,07	0,60	0,30	1,00	1,63					1,63	
29	9,00	0,60	0,30	1,00	1,62					1,62	
									-	-	
									-	-	
									VIENE		
									TOTAL	7,30	



Observaciones	

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

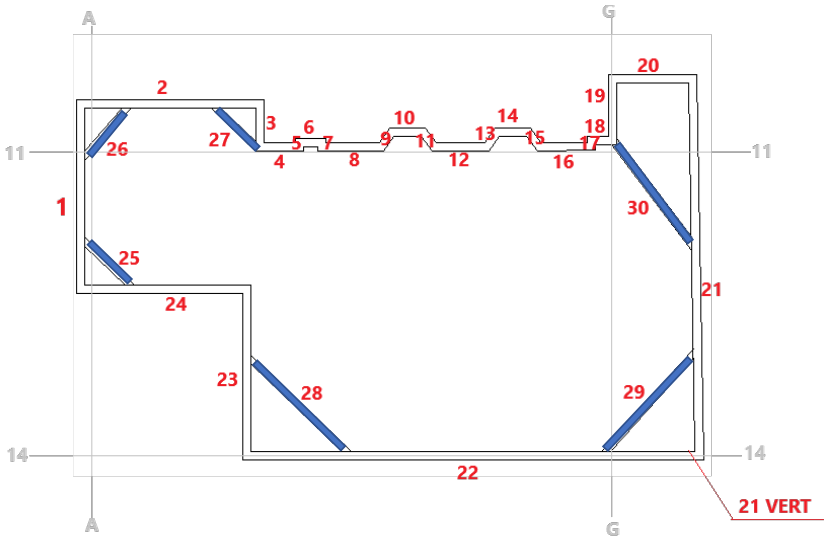
MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. NELSON RIVAS				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	1.2 DESMONTE Y DEMOLICIONES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	1.2.6 Demolición de estructuras aisladas en concreto reforzado con sus cimentaciones. Incluye la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo y la disposición final de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS





Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	2. EXCAVACIONES Y RELLENOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	2.1.1 Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final certificada a sitio autorizado).	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 3

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	Altura	cant	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
Zona urbanismo interno					-				-	-	
zona cancha occidental	32,34	21,20	0,72	1,00	493,56				-	493,56	
Perfilado zona	32,34	21,20	0,05	1,00	34,28				-	34,28	
Zona segura teatrino	10,37	2,87	0,71	1,00	21,12				-	21,12	
	12,76	9,61	1,44	1,00	176,58				-	176,58	
	15,47	4,39	0,70	1,00	47,47				-	47,47	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
CONSOLIDADO CORTE ANTERIOR					-				-	-	
									VIENE	-	
									TOTAL	773,01	





Observaciones

HOJA 1 DE 3

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	2. EXCAVACIONES Y RELLENOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	2.1.1 Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final certificada a sitio autorizado).	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 3

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

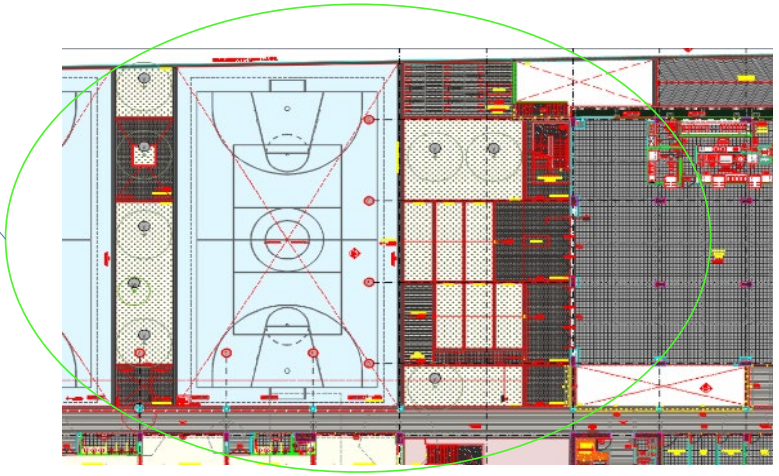CROQUIS





CRONOLOGÍA DE ÁREAS COBRADAS

N. -1,40m



Observaciones	

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	2. EXCAVACIONES Y RELLENOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	2.1.1 Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final certificada a sitio autorizado).	UND.	M3	REF.	HOJA 3 DE 3


ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

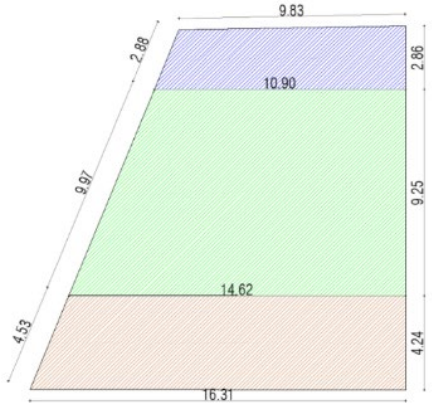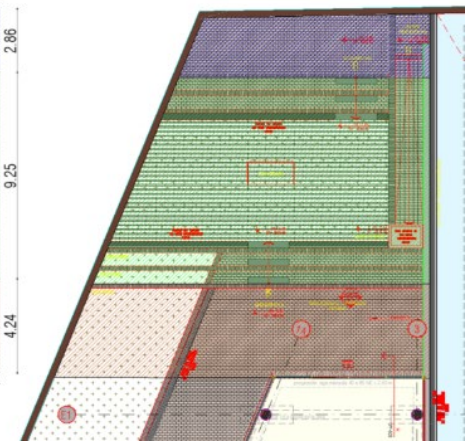CROQUIS









Observaciones	

HOJA 3 DE 3

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

				FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ						
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	2. EXCAVACIONES Y RELLENOS				REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	2.2.1 Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y compactación).	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 2	

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	Altura	cant		L	a	h			
Zona urbanismo interno					-				-	-	
zona cancha occidental	32,34	21,20	0,37	1,00	253,64				-	253,64	
				1,00	1,00				-	1,00	
Zona segura teatrino	10,37	2,87	0,35	1,00	10,41				-	10,41	
	12,76	9,61	0,35	1,00	42,92				-	42,92	
	15,47	4,39	0,35	1,00	23,73				-	23,73	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
CONSOLIDADO CORTE ANTERIOR					-				-	-	
									VIENE	-	
									TOTAL	331,70	

Observaciones	
	HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	2. EXCAVACIONES Y RELLENOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	2.2.1 Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y compactación).	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

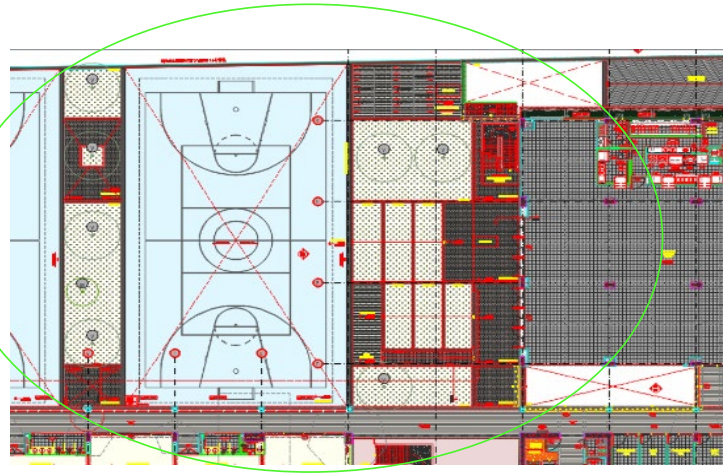CROQUIS





CRONOLOGÍA DE ÁREAS COBRADAS

N. -1,40m



Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO		REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	3.2.1 Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto.	UND. M3	REF. HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL (kg)	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
ZONA ADMINISTRATIVA					-				-	-
PANTALLAS ZONA AULAS EJE A -B ENTRE EJE 11 -12					-				-	-
NIVEL 5					-				-	-
PA3	1,85	0,45	4,73	1,00	3,94				-	3,94
PA8	7,25	0,45	4,73	1,00	15,43				-	15,43
PA3	1,85	0,45	4,73	1,00	3,94				-	3,94
Pantalla PA6 - Eje 11 B	2,85	0,45	4,73	1,00	6,07				-	6,07
Pantalla PA11 - Eje 11 AB	7,25	0,45	4,73	1,00	15,43				-	15,43
Pantalla PA7 - Eje 11 A	2,85	0,45	4,73	1,00	6,07				-	6,07
PANTALLA ZONA AULAS 5 NIVEL EJE A-B ENTRE 3-4 - 2da etapa					-				-	-
PA1	1,85	0,45	1,42	1,00	1,18				-	1,18
PA2	1,85	0,45	1,42	1,00	1,18				-	1,18
PA9	7,25	0,40	1,42	1,00	4,12				-	4,12
PA10	7,25	0,40	1,42	1,00	4,12				-	4,12
PA4	3,25	0,45	1,42	1,00	2,08				-	2,08
PA5	3,25	0,45	1,42	1,00	2,08				-	2,08
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
									VIENE	-
									TOTAL	65,64

FOTOS





Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA LOG IN IA 3 TE

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312


CAPITULO		REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	3.2.1 Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto.	UND. M3	REF. HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

CRONOLOGÍA DE ÁREAS COBRADAS

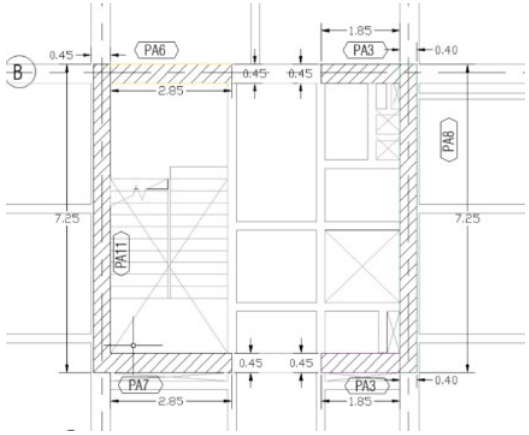PANTALLA ZONA COMEDOR PISO 4 EJE A-B / 11 - 12



Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED — **CONTRATO OBRA No.** CO1.PCCNTR.5698312

DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla	UND.	kg	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS PESO CARTILLA (kg)	ANCHO	LARGO	cantidad	TOTAL	VANOS L	a	h	Sumatoria % pagado con la presente acta	TOTAL (kg)
						-					-
Anexo 11	VIGAS NIVEL 1 ZONA COMEDOR AULAS	8.945,87				8.945,87				100,00%	8.945,87
Anexo 13	VIGAS NIVEL 1 ZONA AULAS	10.603,22				10.603,22				100,00%	10.603,22
Anexo 14	VIGUETAS NIVEL 1 COMEDOR	3.697,95				3.697,95				100,00%	3.697,95
Anexo 17	COLUMNAS ZONA LUDOTECA	2.919,43				2.919,43				90,00%	2.627,49
Anexo 20	ADICIONAL - DETALLES DE PEDESTALES AULAS Y PATIO	1.632,77				1.632,77				100,00%	1.632,77
Anexo 22	PEDESTAL ESCALERA/ VIGA BORDE PLACA EN ZONA AULAS	451,24				451,24				100,00%	451,24
Anexo 24	REFUERZO TANQUES Y POZOS SOTANO	16.989,55				16.989,55				100,00%	16.989,55
Anexo 26	ESCALERA SOTANO A N1 EN EJE G11	179,69				179,69				100,00%	179,69
Anexo 27	VIGAS 2 NIVEL2 LUDOTECA	2.983,51				2.983,51				95,00%	2.834,33
Anexo 28	2do PEDIDO DE COLUMNAS AULAS	46.724,52				46.724,52				100,00%	46.724,52
Anexo 29	PANTALLAS AULAS 2 PEDIDO DEL2AL5 PISO	65.527,02				65.527,02				100,00%	65.527,02
Anexo 30	PLACA PISO 2 ZONA COMEDOR	9.553,10				9.553,10				100,00%	9.553,10
Anexo 31	PLACA PISO 2 ZONA AULAS	41.653,56				41.653,56				100,00%	41.653,56
Anexo 32	columnas comedor 2 pedido	12.799,00				12.799,00				100,00%	12.799,00
Anexo 33	Placa zona Aulas 3er piso	43.702,25				43.702,25				100,00%	43.702,25
Anexo 34	PANTALLAS COMEDOR 2 PEDIDO DEL2 AL 5 PISO	65.527,02				65.527,02				100,00%	65.527,02
Anexo 35	Placa zona Aulas 4to piso - eje 1-9	41.186,13				41.186,13				100,00%	41.186,13
Anexo 36	Pedido pantallas piso 1 zona comedor.	6.274,35				6.274,35				100,00%	6.274,35
Anexo 37	PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR	15.913,01				15.913,01				100,00%	15.913,01
Anexo 38	Rampa vehicular	2.233,96				2.233,96				100,00%	2.233,96
Anexo 39	Placa 3er piso zona Ludoteca	11.981,13				11.981,13				100,00%	11.981,13
Anexo 40	Placa 5to piso	52.037,21				52.037,21				100,00%	52.037,21
Anexo 41	Escaleras	7.222,84				7.222,84				100,00%	7.222,84
Anexo 42	Dinteles concreto	839,19				839,19				100,00%	839,19
Anexo 43	Bancas concreto	408,89				408,89				100,00%	408,89
Anexo 44	VIGAS NIVEL 5A ZONA AULAS	32.852,34				32.852,34				95,00%	31.209,73
Anexo 45	Dinteles comedor nivel 3a	3.225,05				3.225,05				95,00%	3.063,80
Anexo 46	Placa Nivel. 6	34.064,90				34.064,90				60,00%	20.438,94
Anexo 47	Complemento columnas piso 5.-6	10.783,57				10.783,57				80,00%	8.626,86
Anexo 48	Complemento pantallas a cubuierta	9.685,65				9.685,65				90,00%	8.717,09
	PAGADO ACTAS ANTERIORES										-491.270,59
	TOTAL										52.331,12

FOTOS





Observaciones	VER ANEXOS

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.2 Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla	UND.	kg	REF.	HOJA 2 DE 2

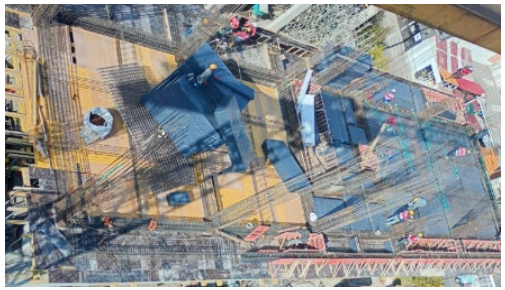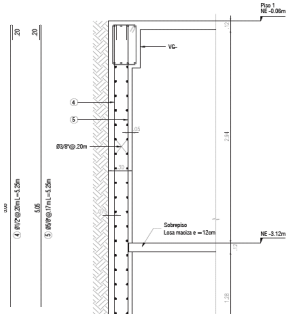CROQUIS







REFUERZO MURO DE CONTENCIÓN MC-5
escala 1:25

Observaciones	
	HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

ESTADO CARTILLAS DE ACERO

ACTA NO. 16

ESTADO	DESCRIPCION DEL PEDIDO	KG CARTILLA	ACERO CIMENTACION 3.1.7			ACERO ESTRUCTURA 3.2.2		
			CANTIDAD	Porcentaje ejecutado	TOTAL A PAGAR ACTA 12	CANTIDAD	Porcentaje ejecutado	TOTAL A PAGAR ACTA 16
Anexo 1	Acero pilotaje inicial	166.468,36	166.468,36	100%	166.468,4			0,00
Anexo 2	Dados cimentacion Sotano	28.599,20	28.599,20	100%	28.599,2			0,00
Anexo 3	Dados cimentacion Primer nivel	38.680,04	38.680,04	100%	38.680,0			0,00
Anexo 4	Vigas cimentacion zona comedor	357,73	357,73	100%	357,7			0,00
Anexo 5	Vigas Nivel 1 zona aulas - Ludoteca	6.115,05	6.115,05	100%	6.115,1			0,00
Anexo 6	Vigas y viguetas sobreplaca fosos ascensor	969,99	969,99	100%	970,0			0,00
Anexo 7	Arranque pantallas zona comedor	27.372,61	27.372,61	100%	27.372,6			0,00
Anexo 8	Arranque pantallas 1er nivel zona aulas	32.276,87	32.276,87	100%	32.276,9			0,00
Anexo 9 y 9a	PILOTAJE TORNILLO	33.389,94	33.389,94	100%	33.389,9			0,00
Anexo 10	VIGAS CIMENTACION ZONA COMEDOR	11.561,75	11.561,75	100%	11.561,8			0,00
Anexo 11	VIGAS NIVEL 1 ZONA COMEDOR AULAS	8.945,87			0,0	8.945,87	100%	8.945,87
Anexo 12	VIGA CABEZAL PILOTES	5.262,97	5.262,97	100%	5.263,0			0,00
Anexo 13	VIGAS NIVEL 1 ZONA AULAS	10.603,22			0,0	10.603,22	100%	10.603,22
Anexo 14	VIGUETAS NIVEL 1 COMEDOR	3.697,95			0,0	3.697,95	100%	3.697,95
Anexo 15	MUROS DE CONTENCION SOTANO	9.488,72	9.488,72	100%	9.488,7			0,00
#Anexo 16	ARRANQUE COLUMNAS ZONA COMEDOR	12.266,78	12.266,78	100%	12.266,8			0,00
Anexo 17	COLUMNAS ZONA LUDOTECA	2.919,43			0,0	2.919,43	90%	2.627,49
Anexo 18	ARRANQUE COLUMNAS ZONA AULAS	7.463,74	7.463,74	100%	7.463,7			0,00
Anexo 19	ARANQUE COLUMNAS ZONA AULAS	20.490,35	20.490,35	100%	20.490,4			0,00
Anexo 20	ADICIONAL - DETALLES DE PEDESTALES AULAS Y PATI	1.632,77			0,0	1.632,77	100%	1.632,77
Anexo 21	REFUERZO INFERIOR ZONA DADO	701,25	701,25	100%	701,3			0,00
Anexo 22	PEDESTAL ESCALERA/ VIGA BORDE PLACA EN ZONA AU	451,24			0,0	451,24	100%	451,24
Anexo 23	COMPLETE DE ARRANQUE DE COLUMNAS ZONA AULAS	183,95	183,95	100%	184,0			0,00
Anexo 24	REFUERZO TANQUES Y POZOS SOTANO	16.989,55			0,0	16.989,55	100%	16.989,55
Anexo 25	LOSA SUPRESION SOTANO / RAMPA	30.735,20	30.735,20	100%	30.735,2			0,00
Anexo 26	ESCALERA SOTANO A N1 EN EJE G11	179,69			0,0	179,69	100%	179,69
Anexo 27	VIGAS 2 NIVEL2 LUDOTECA	2.983,51			0,0	2.983,51	95%	2.834,33
Anexo 28	2do PEDIDO DE COLUMNAS AULAS	46.724,52			0,0	46.724,52	100%	46.724,52
Anexo 29	PANTALLAS AULAS 2 PEDIDO DEL2AL5 PISO	65.527,02			0,0	65.527,02	100%	65.527,02
Anexo 30	PLACA PISO 2 ZONA COMEDOR	9.553,10			0,0	9.553,10	100%	9.553,10
Anexo 31	PLACA PISO 2 ZONA AULAS	41.653,56			0,0	41.653,56	100%	41.653,56
Anexo 32	columnas comedor 2 pedido	12.799,00			0,0	12.799,00	100%	12.799,00
Anexo 33	Placa zona Aulas 3er piso	43.702,25			0,0	43.702,25	100%	43.702,25
Anexo 34	PANTALLAS COMEDOR 2 PEDIDO DEL2 AL 5 PISO	65.527,02			0,0	65.527,02	100%	65.527,02
Anexo 35	Placa zona Aulas 4to piso - eje 1-9	41.186,13			0,0	41.186,13	100%	41.186,13
Anexo 36	Pedido pantallas piso 1 zona comedor.	6.274,35			0,0	6.274,35	100%	6.274,35
Anexo 37	Placa 3er piso zona comedor	15.913,01			0,0	15.913,01	100%	15.913,01
Anexo 38	Rampa vehicular	2.233,96			0,0	2.233,96	100%	2.233,96
Anexo 39	Placa 3er piso zona Ludoteca	11.981,13			0,0	11.981,13	100%	11.981,13
Anexo 40	Placa 5to piso	52.037,21			0,0	52.037,21	100%	52.037,21
Anexo 41	Escaleras	7.222,84			0,0	7.222,84	100%	7.222,84
Anexo 42	Dinteles concreto	839,19				839,19	100%	839,19
Anexo 43	Bancas concreto	408,89				408,89	100%	408,89
Anexo 44	VIGAS NIVEL 5A ZONA AULAS	32.852,34				32.852,34	95%	31.209,73
Anexo 45	Dinteles comedor nivel 3a	3.225,05				3.225,05	95%	3.063,80
Anexo 46	Placa Nivel. 6	34.064,90				34.064,90	60%	20.438,94
Anexo 47	Complemento columnas piso 5.-6	10.783,57				10.783,57	80%	8.626,86
Anexo 48	Complemento pantallas a cubuierta	9.685,65				9.685,65	90%	8.717,09

TOTAL PESO CARTILLAS	994.982,41	432.384,50	432.384,50	562.597,93	543.601,71
TOTAL PAGADO ACTAS ANTERIORES			-432.384,50		-491.270,59
TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA			**0,00**		**52.331,12**

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 V 200-216

VIGAS NIVEL 1 ZONA COMEDOR - AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **8.945,87**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDA DE ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V200 40*65	11-12-13-14	1			3	6		0,25	9,4	9,15		9,4	2,25	63,45	503,08
					3	6			7,5	7,5		7,5	2,25	50,63	
					3	6			11,7	11,45	0,25	11,7	2,25	78,98	
					1	6		0,25	6,3	6,05		6,3	2,25	14,18	
					1	6			8,3	8,3		8,3	2,25	18,68	
					1	6			8	8		8	2,25	18,00	
					1	6			7,6	7,35	0,25	7,6	2,25	17,10	
					2	6		0,25	5,1	4,85		5,1	2,25	22,95	
					2	6			8,2	8,2		8,2	2,25	36,90	
					2	6			8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
					2	6			8,6	8,35	0,25	8,6	2,25	38,70	
					1	4			0,84	0,84		0,84	1	0,84	
				ESTRIBOS	95	3	G= 0.10 0.57 0.32	0,1	1,98	1,58	0,3	1,98	0,56	105,34	
V201 30*65 40*65	11-12-13-14	1			3	6		0,25	5,7	5,2	0,25	5,7	2,25	38,48	984,85
					3	7		0,3	2,8	2,5		2,8	3,06	25,70	
					3	8			4	4		4	4	48,00	
					3	8			4	4		4	4	48,00	
					3	7			3	2,7	0,3	3	3,06	27,54	
					3	7		0,3	4,4	4,1		4,4	3,06	40,39	
					3	7			8,1	8,1		8,1	3,06	74,36	
					3	7			12	11,7	0,3	12	3,06	110,16	
					2	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	22,40	
					2	8			4	4		4	4	32,00	
					2	8			4	4		4	4	32,00	
					3	7			3	2,7	0,3	3	3,06	27,54	
					3	6		0,25	5,7	5,2	0,25	5,7	2,25	38,48	
					1	7		0,3	9,6	9,3		9,6	3,06	29,38	
					1	6			8,2	8,2		8,2	2,25	18,45	
					1	6			7,4	7,15	0,25	7,4	2,25	16,65	
					2	7		0,3	7	6,7		7	3,06	42,84	
					2	7			8,6	8,6		8,6	3,06	52,63	
					2	8			10,3	9,95	0,35	10,3	4	82,40	
					17	3	G= 0.10 0.57 0.22	0,1	1,78	1,58	0,1	1,78	0,56	16,95	
				ESTRIBOS	125	3	G= 0.10 0.57 0.32	0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	138,60	

CONSORCIO URBANOVA SED























CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 V 200-216

VIGAS NIVEL 1 ZONA COMEDOR - AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **8.945,87**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDA DE ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
					44	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	18,97	
					28	2		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,25	2,94	
V201A 40*65	11	1			4	7		0,3	2,6	2	0,3	2,6	3,06	31,82	77,95
					4	7		0,3	2,5	1,9	0,3	2,5	3,06	30,60	
				ESTRIBOS	14	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	15,52	
V202 40*65	11-12-13-14	1			3	7		0,3	11,6	11,3		11,6	3,06	106,49	642,92
					3	7			8,1	8,1		8,1	3,06	74,36	
					3	7			4,7	4,4	0,3	4,7	3,06	43,15	
					2	8		0,3	2,5	2,2		2,5	4	20,00	
					3	8			3,5	3,5		3,5	4	42,00	
					3	7			3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
					2	8			2,5	2,15	0,35	2,5	4	20,00	
					1	7		0,3	9,6	9,3		9,6	3,06	29,38	
					1	7			8,6	8,6		8,6	3,06	26,32	
					1	7			7,4	7,1	0,3	7,4	3,06	22,64	
					2	6		0,25	7,1	6,85		7,1	2,25	31,95	
					2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
					2	6			9,5	9,25	0,25	9,5	2,25	42,75	
				ESTRIBOS	104	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	115,32	
V203 40*65	11-12-13-14	1			3	7		0,3	11,6	11,3		11,6	3,06	106,49	574,06
					3	7			8,1	8,1		8,1	3,06	74,36	
					3	7			4,7	4,4	0,3	4,7	3,06	43,15	
					2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,30	
					3	7			3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
					2	8			3,5	3,5		3,5	4	28,00	
					2	7			2,5	2,2	0,3	2,5	3,06	15,30	
					1	7		0,3	9,6	9,3		9,6	3,06	29,38	
					1	7			8,5	8,5		8,5	3,06	26,01	
					1	7			7,5	7,2	0,3	7,5	3,06	22,95	
					2	6		0,25	7,1	6,85		7,1	2,25	31,95	
					2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
					2	6			9,5	9,25	0,25	9,5	2,25	42,75	
				ESTRIBOS	63	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	69,85	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 V 200-216

VIGAS NIVEL 1 ZONA COMEDOR - AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **8.945,87**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDA DE ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V204 40*65	11-12-13-14	1			3	7		0,3	11,6	11,3		11,6	3,06	106,49	655,95
					3	7			8,1	8,1		8,1	3,06	74,36	
					3	7			4,7	4,4	0,3	4,7	3,06	43,15	
					2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,30	
					2	7			3,5	3,5		3,5	3,06	21,42	
					3	8			4	4		4	4	48,00	
					3	8			2,5	2,15	0,35	2,5	4	30,00	
					1	8		0,35	9,9	9,55		9,9	4	39,60	
					1	7			8,5	8,5		8,5	3,06	26,01	
					1	7			7,5	7,2	0,3	7,5	3,06	22,95	
					2	6		0,25	7,1	6,85		7,1	2,25	31,95	
					2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
					2	6			9,5	9,25	0,25	9,5	2,25	42,75	
				ESTRIBOS	106	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	117,53	
V205 40*65	13-14	1			3	6		0,25	8,7	8,45		8,7	2,25	58,73	249,02
					3	6			4,7	4,45	0,25	4,7	2,25	31,73	
					1	6		0,25	6	5,75		6	2,25	13,50	
					1	6			7,8	7,55	0,25	7,8	2,25	17,55	
					2	6		0,25	11,7	11,45		11,7	2,25	52,65	
					2	6			2,1	1,85	0,25	2,1	2,25	9,45	
				ESTRIBOS	59	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	65,42	
V206 40*65	D-E-F-G	1			3	6		0,25	8,4	8,15		8,4	2,25	56,70	522,65
					3	6			7,9	7,9		7,9	2,25	53,33	
					3	6			8,3	8,3		8,3	2,25	56,03	
					3	6			5,8	5,55	0,25	5,8	2,25	39,15	
					2	4			3	3		3	1	6,00	
					1	6		0,25	5,7	5,45		5,7	2,25	12,83	
					1	6			8,5	8,5		8,5	2,25	19,13	
					1	6			8,6	8,6		8,6	2,25	19,35	
					1	6			8,5	8,25	0,25	8,5	2,25	19,13	
					2	6		0,25	11,1	10,85		11,1	2,25	49,95	
					2	6			8,6	8,6		8,6	2,25	38,70	
					2	6			10,7	10,45	0,25	10,7	2,25	48,15	
				ESTRIBOS	94	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	104,23	
					3	7		0,3	4,6	4,3		4,6	3,06	42,23	
					3	7			8,6	8,6		8,6	3,06	78,95	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 V 200-216

VIGAS NIVEL 1 ZONA COMEDOR - AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **8.945,87**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDA DE ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V207 40*65	D-E-F-G	1			3	7	B		8,2	8,2		8,2	3,06	75,28	724,73
					3	7	B C		5,9	5,6	0,3	5,9	3,06	54,16	
					2	7	A B	0,3	2	1,7		2	3,06	12,24	
					3	7	B		3	3		3	3,06	27,54	
					3	8	B		3,5	3,5		3,5	4	42,00	
					3	8	B C		3	2,65	0,35	3	4	36,00	
					1	7	A B	0,3	7,6	7,3		7,6	3,06	23,26	
					1	7	B		9,2	9,2		9,2	3,06	28,15	
					1	7	B C		11	10,7	0,3	11	3,06	33,66	
					2	6	A B	0,25	9,2	8,95		9,2	2,25	41,40	
					2	6	B		9,3	9,3		9,3	2,25	41,85	
					2	7	B C		8,8	8,5	0,3	8,8	3,06	53,86	
				ESTRIBOS	121	3	G= 0.10 / 0.57 / 0.32	0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	134,16	
V208 40*65	D-E-F-G	1			3	6	A B	0,25	4,5	4,25		4,5	2,25	30,38	701,60
					3	7	B		8,7	8,7		8,7	3,06	79,87	
					3	7	B		8,2	8,2		8,2	3,06	75,28	
					3	7	B C		5,9	5,6	0,3	5,9	3,06	54,16	
					2	8	A B	0,35	2,5	2,15		2,5	4	20,00	
					3	7	B		3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
					3	8	B		3,5	3,5		3,5	4	42,00	
					3	8	B C		3	2,65	0,35	3	4	36,00	
					1	6	A B	0,25	7,5	7,25		7,5	2,25	16,88	
					1	6	B		8,9	8,9		8,9	2,25	20,03	
					1	6	B C		10,5	10,25	0,25	10,5	2,25	23,63	
					2	6	A B	0,25	9,4	9,15		9,4	2,25	42,30	
					2	6	B		9,1	9,1		9,1	2,25	40,95	
					2	7	B C		8,8	8,5	0,3	8,8	3,06	53,86	
				ESTRIBOS	121	3	G= 0.10 / 0.57 / 0.32	0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	134,16	
V208A 20*65	D	1			2	6	A C	0,25	4,65	4,15	0,25	4,65	2,25	20,93	53,93
					2	6	A B C	0,25	4,65	4,15	0,25	4,65	2,25	20,93	
				ESTRIBOS	13	3	G= 0.10 / 0.59 / 0.14	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	12,08	
					2	6	A C	0,25	2,64	2,14	0,25	2,64	2,25	11,88	
					2	6	A B C	0,25	2,64	2,14	0,25	2,64	2,25	11,88	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 V 200-216

VIGAS NIVEL 1 ZONA COMEDOR - AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **8.945,87**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDA DE ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V208B 20*65	13	1		ESTRIBOS	7	3	G= 0.10 / 0.59 / 0.14	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	6,51	30,27
V209 40*65	D-E-F-G	1			3	6	A B	0,25	9	8,75		9	2,25	60,75	616,79
					3	6	B		8	8		8	2,25	54,00	
					3	6	B		8,3	8,3		8,3	2,25	56,03	
					3	6	B C		11	10,75	0,25	11	2,25	74,25	
					1	6	A B	0,25	6,5	6,25		6,5	2,25	14,63	
					1	6	B		8,5	8,5		8,5	2,25	19,13	
					1	6	B		8,6	8,6		8,6	2,25	19,35	
					1	6	B		8,4	8,4		8,4	2,25	18,90	
					1	6	B C		6,1	5,85	0,25	6,1	2,25	13,73	
					2	6	A B	0,25	11,7	11,45		11,7	2,25	52,65	
					2	6	B		8,6	8,6		8,6	2,25	38,70	
					2	6	B		8,5	8,5		8,5	2,25	38,25	
					2	6	B C		8,4	8,15	0,25	8,4	2,25	37,80	
				ESTRIBOS	107	3	G= 0.10 / 0.57 / 0.32	0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	118,64	
V210 30*65	G	1			2	7	A B C	0,3	6,39	5,79	0,3	6,39	3,06	39,11	97,15
					2	7	A B C	0,3	6,39	5,79	0,3	6,39	3,06	39,11	
				ESTRIBOS	19	3	G= 0.10 / 0.57 / 0.22	0,1	1,78	1,58	0,1	1,78	0,56	18,94	
V211 45*65	11--12	1			3	8	A B C	0,35	8,2	7,5	0,35	8,2	4	98,40	864,73
					2	8	B		4	4		4	4	32,00	
					2	7	B		3,5	3,5		3,5	3,06	21,42	
					3	8	A B C	0,35	8,2	7,5	0,35	8,2	4	98,40	
				ESTRIBOS	18	3	G= 0.10 / 0.57 / 0.37	0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	20,97	
					18	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	7,76	
					18	4	G= 0.12 / 0.57 / 0.37	0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	38,16	
					18	4		0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	14,58	
					12	7	B		6	6		6	3,06	220,32	

CONSORCIO URBANOVA SED









CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 V 200-216

VIGAS NIVEL 1 ZONA COMEDOR - AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **8.945,87**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDA DE ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				DETALLE VIGA DE ACOPLE	33	4		0,15	1,4	1,1	0,15	1,4	1	46,20	
					12	7			6	6		6	3,06	220,32	
					33	4		0,15	1,4	1,1	0,15	1,4	1	46,20	
V212 45*65	11--12	1			3	8		0,35	8,2	7,5	0,35	8,2	4	98,40	856,60
					2	7			3,8	3,8		3,8	3,06	23,26	
					2	7			3,6	3,6		3,6	3,06	22,03	
					3	8		0,35	8,2	7,5	0,35	8,2	4	98,40	
				ESTRIBOS	18	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	20,97	
					18	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	7,76	
					18	4		0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	38,16	
					18	4		0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	14,58	
				DETALLE VIGA DE ACOPLE	12	7			6	6		6	3,06	220,32	
					33	4		0,15	1,4	1,1	0,15	1,4	1	46,20	
					12	7			6	6		6	3,06	220,32	
					33	4		0,15	1,4	1,1	0,15	1,4	1	46,20	
V213 40*65	11--12	1			3	6		0,25	8	7,5	0,25	8	2,25	54,00	133,50
					3	6		0,25	8	7,5	0,25	8	2,25	54,00	
				ESTRIBOS	23	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	25,50	
V214 40*65	A-B	1			3	6		0,25	6,9	6,65		6,9	2,25	46,58	234,60
					3	6			6,7	6,45	0,25	6,7	2,25	45,23	
					3	6		0,25	6,9	6,65		6,9	2,25	46,58	
					3	6			6,7	6,45	0,25	6,7	2,25	45,23	

CONSORCIO URBANOVA SED









CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 V 200-216

VIGAS NIVEL 1 ZONA COMEDOR - AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **8.945,87**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDA DE ELEMENTO	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				ESTRIBOS	46	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	51,00	
V215 40*65	A-B	1			3	6		0,25	6,7	6,45		6,7	2,25	45,23	226,60
					3	6			6,7	6,45	0,25	6,7	2,25	45,23	
					1	6		0,25	3,8	3,55		3,8	2,25	8,55	
					1	6			9,8	9,55	0,25	9,8	2,25	22,05	
					2	6		0,25	9,9	9,65		9,9	2,25	44,55	
					2	6			3,7	3,45	0,25	3,7	2,25	16,65	
				ESTRIBOS	40	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	44,35	
V216 40*65	11--12	1			3	6		0,25	10,41	9,91	0,25	10,41	2,25	70,27	194,87
					3	6		0,25	10,41	9,91	0,25	10,41	2,25	70,27	
				ESTRIBOS	49	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	54,33	

TOTAL ACERO	8.945,87

CONSORCIO URBANOVA SED


CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 - E312 VC 217- VC230 VL 100- VL 103

VIGAS NIVEL 1 ZONA AULAS - LUDOTECA

ACERO

TOTAL EJECUTADO **10603,22**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VC217 40*60	1'-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	1		2	4		0,2	2,8	2,6		2,8	1	5,6	2002,928
				5	6			4	4		4	2,25	45	
				5	5			5	5		5	1,56	39	
				2	4			3	3		3	1	6	
				5	5			4	4		4	1,56	31,2	
				5	5		0,25	3,3	3,05		3,3	1,56	25,74	
				5	5			10,2	10,2		10,2	1,56	79,56	
				5	5			12	12		12	1,56	93,6	
				5	5			8	8		8	1,56	62,4	
				5	5			7,9	7,9		7,9	1,56	61,62	
				5	5			7,6	7,6		7,6	1,56	59,28	
				5	5			8,2	8,2		8,2	1,56	63,96	
				5	5			10,5	10,5		10,5	1,56	81,9	
				5	5			10,1	9,85	0,25	10,1	1,56	78,78	
				5	5		0,25	5,2	4,95		5,2	1,56	40,56	
				5	5			6	6		6	1,56	46,8	
				5	5			10,7	10,7		10,7	1,56	83,46	
				5	5			6,8	6,8		6,8	1,56	53,04	
				5	5			8	8		8	1,56	62,4	
				5	5			7,8	7,8		7,8	1,56	60,84	
				5	5			7,1	7,1		7,1	1,56	55,38	
				5	5			8,9	8,9		8,9	1,56	69,42	
				5	5			12	12		12	1,56	93,6	
				5	5			6,1	5,85	0,25	6,1	1,56	47,58	
			ESTRIBOS	651	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	656,208	
VC218 40*60	12-13-14	1		5	5		0,25	10,4	10,15		10,4	1,56	81,12	352,824
				5	5			5,5	5,25	0,25	5,5	1,56	42,9	
				2	4		0,2	1,5	1,3		1,5	1	3	
				2	4		0,2	1,5	1,3		1,5	1	3	
				5	5		0,25	5,4	5,15		5,4	1,56	42,12	
				5	5			10,5	10,25	0,25	10,5	1,56	81,9	
			ESTRIBOS	98	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	98,784	
				5	5			7	7		7	1,56	54,6	
				2	4			3	3		3	1	6	
				5	6			3	3		3	2,25	33,75	
				5	5		0,25	8,5	8,25		8,5	1,56	66,3	
				5	5			6,5	6,5		6,5	1,56	50,7	
				5	5			8,5	8,5		8,5	1,56	66,3	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 - E312 VC 217- VC230 VL 100- VL 103

VIGAS NIVEL 1 ZONA AULAS - LUDOTECA

ACERO

TOTAL EJECUTADO **10603,22**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VC219 40*60	1-1'-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	1		5	5	B		9,8	9,8		9,8	1,56	76,44	2300,258
				5	5	B		7	7		7	1,56	54,6	
				5	5	B		7,7	7,7		7,7	1,56	60,06	
				5	5	B		7,4	7,4		7,4	1,56	57,72	
				5	5	B		8,7	8,7		8,7	1,56	67,86	
				5	5	B		12	12		12	1,56	93,6	
				5	5	B C		6,2	5,95	0,25	6,2	1,56	48,36	
				2	4	B		2	2		2	1	4	
				3	5	B		6,5	6,5		6,5	1,56	30,42	
				4	5	B		6,5	6,5		6,5	1,56	40,56	
				5	5	B		3	3		3	1,56	23,4	
				2	4	B C		2	1,8	0,2	2	1	4	
				5	5	B		3	3		3	1,56	23,4	
				4	5	B		6,5	6,5		6,5	1,56	40,56	
				2	4	B		3	3		3	1	6	
				4	5	B		6,5	6,5		6,5	1,56	40,56	
				2	5	B		3	3		3	1,56	9,36	
				5	5	B		3	3		3	1,56	23,4	
				5	5	A B	0,25	6,3	6,05		6,3	1,56	49,14	
				5	5	B		7,2	7,2		7,2	1,56	56,16	
				5	5	B		8,3	8,3		8,3	1,56	64,74	
				5	5	B		8,1	8,1		8,1	1,56	63,18	
				5	5	B		8,2	8,2		8,2	1,56	63,96	
				5	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	60,84	
				5	5	B		7,5	7,5		7,5	1,56	58,5	
				5	5	B		8,4	8,4		8,4	1,56	65,52	
				5	5	B		10,4	10,4		10,4	1,56	81,12	
				5	5	B C		10,1	9,85	0,25	10,1	1,56	78,78	
			ESTRIBOS	671	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	676,368	
VC220 40*60	12-13-14	1		5	5	A B	0,25	10,5	10,25		10,5	1,56	81,9	363,688
				5	5	B C		5,5	5,25	0,25	5,5	1,56	42,9	
				2	4	A B	0,2	1,5	1,3		1,5	1	3	
				2	4	B		3,5	3,5		3,5	1	7	
				2	5	B C		1,5	1,25	0,25	1,5	1,56	4,68	
				2	4	A B	0,2	1,5	1,3		1,5	1	3	
				2	5	B C		1,5	1,25	0,25	1,5	1,56	4,68	
				5	5	A B	0,25	5,6	5,35		5,6	1,56	43,68	
				5	5	B C		10,4	10,15	0,25	10,4	1,56	81,12	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:
COTRATO No:

CONSORCIO URBANOVA SED
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 - E312 VC 217- VC230 VL 100- VL 103

VIGAS NIVEL 1 ZONA AULAS - LUDOTECA

ACERO

TOTAL EJECUTADO **10603,22**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	91	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	91,728	
VC221 40*60	A-B	1		5	5		0,25	10,31	9,81	0,25	10,31	1,56	80,418	243,636
				5	5		0,25	10,31	9,81	0,25	10,31	1,56	80,418	
			ESTRIBOS	45	4		0,12	1,84	1,6	0,12	1,84	1	82,8	
VC222 40*60	A-B	1		5	5		0,25	6,9	6,65		6,9	1,56	53,82	270,072
				5	5			6,6	6,35	0,25	6,6	1,56	51,48	
				5	5		0,25	4,1	3,85		4,1	1,56	31,98	
				5	5			9,4	9,15	0,25	9,4	1,56	73,32	
			ESTRIBOS	59	3		0,1	1,8	0,7	1	1,8	0,56	59,472	
VC223 40*60	A-B	1		5	5		0,25	6,9	6,65		6,9	1,56	53,82	273,064
				5	5			6,6	6,35	0,25	6,6	1,56	51,48	
				2	4		0,2	2	1,8		2	1	4	
				5	5		0,25	4,1	3,85		4,1	1,56	31,98	
				5	5			9,4	9,15	0,25	9,4	1,56	73,32	
			ESTRIBOS	58	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	58,464	
VC224 40*60	A-B	1		5	5		0,25	6,9	6,65		6,9	1,56	53,82	273,064
				5	5			6,6	6,35	0,25	6,6	1,56	51,48	
				2	4		0,2	2	1,8		2	1	4	
				5	5		0,25	4,1	3,85		4,1	1,56	31,98	
				5	5			9,4	9,15	0,25	9,4	1,56	73,32	
			ESTRIBOS	58	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	58,464	
VC225 40*60	A-B	1		5	5		0,25	6,9	6,65		6,9	1,56	53,82	278,296
				5	5			6,6	6,35	0,25	6,6	1,56	51,48	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				2	4			2	1,8	0,2	2	1	4	
				5	5		0,25	4,1	3,85		4,1	1,56	31,98	
				5	5			9,4	9,15	0,25	9,4	1,56	73,32	
			ESTRIBOS	57	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	57,456	
VC226 40*60	A-B	1		5	5		0,25	6,9	6,65		6,9	1,56	53,82	335,16
				5	5			6,6	6,35	0,25	6,6	1,56	51,48	
				4	5			5,7	5,7		5,7	1,56	35,568	
				4	5			5,7	5,7		5,7	1,56	35,568	
				5	5		0,25	4,1	3,85		4,1	1,56	31,98	
				5	5			9,4	9,15	0,25	9,4	1,56	73,32	
			ESTRIBOS	53	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	53,424	

CONSORCIO URBANOVA SED






CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 - E312 VC 217- VC230 VL 100- VL 103

VIGAS NIVEL 1 ZONA AULAS - LUDOTECA

ACERO

TOTAL EJECUTADO **10603,22**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VC227 40*60	A-B	1		5	5		0,25	6,9	6,65		6,9	1,56	53,82	347,52
				5	5			6,6	6,35	0,25	6,6	1,56	51,48	
				4	5		0,25	3,8	3,55		3,8	1,56	23,712	
				4	5			4,5	4,5		4,5	1,56	28,08	
				4	5		0,25	3,8	3,55		3,8	1,56	23,712	
				2	4			4,5	4,5		4,5	1	9	
				5	5		0,25	4,1	3,85		4,1	1,56	31,98	
				5	5			9,4	9,15	0,25	9,4	1,56	73,32	
			ESTRIBOS	52	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	52,416	
VC227A 40*60	A-B	1		3	6		0,25	4,2	3,95		4,2	2,25	28,35	203,2456
				3	6			6,7	6,45	0,25	6,7	2,25	45,225	
				1	6		0,25	1,6	1,35		1,6	2,25	3,6	
				1	6			9,5	9,25	0,25	9,5	2,25	21,375	
				2	6		0,25	9,5	9,25		9,5	2,25	42,75	
				2	6			1,6	1,35	0,25	1,6	2,25	7,2	
			ESTRIBOS	52	3		0,1	1,88	1,68	0,1	1,88	0,56	54,7456	
VC228 40*60	A-B	1		5	5		0,25	6,9	6,65		6,9	1,56	53,82	263,636
				5	5			4,1	3,85	0,25	4,1	1,56	31,98	
				4	5		0,25	3,3	3,05		3,3	1,56	20,592	
				2	5			3,3	3,05	0,25	3,3	1,56	10,296	
				2	5		0,25	3,3	3,05		3,3	1,56	10,296	
				2	4			3,25	3,05	0,2	3,25	1	6,5	
				5	5		0,25	4,1	3,85		4,1	1,56	31,98	
				5	5			6,9	6,65	0,25	6,9	1,56	53,82	
			ESTRIBOS	44	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	44,352	
VC229 40*60	D-E-F-G	1		5	5		0,25	6,9	6,65		6,9	1,56	53,82	296,604
				5	5			4,1	3,85	0,25	4,1	1,56	31,98	
				5	5		0,25	3,8	3,55		3,8	1,56	29,64	
				5	5			3,8	3,55	0,25	3,8	1,56	29,64	
				5	5		0,25	3,8	3,55		3,8	1,56	29,64	
				4	5			3,8	3,55	0,25	3,8	1,56	23,712	
				5	5		0,25	4,1	3,85		4,1		0	
				5	5			6,9	6,65	0,25	6,9	1,56	53,82	
			ESTRIBOS	44	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	44,352	
				5	5		0,25	9,4	9,15		9,4	1,56	73,32	
				5	5			11	11		11	1,56	85,8	
				5	5			7,4	7,4		7,4	1,56	57,72	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 - E312 VC 217- VC230 VL 100- VL 103

VIGAS NIVEL 1 ZONA AULAS - LUDOTECA

ACERO

TOTAL EJECUTADO **10603,22**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VC230 40*60	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	1		5	5			7	7		7	1,56	54,6	1910,964
				5	5			7,7	7,7		7,7	1,56	60,06	
				5	5			7,9	7,9		7,9	1,56	61,62	
				5	5			8,4	8,4		8,4	1,56	65,52	
				5	5			12	12		12	1,56	93,6	
				5	5			5,9	5,65	0,25	5,9	1,56	46,02	
				5	5		0,25	4,2	3,95		4,2	1,56	32,76	
				5	5			11,9	11,9		11,9	1,56	92,82	
				5	5			10,6	10,6		10,6	1,56	82,68	
				5	5			5,8	5,8		5,8	1,56	45,24	
				5	5			7,9	7,9		7,9	1,56	61,62	
				5	5			8	8		8	1,56	62,4	
				5	5			7,9	7,9		7,9	1,56	61,62	
				5	5			10,3	10,3		10,3	1,56	80,34	
				5	5			10,2	9,95	0,25	10,2	1,56	79,56	
			ESTRIBOS	708	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	713,664	
VIGAS VL - LUDOTECA														
VL100 40*60	1A-3	1		3	6		0,25	7,48	6,98	0,25	7,48	2,25	50,49	161,964
				2	6		0,25	2	1,75		2	2,25	9	
				2	5			2	1,75	0,25	2	1,56	6,24	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				2	5			2	1,75	0,25	2	1,56	6,24	
				3	6		0,25	7,48	6,98	0,25	7,48	2,25	50,49	
			ESTRIBOS	33	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	33,264	
VL101 40*60	1A-3	1		3	6		0,25	10,57	10,07	0,25	10,57	2,25	71,3475	241,047
				3	6		0,25	2	1,75		2	2,25	13,5	
				3	6			2	1,75	0,25	2	2,25	13,5	
				3	6		0,25	2	1,75		2	2,25	13,5	
				3	6			2	1,75	0,25	2	2,25	13,5	
				3	6		0,25	10,57	10,07	0,25	10,57	2,25	71,3475	
			ESTRIBOS	44	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	44,352	
VL102 40*60	D1-E1	1		3	6		0,25	9,2	8,7	0,25	9,2	2,25	62,1	188,472
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				2	5			2	1,75	0,25	2	1,56	6,24	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				2	5			2	1,75	0,25	2	1,56	6,24	
				3	6		0,25	9,2	8,7	0,25	9,2	2,25	62,1	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:
COTRATO No:






CONSORCIO URBANOVA SED
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E311 - E312 VC 217- VC230 VL 100- VL 103

VIGAS NIVEL 1 ZONA AULAS - LUDOTECA

ACERO

TOTAL EJECUTADO **10603,22**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	39	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	39,312	
VL103 40*60	D1-E1	1		3	6		0,25	8,6	8,1	0,25	8,6	2,25	58,05	296,776
				2	4		0,2	2	1,8		2	1	4	
				2	4			2	1,8	0,2	2	1	4	
				11	4				11,58		11,58	1	127,38	
				2	4		0,2	2	1,8		2	1	4	
				2	4			2	1,8	0,2	2	1	4	
				3	6		0,25	8,6	8,1	0,25	8,6	2,25	58,05	
			ESTRIBOS	37	3		0,1	1,8	1,6	0,1	1,8	0,56	37,296	

TOTAL ACERO	**10603,22**

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:
COTRATO No:






















CONSORCIO URBANOVA SED
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E313 VT 200- 206 VT 207-214

VIGUETAS NIVEL 1 COMEDOR / VIGUETAS NIVEL 1 AULAS /

ACERO

TOTAL EJECUTADO **3697,95**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT200 20*65	11-12-13-14	1		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	52,20	315,6716
				2	6			11,5	11,25	0,25	11,5	2,25	51,75	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	4			3	3		3	1	6,00	
				2	4			3	3		3	1	6,00	
				2	6		0,25	7	6,75		7	2,25	31,50	
				2	6			8,6	8,6		8,6	2,25	38,70	
				2	6			8,7	8,45	0,25	8,7	2,25	39,15	
			ESTRIBOS	71	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	66,00	
			REF SEGUNDA FILA	22	2		0,1	0,34	0,14	0,1	0,34	0,25	1,87	
VT201 25*65	12--13	1		3	5		0,25	8,45	7,95	0,25	8,45	1,56	39,55	220,6301
				3	7			3,2	3,2		3,2	3,06	29,38	
				2	6			4,8	4,8		4,8	2,25	21,60	
				3	8		0,35	8,65	7,95	0,35	8,65	4	103,80	
			ESTRIBOS	26	3		0,1	1,76	1,56	0,1	1,76	0,56	25,63	
			REF SEGUNDA FILA	7	2		0,1	0,39	0,19	0,1	0,39	0,25	0,68	
VT202 20*65	11-12-13-14	2		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	104,40	683,23
				2	6			11,5	11,25	0,25	11,5	2,25	103,50	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	22,50	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	22,50	
				2	4			3	3		3	1	12,00	
				2	4			3	3		3	1	12,00	
				2	6		0,25	7	6,75		7	2,25	63,00	
				2	6			8,6	8,6		8,6	2,25	77,40	
				2	6			8,7	8,45	0,25	8,7	2,25	78,30	
				3	4			8,6	8,648		8,648	1	51,89	
			ESTRIBOS	71	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	132,00	
			REF SEGUNDA FILA	22	2		0,1	0,34	0,14	0,1	0,34	0,25	3,74	
				2	6		0,25	4,8	4,55		4,8	2,25	21,60	
				2	6			8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
				2	6			8,2	8,2		8,2	2,25	36,90	
				2	6			5,6	5,35	0,25	5,6	2,25	25,20	
				2	7			3	3		3	3,06	18,36	
				2	7			3	3		3	3,06	18,36	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E313 VT 200- 206 VT 207-214

VIGUETAS NIVEL 1 COMEDOR / VIGUETAS NIVEL 1 AULAS /

ACERO

TOTAL EJECUTADO **3697,95**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT203 20*65	D-E-F-G	1		2	6	B		3,8	3,8		3,8	2,25	17,10	384,74
				2	5	B		3,6	3,6		3,6	1,56	11,23	
				2	6	A B	0,25	7,5	7,25		7,5	2,25	33,75	
				2	6	B		8,9	8,9		8,9	2,25	40,05	
				2	6	B C		10,5	10,25	0,25	10,5	2,25	47,25	
			ESTRIBOS	81	3	G= 0.10 0.30 0.24	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	75,30	
			REF SEGUNDA FILA	27	2	X .10 .10	0,1	0,34	0,14	0,1	0,34	0,25	2,30	
VT204 20*65	D-E-F	1		2	6	A B	0,25	4,5	4,25		4,5	2,25	20,25	325,43
				2	7	B		8,1	8,1		8,1	3,06	49,57	
				2	6	B C		11,2	10,95	0,25	11,2	2,25	50,40	
				2	6	B		2,6	2,6		2,6	2,25	11,70	
				2	5	B		2	2		2	1,56	6,24	
				2	5	B		3,5	3,5		3,5	1,56	10,92	
				2	6	A B	0,25	7,5	7,25		7,5	2,25	33,75	
				2	6	B		9	9		9	2,25	40,50	
				2	6	B C		7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65	
			ESTRIBOS	71	3	G= 0.10 0.30 0.24	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	66,00	
			REF SEGUNDA FILA	17	2	X .10 .10	0,1	0,34	0,14	0,1	0,34	0,25	1,45	
VT205 20*65	D-E-F-G	1		2	6	A B	0,25	9	8,75		9	2,25	40,50	423,19
				2	6	B		8,4	8,4		8,4	2,25	37,80	
				2	7	B		8,1	8,1		8,1	3,06	49,57	
				2	6	B C		5,9	5,65	0,25	5,9	2,25	26,55	
				2	4	B		2	2		2	1	4,00	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	5	B		3,8	3,8		3,8	1,56	11,86	
				2	6	A B	0,25	11,8	11,55		11,8	2,25	53,10	
				2	6	B		8,9	8,9		8,9	2,25	40,05	
				2	6	B C		10,5	10,25	0,25	10,5	2,25	47,25	
			ESTRIBOS	95	3	G= 0.10 0.30 0.24	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	88,31	
			REF SEGUNDA FILA	20	2	X .10 .10	0,1	0,34	0,14	0,1	0,34	0,25	1,70	
				2	6	A B	0,25	9	8,75		9	2,25	40,50	
				2	6	B		8,4	8,4		8,4	2,25	37,80	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E313 VT 200- 206 VT 207-214

VIGUETAS NIVEL 1 COMEDOR / VIGUETAS NIVEL 1 AULAS /

ACERO

TOTAL EJECUTADO **3697,95**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT205A 20*65	D-E-F-G	1		2	7	B		8,1	8,1		8,1	3,06	49,57	420,39
				2	6	B C		4,9	4,65	0,25	4,9	2,25	22,05	
				2	4	B		2	2		2	1	4,00	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	7	B		2,5	2,5		2,5	3,06	15,30	
				2	6	B		4	4		4	2,25	18,00	
				2	6	A B	0,25	11,8	11,55		11,8	2,25	53,10	
				2	6	B		8,9	8,9		8,9	2,25	40,05	
				2	6	B C		9,4	9,15	0,25	9,4	2,25	42,30	
			ESTRIBOS	91	3	G= 0.10 0.52 P=1.14	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	84,59	
			REF SEGUNDA FILA	22	2	X .10 .10	0,1	0,34	0,14	0,1	0,34	0,25	1,87	
VT206 20*65	G	1		2	5	A B C	0,25	1,83	1,33	0,25	1,83	1,56	5,71	15,14
				2	5	A B C	0,25	1,83	1,33	0,25	1,83	1,56	5,71	
			ESTRIBOS	4	3	G= 0.10 0.52 P=1.14	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	3,72	
VT207 20*65	11	1		2	6	A B C	0,25	3,76	3,26	0,25	3,76	2,25	16,92	43,136
				2	6	A B C	0,25	3,76	3,26	0,25	3,76	2,25	16,92	
			ESTRIBOS	10	3	G= 0.10 0.52 P=1.14	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	9,30	
VT208 20*65	12	2		2	6	A B C	0,25	2,76	2,26	0,25	2,76	2,25	24,84	60,8352
				2	6	A B C	0,25	2,76	2,26	0,25	2,76	2,25	24,84	
			ESTRIBOS	6	3	G= 0.10 0.59 P=1.14	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	11,16	
VT209 20*65	12	1		2	6	A B C	0,25	4,84	4,34	0,25	4,84	2,25	21,78	55,64
				2	6	A B C	0,25	4,84	4,34	0,25	4,84	2,25	21,78	
			ESTRIBOS	13	3	G= 0.10 0.58 P=1.14	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	12,08	
VT210 20*65	A-B	2		2	6	A B	0,25	6,6	6,35		6,6	2,25	59,40	414,172
				2	6	B C		6,8	6,55	0,25	6,8	2,25	61,20	
				2	7	B		2,8	2,8		2,8	3,06	34,27	
				2	7	B		2,8	2,8		2,8	3,06	34,27	
				2	6	B		2,8	2,8		2,8	2,25	25,20	
				2	6	A B	0,25	11	10,75		11	2,25	99,00	
				2	6	B C		2,6	2,35	0,25	2,6	2,25	23,40	
			ESTRIBOS	40	3	G= 0.10 0.58 P=1.14	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	74,37	
			REF SEGUNDA FILA	18	2	X .10 .10	0,1	0,34	0,14	0,1	0,34	0,25	3,06	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA:
INTERVENTORIA:
COTRATO No:










CONSORCIO URBANOVA SED
LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E313 VT 200- 206 VT 207-214

VIGUETAS NIVEL 1 COMEDOR / VIGUETAS NIVEL 1 AULAS /

ACERO

TOTAL EJECUTADO **3697,95**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT211 20*65	B	1		2	6		0,25	2,85	2,35	0,25	2,85	2,25	12,83	33,9476
				2	6		0,25	2,85	2,35	0,25	2,85	2,25	12,83	
			ESTRIBOS	6	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	5,58	
			REF SEGUNDA FILA	16	2		0,1	0,34	0,14	0,1	0,34	0,25	2,72	
VT212 20*65		1		2	6		0,25	2,05	1,55	0,25	2,05	2,25	9,23	22,1684
				2	6		0,25	2,05	1,55	0,25	2,05	2,25	9,23	
			ESTRIBOS	4	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	3,72	
VT214 20*65	A-B	1		2	6		0,25	6,6	6,35		6,6	2,25	29,70	279,6268
				2	8			8	7,65	0,35	8	4	64,00	
				2	8			2,6	2,6		2,6	4	20,80	
				2	7			5,2	5,2		5,2	3,06	31,82	
				2	7		0,3	10,3	10		10,3	3,06	63,04	
				2	7			4,7	4,4	0,3	4,7	3,06	28,76	
			REF SEGUNDA FILA	18	2		0,1	0,34	0,14	0,1	0,34	0,25	1,53	
			ESTRIBOS	43	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	39,97	

TOTAL ACERO	**3697,95**

CONSORCIO URBANOVA SED





CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE E:300

COLUMNAS ZONA LUDOTECA

ACERO

TOTAL EJECUTADO **2919,43**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
CL1 d =0,50	E1-1A E1-3	2		8	5		0,25	2,85		3,1	1,56	77,376	1052,23
				8	6			7,6	0,25	7,85	2,25	282,6	
				7	6		0,25	6,9		7,15	2,25	225,225	
				7	6			3,55	0,25	3,8	2,25	119,7	
			ESTRIBOS	96	4		0,12	1,569	0,12	1,809	1	347,33	
CL2 d =0,50	D1-1A D1-3	2		7	7		0,3	3,15		3,45	3,06	147,798	1867,20
				7	8			7,85	0,35	8,2	4	459,2	
				4	8		0,35	7,95		8,3	4	265,6	
				4	8			3,05	0,35	3,4	4	108,8	
				4	8		0,35	8,15		8,5	4	272	
				4	10			3,2	0,45	3,65	6,4	186,88	
			ESTRIBOS	118	4		0,12	1,569	0,12	1,809	1	426,92	

TOTAL ACERO	2919,43







CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO E402A

PEDIDO 17 - ADICIONAL (DETALLES DE PEDESTALES AULAS Y PATIO)

ACERO TOTAL **1.632,77**

	Tipo	ejes	Cant	CANTIDA DE ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO No. Varilla	DIAGRAMA	GANCHO	L	GANCHO	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
PLANO E402A	DETALLE REMATE ENTRE ED AULAS Y PATIO ENTRE EJE 1 AL 3	1 AL 3	1	2	84	3		0,15	0,85		1	0,56	94,08	259,90
				1	84	3		0,95	0,3	0,2	1,45	0,56	68,21	
				1	84	3		0,95	0,3	0,2	1,45	0,56	68,21	
				1	15	3			3,5		3,5	0,56	29,40	
PLANO E402A	DETALLE REMATE ENTRE EDIFIO AULAS Y PATIO ENTRE EJE 3 AL 11	3 AL 11	1	1	255	3		0,15	0,85		1	0,56	142,80	1.173,34
				1	1	4			1,46		1,46	1	1,46	
				1	387	3		0,95	0,3	0,2	1,45	0,56	314,24	
				1	387	3		0,15	1,35		1,5	0,56	325,08	
				1	58	3			12		12	0,56	389,76	
PLANO E402A	DETALLE PEDESTAL EN LOS EJES REMATE ENTRE EDIFIO AULAS Y PATIO	3 AL 11	1	9	14	3		0,1	1,28	0,1	1,48	0,56	104,43	199,53
				9	14	3		0,1	0,32	0,1	0,52	0,56	36,69	
				9	6	5		0,1	0,32	0,1	0,52	1,56	43,80	
				9	2	5		0,1	0,32	0,1	0,52	1,56	14,60	

TOTAL ACERO **1.632,77**








CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO E103

PEDIDO 23 PEDESTAL ESCALERA/ VIGA BORDE PLACA EN ZONA AULAS

ACERO — TOTAL **451,24**

	Tipo	ejes	Cant	CANTIDA DE ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO No. Varilla	DIAGRAMA	GANCHO	L	GANCHO	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
PEDESTAL ESCALERA	PEDESTAL ESCALERA PLANO 407A	9B	1	2	8	6		0,25	1,09	0,25	1,59	2,25	57,24	76,95
			1	2	11	3		0,4	0,6	0,2	1,2	0,56	14,78	
			1	2	11	3		0,1	0,2	0,1	0,4	0,56	4,93	
VIGUETA DE BORDE PLACA DE CONTRAPISO	ESRIBOS DE VIGUETA DE BORDE PLACA	A-1 AL 14	1	1	356,0	3		0,15	0,32	0,15	0,62	0,56	123,60	374,29
	ESRIBOS DE VIGUETA DE BORDE PLACA	EJE B DEL 11 AL 12	1	1	37,0	3		0,15	0,32	0,15	0,62	0,56	12,85	
	CORRIDAS	A-1 AL 14	1	2	8	4	RECTA		12		12	1	192,00	
	CORRIDAS	A-1 AL 14	1	2	1	4			2,35	0,2	2,55	1	5,10	
	CORRIDAS	EJE BA 14	1	1	2	4			6,66	0,2	6,86	1	13,72	
	CORRIDAS	EJE BA 14	1	1	2	4			6	0,2	6,2	1	12,40	
	CORRIDAS	B 11AL112	1	1	2	4		0,2	6,91	0,2	7,31	1	14,62	

TOTAL ACERO	451,24

TOTAL ACERO	451,24

CONSORCIO URBANOVA SED












CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

PEDIDO 18 REFUERZO TANQUES Y POZOS SOTANO

ACERO

TOTAL EJECUTADO **16.989,55**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			14	4		0,2	5,35	4,95	0,2	5,35	1	74,90	
			14	4		0,2	5,3	4,9	0,2	5,3	1	74,20	
			14	4			7,8	7,8		7,8	1	109,20	
			14	4			11,1	11,1		11,1	1	155,40	
			14	4			3,7	3,7		3,7	1	51,80	
			14	4			6,4	6,4		6,4	1	89,60	
			14	4		0,2	4,6	4,4		4,6	1	64,40	
			14	4			8,05	7,85	0,2	8,05	1	112,70	
			14	4			2,45	2,45		2,45	1	34,30	
			14	4			2,55	2,55		2,55	1	35,70	
			14	4		0,2	4	3,8		4	1	56,00	
			14	4			1,75	1,75		1,75	1	24,50	
			14	4			7,65	7,65		7,65	1	107,10	
			14	4			7,35	7,35		7,35	1	102,90	
TANQUE 1	G-F	1	133	4		0,2	0,8	0,4	0,2	0,8	1	106,40	4.322,05
			259	4		0,2	3,85	3,45	0,2	3,85	1	997,15	
			152	4		0,6	3,75	2,95	0,2	3,75	1	570,00	

CONSORCIO URBANOVA SED








CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

PEDIDO 18 REFUERZO TANQUES Y POZOS SOTANO

ACERO

TOTAL EJECUTADO **16.989,55**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			182	4		0,2	1,2	0,8	0,2	1,2	1	218,40	
			44	4		0,2	1,7	1,5		1,7	1	74,80	
			39	4		0,25	2,3	2,05		2,3	1	89,70	
			34	4	RECTA		11,55	11,55		11,55	1	392,70	
			47	4			2,75	2,75		2,75	1	129,25	
			39	4			3,05	3,05		3,05	1	118,95	
			242	4			1,5	1,5		1,5	1	363,00	
			52	4	RECTA		3,25	3,25		3,25	1	169,00	
			14	4			10,45	10,45		10,45	1	146,30	
			14	4		0,2	5,4	5	0,2	5,4	1	75,60	
			14	4			2,05	2,05		2,05	1	28,70	
			14	4			11,5	11,5		11,5	1	161,00	
			87	4		0,2	2,9	2,5	0,2	2,9	1	252,30	
			14	4		0,2	5,25	4,85	0,2	5,25	1	73,50	
			14	4		2,3	10,15	7,85		10,15	1	142,10	
			15	4		1,45	4,65	3,2		4,65	1	69,75	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

PEDIDO 18 REFUERZO TANQUES Y POZOS SOTANO

ACERO

TOTAL EJECUTADO **16.989,55**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			68	4	10.75 .20		10,95	10,75	0,2	10,95	1	744,60	
			14	4	2.80		2,8	2,8		2,8	1	39,20	
			14	4	7.40		7,4	7,4		7,4	1	103,60	
			14	4	4.40 .20	0,2	4,6	4,4		4,6	1	64,40	
			14	4	1.40 .20 .25 .25 .20		2,3	2,3		2,3	1	32,20	
			14	4	.75 .20 .25 .20		1,4	1,4		1,4	1	19,60	
			14	4	3.35 .20 .25		3,8	3,8		3,8	1	53,20	
			14	4	.20 .25 6.85 .20 .25		7,25	7,25		7,25	1	101,50	
			14	4	.20 1.60		1,8	1,8		1,8	1	25,20	
			14	4	.20 2.15 .60		2,95	2,95		2,95	1	41,30	
			14	4	2.15 .60 2.10		4,85	4,85		4,85	1	67,90	
			14	4	3.70 .20 .20	0,2	4,1	3,7	0,2	4,1	1	57,40	
			14	4	2.20 2.75		4,95	4,95		4,95	1	69,30	
TANQUE 2	G-F	1	14	4	4.90 .10	0,2	10,3	9,9	0,2	10,3	1	144,20	8.188,70
			926	4	.20 3.45 .20 ①Ø1/2"@0.20m L=3.85m	0,2	3,85	3,45	0,2	3,85	1	3.565,10	
			121	4	.60 2.95 .20 ②Ø1/2"@0.20m L=3.75m	0,6	3,75	2,95	0,2	3,75	1	453,75	

CONSORCIO URBANOVA SED











CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

PEDIDO 18 REFUERZO TANQUES Y POZOS SOTANO

ACERO

TOTAL EJECUTADO 16.989,55

Tipo	ejes	Cant	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			304	4		0,2	0,8	0,4	0,2	0,8	1	243,20	
			425	4		0,2	1,2	0,8	0,2	1,2	1	510,00	
			40	4		0,2	1,7	1,5		1,7	1	68,00	
			40	4		0,25	2,3	2,05		2,3	1	92,00	
			32	4		0,2	1,7	1,5		1,7	1	54,40	
			32	4		0,25	2,3	2,05		2,3	1	73,60	
			120	4			1,5	1,5		1,5	1	180,00	
			40	4			2,45	2,45		2,45	1	98,00	
			33	4			3,25	3,25		3,25	1	107,25	
			40	4			3,05	3,05		3,05	1	122,00	
			17	4		0,75	1,65	0,7	0,2	1,65	1	28,05	
			17	4		0,6	2,5	1,3	0,6	2,5	1	42,50	
			17	4			1,3	1,3		1,3	1	22,10	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

PEDIDO 18 REFUERZO TANQUES Y POZOS SOTANO

ACERO

TOTAL EJECUTADO **16.989,55**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			3	4	Ø1/2" @0.20m L= 5.3M; 4.10; .40; .60; .20	0,6	5,3	4,1	0,6	5,3	1	15,90	
POZO EYECTOR ALL SOTANO	D,B -11,12	1	12	4	2.10; 0.20; 0.20; 1.50; 1.50; 2.10; ③Ø1/2"@.20m L=7.60m	3	7,6	4,2	0,4	7,6	1	91,20	497,88
			24	4	①Ø1/2"@.20m L=2.50m; 0.20; 2.10; 0.20	0,2	2,5	2,1	0,2	2,5	1	60,00	
			24	4	①Ø1/2"@.20m L=2.50m; 0.20; 2.10; 0.20	0,2	2,5	2,1	0,2	2,5	1	60,00	
			24	4	②Ø1/2"@.20m L=1.90m; 0.20; 1.50; 0.20	0,2	1,9	1,5	0,2	1,9	1	45,60	
			12	3	0.60; 0.60; 1.90; 1.90; ⑧Ø3/8"@.15m L=7.10m; 2.10	2,5	7,1	2,1	2,5	7,1	0,56	47,71	
			36	3	⑨Ø3/8"@.15m L=2.40m; 0.15; 2.10; 0.15	0,15	2,4	2,1	0,15	2,4	0,56	48,38	
			54	3	0.15; 1.90; 0.15; ⑦Ø3/8"@.15m L=2.20m	0,15	2,2	1,9	0,15	2,2	0,56	66,53	
			15	3	0.60; 0.60; 1.90; 1.90; ⑥ Ø3/8"@.15m L=6.5m; 1.50	2,5	6,5	1,5	2,5	6,5	0,56	54,60	
			12	3	1.25; 0.15; 0.60; ④Ø3/8"@.15m L=2.00m	0,6	2	1,25	0,15	2	0,56	13,44	
			12	3	0.15; 1.25; 0.15; ⑤Ø3/8"@.15m L=1.55m	0,15	1,55	1,25	0,15	1,55	0,56	10,42	

CONSORCIO URBANOVA SED









CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

PEDIDO 18 REFUERZO TANQUES Y POZOS SOTANO

ACERO

TOTAL EJECUTADO 16.989,55

Tipo	ejes	Cant	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
EYECTOR SOTANO AR	F-12 Y F 14	2	12	4		2,6	5,6	2,6	0,4	5,6	1	134,40	605,35
			48	4		0,2	1,7	1,3	0,2	1,7	1	163,20	
			22	3		0,15	1,6	1,3	0,15	1,6	0,56	39,42	
			44	3		0,15	1,96	1,66	0,15	1,96	0,56	96,59	
			22	3		2,26	5,82	1,3	2,26	5,82	0,56	143,40	
			22	3		0,2	0,8	0,6		0,8	0,56	19,71	
			11	3		0,15	0,7	0,4	0,15	0,7	0,56	8,62	
TRAMPA DE GRASAS SOTANO	F-12	1	10	4		2	5,6	3,2	0,4	5,6	1	56,00	224,22
			20	4		0,2	2	1,6	0,2	2	1	40,00	
			20	4		0,2	1,4	1	0,2	1,4	1	28,00	
			8	3		1,92	5,44	1,6	1,92	5,44	0,56	24,37	
			28	3		0,15	1,62	1,32	0,15	1,62	0,56	25,40	
			12	3		1,92	4,84	1	1,92	4,84	0,56	32,52	
			40	3		0,2	0,8	0,6		0,8	0,56	17,92	
Complemento muros		1	990	4		0,2	1,2	1		1,2	1	1.188,00	1.188,00

CONSORCIO URBANOVA SED




CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

PEDIDO 18 REFUERZO TANQUES Y POZOS SOTANO

ACERO

TOTAL EJECUTADO **16.989,55**

Tipo	ejes	Cant	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
Tapa tanque		1	12	3		0,15	3,75	3,45	0,15	3,75	0,56	25,20	1.963,35
			333	3		0,15	5,3	5	0,15	5,3	0,56	988,34	
			24	3		0,15	7,05	6,75	0,15	7,05	0,56	94,75	
			34	3		0,15	11,9	11,6	0,15	11,9	0,56	226,58	
			34	3		0,15	12	11,7	0,15	12	0,56	228,48	
			40	4		0,2	10	9,6	0,2	10	1	400,00	
													16.989,55





CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO E408C

PEDIDO 29 ESCALERA SOTANO A N1 EN EJE G11

ACERO TOTAL **179,69**

	Tipo	ejes	Cant	CANTIDA DE ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO No. Varilla	DIAGRAMA	GANCHO	L	GANCHO	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
escalera sotano	escalera sotano	EJE G-11	1	1	8	4		0,35	1,75		2,1	1	16,80	179,69
				1,00	8,00	4,00		0,50	0,5		1,00	1	8,00	
				1,00	8,00	4,00		0,50	2,9	0,25	3,65	1	29,20	
				1,00	8,00	4,00		0,50	1,15	1,70	3,35	1	26,80	
				1,00	8,00	4,00		0,15	2,8	0,50	3,45	1	27,60	
				1,00	8,00	4,00		0,15	1,95	0,50	2,60	1	20,80	
				1,00	56,00	3,00		0,15	1,31	0,15	1,61	0,56	50,49	
				TOTAL ACERO ADICIONAL A										**179,69**

CONSORCIO URBANOVA SED












CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E313 VT 200- 206 VT 207-214 VL 200-205

VIGAS 2 NIVEL LUDOTECA PARTE 1

ACERO

TOTAL EJECUTADO **2983,51**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VIGAS VL - LUDOTECA													
VL200 40*65	1A-3	1		3	6		0,25	6,33	0,25	6,83	2,25	46,1025	127,6866
				3	6		0,25	6,33	0,25	6,83	2,25	46,1025	
			ESTRIBOS	32	3		0,1	1,78	0,1	1,98	0,56	35,4816	
VL201 40*65	1A-3	1		3	6		0,25	10,76	0,25	11,26	2,25	76,005	241,4034
				2	4			4,5		4,5	1	9	
				3	7		0,3	10,76	0,3	11,36	3,06	104,2848	
			ESTRIBOS	47	3		0,1	1,78	0,1	1,98	0,56	52,1136	
VL202 40*65	D1-E1	1		4	7		0,3	5,7		6	3,06	73,44	531,0808
				4	7			7,3	0,3	7,6	3,06	93,024	
				4	7		0,3	3,9		4,2	3,06	51,408	
				2	8			3,65	0,35	4	4	32	
				2	7		0,3	3,8		4,1	3,06	25,092	
				2	8			9,85	0,35	10,2	4	81,6	
				2	8		0,35	9,95		10,3	4	82,4	
				2	7			3,7	0,3	4	3,06	24,48	
			ESTRIBOS	61	3		0,1	1,78	0,1	1,98	0,56	67,6368	
VL203 40*65	D1-E1	2		4	7		0,3	11,33	0,3	11,93	3,06	292,0464	814,136
				2	8		0,35	3,45		3,8	4	60,8	
				2	7			3,2	0,3	3,5	3,06	42,84	
				4	7		0,3	11,33	0,3	11,93	3,06	292,0464	
			ESTRIBOS	57	3		0,1	1,78	0,1	1,98	0,56	126,4032	
VTL204 40*65	1A-3	1		3	6		0,25	9,04	0,25	9,54	2,25	64,395	178,1708
				2	3			3,5		3,5	0,56	3,92	
				3	6		0,25	9,04	0,25	9,54	2,25	64,395	
			ESTRIBOS	41	3		0,1	1,78	0,1	1,98	0,56	45,4608	
VTL205 40*65	1A-3	1		5	7		0,3	10,07	0,3	10,67	3,06	163,251	436,4892
				4	7		0,3	2,2		2,5	3,06	30,6	
				4	7			2,2	0,3	2,5	3,06	30,6	
				5	7		0,3	10,07	0,3	10,67	3,06	163,251	
			ESTRIBOS	44	3		0,1	1,78	0,1	1,98	0,56	48,7872	
VTL200 40*65	1A-3	1		3	6		0,25	10,65	0,25	11,15	2,25	75,2625	254,1031
				2	6			5		5	2,25	22,5	
				3	7		0,3	10,65	0,3	11,25	3,06	103,275	
			ESTRIBOS	46	3		0,1	1,86	0,1	2,06	0,56	53,0656	
				3	8		0,35	4,94	0,35	5,64	4	67,68	
				3	6		0,25	4,94	0,25	5,44	2,25	36,72	

CONSORCIO URBANOVA SED





CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E313 VT 200- 206 VT 207-214 VL 200-205

VIGAS 2 NIVEL LUDOTECA PARTE 1

ACERO

TOTAL EJECUTADO **2983,51**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VTL201 40*65	D1	1	ESTRIBOS	25	3		0,1	1,86	0,1	2,06	0,56	28,84	133,24
VTL202 40*65	D1	1		3	8		0,35	4,57	0,35	5,27	4	63,24	151,7664
				3	8		0,35	4,37	0,35	5,07	4	60,84	
			ESTRIBOS	24	3		0,1	1,86	0,1	2,06	0,56	27,6864	
VTL203 20*65	D1	2		2	6		0,25	4,57	0,25	5,07	2,25	45,63	115,4296
				2	6		0,25	4,57	0,25	5,07	2,25	45,63	
			ESTRIBOS	13	3		0,1	1,46	0,1	1,66	0,56	24,1696	

TOTAL ACERO	2983,51

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

2do PEDIDO DE COLUMNAS AULAS

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4771 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 15:13:38
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
58	b = 11.2	12	N° 10	11,20	860,16	[12]
59	b = 11.25	34	N° 10	11,25	2.448,00	[34]
60	b = 11.35	16	N° 10	11,35	1.162,24	[16]

TOTALES PARA Acero Figurado		
DIÁMETRO	PRODUCTO	PESO TOTAL
N° 3 - 3/8	Acero Figurado	11.274,54
N° 4 - 1/2	Acero Figurado	4.724,13
N° 5 - 5/8	Acero Figurado	2.617,13
N° 6 - 3/4	Acero Figurado	7.236,79
N° 7 - 7/8	Acero Figurado	2.420,61
N° 8 - 1"	Acero Figurado	10.204,60
N° 10 - 1" 1/4	Acero Figurado	8.246,72
TOTAL		46.724,52

PESO TOTAL	46.724,52

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4771 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 15:13:38
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

Ubicación: **COLUMNAS ZONA AULAS 2 PEDIDO DE 2 A 5**

Lista de producto N° 3

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
1	a = 0.1 b = 1.62	468	N° 3	1,82	476,99	[468]
2	a = 0.1 b = 0.72 c = 0.32	1550	N° 3	2,28	1.979,04	[1550]
3	a = 0.1 b = 0.72 c = 0.57	147	N° 3	2,78	228,85	[147]

2do PEDIDO DE COLUMNAS AULAS

4		a = 0.1 b = 1.62 c = 0.72	320	N° 3	4,88	874,50	[320]
5		a = 0.1 b = 0.32 c = 0.1	7750	N° 3	0,52	2.256,80	[7750]
6		a = 0.1 b = 0.72 c = 0.1	4750	N° 3	0,92	2.447,20	[4750]
7		a = 0.1 b = 1.62 c = 0.1	468	N° 3	1,82	476,99	[468]

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4771 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 15:13:38
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
8		a = 0.1 b = 10.75 c = 0.1	344	N° 3	10,95	2.109,41	[344]
9		a = 0.12 b = 0.57 c = 0.12	588	N° 3	0,81	266,72	[588]
10		a = 0.12 b = 0.72 c = 0.12	294	N° 3	0,96	158,05	[294]

Lista de producto N° 4

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
11		b = 8.6	13	N° 4	8,60	111,80	[13]
12		b = 8.65	13	N° 4	8,65	112,45	[13]
13		b = 10.15	26	N° 4	10,15	263,90	[26]
14		a = 0.2 b = 2.65	39	N° 4	2,85	111,15	[39]

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4771 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED


Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 15:13:38
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

2do PEDIDO DE COLUMNAS AULAS

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
15	 a = 0.2 b = 2.75	13	N° 4	2,95	38,35	[13]
16	 a = 0.13 b = 0.72 c = 0.42	212	N° 4	2,54	538,48	[212]
17	 a = 0.13 b = 0.92 c = 0.52	294	N° 4	3,14	923,16	[294]
18	 a = 0.13 b = 0.42 c = 0.13	848	N° 4	0,68	576,64	[848]
19	 a = 0.13 b = 0.52 c = 0.13	1470	N° 4	0,78	1.146,60	[1470]
20	 a = 0.13 b = 0.72 c = 0.13	212	N° 4	0,98	207,76	[212]
21	 a = 0.13 b = 0.92 c = 0.13	588	N° 4	1,18	693,84	[588]

Lista de producto N° 5

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4771 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 15:13:38
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
22	b = 8.65	13	N° 5	8,65	175,42	[13]
23	b = 8.75	13	N° 5	8,75	177,45	[13]
24	b = 9.1	58	N° 5	9,10	823,37	[58]
25	b = 9.4	13	N° 5	9,40	190,63	[13]
26	b = 9.45	26	N° 5	9,45	383,29	[26]
27	b = 9.8	39	N° 5	9,80	594,23	[39]

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

2do PEDIDO DE COLUMNAS AULAS

27		39	N° 5	9,80	596,23	[39]
28	b = 10.15	13	N° 5	10,15	205,84	[13]
29	a = 0.25 b = 2.95	13	N° 5	3,20	64,90	[13]

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4771 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED
Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 15:13:38
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

Lista de producto N° 6

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
30	b = 8.75	13	N° 6	8,75	255,94	[13]
31	b = 8.8	52	N° 6	8,80	1.029,60	[52]
32	b = 8.95	52	N° 6	8,95	1.047,15	[52]
33	b = 9.05	58	N° 6	9,05	1.181,03	[58]
34	b = 9.2	29	N° 6	9,20	600,30	[29]
35	b = 9.9	39	N° 6	9,90	868,73	[39]
36	b = 10.1	17	N° 6	10,10	386,33	[17]

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4771 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED
Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 15:13:38
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
37	b = 10.3	26	N° 6	10,30	602,55	[26]
38	b = 10.4	13	N° 6	10,40	304,20	[13]

2do PEDIDO DE COLUMNAS AULAS

39	a = 0.3 b = 3.05	20	N° 6	3,35	150,75	[20]
40	a = 0.3 b = 6.6	39	N° 6	6,90	605,48	[39]
41	a = 0.3 b = 6.7	13	N° 6	7,00	204,75	[13]

Lista de producto N° 7

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
42	b = 9.2	26	N° 7	9,20	731,95	[26]
43	b = 10.0	13	N° 7	10,00	397,80	[13]

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4771 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 15:13:38
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
44	b = 10.8	26	N° 7	10,80	859,25	[26]
45	b = 10.85	13	N° 7	10,85	431,61	[13]

Lista de producto N° 8

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
46	b = 9.3	13	N° 8	9,30	483,60	[13]
47	b = 9.5	46	N° 8	9,50	1.748,00	[46]
48	b = 10.1	24	N° 8	10,10	969,60	[24]
49	b = 10.15	20	N° 8	10,15	812,00	[20]
50	b = 10.95	101	N° 8	10,95	4.423,80	[101]

2do PEDIDO DE COLUMNAS AULAS

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4771 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED
Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 15:13:38
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
51	a = 0.4 b = 3.2	8	N° 8	3,60	115,20	[8]
52	a = 0.4 b = 6.95	26	N° 8	7,35	764,40	[26]
53	a = 0.4 b = 7.0	30	N° 8	7,40	888,00	[30]

Lista de producto N° 10

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
54	b = 9.2	17	N° 10	9,20	1.000,96	[17]
55	b = 9.65	33	N° 10	9,65	2.038,08	[33]
56	b = 10.4	3	N° 10	10,40	199,68	[3]
57	b = 10.5	8	N° 10	10,50	537,60	[8]

PANTALLAS AULAS 2 PEDIDO DEL2AL5 PISO

TOTALES PARA Acero Figurado		
DIÁMETRO	PRODUCTO	PESO TOTAL
N° 3 - 3/8	Acero Figurado	31.689,14
N° 4 - 1/2	Acero Figurado	15.343,84
N° 5 - 5/8	Acero Figurado	7.435,27

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4769 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 14:56:59
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

N° 6 - 3/4	Acero Figurado	8.638,76
N° 8 - 1"	Acero Figurado	2.420,00
TOTAL		65.527,02

PESO TOTAL	65.527,02

Lista de barras 1"

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
1	9.55	21	1"	9.55	796.79	
2	9.50	16	1"	9.50	603.90	
3	9.35	27	1"	9.35	1002.98	

Peso total barras 1" =2403.67 kg

Lista de barras 3/4"

4	10.55	16	3/4"	10.55	377.27	
5	10.50	16	3/4"	10.50	375.48	
6	10.25	16	3/4"	10.25	366.54	
7	9.70	16	3/4"	9.70	346.87	
8	9.50	18	3/4"	9.50	382.18	
9	9.30	21	3/4"	9.30	436.50	

PazdelRio

CONTRATIST CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTO LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO Nc CO1.PCCNTR.5698312

PANTALLAS AULAS 2 PEDIDO DEL2AL5 PISO

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
10	9.25	5	3/4"	9.25	103.37	
11	9.05	11	3/4"	9.05	222.49	
12	9.00	58	3/4"	9.00	1166.67	
13	8.95	5	3/4"	8.95	100.02	
14	8.80	32	3/4"	8.80	629.38	
15	8.75	60	3/4"	8.75	1173.38	
16	8.35	60	3/4"	8.35	1119.73	
17	5.30	10	3/4"	5.30	118.45	
18	5.10	4	3/4"	5.10	45.59	
19	4.85	68	3/4"	4.85	737.10	
20	4.75	16	3/4"	4.75	169.86	
21	4.70	17	3/4"	4.70	178.58	
22	4.60	25	3/4"	4.60	257.02	
23	0.30 / 1.60	34	3/4"	1.90	144.38	
24	0.30 / 1.40	34	3/4"	1.70	129.18	

Peso total barras 3/4" =8580.05 kg

Lista de barras 5/8"

25	10.45	30	5/8"	10.45	486.55	
26	10.25	60	5/8"	10.25	954.48	
27	10.15	18	5/8"	10.15	283.55	
28	9.65	26	5/8"	9.65	389.40	
29	9.60	16	5/8"	9.60	238.39	
30	9.30	18	5/8"	9.30	259.80	
31	9.10	56	5/8"	9.10	790.90	
32	9.05	26	5/8"	9.05	365.19	
33	8.75	34	5/8"	8.75	461.72	
34	4.70	421	5/8"	4.70	3070.94	
35	0.25 / 1.30	40	5/8"	1.55	96.22	

Peso total barras 5/8" =7397.14 kg

Lista de barras 1/2"

36	10.20	11	1/2"	10.20	111.53	
37	9.10	18	1/2"	9.10	162.82	
38	8.55	12	1/2"	8.55	101.98	
39	7.14	592	1/2"	7.14	4201.52	
40	6.70	13	1/2"	6.70	86.58	
41	4.70	293	1/2"	4.70	1368.84	
42	4.65	16	1/2"	4.65	73.95	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATIST CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTO LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO Nc CO1.PCCNTR.5698312

PANTALLAS AULAS 2 PEDIDO DEL2AL5 PISO

Acero colombiano hecho con el corazón

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
43	4.60	1547	1/2"	4.60	7073.50	
44	4.45	60	1/2"	4.45	265.40	
45	3.25	38	1/2"	3.25	122.76	
46	3.19	394	1/2"	3.19	1249.32	
47	0.20 / 2.55	12	1/2"	2.75	32.80	
48	0.20 / 1.20	288	1/2"	1.40	400.78	

Peso total barras 1/2'' =15251.78 kg

Lista de barras 3/8''












	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
49	7.14	734	3/8"	7.14	2934.83	
50	h, b=0.39 h=1.90 g=0.10	172	3/8"	4.78	460.41	
51	4.60	63	3/8"	4.60	162.29	
52	h, b=0.34 h=1.49 g=0.10	312	3/8"	3.86	674.42	
53	h, b=0.34 h=1.44 g=0.10	468	3/8"	3.76	985.42	

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
54	h, b=0.34 h=1.24 g=0.10	168	3/8"	3.36	316.11	
55	3.19	730	3/8"	3.19	1304.07	
56	h, b=0.34 h=0.99 g=0.10	112	3/8"	2.86	179.38	
	h, b=0.34 h=0.94 g=0.10					

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATIST CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTO LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO Nc CO1.PCCNTR.5698312

PANTALLAS AULAS 2 PEDIDO DEL2AL5 PISO

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
57		156	3/8"	2.76	241.11	
58		624	3/8"	2.46	859.62	
59		2078	3/8"	2.19	2548.46	
60		156	3/8"	2.16	188.70	
61		172	3/8"	2.10	202.27	
62		262	3/8"	2.06	302.24	
63		898	3/8"	1.76	885.07	
64		312	3/8"	1.69	295.28	
65		468	3/8"	1.64	429.81	
66		168	3/8"	1.44	135.48	
67		56	3/8"	1.35	42.34	
68		112	3/8"	1.19	74.64	
69		156	3/8"	1.14	99.59	
70		624	3/8"	0.94	328.47	
71		262	3/8"	0.74	108.57	
72		19521	3/8"	0.59	6449.74	
73		37942	3/8"	0.54	11473.66	

Peso total barras 3/8" =31681.97 kg

PESO TOTAL = 65314.62 kg

CONSORCIO URBANOVA SED















CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E314

PLACA PISO 2 ZONA COMEDOR

ACERO

TOTAL EJECUTADO **9553,10**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V300 45*85	11-12-13-14	1		3	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	22,95	1401,832
				3	8			4,2	4,2		4,2	4	50,4	
				3	8			4	4		4	4	48	
				3	7			2,5	2,2	0,3	2,5	3,06	22,95	
				3	8		0,35	4,6	4,25		4,6	4	55,2	
				3	8			7,8	7,8		7,8	4	93,6	
				3	8			8,4	8,4		8,4	4	100,8	
				3	8			4,6	4,25	0,35	4,6	4	55,2	
				2	8			4	4		4	4	32	
				2	7			4	4		4	3,06	24,48	
				2	6		0,25	10,4	10,15		10,4	2,25	46,8	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	7			5,65	5,4	0,25	5,65	3,06	34,578	
				2	6		0,25	5,6	5,35		5,6	2,25	25,2	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	7			10,55	10,25	0,3	10,55	3,06	64,566	
				2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,3	
				3	8			4	4		4	4	48	
				3	8			4,5	4,5		4,5	4	54	
				2	6			2,5	2,25	0,25	2,5	2,25	11,25	
				1	8		0,35	7,1	6,75		7,1	4	28,4	
				1	7			8,8	8,8		8,8	3,06	26,928	
				1	8			10,1	9,75	0,35	10,1	4	40,4	
				2	8		0,35	9,9	9,55		9,9	4	79,2	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8			7,4	7,05	0,35	7,4	4	59,2	
			ESTRIBOS	115	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	159,712	
				115	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	62,468	
V301 40*85	11-12-13-14	1		3	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	78,3	431,9948
				3	6			11,5	11,25	0,25	11,5	2,25	77,625	
				1	6		0,25	7,2	6,95		7,2	2,25	16,2	
				1	6			8,2	8,2		8,2	2,25	18,45	
				2	4			2,8	2,8		2,8	1	5,6	
				1	6			8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	20,025	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E314

PLACA PISO 2 ZONA COMEDOR

ACERO

TOTAL EJECUTADO **9553,10**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	6	A B	0,25	9	8,75		9	2,25	40,5	
				2	6	B		8,2	8,2		8,2	2,25	36,9	
				2	6	B C		7,1	6,85	0,25	7,1	2,25	31,95	
			ESTRIBOS	96	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	106,4448	
V302 45*85	11-12-13-14	1		4	7	A B	0,3	4,4	4,1		4,4	3,06	53,856	1104,366
				4	7	B		7,6	7,6		7,6	3,06	93,024	
				4	7	B		8,3	8,3		8,3	3,06	101,592	
				4	7	B C		4,7	4,4	0,3	4,7	3,06	57,528	
				2	5	A B	0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				3	8	B		4	4		4	4	48	
				2	7	B		4	4		4	3,06	24,48	
				2	5	B C		2	1,75	0,25	2	1,56	6,24	
				2	5	A B	0,25	10,4	10,15		10,4	1,56	32,448	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5	B C		5,65	5,4	0,25	5,65	1,56	17,628	
				2	5	A B	0,25	5,6	5,35		5,6	1,56	17,472	
				2	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				2	5	B C		10,55	10,3	0,25	10,55	1,56	32,916	
				2	6	A B	0,25	7,1	6,85		7,1	2,25	31,95	
				2	7	B		8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7	B C		9,9	9,6	0,3	9,9	3,06	60,588	
				2	7	A B	0,3	9,7	9,4		9,7	3,06	59,364	
				2	7	B		8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7	B C		7,3	7	0,3	7,3	3,06	44,676	
				2	5	A B	0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				2	5	B		3,5	3,5		3,5	1,56	10,92	
				2	8	B		3	3		3	4	24	
			ESTRIBOS	115	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	159,712	
				115	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	62,468	
				5	8	A B	0,35	5	4,65		5	4	100	
				5	8	B		8,5	8,5		8,5	4	170	
				5	8	B		8,2	8,2		8,2	4	164	
				5	8	B C		4,9	4,55	0,35	4,9	4	98	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E314

PLACA PISO 2 ZONA COMEDOR

ACERO

TOTAL EJECUTADO **9553,10**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V303 55*85	D-E-F-G	1		4	8		0,35	3	2,65		3	4	48	1939,658
				3	8			4	4		4	4	48	
				4	8			4	4		4	4	64	
				4	8			3	2,65	0,35	3	4	48	
				4	8			4	4		4	4	64	
				2	8			3	2,65	0,35	3	4	24	
				2	6		0,25	11,2	10,95		11,2	2,25	50,4	
				2	6			5,9	5,65	0,25	5,9	2,25	26,55	
				2	6		0,25	8,75	8,25	0,25	8,75	2,25	39,375	
				2	6		0,25	5,8	5,55		5,8	2,25	26,1	
				2	6			11,3	11,05	0,25	11,3	2,25	50,85	
				2	6		0,25	8,75	8,25	0,25	8,75	2,25	39,375	
				2	8		0,35	3	2,65		3	4	24	
				2	7			3	3		3	3,06	18,36	
				2	6			3	3		3	2,25	13,5	
				2	7			3	2,7	0,3	3	3,06	18,36	
				2	8		0,35	7,6	7,25		7,6	4	60,8	
				2	8			9,2	9,2		9,2	4	73,6	
				2	8			10,4	10,05	0,35	10,4	4	83,2	
				3	8		0,35	10,4	10,05		10,4	4	124,8	
				3	8			9,3	9,3		9,3	4	111,6	
				3	8			7,6	7,25	0,35	7,6	4	91,2	
			ESTRIBOS	127	3		0,1	2,68	2,48	0,1	2,68	0,56	190,6016	
				127	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	68,9864	
V304 45*65	D-E-F-G	1		3	8		0,35	6,88	6,18	0,35	6,88	4	82,56	244,6404
				3	8			3	2,65	0,35	3	4	36	
				3	7		0,3	6,78	6,18	0,3	6,78	3,06	62,2404	
			ESTRIBOS	40	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	46,592	
				40	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	17,248	
				3	8		0,35	6,88	6,18	0,35	6,88	4	82,56	
				3	8			3,5	3,15	0,35	3,5	4	42	
				3	7		0,3	6,78	6,18	0,3	6,78	3,06	62,2404	

CONSORCIO URBANOVA SED








CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E314

PLACA PISO 2 ZONA COMEDOR

ACERO

TOTAL EJECUTADO **9553,10**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V305 45*65	G	1	ESTRIBOS	40	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	46,592	250,6404
				40	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	17,248	
V306 45*85	D-E-F-G	1		3	8		0,35	9,1	8,75		9,1	4	109,2	1540,121
				3	8			8,4	8,4		8,4	4	100,8	
				3	8			8,3	8,3		8,3	4	99,6	
				3	8			5	4,65	0,35	5	4	60	
				3	7			4,5	4,5		4,5	3,06	41,31	
				3	7			3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
				3	8			3,8	3,8		3,8	4	45,6	
				3	7			3	2,7	0,3	3	3,06	27,54	
				2	7			4				3,06	0	
				2	7			3,8	3,8		3,8	3,06	23,256	
				2	7			3	2,7	0,3	3	3,06	18,36	
				2	6		0,25	7,6	7,35		7,6	2,25	34,2	
				2	6			10,6	10,6		10,6	2,25	47,7	
				2	6			11,1	10,85	0,25	11,1	2,25	49,95	
				2	6		0,25	10	9,75		10	2,25	45	
				2	6			5,9	5,9		5,9	2,25	26,55	
				2	6			8,2	8,2		8,2	2,25	36,9	
				2	6			5,85	5,6	0,25	5,85	2,25	26,325	
				2	8			4	4		4	4	32	
				2	8			3,8	3,8		3,8	4	30,4	
				2	7			3,8	3,8		3,8	3,06	23,256	
				2	7			3	2,7	0,3	3	3,06	18,36	
				1	7		0,3	6,8	6,5		6,8	3,06	20,808	
				1	7			8,9	8,9		8,9	3,06	27,234	
				1	7			9	9		9	3,06	27,54	
				1	7			7,5	7,2	0,3	7,5	3,06	22,95	
				2	8		0,35	11,7	11,35		11,7	4	93,6	
				2	8			9,2	9,2		9,2	4	73,6	
				2	8			10,4	10,05	0,35	10,4	4	83,2	
			ESTRIBOS	136	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	188,8768	

CONSORCIO URBANOVA SED
















CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E314

PLACA PISO 2 ZONA COMEDOR

ACERO

TOTAL EJECUTADO **9553,10**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				136	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	73,8752	
VT300 20*85	11-12-13-14	1		2	6		0,25	11,7	11,45		11,7	2,25	52,65	385,9448
				2	6			11,4	11,15	0,25	11,4	2,25	51,3	
				2	4		0,2	10,35	10,15		10,35	1	20,7	
				2	4			10,1	10,1		10,1	1	20,2	
				2	4			3,15	2,95	0,2	3,15	1	6,3	
				2	4		0,2	5,75	5,55		5,75	1	11,5	
				2	4			12	12		12	1	24	
				2	4			5,75	5,55	0,2	5,75	1	11,5	
				2	6		0,25	7,2	6,95		7,2	2,25	32,4	
				2	6			10	10		10	2,25	45	
				2	6			7,1	6,85	0,25	7,1	2,25	31,95	
			ESTRIBOS	68	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	78,4448	
VT300A 30*85	14	3		2	7		0,3	1,2	0,6	0,3	1,2	3,06	22,032	76,0464
				2	5		0,25	1,1	0,6	0,25	1,1	1,56	10,296	
				2	5		0,25	1,1	0,6	0,25	1,1	1,56	10,296	
				2	7		0,3	1,2	0,6	0,3	1,2	3,06	22,032	
			ESTRIBOS	3	3		0,1	2,26	2,06	0,1	2,26	0,56	11,3904	
VT301 20*65	G	2		2	5		0,25	6,67	6,17	0,25	6,67	1,56	41,6208	118,5664
				2	5		0,25	6,67	6,17	0,25	6,67	1,56	41,6208	
			ESTRIBOS	19	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	35,3248	
VT301A 20*65		1		2	5		0,25	2,35	1,85	0,25	2,35	1,56	7,332	18,3824
				2	5		0,25	2,35	1,85	0,25	2,35	1,56	7,332	
			ESTRIBOS	4	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	3,7184	
VT301B 20*65	G	1		2	5		0,25	5,12	4,62	0,25	5,12	1,56	15,9744	44,0336
				2	5		0,25	5,12	4,62	0,25	5,12	1,56	15,9744	
			ESTRIBOS	13	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	12,0848	

CONSORCIO URBANOVA SED

















CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E314

PLACA PISO 2 ZONA COMEDOR

ACERO

TOTAL EJECUTADO **9553,10**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT301C 15*85	D-E-F-G	1		2	7		0,3	8,9	8,6		8,9	3,06	54,468	528,4496
				2	6			8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			4,9	4,65	0,25	4,9	2,25	22,05	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	5			2,5	2,5		2,5	1,56	7,8	
				2	4		0,2	9,65	9,45		9,65	1	19,3	
				2	4			8,4	8,4		8,4	1	16,8	
				2	4			8,1	8,1		8,1	1	16,2	
				2	4			3,8	3,6	0,2	3,8	1	7,6	
				2	4		0,2	7,45	7,25		7,45	1	14,9	
				2	4			8,1	8,1		8,1	1	16,2	
				2	4			8,3	8,3		8,3	1	16,6	
				2	4			6,1	5,9	0,2	6,1	1	12,2	
				2	6		0,25	11,9	11,65		11,9	2,25	53,55	
				2	4			2,2	2,2		2,2	1	4,4	
				2	6			8,6	8,6		8,6	2,25	38,7	
				2	6			9,5	9,25	0,25	9,5	2,25	42,75	
			ESTRIBOS	91	3		0,1	1,96	1,76	0,1	1,96	0,56	99,8816	
Detalles		1		582	3		0	1,2	1,2	0	1,2	0,56	391,104	1468,428
				15	3			1,67	1,67		1,67	0,56	14,028	
				96	5			7,1	6,85	0,25	7,1	1,56	1063,296	
														9553,10

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V307 20*85 40*85	2-3-4-5-6-7-8-9	1		2	6		0,25	8	7,5	0,25	8	2,25	36	1073,2044
				2	6		0,25	9,8	9,55		9,8	2,25	44,1	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			11,7	11,45	0,25	11,7	2,25	52,65	
				2	4		0,2	10,65	10,45		10,65	1	21,3	
				2	4			7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4			7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4			7,6	7,6		7,6	1	15,2	
				2	4			5,8	5,8		5,8	1	11,6	
				2	4			7,6	7,6		7,6	1	15,2	
				2	4			10,2	10,2		10,2	1	20,4	
				2	4			3,5	3,3	0,2	3,5	1	7	
				2	4		0,2	8,45	8,25		8,45	1	16,9	
				2	4			7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4			7,6	7,6		7,6	1	15,2	
				2	4			10,2	10,2		10,2	1	20,4	
				2	4			7,6	7,6		7,6	1	15,2	
				2	4			10,75	10,55	0,2	10,75	1	21,5	
				2	6		0,25	8	7,5	0,25	8	2,25	36	
				2	6		0,25	5,3	5,05		5,3	2,25	23,85	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			9,4	9,15	0,25	9,4	2,25	42,3	

CONSORCIO URBANOVA SED


CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	152	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	175,3472	
				22	3		0,1	2,46	2,26	0,1	2,46	0,56	30,3072	
V308 45*65 50*65	1'-2-3-4-5-6-7-8-9	1		3	8		0,35	10,8	10,45		10,8	4	129,6	1883,53
				3	8			7,5	7,5		7,5	4	90	
				3	8			8,6	8,6		8,6	4	103,2	
				3	7			8	8		8	3,06	73,44	
				3	8			8,2	8,2		8,2	4	98,4	
				3	7			7,5	7,5		7,5	3,06	68,85	
				3	8			8,7	8,7		8,7	4	104,4	
				3	8			4,3	3,95	0,35	4,3	4	51,6	
				2	6		0,25	2,2	1,95		2,2	2,25	9,9	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				2	8			4	4		4	4	32	
				2	6			2	1,75	0,25	2	2,25	9	
				1	7		0,3	8,6	8,3		8,6	3,06	26,316	
				1	8			10,6	10,6		10,6	4	42,4	
				1	7			11,5	11,5		11,5	3,06	35,19	
				1	7			8,5	8,5		8,5	3,06	26,01	
				1	7			8,4	8,4		8,4	3,06	25,704	
				1	7			7,1	7,1		7,1	3,06	21,726	
				1	7			10,7	10,4	0,3	10,7	3,06	32,742	
				2	5			2,2	1,95	0,25	2,2	1,56	6,864	
				2	7		0,3	6,2	5,65	0,25	6,2	3,06	37,944	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	8			11	11		11	4	88	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			8,3	8,3		8,3	3,06	50,796	

CONSORCIO URBANOVA SED





CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	7			7,4	7,1	0,3	7,4	3,06	45,288	
			ESTRIBOS	239	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	278,3872	
				36	3		0,1	2,18	1,98	0,1	2,18	0,56	43,9488	
				275	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	118,58	
V309 45*65 45*85	11-12-13-14	1		3	8		0,35	5,3	4,95		5,3	4	63,6	768,077
				3	8			7,9	7,9		7,9	4	94,8	
				3	8			11,9	11,55	0,35	11,9	4	142,8	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				1	8			5,6	5,6		5,6	4	22,4	
				1	7			8,4	8,4		8,4	3,06	25,704	
				1	7			7,3	7	0,3	7,3	3,06	22,338	
				3	8		0,35	5,3	4,95		5,3	4	63,6	
				2	7			10,7	10,7		10,7	3,06	65,484	
				2	7			9,2	8,9	0,3	9,2	3,06	56,304	
				2	6		0,25	1,05	0,55	0,25	1,05	2,25	4,725	
				2	6		0,25	1,05	0,55	0,25	1,05	2,25	4,725	
				3	7		0,3	1,15	0,55	0,3	1,15	3,06	10,557	
			ESTRIBOS	106	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	123,4688	
				2	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	2,7776	
				106	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	45,7072	
				2	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,0864	
V310	3--4	1		4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	288,924
				2	5			3,5	3,5		3,5	1,56	10,92	
				2	5			3,5	3,5		3,5	1,56	10,92	
				4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	

CONSORCIO URBANOVA SED















CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
60*65			ESTRIBOS	39	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	51,9792	
				39	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	16,8168	
V311 45*85 45*65	11--12	1		3	8		0,35	8,2	7,5	0,35	8,2	4	98,4	309,87
				2	6		0,25	3,65	3,15	0,25	3,65	2,25	16,425	
				2	6		0,25	3,65	3,15	0,25	3,65	2,25	16,425	
				3	8			6,1	5,75	0,35	6,1	4	73,2	
				3	8		0,35	3,85	3,15	0,35	3,85	4	46,2	
			ESTRIBOS	10	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	13,888	
				25	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	29,12	
				10	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,432	
				25	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	10,78	
V313 40*85	11--12-13-14	1		3	7		0,3	5	4,7		5	3,06	45,9	790,5808
				3	7			7,3	7,3		7,3	3,06	67,014	
				3	7			12	12		12	3,06	110,16	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	5			2	1,75	0,25	2	1,56	6,24	
				2	5		0,25	10,4	10,15		10,4	1,56	32,448	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			5,65	5,4	0,25	5,65	1,56	17,628	
				2	5		0,25	5,6	5,35		5,6	1,56	17,472	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				2	5			10,55	10,3	0,25	10,55	1,56	32,916	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				1	7		0,3	9,3	9		9,3	3,06	28,458	
				1	7			8,4	8,4		8,4	3,06	25,704	

CONSORCIO URBANOVA SED


CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				1	7			7,6	7,3	0,3	7,6	3,06	23,256	
				2	7		0,3	7,3	7		7,3	3,06	44,676	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			9,5	9,2	0,3	9,5	3,06	58,14	
			ESTRIBOS	116	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	154,6048	
				3	7		0,3	7,6	7,3		7,6	3,06	418,608	
				3	7			8	8		8	3,06	440,64	
				3	8			7,2	7,2		7,2	4	518,4	
				3	8			9	9		9	4	648	
				3	8			8	8		8	4	576	
				3	8			8	8		8	4	576	
				3	8			7	7		7	4	504	
				3	8			9	9		9	4	648	
				3	8			4,3	3,95	0,35	4,3	4	309,6	
				2	6			3	3		3	2,25	81	
				2	7			4	4		4	3,06	146,88	
				3	8			4,5	4,5		4,5	4	324	
				2	7			2,3	2	0,3	2,3	3,06	84,456	
				2	6		0,25	5,9	5,65		5,9	2,25	159,3	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	207,9	
				2	4			7,4	7,4		7,4	1	88,8	
				2	6			8,6	8,6		8,6	2,25	232,2	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	207,9	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	213,3	
				2	6			7,3	7,3		7,3	2,25	197,1	
				2	6			8,2	8,2		8,2	2,25	221,4	
				2	6			5,75	5,75		5,75	2,25	155,25	
				2	6		0,25	8,1	7,85		8,1	2,25	218,7	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	213,3	
				2	6			7	7		7	2,25	189	
				2	6			8,7	8,7		8,7	2,25	234,9	

CONSORCIO URBANOVA SED


CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V312 40*85	1-1'-2-3-4-5-6-7-8-9	6		2	6	B		8	8		8	2,25	216	15899,9784
				2	6	B		7,7	7,7		7,7	2,25	207,9	
				2	6	B		7,1	7,1		7,1	2,25	191,7	
				2	6	B		8,5	8,5		8,5	2,25	229,5	
				2	6	B C		3,45	3,2	0,25	3,45	2,25	93,15	
				2	6	B		3	3		3	2,25	81	
				2	6	B		3	3		3	2,25	81	
				2	6	B C		2,2	1,95	0,25	2,2	2,25	59,4	
				1	8	A B	0,35	10,1	9,75		10,1	4	242,4	
				1	8	B		8,6	8,6		8,6	4	206,4	
				1	8	B		7,2	7,2		7,2	4	172,8	
				1	8	B		10	10		10	4	240	
				1	8	B		8,5	8,5		8,5	4	204	
				1	8	B		8,6	8,6		8,6	4	206,4	
				1	8	B		7,3	7,3		7,3	4	175,2	
				1	8	B C		11	10,65	0,35	11	4	264	
				2	7	A B	0,3	4,9	4,6		4,9	3,06	179,928	
				2	7	B		8,6	8,6		8,6	3,06	315,792	
				2	7	B		8,5	8,5		8,5	3,06	312,12	
				2	7	B		8,4	8,4		8,4	3,06	308,448	
				2	7	B		8,6	8,6		8,6	3,06	315,792	
				2	7	B		8,3	8,3		8,3	3,06	304,776	
				2	7	B		8,4	8,4		8,4	3,06	308,448	
				2	7	B		8,6	8,6		8,6	3,06	315,792	
				2	8	B C		7,3	6,95	0,35	7,3	4	350,4	
			ESTRIBOS	313	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	2502,9984	
				2	6	A B	0,25	11,7	11,45		11,7	2,25	52,65	
				2	6	B C		11,6	11,35	0,25	11,6	2,25	52,2	
				2	4	A B	0,2	10,35	10,15		10,35	1	20,7	
				2	4	B		7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4	B C		5,6	5,4	0,2	5,6	1	11,2	
				2	4	A B	0,2	5,55	5,35		5,55	1	11,1	

CONSORCIO URBANOVA SED


CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V314 20*85	11-12-13-14	1		2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	15,6	390,802
				2	4	B C		10,5	10,3	0,2	10,5	1	21	
				2	6	A B	0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	32,85	
				2	6	B		9,6	9,6		9,6	2,25	43,2	
				2	6	B C		7,5	7,25	0,25	7,5	2,25	33,75	
			ESTRIBOS	70	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	80,752	
V315 20*85	A-B	1		2	6	A B	0,25	5,9	5,65		5,9	2,25	26,55	241,494
				2	6	B C		8,1	7,85	0,25	8,1	2,25	36,45	
				2	4	B		2,2	2,2		2,2	1	4,4	
				2	4	A B	0,2	7,3	7,1		7,3	1	14,6	
				2	4	B C		6,6	6,4	0,2	6,6	1	13,2	
				2	4	A B	0,2	4,1	3,9		4,1	1	8,2	
				2	4	B C		9,8	9,6	0,2	9,8	1	19,6	
				2	4	B		4	4		4	1	8	
				2	6	A B	0,25	10,2	9,95		10,2	2,25	45,9	
				2	6	B C		4,1	3,85	0,25	4,1	2,25	18,45	
			ESTRIBOS	40	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	46,144	
V316 45*85 45*65	A-B	1		2	6	A B	0,25	2,5	2,25		2,5	2,25	11,25	304,8078
				2	6	B C		2	1,75	0,25	2	2,25	9	
				3	7	A B C	0,3	10,66	10,06	0,3	10,66	3,06	97,8588	
				2	5	A B C	0,25	1,46	0,96	0,25	1,46	1,56	4,5552	
				2	5	A B C	0,25	1,46	0,96	0,25	1,46	1,56	4,5552	
				3	7	A B C	0,3	10,41	9,81	0,3	10,41	3,06	95,5638	
				3	7	A B C	0,3	1,56	0,96	0,3	1,56	3,06	14,3208	
			ESTRIBOS	2	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	2,7776	
				40	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	46,592	
				2	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,0864	










CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				40	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	17,248	
V317 45*85 45*65	A-B	1		3	7		0,3	5,8	5,5		5,8	3,06	53,244	425,379
				3	8			8,2	7,85	0,35	8,2	4	98,4	
				2	7		0,3	2,3	2		2,3	3,06	14,076	
				2	7			2,5	2,5		2,5	3,06	15,3	
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	4,524	
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	4,524	
				1	7		0,3	9,1	8,8		9,1	3,06	27,846	
				1	7			5	4,7	0,3	5	3,06	15,3	
				2	7		0,3	11,5	11,2		11,5	3,06	70,38	
				2	7			2,6	2,3	0,3	2,6	3,06	15,912	
				3	7		0,3	1,55	0,95	0,3	1,55	3,06	14,229	
			ESTRIBOS	2	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	2,7776	
				55	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	64,064	
				2	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,0864	
				55	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,716	
V318 45*85 45*65	A-B	1		3	8		0,35	7,5	7,15		7,5	4	90	464,024
				3	8			6,6	6,25	0,35	6,6	4	79,2	
				3	8			3	3		3	4	36	
				2	6		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	2,25	6,525	
				2	6		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	2,25	6,525	
				1	7		0,3	11,5	11,2		11,5	3,06	35,19	
				1	7			2,6	2,3	0,3	2,6	3,06	7,956	
				2	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	22,4	
				2	7			11,5	11,2	0,3	11,5	3,06	70,38	
				3	8		0,35	1,65	0,95	0,35	1,65	4	19,8	
				2	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	2,7776	

CONSORCIO URBANOVA SED













CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				2	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,0864	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
V319 45*85 45*65	A-B	1		3	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	63,342	406,977
				3	7			7	6,7	0,3	7	3,06	64,26	
				3	8			3	3		3	4	36	
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	4,524	
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	4,524	
				1	7		0,3	2,7	2,4		2,7	3,06	8,262	
				1	7			11,4	11,1	0,3	11,4	3,06	34,884	
				2	7		0,3	11,6	11,3		11,6	3,06	70,992	
				2	7			2,6	2,3	0,3	2,6	3,06	15,912	
				3	7		0,3	1,55	0,95	0,3	1,55	3,06	14,229	
			ESTRIBOS	2	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	2,7776	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				2	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,0864	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				3	7		0,3	6	5,7		6	3,06	55,08	
				3	7			7,9	7,6	0,3	7,9	3,06	72,522	
				3	7		0,3	3	2,7		3	3,06	27,54	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	4,524	
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	4,524	
				1	7		0,3	11,5	11,2		11,5	3,06	35,19	
				1	7			2,6	2,3	0,3	2,6	3,06	7,956	
				2	7		0,3	2,6	2,3		2,6	3,06	15,912	

CONSORCIO URBANOVA SED





CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V320 45*85 45*65	A-B 5	1		2	7			11,5	11,2	0,3	11,5	3,06	70,38	441,501
				3	7		0,3	1,55	0,95	0,3	1,55	3,06	14,229	
			ESTRIBOS	2	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	2,7776	
				55	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	64,064	
				2	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,0864	
				55	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,716	
V321 45*85 45*65	A-B	1		3	7		0,3	6	5,7		6	3,06	55,08	441,501
				3	7			7,9	7,6	0,3	7,9	3,06	72,522	
				3	7		0,3	3	2,7		3	3,06	27,54	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	4,524	
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	4,524	
				1	7		0,3	11,5	11,2		11,5	3,06	35,19	
				1	7			2,6	2,3	0,3	2,6	3,06	7,956	
				2	7		0,3	2,6	2,3		2,6	3,06	15,912	
				2	7			11,5	11,2	0,3	11,5	3,06	70,38	
				3	7		0,3	1,55	0,95	0,3	1,55	3,06	14,229	
			ESTRIBOS	2	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	2,7776	
				55	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	64,064	
				2	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,0864	
				55	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,716	
				3	7		0,3	6	5,7		6	3,06	55,08	
				3	7			7,9	7,6	0,3	7,9	3,06	72,522	
				3	7		0,3	3	2,7		3	3,06	27,54	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	

CONSORCIO URBANOVA SED













CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V322 45*85 45*65	A-B	1		2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	4,524	441,501
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	4,524	
				1	7		0,3	11,5	11,2		11,5	3,06	35,19	
				1	7			2,6	2,3	0,3	2,6	3,06	7,956	
				2	7		0,3	2,6	2,3		2,6	3,06	15,912	
				2	7			11,5	11,2	0,3	11,5	3,06	70,38	
				3	7		0,3	1,55	0,95	0,3	1,55	3,06	14,229	
			ESTRIBOS	2	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	2,7776	
				55	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	64,064	
				2	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,0864	
				55	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,716	
V323 80*85 80*65	A-B	1		5	8		0,35	5,9	5,55		5,9	4	118	701,1772
				5	8			7,85	7,5	0,35	7,85	4	157	
				2	7		0,3	2,8	2,5		2,8	3,06	17,136	
				2	8			3	3		3	4	24	
				2	6		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	2,25	6,525	
				2	6		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	2,25	6,525	
				3	7		0,3	2,4	2,1		2,4	3,06	22,032	
				3	7			11,45	11,15	0,3	11,45	3,06	105,111	
				2	7		0,3	9,1	8,8		9,1	3,06	55,692	
				2	7			4,75	4,45	0,3	4,75	3,06	29,07	
				5	7		0,3	1,55	0,95	0,3	1,55	3,06	23,715	
			ESTRIBOS	2	3		0,1	3,18	2,98	0,1	3,18	0,56	3,5616	
				54	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	84,0672	
				4	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	2,1728	

CONSORCIO URBANOVA SED














CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				108	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	46,5696	
V324 80*85 80*65	A-B	1		5	7		0,3	5,9	5,6		5,9	3,06	90,27	812,853
				5	8			8,35	8	0,35	8,35	4	167	
				4	7		0,3	2,8	2,5		2,8	3,06	34,272	
				4	8			3	3		3	4	48	
				2	6		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	2,25	6,525	
				2	6		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	2,25	6,525	
				5	7		0,3	5,7	5,4		5,7	3,06	87,21	
				5	8			8,35	8,05	0,3	8,35	4	167	
				5	7		0,3	1,55	0,95	0,3	1,55	3,06	23,715	
			ESTRIBOS	2	3		0,1	3,18	2,98	0,1	3,18	0,56	3,5616	
				73	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	113,6464	
				4	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	2,1728	
				146	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	62,9552	
V325 40*85	A-B	1		3	8		0,35	6,8	6,45		6,8	4	81,6	526,3232
				3	7			7,7	7,4	0,3	7,7	3,06	70,686	
				2	8			2,5	2,5		2,5	4	20	
				2	6		0,25	8,15	7,9		8,15	2,25	36,675	
				2	6			5,45	5,2	0,25	5,45	2,25	24,525	
				2	6		0,25	5,75	5,5		5,75	2,25	25,875	
				2	6			7,85	7,6	0,25	7,85	2,25	35,325	
				3	7		0,3	6,7	6,4		6,7	3,06	61,506	
				3	7			7,6	7,3	0,3	7,6	3,06	69,768	
			ESTRIBOS	57	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	75,9696	

CONSORCIO URBANOVA SED











CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				18	3		0,1	2,42	2,22	0,1	2,42	0,56	24,3936	
				4	8		0,35	7,2	6,85		7,2	4	115,2	
				3	8			6,8	6,45	0,35	6,8	4	81,6	
				4	8			2,5	2,5		2,5	4	40	
				2	8			2,8	2,8		2,8	4	22,4	
				2	8		0,35	1,65	0,95	0,35	1,65	4	13,2	
				2	8		0,35	1,65	0,95	0,35	1,65	4	13,2	
				3	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	22,95	
				3	7		0,3	3,5	3,2		3,5	3,06	32,13	
				1	7		0,3	9,9	9,6		9,9	3,06	30,294	
				1	7			4,2	3,9	0,3	4,2	3,06	12,852	
				2	7		0,3	2,7	2,4		2,7	3,06	16,524	
				2	7			11,4	11,1	0,3	11,4	3,06	69,768	
				3	8		0,35	1,65	0,95	0,35	1,65	4	19,8	
V326 45*85 45*65	A-B	1		3	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	4,1664	612,294
				18	4		0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	38,16	
				40	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	46,592	
			ESTRIBOS	3	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,6296	
				18	4		0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	14,58	
				40	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	17,248	
				3	8		0,35	6,1	5,75		6,1	4	73,2	
				3	7			7,9	7,6	0,3	7,9	3,06	72,522	

CONSORCIO URBANOVA SED






CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V327 45*85 45*65	A-B	1		3	8		0,35	3	2,65		3	4	36	497,097
				3	7			3,8	3,8		3,8	3,06	34,884	
				3	7			3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
				2	6		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	2,25	6,525	
				2	6		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	2,25	6,525	
				1	7		0,3	11,5	11,2		11,5	3,06	35,19	
				1	7			2,6	2,3	0,3	2,6	3,06	7,956	
				2	7		0,3	2,6	2,3		2,6	3,06	15,912	
				2	7			11,5	11,2	0,3	11,5	3,06	70,38	
				3	7		0,3	1,55	0,95	0,3	1,55	3,06	14,229	
			ESTRIBOS	2	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	2,7776	
				55	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	64,064	
				2	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,0864	
				55	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,716	
V328 45*85	A-B	1		3	8		0,35	5,5	5,15		5,5	4	66	652,584
				3	8			8,6	8,25	0,35	8,6	4	103,2	
				2	8		0,35	3	2,65		3	4	24	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	6		0,25	7,05	6,8		7,05	2,25	31,725	
				2	6			6,55	6,3	0,25	6,55	2,25	29,475	
				2	6		0,25	4,35	4,1		4,35	2,25	19,575	
				2	6			9,25	9	0,25	9,25	2,25	41,625	
				3	8		0,35	9,4	9,05		9,4	4	112,8	
				3	8			5,2	4,85	0,35	5,2	4	62,4	
			ESTRIBOS	62	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	86,1056	

CONSORCIO URBANOVA SED









CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				62	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	33,6784	
VT302 20*65	3	1		2	6		0,25	4,3	3,8	0,25	4,3	2,25	19,35	48,9256
				2	6		0,25	4,3	3,8	0,25	4,3	2,25	19,35	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	10,2256	
VT303 20*65	2--3	1		2	6		0,25	8	7,5	0,25	8	2,25	36	118,8088
				2	5			3,8	3,8		3,8	1,56	11,856	
				2	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	49,572	
			ESTRIBOS	23	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	21,3808	
VT304 20*65	A-B	1		2	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	45,9	225,1116
				2	7			6,2	6,2		6,2	3,06	37,944	
				2	6			6,5	6,5		6,5	2,25	29,25	
				2	8		0,35	10,4	9,7	0,35	10,4	4	83,2	
			ESTRIBOS	31	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	28,8176	
VT305 20*65	B	1		2	6		0,25	3,15	2,65	0,25	3,15	2,25	14,175	34,8572
				2	6		0,25	3,15	2,65	0,25	3,15	2,25	14,175	
			ESTRIBOS	7	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	6,5072	
VT306 20*65	B	1		2	6		0,25	3,1	2,6	0,25	3,1	2,25	13,95	34,4072
				2	6		0,25	3,1	2,6	0,25	3,1	2,25	13,95	
			ESTRIBOS	7	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	6,5072	
VT311 20*65	1-1'-2	1		2	6		0,25	8,28	7,78	0,25	8,28	2,25	37,26	103,8304
				2	4			3,5	3,5		3,5	1	7	
				2	6		0,25	8,28	7,78	0,25	8,28	2,25	37,26	
			ESTRIBOS	24	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	22,3104	
VT313	3	2		2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	25,29	63,5944
				2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	25,29	

CONSORCIO URBANOVA SED
















CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
20*65			ESTRIBOS	7	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	13,0144	
VT314 20*65	3	1		2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	22,005	56,0948
				2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	22,005	
			ESTRIBOS	13	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	12,0848	
VT317 20*65	4-5-6-7-8-9	2		2	6		0,25	11,7	11,45		11,7	2,25	105,3	969,2288
				2	6			7,6	7,6		7,6	2,25	68,4	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	69,3	
				2	6			11,9	11,65	0,25	11,9	2,25	107,1	
				2	5			2	2		2	1,56	12,48	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	6		0,25	7,2	6,95		7,2	2,25	64,8	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	72,9	
				2	6			8	8		8	2,25	72	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	69,3	
				2	6			9,3	9,05	0,25	9,3	2,25	83,7	
			ESTRIBOS	114	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	211,9488	
				2	6		0,25	11,8	11,55		11,8	2,25	53,1	
				2	6			7,6	7,6		7,6	2,25	34,2	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			11,9	11,65	0,25	11,9	2,25	53,55	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4		0,2	10,45	10,25		10,45	1	20,9	
				2	4			10,2	10,2		10,2	1	20,4	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT317A 15*85	1-1'-2-3-4-5-6-7-8-9	1		2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	15,6	1035,306
				2	4	B		7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4	B C		7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4	B		7,6	7,6		7,6	1	15,2	
				2	4	B C		10,7	10,5	0,2	10,7	1	21,4	
				2	4	A B	0,2	5,5	5,3		5,5	1	11	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4	B		5,8	5,8		5,8	1	11,6	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4	B		7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4	B		7,6	7,6		7,6	1	15,2	
				2	4	B		7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4	B C		5,6	5,4	0,2	5,6	1	11,2	
				2	6	A B	0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	32,85	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6	B C		9,4	9,15	0,25	9,4	2,25	42,3	
			ESTRIBOS	185	3	0.10 0.23 0.23	0,1	1,96	1,76	0,1	1,96	0,56	203,056	
VT318 20*65	1-1'-2	1		2	6	A B C	0,25	9,51	9,01	0,25	9,51	2,25	42,795	122,5388
				2	5	B		3,5	3,5		3,5	1,56	10,92	
				2	6	A B C	0,25	9,51	9,01	0,25	9,51	2,25	42,795	
			ESTRIBOS	28	3	G= 0.10 0.59 0.15	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	26,0288	
VT320 20*65	11	2		2	6	A B C	0,25	3,76	3,26	0,25	3,76	2,25	33,84	86,272
				2	6	A B C	0,25	3,76	3,26	0,25	3,76	2,25	33,84	
			ESTRIBOS	10	3	G= 0.10 0.59 0.15	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	18,592	

CONSORCIO URBANOVA SED

























CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT321 20*65	12	1		2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	22,005	56,0948
				2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	22,005	
			ESTRIBOS	13	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	12,0848	
VT322 20*65	11	3		2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	37,935	92,6028
				2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	37,935	
			ESTRIBOS	6	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	16,7328	
VT323 20*65 20*85	12-13-14	2		2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	103,5	415,8376
				2	6			4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	41,4	
				2	6			2	2		2	2,25	18	
				2	4		0,2	1	0,6	0,2	1	1	4	
				2	4		0,2	1	0,6	0,2	1	1	4	
				2	6		0,25	8,9	8,65		8,9	2,25	80,1	
				2	6			7,2	6,95	0,25	7,2	2,25	64,8	
				2	6		0,25	1,1	0,6	0,25	1,1	2,25	9,9	
			ESTRIBOS	46	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	85,5232	
				2	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	4,6144	
VT323A 15*85	11-12-13-14	1		2	6		0,25	11,7	11,45		11,7	2,25	52,65	388,932
				2	6			11,4	11,15	0,25	11,4	2,25	51,3	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4		0,2	10,45	10	0,25	10,45	1	20,9	
				2	4			10	10		10	1	20	
				2	4			3,15	2,95	0,2	3,15	1	6,3	
				2	4		0,2	5,5	5,3		5,5	1	11	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4			5,8	5,8		5,8	1	11,6	
				2	4			5,15	4,95	0,2	5,15	1	10,3	
				2	6		0,25	8,8	8,55		8,8	2,25	39,6	
				2	6			6,6	6,6		6,6	2,25	29,7	
				2	6			8,7	8,45	0,25	8,7	2,25	39,15	

CONSORCIO URBANOVA SED














CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	70	3		0,1	1,96	1,76	0,1	1,96	0,56	76,832	
VT326 20*65	A-B	9		2	6		0,25	5,5	5,25		5,5	2,25	222,75	3006,8496
				2	8			7,9	7,55	0,35	7,9	4	568,8	
				2	7			3,3	3,3		3,3	3,06	181,764	
				2	8			3,3	3,3		3,3	4	237,6	
				2	7			5	5		5	3,06	275,4	
				2	6			5	5		5	2,25	202,5	
				2	8		0,35	9,5	9,15		9,5	4	684	
				2	6			4,5	4,25	0,25	4,5	2,25	182,25	
			ESTRIBOS	54	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	451,7856	
VT326A 15*85	A-B	1		2	6		0,25	5,5	5,25		5,5	2,25	24,75	389,4968
				2	8			7,9	7,55	0,35	7,9	4	63,2	
				2	8			3	3		3	4	24	
				2	6		0,25	6,9	6,65		6,9	2,25	31,05	
				2	6			6,2	5,95	0,25	6,2	2,25	27,9	
				2	6		0,25	4	3,75		4	2,25	18	
				2	6			9,1	8,85	0,25	9,1	2,25	40,95	
				2	6			3,6	3,6		3,6	2,25	16,2	
				2	8		0,35	9,5	9,15		9,5	4	76	
				2	6			4,5	4,25	0,25	4,5	2,25	20,25	
			ESTRIBOS	43	3		0,1	1,96	1,76	0,1	1,96	0,56	47,1968	
VT327 20*65	A-B	2		2	8		0,35	10,4	9,7	0,35	10,4	4	166,4	461,8032
				2	8			2,8	2,8		2,8	4	44,8	
				2	8			3,6	3,6		3,6	4	57,6	
				2	7		0,3	10,3	9,7	0,3	10,3	3,06	126,072	
			ESTRIBOS	36	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	66,9312	
				2	7		0,3	10,4	9,8	0,3	10,4	3,06	127,296	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPI E314

PLACA PISO 2 ZONA AULAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **41653,56**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT328 20*65	A-B	2		2	8	B		3	3		3	4	48	409,28
				2	7	B		3,5	3,5		3,5	3,06	42,84	
				2	7	A B C	0,3	10,3	9,7	0,3	10,3	3,06	126,072	
			ESTRIBOS	35	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	65,072	
Detalles		1		1449	3	B	0	1,2	1,2	0	1,2	0,56	973,728	2184,332
				15	3	B		1,67	1,67		1,67	0,56	14,028	
				96	5	B C		7,1	6,85	0,25	7,1	1,56	1063,296	
				100	3		0,1	2,38	2,03	0,25	2,38	0,56	133,28	
vigas acople V40X85		1		20	6	B		4,7			4,7	2,25	211,5	338,7
				106	4	.25 .20 M15 EØ1/2"@0.07m L=1.20m	0,2	1,2	0,25	0,15	1,2	1	127,2	
vigas acople V45X65		2		20	7	B		4,7			4,7	3,06	575,28	850,88
				106	4	.30 .20 M15 EØ1/2"@0.09m L=1.30m	0,2	1,3	0,3	0,15	1,3	1	275,6	
vigas acople V50X65		3		24	6	B		4,95			4,95	2,25	801,9	1247,1
				106	4	.30 .20 M15 EØ1/2"@0.09m L=1.30m	0,25	1,4	0,3	0,15	1,4	1	445,2	
vigas acople V60X85		1		20	7	B		6			6	3,06	367,2	538,2
				114	4	.35 .25 M15 EØ1/2"@0.065m L=1.50m	0,25	1,5	0,35	0,15	1,5	1	171	
														41653,56

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

columnas comedor 2 pedido

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 5108 -- ESTADO [Confirmado]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 04-04-2025 09:19:56
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

Ubicación: **PEDIDO 2 COLUMNAS ZONA COMEDOR**

Lista de producto N° 3

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
1	 a = 0.1 b = 0.82 c = 0.32	62	N° 3	2,48	86,11	[62]
2	 a = 0.1 b = 0.82 c = 0.42	266	N° 3	2,68	399,21	[266]
3	 a = 0.1 b = 0.32 c = 0.1	250	N° 3	0,52	72,80	[250]
4	 a = 0.1 b = 0.42 c = 0.1	771	N° 3	0,62	267,69	[771]
5	 a = 0.1 b = 0.82 c = 0.1	413	N° 3	1,02	235,91	[413]

Lista de producto N° 4

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
6	b = 8.65	28	N° 4	8,65	242,20	[28]

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 5108 -- ESTADO [Confirmado]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 04-04-2025 09:19:56
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
7	 a = 0.2 b = 2.7	42	N° 4	2,90	121,80	[42]

Lista de producto N° 5

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG.	PESO	UBICACIÓN

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

columnas comedor 2 pedido

				(m)	(kg)	
8	b = 9.1	15	N° 5	9,10	212,94	[15]
9	a = 0.25 b = 2.75	14	N° 5	3,00	65,52	[14]
10	a = 0.25 b = 6.7	56	N° 5	6,95	607,15	[56]

Lista de producto N° 6

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
11	b = 7.85	30	N° 6	7,85	529,88	[30]

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 5108 -- ESTADO [Confirmado]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 04-04-2025 09:19:56
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
12	b = 8.95	28	N° 6	8,95	563,85	[28]
13	b = 9.15	15	N° 6	9,15	308,81	[15]
14	b = 9.25	44	N° 6	9,25	915,75	[44]
15	b = 10.25	30	N° 6	10,25	691,88	[30]
16	a = 0.25 b = 3.0	14	N° 6	3,25	102,38	[14]
17	a = 0.25 b = 3.05	14	N° 6	3,30	103,95	[14]
18	a = 0.25 b = 6.9	14	N° 6	7,15	225,23	[14]

Lista de producto N° 7

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG.	PESO (kg)	UBICACIÓN

columnas comedor 2 pedido

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 5108 -- ESTADO [Confirmado]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 04-04-2025 09:19:56
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
19	b = 9.3	14	N° 7	9,30	398,41	[14]
20	b = 9.35	41	N° 7	9,35	1.173,05	[41]
21	a = 0.3 b = 6.9	60	N° 7	7,20	1.321,92	[60]

Lista de producto N° 8

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
22	b = 9.35	29	N° 8	9,35	1.084,60	[29]
23	b = 9.45	14	N° 8	9,45	529,20	[14]
24	b = 9.7	4	N° 8	9,70	155,20	[4]
25	a = 0.35 b = 3.15	71	N° 8	3,50	994,00	[71]

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 5108 -- ESTADO [Confirmado]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 04-04-2025 09:19:56
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
26	a = 0.35 b = 7.0	44	N° 8	7,35	1.293,60	[44]

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

columnas comedor 2 pedido

Lista de producto Nº 10

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
27		4	Nº 10	3,75	96,00	[4]

TOTALES PARA Acero Figurado		
DIÁMETRO	PRODUCTO	PESO TOTAL
Nº 3 - 3/8	Acero Figurado	1.061,72
Nº 4 - 1/2	Acero Figurado	364,00
Nº 5 - 5/8	Acero Figurado	885,61
Nº 6 - 3/4	Acero Figurado	3.441,71
Nº 7 - 7/8	Acero Figurado	2.893,38
Nº 8 - 1"	Acero Figurado	4.056,60
Nº 10 - 1" 1/4	Acero Figurado	96,00
TOTAL		12.799,02

PESO TOTAL	12.799,02

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	6	A B	0,25	6,4	6,15		6,4	2,25	28,8	
				2	6	B		7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B		7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	5	B		3	3		3	1,56	9,36	
				2	4	B		3	3		3	1	6	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B C		11,6	11,35	0,25	11,6	2,25	52,2	
				2	4	A B	0,2	7,75	7,55		7,75	1	15,5	
				2	4	B		12	12		12	1	24	
				2	4	B		8,2	8,2		8,2	1	16,4	
				2	4	B		7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4	B		10,8	10,8		10,8	1	21,6	
				2	4	B		12	12		12	1	24	
				2	4	B		10,3	10,3		10,3	1	20,6	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4	B		5,6	5,6		5,6	1	11,2	
				2	4	B C		5,4	5,2	0,2	5,4	1	10,8	
V408 15*85	1-1'-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	1		2	4	A B	0,2	11,95	11,75		11,95	1	23,9	1720,8776
				2	4	B		10,5	10,5		10,5	1	21	
				2	4	B		7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4	B		8	8		8	1	16	
				2	4	B		7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4	B		7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4	B		5,7	5,7		5,7	1	11,4	
				2	4	B		10,5	10,5		10,5	1	21	
				2	4	B		12	12		12	1	24	
				2	4	B		8,2	8,2		8,2	1	16,4	
				2	4	B		10,2	10,2		10,2	1	20,4	
				2	4	B C		3,2	3	0,2	3,2	1	6,4	
				2	6	A B	0,25	9,1	8,85		9,1	2,25	40,95	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B C		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6	B		8,2	8,2		8,2	2,25	36,9	
				2	6	B		8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
				2	5	B		4,5	4,5		4,5	1,56	14,04	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B C		8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	40,05	
			ESTRIBOS	301	3	G= 0,10 0,25 0,70	0,1	1,96	1,76	0,1	1,96	0,56	330,3776	
				2	7	A B	0,3	9,9	9,6		9,9	3,06	60,588	
				2	7	B		8	8		8	3,06	48,96	
				2	7	B		8	8		8	3,06	48,96	
				2	7	B		7,8	7,8		7,8	3,06	47,736	
				2	7	B		8	8		8	3,06	48,96	
				2	7	B		7,7	7,7		7,7	3,06	47,124	
				2	7	B		7,9	7,9		7,9	3,06	48,348	
				2	7	B		12	12		12	3,06	73,44	
				2	7	B		11,5	11,5		11,5	3,06	70,38	
				2	7	B		8	8		8	3,06	48,96	
				2	7	B		7,8	7,8		7,8	3,06	47,736	
				2	7	B C		5	4,7	0,3	5	3,06	30,6	
				2	5	A B C	0,25	8,02	7,52	0,25	8,02	1,56	25,0224	
				2	5	A B	0,25	8	7,75		8	1,56	24,96	
				2	5	B C		8,1	7,85	0,25	8,1	1,56	25,272	
				2	5	B		3	3		3	1,56	9,36	
				2	5	B		2	2		2	1,56	6,24	
				2	5	A B	0,25	4,1	3,85		4,1	1,56	12,792	
				2	5	B		12	12		12	1,56	37,44	
				2	5	B		8,1	8,1		8,1	1,56	25,272	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5	B		10	10		10	1,56	31,2	
				2	5	B		7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5	B		7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5	B		12	12		12	1,56	37,44	
				2	5	B		11,4	11,4		11,4	1,56	35,568	


CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V409 20*85 40*85	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	1		2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	2632,5904
				2	5			10,95	10,7	0,25	10,95	1,56	34,164	
				2	5			8,5	8,5		8,5	1,56	26,52	
				2	5			10,2	10,2		10,2	1,56	31,824	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5			8	8		8	1,56	24,96	
				2	5			5,6	5,6		5,6	1,56	17,472	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5			10,6	10,6		10,6	1,56	33,072	
				2	5			12	12		12	1,56	37,44	
				2	5			8,5	8,5		8,5	1,56	26,52	
				2	5			10	10		10	1,56	31,2	
				2	5			3,9	3,65	0,25	3,9	1,56	12,168	
				2	5		0,25	8,02	7,52	0,25	8,02	1,56	25,0224	
				2	5		0,25	12	11,75		12	1,56	37,44	
				2	5			4,2	3,95	0,25	4,2	1,56	13,104	
				2	7		0,3	5,3	5		5,3	3,06	32,436	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			8	8		8	3,06	48,96	
				2	7			11,8	11,8		11,8	3,06	72,216	
				2	7			12	12		12	3,06	73,44	
				2	7			9,2	9,2		9,2	3,06	56,304	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			10,1	9,85	0,25	10,1	3,06	61,812	
			ESTRIBOS	223	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	257,2528	
				223	3		0,1	2,46	2,26	0,1	2,46	0,56	307,2048	
				4	8		0,35	11,2	10,85		11,2	4	358,4	
				4	8			7,3	7,3		7,3	4	233,6	
				4	8			8,6	8,6		8,6	4	275,2	
				4	8			8,1	8,1		8,1	4	259,2	
				4	8			7,9	7,9		7,9	4	252,8	
				4	8			7,5	7,5		7,5	4	240	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V410 45*65 80*85 45*85	1`-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	2		4	8			8,5	8,5		8,5	4	272	10728,8592
				4	10			8,3	8,3		8,3	6,4	424,96	
				4	8			10	10		10	4	320	
				4	10			8,9	8,9		8,9	6,4	455,68	
				4	8			8,2	8,2		8,2	4	262,4	
				4	8			8	8		8	4	256	
				4	8			5,1	4,75	0,35	5,1	4	163,2	
				2	6			6	6		6	2,25	54	
				2	7			4,5	4,5		4,5	3,06	55,08	
				6	8		0,35	4,4	4,05		4,4	4	211,2	
				6	8			5,4	5,05	0,35	5,4	4	259,2	
				2	8		0,35	3	2,65		3	4	48	
				2	10			4,5	4,1	0,4	4,5	6,4	115,2	
				4	8			3	2,65	0,35	3	4	96	
				2	8		0,35	8,35	7,65	0,35	8,35	4	133,6	
				2	8		0,35	8,25	7,55	0,35	8,25	4	132	
				2	8		0,35	8,35	7,65	0,35	8,35	4	133,6	
				2	8		0,35	8,25	7,55	0,35	8,25	4	132	
				2	6		0,25	1,55	1,05	0,25	1,55	2,25	13,95	
				2	6		0,25	1,55	1,05	0,25	1,55	2,25	13,95	
				2	7		0,3	6,4	6,1		6,4	3,06	78,336	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	102,816	
				2	8			11	11		11	4	176	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	104,04	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	102,816	
				2	7			12	12		12	3,06	146,88	
				2	8			11,6	11,6		11,6	4	185,6	
				2	7		0,3	8,7	8,4		8,7	3,06	106,488	
				2	8			10,4	10,4		10,4	4	166,4	
				2	8			11,7	11,7		11,7	4	187,2	
				2	7			8,6	8,6		8,6	3,06	105,264	
				2	7			10,7	10,7		10,7	3,06	130,968	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	139,2	
				2	8			7,9	7,9		7,9	4	126,4	
				6	8		0,35	3	2,65		3	4	144	
				6	8		0,35	4,5	4,15		4,5	4	216	
				4	8			4,5	4,5		4,5	4	144	
				6	8			9,8	9,8		9,8	4	470,4	
				6	7			4	3,7	0,3	4	3,06	146,88	
				4	8			6,2	6,2		6,2	4	198,4	
				4	8			10,4	10,4		10,4	4	332,8	


















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				4	8			9,6	9,25	0,35	9,6	4	307,2	
				4	6		0,25	1,55	1,05	0,25	1,55	2,25	27,9	
				381	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	887,5776	
				48	3		0,1	3,18	2,98	0,1	3,18	0,56	170,9568	
			ESTRIBOS	57	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	158,3232	
				381	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	328,5744	
				153	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	166,2192	
V411 45*65	3--4	1		4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	287,244
				2	6			3,5	3,5		3,5	2,25	15,75	
				2	6			3,5	3,5		3,5	2,25	15,75	
				4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	
			ESTRIBOS	36	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	41,9328	
				36	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	15,5232	
V412 45*65	11--12	1		4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	291,744
				2	6			4	4		4	2,25	18	
				2	6			4	4		4	2,25	18	
				4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	
			ESTRIBOS	36	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	41,9328	
				36	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	15,5232	
				4	8		0,35	7,5	7,15		7,5	4	120	
				4	8			7,9	7,9		7,9	4	126,4	
				4	8			7,4	7,4		7,4	4	118,4	
				4	8			8,9	8,9		8,9	4	142,4	
				4	8			8	8		8	4	128	
				4	8			7,8	7,8		7,8	4	124,8	
				4	8			7,7	7,7		7,7	4	123,2	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				4	8	B		8,5	8,5		8,5	4	136	
				4	10	B		8,2	8,2		8,2	6,4	209,92	
				4	8	B		10,1	10,1		10,1	4	161,6	
				4	10	B		8,2	8,2		8,2	6,4	209,92	
				4	8	B		8,4	8,4		8,4	4	134,4	
				4	8	B C		12	11,65	0,35	12	4	192	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				3	8	B		4,5	4,5		4,5	4	54	
				3	8	B		4,5	4,5		4,5	4	54	
				4	8	B		4,5	4,5		4,5	4	72	
				2	6	B		4,5	4,5		4,5	2,25	20,25	
				4	8	B		4,5	4,5		4,5	4	72	
				2	8	B		4,5	4,5		4,5	4	36	
				2	6	A B	0,25	8,3	8,05		8,3	2,25	37,35	
				2	6	B		12	12		12	2,25	54	
				2	6	B		8,6	8,6		8,6	2,25	38,7	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B		10	10		10	2,25	45	
				2	6	B		6,9	6,9		6,9	2,25	31,05	
				2	6	B		8,7	8,7		8,7	2,25	39,15	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B C		10,75	10,5	0,25	10,75	2,25	48,375	
				2	6	A B	0,25	6	5,75		6	2,25	27	
				2	6	B		10,2	10,2		10,2	2,25	45,9	
				2	6	B		7	7		7	2,25	31,5	
				2	6	B		8,8	8,8		8,8	2,25	39,6	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6	B		12	12		12	2,25	54	
V413 45*85	1-1'-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	1		2	6	B		8,5	8,5		8,5	2,25	38,25	6045,668
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B		7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B		7,5	7,5		7,5	2,25	33,75	
				2	6	B C		6,25	6	0,25	6,25	2,25	28,125	
				2	7	A B	0,3	10,2	9,9		10,2	3,06	62,424	
				2	7	A B	0,3	5	4,7		5	3,06	30,6	
				2	7	B		8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	7	B		8,9	8,9		8,9	3,06	54,468	
				2	7	B		12	12		12	3,06	73,44	
				2	8	B		10,9	10,9		10,9	4	87,2	
				2	6	B		4	4		4	2,25	18	
				2	7	B		8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	8	B		9,9	9,9		9,9	4	79,2	
				2	7	B		9	9		9	3,06	55,08	
				2	7	B		8,6	8,6		8,6	3,06	52,632	
				2	8	B		12	12		12	4	96	
				2	7	B		10,6	10,6		10,6	3,06	64,872	
				2	7	B		3,5	3,5		3,5	3,06	21,42	
				2	8	B		9,7	9,7		9,7	4	77,6	
				2	8	B		8,5	8,5		8,5	4	68	
				2	8	B		6,4	6,4		6,4	4	51,2	
				4	8	B		5,6	5,6		5,6	4	89,6	
				2	8	B		5	5		5	4	40	
				4	8	B		9,7	9,7		9,7	4	155,2	
				4	8	B		5	5		5	4	80	
				4	8	B		10,7	10,7		10,7	4	171,2	
				2	8	B		10,8	10,8		10,8	4	86,4	
				2	8	B		8,5	8,5		8,5	4	68	
				2	8	B C		8	7,65	0,35	8	4	64	
				2	8	B C		10,3	9,95	0,35	10,3	4	82,4	
			ESTRIBOS	527	3	C= 0.10 0,27 0,37 #3	0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	731,8976	
			ESTRIBOS	527	3	C= 0.10 0,77 #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	286,2664	
V414 20*85	A-B	1		2	6	A B	0,25	5,8	5,55		5,8	2,25	26,1	236,994
				2	6	B C		8,5	8,25	0,25	8,5	2,25	38,25	
				2	4	B		2	2		2	1	4	
				2	4	A B		7,35	7,15	0,2	7,35	1	14,7	
				2	4	B C		6,85	6,65	0,2	6,85	1	13,7	
				2	4	A H	0,2	11,95	11,75		11,95	1	23,9	
				2	4	H C		2,25	2,05	0,2	2,25	1	4,5	
				2	6	A H	0,25	10,1	9,85		10,1	2,25	45,45	
				2	6	B C		4,5	4,25	0,25	4,5	2,25	20,25	
			ESTRIBOS	40	3	C= 0.10 0,78 0,74 #3	0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	46,144	
				4	7	A B C	0,3	11,8	11,2	0,3	11,8	3,06	144,432	

















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V415 45*85 45*65	A-B	1		2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	383,976
				2	5			2	1,75	0,25	2	1,56	6,24	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				4	6		0,25	10,3	9,8	0,25	10,3	2,25	92,7	
				4	7		0,3	2,7	2,1	0,3	2,7	3,06	33,048	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	15,2768	
				40	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	46,592	
				11	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,9752	
				40	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	17,248	
V416 45*85 45*65	A-B	1		4	7		0,3	7,1	6,8		7,1	3,06	86,904	510,248
				4	7			7,9	7,6	0,3	7,9	3,06	96,696	
				2	8		0,35	2,5	2,15		2,5	4	20	
				3	7			3	3		3	3,06	27,54	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	6		0,25	2,1	1,85		2,1	2,25	9,45	
				2	6			11,5	11,25	0,25	11,5	2,25	51,75	
				2	6		0,25	9	8,75		9	2,25	40,5	
				2	6			4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	20,7	
				4	7		0,3	2,7	2,4		2,7	3,06	33,048	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	15,2768	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				11	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,9752	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				4	7		0,3	8,2	7,9		8,2	3,06	100,368	
				4	7			6,8	6,5	0,3	6,8	3,06	83,232	
				2	8			2,5	2,5		2,5	4	20	
























CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V417 45*85 45*65	A-B	1		3	8			3	3		3	4	36	538,928
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	6		0,25	11	10,75		11	2,25	49,5	
				2	6			2,6	2,35	0,25	2,6	2,25	11,7	
				2	7		0,3	2	1,7		2	3,06	12,24	
				2	6		0,25	2,6	2,35		2,6	2,25	11,7	
				2	6			11	10,75	0,25	11	2,25	49,5	
				4	7		0,3	2,7	2,1	0,3	2,7	3,06	33,048	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	15,2768	
				59	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	68,7232	
				11	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,9752	
				59	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	25,4408	
V418 45*85 45*65	A-B	1		4	7		0,3	8,2	7,9		8,2	3,06	100,368	717,054
				4	7			6,8	6,5	0,3	6,8	3,06	83,232	
				2	7		0,3	4	3,7		4	3,06	24,48	
				2	8			2,8	2,45	0,35	2,8	4	22,4	
				6	7			2,5	2,5		2,5	3,06	45,9	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				4	8		0,35	4	3,65		4	4	64	
				2	8		0,35	11,6	11,25		11,6	4	92,8	
				2	6			2,6	2,35	0,25	2,6	2,25	11,7	
				2	8		0,35	2,7	2,35		2,7	4	21,6	
				2	6			11,5	11,25	0,25	11,5	2,25	51,75	
				4	7		0,3	2,7	2,1	0,3	2,7	3,06	33,048	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	15,2768	
				22	4		0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	46,64	
				40	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	46,592	
























CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				11	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,9752	
				22	4		0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	17,82	
				40	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	17,248	
				4	7		0,3	7,1	6,8		7,1	3,06	86,904	
				4	7			7,9	7,6	0,3	7,9	3,06	96,696	
				2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,3	
				2	8			3	2,65	0,35	3	4	24	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	6		0,25	2	1,75		2	2,25	9	
				2	6			11,6	11,35	0,25	11,6	2,25	52,2	
				2	6		0,25	9	8,75		9	2,25	40,5	
				2	6			4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	20,7	
V419 45*85 45*65	A-B	1		4	7		0,3	2,7	2,1	0,3	2,7	3,06	33,048	502,008
			ESTRIBOS	11	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	15,2768	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				11	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,9752	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				4	7		0,3	7,1	6,8		7,1	3,06	86,904	
				4	7			7,9	7,6	0,3	7,9	3,06	96,696	
				2	8		0,35	2,5	2,15		2,5	4	20	
				2	8			3	3		3	4	24	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	6		0,25	2	1,75		2	2,25	9	
				2	6			11,6	11,35	0,25	11,6	2,25	52,2	
				2	6		0,25	9	8,75		9	2,25	40,5	
				2	6			4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	20,7	
V420 45*85	A-B	1		4	7		0,3	2,7	2,1	0,3	2,7	3,06	33,048	506,708


























CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
45*65				11	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	15,2768	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,9752	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
V421 45*85 45*65	A-B	1		4	7		0,3	7,1	6,8		7,1	3,06	86,904	506,708
				4	7			7,9	7,6	0,3	7,9	3,06	96,696	
				2	8		0,35	2,5	2,15		2,5	4	20	
				2	8			3	3		3	4	24	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	6		0,25	2	1,75		2	2,25	9	
				2	6			11,6	11,35	0,25	11,6	2,25	52,2	
				2	6		0,25	9	8,75		9	2,25	40,5	
				2	6			4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	20,7	
				4	7		0,3	2,7	2,1	0,3	2,7	3,06	33,048	
				11	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	15,2768	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,9752	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				5	8		0,35	7,3	6,95		7,3	4	146	
				5	8			7,9	7,55	0,35	7,9	4	158	
				2	7		0,3	3,8	3,5		3,8	3,06	23,256	
				2	8			3	3		3	4	24	
				2	6		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	2,25	11,7	
				2	6		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	2,25	11,7	
				2	6		0,25	2	1,75		2	2,25	9	
				2	6			11,6	11,35	0,25	11,6	2,25	52,2	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V422 80*85 80*65	A-B	1		3	7	A B	0,3	9,1	8,8		9,1	3,06	83,538	783,47
				3	7	B C		5	5		5	3,06	45,9	
				5	8	A B C	0,35	2,8	-32,55	35	2,8	4	56	
			ESTRIBOS	11	3	G= 0.10 / 0.77 / 0.72 #3	0,1	3,18	2,98	0,1	3,18	0,56	19,5888	
				54	3	G= 0.10 / 0.57 / 0.72 #3	0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	84,0672	
				22	3	G= 0.10 / 0.77 #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	11,9504	
				108	3	G= 0.10 / 0.57 #3	0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	46,5696	
V423 80*85 80*65	A-B	1		5	8	A B	0,35	7,8	7,45		7,8	4	156	925,3568
				5	8	B C		7,9	7,55	0,35	7,9	4	158	
				2	7	A B	0,3	4	3,7		4	3,06	24,48	
				4	7	B		3	3		3	3,06	36,72	
				2	6	A B C	0,25	2,8	2,3	0,25	2,8	2,25	12,6	
				2	6	A B C	0,25	2,8	2,3	0,25	2,8	2,25	12,6	
				5	7	A B	0,3	6,4	6,1		6,4	3,06	97,92	
				5	8	B C		7,9	7,55	0,35	7,9	4	158	
				5	8	A B C	0,35	3	2,3	0,35	3	4	60	
			ESTRIBOS	13	3	G= 0.10 / 0.77 / 0.72 #3	0,1	3,18	2,98	0,1	3,18	0,56	23,1504	
				71	3	G= 0.10 / 0.57 / 0.72 #3	0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	110,5328	
				26	3	G= 0.10 / 0.77 #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	14,1232	
				142	3	G= 0.10 / 0.57 #3	0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	61,2304	
				3	8	A B	0,35	7,6	7,25		7,6	4	91,2	
				3	8	B C		7,5	7,15	0,35	7,5	4	90	
				2	6	A B	0,25	2	1,75		2	2,25	9	
				2	6	B		2	2		2	2,25	9	
				2	6	A B C	0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	2,25	11,7	
				2	6	A B C	0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	2,25	11,7	
				1	7	A H	0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	7,65	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V424 45*85 45*65	A-B	1		1	7			11,6	11,3	0,3	11,6	3,06	35,496	493,074
				2	7		0,3	9,2	8,9		9,2	3,06	56,304	
				2	7			4,9	4,6	0,3	4,9	3,06	29,988	
				3	8		0,35	2,8	2,1	0,35	2,8	4	33,6	
			ESTRIBOS	11	3	G= 0.10 0.77 0.37 #3	0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	15,2768	
				54	3	G= 0.10 0.57 0.37 #3	0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				11	3	G= 0.10 0.77 #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,9752	
				54	3	G= 0.10 0.57 #3	0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
V425 45*85 45*65	A-B	1		4	7		0,3	8,3	8		8,3	3,06	101,592	670,652
				4	8			7,4	7,05	0,35	7,4	4	118,4	
				4	8			3	3		3	4	48	
				3	8			3	3		3	4	36	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				4	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	84,456	
				4	6			7,1	6,85	0,25	7,1	2,25	63,9	
				4	7			2,5	2,5		2,5	3,06	30,6	
				4	7		0,3	2,7	2,1	0,3	2,7	3,06	33,048	
			ESTRIBOS	13	3	G= 0.10 0.77 0.37 #3	0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	18,0544	
				71	3	G= 0.10 0.57 0.37 #3	0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	82,7008	
				13	3	G= 0.10 0.77 #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	7,0616	
				71	3	G= 0.10 0.57 #3	0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	30,6152	
				3	8		0,35	8,1	7,75		8,1	4	97,2	
				3	7			7	6,7	0,3	7	3,06	64,26	
				3	6			2	2		2	2,25	13,5	
				2	6		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	2,25	11,7	
				2	6		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	2,25	11,7	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V426 45*85 45*65	A-B	1		1	7		0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	34,884	467,238
				1	7			2,7	2,4	0,3	2,7	3,06	8,262	
				2	7		0,3	2,4	2,1		2,4	3,06	14,688	
				2	7			11,7	11,4	0,3	11,7	3,06	71,604	
				3	8		0,35	2,8	2,1	0,35	2,8	4	33,6	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	15,2768	
				53	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	61,7344	
				11	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,9752	
				53	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	22,8536	
V427 45*85 45*65	A-B	1		4	7		0,3	7,1	6,8		7,1	3,06	86,904	521,658
				4	7			7,9	7,6	0,3	7,9	3,06	96,696	
				3	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	22,95	
				3	8			3	3		3	4	36	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	5		0,25	2,6	2,1	0,25	2,6	1,56	8,112	
				2	6		0,25	2	1,75		2	2,25	9	
				2	6			11,6	11,35	0,25	11,6	2,25	52,2	
				2	6		0,25	9	8,75		9	2,25	40,5	
				2	6			4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	20,7	
				4	7		0,3	2,7	2,1	0,3	2,7	3,06	33,048	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	15,2768	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				11	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	5,9752	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				3	8		0,35	7	6,65		7	4	84	
				3	8			8,2	7,85	0,35	8,2	4	98,4	
				2	6		0,25	3,2	2,95		3,2	2,25	14,4	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V428 45*85	A-B	1		2	7	B		3	3		3	3,06	18,36	671,55
				2	6	A B	0,25	8,15	7,9		8,15	2,25	36,675	
				2	6	B C		6,6	6,35	0,25	6,6	2,25	29,7	
				2	6	A B	0,25	5,45	5,2		5,45	2,25	24,525	
				2	6	B C		9,3	9,05	0,25	9,3	2,25	41,85	
				1	8	A B	0,35	10,5	10,15		10,5	4	42	
				1	8	B C		5,2	4,85	0,35	5,2	4	20,8	
				2	8	A B	0,35	4,1	3,75		4,1	4	32,8	
				2	8	B C		11,6	11,25	0,35	11,6	4	92,8	
			ESTRIBOS	70	3	G= 0.10 0.77 0.27 #3	0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	97,216	
				70	3	G= 0.10 0.77 #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	38,024	
VT405 20*65	1-1'-2-3	1		2	6	A B	0,25	11,9	11,65		11,9	2,25	53,55	201,0812
				2	6	B C		4,3	4,05	0,25	4,3	2,25	19,35	
				2	5	B		2	2		2	1,56	6,24	
				2	4	B		2	2		2	1	4	
				2	6	A B	0,25	7,7	7,45		7,7	2,25	34,65	
				2	6	B C		8,8	8,55	0,25	8,8	2,25	39,6	
			ESTRIBOS	47	3	C= 0.10 0.59 0.14 #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	43,6912	
VT405A 20*65	3	1		2	7	A B	0,3	2	1,7		2	3,06	12,24	68,3348
				2	6	A B C	0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	22,005	
				2	6	A B C	0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	22,005	
			ESTRIBOS	13	3	G= 0.10 0.59 0.14 #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	12,0848	
VT406 20*65	1-1'-2-3	1		2	6	A B	0,25	6,3	6,05		6,3	2,25	28,35	216,0496
				2	6	B C		11,2	10,95	0,25	11,2	2,25	50,4	
				2	5	B		2	2		2	1,56	6,24	
				2	4	B		2	2		2	1	4	
				2	6	A B	0,25	10,4	10,15		10,4	2,25	46,8	
				2	6	B C		7,3	7,05	0,25	7,3	2,25	32,85	
			ESTRIBOS	51	3	G= 0.10 0.59 0.14 #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	47,4096	
				2	6	A B C	0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	37,935	
				2	6	A B C	0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	37,935	




CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT407 20*65	3	3	ESTRIBOS	6	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	16,7328	92,6028
VT409 20*65	B	1		2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	15,075	37,5868
				2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	15,075	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	7,4368	
VT410 20*85	A	3		2	6		0,25	2,25	1,75	0,25	2,25	2,25	30,375	103,854
				2	4		0,2	2,15	1,75	0,2	2,15	1	12,9	
				2	4		0,2	2,15	1,75	0,2	2,15	1	12,9	
				2	6		0,25	2,25	1,75	0,25	2,25	2,25	30,375	
			ESTRIBOS	5	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	17,304	
VT411 20*85	4	2		2	6		0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	34,29	87,172
				2	6		0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	34,29	
			ESTRIBOS	10	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	18,592	
VT412 20*85	B	2		2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	30,15	75,1736
				2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	30,15	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	14,8736	
VT413 20*65	4-5-6-7-8-9	1		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	52,2	486,8544
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			11,9	11,65	0,25	11,9	2,25	53,55	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	6		0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	32,85	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			9,3	9,05	0,25	9,3	2,25	41,85	
			ESTRIBOS	114	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	105,9744	























CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT414 20*65	10--11	2		2	6		0,25	8	7,5	0,25	8	2,25	72	237,6176
				2	5			3,8	3,8		3,8	1,56	23,712	
				2	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	
			ESTRIBOS	23	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	42,7616	
VT415 20*65	4-5-6-7-8-9	1		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	52,2	486,8544
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			11,9	11,65	0,25	11,9	2,25	53,55	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	6		0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	32,85	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			9,3	9,05	0,25	9,3	2,25	41,85	
			ESTRIBOS	114	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	105,9744	
VT418 20*65	11	1		2	6		0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	17,145	43,586
				2	6		0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	17,145	
			ESTRIBOS	10	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	9,296	
VT419 20*65	12	2		2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	44,01	112,1896
				2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	44,01	
			ESTRIBOS	13	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	24,1696	
VT420A 15*87	12-13-14	1		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	52,2	262,27
				2	6			4,2	3,95	0,25	4,2	2,25	18,9	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4		0,2	10,35	10,15		10,35	1	20,7	
				2	4			5,45	5,25	0,2	5,45	1	10,9	
				2	4		0,2	5,55	5,35		5,55	1	11,1	
				2	4			10,25	10,05	0,2	10,25	1	20,5	
				2	6		0,25	7,2	6,95		7,2	2,25	32,4	
				2	6			8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	40,05	




CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	46	3		0,1	2	1,8	0,1	2	0,56	51,52	
VT424A 20*65	B	1		2	6		0,25	3,9	3,4	0,25	3,9	2,25	17,55	44,396
				2	6		0,25	3,9	3,4	0,25	3,9	2,25	17,55	
			ESTRIBOS	10	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	9,296	
VT420 20*65 20*85	12-13-14	2		2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	103,5	435,1376
				2	6			5,1	4,85	0,25	5,1	2,25	45,9	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	22,5	
				2	4		0,2	1,5	1,1	0,2	1,5	1	6	
				2	4		0,2	1,5	1,1	0,2	1,5	1	6	
				2	6		0,25	8,8	8,55		8,8	2,25	79,2	
				2	6			7,5	7,25	0,25	7,5	2,25	67,5	
				2	6		0,25	1,6	1,1	0,25	1,6	2,25	14,4	
			ESTRIBOS	46	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	85,5232	
				2	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	4,6144	
VT421 20*65 20*85	A-B	13		2	7		0,3	6,5	6,2		6,5	3,06	517,14	3045,7804
				2	6			8,4	8,15	0,25	8,4	2,25	491,4	
				2	7			2,2	2,2		2,2	3,06	175,032	
				2	5		0,25	2,25	1,75	0,25	2,25	1,56	91,26	
				2	5		0,25	2,25	1,75	0,25	2,25	1,56	91,26	
				2	5			3,8	3,8		3,8	1,56	154,128	
				2	6			9,6	9,6		9,6	2,25	561,6	
				2	6			4,2	3,95	0,25	4,2	2,25	245,7	
				2	7		0,3	2,35	1,75	0,3	2,35	3,06	186,966	
			ESTRIBOS	4	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	59,9872	
				39	3		0,12	1,66	1,42	0,12	1,66	0,56	471,3072	
VT422 20*65	A-B	4		2	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	183,6	868,3616
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	112	
				2	6			3	3		3	2,25	54	
				2	8			3,8	3,8		3,8	4	121,6	
				2	7		0,3	10,3	9,7	0,3	10,3	3,06	252,144	




















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	39	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	145,0176	
VT424 20*65 20*85	A-B	1		2	7		0,3	6,4	6,1		6,4	3,06	39,168	235,9918
				2	6			8,5	8,25	0,25	8,5	2,25	38,25	
				2	7		0,3	3,2	2,9		3,2	3,06	19,584	
				2	5		0,25	2,25	1,75	0,25	2,25	1,56	7,02	
				2	5		0,25	2,25	1,75	0,25	2,25	1,56	7,02	
				2	6			9,7	9,7		9,7	2,25	43,65	
				2	6			4,1	3,85	0,25	4,1	2,25	18,45	
				2	6		0,25	2,25	1,75	0,25	2,25	2,25	10,125	
				2	5			3,8	3,8		3,8	1,56	11,856	
			ESTRIBOS	4	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	4,6144	
				39	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	36,2544	
VT425 20*85	A-B	1		2	6		0,25	5,5	5,25		5,5	2,25	24,75	259,0204
				2	6			7,8	7,55	0,25	7,8	2,25	35,1	
				2	4		0,2	11,05	10,85		11,05	1	22,1	
				2	4			2,25	2,05	0,2	2,25	1	4,5	
				2	4		0,2	3,85	3,65		3,85	1	7,7	
				2	4			9,45	9,25	0,2	9,45	1	18,9	
				2	7			6,5	6,5		6,5	3,06	39,78	
				2	6		0,25	11	10,75		11	2,25	49,5	
				2	6			2,6	2,35	0,25	2,6	2,25	11,7	
			ESTRIBOS	39	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	44,9904	
VT426 20*65	12	2		2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	25,29	61,7352
				2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	25,29	
			ESTRIBOS	6	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	11,1552	
Detalles		1		1821	3		0	1,2	1,2	0	1,2	0,56	1223,712	2434,316
				15	3			1,67	1,67		1,67	0,56	14,028	
				96	5			7,1	6,85	0,25	7,1	1,56	1063,296	
				100	3		0,1	2,38	2,03	0,25	2,38	0,56	133,28	
				24	7			6			6	3,06	1762,56	


CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **43702,25**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
vigas acople V45X65	PL318	4		106	4		0,25	1,4	0,3	0,15	1,4	1	593,6	2356,16
vigas acople V45X65	PL319	3		20	7			4,7			4,7	3,06	862,92	1307,52
				114	4		0,2	1,3	0,3	0,15	1,3	1	444,6	
														43702,25

PANTALLAS COMEDOR PEDIDO DEL2AL5 PISO

TOTALES PARA Acero Figurado		
DIÁMETRO	PRODUCTO	PESO TOTAL
N° 3 - 3/8	Acero Figurado	31.689,14
N° 4 - 1/2	Acero Figurado	15.343,84
N° 5 - 5/8	Acero Figurado	7.435,27

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 4769 -- ESTADO [Borrador]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-03-2025 14:56:59
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

N° 6 - 3/4	Acero Figurado	8.638,76
N° 8 - 1"	Acero Figurado	2.420,00
TOTAL		65.527,02

PESO TOTAL	65.527,02

Lista de barras 1"

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
1	9.55	21	1"	9.55	796.79	
2	9.50	16	1"	9.50	603.90	
3	9.35	27	1"	9.35	1002.98	

Peso total barras 1" =2403.67 kg

Lista de barras 3/4"

4	10.55	16	3/4"	10.55	377.27	
5	10.50	16	3/4"	10.50	375.48	
6	10.25	16	3/4"	10.25	366.54	
7	9.70	16	3/4"	9.70	346.87	
8	9.50	18	3/4"	9.50	382.18	
9	9.30	21	3/4"	9.30	436.50	

PazdelRio

CONTRATIST CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTO LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO Nc CO1.PCCNTR.5698312

PANTALLAS COMEDOR PEDIDO DEL2AL5 PISO

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
10	9.25	5	3/4"	9.25	103.37	
11	9.05	11	3/4"	9.05	222.49	
12	9.00	58	3/4"	9.00	1166.67	
13	8.95	5	3/4"	8.95	100.02	
14	8.80	32	3/4"	8.80	629.38	
15	8.75	60	3/4"	8.75	1173.38	
16	8.35	60	3/4"	8.35	1119.73	
17	5.30	10	3/4"	5.30	118.45	
18	5.10	4	3/4"	5.10	45.59	
19	4.85	68	3/4"	4.85	737.10	
20	4.75	16	3/4"	4.75	169.86	
21	4.70	17	3/4"	4.70	178.58	
22	4.60	25	3/4"	4.60	257.02	
23	0.30 / 1.60	34	3/4"	1.90	144.38	
24	0.30 / 1.40	34	3/4"	1.70	129.18	

Peso total barras 3/4" =8580.05 kg

Lista de barras 5/8"

25	10.45	30	5/8"	10.45	486.55	
26	10.25	60	5/8"	10.25	954.48	
27	10.15	18	5/8"	10.15	283.55	
28	9.65	26	5/8"	9.65	389.40	
29	9.60	16	5/8"	9.60	238.39	
30	9.30	18	5/8"	9.30	259.80	
31	9.10	56	5/8"	9.10	790.90	
32	9.05	26	5/8"	9.05	365.19	
33	8.75	34	5/8"	8.75	461.72	
34	4.70	421	5/8"	4.70	3070.94	
35	0.25 / 1.30	40	5/8"	1.55	96.22	

Peso total barras 5/8" =7397.14 kg

Lista de barras 1/2"

36	10.20	11	1/2"	10.20	111.53	
37	9.10	18	1/2"	9.10	162.82	
38	8.55	12	1/2"	8.55	101.98	
39	7.14	592	1/2"	7.14	4201.52	
40	6.70	13	1/2"	6.70	86.58	
41	4.70	293	1/2"	4.70	1368.84	
42	4.65	16	1/2"	4.65	73.95	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATIST CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTO LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO Nc CO1.PCCNTR.5698312

PANTALLAS COMEDOR PEDIDO DEL2AL5 PISO

Acero colombiano hecho con el corazón

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
43	4.60	1547	1/2"	4.60	7073.50	
44	4.45	60	1/2"	4.45	265.40	
45	3.25	38	1/2"	3.25	122.76	
46	3.19	394	1/2"	3.19	1249.32	
47	0.20 / 2.55	12	1/2"	2.75	32.80	
48	0.20 / 1.20	288	1/2"	1.40	400.78	

Peso total barras 1/2'' =15251.78 kg













Lista de barras 3/8''

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
49	7.14	734	3/8"	7.14	2934.83	
50	h, b=0.39 h=1.90 g=0.10	172	3/8"	4.78	460.41	
51	4.60	63	3/8"	4.60	162.29	
52	h, b=0.34 h=1.49 g=0.10	312	3/8"	3.86	674.42	
53	h, b=0.34 h=1.44 g=0.10	468	3/8"	3.76	985.42	

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
54	h, b=0.34 h=1.24 g=0.10	168	3/8"	3.36	316.11	
55	3.19	730	3/8"	3.19	1304.07	
56	h, b=0.34 h=0.99 g=0.10	112	3/8"	2.86	179.38	
	h, b=0.34 h=0.94 g=0.10					

CONTRATIST CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTO LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO Nc CO1.PCCNTR.5698312

PANTALLAS COMEDOR PEDIDO DEL2AL5 PISO

	DIAGRAMA	CANTIDAD	DIAM.	LONG. (m)	PESO	UBICACION
57		156	3/8"	2.76	241.11	
58		624	3/8"	2.46	859.62	
59		2078	3/8"	2.19	2548.46	
60		156	3/8"	2.16	188.70	
61		172	3/8"	2.10	202.27	
62		262	3/8"	2.06	302.24	
63		898	3/8"	1.76	885.07	
64		312	3/8"	1.69	295.28	
65		468	3/8"	1.64	429.81	
66		168	3/8"	1.44	135.48	
67		56	3/8"	1.35	42.34	
68		112	3/8"	1.19	74.64	
69		156	3/8"	1.14	99.59	
70		624	3/8"	0.94	328.47	
71		262	3/8"	0.74	108.57	
72		19521	3/8"	0.59	6449.74	
73		37942	3/8"	0.54	11473.66	

Peso total barras 3/8" =31681.97 kg





















PESO TOTAL = 65314.62 kg

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**






Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V500 45*1.80 45*65	11-12-13-14	1		3	7		0,3	3	2,7		3	3,06	27,54	1426,271
				3	8			4	4		4	4	48	
				3	7			3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
				3	8		0,35	8	7,65		8	4	96	
				3	7			8	8		8	3,06	73,44	
				3	8			8,2	8,2		8,2	4	98,4	
				3	8			5,1	4,75	0,35	5,1	4	61,2	
				3	8		0,35	4,55	4,2		4,55	4	54,6	
				5	8		0,35	3	2,65		3	4	60	
				2	7			4	4		4	3,06	24,48	
				5	6		0,25	4,35	3,85	0,25	4,35	2,25	48,9375	
				5	6		0,25	4,35	3,85	0,25	4,35	2,25	48,9375	
				1	8			10,7	10,7		10,7	4	42,8	
				1	7			8,8	8,8		8,8	3,06	26,928	
				1	8			7,7	7,35	0,35	7,7	4	30,8	
				2	8			8,1	8,1		8,1	4	64,8	
				2	7			8,7	8,7		8,7	3,06	53,244	
				2	8			10,4	10,05	0,35	10,4	4	83,2	
				6	8		0,35	4,55	3,85	0,35	4,55	4	109,2	
				2	8			4,2	4,2		4,2	4	33,6	
				2	6			4,5	4,5		4,5	2,25	20,25	
			ESTRIBOS	30	3		0,1	4,38	4,18	0,1	4,38	0,56	73,584	
				114	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	132,7872	
				30	3		0,1	1,92	1,72	0,1	1,92	0,56	32,256	
				114	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	49,1568	
V501 40*65	11	1		4	8		0,35	6,6	5,9	0,35	6,6	4	105,6	222,8952
				3	7			3	3		3	3,06	27,54	
				4	6		0,25	6,4	5,9	0,25	6,4	2,25	57,6	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**
















Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	29	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	32,1552	
V502 45*1.80 45*65	11-12-13-14	1		3	8		0,35	8	7,65		8	4	96	1364,585
				3	7			8	8		8	3,06	73,44	
				3	8			8,2	8,2		8,2	4	98,4	
				3	8			5,1	4,75	0,35	5,1	4	61,2	
				3	8		0,35	4,55	3,85	0,35	4,55	4	54,6	
				3	8		0,35	3	2,65		3	4	36	
				3	8		0,35	3	2,65		3	4	36	
				3	7			4	4		4	3,06	36,72	
				2	7			4	4		4	3,06	24,48	
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28	
				5	6		0,25	4,35	3,85	0,25	4,35	2,25	48,9375	
				5	6		0,25	4,35	3,85	0,25	4,35	2,25	48,9375	
				1	8			10,8	10,8		10,8	4	43,2	
				1	7			8,7	8,7		8,7	3,06	26,622	
				1	8			7,7	7,35	0,35	7,7	4	30,8	
				2	7			8,1	8,1		8,1	3,06	49,572	
				2	7			8,7	8,7		8,7	3,06	53,244	
				2	8			10,4	10,05	0,35	10,4	4	83,2	
				6	8		0,35	4,55	3,85	0,35	4,55	4	109,2	
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28	
				2	7			3,5	3,5		3,5	3,06	21,42	
			ESTRIBOS	30	3		0,1	4,38	4,18	0,1	4,38	0,56	73,584	
				107	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	124,6336	
				30	3		0,1	1,92	1,72	0,1	1,92	0,56	32,256	
				107	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	46,1384	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**
















Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V503 45*65	E-F-G	1		3	8		0,35	3,2	2,85		3,2	4	38,4	856,552
				5	8			4	4		4	4	80	
				3	7			2,8	2,5	0,3	2,8	3,06	25,704	
				3	8		0,35	4,9	4,55		4,9	4	58,8	
				3	8			8,5	8,5		8,5	4	102	
				3	8			5	4,65	0,35	5	4	60	
				2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,3	
				3	8			4	4		4	4	48	
				2	8			2,8	2,45	0,35	2,8	4	22,4	
				1	8		0,35	7,9	7,55		7,9	4	31,6	
				1	8			10,3	9,95	0,35	10,3	4	41,2	
				2	8		0,35	10,6	10,25		10,6	4	84,8	
				2	8			7,6	7,25	0,35	7,6	4	60,8	
				2	6		0,25	2,8	2,55		2,8	2,25	12,6	
				3	7			4,2	4,2		4,2	3,06	38,556	
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5	
			ESTRIBOS	77	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	89,6896	
				77	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	33,2024	
V504 45*65	E-F-G	1		3	8		0,35	5	4,65		5	4	60	607,896
				3	7			8,4	8,4		8,4	3,06	77,112	
				3	7			4,8	4,45	0,35	4,8	3,06	44,064	
				3	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	33,6	
				3	8			3,8	3,8		3,8	4	45,6	
				3	8			2,8	2,45	0,35	2,8	4	33,6	
				2	7			3,5	3,5		3,5	3,06	21,42	
				2	6			3,8	3,8		3,8	2,25	17,1	
				2	5			4,2	3,95	0,25	4,2	1,56	13,104	
				1	7		0,3	7,8	7,5		7,8	3,06	23,868	
				1	7			10,1	9,8	0,3	10,1	3,06	30,906	
				2	7		0,3	10,4	10,1		10,4	3,06	63,648	
				2	6			7,5	7,25	0,25	7,5	2,25	33,75	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**






















Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	69	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	80,3712	
				69	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	29,7528	
V505 45*65	G	2		4	7		0,3	4,25	3,65	0,3	4,25	3,06	104,04	391,304
				4	8			2,5	2,15	0,35	2,5	4	80	
				4	7			2	1,7	0,3	2	3,06	48,96	
				4	7		0,3	4,25	3,65	0,3	4,25	3,06	104,04	
			ESTRIBOS	17	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	39,6032	
				17	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	14,6608	
V507 45*65	3--4	1		4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	339,756
				2	8			4	4		4	4	32	
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28	
				4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	
			ESTRIBOS	18	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	20,9664	
				18	4		0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	38,16	
				18	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	7,7616	
				18	4		0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	14,58	
				4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	
				2	7			4	4		4	3,06	24,48	
				2	7			4	4		4	3,06	24,48	
				4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V508 45*65	11--12	1	ESTRIBOS	18	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	20,9664	328,716
				18	4		0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	38,16	
				18	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	7,7616	
				18	4		0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	14,58	
				3	8		0,25	7,6	7,35		7,6	4	91,2	
				3	8			8	8		8	4	96	
				3	8			7,5	7,5		7,5	4	90	
				3	10			9	9		9	6,4	172,8	
				3	8			8	8		8	4	96	
				3	8			8	8		8	4	96	
				3	8			11,6	11,25	0,35	11,6	4	139,2	
				2	7			2,8	2,8		2,8	3,06	17,136	
				2	7			2,8	2,8		2,8	3,06	17,136	
				2	8			4	4		4	4	32	
				2	6			2,8	2,8		2,8	2,25	12,6	
				2	6			2,8	2,8		2,8	2,25	12,6	
				2	7			2,8	2,8		2,8	3,06	17,136	
				4	8			4	3,65	0,35	4	4	64	
				2	6		0,25	6,1	5,85		6,1	2,25	27,45	
				2	6			10,1	10,1		10,1	2,25	45,45	
				2	6			7,1	7,1		7,1	2,25	31,95	
				2	6			8,6	8,6		8,6	2,25	38,7	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			10,15	9,9	0,25	10,15	2,25	45,675	
				2	6		0,25	8,4	8,15		8,4	2,25	37,8	
				2	6			5,6	5,6		5,6	2,25	25,2	
				2	6			7,3	7,3		7,3	2,25	32,85	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**









Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V509 40*85	1-1'-2-3-4-5-6-7-8	1		2	6	B		8,4	8,4		8,4	2,25	37,8	2688,219
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6	B		7,3	7,3		7,3	2,25	32,85	
				2	6	B C		6	5,75	0,25	6	2,25	27	
				2	8	B		6	6		6	4	48	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				3	7	B C		3,8	3,5	0,3	3,8	3,06	34,884	
				1	7	A B	0,3	5	4,7		5	3,06	15,3	
				1	7	B		8,5	8,5		8,5	3,06	26,01	
				1	8	B		8,6	8,6		8,6	4	34,4	
				1	8	B		8,7	8,7		8,7	4	34,8	
				1	8	B		8,5	8,5		8,5	4	34	
				1	7	B		8,7	8,7		8,7	3,06	26,622	
				1	8	B		12	12		12	4	48	
				1	8	B C		3,9	3,55	0,35	3,9	4	15,6	
				2	8	A B	0,35	10,3	9,95		10,3	4	82,4	
				2	8	B		8,6	8,6		8,6	4	68,8	
				2	8	B		7,4	7,4		7,4	4	59,2	
				2	8	B		9,8	9,8		9,8	4	78,4	
				2	8	B		8,6	8,6		8,6	4	68,8	
				2	8	B		8,6	8,6		8,6	4	68,8	
				2	8	B C		9,5	9,15	0,35	9,5	4	76	
			ESTRIBOS	275	3	G= 0.10 0.27 0.32 #3	0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	366,52	
V511				3	7	A B C	0,3	11,8	11,2	0,3	11,8	3,06	108,324	
				2	6	A B	0,25	2	1,75		2	2,25	9	
				2	7	B C		2	1,7	0,3	2	3,06	12,24	
				3	7	A B C	0,3	10,4	9,8	0,3	10,4	3,06	95,472	
				3	5	A B	0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				8	3	G= 0.10 0.22 0.37 #3	0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**










Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
45*30 45*65	A-B	1	ESTRIBOS	40	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	46,592	310,512
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				40	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	17,248	
V510 40*85	9-10-11-12-13-14	1		3	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	33,6	2739,1332
				3	8			4,5	4,5		4,5	4	54	
				4	10		0,4	4,7	4,3		4,7	6,4	120,32	
				4	8			8,5	8,5		8,5	4	136	
				4	8			9,5	9,5		9,5	4	152	
				4	8			7,9	7,9		7,9	4	126,4	
				4	8			7,9	7,9		7,9	4	126,4	
				4	8			5,1	4,75	0,35	5,1	4	81,6	
				5	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	56	
				7	8			4,5	4,5		4,5	4	126	
				2	6		0,25	10,5	10,25		10,5	2,25	47,25	
				2	6			10,2	10,2		10,2	2,25	45,9	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			11	10,75	0,25	11	2,25	49,5	
				2	6		0,25	5,7	5,45		5,7	2,25	25,65	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			5,6	5,6		5,6	2,25	25,2	
				2	6			7,6	7,6		7,6	2,25	34,2	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			6,2	5,95	0,25	6,2	2,25	27,9	
				3	8			5,5	5,5		5,5	4	66	
				5	8			5,5	5,5		5,5	4	110	
				2	8			6,3	6,3		6,3	4	50,4	
				2	8			8,6	8,6		8,6	4	68,8	
				2	8			10,2	9,85	0,35	10,2	4	81,6	
				4	8		0,35	11,4	11,05		11,4	4	182,4	
				4	8			7	7		7	4	112	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**




Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	8			8,4	8,4		8,4	4	67,2	
				2	8			8,6	8,6		8,6	4	68,8	
				2	8			8,1	7,75	0,35	8,1	4	64,8	
			ESTRIBOS	138	4		0,12	2,42	2,18	0,12	2,42	1	333,96	
				119	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	158,6032	
V512 45*30 45*65	A-B	1		3	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	63,342	421,13
				3	7			8	7,7	0,3	8	3,06	73,44	
				2	8		0,35	2,5	2,15		2,5	4	20	
				3	7			3	3		3	3,06	27,54	
				3	5		0,25	3	2,75		3	1,56	14,04	
				1	7		0,3	9	8,7		9	3,06	27,54	
				1	7			5	4,7	0,3	5	3,06	15,3	
				2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,3	
				2	7			11,5	11,2	0,3	11,5	3,06	70,38	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				3	7		0,3	7,9	7,6		7,9	3,06	72,522	
				3	7			7	6,7	0,3	7	3,06	64,26	
				4	8			2,5	2,5		2,5	4	40	
				3	8			3	3		3	4	36	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				3	8		0,3	2,5	2,2		2,5	4	30	
				1	7		0,3	2,7	2,4		2,7	3,06	8,262	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**







Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V513 45*30 45*65	A-B	1		1	7			11,4	11,1	0,3	11,4	3,06	34,884	502,98
				2	7		0,3	11,5	11,2		11,5	3,06	70,38	
				2	7			2,6	2,3	0,3	2,6	3,06	15,912	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				16	4		0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	33,92	
				39	3		0,1	2,08	0,98	1	2,08	0,56	45,4272	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				16	4		0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	12,96	
				39	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	16,8168	
V514 45*30 45*65	A-B	1		3	7		0,3	8,2	7,9		8,2	3,06	75,276	417,738
				3	8			6,9	6,55	0,35	6,9	4	82,8	
				2	8			3	3		3	4	24	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	7		0,3	2,7	2,4		2,7	3,06	8,262	
				1	7			11,4	11,1	0,3	11,4	3,06	34,884	
				2	7		0,3	11,5	11,2		11,5	3,06	70,38	
				2	7			2,6	2,3	0,3	2,6	3,06	15,912	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				53	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	61,7344	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**






Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	53	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	22,8536	
V515 45*30 45*65	A-B	1	ESTRIBOS	3	7		0,3	7	6,7		7	3,06	64,26	446,958
				3	7			8	7,7	0,3	8	3,06	73,44	
				3	8		0,35	2,5	2,15		2,5	4	30	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	7		0,3	9	8,7		9	3,06	27,54	
				1	7			5,1	4,8	0,3	5,1	3,06	15,606	
				2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,3	
				2	7			11,6	11,3	0,3	11,6	3,06	70,992	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
V516 45*30 45*65	A-B	1		3	7		0,3	7,1	6,8		7,1	3,06	65,178	471,276
				3	8			8	7,7	0,3	8	4	96	
				3	8		0,35	2,5	2,15		2,5	4	30	
				4	7			3,5	3,5		3,5	3,06	42,84	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	7		0,3	9	8,7		9	3,06	27,54	
				1	7			5,1	4,8	0,3	5,1	3,06	15,606	
				2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,3	
				2	7			11,6	11,3	0,3	11,6	3,06	70,992	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**
















Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
V517 45*30 45*65	A-B	1		3	7		0,3	7	6,7		7	3,06	64,26	472,026
				3	8			8,1	7,8	0,3	8,1	4	97,2	
				3	8		0,35	2,5	2,15		2,5	4	30	
				4	7			3,5	3,5		3,5	3,06	42,84	
				3	5		0,25	3	2,75		3	1,56	14,04	
				1	7		0,3	9,1	8,8		9,1	3,06	27,846	
				1	7			5	4,7	0,3	5	3,06	15,3	
				2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,3	
				2	7			11,6	11,3	0,3	11,6	3,06	70,992	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				3	8		0,35	7,1	6,75		7,1	4	85,2	
				5	8			8,1	7,75	0,35	8,1	4	162	
				2	8		0,35	5,7	5,35		5,7	4	45,6	
				3	8			3,8	3,8		3,8	4	45,6	
				3	8		0,35	3	2,65		3	4	36	
				2	8			3,8	3,8		3,8	4	30,4	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**


















Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V518 45*30 80*65	A-B	1	ESTRIBOS	2	7		0,3	2,4	2,1		2,4	3,06	14,688	772,8028
				2	7			11,7	11,4	0,3	11,7	3,06	71,604	
				3	7		0,3	9,2	8,9		9,2	3,06	84,456	
				3	7			4,9	4,6	0,3	4,9	3,06	44,982	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	84,0672	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				108	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	46,5696	
V519 45*30 80*65	A-B	1	ESTRIBOS	3	7		0,3	7,5	7,2		7,5	3,06	68,85	700,5552
				5	7			8	7,7	0,3	8	3,06	122,4	
				2	7		0,3	6,1	5,8		6,1	3,06	37,332	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	7		0,3	3	2,7		3	3,06	18,36	
				3	5		0,25	3	2,75		3	1,56	14,04	
				5	7		0,3	6,1	5,8		6,1	3,06	93,33	
				5	7			8	7,7	0,3	8	3,06	122,4	
				10	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	7,728	
				71	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	110,5328	
				10	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	2,352	
				142	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	61,2304	
				3	7		0,3	7,2	6,9		7,2	3,06	66,096	
				3	7			7,8	7,5	0,3	7,8	3,06	71,604	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**





Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V520 45*30 45*65	A-B	1	ESTRIBOS	4	7		0,3	3	2,7		3	3,06	36,72	445,926
				3	7			3	3		3	3,06	27,54	
				3	5		0,25	3	2,75		3	1,56	14,04	
				1	7		0,3	2,4	2,1		2,4	3,06	7,344	
				1	7			11,7	11,4	0,3	11,7	3,06	35,802	
				2	7		0,3	9,2	8,9		9,2	3,06	56,304	
				2	7			4,9	4,6	0,3	4,9	3,06	29,988	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
V521 45*30 45*65	A-B	1		3	8		0,35	8,9	8,55		8,9	4	106,8	561,3468
				3	8			6,8	6,45	0,35	6,8	4	81,6	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				3	8			3	3		3	4	36	
				2	8			3	3		3	4	24	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				3	7		0,3	7,3	7		7,3	3,06	67,014	
				3	7			6,8	6,5	0,3	6,8	3,06	62,424	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				2	7			2,5	2,2	0,3	2,5	3,06	15,3	
				10	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	7,728	
				18	4		0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	38,16	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**



















Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				52	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	60,5696	
				10	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	2,352	
			ESTRIBOS	18	3		0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	0,56	8,1648	
				52	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	22,4224	
				3	7		0,3	9	8,7		9	3,06	82,62	
				3	8			6,1	5,75	0,35	6,1	4	73,2	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	7		0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	34,884	
				1	7			2,7	2,4	0,3	2,7	3,06	8,262	
				2	7		0,3	2,4	2,1		2,4	3,06	14,688	
				2	7			11,7	11,4	0,3	11,7	3,06	71,604	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
V522 45*30 45*65	A-B	1		8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	415,212
				53	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	61,7344	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				53	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	22,8536	
				3	8		0,35	7,1	6,75		7,1	4	85,2	
				3	8			8	7,65	0,35	8	4	96	
				3	8		0,35	2,5	2,15		2,5	4	30	
				4	7			3,5	3,5		3,5	3,06	42,84	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V523 45*30 45*65	A-B	1	ESTRIBOS	3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	491,298
				1	7		0,3	9,1	8,8		9,1	3,06	27,846	
				1	7			5	4,7	0,3	5	3,06	15,3	
				2	7		0,3	2,6	2,3		2,6	3,06	15,912	
				2	7			11,5	11,2	0,3	11,5	3,06	70,38	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
V524 40*30 40*85	A-B	1	ESTRIBOS	3	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	63,342	523,0056
				3	7			8	7,7	0,3	8	3,06	73,44	
				3	7		0,3	3	2,7		3	3,06	27,54	
				3	8			4	4		4	4	48	
				2	5		0,25	11	10,75		11	1,56	34,32	
				2	5			2,35	2,1	0,25	2,35	1,56	7,332	
				2	5		0,25	6,9	6,65		6,9	1,56	21,528	
				2	5			6,45	6,2	0,25	6,45	1,56	20,124	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	7		0,3	9,2	8,9		9,2	3,06	28,152	
				1	7			4,9	4,6	0,3	4,9	3,06	14,994	
				2	7		0,3	2,4	2,1		2,4	3,06	14,688	
				2	7			11,7	11,4	0,3	11,7	3,06	71,604	
				8	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	5,7344	
				59	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	78,6352	
				2	5		0,25	4,8	4,55		4,8	1,56	14,976	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V526 40*30		1		2	5	B		9,5	9,5		9,5	1,56	29,64	483,0832
				2	5	B		5,8	5,8		5,8	1,56	18,096	
				2	5	B		8	8		8	1,56	24,96	
				2	5	B C		11,4	11,15	0,25	11,4	1,56	35,568	
				2	4	B		2,5	2,5		2,5	1	5	
				2	3	B		2	2		2	0,56	2,24	
				2	6	A B	0,25	4,8	4,55		4,8	2,25	21,6	
				2	5	B		9,6	9,6		9,6	1,56	29,952	
				2	5	B		9	9		9	1,56	28,08	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5	B C		8,6	8,35	0,25	8,6	1,56	26,832	
			ESTRIBOS	309	3	G= 0.10 / 0.22 / 0.32 / #3	0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	221,4912	
V525		1		2	5	A B	0,25	6,1	5,85		6,1	1,56	19,032	676,1792
				2	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				2	5	B		7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5	B		7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5	B		8	8		8	1,56	24,96	
				2	5	B C		11,5	11,25	0,25	11,5	1,56	35,88	
				2	3	B		2	2		2	0,56	2,24	
				2	5	A B	0,25	10,7	10,45		10,7	1,56	33,384	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5	B C		7,1	6,85	0,25	7,1	1,56	22,152	
			ESTRIBOS	444	3	G= 0.10 / 0.22 / 0.32 / #3	0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	318,2592	
				2	7	A B	0,3	9,9	9,6		9,9	3,06	60,588	
				2	7	B		8	8		8	3,06	48,96	
				2	7	B		8	8		8	3,06	48,96	
				2	7	B		7,8	7,8		7,8	3,06	47,736	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**













Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	7	B		8	8		8	3,06	48,96	
				2	7	B		7,7	7,7		7,7	3,06	47,124	
				2	7	B		7,9	7,9		7,9	3,06	48,348	
				2	7	B		12	12		12	3,06	73,44	
				2	7	B		11,5	11,5		11,5	3,06	70,38	
				2	7	B		8	8		8	3,06	48,96	
				2	7	B		7,8	7,8		7,8	3,06	47,736	
				2	7	B C		4,2	3,9	0,3	4,2	3,06	25,704	
				2	5	B		2,5	2,5		2,5	1,56	7,8	
				2	5	B		3,5	3,5		3,5	1,56	10,92	
				2	5	A B	0,25	4,1	3,85		4,1	1,56	12,792	
				2	5	B		12	12		12	1,56	37,44	
				2	5	B		8,1	8,1		8,1	1,56	25,272	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				2	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				2	5	B		10,8	10,8		10,8	1,56	33,696	
				2	5	B		12	12		12	1,56	37,44	
				2	5	B		10,3	10,3		10,3	1,56	32,136	
				2	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				2	5	B		5,6	5,6		5,6	1,56	17,472	
				2	5	B C		5,45	5,2	0,25	5,45	1,56	17,004	
V527		1		2	5	A B	0,25	8,5	8,25		8,5	1,56	26,52	2268,3096
				2	5	B		10,2	10,2		10,2	1,56	31,824	
				2	5	B		7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5	B		8	8		8	1,56	24,96	
				2	5	B		7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5	B		7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5	B		5,7	5,7		5,7	1,56	17,784	
				2	5	B		10,5	10,5		10,5	1,56	32,76	
				2	5	B		12	12		12	1,56	37,44	
				2	5	B		8,2	8,2		8,2	1,56	25,584	
				2	5	B		10,2	10,2		10,2	1,56	31,824	
				2	5	B C		3,25	3	0,25	3,25	1,56	10,14	
				2	5	B		7,5	7,5		7,5	1,56	23,4	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	7		0,25	5,4	5,15		5,4	3,06	33,048	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			8,1	8,1		8,1	3,06	49,572	
				2	7			11,7	11,7		11,7	3,06	71,604	
				2	7			12	12		12	3,06	73,44	
				2	7			9,2	9,2		9,2	3,06	56,304	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			9,5	9,2	0,3	9,5	3,06	58,14	
			ESTRIBOS	291	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	335,6976	
				4	8		0,35	11,2	10,85		11,2	4	179,2	
				4	8			7,3	7,3		7,3	4	116,8	
				4	8			8,6	8,6		8,6	4	137,6	
				4	8			8,1	8,1		8,1	4	129,6	
				4	8			7,9	7,9		7,9	4	126,4	
				4	8			7,5	7,5		7,5	4	120	
				4	8			8,5	8,5		8,5	4	136	
				4	8			8,6	8,6		12	4	192	
				4	8			8,1	8,1		8,1	4	129,6	
				4	8			7,8	7,8		7,8	4	124,8	
				4	8			8	8		8	4	128	
				4	8			5,1	4,75	0,35	5,1	4	81,6	
				2	6		0,15		6,83	0,15	7,13	2,25	32,09	
				2	6		0,15		6,83	0,15	7,13	2,25	32,09	
				5	7		0,3	7,23	6,63	0,3	7,23	3,06	110,619	
				2	6			6	6		6	2,25	27	
				2	7			7,9	7,9		7,9	3,06	48,348	
				2	7			12	12		12	3,06	73,44	
				2	6			4	4		4	2,25	18	
				2	8			11	11		11	4	88	
				2	8			11,7	11,7		11,7	4	93,6	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**


















Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	7	B		8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7	B		8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7	B		8,6	8,6		8,6	3,06	52,632	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	7	B		12	12		12	3,06	73,44	
				2	7	B		10,7	10,7		10,7	3,06	65,484	
				2	7	B		4,5	4,5		4,5	3,06	27,54	
				2	8	B		11,6	11,6		11,6	4	92,8	
				2	8	B		8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8	B		7,9	7,9		7,9	4	63,2	
				2	8	B		8	8		8	4	64	
				4	10	B		8,6	8,6		8,6	6,4	220,16	
V528		1		2	6	A B	0,25	10,4	10,15		10,4	2,25	46,8	5463,22
				2	6	A B	0,25	5,6	5,35		5,6	2,25	25,2	
				6	8	A B	0,25	4,9	4,65		4,9	4	117,6	
				4	8	B C		12	11,65	0,35	12	4	192	
				8	8	B C		3,9	3,55	0,35	3,9	4	124,8	
				2	6	B C		5,55	5,3	0,25	5,55	2,25	24,975	
				2	6	B C		10,35	10,1	0,25	10,35	2,25	46,58	
				7	8	B		4,5	4,5		4,5	4	126	
				2	8	B		5	5		5	4	40	
				6	8	B C		12	11,65	0,35	12	4	288	
				2	6	B		6	6		6	2,25	27	
				2	8	B		10,2	10,2		10,2	4	81,6	
				2	8	B		6,3	6,3		6,3	4	50,4	
				2	6	B		4	4		4	2,25	18	
				2	8	B		11,9	11,9		11,9	4	95,2	
				2	8	B		8	8		8	4	64	
				2	6	A B C	0,25	8,75	8,25	0,25	8,75	2,25	39,375	
				2	6	A B C	0,25	8,75	8,25	0,25	8,75	2,25	39,375	
				5	7	A B C	0,3	8,85	8,25	0,3	8,85	3,06	135,405	
				80	3	G= 0.10 0.22 0.17 #3	0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	111,104	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**











Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				323	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	376,2304	
				117	3		0,12	2,52	2,28	0,12	2,52	0,56	165,1104	
			ESTRIBOS	80	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	43,456	
				323	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	139,2776	
				117	3		0,12	1,01	0,12	0,77	1,01	0,56	66,1752	
				2	6		0,25	6,2	5,95		6,2	2,25	27,9	
				2	6			8,1	7,85	0,25	8,1	2,25	36,45	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	4		0,2	7,55	7,35		7,55	1	15,1	
				2	4			6,65	6,45	0,2	6,65	1	13,3	
				2	4		0,2	4,3	4,1		4,3	1	8,6	
V529		1		2	4			9,9	9,7	0,2	9,9	1	19,8	252,244
				2	4			4	4		4	1	8	
				2	6		0,25	10,2	9,95		10,2	2,25	45,9	
				2	6			4,4	4,15	0,25	4,4	2,25	19,8	
			ESTRIBOS	40	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	46,144	
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	13,572	
				2	5		0,25	1,45	0,95	0,25	1,45	1,56	13,572	
VT500		3	ESTRIBOS	2	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	5,5776	32,7216
				2	6		0,25	6,4	5,9	0,25	6,4	2,25	28,8	
				2	6		0,25	6,4	5,9	0,25	6,4	2,25	28,8	
VT501		1	ESTRIBOS	17	3		0,1	1,76	1,56	0,1	1,76	0,56	16,7552	74,3552

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**




Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT502		1		2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75	314,272
				2	6			11,6	11,35	0,25	11,6	2,25	52,2	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				2	7			2,5	2,5		2,5	3,06	15,3	
				2	4			2,8	2,8		2,8	1	5,6	
				2	4			3	3		3	1	6	
				2	6		0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	32,85	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	40,05	
			ESTRIBOS	70	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	65,072	
VT503		3		2	6		0,25	2,85	2,35	0,25	2,85	2,25	38,475	93,6828
				2	6		0,25	2,85	2,35	0,25	2,85	2,25	38,475	
			ESTRIBOS	6	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	16,7328	
VT505		1		2	6		0,25	5	4,75		5	2,25	22,5	212,7916
				2	6			8,6	8,35	0,25	8,6	2,25	38,7	
				2	8			3	3		3	4	24	
				2	7			4,4	4,4		4,4	3,06	26,928	
				2	6		0,25	8	7,75		8	2,25	36	
				2	6			5,9	5,65	0,25	5,9	2,25	26,55	
			ESTRIBOS	41	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	38,1136	
VT505A		1		4	8		0,35	5,2	4,85		5,2	4	83,2	1093,9596
				4	8			8,5	8,5		8,5	4	136	
				4	8			5	4,65	0,35	5	4	80	
				5	6		0,25	11,2	10,95		11,2	2,25	126	
				5	6			5,9	5,65	0,25	5,9	2,25	66,375	
				5	6		0,25	6	5,75		6	2,25	67,5	
				5	6			11,1	10,85	0,25	11,1	2,25	124,875	
				2	8		0,35	8,1	7,75		8,1	4	64,8	
				2	8			10,1	9,75	0,35	10,1	4	80,8	
				2	8		0,35	10,4	10,05		10,4	4	83,2	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**

















Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	8			7,8	7,45	0,35	7,8	4	62,4	
			ESTRIBOS	51	3		0,1	4,16	3,96	0,1	4,16	0,56	118,8096	
VT506		4		2	5		0,25	4,15	3,65	0,25	4,15	1,56	51,792	144,4864
				2	5		0,25	4,15	3,65	0,25	4,15	1,56	51,792	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	40,9024	
VT507		1		2	5		0,25	10,5	10,25		10,5	1,56	32,76	153,808
				2	5			6,6	-18,4	25	6,6	1,56	20,592	
				2	5		0,25	8	7,75		8	1,56	24,96	
				2	5			9,3	9,05	0,25	9,3	1,56	29,016	
			ESTRIBOS	50	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	46,48	
VT508		1		2	6		0,25	12	11,75		12	2,25	54	201,0812
				2	6			4,2	3,95	0,25	4,2	2,25	18,9	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	6		0,25	7,7	7,45		7,7	2,25	34,65	
				2	6			8,8	8,55	0,25	8,8	2,25	39,6	
			ESTRIBOS	47	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	43,6912	
VT508A		1		2	6		0,25	10,3	10,05		10,3	2,25	46,35	242,19
				2	6			4,3	4,05	0,25	4,3	2,25	19,35	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4		0,2	9,15	8,95		9,15	1	18,3	
				2	4			5,45	5,25	0,2	5,45	1	10,9	
				2	4		0,2	4,75	4,55		4,75	1	9,5	
				2	4			9,85	9,65	0,2	9,85	1	19,7	
				2	6		0,25	7,6	7,35		7,6	2,25	34,2	
				2	6			7,3	7,05	0,25	7,3	2,25	32,85	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	42	3		0,1	2	1,8	0,1	2	0,56	47,04	
VT509		1		2	6		0,25	6,3	6,05		6,3	2,25	28,35	216,0496
				2	6			11,2	10,95	0,25	11,2	2,25	50,4	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	6		0,25	10,5	10,25		10,5	2,25	47,25	
				2	6			7,2	6,95	0,25	7,2	2,25	32,4	
			ESTRIBOS	51	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	47,4096	
VT510		1		2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	22,005	56,0948
				2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	22,005	
			ESTRIBOS	13	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	12,0848	
VT511		1		2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	12,645	30,8676
				2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	12,645	
			ESTRIBOS	6	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	5,5776	
VT512		1		2	6		0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	17,145	43,586
				2	6		0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	17,145	
			ESTRIBOS	10	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	9,296	
VT513		2		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	104,4	776,3472
				2	6			4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	41,4	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	69,3	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	69,3	
				2	5			2	2		2	1,56	12,48	
				2	5			2	2		2	1,56	12,48	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	6		0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	65,7	
				2	6			8	8		8	2,25	72	
				2	6			8	8		8	2,25	72	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**













Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	6	B C		8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	80,1	
			ESTRIBOS	91	3	C= 0.10 / 0.59 / 0.14 / #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	169,1872	
VT513A		1		2	6	A B	0,25	11,7	11,45		11,7	2,25	52,65	512,51
				2	6	B		7,5	7,5		7,5	2,25	33,75	
				2	6	B C		11,7	11,45	0,25	11,7	2,25	52,65	
				2	4	B		2	2		2	1	4	
				2	4	A B	0,2	10,35	10,15		10,35	1	20,7	
				2	4	B		7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4	B		7,4	7,4		7,4	1	14,8	
				2	4	B C		5,85	5,65	0,2	5,85	1	11,7	
				2	4	A B	0,2	3,15	2,95		3,15	1	6,3	
				2	4	B		10,1	10,1		10,1	1	20,2	
				2	4	B		7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4	B C		10,35	10,15	0,2	10,35	1	20,7	
				2	6	A B	0,25	8,9	8,65		8,9	2,25	40,05	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B C		7,2	6,95	0,25	7,2	2,25	32,4	
			ESTRIBOS	88	3	C= 0.10 / 0.81 / 0.09 / #3	0,1	2	1,8	0,1	2	0,56	98,56	
VT515		2		2	6	A B	0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	104,4	395,064
				2	6	B C		4,3	4,05	0,25	4,3	2,25	38,7	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	22,5	
				2	6	A B	0,25	7,4	7,15		7,4	2,25	66,6	
				2	6	B C		8,8	8,55	0,25	8,8	2,25	79,2	
			ESTRIBOS	45	3	C= 0.10 / 0.59 / 0.14 / #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	83,664	
VT516		1		2	6	A B C	0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	17,145	43,586
				2	6	A B C	0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	17,145	
			ESTRIBOS	10	3	C= 0.10 / 0.59 / 0.14 / #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	9,296	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**












Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT515A		1		2	6		0,25	8,03	7,53	0,25	8,03	2,25	36,135	137,35
				2	4		0,2	7,93	7,53	0,2	7,93	1	15,86	
				2	4		0,2	7,93	7,53	0,2	7,93	1	15,86	
				2	4			3,8	3,8		3,8	1	7,6	
				2	6		0,25	8,03	7,53	0,25	8,03	2,25	36,135	
			ESTRIBOS	23	3		0,1	2	1,8	0,1	2	0,56	25,76	
VT517		2		2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	44,01	112,1896
				2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	44,01	
			ESTRIBOS	13	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	24,1696	
VT518		2		2	6		0,25	11,4	11,15		11,4	2,25	102,6	412,3416
				2	6			5,2	4,95	0,25	5,2	2,25	46,8	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	22,5	
				2	6		0,25	7,2	6,95		7,2	2,25	64,8	
				2	6			9,6	9,35	0,25	9,6	2,25	86,4	
			ESTRIBOS	48	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	89,2416	
VT518A		1		2	6		0,25	11,4	11,15		11,4	2,25	51,3	274,26
				2	6			5,2	4,95	0,25	5,2	2,25	23,4	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4		0,2	10,35	10,15		10,35	1	20,7	
				2	4			6,2	6	0,2	6,2	1	12,4	
				2	4		0,2	5,55	5,35		5,55	1	11,1	
				2	4			11	10,8	0,2	11	1	22	
				2	6		0,25	7,2	6,95		7,2	2,25	32,4	
				2	6			9,6	9,35	0,25	9,6	2,25	43,2	
			ESTRIBOS	48	3		0,1	2	1,8	0,1	2	0,56	53,76	
				2	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	91,8	
				2	6			4	4		4	2,25	36	
				2	6			6,5	6,5		6,5	2,25	58,5	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**










Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT519		2		2	8		0,35	10,4	9,7	0,35	10,4	4	166,4	410,3352
			ESTRIBOS	31	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	57,6352	
VT520		3		2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	45,225	147,9354
				2	8		0,35	3,35	2,65	0,35	3,35	4	80,4	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	22,3104	
VT520A		2		2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	30,15	104,7576
				2	4		0,2	3,25	2,85	0,2	3,25	1	13	
				2	4		0,2	3,25	2,85	0,2	3,25	1	13	
				2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	30,15	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	18,4576	
VT521		8		2	6		0,25	5,5	5,25		5,5	2,25	198	1818,9152
				2	6			7,8	7,55	0,25	7,8	2,25	280,8	
				2	7			5,5	5,5		5,5	3,06	269,28	
				2	8		0,35	9,5	9,15		9,5	4	608	
				2	6			4,8	4,55	0,25	4,8	2,25	172,8	
			ESTRIBOS	39	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	290,0352	
VT522		4		2	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	183,6	868,7616
				2	8			3,2	3,2		3,2	4	102,4	
				2	6			3,2	3,2		3,2	2,25	57,6	
				2	8			4	4		4	4	128	
				2	7		0,3	10,3	9,7	0,3	10,3	3,06	252,144	
			ESTRIBOS	39	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	145,0176	
				2	4		0,2	2,1	1,7	0,2	2,1	1	12,6	
				2	4		0,2	2,1	1,7	0,2	2,1	1	12,6	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLACA 4TO PISO - AULAS - PARTE 1

TOTAL EJECUTADO **41186,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT523		3	ESTRIBOS	7	3		0,1	0,96	0,76	0,1	0,96	0,56	11,2896	36,4896
VT525		1		2	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	45,9	278,2616
				2	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	45,9	
				2	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	45,9	
				2	6			4,8	4,8		4,8	2,25	21,6	
				2	8		0,35	10,4	9,7	0,35	10,4	4	83,2	
			ESTRIBOS	31	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	35,7616	
VT526		2		2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	25,29	61,7352
				2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	25,29	
			ESTRIBOS	6	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	11,1552	
VT527		2		2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	25,29	61,7352
				2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	25,29	
			ESTRIBOS	6	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	11,1552	
Detalles		1		1480	3		0	1,2	1,2	0	1,2	0,56	994,56	2071,884
				15	3			1,67	1,67		1,67	0,56	14,028	
				96	5			7,1	6,85	0,25	7,1	1,56	1063,296	
vigas acople V40X65	PL 321/323	4		24	7			6			6	3,06	1762,56	2356,16
				106	4		0,25	1,4	0,3	0,15	1,4	1	593,6	
vigas acople V45X65		1		20	7			4,7			4,7	3,06	287,64	334,44
				36	4		0,2	1,3	0,3	0,15	1,3	1	46,8	

41186,13

CONSORCIO URBANOVA SED



CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

PANTALLAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **6274,35**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO no.	DIAGRAMA	A	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
PA7		1	1	21	4	B		9,55		9,55	1	200,55	200,55
PA7		1	1	5	7	B		9,3		9,3	3,06	142,29	142,29
PA7		1	1	17	7	B		4,7		4,7	3,06	244,494	244,49
PA6		1	1	43	7	B		9,2		9,2	3,06	1210,536	1210,54
PA3		1	1	62	7	B		9,2		9,2	3,06	1745,424	1745,42
PA11		1	1	34	5	B		8,75		8,75	1,56	464,1	464,10
PA11		1	1	78	4	B		4,6		4,6	1	358,8	358,80
PA8		1	1	24	4	B		8,55		8,55	1	205,2	205,20
PA8		1	1	92	4	B		4,6		4,6	1	423,2	423,20
PA3		1	1	176	3		0,39	1,4	0,1	3,78	0,56	372,56	372,56
		1	1	3000	3		0,1	0,34	0,1	0,54	0,56	907,20	907,20

TOTAL ACERO	6274,35



CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT400A 20*85	14	2		2	6		0,25	1,6	1,1	0,25	1,6	2,25	14,4	181,9392
				2	4		0,2	1,55	1,15	0,2	1,55	1	6,2	
				2	4		0,2	1,55	1,15	0,2	1,55	1	6,2	
				2	6		0,25	1,6	1,1	0,25	1,6	2,25	14,4	
			ESTRIBOS	61	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	140,7392	
VT401 20*85	11-12-13-14	1		2	6		0,25	7,5	7,25		7,5	2,25	33,75	486,2312
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			5,2	4,95	0,25	5,2	2,25	23,4	
				2	4			2,5	2,5		2,5	1	5	
				2	4			2,5	2,5		2,5	1	5	
				2	4		0,2	8,85	8,65		8,85	1	17,7	
				2	4			7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4			7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4			3,75	3,55	0,2	3,75	1	7,5	
				2	4		0,2	6,65	6,45		6,65	1	13,3	
				2	4			8,1	8,1		8,1	1	16,2	
				2	4			7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4			5,75	5,55	0,2	5,75	1	11,5	
				2	6		0,25	10,6	10,35		10,6	2,25	47,7	
				2	6			8,2	8,2		8,2	2,25	36,9	
				2	6			9,7	9,45	0,25	9,7	2,25	43,65	
			ESTRIBOS	92	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	106,1312	
VT400 20*65	14	1		2	5		0,25	5,21	4,71	0,25	5,21	1,56	16,2552	46,4544
				2	5		0,25	5,21	4,71	0,25	5,21	1,56	16,2552	
			ESTRIBOS	15	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	13,944	
				2	8		0,35	4,45	3,75	0,35	4,45	4	35,6	
				2	8		0,35	4,6	4,25		4,6	4	36,8	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	7			8	8		8	3,06	48,96	
				2	6			5,2	4,95	0,25	5,2	2,25	23,4	
				2	5			3	3		3	1,56	9,36	
				2	7			3,5	3,5		3,5	3,06	21,42	
				2	4		0,2	1,5	1,1	0,2	1,5	1	3	
				2	6		0,25	4,25	3,75	0,25	4,25	2,25	19,125	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT401A 20*65 20*85	11-12-13-14	1		2	6	B		2,6	2,6		2,6	2,25	11,7	474,0726
				2	6	A B	0,25	7,2	6,95		7,2	2,25	32,4	
				2	6	B		10,4	10,4		10,4	2,25	46,8	
				2	6	B		3,5	3,5		3,5	2,25	15,75	
				2	7	B C		7,2	6,9	0,3	7,2	3,06	44,064	
				2	4	A B C	0,2	1,5	1,1	0,2	1,5	1	3	
				2	6	A B C	0,25	1,6	1,1	0,25	1,6	2,25	7,2	
			ESTRIBOS	84	3	C= 0.10 0.59 0.14 #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	78,0864	
				2	3	C= 0.10 0.79 0.14 #3	0,12	2,06	1,82	0,12	2,06	0,56	2,3072	
VT402 20*85	D-E-F-G	1		2	6	A B	0,25	4,3	4,05		4,3	2,25	19,35	439,3664
				2	6	B		8,4	8,4		8,4	2,25	37,8	
				2	6	B		8,5	8,5		8,5	2,25	38,25	
				2	6	B C		5	4,75	0,25	5	2,25	22,5	
				2	4	B		2,5	2,5		2,5	1	5	
				2	4	B		2,5	2,5		2,5	1	5	
				2	4	A B	0,2	5,5	5,3		5,5	1	11	
				2	4	B		8,3	8,3		8,3	1	16,6	
				2	4	B		8,7	8,7		8,7	1	17,4	
				2	4	B C		3,55	3,35	0,2	3,55	1	7,1	
				2	4	A B	0,2	3,3	3,1		3,3	1	6,6	
				2	4	B		8,3	8,3		8,3	1	16,6	
				2	4	B		8,5	8,5		8,5	1	17	
				2	4	B C		5,95	5,75	0,2	5,95	1	11,9	
				2	4	B		2	2		2	1	4	
				2	6	A B	0,25	9,5	9,25		9,5	2,25	42,75	
				2	6	B		9	9		9	2,25	40,5	
				2	6	B C		7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65	
			ESTRIBOS	74	3	C= 0.10 0.79 #3	0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	85,3664	
VT402A				2	6	A B C	0,25	5,72	5,22	0,25	5,72	2,25	25,74	
				2	4	A B C	0,2	1,07	0,67	0,2	1,07	1	2,14	
				2	4	A B C	0,2	1,07	0,67	0,2	1,07	1	2,14	
				2	6	A B C	0,25	5,4	4,9	0,25	5,4	2,25	24,3	
				2	6	A B C	0,25	1,17	0,67	0,25	1,17	2,25	5,265	


















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
20*65 20*85	G	1	ESTRIBOS	15	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	13,944	75,8362
				2	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	2,3072	
VT402B 20*65 20*85	D-E-F-G	1		2	6		0,25	4,6	4,35		4,6	2,25	20,7	362,4626
				2	6			8,4	8,4		8,4	2,25	37,8	
				2	6			8,5	8,5		8,5	2,25	38,25	
				2	6			4,7	4,45	0,25	4,7	2,25	21,15	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	4		0,2	1,07	0,67	0,2	1,07	1	2,14	
				2	4		0,2	1,07	0,67	0,2	1,07	1	2,14	
				2	5			3,5	3,5		3,5	1,56	10,92	
				2	7		0,3	7,5	7,2		7,5	3,06	45,9	
				2	6			9,3	9,3		9,3	2,25	41,85	
				2	6			9,5	9,25	0,25	9,5	2,25	42,75	
				2	6		0,25	1,17	0,67	0,25	1,17	2,25	5,265	
			ESTRIBOS	74	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	68,7904	
				2	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	2,3072	
VT403 20*65 20*85	G	1		2	6		0,25	5,72	5,22	0,25	5,72	2,25	25,74	90,4936
				2	4		0,2	1,07	0,67	0,2	1,07	1	2,14	
				2	4		0,2	1,07	0,67	0,2	1,07	1	2,14	
				2	6			2,7	2,7		2,7	2,25	12,15	
				2	6		0,25	5,4	4,9	0,25	5,4	2,25	24,3	
				2	7		0,3	1,27	0,67	0,3	1,27	3,06	7,7724	
			ESTRIBOS	15	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	13,944	
				2	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	2,3072	
				2	6		0,25	7,5	7,25		7,5	2,25	67,5	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	70,2	
				2	6			8	8		8	2,25	72	
				2	6			5,2	4,95	0,25	5,2	2,25	46,8	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	22,5	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT403A 20*65 20*85	11-12-13-14	2		2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	22,5	740,5504
				2	4	A B C	0,2	1,5	1,1	0,2	1,5	1	6	
				2	4	A B C	0,2	1,5	1,1	0,2	1,5	1	6	
				2	4	B		2,5	2,5		2,5	1	10	
				2	6	A B	0,25	10,7	10,45		10,7	2,25	96,3	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	72,9	
				2	6	B C		8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	80,1	
				2	6	A B C	0,25	1,6	1,1	0,25	1,6	2,25	14,4	
			ESTRIBOS	80	3	C= 0,10 0,59 0,14 #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	148,736	
				2	3	C= 0,10 0,79 0,14 #3	0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	4,6144	
VT404 20*65	D-E-F	2		2	6	A B	0,25	4,8	4,55		4,8	2,25	43,2	520,2536
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	70,2	
				2	6	B C		7,8	7,55	0,25	7,8	2,25	70,2	
				2	7	B		3	3		3	3,06	36,72	
				2	4	B		2,8	2,8		2,8	1	11,2	
				2	6	A B	0,25	9,4	9,15		9,4	2,25	84,6	
				2	6	B C		10,7	10,45	0,25	10,7	2,25	96,3	
			ESTRIBOS	58	3	C= 0,10 0,59 0,14 #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	107,8336	
V404A 20*85	D-E-F-G	1		2	6	A B	0,25	8,3	8,05		8,3	2,25	37,35	514,2204
				2	6	B		8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
				2	6	B		8,5	8,5		8,5	2,25	38,25	
				2	6	B C		5	4,75	0,25	5	2,25	22,5	
				2	6	B		3	3		3	2,25	13,5	
				2	5	B		2,5	2,5		2,5	1,56	7,8	
				2	4	A B	0,2	9,4	9,2		9,4	1	18,8	
				2	4	B		8,4	8,4		8,4	1	16,8	
				2	4	B		8,6	8,6		8,6	1	17,2	
				2	4	B C		3,55	3,35	0,2	3,55	1	7,1	
				2	4	A B	0,2	7,1	6,9		7,1	1	14,2	
				2	4	B		8,3	8,3		8,3	1	16,6	
				2	4	B		8,6	8,6		8,6	1	17,2	
				2	4	B C		5,95	5,75	0,2	5,95	1	11,9	
				2	6	A B	0,25	11,2	10,95		11,2	2,25	50,4	
				2	6	B		8,9	8,9		8,9	2,25	40,05	
				2	6	B C		9,9	9,65	0,25	9,9	2,25	44,55	




















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	89	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	102,6704	
V400 45*85	11-12-13-14	1		4	8		0,35	8	7,65		8	4	128	1617,84
				4	8			8	8		8	4	128	
				4	8			8,1	8,1		8,1	4	129,6	
				4	8			5,2	4,85	0,35	5,2	4	83,2	
				2	7		0,3	6	5,7		6	3,06	36,72	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28	
				3	8			4	4		4	4	48	
				2	6			3,5	3,5		3,5	2,25	15,75	
				2	6		0,25	8,9	8,65		8,9	2,25	40,05	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			3,8	3,55	0,25	3,8	2,25	17,1	
				2	6		0,25	6,7	6,45		6,7	2,25	30,15	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			5,8	5,55	0,25	5,8	2,25	26,1	
				2	7			4,2	4,2		4,2	3,06	25,704	
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28	
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5	
				2	6		0,25	5,6	5,35		5,6	2,25	25,2	
				2	7			8,8	8,8		8,8	3,06	53,856	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	6			7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65	
				2	7		0,3	10,5	10,2		10,5	3,06	64,26	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8			10,6	10,25	0,35	10,6	4	84,8	
			ESTRIBOS	140	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	194,432	
				140	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	76,048	
				6	8		0,35	6,2	5,85		6,2	4	148,8	
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28	
				4	8		0,35	8	7,65		8	4	128	
				4	8			8	8		8	4	128	
				4	8			8,1	8,1		8,1	4	129,6	
				4	8			5,2	4,85	0,35	5,2	4	83,2	

























CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V401 75*65 75*85	11-12-13-14	1		9	8		0,35	5,2	4,85		5,2	4	187,2	1631,03
				2	6		0,25	1,65	1,15	0,25	1,65	2,25	7,425	
				2	6		0,25	1,65	1,15	0,25	1,65	2,25	7,425	
				2	8		0,35	5,9	5,55		5,9	4	47,2	
				2	8			9	9		9	4	72	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8			7,1	6,75	0,35	7,1	4	56,8	
				2	8		0,35	10,6	10,25		10,6	4	84,8	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8			9,8	9,45	0,35	9,8	4	78,4	
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28	
				4	8		0,35	1,85	1,15	0,35	1,85	4	29,6	
			ESTRIBOS	121	3		0,1	2,68	2,48	0,1	2,68	0,56	181,5968	
				6	3		0,1	3,08	2,88	0,1	3,08	0,56	10,3488	
				121	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	52,1752	
				6	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	3,2592	
V402 75*65 75*85	11-12-13-14	1		6	8		0,35	6,2	5,85		6,2	4	148,8	1705,328
				4	7			3,8	3,8		3,8	3,06	46,512	
				3	8			3,8	3,8		3,8	4	45,6	
				4	8		0,35	8	7,65		8	4	128	
				4	8			8	8		8	4	128	
				4	8			8,1	8,1		8,1	4	129,6	
				4	8			5,2	4,85	0,35	5,2	4	83,2	
				9	8		0,35	6	5,65		6	4	216	
				2	6		0,25	1,55	1,05	0,25	1,55	2,25	6,975	
				2	6		0,25	1,55	1,05	0,25	1,55	2,25	6,975	
				2	6			3,5	3,5		3,5	2,25	15,75	
				2	8		0,35	5,9	5,55		5,9	4	47,2	
				2	8			9	9		9	4	72	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8			7,1	6,75	0,35	7,1	4	56,8	
				2	8		0,35	10,6	10,25		10,6	4	84,8	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8			9,8	9,45	0,35	9,8	4	78,4	
				4	8		0,35	1,75	1,05	0,35	1,75	4	28	


















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	119	3		0,1	2,68	2,48	0,1	2,68	0,56	178,5952	
				6	3		0,1	3,08	2,88	0,1	3,08	0,56	10,3488	
				119	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	51,3128	
				6	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	3,2592	
V403 50*85	11-12-13-14	1		4	7		0,3	7,9	7,6		7,9	3,06	96,696	1364,226
				4	7			8	8		8	3,06	97,92	
				4	7			8,1	8,1		8,1	3,06	99,144	
				4	7			5	4,7	0,3	5	3,06	61,2	
				4	7			4	4		4	3,06	48,96	
				2	7			3,5	3,5		3,5	3,06	21,42	
				2	6			3,5	3,5		3,5	2,25	15,75	
				2	7			4	4		4	3,06	24,48	
				2	6		0,25	8,9	8,65		8,9	2,25	40,05	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			3,8	3,55	0,25	3,8	2,25	17,1	
				2	6		0,25	6,7	6,2	0,25	6,7	2,25	30,15	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			5,8	5,55	0,25	5,8	2,25	26,1	
				2	7		0,3	5,7	5,15	0,25	5,7	3,06	34,884	
				2	7			8,8	8,8		8,8	3,06	53,856	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			7,7	7,4	0,3	7,7	3,06	47,124	
				2	7		0,3	10,5	9,95	0,25	10,5	3,06	64,26	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			10,4	10,1	0,3	10,4	3,06	63,648	
			ESTRIBOS	138	3		0,1	2,58	2,38	0,1	2,58	0,56	199,3824	
				138	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	74,9616	
				4	8		0,35	5	4,65		5	4	80	
				4	7			8,3	8,3		8,3	3,06	101,592	
				4	7			8,3	8,3		8,3	3,06	101,592	


CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V404 45*85	D-E-F-G	1		4	8			5,3	4,95	0,35	5,3	4	84,8	1657,844
				4	8		0,35	3	2,65		3	4	48	
				4	8			4,5	4,5		4,5	4	72	
				2	7			4,5	4,5		4,5	3,06	27,54	
				4	8			4,5	4,5		4,5	4	72	
				3	7			4	4		4	3,06	36,72	
				4	8			3,2	2,85	0,35	3,2	4	51,2	
				2	6		0,25	11,2	10,95		11,2	2,25	50,4	
				2	6			8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
				2	6			6,1	5,85	0,25	6,1	2,25	27,45	
				2	6		0,25	5,9	5,65		5,9	2,25	26,55	
				2	6			8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
				2	6			11,4	11,15	0,25	11,4	2,25	51,3	
				2	6		0,25	3	2,75		3	2,25	13,5	
				2	7			4	4		4	3,06	24,48	
				2	8			4	4		4	4	32	
				2	8			3,2	2,85	0,35	3,2	4	25,6	
				2	7		0,3	7,6	7,3		7,6	3,06	46,512	
				2	8			9,2	9,2		9,2	4	73,6	
				2	8			10,7	10,35	0,35	10,7	4	85,6	
				2	8		0,35	10,4	10,05		10,4	4	83,2	
				2	8			9,4	9,4		9,4	4	75,2	
				2	8			7,8	7,45	0,35	7,8	4	62,4	
			ESTRIBOS	119	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	165,2672	
				119	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	64,6408	
				3	7		0,3	4,3	4		4,3	3,06	39,474	
				3	7			8,8	8,8		8,8	3,06	80,784	
				3	7			6,5	6,5		6,5	3,06	59,67	
				5	7			7,1	6,8	0,3	7,1	3,06	108,63	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				3	7			3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
				2	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	22,4	
				4	8			2,5	2,15	0,35	2,5	4	40	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	6		0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	5,49	
				2	6		0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	5,49	
				2	8		0,35	8,75	8,05	0,35	8,75	4	70	
				1	8		0,35	7,6	7,25		7,6	4	30,4	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V40S 45*65 60*65 60*85	D-E-F-G	1		1	7	B		9,5	9,5		9,5	3,06	29,07	1179,55
				1	8	B C		10,1	9,75	0,35	10,1	4	40,4	
				2	7	A B	0,3	9,8	9,5		9,8	3,06	59,976	
				2	7	B		9,4	9,4		9,4	3,06	57,528	
				2	8	B C		7,8	7,45	0,35	7,8	4	62,4	
				3	8	B		3	3		3	4	36	
				5	8	A B C	0,35	1,42	0,72	0,35	1,42	4	28,4	
			ESTRIBOS	73	3	G= 0.10 0.57 0.37 #3	0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	85,0304	
				62	4	G= 0.12 0.57 0.52 #4	0,12	2,42	2,18	0,12	2,42	1	150,04	
				3	3	G= 0.10 0.77 0.52 #3	0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	4,6704	
				73	3	G= 0.10 0.57 #3	0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	31,4776	
				62	4	G= 0.12 0.57 #4	0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	50,22	
				3	3	G= 0.10 0.77 #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,6296	
				3	7	A B	0,3	4,5	4,2		4,5	3,06	41,31	
				3	7	B		8,6	8,6		8,6	3,06	78,948	
				3	7	B		6,4	6,4		6,4	3,06	58,752	
				5	7	B C		7,1	6,8	0,3	7,1	3,06	108,63	
				2	5	A B	0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				3	7	B		3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
				3	8	A B	0,35	2,8	2,45		2,8	4	33,6	
				5	8	B C		2,8	2,45	0,35	2,8	4	56	
				3	8	B		3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	6	A B C	0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	5,49	
				2	6	A B C	0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	5,49	
				2	8	A B C	0,35	8,75	8,05	0,35	8,75	4	70	
				1	8	A B	0,35	7,6	7,25		7,6	4	30,4	
				1	7	B		9,4	9,4		9,4	3,06	28,764	
				1	7	B C		10	9,7	0,3	10	3,06	30,6	
				2	7	A B	0,3	9,7	9,4		9,7	3,06	59,364	
				2	7	B		9,3	9,3		9,3	3,06	56,916	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V406 45*65 60*65 60*85	D-E-F-G	1		2	7			7,7	7,4	0,3	7,7	3,06	47,124	1259,726
				5	8			3,5	3,5		3,5	4	70	
				6	8		0,35	1,42	0,72	0,35	1,42	4	34,08	
			ESTRIBOS	73	3	C= 0.10 / 0.57 / 0.37 #3	0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	85,0304	
				63	4	C= 0.12 / 0.57 / 0.52 #4	0,12	2,42	2,18	0,12	2,42	1	152,46	
				3	4	C= 0.12 / 0.77 / 0.52 #4	0,12	2,82	2,58	0,12	2,82	1	8,46	
				73	3	C= 0.10 / 0.57 #3	0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	31,4776	
				103	4	C= 0.12 / 0.57 #4	0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	83,43	
				3	4	C= 0.12 / 0.77 #4	0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	3,03	
V407 45*85	D-E-F-G	1		4	7		0,3	8,9	8,6		8,9	3,06	108,936	1565,582
				4	7			8,2	8,2		8,2	3,06	100,368	
				4	7			8,2	8,2		8,2	3,06	100,368	
				4	8			5,3	4,95	0,35	5,3	4	84,8	
				4	7			3,8	3,8		3,8	3,06	46,512	
				4	8			3,8	3,8		3,8	4	60,8	
				4	8			4	4		4	4	64	
				4	7			3	2,7	0,3	3	3,06	36,72	
				2	6		0,25	9,7	9,45		9,7	2,25	43,65	
				2	6			8,4	8,4		8,4	2,25	37,8	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			3,85	3,6	0,25	3,85	2,25	17,325	
				2	6		0,25	7,5	7,25		7,5	2,25	33,75	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
				2	6			6,15	5,9	0,25	6,15	2,25	27,675	
				2	5			3	3		3	1,56	9,36	
				2	5			3,5	3,5		3,5	1,56	10,92	
				2	7		0,3	6,6	6,3		6,6	3,06	40,392	
				2	7			8,7	8,7		8,7	3,06	53,244	
				2	7			9,3	9,3		9,3	3,06	56,916	





CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E318

PLACA 3ER PISO - ZONA COMEDOR.

TOTAL EJECUTADO **15913,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	8			7,9	7,55	0,35	7,9	4	63,2	
				2	6		0,25	11,4	11,15		11,4	2,25	51,3	
				2	7			9	9		9	3,06	55,08	
				2	8			10,7	10,35	0,35	10,7	4	85,6	
			ESTRIBOS	138	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	191,6544	
				138	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	74,9616	
														15913,01

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

RAMPA VEHICULAR

DISHIERROS S.A.S.


CARTILLA No. 6415 -- ESTADO [Confirmado]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO




Fecha: 02-08-2025 12:38:17
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

Ubicación: **RAMPA VEHICULAR**

Lista de producto Nº 3

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
1	 b = 4.65	158	Nº 3	4,65	411,43	[79] placa,/n[79] placa
2	 a = 0.1 b = 0.42 c = 0.32	444	Nº 3	1,68	417,72	[348] VR01,/n[96] VR02

Lista de producto Nº 4

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
3	 a = 0.1 b = 0.72 c = 0.57	49	Nº 4	2,78	136,22	[49] CA1 - PISO 2-3
4	 a = 0.12 b = 0.57 c = 0.12	164	Nº 4	0,81	132,84	[164] CA1 - PISO 2-3
5	 a = 0.12 b = 0.72 c = 0.12	100	Nº 4	0,96	96,00	[100] CA1 - PISO 2-3

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

RAMPA VEHICULAR

Lista de producto Nº 5

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 6415 -- ESTADO [Confirmado]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 02-08-2025 12:38:17
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909


No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
6	b = 3.6	12	Nº 5	3,60	67,39	[6] VR02,/n[6] VR02
7	b = 12.0	10	Nº 5	12,00	187,20	[10] VR02
8	a = 0.25 b = 5.0	9	Nº 5	5,25	73,71	[9] VR01

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

RAMPA VEHICULAR

Lista de producto Nº 6


No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
9	 b = 2.0	6	Nº 6	2,00	27,00	[6] VR02
10	 b = 5.4	6	Nº 6	5,40	72,90	[6] VR02
11	 b = 8.3	9	Nº 6	8,30	168,08	[9] VR01
12	 a = 0.3 b = 2.3	9	Nº 6	2,60	52,65	[9] VR01

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 6415 -- ESTADO [Confirmado]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 02-08-2025 12:38:17
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
13	 a = 0.3 b = 7.0	9	Nº 6	7,30	147,83	[9] VR01
14	 a = 0.3 b = 11.7	9	Nº 6	12,00	243,00	[9] VR01

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

RAMPA VEHICULAR

TOTALES PARA Acero Figurado		
DIÁMETRO	PRODUCTO	PESO TOTAL
N° 3 - 3/8	Acero Figurado	829,15
N° 4 - 1/2	Acero Figurado	365,06
N° 5 - 5/8	Acero Figurado	328,30
N° 6 - 3/4	Acero Figurado	711,45
TOTAL		2.233,96

PESO TOTAL	2.233,96

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E317

VIGUETAS LUDOTECA NIVEL 2 / VIGAS NIVEL 3

ACERO

TOTAL EJECUTADO **11981,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V400 45*85	11-12-13-14	1		4	8	A B	0,35	8	7,65		8	4	128	1617,84
				4	8	B		8	8		8	4	128	
				4	8	B		8,1	8,1		8,1	4	129,6	
				4	8	B C		5,2	4,85	0,35	5,2	4	83,2	
				2	7	A B	0,3	6	5,7		6	3,06	36,72	
				3	8	B		3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	8	B		3,5	3,5		3,5	4	28	
				3	8	B		4	4		4	4	48	
				2	6	B		3,5	3,5		3,5	2,25	15,75	
				2	6	A B	0,25	8,9	8,65		8,9	2,25	40,05	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B C		3,8	3,55	0,25	3,8	2,25	17,1	
				2	6	A B	0,25	6,7	6,45		6,7	2,25	30,15	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B C		5,8	5,55	0,25	5,8	2,25	26,1	
				2	7	B		4,2	4,2		4,2	3,06	25,704	
				2	8	B		3,5	3,5		3,5	4	28	
				2	6	B C		3	2,75	0,25	3	2,25	13,5	
				2	6	A B	0,25	5,6	5,35		5,6	2,25	25,2	
				2	7	B		8,8	8,8		8,8	3,06	53,856	
				2	7	B		8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	6	B C		7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65	
				2	7	A B	0,3	10,5	10,2		10,5	3,06	64,26	
				2	8	B		8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8	B C		10,6	10,25	0,35	10,6	4	84,8	
			ESTRIBOS	140	3	6 0.10 0.27 0.27 #3	0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	194,432	
				140	3	C 0.10 0.77 #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	76,048	
				6	8	A B	0,35	6,2	5,85		6,2	4	148,8	
				2	8	B		3,5	3,5		3,5	4	28	
				4	8	A B	0,35	8	7,65		8	4	128	
				4	8	B		8	8		8	4	128	
				4	8	B		8,1	8,1		8,1	4	129,6	
				4	8	B C		5,2	4,85	0,35	5,2	4	83,2	
				9	8	A B	0,35	5,2	4,85		5,2	4	187,2	
				2	6	A B C	0,25	1,65	1,15	0,25	1,65	2,25	7,425	

CONSORCIO URBANOVA SED























CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E317

VIGUETAS LUDOTECA NIVEL 2 / VIGAS NIVEL 3

ACERO

TOTAL EJECUTADO **11981,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V401 75*65 75*85	11-12-13-14	1		2	6		0,25	1,65	1,15	0,25	1,65	2,25	7,425	1631,03
				2	8		0,35	5,9	5,55		5,9	4	47,2	
				2	8			9	9		9	4	72	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8			7,1	6,75	0,35	7,1	4	56,8	
				2	8		0,35	10,6	10,25		10,6	4	84,8	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8			9,8	9,45	0,35	9,8	4	78,4	
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28	
				4	8		0,35	1,85	1,15	0,35	1,85	4	29,6	
			ESTRIBOS	121	3		0,1	2,68	2,48	0,1	2,68	0,56	181,5968	
				6	3		0,1	3,08	2,88	0,1	3,08	0,56	10,3488	
				121	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	52,1752	
				6	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	3,2592	
V402 75*65 75*85	11-12-13-14	1		6	8		0,35	6,2	5,85		6,2	4	148,8	1705,328
				4	7			3,8	3,8		3,8	3,06	46,512	
				3	8			3,8	3,8		3,8	4	45,6	
				4	8		0,35	8	7,65		8	4	128	
				4	8			8	8		8	4	128	
				4	8			8,1	8,1		8,1	4	129,6	
				4	8			5,2	4,85	0,35	5,2	4	83,2	
				9	8		0,35	6	5,65		6	4	216	
				2	6		0,25	1,55	1,05	0,25	1,55	2,25	6,975	
				2	6		0,25	1,55	1,05	0,25	1,55	2,25	6,975	
				2	6			3,5	3,5		3,5	2,25	15,75	
				2	8		0,35	5,9	5,55		5,9	4	47,2	
				2	8			9	9		9	4	72	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8			7,1	6,75	0,35	7,1	4	56,8	
				2	8		0,35	10,6	10,25		10,6	4	84,8	
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				2	8			9,8	9,45	0,35	9,8	4	78,4	
				4	8		0,35	1,75	1,05	0,35	1,75	4	28	
				119	3		0,1	2,68	2,48	0,1	2,68	0,56	178,5952	

CONSORCIO URBANOVA SED















CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E317

VIGUETAS LUDOTECA NIVEL 2 / VIGAS NIVEL 3

ACERO

TOTAL EJECUTADO **11981,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	6	3		0,1	3,08	2,88	0,1	3,08	0,56	10,3488	
				119	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	51,3128	
				6	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	3,2592	
V403 50*85	11-12-13-14	1		4	7		0,3	7,9	7,6		7,9	3,06	96,696	1364,226
				4	7			8	8		8	3,06	97,92	
				4	7			8,1	8,1		8,1	3,06	99,144	
				4	7			5	4,7	0,3	5	3,06	61,2	
				4	7			4	4		4	3,06	48,96	
				2	7			3,5	3,5		3,5	3,06	21,42	
				2	6			3,5	3,5		3,5	2,25	15,75	
				2	7			4	4		4	3,06	24,48	
				2	6		0,25	8,9	8,65		8,9	2,25	40,05	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			3,8	3,55	0,25	3,8	2,25	17,1	
				2	6		0,25	6,7	6,2	0,25	6,7	2,25	30,15	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			5,8	5,55	0,25	5,8	2,25	26,1	
				2	7		0,3	5,7	5,15	0,25	5,7	3,06	34,884	
				2	7			8,8	8,8		8,8	3,06	53,856	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			7,7	7,4	0,3	7,7	3,06	47,124	
				2	7		0,3	10,5	9,95	0,25	10,5	3,06	64,26	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			10,4	10,1	0,3	10,4	3,06	63,648	
			ESTRIBOS	138	3		0,1	2,58	2,38	0,1	2,58	0,56	199,3824	
				138	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	74,9616	
				4	8		0,35	5	4,65		5	4	80	
				4	7			8,3	8,3		8,3	3,06	101,592	
				4	7			8,3	8,3		8,3	3,06	101,592	
				4	8			5,3	4,95	0,35	5,3	4	84,8	
				4	8		0,35	3	2,65		3	4	48	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E317

VIGUETAS LUDOTECA NIVEL 2 / VIGAS NIVEL 3

ACERO

TOTAL EJECUTADO **11981,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V404 45*85	D-E-F-G	1		4	8			4,5	4,5		4,5	4	72	1657,844
				2	7			4,5	4,5		4,5	3,06	27,54	
				4	8			4,5	4,5		4,5	4	72	
				3	7			4	4		4	3,06	36,72	
				4	8			3,2	2,85	0,35	3,2	4	51,2	
				2	6		0,25	11,2	10,95		11,2	2,25	50,4	
				2	6			8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
				2	6			6,1	5,85	0,25	6,1	2,25	27,45	
				2	6		0,25	5,9	5,65		5,9	2,25	26,55	
				2	6			8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
				2	6			11,4	11,15	0,25	11,4	2,25	51,3	
				2	6		0,25	3	2,75		3	2,25	13,5	
				2	7			4	4		4	3,06	24,48	
				2	8			4	4		4	4	32	
				2	8			3,2	2,85	0,35	3,2	4	25,6	
				2	7		0,3	7,6	7,3		7,6	3,06	46,512	
				2	8			9,2	9,2		9,2	4	73,6	
				2	8			10,7	10,35	0,35	10,7	4	85,6	
				2	8		0,35	10,4	10,05		10,4	4	83,2	
				2	8			9,4	9,4		9,4	4	75,2	
				2	8			7,8	7,45	0,35	7,8	4	62,4	
			ESTRIBOS	119	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	165,2672	
				119	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	64,6408	
				3	7		0,3	4,3	4		4,3	3,06	39,474	
				3	7			8,8	8,8		8,8	3,06	80,784	
				3	7			6,5	6,5		6,5	3,06	59,67	
				5	7			7,1	6,8	0,3	7,1	3,06	108,63	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				3	7			3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
				2	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	22,4	
				4	8			2,5	2,15	0,35	2,5	4	40	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	6		0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	5,49	
				2	6		0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	5,49	
				2	8		0,35	8,75	8,05	0,35	8,75	4	70	
				1	8		0,35	7,6	7,25		7,6	4	30,4	
				1	7			9,5	9,5		9,5	3,06	29,07	
				1	8			10,1	9,75	0,35	10,1	4	40,4	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E317

VIGUETAS LUDOTECA NIVEL 2 / VIGAS NIVEL 3

ACERO

TOTAL EJECUTADO **11981,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V405 45*65 60*65 60*85	D-E-F-G	1		2	7	A B	0,3	9,8	9,5		9,8	3,06	59,976	
				2	7	B		9,4	9,4		9,4	3,06	57,528	1179,55
				2	8	B C		7,8	7,45	0,35	7,8	4	62,4	
				3	8	B		3	3		3	4	36	
				5	8	A B C	0,35	1,42	0,72	0,35	1,42	4	28,4	
			ESTRIBOS	73	3	G= 0.10 0.57 0.37 #3	0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	85,0304	
				62	4	G= 0.12 0.57 0.52 #4	0,12	2,42	2,18	0,12	2,42	1	150,04	
				3	3	G= 0.10 0.77 0.52 #3	0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	4,6704	
				73	3	G= 0.10 0.57 #3	0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	31,4776	
				62	4	G= 0.12 0.57 #4	0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	50,22	
				3	3	G= 0.10 0.77 #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	1,6296	
V406 45*65 60*65 60*85	D-E-F-G	1		3	7	A B	0,3	4,5	4,2		4,5	3,06	41,31	1259,726
				3	7	B		8,6	8,6		8,6	3,06	78,948	
				3	7	B		6,4	6,4		6,4	3,06	58,752	
				5	7	B C		7,1	6,8	0,3	7,1	3,06	108,63	
				2	5	A B	0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				3	7	B		3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
				3	8	A B	0,35	2,8	2,45		2,8	4	33,6	
				5	8	B C		2,8	2,45	0,35	2,8	4	56	
				3	8	B		3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	6	A B C	0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	5,49	
				2	6	A B C	0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	5,49	
				2	8	A B C	0,35	8,75	8,05	0,35	8,75	4	70	
				1	8	A B	0,35	7,6	7,25		7,6	4	30,4	
				1	7	B		9,4	9,4		9,4	3,06	28,764	
				1	7	B C		10	9,7	0,3	10	3,06	30,6	
				2	7	A B	0,3	9,7	9,4		9,7	3,06	59,364	
				2	7	B		9,3	9,3		9,3	3,06	56,916	
				2	7	B C		7,7	7,4	0,3	7,7	3,06	47,124	
				5	8	B		3,5	3,5		3,5	4	70	

CONSORCIO URBANOVA SED













CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E317

VIGUETAS LUDOTECA NIVEL 2 / VIGAS NIVEL 3

ACERO

TOTAL EJECUTADO **11981,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				6	8		0,35	1,42	0,72	0,35	1,42	4	34,08	
			ESTRIBOS	73	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	85,0304	
				63	4		0,12	2,42	2,18	0,12	2,42	1	152,46	
				3	4		0,12	2,82	2,58	0,12	2,82	1	8,46	
				73	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	31,4776	
				103	4		0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	83,43	
				3	4		0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	3,03	
V407 45*85	D-E-F-G	1		4	7		0,3	8,9	8,6		8,9	3,06	108,936	1565,582
				4	7			8,2	8,2		8,2	3,06	100,368	
				4	7			8,2	8,2		8,2	3,06	100,368	
				4	8			5,3	4,95	0,35	5,3	4	84,8	
				4	7			3,8	3,8		3,8	3,06	46,512	
				4	8			3,8	3,8		3,8	4	60,8	
				4	8			4	4		4	4	64	
				4	7			3	2,7	0,3	3	3,06	36,72	
				2	6		0,25	9,7	9,45		9,7	2,25	43,65	
				2	6			8,4	8,4		8,4	2,25	37,8	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			3,85	3,6	0,25	3,85	2,25	17,325	
				2	6		0,25	7,5	7,25		7,5	2,25	33,75	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			8,3	8,3		8,3	2,25	37,35	
				2	6			6,15	5,9	0,25	6,15	2,25	27,675	
				2	5			3	3		3	1,56	9,36	
				2	5			3,5	3,5		3,5	1,56	10,92	
				2	7		0,3	6,6	6,3		6,6	3,06	40,392	
				2	7			8,7	8,7		8,7	3,06	53,244	
				2	7			9,3	9,3		9,3	3,06	56,916	
				2	8			7,9	7,55	0,35	7,9	4	63,2	
				2	6		0,25	11,4	11,15		11,4	2,25	51,3	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E317

VIGUETAS LUDOTECA NIVEL 2 / VIGAS NIVEL 3

ACERO

TOTAL EJECUTADO **11981,13**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	7	B		9	9		9	3,06	55,08	
				2	8	B C		10,7	10,35	0,35	10,7	4	85,6	
			ESTRIBOS	138	3	G= 0.10 / 0.77 / 0.37 / #3	0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	191,6544	
				138	3	G= 0.10 / 0.77 / #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	74,9616	

11981,13


CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V600		1		3	7		0,3	8	7,7		8	3,06	73,44	924,1324
				3	7			8,1	8,1		8,1	3,06	74,358	
				2	7			8,2	8,2		8,2	3,06	50,184	
				2	7			4,7	4,4	0,3	4,7	3,06	28,764	
				3	6			3	3		3	2,25	20,25	
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28	
				2	6			3	3		3	2,25	13,5	
				2	5		0,25	8,9	8,65		8,9	1,56	27,768	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			3,8	3,55	0,25	3,8	1,56	11,856	
				2	5		0,25	6,7	6,45		6,7	1,56	20,904	
				2	5			8,1	8,1		8,1	1,56	25,272	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			5,8	5,55	0,25	5,8	1,56	18,096	
				1	7		0,3	5,7	5,4		5,7	3,06	17,442	
				1	7			8,9	8,9		8,9	3,06	27,234	
				1	7			8,5	8,5		8,5	3,06	26,01	
				1	7			7,6	7,3	0,3	7,6	3,06	23,256	
				2	7		0,3	10,6	10,3		10,6	3,06	64,872	
				2	7			8,6	8,6		8,6	3,06	52,632	
				2	7			10,2	9,9	0,3	10,2	3,06	62,424	
			ESTRIBOS	138	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	183,9264	
V601		1		3	8		0,35	3,5	3,15		3,5	4	42	1526,698
				5	8		0,35	5	4,65		5	4	100	
				5	6			7,9	7,9		7,9	2,25	88,875	
				5	6			7,5	7,5		7,5	2,25	84,375	
				3	8			3	2,65	0,35	3	4	36	
				5	8			5,2	4,85	0,35	5,2	4	104	
				2	8			3	2,65	0,35	3	4	24	
				8	8		0,35	3,5	3,15		3,5	4	112	
				2	6		0,25	10,4	10,15		10,4	2,25	46,8	
				2	6			10,1	10,1		10,1	2,25	45,45	
				2	6			3,8	3,55	0,25	3,8	2,25	17,1	
				2	6		0,25	5,5	5,25		5,5	2,25	24,75	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6			11	10,75	0,25	11	2,25	49,5	
				3	8			4,5	4,5		4,5	4	54	
				2	7		0,3	9,6	9,3		9,6	3,06	58,752	














CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	8			8,8	8,8		8,8	4	70,4	
				2	6			7,8	7,55	0,25	7,8	2,25	35,1	
				3	8		0,35	7,3	6,95		7,3	4	87,6	
				3	8			8,8	8,8		8,8	4	105,6	
				3	8			10,2	9,85	0,35	10,2	4	122,4	
				92	3		0,1	2,58	2,38	0,1	2,58	0,56	132,9216	
			ESTRIBOS	92	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	49,9744	
				3	7		0,3	8	7,7		8	3,06	73,44	
				3	7			8,3	8,3		8,3	3,06	76,194	
				3	7			8,2	8,2		8,2	3,06	75,276	
				3	7			4,9	4,6	0,3	4,9	3,06	44,982	
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28	
				3	7			3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
				2	7			3	3		3	3,06	18,36	
				2	5		0,25	8,9	8,65		8,9	1,56	27,768	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			3,8	3,55	0,25	3,8	1,56	11,856	
				2	5		0,25	6,7	6,45		6,7	1,56	20,904	
V602		1		2	5			8,1	8,1		8,1	1,56	25,272	993,0664
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				3	5			5,8	5,55	0,25	5,8	1,56	27,144	
				1	7		0,3	5,7	5,4		5,7	3,06	17,442	
				1	7			8,9	8,9		8,9	3,06	27,234	
				1	7			8,5	8,5		8,5	3,06	26,01	
				1	7			7,6	7,3	0,3	7,6	3,06	23,256	
				2	7		0,3	10,6	10,3		10,6	3,06	64,872	
				2	7			8,6	8,6		8,6	3,06	52,632	
				2	7			10,2	9,9	0,3	10,2	3,06	62,424	
			ESTRIBOS	138	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	183,9264	
				3	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	33,6	
				3	8			3,8	3,8		3,8	4	45,6	
				2	5			2,5	2,25	0,25	2,5	1,56	7,8	
				3	8		0,35	4,9	4,55		4,9	4	58,8	
				3	8			8,7	8,7		8,7	4	104,4	
























CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V603		1		3	7			4,8	4,5	0,3	4,8	3,06	44,064	768,636
				2	6		0,25	10,4	10,15		10,4	2,25	46,8	
				2	6			6,7	6,45	0,25	6,7	2,25	30,15	
				2	6		0,25	5,5	5,25		5,5	2,25	24,75	
				2	6			11,6	11,35	0,25	11,6	2,25	52,2	
				2	6			4	4		4	2,25	18	
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5	
				1	8		0,35	10,6	10,25		10,6	4	42,4	
				1	8			7,6	7,25	0,35	7,6	4	30,4	
				2	7		0,3	7,8	7,5		7,8	3,06	47,736	
				2	7			10,1	9,8	0,3	10,1	3,06	61,812	
			ESTRIBOS	80	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	106,624	
V604		1		3	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	22,95	1213,551
				3	8			3	2,65	0,35	3	4	36	
				5	8		0,35	4,6	4,25		4,6	4	92	
				5	6			8,7	8,7		8,7	2,25	97,875	
				5	8			5	4,65	0,35	5	4	100	
				4	8			3	2,65	0,35	3	4	48	
				2	6		0,25	11,4	11,15		11,4	2,25	51,3	
				2	6			5,7	5,45	0,25	5,7	2,25	25,65	
				2	6		0,25	6	5,75		6	2,25	27	
				2	6			11,1	10,85	0,25	11,1	2,25	49,95	
				4	8			5	5		5	4	80	
				4	8			8,5	8,5		8,5	4	136	
				2	7		0,3	10,1	9,8		10,1	3,06	61,812	
				2	7			7,8	7,5	0,3	7,8	3,06	47,736	
				3	7		0,3	8	7,7		8	3,06	73,44	
				3	7			9,9	9,6	0,3	9,9	3,06	90,882	
			ESTRIBOS	87	3		0,1	2,58	2,38	0,1	2,58	0,56	125,6976	
				87	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	47,2584	
				4	8		0,35	2,5	2,15		2,5	4	40	
				3	8			3	2,65	0,35	3	4	36	
				5	7		0,3	4,7	4,4		4,7	3,06	71,91	
				5	6			8,4	8,4		8,4	2,25	94,5	
				5	8			5,1	4,75	0,35	5,1	4	102	
















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V605		1		5	8			3	2,65	0,35	3	4	60	1271,104
				2	6		0,25	11,4	11,15		11,4	2,25	51,3	
				2	6			5,7	5,45	0,25	5,7	2,25	25,65	
				2	6		0,25	5,9	5,65		5,9	2,25	26,55	
				2	6			11,2	10,95	0,25	11,2	2,25	50,4	
				3	8			8	8		8	4	96	
				5	8			6	6		6	4	120	
				2	8		0,35	10,4	10,05		10,4	4	83,2	
				2	8			7,8	7,45	0,35	7,8	4	62,4	
				3	7		0,3	7,9	7,6		7,9	3,06	72,522	
				3	7			10	9,7	0,3	10	3,06	91,8	
			ESTRIBOS	94	3		0,1	2,58	2,38	0,1	2,58	0,56	135,8112	
				94	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	51,0608	
V606		1		3	7		0,3	5	4,7		5	3,06	45,9	634,4388
				3	7			8,4	8,4		8,4	3,06	77,112	
				3	7			4,9	4,6	0,3	4,9	3,06	44,982	
				3	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	33,6	
				3	8			3,8	3,8		3,8	4	45,6	
				2	5			2,2	1,95	0,25	2,2	1,56	6,864	
				2	5		0,25	10,4	10,15		10,4	1,56	32,448	
				2	5			6,7	6,45	0,25	6,7	1,56	20,904	
				2	5		0,25	5,5	5,25		5,5	1,56	17,16	
				2	5			11,6	11,35	0,25	11,6	1,56	36,192	
				1	7		0,3	10,6	10,3		10,6	3,06	32,436	
				1	8			7,6	7,25	0,35	7,6	4	30,4	
				2	7		0,3	7,8	7,5		7,8	3,06	47,736	
				2	7			10,1	9,8	0,3	10,1	3,06	61,812	
			ESTRIBOS	76	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	101,2928	
				3	8		0,35	9	8,65		9	4	216	
				3	8			9,2	8,85	0,35	9,2	4	220,8	
				2	6		0,25	11,4	11,15		11,4	2,25	102,6	
				2	6			5,7	5,45	0,25	5,7	2,25	51,3	
				2	6		0,25	5,9	5,65		5,9	2,25	53,1	
				2	6			11,2	10,95	0,25	11,2	2,25	100,8	
				1	8		0,35	12	11,65		12	4	96	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V607		2		1	8	B C		6,2	5,85	0,35	6,2	4	49,6	1306,36
				2	7	A B	0,3	5,9	5,6		5,9	3,06	72,216	
				2	7	B C		12	11,7	0,3	12	3,06	146,88	
				51	3	G= 0.10 0.77 0.37 #3	0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	141,6576	
			ESTRIBOS	51	3	G= 0.10 0.77 #3	0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	55,4064	
				4	7	A B	0,3	11	10,7		11	3,06	134,64	
				2	7	A B	0,3	3	2,7		3	3,06	18,36	
				2	5	A B C	0,25	7,13	6,63	0,25	7,13	1,56	22,2456	
				2	5	A B C	0,25	7,13	6,63	0,25	7,13	1,56	22,2456	
				4	7	A B C	0,3	7,23	6,63	0,3	7,23	3,06	88,4952	
				2	7	B		12	12		12	3,06	73,44	
				2	7	B		8	8		8	3,06	48,96	
				4	8	B		7,3	7,3		7,3	4	116,8	
				2	6	B		6	6		6	2,25	27	
				2	8	B		10,9	10,9		10,9	4	87,2	
				2	6	B		6	6		6	2,25	27	
				4	8	B		8,6	8,6		8,6	4	137,6	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	8	B		11,8	11,8		11,8	4	94,4	
				2	7	B		8,2	8,2		8,2	3,06	50,184	
				4	7	B		8,1	8,1		8,1	3,06	99,144	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	7	B		8,6	8,6		8,6	3,06	52,632	
				2	7	B		8,7	8,7		8,7	3,06	53,244	
				4	7	B		7,9	7,9		7,9	3,06	96,696	
				2	7	B		10,6	10,6		10,6	3,06	64,872	
				4	7	B		7,4	7,4		7,4	3,06	90,576	
				2	6	B		2,5	2,5		2,5	2,25	11,25	
				2	7	B		12	12		12	3,06	73,44	
				2	8	B		8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				4	8	B		8,5	8,5		8,5	4	136	
				2	7	B		4,5	4,5		4,5	3,06	27,54	
				2	8	B		7,9	7,9		7,9	4	63,2	
				2	8	B		11,6	11,6		11,6	4	92,8	
				4	10	B		8,1	8,1		8,1	6,4	207,36	
				4	8	A B	0,35	4,2	3,85		4,2	4	67,2	
				4	8	B		10,1	10,1		10,1	4	161,6	
























CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V608		1		7	8		0,35	3	2,65		3	4	84	5274,9914
				2	6		0,25	5,5	5,25		5,5	2,25	24,75	
				2	6			10,45	10,2	0,25	10,45	2,25	47,025	
				2	6		0,25	10,6	10,35		10,6	2,25	47,7	
				6	8			4,5	4,5		4,5	4	108	
				2	7			5,5	5,5		5,5	3,06	33,66	
				6	7		0,3	4,1	3,8		4,1	3,06	75,276	
				6	8			10,1	10,1		10,1	4	242,4	
				4	8			4	3,65	0,35	4	4	64	
				7	8			2,8	2,45	0,35	2,8	4	78,4	
				6	7			4	3,7	0,3	4	3,06	73,44	
				4	8			8,4	8,4		8,4	4	134,4	
				2	7			10	10		10	3,06	61,2	
				2	7			6,3	6,3		6,3	3,06	38,556	
				2	7			6	6		6	3,06	36,72	
				4	8			7,8	7,8		7,8	4	124,8	
				2	7			6,5	6,5		6,5	3,06	39,78	
				2	7			8	8		8	3,06	48,96	
				2	7			11,7	11,7		11,7	3,06	71,604	
				4	8			8	8		8	4	128	
				4	8			5,1	4,75	0,35	5,1	4	81,6	
				2	6		0,25	8,75	8,25	0,25	8,75	2,25	39,375	
				2	6		0,25	8,75	8,25	0,25	8,75	2,25	39,375	
				4	7		0,3	8,85	8,25	0,3	8,85	3,06	108,324	
				80	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	111,104	
				337	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	392,5376	
				117	4		0,12	2,52	2,28	0,12	2,52	1	294,84	
			ESTRIBOS	80	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	43,456	
				337	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	145,3144	
				117	4		0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	118,17	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V609		1	ESTRIBOS	4	7	A B C	0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	339,756
				2	8	B		4	4		4	4	32	
				2	8	B		3,5	3,5		3,5	4	28	
				4	7	A B C	0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	
				18	3	G= 0.10 0.57 0.37 #3	0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	20,9664	
				18	4	G= 0.12 0.57 0.37 #4	0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	38,16	
				18	3	G= 0.10 0.57 #3	0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	7,7616	
				18	4	G= 0.12 0.57 #4	0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	14,58	
V610		1	ESTRIBOS	4	7	A B C	0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	336,236
				2	8	B		4	4		4	4	32	
				2	7	B		4	4		4	3,06	24,48	
				4	7	A B C	0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	
				18	3	G= 0.10 0.57 0.37 #3	0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	20,9664	
				18	4	G= 0.12 0.57 0.37 #4	0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	38,16	
				18	3	G= 0.10 0.57 #3	0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	7,7616	
				18	4	G= 0.12 0.57 #4	0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	14,58	
				3	8	A B	0,35	7,6	7,25		7,6	4	91,2	
				3	8	B		8	8		8	4	96	
				2	7	B		2,8	2,8		2,8	3,06	17,136	
				2	6	A B	0,25	6,1	5,85		6,1	2,25	27,45	
				2	6	A B	0,25	8,4	8,15		8,4	2,25	37,8	
				1	7	A B	0,3	5	4,7		5	3,06	15,3	
				1	7	B		8,5	8,5		8,5	3,06	26,01	
				2	8	A B	0,35	10,2	9,85		10,2	4	81,6	
				3	8	B		7,5	7,5		7,5	4	90	
				2	7	B		2,8	2,8		2,8	3,06	17,136	
				2	6	B		10,1	10,1		10,1	2,25	45,45	


CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V611		1		2	6	B		12	12		12	2,25	54	2664,374
				1	8	B		8,6	8,6		8,6	4	34,4	
				2	8	B		8,6	8,6		8,6	4	68,8	
				2	8	B		7,4	7,4		7,4	4	59,2	
				2	6	B		7,1	7,1		7,1	2,25	31,95	
				2	6	B		8,6	8,6		8,6	2,25	38,7	
				2	6	B		8,6	8,6		8,6	2,25	38,7	
				3	10	B		8,5	8,5		8,5	6,4	163,2	
				2	8	B		4,5	4,5		4,5	4	36	
				3	8	B		6	6		6	4	72	
				1	8	B		8,7	8,7		8,7	4	34,8	
				2	8	B		9,8	9,8		9,8	4	78,4	
				3	8	B		8,5	8,5		8,5	4	102	
				2	6	B		2,8	2,8		2,8	2,25	12,6	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				1	8	B		8,5	8,5		8,5	4	34	
				2	8	B		8,6	8,6		8,6	4	68,8	
				1	7	B		8,7	8,7		8,7	3,06	26,622	
				3	8	B		8	8		8	4	96	
				2	6	B		12	12		12	2,25	54	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B		9,3	9,3		9,3	2,25	41,85	
				1	8	B		12	12		12	4	48	
				2	8	B		8,7	8,7		8,7	4	69,6	
				3	8	B C		11,6	11,25	0,35	11,6	4	139,2	
				2	6	B		2,8	2,8		2,8	2,25	12,6	
				4	8	B C		4	3,65	0,35	4	4	64	
				2	6	B C		6,05	5,8	0,25	6,05	2,25	27,225	
				2	6	B C		4,05	3,8	0,25	4,05	2,25	18,225	
				2	8	B C		3,8	3,45	0,35	3,8	4	30,4	
				1	8	B C		3,8	3,45	0,35	3,8	4	15,2	
				2	8	B C		9,4	9,05	0,35	9,4	4	75,2	
			ESTRIBOS	275	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	366,52	
				4	8	A B	0,35	3,2	2,85		3,2	4	51,2	
				4	8	A B	0,35	5,7	5,35		5,7	4	91,2	
				6	8	A B	0,35	3	2,65		3	4	72	
				2	6	A B	0,25	10,65	10,4		10,65	2,25	47,925	



























CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V612		1		2	6		0,25	5,55	5,3		5,55	2,25	24,975	2563,0262
				4	8		0,35	5,7	5,35		5,7	4	91,2	
				4	8			8,7	8,7		8,7	4	139,2	
				2	6			7,95	7,95		7,95	2,25	35,775	
				4	8			5,5	5,5		5,5	4	88	
				3	8			5,5	5,5		5,5	4	66	
				4	8			8,6	8,6		8,6	4	137,6	
				3	8			4,6	4,6		4,6	4	55,2	
				4	8			7,9	7,9		7,9	4	126,4	
				6	8			4,6	4,6		4,6	4	110,4	
				2	6			10,1	10,1		10,1	2,25	45,45	
				2	6			5,6	5,6		5,6	2,25	25,2	
				4	8			5,5	5,5		5,5	4	88	
				4	8			8	8		8	4	128	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	7			6,3	6,3		6,3	3,06	38,556	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			8,2	8,2		8,2	3,06	50,184	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				4	7			8	8		8	3,06	97,92	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6			7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				4	8			5	4,65	0,35	5	4	80	
				2	6			3,9	3,65	0,25	3,9	2,25	17,55	
				2	6			6,2	5,95	0,25	6,2	2,25	27,9	
				2	7			10	9,7	0,3	10	3,06	61,2	
				2	7			8,1	7,8	0,3	8,1	3,06	49,572	
			ESTRIBOS	130	4		0,12	2,42	2,18	0,12	2,42	1	314,6	
				119	3		0,1	2,38	1,28	1	2,38	0,56	158,6032	
				3	5		0,25	6,3	6,05		6,3	1,56	29,484	
				1	5		0,25	9,2	8,95		9,2	1,56	14,352	
				2	5		0,25	10,6	10,35		10,6	1,56	33,072	
				3	5			7,8	7,8		7,8	1,56	36,504	
				1	5			7,9	7,9		7,9	1,56	12,324	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V613		1		2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	848,2248
				3	5	B		7,7	7,7		7,7	1,56	36,036	
				1	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	12,168	
				2	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				3	5	B		7,7	7,7		7,7	1,56	36,036	
				1	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	12,168	
				2	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				3	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	36,504	
				1	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	12,168	
				2	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				3	5	B		8	8		8	1,56	37,44	
				1	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	12,168	
				2	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				3	5	B C		11,5	11,25	0,25	11,5	1,56	53,82	
				1	5	B C		8,6	8,35	0,25	8,6	1,56	13,416	
				2	5	B C		7,2	6,95	0,25	7,2	1,56	22,464	
			ESTRIBOS	441	3	G= 0.10 0.22 0.32 #3	0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	316,1088	
V614		1		3	5	A B	0,25	4,3	4,05		4,3	1,56	20,124	597,176
				3	5	B		9,6	9,6		9,6	1,56	44,928	
				3	5	B		6,1	6,1		6,1	1,56	28,548	
				3	5	B		8	8		8	1,56	37,44	
				3	5	B C		11,5	11,25	0,25	11,5	1,56	53,82	
				2	4	B		2	2		2	1	4	
				3	5	A B	0,25	4,3	4,05		4,3	1,56	20,124	
				3	5	B		9,6	9,6		9,6	1,56	44,928	
				2	5	B		9,3	9,3		9,3	1,56	29,016	
				1	5	B		10,7	10,7		10,7	1,56	16,692	
				2	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				1	5	B		7,9	7,9		7,9	1,56	12,324	
				2	5	B C		8,7	8,45	0,25	8,7	1,56	27,144	
				1	5	B C		7,2	6,95	0,25	7,2	1,56	11,232	
			ESTRIBOS	310	3	G= 0.10 0.22 0.32 #3	0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	222,208	
				3	7	A B C	0,3	11,8	11,2	0,3	11,8	3,06	108,324	
				2	7	A B	0,3	2,2	1,9		2,2	3,06	13,464	
				2	7	B C		2	1,7	0,3	2	3,06	12,24	
				3	5	A B	0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				3	7	A B C	0,3	10,4	9,8	0,3	10,4	3,06	95,472	

















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V615		1	ESTRIBOS	9	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,9552	317,58
				41	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	47,7568	
				9	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	2,1168	
				41	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	17,6792	
V616		1	ESTRIBOS	3	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	63,342	424,398
				3	8			8,2	7,85	0,35	8,2	4	98,4	
				3	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	22,95	
				2	7			3	2,7	0,3	3	3,06	18,36	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	7		0,3	9	8,7		9	3,06	27,54	
				1	7			5,1	4,8	0,3	5,1	3,06	15,606	
				2	7			11,5	11,2	0,3	11,5	3,06	70,38	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				3	7		0,3	7,9	7,6		7,9	3,06	72,522	
				3	7			7,1	6,8	0,3	7,1	3,06	65,178	
				3	7			2,5	2,5		2,5	3,06	22,95	
				3	8			3	3		3	4	36	
				3	8			2,5	2,5		2,5	4	30	
				3	5		0,25	3,1	2,85		3,1	1,56	14,508	
				1	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	11,2	
				1	7			11,5	11,2	0,3	11,5	3,06	35,19	
				2	7		0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	69,768	
				2	7			2,7	2,4	0,3	2,7	3,06	16,524	
				3	8		0,35	2	1,65		2	4	24	

















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V617		1	ESTRIBOS	9	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,9552	526,422
				19	4		0,12	2,12	1,9	0,1	2,12	1	40,28	
				40	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	46,592	
				9	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	2,1168	
				19	4		0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	15,39	
				40	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	17,248	
V618		1	ESTRIBOS	3	7		0,3	8,1	7,8		8,1	3,06	74,358	419,0512
				3	8			7	6,65	0,35	7	4	84	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	7			3	3		3	3,06	18,36	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	7		0,3	2,7	2,4		2,7	3,06	8,262	
				1	7			11,4	11,1	0,3	11,4	3,06	34,884	
				2	7		0,3	11,5	11,2		11,5	3,06	70,38	
				2	7			2,6	2,3	0,3	2,6	3,06	15,912	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				53	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	61,7344	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				3	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	63,342	
				3	8			8,2	7,85	0,35	8,2	4	98,4	
				3	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	22,95	
				3	8			3,2	3,2		3,2	4	38,4	








CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V619		1	ESTRIBOS	3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	469,61
				1	8		0,35	9,2	8,85		9,2	4	36,8	
				1	7			5,1	4,8	0,3	5,1	3,06	15,606	
				2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,3	
				2	7			11,6	11,3	0,3	11,6	3,06	70,992	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
V620		1	ESTRIBOS	3	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	63,342	473,21
				3	8			8,2	7,85	0,35	8,2	4	98,4	
				3	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	22,95	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	8		0,35	9,2	8,85		9,2	4	36,8	
				1	7			5,1	4,8	0,3	5,1	3,06	15,606	
				2	7		0,3	2,6	2,3		2,6	3,06	15,912	
				2	7			11,5	11,2	0,3	11,5	3,06	70,38	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				3	7		0,3	7	6,7		7	3,06	64,26	
				3	8			8,1	7,75	0,35	8,1	4	97,2	
				3	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	22,95	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	












CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V621		1	ESTRIBOS	1	8		0,35	9,2	8,85		9,2	4	36,8	472,928
				1	7			5,1	4,8	0,3	5,1	3,06	15,606	
				2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,3	
				2	7			11,6	11,3	0,3	11,6	3,06	70,992	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
V622		1	ESTRIBOS	3	7		0,3	6,8	6,5		6,8	3,06	62,424	700,8588
				4	8			3	3		3	4	48	
				3	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	33,6	
				2	8		0,35	5,5	5,15		5,5	4	44	
				5	8			8,3	7,95	0,35	8,3	4	166	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				2	7		0,35	2,5	2,15		2,5	3,06	15,3	
				2	7			11,6	11,3	0,3	11,6	3,06	70,992	
				3	7		0,3	9,2	8,9		9,2	3,06	84,456	
				3	7			4,9	4,6	0,3	4,9	3,06	44,982	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				108	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	46,5696	
				3	7		0,3	7,5	7,2		7,5	3,06	68,85	
				5	7			8	7,7	0,3	8	3,06	122,4	
				2	8		0,35	3	2,65		3	4	24	
				3	8			3,5	3,5		3,5	4	42	
				2	7		0,3	6,1	5,8		6,1	3,06	37,332	










CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V623		1	ESTRIBOS	3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	705,7272
				5	7		0,3	6,1	5,8		6,1	3,06	93,33	
				5	7			8	7,7	0,3	8	3,06	122,4	
				10	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	7,728	
				71	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	110,5328	
				10	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	2,352	
				142	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	61,2304	
V624		1	ESTRIBOS	3	7		0,3	7	6,7		7	3,06	64,26	445,458
				3	7			8	7,7	0,3	8	3,06	73,44	
				4	7		0,3	3	2,7		3	3,06	36,72	
				3	7			3	3		3	3,06	27,54	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	7,65	
				1	7			11,6	11,3	0,3	11,6	3,06	35,496	
				2	7		0,3	9,2	8,9		9,2	3,06	56,304	
				2	7			4,9	4,6	0,3	4,9	3,06	29,988	
				2	5		0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
				3	8		0,35	9	8,65		9	4	108	
				3	8			6,7	6,35	0,35	6,7	4	80,4	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				5	8			3	3		3	4	60	
				3	8			3	3		3	4	36	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V625		1	ESTRIBOS	3	8	A B	0,35	7,6	7,25		7,6	4	91,2	662,22
				3	8	B C		6,7	6,35	0,35	6,7	4	80,4	
				2	7	A B	0,3	2	1,7		2	3,06	12,24	
				2	8	B		3	3		3	4	24	
				10	3	G= 0.10 0.22 0.37 #3	0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	7,728	
				18	4	G= 0.12 0.57 0.37 #4	0,12	2,12	1,88	0,12	2,12	1	38,16	
				53	3	G= 0.10 0.57 0.37 #3	0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	61,7344	
				10	3	G= 0.10 0.22 #3	0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	2,352	
				18	4	G= 0.12 0.53 #4	0,12	0,81	0,57	0,12	0,81	1	14,58	
				53	3	G= 0.10 0.57 #3	0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	22,8536	
V626		1		3	7	A B	0,3	8,3	8		8,3	3,06	76,194	502,196
				3	8	B C		6,8	6,45	0,35	6,8	4	81,6	
				2	6	B		2	2		2	2,25	9	
				3	7	B		2,5	2,5		2,5	3,06	22,95	
				2	8	B		2,5	2,5		2,5	4	20	
				3	5	A B	0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				2	7	A B	0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	69,768	
				2	7	A B	0,3	2,7	2,4		2,7	3,06	16,524	
				2	5	A B	0,25	2	1,75		2	1,56	6,24	
				2	7	B C		2,7	2,4	0,3	2,7	3,06	16,524	
				2	7	B C		11,4	11,1	0,3	11,4	3,06	69,768	
				2	6	A B		2	2		2	2,25	9	
			ESTRIBOS	8	3	G= 0.10 0.22 0.37 #3	0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				52	3	G= 0.10 0.57 0.37 #3	0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	60,5696	
				8	3	G= 0.10 0.22 #3	0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	









CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				52	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	22,4224	
V627		1		3	7		0,3	7,1	6,8		7,1	3,06	65,178	488,916
				3	8			8	7,65	0,35	8	4	96	
				3	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	33,6	
				2	6		0,25	2	1,75		2	2,25	9	
				3	7			3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
				2	6			3,5	3,5		3,5	2,25	15,75	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	7		0,3	9,2	8,9		9,2	3,06	28,152	
				2	7		0,3	2,5	2,2		2,5	3,06	15,3	
				1	7			4,9	4,6	0,3	4,9	3,06	14,994	
				2	7			11,6	11,3	0,3	11,6	3,06	70,992	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	6,1824	
				54	3		0,1	2,08	1,88	0,1	2,08	0,56	62,8992	
				8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816	
				54	3		0,1	0,77	0,57	0,1	0,77	0,56	23,2848	
V628		1		3	7		0,3	6,8	6,5		6,8	3,06	62,424	523,0476
				3	7			8,2	7,9	0,3	8,2	3,06	75,276	
				3	7		0,3	2,8	2,5		2,8	3,06	25,704	
				4	7			4	4		4	3,06	48,96	
				2	5		0,25	6,9	6,65		6,9	1,56	21,528	
				2	5			6,45	6,2	0,25	6,45	1,56	20,124	
				2	5		0,25	4,2	3,95		4,2	1,56	13,104	
				2	5			9,15	8,9	0,25	9,15	1,56	28,548	
				3	5		0,25	2,9	2,65		2,9	1,56	13,572	
				1	7		0,3	9,2	8,9		9,2	3,06	28,152	
				1	7			4,9	4,6	0,3	4,9	3,06	14,994	
				2	7		0,3	2,4	2,1		2,4	3,06	14,688	
				2	7			11,7	11,4	0,3	11,7	3,06	71,604	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	5,7344	





























CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				59	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	78,6352	
V629		1		2	6		0,25	6,2	5,95		6,2	2,25	27,9	255,718
				2	6			8,1	7,85	0,25	8,1	2,25	36,45	
				2	4			2,2	2,2		2,2	1	4,4	
				2	4		0,2	7,35	7,15		7,35	1	14,7	
				2	4			6,85	6,65	0,2	6,85	1	13,7	
				2	4		0,2	4,15	3,95		4,15	1	8,3	
				2	4			10,05	9,85	0,2	10,05	1	20,1	
				2	7		0,3	10,2	9,9		10,2	3,06	62,424	
				2	6			4,8	4,55	0,25	4,8	2,25	21,6	
			ESTRIBOS	40	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	46,144	
				2	7		0,3	9,9	9,6		9,9	3,06	60,588	
				2	5		0,25	4,4	4,15		4,4	1,56	13,728	
				2	5		0,25	8,5	8,25		8,5	1,56	26,52	
				2	7		0,3	5,4	5,1		5,4	3,06	33,048	
				2	7			8	8		8	3,06	48,96	
				2	5			12	12		12	1,56	37,44	
				2	5			10,2	10,2		10,2	1,56	31,824	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			8	8		8	3,06	48,96	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			7,8	7,8		7,8	3,06	47,736	
				2	7			8	8		8	3,06	48,96	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				2	5			8	8		8	1,56	24,96	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7			7,7	7,7		7,7	3,06	47,124	
				2	7			8,5	8,5		8,5	3,06	52,02	
				2	7			8,1	8,1		8,1	3,06	49,572	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5			10,8	10,8		10,8	1,56	33,696	


CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V630		1		2	5	B		5,7	5,7		5,7	1,56	17,784	2317,8976
				2	7	B		7,9	7,9		7,9	3,06	48,348	
				2	7	B		12	12		12	3,06	73,44	
				2	7	B		11,8	11,8		11,8	3,06	72,216	
				2	5	B		3,5	3,5		3,5	1,56	10,92	
				2	5	B		12	12		12	1,56	37,44	
				2	5	B		10,5	10,5		10,5	1,56	32,76	
				2	5	B		12	12		12	1,56	37,44	
				2	5	B		4,5	4,5		4,5	1,56	14,04	
				2	7	B		12	12		12	3,06	73,44	
				2	7	B		11,2	11,2		11,2	3,06	68,544	
				2	5	B		10,3	10,3		10,3	1,56	32,136	
				2	6	B		3	3		3	2,25	13,5	
				2	5	A B C	0,25	8,1	7,6	0,25	8,1	1,56	25,272	
				2	5	A B C	0,25	8,1	7,6	0,25	8,1	1,56	25,272	
				2	7	B		9,1	9,1		9,1	3,06	55,692	
				2	5	B		8,2	8,2		8,2	1,56	25,584	
				2	5	B		7,8	7,8		7,8	1,56	24,336	
				2	7	B		8	8		8	3,06	48,96	
				2	7	B		8,4	8,4		8,4	3,06	51,408	
				2	7	B		7,8	7,8		7,8	3,06	47,736	
				2	5	B		5,6	5,6		5,6	1,56	17,472	
				2	5	B		10,2	10,2		10,2	1,56	31,824	
				2	7	B C		4,2	3,9	0,3	4,2	3,06	25,704	
				2	5	B C		5,45	5,2	0,25	5,45	1,56	17,004	
				2	5	B C		3,25	3	0,25	3,25	1,56	10,14	
				2	7	B C		9,4	9,1	0,3	9,4	3,06	57,528	
			ESTRIBOS	268	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	309,1648	
				23	3		0,1	2,46	2,26	0,1	2,46	0,56	31,6848	
				2	6	A B	0,25	8	7,75		8	2,25	36	
				2	6	B		7,6	7,6		7,6	2,25	34,2	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	4	B		2	2		2	1	4	
				2	6	B C		4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	20,7	
				2	4	A B	0,2	8,85	8,65		8,85	1	17,7	
				2	4	B		7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4	B		7,9	7,9		7,9	1	15,8	


















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT600		1		2	4			3,75	3,55	0,2	3,75	1	7,5	465,098
				2	4		0,2	6,68	6,48		6,68	1	13,36	
				2	4			8,1	8,1		8,1	1	16,2	
				2	4			7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4			5,75	5,55	0,2	5,75	1	11,5	
				2	6		0,25	10,8	10,55		10,8	2,25	48,6	
				2	6			8,2	8,2		8,2	2,25	36,9	
				2	6			9,5	9,25	0,25	9,5	2,25	42,75	
			ESTRIBOS	80	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	92,288	
VT600A		1		2	6		0,25	4,45	4,2		4,45	2,25	20,025	407,5484
				2	6			7,6	7,6		7,6	2,25	34,2	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	6			4,9	4,65	0,25	4,9	2,25	22,05	
				2	4		0,2	5,3	5,1		5,3	1	10,6	
				2	4			7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4			7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4			3,75	3,55	0,2	3,75	1	7,5	
				2	4		0,2	3,1	2,9		3,1	1	6,2	
				2	4			8,1	8,1		8,1	1	16,2	
				2	4			7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4			5,75	5,55	0,2	5,75	1	11,5	
				2	6		0,25	7,25	7		7,25	2,25	32,625	
				2	6			8,2	8,2		8,2	2,25	36,9	
				2	6			9,5	9,25	0,25	9,5	2,25	42,75	
			ESTRIBOS	69	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	79,5984	
VT601		14		2	6		0,25	4,35	3,85	0,25	4,35	2,25	274,05	963,7544
				2	4		0,2	4,25	3,85	0,2	4,25	1	119	
				2	4		0,2	4,25	3,85	0,2	4,25	1	119	
				2	6		0,25	4,35	-20,9	25	4,35	2,25	274,05	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	177,6544	
				2	6		0,25	4,9	4,65		4,9	2,25	88,2	
				2	6			8,4	8,4		8,4	2,25	151,2	
				2	5			2	2		2	1,56	24,96	
				2	6			4,5	4,25	0,25	4,5	2,25	81	





















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT602		4		3	8				0		0	4	0	1165,8944
				2	4		0,2	11,35	11,15		11,35	1	90,8	
				2	4			5,65	5,45	0,2	5,65	1	45,2	
				2	4		0,2	5,85	5,65		5,85	1	46,8	
				2	4			11,15	10,95	0,2	11,15	1	89,2	
				2	6		0,25	9,7	9,45		9,7	2,25	174,6	
				2	6			7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	138,6	
			ESTRIBOS	51	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	235,3344	
VT603		1		2	6		0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	17,145	43,586
				2	6		0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	17,145	
			ESTRIBOS	10	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	9,296	
VT604		1		2	6		0,25	6,3	6,05		6,3	2,25	28,35	216,0496
				2	6			11,2	10,95	0,25	11,2	2,25	50,4	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	6		0,25	10,5	10,25		10,5	2,25	47,25	
				2	6			7,2	6,95	0,25	7,2	2,25	32,4	
				2	4			2	2		2	1	4	
			ESTRIBOS	51	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	47,4096	
VT605		3		2	6		0,3	2,81	2,21	0,3	2,81	2,25	37,935	92,6028
				2	6		0,3	2,81	2,21	0,3	2,81	2,25	37,935	
			ESTRIBOS	6	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	16,7328	
VT606		1		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	52,2	350,9896
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	20,7	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	6		0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	32,85	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	40,05	

















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	51	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	47,4096	
VT608		1		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	52,2	388,1736
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	20,7	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	6		0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	32,85	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	40,05	
			ESTRIBOS	91	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	84,5936	
VT609		2		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	104,4	395,064
				2	6			4,3	4,05	0,25	4,3	2,25	38,7	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	22,5	
				2	6		0,25	7,4	7,15		7,4	2,25	66,6	
				2	6			8,8	8,55	0,25	8,8	2,25	79,2	
			ESTRIBOS	45	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	83,664	
VT610		1		2	6		0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	17,145	43,586
				2	6		0,25	3,81	3,31	0,25	3,81	2,25	17,145	
			ESTRIBOS	10	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	9,296	
VT611		2		2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	44,01	112,1896
				2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	44,01	
			ESTRIBOS	13	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	24,1696	
VT612		2		2	6		0,25	11,4	11,15		11,4	2,25	102,6	414,1416
				2	6			5,3	5,05	0,25	5,3	2,25	47,7	
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	22,5	
				2	6		0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	65,7	
				2	6			9,6	9,35	0,25	9,6	2,25	86,4	





















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	48	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	89,2416	
VT613		8		2	6		0,25	5,5	5,25		5,5	2,25	198	1805,5232
				2	6			7,8	7,55	0,25	7,8	2,25	280,8	
				2	7			5,3	5,3		5,3	3,06	259,488	
				2	8		0,35	9,5	9,15		9,5	4	608	
				2	6			4,7	4,45	0,25	4,7	2,25	169,2	
			ESTRIBOS	39	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	290,0352	
VT614		4		2	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	183,6	865,1616
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	112	
				2	6			3	3		3	2,25	54	
				2	8			3,7	3,7		3,7	4	118,4	
				2	7		0,3	10,3	9,7	0,3	10,3	3,06	252,144	
			ESTRIBOS	39	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	145,0176	
VT615		1		2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	15,075	38,5164
				2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	15,075	
			ESTRIBOS	9	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	8,3664	
VT616		1		2	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	45,9	226,4116
				2	4		0,2	10,1	9,7	0,2	10,1	1	20,2	
				2	4		0,2	10,1	9,7	0,2	10,1	1	20,2	
				2	6			4,7	4,7		4,7	2,25	21,15	
				2	8		0,35	10,4	9,7	0,35	10,4	4	83,2	
			ESTRIBOS	31	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	35,7616	
VT618		1		2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	22,005	56,0948
				2	6		0,25	4,89	4,39	0,25	4,89	2,25	22,005	
			ESTRIBOS	13	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	12,0848	
VT620		2		2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	30,15	75,1736
				2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	30,15	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	14,8736	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT620A		2		2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	30,15	104,7576
				2	4		0,2	3,25	2,85	0,2	3,25	1	13	
				2	4		0,2	3,25	2,85	0,2	3,25	1	13	
				2	6		0,25	3,35	2,85	0,25	3,35	2,25	30,15	
			ESTRIBOS	8	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	18,4576	
VT606A		1		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	52,2	519,02
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6			4,6	4,35	0,25	4,6	2,25	20,7	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4		0,2	10,35	10,15		10,35	1	20,7	
				2	4			7,9	7,9		7,9	1	15,8	
				2	4			7,6	7,6		7,6	1	15,2	
				2	4			5,65	5,45	0,2	5,65	1	11,3	
				2	4		0,2	3,35	3,15		3,35	1	6,7	
				2	4			10,6	10,6		10,6	1	21,2	
				2	4			7,2	7,2		7,2	1	14,4	
				2	4			10,35	10,15	0,2	10,35	1	20,7	
				2	6		0,25	7,2	6,95		7,2	2,25	32,4	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	40,05	
			ESTRIBOS	91	3		0,1	2	1,8	0,1	2	0,56	101,92	
VT609A		1		2	6		0,25	11,6	11,35		11,6	2,25	52,2	262,25
				2	6			4,3	4,05	0,25	4,3	2,25	19,35	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4		0,2	10,35	10,15		10,35	1	20,7	
				2	4			5,5	5,3	0,2	5,5	1	11	
				2	4		0,2	5,55	5,35		5,55	1	11,1	
				2	4			10,3	10,1	0,2	10,3	1	20,6	
				2	6		0,25	7,4	7,15		7,4	2,25	33,3	
				2	6			8,8	8,55	0,25	8,8	2,25	39,6	
			ESTRIBOS	45	3		0,1	2	1,8	0,1	2	0,56	50,4	
				2	6		0,25	11,7	11,45		11,7	2,25	52,65	
				2	6			4,2	3,95	0,25	4,2	2,25	18,9	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT612A		1		2	4	B		2	2		2	1	4	262,72
				2	4	A B	0,2	10,35	10,15		10,35	1	20,7	
				2	4	B C		5,45	5,25	0,2	5,45	1	10,9	
				2	4	A B	0,2	5,55	5,35		5,55	1	11,1	
				2	4	B C		10,25	10,05	0,2	10,25	1	20,5	
				2	6	A B	0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	32,85	
				2	6	B C		8,8	8,55	0,25	8,8	2,25	39,6	
			ESTRIBOS	46	3	G= 0.10 / 0.81 / 0.08 #3	0,1	2	1,8	0,1	2	0,56	51,52	
VT617		1		2	6	A B	0,25	12	11,75		12	2,25	54	201,0812
				2	6	B C		4,2	3,95	0,25	4,2	2,25	18,9	
				2	5	B		2	2		2	1,56	6,24	
				2	4	B		2	2		2	1	4	
				2	6	A B	0,25	7,7	7,45		7,7	2,25	34,65	
				2	6	B C		8,8	8,55	0,25	8,8	2,25	39,6	
			ESTRIBOS	47	3	G= 0.10 / 0.59 / 0.14 #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	43,6912	
VT617A		1		2	6	A B	0,25	10,9	10,65		10,9	2,25	49,05	251,58
				2	6	B C		4,3	4,05	0,25	4,3	2,25	19,35	
				2	4	B		2	2		2	1	4	
				2	4	A B	0,2	9,65	9,45		9,65	1	19,3	
				2	4	B C		5,5	5,3	0,2	5,5	1	11	
				2	4	A B	0,2	5,15	4,95		5,15	1	10,3	
				2	4	B C		10	9,8	0,2	10	1	20	
				2	6	A B	0,25	6,6	6,35		6,6	2,25	29,7	
				2	6	B C		8,8	8,55	0,25	8,8	2,25	39,6	
			ESTRIBOS	44	3	G= 0.10 / 0.81 / 0.08 #3	0,1	2	1,8	0,1	2	0,56	49,28	
VT619		2		2	6	A C	0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	91,8	432,8352
				2	6	B		6,5	6,5		6,5	2,25	58,5	
				2	6	B		6,5	6,5		6,5	2,25	58,5	
				2	8	A B C	0,35	10,4	9,7	0,35	10,4	4	166,4	
			ESTRIBOS	31	3	G= 0.10 / 0.59 / 0.14 #3	0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	57,6352	
				2	4	A C	0,2	2,1	1,7	0,2	2,1	1	12,6	
				2	4	A B C	0,2	2,1	1,7	0,2	2,1	1	12,6	
















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VT621		3	ESTRIBOS	7	3		0,1	0,96	0,76	0,1	0,96	0,56	11,2896	36,4896
VT622		2	ESTRIBOS	2	6		0,25	2,81	2,31	0,25	2,81	2,25	25,29	55,3452
				2	6		0,25	2,1	1,6	0,25	2,1	2,25	18,9	
				6	3		0,1	1,66	1,46	0,1	1,66	0,56	11,1552	
VA600		1	ESTRIBOS	3	6		0,25	10,31	9,81	0,25	10,31	2,25	69,5925	183,537
				3	6		0,25	10,31	9,81	0,25	10,31	2,25	69,5925	
				40	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	44,352	
VA601		11	ESTRIBOS	3	4		0,2	2,5	2,1	0,2	2,5	1	82,5	322,696
				3	4		0,2	2,5	2,1	0,2	2,5	1	82,5	
				20	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	157,696	
VA601A		3	ESTRIBOS	3	4		0,2	2,3	1,9	0,2	2,3	1	20,7	86,5584
				3	4		0,2	2,3	1,9	0,2	2,3	1	20,7	
				21	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	45,1584	
VA602		1	ESTRIBOS	3	6		0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	8,235	18,6876
				3	6		0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	8,235	
				2	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	2,2176	
VA603		1	ESTRIBOS	3	6		0,25	3,7	3,2	0,25	3,7	2,25	24,975	66,582
				3	6		0,25	3,7	3,2	0,25	3,7	2,25	24,975	
				15	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	16,632	
VA604		2	ESTRIBOS	3	4		0,2	1,45	1,05	0,2	1,45	1	8,7	31,736
				3	4		0,2	1,45	1,05	0,2	1,45	1	8,7	
				10	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	14,336	
VTA600		1		2	5		0,25	10,96	10,46	0,25	10,96	1,56	34,1952	129,7904
				2	5			5,8	5,8		5,8	1,56	18,096	
				2	6		0,25	10,96	10,46	0,25	10,96	2,25	49,32	








CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
			ESTRIBOS	34	3		0,1	1,48	1,28	0,1	1,48	0,56	28,1792	
VTA601		9		2	4		0,2	1,97	1,57	0,2	1,97	1	35,46	118,0944
				2	4		0,2	1,97	1,57	0,2	1,97	1	35,46	
			ESTRIBOS	12	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	47,1744	
VTA601A		1		2	4		0,2	2,1	1,7	0,2	2,1	1	4,2	13,2048
				2	4		0,2	2,1	1,7	0,2	2,1	1	4,2	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	4,8048	
VTA602		1		3	5		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	1,56	47,736	202,8888
				3	6			6,2	6,2		6,2	2,25	41,85	
				3	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	68,85	
			ESTRIBOS	81	3		0,1	0,98	0,78	0,1	0,98	0,56	44,4528	
VTA603		1		2	5		0,25	2,07	1,57	0,25	2,07	1,56	6,4584	16,232
				2	5		0,25	2,07	1,57	0,25	2,07	1,56	6,4584	
			ESTRIBOS	4	3		0,1	1,48	1,28	0,1	1,48	0,56	3,3152	
VTA604		1		2	5		0,25	2,85	2,35	0,25	2,85	1,56	8,892	23,5856
				2	5		0,25	2,85	2,35	0,25	2,85	1,56	8,892	
			ESTRIBOS	7	3		0,1	1,48	1,28	0,1	1,48	0,56	5,8016	
VTA605		2		2	4		0,2	4,1	3,9		4,1	1	16,4	279,8096
				2	5			6	6		6	1,56	37,44	
				2	4			4,8	4,6	0,2	4,8	1	19,2	
				2	6			2	2		2	2,25	18	
				2	6			3,8	3,8		3,8	2,25	34,2	
				2	4		0,2	5,9	5,7		5,9	1	23,6	
				2	4			8,5	8,3	0,2	8,5	1	34	
			ESTRIBOS	111	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	96,9696	
				2	4		0,2	5	4,8		5	1	20	
				2	5			6,8	6,8		6,8	1,56	42,432	
				2	4			4,4	4,2	0,2	4,4	1	17,6	





CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VTA606		2		2	6			3	3		3	2,25	27	312,5776
				2	5		0,25	7,3	7,05		7,3	1,56	45,552	
				2	5			8,7	8,45	0,25	8,7	1,56	54,288	
			ESTRIBOS	121	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	105,7056	
VTA607		2		2	4		0,2	5	4,8		5	1	20	311,4832
				2	5			6,2	6,2		6,2	1,56	38,688	
				2	4			5	4,8	0,2	5	1	20	
				2	6			3	3		3	2,25	27	
				2	5		0,25	7,3	7,05		7,3	1,56	45,552	
				2	5			8,6	8,35	0,25	8,6	1,56	53,664	
			ESTRIBOS	122	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	106,5792	
VTA608		2		2	4		0,2	1,45	1,05	0,2	1,45	1	5,8	15,968
				2	4		0,2	1,45	1,05	0,2	1,45	1	5,8	
			ESTRIBOS	5	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	4,368	
VTA609		1		2	5		0,25	11,4	11,15		11,4	1,56	35,568	221,4816
				2	5			11,5	11,25	0,25	11,5	1,56	35,88	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4			2,6	2,6		2,6	1	5,2	
				2	5		0,25	7,2	6,95		7,2	1,56	22,464	
				2	4			8	8		8	1	16	
				2	4			8,5	8,3	0,2	8,5	1	17	
			ESTRIBOS	172	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	75,1296	
				2	5		0,25	5,5	5,25		5,5	1,56	17,16	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			7,6	7,6		7,6	1,56	23,712	
				2	5			11,5	11,25	0,25	11,5	1,56	35,88	
				2	6			3	3		3	2,25	13,5	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	6			2,3	2,3		2,3	2,25	10,35	


















CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VTA610		1		2	5		0,25	5,8	5,55		5,8	1,56	18,096	476,0036
				2	5		0,25	10,2	9,95		10,2	1,56	31,824	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4			8,2	8,2		8,2	1	16,4	
				2	4			7,6	7,6		7,6	1	15,2	
				2	4			8	8		8	1	16	
				2	4			2,5	2,5		2,5	1	5	
				2	5			7	6,75	0,25	7	1,56	21,84	
			ESTRIBOS	362	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	158,1216	
VTA611		2		2	4		0,2	6,2	6		6,2	1	24,8	2108,948
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	48,048	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	49,296	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	48,048	
				2	5			8	8		8	1,56	49,92	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	48,048	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	48,048	
				2	5			11,6	11,35	0,25	11,6	1,56	72,384	
				2	5			2	2		2	1,56	12,48	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	6			3	3		3	2,25	27	
				2	6			3,7	3,7		3,7	2,25	33,3	
				2	4			3	3		3	1	12	
				2	4		0,2	9	8,8		9	1	36	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	31,2	

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPII E324

VIGAS NIVEL 5 ZONA COMEDOR

TOTAL EJECUTADO **52037,21**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	70,2	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	70,2	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	70,2	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	70,2	
				2	6	B C		8,6	8,4	0,2	8,6	2,25	77,4	
			ESTRIBOS	810	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	707,616	
Detalles		1		1693	3	B	0	1,2	1,2	0	1,2	0,56	1137,696	2215,02
				15	3	B		1,67	1,67		1,67	0,56	14,028	
				96	5	B C		7,1	6,85	0,25	7,1	1,56	1063,296	
vigas acople V40X65		4		24	7	B		6			6	3,06	1762,56	2356,16
				106	4	 EØ1/2"@0.09m L=1.30m	0,25	1,4	0,3	0,15	1,4	1	593,6	
vigas acople V45X65		3		20	7	B		4,7			4,7	3,06	862,92	1307,52
				114	4	 EØ1/2"@0.09m L=1.30m	0,2	1,3	0,3	0,15	1,3	1	444,6	

52037,21

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

ESCALERAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO: 3566,01

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO no.	DIAGRAMA	A	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
		ESCALERA EJE 11-12 A-B											
Tramo 1 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	1	16	4	B		0,9		0,9	1	14,4	14,40
Tramo 1 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	2	8	4	B		3,25		3,25	1	26	26,00
Tramo 1 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	3	8	4	B		2,15		2,15	1	17,2	17,20
Tramo 1 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	4	8	4	B		2,3		2,3	1	18,4	18,40
Tramo 1 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	5	8	4	B		2,85		2,85	1	22,8	22,80
Tramo 1 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	6	8	4	B		1,65		1,65	1	13,2	13,20
Tramo 1 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1		28	3	B		1,33		1,33	0,56	20,8544	20,85
Tramo 1 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1		20	3	B		2,76		2,76	0,56	30,912	30,91
Tramo 2 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	1	16	4	B		0,9		0,9	1	14,4	14,40
Tramo 2 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	7	8	4	B		4		4	1	32	32,00
Tramo 2 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	8	8	4	B		2,6		2,6	1	20,8	20,80
Tramo 2 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	9	8	4	B		1,8		1,8	1	14,4	14,40
Tramo 2 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	10	8	4	B		2,75		2,75	1	22	22,00
Tramo 2 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	11	8	4	B		4,7		4,7	1	37,6	37,60
Tramo 2 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	12	8	4	B		2,75		2,75	1	22	22,00
Tramo 2 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1		34	3	B		1,33		1,33	0,56	25,3232	25,32
Tramo 2 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1		24	3	B		1,33		1,33	0,56	17,8752	17,88
Tramo 2 NE. -30,076 a N. 0	EJE A-B 11-12 NE. -3,06 a N. 0	1	1	16	4	B		0,9		0,9	1	14,4	14,40
												0	
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	1	16	4	B		0,9		0,9	1	72	72,00
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	13	8	4	B		2,8		2,8	1	112	112,00
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	14	8	4	B		3,4		3,4	1	136	136,00
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	15	8	4	B		1,7		1,7	1	68	68,00
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	16	8	4	B		3		3	1	120	120,00
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	17	8	4	B		5,75		5,75	1	230	230,00
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	18	8	4	B		1,8		1,8	1	72	72,00
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	1	16	4	B		0,9		0,9	1	72	72,00
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5		26	3	B		1,33		1,33	0,56	96,824	96,82
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5		42	3	B		1,33		1,33	0,56	156,408	156,41
TRAMO 1	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5		16	3	B		2,76		2,76	0,56	123,648	123,65
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	1	16	4	B		0,9		0,9	1	72	72,00
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	19	8	4	B		2,8		2,8	1	112	112,00
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	20	8	4	B		4,35		4,35	1	174	174,00
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	21	8	4	B		1,8		1,8	1	72	72,00
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	22	8	4	B		2,65		2,65	1	106	106,00
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	23	16	4	B		0,9		0,9	1	72	72,00
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	24	8	4	B		2,05		2,05	1	82	82,00
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5	25	8	4	B		4,8		4,8	1	192	192,00

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

ESCALERAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **3566,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO no.	DIAGRAMA	A	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5		42	3	B		1,33		1,33	0,56	156,408	156,41
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 0.00 a N. 19,80	5		24	3	B		1,33		1,33	0,56	89,376	89,38
												0	
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	26	16	4	B		0,9		0,9	1	14,4	14,40
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	27	8	4	B		4,35		4,35	1	34,8	34,80
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	28	8	4	B		2,8		2,8	1	22,4	22,40
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	29	8	4	B		2,65		2,65	1	21,2	21,20
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	30	8	4	B		4,8		4,8	1	38,4	38,40
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	31	8	4	B		1,8		1,8	1	14,4	14,40
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	32	8	4	B		2,05		2,05	1	16,4	16,40
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	1	16	4	B		0,9		0,9	1	14,4	14,40
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1		16	3	B		2,76		2,76	0,56	24,7296	24,73
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1		42	3	B		1,33		1,33	0,56	31,2816	31,28
TRAMO 2	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1		24	3	B		2,76		2,76	0,56	37,0944	37,09
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	1	16	4	B		0,9		0,9	1	14,4	14,40
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	33	8	4	B		2,45		2,45	1	19,6	19,60
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	34	8	4	B		3,6		3,6	1	28,8	28,80
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	35	8	4	B		2,25		2,25	1	18	18,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	36	8	4	B		3		3	1	24	24,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	37	8	4	B		1,8		1,8	1	14,4	14,40
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	38	8	4	B		5,1		5,1	1	40,8	40,80
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	1	30	4	B		0,9		0,9	1	27	27,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1		20	3	B		2,76		2,76	0,56	30,912	30,91
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1		32	3	B		1,33		1,33	0,56	23,8336	23,83
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1		26	3	B		1,33		1,33	0,56	19,3648	19,36
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	39	8	4	B		3		3	1	24	24,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	40	8	4	B		3,4		3,4	1	27,2	27,20
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	41	8	4	B		1,7		1,7	1	13,6	13,60
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	42	8	4	B		2,8		2,8	1	22,4	22,40
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	43	8	4	B		5,75		5,75	1	46	46,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	44	8	4	B		1,8		1,8	1	14,4	14,40
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	1	30	4	B		0,9		0,9	1	27	27,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1		16	3	B		1,33		1,33	0,56	11,9168	11,92
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1		42	3	B		1,33		1,33	0,56	31,2816	31,28
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1		26	3	B		1,33		1,33	0,56	19,3648	19,36
tramo 1 y 3	EJE A-B 11-12 NE. 19,80 a N. 21,42	1	1	30	4	B		0,9		0,9	1	27	27,00
	ESCALERA EJE 3'-4 A-B												
												0	
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	1	16	4	B		0,9		0,9	1	72	72,00
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	13	8	4	B		2,8		2,8	1	112	112,00

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

ESCALERAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **3566,01**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO no.	DIAGRAMA	A	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	14	8	4	B		3,4		3,4	1	136	136,00
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	15	8	4	B		1,7		1,7	1	68	68,00
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	16	8	4	B		3		3	1	120	120,00
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	17	8	4	B		5,75		5,75	1	230	230,00
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	18	8	4	B		1,8		1,8	1	72	72,00
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	1	16	4	B		0,9		0,9	1	72	72,00
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5		26	3	B		1,33		1,33	0,56	96,824	96,82
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5		42	3	B		1,33		1,33	0,56	156,408	156,41
TRAMO 1	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5		16	3	B		2,76		2,76	0,56	123,648	123,65
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	1	16	4	B		0,9		0,9	1	72	72,00
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	19	8	4	B		2,8		2,8	1	112	112,00
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	20	8	4	B		4,35		4,35	1	174	174,00
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	21	8	4	B		1,8		1,8	1	72	72,00
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	22	8	4	B		2,65		2,65	1	106	106,00
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	23	16	4	B		0,9		0,9	1	72	72,00
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	24	8	4	B		2,05		2,05	1	82	82,00
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5	25	8	4	B		4,8		4,8	1	192	192,00
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5		42	3	B		1,33		1,33	0,56	156,408	156,41
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 0.00 a N. 19,80	5		24	3	B		1,33		1,33	0,56	89,376	89,38
												0	
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	26	16	4	B		0,9		0,9	1	14,4	14,40
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	27	8	4	B		4,35		4,35	1	34,8	34,80
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	28	8	4	B		2,8		2,8	1	22,4	22,40
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	29	8	4	B		2,65		2,65	1	21,2	21,20
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	30	8	4	B		4,8		4,8	1	38,4	38,40
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	31	8	4	B		1,8		1,8	1	14,4	14,40
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	32	8	4	B		2,05		2,05	1	16,4	16,40
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	1	16	4	B		0,9		0,9	1	14,4	14,40
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1		16	3	B		2,76		2,76	0,56	24,7296	24,73
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1		42	3	B		1,33		1,33	0,56	31,2816	31,28
TRAMO 2	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1		24	3	B		2,76		2,76	0,56	37,0944	37,09
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	1	16	4	B		0,9		0,9	1	14,4	14,40
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	33	8	4	B		2,45		2,45	1	19,6	19,60
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	34	8	4	B		3,6		3,6	1	28,8	28,80
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	35	8	4	B		2,25		2,25	1	18	18,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	36	8	4	B		3		3	1	24	24,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	37	8	4	B		1,8		1,8	1	14,4	14,40
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	38	8	4	B		5,1		5,1	1	40,8	40,80
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	1	30	4	B		0,9		0,9	1	27	27,00

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

ESCALERAS

ACERO

TOTAL EJECUTADO **3566,01**














Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO no.	DIAGRAMA	A	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1		20	3	B		2,76		2,76	0,56	30,912	30,91
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1		32	3	B		1,33		1,33	0,56	23,8336	23,83
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1		26	3	B		1,33		1,33	0,56	19,3648	19,36
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	39	8	4	B		3		3	1	24	24,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	40	8	4	B		3,4		3,4	1	27,2	27,20
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	41	8	4	B		1,7		1,7	1	13,6	13,60
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	42	8	4	B		2,8		2,8	1	22,4	22,40
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	43	8	4	B		5,75		5,75	1	46	46,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	44	8	4	B		1,8		1,8	1	14,4	14,40
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	1	30	4	B		0,9		0,9	1	27	27,00
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1		16	3	B		1,33		1,33	0,56	11,9168	11,92
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1		42	3	B		1,33		1,33	0,56	31,2816	31,28
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1		26	3	B		1,33		1,33	0,56	19,3648	19,36
tramo 1 y 3	EJE A-B 3'-4 NE. 19,80 a N. 21,42	1	1	30	4	B		0,9		0,9	1	27	27,00
		ESCALERA COCINA										0	
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	1	10	4	B		1,4		1,4	1	14	14,00
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	2	10	4	B		3,1		3,1	1	31	31,00
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	3	10	4	B		3,75		3,75	1	37,5	37,50
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	4	10	4	B		1,65		1,65	1	16,5	16,50
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	5	10	4	B		1,8		1,8	1	18	18,00
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	6	10	4	B		0,9		0,9	1	9	9,00
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	7	10	4	B		3,25		3,25	1	32,5	32,50
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	8	10	4	B		2,05		2,05	1	20,5	20,50
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	9	10	4	B		2,05		2,05	1	20,5	20,50
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	10	10	4	B		0,75		0,75	1	7,5	7,50
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1	11	10	4	B		2,1		2,1	1	21	21,00
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1		8	4	B		1,12		1,12	1	8,96	8,96
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1		32	3	B		1,12		1,12	0,56	20,0704	20,07
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1		12	3	B		1,12		1,12	0,56	7,5264	7,53
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1		24	3	B		1,12		1,12	0,56	15,0528	15,05
		ESCALERA COCINA										0	
Escalera sotano a patio escolar	Eje G11	1	1	8	4	B		2,6		2,6	1	20,8	20,80
Escalera sotano a patio escolar	Eje G11	1	2	8	4	B		3,45		3,45	1	27,6	27,60
Escalera sotano a patio escolar	Eje G11	1	3	8	4	B		3,65		3,65	1	29,2	29,20
Escalera sotano a patio escolar	Eje G11	1	4	8	4	B		5,75		5,75	1	46	46,00
Escalera sotano a patio escolar	Eje G11	1	5	8	4	B		2,1		2,1	1	16,8	16,80
Escalera Cocina	Eje G11	1	6	8	4	B		1		1	1	8	8,00
Escalera Cocina	Eje G11	1		18	3	B		1,41		1,41	0,56	14,2128	14,21
Escalera Cocina	Eje G11	1		12	3	B		1,41		1,41	0,56	9,4752	9,48
Escalera Cocina	Eje G / 12-13	1		30	3	B		1,41		1,41	0,56	23,688	23,69


















TOTAL ACERO	7222,84

PLANO DESPIE E329-330



































VIGAS NIVEL 5A ZONA AULAS


TOTAL EJECUTADO **32852,34**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
VA600		2		3	6		0,25	10,31	9,81	0,25	10,31	2,25	139,185	367,074
				3	6		0,25	10,31	9,81	0,25	10,31	2,25	139,185	
			ESTRIBOS	40	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	88,704	
VA601		11		3	4		0,2	2,5	2,1	0,2	2,5	1	82,5	322,696
				3	4		0,2	2,5	2,1	0,2	2,5	1	82,5	
			ESTRIBOS	20	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	157,696	
VA601A		3		3	4		0,2	2,3	1,9	0,2	2,3	1	20,7	86,5584
				3	4		0,2	2,3	1,9	0,2	2,3	1	20,7	
			ESTRIBOS	21	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	45,1584	
VA602		1		3	6		0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	8,235	18,6876
				3	6		0,25	1,22	0,72	0,25	1,22	2,25	8,235	
			ESTRIBOS	2	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	2,2176	
VA603		1		3	6		0,25	3,7	3,2	0,25	3,7	2,25	24,975	66,582
				3	6		0,25	3,7	3,2	0,25	3,7	2,25	24,975	
			ESTRIBOS	15	3		0,1	1,98	1,78	0,1	1,98	0,56	16,632	
VA604		2		3	4		0,2	1,45	1,05	0,2	1,45	1	8,7	31,736
				3	4		0,2	1,45	1,05	0,2	1,45	1	8,7	
			ESTRIBOS	10	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	14,336	
VTA600		1		2	5		0,25	10,96	10,46	0,25	10,96	1,56	34,1952	129,7904
				2	5			5,8	5,8		5,8	1,56	18,096	
				2	6		0,25	10,96	10,46	0,25	10,96	2,25	49,32	
			ESTRIBOS	34	3		0,1	1,48	1,28	0,1	1,48	0,56	28,1792	
				2	4		0,2	1,97	1,57	0,2	1,97	1	35,46	
				2	4		0,2	1,97	1,57	0,2	1,97	1	35,46	








VTA601		9	ESTRIBOS	12	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	47,1744	118,0944
VTA601A		1		2	4		0,2	2,1	1,7	0,2	2,1	1	4,2	13,2048
				2	4		0,2	2,1	1,7	0,2	2,1	1	4,2	
			ESTRIBOS	11	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	4,8048	
VTA602		1		3	5		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	1,56	47,736	202,8888
				3	6			6,2	6,2		6,2	2,25	41,85	
				3	6		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	2,25	68,85	
			ESTRIBOS	81	3		0,1	0,98	0,78	0,1	0,98	0,56	44,4528	
VTA603		1		2	5		0,25	2,07	1,57	0,25	2,07	1,56	6,4584	16,232
				2	5		0,25	2,07	1,57	0,25	2,07	1,56	6,4584	
			ESTRIBOS	4	3		0,1	1,48	1,28	0,1	1,48	0,56	3,3152	
VTA604		1		2	5		0,25	2,85	2,35	0,25	2,85	1,56	8,892	23,5856
				2	5		0,25	2,85	2,35	0,25	2,85	1,56	8,892	
			ESTRIBOS	7	3		0,1	1,48	1,28	0,1	1,48	0,56	5,8016	
VTA605		2		2	4		0,2	4,1	3,9		4,1	1	16,4	279,8096
				2	5			6	6		6	1,56	37,44	
				2	4			4,8	4,6	0,2	4,8	1	19,2	
				2	6			2	2		2	2,25	18	
				2	6			3,8	3,8		3,8	2,25	34,2	
				2	4		0,2	5,9	5,7		5,9	1	23,6	
				2	4			8,5	8,3	0,2	8,5	1	34	
			ESTRIBOS	111	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	96,9696	
VTA606		2		2	4		0,2	5	4,8		5	1	20	312,5776
				2	5			6,8	6,8		6,8	1,56	42,432	
				2	4			4,4	4,2	0,2	4,4	1	17,6	
				2	6			3	3		3	2,25	27	
				2	5		0,25	7,3	7,05		7,3	1,56	45,552	
				2	5			8,7	8,45	0,25	8,7	1,56	54,288	
			ESTRIBOS	121	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	105,7056	
				2	4		0,2	5	4,8		5	1	20	
				2	5			6,2	6,2		6,2	1,56	38,688	








VTA607		2		2	4			5	4,8	0,2	5	1	20	311,4832
				2	6			3	3		3	2,25	27	
				2	5		0,25	7,3	7,05		7,3	1,56	45,552	
				2	5			8,6	8,35	0,25	8,6	1,56	53,664	
			ESTRIBOS	122	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	106,5792	
VTA608		2		2	4		0,2	1,45	1,05	0,2	1,45	1	5,8	15,968
				2	4		0,2	1,45	1,05	0,2	1,45	1	5,8	
			ESTRIBOS	5	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	4,368	
VTA609		1		2	5		0,25	11,4	11,15		11,4	1,56	35,568	221,4816
				2	5			11,5	11,25	0,25	11,5	1,56	35,88	
				2	5			2	2		2	1,56	6,24	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4			2,6	2,6		2,6	1	5,2	
				2	5		0,25	7,2	6,95		7,2	1,56	22,464	
				2	4			8	8		8	1	16	
				2	4			8,5	8,3	0,2	8,5	1	17	
			ESTRIBOS	172	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	75,1296	
VTA610		1		2	5		0,25	5,5	5,25		5,5	1,56	17,16	476,0036
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	24,024	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	24,648	
				2	5			7,6	7,6		7,6	1,56	23,712	
				2	5			11,5	11,25	0,25	11,5	1,56	35,88	
				2	6			3	3		3	2,25	13,5	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	6			2,3	2,3		2,3	2,25	10,35	
				2	5		0,25	5,8	5,55		5,8	1,56	18,096	
				2	5		0,25	10,2	9,95		10,2	1,56	31,824	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4			8,2	8,2		8,2	1	16,4	
				2	4			7,6	7,6		7,6	1	15,2	
				2	4			8	8		8	1	16	
				2	4			2,5	2,5		2,5	1	5	
				2	5			7	6,75	0,25	7	1,56	21,84	
			ESTRIBOS	362	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	158,1216	






















				2	4		0,2	6,2	6		6,2	1	24,8	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	48,048	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,9	7,9		7,9	1,56	49,296	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	48,048	
				2	5			8	8		8	1,56	49,92	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	48,048	
				2	5			7,7	7,7		7,7	1,56	48,048	
				2	5			11,6	11,35	0,25	11,6	1,56	72,384	
				2	5			2	2		2	1,56	12,48	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
VTA611		2		2	4			2	2		2	1	8	1999,1
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	6			3	3		3	2,25	27	
				2	6			3,7	3,7		3,7	2,25	33,3	
				2	4			3	3		3	1	12	
				2	4		0,2	9	8,8		9	1	36	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			7,8	7,8		7,8	1,56	48,672	
				2	5			8,6	8,4	0,2	8,6	1,56	53,664	
			ESTRIBOS	810	3		0,1	0,78	0,58	0,1	0,78	0,56	707,616	
				5	8		0,35	11,1	10,75		11,1	4	222	

2	8		0,35	9,7	9,35		9,7	4	77,6
2	8		0,35	3,45	3,1		3,45	4	27,6
5	8		0,35	1,45	0,75	0,35	1,45	4	29
2	8		0,35	6,1	5,75		6,1	4	48,8
3	8		0,35	8,2	7,85		8,2	4	98,4
2	8			9,4	9,4		9,4	4	75,2
5	10			7,5	7,5		7,5	6,4	240
2	8			9	9		9	4	72
2	8			8,4	8,4		8,4	4	67,2
2	8			8,6	8,6		8,6	4	68,8
3	8			10,8	10,8		10,8	4	129,6
2	10			7,85	7,85		7,85	6,4	100,48
5	10			11,1	11,1		11,1	6,4	355,2
7	10			8,05	8,05		8,05	6,4	360,64
12	10			4,75	4,75		4,75	6,4	364,8
2	8			9,6	9,6		9,6	4	76,8
10	8		0,35	6,35	6		6,35	4	254
3	8			2,85	2,85		2,85	4	34,2
2	8			4,65	4,65		4,65	4	37,2
10	8		0,4	9,2	8,8		9,2	4	368
10	8			12	12		12	4	480
2	8			9	9		9	4	72
10	8			8,1	8,1		8,1	4	324
10	10			10,1	10,1		10,1	6,4	646,4
10	8			8,8	8,8		8,8	4	352
2	8			11,6	11,6		11,6	4	92,8
10	8			11,6	11,6		11,6	4	464
10	8			11,4	11,4		11,4	4	456
10	10			11,5	11,5		11,5	6,4	736
5	10			10,5	10,5		10,5	6,4	336
11	10			7,1	6,7	0,4	7,1	6,4	499,84
2	10			5,5	5,5		5,5	6,4	70,4
17	10			3,8	3,4	0,4	3,8	6,4	413,44
2	8			8,3	8,3		8,3	4	66,4
10	8			9,3	8,95	0,35	9,3	4	372
10	10			7,4	7	0,4	7,4	6,4	473,6
5	8			9,2	9,2		9,2	4	184
2	10			5	5		5	6,4	64
7	8			5	5		5	4	140
2	8			10,4	10,4		10,4	4	83,2
2	8			6,5	6,5		6,5	4	52
2	8			5,8	5,8		5,8	4	46,4
2	8			8,4	8,4		8,4	4	67,2

V701	1		3	8	B		8,4	8,4		8,4	4	100,8	15141,396
			5	8	B		8,7	8,7		8,7	4	174	
			2	8	B		11,6	11,6		11,6	4	92,8	
			2	8	B		8,1	8,1		8,1	4	64,8	
			5	8	B		6,9	6,9		6,9	4	138	
			8	8	B		5	5		5	4	160	
			5	8	B		8,7	8,7		8,7	4	174	
			2	8	B		5,5	5,5		5,5	4	44	
			5	10	B		8,5	8,5		8,5	6,4	272	
			2	10	B		4	4		4	6,4	51,2	
			4	10	B		4	4		4	6,4	102,4	
			2	8	B		9,4	9,4		9,4	4	75,2	
			2	8	B		11,9	11,9		11,9	4	95,2	
			5	10	B		8,9	8,9		8,9	6,4	284,8	
			5	10	B		7,7	7,7		7,7	6,4	246,4	
			2	8	B		3	3		3	4	24	
			5	10	B		6	6		6	6,4	192	
			5	8	B		8,1	8,1		8,1	4	162	
			2	8	B		10,3	10,3		10,3	4	82,4	
			2	8	B		11,2	11,2		11,2	4	89,6	
			3	8	B		8,7	8,7		8,7	4	104,4	
			2	8	B		6,7	6,7		6,7	4	53,6	
			5	8	B C		5,3	4,95	0,35	5,3	4	106	
			2	8	B C		4,1	3,75	0,35	4,1	4	32,8	
			2	8	B C		6,5	6,15	0,35	6,5	4	52	
			3	8	B C		7,4	7,05	0,35	7,4	4	88,8	
			2	8	B C		9,4	9,05	0,35	9,4	4	75,2	
			4	8	A B C	0,35	1,75	1,05	0,35	1,75	4	28	
			8	4	G= 0.12 0.22 0.52 #4	0,12	1,72	1,48	0,12	1,72	1	13,76	
			221	3	G= 0.10 0.77 0.52 #3	0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	344,0528	
			168	4	G= 0.12 0.77 0.52 #4	0,12	2,82	2,58	0,12	2,82	1	473,76	
			43	3	G= 0.10 1.02 0.55 #3	0,1	5,08	4,88	0,1	5,08	0,56	122,3264	

			ESTRIBOS	148	4		0,12	5,12	4,88	0,12	5,12	1	757,76
				8	4		0,12	0,46	0,22	0,12	0,46	1	3,68
				221	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	120,0472
				168	4		0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	169,68
				43	3		0,1	2,12	1,92	0,1	2,12	0,56	51,0496
				148	4		0,12	2,16	1,92	0,12	2,16	1	319,68
				5	7		0,3	7,5	7,2		7,5	3,06	114,75
				2	8			3,5	3,5		3,5	4	28
				2	8		0,35	6,15	5,8		6,15	4	49,2
				2	8		0,35	8,45	8,1		8,45	4	67,6
				5	7		0,3	1,1	0,5	0,3	1,1	3,06	16,83
				2	8		0,35	4,8	4,45		4,8	4	38,4
				3	8		0,35	9,9	9,55		9,9	4	118,8
				5	8			8,1	8,1		8,1	4	162
				2	8			10,7	10,7		10,7	4	85,6
				2	8			6	6		6	4	48
				2	8			8,7	8,7		8,7	4	69,6
				5	8			7,4	7,4		7,4	4	148
				2	8			6,9	6,9		6,9	4	55,2
				2	8			7,5	7,5		7,5	4	60
				2	8			8,6	8,6		8,6	4	68,8
				3	8			8,6	8,6		8,6	4	103,2
				5	10			10,9	10,9		10,9	6,4	348,8
				2	8			10	10		10	4	80
				2	8			5,55	5,55		5,55	4	44,4
				3	8			6,7	6,7		6,7	4	80,4
				3	8			8,9	8,9		8,9	4	106,8
				5	10		0,4	8,2	7,8		8,2	6,4	262,4
				2	8		0,35	4	3,65		4	4	32
				12	10		0,4	5	4,6		5	6,4	384
				10	8		0,35	4,65	4,3		4,65	4	186
				2	8		0,35	4	3,65		4	4	32

				10	8		0,35	12	11,65		12	4	480	
				10	8			8,9	8,9		8,9	4	356	
				10	8			8	8		8	4	320	
				2	8			11,8	11,8		11,8	4	94,4	
				10	8			12	12		12	4	480	
				2	8			10,6	10,6		10,6	4	84,8	
				10	8			11,6	11,6		11,6	4	464	
				10	10			12	12		12	6,4	768	
				5	10			10,4	10,4		10,4	6,4	332,8	
				5	10			7,2	6,8	0,4	7,2	6,4	230,4	
				10	10			4	3,6	0,4	4	6,4	256	
				2	8			5	5		5	4	40	
				2	8			5,6	5,6		5,6	4	44,8	
				10	8			9,4	9,05	0,35	9,4	4	376	
				10	8			10,6	10,25	0,35	10,6	4	424	
				5	8			8,2	8,2		8,2	4	164	
				2	8			5	5		5	4	40	
				7	8			5	5		5	4	140	
				2	8			10,4	10,4		10,4	4	83,2	
				2	8			6,3	6,3		6,3	4	50,4	
				2	8			6	6		6	4	48	
				5	8			4	4		4	4	80	
				5	8			10,8	10,8		10,8	4	216	
V704	1			5	8			9,9	9,9		9,9	4	198	12697,3936
				2	8			8	8		8	4	64	
				2	8			7,9	7,9		7,9	4	63,2	
				5	10			10,2	10,2		10,2	6,4	326,4	
				2	10			5	5		5	6,4	64	
				5	10			7,8	7,8		7,8	6,4	249,6	
				2	8			4	4		4	4	32	
				4	10			4	4		4	6,4	102,4	
				2	8			8,2	8,2		8,2	4	65,6	

	2	8			8,2	8,2		8,2	4	65,6
	3	8			10,7	10,7		10,7	4	128,4
	2	8			5,8	5,8		5,8	4	46,4
	5	8			8,4	8,4		8,4	4	168
	2	8			7,9	7,9		7,9	4	63,2
	2	8			7,9	7,9		7,9	4	63,2
	2	8			8,5	8,5		8,5	4	68
	3	8			8,6	8,6		8,6	4	103,2
	5	8			8	8		8	4	160
	2	8			8	8		8	4	64
	2	8			8,6	8,6		8,6	4	68,8
	5	8			5,3	4,95	0,35	5,3	4	106
	2	8			11,35	11	0,35	11,35	4	90,8
	2	8			6,5	6,15	0,35	6,5	4	52
	3	8			9,4	9,05	0,35	9,4	4	112,8
	2	8			7,3	6,95	0,35	7,3	4	58,4
	3	8		0,35	1,75	1,05	0,35	1,75	4	21
	8	4		0,1	1,68	0,1	0,12	0,32	1	2,56
	335	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	521,528
	181	3		0,1	5,08	4,88	0,1	5,08	0,56	514,9088
ESTRIBOS	76	4		0,12	2,82	2,58	0,12	2,82	1	214,32
	8	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,8816
	335	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	181,972
	181	3		0,1	2,12	1,92	0,1	2,12	0,56	214,8832
	76	4		0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	76,76

	32852,34

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

PLANO DESPIECE

DINTEL COMEDOR NIVEL 3A

ACERO

TOTAL EJECUTADO **3225,05**

Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO no.	DIAGRAMA	A	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
		ESCALERA EJE 11-12 A-B											
Dintel 30*70		1	Fleje dintel	348	3	B	0,1	0,6	0,12	1,64	0,56	319,6032	319,60
		1	Fleje dintel	261	3	B	0,1	0,62	0,22	1,88	0,56	274,7808	274,78
		1	Varilla	4	6	B		60		60	2,25	540	540,00
		1	Varilla	4	5	B		60		60	1,56	374,4	374,40
		1	Varilla	4	3	B		60		60	0,56	134,4	134,40
dintel 30x168		1	Fleje dintel	108	3	B	0,1	0,6	0,12	1,64	0,56	99,1872	99,19
		1	Fleje dintel	81	3	B	0,1	1,72	0,22	4,08	0,56	185,0688	185,07
		2	Varilla	12	6	B		9		9	2,25	486	486,00
		2	Varilla	6	5	B		9		9	1,56	168,48	168,48
		2	Varilla	4	3	B		9		9	0,56	40,32	40,32
dintel 30x70		1	Fleje dintel	108	3	B		2,95		2,95	0,56	178,416	178,42
		1	Fleje dintel	81	3		0,1	0,62	0,22	1,88	0,56	85,2768	85,28
		2	Varilla	4	6			9		9	2,25	162	162,00
		2	Varilla	2	5			9		9	1,56	56,16	56,16
		2	Varilla	12	3			9		9	0,56	120,96	120,96
											TOTAL ACERO		**3225,05**



CONSORCIO URBANOVA SED



















CONTRATIS CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTO LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO N CO1.PCCNTR.5698312







































PLANO DESPI E329

















PLACA NIVEL 6




















TOTAL EJECUTADO **29211,08**



Tipo	ejes	Cant	ELEMENTO	CANTIDAD	DIAMETRO	DIAGRAMA	A	LTOTAL	B	C	LONG TOTAL	PESO BARRA	PESO	PESO TOTAL Kg/m
V700		1		3	7		0,3	9,2	8,9		9,2	3,06	84,456	1641,91
				3	5			7,8	7,8		7,8	1,56	36,504	
				3	5			8	8		8	1,56	37,44	
				3	5			8	8		8	1,56	37,44	
				3	5			7,6	7,6		7,6	1,56	35,568	
				3	5			7,5	7,5		7,5	1,56	35,1	
				3	5			8,2	8,2		8,2	1,56	38,376	
				3	5			7,5	7,5		7,5	1,56	35,1	
				3	5			8	8		8	1,56	37,44	
				3	5			8	8		8	1,56	37,44	
				3	5			8	8		8	1,56	37,44	
				3	5			7,9	7,9		7,9	1,56	36,972	
				3	5			4,7	4,45	0,25	4,7	1,56	21,996	
				3	7			3,5	3,5		3,5	3,06	32,13	
				2	5			3	3		3	1,56	9,36	
				2	4			3	3		3	1	6	
				2	5			3	3		3	1,56	9,36	
				2	4			3	3		3	1	6	
				2	4			3	3		3	1	6	
				2	4			3	3		3	1	6	
				2	4			3	3		3	1	6	
				2	4			3	3		3	1	6	
				2	6			3	3		3	2,25	13,5	
				2	4			3,5	3,5		3,5	1	7	
				3	5		0,25	11,6	11,35		11,6	1,56	54,288	
				3	5			8	8		8	1,56	37,44	
				3	5			7,9	7,9		7,9	1,56	36,972	
				3	5			7,9	7,9		7,9	1,56	36,972	
				3	5			7,9	7,9		7,9	1,56	36,972	
				3	5			7,8	7,8		7,8	1,56	36,504	
				3	5			7,9	7,9		7,9	1,56	36,972	
				3	5			7,9	7,9		7,9	1,56	36,972	
				3	5			7,8	7,8		7,8	1,56	36,504	
				3	5			8,1	8,1		8,1	1,56	37,908	
				3	5			7,8	7,8		7,8	1,56	36,504	
















				3	5			9,6	9,35	0,25	9,6	1,56	44,928	
			ESTRIBOS	765	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	548,352	
V702	1			4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	426,592
				2	8			4	4		4	4	32	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				2	5		0,25	8	7,5	0,25	8	1,56	24,96	
				2	5		0,25	8	7,5	0,25	8	1,56	24,96	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				2	8			4	4		4	4	32	
				4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	
				17	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	23,6096	
				18	4		0,12	2,52	2,28	0,12	2,52	1	45,36	
			ESTRIBOS	17	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	9,2344	
				18	4		0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	18,18	
V703	1			4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	448,672
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				2	8			4	4		4	4	32	
				2	6		0,25	8	7,5	0,25	8	2,25	36	
				2	6		0,25	8	7,5	0,25	8	2,25	36	
				2	8			4	4		4	4	32	
				2	6			2	2		2	2,25	9	
				4	7		0,3	8,1	7,5	0,3	8,1	3,06	99,144	
				17	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	23,6096	
				18	4		0,12	2,52	2,28	0,12	2,52	1	45,36	
			ESTRIBOS	17	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	9,2344	
				18	4		0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	18,18	
				2	5		0,25	6,6	6,35		6,6	1,56	20,592	

















V706	1	ESTRIBOS	2	5			10,5	10,25	0,25	10,5	1,56	32,76	166,2528
			2	5		0,25	10,7	10,45		10,7	1,56	33,384	
			2	5			6,5	6,25	0,25	6,5	1,56	20,28	
			123	3		0,1	0,86	0,66	0,1	0,86	0,56	59,2368	
V705	1		3	5		0,25	7,6	7,35		7,6	1,56	35,568	1942,833
			3	6			8,1	8,1		8,1	2,25	54,675	
			2	6			3	3		3	2,25	13,5	
			2	6			3	3		3	2,25	13,5	
			3	6			8	8		8	2,25	54	
			3	6			8	8		8	2,25	54	
			2	6			3	3		3	2,25	13,5	
			2	6			3,2	3,2		3,2	2,25	14,4	
			3	5			7,6	7,6		7,6	1,56	35,568	
			3	5			7,5	7,5		7,5	1,56	35,1	
			3	5			8,2	8,2		8,2	1,56	38,376	
			3	5			7,5	7,5		7,5	1,56	35,1	
			3	6			8	8		8	2,25	54	
			2	5			3	3		3	1,56	9,36	
			3	6			3	3		3	2,25	20,25	
			3	5			8	8		8	1,56	37,44	
			3	6			8	8		8	2,25	54	
			3	5			7,9	7,9		7,9	1,56	36,972	
			2	4			3	3		3	1	6	
			3	6			3	3		3	2,25	20,25	
			2	6			3	3		3	2,25	13,5	
			3	6			3	3		3	2,25	20,25	
			3	6			11,8	11,55	0,25	11,8	2,25	79,65	
			3	6		0,25	10,4	10,15		10,4	2,25	70,2	
			3	5			9,9	9,9		9,9	1,56	46,332	
			3	6			8,2	8,2		8,2	2,25	55,35	
			3	5			7,8	7,8		7,8	1,56	36,504	
			3	5			7,8	7,8		7,8	1,56	36,504	
			3	5			8	8		8	1,56	37,44	
			3	5			7,8	7,8		7,8	1,56	36,504	
			3	5			8	8		8	1,56	37,44	
			3	6			8,1	8,1		8,1	2,25	54,675	
			3	6			8,1	8,1		8,1	2,25	54,675	
			3	5			8	8		8	1,56	37,44	
			3	5			8	8		8	1,56	37,44	
			2	5			3	3		3	1,56	9,36	


















				3	6			7,8	7,55	0,25	7,8	2,25	52,65	
			ESTRIBOS	825	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	591,36	
V707	1			4	7		0,3	7	6,7		7	3,06	85,68	630,7734
				4	7			9,2	8,9	0,3	9,2	3,06	112,608	
				3	8			6	5,65	0,35	6	4	72	
				2	5		0,25	11,5	11,25		11,5	1,56	35,88	
				2	5			3	2,75	0,25	3	1,56	9,36	
				2	5		0,25	6,8	6,55		6,8	1,56	21,216	
				2	5			7,7	7,45	0,25	7,7	1,56	24,024	
				4	5		0,25	1,7	1,2	0,25	1,7	1,56	10,608	
				2	7		0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	69,768	
				2	7			3,8	3,5	0,3	3,8	3,06	23,256	
				3	7		0,3	1,45	0,85	0,3	1,45	3,06	13,311	
				2	7		0,3	9,3	9		9,3	3,06	56,916	
				2	7			5,9	5,6	0,3	5,9	3,06	36,108	
				2	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	1,4336	
			ESTRIBOS	41	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	54,6448	
				3	4		0,12	1,32	1,08	0,12	1,32	1	3,96	
V708	1			2	8		0,35	3	2,65		3	4	24	493,122
				2	7			3	2,7	0,3	3	3,06	18,36	
				3	8		0,35	11,21	10,51	0,35	11,21	4	134,52	
				2	6		0,25	10,31	9,81	0,25	10,31	2,25	46,395	
				2	6		0,25	10,31	9,81	0,25	10,31	2,25	46,395	
				3	5		0,25	2,4	2,15		2,4	1,56	11,232	
				3	8		0,35	10,51	9,81	0,35	10,51	4	126,12	
				3	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	2,3184	
			ESTRIBOS	43	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	59,7184	
				3	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	0,7056	







				43	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	23,3576	
V709		1	ESTRIBOS	4	8		0,35	6,8	6,45		6,8	4	108,8	1109,632
				4	10			9,8	9,4	0,4	9,8	6,4	250,88	
				4	8			4,8	4,8		4,8	4	76,8	
				4	8			4	4		4	4	64	
				2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75	
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5	
				2	6		0,25	6,8	6,55		6,8	2,25	30,6	
				2	6			7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65	
				4	7		0,3	2	1,4	0,3	2	3,06	24,48	
				4	7		0,3	1,45	0,85	0,3	1,45	3,06	17,748	
				2	8		0,35	9,2	8,85		9,2	4	73,6	
				2	10			6,7	6,3	0,4	6,7	6,4	85,76	
				2	8		0,35	2,7	2,35		2,7	4	21,6	
				2	8			10,3	10,3		10,3	4	82,4	
				2	8			3,9	3,55	0,35	3,9	4	31,2	
				3	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	2,3184	
				63	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	98,0784	
				3	4		0,12	1,72	1,48	0,12	1,72	1	5,16	
				3	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	0,7056	
				63	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	34,2216	
				3	4		0,12	0,46	0,22	0,12	0,46	1	1,38	
				4	8		0,35	7,7	7,35		7,7	4	123,2	
				4	10			8,9	8,5	0,4	8,9	6,4	227,84	
				4	8			3	3		3	4	48	
				4	8			3,5	3,5		3,5	4	56	
				3	8			3	3		3	4	36	
				4	8			3,5	3,5		3,5	4	56	
				2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75	
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5	



















V710	1		ESTRIBOS	2	6		0,25	8	7,75		8	2,25	36		1164,28
				2	6			6,5	6,25	0,25	6,5	2,25	29,25		
				4	7		0,3	2	1,4	0,3	2	3,06	24,48		
				4	7		0,3	1,45	0,85	0,3	1,45	3,06	17,748		
				2	8		0,35	9,9	9,55		9,9	4	79,2		
				2	8			5,6	5,25	0,35	5,6	4	44,8		
				2	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	22,4		
				2	8			10,3	10,3		10,3	4	82,4		
				2	8			3,8	3,45	0,35	3,8	4	30,4		
				3	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	2,3184		
				22	4		0,12	2,82	2,58	0,12	2,82	1	62,04		
				45	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	70,056		
				3	3		0,1	1,68	1,48	0,1	1,68	0,56	2,8224		
				6	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,4112		
				22	4		0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	22,22		
				45	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	24,444		
				4	8		0,35	7,6	7,25		7,6	4	121,6		
				4	10			9	8,6	0,4	9	6,4	230,4		
				2	6			2,5	2,5		2,5	2,25	11,25		
				6	8			6,5	6,5		6,5	4	156		
				10	8			5	5		5	4	200		
				2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75		
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5		
				2	6		0,25	8	7,75		8	2,25	36		
				2	6			6,5	6,25	0,25	6,5	2,25	29,25		
				4	7		0,3	2	1,4	0,3	2	3,06	24,48		
				4	7		0,3	1,45	0,85	0,3	1,45	3,06	17,748		
				2	8		0,35	2,8	2,45		2,8	4	22,4		
				2	8			10,2	10,2		10,2	4	81,6		
				2	8			3,9	3,55	0,35	3,9	4	31,2		






V711		1	ESTRIBOS	2	8		0,35	9,9	9,55		9,9	4	79,2	1348,95
				2	10			6	5,6	0,4	6	6,4	76,8	
				2	6		0,25	2	1,75		2	2,25	9	
				3	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	2,3184	
				14	4		0,12	2,82	2,58	0,12	2,82	1	39,48	
				46	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	71,6128	
				3	3		0,1	1,68	1,48	0,1	1,68	0,56	2,8224	
				6	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,4112	
				14	4		0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	14,14	
				46	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	24,9872	
V720		1	ESTRIBOS	4	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	84,456	622,1868
				4	7			9,2	8,9	0,3	9,2	3,06	112,608	
				4	7			6	5,7	0,3	6	3,06	73,44	
				2	5		0,25	11,5	11,25		11,5	1,56	35,88	
				2	5			3	2,75	0,25	3	1,56	9,36	
				2	5		0,25	6,8	6,55		6,8	1,56	21,216	
				2	5			7,7	7,45	0,25	7,7	1,56	24,024	
				4	5		0,25	1,7	1,2	0,25	1,7	1,56	10,608	
				3	5		0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	1,56	6,318	
				2	7		0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	69,768	
				2	7			3,8	3,5	0,3	3,8	3,06	23,256	
				2	7		0,3	9,3	9		9,3	3,06	56,916	
				2	7			5,9	5,6	0,3	5,9	3,06	36,108	
				5	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	3,584	
				41	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	54,6448	
				4	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	84,456	
				4	7			9,2	8,9	0,3	9,2	3,06	112,608	














V722	1	ESTRIBOS	4	7			6	5,7	0,3	6	3,06	73,44	622,1868
			2	5		0,25	11,5	11,25		11,5	1,56	35,88	
			2	5			3	2,75	0,25	3	1,56	9,36	
			2	5		0,25	6,8	6,55		6,8	1,56	21,216	
			2	5			7,7	7,45	0,25	7,7	1,56	24,024	
			4	5		0,25	1,7	1,2	0,25	1,7	1,56	10,608	
			3	5		0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	1,56	6,318	
			2	7		0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	69,768	
			2	7			3,8	3,5	0,3	3,8	3,06	23,256	
			2	7		0,3	9,3	9		9,3	3,06	56,916	
			2	7			5,9	5,6	0,3	5,9	3,06	36,108	
			5	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	3,584	
			41	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	54,6448	
V712	1	ESTRIBOS	4	8		0,35	7	6,65		7	4	112	1074,5245
			4	8			9,4	9,05	0,35	9,4	4	150,4	
			2	8		0,35	3	2,65		3	4	24	
			6	8			6,2	5,85	0,35	6,2	4	148,8	
			5	8			4,2	4,2		4,2	4	84	
			2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75	
			2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5	
			2	6		0,25	6,8	6,55		6,8	2,25	30,6	
			2	6			7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65	
			4	5		0,25	1,9	1,4	0,25	1,9	1,56	11,856	
			3	6		0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	2,25	9,1125	
			2	8		0,35	9,2	8,85		9,2	4	73,6	
			2	8			6,2	5,85	0,35	6,2	4	49,6	
			2	8		0,35	2,7	2,35		2,7	4	21,6	
			2	8			10,3	10,3		10,3	4	82,4	
			2	8			3,8	3,45	0,35	3,8	4	30,4	
			2	6			2	2		2	2,25	9	
			6	3		0,1	1,68	1,48	0,1	1,68	0,56	5,6448	
			62	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	96,5216	
			6	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,4112	

				62	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	33,6784		
V713		1	ESTRIBOS	4	8		0,35	8	7,65		8	4	128		
				4	8			8,9	8,55	0,35	8,9	4	142,4		
				6	8			6,2	5,85	0,35	6,2	4	148,8		
				7	8			4,5	4,5		4,5	4	126		
				2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75		
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5		
				2	6		0,25	6,8	6,55		6,8	2,25	30,6		
				2	6			7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65		
				4	5		0,25	2,1	1,6	0,25	2,1	1,56	13,104		
				3	6		0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	2,25	9,1125		
				4	8		0,35	7,3	6,95		7,3	4	116,8		
				4	8			8,2	7,85	0,35	8,2	4	131,2		1166,0925
				4	7			3	3		3	3,06	36,72		
				6	3		0,1	1,68	1,48	0,1	1,68	0,56	5,6448		
				84	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	130,7712		
				6	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,4112		
				84	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	45,6288		
V714		1		4	8		0,35	7	6,65		7	4	112		
				4	8			9,4	9,05	0,35	9,4	4	150,4		
				2	6		0,25	3	2,75		3	2,25	13,5		
				4	7			4,2	4,2		4,2	3,06	51,408		
				2	8			4,2	4,2		4,2	4	33,6		
				2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75		
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5		
				2	6		0,25	6,8	6,55		6,8	2,25	30,6		
				2	6			7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65		
				4	5		0,25	1,9	1,4	0,25	1,9	1,56	11,856		
				3	6		0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	2,25	9,1125		
				2	8		0,35	9,2	8,85		9,2	4	73,6		
				2	8			6,2	5,85	0,35	6,2	4	49,6		
				2	8		0,35	2,7	2,35		2,7	4	21,6		906,0565
				2	8			10,3	10,3		10,3	4	82,4		


























			ESTRIBOS	2	8			3,8	3,45	0,35	3,8	4	30,4	
				5	3		0,1	1,68	1,48	0,1	1,68	0,56	4,704	
				62	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	96,5216	
				5	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,176	
				62	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	33,6784	
				4	8		0,35	8,2	7,85		8,2	4	131,2	
				4	10			9,2	8,8	0,4	9,2	6,4	235,52	
				3	7			2,8	2,8		2,8	3,06	25,704	
				6	8			5,8	5,55	0,25	5,8	4	139,2	
				10	8			4,3	4,3		4,3	4	172	
				2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75	
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5	
				2	6		0,25	8	7,75		8	2,25	36	
				2	6			6,5	6,25	0,25	6,5	2,25	29,25	
				4	7		0,3	2	1,4	0,3	2	3,06	24,48	
				4	6		0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	2,25	12,15	
				2	8		0,35	2	1,65		2	4	16	
				4	8			3	3		3	4	48	
				4	8		0,35	7,5	7,15		7,5	4	120	
				4	10			8,4	8	0,4	8,4	6,4	215,04	
V715	1			6	3		0,1	1,68	1,48	0,1	1,68	0,56	5,6448	1494,17
				18	4		0,12	2,82	2,58	0,12	2,82	1	50,76	
				62	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	96,5216	
				6	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,4112	
				36	4		0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	36,36	

				62	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	33,6784		
V716		1	ESTRIBOS	4	8		0,35	8,4	8,05		8,4	4	134,4	1116,38	
				4	8			8	7,65	0,35	8	4	128		
				2	7			2,2	2,2		2,2	3,06	13,464		
				6	8			5,3	5,05	0,25	5,3	4	127,2		
				8	8			3,5	3,5		3,5	4	112		
				2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75		
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5		
				2	6		0,25	8	7,75		8	2,25	36		
				2	6			6,5	6,25	0,25	6,5	2,25	29,25		
				4	7		0,3	2	1,4	0,3	2	3,06	24,48		
				4	8		0,35	1,55	0,85	0,35	1,55	4	24,8		
				4	8		0,35	4,5	4,15		4,5	4	72		
				2	7			3	3		3	3,06	18,36		
				4	8			11	10,65	0,35	11	4	176		
				6	3		0,1	1,68	1,48	0,1	1,68	0,56	5,6448		
				14	4		0,12	2,82	2,58	0,12	2,82	1	39,48		
				45	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	70,056		
				6	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,4112		
				14	4		0,12	1,01	0,77	0,12	1,01	1	14,14		
				45	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	24,444		
				5	8		0,35	6,3	5,95		6,3	4	126		
				5	8			10	9,65	0,35	10	4	200		
				5	8			4	4		4	4	80		
				5	8			6,2	5,95	0,25	6,2	4	124		
				2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75		
				2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5		
				2	6		0,25	6,8	6,55		6,8	2,25	30,6		
				2	6			7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65		
				4	5		0,25	1,9	1,4	0,25	1,9	1,56	11,856		





V717	1	ESTRIBOS	3	6		0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	2,25	9,1125	1086,9245
			2	6			2	2		2	2,25	9	
			2	8		0,35	9,2	8,85		9,2	4	73,6	
			2	8			6,3	5,95	0,35	6,3	4	50,4	
			2	8		0,35	2,7	2,35		2,7	4	21,6	
			2	8			3,8	3,45	0,35	3,8	4	30,4	
			2	8			10,4	10,4		10,4	4	83,2	
			6	3		0,1	1,68	1,48	0,1	1,68	0,56	5,6448	
			62	3		0,1	2,78	2,58	0,1	2,78	0,56	96,5216	
			6	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,4112	
			62	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	33,6784	
V718	1	ESTRIBOS	4	8		0,35	6,4	6,05		6,4	4	102,4	839,655
			4	8			9,9	9,55	0,35	9,9	4	158,4	
			4	8			6	5,65	0,35	6	4	96	
			2	6		0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75	
			2	6			3	2,75	0,25	3	2,25	13,5	
			2	6		0,25	6,8	6,55		6,8	2,25	30,6	
			2	6			7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65	
			4	5		0,25	1,9	1,4	0,25	1,9	1,56	11,856	
			3	7		0,3	1,45	0,85	0,3	1,45	3,06	13,311	
			2	8		0,35	9,2	8,85		9,2	4	73,6	
			2	8			6,2	5,85	0,35	6,2	4	49,6	
			2	6		0,25	2	1,75		2	2,25	9	
			2	7			3,8	3,5	0,3	3,8	3,06	23,256	
			2	6			10,2	10,2		10,2	2,25	45,9	
			6	3		0,1	1,38	1,18	0,1	1,38	0,56	4,6368	
			62	3		0,1	2,48	2,28	0,1	2,48	0,56	86,1056	
			6	3		0,1	0,42	0,22	0,1	0,42	0,56	1,4112	












				62	3		0,1	0,97	0,77	0,1	0,97	0,56	33,6784	
V719	1		ESTRIBOS	4	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	84,456	620,7468
				4	7			9,2	8,9	0,3	9,2	3,06	112,608	
				3	8			6	5,65	0,35	6	4	72	
				2	5		0,25	11,5	11,25		11,5	1,56	35,88	
				2	5			3	2,75	0,25	3	1,56	9,36	
				2	5		0,25	6,8	6,55		6,8	1,56	21,216	
				2	5			7,7	7,45	0,25	7,7	1,56	24,024	
				4	5		0,25	1,7	1,2	0,25	1,7	1,56	10,608	
				3	5		0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	1,56	6,318	
				2	7		0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	69,768	
				2	7			3,8	3,5	0,3	3,8	3,06	23,256	
				2	7		0,3	9,3	9		9,3	3,06	56,916	
				2	7			5,9	5,6	0,3	5,9	3,06	36,108	
				5	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	3,584	
				41	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	54,6448	
V721	1		ESTRIBOS	4	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	84,456	622,1868
				4	7			9,2	8,9	0,3	9,2	3,06	112,608	
				4	7			6	5,7	0,3	6	3,06	73,44	
				2	5		0,25	11,5	11,25		11,5	1,56	35,88	
				2	5			3	2,75	0,25	3	1,56	9,36	
				2	5		0,25	6,8	6,55		6,8	1,56	21,216	
				2	5			7,7	7,45	0,25	7,7	1,56	24,024	
				4	5		0,25	1,7	1,2	0,25	1,7	1,56	10,608	
				3	5		0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	1,56	6,318	
				2	7		0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	69,768	
				2	7			3,8	3,5	0,3	3,8	3,06	23,256	
				2	7		0,3	9,3	9		9,3	3,06	56,916	
				2	7			5,9	5,6	0,3	5,9	3,06	36,108	
				5	3		0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	3,584	
				41	3		0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	54,6448	
				4	7		0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	84,456	
				4	7			9,2	8,9	0,3	9,2	3,06	112,608	












V723		1		4	7	B C		6	5,7	0,3	6	3,06	73,44	623,5196
				2	5	A B	0,25	11,5	11,25		11,5	1,56	35,88	
				2	5	B C		3	2,75	0,25	3	1,56	9,36	
				2	5	A B	0,25	6,8	6,55		6,8	1,56	21,216	
				2	5	B C		7,7	7,45	0,25	7,7	1,56	24,024	
				4	5	A B C	0,25	1,7	1,2	0,25	1,7	1,56	10,608	
				3	5	A B C	0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	1,56	6,318	
				2	7	A B	0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	69,768	
				2	7	B C		3,8	3,5	0,3	3,8	3,06	23,256	
				2	7	A B	0,3	9,3	9		9,3	3,06	56,916	
				2	7	B C		5,9	5,6	0,3	5,9	3,06	36,108	
			ESTRIBOS	5	3	G= 0.10 0.22 0.32 #3	0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	3,584	
				42	3	G= 0.10 0.77 0.37 #3	0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	55,9776	
V724		1		4	7	A B	0,3	6,9	6,6		6,9	3,06	84,456	731,8884
				4	8	B C		9,4	9,05	0,35	9,4	4	150,4	
				4	8	B :		6	5,65	0,35	6	4	96	
				2	6	A B	0,25	11,5	11,25		11,5	2,25	51,75	
				2	6	B C		3	2,75	0,25	3	2,25	13,5	
				2	6	A B	0,25	6,8	6,55		6,8	2,25	30,6	
				2	6	B C		7,7	7,45	0,25	7,7	2,25	34,65	
				4	5	A B C	0,25	1,7	1,2	0,25	1,7	1,56	10,608	
				3	5	A B C	0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	1,56	6,318	
				2	7	A B	0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	69,768	
				2	7	B C		3,8	3,5	0,3	3,8	3,06	23,256	
				2	7	A B	0,3	9,3	9		9,3	3,06	56,916	
				2	7	B C		5,9	5,6	0,3	5,9	3,06	36,108	
			ESTRIBOS	5	3	G= 0.10 0.22 0.32 #3	0,1	1,28	1,08	0,1	1,28	0,56	3,584	
				48	3	G= 0.10 0.77 0.37 #3	0,1	2,38	2,18	0,1	2,38	0,56	63,9744	
VT700		1		2	6	A B C	0,25	5,04	4,54	0,25	5,04	2,25	22,68	80,1168
				2	4	A B C	0,2	4,94	4,54	0,2	4,94	1	9,88	
				2	4	A B C	0,2	4,94	4,54	0,2	4,94	1	9,88	
				2	6	A B C	0,25	5,04	4,54	0,25	5,04	2,25	22,68	
			ESTRIBOS	13	3	G= 0.10 0.29 0.14 #3	0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	14,9968	

VT701		3		2	6		0,25	2,96	2,46	0,25	2,96	2,25	39,96	135,0048
				2	4		0,2	2,86	2,46	0,2	2,86	1	17,16	
				2	4		0,2	2,86	2,46	0,2	2,86	1	17,16	
				2	6		0,25	2,96	2,46	0,25	2,96	2,25	39,96	
			ESTRIBOS	6	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	20,7648	
VT703		2		2	6		0,25	11,7	11,45		11,7	2,25	105,3	1016,3768
				2	6			7,5	7,5		7,5	2,25	67,5	
				2	6			11,7	11,45	0,25	11,7	2,25	105,3	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4			2	2		2	1	8	
				2	4		0,2	10,35	10,15		10,35	1	41,4	
				2	4			1,1	1,1		1,1	1	4,4	
				2	4			10,35	10,15	0,2	10,35	1	41,4	
				2	4		0,2	5,5	5,3		5,5	1	22	
				2	4			7,7	7,7		7,7	1	30,8	
				2	4			5,6	5,6		5,6	1	22,4	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	31,2	
				2	4			5,5	5,3	0,2	5,5	1	22	
				2	6		0,25	7,2	6,95		7,2	2,25	64,8	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	72,9	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	72,9	
				2	6			8,8	8,55	0,25	8,8	2,25	79,2	
			ESTRIBOS	94	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	216,8768	
VT704		1		2	6		0,25	11,9	11,65		11,9	2,25	53,55	265,682
				2	6			4,4	4,15	0,25	4,4	2,25	19,8	
				2	4		0,2	5,75	5,55		5,75	1	11,5	
				2	4			10,05	9,85	0,2	10,05	1	20,1	
				2	4		0,2	10,45	10,25		10,45	1	20,9	
				2	4			5,35	5,15	0,2	5,35	1	10,7	
				2	6		0,25	0,96	0,46	0,25	0,96	2,25	4,32	
				2	6		0,25	9,1	8,85		9,1	2,25	40,95	
				2	6			7,1	6,85	0,25	7,1	2,25	31,95	
			ESTRIBOS	45	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	51,912	
				2	6		0,25	5,4	4,9	0,25	5,4	2,25	72,9	
				2	4		0,2	4,55	4,15	0,2	4,55	1	27,3	

VT707		3	ESTRIBOS	2	4	A B C	0,2	4,55	4,15	0,2	4,55	1	27,3	253,2552
				2	6	A B C	0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	2,25	18,225	
				2	6	A B C	0,25	4,65	4,15	0,25	4,65	2,25	62,775	
				12	3	G= 0.10 0.79 0.14 #3	0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	41,5296	
				2	3	G= 0.10 0.24 0.14 #3	0,1	0,96	0,76	0,1	0,96	0,56	3,2256	
VT716		2	ESTRIBOS	2	6	A B C	0,25	2,96	2,46	0,25	2,96	2,25	26,64	90,0032
				2	4	A B C	0,2	2,86	2,46	0,2	2,86	1	11,44	
				2	4	A B C	0,2	2,86	2,46	0,2	2,86	1	11,44	
				2	6	A B C	0,25	2,96	2,46	0,25	2,96	2,25	26,64	
				6	3	G= 0.10 0.79 0.14 #3	0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	13,8432	
				2	6	A B	0,25	9,2	8,95		9,2	2,25	41,4	
				2	6	B		7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6	B		8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6	B		7,6	7,6		7,6	2,25	34,2	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6	B		8	8		8	2,25	36	
				2	6	B		7,7	7,7		7,7	2,25	34,65	
				2	6	B		7,8	7,8		7,8	2,25	35,1	
				2	6	B C		4,9	4,65	0,25	4,9	2,25	22,05	
				2	4	A B	0,2	9,75	9,55		9,75	1	19,5	
				2	4	B		8	8		8	1	16	
				2	4	B		8	8		8	1	16	
				2	4	B		7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4	B		7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4	B		7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4	B		8	8		8	1	16	
				2	4	B		8	8		8	1	16	
				2	4	B		7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4	B		8	8		8	1	16	
				2	4	B		7,8	7,8		7,8	1	15,6	

VT702	1			2	4			10,4	10,2	0,2	10,4	1	20,8	1773,0788
				2	4		0,2	7,4	7,2		7,4	1	14,8	
				2	4			8	8		8	1	16	
				2	4			8	8		8	1	16	
				2	4			8	8		8	1	16	
				2	4			7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4			7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4			7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4			8	8		8	1	16	
				2	4			8	8		8	1	16	
				2	4			7,7	7,7		7,7	1	15,4	
				2	4			8	8		8	1	16	
				2	4			7,8	7,8		7,8	1	15,6	
				2	4			5,4	5,2	0,2	5,4	1	10,8	
				2	6		0,25	1,6	1,1	0,25	1,6	2,25	7,2	
				2	6		0,25	0,96	0,46	0,25	0,96	2,25	4,32	
				2	6		0,25	4,5	4,25		4,5	2,25	20,25	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			8,2	8,2		8,2	2,25	36,9	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	6			8,1	8,1		8,1	2,25	36,45	
				2	6			7,9	7,9		7,9	2,25	35,55	
				2	6			8	8		8	2,25	36	
				2	8			8,1	8,1		8,1	4	64,8	
				2	8			8	8		8	4	64	
				2	8			8,2	8,2		8,2	4	65,6	
				2	8			7,9	7,9		7,9	4	63,2	
				2	6			9	8,75	0,25	9	2,25	40,5	
			ESTRIBOS	294	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	339,1584	
				4	3		0,1	0,96	0,76	0,1	0,96	0,56	2,1504	
V708	4			2	7		0,3	10,3	9,7	0,3	10,3	3,06	252,144	998,0704
				2	7			2,5	2,5		2,5	3,06	61,2	
				2	5		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	1,56	127,296	
				2	5		0,25	10,2	9,7	0,25	10,2	1,56	127,296	
				2	5			2,8	2,8		2,8	1,56	34,944	
				2	7		0,3	10,3	9,7	0,3	10,3	3,06	252,144	

			ESTRIBOS	31	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	143,0464	
V709		1		2	6		0,25	6,3	6,05		6,3	2,25	28,35	291,05
				2	6			11,2	10,95	0,25	11,2	2,25	50,4	
				2	4			2	2		2	1	4	
				2	4		0,2	6,75	6,55		6,75	1	13,5	
				2	4			10,25	10,05	0,2	10,25	1	20,5	
				2	4		0,2	11,65	11,45		11,65	1	23,3	
				2	4			5,35	5,15	0,2	5,35	1	10,7	
				2	6		0,25	0,96	0,46	0,25	0,96	2,25	4,32	
				2	6		0,25	8,5	8,25		8,5	2,25	38,25	
				2	6			8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	40,05	
			ESTRIBOS	50	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	57,68	
V710		2		2	6		0,25	11,7	11,45		11,7	2,25	105,3	531,4312
				2	6			4,2	3,95	0,25	4,2	2,25	37,8	
				2	4			2,5	2,5		2,5	1	10	
				2	4		0,2	5,55	5,35		5,55	1	22,2	
				2	4			10,25	10,05	0,2	10,25	1	41	
				2	4		0,2	10,45	10,25		10,45	1	41,8	
				2	4			5,35	5,15	0,2	5,35	1	21,4	
				2	6		0,25	7,3	7,05		7,3	2,25	65,7	
				2	6			8,9	8,65	0,25	8,9	2,25	80,1	
			ESTRIBOS	46	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	106,1312	
V711		2		2	7		0,3	11,5	11,2		11,5	3,06	140,76	672,548
				2	7			5,3	5	0,3	5,3	3,06	64,872	
				2	5		0,25	5,4	5,15		5,4	1,56	33,696	
				2	5			10,4	10,15	0,25	10,4	1,56	64,896	
				2	5		0,25	10,4	10,15		10,4	1,56	64,896	
				2	5			5,4	5,15	0,25	5,4	1,56	33,696	
				2	6		0,25	1,6	1,1	0,25	1,6	2,25	14,4	
				2	6		0,25	9	8,75		9	2,25	81	
				2	6			7,1	6,85	0,25	7,1	2,25	63,9	

			ESTRIBOS	46	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	106,1312	
				4	3		0,1	0,96	0,76	0,1	0,96	0,56	4,3008	
V712		2		2	6		0,25	5,04	4,54	0,25	5,04	2,25	45,36	
				2	4		0,2	4,94	4,54	0,2	4,94	1	19,76	
				2	4		0,2	4,94	4,54	0,2	4,94	1	19,76	
				2	6		0,25	5,04	4,54	0,25	5,04	2,25	45,36	
			ESTRIBOS	13	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	29,9936	160,2336
VT714		1		2	4		0,2	6,1	5,9		6,1	1	12,2	
				2	4			9,6	9,4	0,2	9,6	1	19,2	
				2	4		0,2	10	9,8		10	1	20	
				2	4			5,8	5,6	0,2	5,8	1	11,6	
			ESTRIBOS	96	3		0,1	0,96	0,76	0,1	0,96	0,56	51,6096	114,6096
V715		6		2	6		0,25	5,2	4,95		5,2	2,25	140,4	
				2	6			10,1	9,85	0,25	10,1	2,25	272,7	
				2	6			3	3		3	2,25	81	
				2	5		0,25	4,05	3,8		4,05	1,56	75,816	
				2	5			10,4	10,15	0,25	10,4	1,56	194,688	
				2	5		0,25	6,75	6,5		6,75	1,56	126,36	
				2	5			7,7	7,45	0,25	7,7	1,56	144,144	
				2	6		0,25	1,35	0,85	0,25	1,35	2,25	36,45	
				2	7		0,3	11,4	11,1		11,4	3,06	418,608	
				2	7			3,8	3,5	0,3	3,8	3,06	139,536	
			ESTRIBOS	42	3		0,1	2,06	1,86	0,1	2,06	0,56	290,7072	1930,086
				3	3		0,1	0,96	0,76	0,1	0,96	0,56	9,6768	
				1693	3		0	1,2	1,2	0	1,2	0,56	1137,696	

Detalles		1		15	3	B		1,67	1,67		1,67	0,56	14,028	2215,02
				96	5	B c		7,1	6,85	0,25	7,1	1,56	1063,296	
vigas acople V40X65		3		24	7	B		6			6	3,06	1321,92	1767,12
				106	4	.30 .15 20 E Ø1/2"@0.09m L=1.30m	0,25	1,4	0,3	0,15	1,4	1	445,2	
vigas acople V45X65		2		20	7	B		4,7			4,7	3,06	575,28	871,68
				114	4	.30 .15 20 E Ø1/2"@0.09m L=1.30m	0,2	1,3	0,3	0,15	1,3	1	296,4	
														34064,90




CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

Columnas piso 5-6


Ubicación: **Columnas piso 5-6**

Lista de producto Nº 3

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
1	 a = 0.1 b = 0.39 c = 0.39	320	Nº 3	1,76	315,39	[320] Pantalla 3
2	 a = 0.1 b = 0.72 c = 0.32	235	Nº 3	2,28	300,05	[235] Ca10
3	 a = 0.1 b = 0.32 c = 0.1	1000	Nº 3	0,52	291,20	[1000] Ca10
4	 a = 0.1 b = 0.34 c = 0.1	8000	Nº 3	0,54	2.419,20	[8000] Pantallas 3,2,1,4
5	 a = 0.1 b = 0.39 c = 0.1	2000	Nº 3	0,59	660,80	[2000] Pantallas 3,2,1,4
6	 a = 0.1 b = 0.72 c = 0.1	400	Nº 3	0,92	206,08	[400] Ca10

Lista de producto Nº 4






No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
7	 a = 0.12 b = 0.72 c = 0.42	142	Nº 4	2,52	357,84	[142] Columna Ca2
	a = 0.12 b = 0.72					

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

Columnas piso 5-6

8	 c = 0.57	71	N° 4	2,82	200,22	[71] Ca1
9	 a = 0.12 b = 0.92 c = 0.52	50	N° 4	3,12	156,00	[50] Columna 3-4
10	 a = 0.12 b = 0.42 c = 0.12	568	N° 4	0,66	374,88	[568] Columna Ca2
11	 a = 0.12 b = 0.52 c = 0.12	250	N° 4	0,76	190,00	[250] Columna 3-4
12	 a = 0.12 b = 0.57 c = 0.12	284	N° 4	0,81	230,04	[284] Ca1
13	 a = 0.12 b = 0.72 c = 0.12	426	N° 4	0,96	408,96	[142] Ca1,/n[284] Columna Ca2
14	 a = 0.12 b = 0.92 c = 0.12	100	N° 4	1,16	116,00	[100] Columna 3-4

Lista de producto N° 5

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
15	 a = 0.25 b = 7.45	50	N° 5	7,70	600,60	[50] Pantalla 3

Lista de producto N° 7




No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
16	 a = 0.3 b = 7.75	13	N° 7	8,05	320,23	[13] Ca12

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

Columnas piso 5-6

Lista de producto Nº 8

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
17		26	Nº 8	8,15	847,60	[13] Ca10,/n[13] Ca13
18		20	Nº 8	8,15	652,00	[20] Columna Ca2
19		47	Nº 8	8,20	1.541,60	[17] Columna Ca3,/n[16] Ca1,/n[14] Columna CA4


DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 7690 -- ESTADO [Confirmado]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 06-11-2025 17:15:45
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

Lista de producto Nº 10

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
20		11	Nº 10	8,45	594,88	[3] Columna CA4,/n[8] Columna Ca2

TOTALES PARA Acero Figurado		
DIÁMETRO	PRODUCTO	PESO TOTAL
Nº 3 - 3/8	Acero Figurado	4.192,72
Nº 4 - 1/2	Acero Figurado	2.033,94
Nº 5 - 5/8	Acero Figurado	600,60
Nº 7 - 7/8	Acero Figurado	320,23
Nº 8 - 1"	Acero Figurado	3.041,20

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

Columnas piso 5-6

N° 10 - 1" 1/4	Acero Figurado	594,88
TOTAL		10.783,57

PESO TOTAL	10.783,57

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

Complemento pantallas a cubierta aulas

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 7355 -- ESTADO [Confirmado]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-10-2025 16:35:32
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

Ubicación:

Lista de producto Nº 3

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
1	b = 6.2	398	Nº 3	6,20	1.381,86	[46] Pantalla 5,/n[124] Pantalla 8,/n[126] Pantalla 11,/n[102] Pantalla 10
2	a = 0.1 b = 0.87 c = 0.1	1370	Nº 3	1,07	820,90	[1370] Columna CA5
3	a = 0.1 b = 1.62 c = 0.1	548	Nº 3	1,82	558,52	[548] Columna CA5

Lista de producto Nº 4

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
4	b = 6.2	292	Nº 4	6,20	1.810,40	[28] pantalla 2,/n[46] PANTALLA 4,/n[42] Pantalla 9,/n[28] Pantalla 1,/n[46] pantalla 7,/n[46] Pantalla 6,/n[56] Pantalla 3


No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
5	a = 0.1 b = 0.32 c = 0.26	10	Nº 4	1,36	13,60	[10] Viga de acople

CONSORCIO URBANOVA SED


CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

Complemento pantallas a cubierta aulas

6	 a = 0.1 b = 0.32 c = 0.28	8	N° 4	1,40	11,20	[8] Viga de acople
7	 a = 0.1 b = 0.32 c = 0.3	8	N° 4	1,44	11,52	[8] Viga de acople
8	 a = 0.1 b = 0.32 c = 0.32	8	N° 4	1,48	11,84	[8] Viga de acople
9	 a = 0.1 b = 0.32 c = 0.34	8	N° 4	1,52	12,16	[8] Viga de acople
10	 a = 0.1 b = 0.32 c = 0.36	4	N° 4	1,56	6,24	[4] Viga de acople
11	 a = 0.1 b = 0.32 c = 0.38	4	N° 4	1,60	6,40	[4] Viga de acople
12	 a = 0.1 b = 0.32 c = 0.4	4	N° 4	1,64	6,56	[4] Viga de acople

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
13	 a = 0.1 b = 0.32 c = 0.42	4	N° 4	1,68	6,72	[4] Viga de acople
14	 a = 0.12 b = 1.62 c = 0.87	137	N° 4	5,22	715,14	[137] Columna CA5

Lista de producto N° 5

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
15	 b = 6.3	42	N° 5	6,30	412,78	[42] Pantalla 9

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

Complemento pantallas a cubierta aulas

Lista de producto Nº 7

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
16	b = 4.7	40	Nº 7	4,70	575,28	[40] Viga de acople 2
17	b = 6.0	48	Nº 7	6,00	881,28	[48] Viga de acople

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
18	b = 10.8	26	Nº 7	10,80	859,25	[26] Columna

Lista de producto Nº 8

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
19	a = 0.35 b = 4.3	12	Nº 8	4,65	223,20	[12] Columna CA5
20	a = 0.35 b = 6.91	25	Nº 8	7,61	761,00	[25] Columna CA5

Lista de producto Nº 10

No.	DIAGRAMA	CANTIDAD	PRODUCTO	LONG. (m)	PESO (kg)	UBICACIÓN
21	a = 0.45 b = 6.91	12	Nº 10	7,81	599,81	[12] Columna CA5

TOTALES PARA Acero Figurado		
DIÁMETRO	PRODUCTO	PESO TOTAL
Nº 3 - 3/8	Acero Figurado	2.761,28
Nº 4 - 1/2	Acero Figurado	2.611,78
Nº 5 - 5/8	Acero Figurado	412,78

CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
COTRATO No: CO1.PCCNTR.5698312

Complemento pantallas a cubierta aulas

DISHIERROS S.A.S.

CARTILLA No. 7355 -- ESTADO [**Confirmado**]
Cliente: CONSORCIO URBANOVA SED

Dirección: CALLE 159 # 8-56
Persona a cargo: ING DANILO

Fecha: 07-10-2025 16:35:32
Proyecto: COLEGIO GENERAL SANTANDER
Teléfono: 319 4795909

N° 7 - 7/8	Acero Figurado	2.315,81
N° 8 - 1"	Acero Figurado	984,20
N° 10 - 1" 1/4	Acero Figurado	599,81
TOTAL		9.685,65

PESO TOTAL	9.685,65

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.5 Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
CANCHA					-				-	-
CANCHA NO. 1	32,11	18,40	0,10	1,00	59,08				-	59,08
CANCHA NO. 2	32,11	18,40	0,10	1,00	59,08				-	59,08
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
									VIENE	
									TOTAL	118,16

FOTOS





Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.5 Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 2

CROQUIS

CANCHAS





Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.9 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
LUDOTECA SEGUNDO NIVEL EJE D1 /1A 3					-				-	-
VL 204	8,39	0,40	0,53	1,00	1,78				-	1,78
VL 205	9,39	0,40	0,53	1,00	1,99				-	1,99
VTL 200	10,08	0,40	0,53	1,00	2,14				-	2,14
VTL201	5,02	0,40	0,53	1,00	1,06				-	1,06
VTL203	3,88	0,20	0,53	2,00	0,82				-	0,82
VTL 202	4,67	0,40	0,53	1,00	0,99				-	0,99
PLACA	9,87	4,85	0,12	1,00	5,74				-	5,74
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-					-
					-					-
					-					-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
									VIENE	
									TOTAL	14,52

FOTOS





Observaciones	Se ajusta largo de vigas por recomendación estructural

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.9 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 2

CROQUIS

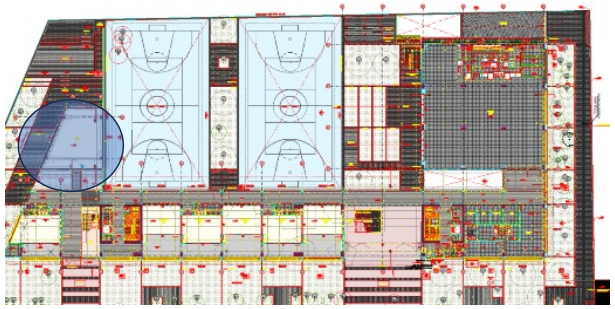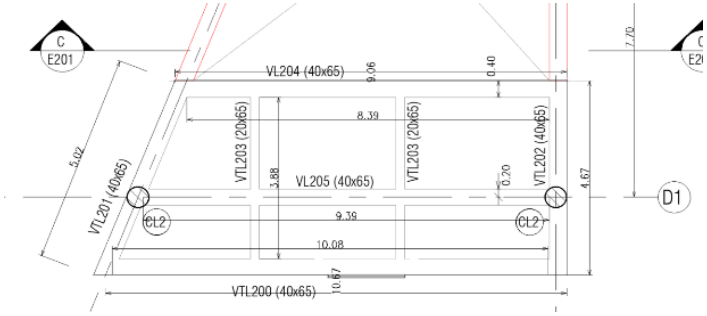PLACA 2DO PISO
LUDOTECA





Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED / Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas / Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.17 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
PLACA CUARTO PISO - ZONA COMEDOR					-				-	-
EJE 10-14 / E-G					-				-	-
a AREA TOTAL PLACA		0,13	114,90	1,00	14,94				-	14,94
b AREA VACIOS		0,13	13,35	-1,00	-1,74				-	-1,74
c AREA VIGAS		0,53	35,58	1,00	18,86				-	18,86
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
									VIENE	-
									TOTAL	32,06

FOTOS



Observaciones

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA Logia 3	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED


DIRECTOR TECNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ


INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.17 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 2

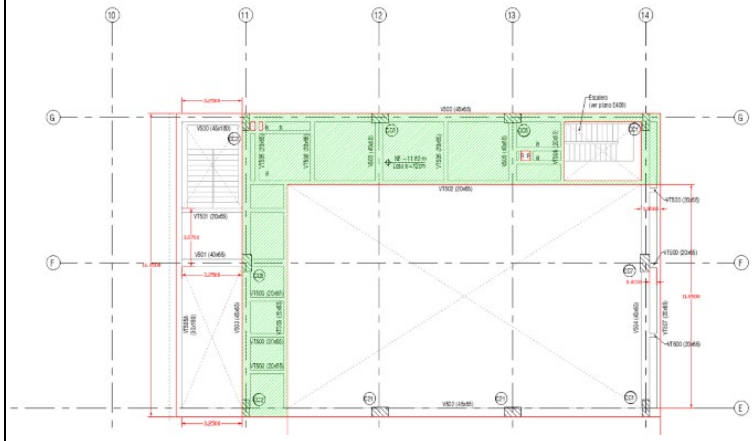CROQUIS





SECCION TIPICA DE PLACA AULAS
escala 1 : 25

AREA: 114,90M2
vacios: 13,35M2
Caseton: 79,32M2
AREA VIGAS:
35,58M2

Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	**3.2.21 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Quinto nivel.**	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 2

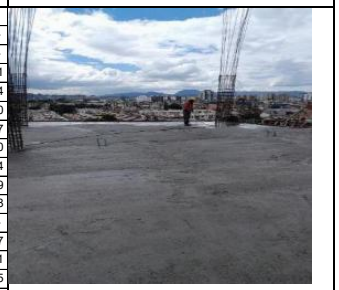AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD		L	a	h			
					-				-	-	
PLACA QUINTO PISO					-				-	-	
EJE 8'-14 / A-B					-				-	-	
a AREA TOTAL PLACA	2,70	4,30	0,13	1,00	1,51				-	1,51	
a AREA TOTAL PLACA	40,80	12,30	0,13	1,00	65,24				-	65,24	
a AREA TOTAL PLACA	7,70	1,40	0,13	1,00	1,40				-	1,40	
V630	40,80	0,20	0,73	1,00	3,17				-	3,17	
V608	35,30	0,45	0,73	1,00	11,60				-	11,60	
VT609A	13,65	0,15	0,75	1,00	1,54				-	1,54	
VT609	13,65	0,20	0,53	2,00	2,89				-	2,89	
V612	37,25	0,40	0,73	1,00	10,88				-	10,88	
					-				-	-	
VT 622	1,76	0,20	0,53	2,00	0,37				-	0,37	
VT611	3,84	0,20	0,53	2,00	0,81				-	0,81	
V610	1,88	0,45	0,53	1,00	0,45				-	0,45	
VT610	2,65	0,20	0,53	1,00	0,28				-	0,28	
VT622	1,76	0,20	0,53	1,00	0,19				-	0,19	
VT612A	13,95	0,15	0,73	1,00	1,53				-	1,53	
VT612	13,95	0,20	0,53	2,00	2,96				-	2,96	
VT615	2,70	0,20	0,53	1,00	0,29				-	0,29	
V623	11,70	0,80	0,53	1,00	4,96				-	4,96	
VT613	11,70	0,20	0,53	3,00	3,72				-	3,72	
V624	11,70	0,40	0,53	1,00	2,48				-	2,48	
V625	11,70	0,45	0,53	1,00	2,79				-	2,79	
VT620	2,70	0,20	0,53	1,00	0,29				-	0,29	
VT620A	2,70	0,20	0,73	1,00	0,39				-	0,39	
VT614	8,95	0,20	0,53	2,00	1,90				-	1,90	
V626	11,70	0,45	0,73	1,00	3,84				-	3,84	
V627	11,70	0,40	0,53	1,00	2,48				-	2,48	
VT619	11,70	0,20	0,53	1,00	1,24				-	1,24	
V628	11,70	0,40	0,73	1,00	3,42				-	3,42	
									-	-	
									-	-	
									VIENE	-	
									TOTAL	132,62	

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA Logia 3	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED


DIRECTOR TECNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ


INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.21 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Quinto nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 2

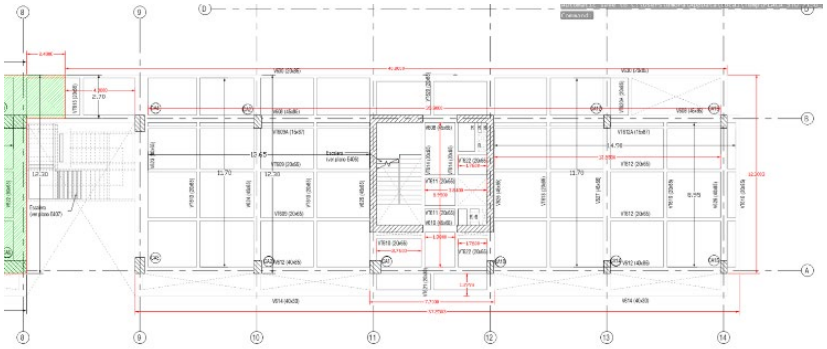CROQUIS





SECCION TIPICA DE PLACA AULAS
escala 1 : 25

Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TECNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.25 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Sexto nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 4

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			%. PARCIAL A PAGAR OPRESENTE CORTE	TOTAL	FOTOS
	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	CANTIDAD		L	a	h			
					-					-	
PLACA SEXTO PISO - ZONA COMEDOR					-					-	
EJE 1-9/ A-B					-					-	
a AREA TOTAL PLACA		0,13	1.415,70	1,00	184,04				40%	73,62	
Area vacios		0,13	100,52	-1,00	-13,07				40%	-5,23	
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	-					-	
V700	91,60	0,40	0,30	1,00	10,99				40%	4,40	
VT702	92,04	0,20	0,73	1,00	13,44				40%	5,38	
VT702	92,77	0,20	0,73	1,00	13,54				40%	5,42	
VT701	20,34	0,60	0,73	1,00	8,91				40%	3,56	
VT704	14,48	0,20	0,73	1,00	2,11				40%	0,84	
VT709	15,71	0,20	0,73	1,00	2,29				40%	0,92	
VT704	24,00	0,60	0,73	1,00	10,51				40%	4,20	
VT700	3,84	0,20	0,73	1,00	0,56				40%	0,22	
VT701	1,75	0,20	0,73	1,00	0,26				40%	0,10	
V702	6,80	0,45	0,73	1,00	2,23				40%	0,89	
VT703	28,00	0,20	0,73	2,00	8,18				40%	3,27	
VT701	43,75	0,60	0,73	1,00	19,16				40%	7,66	
VT710	13,70	0,20	0,73	2,00	4,00				40%	1,60	
V704	43,75	0,60	0,73	1,00	19,16				40%	7,66	
VT 716	1,76	0,20	0,53	1,00	0,19				40%	0,08	
VT712	3,84	0,20	0,73	2,00	1,12				40%	0,45	
V703	6,80	0,45	0,73	1,00	2,23				40%	0,89	
VT711	14,75	0,20	0,73	1,00	2,15				40%	0,86	
					-					-	
VT706	17,29	0,15	0,30	1,00	0,78				40%	0,31	
VT706	15,20	0,15	0,30	1,00	0,68				40%	0,27	
V708	8,55	0,45	0,73	1,00	2,81				40%	1,12	
VT715	13,20	0,20	0,73	6,00	11,56				40%	4,62	
					-					-	
					-					-	
									VIENE	-	
									PASA	123,11	



Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED — **CONTRATO OBRA No.** CO1.PCCNTR.5698312

DIRECTOR TECNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.25 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Sexto nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 4

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			%. PARCIAL A PAGAR OPRESENTE CORTE	TOTAL	FOTOS
	LARGO (m)	ALTURA (m)	AREA (m2)	CANTIDAD		L	a	h			
					-					-	
V709	13,20	0,60	0,73	1,00	5,78				40%	2,31	
V710	13,20	0,60	0,73	1,00	5,78				40%	2,31	
VT707	4,00	0,20	0,73	3,00	1,75				40%	0,70	
VT708	8,70	0,20	0,73	4,00	5,08				40%	2,03	
V711	13,20	0,60	0,73	1,00	5,78				40%	2,31	
V707	13,20	0,40	0,73	1,00	3,85				40%	1,54	
V719	13,20	0,40	0,73	1,00	3,85				40%	1,54	
V720	13,20	0,40	0,73	1,00	3,85				40%	1,54	
V721	13,20	0,40	0,73	1,00	3,85				40%	1,54	
V722	13,20	0,40	0,73	1,00	3,85				40%	1,54	
V723	13,20	0,40	0,73	1,00	3,85				40%	1,54	
V724	13,20	0,40	0,73	1,00	3,85				40%	1,54	
V712	13,20	0,60	0,73	1,00	5,78				40%	2,31	
V713	13,20	0,60	0,73	1,00	5,78				40%	2,31	
V714	13,20	0,60	0,73	1,00	5,78				40%	2,31	
V715	13,20	0,60	0,73	1,00	5,78				40%	2,31	
V716	13,20	0,60	0,73	1,00	5,78				40%	2,31	
V717	13,20	0,60	0,73	1,00	5,78				40%	2,31	
V718	13,20	0,45	0,73	1,00	4,34				40%	1,74	
VT714	13,20	0,20	0,30	1,00	0,79				40%	0,32	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
										-	
										-	
										-	
					-					-	
					-					-	
									VIENE	123,11	
									TOTAL	159,47	

Observaciones

HOJA 2 DE 4

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA Logia 3	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED


DIRECTOR TECNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ


INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.25 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Sexto nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 3 DE 4

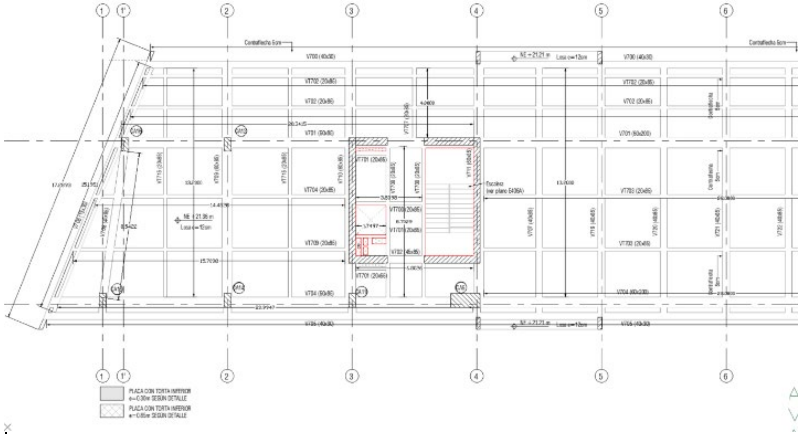CROQUIS





SECCION TIPICA DE PLACA AULAS
escala 1 : 25

Observaciones	

HOJA 3 DE 4

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA Logia 3	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ			CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.25 Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Sexto nivel.	UND.	M3	REF.	HOJA 4 DE 4

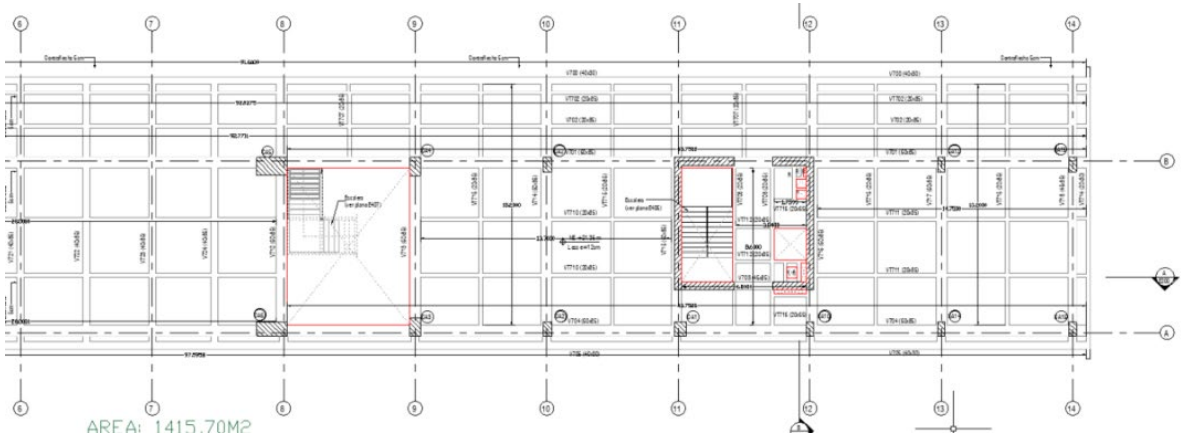CROQUIS



Observaciones	

HOJA 4 DE 4

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.33 Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel y sótano.	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	AREA	ALTURA	CANTIDAD		L	a	h			
LOSA SOTANO					-				-	-	
EJE 10-14 D-G		422,67	0,10	1,00	42,27				-	42,27	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
									VIENE		
									TOTAL	42,27	



Observaciones	

HOJA 1 DE 2

eso inicio con regaño
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA	5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	3.2.33 Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel y sótano.	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 2

CROQUIS

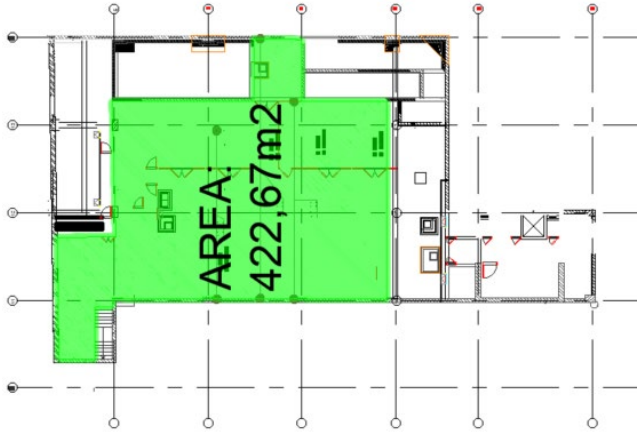SOTANO



Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.25698312

CAPITULO	MAMPOSTERÍA		REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	UND. M2	REF.	HOJA 1 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4						-				-	-
EJE A /1-2	L3		6,80	0,85	1,00	5,78				-	5,78
EJE A /3-4	L4		6,80	0,85	1,00	5,78				-	5,78
EJE B /2-3	L31		5,53	2,30	1,00	12,72				-	12,72
EJE B -2	L32		0,77	2,30	1,00	1,77				-	1,77
PISO 3						-				-	-
EJE A / 10-11	L10		6,70	0,84	1,00	5,63				-	5,63
EJE A / 12-13	L11		6,80	0,84	1,00	5,71				-	5,71
EJE A / 13-14	L12		6,80	0,84	1,00	5,71					5,71
EJE B / 8-10	L37		17,74		1,00	17,74				-	17,74
PISO 1	Comedor					-				-	-
EJE 11/ G-F	L40		6,55	3,11	1,00	20,37				-	20,37
EJE 11/ G-F	L42		2,04	3,11	1,00	6,34				-	6,34
EJE 11/ G-F	L44		1,14	3,11	1,00	3,55				-	3,55
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
											-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-					
						-					
										PASA	91,10

FOTOS





Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"

CONSORCIO URBANOVA SED

Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas


BOGOTÁ Secretaría de Educación

ACTA NO 16


CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ			CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	MAMPOSTERÍA			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	UND.	M2	REF.	HOJA 2 DE 11

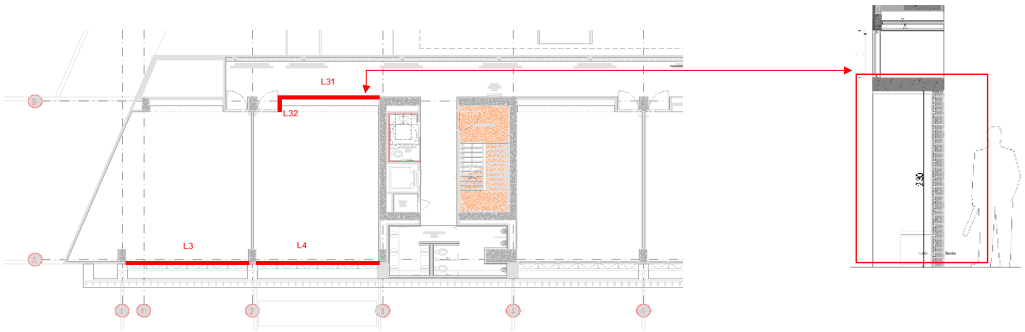PISO 4




PISO 3

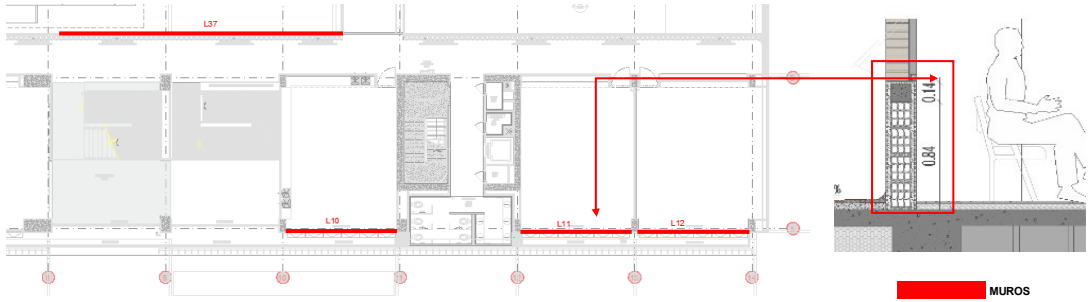

MUROS

CRONOLOGÍA

PISO 4



PISO 3



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

PAGADO EN EL ANTERIOR CORTE

Observaciones

HOJA 2 DE 11

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERÍA			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	UND.	M2	REF.	HOJA 3 DE 11

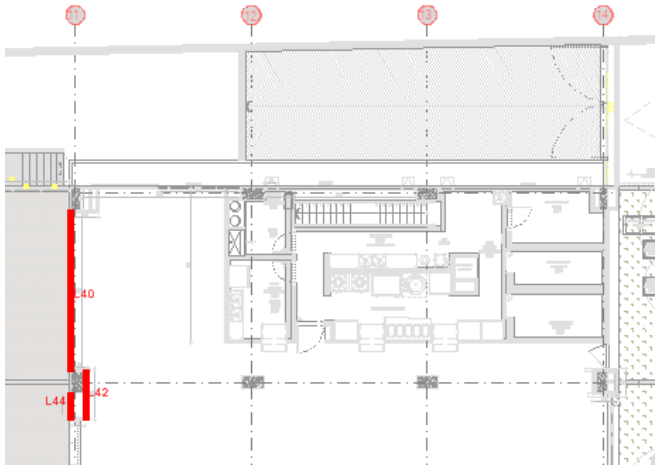Piso 1 COMEDOR





MUROS

CRONOLOGÍA

Piso 1 - Comedor



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

PAGADO EN EL ANTERIOR CORTE

Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERÍA		REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	UND. M2	REF.	HOJA 4 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4p						-				-	-
EJE B - 5	L27		5,50	2,30	1,00	12,65				-	12,65
EJE B - 5	L26		5,50	2,30	1,00	12,65				-	12,65
EJE 1 / A-B	L1		10,42	3,10	1,00	32,30				-	32,30
EJE A - 1	L2		2,98	3,10	1,00	9,24				-	9,24
EJE 1 / A-B	L35		2,70	0,97	1,00	2,62				-	2,62
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-					-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
											-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-					
						-				VIENE	91,10
										PASA	160,56

FOTOS





Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERÍA			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	UND.	M2	REF.	HOJA 5 DE 11

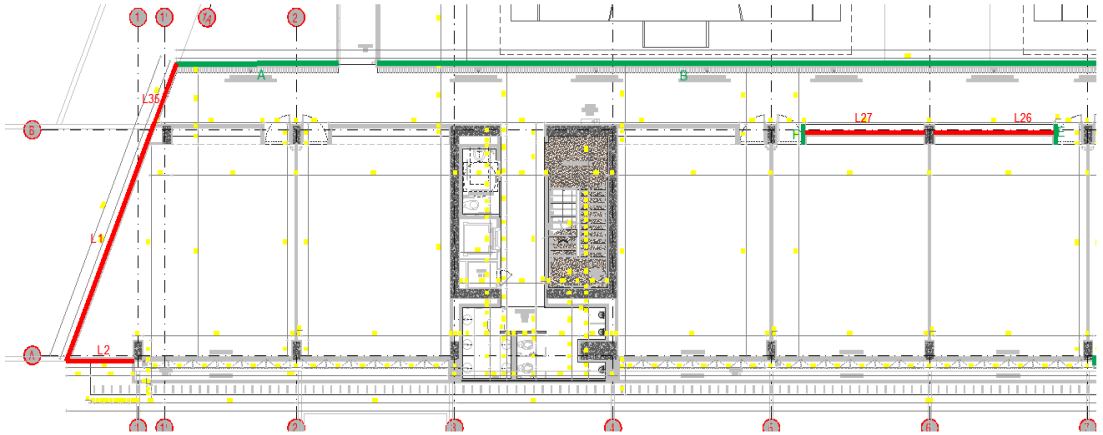Piso 4



MUROS

CRONOLOGÍA

Piso 4



Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	ACTA NO 16	

CONSORCIO URBANOVA SED — Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas — BOGOTÁ Secretaría de Educación

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312

CAPITULO	MAMPOSTERÍA	REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales. UND. M2	REF.	HOJA 6 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS: ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS: L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4						-				-	-
BARANDA	A		7,36	1,00	1,00	7,36				-	7,36
BARANDA	B		40,21	1,00	1,00	40,21				-	40,21
EJE B /7-8	C		4,30	2,30	1,00	9,89				-	9,89
EJE B /7-8	C		0,78	1,01	1,00	0,79				-	0,79
EJE B /7-8	D		0,76	2,30	1,00	1,75				-	1,75
EJE B -7	E		0,77	2,30	1,00	1,77				-	1,77
EJE B -7	F		0,77	2,30	1,00	1,77				-	1,77
EJE A / 7-8	G		5,49	0,84	1,00	4,61				-	4,61
						-				-	-
						-				-	-
						-					-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
											-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-					
						-				VIENE	160,56
										PASA	228,71

FOTOS





Observaciones

HOJA 6 DE 11

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERÍA			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	UND.	M2	REF.	HOJA 7 DE 11

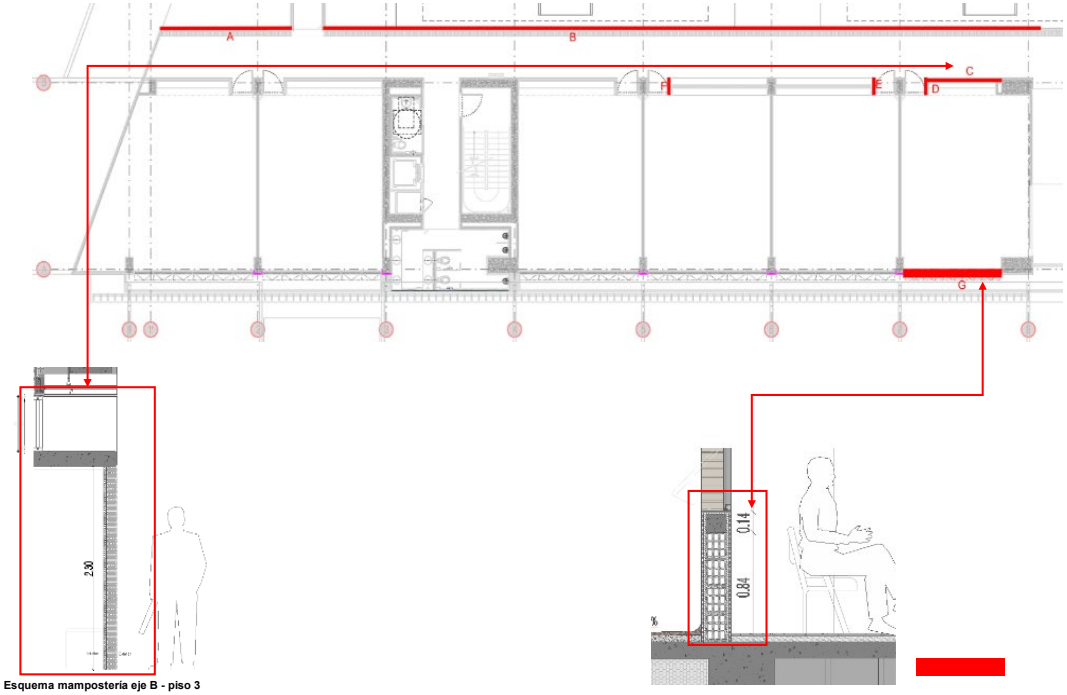Piso 4




Esquema mampostería eje B - piso 3

CRONOLOGÍA

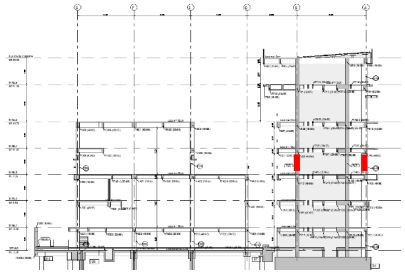PISO 3





Observaciones	

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERÍA			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	UND.	M2	REF.	HOJA 8 DE 11

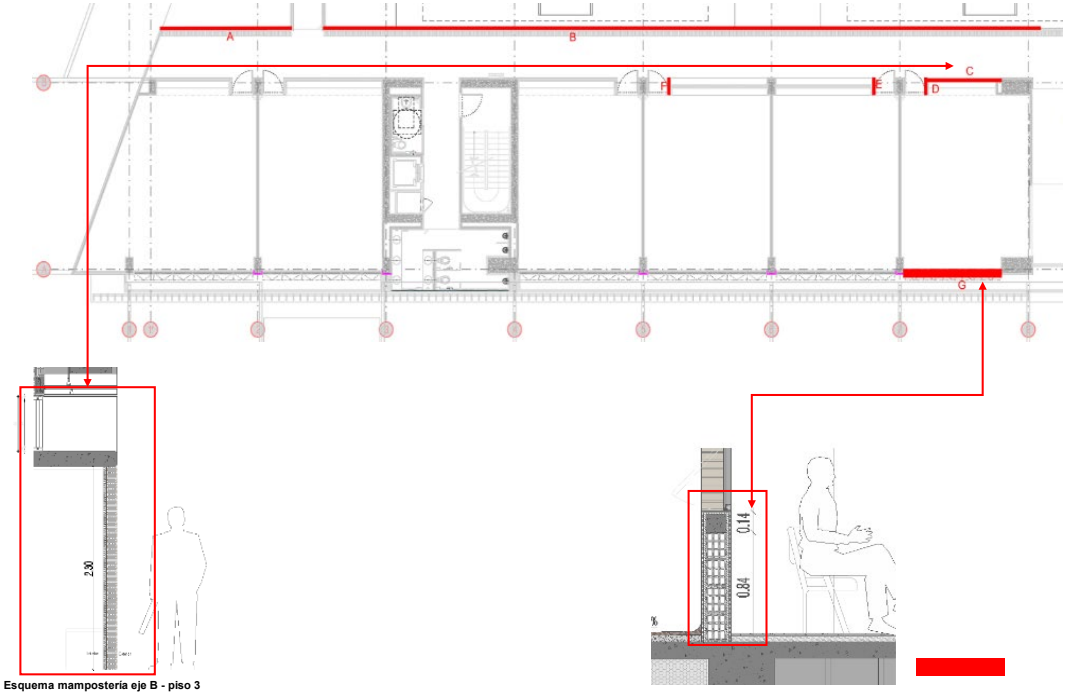Piso 4




Esquema mampostería eje B - piso 3

CRONOLOGÍA

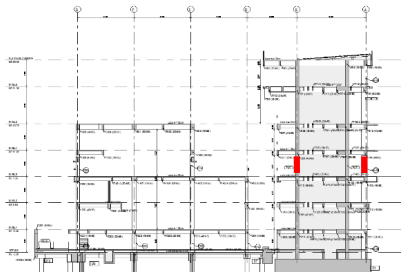PISO 3





Observaciones	

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA	5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ					
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS					

CAPITULO	MAMPOSTERÍA			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	UND.	M2	REF.	HOJA 9 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	DESCEUNTO	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
Piso 4	Aulas					-				-	-
Eje 1-B	A		4,30	2,32		9,98				-	9,98
Eje 1-B	B		0,65	2,32		1,51				-	1,51
Eje 2-B	C		5,65	2,32		13,11				-	13,11
Eje 2-B	D		0,65	2,32		1,51				-	1,51
Eje 2-B	E		5,60	2,30		12,88				-	12,88
Eje 2-B	F		0,65	2,32		1,51				-	1,51
Eje 1-A	G		6,80	0,84		5,71				-	5,71
Eje 2-A	H		6,80	0,84		5,71				-	5,71
Eje 4-A	I		6,80	0,84		5,71				-	5,71
Eje 5-A	J		6,80	0,84		5,71				-	5,71
Eje 6-A	K		6,80	0,84		5,71				-	5,71
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				VIENE	228,71
										TOTAL	297,76

FOTOS



Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	


CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERÍA			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	UND.	M2	REF.	HOJA 10 DE 11

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

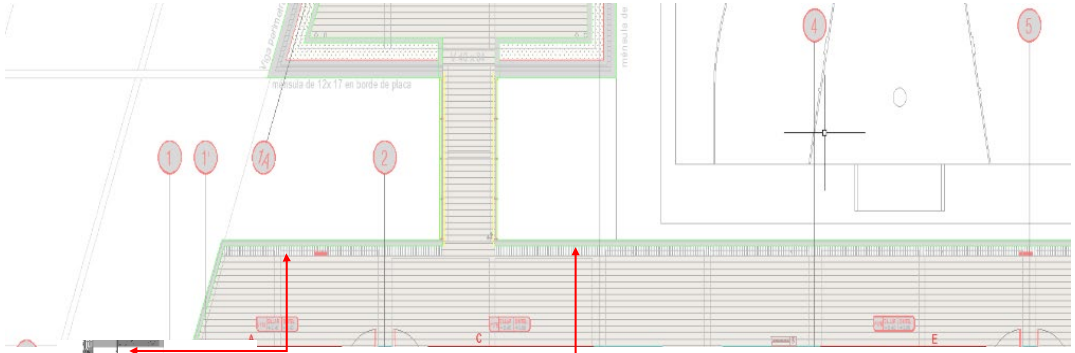Piso 4p






Esquema mamposteria eje B - piso 3




MUROS CORTE # 1

CRONOLOGÍA

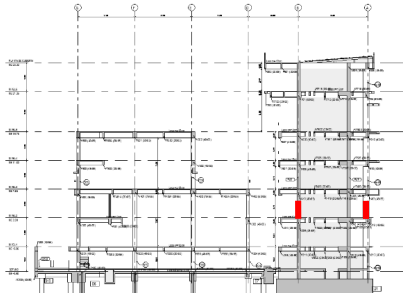PISO 3





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	


CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERÍA			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM	4.1.1 C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref.: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	UND.	M2	REF.	HOJA 11 DE 11

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

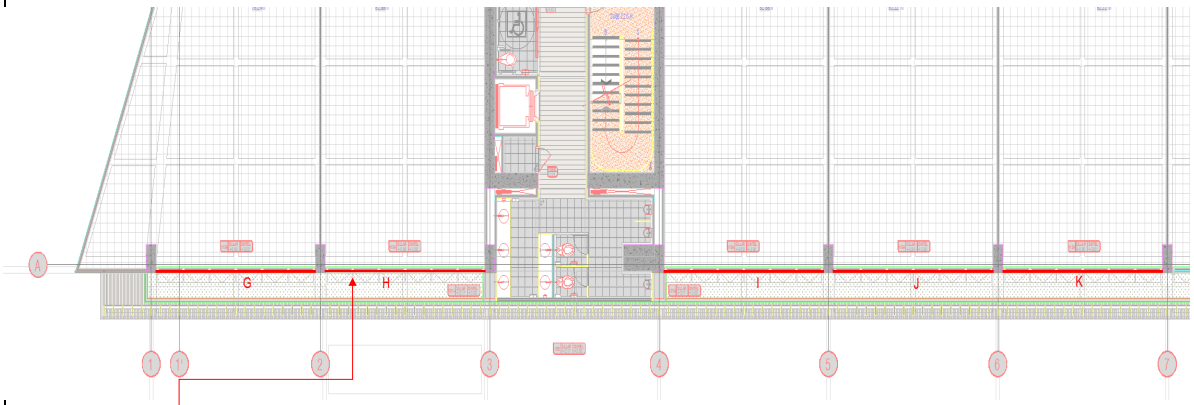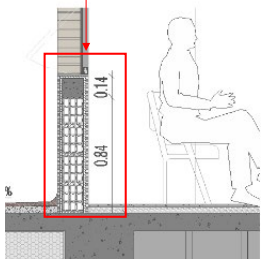Piso 4p





Esquema muro







MUROS CORTE # 1

CRONOLOGÍA

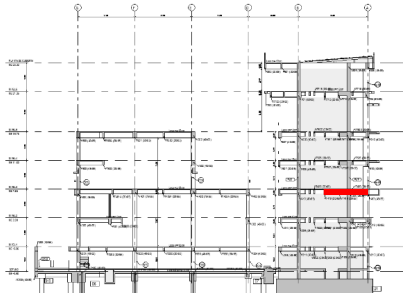PISO 3





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.25698312

CAPITULO	4. MUROS Y PAÑETES		REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.5 Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm.	UND. M2	REF.	HOJA 1 DE 5

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 2						-				-	-
EJE 11 / A-B	B52		5,10	3,31	1,00	16,88				-	16,88
EJE 11 / A-B	B49		1,68	3,31	1,00	5,56				-	5,56
EJE 11 / A-B	B45		1,70	3,31	1,00	5,63				-	5,63
EJE 11 / A-B	B44		1,44	3,81	1,00	5,49				-	5,49
EJE 11 / A-B	B47		0,68	3,31	1,00	2,25				-	2,25
EJE 11 / A-B	B35		1,75	3,31	1,00	5,79				-	5,79
EJE 11 / A-B	B46		0,68	3,31	1,00	2,25				-	2,25
EJE 11 / A-B	B31		2,80	3,81	1,00	10,67				-	10,67
EJE 11 / A-B	B34		2,41	3,31	1,00	7,98				-	7,98
EJE 11 / A-B	B36		1,72	3,31	1,00	5,69				-	5,69
EJE 11 / A-B	B32"		1,25	3,81	1,00	4,76				-	4,76
EJE 11 / A-B	B38		1,25	3,81	1,00	4,76				-	4,76
EJE 11 / A-B	B28		2,41	3,81	1,00	9,18				-	9,18
PISO 1						-				-	-
EJE 12 / A-B	B63		1,02	3,31	1,00	3,38				-	3,38
SOTANO						-				-	-
EJE 11 / A-B	BS1		1,59	2,42	1,00	3,85				-	3,85
EJE 11 / A-B	BS2		1,59	2,42	1,00	3,85				-	3,85
EJE 11 / A-B	BS19		6,58	2,40	1,00	15,79				-	15,79
EJE 11 / A-B	BS21		5,13	2,42	1,00	12,41				-	12,41
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
										PASA	126,17

FOTOS







Observaciones

HOJA 1 DE 5

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	4. MUROS Y PAÑETES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.5 Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm.	UND.	M2	REF.	HOJA 2 DE 5

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD		L	a	h			

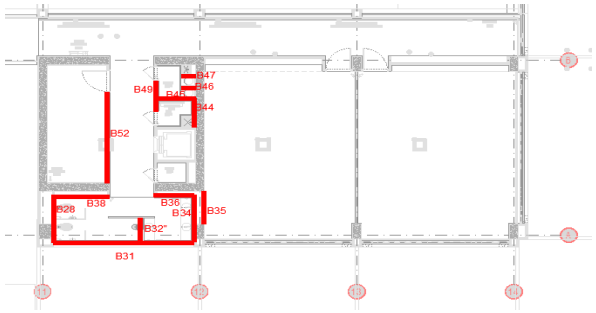Piso 2



PISO 1



Sotano



CRONOLOGÍA


PISO 2



PISO 1



Sotan



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	4. MUROS Y PAÑETES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.5 Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm.	UND.	M2	REF.	HOJA 3 DE 5


AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD		L	a	h			

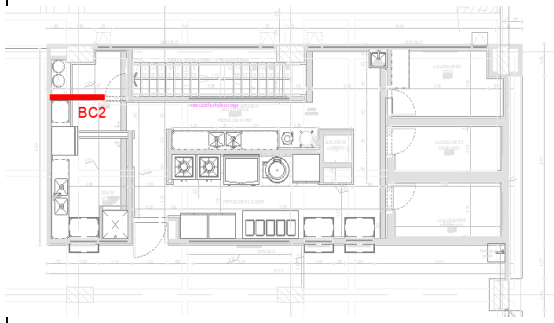COCINA




PISO 1

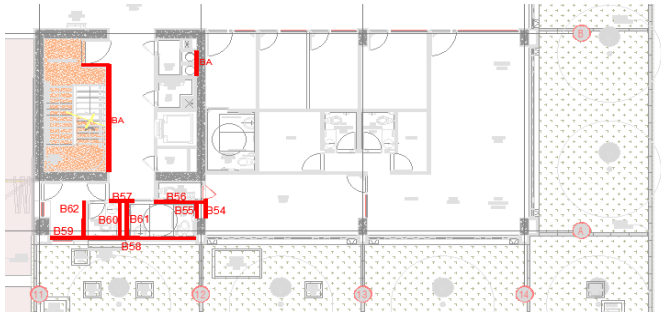

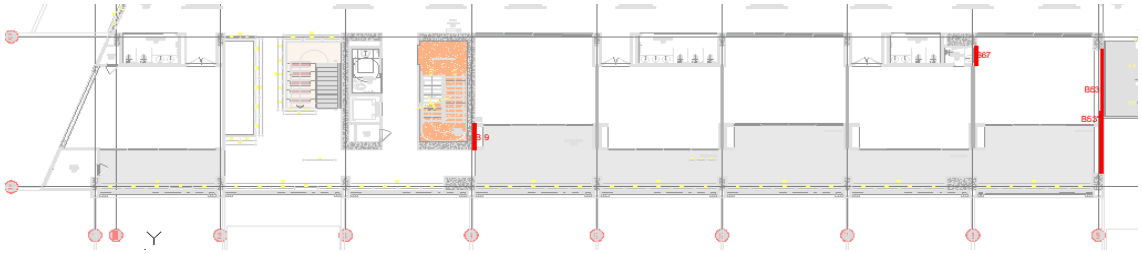

CRONOLOGÍA

PISO 1



PISO 2



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.25698312

CAPITULO	4. MUROS Y PAÑETES	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.5 Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm.	UND. M2	REF. HOJA 4 DE 5

AREA O LUGAR		ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4P						-				-	-
EJE 3 / A-B	BA		1,88	3,31	1,00	6,22				-	6,22
EJE 3 / A-B	BB		1,01	3,31	1,00	3,34				-	3,34
EJE 3 / A-B	BC		1,86	3,11	1,00	5,78				-	5,78
EJE 3 / A-B - DINTEL	BC		2,20	0,80	1,00	1,76				-	1,76
EJE 3 / A-B	BD		1,80	3,31	1,00	5,96				-	5,96
EJE 3 / A-B	BE		3,07	3,31	1,00	10,16				-	10,16
EJE 3 / A-B	BF		1,80	3,31	1,00	5,96				-	5,96
EJE 3 / A-B	BG		0,80	2,15	1,00	1,72				-	1,72
EJE 4 / A-B	BK		0,86	2,16	1,00	1,86				-	1,86
EJE 4 / A-B	BK"		0,86	2,16	1,00	1,86				-	1,86
EJE 4 / A-B	BL		1,44	3,81	1,00	5,49				-	5,49
EJE 4 / A-B	BM		1,78	3,81	1,00	6,78				-	6,78
EJE 4 / A-B	BN		3,02	3,31	1,00	10,00				-	10,00
EJE 4 / A-B	BÑ		4,71	3,31	1,00	15,59				-	15,59
EJE 8 / A-B	BT		4,54	3,31	1,00	15,03				-	15,03
						-				-	-
						-				-	-
						-				VIENE	126,17
										TOTAL	223,68

FOTOS





Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	


CONTRATISTA	G&O CONSTRUCTORS SAS	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	CORTE N° 2	REF.	CONTRACTUAL

ITEM	11. Mano de obra para instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación vertical estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm. (bloque estructural perforación vertical)	UND.	M2	REF.	HOJA 5 DE 5

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

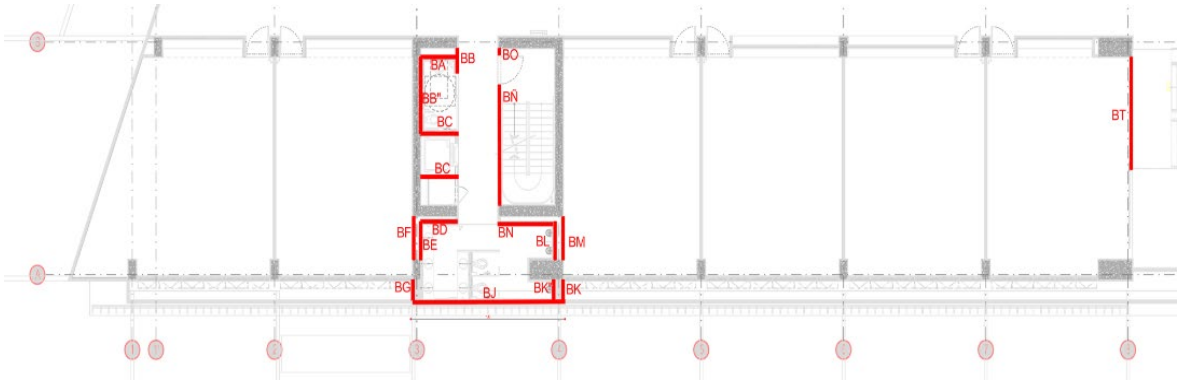
PISO 4P



CRONOLOGÍA

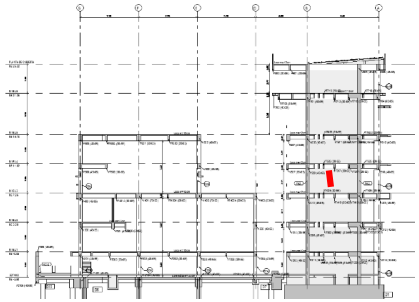PISO 1





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	

HOJA 5 DE 5

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12	AÑO	2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.			CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND. UND	REF. HOJA 1 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4						-				-	-
EJE A /1-2	L3			0,84	8,00	8,00				-	8,00
EJE A /3-4	L4			0,84	8,00	8,00				-	8,00
EJE 2 / A-B	C1			3,31	18,00	18,00				-	18,00
EJE B /2-3	L31			2,30	8,00	8,00				-	8,00
EJE B -2	L32			2,30	4,00	4,00				-	4,00
PISO 3						-				-	-
EJE A/8-9	L8.1			0,40	8,00	8,00				-	8,00
EJE A / 9-10	L9			0,40	8,00	8,00				-	8,00
EJE A / 10-11	L10			0,84	8,00	8,00					8,00
EJE A / 12-13	L11			0,84	8,00	8,00				-	8,00
EJE A / 13-14	L12			0,84	8,00	8,00				-	8,00
EJE B / 8-10	L37			1,00	22,00	22,00				-	22,00
PISO 2						-				-	-
EJE 11 / A-B	B52			3,31	10,00	10,00				-	10,00
EJE 11 / A-B	B49			3,31	6,00	6,00				-	6,00
EJE 11 / A-B	B45			3,31	6,00	6,00				-	6,00
EJE 11 / A-B	B44			3,81	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11 / A-B	B47			3,31	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11 / A-B	B39			3,31	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11 / A-B	B35			3,31	6,00	6,00				-	6,00
EJE 11 / A-B	B34			3,31	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11 / A-B	B37			3,31	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11 / A-B	B46			3,31	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11 / A-B	B32			3,81	6,00	6,00				-	6,00
EJE 11 / A-B	B36			3,31	8,00	8,00				-	8,00
EJE 11 / A-B	B32'			3,81	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11 / A-B	B38			3,81	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11 / A-B	B28			3,81	6,00	6,00				-	6,00
										PASA	188,00

FOTOS



Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.25698312

CAPITULO	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND. UND	REF. HOJA 2 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 1						-				-	-
EJE 12 / A-B	B63			3,31	4,00	4,00				-	4,00
PISO 1 Comedor						-				-	-
EJE 11/ G-F	L40			3,11	16,00	16,00				-	16,00
EJE 11/ G-F	L41			3,11	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11/ G-F	L42			3,11	6,00	6,00				-	6,00
EJE 11/ G-F	L43			3,11	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11/ G-F	L44			3,11	4,00	4,00				-	4,00
SOTANO						-				-	-
EJE 11 / A-B	BS1			2,42	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11 / A-B	BS2			2,42	4,00	4,00				-	4,00
EJE 11 / A-B	BS19			2,40	12,00	12,00					12,00
EJE 11 / A-B	BS21			2,40	10,00	10,00				-	10,00
PISO 2 Machones						-				-	-
EJE A -1	M1			3,11	4,00	4,00				-	4,00
EJE A -1	M2			3,11	4,00	4,00				-	4,00
EJE A -1	M3			3,11	6,00	6,00				-	6,00
EJE A -1	M4			3,11	2,00	2,00				-	2,00
EJE A -1	M5			3,11	6,00	6,00					6,00
EJE A -1	M6			3,11	6,00	6,00				-	6,00
Eje B-5	M30			4,16	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-5	M29			3,99	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-5	M28			3,99	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-5	M27			3,99	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-6	M34			4,16	4,00	4,00					4,00
Eje B-6	M33			3,99	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-6	M32			3,99	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-6	M31			3,99	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-7	M38			4,16	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-7	M37			3,99	4,00	4,00				-	4,00
										VIENE	188,00
										PASA	324,00

FOTOS





Observaciones

HOJA 2 DE 11

Director de obra
Arq. Mónica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND.	UND	REF.	HOJA 3 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
Eje B-7	M36			3,99	4,00	4,00					4,00
Eje B-7	M35			3,99	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-8	M42			4,16	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-8	M41			3,99	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-8	M40			3,99	4,00	4,00				-	4,00
Eje B-8	M39			3,99	4,00	4,00				-	4,00
placa piso 2	Anclaje en viga para pasar enchape - 9 por machon				99,00	99,00				-	99,00
PISO 2 PLACA DINTEL						-				-	-
EJE B-14	P19	5,50	0,78		6,00	6,00				-	6,00
EJE B - 12	P16	5,50	0,78		6,00	6,00				-	6,00
PISO 3 PLACA DINTEL						-				-	-
EJE B - 1	P34	4,25	0,78		6,00	6,00				-	6,00
EJE B - 3	P31	5,50	0,78		6,00	6,00				-	6,00
EJE B - 4	P29	5,50	0,78		6,00	6,00				-	6,00
EJE B - 6	P27	5,50	0,78		6,00	6,00				-	6,00
EJE B - 6	P26	5,50	0,78		6,00	6,00				-	6,00
EJE B - 7	P23	5,50	0,78		6,00	6,00				-	6,00
Piso 4	Anclaje andamio				12,00	12,00				-	12,00
Piso 3	Anclaje andamio				16,00	16,00				-	16,00
						-				VIENE	324,00
										PASA	523,00

FOTOS





Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Alvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA		REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND. UND	REF.	HOJA 4 DE 11


AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

SOTANO Y COCINA


PISO 1

CRONOLOGÍA

Piso 4




Piso 3




Piso 2



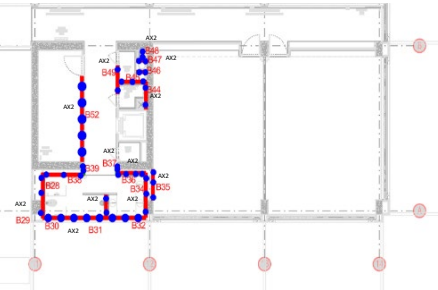Piso 2



Piso 1 comedor

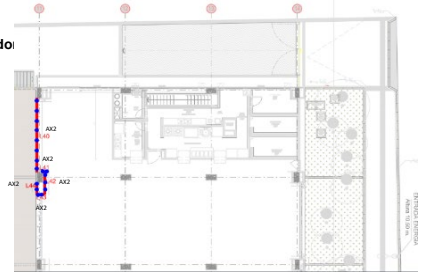

Sotano



DOVELAS
MAMPOSTERIA

CRONOLOGÍA

PISO 4



PISO 3




PISO 2



PISO 1 - comedor
PISO 1 - comedor
PISO 1 - comedor

Sotano
Sotano
Sotano





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observa

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	G&O CONSTRUCTORS SAS	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	MAMPOSTERIA		REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND. UND	REF.	HOJA 5 DE 11

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

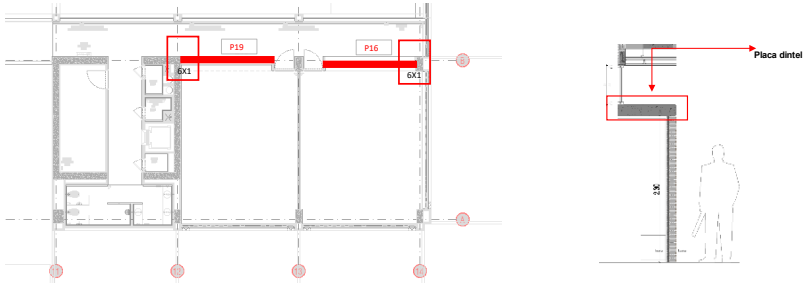PISO 2




PISO 3

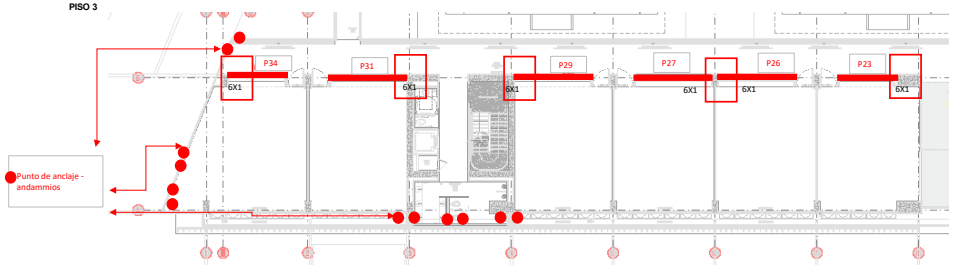

CRONOLOGÍA

PISO 2



PISO 3



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	
	HOJA 5 DE 11

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.25698312

CAPITULO	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND. UND	REF. HOJA 6 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4P	LADRILLO					-				-	-
BARANDA	A			1,00	10,00	10,00				-	10,00
BARANDA	B			1,00	52,00	52,00				-	52,00
EJE B /7-8	C			2,30	7,00	7,00				-	7,00
EJE B /7-8	D			2,30	4,00	4,00				-	4,00
EJE B -7	E			2,30	5,00	5,00				-	5,00
EJE B -7	F			2,30	5,00	5,00				-	5,00
EJE A / 7-8	G			0,84	8,00	8,00				-	8,00
Eje 7/(A-B)	CD			3,31	18,00	18,00				-	18,00
PISO 4P	BLOQUE					-				-	-
EJE 3 / A-B	BA			3,31	6,00	6,00				-	6,00
EJE 3 / A-B	BB			3,31	4,00	4,00				-	4,00
EJE 3 / A-B	BC			3,31	6,00	6,00				-	6,00
EJE 3 / A-B - DINTEL	BC			0,80	2,00	2,00				-	2,00
EJE 3 / A-B	BD			3,31	6,00	6,00				-	6,00
EJE 3 / A-B	BE			3,31	4,00	4,00				-	4,00
EJE 3 / A-B	BF			3,31	6,00	6,00				-	6,00
EJE 3 / A-B	BG			2,15	4,00	4,00				-	4,00
EJE A / 3-4	BH			1,47	2,00	2,00				-	2,00
EJE A / 3-4	BI			1,47	2,00	2,00				-	2,00
EJE A / 3-4	BJ			2,70	8,00	8,00				-	8,00
EJE A / 3-4	BJ			1,46	4,00	4,00				-	4,00
EJE 4 / A-B	BK			2,16	2,00	2,00				-	2,00
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										-	-
										VIENE	523,00
										PASA	688,00

FOTOS



Observaciones

HOJA 6 DE 11

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA		REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND. UND	REF.	HOJA 7 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4P	BLOQUE					-				-	-
EJE 4 / A-B	BL			3,81	4,00	4,00				-	4,00
EJE 4 / A-B	BM			3,81	6,00	6,00				-	6,00
EJE 4 / A-B	BN			3,31	6,00	6,00				-	6,00
EJE 4 / A-B	BÑ			3,31	10,00	10,00				-	10,00
EJE 4 / A-B	BO			3,31	4,00	4,00				-	4,00
EJE 8 / A-B	BT			3,31	8,00	8,00				-	8,00
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				VIENE	688,00
						-					
										PASA	726,00

FOTOS



Observaciones

HOJA 7 DE 11

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES	12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	MAMPOSTERIA		REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND. UND	REF.	HOJA 8 DE 11

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

PISO 3




PISO 2



DOVELAS CORTE #2
MAMPOSTERIA


CRONOLOGÍA

PISO 3



PISO 2





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	
	HOJA 8 DE 11

Director de obra
Arq. Mónica Paola Alvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND.	UND	REF.	HOJA 9 DE 11

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

PISO 1




DOVELAS CORTE #2
MAMPOSTERIA

CRONOLOGÍA

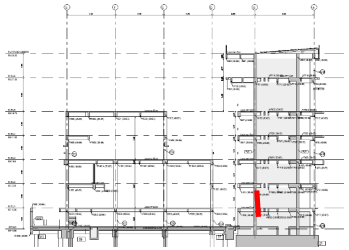PISO 1





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones

HOJA 9 DE 11

Director de obra
Arq. Mónica Paola Alvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA		REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND. UND	REF.	HOJA 10 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4P						-				-	-
PISO4P						-				-	-
Eje 1-B	A			2,32	7,00	7,00				-	7,00
Eje 1-B	B			2,32	3,00	3,00				-	3,00
Eje 2-B	C			2,32	9,00	9,00				-	9,00
Eje 2-B	D			2,32	3,00	3,00				-	3,00
Eje 2-B	E			2,32	9,00	9,00				-	9,00
Eje 2-B	F			2,32	3,00	3,00				-	3,00
Eje 1-A	G			0,84	9,00	9,00				-	9,00
Eje 2-A	H			0,84	9,00	9,00				-	9,00
Eje 4-A	I			0,84	9,00	9,00				-	9,00
Eje 5-A	J			0,84	9,00	9,00				-	9,00
Eje 6-A	K			0,84	9,00	9,00				-	9,00
Eje2 /(A-B)	CA			3,31	18,00	18,00				-	18,00
Eje 5/(A-B)	CB			3,31	18,00	18,00				-	18,00
Eje 6/(A-B)	CC			3,31	18,00	18,00				-	18,00
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				VIENE	726,00
										TOTAL	859,00

FOTOS

PISO4P





Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.8 Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato. (incluye epoxico)	UND.	UND	REF.	HOJA 11 DE 11

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

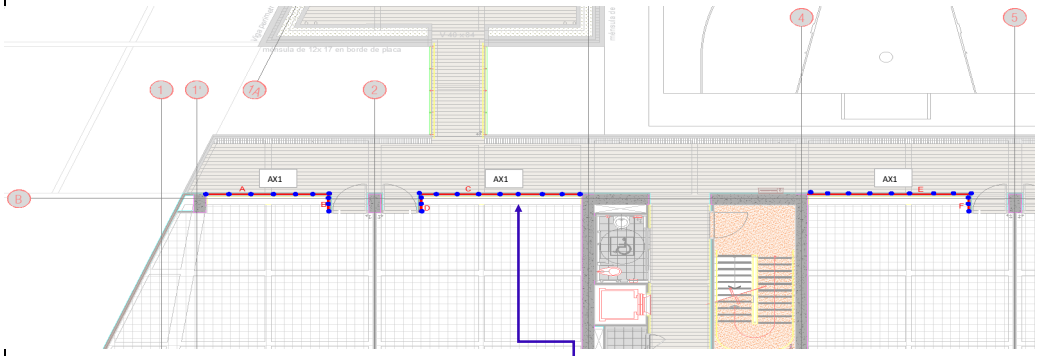PISO4P







Dovelas
Muro

CRONOLOGÍA

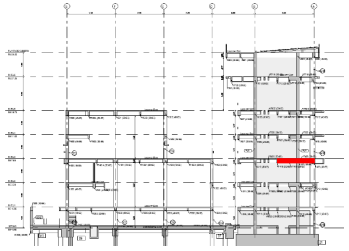PISO 3





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones

HOJA 11 DE 11

Director de obra
Arq. Mónica Paola Alvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.25698312

CAPITULO	MAMPOSTERIA	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.	UND. M	REF. HOJA 1 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4						-				-	-
EJE A /1-2	L3			0,84	8,00	6,72				-	6,72
EJE A /3-4	L4			0,84	8,00	6,72				-	6,72
EJE 2 / A-B	C1			3,31	9,00	29,79				-	29,79
EJE B /2-3	L31			2,30	8,00	18,40				-	18,40
EJE B -2	L32			2,30	4,00	9,20				-	9,20
PISO 3						-				-	-
EJE A/8-9	L8.1			0,40	49,00	19,60				-	19,60
EJE A / 9-10	L9			0,40	8,00	3,20				-	3,20
EJE A / 10-11	L10			0,84	8,00	6,72				-	6,72
EJE A / 12-13	L11			0,84	8,00	6,72				-	6,72
EJE A / 13-14	L12			0,84	8,00	6,72				-	6,72
EJE B / 8-10	L37			1,00	22,00	22,00				-	22,00
PISO 2						-				-	-
EJE 11 / A-B	B52			3,31	5,00	16,55				-	16,55
EJE 11 / A-B	B49			3,31	3,00	9,93				-	9,93
EJE 11 / A-B	B45			3,31	3,00	9,93				-	9,93
EJE 11 / A-B	B44			3,81	2,00	7,62				-	7,62
EJE 11 / A-B	B47			3,31	2,00	6,62				-	6,62
EJE 11 / A-B	B39			3,31	2,00	6,62				-	6,62
EJE 11 / A-B	B35			3,31	3,00	9,93				-	9,93
EJE 11 / A-B	B37			3,31	2,00	6,62				-	6,62
EJE 11 / A-B	B46			3,31	2,00	6,62				-	6,62
EJE 11 / A-B	B32			3,81	3,00	11,43				-	11,43
EJE 11 / A-B	B36			3,31	4,00	13,24				-	13,24
EJE 11 / A-B	B32"			3,81	2,00	7,62				-	7,62
EJE 11 / A-B	B38			3,81	2,00	7,62				-	7,62
EJE 11 / A-B	B28			3,81	3,00	11,43				-	11,43
						-					
										PASA	267,57

FOTOS



Observaciones

HOJA 1 DE 11

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS					

CAPITULO	MAMPOSTERIA		REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.	UND. M	REF.	HOJA 2 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 1	comedor					-				-	-
EJE 11/ G-F	L40			3,11	8,00	24,88				-	24,88
EJE 11/ G-F	L41			3,11	2,00	6,22					6,22
EJE 11/ G-F	L42			3,11	3,00	9,33					9,33
EJE 11/ G-F	L43			3,11	2,00	6,22				-	6,22
EJE 11/ G-F	L44			3,11	2,00	6,22					6,22
PISO 1						-				-	-
EJE 12 / A-B	**B63**			3,31	2,00	6,62				-	6,62
SOTANO						-				-	-
EJE 11 / A-B	**BS1**			2,42	2,00	4,84				-	4,84
EJE 11 / A-B	**BS2**			2,42	2,00	4,84				-	4,84
EJE 11 / A-B	**BS19**			2,40	6,00	14,40				-	14,40
EJE 11 / A-B	**BS21**			2,40	5,00	12,00				-	12,00
PISO 2	Machones					-					-
EJE A -1	M1			3,11	2,00	6,22				-	6,22
EJE A -1	M2			3,11	2,00	6,22					6,22
EJE A -1	**M3**			3,11	3,00	9,33					9,33
EJE A -1	**M4**			3,11	2,00	6,22					6,22
EJE A -1	**M5**			3,11	2,00	6,22					6,22
EJE A -1	**M6**			3,11	3,00	9,33					9,33
Eje B-5	**M30**			4,16	2,00	8,32					8,32
Eje B-5	**M29**			3,99	2,00	7,97				-	7,97
Eje B-5	**M28**			3,99	2,00	7,97					7,97
Eje B-5	**M27**			3,99	2,00	7,97					7,97
Eje B-6	**M34**			4,16	2,00	8,32					8,32
Eje B-6	**M33**			3,99	2,00	7,97					7,97
Eje B-6	M32			3,99	2,00	7,97				-	7,97
Eje B-6	M31			3,99	2,00	7,97					7,97
Eje B-7	**M38**			4,16	2,00	8,32					8,32
Eje B-7	**M37**			3,99	2,00	7,97					7,97
Eje B-7	**M36**			3,99	2,00	7,97					7,97
Eje B-7	**M35**			3,99	2,00	7,97					7,97
EJE 11 / A-B	**B34**			3,31	2,00	6,62				-	6,62
Eje B-8	**M42**			4,16	2,00	8,32					8,32
Eje B-8	**M41**			3,99	2,00	7,97				-	7,97
Eje B-8	**M40**			3,99	2,00	7,97					7,97
Eje B-8	**M39**			3,99	2,00	7,97					7,97
						-				VIENE	267,57
										PASA	**542,22**

FOTOS



Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA				REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.			UND. M	REF.	HOJA 3 DE 11

AREA O LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	%AVANCE	L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS

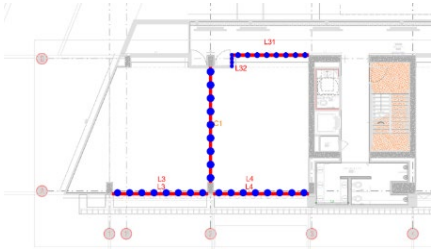Piso 4




Piso 3




Piso 2



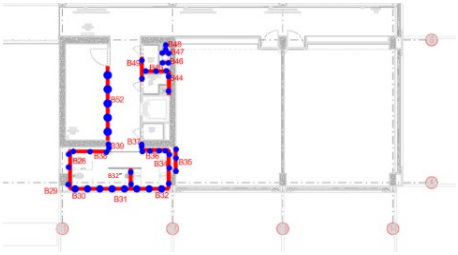
Piso 2



Piso 1 comedor



Piso 1 - Aulas



Sotano



DOVELAS CORTE #2
MAMPOSTERIA

CRONOLOGÍA

PISO 4



PISO 3



PISO 2



PISO 1 - comedor



Sotano



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	
	HOJA 3 DE 11

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residénte de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.	UND.	M	REF.	HOJA 4 DE 11

AREA O LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	%AVANCE	L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS


SOTANO Y COCINA




PISO 1




PISO 2







PISO 3



DOVELAS CORTE #2
MAMPOSTERIA

CRONOLOGÍA

PISO 1



PISO 2



PISO 3



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	
	HOJA 4 DE 11

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.25698312

CAPITULO	MAMPOSTERIA		REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.	UND. M	REF.	HOJA 5 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4P	LADRILLO					-				-	-
BARANDA	A			1,00	10,00	10,00				-	10,00
BARANDA	B			1,00	52,00	52,00				-	52,00
EJE B /7-8	C			2,30	5,00	11,50				-	11,50
EJE B /7-8	C			3,31	2,00	6,62				-	6,62
EJE B /7-8	D			2,30	4,00	9,20				-	9,20
EJE B -7	E			2,30	5,00	11,50				-	11,50
EJE B -7	F			2,30	5,00	11,50				-	11,50
EJE A / 7-8	G			0,84	8,00	6,72				-	6,72
PISO 4P	TOPO					-				-	-
Eje 7/(A-B)	CD			3,31	9,00	29,79				-	29,79
PISO 4P	BLOQUE					-				-	-
EJE 3 / A-B	BA			3,31	3,00	9,93				-	9,93
EJE 3 / A-B	BB			3,31	2,00	6,62				-	6,62
EJE 3 / A-B	BC			3,11	3,00	9,33				-	9,33
EJE 3 / A-B - DINTEL	BC			0,80	2,00	1,60				-	1,60
EJE 3 / A-B	BD			3,31	3,00	9,93				-	9,93
EJE 3 / A-B	BE			3,31	2,00	6,62				-	6,62
EJE 3 / A-B	BF			3,31	3,00	9,93				-	9,93
EJE 3 / A-B	BG			2,15	2,00	4,30				-	4,30
EJE A / 3-4	BH			1,47	2,00	2,94				-	2,94
EJE A / 3-4	BI			1,47	2,00	2,94				-	2,94
EJE A / 3-4	BJ			2,70	8,00	21,60				-	21,60
EJE 4 / A-B	BK			2,16	2,00	4,32				-	4,32
EJE 4 / A-B	BK*			2,16	2,00	4,32				-	4,32
PISO 4P	BLOQUE					-				-	-
EJE 4 / A-B	BL			3,81	2,00	7,62				-	7,62
EJE 4 / A-B	BM			3,81	3,00	11,43				-	11,43
EJE 4 / A-B	BN			3,31	3,00	9,93				-	9,93
EJE 4 / A-B	BÑ			3,31	5,00	16,55				-	16,55
EJE 4 / A-B	BO			3,31	2,00	6,62				-	6,62
EJE 8 / A-B	BT			3,31	4,00	13,24				-	13,24
						-				VIENE	542,22
										PASA	850,82

FOTOS



Observaciones

HOJA 5 DE 11

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA					REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.				UND.	M	REF.	HOJA 6 DE 11

AREA O LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	%AVANCE	L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS

PISO 3



PISO 2 TOPO


PISO 2



DOVELAS CORTE #2
MAMPOSTERIA


CRONOLOGÍA

PISO 3



PISO 2





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones

HOJA 6 DE 11

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	MAMPOSTERIA						REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.				UND.	M	REF.	HOJA 7 DE 11

AREA O LUGAR	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	%AVANCE	L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS

PISO 1



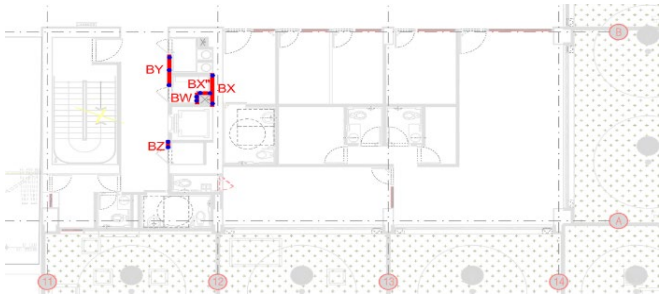PISO 2 TOPO




DOVELAS CORTE #2
MAMPOSTERIA

CRONOLOGÍA

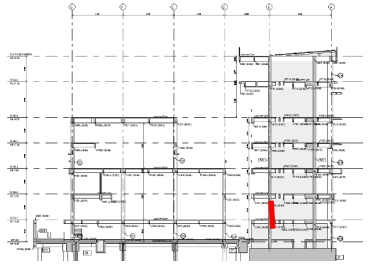PISO 1





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	
	HOJA 7 DE 11

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA	5	MES	12	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312				
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ							
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS							

CAPITULO	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.	UND.	M	REF.	HOJA 8 DE 11

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
		ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD		L	a	h		
PISO 4P						-				-	-
PISO 4P						-				-	-
Eje 1-B	A			2,32	7,00	16,24				-	16,24
Eje 1-B	B			2,32	3,00	6,96				-	6,96
Eje 2-B	C			2,32	9,00	20,88				-	20,88
Eje 2-B	D			2,32	3,00	6,96				-	6,96
Eje 2-B	E			2,30	9,00	20,70				-	20,70
Eje 2-B	F			2,32	3,00	6,96				-	6,96
Eje 1-A	G			0,84	9,00	7,56				-	7,56
Eje 2-A	H			0,84	9,00	7,56				-	7,56
Eje 4-A	I			0,84	9,00	7,56				-	7,56
Eje 5-A	J			0,84	9,00	7,56				-	7,56
Eje 6-A	K			0,84	9,00	7,56				-	7,56
Eje2 /(A-B)	CA			3,31	9,00	29,79				-	29,79
Eje 5/(A-B)	CB			3,31	9,00	29,79				-	29,79
Eje 6/(A-B)	CC			3,31	9,00	29,79				-	29,79
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
										VIENE	850,82
										TOTAL	1.056,69

FOTOS



Observaciones

HOJA 8 DE 11

Director de obra	Director Interventoría
Arq. Monica Paola Alvarez Rios	Ing. Luis Santiago Cely Báez
Residente de obra	Residente Interventoría
Ing. David Alberto Morales Sanchez	Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.	UND.	M	REF.	HOJA 9 DE 11

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

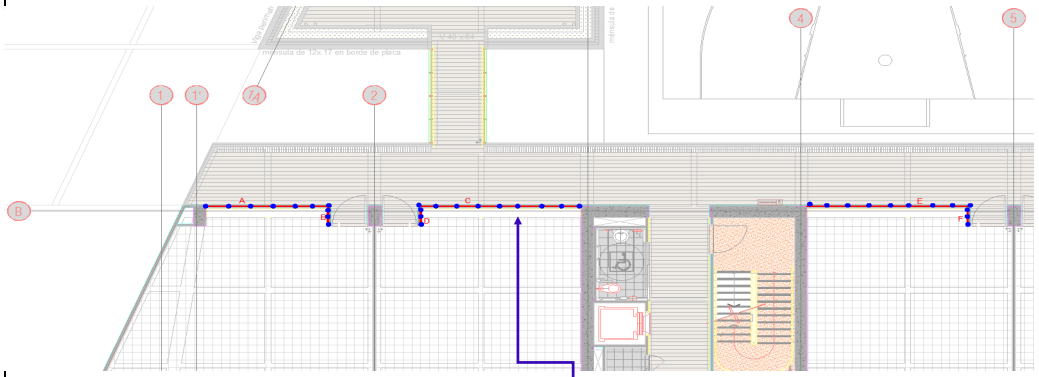PISO 4P







DOVELAS CORTE # 1

CRONOLOGÍA

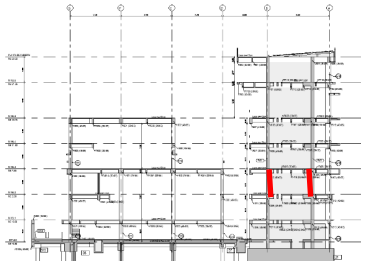PISO 4





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	
	HOJA 9 DE 11

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.	UND.	M	REF.	HOJA 10 DE 11

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

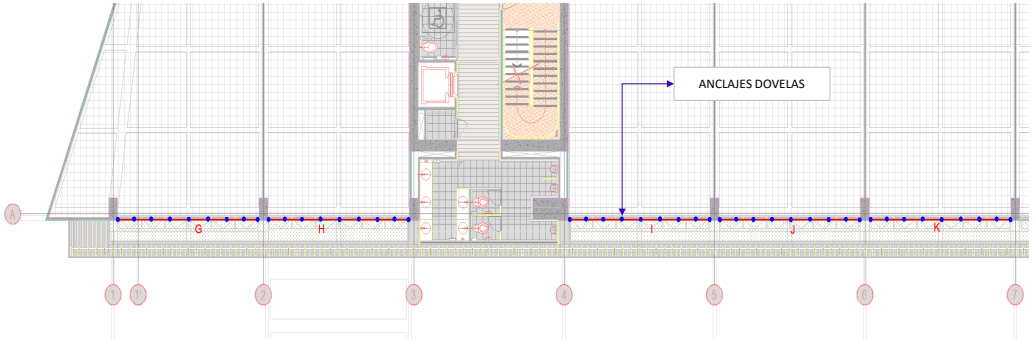PISO 4P









CRONOLOGÍA

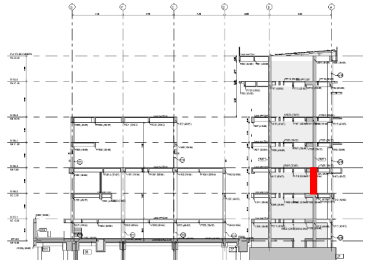PISO 3





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	
	HOJA 10 DE 11

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	MAMPOSTERIA			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.1.11 Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye instalacion varilla de refuerzo.	UND.	M	REF.	HOJA 11 DE 11


AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			


0



CRONOLOGÍA

PISO 3





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA	5	MES 12	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312			
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ						
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	4. MUROS Y PAÑETES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.3.1 Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm.	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 5

		ELEMENTOS LLENOS					VANOS					
AREA O LUGAR		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
PISO 3						-				-	-	
						-				-	-	
EJE 3 / A-B	B1		0,74	3,31	1,00	2,45				-	2,45	
EJE 3 / A-B	B2		1,83	3,31	1,00	6,06				-	6,06	
EJE 3 / A-B	B3		2,80	3,81	1,00	10,67				-	10,67	
EJE 3 / A-B	B4		1,74	3,31	1,00	5,76				-	5,76	
EJE 3 / A-B	B6		1,76	3,31	1,00	5,83				-	5,83	
EJE 3 / A-B	B11		1,74	3,31	1,00	5,76				-	5,76	
EJE 3 / A-B	B12		1,79	3,31	1,00	5,92				-	5,92	
EJE 3 / A-B	B13		3,06	3,46	1,00	10,59				-	10,59	
EJE 3 / A-B	B-13 VACIO		0,87	0,90	-1,00	-0,78				-	-0,78	
EJE A / 3-4	B15		2,30	2,26	1,00	5,20				-	5,20	
EJE A / 3-4	B15		4,13	2,26	1,00	9,33				-	9,33	
EJE 3 / A-B	B16		2,02	3,81	2,00	15,39				-	15,39	
EJE 4 / A-B	B-17		0,85	2,26	1,00	1,92				-	1,92	
EJE 4 / A-B	B19		1,75	3,81	1,00	6,67				-	6,67	
EJE 4 / A-B	B20		1,42	3,81	1,00	5,41				-	5,41	
EJE 4 / A-B	B21		2,58	3,31	1,00	8,54				-	8,54	
EJE 4 / A-B	B9		4,72	3,31	1,00	15,62				-	15,62	
PISO 2 AL 3						-				-	-	
EJE 4 / A-B	B9 -ESCALERA		4,72	1,80	1,00	8,50				-	8,50	
PISO 3						-				-	-	
EJE 3- / A-B ASCENSOR	B4		1,74	3,05	1,00	5,31				-	5,31	
EJE 3- / A-B ASCENSOR	B6		1,74	1,02	1,00	1,77				-	1,77	
EJE 3- / A-B DINTEL	B5		2,20	1,02	1,00	2,24				-	2,24	
EJE 4 / A-B	B9 -ESCALERA	4,86	2,20		1,00	10,69				-	10,69	
PISO 1 AL 2						-				-	-	
EJE 4 / A-B	B9 -ESCALERA		4,72	1,80	1,00	8,50				-	8,50	
EJE 4 / A-B	B9 -ESCALERA	4,40			1,00	4,40				-	4,40	
						-				-	-	
						-				-		
						-				-	-	
										PASA	161,75	





Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA	5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ					
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS					

CAPITULO	4. MUROS Y PAÑETES			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.3.1 Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm.	UND.	M2	REF.	HOJA 2 DE 5

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
		AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PISO 4 P						-				-	-
						-				-	-
EJE 3 / A-B	B1		0,74	3,31	1,00	2,45				-	2,45
EJE 3 / A-B	B2		1,83	3,31	1,00	6,06				-	6,06
EJE 3 / A-B	B3		2,80	3,81	1,00	10,67				-	10,67
EJE 3 / A-B	B4		1,74	3,31	1,00	5,76				-	5,76
EJE 3 / A-B	B6		1,76	3,31	1,00	5,83				-	5,83
EJE 3 / A-B	B11		1,74	3,31	1,00	5,76				-	5,76
EJE 3 / A-B	B12		1,79	3,31	1,00	5,92				-	5,92
EJE 3 / A-B	B13		3,06	3,46	1,00	10,59				-	10,59
EJE 3 / A-B	B-13 VACIO		0,87	0,90	-1,00	-0,78				-	-0,78
EJE A / 3-4	B15		2,30	2,26	1,00	5,20				-	5,20
EJE A / 3-4	B15		4,13	2,26	1,00	9,33				-	9,33
EJE 3 / A-B	B16		2,02	3,81	2,00	15,39				-	15,39
EJE 4 / A-B	B-17		0,85	2,26	1,00	1,92				-	1,92
EJE 4 / A-B	B19		1,75	3,81	1,00	6,67				-	6,67
EJE 4 / A-B	B20		1,42	3,81	1,00	5,41				-	5,41
EJE 4 / A-B	B21		2,58	3,31	1,00	8,54				-	8,54
EJE 4 / A-B	B9		4,72	3,31	1,00	15,62				-	15,62
PISO 4 AL 4P						-				-	-
EJE 4 / A-B	B9 -ESCALERA		4,72	1,80	1,00	8,50				-	8,50
PISO 3						-				-	-
EJE 3- / A-B ASCENSOR	B4		1,74	3,05	1,00	5,31				-	5,31
EJE 3- / A-B ASCENSOR	B6		1,74	1,02	1,00	1,77				-	1,77
EJE 3- / A-B DINTEL	B5		2,20	1,02	1,00	2,24				-	2,24
EJE 4 / A-B	B9 -ESCALERA	4,86	2,20		1,00	10,69				-	10,69
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	
						-				VIENE	161,75
										PASA	310,60

FOTOS



Observaciones

HOJA 2 DE 5

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	


CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			FECHA	DIA 5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ			CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS					


CAPITULO	4. MUROS Y PAÑETES				REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.3.1 Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm.			UND.	M2	REF. HOJA 3 DE 5

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

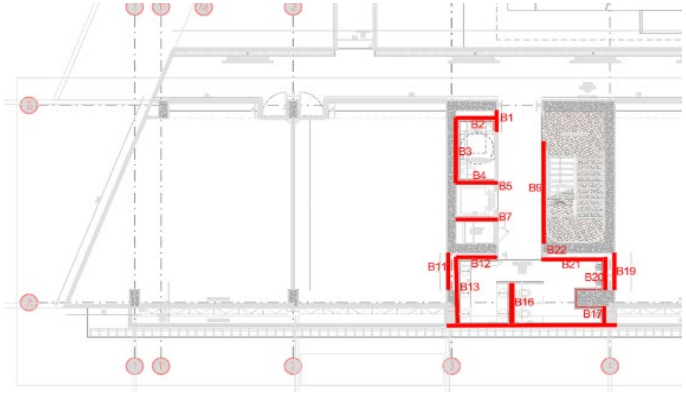

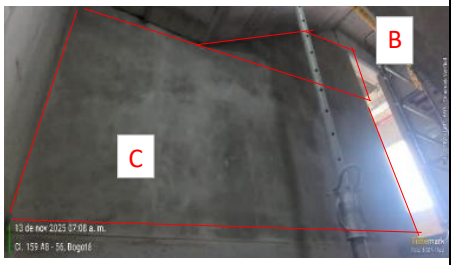

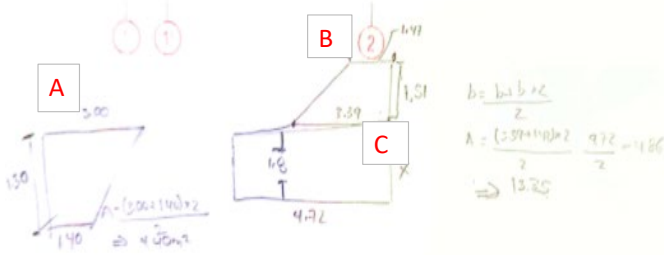

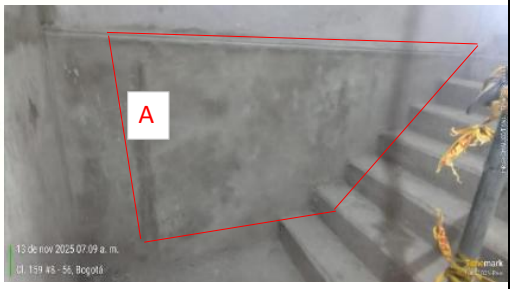

CRONOLOGÍA

PISO 4



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

PAGADO EN CORTE ANTERIOR

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS					

CAPITULO	4. MUROS Y PAÑETES		REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.3.1 Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm.	UND.	M2	REF. HOJA 4 DE 5

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
		ANCHO INFORMATIVO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PISO 1						-				-	-
EJE 3 / A-B	B1		0,60	3,31	2,00	3,97				-	3,97
EJE 3 / A-B	B4		0,60	2,20	1,00	1,32				-	1,32
EJE 4 / A-B	B8		0,60	3,31	3,00	5,96				-	5,96
EJE 4 / A-B	B9		0,60	3,31	3,00	5,96				-	5,96
EJE 3 / A-B	B10		0,60	3,31	2,00	3,97				-	3,97
EJE 3 / A-B	B16		0,60	3,81	1,00	2,29				-	2,29
EJE A / 8-9	L8,1		0,60	6,70	3,00	12,06				-	12,06
EJE A / 9-10	L9		0,60	6,70	3,00	12,06				-	12,06
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				VIENE	310,60
						-				-	-
										TOTAL	358,19

FOTOS



Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			FECHA	DIA	5 MES 12 AÑO 2025	
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ			CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	4. MUROS Y PAÑETES				REF.	CONTRACTUAL
ITEM	4.3.1 Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm.		UND.	M2	REF.	HOJA 5 DE 5

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

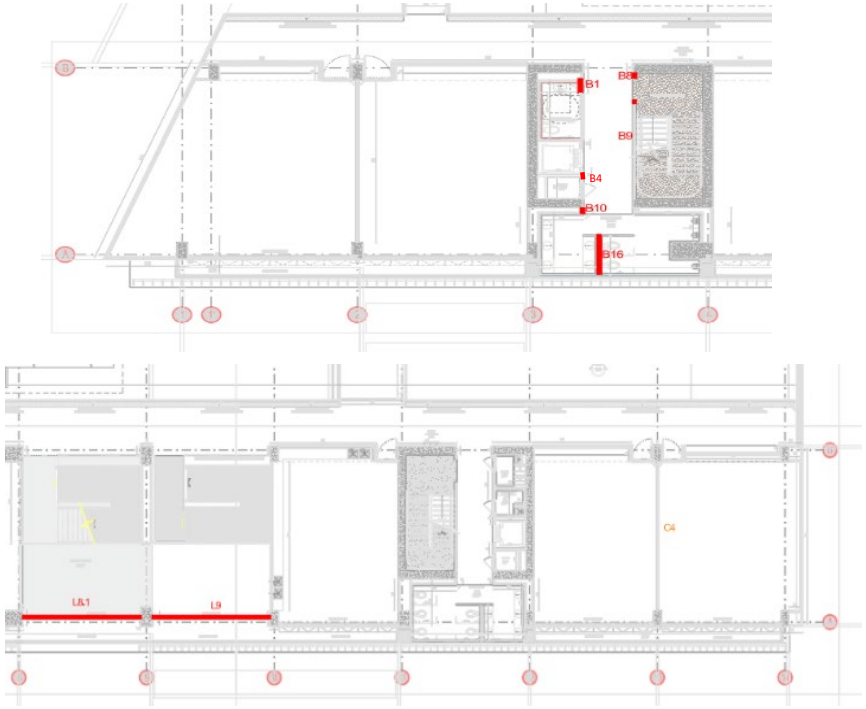Piso 4



CRONOLOGÍA

PISO 3





Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO NOVAURBANO SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.4 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 3"	UND.	ML	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
					-				-	-	
HALL EJES 1-14 Y B	53,81			1,00	53,81					53,81	
										-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
										-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
TOTAL										53,81	

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.4 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 3"	UND.	ML	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

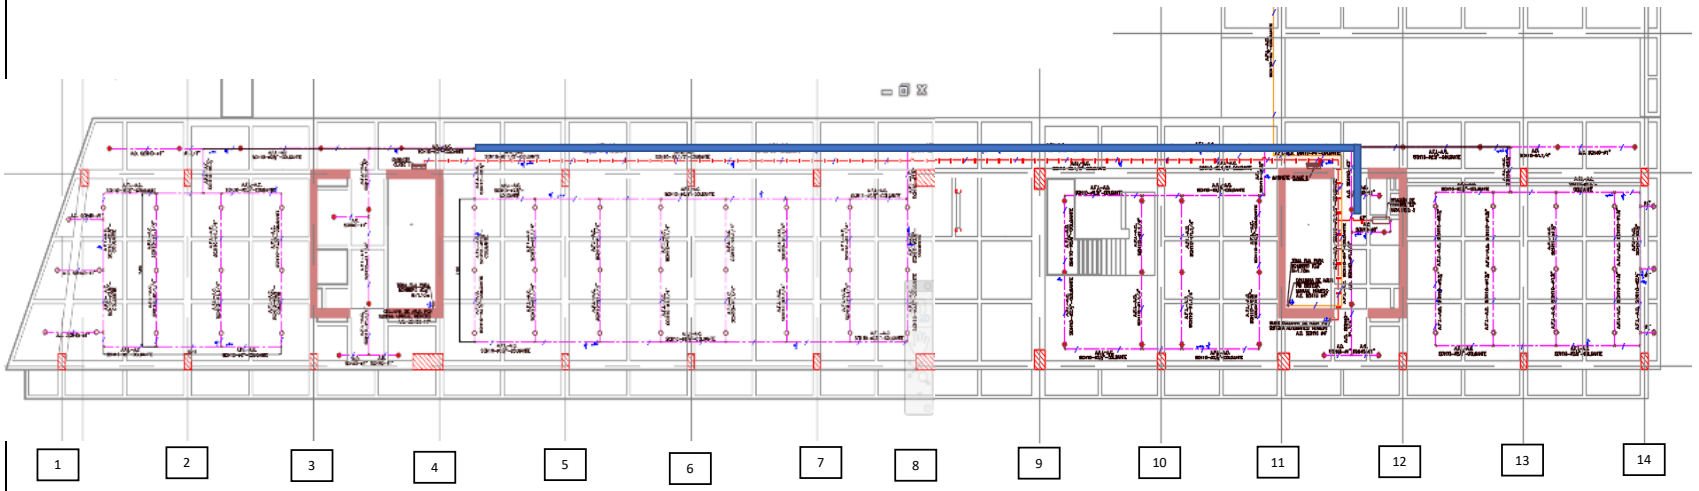CROQUIS



Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO NOVAURBANO SED — **CONTRATO OBRA No.** CO1.PCCNTR.5698312


DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.5Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 1/2"	UND.	ML	REF.	HOJA 1 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
5 PISO					-				-	-
ZONA AULAS EJES 1 A 3-AB	10,10			2,00	20,20				-	20,20
ZONA AULAS EJES 1 A 3-AB	7,43			2,00	14,86				-	14,86
ZONA AULAS EJES 1 A 3-AB	2,10			1,00	2,10				-	2,10
ZONA AULAS EJES 4 A 8-AB	7,50			2,00	15,00				-	15,00
ZONA AULAS EJES 4 A 8-AB	24,77			2,00	49,54				-	49,54
ZONA AULAS EJES 9 A 11-AB	6,90			2,00	13,80				-	13,80
ZONA AULAS EJES 9 A 11-AB	10,41			2,00	20,82				-	20,82
ZONA AULAS EJES 12 A 14-AB	7,43			2,00	14,86				-	14,86
ZONA AULAS EJES 12 A 14-AB	12,05			2,00	24,10				-	24,10
HALL TERCER NIVEL EJES 1-14 Y B	85,27			1,00	85,27				-	85,27
									-	-
										-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
TOTAL										**260,55**

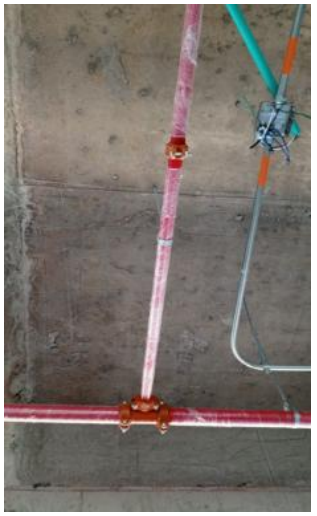FOTOS



Observaciones

HOJA 1 DE 3

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.5Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 1/2"	UND.	ML	REF.	HOJA 2 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

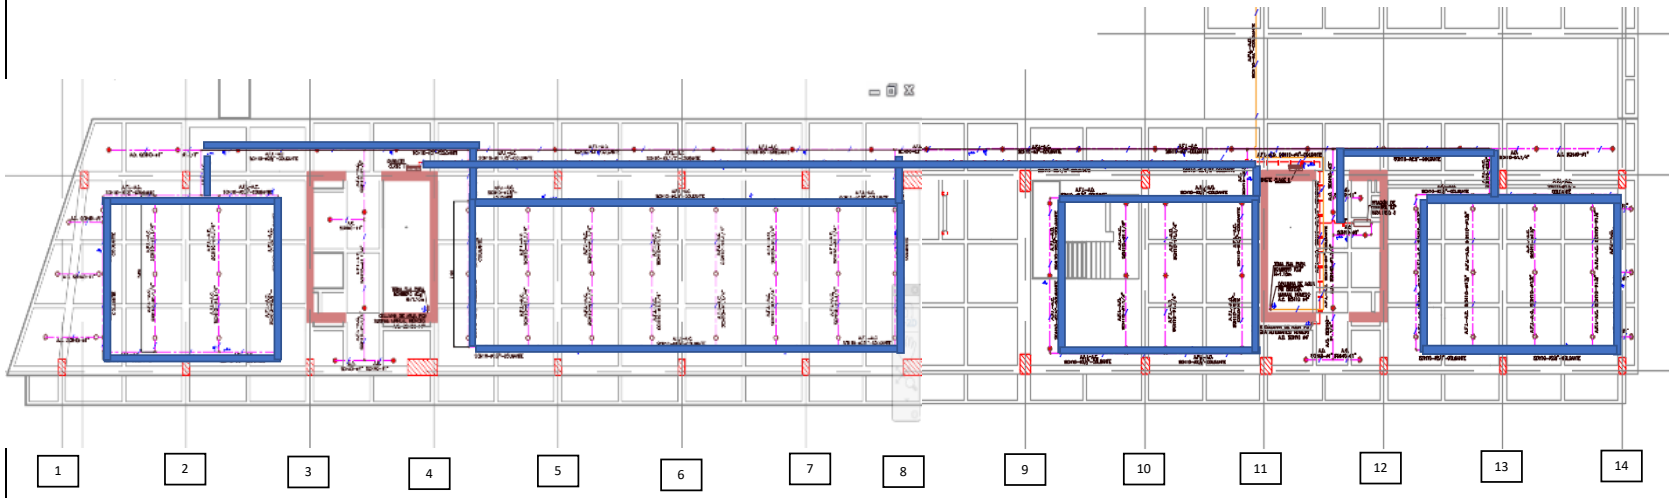PLANTA NIVEL 5



Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.5Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 1/2"	UND.	ML	REF.	HOJA 3 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

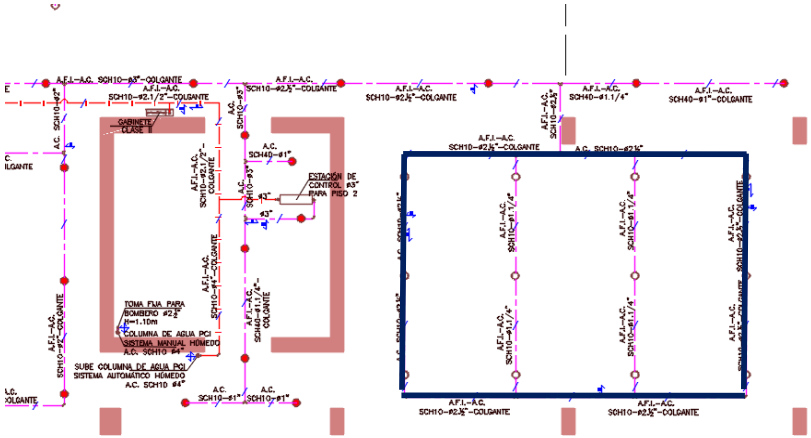CROQUIS PLANTA SEGUNDO NIVEL EJES DE 11-14 Y A-B



Observaciones	

HOJA 3 DE 3

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6.24 RED DE CONTRA INCENDIO			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.7 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/2"	UND.	ml	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
ZONA AULAS EJES 12 A 14-AB			12,50	3,00	37,50				-	37,50	
					-				-	-	
					-				-	-	
									-	-	
					-				-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
									VIENE	-	
									TOTAL	37,50	

Observaciones

medidas varian en altura por la altura de la viga de 2 nivel

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.7 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/2"	UND.	ml	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

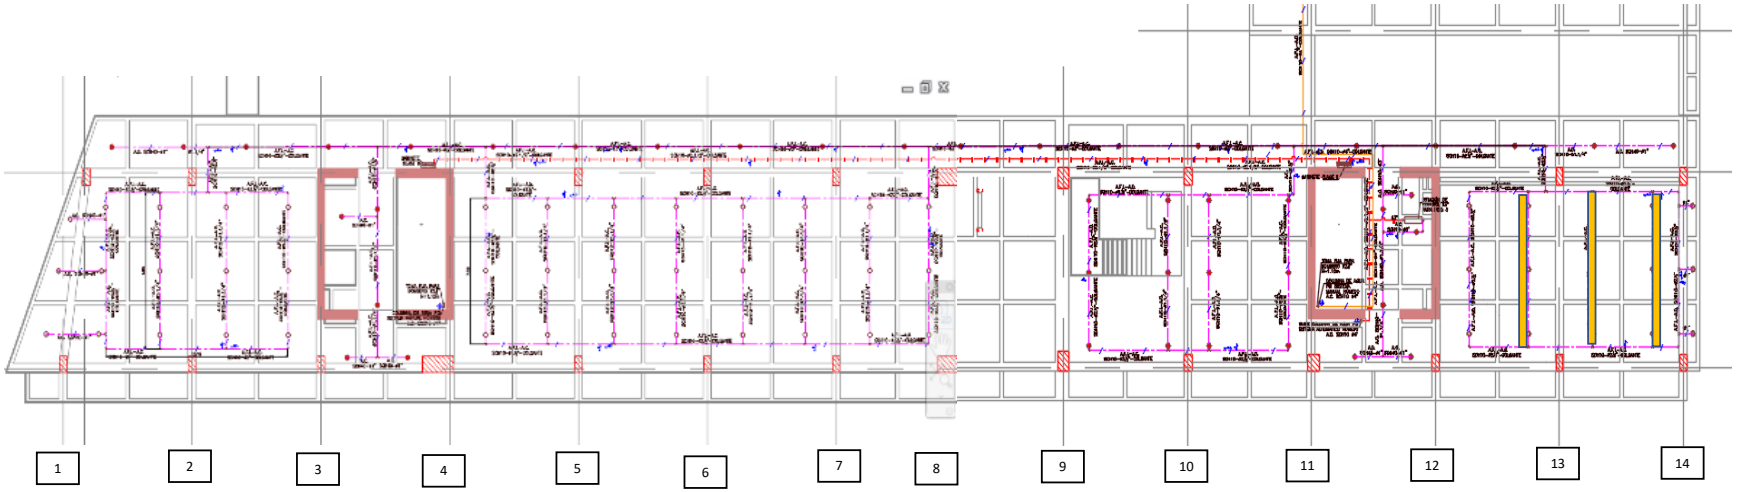CROQUIS



Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	6.24 RED DE CONTRA INCENDIO			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.8 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/4"	UND.	ml	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
ZONA AULAS EJES 1 A 3-AB			7,50	2,00	15,00				-	15,00	
ZONA AULAS EJES 4 A 8-AB			7,00	6,00	42,00				-	42,00	
ZONA AULAS EJES 9 A 11-AB			6,90	2,00	13,80				-	13,80	
									-	-	
					-				-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
									VIENE	-	
									TOTAL	70,80	

Observaciones
medidas varian en altura por la altura de la viga de 2 nivel

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.8 Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/4"	UND.	ml	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS



Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO NOVAURBANO SED

DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.14 Accesorio ranurado 3"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
HALL EJES 1-14 Y B				4,00	4,00					4,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
TOTAL										4,00	

Observaciones

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA NO 16
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTA Secretaría de Educación	

		FECHA	DIA	5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.14 Accesorio ranurado 3"	UND.	UND	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

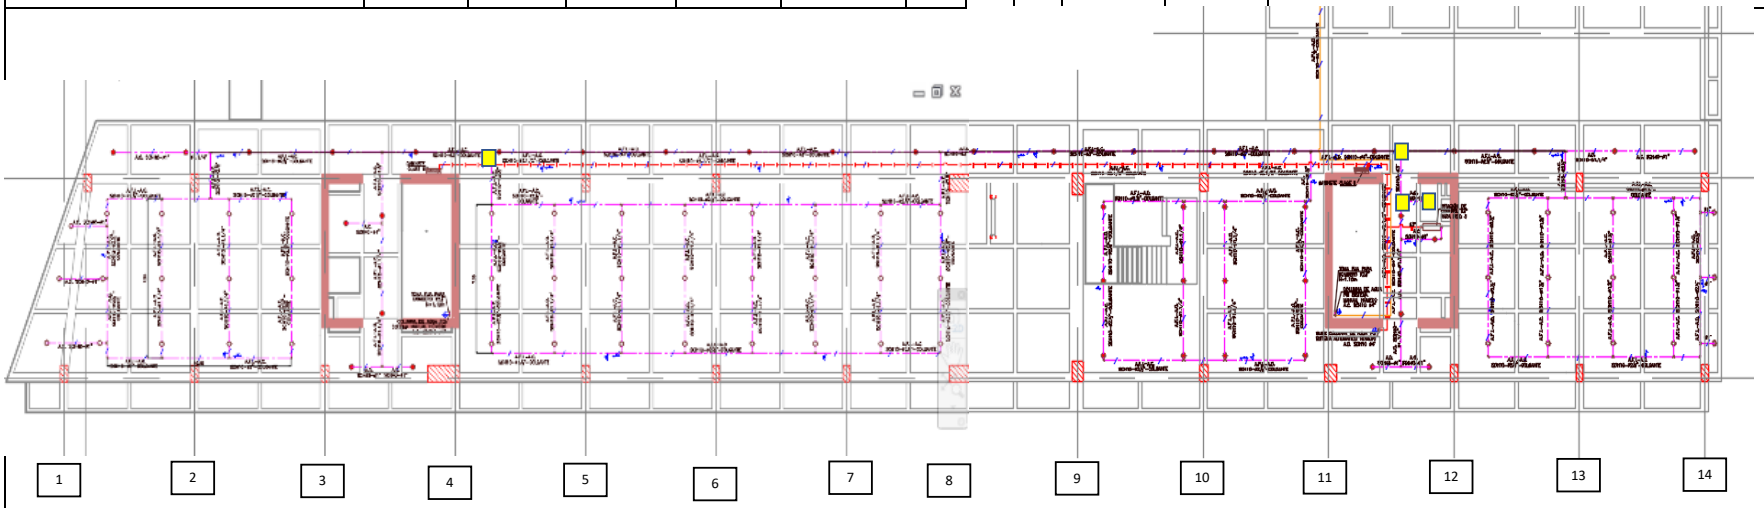

Observaciones

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.15 Accesorio ranurado 2 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
ZONA AULAS EJES 1 A 3-AB				12,00	12,00				-	12,00	
ZONA AULAS EJES 4 A 8-AB				18,00	18,00				-	18,00	
ZONA AULAS EJES 9 A 11-AB				13,00	13,00				-	13,00	
ZONA AULAS EJES 12 A 14-AB				14,00	14,00				-	14,00	
HALL TERCER NIVEL EJES 1-14 Y B				5,00	5,00				-	5,00	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
TOTAL										62,00	



Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

FECHA		DIA	5	MES	12	AÑO	2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.			CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ						
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.15 Accesorio ranurado 2 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 2 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

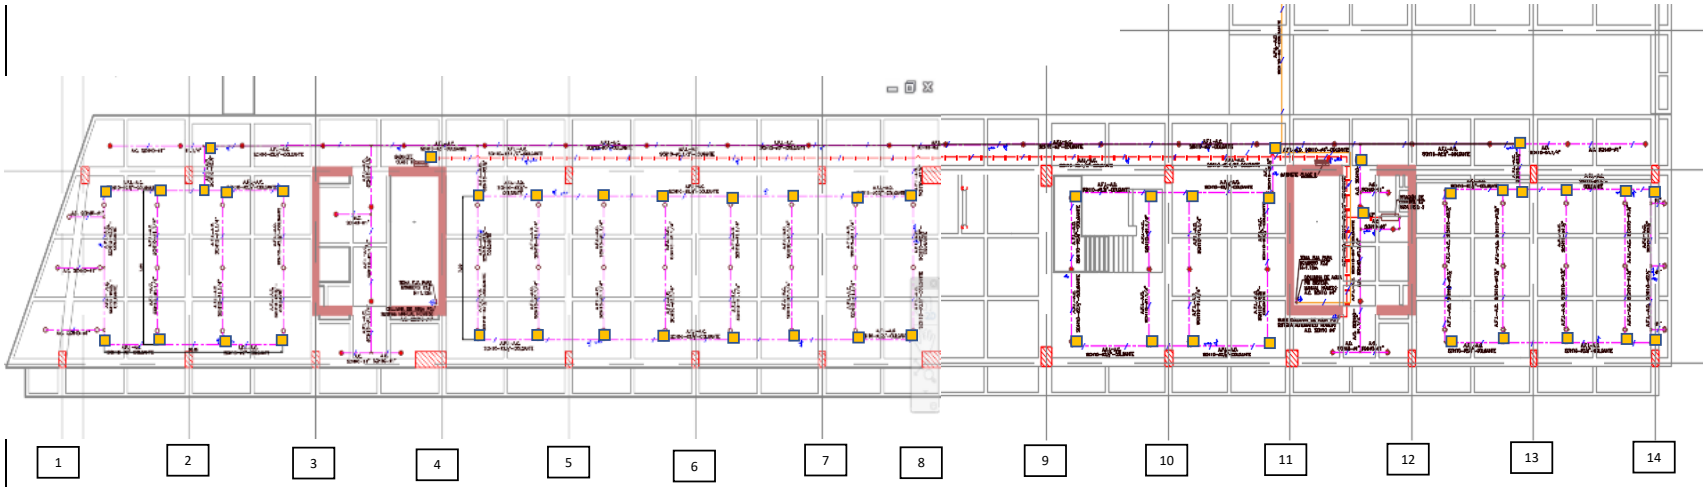

Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA NO 16
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	


FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO NOVAURBANO SED

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

6.24.15 Accesorio ranurado 2 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 3 DE 3	

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

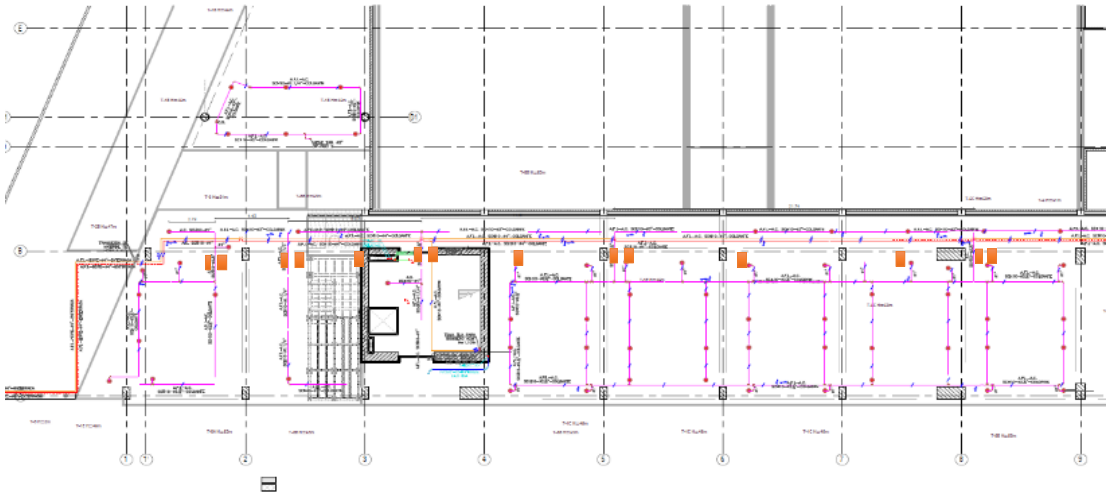



Observaciones

HOJA 3 DE 3

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA NO 16
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO NOVAURBANO SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.21 Acople rigido 3"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
HALL EJES 1-14 Y B				14,00	14,00				-	14,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
										-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
TOTAL										14,00	



Observaciones

HOJA 1 DE 3

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA			
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación		ACTA NO 16

				FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED			CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ						
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.21 Acople rigido 3"	UND.	UND	REF.	HOJA 2 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

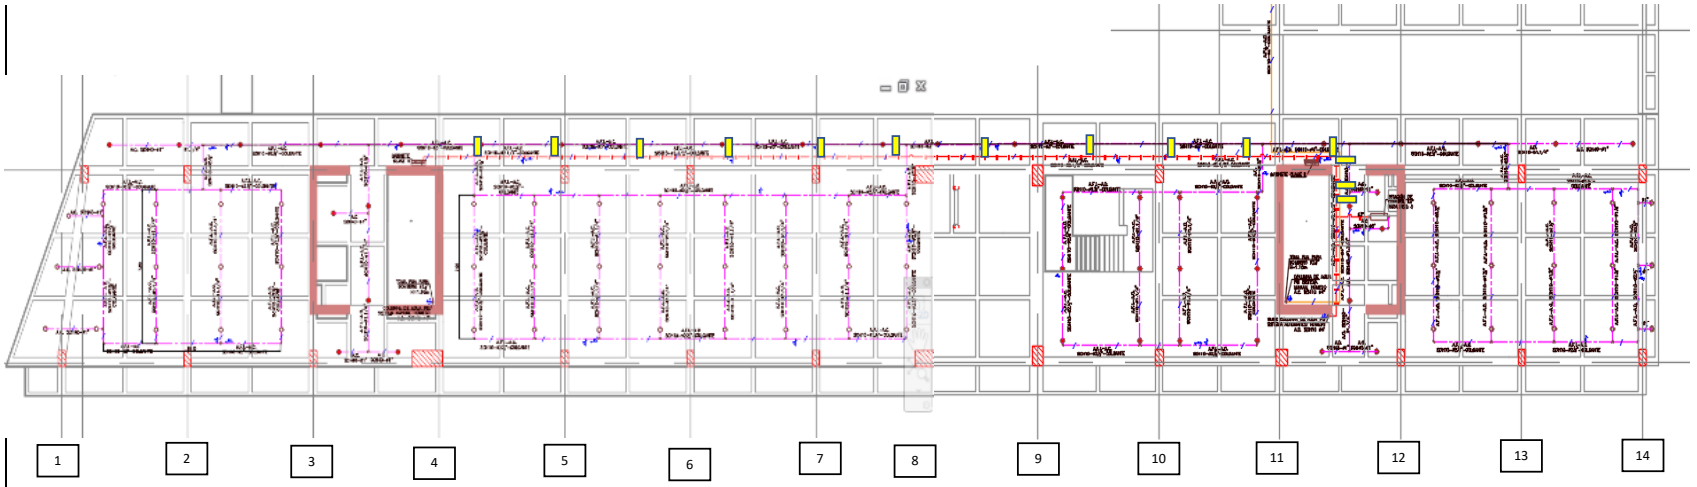

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

		FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.21 Acople rigido 3"	UND.	UND	REF.	HOJA 3 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

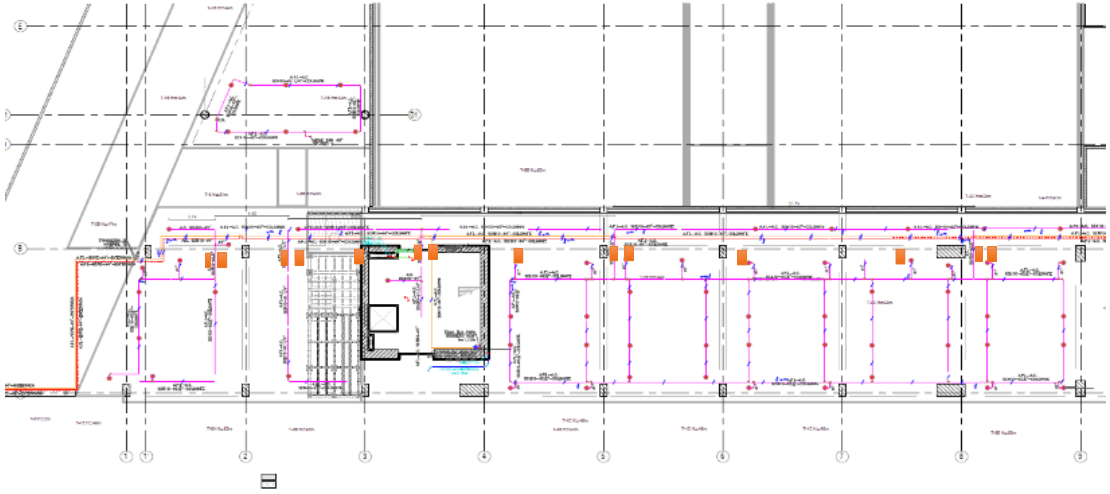



Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO NOVAURBANO SED


DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.22 Acople rigido 2 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
ZONA AULAS EJES 1 A 3-AB				19,00	19,00				-	19,00	
ZONA AULAS EJES 4 A 8-AB				17,00	17,00					17,00	
ZONA AULAS EJES 9 A 11-AB				18,00	18,00					18,00	
ZONA AULAS EJES 12 A 14-AB				23,00	23,00					23,00	
HALL TERCER NIVEL EJES 1-14 Y B				21,00	21,00					21,00	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
										-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
TOTAL										98,00	

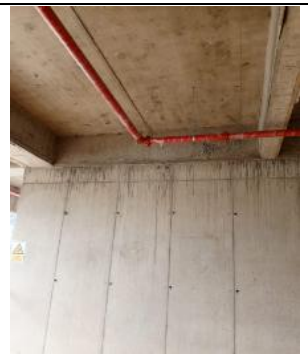

Observaciones

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.22 Acople rigido 2 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

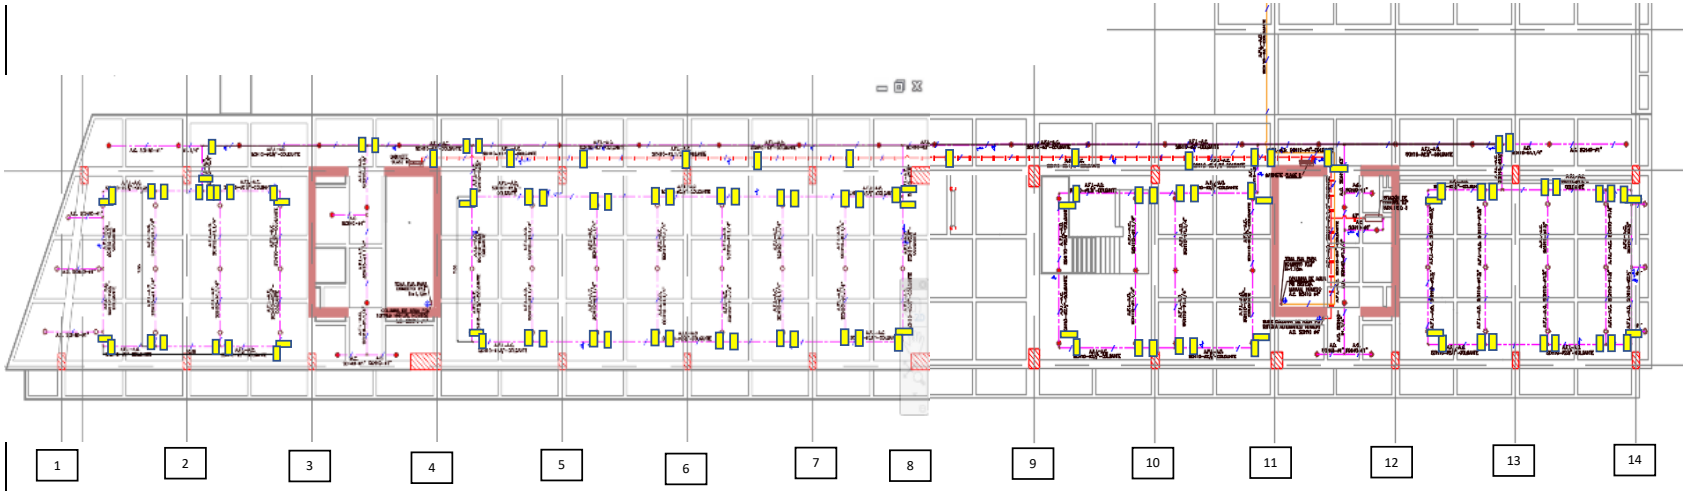

Observaciones

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6.24 RED DE CONTRA INCENDIO			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.24 Acople rigido 1 1/2"	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
ZONA AULAS EJES 12 A 14-AB			9,00	1,00	9,00				-	9,00	
					-				-	-	
					-				-	-	
									-	-	
					-				-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
									VIENE	-	
									TOTAL	9,00	

Observaciones

medidas varian en altura por la altura de la viga de 2 nivel

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.24 Acople rigido 1 1/2"	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

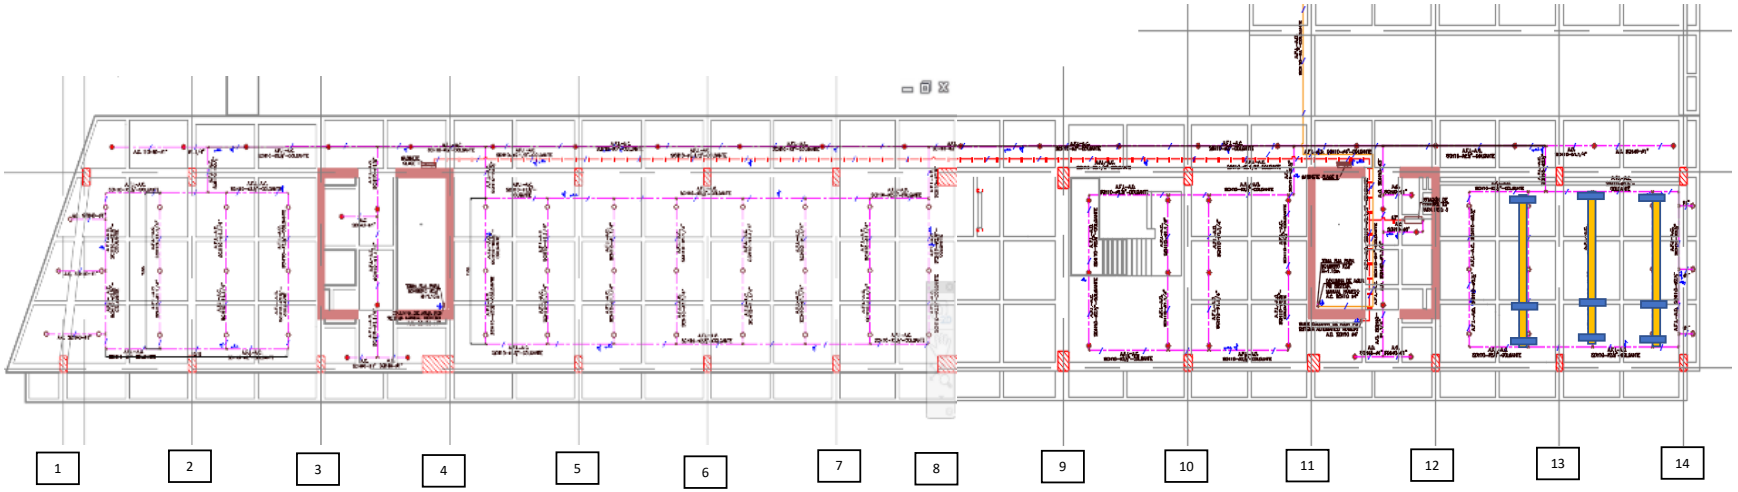CROQUIS



Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.25 Acople rigido 1 1/4"	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
ZONA AULAS EJES 1 A 3-AB				6,00	6,00				-	6,00	
ZONA AULAS EJES 4 A 8-AB				18,00	18,00					18,00	
ZONA AULAS EJES 9 A 11-AB				6,00	6,00					6,00	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
										-	
									-	-	
									-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
TOTAL										30,00	

Observaciones

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.25 Acople rigido 1 1/4"	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

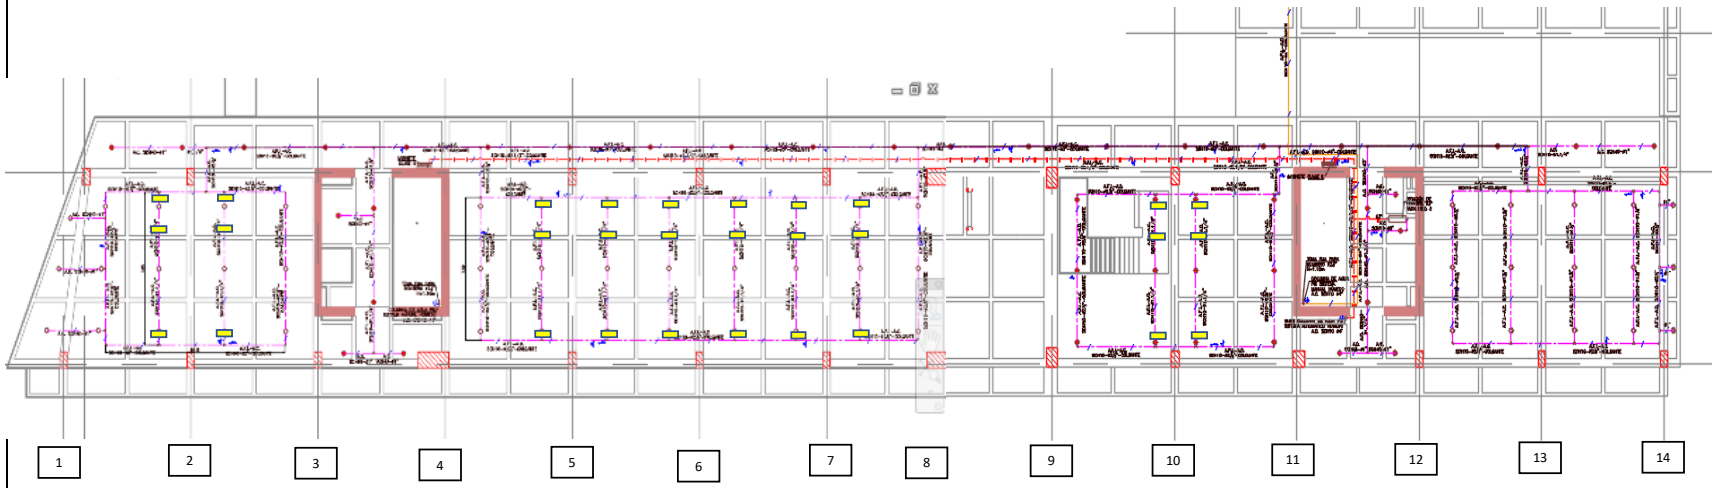CROQUIS



Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA NO 16
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO NOVAURBANO SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.47 Soporte sencillo ul/fm 3"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
Nivel 5					-				-	-	
HALL EJES 1-14 Y B				16,00	16,00				-	16,00	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
										-	
										-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
										-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
TOTAL										16,00	

Observaciones

HOJA 1 DE 3

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025		
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.47 Soporte sencillo ul/fm 3"	UND.	UND	REF.	HOJA 2 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

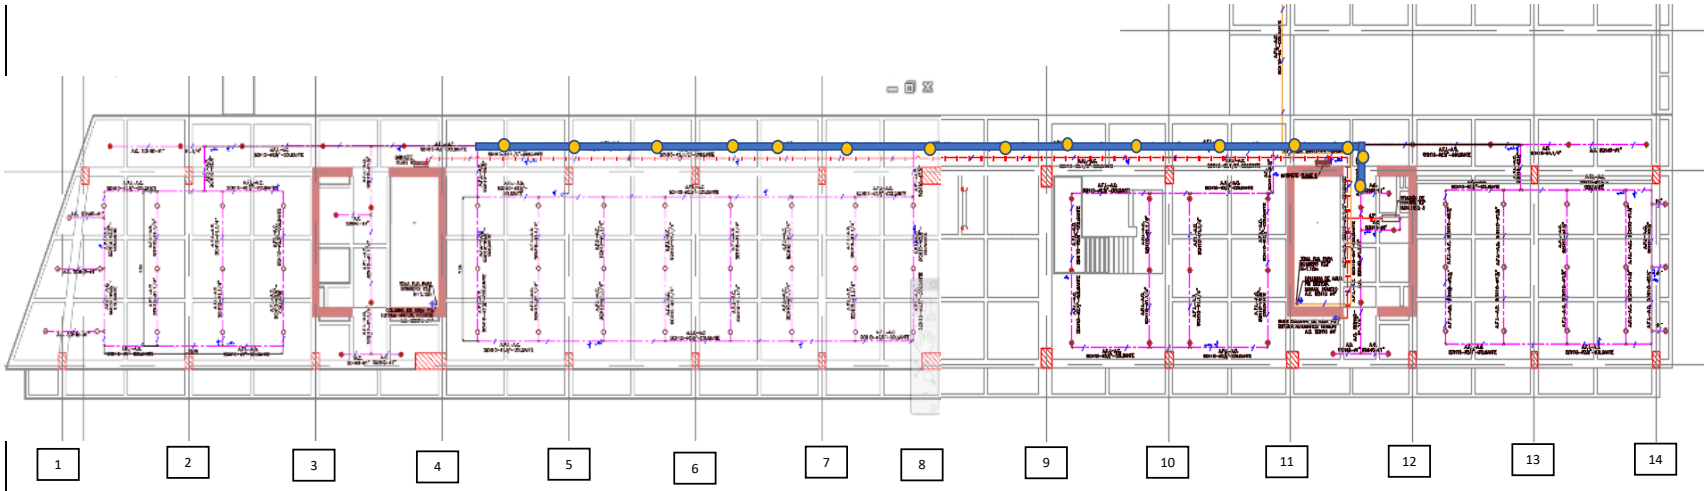

Observaciones	
	HOJA 2 DE 3

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA NO 16
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO NOVAURBANO SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.47 Soporte sencillo ul/fm 3"	UND.	UND	REF.	HOJA 3 DE 3

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

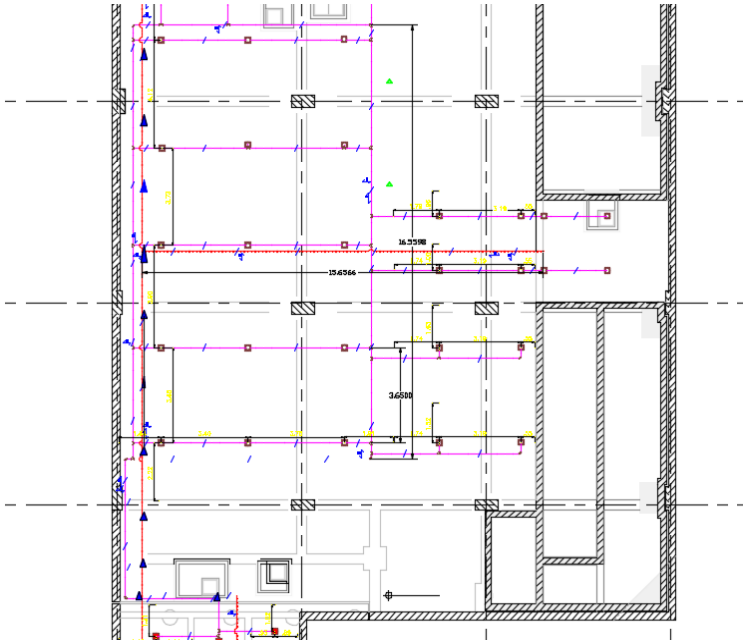



Observaciones

HOJA 3 DE 3

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO NOVAURBANO SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.48 Soporte sencillo ul/fm 2 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 2

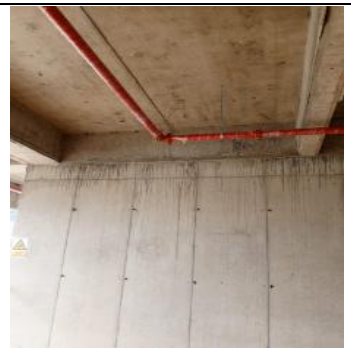AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
ZONA AULAS EJES 1 A 3-AB				14,00	14,00				-	14,00	
ZONA AULAS EJES 4 A 8-AB				20,00	20,00					20,00	
ZONA AULAS EJES 9 A 11-AB				14,00	14,00					14,00	
ZONA AULAS EJES 12 A 14-AB				15,00	15,00					15,00	
HALL TERCER NIVEL EJES 1-14 Y B				28,00	28,00					28,00	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
										-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
TOTAL										91,00	

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA			
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación		ACTA NO 16

				FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED			CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ						
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.48 Soporte sencillo ul/fm 2 1/2"	UND.	UND	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			



Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6.24 RED DE CONTRA INCENDIO			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.50 Soporte sencillo ul/fm 1 1/2"	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	ALTO	ANCHO	LARGO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5					-				-	-	
ZONA AULAS EJES 12 A 14-AB			12,50	3,00	37,50				-	37,50	
					-				-	-	
					-				-	-	
									-	-	
					-				-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
									-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
									VIENE	-	
									TOTAL	37,50	

Observaciones

medidas varian en altura por la altura de la viga de 2 nivel

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	3. ESTRUCTURAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	6.24.50 Soporte sencillo ul/fm 1 1/2"	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

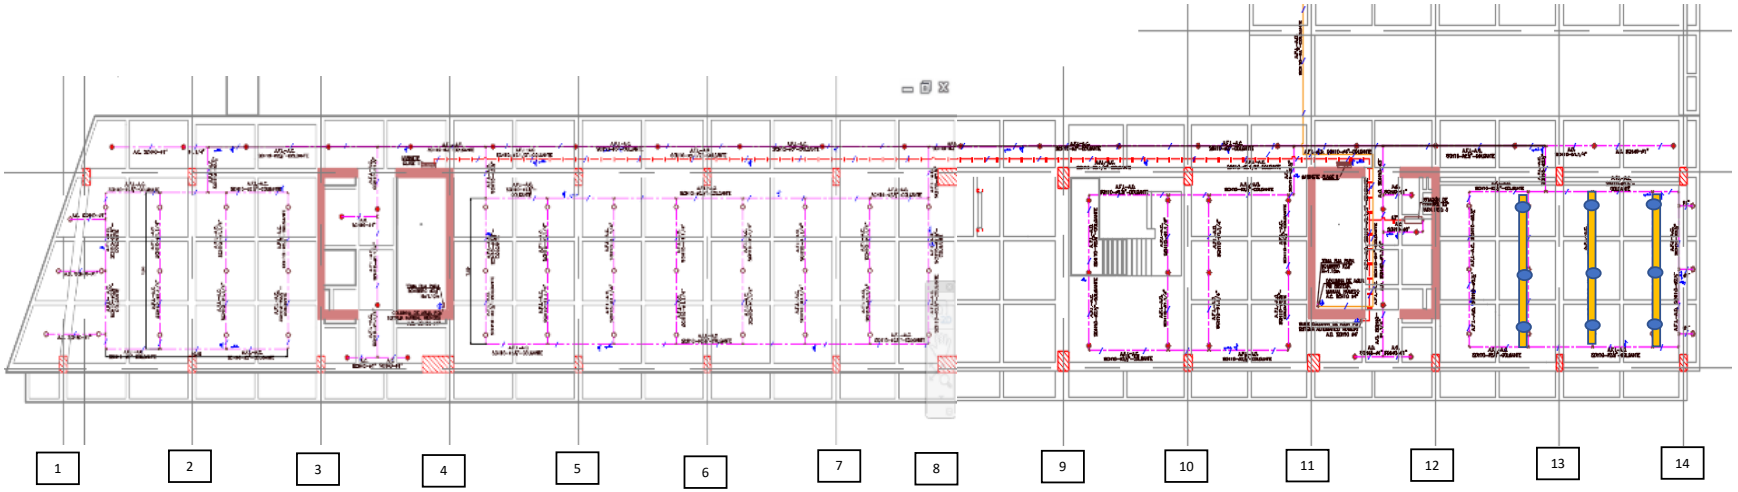CROQUIS



Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO NOVAURBANO SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.25 Soporte sencillo ul/fm 1 1/4"	UND.	UND	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 5									-		
ZONA AULAS EJES 1 A 3-AB				6,00	6,00				-	6,00	
ZONA AULAS EJES 4 A 8-AB				18,00	18,00					18,00	
ZONA AULAS EJES 9 A 11-AB				6,00	6,00					6,00	
					-					-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-					-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
TOTAL										30,00	



Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS			REF.	CONTRACTUAL
	6.24.25 Soporte sencillo ul/fm 1 1/4"	UND.	UND	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

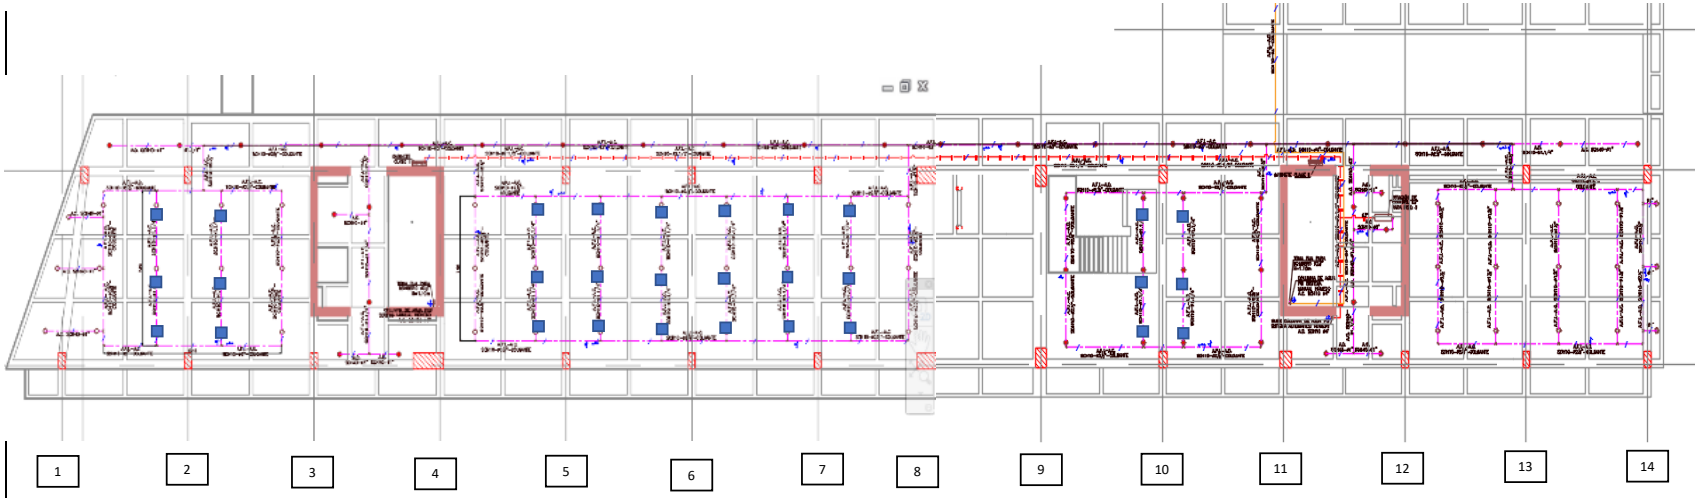

Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.1 Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo luminoso 125 o más, Autonomía de 90 minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
					-					-	
Luminaria emergencia					-					-	
SOTANO				19,00	19,00				50,00%	9,50	
1ER PISO				39,00	39,00				50,00%	19,50	
2do PISO				26,00	26,00				50,00%	13,00	
3er PISO				26,00	26,00				50,00%	13,00	
4to PISO				21,00	21,00				50,00%	10,50	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
									VIENE	-	
									TOTAL	65,50	





Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director de Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.1 Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo luminoso 125 o más, Autonomía de 90 minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

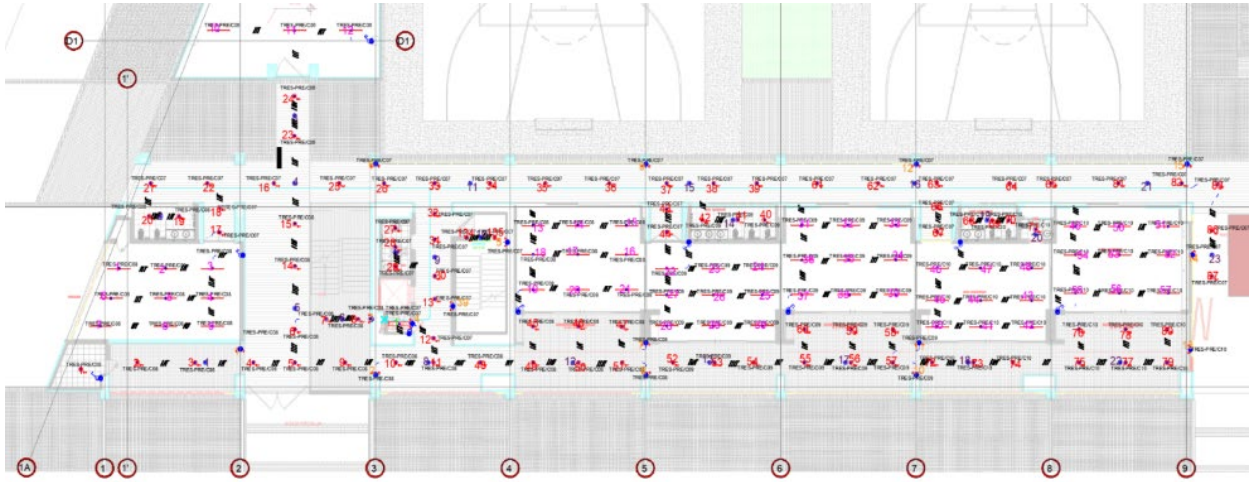PISO 1 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.1 Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo luminoso 125 o más, Autonomía de 90 minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 3 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

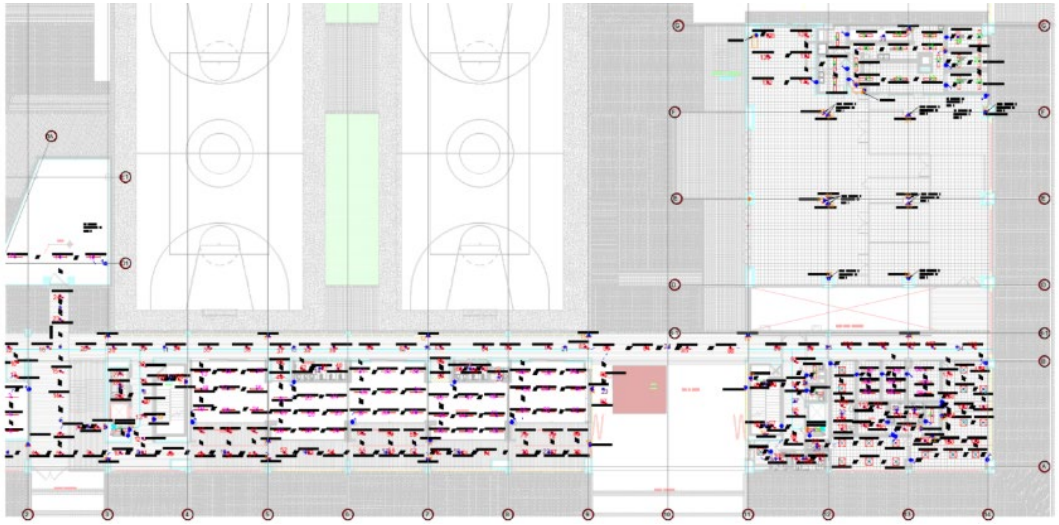PISO 1 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 3 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.1 Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo luminoso 125 o más, Autonomía de 90 minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 4 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

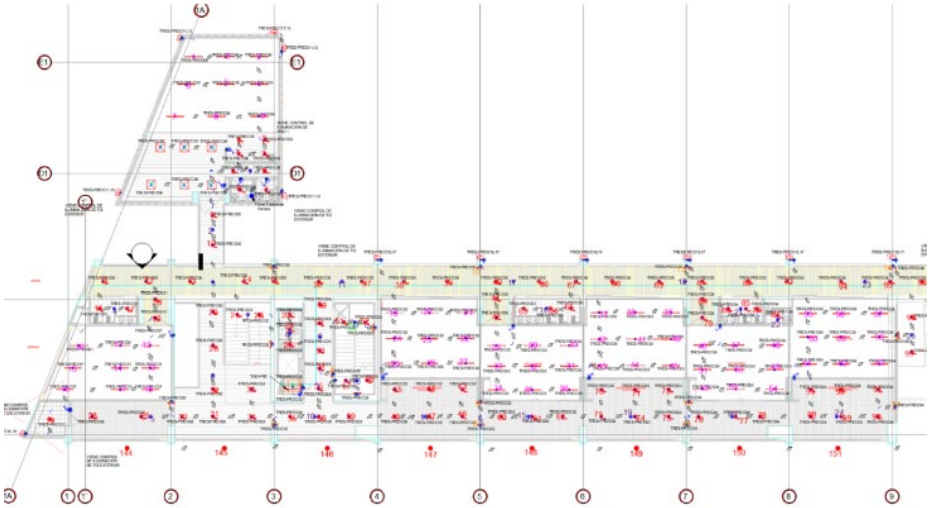PISO 2 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 4 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.1 Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo luminoso 125 o más, Autonomía de 90 minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 5 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

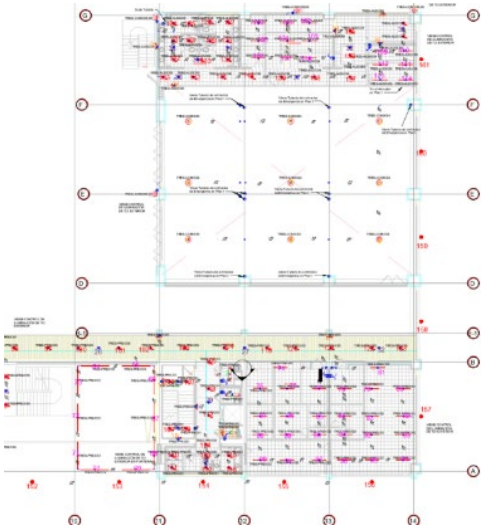PISO 2 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 5 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.1 Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo luminoso 125 o más, Autonomía de 90 minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 6 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 3 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.1 Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo luminoso 125 o más, Autonomía de 90 minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 7 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 3 EJE A-G 9-14											CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 7 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.2 Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-					-
Lampara hermetica					-					-
SOTANO				54,00	54,00				50,00%	27,00
1ER PISO				25,00	25,00				50,00%	12,50
2do PISO				4,00	4,00				50,00%	2,00
3er PISO				4,00	4,00				50,00%	2,00
4to PISO				5,00	5,00				50,00%	2,50
					-					-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									VIENE	-
									TOTAL	46,00

FOTOS





Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.2 Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

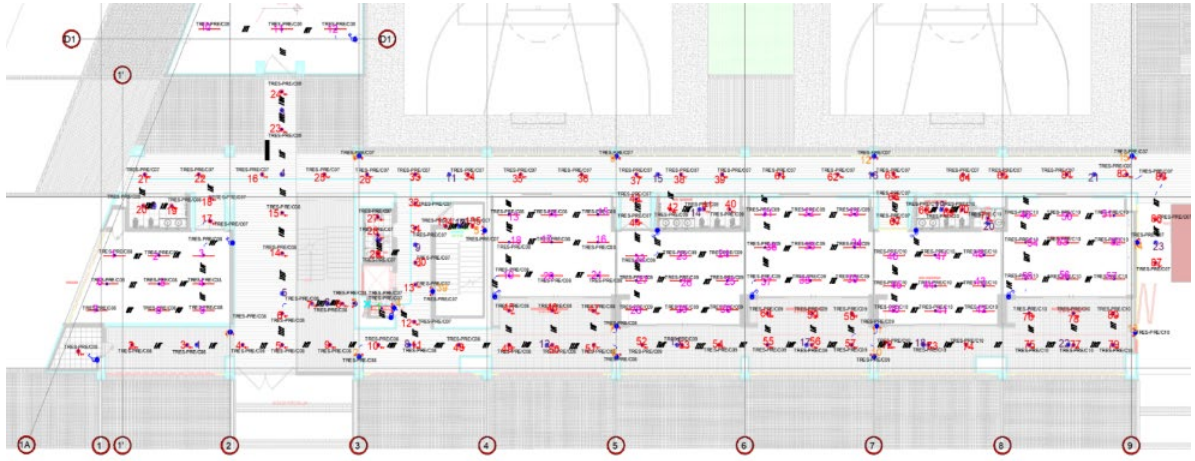PISO 1 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.2 Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 3 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

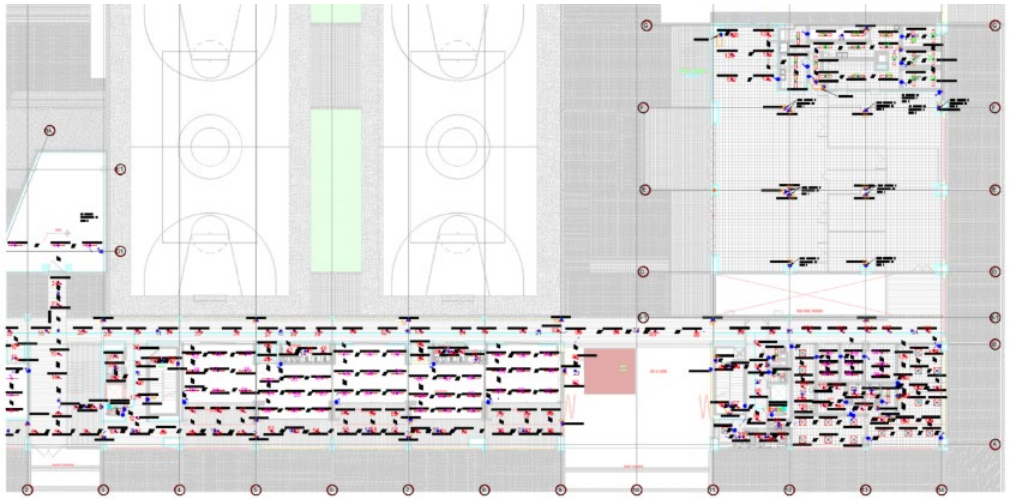PISO 1 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 3 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.2 Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 4 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

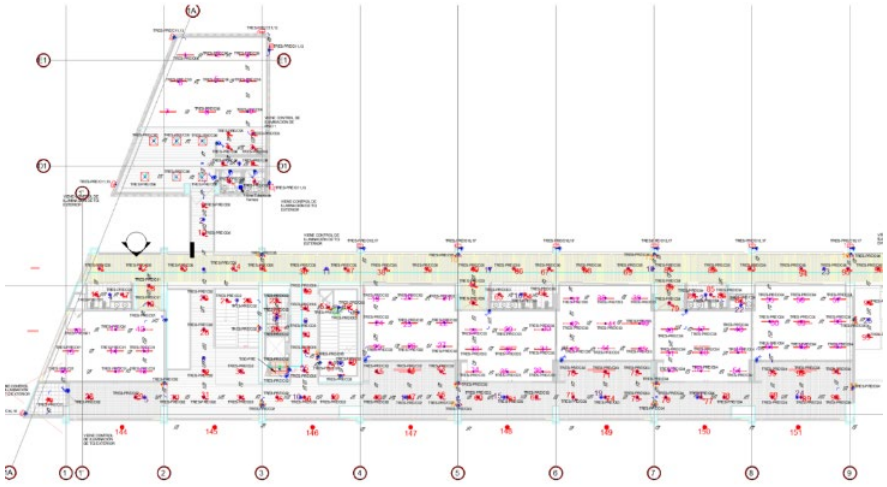PISO 2 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 4 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.2 Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 5 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 2 EJE A-B 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.2 Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 6 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 3 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.2 Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 7 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 3 EJE A-G 9-14											CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 7 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
					-					-	
Lampara led 18w					-					-	
SOTANO				34,00	34,00				50,00%	17,00	
1ER PISO				135,00	135,00				50,00%	67,50	
2do PISO				161,00	161,00				50,00%	80,50	
3er PISO				130,00	130,00				50,00%	65,00	
4to PISO				87,00	87,00				50,00%	43,50	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
									VIENE	-	
									TOTAL	273,50	



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

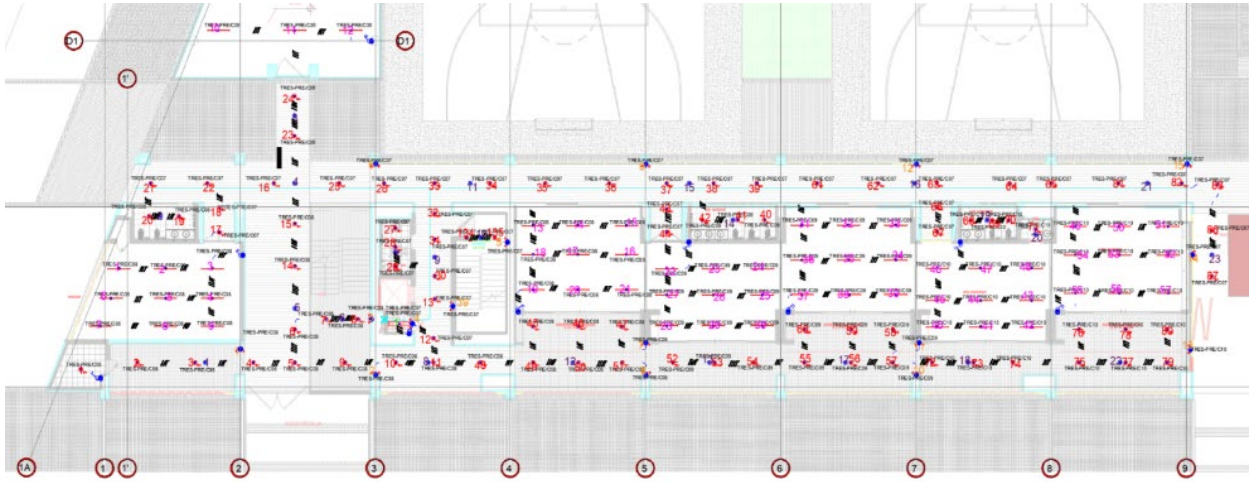PISO 1 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 3 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

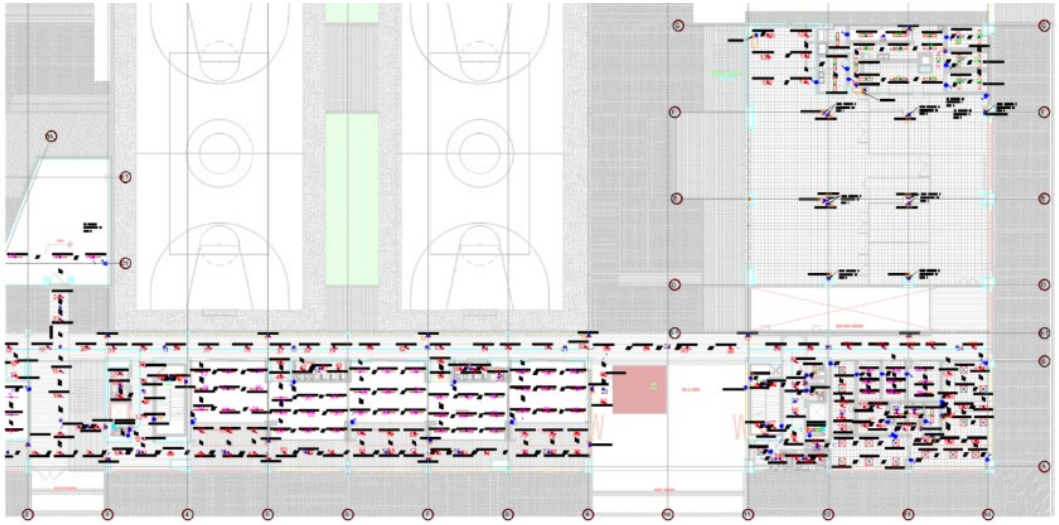PISO 1 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 3 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	**7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.**	UND.	UN	REF.	HOJA 4 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

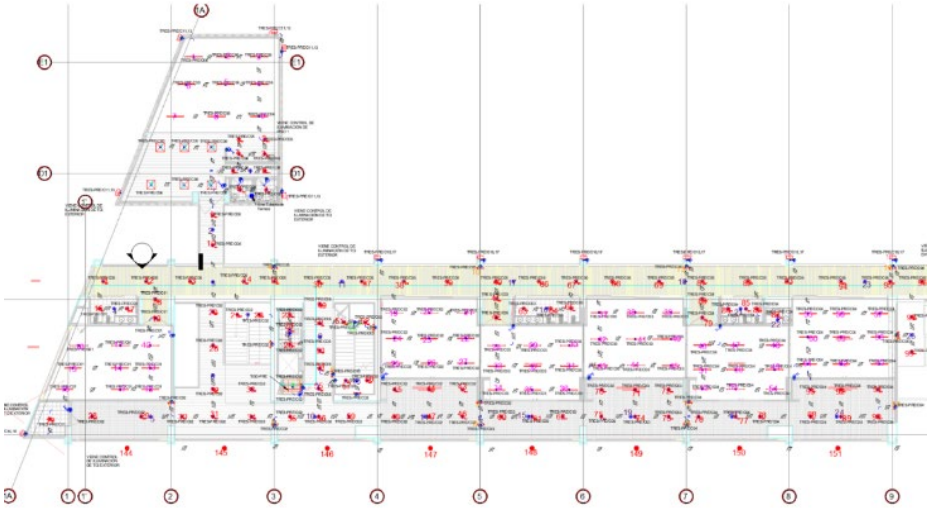PISO 2 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 5 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 2 EJE A-B 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO: ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 6 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 3 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 6 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 7 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

PISO 3 EJE A-G 9-14

CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 7 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.6 Suministro e Instalación de luminaria lineal LED de 40W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 3200 lm, IRC 80, vida útil mayor a 10,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
					-					-	
Lampara led 18w					-					-	
					-					-	
1ER PISO				66,00	66,00				50,00%	33,00	
2do PISO				104,00	104,00				50,00%	52,00	
3er PISO				124,00	124,00				50,00%	62,00	
4to PISO				141,00	141,00				50,00%	70,50	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
									VIENE	-	
									TOTAL	217,50	



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

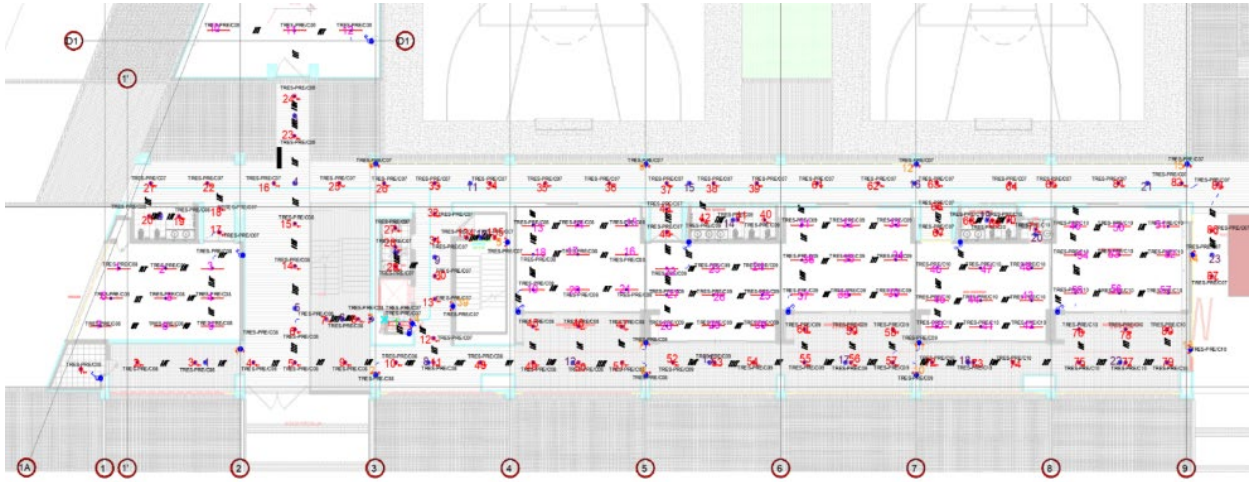PISO 1 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 3 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

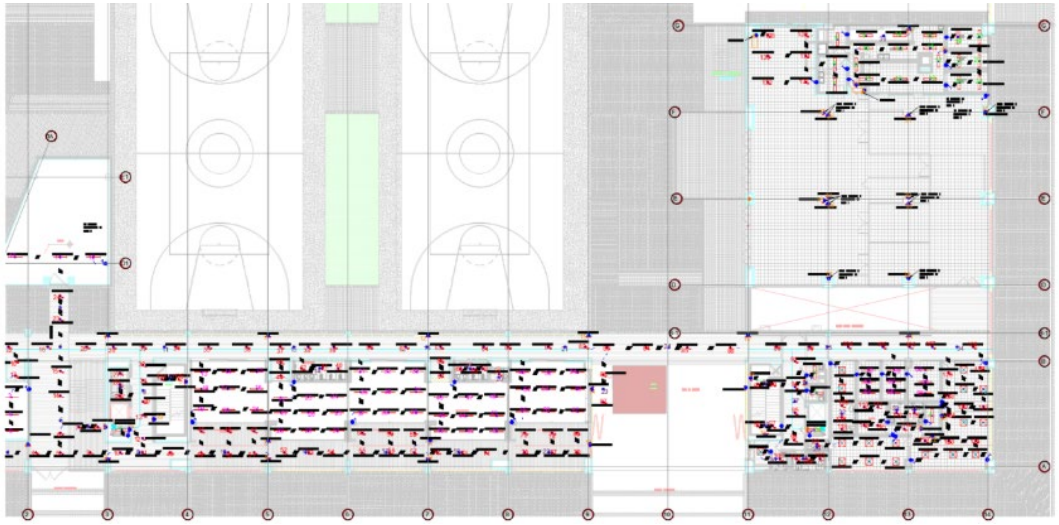PISO 1 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 4 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

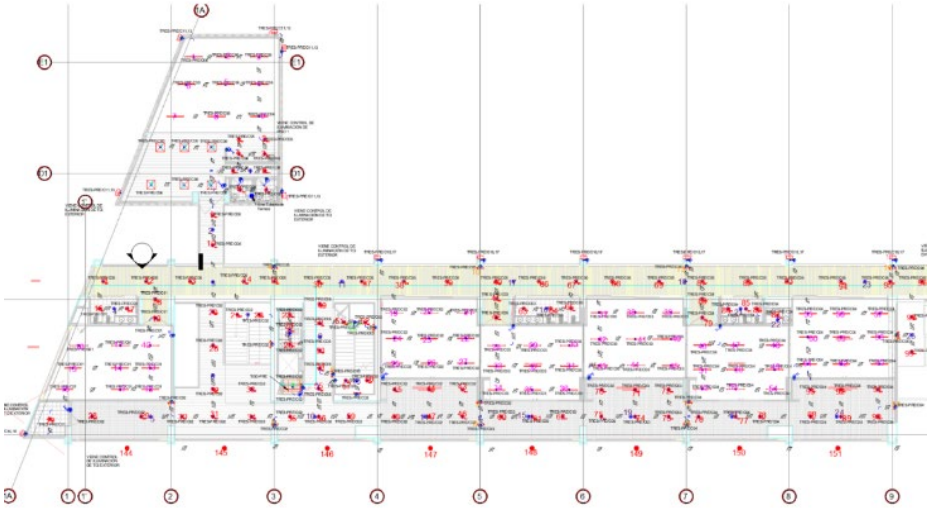PISO 2 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 4 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 5 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 2 EJE A-B 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 5 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 6 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 3 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS
	HOJA 6 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.1.3 Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	UND.	UN	REF.	HOJA 7 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

PISO 3 EJE A-G 9-14

CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 7 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED — Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas — Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.1 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-					-
SALIDA Luminaria emergencia					-					-
					-					-
1ER PISO				39,00	39,00				90,00%	35,10
2do PISO				26,00	26,00				90,00%	23,40
3er PISO				26,00	26,00				90,00%	23,40
4to PISO				21,00	21,00				60,00%	12,60
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
						PAGADO ACTAS ANTERIORES				- 54,60
									VIENE	-
									TOTAL	39,90

FOTOS





Observaciones: VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.1 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

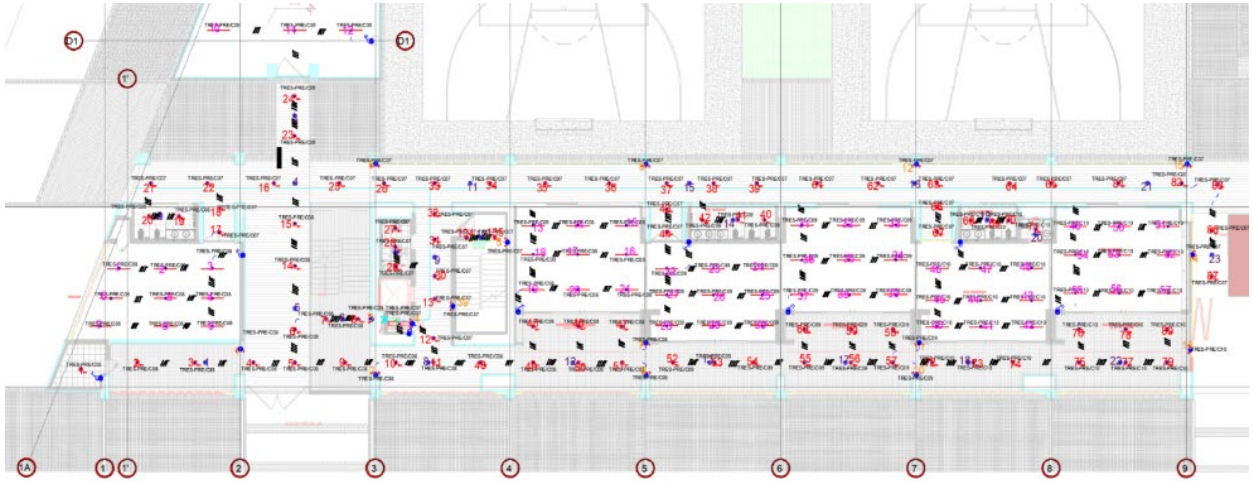PISO 1 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.1 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 3 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

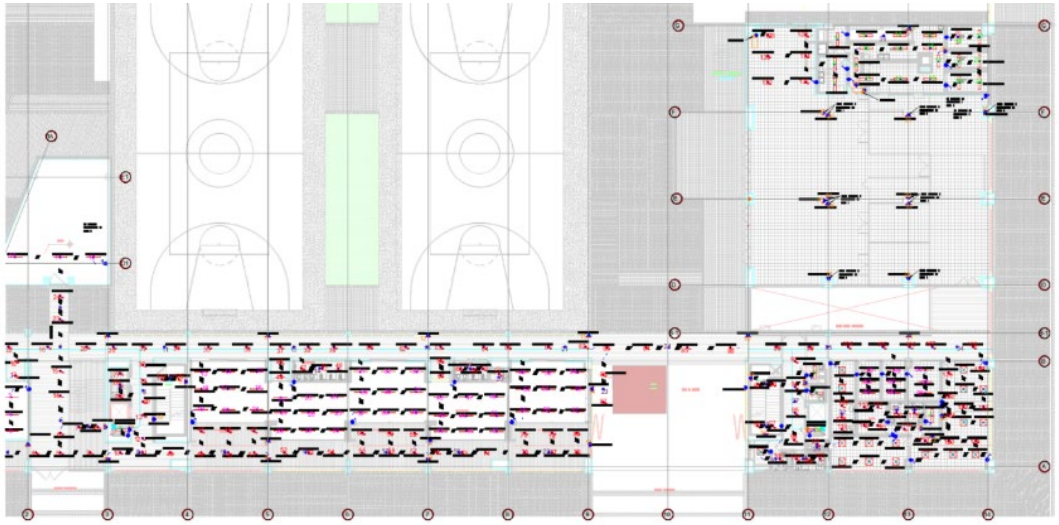PISO 1 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 3 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.1 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 4 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

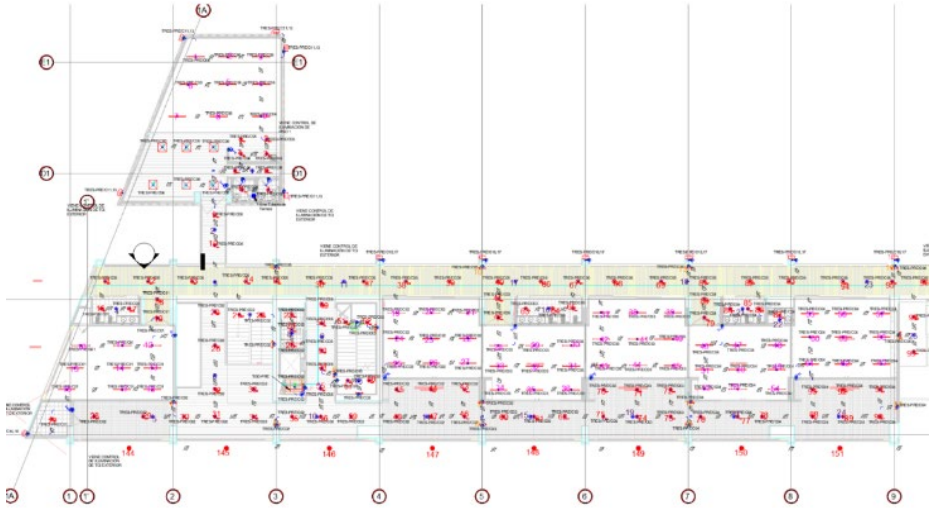PISO 2 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 4 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


				FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ						
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.1 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 5 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

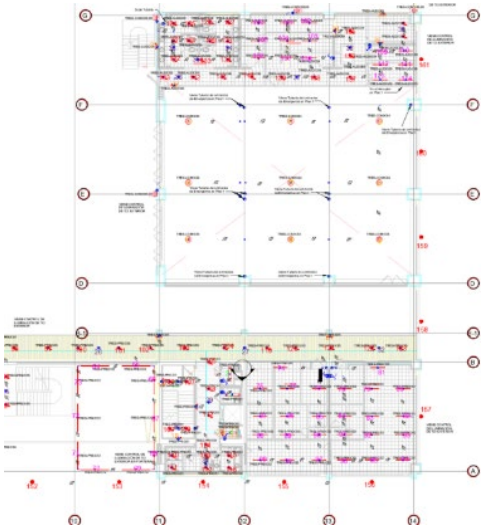PISO 2 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS
	HOJA 5 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.1 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 6 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 3 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.1 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 7 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 3 EJE A-G 9-14											CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS
	HOJA 7 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

DIRECTOR TÉCNICO: ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL	REF.	CONTRACTUAL

ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
					-					-	
SALIDA Luminaria bala led 18w					-					-	
					-					-	
1ER PISO				135,00	135,00				90,00%	121,50	
2do PISO				161,00	161,00				90,00%	144,90	
3er PISO				130,00	130,00				90,00%	117,00	
4to PISO				87,00	87,00				60,00%	52,20	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
						PAGADO ACTAS ANTERIORES				- 194,40	
									VIENE	-	
									TOTAL	241,20	

Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

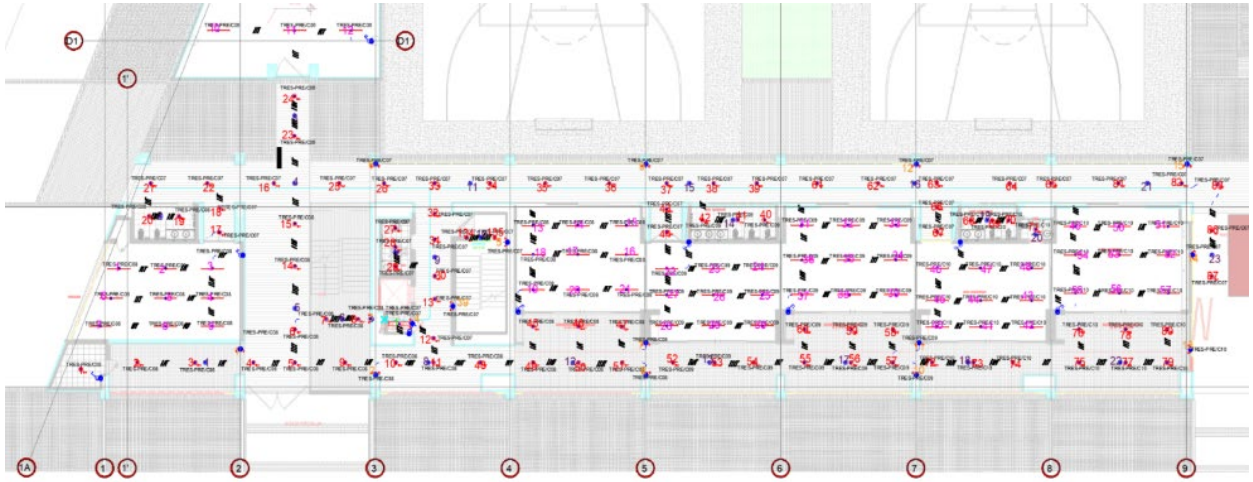PISO 1 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 3 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

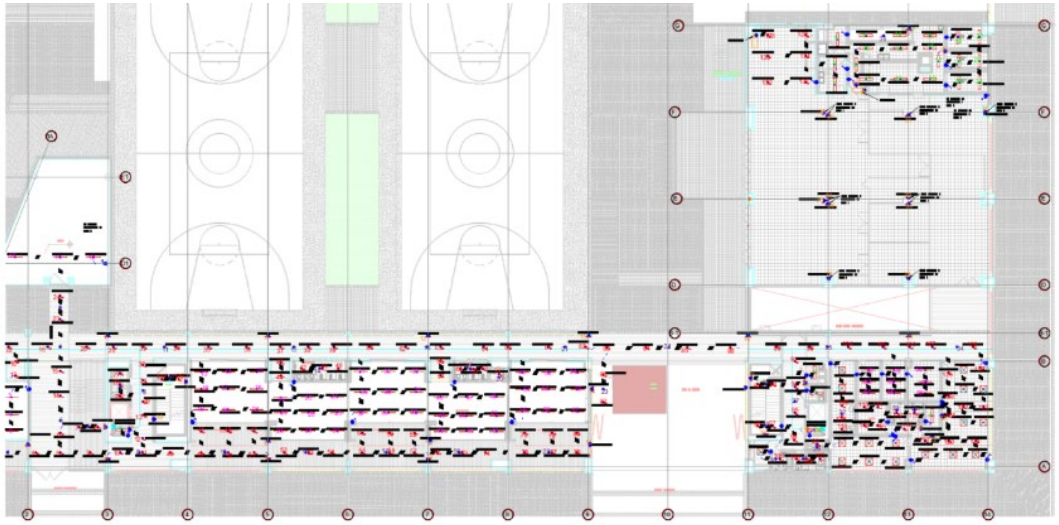PISO 1 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 4 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

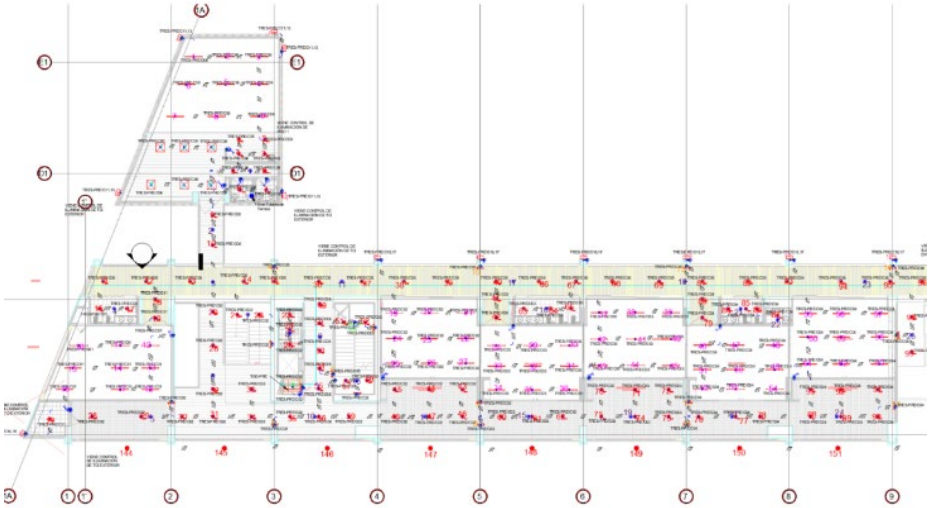PISO 2 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 4 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 5 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 2 EJE A-B 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

				FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ						
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 6 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 3 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 7 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 3 EJE A-G 9-14											CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS
	HOJA 7 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.5 Suministro de materiales e instalación de salida para reflector LED (200W) en tubería conduit EMT/PVC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
					-					-	
SALIDA Luminaria bala led 18w					-					-	
					-					-	
					-					-	
2do PISO				16,00	16,00				60,00%	9,60	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
						PAGADO ACTAS ANTERIORES					
									VIENE	-	
									TOTAL	9,60	
Observaciones	VER PLANOS ANEXOS										

HOJA 1 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

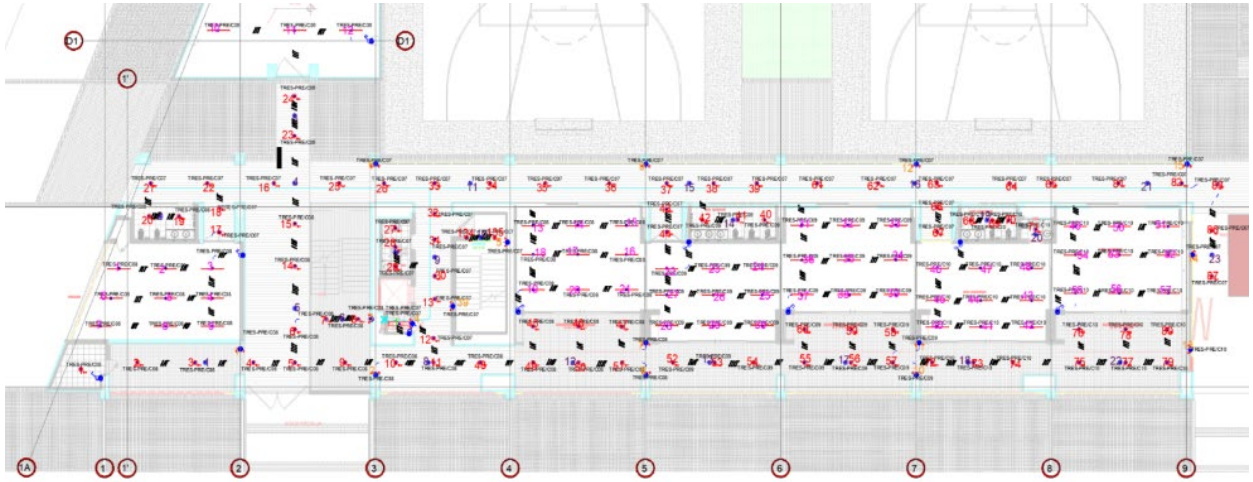PISO 1 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 3 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

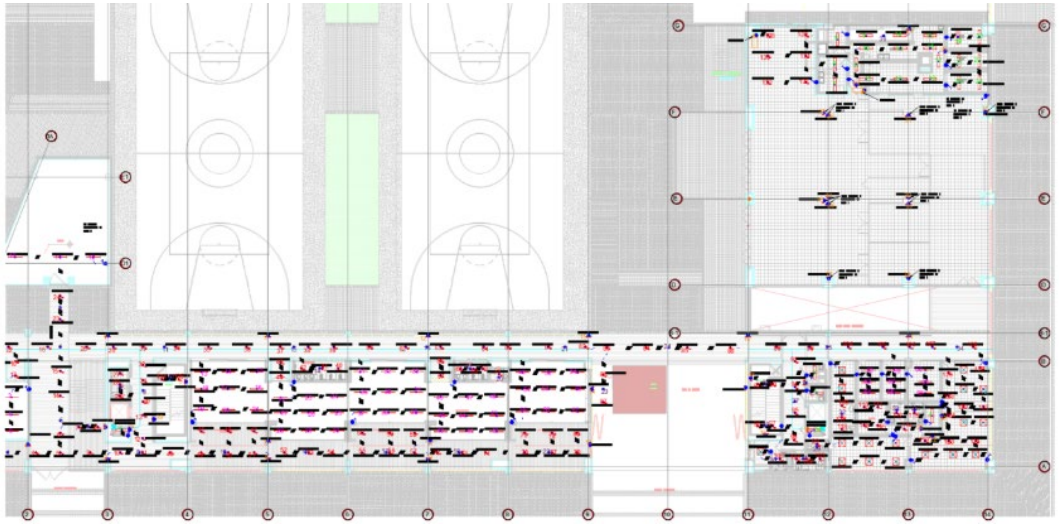PISO 1 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 4 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

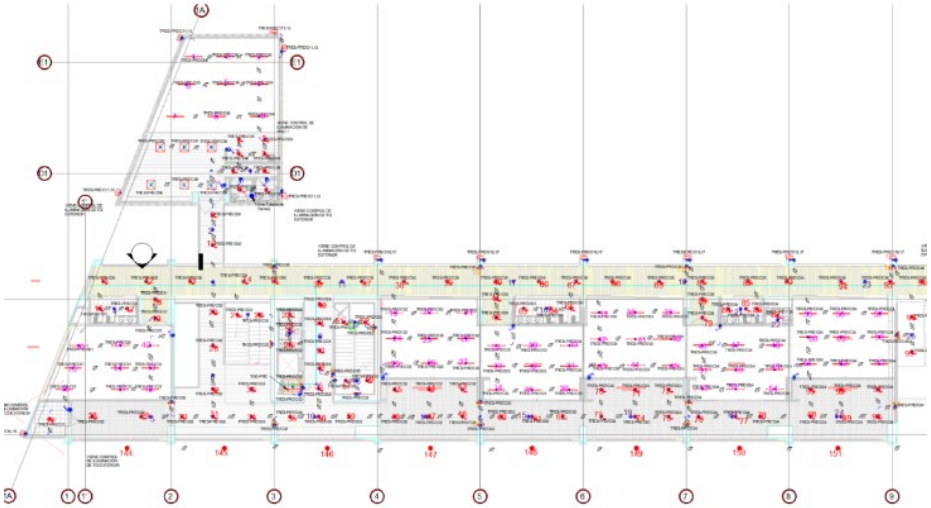PISO 2 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS
	HOJA 4 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 5 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 2 EJE A-B 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 5 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 6 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 3 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 7 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

PISO 3 EJE A-G 9-14

CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 7 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.6 Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro (40 W,80 W, campana 100w, aro 150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-					-
SALIDA Lampara hermetica					-					-
1ER PISO				25,00	25,00				90,00%	22,50
2do PISO				4,00	4,00				90,00%	3,60
3er PISO				4,00	4,00				90,00%	3,60
4to PISO				5,00	5,00				60,00%	3,00
Salida Luminaria lineal					-					-
1ER PISO				66,00	66,00				90,00%	59,40
2do PISO				104,00	104,00				90,00%	93,60
3er PISO				124,00	124,00				90,00%	111,60
4to PISO				141,00	141,00				60,00%	84,60
Salida Luminaria Panel 60x60 cm					-					-
1ER PISO				17,00	17,00				90,00%	15,30
2do PISO				6,00	6,00				90,00%	5,40
3er PISO					-					-
4to PISO				27,00	27,00				60,00%	16,20
Salida Luminaria lineal doble					-					-
2do PISO				10,00	10,00				60,00%	6,00
4to PISO				14,00	14,00				60,00%	8,40
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
						PAGADO ACTAS ANTERIORES			-	210,00
									VIENE	-
									TOTAL	223,20

FOTOS



Observaciones VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.6 Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro (40 W,80 W, campana 100w, aro 150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

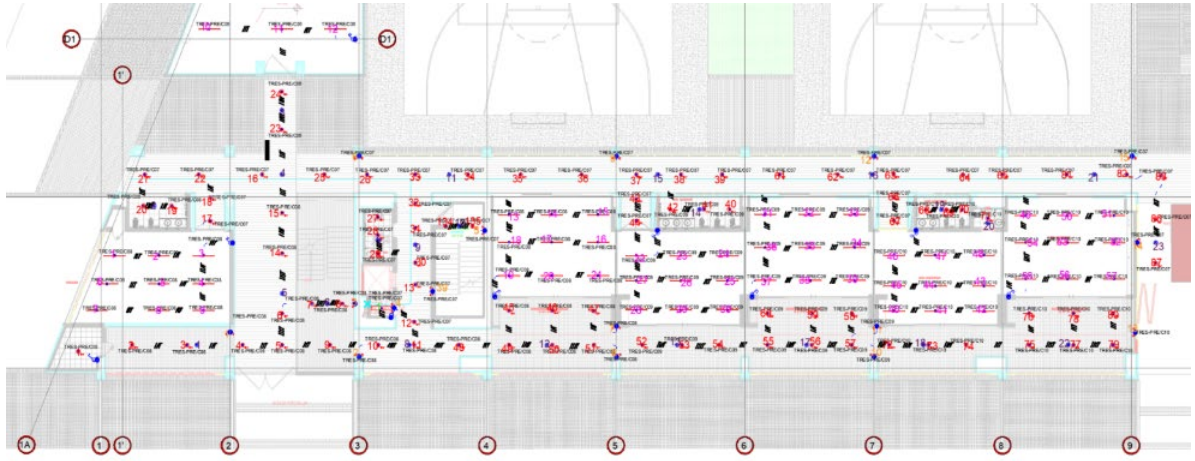PISO 1 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.6 Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro (40 W,80 W, campana 100w, aro 150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 3 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

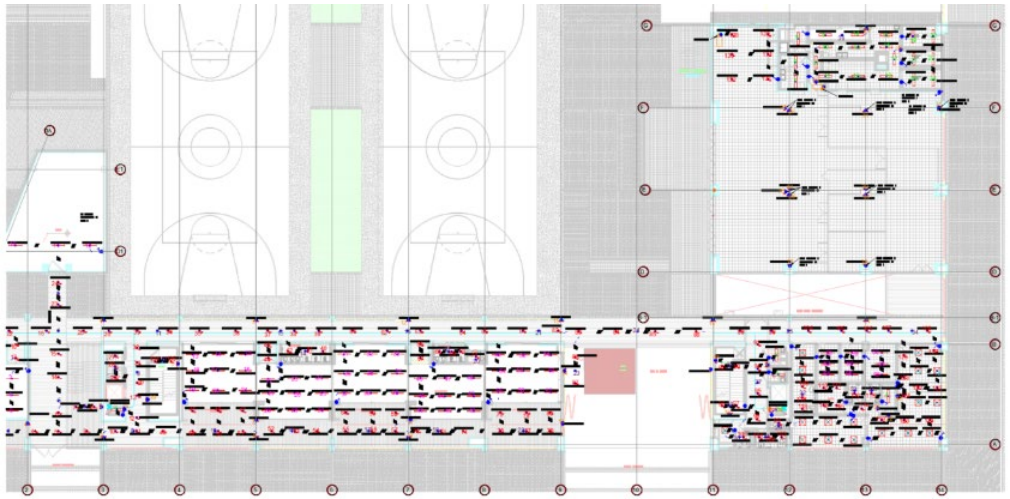PISO 1 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 3 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.6 Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro (40 W,80 W, campana 100w, aro 150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 4 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

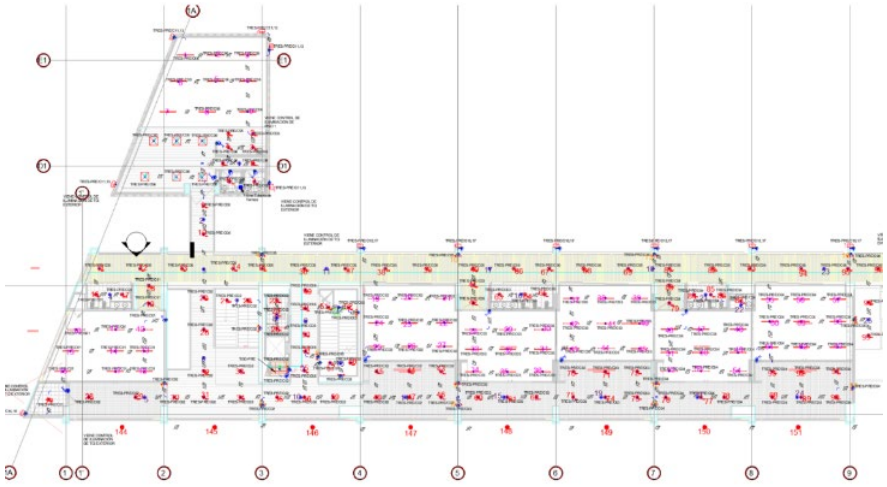PISO 2 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 4 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.6 Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro (40 W,80 W, campana 100w, aro 150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 5 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 2 EJE A-B 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.6 Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro (40 W,80 W, campana 100w, aro 150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 6 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 3 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.6 Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro (40 W,80 W, campana 100w, aro 150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 7 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

PISO 3 EJE A-G 9-14

CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 7 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED / Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas / Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL	REF.	CONTRACTUAL		
ÍTEM:	7.2.22 Suministro de materiales e instalación de salida para sensor de movimiento en techo en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye sensor con configuración día/noche y temporizador , cable Cu HFFR-LS No. 2x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 7

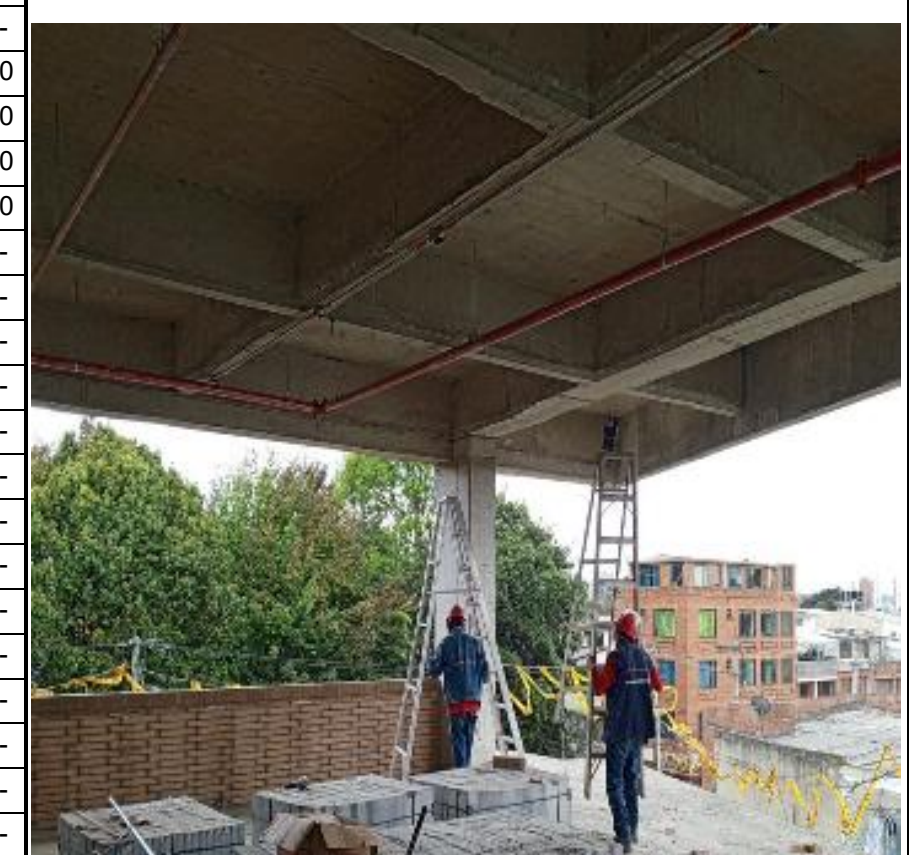ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
					-					-	
SALIDA Luminaria bala led 18w					-					-	
					-					-	
1ER PISO				36,00	36,00				50,00%	18,00	
2do PISO				39,00	39,00				50,00%	19,50	
3er PISO				28,00	28,00				50,00%	14,00	
4to PISO				28,00	28,00				50,00%	14,00	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
						Pagado actas anteriores				- 6,50	
									VIENE	-	
									TOTAL	59,00	
Observaciones	VER PLANOS ANEXOS										

HOJA 1 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

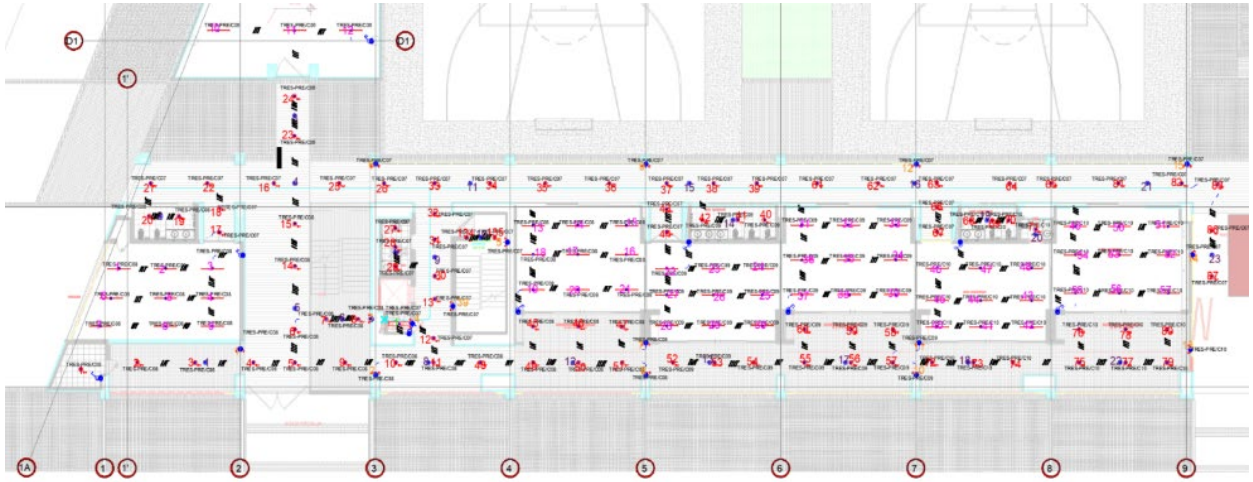PISO 1 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 3 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

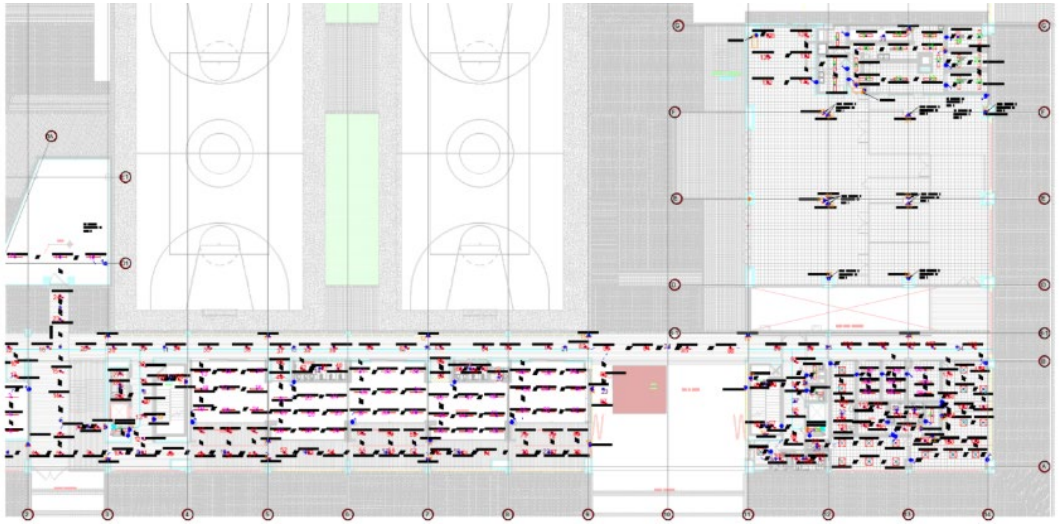PISO 1 EJE A-G 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 3 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 4 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

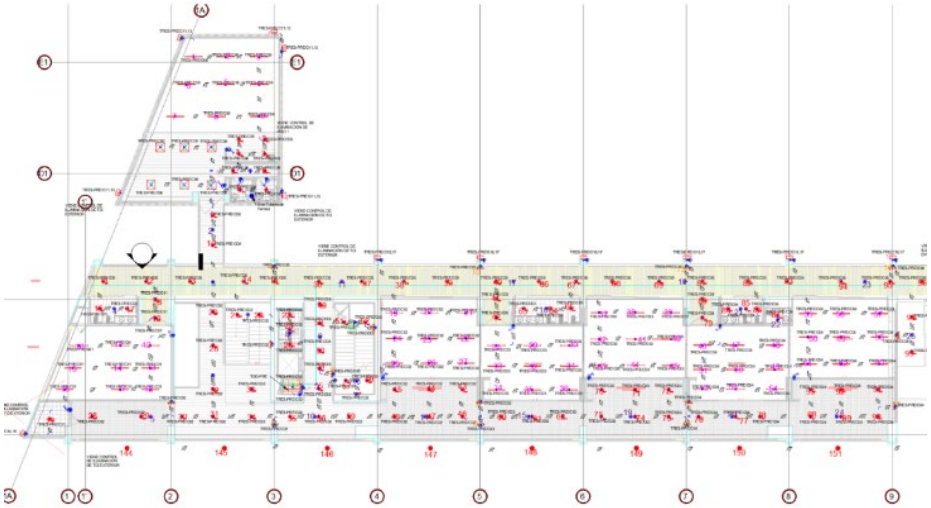PISO 2 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

				FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ						
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 5 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 2 EJE A-B 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS
	HOJA 5 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

				FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ						
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 6 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

PISO 3 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 6 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.2.3 Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	UND.	UN	REF.	HOJA 7 DE 7

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

PISO 3 EJE A-G 9-14

CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 7 DE 7

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ


INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.3.2 Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	UND.	ML	REF.	HOJA 1 DE 4

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS				TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
					-					-	
3er piso					-					-	
Eje B / 9-14	34,00			1,00	34,00					34,00	
4to piso					-					-	
Eje B / 2-13	81,86			1,00	81,86					81,86	
Eje 2 A-B	6,71			1,00	6,71					6,71	
	2,70			1,00	2,70					2,70	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
									VIENE	-	
									TOTAL	125,27	





Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 4

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.3.2 Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	UND.	ML	REF.	HOJA 2 DE 4

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

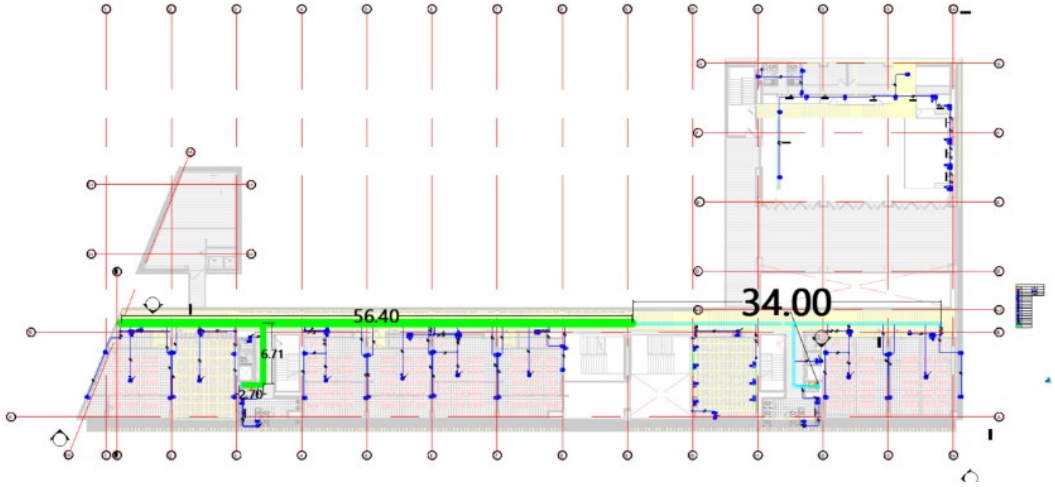PISO 3 Eje B / 9-14



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.3.2 Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	UND.	ML	REF.	HOJA 3 DE 4

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

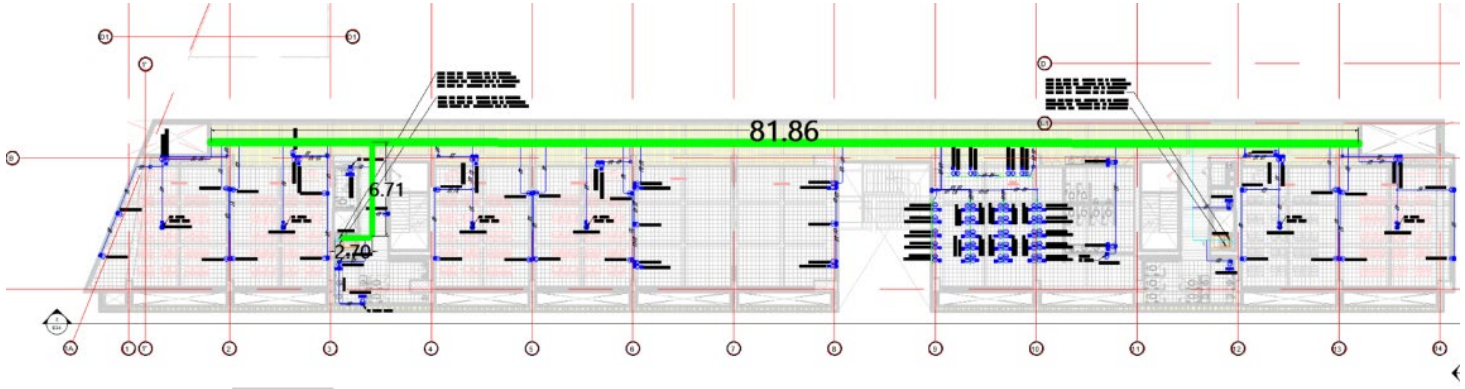PISO 4 EJE B 2-13



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 3 DE 4

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.3.2 Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	UND.	ML	REF.	HOJA 4 DE 4

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

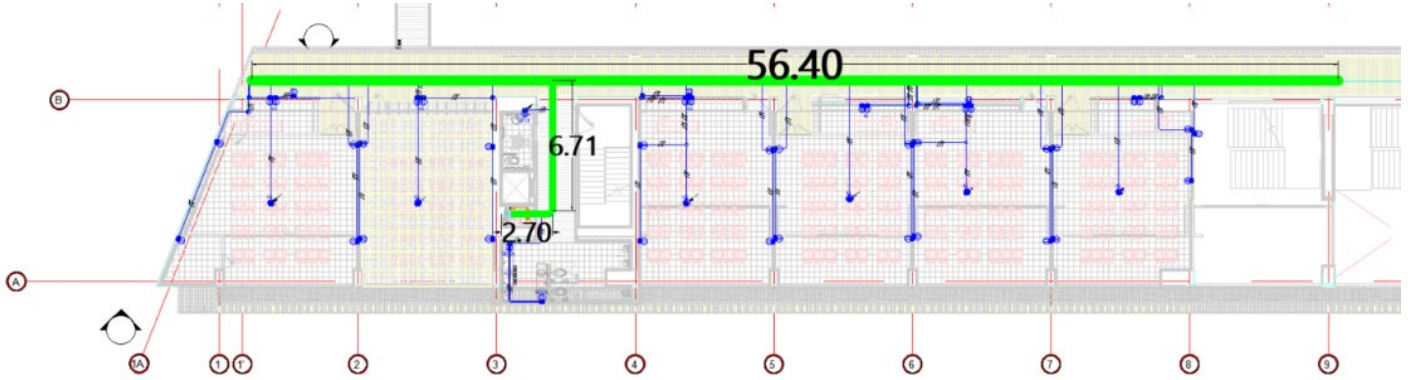PISO 3 EJE A-B 1-9



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 4 DE 4

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED / Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas / Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025


CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL	REF.	CONTRACTUAL

ÍTEM:	7.7.9 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRE según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-					-
					-					-
tablero trifásico TGD-PRE				1,00	1,00					1,00
2do piso					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									VIENE	-
									TOTAL	1,00

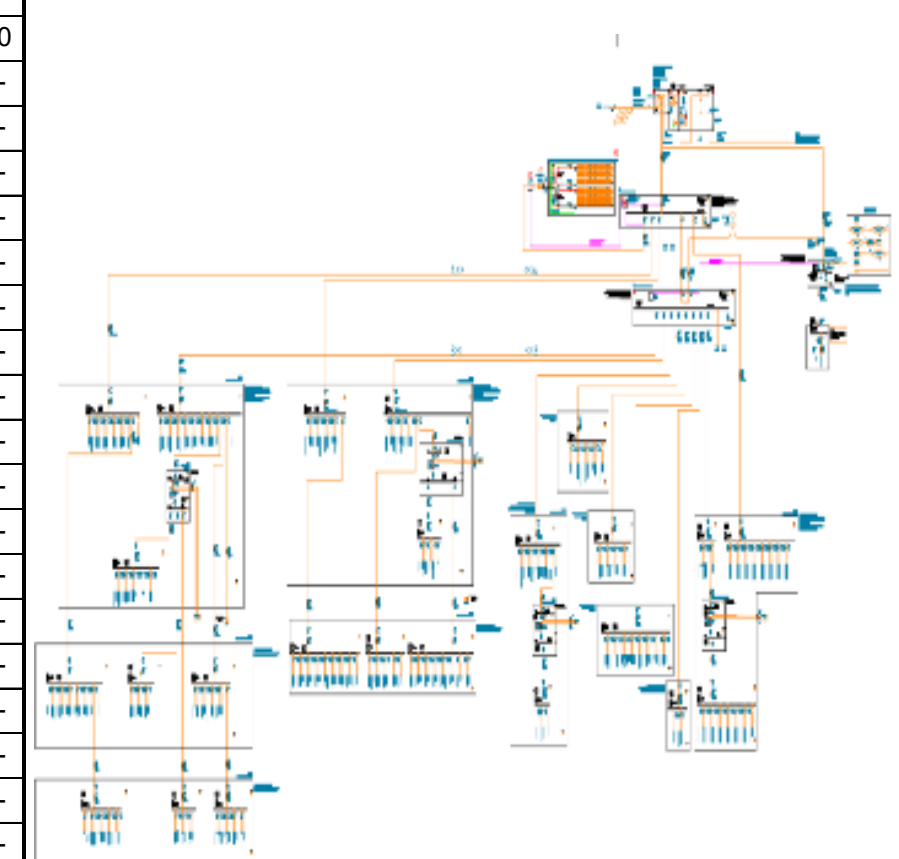FOTOS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.9 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRE según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

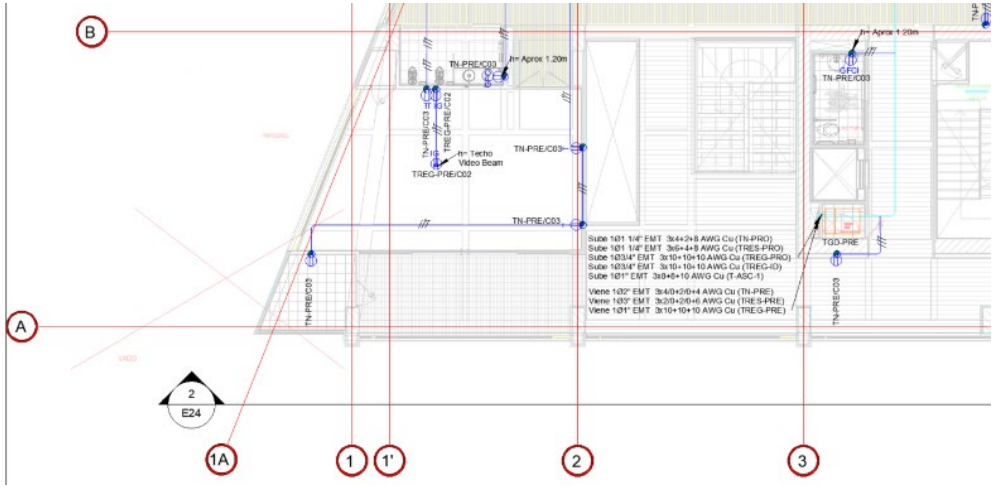CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED / Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas / Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.10 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRO según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-					-
					-					-
Tablero trifásico TGD-PRO				1,00	1,00					1,00
4to piso					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									VIENE	-
									TOTAL	1,00

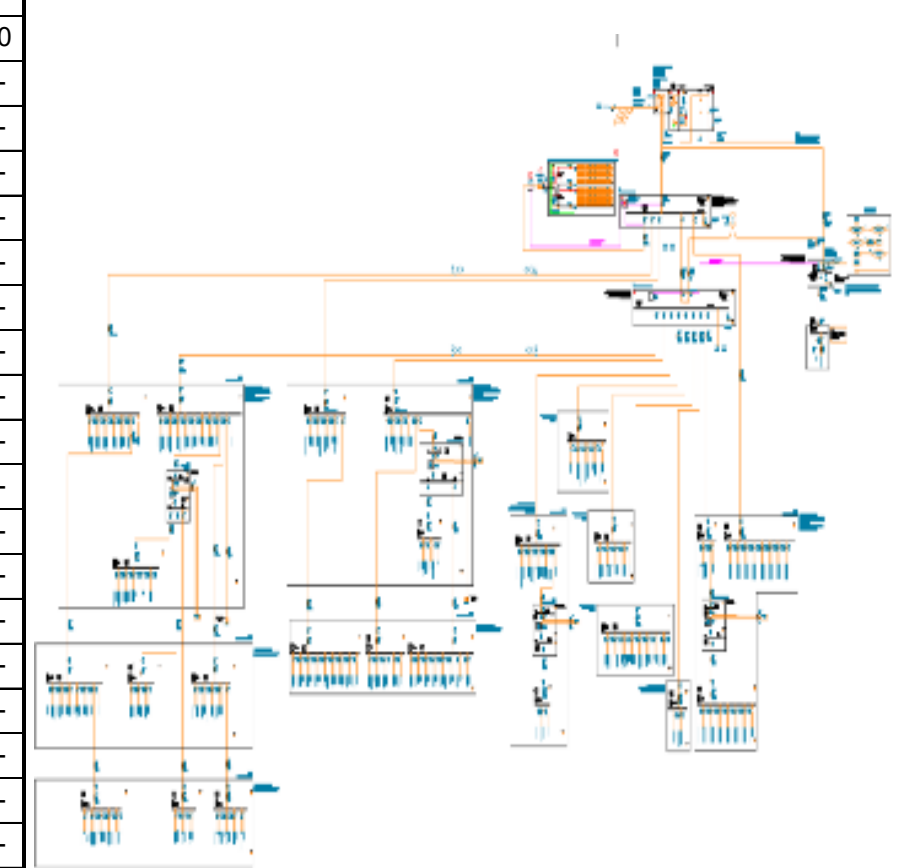FOTOS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C · Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.10 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRO según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

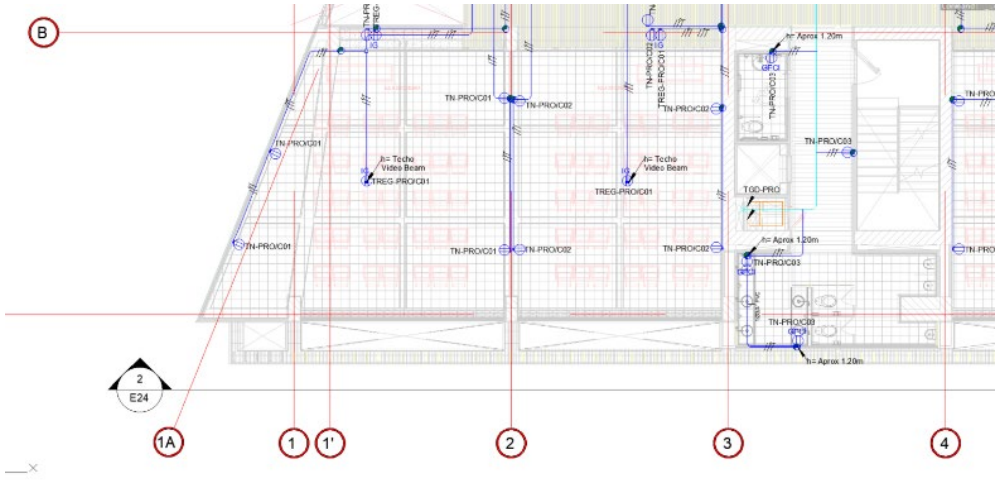CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025


CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.11 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-ID según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

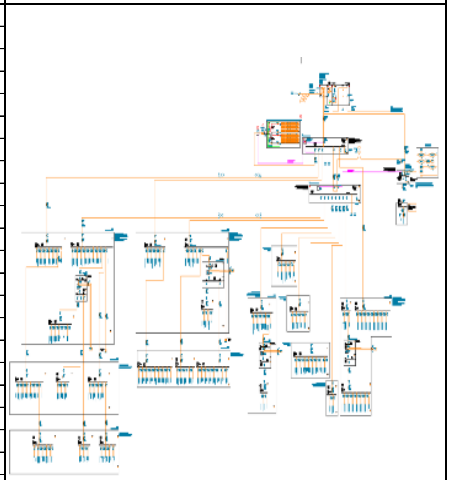ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
					-					-	
					-					-	
tablero trifásico TGD-ID				1,00	1,00					1,00	
6to piso					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
									VIENE	-	
									TOTAL	1,00	

Observaciones VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.11 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-ID según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

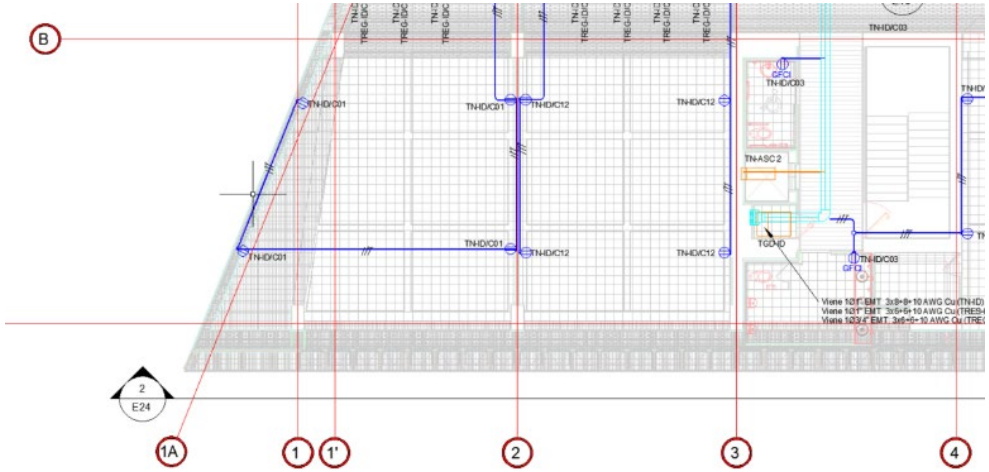CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"

CONSORCIO URBANOVA SED

Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas

Secretaría de Educación D.C
Sub Dirección de Plantas
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025


CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.12 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRI según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-					-
					-					-
tablero trifásico TGD-PRI				1,00	1,00					1,00
2do piso					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									VIENE	-
									TOTAL	1,00

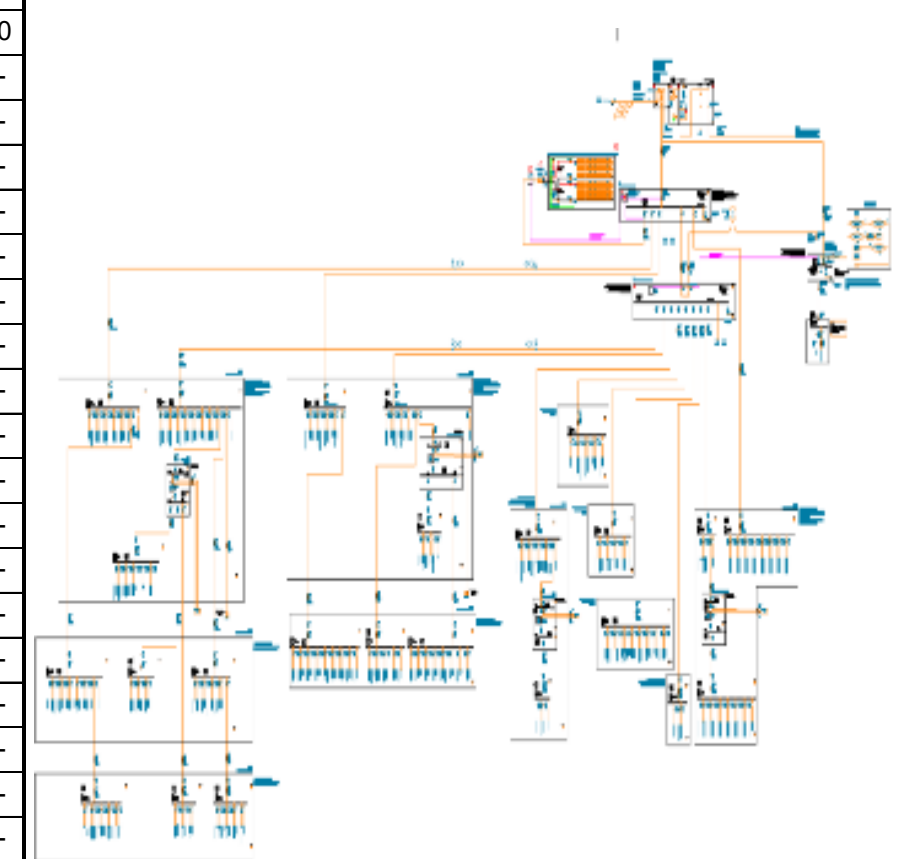FOTOS



Observaciones **VER PLANOS ANEXOS**

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.12 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRI según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

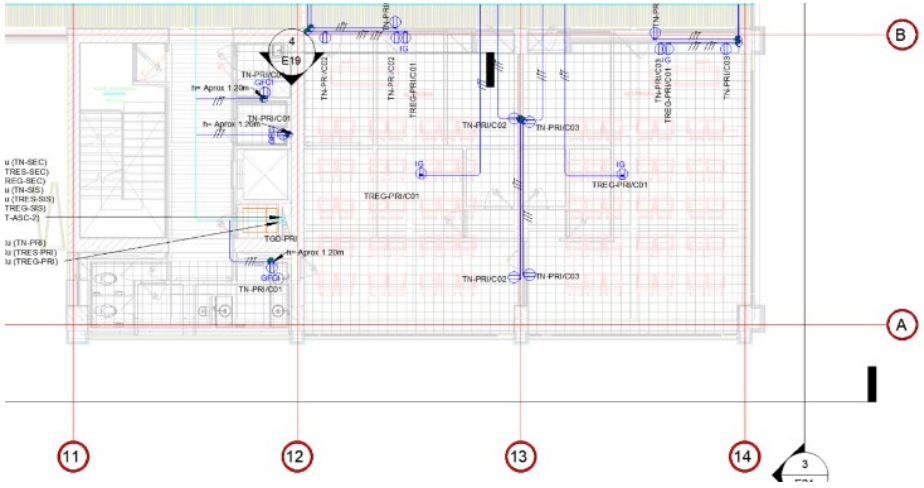CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO URBANOVA SED / Logia3 / Secretaría de Educación D.C – Sub Dirección de Plantas – ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ	COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"		ACTA NO 16	


FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.13 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SEC según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-					-
					-					-
trifásico TGD-SEC				1,00	1,00					1,00
4to piso					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									VIENE	-
									TOTAL	1,00

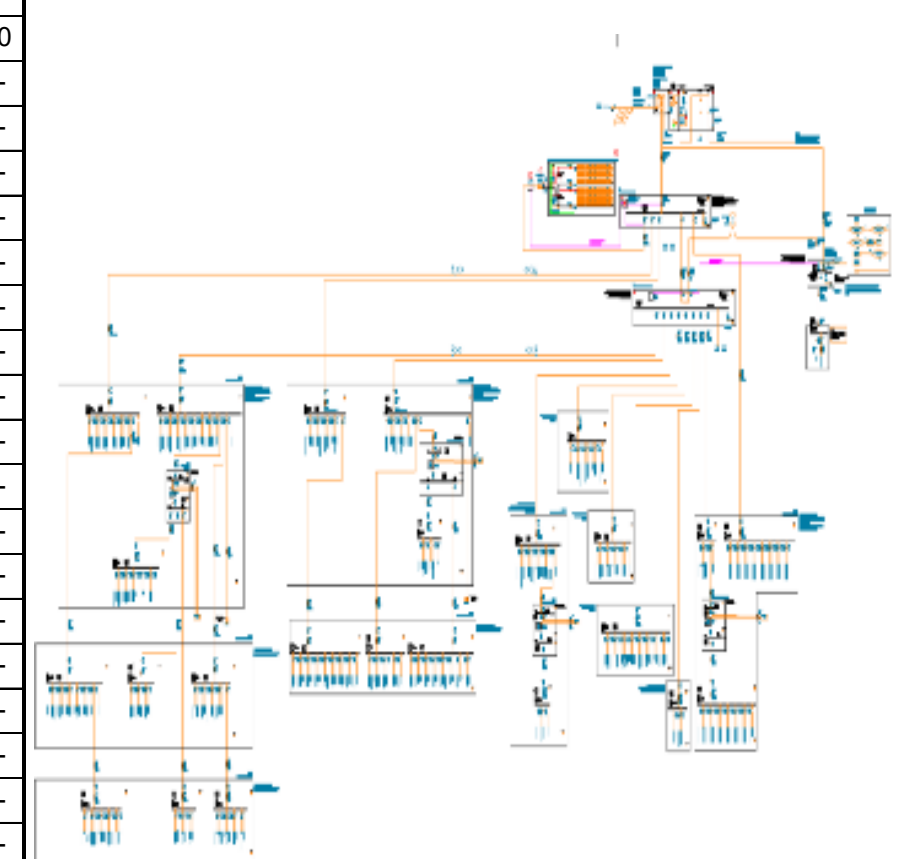FOTOS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.13 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SEC según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

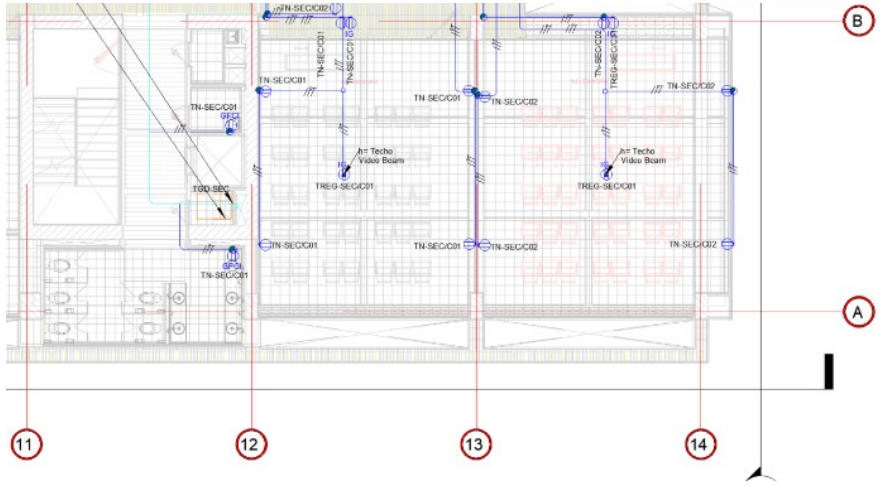CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C – Sub Dirección de Plantas – ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"		ACTA NO 16	


FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.14 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-AUD según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-					-
					-					-
TABLERO TGD-AUD				1,00	1,00					1,00
4to piso					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									VIENE	-
									TOTAL	1,00

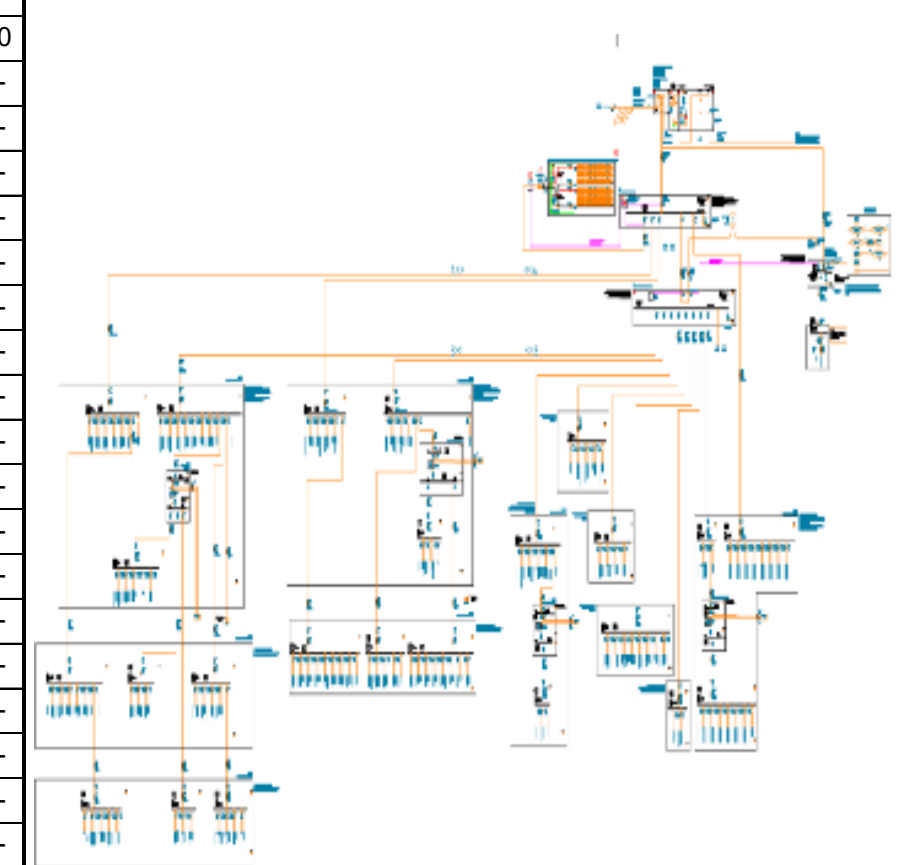FOTOS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 2

Director de obra Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos	Director Interventoría Ing. Luis Santiago Cely Báez
Residente de obra Ing. David Alberto Morales Sanchez	Residente interventoría Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.14 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-AUD según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

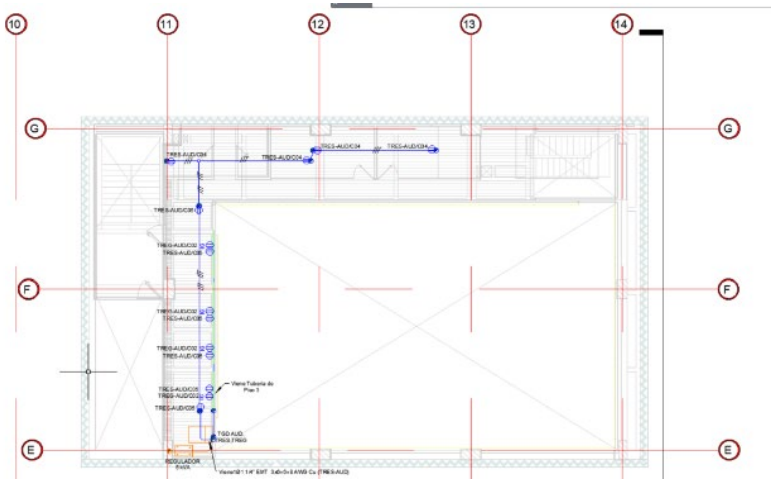CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez


Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED / Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas / Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL	REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.15 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SIS según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND. UN	REF. HOJA 1 DE 2

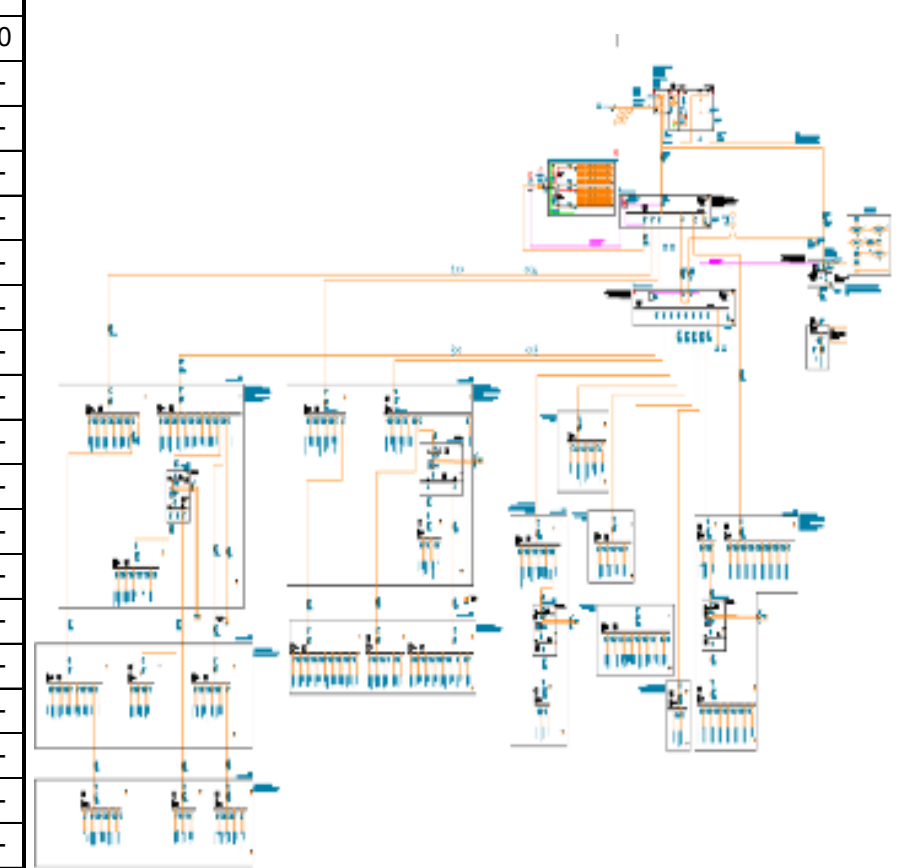ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL (kg)	VANOS L	a	h	% pagado con la presente acta	TOTAL	FOTOS
					-					-	
					-					-	
tablero trifásico TGD-SIS				1,00	1,00					1,00	
sexto piso					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
					-					-	
									VIENE	-	
									TOTAL	1,00	

Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.15 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SIS según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO URBANOVA SED / Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas / Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"		ACTA NO 16	


FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.16 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TRES-BOM según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, barraje y breakers.	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			% pagado con la presente acta	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-					-
					-					-
tablero trifásico TRES-BOM				1,00	1,00					1,00
Sotano					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
					-					-
									VIENE	-
									TOTAL	1,00

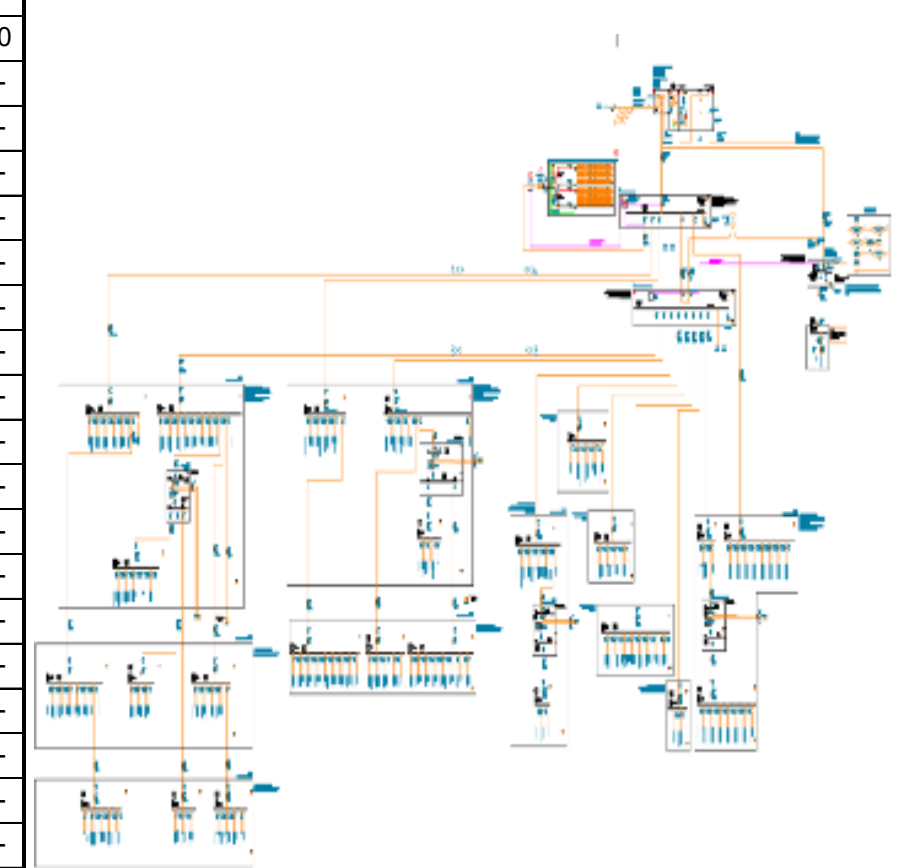FOTOS



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	7.7.16 Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TRES-BOM según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, barraje y breakers.	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

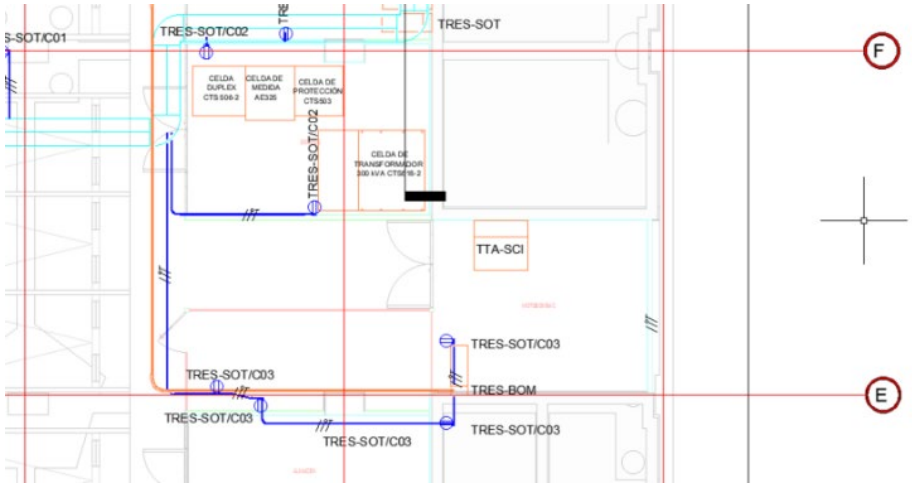SOTANO



Observaciones	VER PLANOS ANEXOS

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.4 B3 - Suministro e instalación de piso en Baldosa de grano terrazo 30x30cm color Gris tipo ROCA Ref: 132749- B02 gris grano Danta 1-2 pulida 30x30 o equivalente que cumpla la norma NTC 2849, uso institucional y trafico intenso con dilatación en varilla plástica de igual color, bidireccionalmente cada 1.80m y boquilla de 3mm correspondiente al mismo color de la baldosa. Pulida y brillada a máquina. + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente. Instalación y modulación según detalle especifico de pisos.	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 10

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	% A PAGAR PRESENTE ACTA	TOTAL
NIVEL 1 COCINA					-					
AREA 1´	1,00	0,40		1,00	0,40				80,00%	0,32
AREA 1	1,90	0,92		1,00	1,75				80,00%	1,40
AREA 2	3,27	2,52		1,00	8,24				80,00%	6,59
AREA 3	1,46	0,99		1,00	1,45				80,00%	1,16
AREA 4	6,01	0,86		1,00	5,17				80,00%	4,14
AREA 5	4,03	0,60		1,00	2,42				80,00%	1,94
AREA 6	2,74	1,02		1,00	2,79				80,00%	2,23
AREA 7	4,86	2,61		1,00	12,68				80,00%	10,14
AREA 8	2,17	2,01		1,00	4,36				80,00%	3,49
AREA 9	1,16	1,11		1,00	1,29				80,00%	1,03
AREA 10	2,85	2,52		1,00	7,18				80,00%	5,74
AREA 11	3,82	1,25		1,00	4,78				80,00%	3,82
AREA 12	3,81	0,80		1,00	3,05				80,00%	2,44
Area Administracion nivel 1										-
primeros auxilios- Area 1	3,68	2,25		1,00	8,28				80,00%	6,62
BAÑO-PRIMEROS AUX	2,87	2,22		1,00	6,37				80,00%	5,10
monitoreo	1,67	1,68		1,00	2,81				80,00%	2,25
Medios educativos	4,41	3,65		1,00	16,10				80,00%	12,88
Medios educativos- areas monitoreo	1,67	1,68		-1,00	-2,81				80,00%	- 2,25
Emisora	3,64	2,97		1,00	10,81				80,00%	8,65
administracion-area 1	9,50	4,25		1,00	40,38				80,00%	32,30
administracion-area 2	9,97	2,75		1,00	27,42				80,00%	21,94
Archivo	7,50	2,87		1,00	21,53				80,00%	17,22
Archivo- area baños archivo	3,39	1,98		1,00	6,71				80,00%	5,37
Baños archivo	1,40	1,75		2,00	4,90				80,00%	3,92
								PASA		158,45

FOTOS





Observaciones	Se realiza pago del 80% considerando el avance de la actividad la cual se compone de suministro, instalacion y emboquillado, DESTRONQUE, pendiente actividades de destronque, pulida y brillo final para entrega final.

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED — Logia 3 — Secretaria de Educación D.C, Sub Dirección de Plantas, ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED — **CONTRATO OBRA No.** CO1.PCCNTR.5698312

DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.4 B3 - Suministro e instalación de piso en Baldosa de grano terrazo 30x30cm color Gris tipo ROCA Ref: 132749- B02 gris grano Danta 1-2 pulida 30x30 o equivalente que cumpla la norma NTC 2849, uso institucional y trafico intenso con dilatación en varilla plástica de igual color, bidireccionalmente cada 1.80m y boquilla de 3mm correspondiente al mismo color de la baldosa. Pulida y brillada a máquina. + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente. Instalación y modulación según detalle especifico de pisos.	UND.	M2	REF.	HOJA 2 DE 10

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			% A PAGAR PRESENTE ACTA	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
NIVEL 1 - BAÑOS										
Baño Preescolar 3 - Eje B /1-2	3,02	1,62		1,00	4,89				80,00%	3,91
Baño Preescolar 2 - Eje B / 5-6	4,34	1,56		1,00	6,77				80,00%	5,42
A- Baño Preescolar 1 - Eje B / 7-8	2,78	1,55		1,00	4,31				80,00%	3,45
B- Baño Preescolar 1 - Eje B / 7-8	1,81	1,30		1,00	2,35				80,00%	1,88
BAÑOS NIVEL 2										-
Baño Preescolar 1 - Eje B /1-2	3,08	1,56		1,00	4,80				80,00%	3,84
DEPOSITO LUDOTECA Eje A /1	2,31	2,28		1,00	5,27				80,00%	4,22
Baño Preescolar 2 - Eje B / 5-6	4,34	1,56		1,00	6,77				80,00%	5,42
Baño Preescolar 3 - Eje B / 7-8	1,57	2,78		1,00	4,36				80,00%	3,49
nivel 3										
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 1-2	8,89	3,30		0,50	14,67				80,00%	11,74
	8,89	1,01		1,00	8,98				80,00%	7,18
	9,19	5,59		1,00	51,37				80,00%	41,10
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 1-2	8,87	6,97		1,00	61,82				80,00%	49,46
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 2-3	8,87	6,76		1,00	59,96				80,00%	47,97
	5,53	0,66		1,00	3,65				80,00%	2,92
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 4-5	8,87	6,68		1,00	59,25				80,00%	47,40
	5,48	0,66		1,00	3,62				80,00%	2,90
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 5-6	8,87	6,68		1,00	59,25				80,00%	47,40
	5,48	0,66		1,00	3,62				80,00%	2,90
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 6-7	8,87	6,68		1,00	59,25				80,00%	47,40
									PAGADO ACTAS ANTERIORES	
									VIENE	158,45
									PASA	339,97

FOTOS





Observaciones	Se realiza pago del 80% considerando el avance de la actividad la cual se compone de suministro, instalacion y emboquillado, DESTRONQUE, pendiente actividades de destronque, pulida y brillo final para entrega final.

HOJA 2 DE 10

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED — **CONTRATO OBRA No.** CO1.PCCNTR.5698312

DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.4 B3 - Suministro e instalación de piso en Baldosa de grano terrazo 30x30cm color Gris tipo ROCA Ref: 132749- B02 gris grano Danta 1-2 pulida 30x30 o equivalente que cumpla la norma NTC 2849, uso institucional y trafico intenso con dilatación en varilla plástica de igual color, bidireccionalmente cada 1.80m y boquilla de 3mm correspondiente al mismo color de la baldosa. Pulida y brillada a máquina. + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente. Instalación y modulación según detalle especifico de pisos.	UND.	M2	REF.	HOJA 3 DE 10

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	% A PAGAR PRESENTE ACTA	TOTAL
2do piso										-
Ambiente pedagogico 1-5 Eje A-B / 12-13				64,57	64,57				60,00%	38,74
Ambiente pedagogico 1-5 Eje A-B / 13-14				68,63	68,63				60,00%	41,18
3er piso					-					-
Ambiente esp. lab. Ciencia Eje A-B / 10-11				66,16	66,16				60,00%	39,70
Ambiente pedagogico 6-9 Eje A-B / 12-13				62,88	62,88				60,00%	37,73
Ambiente pedagogico 6-9 Eje A-B / 13-14				69,77	69,77				60,00%	41,86
nivel 4					-					
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 1-2	8,89	3,30		0,50	14,67				60,00%	8,80
	8,89	1,01		1,00	8,98				60,00%	5,39
	9,19	5,59		1,00	51,37				60,00%	30,82
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 1-2	8,87	6,97		1,00	61,82				60,00%	37,09
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 2-3	8,87	6,76		1,00	59,96				60,00%	35,98
	5,53	0,66		1,00	3,65				60,00%	2,19
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 4-5	8,87	6,68		1,00	59,25				60,00%	35,55
	5,48	0,66		1,00	3,62				60,00%	2,17
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 5-6	8,87	6,68		1,00	59,25				60,00%	35,55
	5,48	0,66		1,00	3,62				60,00%	
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 6-7	8,87	6,68		1,00	59,25				60,00%	35,55
										-
COMEDOR 1ER PISO				403,90	403,90				60,00%	242,34
										-
								PAGADO ACTAS ANTERIORES		- 373,81
								VIENE		339,97
								TOTAL		636,80

FOTOS





Observaciones	Se realiza pago del 80% considerando el avance de la actividad la cual se compone de suministro, instalacion y en destronque, pulida y brillo final para entrega final.

HOJA 3 DE 10

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


				FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ						
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	11 ACABADOS				REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	11.1.11 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m.		UND.	M2	REF.	HOJA 4 DE 10

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			TOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

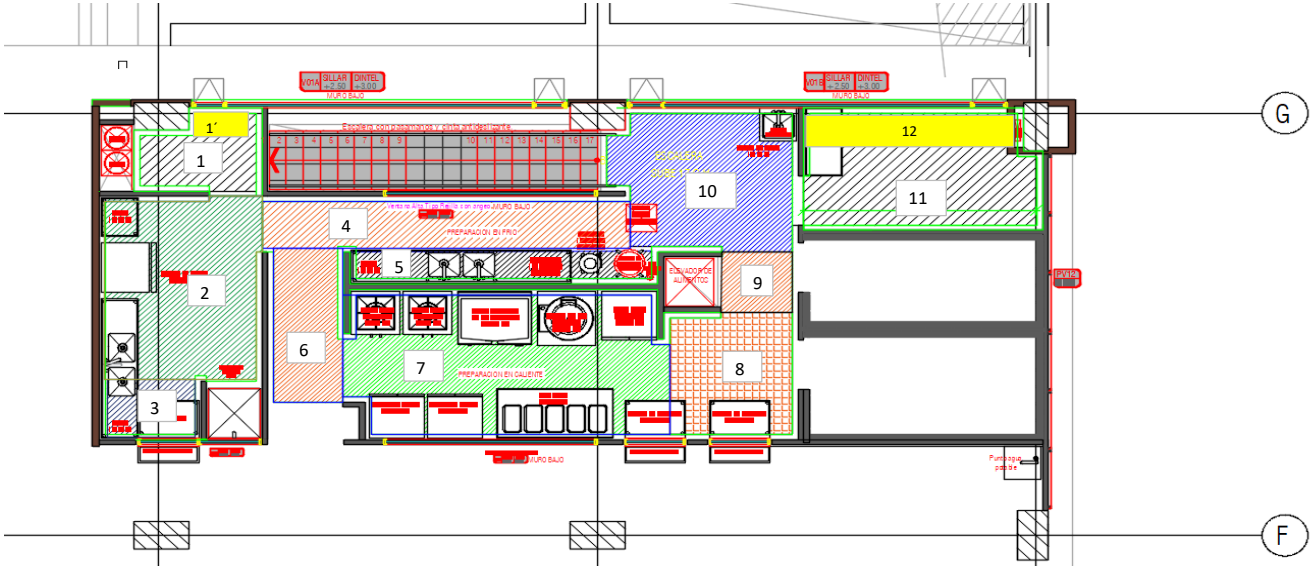1ER PISO - ZONA AULAS
BAÑOS PREESCOLAR



Observaciones	

HOJA 4 DE 10

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	11.1.11 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m.	UND.	M2	REF.	HOJA 5 DE 10

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			TOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

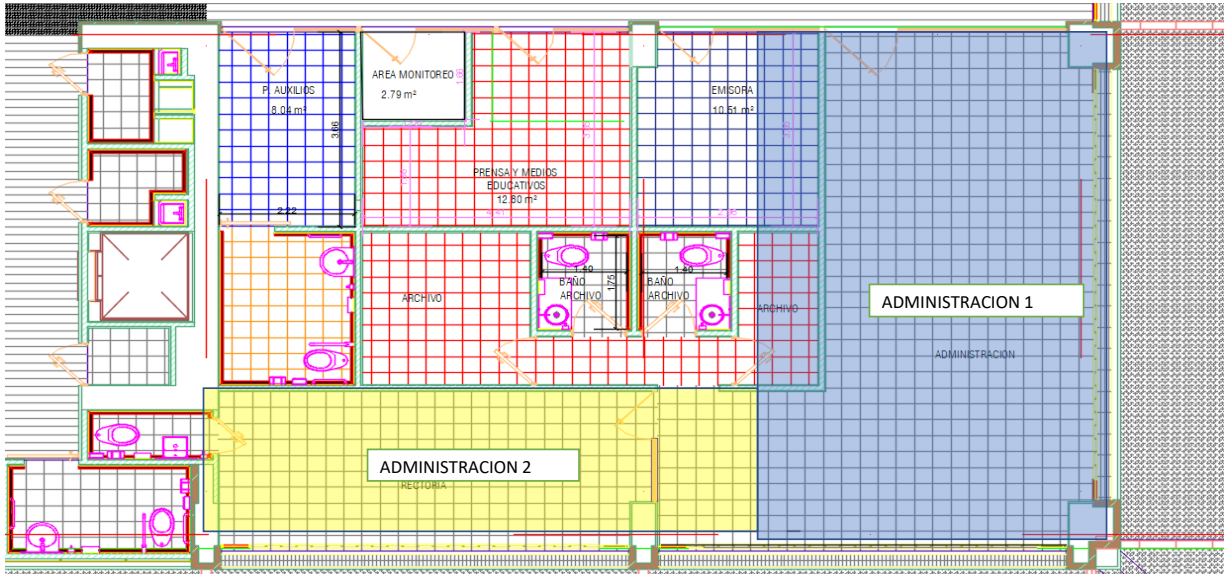1ER PISO - ZONA ADMINISTRATIVA
EJES 12-14 / A-B



Observaciones	

HOJA 5 DE 10

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OB+174:217RA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	11.1.11 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m.	UND.	M2	REF.	HOJA 6 DE 10


ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			TOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

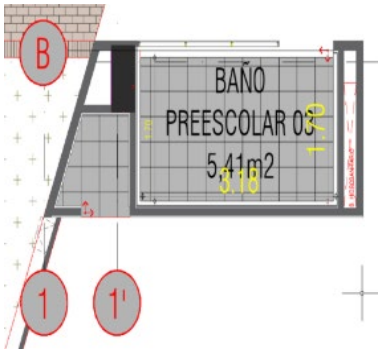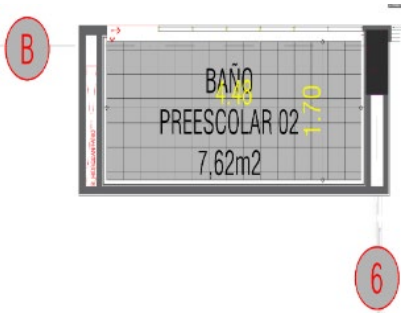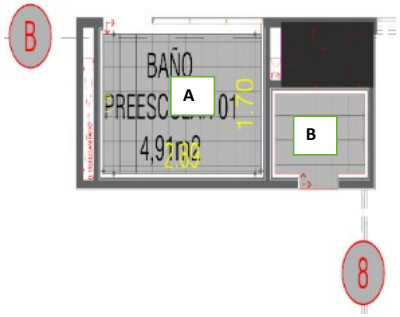NIVEL 1 - ZONA PREESCOLAR - EJE 1-8







Observaciones	

HOJA 6 DE 10

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OB+174:217RA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORÍA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312


CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	11.1.11 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m.	UND.	M2	REF.	HOJA 7 DE 10


ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			TOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

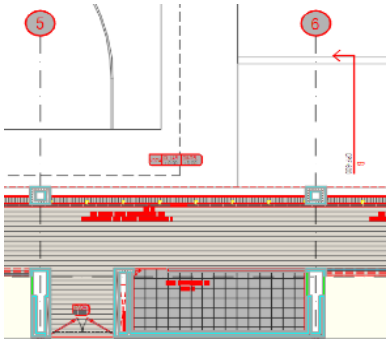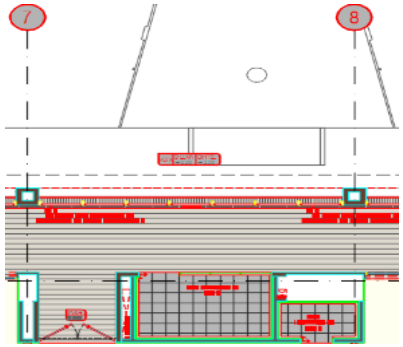NIVEL 2 - BAÑOS ZONA PREESCOLAR - EJE 1-8







Observaciones	

HOJA 7 DE 10

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OB+174:217RA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	11.1.11 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m.	UND.	M2	REF.	HOJA 8 DE 10


ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			TOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

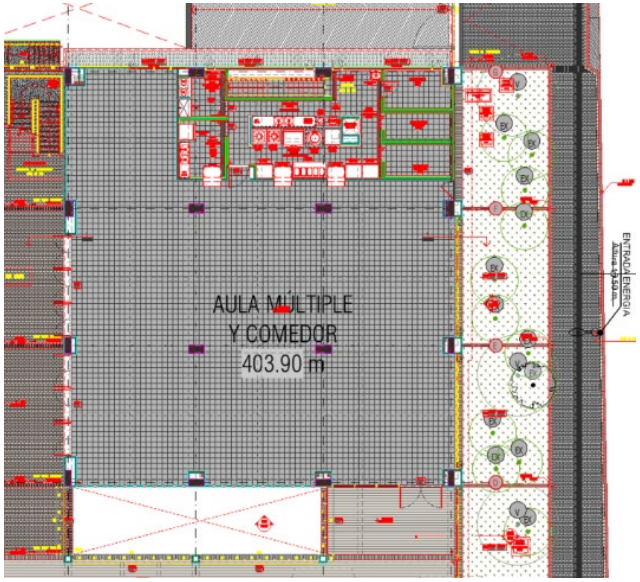NIVEL 1 - COMEDOR 1ER PISO



NIVEL 2 - AULAS

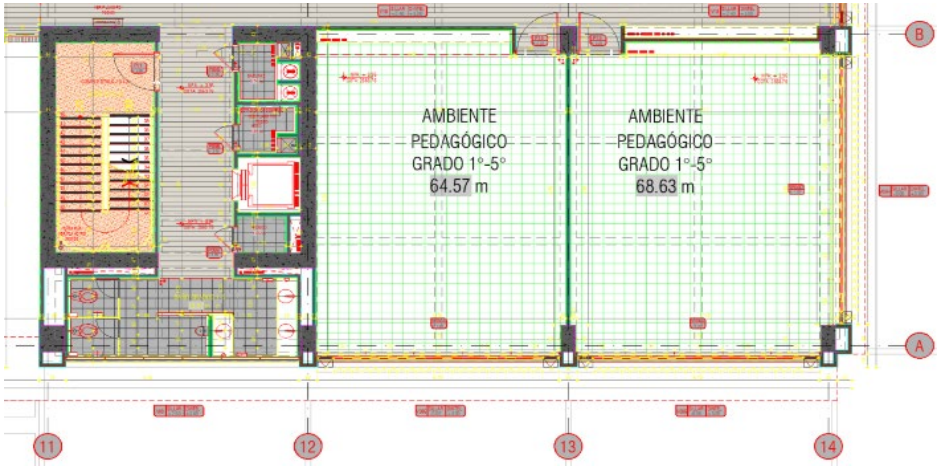

Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OB+174:217RA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	11.1.11 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m.	UND.	M2	REF.	HOJA 9 DE 10

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			TOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

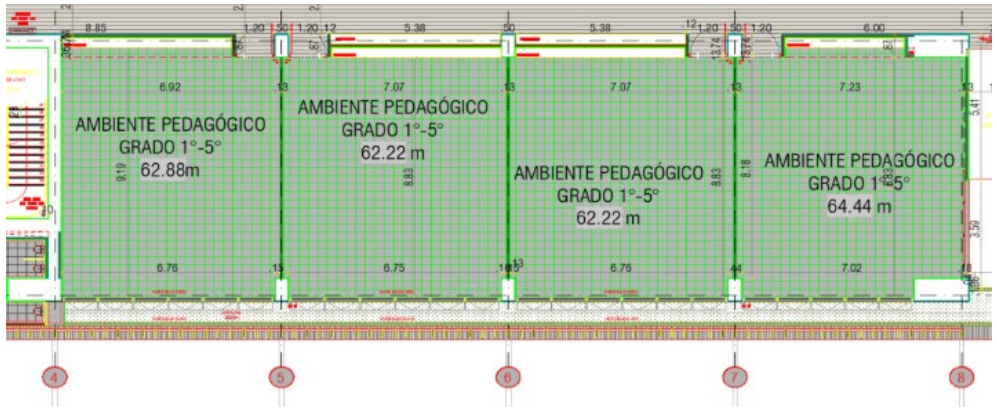NIVEL 3 y 4 - AULAS - EJE 1-8





Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OB+174:217RA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	11.1.11 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m.	UND.	M2	REF.	HOJA 10 DE 10

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			TOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

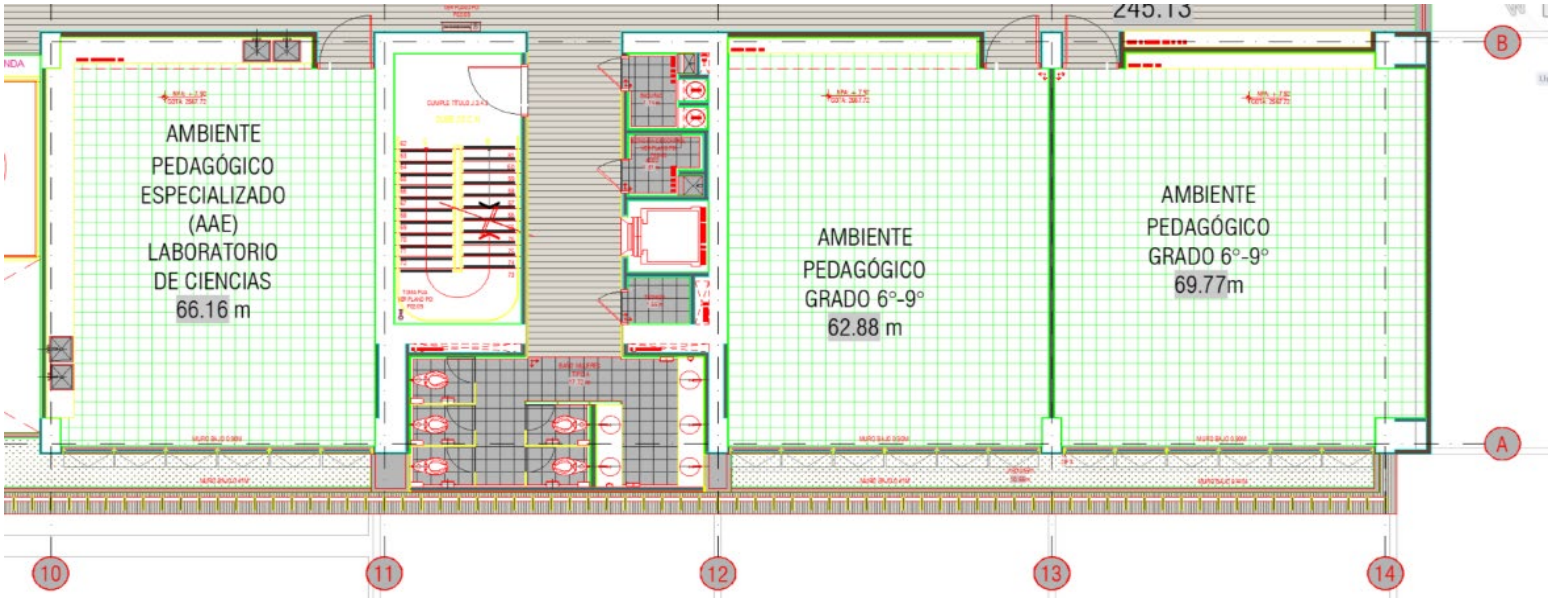NIVEL 3 - AULAS - EJE 10-14



Observaciones	

HOJA 10 DE 10

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED — **CONTRATO OBRA No.** CO1.PCCNTR.5698312

DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.6 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5MPa, e=0.04m.	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 4

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			SUBTOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
2do piso											
Ambiente pedagogico 1-5 Eje A-B / 12-13				64,57	64,57					64,57	
Ambiente pedagogico 1-5 Eje A-B / 13-14				68,63	68,63					68,63	
3er piso					-					-	
Ambiente esp. lab. Ciencia Eje A-B / 10-11				66,16	66,16					66,16	
Ambiente pedagogico 6-9 Eje A-B / 12-13				62,88	62,88					62,88	
Ambiente pedagogico 6-9 Eje A-B / 13-14				69,77	69,77					69,77	
nivel 4					-					-	
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 1-2	8,89	3,30		0,50	14,67					14,67	
	8,88	1,00		1,00	8,88					8,88	
	9,19	5,59		1,00	51,37					51,37	
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 1-2	8,87	6,97		1,00	61,82					61,82	
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 2-3	8,87	6,76		1,00	59,96					59,96	
	5,53	0,66		1,00	3,65					3,65	
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 4-5	8,87	6,68		1,00	59,25					59,25	
	5,48	0,66		1,00	3,62					3,62	
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 5-6	8,87	6,68		1,00	59,25					59,25	
	5,48	0,66		1,00	3,62					3,62	
Amb. pedagogico Grado 1-5 Eje A-B / 6-7	8,87	6,68		1,00	59,25					59,25	
										-	
COMEDOR 1ER PISO				403,90	403,90					403,90	
										-	
								PAGADO ACTAS ANTERIORES			
								VIENE			
								TOTAL		1.121,25	





Observaciones	

HOJA 1 DE 4

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OB+174:217RA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


			FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025	
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.6 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5MPa, e=0.04m.	UND.	M2	REF.	HOJA 2 DE 4


ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			TOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

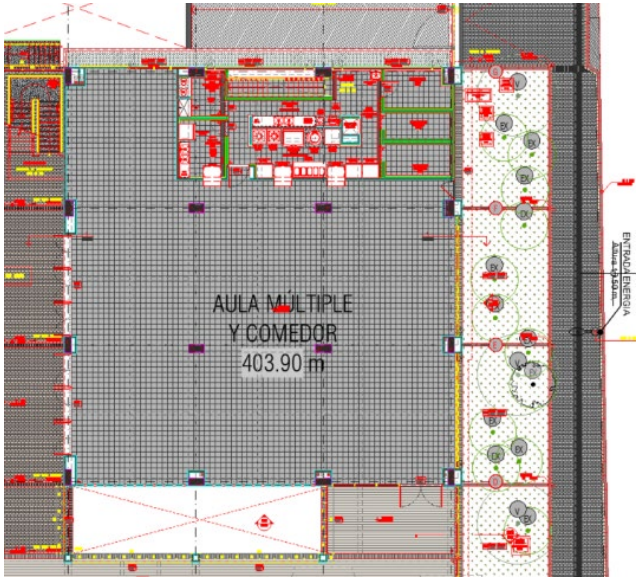NIVEL 1 - COMEDOR 1ER PISO



NIVEL 2 - AULAS

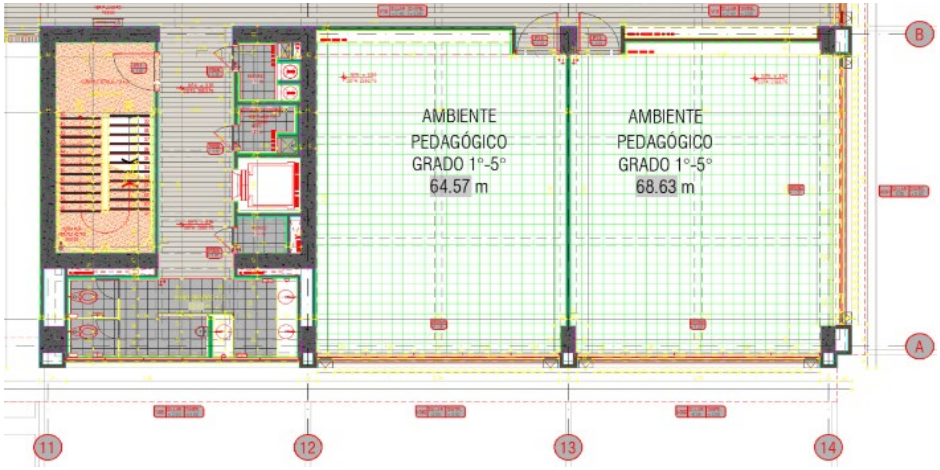

Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OB+174:217RA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORÍA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312


CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	11.1.6 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5MPa, e=0.04m.	UND.	M2	REF.	HOJA 3 DE 4

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			TOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

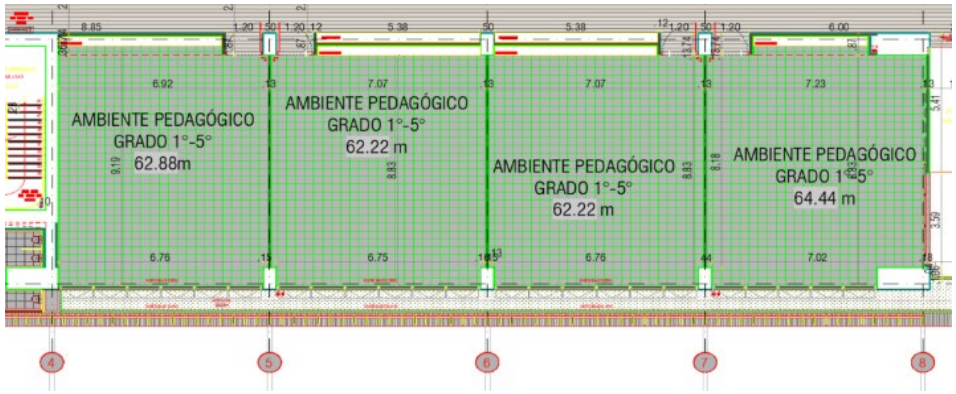NIVEL 3 y 4 - AULAS - EJE 1-8





Observaciones	

HOJA 3 DE 4

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OB+174:217RA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


				FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED			CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ						
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	11 ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	11.1.6 Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5MPa, e=0.04m.	UND.	M2	REF.	HOJA 4 DE 4

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			TOTAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

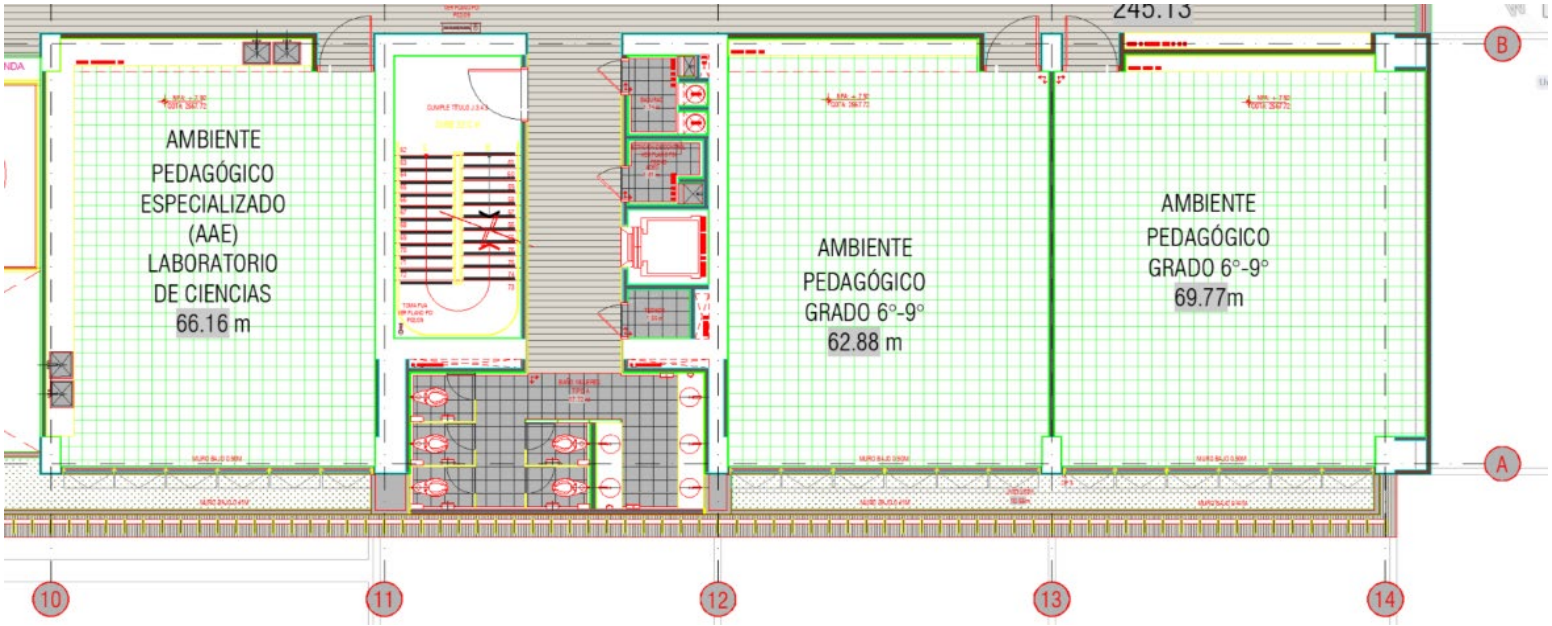NIVEL 3 - AULAS - EJE 10-14



Observaciones	

HOJA 4 DE 4

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	11. ACABADOS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	**11.3.2 C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo.**	UND. ML	REF.	HOJA 1 DE 7

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4	**Hilada parada**					-				-	-
EJE A /1-2	L3		6,80		1,00	6,80				-	6,80
EJE A /3-4	L4		6,80		1,00	6,80				-	6,80
PISO 3	**Hilada parada**					-				-	-
EJE B / 8-10	L37		17,74		2,00	35,48				-	35,48
EJE A / 10-11	L10		6,70		1,00	6,70				-	6,70
EJE A / 12-13	L11		6,80		1,00	6,80				-	6,80
EJE A / 13-14	L12		6,80		1,00	6,80				-	6,80
PISO 2	**Hilada parada**					-				-	-
EJE A / 12-13	L11		6,80		1,00	6,80				-	6,80
EJE A / 13-14	L12		6,80		1,00	6,80				-	6,80
						-				-	-
						-				-	-
						-					-
						-				-	-
						-					-
						-				-	-
						-				-	-
						-					-
						-					-
						-					-
						-					-
						-				-	-
						-				-	-
						-					-
						-				-	-
						-				-	-
						-					-
						-					-
						-					-
						-					-
						-					-
						-					-
						-					-
						-					-
						-				-	-
										PASA	**82,98**

FOTOS







Observaciones	

HOJA 1 DE 7

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312			
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS					


CAPITULO	11. ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	11.3.2 C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo.	UND.	ML	REF.	HOJA 2 DE 7

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

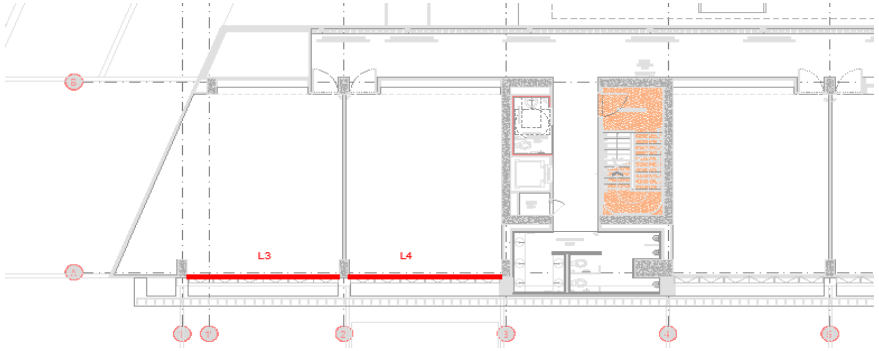PISO 4




PISO 3

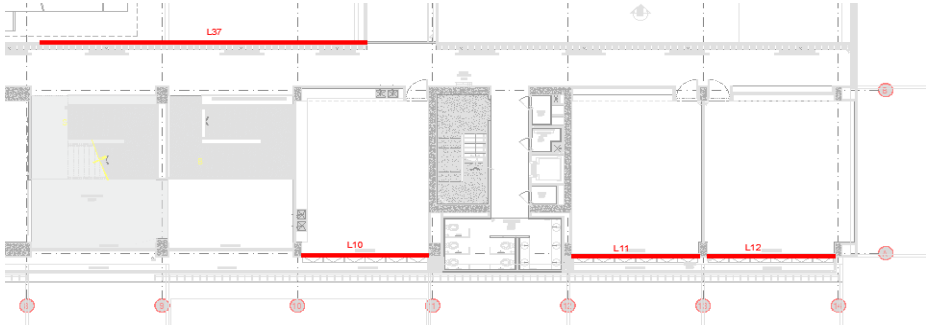


MUROS ML

CRONOLOGÍA

PISO 4



PISO 3



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

PAGADO EN EL ANTERIOR CORTE

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	11. ACABADOS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	11.3.2 C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo.	UND. ML	REF. HOJA 3 DE 7

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

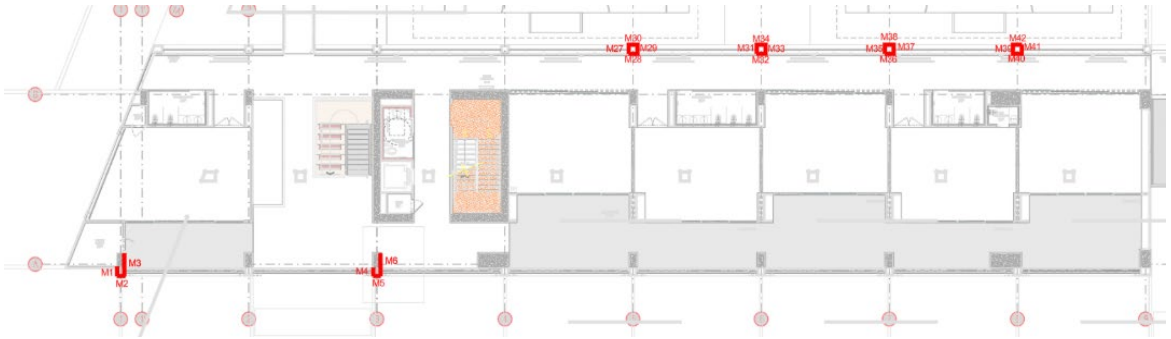
PISO 2



PISO 2

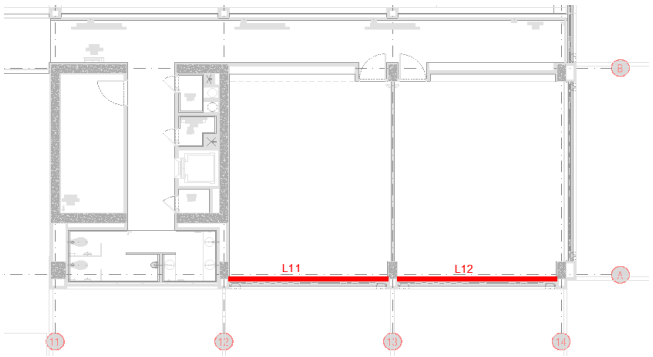

PISO 1 COMEDOR

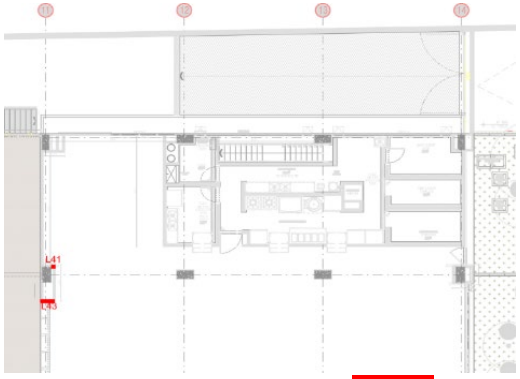


MUROS ML

CRONOLOGÍA

PISO 2



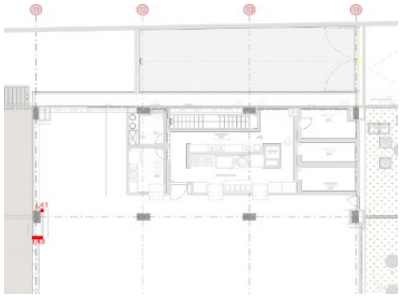PISO 1 COMEDOR



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

PAGADO EN EL ANTERIOR CORTE

Observaciones

HOJA 3 DE 7

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TECNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.25698312

CAPITULO	11. ACABADOS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	11.3.2 C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo.	UND. ML	REF. HOJA 4 DE 7

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO INFORMATIVO	LONGITUD / ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4P	**HILADA PARADA**					-				-	-
BARANDA			64,80		1,00	64,80				-	64,80
					1,00	1,00				-	1,00
					1,00	1,00				-	1,00
					1,00	1,00				-	1,00
PISO 3	HILADA PARADA					-				-	-
Eje -1 - B	A		7,36		1,00	7,36					7,36
Eje -B - / 1- 8	B		40,21		1,00	40,21				-	40,21
Eje 1-A	G		6,80		1,00	6,80				-	6,80
Eje 2-A	H		6,80		1,00	6,80					6,80
Eje 4-A	I		6,80		1,00	6,80				-	6,80
Eje 5-A	J		6,80		1,00	6,80				-	6,80
Eje 6-A	K		6,80		1,00	6,80				-	6,80
PISO 2	HILADA PARADA					-				-	-
EJ 1 / A	H		2,88		1,00	2,88				-	2,88
EJE A/1-1"	I		2,77		1,00	2,77				-	2,77
PISO 1	HILADA PARADA					-				-	-
COCINA						-				-	-
Eje G -11	VENTANA		3,10		1,00	3,10				-	3,10
SOTANO	HILADA PARADA					-				-	-
COCINA						-					-
EJE G-12-13	VENTANA		6,10		1,00	6,10					6,10
						-					
						-					-
						-					-
						-				VIENE	82,98
										TOTAL	**247,20**

FOTOS









Observaciones

HOJA 4 DE 7

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312			
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS					

CAPITULO	11. ACABADOS		REF.	CONTRACTUAL
ITEM	11.3.2 C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo.	UND. ML	REF.	HOJA 5 DE 7

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

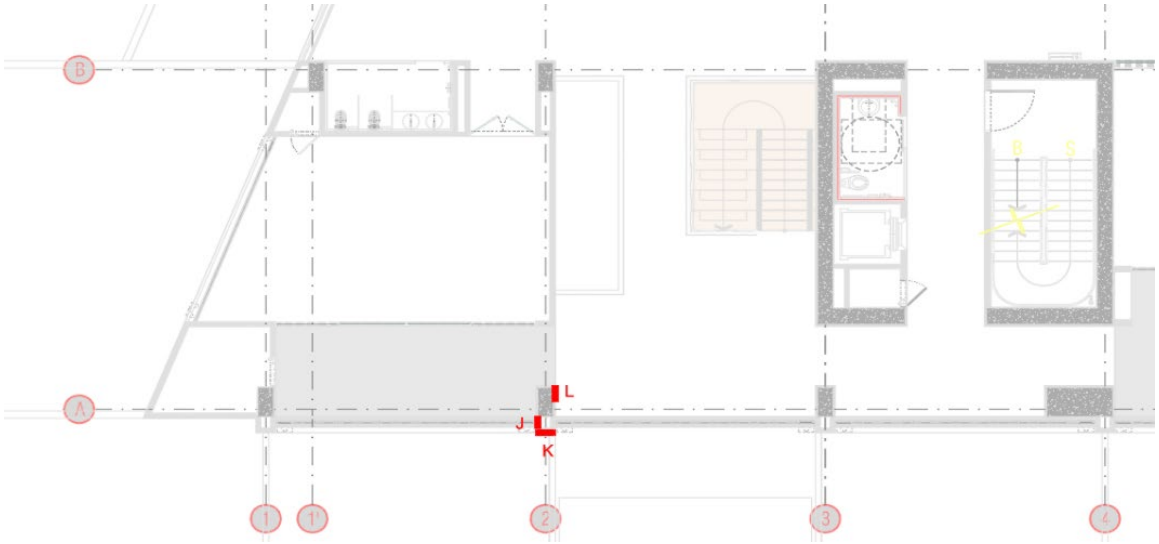
Piso 2




MUROS ML

CRONOLOGÍA

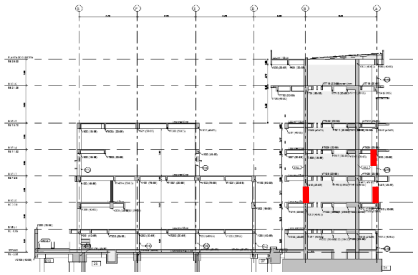PISO 2





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

PAGADO EN EL ANTERIOR CORTE

Observaciones

HOJA 5 DE 7

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.		CO1.PCCNTR.25698312	
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	11. ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	11.3.2 C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo.	UND.	ML	REF.	HOJA 6 DE 7

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

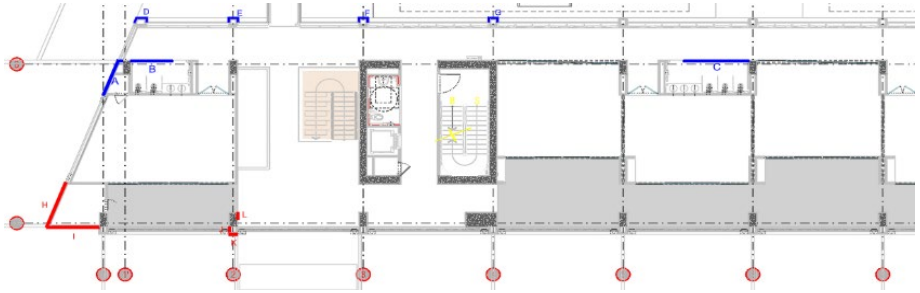Piso 2



Piso 3




HILADA PARADA
HILADA PARADA


CRONOLOGÍA

PISO 2



PISO 3





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE
PAGADO EN EL ANTERIOR CORTE

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA	5	MES	12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.25698312				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						


CAPITULO	11. ACABADOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	11.3.2 C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo.	UND.	ML	REF.	HOJA 7 DE 7

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

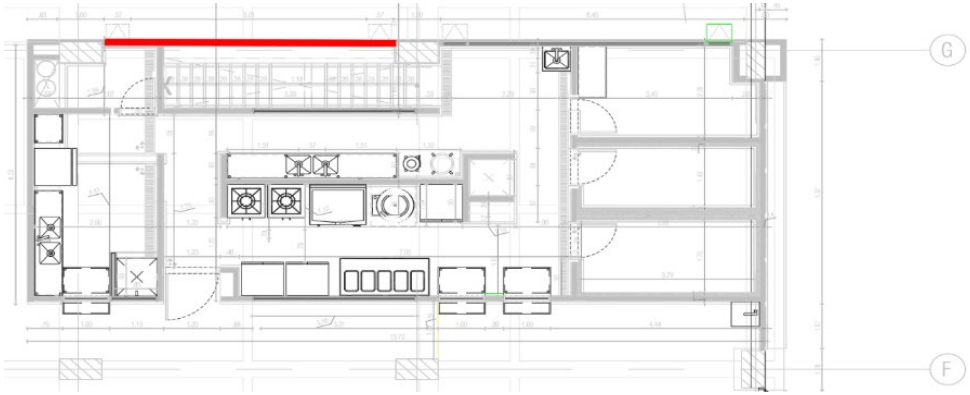
Piso 1



Sotano

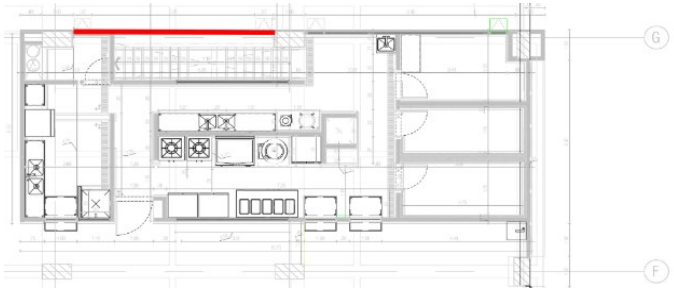

Piso 2 - biselado

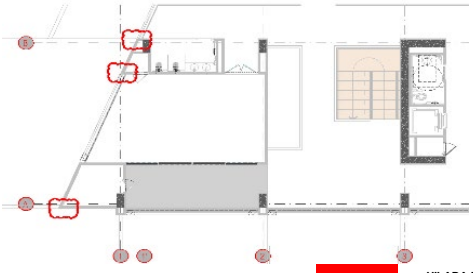

HILADA PARADA


CRONOLOGÍA

Piso 1



Sotano





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

PAGADO EN EL ANTERIOR CORTE

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 09 Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, H=0,28m, para cimentación de Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m.	UND.	ML	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	CANTIDAD ANCLAJES	CANTIDAD ELEMENTOS		L	a	h		
murete en concreto sotano para placa N. 3,50 - Sotano					-				-	-
					-				-	-
Eje 11-13 / B-D	14,24			4,00	56,96				-	56,96
Eje 11-13 / B-D	10,86			1,00	10,86				-	10,86
Eje 11-13 / G	16,22			3,00	48,66				-	48,66
Eje 11-13 / G	22,02			2,00	44,04				-	44,04
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
CONSOLIDADO CORTE ANTERIOR					-				-	-
									VIENE	-
									TOTAL	160,52

FOTOS



Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 09 Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, H=0,28m, para cimentación de Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m.	UND.	ML	REF.	HOJA 2 DE 2


ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

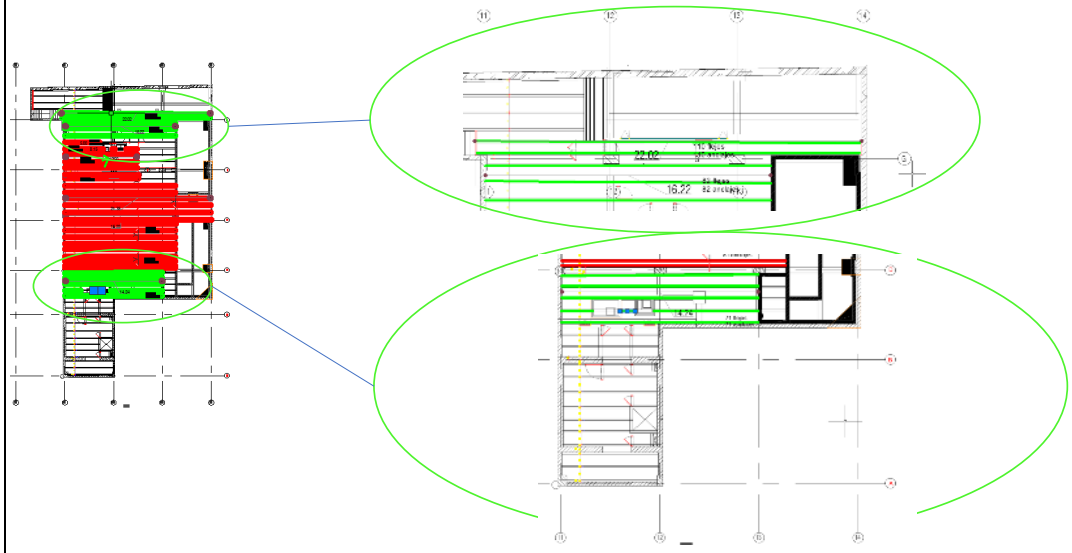CROQUIS




CRONOLOGÍA DE ÁREAS COBRADAS


N. -3,90m



N. -0,06m



N. 3,90m



Bordillos rojos cobrados actas anteriores

Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ
INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP 012 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA A LA VISTA DE LADRILLO PORTANTE DE PERFORACIÓN VERTICAL DE 6CM X 24,5CM X 12CM, COLOR TOPO O COCOA O SIMILAR LISO. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN)	UND. M2	REF. HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ANCHO	LONGITUD	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
PISO 4						-				-	-	
										-	-	
Eje2 /(A-B)	CA		8,20	3,31	1,00	27,14					27,14	
Eje 5/(A-B)	CB		8,20	3,31	1,00	27,14					27,14	
Eje 6/(A-B)	CC		8,20	3,31	1,00	27,14					27,14	
Eje 7/(A-B)	CD		8,20	3,31	1,00	27,14					27,14	
											-	
											-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
										TOTAL	108,56	





Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP 012 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA A LA VISTA DE LADRILLO PORTANTE DE PERFORACIÓN VERTICAL DE 6CM X 24,5CM X 12CM, COLOR TOPO O COCOA O SIMILAR LISO. (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN)	UND. M2	REF. HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

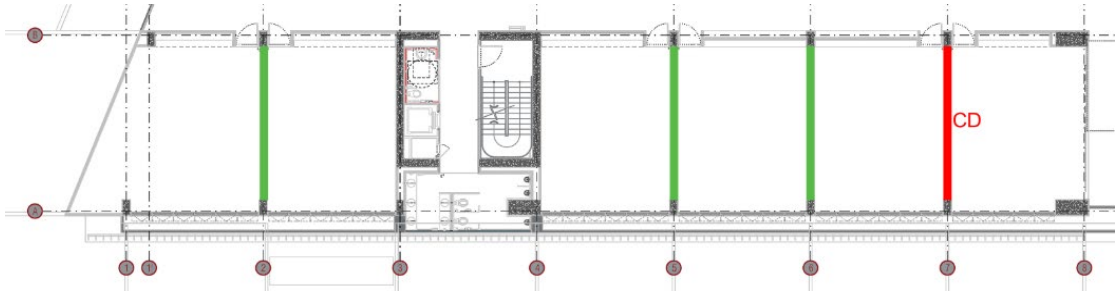PISO 4



Ladrillo topo

CRONOLOGÍA

PISO 4



Observaciones

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C · Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	**CONTRATO OBRA No.**	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP 13 Suministro e instalación de geotextil tejido T2100	UND.	M2	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	Altura	cant	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
Zona urbanismo interno					-				-	-	
zona cancha oriental	34,34	23,20		1,00	796,57				-	796,57	
zonas de traslapo	23,20	0,60		9,00	125,28				-	125,28	
									-	-	
Zona segura teatrino	12,37	2,87		1,00	35,49				-	35,49	
	14,76	9,61		1,00	141,84				-	141,84	
	17,47	4,39		1,00	76,58				-	76,58	
zonas de traslapo	14,76	0,60		4,00	35,42				-	35,42	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
CONSOLIDADO CORTE ANTERIOR					-				-	-	
									VIENE	-	
									TOTAL	1.211,18	

Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO: ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP 13 Suministro e instalación de geotextil tejido T2100	UND.	M2	REF.	HOJA 2 DE 2


ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

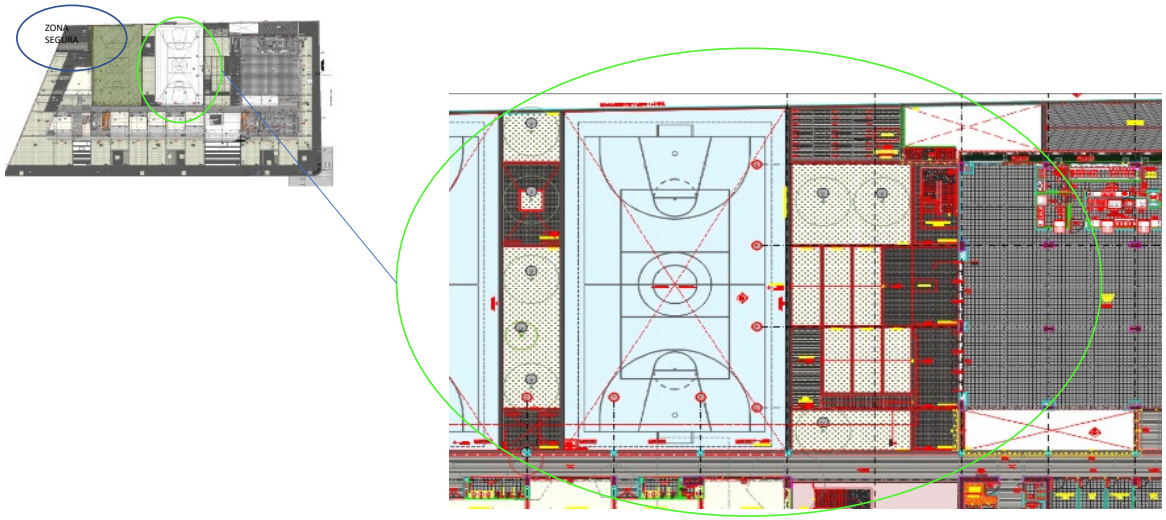CROQUIS



CRONOLOGÍA DE ÁREAS COBRADAS

N. -1,40m



Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO NOVAURBANO SED

DIRECTOR TECNICO ARQ. NELSON RIVAS

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP 14 Descabece de pilotes en concreto 28MPa h=0,30m Ø0.30m, incluye retiro de material	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
ZONA CANCHAS									-	-	
10				10,00	10,00					10,00	
										-	
										-	
										-	
										-	
										-	
									-	-	
									-	-	
									VIENE		
									PASA	10,00	



Observaciones	

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO NOVAURBANO SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. NELSON RIVAS				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP 14 Descabece de pilotes en concreto 28MPa h=0,30m Ø0.30m, incluye retiro de material	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

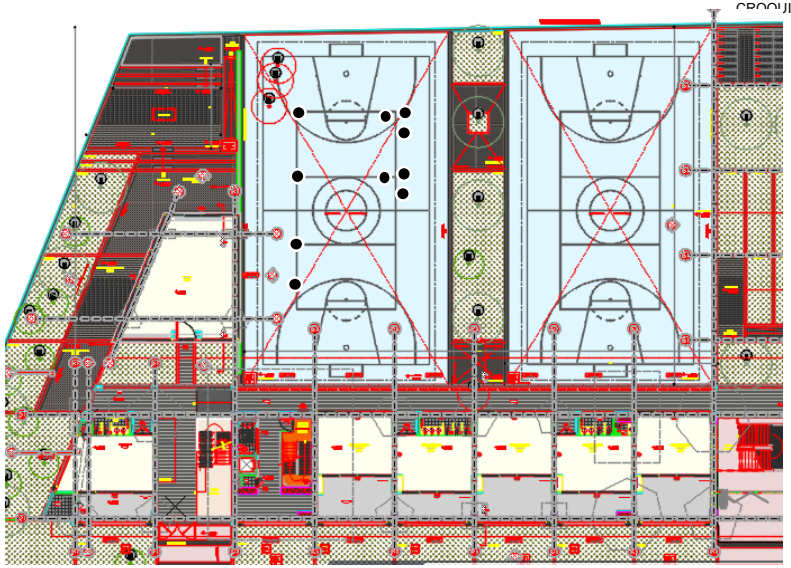CROQUIS





Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED / Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas / Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15	UND.	KG	REF.	HOJA 1 DE 5

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	AREA	TOTAL AREA	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
PLACA 4to PISO COMEDOR Eje 10-14 (D-G) con malla Diametro 5.5mm				934,98	934,98				-	934,98
PLACA 3ER PISO COMEDOR Eje 10-14 (D-G) con malla Diametro 5.5mm torta inferior con malla Diametro 4.5mm				3.332,83	3.332,83				-	3.332,83
PLACA 6TO PISO AULAS Eje 1-14 (A-B) con malla Diametro 5.5mm				9.889,60	9.889,60				-	9.889,60
PLACA CANCHAS con malla Diametro 6.00m				5.276,78	5.276,78				-	5.276,78
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									-	-
									TOTAL	19.434,19

FOTOS





Observaciones	Ver Anexo malla

HOJA 1 DE 5

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MONICA ALVAREZ


INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS


CAPITULO	15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15	UND.	KG	REF.	HOJA 2 DE 5

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

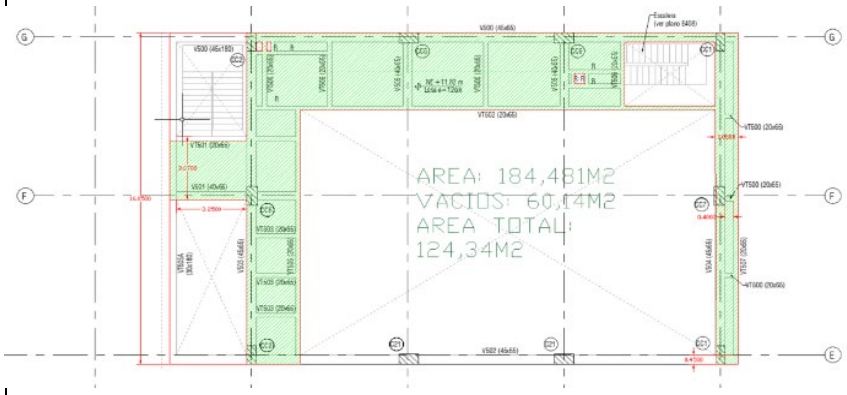PLACA 3ER PISO COMEDOR Eje 10-14 (D-G) con malla Diametro 5.5mm





Observaciones	

HOJA 2 DE 5

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025


CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TECNICO: ARQ. MONICA ALVAREZ
INTERVENTORIA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312


CAPITULO	15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15	UND.	KG	REF.	HOJA 3 DE 5

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

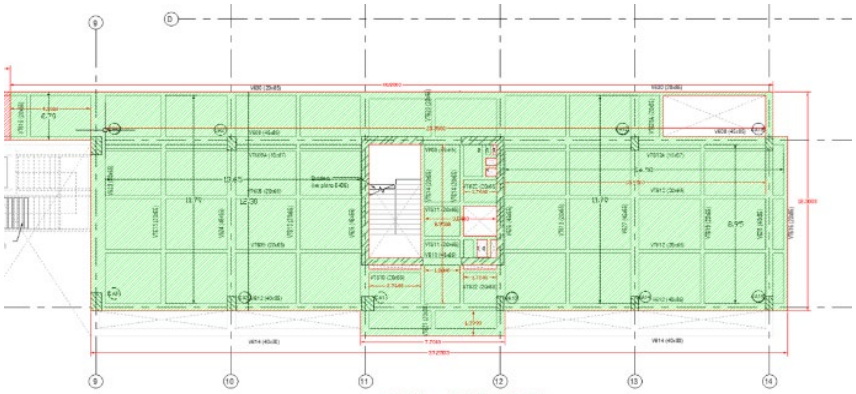PLACA 5TO PISO AULAS Eje 1-4' (A-B) con malla Diametro 5.5mm





Observaciones	

HOJA 3 DE 5

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		


CAPITULO	15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15	UND.	KG	REF.	HOJA 4 DE 5

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

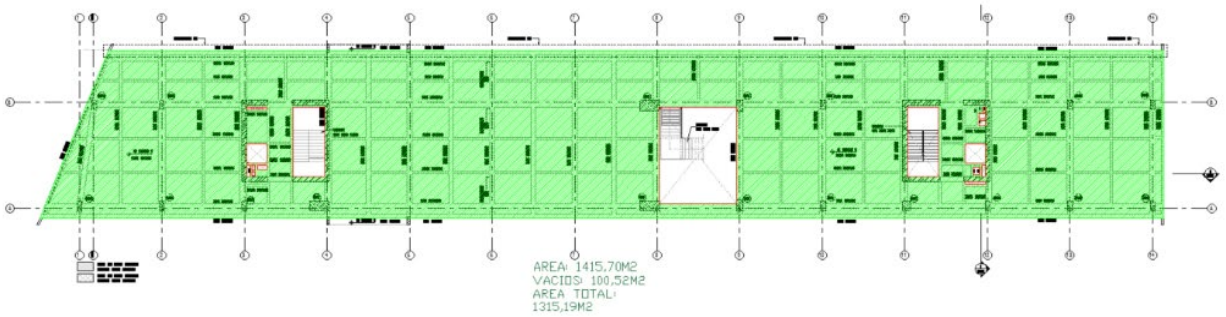PLACA 6TO PISO AULAS Eje 1-14 (A-B) con malla Diametro 5.5mm





Observaciones	
	HOJA 4 DE 5

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM:	NP 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15	UND.	KG	REF.	HOJA 5 DE 5

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

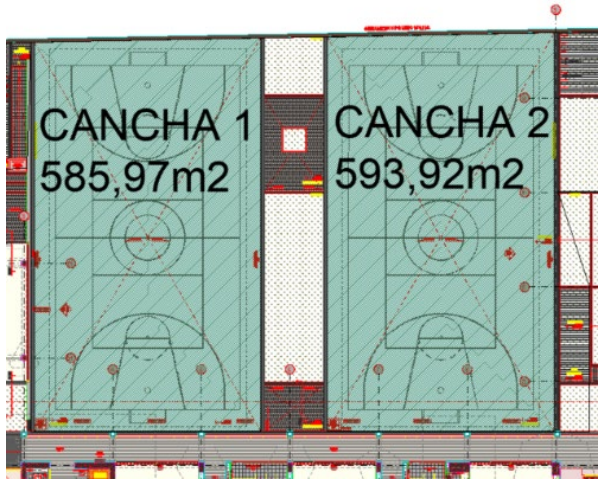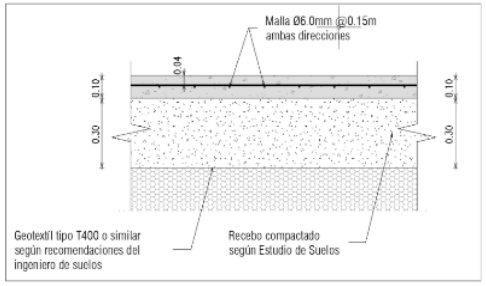CROQUIS





SECCION TIPICA DE CONTRAPISO
escala 1 : 20

Observaciones	

HOJA 5 DE 5

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO URBANOVA SED
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	

CAPITULO	15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS
ITEM:	NP 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15

PLACA 4to PISO COMEDOR Eje 10-14 (D-G) con malla Diametro 5.5mm					
ÁREA PLACA			184,48	184,48	
DESCUENTO VACÍOS			-60,14	-60,14	
FUNDIDA TERCIO ANTERIOR EJE 9 A EJE 14					
TOTAL AREA PLACA			M2	124,34	
Doble malla -. Superior e inferior			x2	248,68	
a	TOTAL AREA PLACA ALIGERADA CON DOBLE MALLA diametro 5,5mm - zona AULAS con malla Diametro 5.5mm			248,68	m2
b	Area Util malla - Ver detalle area util			9,45	m2
c	Cantidad total de mallas de acuerdo a Area (a/b)			26,32	un
d	Peso malla diametro 5,5mm (Ver tabla pesos malla)			35,53	Kg/un
TOTAL KG MALLA PLACA 4TO PISO COMEDOR Eje 10-14 (D-G) con malla Diametro 5.5mm MALLA diametro 5,5mm (c*d)				**934,98**	**KG**

PLACA 3ER PISO COMEDOR Eje 10-14 (D-G) con malla Diametro 5.5mm torta inferior con malla Diametro 4.5mm					
ÁREA PLACA			41,04	41,04	
TOTAL AREA PLACA			M2	41,04	
malla sencilla - Superior e inferior				41,04	
a	TOTAL AREA PLACA ALIGERADA CON DOBLE MALLA diametro 5,5mm - zona AULAS Eje 1-9 (A-B) con malla Diametro 5.5mm SUPERIOR			82,08	m2
a	TOTAL AREA PLACA ALIGERADA CON DOBLE MALLA diametro 4,5mm - zona AULAS Eje 1-9 (A-B) con malla Diametro 5.5mm INFERIOR			41,04	m2
b	Area Util malla - Ver detalle area util			9,45	m2
c	Cantidad total de mallas de acuerdo a Area (a/b)			13,03	un
d	Peso malla diametro 4,5mm (Ver tabla pesos malla)			23,80	Kg/un
TOTAL KG MALLA AULAS 3er piso torta inferior COMEDOR Eje 10-14 (D-G) con malla Diametro 4.5mm MALLA diametro 5,5mm (c*d)				**310,08**	**KG**

PLACA 5TO PISO AULAS Eje 8'-14 (A-B) con malla Diametro 5.5mm					
ÁREA PLACA			478,71	478,71	
DESCUENTO VACÍOS			-35,49	-35,49	
FUNDIDA TERCIO ANTERIOR EJE 9 A EJE 14					

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	CONSORCIO URBANOVA SED
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	


CAPITULO	**15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS**				
ITEM:	**NP 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15**				
	TOTAL AREA PLACA		M2	443,22	
	Doble malla -. Superior e inferior		x2	886,44	
a	TOTAL AREA PLACA ALIGERADA CON DOBLE MALLA diametro 5,5mm - zona AULAS con malla Diametro 5.5mm			886,44	m2
b	Area Util malla - Ver detalle area util			9,45	m2
c	Cantidad total de mallas de acuerdo a Area (a/b)			93,80	un
d	Peso malla diametro 5,5mm (Ver tabla pesos malla)			35,53	Kg/un
	TOTAL KG MALLA AULAS Eje 8'-14 (A-B) con malla Diametro 5.5mm MALLA diametro 5,5mm (c*d)			**3.332,83**	**KG**
	PLACA 6TO PISO AULAS Eje 1-14 (A-B) con malla Diametro 5.5mm				
	ÁREA PLACA		1.415,70	1.415,70	
	DESCUENTO VACÍOS		-100,52	-100,52	
	FUNDIDA TERCIO ANTERIOR EJE 9 A EJE 14				
	TOTAL AREA PLACA		M2	1.315,18	
	Doble malla -. Superior e inferior		x2	2.630,36	
a	TOTAL AREA PLACA ALIGERADA CON DOBLE MALLA diametro 5,5mm - zona AULAS con malla Diametro 5.5mm			2.630,36	m2
b	Area Util malla - Ver detalle area util			9,45	m2
c	Cantidad total de mallas de acuerdo a Area (a/b)			278,34	un
d	Peso malla diametro 5,5mm (Ver tabla pesos malla)			35,53	Kg/un
	TOTAL KG MALLA AULAS Eje 8'-14 (A-B) con malla Diametro 5.5mm MALLA diametro 5,5mm (c*d)			**9.889,60**	**KG**
	PLACA CANCHAS con malla Diametro 6.00m				
	ÁREA PLACA CANCHA 1	32,11	18,40	590,82	
	ÁREA PLACA CANCHA 2	32,11	18,40	590,82	
	TOTAL AREA PLACA		M2	1.181,65	
	MALLA SENCILLA		x1	1.181,65	
a	TOTAL AREA PLACA CONTRAPISO MALLA diametro 6mm - con malla Diametro 6mm			1.181,65	m2
b	Area Util malla - Ver detalle area util			9,45	m2

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA	
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED

CAPITULO	15 ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
ITEM:	NP 16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15				
c	Cantidad total de mallas de acuerdo a Area (a/b)			125,04	un
d	Peso malla diametro 6mm (Ver tabla pesos malla)			42,20	Kg/un
TOTAL KG MALLA canchas con malla Diametro 6mm MALLA (c*d)				**5.276,78**	**KG**


DETALLE AREA UTIL MALLA


TRASLAPO MINIMO EN MALLAS



Detalle solicitud planos estructurales General santander

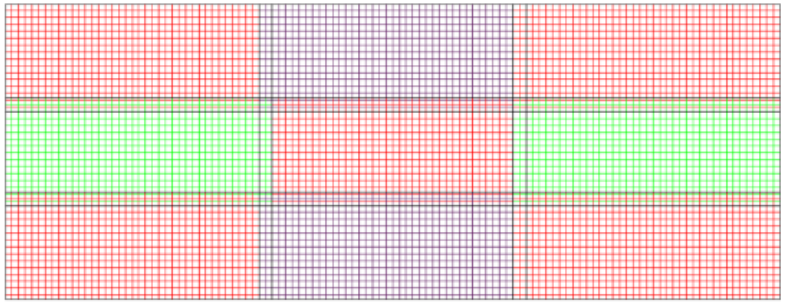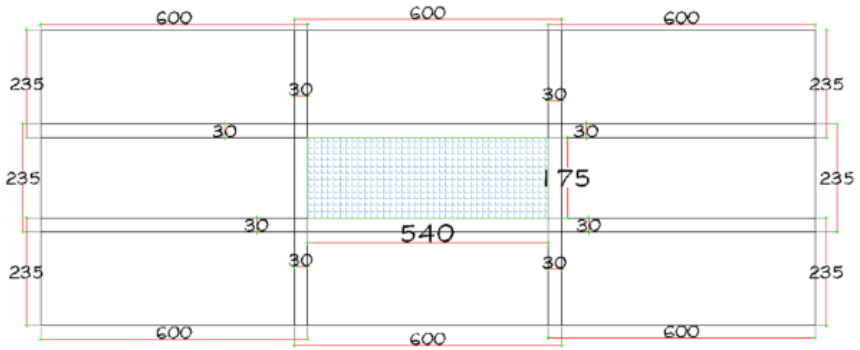traslapo malla 30cm





Calculo area util malla

5,40*1,75=9.45m2
area util de malla

TABLA PESOS MALLAS

MALLAS ELECTROSOLDADAS ESTÁNDAR

TIPO	Referencias Equivalentes	Ø	Espacio	No. VARILLAS	PESO PANEL	SECCIÓN cm²/mt
Q-1	E-047	L T3.0	15	16 40	10.53	0.47
Q-1.1	M-064	L T3.5	15	16 40	14.33	0.64
Q-2	M-084	L T4.0	15	16 40	18.81	0.84
Q-2.1	E-050	L T4.0	25	10 24	11.52	0.50
Q-2.2	M-063	L T4.0	20	12 30	14.10	0.63
Q-3	M-106	L T4.5	15	16 40	23.80	1.06
Q-3.1	M131	L T5.0	15	16 40	29.30	1.31
Q.3.2	L-038	L T5.0	20	12 30	21.93	0.98
Q-4	M-159	L T5.5	15	16 40	35.53	1.59
Q-5	M-188	L T6.0	15	16 40	42.20	1.89
Q.6	M-221	L T6.5	15	16 40	49.60	2.21
Q-6.1	M-257	L T7.0	15	16 40	57.40	2.57
Q-7	M-295	L T7.5	15	16 40	65.93	2.95
Q-7.1	M-335	L T8.0	15	16 40	75.10	3.35
Q-8	M-378	L T8.5	15	16 40	84.74	3.78
Q.9	M-442	L T7.5	10	24 60	98.90	4.42
Q-10	M-567	L T8.5	10	24 60	126.83	5.67

L= Longitudinal **T=** Transversal
d= Alambres dobles en el sentido longitudinal

Dimensión Panel= 6.00 x 2.35 mts. **Area Total=** 14.10 mts.
Area Util= 13.40 mts.

Mallas especiales según requerimiento

TIPO	Referencias Equivalentes	Ø	Espacio	No. VARILLAS	PESO PANEL	SECCIÓN cm²/mt
R-2	H-071	L3.0 T3.0	10 15	24 40	13.19	071 0.47
R-2.1	H-084	L4.0 T4.0	15 25	16 24	15.10	0.84 0.50
R2.1d		L4.0d T4.0	15 25	32 24	24.47	1.68 0.50
R-2.2		L4.0 T4.0	25 35	10 18	10.08	0.50 0.36
R-2.3		L4.0 T4.0	20 30	12 20	11.72	0.63 0.42
R-3	H-106R	L4.5 T3.0	15 25	16 24	15.10	1.06 0.28
R-3.1	H-131	L5.0 T4.0	15 30	16 20	19.44	1.31 0.42
R-3.2	H-158	L5.5 T4.0	15 25	16 24	23.54	1.58 0.50
R-3.3	H-106	L4.5 T4.0	15 25	16 24	17.60	1.06 0.50
R3.4d		L5.0d T4.5	15 25	32 24	36.59	2.62 0.64
R-4		L6.0 T5.0	10 25	24 24	40.61	2.83 0.78
R-5		L8.0 T6.0	15 20	16 30	53.46	3.35 1.42
R-5.1		L8.5 T5.0	15 25	16 24	51.39	3.78 0.78
R-5.2		L7.5 T5.5	10 15	24 24	60.38	4.42 0.95
R-5.3		L8.0 T5.0	15 25	16 24	46.51	3.35 0.79
R-6		L8.0 T6.0	10 20	24 30	72.38	5.03 1.42
R-7		L8.5 T6.0	10 20	24 30	79.69	5.67 1.42
R-8		L5.0 T3.5	10 30	24 20	25.71	1.96 0.32
R-8.1	H-221	L6.5 T4.0	15 25	16 24	30.60	0.50
R-8.2	H-257	L7.0 T5.0	15 25	16 24	37.70	2.57 0.78
R8.3d		L7.0d T6.0	15 25	32 24	70.43	5.13 1.13

Características de las Mallas Electrosoldadas

Las mallas electrosoldadas son producidas a partir de alambres trefilados grafilados y/o lisos de alta resistencia, longitudinales y transversales, unidos mediante un proceso de electrosoldadura formando ángulos rectos, en páneles de 6 m de largo por 2.35 m de ancho con las siguientes características:

(Norma ASTM A-497) NTC 2310 - NTC 1925

Esfuerzo de rotura: fs 5.500 Kg/cm2
Esfuerzo de trabajo: fs 2.500 Kg/cm2
Módulo de Elasticidad: Es 2.100.000 Kg/cm2
Límite elástico convencional: fy 5.000 Kg/cm2
Alargamiento de rotura: Ed 5%
Diámetro mínimo: 4.0 mm y Diámetro máximo: 9.5 mm

- Intervalo de medida longitudinal: mínimo 1.00 m y máximo 12.00 mm
- Intervalo de medida transversal: mínimo 1.00 m y máximo 2.65 m
- Espacios longitudinales de 10 a 30 cm en múltiplos de 5 cm
- Espacios transversales de 5 a 35 cm

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO: ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.: CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP 17 Suministro e instalación de sub-base granular reciclada incluye Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación Con Vibrocompactador	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	Altura	cant	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
Zona urbanismo interno					-				-	-
zona cancha occidental	31,60	21,30	0,27	1,00	181,73				-	181,73
zona cancha oriental	32,34	21,20	0,27	1,00	185,09				-	185,09
									-	-
Zona segura teatrino	10,37	2,87	0,25	1,00	7,44				-	7,44
	12,76	9,61	0,25	1,00	30,66				-	30,66
	15,47	4,39	0,25	1,00	16,95				-	16,95
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
CONSOLIDADO CORTE ANTERIOR					-				-	-
									VIENE	-
									TOTAL	421,87

FOTOS





Observaciones

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP 17 Suministro e instalación de sub-base granular reciclada incluye Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación Con Vibrocompactador	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

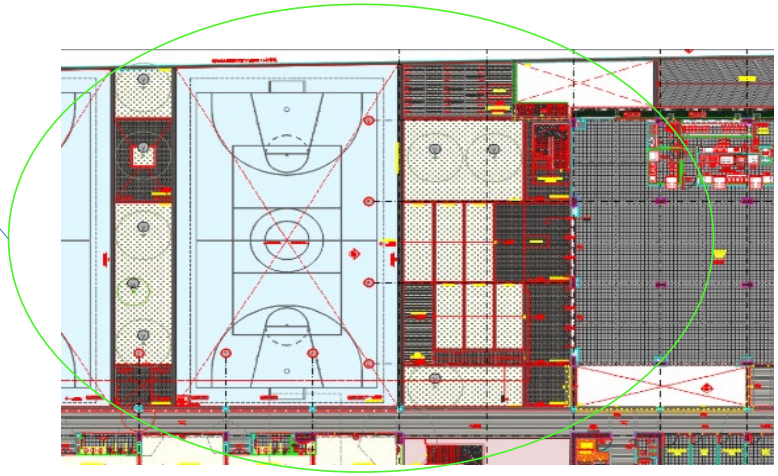CROQUIS





CRONOLOGÍA DE ÁREAS COBRADAS

N. -1,40m



Observaciones	

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 18 Bloqueo y traslado de árboles - Categoria 1 hasta H = 5m (Incluye poda aérea, excavación lateral, corte de las raíces laterales o secundarias, aplicación de cicatrizante, amarre del bloque, destronque y traslado interno hasta el punto del trasplante)	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
					-				-	-
Bloqueo y traslado de arbol palmeras				1,00	1,00				-	1,00
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
									VIENE	-
									TOTAL	1,00

FOTOS





Observaciones

HOJA 1 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 18 Bloqueo y traslado de árboles - Categoria 1 hasta H = 5m (Incluye poda aérea, excavación lateral, corte de las raíces laterales o secundarias, aplicación de cicatrizante, amarre del bloque, destronque y traslado interno hasta el punto del trasplante)	UND.	UN	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

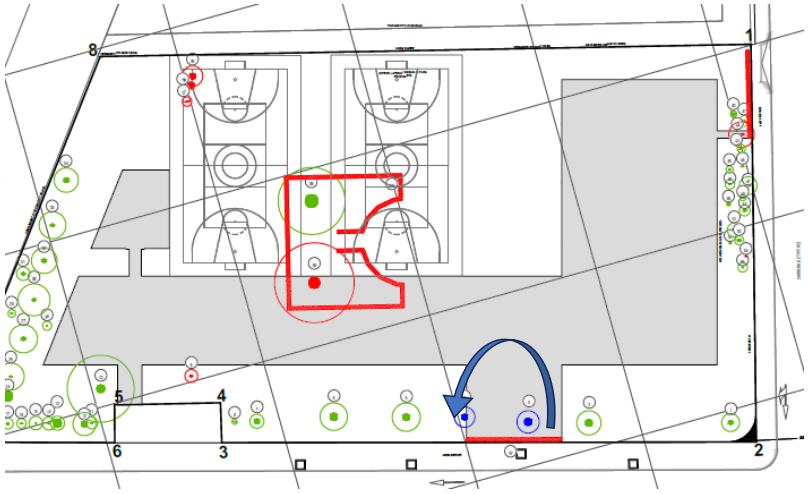CROQUIS



CRONOLOGÍA DE ÁREAS COBRADAS

Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 19 Medidas de compensación de los impactos y efectos ambientales por los árboles viabilizados con ocasión de la tala autorizada en el acto administrativo Resolución No. 03030 del 26/12/24 y Resolución No. 00606 del 21/03/25, de acuerdo con lo liquidado en los conceptos técnicos SSFFS-13796 del 14 de diciembre de 2023 y SSFFS-01054 de 17 de marzo de 2025, respectivamente	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 1

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
					-				-	-
					-				-	-
Pago compensacion				1,00	1,00				-	1,00
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
									VIENE	-
									TOTAL	1,00

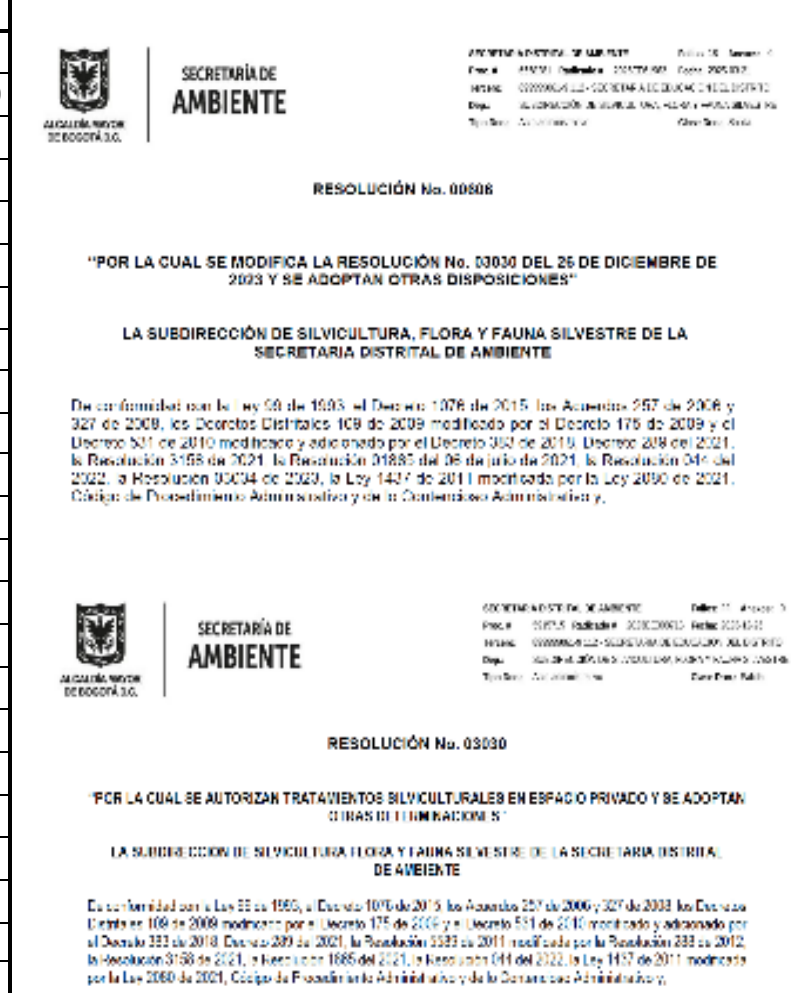FOTOS


SECRETARÍA DE AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 00606

"POR LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN No. 03030 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023 Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"

LA SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

SECRETARÍA DE AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 03030

"POR LA CUAL SE AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PRIVADO Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

Observaciones

HOJA 1 DE 1

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	G&O CONSTRUCTORS SAS	FECHA	DIA	5	MES 12	AÑO	2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS						

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP. 31 Viga en concreto de 175KG canchada en mamposteria h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	UND. ML	REF. HOJA 1 DE 10

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS ALTURA	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
SOTANO						-				-	-
EJE A /1-2	L3	0,84	6,80		1,00	6,80				-	6,80
EJE A /3-4	L4	0,84	6,80		1,00	6,80				-	6,80
EJE 2 / A-B	C1	3,31	8,20		2,00	16,40				-	16,40
PISO 3						-				-	-
EJE A/8-9	L8.1	0,40	6,70		1,00	6,70				-	6,70
EJE A / 9-10	L9	0,40	6,70		1,00	6,70				-	6,70
EJE A / 10-11	L10	0,84	6,70		1,00	6,70				-	6,70
EJE A / 12-13	L11	0,84	6,80		1,00	6,80				-	6,80
EJE A / 13-14	L12	0,84	6,80		1,00	6,80				-	6,80
EJE B / 8-10	L37		17,74		2,00	35,48				-	35,48
PISO 2						-				-	-
EJE 11 / A-B	B52	3,31	5,10		2,00	10,20				-	10,20
EJE 11 / A-B	B49	3,31	1,68		2,00	3,36				-	3,36
EJE 11 / A-B	B45	3,31	1,70		2,00	3,40					3,40
EJE 11 / A-B	B44	3,81	1,44		2,00	2,88				-	2,88
EJE 11 / A-B	B47	3,31	0,68		2,00	1,36					1,36
EJE 11 / A-B	B39	3,31	0,32		2,00	0,64				-	0,64
EJE 11 / A-B	B35	3,31	1,75		2,00	3,50				-	3,50
EJE 11 / A-B	B37	3,31	0,32		2,00	0,64				-	0,64
EJE 11 / A-B	B46	3,31	0,68		2,00	1,36				-	1,36
EJE 11 / A-B	B32	3,81	2,80		2,00	5,60				-	5,60
EJE 11 / A-B	B36	3,31	1,72		2,00	3,44				-	3,44
EJE 11 / A-B	B32"	3,81	1,25		2,00	2,50				-	2,50
EJE 11 / A-B	B38	3,81	1,25		2,00	2,50				-	2,50
EJE 11 / A-B	B28	3,81	2,41		2,00	4,82				-	4,82
EJE A / 12-13	L11	0,84	6,70		1,00	6,70				-	6,70
EJE A / 13-14	L12	0,84	6,70		1,00	6,70				-	6,70
										PASA	158,78

FOTOS



Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez


Director Interventoria
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoria
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	G&O CONSTRUCTORS SAS	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ				
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP. 31 Viga en concreto de 175KG canchada en mamposteria h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	UND. ML	REF. HOJA 2 DE 10

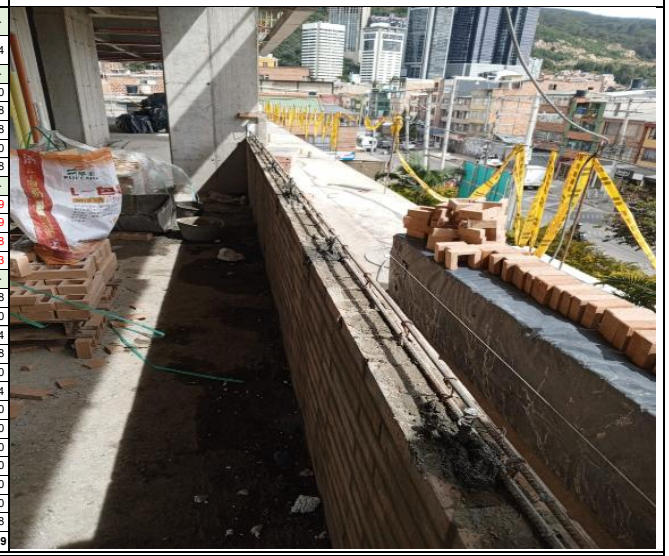AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
		ALTURA	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD		L	a	h			
PISO 1						-				-	-	
EJE 12 / A-B	B63	3,31	1,02		2,00	2,04				-	2,04	
PISO 1	Comedor					-				-	-	
EJE 11/ G-F	L40	3,11	6,55		2,00	13,10				-	13,10	
EJE 11/ G-F	L41	3,11	0,34		2,00	0,68				-	0,68	
EJE 11/ G-F	L42	3,11	2,04		2,00	4,08				-	4,08	
EJE 11/ G-F	L43	3,11	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
EJE 11/ G-F	L44	3,11	1,14		2,00	2,28				-	2,28	
SOTANO						-				-	-	
EJE 11 / A-B	BS1	2,42	1,59		1,00	1,59				-	1,59	
EJE 11 / A-B	BS2	2,42	1,59		1,00	1,59				-	1,59	
EJE 11 / A-B	BS19	2,40	6,58		1,00	6,58				-	6,58	
EJE 11 / A-B	BS21	2,42	5,13		1,00	5,13				-	5,13	
						-				-	-	
EJE A -1	M1	3,11	0,54		2,00	1,08				-	1,08	
EJE A -1	M2	3,11	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
EJE A -1	M3	3,11	1,17		2,00	2,34				-	2,34	
EJE A -1	M4	3,11	0,54		2,00	1,08				-	1,08	
EJE A -1	M5	3,11	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
EJE A -1	M6	3,11	1,17		2,00	2,34				-	2,34	
Eje B-5	M30	4,16	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-5	M29	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-5	M28	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-5	M27	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-6	M34	4,16	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-6	M33	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
						-				VIENE	158,78	
										PASA	211,69	

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA G&O CONSTRUCTORS SAS

DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL

ITEM	NP. 31 Viga en concreto de 175KG canchada en mamposteria h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	UND.	ML	REF.	HOJA 3 DE 10

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
		ALTURA	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD		L	a	h			
Eje B-6	M32	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-6	M31	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-7	M38	4,16	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-7	M37	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-7	M36	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-7	M35	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-8	M42	4,16	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-8	M41	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-8	M40	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
Eje B-8	M39	3,99	0,50		2,00	1,00				-	1,00	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				-	-	
						-				VIENE	211,69	
										PÁSA	221,69	

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	G&O CONSTRUCTORS SAS	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP. 31 Viga en concreto de 175KG canchada en mamposteria h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	UND. M	REF. HOJA 4 DE 10

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

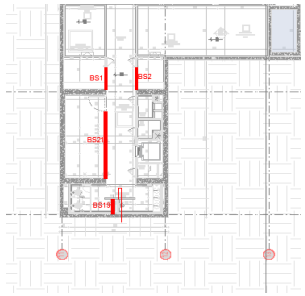
Sotano




Piso 1 - comedor

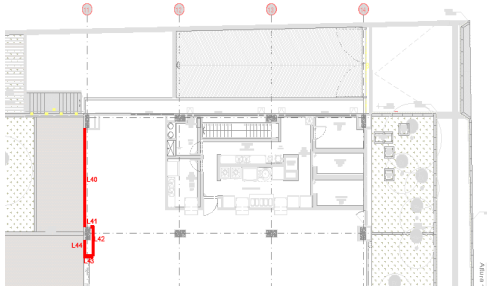

Piso 1 - Aulas

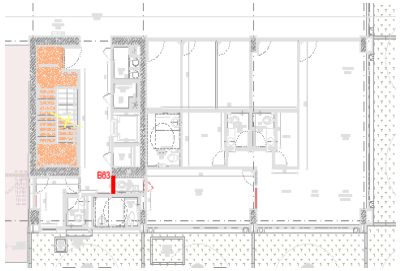

Piso 2

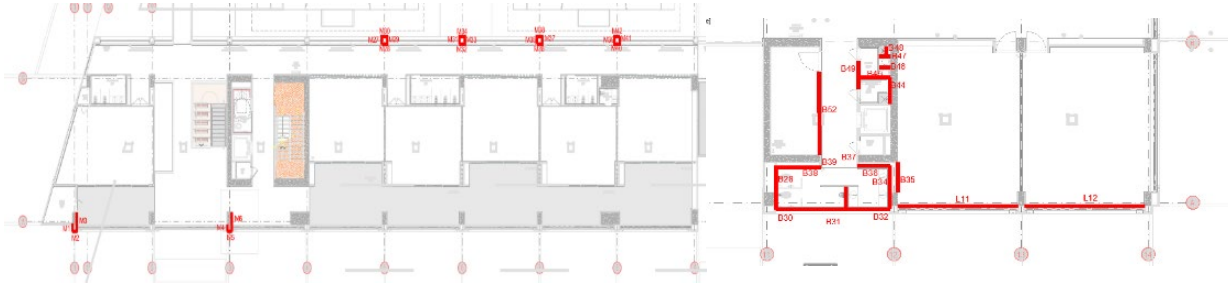

CRONOLOGÍA

Sotano



Piso 2



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	G&O CONSTRUCTORS SAS	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP. 31 Viga en concreto de 175KG canchada en mamposteria h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	UND. M	REF. HOJA 5 DE 10

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

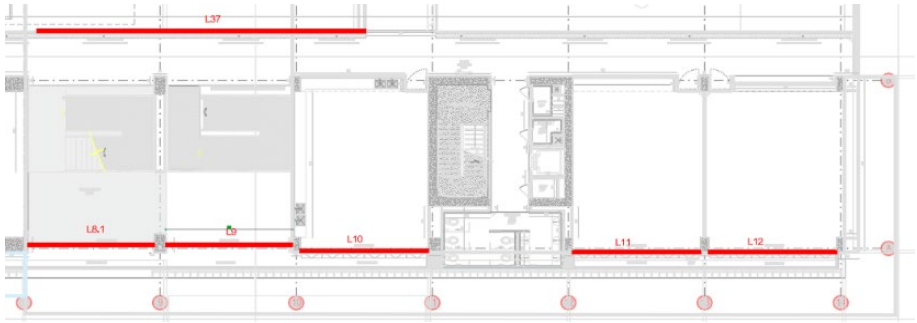Piso 3



Piso 4

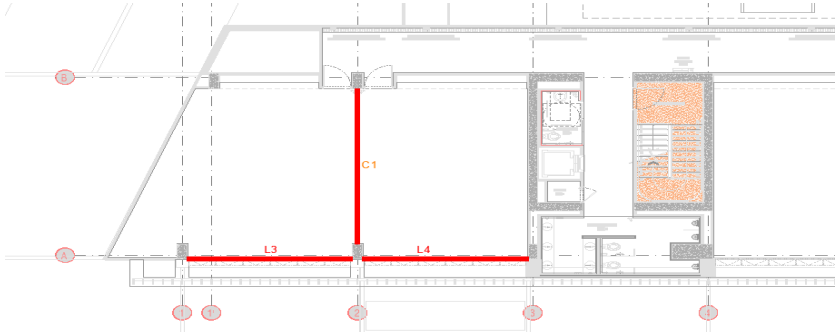

CRONOLOGÍA

Piso 3



Piso 4



PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA G&O CONSTRUCTORS SAS
DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ
INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP. 31 Viga en concreto de 175KG canchada en mamposteria h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	UND. ML	REF. HOJA 6 DE 10

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD	TOTAL	VANOS L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
PISO 4P	LADRILLO					-				-	-
BARANDA	A		7,36		1,00	7,36				-	7,36
BARANDA	B		40,21		1,00	40,21				-	40,21
PISO 4P	BLOQUE					-				-	-
EJE 3 / A-B	V	BA	1,88		2,00	3,76				-	3,76
EJE 3 / A-B	V	BB	1,01		2,00	2,02				-	2,02
EJE 3 / A-B	V	BC	1,01		1,00	1,01				-	1,01
EJE 3 / A-B - DINTEL	V	BC	2,02		1,00	2,02				-	2,02
EJE 3 / A-B	V	BD	1,80		2,00	3,60				-	3,60
EJE 3 / A-B	V	BE	3,07		2,00	6,14				-	6,14
EJE 3 / A-B	V	BF	1,80		2,00	3,60				-	3,60
EJE A / 3-4	V	BJ	7,80		1,00	7,80				-	7,80
EJE 4 / A-B	V	BK	0,86		1,00	0,86				-	0,86
EJE 4 / A-B	V	BK"	0,86		1,00	0,86				-	0,86
EJE 4 / A-B	V	BL	1,44		2,00	2,88				-	2,88
EJE 4 / A-B	V	BM	1,78		2,00	3,56				-	3,56
EJE 4 / A-B	V	BN	3,02		2,00	6,04				-	6,04
EJE 4 / A-B	V	BÑ	4,71		2,00	9,42				-	9,42
EJE 4 / A-B	V	BO	0,33		2,00	0,66				-	0,66
EJE 8 / A-B	V	BT	4,54		2,00	9,08				-	9,08
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				VIENE	221,69
										PASA	332,57

FOTOS



Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	G&O CONSTRUCTORS SAS	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP. 31 Viga en concreto de 175KG canchada en mamposteria h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	UND. M	REF. HOJA 7 DE 10

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

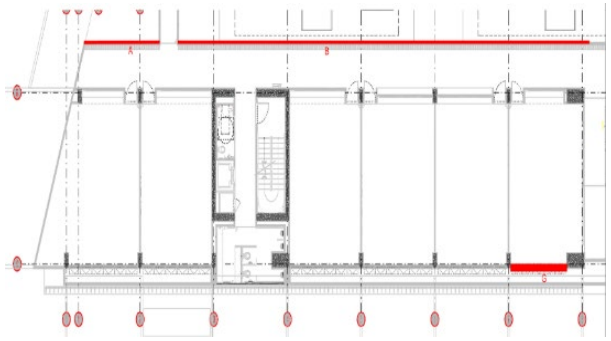
PISO 3 LADRILLO



PISO 2 LADRILLO

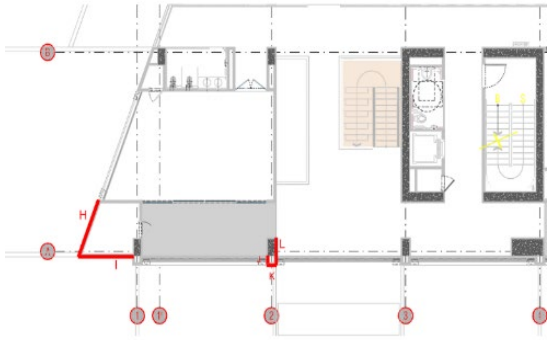


SOTANO

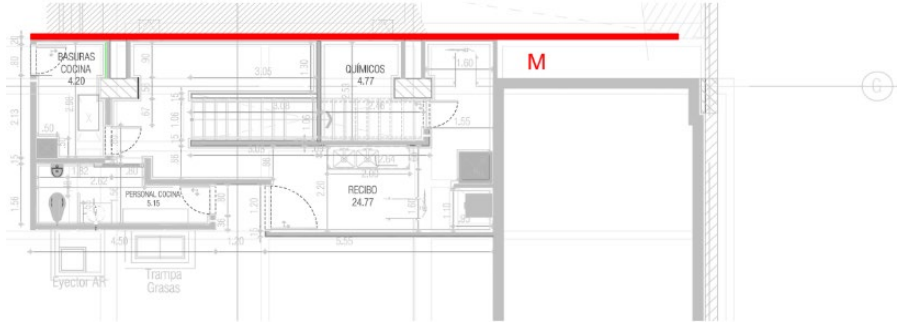


CRONOLOGÍA

PISO 3 LADRILLO



PISO 2 LADRILLO



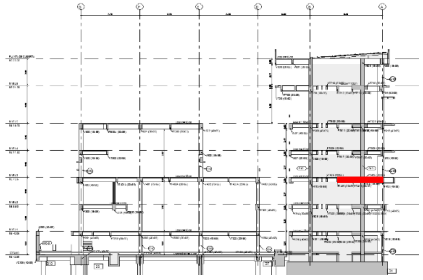

PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	G&O CONSTRUCTORS SAS	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP. 31 Viga en concreto de 175KG canchada en mamposteria h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	UND. M	REF. HOJA 8 DE 10

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

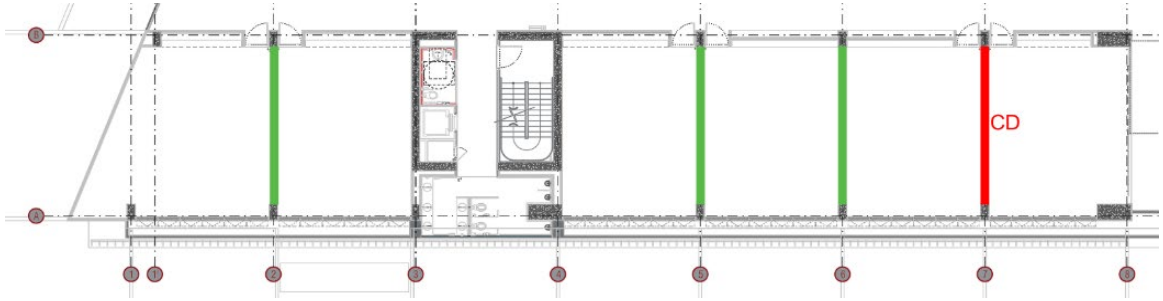PISO 3



PISO 2

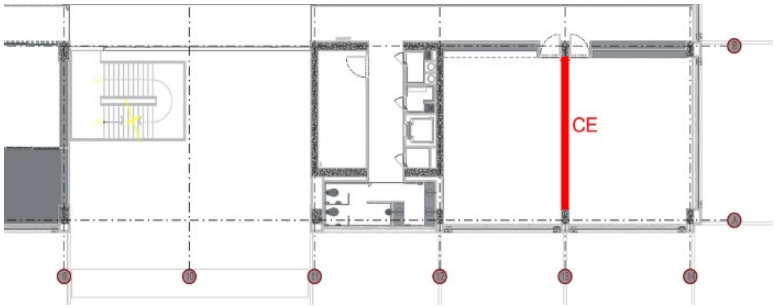





Ladrillo topo


CRONOGRAMA

PISO 3



PISO 2



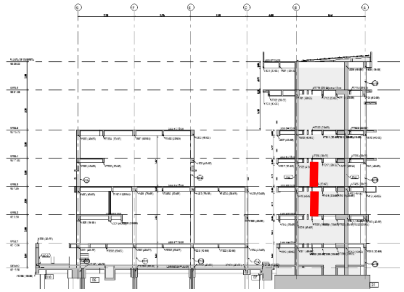

PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

PAGADO EN CORTE ANTERIOR

Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED / Logia 3 / BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	G&O CONSTRUCTORS SAS	CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ	
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS	

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP. 31 Viga en concreto de 175KG canchada en mamposteria h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	UND.	ML	REF.	HOJA 9 DE 10

AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
		LONGITUD	ANCHO	ALTURA	CANTIDAD		L	a	h		
PISO 3		LONGITUD				-				-	-
PISO 4P						-				-	-
Eje 1-A	G		6,80		1,00	6,80				-	6,80
Eje 2-A	H		6,80		1,00	6,80				-	6,80
Eje 4-A	I		6,80		1,00	6,80				-	6,80
Eje 5-A	J		6,80		1,00	6,80				-	6,80
Eje 6-A	K		6,80		1,00	6,80				-	6,80
Eje2 /(A-B)	CA		8,20		2,00	16,40				-	16,40
Eje 5/(A-B)	CB		8,20		2,00	16,40				-	16,40
Eje 6/(A-B)	CC		8,20		2,00	16,40				-	16,40
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				-	-
						-				VIENE	332,57
										TOTAL	415,77

FOTOS



Observaciones

HOJA 9 DE 10

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	G&O CONSTRUCTORS SAS		FECHA	DIA 5	MES 12 AÑO 2025
DIRECTOR TECNICO	ARQ. MONICA PAOLA ALVAREZ		CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312	
INTERVENTORIA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP. 31 Viga en concreto de 175KG canchada en mamposteria h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	UND. M	REF. HOJA 10 DE 10

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				%AVANCE	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

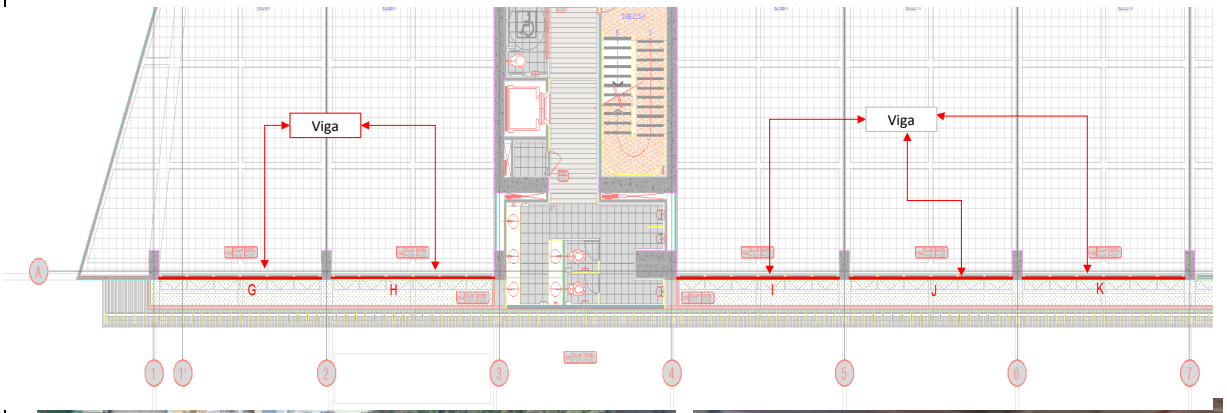PISO 4P









CRONOLOGÍA

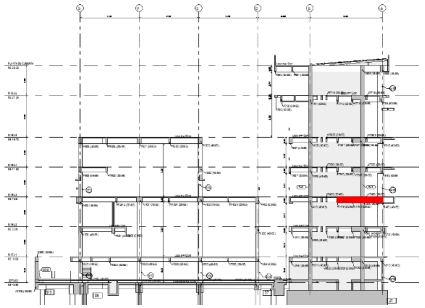PISO 3





PAGADO EN EL PRESENTE CORTE

Observaciones	
	HOJA 10 DE 10

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 035 Suministro e instalación de viga aérea en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.	UND.	M3	REF.	HOJA 1 DE 8

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL
LUDOTECA SEGUNDO NIVEL EJE D1 /1A 3					-				-	-
VTL 201	7,29	0,40	0,65	1,00	1,90				-	1,90
VTL 205	6,34	0,40	0,65	1,00	1,65				-	1,65
VTL 202	6,77	0,20	0,65	1,00	0,88				-	0,88
					-				-	-
PLACA CUARTO PISO - ZONA COMEDOR					-				-	-
EJE 10-14 / E-G					-				-	-
V500	3,25	0,45	1,80	1,00	2,63				-	2,63
VT501	3,25	0,20	0,53	1,00	0,34				-	0,34
V501	3,25	0,40	0,53	1,00	0,69				-	0,69
V502	3,25	0,45	0,65	1,00	0,95				-	0,95
VT505A	16,05	0,30	1,80	1,00	8,67				-	8,67
placa.	3,07	3,25	0,13	1,00	1,30				-	1,30
V502	20,15	0,45	0,65	1,00	5,89				-	5,89
V504	11,85	0,40	0,53	1,00	2,51				-	2,51
VT507	11,85	0,20	0,53	1,00	1,26				-	1,26
VT500	0,40	0,20	0,53	2,00	0,08				-	0,08
placa,	11,85	1,05	0,13	1,00	1,62				-	1,62
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	
									VIENE	
									PASA	30,37

FOTOS





Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO URBANOVA SED

DIRECTOR TÉCNICO ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ

INTERVENTORÍA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	**NP. 035 Suministro e instalación de viga aérea en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.**	UND.	M3	REF.	HOJA 2 DE 8

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PLACA QUINTO PISO					-				-	-
EJE 8'-14 / A-B					-				-	-
V614	37,25	0,40	0,30	1,00	4,47				-	4,47
VT616	12,30	0,20	0,85	1,00	2,09				-	2,09
A9	1,00	0,80	0,65	1,00	0,52				-	0,52
A10	1,00	0,45	0,65	1,00	0,29				-	0,29
A11	1,00	0,45	0,65	1,00	0,29				-	0,29
A12	1,00	0,45	0,65	1,00	0,29				-	0,29
A13	1,00	0,45	0,65	1,00	0,29				-	0,29
A14	1,00	0,45	0,85	1,00	0,38				-	0,38
					-				-	-
PLACA NIVEL 5A					-				-	-
VA602	0,34	0,40	0,53	1,00	0,07				-	0,07
VTA603	1,13	0,15	0,53	1,00	0,09				-	0,09
VTA604	1,91	0,15	0,53	1,00	0,15				-	0,15
VA603	2,98	0,40	0,65	1,00	0,77				-	0,77
VTA605	12,69	0,15	0,30	2,00	1,14				-	1,14
VTA600	9,70	0,15	0,53	1,00	0,77				-	0,77
VA600	9,11	0,40	0,53	1,00	1,93				-	1,93
VTA601A	1,25	0,15	0,30	1,00	0,06				-	0,06
VA601	1,38	0,40	0,30	11,00	1,82				-	1,82
VTA601	1,38	0,15	0,30	1,00	0,06				-	0,06
VTA609	19,90	0,15	0,30	1,00	0,90				-	0,90
VTA611	95,35	0,15	0,30	2,00	8,58				-	8,58
					-				-	-
					-				-	
									VIENE	30,37
									PASA	**55,33**

FOTOS



Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA	COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	ACTA NO 16	

CONSORCIO URBANOVA SED — Logia 3 Desarrollo de Proyectos e Ideas — Secretaría de Educación D.C, Sub Dirección de Plantas, ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 035 Suministro e instalación de viga aérea en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.	UND.	M3	REF.	HOJA 3 DE 8

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
PLACA NIVEL 5A					-				-	-
V701	28,00	0,60	2,00	1,00	33,60				-	33,60
V704	28,00	0,60	2,00	1,00	33,60				-	33,60
VA601A	1,25	0,40	0,30	3,00	0,45				-	0,45
VTA606	13,89	0,15	0,30	2,00	1,25				-	1,25
VTA 610	42,80	0,15	0,30	1,00	1,93				-	1,93
VTA607	13,98	0,15	0,30	2,00	1,26				-	1,26
VA 600 EJE 14	11,20	0,40	0,65	1,00	2,91				-	2,91
VA 604	0,50	0,40	0,30	2,00	0,12				-	0,12
VTA602	11,20	0,25	0,30	1,00	0,84				-	0,84
VTA 608	0,50	0,15	0,30	2,00	0,05				-	0,05
PLACA NIVEL 5A	194,62		0,13	1,00	25,30				-	25,30
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	-
					-				-	
									VIENE	55,33
									TOTAL	**156,64**

FOTOS



Observaciones

HOJA 3 DE 8

Director de obra	Director Interventoría
Arq. Monica Paola Alvarez Rios	Ing. Luis Santiago Cely Báez
Residente de obra	Residente Interventoría
Ing. David Alberto Morales Sanchez	Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 035 Suministro e instalación de viga aérea en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.	UND.	M3	REF.	HOJA 4 DE 8

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

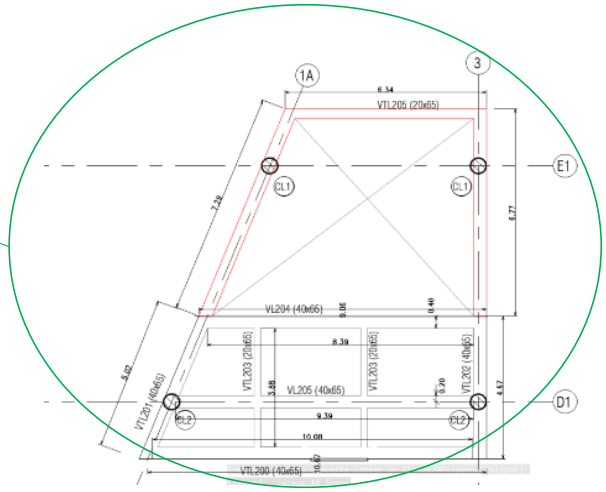CROQUIS







Observaciones	

HOJA 4 DE 8

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 035 Suministro e instalación de viga aérea en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.	UND.	M3	REF.	HOJA 5 DE 8

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

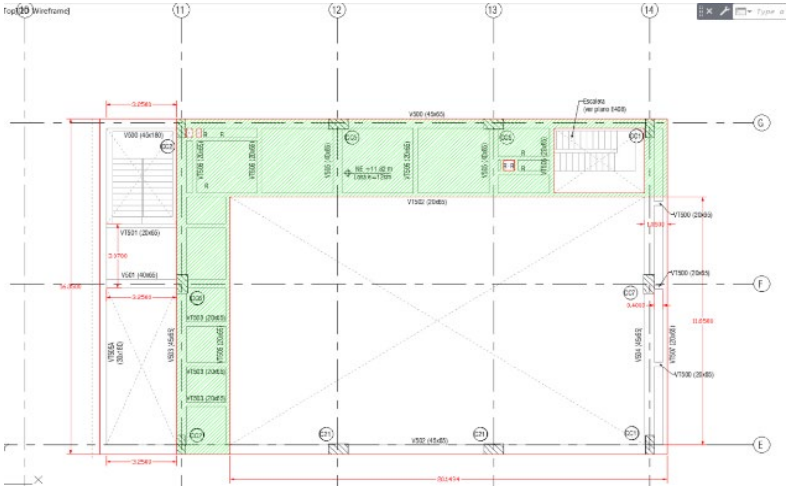PLACA CUARTO PISO - ZONA COMEDOR
EJE 10-14 / E-G



Observaciones	

HOJA 5 DE 8

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 035 Suministro e instalación de viga aérea en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.	UND.	M3	REF.	HOJA 6 DE 8

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

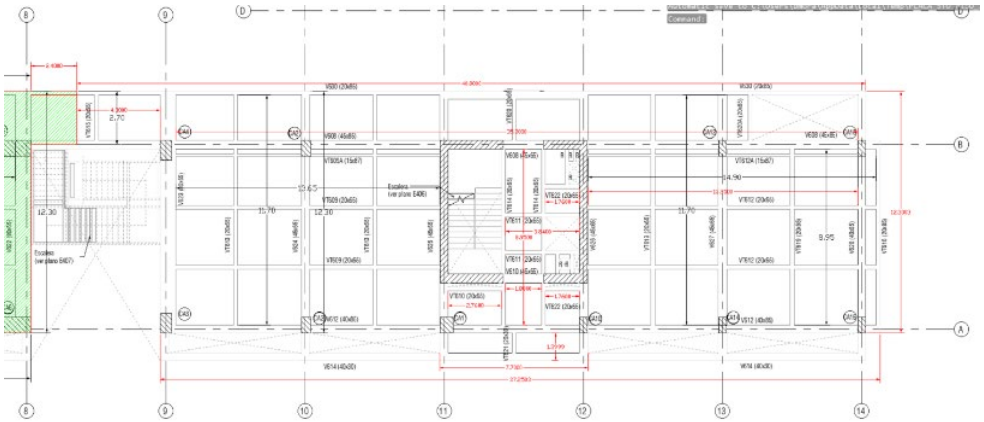PLACA QUINTO PISO - ZONA AULAS
EJE 8'-14 / A-B



Observaciones	

HOJA 6 DE 8

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 035 Suministro e instalación de viga aérea en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.	UND.	M3	REF.	HOJA 7 DE 8

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

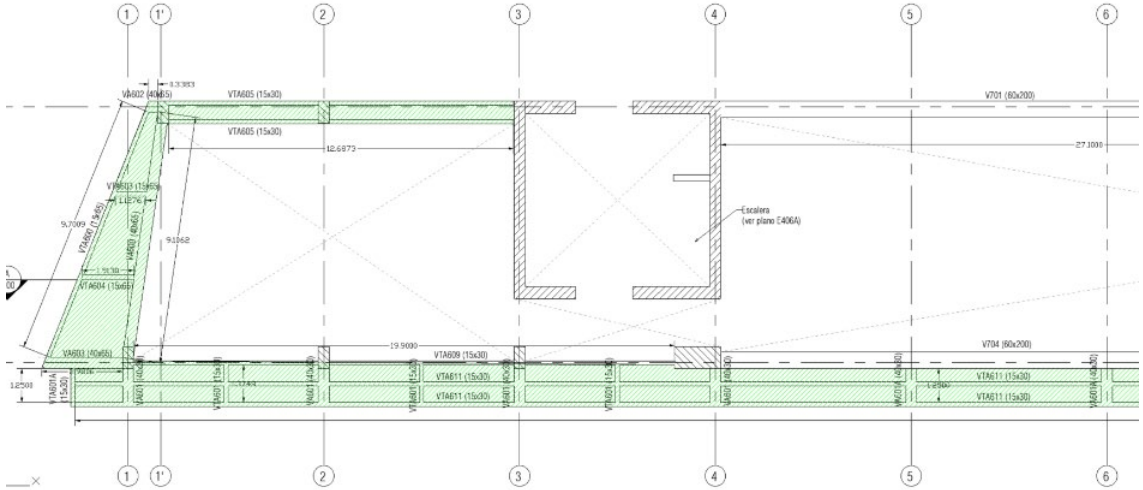PLACA QUINTO A



Observaciones	

HOJA 7 DE 8

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ	ACTA NO 16	


		FECHA	DIA 5 MES 12 AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTAS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 035 Suministro e instalación de viga aérea en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.	UND.	M3	REF.	HOJA 8 DE 8

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

CROQUIS

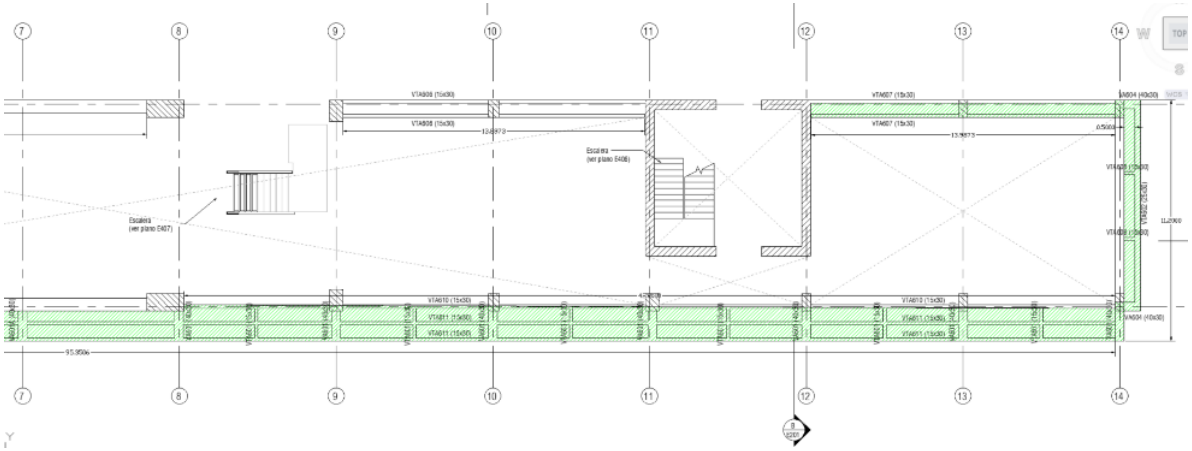PLACA QUINTO A



Observaciones	

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED / Logia3 Desarrollo de Proyectos e Ideas / Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS		

CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 36 Construcción de Micropilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.20m H=2m, (Incluye prehuecos, excavación, transporte, armado y desmonte de equipos, suministro de concreto). No incluye suministro de acero.	UND.	ml	REF.	HOJA 1 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS: LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL (kg)	VANOS: L	a	h	V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
					-				-	-	
Costado ludoteca rampa			2,00	6,00	12,00				-	12,00	
Costado ludoteca			2,00	21,00	42,00				-	42,00	
cerramiento acceso infantil			2,00	6,00	12,00				-	12,00	
zona bicicletero			2,00	20,00	40,00				-	40,00	
gradas zona verde			2,00	8,00	16,00				-	16,00	
gradas zona verde			2,00	11,00	22,00				-	22,00	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
									VIENE	-	
									TOTAL	144,00	

Observaciones

HOJA 1 DE 2

Director de obra	Director Interventoría
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos	Ing. Luis Santiago Cely Báez
Residente de obra	Residente Interventoría
Ing. David Alberto Morales Sanchez	Ing. Oscar Iván Salamanca


MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

		FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ				
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 36 Construcción de Micropilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.20m H=2m, (Incluye prehuecos, excavación, transporte, armado y desmonte de equipos, suministro de concreto). No incluye suministro de acero.	UND.	ml	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			

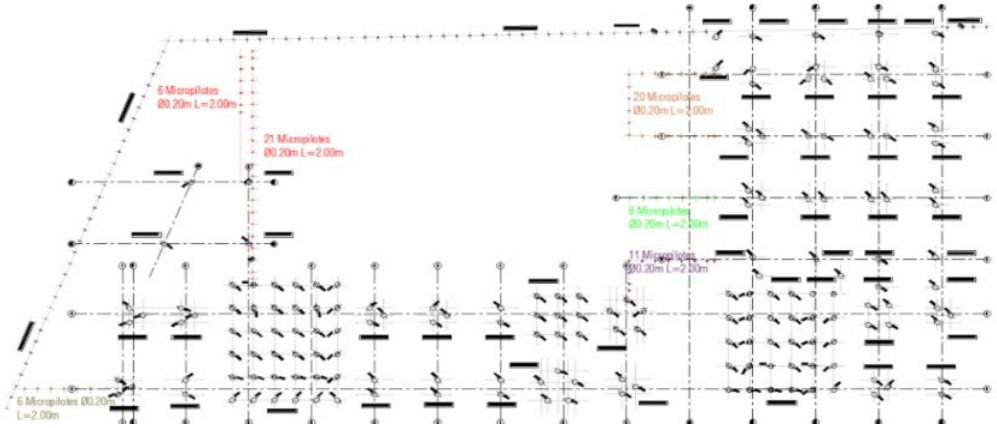CROQUIS



CRONOLOGÍA DE ÁREAS COBRADAS

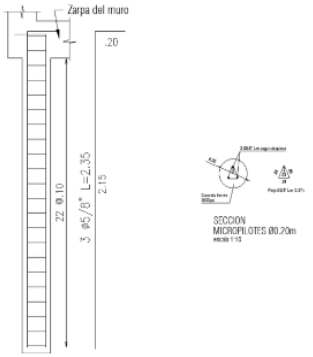

DETALLE REFUERZO DE MICROPILOTES
escala 1:25

Observaciones	
	HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		ACTA NO 16
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · BOGOTÁ Secretaría de Educación	

FECHA DIA 5 MES 12 AÑO 2025

CONTRATISTA CONSORCIO NOVAURBANO SED


DIRECTOR TECNICO ARQ. MONICA ALVAREZ

INTERVENTORIA LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

CONTRATO OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

CAPITULO	NO PREVISTOS			REF.	CONTRACTUAL
ITEM	NP 037 Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø3/8" L:9cm	UND.	UN	REF.	HOJA 1 DE 2

AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	CANT ANCLAJES	CANT ELEMENTOS		L	a	h			
murete en concreto sotano para placa N. 3,50 - Sotano					-				-		
					-				-	-	
Eje 11-13 / B-D			71,00	4,00	284,00					284,00	
Eje 11-13 / B-D			55,00	1,00	55,00					55,00	
Eje 11-13 / G			82,00	3,00	246,00				-	246,00	
Eje 11-13 / G			110,00	2,00	220,00				-	220,00	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
					-				-	-	
TOTAL										805,00	

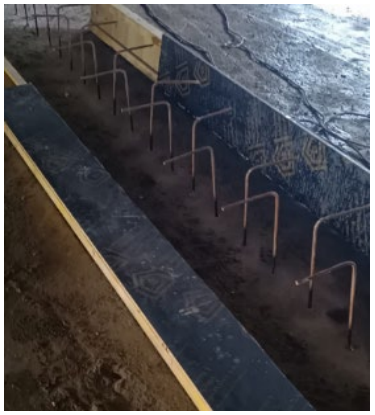

Observaciones

Director de obra
Arq. Monica Paola Alvarez Rios

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sanchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

MEMORIAS DE REVISIÓN CANTIDADES DE OBRA		COLEGIO GENERAL SANTANDER	CPF: 138
PROYECTO: cuyo objeto es: "Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito"	CONSORCIO URBANOVA SED · Logia 3 · Secretaria de Educación D.C Sub Dirección de Plantas · ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA	ACTA NO 16	

CONTRATISTA	CONSORCIO URBANOVA SED	FECHA	DIA 5	MES 12	AÑO 2025
DIRECTOR TÉCNICO	ARQ. MÓNICA ÁLVAREZ	CONTRATO OBRA No.	CO1.PCCNTR.5698312		
INTERVENTORÍA	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS				


CAPITULO	ACTIVIDADES NO PREVISTOS			REF.	CONTRACTUAL
ÍTEM:	NP. 09 Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, H=0,28m, para cimentación de Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m.	UND.	ML	REF.	HOJA 2 DE 2

ÁREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				TOTAL (kg)	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	FOTOS
	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			


CROQUIS




N. -3,90m



N. -0,06m



N. 3,90m



Bordillos rojos cobrados actas anteriores

Observaciones	

HOJA 2 DE 2

Director de obra
Arq. Mónica Paola Álvarez Ríos

Residente de obra
Ing. David Alberto Morales Sánchez

Director Interventoría
Ing. Luis Santiago Cely Báez

Residente Interventoría
Ing. Oscar Iván Salamanca

Acta de mayores y menores cantidades de obra

ALCALDIA MAYOR
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS

ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES No. 16

CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.5698312

OBJETO DEL CONTRATO Ejecución de las obras de urbanismo, demolición total, cerramiento y construcción obra nueva de la planta física del colegio General Santander ubicado en la localidad de Usaquén, del Distrito Capital, de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación del Distrito

CONTRATISTA :	CONSORCIO URBANOVA SED	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**$ 40.020.746.260,00**
DIRECCION :	Cra 7 #155c-20 OF 3301	**ANTICIPO (30 %)**	**$ 12.006.223.878,00**
C.C. ó NIT :	901.784.778-3	**VALOR ADICIONES**	
TELEFONO :	311 2377824	**VR. RESOL., RECON, TRANS.**	
INTERVENTOR :	LOGIA 3 ASOCIADOS SAS	**VR. TOTAL CONTRATO**	**$ 40.020.746.260,00**
		% A.I.U. DEL CONTRATO	**28,41%**

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA

CAPITULO	SUBC	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL	CANTIDAD REAL	VARIACIÓN CANTIDAD	V. COSTO DIRECTO UNITARIO	V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO	V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES	VARIACIÓN TOTAL	% INCIDENCIA PRESUP.
					1	2	3	4	5	6	7	4c
					DATO CONTRATO	DATO ESTUDIO	(2-1)	DATO CONTRATO	1 X 3	2 X 3	(6-5)	4a/Total 4a
ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
1			PRELIMINARES						$ 555.597.216,00	$ 602.668.863,00	$ 47.071.647,00	1,51%
	1,1		**REPLANTEO**						**$ 55.702.640,00**	**$ 67.555.483,00**	**$ 11.852.843,00**	0,17%
		1.1.1	Localización, trazado y replanteo con elementos de precisión.	m²	6.014,99	11.275,18	5.260,19	$ 2.771,00	$ 16.667.537,00	$ 31.243.524,00	$ 14.575.987,00	0,08%
		1.1.2	Descapote manual y retiro, de acuerdo con la geología local descrita en el informe de suelos.	m³	541,56	503,78	-37,78	$ 72.079,00	$ 39.035.103,00	$ 36.311.959,00	-$ 2.723.144,00	0,09%
	1,2		**DESMONTE Y DEMOLICIONES**						**$ 499.894.576,00**	**$ 535.113.380,00**	**$ 35.218.804,00**	1,34%
		1.2.1	Demolición de pavimentos en concreto y/o adoquín de arcilla o concreto, espesor hasta 15cm. Incluye retiro de RCD y disposición final.	m²	1.611,51	2.463,45	851,94	$ 52.069,00	$ 83.909.714,00	$ 128.269.378,00	$ 44.359.664,00	0,32%
		1.2.2	Demolición de cañuelas, cunetas y/o cárcamos en concreto para recolección de aguas lluvias, hasta un a=0.5m y e=0.4m.	m	179,47	183,71	4,24	$ 54.837,00	$ 9.841.596,00	$ 10.074.105,00	$ 232.509,00	0,03%
		1.2.3	Desmonte de cubiertas en tejas de láminas metálicas de bajo calibre con desmonte de la perfilería para la subestructura de cubierta. Incluye disposición final.	m²	2.068,28	1.000,10	-1.068,18	$ 17.521,00	$ 36.238.334,00	$ 17.522.752,00	-$ 18.715.582,00	0,04%
		1.2.4	Demolición manual y con maquinaría pesada de edificaciones con estructura en pórticos de concreto y muros en mampostería en ladrillos huecos de arcilla. Incluye el retiro y suspensión de redes eléctricas, luminarias, tomacorrientes, equipos, redes hidro sanitarias, redes de gas y cualquier otra red existente; el retiro de las tuberías incluye el de los conductores a su interior. Incluye el desmonte de puertas y ventanas en cualquier material. Incluye la demolición de pisos y/o placas aéreas de piso y contrapiso. Incluye el desmonte de muebles fijos, aparatos hidrosanitarios, retiro de mobiliario dotacional, etc. Incluye la demolición de la estructura en concreto de la edificación, así como la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo , también incluye la demolición de las escaleras o elementos de circulación vertical. Incluye el desmonte de divisiones o cerramientos en muros livianos. Incluye la demolición de muros divisiorios o de fachada en mampostería de ladrillos huecos de arcilla. Incluye la disposición final de cada uno de los tipos de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.	m²	2.065,76	2.203,99	138,23	$ 123.744,00	$ 255.625.405,00	$ 272.730.539,00	$ 17.105.134,00	0,68%
		1.2.5	Demolición de cimentaciones superficiales de edificaciones de uno y dos niveles en concreto reforzado hasta 1.5m de profundidad. Incluye la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo y la disposición final de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.	m²	1.695,68	1.613,64	-82,04	$ 41.893,00	$ 71.037.122,00	$ 67.600.221,00	-$ 3.436.901,00	0,17%
		1.2.6	Demolición de estructuras aisladas en concreto reforzado con sus cimentaciones. Incluye la separación del Suministro e instalación de acero de refuerzo y la disposición final de materiales de acuerdo con las indicaciones de los entes reguladores en temas ambientales.	m³	47,41	220,78	173,37	$ 131.593,00	$ 6.238.824,00	$ 29.053.103,00	$ 22.814.279,00	0,07%
		1.2.7	Retiro y disposición final de puntos de recolección de residuos o canecas de basura, l=2m x a=0.6m x h=1.2m.	Und	4,00	4,00		$ 31.661,00	$ 126.644,00	$ 126.644,00		0,00%
		1.2.8	Desmonte y disposición final de juegos infantiles de 2.00m x 3.00m.	Und	1,00		-1,00	$ 482.628,00	$ 482.628,00		-$ 482.628,00	
		1.2.9	Desmonte y disposición final de estructuras de canchas deportivas con arco y soporte para tablero.	Und	2,00		-2,00	$ 388.851,00	$ 777.702,00		-$ 777.702,00	
		1.2.10	Demolición de muro de cerramiento en mampostería confinada, incluye demolición de la cimentación superficial hasta una profundidad de 1.5m bien sea corrida o aislada. Incluye retiro de RCD y disposición final. A ejecutar en fase final de obra.	m²	694,31		-694,31	$ 36.357,00	$ 25.243.029,00		-$ 25.243.029,00	
		1.2.11	Demolición y retiro de cerramiento en reja metálica, incluye demolición de la cimentación superficial hasta una profundidad de 1.5m bien sea corrida o aislada. A ejecutar en fase final de obra.	m²	384,94	368,84	-16,10	$ 26.398,00	$ 10.161.646,00	$ 9.736.638,00	-$ 425.008,00	0,02%
		1.2.12	Retiro y disposición final de postes metálicos de Ø4", incluye retiro de malla liviana.	m	31,50		-31,50	$ 6.728,00	$ 211.932,00		-$ 211.932,00	

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
2			EXCAVACIONES Y RELLENOS						$ 633.616.976,00	$ 580.007.365,00	-$ 53.609.611,00	1,45%
	2,1		**EXCAVACIONES**						**$ 373.706.392,00**	**$ 423.882.858,00**	**$ 50.176.466,00**	1,06%
		2.1.1	Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio autorizado).	m³	6.098,74	6.917,60	818,86	$ 61.276,00	$ 373.706.392,00	$ 423.882.858,00	$ 50.176.466,00	1,06%
	2,2		**RELLENOS**						**$ 259.910.584,00**	**$ 156.124.507,00**	**-$ 103.786.077,00**	0,39%
		2.2.1	Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y compactación).	m³	695,68	1.400,76	705,08	$ 111.457,00	$ 77.538.406,00	$ 156.124.507,00	$ 78.586.101,00	0,39%
		2.2.2	B15 - Suministro e instalación de sub-base granular, según estudio de suelos. Espesor y acabado según pliego de condiciones.	m³	894,23		-894,23	$ 146.743,00	$ 131.221.993,00		-$ 131.221.993,00	
		2.2.3	Suministro e instalación de geotextil NT2000.	m²	4.471,17		-4.471,17	$ 11.440,00	$ 51.150.185,00		-$ 51.150.185,00	
3			ESTRUCTURAS						$ 20.455.827.035,00	$ 12.973.777.994,00	-$ 7.482.049.041,00	32,42%
	3,1		**SUBESTRUCTURA - CIMENTACIÓN**						**$ 11.935.662.088,00**	**$ 4.237.570.862,00**	**-$ 7.698.091.226,00**	10,59%
		3.1.1	Suministro e instalación de pilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.5m, de 24.5MPa. (Incluye prehuecos, excavación, retiro de material, transporte, armado y desmonte de equipos, no incluye acero).	m	4.105,68		-4.105,68	$ 351.239,00	$ 1.442.074.938,00		-$ 1.442.074.938,00	
		3.1.2	Suministro e instalación de pilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.8m, de 24.5MPa. (Incluye prehuecos, excavación, retiro de material, transporte, armado y desmonte de equipos, no incluye acero).	m	3.717,00		-3.717,00	$ 755.639,00	$ 2.808.710.163,00		-$ 2.808.710.163,00	
		3.1.3	Suministro e instalación de concreto de limpieza de 14.5MPa, e=0,05m.	m²	658,58	1.653,08	994,50	$ 43.841,00	$ 28.872.806,00	$ 72.472.680,00	$ 43.599.874,00	0,18%
		3.1.4	Suministro e instalación de dados de cimentación en concreto reforzado de 28MPa.	m³	1.351,50	1.062,93	-288,57	$ 920.532,00	$ 1.244.098.998,00	$ 978.461.079,00	-$ 265.637.919,00	2,44%
		3.1.5	Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 28MPa (incluye vibrado y curado). No incluye acero.	m³	51,59	122,77	106,18	$ 924.431,00	$ 47.691.395,00	$ 113.492.394,00	$ 65.800.999,00	0,28%
		3.1.6	Suministro e instalación de vigas de amarre en concreto 35MPa (incluye vibrado y curado). No incluye acero.	m³	11,75	11,75		$ 984.328,00	$ 11.565.854,00	$ 11.565.854,00		0,03%
		3.1.7	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Cimentación.	kg	905.356,01	435.705,58	-469.650,43	$ 6.606,00	$ 5.980.781.802,00	$ 2.878.271.061,00	-$ 3.102.510.741,00	7,19%
		3.1.8	Suministro e instalación de muros de contención y tanques en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto.	m³	164,02	164,02		$ 818.121,00	$ 134.188.206,00	$ 134.188.206,00		0,34%
		3.1.9	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros de contención y tanques en concreto.	kg	22.447,15		-22.447,15	$ 6.606,00	$ 148.285.873,00		-$ 148.285.873,00	
		3.1.10	Descabece de pilotes en concreto 24.5MPa h=2m Ø0.5m.	Und	134,00		-134,00	$ 116.651,00	$ 15.631.234,00		-$ 15.631.234,00	
		3.1.11	Descabece de pilotes en concreto 24.5MPa h=2m Ø0.8m.	Und	131,00		-131,00	$ 188.101,00	$ 24.641.231,00		-$ 24.641.231,00	
		3.1.12	Suministro e instalación de zarpas de cimentación de muros en concreto reforzado de 28MPa.	m³	53,36	53,36		$ 920.532,00	$ 49.119.588,00	$ 49.119.588,00		0,12%
	3,2		**SUPERESTRUCTURA - CONCRETO**						**$ 8.019.546.648,00**	**$ 8.235.588.833,00**	**$ 216.042.185,00**	20,58%
		3.2.1	Suministro e instalación de muros pantalla en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto.	m³	567,93	567,93		$ 981.657,00	$ 557.512.460,00	$ 557.512.460,00		1,39%
		3.2.2	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Muros pantalla.	kg	138.267,91	598.085,08	459.817,17	$ 6.606,00	$ 913.397.813,00	$ 3.950.950.038,00	$ 3.037.552.225,00	9,87%
		3.2.3	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Nivel sótano.	m³	3,75	49,09	45,34	$ 981.657,00	$ 3.681.214,00	$ 48.189.542,00	$ 44.508.328,00	0,12%
		3.2.4	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas nivel sótano.	kg	1.121,43		-1.121,43	$ 6.606,00	$ 7.408.167,00		-$ 7.408.167,00	
		3.2.5	Suministro e instalación de placas de contrapiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Incluye formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel.	m³	8,92	136,34	127,42	$ 886.558,00	$ 7.908.097,00	$ 120.873.318,00	$ 112.965.221,00	0,30%
		3.2.6	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placas de contrapiso de sótano y primer nivel.	kg	588,38		-588,38	$ 6.606,00	$ 3.886.838,00		-$ 3.886.838,00	
		3.2.7	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel.	m³	62,82	62,97	0,15	$ 981.657,00	$ 61.667.693,00	$ 61.814.941,00	$ 147.248,00	0,15%
		3.2.8	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas primer nivel.	kg	18.786,15		-18.786,15	$ 6.606,00	$ 124.101.307,00		-$ 124.101.307,00	
		3.2.9	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	m³	247,01	559,10	312,09	$ 1.039.665,00	$ 256.807.652,00	$ 581.276.702,00	$ 324.469.050,00	1,45%
		3.2.10	Suministro e instalación de Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa segundo nivel.	kg	29.658,63		-29.658,63	$ 6.606,00	$ 195.924.910,00		-$ 195.924.910,00	
		3.2.11	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	m³	44,81	73,11	28,30	$ 981.657,00	$ 43.988.050,00	$ 71.768.943,00	$ 27.780.893,00	0,18%
		3.2.12	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas segundo nivel.	kg	13.400,31		-13.400,31	$ 6.606,00	$ 88.522.448,00		-$ 88.522.448,00	
		3.2.13	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.	m³	307,96	516,41	208,45	$ 1.039.665,00	$ 320.175.233,00	$ 536.893.403,00	$ 216.718.170,00	1,34%
		3.2.14	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa tercer nivel.	kg	38.895,59		-38.895,59	$ 6.606,00	$ 256.944.268,00		-$ 256.944.268,00	
		3.2.15	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.	m³	46,44	50,40	3,96	$ 981.657,00	$ 45.588.151,00	$ 49.475.513,00	$ 3.887.362,00	0,12%
		3.2.16	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas tercer nivel.	kg	13.887,76		-13.887,76	$ 6.606,00	$ 91.742.543,00		-$ 91.742.543,00	
		3.2.17	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	m³	271,75	393,85	122,10	$ 1.039.665,00	$ 282.528.964,00	$ 409.472.060,00	$ 126.943.096,00	1,02%
		3.2.18	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa cuarto nivel.	kg	36.566,78		-36.566,78	$ 6.606,00	$ 241.560.149,00		-$ 241.560.149,00	

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		3.2.19	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	m³	46,18	46,18		$ 981.657,00	$ 45.332.920,00	$ 45.332.920,00		0,11%
		3.2.20	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas cuarto nivel.	kg	13.810,00		-13.810,00	$ 6.606,00	$ 91.228.860,00		-$ 91.228.860,00	
		3.2.21	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Quinto nivel.	m³	276,37	336,00	59,63	$ 1.039.665,00	$ 287.332.216,00	$ 349.327.440,00	$ 61.995.224,00	0,87%
		3.2.22	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa quinto nivel.	kg	41.328,28		-41.328,28	$ 6.606,00	$ 273.014.618,00		-$ 273.014.618,00	
		3.2.23	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Quinto nivel.	m³	54,41	54,41		$ 981.657,00	$ 53.411.957,00	$ 53.411.957,00		0,13%
		3.2.24	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas quinto nivel.	kg	16.271,16		-16.271,16	$ 6.606,00	$ 107.487.283,00		-$ 107.487.283,00	
		3.2.25	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Sexto nivel.	m³	465,34	465,34		$ 1.039.665,00	$ 483.797.711,00	$ 483.797.711,00		1,21%
		3.2.26	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa sexto nivel.	kg	59.687,52		-59.687,52	$ 6.606,00	$ 394.295.757,00		-$ 394.295.757,00	
		3.2.27	Suministro e instalación de columna en concreto de 35MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Sexto nivel.	m³	42,62	42,62		$ 981.657,00	$ 41.838.221,00	$ 41.838.221,00		0,10%
		3.2.28	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas sexto nivel.	kg	12.745,40		-12.745,40	$ 6.606,00	$ 84.196.112,00		-$ 84.196.112,00	
		3.2.29	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 35MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cubierta.	m³	331,88	331,88		$ 1.039.665,00	$ 345.044.020,00	$ 345.044.020,00		0,86%
		3.2.30	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa cubierta.	kg	45.516,58		-45.516,58	$ 6.606,00	$ 300.682.527,00		-$ 300.682.527,00	
		3.2.31	Suministro e instalación de columna en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Nivel sótano.	m³	18,89		-18,89	$ 925.087,00	$ 17.474.893,00		-$ 17.474.893,00	
		3.2.32	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas nivel sótano.	kg	4.869,53		-4.869,53	$ 6.606,00	$ 32.168.115,00		-$ 32.168.115,00	
		3.2.33	Suministro e instalación de placa de contrapiso y aligerada en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel y sótano.	m³	622,12	481,32	-140,80	$ 983.094,00	$ 611.602.439,00	$ 473.182.804,00	-$ 138.419.635,00	1,18%
		3.2.34	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa primer nivel.	kg	45.016,76		-45.016,76	$ 6.606,00	$ 297.380.717,00		-$ 297.380.717,00	
		3.2.35	Suministro e instalación de columna en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Primer nivel.	m³	25,68		-25,68	$ 925.087,00	$ 23.756.234,00		-$ 23.756.234,00	
		3.2.36	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas primer nivel.	kg	6.619,88		-6.619,88	$ 6.606,00	$ 43.730.927,00		-$ 43.730.927,00	
		3.2.37	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	m³	79,80		-79,80	$ 983.094,00	$ 78.450.901,00		-$ 78.450.901,00	
		3.2.38	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa segundo nivel.	kg	11.085,03		-11.085,03	$ 6.606,00	$ 73.227.708,00		-$ 73.227.708,00	
		3.2.39	Suministro e instalación de columna en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Segundo nivel.	m³	25,38		-25,38	$ 925.087,00	$ 23.478.708,00		-$ 23.478.708,00	
		3.2.40	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas segundo nivel.	kg	6.542,55		-6.542,55	$ 6.606,00	$ 43.220.085,00		-$ 43.220.085,00	
		3.2.41	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.	m³	186,53		-186,53	$ 983.094,00	$ 183.376.524,00		-$ 183.376.524,00	
		3.2.42	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa tercer nivel.	kg	22.773,19		-22.773,19	$ 6.606,00	$ 150.439.693,00		-$ 150.439.693,00	
		3.2.43	Suministro e instalación de columna en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Tercer nivel.	m³	16,40		-16,40	$ 925.087,00	$ 15.171.427,00		-$ 15.171.427,00	
		3.2.44	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas tercer nivel.	kg	4.227,65		-4.227,65	$ 6.606,00	$ 27.927.856,00		-$ 27.927.856,00	
		3.2.45	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	m³	56,64		-56,64	$ 983.094,00	$ 55.682.444,00		-$ 55.682.444,00	
		3.2.46	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa cuarto nivel.	kg	6.934,00		-6.934,00	$ 6.606,00	$ 45.806.004,00		-$ 45.806.004,00	
		3.2.47	Suministro e instalación de columna en concreto de 28MPa premezclado, acabado a la vista con filos redondeados, formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cuarto nivel.	m³	15,90		-15,90	$ 925.087,00	$ 14.708.883,00		-$ 14.708.883,00	
		3.2.48	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Columnas cuarto nivel.	kg	4.098,76		-4.098,76	$ 6.606,00	$ 27.076.409,00		-$ 27.076.409,00	
		3.2.49	Suministro e instalación de placa aligerada de entrepiso en concreto 28MPa, h=0.65m - 0.85m. Contempla los tipos de placa con viga descolgada, placa con torta sencilla y placa invertida. Acabado a la vista, incluye aligeramiento y formaleta en madera aglomerada protegida con resina polimérica melamínica. Incluye armado y desencofrado de formaleta, vaciado y curado del concreto. Cubierta.	m³	119,51		-119,51	$ 983.094,00	$ 117.489.564,00		-$ 117.489.564,00	
		3.2.50	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Placa cubierta.	kg	13.715,41		-13.715,41	$ 6.606,00	$ 90.603.998,00		-$ 90.603.998,00	
		3.2.51	A2 - Suministro e instalación de escalera en concreto reforzado de 28 Mpa. Cantidad y disposición del refuerzo, tipos de anclaje a la estructura, dimensiones y espesor según cálculos y diseño estructural. Vaciado sobre formaleta metálica, acabado según detalle arquitectónico.	m³	36,38	56,38	20,00	$ 983.094,00	$ 35.764.960,00	$ 55.426.840,00	$ 19.661.880,00	0,14%
	3,3		**SUPERESTRUCTURA - ACERO**						**$ 500.618.299,00**	**$ 500.618.299,00**		1,25%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		3.3.1	Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para vigas, viguetas y correas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. (Incluye perfiles tubulares, platinas y soldadura E7018, limpieza de superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + acabado en pintura epóxica color RAL9017 "negro tráfico", pernos de conexión ASTM A354).	kg	25.670,54	25.670,54		$ 18.552,00	$ 476.239.858,00	$ 476.239.858,00		1,19%
		3.3.2	Suministro e instalación de estructura en acero estructural al carbón para columnas ASTM A500, grado: C, 322 MPa. (Incluye perfiles tubulares, platinas y soldadura E7018, limpieza de superficie tipo SSPC-SP3, pintura anticorrosiva + acabado en pintura epóxica color RAL9017 "negro tráfico", pernos de conexión ASTM A354).	kg	1.314,06	1.314,06		$ 18.552,00	$ 24.378.441,00	$ 24.378.441,00		0,06%
4			MUROS Y PAÑETES						$ 2.210.566.079,00	$ 2.126.727.224,00	-$ 83.838.855,00	5,31%
	4,1		MUROS MAMPOSTERÍA						$ 1.613.284.905,00	$ 1.618.534.197,00	$ 5.249.292,00	4,04%
		4.1.1	C11 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	m²	2.783,35	2.783,35		$ 211.390,00	$ 588.372.357,00	$ 588.372.357,00		1,47%
		4.1.2	Suministro e instalación de muro en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, montado en zig zag con aparejo completo, color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.	m²	530,87	530,87		$ 308.767,00	$ 163.915.137,00	$ 163.915.137,00		0,41%
		4.1.3	Suministor e instalación de muro en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, aparejo calado con desplazamiento a medios, color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.	m²	376,84	376,84		$ 172.941,00	$ 65.171.086,00	$ 65.171.086,00		0,16%
		4.1.4	C12 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x14x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas dispuestas a tercios con un 1 cm de pega, repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla para juntas de muros y fachaletas de ladrillo Gran Formato Cobrizo. Lavado con hidrófugo. Recomendaciones para la disposición del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	m²	525,06	525,06		$ 221.504,00	$ 116.302.890,00	$ 116.302.890,00		0,29%
		4.1.5	Suministro e instalación de muro en mampostería de bloques de arcilla de perforación horizontal estriados, unidades de 9cm x 23cm x 33cm, aparejo tipo pandereta a medios. Mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, espesor de 1cm.	m²	4.016,08	4.016,08		$ 49.441,00	$ 198.559.011,00	$ 198.559.011,00		0,50%
		4.1.6	C19 - Suministro e instalación de muro calado en espina en Ladrillo Tolete Gran Formato color Cobrizo 39x11.5x5 cm de textura rugosa a la vista. Instalación: hiladas intercaladas dispuestas en forma de espina de pescado con un 1 cm de pega entre ellos segun diseño arquitectónico. Repellado a ras con emboquillado del mismo tono del ladrillo a 1 cm de profundidad y lavado con hidrófugo. Adovelados con Suministro e instalación de acero de refuerzo en sentido vertical según cálculo estructural y anclados al borde de placa a una profundidad mínima a 10 veces el diámetro de la varilla, mediante epóxico. Las ventanas para el adovelado deben realizarse por la cara que no quede a la vista, en la longitud completa, y cubrirse con chapa una vez llenado. Recomendaciones para la disposición, instalación y destribución del refuerzo y llenado de las celdas en planos estructurales.	m²	251,76	251,76		$ 240.712,00	$ 60.601.653,00	$ 60.601.653,00		0,15%
		4.1.7	C4 - Suministro e instalación de canal de vidrio translucido en forma de "Taslapado" con 6 mm de espesor, 26.02 cm de ancho, pestaña de 4 cm, aleta de 4.01 y moduladas a una longitud de 1.00 m para reemplazo en caso de daño.De Textura Transluz y color natular. instalación de configuración traslapada (a una cara), con dilataciones de 1 mm entre canales y sellamiento de silicona. Perfil superior tipo c y perfil inferior tipo angulo doble y empaque en poliuretano.	m²	513,93	513,93		$ 204.106,00	$ 104.896.197,00	$ 104.896.197,00		0,26%
		4.1.8	Suministro e instalación de arranque y anclaje superior epóxico en varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L=0.8m para columnetas de confinamiento en muros en ladrillo estriado, y para dovelas de refuerzo de muros en ladrillo gran formato.	und	2.357,00	2.631,00	274,00	$ 19.158,00	$ 45.155.406,00	$ 50.404.698,00	$ 5.249.292,00	0,13%
		4.1.9	Suministro e instalación de columnetas, viguetas y/o vigas cinta en concreto de 21MPa para confinamiento de muros en mampostería.	m³	9,27	9,27		$ 937.290,00	$ 8.688.678,00	$ 8.688.678,00		0,02%
		4.1.10	Suministro e instalación de acero de refuerzo 60000 PSI. Vigas cinta.	kg	741,37	741,37		$ 6.606,00	$ 4.897.490,00	$ 4.897.490,00		0,01%
		4.1.11	Suministro e instalación de dóvelas de refuerzo en concreto de alta fluidez tipo 'grouting' para refuerzo de mampostería reforzada, f'c 21MPa, l=0.06m x a=0.05m. Incluye varilla de refuerzo.	m	12.500,00	12.500,00		$ 20.538,00	$ 256.725.000,00	$ 256.725.000,00		0,64%
	4,2		MUROS LIVIANOS						$ 326.076.187,00	$ 326.076.187,00		0,81%
		4.2.1	C3 - Suministro e instalación de divisiones interiores en policarbonato multicell Danpal de 16 mm ancho 1040mm color clear con acabado softlite DG +conectores autoportante U70 cada 1040 mm para vencer luz de 3 mts+ UPD y ángulos de aluminio (acabado Gris nopal) perimetrales para enmarcar el producto. Perfil inferior instalado al nivel del mortero de nivelación y anclado mediante tornillería a la estructura de piso, techo y pared. Ref: Danpal de 16 mm ancho 1040mm color clear con acabado softlite DG o equivalente.	m²	59,60	59,60		$ 220.562,00	$ 13.145.495,00	$ 13.145.495,00		0,03%
		4.2.2	Suministro e instalación de muro acústico formados por paneles en lámina de madera aglomerada con perforaciones del 30.42% y ranuras de 3.2mm, @16mm, paneles de 0.6m x 1.2m, acabado con chapilla de madera natural especie Flormorado nacional, tabebuia rosea, humedad relativa entre 0% a 15%, e=16mm; instalado completamente a nivel con puntilla sin cabeza. Estructurado con parales de madera, sección de 1" x 2", armados @0.6m. Incluye acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de roca, e=1", densidad de 100kg/m³, instalada entre los parales de madera. Referencia RP16 similar o equivalente.	m²	78,51	78,51		$ 518.750,00	$ 40.727.063,00	$ 40.727.063,00		0,10%
		4.2.3	Suministro e instalación de muro en lámina de fibrocemento e=10mm, doble cara e=0.11m, acabado liso, uniones y filos resanados; instalado completamente a plomo. Estructurado con rieles y parales de acero galvanizado ASTM A653 forma en c, 3-5/8"y 3-1/2" respectivamente, calibre 20, armado cada 50cm en una dirección. Anclado con tornillería de cabeza o fulminantes.	m²	9,46	9,46		$ 158.480,00	$ 1.499.221,00	$ 1.499.221,00		0,00%
		4.2.4	Suministro e instalación de muro en lámina de madera aglomerada con recubrimiento melamínico resistente a la humedad RH, referencia Rovere o equivalente, e=18mm, instalado con cinta doble faz con espuma de polietileno y adhesivo acrílico de 1mm; adicionalmente instalado con chazo expandible plástico para mampostería de 1/4" con tornillo para madera aglomerada #6 1-5/8" irizado.	m²	423,55	423,55		$ 133.511,00	$ 56.548.584,00	$ 56.548.584,00		0,14%
		4.2.5	Suministro e instalación de muro de recubrimiento en lámina metálica de acero cold rolled, calibre 14, fabricada con planchas de acero. Estructurado con perfiles tubulares de acero negro, 50mm x 50mm x 2mm. Recubrimiento con dos capas de pintura anticorrosiva y tres capas de pintura en esmalte aplicada con aerógrafo color RAL9017 "negro tráfico".	m²	509,22	509,22		$ 198.172,00	$ 100.913.146,00	$ 100.913.146,00		0,25%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		4.2.6	Suministro e instalación de muro autoportante para cuartos fríos en paneles tipo sándwich, e=100mm, construidos en caras externas con láminas de acero calibre 26, núcleo de poliisocianurato (PIR), acabado en pintura a base de poliéster color RAL9002 "Blanco gris", sistema de encastre tipo machimbrado.	m²	68,31	68,31		$ 370.649,00	$ 25.319.033,00	$ 25.319.033,00		0,06%
		4.2.7	Suministro e instalación de muro en paneles acústicos formados por listones de madera aglomerada recubiertos con chapilla de madera natural especie Flormorado Nacional tabebuia rosea, listones de 3cm x 6cm colocados @6cm, formato de panel de 0.6m x 1.2m, humedad relativa entre 0% a 15%, e=45mm; instalado completamente a plomo con puntilla sin cabeza. Estructurado con parales de madera, sección de 1" x 2", armados @0.6m. Incluye acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de roca, e=1", instalada entre los parales de madera.	m²	235,81	235,81		$ 372.858,00	$ 87.923.645,00	$ 87.923.645,00		0,22%
	4,3		**PAÑETES**						**$ 271.204.987,00**	**$ 182.116.840,00**	**-$ 89.088.147,00**	0,46%
		4.3.1	Suministro e instalación de mortero de pañete para muros de mampostería de cemento y arena 1:3.5 f'cp 12.5MPa, e=1.5cm.	m²	4.992,84	4.747,21	-245,63	$ 23.525,00	$ 117.456.561,00	$ 111.678.021,00	-$ 5.778.540,00	0,28%
		4.3.2	Suministro e instalación de estuco plástico, tres manos, incluye filos y dilataciones.	m²	9.597,28	4.396,93	-5.200,35	$ 16.020,00	$ 153.748.426,00	$ 70.438.819,00	-$ 83.309.607,00	0,18%
5			**IMPERMEABILIZACIONES**						**$ 298.714.892,00**	**$ 238.219.058,00**	**-$ 60.495.834,00**	**0,60%**
	5,1		**CUBIERTAS**						**$ 81.719.242,00**	**$ 81.719.242,00**		0,20%
		5.1.1	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización líquido multicapa con solución de asfaltos refinados. Primera capa de imprimante a base de asfaltos refinados de alta adherencia, una mano, color negro, aplicado con rodillo. Segunda y cuarta capa de solución densa de asfaltos refinados reforzada con elastómeros, adhesivos y compuestos plastificantes, con protección impermeable con aditivo anti-raíz, dos manos, resistente al vapor, color negro, aplicado con brocha o llana metálica. Tercera capa con tela de refuerzo de poliéster no tejido, color negro, extendido sobre primera capa de solución densa.	m²	250,00	250,00		$ 85.226,00	$ 21.306.500,00	$ 21.306.500,00		0,05%
		5.1.2	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización para cubiertas planas rígidas con membrana de policloruro de vinilo (PVC) de alta calidad con refuerzo en fibra de vidrio no tejido, e=1.5mm.	m²	299,23	299,23		$ 201.894,00	$ 60.412.742,00	$ 60.412.742,00		0,15%
	5,2		**TANQUES**						**$ 216.995.650,00**	**$ 156.499.816,00**	**-$ 60.495.834,00**	0,39%
		5.2.1	Suministro e instalacion de sistema de impermeabilizacion en muros para tanques de agua con membrana de PVC, e=4.5mm. Primera capa en membrana sintética no tejida 100% de polipropileno 1800, e=1.5mm. Segunda capa en tiras de 10cm para cambios de sentido en lámina de acero galvanizado con recubrimiento en PVC a una cara y con recubrimiento epóxico en la otra, e=1.8mm, acabado de PVC color gris claro. Tercera capa en membrana impermeabilizante de PVC plastificado reforzado con armadura de poliéster, e=1.2mm, color gris.	m²	850,00	613,03	-236,97	$ 255.289,00	$ 216.995.650,00	$ 156.499.816,00	-$ 60.495.834,00	0,39%
6			**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO Y DE GAS**						**$ 2.306.876.589,00**	**$ 2.416.185.816,00**	**$ 109.309.227,00**	**6,04%**
	6,1		**ACOMETIDA**						**$ 23.566.515,00**	**$ 121.778.606,00**	**$ 98.212.091,00**	0,30%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua fría desde el medidor totalizador hasta la llegada a los cuartos de bombas y los tanques de almacenamiento. Se incluye acometida tanque incendio.									
		6.1.1	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	5,13	5,13		$ 127.637,00	$ 654.778,00	$ 654.778,00		0,00%
		6.1.2	Suministro e instalación de tubería PVC-P 1-1/2"	m	130,00	130,00		$ 47.221,00	$ 6.138.730,00	$ 6.138.730,00		0,02%
		6.1.3	Suministro e instalación de flotador mecanico bola grande 1-1/2"	Und	3,00	3,00		$ 399.554,00	$ 1.198.662,00	$ 1.198.662,00		0,00%
		6.1.4	Suministro e instalación de válvula antifraude 1-1/2"	Und	2,00	2,00		$ 572.889,00	$ 1.145.778,00	$ 1.145.778,00		0,00%
		6.1.5	Suministro e instalación de relleno en material seleccionado	m³	11,97	47,47	35,50	$ 37.870,00	$ 453.304,00	$ 1.797.689,00	$ 1.344.385,00	0,00%
		6.1.6	Suministro e instalación de niple pasamuros acero inox. 1-1/2"	Und	3,00	3,00		$ 356.662,00	$ 1.069.986,00	$ 1.069.986,00		0,00%
		6.1.7	Suministro e instalación de medidor totalizador 1-1/2"	Und	1,00	1,00		$ 952.396,00	$ 952.396,00	$ 952.396,00		0,00%
		6.1.8	Suministro e instalación de medidor agua potable 1-1/2"	Und	1,00	1,00		$ 2.459.563,00	$ 2.459.563,00	$ 2.459.563,00		0,01%
		6.1.9	Suministro e instalación de medidor incendio 1-1/2"	Und	1,00	1,00		$ 2.467.087,00	$ 2.467.087,00	$ 2.467.087,00		0,01%
		6.1.10	Suministro e instalación de registro corte RED WHITE 1-1/2"	Und	3,00	3,00		$ 571.917,00	$ 1.715.751,00	$ 1.715.751,00		0,00%
		6.1.11	Suministro e instalación de caja medidor para totalizador	Und	1,00	1,00		$ 1.937.951,00	$ 1.937.951,00	$ 1.937.951,00		0,00%
		6.1.12	Suministro e instalación de nicho medidores AP + PCI	Und	1,00	1,00		$ 473.624,00	$ 473.624,00	$ 473.624,00		0,00%
		6.1.13	Suministro e instalación de tubería PVC-S 2"	m	6,00	25,35	19,35	$ 51.419,00	$ 308.514,00	$ 1.303.472,00	$ 994.958,00	0,00%
		6.1.14	Suministro e instalación de sifón PVC-S 2"	Und	1,00	1,00		$ 93.951,00	$ 93.951,00	$ 93.951,00		0,00%
		6.1.15	Suministro e instalación de cheque hidro 1 1/2"	Und	1,00	1,00		$ 373.676,00	$ 373.676,00	$ 373.676,00		0,00%
		6.1.16	Suministro e instalación de registro bola P.D. 1 1/2"	Und	2,00	2,00		$ 334.622,00	$ 669.244,00	$ 669.244,00		0,00%
		6.1.17	Suministro e instalación de universal H.G. 1 1/2"	Und	1,00	1,00		$ 81.175,00	$ 81.175,00	$ 81.175,00		0,00%
		6.1.18	Suministro e instalación de unión dresser 1 1/2"	Und	1,00	1,00		$ 81.175,00	$ 81.175,00	$ 81.175,00		0,00%
		6.1.19	Excavación manual	m³	17,10	1.286,82	1.269,72	$ 75.507,00	$ 1.291.170,00	$ 97.163.918,00	$ 95.872.748,00	0,24%
	6,2		**CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**						**$ 24.323.665,00**	**$ 24.323.665,00**		0,06%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del cuarto de bombas de agua potable. Se incluye recirculación, lavado y rebose.									
		6.2.1	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 4"	m	4,00	4,00		$ 230.187,00	$ 920.748,00	$ 920.748,00		0,00%
		6.2.2	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 3"	m	3,00	3,00		$ 179.511,00	$ 538.533,00	$ 538.533,00		0,00%
		6.2.3	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2-1/2"	m	6,00	6,00		$ 152.318,00	$ 913.908,00	$ 913.908,00		0,00%
		6.2.4	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2"	m	1,00	1,00		$ 97.420,00	$ 97.420,00	$ 97.420,00		0,00%
		6.2.5	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/2"	m	3,00	3,00		$ 77.931,00	$ 233.793,00	$ 233.793,00		0,00%
		6.2.6	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/4"	m	3,00	3,00		$ 73.686,00	$ 221.058,00	$ 221.058,00		0,00%
		6.2.7	Suministro e instalación de tubería PVCP 1/2"	m	1,00	1,00		$ 26.903,00	$ 26.903,00	$ 26.903,00		0,00%
		6.2.8	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 3"	Und	2,00	2,00		$ 2.896.453,00	$ 5.792.906,00	$ 5.792.906,00		0,01%
		6.2.9	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2-1/2"	Und	3,00	3,00		$ 141.390,00	$ 424.170,00	$ 424.170,00		0,00%
		6.2.10	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2"	Und	1,00	1,00		$ 899.162,00	$ 899.162,00	$ 899.162,00		0,00%
		6.2.11	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/2"	Und	1,00	1,00		$ 563.120,00	$ 563.120,00	$ 563.120,00		0,00%
		6.2.12	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/4"	Und	1,00	1,00		$ 433.272,00	$ 433.272,00	$ 433.272,00		0,00%
		6.2.13	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1/2"	Und	1,00	1,00		$ 108.152,00	$ 108.152,00	$ 108.152,00		0,00%
		6.2.14	Suministro e instalación de cheque hidro 2-1/2"	Und	3,00	3,00		$ 689.969,00	$ 2.069.907,00	$ 2.069.907,00		0,01%
		6.2.15	Suministro e instalación de cheque cortina 1-1/4" perforado	Und	1,00	1,00		$ 363.883,00	$ 363.883,00	$ 363.883,00		0,00%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		6.2.16	Suministro e instalación de universal H.G. 1-1/4"	Und	1,00	1,00		$ 152.902,00	$ 152.902,00	$ 152.902,00		0,00%
		6.2.17	Suministro e instalación de unión flexible metálica 3"	Und	2,00	2,00		$ 255.799,00	$ 511.598,00	$ 511.598,00		0,00%
		6.2.18	Suministro e instalación de unión flexible metálica 2-1/2"	Und	3,00	3,00		$ 231.123,00	$ 693.369,00	$ 693.369,00		0,00%
		6.2.19	Suministro e instalación de válvula de pie 3"	Und	2,00	2,00		$ 692.949,00	$ 1.385.898,00	$ 1.385.898,00		0,00%
		6.2.20	Suministro e instalación de copa excéntrica 3" x 2"	Und	2,00	2,00		$ 360.849,00	$ 721.698,00	$ 721.698,00		0,00%
		6.2.21	Suministro e instalación de copa concéntrica 2-1/2" x 2"	Und	2,00	2,00		$ 10.991,00	$ 21.982,00	$ 21.982,00		0,00%
		6.2.22	Suministro e instalación de brida acero (individual) 3"	Und	12,00	12,00		$ 131.110,00	$ 1.573.320,00	$ 1.573.320,00		0,00%
		6.2.23	Suministro e instalación de brida acero (individual) 2-1/2"	Und	22,00	22,00		$ 116.758,00	$ 2.568.676,00	$ 2.568.676,00		0,01%
		6.2.24	Suministro e instalación de manométro antivibratorio	Und	2,00	2,00		$ 129.993,00	$ 259.986,00	$ 259.986,00		0,00%
		6.2.25	Suministro e instalación de soporte para tubería de succión	Und	2,00	2,00		$ 189.682,00	$ 379.364,00	$ 379.364,00		0,00%
		6.2.26	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4"	Und	1,00	1,00		$ 615.673,00	$ 615.673,00	$ 615.673,00		0,00%
		6.2.27	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 3"	Und	2,00	2,00		$ 526.889,00	$ 1.053.778,00	$ 1.053.778,00		0,00%
		6.2.28	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 2"	Und	1,00	1,00		$ 421.150,00	$ 421.150,00	$ 421.150,00		0,00%
		6.2.29	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 1-1/2"	Und	1,00	1,00		$ 357.336,00	$ 357.336,00	$ 357.336,00		0,00%
	6,3		**CUARTO DE BOMBAS AGUA LLUVIA**						**$ 46.278.906,00**	**$ 47.510.252,00**	**$ 1.231.346,00**	0,12%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del cuarto de bombas de agua lluvia. Se incluye recirculación, lavado y rebose.									
		6.3.1	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 4"	m	10,00	10,00		$ 230.187,00	$ 2.301.870,00	$ 2.301.870,00		0,01%
		6.3.2	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 3"	m	4,00	4,00		$ 179.511,00	$ 718.044,00	$ 718.044,00		0,00%
		6.3.3	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 2"	m	1,00	1,00		$ 97.420,00	$ 97.420,00	$ 97.420,00		0,00%
		6.3.4	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/2"	m	3,00	3,00		$ 77.931,00	$ 233.793,00	$ 233.793,00		0,00%
		6.3.5	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1-1/4"	m	4,00	4,00		$ 73.686,00	$ 294.744,00	$ 294.744,00		0,00%
		6.3.6	Suministro e instalación de tubería de agua PVC SCH80 1/2"	m	1,00	1,00		$ 46.423,00	$ 46.423,00	$ 46.423,00		0,00%
		6.3.7	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 4"	Und	1,00	1,00		$ 3.559.306,00	$ 3.559.306,00	$ 3.559.306,00		0,01%
		6.3.8	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 3"	Und	6,00	6,00		$ 2.896.453,00	$ 17.378.718,00	$ 17.378.718,00		0,04%
		6.3.9	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 2"	Und	1,00	1,00		$ 899.162,00	$ 899.162,00	$ 899.162,00		0,00%
		6.3.10	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/2"	Und	1,00	1,00		$ 563.120,00	$ 563.120,00	$ 563.120,00		0,00%
		6.3.11	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1-1/4"	Und	1,00	1,00		$ 433.272,00	$ 433.272,00	$ 433.272,00		0,00%
		6.3.12	Suministro e instalación de registro R.W. P.D. 1/2"	Und	1,00	1,00		$ 108.152,00	$ 108.152,00	$ 108.152,00		0,00%
		6.3.13	Suministro e instalación de cheque hidro 4"	Und	1,00	1,00		$ 3.445.334,00	$ 3.445.334,00	$ 3.445.334,00		0,01%
		6.3.14	Suministro e instalación de cheque hidro 3"	Und	3,00	3,00		$ 1.172.422,00	$ 3.517.266,00	$ 3.517.266,00		0,01%
		6.3.15	Suministro e instalación de cheque cortina 1-1/4"	Und	1,00	1,00		$ 363.883,00	$ 363.883,00	$ 363.883,00		0,00%
		6.3.16	Suministro e instalación de universal H.G. 1-1/4"	Und	1,00	1,00		$ 152.902,00	$ 152.902,00	$ 152.902,00		0,00%
		6.3.17	Suministro e instalación de unión flexible metálica 4"	Und	1,00	1,00		$ 317.487,00	$ 317.487,00	$ 317.487,00		0,00%
		6.3.18	Suministro e instalación de unión flexible metálica 3"	Und	3,00	3,00		$ 255.799,00	$ 767.397,00	$ 767.397,00		0,00%
		6.3.19	Suministro e instalación de válvula de pie 3"	Und	3,00	3,00		$ 692.949,00	$ 2.078.847,00	$ 2.078.847,00		0,01%
		6.3.20	Suministro e instalación de copa excéntrica 3" x 2"	Und	3,00	3,00		$ 360.849,00	$ 1.082.547,00	$ 1.082.547,00		0,00%
		6.3.21	Suministro e instalación de copa concéntrica 3" x 2"	Und	3,00	3,00		$ 360.849,00	$ 1.082.547,00	$ 1.082.547,00		0,00%
		6.3.22	Suministro e instalación de brida acero (individual) 4"	Und	3,00	3,00		$ 180.947,00	$ 542.841,00	$ 542.841,00		0,00%
		6.3.23	Suministro e instalación de brida acero (individual) 3"	Und	18,00	18,00		$ 131.110,00	$ 2.359.980,00	$ 2.359.980,00		0,01%
		6.3.24	Suministro e instalación de manométro antivibratorio	Und	3,00	3,00		$ 129.993,00	$ 389.979,00	$ 389.979,00		0,00%
		6.3.25	Suministro e instalación de soporte para tubería de succión	Und	3,00	3,00		$ 189.682,00	$ 569.046,00	$ 569.046,00		0,00%
		6.3.26	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 4"	Und	1,00	3,00	2,00	$ 615.673,00	$ 615.673,00	$ 1.847.019,00	$ 1.231.346,00	0,00%
		6.3.27	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 3"	Und	3,00	3,00		$ 526.889,00	$ 1.580.667,00	$ 1.580.667,00		0,00%
		6.3.28	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 2"	Und	1,00	1,00		$ 421.150,00	$ 421.150,00	$ 421.150,00		0,00%
		6.3.29	Suministro e instalación de niple pasamuro acero inoxidable 1-1/2"	Und	1,00	1,00		$ 357.336,00	$ 357.336,00	$ 357.336,00		0,00%
	6,4		**RED GENERAL AGUA POTABLE**						**$ 48.241.069,00**	**$ 48.241.069,00**		0,12%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua potable desde la salida del cuarto de bombas hasta la llegada a cada punto hidráulico.									
		6.4.1	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2-1/2"	m	55,00	55,00		$ 96.174,00	$ 5.289.570,00	$ 5.289.570,00		0,01%
		6.4.2	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2"	m	108,00	108,00		$ 62.340,00	$ 6.732.720,00	$ 6.732.720,00		0,02%
		6.4.3	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/2"	m	38,00	38,00		$ 47.576,00	$ 1.807.888,00	$ 1.807.888,00		0,00%
		6.4.4	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/4"	m	30,00	30,00		$ 40.740,00	$ 1.222.200,00	$ 1.222.200,00		0,00%
		6.4.5	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1"	m	121,00	121,00		$ 34.219,00	$ 4.140.499,00	$ 4.140.499,00		0,01%
		6.4.6	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 3/4"	m	287,00	287,00		$ 29.916,00	$ 8.585.892,00	$ 8.585.892,00		0,02%
		6.4.7	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1/2"	m	616,00	616,00		$ 26.605,00	$ 16.388.680,00	$ 16.388.680,00		0,04%
		6.4.8	Suministro e instalación de registro bola 2"	Und	1,00	1,00		$ 540.372,00	$ 540.372,00	$ 540.372,00		0,00%
		6.4.9	Suministro e instalación de registro bola 1-1/2"	Und	1,00	1,00		$ 279.914,00	$ 279.914,00	$ 279.914,00		0,00%
		6.4.10	Suministro e instalación de registro bola 1"	Und	1,00	1,00		$ 68.641,00	$ 68.641,00	$ 68.641,00		0,00%
		6.4.11	Suministro e instalación de registro bola 3/4"	Und	20,00	20,00		$ 52.851,00	$ 1.057.020,00	$ 1.057.020,00		0,00%
		6.4.12	Suministro e instalación de registro bola 1/2"	Und	49,00	49,00		$ 34.712,00	$ 1.700.888,00	$ 1.700.888,00		0,00%
		6.4.13	Suministro e instalación de llave de manguera 1/2"	Und	5,00	5,00		$ 85.357,00	$ 426.785,00	$ 426.785,00		0,00%
	6,5		**RED GENERAL AGUA LLUVIA REUTILIZADA**						**$ 59.123.993,00**	**$ 59.123.993,00**		0,15%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua lluvia reutilizada desde la salida del cuarto de bombas hasta la llegada a cada punto hidráulico.									
		6.5.1	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 4"	m	55,00	55,00		$ 198.210,00	$ 10.901.550,00	$ 10.901.550,00		0,03%
		6.5.2	Suministro e instalación de tubería PVC-P 3"	m	56,00	56,00		$ 126.691,00	$ 7.094.696,00	$ 7.094.696,00		0,02%
		6.5.3	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2-1/2"	m	51,00	51,00		$ 96.174,00	$ 4.904.874,00	$ 4.904.874,00		0,01%
		6.5.4	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 2"	m	75,00	75,00		$ 62.340,00	$ 4.675.500,00	$ 4.675.500,00		0,01%
		6.5.5	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/2"	m	168,00	168,00		$ 47.576,00	$ 7.992.768,00	$ 7.992.768,00		0,02%
		6.5.6	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1-1/4"	m	320,00	320,00		$ 40.740,00	$ 13.036.800,00	$ 13.036.800,00		0,03%
		6.5.7	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1"	m	8,00	8,00		$ 34.219,00	$ 273.752,00	$ 273.752,00		0,00%
		6.5.8	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 1/2"	m	106,00	106,00		$ 26.605,00	$ 2.820.130,00	$ 2.820.130,00		0,01%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		6.5.9	Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 3/4"	m	38,00	38,00		$ 29.916,00	$ 1.136.808,00	$ 1.136.808,00		0,00%
		6.5.10	Suministro e instalación de registro bola 2-1/2"	Und	1,00	1,00		$ 769.816,00	$ 769.816,00	$ 769.816,00		0,00%
		6.5.11	Suministro e instalación de registro bola 2"	Und	1,00	1,00		$ 540.372,00	$ 540.372,00	$ 540.372,00		0,00%
		6.5.12	Suministro e instalación de registro bola 1-1/2"	Und	12,00	12,00		$ 279.914,00	$ 3.358.968,00	$ 3.358.968,00		0,01%
		6.5.13	Suministro e instalación de registro bola 1-1/4"	Und	17,00	17,00		$ 72.437,00	$ 1.231.429,00	$ 1.231.429,00		0,00%
		6.5.14	Suministro e instalación de registro bola 3/4"	Und	6,00	6,00		$ 52.851,00	$ 317.106,00	$ 317.106,00		0,00%
		6.5.15	Suministro e instalación de registro bola 1/2"	Und	2,00	2,00		$ 34.712,00	$ 69.424,00	$ 69.424,00		0,00%
	6,6		**RED DE SUMINISTRO DE AGUA CALIENTE**						**$ 2.795.589,00**	**$ 2.795.589,00**		0,01%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de agua caliente desde la salida del calentador hasta cada conexión con el punto de agua caliente.									
		6.6.1	Suministro e instalación de tubería CPVC 1"	m	3,00	3,00		$ 44.453,00	$ 133.359,00	$ 133.359,00		0,00%
		6.6.2	Suministro e instalación de tubería CPVC 3/4"	m	8,00	8,00		$ 30.759,00	$ 246.072,00	$ 246.072,00		0,00%
		6.6.3	Suministro e instalación de tubería CPVC 1/2"	m	13,00	13,00		$ 22.325,00	$ 290.225,00	$ 290.225,00		0,00%
		6.6.4	Suministro e instalación de cheque hidro 1"	Und	1,00	1,00		$ 206.647,00	$ 206.647,00	$ 206.647,00		0,00%
		6.6.5	Suministro e instalación de registro bola 1"	Und	1,00	1,00		$ 68.641,00	$ 68.641,00	$ 68.641,00		0,00%
		6.6.6	Suministro e instalación de calentador eléctrico 16l/min	Und	1,00	1,00		$ 1.850.645,00	$ 1.850.645,00	$ 1.850.645,00		0,00%
	6,7		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA POTABLE**						**$ 9.825.525,00**	**$ 9.825.525,00**		0,02%
			Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de dirección de horizontal en la red, a vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el accesorio de cambio de dirección) Incluye el paral, la recamara, el tapones para prueba de la instalación de suministro y los adaptadores que sean requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta.									
		6.7.1	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable de 1/2" - PVC	Und	130,00	130,00		$ 72.298,00	$ 9.398.740,00	$ 9.398.740,00		0,02%
		6.7.2	Suministro e instalación de llave de manguera 1/2"	Und	5,00	5,00		$ 85.357,00	$ 426.785,00	$ 426.785,00		0,00%
	6,8		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA LLUVIA REUTILIZADA**						**$ 7.989.842,00**	**$ 7.989.842,00**		0,02%
			Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de dirección de horizontal en la red, a vertical en el paral de abastecimiento. (Se incluye el accesorio de cambio de dirección) Incluye el paral, la recamara, el tapones para prueba de la instalación de suministro y los adaptadores que sean requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta.									
		6.8.1	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 1-1/4" - PVC	Und	58,00	58,00		$ 93.658,00	$ 5.432.164,00	$ 5.432.164,00		0,01%
		6.8.2	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 1/2" - PVC	Und	16,00	16,00		$ 74.001,00	$ 1.184.016,00	$ 1.184.016,00		0,00%
		6.8.3	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua lluvia reutilizada de 3/4" - PVC	Und	19,00	19,00		$ 72.298,00	$ 1.373.662,00	$ 1.373.662,00		0,00%
	6,9		**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA CALIENTE**						**$ 702.964,00**	**$ 702.964,00**		0,00%
			Incluye el suministro, instalación, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de agua a los aparatos sanitarios o puntos de abastecimiento. (Se incluye accesorio de cambio de dirección). Comprende el tramo vertical a partir del codo mediante el cual se realiza el cambio de dirección de horizontal en la red, a vertical en el paral de abastecimiento. Incluye el paral, la recamara, el tapon para prueba de la instalación de suministro de agua caliente y los adaptadores que sean requeridos para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta.									
		6.9.1	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable caliente de 1/2" - CPVC	Und	7,00	7,00		$ 86.097,00	$ 602.679,00	$ 602.679,00		0,00%
		6.9.2	Suministro e instalación de punto de suministro hidráulico de agua potable caliente de 1" - CPVC	Und	1,00	1,00		$ 100.285,00	$ 100.285,00	$ 100.285,00		0,00%
	6.10		**RAMALES DE AGUAS LLUVIAS**						**$ 120.386.990,00**	**$ 120.386.990,00**		0,30%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos horizontales en cubierta y terrazas. Se incluyen tramos de piso 1.									
		6.10.1	Suministro e instalación de tubería PVC-S 6"	m	103,00	103,00		$ 201.466,00	$ 20.750.998,00	$ 20.750.998,00		0,05%
		6.10.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4"	m	229,00	229,00		$ 96.878,00	$ 22.185.062,00	$ 22.185.062,00		0,06%
		6.10.3	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3"	m	574,00	574,00		$ 75.937,00	$ 43.587.838,00	$ 43.587.838,00		0,11%
		6.10.4	Suministro e instalación de tragante 8" x 6"	Und	12,00	12,00		$ 215.993,00	$ 2.591.916,00	$ 2.591.916,00		0,01%
		6.10.5	Suministro e instalación de tragante 6" x 4"	Und	4,00	4,00		$ 77.903,00	$ 311.612,00	$ 311.612,00		0,00%
		6.10.6	Suministro e instalación de tragante 4" x 3"	Und	12,00	12,00		$ 60.371,00	$ 724.452,00	$ 724.452,00		0,00%
		6.10.7	Suministro e instalación de sifón con rejilla para desagüe 4"	Und	4,00	4,00		$ 135.168,00	$ 540.672,00	$ 540.672,00		0,00%
		6.10.8	Suministro e instalación de sifón con rejilla para desagüe 3"	Und	82,00	82,00		$ 105.472,00	$ 8.648.704,00	$ 8.648.704,00		0,02%
		6.10.9	Excavación manual	m³	113,50	113,50		$ 75.507,00	$ 8.570.045,00	$ 8.570.045,00		0,02%
		6.10.10	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	18,90	18,90		$ 127.637,00	$ 2.412.339,00	$ 2.412.339,00		0,01%
		6.10.11	Suministro e instalación de relleno en material seleccionado	m³	94,60	94,60		$ 37.870,00	$ 3.582.502,00	$ 3.582.502,00		0,01%
		6.10.12	Suministro e instalación de pases en viga 4"	Und	50,00	50,00		$ 31.945,00	$ 1.597.250,00	$ 1.597.250,00		0,00%
		6.10.13	Suministro e instalación de pases en viga 3"	Und	200,00	200,00		$ 24.418,00	$ 4.883.600,00	$ 4.883.600,00		0,01%
	6,11		**BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS**						**$ 36.708.982,00**	**$ 36.708.982,00**		0,09%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales de aguas lluvias correspondiente a las bajantes de aguas lluvias hasta conectar a los ramales horizontales en todos los pisos.									
		6.11.1	Suministro e instalación de tubería PVC-S 6"	m	117,00	117,00		$ 201.466,00	$ 23.571.522,00	$ 23.571.522,00		0,06%
		6.11.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4"	m	90,00	90,00		$ 96.878,00	$ 8.719.020,00	$ 8.719.020,00		0,02%
		6.11.3	Suministro e instalación de tubería PVC-S 3"	m	24,00	24,00		$ 75.937,00	$ 1.822.488,00	$ 1.822.488,00		0,00%
		6.11.4	Suministro e instalación de junta de expansión 6"	Und	8,00	8,00		$ 161.684,00	$ 1.293.472,00	$ 1.293.472,00		0,00%
		6.11.5	Suministro e instalación de junta de expansión 4"	Und	12,00	12,00		$ 94.378,00	$ 1.132.536,00	$ 1.132.536,00		0,00%
		6.11.6	Suministro e instalación de junta de expansión 3"	Und	2,00	2,00		$ 84.972,00	$ 169.944,00	$ 169.944,00		0,00%
	6,12		**RED EXTERIOR DE AGUAS LLUVIAS**						**$ 44.760.136,00**	**$ 44.760.136,00**		0,11%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de las redes generales de aguas lluvias del proyecto en zonas verdes y/o duras interconectadas por cajas v/o pozos de inspección.									
		6.12.1	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 12"	m	57,00	57,00		$ 207.967,00	$ 11.854.119,00	$ 11.854.119,00		0,03%
		6.12.2	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 10"	m	69,00	69,00		$ 159.152,00	$ 10.981.488,00	$ 10.981.488,00		0,03%
		6.12.3	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 8"	m	35,00	35,00		$ 121.896,00	$ 4.266.360,00	$ 4.266.360,00		0,01%
		6.12.4	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 6"	m	26,00	26,00		$ 78.946,00	$ 2.052.596,00	$ 2.052.596,00		0,01%
		6.12.5	Excavación manual	m³	145,86	145,86		$ 75.507,00	$ 11.013.451,00	$ 11.013.451,00		0,03%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		6.12.6	Suministro e instalación de relleno cama de triturado	m³	22,44	22,44		$ 204.640,00	$ 4.592.122,00	$ 4.592.122,00		0,01%
	6,13		**RAMALES DE AGUAS NEGRAS**						**$ 79.604.181,00**	**$ 89.469.971,00**	**$ 9.865.790,00**	0,22%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos horizontales de aguas residuales en todos los pisos hasta la entrega a cajas de inspección o pozos eyectores.									
		6.13.1	Suministro e instalación de tubería PVC-S 6"	m	7,00	55,97	48,97	$ 201.466,00	$ 1.410.262,00	$ 11.276.052,00	$ 9.865.790,00	0,03%
		6.13.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4"	m	468,00	468,00		$ 96.878,00	$ 45.338.904,00	$ 45.338.904,00		0,11%
		6.13.3	Suministro e instalación de tubería PVC-S 2"	m	293,00	293,00		$ 51.419,00	$ 15.065.767,00	$ 15.065.767,00		0,04%
		6.13.4	Excavación manual	m³	126,00	126,00		$ 75.507,00	$ 9.513.882,00	$ 9.513.882,00		0,02%
		6.13.5	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	31,50	31,50		$ 127.637,00	$ 4.020.566,00	$ 4.020.566,00		0,01%
		6.13.6	Suministro e instalación de pases en viga 2"	Und	50,00	50,00		$ 27.324,00	$ 1.366.200,00	$ 1.366.200,00		0,00%
		6.13.7	Suministro e instalación de pases en viga 4"	Und	50,00	50,00		$ 57.772,00	$ 2.888.600,00	$ 2.888.600,00		0,01%
	6,14		**BAJANTES DE AGUAS NEGRAS**						**$ 19.851.051,00**	**$ 19.851.051,00**		0,05%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales desde la conexión con las colgantes principales bajo primer piso hasta piso 6.									
		6.14.1	Suministro e instalación de tubería PVC-S 4"	m	178,00	178,00		$ 96.878,00	$ 17.244.284,00	$ 17.244.284,00		0,04%
		6.14.2	Suministro e instalación de tubería PVC-S 2"	m	25,00	25,00		$ 51.419,00	$ 1.285.475,00	$ 1.285.475,00		0,00%
		6.14.3	Suministro e instalación de junta de expansión 4"	Und	14,00	14,00		$ 94.378,00	$ 1.321.292,00	$ 1.321.292,00		0,00%
	6,15		**RED EXTERIOR DE AGUAS RESIDUALES**						**$ 22.715.952,00**	**$ 22.715.952,00**		0,06%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de las redes generales de aguas lluvias del proyecto en zonas verdes y/o duras interconectadas por cajas v/o pozos de inspección.									
		6.15.1	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 6"	m	132,00	132,00		$ 78.946,00	$ 10.420.872,00	$ 10.420.872,00		0,03%
		6.15.2	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 4"	m	23,00	23,00		$ 40.149,00	$ 923.427,00	$ 923.427,00		0,00%
		6.15.3	Excavación manual	m³	77,50	77,50		$ 75.507,00	$ 5.851.793,00	$ 5.851.793,00		0,01%
		6.15.4	Suministro e instalación de relleno cama en triturado	m³	15,50	15,50		$ 204.640,00	$ 3.171.920,00	$ 3.171.920,00		0,01%
		6.15.5	Suministro e instalación de relleno en material seleccionado	m³	62,00	62,00		$ 37.870,00	$ 2.347.940,00	$ 2.347.940,00		0,01%
	6,16		**SALIDAS SANITARIAS**						**$ 30.305.077,00**	**$ 30.305.077,00**		0,08%
			Incluye el suministro, instalacion, prueba de la tuberia y accesorios requeridos para realizar la conexión de aguas residuales domesticas de los aparatos sanitarios o puntos de descarga. Comprende el tramo vertical desde la boca de conexión del aparato hasta el accesorio de conexión con la red horizontal. Incluye los tapones temporales para prueba y protección de la instalación de desagues y los adaptadores complementarios que se requieran para el montaje del aparato, además de la soldadura, sellante y herramienta. No incluye el montaje de los aparatos ni los resanes									
		6.16.1	Suministro e instalación de punto de salida sanitaria de agua sanitaria de 2" - PVCS	Und	149,00	149,00		$ 82.373,00	$ 12.273.577,00	$ 12.273.577,00		0,03%
		6.16.2	Suministro e instalación de punto de salida sanitaria de agua sanitaria de 4" - PVCS	Und	150,00	150,00		$ 120.210,00	$ 18.031.500,00	$ 18.031.500,00		0,05%
	6,17		**RAMALES Y COLUMNAS DE VENTILACIÓN Y REVENTILACIÓN**						**$ 23.814.536,00**	**$ 23.814.536,00**		0,06%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la instalación de los tramos verticales, horizontales y desvíos de las bajantes de ventilaciones y reventilaciones, desde la conexión con las colgantes principales bajo primer piso hasta cubierta.									
		6.17.1	Suministro e instalación de tubería PVC L 4"	m	39,00	39,00		$ 82.249,00	$ 3.207.711,00	$ 3.207.711,00		0,01%
		6.17.2	Suministro e instalación de tubería PVC L 3"	m	108,00	108,00		$ 60.060,00	$ 6.486.480,00	$ 6.486.480,00		0,02%
		6.17.3	Suministro e instalación de tubería PVC L 2"	m	179,00	179,00		$ 44.013,00	$ 7.878.327,00	$ 7.878.327,00		0,02%
		6.17.4	Suministro e instalación de válvula minivent 2"	Und	22,00	22,00		$ 217.373,00	$ 4.782.206,00	$ 4.782.206,00		0,01%
		6.17.5	Suministro e instalación válvula maxivent 4"	Und	4,00	4,00		$ 364.953,00	$ 1.459.812,00	$ 1.459.812,00		0,00%
	6,18		**DESAGÜE DE SÓTANO**						**$ 14.031.763,00**	**$ 14.031.763,00**		0,04%
		6.18.1	Suministro e instalación de tubería PVCS 4"	m	48,00	48,00		$ 96.878,00	$ 4.650.144,00	$ 4.650.144,00		0,01%
		6.18.2	Suministro e instalación de tubería PVCS 2"	m	25,00	25,00		$ 51.419,00	$ 1.285.475,00	$ 1.285.475,00		0,00%
		6.18.3	Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.8m x l=0.8m x h=0.6m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.	Und	6,00	6,00		$ 855.079,00	$ 5.130.474,00	$ 5.130.474,00		0,01%
		6.18.4	Suministro e instalación de cárcamo con rejilla B=0.30m H=0.20m	Und	5,00	5,00		$ 317.188,00	$ 1.585.940,00	$ 1.585.940,00		0,00%
		6.18.5	Suministro e instalación de cárcamo con rejilla B=0.20m H=0.20m	Und	5,00	5,00		$ 275.946,00	$ 1.379.730,00	$ 1.379.730,00		0,00%
	6,19		**DESCARGA POZO EYECTOR**						**$ 56.982.956,00**	**$ 56.982.956,00**		0,14%
		6.19.1	Suministro e instalación de tubería PVCS 3"	m	327,00	327,00		$ 75.643,00	$ 24.735.261,00	$ 24.735.261,00		0,06%
		6.19.2	Suministro e instalación de cheque hidro 3"	Und	12,00	12,00		$ 1.172.422,00	$ 14.069.064,00	$ 14.069.064,00		0,04%
		6.19.3	Suministro e instalación de registro bola tipo pesado 3"	Und	12,00	12,00		$ 1.119.197,00	$ 13.430.364,00	$ 13.430.364,00		0,03%
		6.19.4	Suministro e instalación de unión DRESSER 3"	Und	12,00	12,00		$ 220.305,00	$ 2.643.660,00	$ 2.643.660,00		0,01%
		6.19.5	Suministro e instalación de relleno de material seleccionado	m³	10,50	10,50		$ 37.870,00	$ 397.635,00	$ 397.635,00		0,00%
		6.19.6	Excavación manual	m³	15,00	15,00		$ 75.507,00	$ 1.132.605,00	$ 1.132.605,00		0,00%
		6.19.7	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	4,50	4,50		$ 127.637,00	$ 574.367,00	$ 574.367,00		0,00%
	6.20		**TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**						**$ 3.200.065,00**	**$ 3.200.065,00**		0,01%
		6.20.1	Suministro e instalación de tapón PVC S 4"	Und	122,00	122,00		$ 10.575,00	$ 1.290.150,00	$ 1.290.150,00		0,00%
		6.20.2	Suministro e instalación de tapón PVC S 2"	Und	209,00	209,00		$ 4.839,00	$ 1.011.351,00	$ 1.011.351,00		0,00%
		6.20.3	Suministro e instalación de tapón PVC P 1 1/4"	Und	58,00	58,00		$ 8.120,00	$ 470.960,00	$ 470.960,00		0,00%
		6.20.4	Suministro e instalación de tapón PVC P 3/4"	Und	19,00	19,00		$ 4.004,00	$ 76.076,00	$ 76.076,00		0,00%
		6.20.5	Suministro e instalación de tapón PVC P 1/2"	Und	151,00	151,00		$ 2.328,00	$ 351.528,00	$ 351.528,00		0,00%
	6,21		**SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS**						**$ 39.687.936,00**	**$ 39.687.936,00**		0,10%
		6.21.1	Equipo agua potable SEGÚN EETT.	Und	1,00	1,00		$ 4.960.992,00	$ 4.960.992,00	$ 4.960.992,00		0,01%
		6.21.2	Equipo agua lluvia SEGÚN EETT.	Und	1,00	1,00		$ 4.960.992,00	$ 4.960.992,00	$ 4.960.992,00		0,01%
		6.21.3	Equipo eyector aguas residuales. SEGÚN EETT.	Und	4,00	4,00		$ 4.960.992,00	$ 19.843.968,00	$ 19.843.968,00		0,05%
		6.21.4	Equipo eyector aguas lluvias. SEGÚN EETT.	Und	2,00	2,00		$ 4.960.992,00	$ 9.921.984,00	$ 9.921.984,00		0,02%
	6,22		**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO Y MAMPOSTERÍA AN Y ALL**						**$ 89.030.935,00**	**$ 89.030.935,00**		0,22%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red dentro del cuarto de bombas de agua incendio. Se incluye cabezal de pruebas.									
		6.22.1	Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.6m x l=0.6m x h=0.6m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.	Und	13,00	13,00		$ 491.095,00	$ 6.384.235,00	$ 6.384.235,00		0,02%
		6.22.2	Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=0.8m x l=0.8m x h=0.4m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.	Und	6,00	6,00		$ 781.496,00	$ 4.688.976,00	$ 4.688.976,00		0,01%
		6.22.3	Suministro e instalación de caja de limpieza en ladrillo tolete, a=1m x l=1m x h=0.8m, en unidades de ladrillo recocido 6cm x 12cm x 24cm, recubiertas internamente con mortero 1:3.	Und	1,00	1,00		$ 1.131.457,00	$ 1.131.457,00	$ 1.131.457,00		0,00%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		6.22.4	Suministro e instalación de pozo de inspección en concreto y mampostería Ø=1.20m. Tapa de concreto según la NP-024 de la EAAB. Cono de reducción en concreto reforzado de 28MPa. Muro en mampostería de ladrillo tolete, unidades de 6cm x 12cm x 24cm, aparejo tipo soga, pegado con mortero f'c 17.5MPa, impermeabilización exterior con mortero de pañete, e=10mm, incluye geotextil para filtración de subdrenajes NS-088. Recubrimiento interior en mortero de pañete f'c 12.5MPa, e=10mm. Placa de fondo en concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en plano Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.	Und	2,00	2,00		$ 7.327.273,00	$ 14.654.546,00	$ 14.654.546,00		0,04%
		6.22.5	Cárcamo con rejilla B=0.30m H=0.25m	Und	163,00	163,00		$ 325.267,00	$ 53.018.521,00	$ 53.018.521,00		0,13%
		6.22.6	Cárcamo con rejilla B=0.20m H=0.25m	Und	24,00	24,00		$ 291.230,00	$ 6.989.520,00	$ 6.989.520,00		0,02%
		6.22.7	Suministro e instalación de trampa de grasas en concreto y mamposteria, dimensiones internas, l=1.2m x a=0.8m x h=1.85m. Tapa en lámina de acero al carbono. Muros en mampostería de ladrillo tolete, unidades de 6cm x 12cm x 24cm, aparejo tipo soga, pegado con mortero f'c 17.5MPa, impermeabilización interior con mortero de pañete impermeabilizado, e=10mm. Placa de fondo en concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en plano Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.	Und	2,00	2,00		$ 746.412,00	$ 1.492.824,00	$ 1.492.824,00		0,00%
		6.22.8	Suministro e instalación de caja de aforo en concreto reforzado, dimensiones internas, l=1.2m x a=1.2m x h=1.2m. Tapa en lámina de acero al carbono. Muros en concreto reforzado de 28MPa. Placa de fondo en concreto reforzado de 28MPa. Ver detalle en plano Diseño hidráulico - detalles, H08 de 9.	Und	1,00	1,00		$ 670.856,00	$ 670.856,00	$ 670.856,00		0,00%
	6,23		**CUARTO DE BOMBAS AGUA INCENDIO**						**$ 28.465.763,00**	**$ 28.465.763,00**		0,07%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.									
		6.23.1	Tuberia acero sch 40 ranurada 6"	m	14,00	14,00		$ 295.099,00	$ 4.131.386,00	$ 4.131.386,00		0,01%
		6.23.2	Tuberia acero sch 40 ranurada 4"	m	8,00	8,00		$ 234.661,00	$ 1.877.288,00	$ 1.877.288,00		0,00%
		6.23.3	Tuberia acero sch 40 ranurada 2 1/2"	m	2,00	2,00		$ 160.658,00	$ 321.316,00	$ 321.316,00		0,00%
		6.23.4	Tuberia acero sch 40 ranurada 1 1/2"	m	5,00	5,00		$ 88.556,00	$ 442.780,00	$ 442.780,00		0,00%
		6.23.5	Accesorios acero ranurados 6"	Und	8,00	8,00		$ 327.301,00	$ 2.618.408,00	$ 2.618.408,00		0,01%
		6.23.6	Accesorios acero ranurados 4"	Und	4,00	4,00		$ 86.394,00	$ 345.576,00	$ 345.576,00		0,00%
		6.23.7	Accesorios acero ranurados 2 1/2"	Und	2,00	2,00		$ 40.440,00	$ 80.880,00	$ 80.880,00		0,00%
		6.23.8	Accesorios acero ranurados 1 1/2"	Und	4,00	4,00		$ 17.713,00	$ 70.852,00	$ 70.852,00		0,00%
		6.23.9	Acople rigido 6"	Und	20,00	20,00		$ 73.946,00	$ 1.478.920,00	$ 1.478.920,00		0,00%
		6.23.10	Acople rigido 4"	Und	10,00	10,00		$ 41.229,00	$ 412.290,00	$ 412.290,00		0,00%
		6.23.11	Acople rigido 2 1/2"	Und	5,00	5,00		$ 35.029,00	$ 175.145,00	$ 175.145,00		0,00%
		6.23.12	Acople rigido 1 1/2"	Und	10,00	10,00		$ 25.487,00	$ 254.870,00	$ 254.870,00		0,00%
		6.23.13	Válvula de corte 1 1/2"	Und	2,00	2,00		$ 572.643,00	$ 1.145.286,00	$ 1.145.286,00		0,00%
		6.23.14	Válvula compuerta os&y 6"	Und	1,00	1,00		$ 1.763.083,00	$ 1.763.083,00	$ 1.763.083,00		0,00%
		6.23.15	Válvula mariposa ulfm 6"	Und	2,00	2,00		$ 1.725.177,00	$ 3.450.354,00	$ 3.450.354,00		0,01%
		6.23.16	Cheque cortina ulfm 6"	Und	1,00	1,00		$ 952.227,00	$ 952.227,00	$ 952.227,00		0,00%
		6.23.17	Cheque cortina ulfm 1 1/2"	Und	1,00	1,00		$ 433.133,00	$ 433.133,00	$ 433.133,00		0,00%
		6.23.18	Lamina antivortice 6"	Und	1,00	1,00		$ 2.112.185,00	$ 2.112.185,00	$ 2.112.185,00		0,01%
		6.23.19	Cabezal de pruebas 4 x 2 salidas de 2.1/2"	Und	1,00	1,00		$ 2.085.139,00	$ 2.085.139,00	$ 2.085.139,00		0,01%
		6.23.20	Valvula de alivio 3"	Und	1,00	1,00		$ 1.949.386,00	$ 1.949.386,00	$ 1.949.386,00		0,00%
		6.23.21	Copa excentrica 1"x1 1/2"	Und	1,00	1,00		$ 215.628,00	$ 215.628,00	$ 215.628,00		0,00%
		6.23.22	Copa concentrica 1"x1 1/2"	Und	1,00	1,00		$ 11.395,00	$ 11.395,00	$ 11.395,00		0,00%
		6.23.23	Niple pasamuros acero inox. 6"	Und	2,00	2,00		$ 939.605,00	$ 1.879.210,00	$ 1.879.210,00		0,00%
		6.23.24	Manometro antivibratorio	Und	2,00	2,00		$ 129.513,00	$ 259.026,00	$ 259.026,00		0,00%
	6,24		**RED DE CONTRA INCENDIO**						**$ 1.352.480.738,00**	**$ 1.352.480.738,00**		3,38%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramienta y materiales para la red de gas desde los reguladores de primera etapa hasta los reguladores de segunda etapa. Se incluye tubería y accesorios de nicho de regulador de primera etapa.									
		6.24.1	Tubería pead 4"	m	47,00	47,00		$ 289.336,00	$ 13.598.792,00	$ 13.598.792,00		0,03%
		6.24.2	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 6"	m	44,00	44,00		$ 213.160,00	$ 9.379.040,00	$ 9.379.040,00		0,02%
		6.24.3	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 4"	m	394,00	394,00		$ 171.224,00	$ 67.462.256,00	$ 67.462.256,00		0,17%
		6.24.4	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 3"	m	646,00	646,00		$ 152.520,00	$ 98.527.920,00	$ 98.527.920,00		0,25%
		6.24.5	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2 1/2"	m	1.702,00	1.702,00		$ 88.621,00	$ 150.832.942,00	$ 150.832.942,00		0,38%
		6.24.6	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 2"	m	289,00	289,00		$ 74.878,00	$ 21.639.742,00	$ 21.639.742,00		0,05%
		6.24.7	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/2"	m	459,00	459,00		$ 90.868,00	$ 41.708.412,00	$ 41.708.412,00		0,10%
		6.24.8	Tuberia acero negro sch 10 ranurada 1 1/4"	m	600,00	600,00		$ 63.247,00	$ 37.948.200,00	$ 37.948.200,00		0,09%
		6.24.9	Tuberia acero negro sch 40 roscada 1"	m	387,00	387,00		$ 47.868,00	$ 18.524.916,00	$ 18.524.916,00		0,05%
		6.24.10	Accesorio pead	Und	11,00	11,00		$ 81.974,00	$ 901.714,00	$ 901.714,00		0,00%
		6.24.11	Transicion hdpe a tuberia metalica	Und	5,00	5,00		$ 1.996.130,00	$ 9.980.650,00	$ 9.980.650,00		0,02%
		6.24.12	Accesorio ranurado 6"	Und	10,00	10,00		$ 327.104,00	$ 3.271.040,00	$ 3.271.040,00		0,01%
		6.24.13	Accesorio ranurado 4"	Und	78,00	78,00		$ 86.294,00	$ 6.730.932,00	$ 6.730.932,00		0,02%
		6.24.14	Accesorio ranurado 3"	Und	170,00	170,00		$ 54.601,00	$ 9.282.170,00	$ 9.282.170,00		0,02%
		6.24.15	Accesorio ranurado 2 1/2"	Und	447,00	447,00		$ 40.443,00	$ 18.078.021,00	$ 18.078.021,00		0,05%
		6.24.16	Accesorio ranurado 2"	Und	131,00	131,00		$ 26.058,00	$ 3.413.598,00	$ 3.413.598,00		0,01%
		6.24.17	Accesorio ranurado 1.1/2"	Und	66,00	66,00		$ 17.726,00	$ 1.169.916,00	$ 1.169.916,00		0,00%
		6.24.18	Accesorio ranurado 1.1/4"	Und	64,00	64,00		$ 15.586,00	$ 997.504,00	$ 997.504,00		0,00%
		6.24.19	Acople rigido 6"	Und	110,00	110,00		$ 73.946,00	$ 8.134.060,00	$ 8.134.060,00		0,02%
		6.24.20	Acople rigido 4"	Und	985,00	985,00		$ 41.229,00	$ 40.610.565,00	$ 40.610.565,00		0,10%
		6.24.21	Acople rigido 3"	Und	1.615,00	1.615,00		$ 39.765,00	$ 64.220.475,00	$ 64.220.475,00		0,16%
		6.24.22	Acople rigido 2 1/2"	Und	4.255,00	4.255,00		$ 35.233,00	$ 149.916.415,00	$ 149.916.415,00		0,37%
		6.24.23	Acople rigido 2"	Und	723,00	723,00		$ 31.532,00	$ 22.797.636,00	$ 22.797.636,00		0,06%
		6.24.24	Acople rigido 1 1/2"	Und	1.148,00	1.148,00		$ 25.487,00	$ 29.259.076,00	$ 29.259.076,00		0,07%
		6.24.25	Acople rigido 1 1/4"	Und	150,00	150,00		$ 26.239,00	$ 3.935.850,00	$ 3.935.850,00		0,01%
		6.24.26	STRAP 3"	Und	116,00	116,00		$ 54.601,00	$ 6.333.716,00	$ 6.333.716,00		0,02%
		6.24.27	STRAP 2 1/2"	Und	140,00	140,00		$ 40.443,00	$ 5.662.020,00	$ 5.662.020,00		0,01%
		6.24.28	STRAP 2"	Und	47,00	47,00		$ 26.058,00	$ 1.224.726,00	$ 1.224.726,00		0,00%
		6.24.29	STRAP 1 1/2"	Und	92,00	92,00		$ 17.726,00	$ 1.630.792,00	$ 1.630.792,00		0,00%
		6.24.30	STRAP 1 1/4"	Und	199,00	199,00		$ 15.534,00	$ 3.091.266,00	$ 3.091.266,00		0,01%
		6.24.31	Accesorios acero roscados 1"	Und	45,00	45,00		$ 11.430,00	$ 514.350,00	$ 514.350,00		0,00%
		6.24.32	SIAMESA 4" x 2.1/2" x 2.1/2"	Und	2,00	2,00		$ 1.815.070,00	$ 3.630.140,00	$ 3.630.140,00		0,01%
		6.24.33	CHEQUE (UL/FM) 4"	Und	2,00	2,00		$ 1.868.608,00	$ 3.737.216,00	$ 3.737.216,00		0,01%
		6.24.34	Estación de control + reductora de presión 3"	Und	9,00	9,00		$ 7.759.367,00	$ 69.834.303,00	$ 69.834.303,00		0,17%
		6.24.35	Estación de control + reductora de presión 2 1/2"	Und	1,00	1,00		$ 6.732.322,00	$ 6.732.322,00	$ 6.732.322,00		0,02%
		6.24.36	ROCIADORES PENDENT k=5.6	Und	474,00	474,00		$ 53.022,00	$ 25.132.428,00	$ 25.132.428,00		0,06%
		6.24.37	ROCIADORES PENDENT k=8.0	Und	19,00	19,00		$ 128.519,00	$ 2.441.861,00	$ 2.441.861,00		0,01%
		6.24.38	ROCIADORES PENDENT k=8.0 TEMPERATURA INTERMEDIA	Und	9,00	9,00		$ 128.519,00	$ 1.156.671,00	$ 1.156.671,00		0,00%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		6.24.39	ROCIADORES UP-RIGHT k=5.6	Und	244,00	244,00		$ 53.022,00	$ 12.937.368,00	$ 12.937.368,00		0,03%
		6.24.40	ROCIADORES UP-RIGHT k=8.0	Und	25,00	25,00		$ 128.519,00	$ 3.212.975,00	$ 3.212.975,00		0,01%
		6.24.41	Escudos para rociadores	Und	771,00	771,00		$ 15.787,00	$ 12.171.777,00	$ 12.171.777,00		0,03%
		6.24.42	Puntos hidraulicos rociadores	Und	771,00	771,00		$ 74.296,00	$ 57.282.216,00	$ 57.282.216,00		0,14%
		6.24.43	Válvula expulsora de aire (ul/fm) 2"	Und	4,00	4,00		$ 270.832,00	$ 1.083.328,00	$ 1.083.328,00		0,00%
		6.24.44	Extintor de tipo co2 de 10lb	Und	2,00	2,00		$ 98.701,00	$ 197.402,00	$ 197.402,00		0,00%
		6.24.45	Soporte sencillo ul/fm 6"	Und	20,00	20,00		$ 33.847,00	$ 676.940,00	$ 676.940,00		0,00%
		6.24.46	Soporte sencillo ul/fm 4"	Und	172,00	172,00		$ 29.080,00	$ 5.001.760,00	$ 5.001.760,00		0,01%
		6.24.47	Soporte sencillo ul/fm 3"	Und	281,00	281,00		$ 29.080,00	$ 8.171.480,00	$ 8.171.480,00		0,02%
		6.24.48	Soporte sencillo ul/fm 2 1/2"	Und	740,00	740,00		$ 29.080,00	$ 21.519.200,00	$ 21.519.200,00		0,05%
		6.24.49	Soporte sencillo ul/fm 2"	Und	126,00	126,00		$ 27.846,00	$ 3.508.596,00	$ 3.508.596,00		0,01%
		6.24.50	Soporte sencillo ul/fm 1 1/2"	Und	200,00	200,00		$ 27.846,00	$ 5.569.200,00	$ 5.569.200,00		0,01%
		6.24.51	Soporte sencillo ul/fm 1 1/4"	Und	261,00	261,00		$ 27.846,00	$ 7.267.806,00	$ 7.267.806,00		0,02%
		6.24.52	Soporte sencillo ul/fm 1"	Und	169,00	169,00		$ 28.397,00	$ 4.799.093,00	$ 4.799.093,00		0,01%
		6.24.53	Soporte sísmico transversal ul/fm 6"	Und	4,00	4,00		$ 463.431,00	$ 1.853.724,00	$ 1.853.724,00		0,00%
		6.24.54	Soporte sísmico longitudinal ul/fm 6"	Und	2,00	2,00		$ 463.431,00	$ 926.862,00	$ 926.862,00		0,00%
		6.24.55	Soporte sísmico transversal ul/fm 4"	Und	34,00	34,00		$ 438.756,00	$ 14.917.704,00	$ 14.917.704,00		0,04%
		6.24.56	Soporte sísmico longitudinal ul/fm 4"	Und	17,00	17,00		$ 438.756,00	$ 7.458.852,00	$ 7.458.852,00		0,02%
		6.24.57	Soporte sísmico transversal ul/fm 3"	Und	54,00	54,00		$ 401.743,00	$ 21.694.122,00	$ 21.694.122,00		0,05%
		6.24.58	Soporte sísmico longitudinal ul/fm 3"	Und	27,00	27,00		$ 401.743,00	$ 10.847.061,00	$ 10.847.061,00		0,03%
		6.24.59	Soporte sísmico transversal ul/fm 2 1/2"	Und	142,00	142,00		$ 377.068,00	$ 53.543.656,00	$ 53.543.656,00		0,13%
		6.24.60	Soporte sísmico longitudinal ul/fm 2 1/2"	Und	71,00	71,00		$ 377.068,00	$ 26.771.828,00	$ 26.771.828,00		0,07%
		6.24.61	Soporte cuatro vías ul/fm 4"	Und	18,00	18,00		$ 876.444,00	$ 15.775.992,00	$ 15.775.992,00		0,04%
		6.24.62	Pintura de tubería 6"	m	44,00	44,00		$ 27.730,00	$ 1.220.120,00	$ 1.220.120,00		0,00%
		6.24.63	Pintura de tubería 4"	m	394,00	394,00		$ 23.769,00	$ 9.364.986,00	$ 9.364.986,00		0,02%
		6.24.64	Pintura de tubería 3"	m	646,00	646,00		$ 22.344,00	$ 14.434.224,00	$ 14.434.224,00		0,04%
		6.24.65	Pintura de tubería 2 1/2"	m	1.702,00	1.702,00		$ 20.698,00	$ 35.227.996,00	$ 35.227.996,00		0,09%
		6.24.66	Pintura de tubería 2"	m	289,00	289,00		$ 18.782,00	$ 5.427.998,00	$ 5.427.998,00		0,01%
		6.24.67	Pintura de tubería 1 1/2"	m	459,00	459,00		$ 17.523,00	$ 8.043.057,00	$ 8.043.057,00		0,02%
		6.24.68	Pintura de tubería 1 1/4"	m	600,00	600,00		$ 16.412,00	$ 9.847.200,00	$ 9.847.200,00		0,02%
		6.24.69	Pintura de tubería 1"	m	387,00	387,00		$ 14.386,00	$ 5.567.382,00	$ 5.567.382,00		0,01%
		6.24.70	Excavación manual	m³	21,15	21,15		$ 75.507,00	$ 1.596.973,00	$ 1.596.973,00		0,00%
		6.24.71	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	3,53	3,53		$ 127.637,00	$ 450.559,00	$ 450.559,00		0,00%
		6.24.72	Suministro e instalación de relleno de material seleccionado	m³	17,63	17,63		$ 37.870,00	$ 667.648,00	$ 667.648,00		0,00%
	6,25		**SUMINISTRO Y CONEXIÓN DE GABINETE CONTRA INCENDIO, ESTACIONES DE MANGUERA Y VÁLVULAS PARA BOMBEROS**						**$ 41.566.641,00**	**$ 41.566.641,00**		0,10%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.									
		6.25.1	Suministro e instalación de gabinete clase II	Und	17,00	17,00		$ 1.699.402,00	$ 28.889.834,00	$ 28.889.834,00		0,07%
		6.25.2	Toma fija para bomberos 2.1/2"	Und	13,00	13,00		$ 975.139,00	$ 12.676.807,00	$ 12.676.807,00		0,03%
	6,26		**SUMINISTRO DE EQUIPOS**						**$ 54.146.765,00**	**$ 54.146.765,00**		0,14%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.									
		6.26.1	Bomba principal con motor eléctrico 500gpm@140 psi (incluye accesorios y tablero de control)	Und	1,00	1,00		$ 47.621.134,00	$ 47.621.134,00	$ 47.621.134,00		0,12%
		6.26.2	Bomba jockey con motor eléctrico 5 gpm @150psi. (incluye accesorios y tablero de control)	Und	1,00	1,00		$ 6.525.631,00	$ 6.525.631,00	$ 6.525.631,00		0,02%
	6,27		**RED DE GAS MEDIA PRESIÓN**						**$ 14.447.343,00**	**$ 14.447.343,00**		0,04%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.									
		6.27.1	Tubería acero cu-l 1"	m	8,00	8,00		$ 82.955,00	$ 663.640,00	$ 663.640,00		0,00%
		6.27.2	Tubería acero cu-l 3/4"	m	23,00	23,00		$ 49.818,00	$ 1.145.814,00	$ 1.145.814,00		0,00%
		6.27.3	Tubería acero cu-l 1/2"	m	61,00	61,00		$ 33.830,00	$ 2.063.630,00	$ 2.063.630,00		0,01%
		6.27.4	Tubería acero galvanizado sch. 40 3/4"	m	2,00	2,00		$ 27.311,00	$ 54.622,00	$ 54.622,00		0,00%
		6.27.5	Tubería polietileno 3/4"	m	70,00	70,00		$ 70.537,00	$ 4.937.590,00	$ 4.937.590,00		0,01%
		6.27.6	Valvula bola 1"	Und	1,00	1,00		$ 72.562,00	$ 72.562,00	$ 72.562,00		0,00%
		6.27.7	Valvula bola 1/2"	Und	3,00	3,00		$ 34.811,00	$ 104.433,00	$ 104.433,00		0,00%
		6.27.8	Universal 3/4"	Und	1,00	1,00		$ 32.074,00	$ 32.074,00	$ 32.074,00		0,00%
		6.27.9	Elevador 3/4"	Und	1,00	1,00		$ 107.620,00	$ 107.620,00	$ 107.620,00		0,00%
		6.27.10	Medidor de gas g-6 (incluye montaje)	Und	1,00	1,00		$ 1.192.933,00	$ 1.192.933,00	$ 1.192.933,00		0,00%
		6.27.11	Medidor de gas g-10 (incluye montaje)	Und	1,00	1,00		$ 1.713.954,00	$ 1.713.954,00	$ 1.713.954,00		0,00%
		6.27.12	Plaqueta de identificación	Und	4,00	4,00		$ 12.338,00	$ 49.352,00	$ 49.352,00		0,00%
		6.27.13	Regulador de primera etapa Q=20.52m3/h	Und	1,00	1,00		$ 453.966,00	$ 453.966,00	$ 453.966,00		0,00%
		6.27.14	Excavación manual	m³	14,70	14,70		$ 75.507,00	$ 1.109.953,00	$ 1.109.953,00		0,00%
		6.27.15	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	2,10	2,10		$ 127.637,00	$ 268.038,00	$ 268.038,00		0,00%
		6.27.16	Suministro e instalación de relleno de material seleccionado	m³	12,60	12,60		$ 37.870,00	$ 477.162,00	$ 477.162,00		0,00%
	6,28		**RED DE GAS BAJA PRESION**						**$ 9.170.709,00**	**$ 9.170.709,00**		0,02%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.									
		6.28.1	Tubería acero cu-l 1"	m	11,00	11,00		$ 82.955,00	$ 912.505,00	$ 912.505,00		0,00%
		6.28.2	Tubería acero cu-l 3/4"	m	24,00	24,00		$ 49.818,00	$ 1.195.632,00	$ 1.195.632,00		0,00%
		6.28.3	Tubería acero cu-l 1/2"	m	63,00	63,00		$ 33.830,00	$ 2.131.290,00	$ 2.131.290,00		0,01%
		6.28.4	Encamisado dielectrico 1"	Und	11,00	11,00		$ 15.366,00	$ 169.026,00	$ 169.026,00		0,00%
		6.28.5	Encamisado dielectrico 3/4"	Und	24,00	24,00		$ 18.872,00	$ 452.928,00	$ 452.928,00		0,00%
		6.28.6	Encamisado dielectrico 1/2"	Und	63,00	63,00		$ 23.880,00	$ 1.504.440,00	$ 1.504.440,00		0,00%
		6.28.7	Valvula bola 1"	Und	2,00	2,00		$ 72.562,00	$ 145.124,00	$ 145.124,00		0,00%
		6.28.8	Valvula bola 3/4"	Und	3,00	3,00		$ 52.851,00	$ 158.553,00	$ 158.553,00		0,00%
		6.28.9	Valvula bola 1/2"	Und	12,00	12,00		$ 34.811,00	$ 417.732,00	$ 417.732,00		0,00%
		6.28.10	Regulador de segunda etapa q=0.40m3/h	Und	3,00	3,00		$ 498.569,00	$ 1.495.707,00	$ 1.495.707,00		0,00%
		6.28.11	Regulador de segunda etapa q=14.52m3/h	Und	1,00	1,00		$ 587.772,00	$ 587.772,00	$ 587.772,00		0,00%
	6,29		**PUNTOS DE GAS**						**$ 2.670.002,00**	**$ 2.670.002,00**		0,01%
			Se toma en este capítulo la mano de obra, herramientas, tuberías y accesorios accesorios para instalación de la red de gas desde los codos a nivel de piso hasta los codos de salida en muros.									
		6.29.1	Conexión estufa enana 3/4"	Und	2,00	2,00		$ 184.812,00	$ 369.624,00	$ 369.624,00		0,00%
		6.29.2	Conexión sartén basculante 1"	Und	1,00	1,00		$ 301.993,00	$ 301.993,00	$ 301.993,00		0,00%
		6.29.3	Conexión marmita 3/4"	Und	1,00	1,00		$ 184.812,00	$ 184.812,00	$ 184.812,00		0,00%
		6.29.4	Conexión horno combi 1"	Und	1,00	1,00		$ 301.993,00	$ 301.993,00	$ 301.993,00		0,00%
		6.29.5	Conexión mechero 1/2"	Und	12,00	12,00		$ 125.965,00	$ 1.511.580,00	$ 1.511.580,00		0,00%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
7			**INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SEGURIDAD Y CONTROL**						**$ 3.169.126.183,00**	**$ 3.240.611.624,00**	**$ 71.485.441,00**	**8,10%**
	7,1		**SALIDAS DE ILUMINACIÓN**						**$ 425.234.660,00**	**$ 425.234.660,00**		1,06%
		7.1.1	Suministro e Instalación de luminaria de emergencia 2x1,6W 100-240 V, 6500 K, IRC 70, flujo luminoso 125 o más, Autonomía de 90 minutos. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	163,00	163,00		$ 141.556,00	$ 23.073.628,00	$ 23.073.628,00		0,06%
		7.1.2	Suministro e Instalación de luminaria hermética 2x18 W sobreponer, 100-240 V, IRC 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 K. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	117,00	117,00		$ 193.594,00	$ 22.650.498,00	$ 22.650.498,00		0,06%
		7.1.3	Suministro e Instalación de luminaria panel LED redondo 8" 18W incrustar, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 1050 lm, IRC 70, vida útil mayor 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	615,00	615,00		$ 58.006,00	$ 35.673.690,00	$ 35.673.690,00		0,09%
		7.1.4	Suministro e Instalación de luminaria reflector LED 70W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 8000 lm, IRC 70, vida útil mayor a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	24,00	24,00		$ 155.598,00	$ 3.734.352,00	$ 3.734.352,00		0,01%
		7.1.5	Suministro e Instalación de reflector LED de 200 W, 6500 K, 100-240 V, IP 67, flujo luminoso mayor a 2000 lm, IRC 80, vida útil mayor a 10,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	16,00	16,00		$ 286.010,00	$ 4.576.160,00	$ 4.576.160,00		0,01%
		7.1.6	Suministro e Instalación de luminaria lineal LED de 40W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 3200 lm, IRC 80, vida útil mayor a 10,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	606,00	606,00		$ 405.822,00	$ 245.928.132,00	$ 245.928.132,00		0,61%
		7.1.7	Suministro de materiales e instalación de AVISO Salida de Emergencia. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	60,00	60,00		$ 132.916,00	$ 7.974.960,00	$ 7.974.960,00		0,02%
		7.1.8	Suministro de materiales e instalación de luminaria tipo Bala LED 6W IP7 tipo exterior. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	92,00	92,00		$ 218.808,00	$ 20.130.336,00	$ 20.130.336,00		0,05%
		7.1.9	Suministro e instalación de soporte metálico en L para reflector exterior, incluye soporte y tornillería para su correcto anclaje, pintura para exterior.	Und	24,00	24,00		$ 38.725,00	$ 929.400,00	$ 929.400,00		0,00%
		7.1.10	Suministro e Instalación de luminaria Panel de 60x60 LED 40W, 6500 K, 100-240 v, IRC 70, 3200 Lm, vida útil mayor a 20,000 H. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. Material certificado. garantizado e instalado según reglamentación NTC 2051	Und	50,00	50,00		$ 198.617,00	$ 9.930.850,00	$ 9.930.850,00		0,02%
		7.1.11	Suministro e instalación de campana led 100W, 5700 k, 100-277 v, irc 70, 18700 lm, vida útil 50,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte.	Und	9,00	9,00		$ 546.047,00	$ 4.914.423,00	$ 4.914.423,00		0,01%
		7.1.12	Suministro e Instalación de luminaria lineal LED 2,4 mts de 80W, 6500 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 6200 lm, IRC 80, vida útil mayor a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. .	Und	55,00	55,00		$ 751.210,00	$ 41.316.550,00	$ 41.316.550,00		0,10%
		7.1.13	Suministro e Instalación de luminaria aro de diametro, diametro 2mts de 150W, 2700 K, 100-240 V, flujo luminoso mayor a 4000 lm, IRC 80, vida útil mayor a 20,000 h. Incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. .	Und	3,00	3,00		$ 149.442,00	$ 448.326,00	$ 448.326,00		0,00%
		7.1.14	Suministro e instalación de poste metálico 6 mts altura, incluye base, hicada, brazo para dos refletctores y demás accesorios para su puesta en servicio.	Und	3,00	3,00		$ 1.317.785,00	$ 3.953.355,00	$ 3.953.355,00		0,01%
	7,2		**SALIDAS ELÉCTRICAS**						**$ 390.890.605,00**	**$ 470.580.165,00**	**$ 79.689.560,00**	1,18%
		7.2.1	Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria de emergencia (tipo R1 y Aviso SALIDA) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	223,00	223,00		$ 183.462,00	$ 40.912.026,00	$ 40.912.026,00		0,10%
		7.2.2	Suministro de materiales e instalación de salida para bala LED tipo exterior en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	92,00	92,00		$ 134.654,00	$ 12.388.168,00	$ 12.388.168,00		0,03%
		7.2.3	Suministro de materiales e instalación de salida para luminaria LED panel (18W) en tuberia conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1 ,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	1,00	435,60	434,60	$ 183.363,00	$ 183.363,00	$ 79.872.923,00	$ 79.689.560,00	0,20%
		7.2.4	Suministro de materiales e instalación de salida para reflector LED (70W) en tubería conduit IMC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	24,00	24,00		$ 250.691,00	$ 6.016.584,00	$ 6.016.584,00		0,02%
		7.2.5	Suministro de materiales e instalación de salida para reflector LED (200W) en tubería conduit EMT/PVC de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	16,00	16,00		$ 179.685,00	$ 2.874.960,00	$ 2.874.960,00		0,01%
		7.2.6	Suministro de materiales e instalación de salida luminaria LED lineal, campana, hermética, aro (40 W,80 W, campana 100w, aro 150W) en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica, con tapa, prensaestopa 1/2", 1,5 m cable encauchetado 3x14 AWG. e incidencia de: curvas, terminales, uniones, cajas de paso, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. No se incluye luminaria. - Promedio 4 -	Und	673,00	673,00		$ 179.685,00	$ 120.928.005,00	$ 120.928.005,00		0,30%
		7.2.7	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor sencillo en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 2x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	107,00	107,00		$ 191.027,00	$ 20.439.889,00	$ 20.439.889,00		0,05%
		7.2.8	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor doble en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	16,00	16,00		$ 218.022,00	$ 3.488.352,00	$ 3.488.352,00		0,01%
		7.2.9	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor doble conmutable en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 4x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	1,00	1,00		$ 260.262,00	$ 260.262,00	$ 260.262,00		0,00%
		7.2.10	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor conmutable en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	6,00	6,00		$ 198.584,00	$ 1.191.504,00	$ 1.191.504,00		0,00%
		7.2.11	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	176,00	176,00		$ 196.998,00	$ 34.671.648,00	$ 34.671.648,00		0,09%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		7.2.12	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en muro o piso en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, tapa con empaque , cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	70,00	70,00		$ 149.959,00	$ 10.497.130,00	$ 10.497.130,00		0,03%
		7.2.13	Suministro de materiales e instalación de salida para seca manos red normal en muro en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. No Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	12,00	12,00		$ 148.070,00	$ 1.776.840,00	$ 1.776.840,00		0,00%
		7.2.14	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente GFCI red normal en muro en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	56,00	56,00		$ 231.469,00	$ 12.962.264,00	$ 12.962.264,00		0,03%
		7.2.15	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente bifásica red normal en muro en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato sin grado de protección especial, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica doble fondo 2400 e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	4,00	4,00		$ 236.158,00	$ 944.632,00	$ 944.632,00		0,00%
		7.2.16	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente trifásica red normal en muro en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato 32A sin grado de protección especial, cable de Cu HFFR-LS No. 5x12 AWG, caja metálica doble fondo 2400 e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	4,00	4,00		$ 279.348,00	$ 1.117.392,00	$ 1.117.392,00		0,00%
		7.2.17	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal de piso para cargador de baterías planta eléctrica proyectado en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato con tapa para instalación en piso, cable trenzado de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase azul, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 12 -	Und	1,00	1,00		$ 714.619,00	$ 714.619,00	$ 714.619,00		0,00%
		7.2.18	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en muro en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 mts Tubería, 6 mts cableado	Und	34,00	34,00		$ 190.488,00	$ 6.476.592,00	$ 6.476.592,00		0,02%
		7.2.19	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en muro en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 mts Tubería, 6 mts cableado	Und	30,00	30,00		$ 257.514,00	$ 7.725.420,00	$ 7.725.420,00		0,02%
		7.2.20	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red UPS en canalización perimetral. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 3	Und	148,00	148,00		$ 120.623,00	$ 17.852.204,00	$ 17.852.204,00		0,04%
		7.2.21	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en canalización perimetral. Incluye aparato, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, tapa , marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 3	Und	147,00	147,00		$ 105.667,00	$ 15.533.049,00	$ 15.533.049,00		0,04%
		7.2.22	Suministro de materiales e instalación de salida para sensor de movimiento en techo en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye sensor con configuración día/noche y temporizador , cable Cu HFFR-LS No. 2x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	183,00	183,00		$ 318.130,00	$ 58.217.790,00	$ 58.217.790,00		0,15%
		7.2.23	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal en piso tipo exterior en tubería conduit PVC de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, tapa tipo intemperie, cable de Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG, caja plástica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 5 -	Und	7,00	7,00		$ 450.664,00	$ 3.154.648,00	$ 3.154.648,00		0,01%
		7.2.24	Suministro de materiales e instalación de salida para interruptor triple en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 4x12 + 1x12 AWG desnudo, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	3,00	3,00		$ 250.324,00	$ 750.972,00	$ 750.972,00		0,00%
		7.2.25	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red normal tipo Tamper resistant en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	36,00	36,00		$ 196.908,00	$ 7.088.688,00	$ 7.088.688,00		0,02%
		7.2.26	Suministro de materiales e instalación de salida para tomacorriente red regulada tipo Tamper resistant en tubería conduit EMT de 3/4" de diámetro. Incluye aparato, cable Cu HFFR-LS No. 3x12, caja metálica e incidencia de: curvas, adaptador terminal, cajas de paso, suplementos, marquillado, conectores, accesorios de fijación y conexión. - Promedio 4 -	Und	12,00	12,00		$ 226.967,00	$ 2.723.604,00	$ 2.723.604,00		0,01%
	7,3		**CANALIZACIONES ELÉCTRICAS**						**$ 253.598.770,00**	**$ 273.304.526,00**	**$ 19.705.756,00**	0,68%
		7.3.1	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm semipesada, para sostener cable MT en celda de transformador, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m	6,00	6,00		$ 145.085,00	$ 870.510,00	$ 870.510,00		0,00%
		7.3.2	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 30 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m	240,00	322,70	82,70	$ 238.280,00	$ 57.187.200,00	$ 76.892.956,00	$ 19.705.756,00	0,19%
		7.3.3	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 40 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m	90,00	90,00		$ 261.309,00	$ 23.517.810,00	$ 23.517.810,00		0,06%
		7.3.4	Suministro e instalación canalización perimetral metálica de 12 x 5 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye línea SPT cable No. 10 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m	203,00	203,00		$ 91.397,00	$ 18.553.591,00	$ 18.553.591,00		0,05%
		7.3.5	Suministro e instalación de caja de paso metálica 60x60x15 cm de transición. Incidencia de accesorios fijación y soporte.	Und	2,00	2,00		$ 310.948,00	$ 621.896,00	$ 621.896,00		0,00%
		7.3.6	Suministro e instalación de caja de paso metálica 40x40x15 cm de transición. Incidencia de accesorios fijación y soporte.	Und	4,00	4,00		$ 178.237,00	$ 712.948,00	$ 712.948,00		0,00%
		7.3.7	Suministro e instalación de tubería conduit IMC 3" desde planta y transformador hasta T-RES-SCI. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	22,00	22,00		$ 227.192,00	$ 4.998.224,00	$ 4.998.224,00		0,01%
		7.3.8	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3" desde caja de paso a Tableros . Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	18,00	18,00		$ 147.799,00	$ 2.660.382,00	$ 2.660.382,00		0,01%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		7.3.9	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 2" subientes a tableros. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	35,00	35,00		$ 74.961,00	$ 2.623.635,00	$ 2.623.635,00		0,01%
		7.3.10	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1 1/2" hasta Tableros de Distribución. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	48,00	48,00		$ 86.599,00	$ 4.156.752,00	$ 4.156.752,00		0,01%
		7.3.11	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1" a tableros. Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	40,00	40,00		$ 31.203,00	$ 1.248.120,00	$ 1.248.120,00		0,00%
		7.3.12	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 20x20x15 cm. Se incluye incidencia de soportería, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.	Und	21,00	21,00		$ 78.420,00	$ 1.646.820,00	$ 1.646.820,00		0,00%
		7.3.13	Suministro e instalación de caja de paso metálica de 15x15x10 cm. Se incluye incidencia de soportería, varillas de fijación, elaboración de aperturas de ductos y accesorios de fijación.	Und	10,00	10,00		$ 60.762,00	$ 607.620,00	$ 607.620,00		0,00%
		7.3.14	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 1Ø1" para ramales de tomacorrientes. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	210,00	210,00		$ 31.003,00	$ 6.510.630,00	$ 6.510.630,00		0,02%
		7.3.15	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3/4" para ramales de iluminación. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	640,00	640,00		$ 28.701,00	$ 18.368.640,00	$ 18.368.640,00		0,05%
		7.3.16	Suministro e instalación de tubería conduit EMT 3/4" para ramales de tomacorrientes. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	350,00	350,00		$ 28.701,00	$ 10.045.350,00	$ 10.045.350,00		0,03%
		7.3.17	Suministro e instalación de tubería conduit IMC 3/4" para ramales de iluminación exterior. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	180,00	180,00		$ 43.511,00	$ 7.831.980,00	$ 7.831.980,00		0,02%
		7.3.18	Suministro e instalación de tubería conduit PVC 3/4" para ramales de iluminación y tomacorrientes. No incluye regata en piso ni resanes de obra civil).Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	420,00	420,00		$ 8.208,00	$ 3.447.360,00	$ 3.447.360,00		0,01%
		7.3.19	Suministro e instalación de tubería conduit PVC 1" para ramales de iluminación y tomacorrientes. Mo incluye regata en piso ni resanes de obra civil).Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	310,00	310,00		$ 8.878,00	$ 2.752.180,00	$ 2.752.180,00		0,01%
		7.3.20	Suministro e instalación de bajante IMC de 3/4" para cable Al 1/0 desnudo , Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	368,00	368,00		$ 43.189,00	$ 15.893.552,00	$ 15.893.552,00		0,04%
		7.3.21	Suministro e instalación de tubería PVC de 1" para cable Cu 1/0 desnudo de bajantes a cajas de paso de tierra, Se incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	75,00	75,00		$ 10.412,00	$ 780.900,00	$ 780.900,00		0,00%
		7.3.22	Suministro e instalación de caja 4"x4" tipo intemperie para cambio de bajante Al a Cu, Incluye cola de cable para conexión a estructura de acuerdo a detalle. Se incluye incidencia de soportería y fijación. conector bimetálico para cable Al 1/0 a Cu 1/0 AWG	m	15,00	15,00		$ 121.323,00	$ 1.819.845,00	$ 1.819.845,00		0,00%
		7.3.23	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 20 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	m	300,00	300,00		$ 209.821,00	$ 62.946.300,00	$ 62.946.300,00		0,16%
		7.3.24	Suministro e instalación Bandeja Portacable de 60 x 8 cm ducto cerrado color blanco, con división interna para cableado de potencia y de datos, Incluye Riel estructural, varilla roscada, uniones, línea SPT cable No. 8 desnudo. Incidencia de accesorios de derivación, fijación y soporte.	Und	25,00	25,00		$ 151.861,00	$ 3.796.525,00	$ 3.796.525,00		0,01%
	7,4		**SISTEMA APANTALLAMIENTO Y PUESTA A TIERRA**						**$ 46.082.358,00**	**$ 46.082.358,00**		0,12%
		7.4.1	Suministro e instalación de base y punta captadora de 100 cm, se incluye base con ángulo ajustable, accesorios de fijación y sujeción.	m	12,00	12,00		$ 216.166,00	$ 2.593.992,00	$ 2.593.992,00		0,01%
		7.4.2	Suministro e instalación de Alambrón Al 8mm, se incluye incidencia de conectores snap o parecidos, se incluye accesorios de fijación y sujeción .	m	431,00	431,00		$ 19.877,00	$ 8.566.987,00	$ 8.566.987,00		0,02%
		7.4.3	Suministro e instalación de base y punta captadora de 60 cm, se incluye base con ángulo ajustable, accesorios de fijación y sujeción.	Und	8,00	8,00		$ 195.629,00	$ 1.565.032,00	$ 1.565.032,00		0,00%
		7.4.4	Suministro e instalación de cable Cu 1/0, se incluye incidencia de conectores de cable Cu 1/0 a Cu 2/0 en caja AP274.	m	45,00	45,00		$ 64.349,00	$ 2.895.705,00	$ 2.895.705,00		0,01%
		7.4.5	Suministro e instalación de cable Cu 2/0, se incluye incidencia de conectores para empalmes para equipotencializar las mallas de puesta a tierra y sistema de apantallamiento.	m	150,00	150,00		$ 41.639,00	$ 6.245.850,00	$ 6.245.850,00		0,02%
		7.4.6	Suministro e instalación de varilla de cobre 2,4 mts x 5/8", incluye soldadura exotérmica con cable Cu 1/0 dentro de caja AP274 para sistema de apantallamiento.	Und	15,00	15,00		$ 668.921,00	$ 10.033.815,00	$ 10.033.815,00		0,03%
		7.4.7	Suministro e instalación de malla puesta a tierra sistema de potencia de 6x6m, 9 grillas, de cable Cu 2/0 desnudo, 5 varillas cobre 2,4 m x 5/8", incluye 2 cajas AE 281 para inspección, soldaduras exotérmicas, incluye excavación necesaria aprox. 75 cm profundidad para enterrar el cable, no incluye tratamiento de terreno adicional.	Und	1,00	1,00		$ 5.963.551,00	$ 5.963.551,00	$ 5.963.551,00		0,01%
		7.4.8	Suministro e instalación de caja de inspección AE 281 30X30 cm para inspección de sistema de apantallamiento y puesta a tierra.	Und	15,00	15,00		$ 364.222,00	$ 5.463.330,00	$ 5.463.330,00		0,01%
		7.4.9	Suministro e instalación mástil de 2 m para sistema de apantallamiento, incluye sistema de fijación a piso y base para punta captadora	Und	4,00	4,00		$ 688.524,00	$ 2.754.096,00	$ 2.754.096,00		0,01%
	7,5		**CANALIZACIONES CIVILES**						**$ 163.477.134,00**	**$ 163.477.134,00**		0,41%
		7.5.1	Suministro e instalación de caja de inspección CS276.	Und	2,00	2,00		$ 5.525.531,00	$ 11.051.062,00	$ 11.051.062,00		0,03%
		7.5.2	Suministro e instalación de caja de inspección CS275.	Und	4,00	4,00		$ 2.481.202,00	$ 9.924.808,00	$ 9.924.808,00		0,02%
		7.5.3	Suministro e instalación de caja de inspección CS274.	Und	6,00	6,00		$ 1.412.626,00	$ 8.475.756,00	$ 8.475.756,00		0,02%
		7.5.4	Suministro de materiales y construcción de Cárcamo en Cuartos Técnicos, con dimensiones de altura 40 x 40 cm ancho. Incluye tapa en lamina de alfajor.	m	10,00	10,00		$ 648.043,00	$ 6.480.430,00	$ 6.480.430,00		0,02%
		7.5.5	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Φ6" desde bajante M.T. hasta Caja CS276 entrada a Subestación. Incluye pasacables de baja tensión, excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	40,00	40,00		$ 777.385,00	$ 31.095.400,00	$ 31.095.400,00		0,08%
		7.5.6	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 4Φ4" Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA desde Cárcamo a ductos eléctricos , arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	80,00	80,00		$ 333.022,00	$ 26.641.760,00	$ 26.641.760,00		0,07%
		7.5.7	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 3Φ4" entre Cajas CS275 a cuarto tableros, Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	35,00	35,00		$ 257.585,00	$ 9.015.475,00	$ 9.015.475,00		0,02%
		7.5.8	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 2Φ2" acometidas subterráneas a bombas hidráulicas, cuartos técnicos desde caja CS274, Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	70,00	70,00		$ 133.399,00	$ 9.337.930,00	$ 9.337.930,00		0,02%
		7.5.9	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 3Φ3" desde cajas CS275 a cuartos técnicos, para cableado y comunicaciones cuartos TIC .Incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas CODENSA, relleno , terminales tipo campana para ductos.	m	15,00	15,00		$ 182.047,00	$ 2.730.705,00	$ 2.730.705,00		0,01%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		7.5.10	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 6φ4" incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas Codensa, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	35,00	35,00		$ 397.859,00	$ 13.925.065,00	$ 13.925.065,00		0,03%
		7.5.11	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos PVC de 6φ6" para red M.T. exterior incluye excavación zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según normas Codensa desde cárcamo a ductos eléctricos , arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros.	m	25,00	25,00		$ 730.779,00	$ 18.269.475,00	$ 18.269.475,00		0,05%
		7.5.12	Suministro e instalación de caja de inspección CS280.	Und	3,00	3,00		$ 5.509.756,00	$ 16.529.268,00	$ 16.529.268,00		0,04%
	7,6		**ALIMENTADORES ELÉCTRICOS (HFFR-LS)**						**$ 647.417.940,00**	**$ 647.417.940,00**		1,62%
		7.6.1	Suministro e instalación de acometida en cable XLPE 15 KV 3x185 mm2 Al, apantallado en hilos desde punto conexión físico CODENSA hasta Subestación, Puentes entre celdas de M.T. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	85,00	85,00		$ 345.608,00	$ 29.376.680,00	$ 29.376.680,00		0,07%
		7.6.2	Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo interior para cable XLPE 15 KV 185 mm2 Al desde punto conexión físico CODENSA hasta Celda Triplex, Puentes entre celdas de M.T. Se incluye accesorios de fijación y soporte.	Juego	3,00	3,00		$ 1.258.052,00	$ 3.774.156,00	$ 3.774.156,00		0,01%
		7.6.3	Suministro e instalación de juego de premoldeados tipo exterior para cable XLPE 15 KV 185 mm2 Al desde punto conexión físico CODENSA hasta Celda Triplex, Puentes entre celdas de M.T. Se incluye accesorios de fijación y soporte.	Juego	1,00	1,00		$ 1.258.052,00	$ 1.258.052,00	$ 1.258.052,00		0,00%
		7.6.4	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X(3X400 KCMIL F + 350 KCMIL N) + 2/0 T desde Transformador a TGD. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	38,00	38,00		$ 2.864.754,00	$ 108.860.652,00	$ 108.860.652,00		0,27%
		7.6.5	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X(3X4/0 MCM F + 4/0 MCM N) + 2/0 T desde TGD y Planta Eléctrica a TTA. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	26,00	26,00		$ 1.452.513,00	$ 37.765.338,00	$ 37.765.338,00		0,09%
		7.6.6	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS (3x4/0 AWG F + 2/0 AWG N) + 4 T desde TTRANSFORMADOR A TTA-SCI - TRES-SCI. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	200,00	200,00		$ 482.673,00	$ 96.534.600,00	$ 96.534.600,00		0,24%
		7.6.7	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x8 AWG F + 8 AWG N + 10 T para TGD-ID Barraje Normal, TRES-ASC 1, TGD-SEC Barraje Respaldado, TGD-SEC Barraje respaldado, TRES-SOT y TRES-ASC 2. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	130,00	130,00		$ 49.302,00	$ 6.409.260,00	$ 6.409.260,00		0,02%
		7.6.8	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X4 AWG F + 4 AWG N + 8 T para TGD-PRI Barraje Normal y TGD a Inversor. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	142,00	142,00		$ 122.971,00	$ 17.461.882,00	$ 17.461.882,00		0,04%
		7.6.9	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x6 AWG F + 6 AWG N + 8 T para TGD-AUD y TGD-ID Barraje Respaldado . Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	64,00	64,00		$ 76.136,00	$ 4.872.704,00	$ 4.872.704,00		0,01%
		7.6.10	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x6 AWG F + 4 AWG N + 8 T para TGD-SEC Barraje Normal y TGD-PRO Barraje respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	20,00	20,00		$ 87.528,00	$ 1.750.560,00	$ 1.750.560,00		0,00%
		7.6.11	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X1/0 AWG F + 1/0 AWG N + 6 T para TRES-BOM. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	50,00	50,00		$ 277.117,00	$ 13.855.850,00	$ 13.855.850,00		0,03%
		7.6.12	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 1/0 AWG N + 6 T para TRES-COC. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	19,00	19,00		$ 211.117,00	$ 4.011.223,00	$ 4.011.223,00		0,01%
		7.6.13	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 2 AWG N + 6 T para TGD-PRI Barraje Normal, TGD-SIS Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	165,00	165,00		$ 188.673,00	$ 31.131.045,00	$ 31.131.045,00		0,08%
		7.6.14	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x4/0 F+ 4/0 AWG N + 4 AWG T para TGD-PRI Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	72,00	72,00		$ 525.261,00	$ 37.818.792,00	$ 37.818.792,00		0,09%
		7.6.15	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X4 AWG F + 2 AWG N + 8 T para TGD-PRO Barraje Normal. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	10,00	10,00		$ 139.887,00	$ 1.398.870,00	$ 1.398.870,00		0,00%
		7.6.16	Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 2x10 AWG + No 12 AWG T para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales (CIRCUITOS LEJANOS DE TABLEROS MÁS DE 30 METROS HASTA LA PRIMER TOMA). Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	m	1.200,00	1.200,00		$ 18.101,00	$ 21.721.200,00	$ 21.721.200,00		0,05%
		7.6.17	Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG para conexión de circuitos ramales tomacorrientes normales. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	m	3.870,00	3.870,00		$ 14.302,00	$ 55.348.740,00	$ 55.348.740,00		0,14%
		7.6.18	Suministro e instalación de cable Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG para conexión de circuitos ramales de iluminación. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	m	1.450,00	1.450,00		$ 12.037,00	$ 17.453.650,00	$ 17.453.650,00		0,04%
		7.6.19	Suministro e instalación de cable trenzado Cu HFFR-LS No. 3x12 AWG fase roja , tierra aislada verde para conexión de circuitos ramales regulados. Se incluye material de conexionado, empalme autodesforre y accesorios de fijación.	m	2.520,00	2.520,00		$ 17.093,00	$ 43.074.360,00	$ 43.074.360,00		0,11%
		7.6.20	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3x4/0 F+ 4/0 AWG N + 4 AWG T para TGD-PRE Barraje Normal. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. .	m	120,00	120,00		$ 525.261,00	$ 63.031.320,00	$ 63.031.320,00		0,16%
		7.6.21	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X10 AWG F + 10 AWG N + 10 AWG T para Bomba Jockey, TGD-PRO Regulado, TGD-ID Regulado, TRES-COM, Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	70,00	70,00		$ 34.693,00	$ 2.428.510,00	$ 2.428.510,00		0,01%
		7.6.22	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X300 KCMIL F + 300 KCMIL N + 20 T desde Transformador a TTA SCI y Bomba Jockey. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	31,00	31,00		$ 1.032.166,00	$ 31.997.146,00	$ 31.997.146,00		0,08%
		7.6.23	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X2AWG F + 2 AWG N + 8 T para TGD-PRI Barraje Normal, TGD-SIS Barraje Respaldado. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	50,00	50,00		$ 321.667,00	$ 16.083.350,00	$ 16.083.350,00		0,04%
	7,7		**TABLEROS E INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS**						**$ 244.263.675,00**	**$ 244.263.675,00**		0,61%
		7.7.1	Suministro e instalación de barraje de tierras 14 entradas para celdas en subestación, Cuarto B.T , incluye aisladores. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 927.777,00	$ 927.777,00	$ 927.777,00		0,00%
		7.7.2	Suministro e instalación de barraje de kit tierras para Rack principal , incluye aisladores, incluye 50 mts cable 8 desnudo hasta malla puesta a tierra. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 971.647,00	$ 971.647,00	$ 971.647,00		0,00%
		7.7.3	Suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico TTA según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 21.282.707,00	$ 21.282.707,00	$ 21.282.707,00		0,05%
		7.7.4	Suministro e instalación de celda o tablero de transferencia automática trifásico TTA-SCI según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	3,00	3,00		$ 35.702.439,00	$ 107.107.317,00	$ 107.107.317,00		0,27%
		7.7.5	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 9.781.284,00	$ 9.781.284,00	$ 9.781.284,00		0,02%
		7.7.6	Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 42 circuitos para breakers enchufables con espacio para totalizador. De acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 990.972,00	$ 990.972,00	$ 990.972,00		0,00%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		7.7.7	Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 18 circuitos para breakers enchufables con espacio para totalizador. De acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 630.534,00	$ 630.534,00	$ 630.534,00		0,00%
		7.7.8	Suministro e instalación de Tablero trifásico 3F-5H de 12 circuitos para breakers enchufables con espacio para totalizador. De acuerdo a unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 615.424,00	$ 615.424,00	$ 615.424,00		0,00%
		7.7.9	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRE según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 19.074.314,00	$ 19.074.314,00	$ 19.074.314,00		0,05%
		7.7.10	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRO según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 10.543.757,00	$ 10.543.757,00	$ 10.543.757,00		0,03%
		7.7.11	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-ID según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 9.772.655,00	$ 9.772.655,00	$ 9.772.655,00		0,02%
		7.7.12	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-PRI según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 14.245.047,00	$ 14.245.047,00	$ 14.245.047,00		0,04%
		7.7.13	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SEC según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 12.240.182,00	$ 12.240.182,00	$ 12.240.182,00		0,03%
		7.7.14	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-AUD según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 9.317.328,00	$ 9.317.328,00	$ 9.317.328,00		0,02%
		7.7.15	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TGD-SIS según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 13.712.611,00	$ 13.712.611,00	$ 13.712.611,00		0,03%
		7.7.16	Suministro e instalación de celda o tablero trifásico TRES-BOM según diagrama unifilar. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, barraje y breakers.	Und	1,00	1,00		$ 4.377.260,00	$ 4.377.260,00	$ 4.377.260,00		0,01%
		7.7.17	Suministro e instalación Caja con programador de horario electrónico, 4 contactor trifásico 3x30A, 4 breaker riel 1x20A. (Control ilm exterior)	Und	2,00	2,00		$ 3.681.098,00	$ 7.362.196,00	$ 7.362.196,00		0,02%
		7.7.18	Suministro e instalación Cofre tipo intemperie con control de iluminación, contactor trifásico 3x20A, breaker riel 1x20A, botón push para encendió (iluminación canchas).	Und	1,00	1,00		$ 1.310.663,00	$ 1.310.663,00	$ 1.310.663,00		0,00%
	7,8		**INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, CÁMARAS Y SONIDO - EQUIPOS ACTIVOS**						**$ 165.573.088,00**	**$ 165.573.088,00**		0,41%
		7.8.1	Suministro e instalación de servidor grabador de vídeo rackeable, 64 canales de video, capacidad de acceso y configuración remoto, capacidad hasta 48 TB memoria grabando a 15 FPS - 2 MP - 15 días, Procesador mínimo Core i7-4770S 3,1 GHz, Tarjeta de vídeo 4GB de video en RAM, Dual Gigabit LAN ports, RAM mínima de 8GB (4x2) Dual channel, RAID protección de información opcional.	Und	1,00	1,00		$ 7.291.790,00	$ 7.291.790,00	$ 7.291.790,00		0,02%
		7.8.2	Suministro e instalación de disco duro 6 TB especializado para CCTV	Und	1,00	1,00		$ 1.415.268,00	$ 1.415.268,00	$ 1.415.268,00		0,00%
		7.8.3	Suministro e instalación de pantalla LED 43", mouse y teclado para manejo y configuración del sistema de CCTV.	Und	1,00	1,00		$ 7.333.759,00	$ 7.333.759,00	$ 7.333.759,00		0,02%
		7.8.4	Switch PoE 48 puertos mín. 300 W, puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.	Und	7,00	7,00		$ 6.762.923,00	$ 47.340.461,00	$ 47.340.461,00		0,12%
		7.8.5	Switch PoE 24 puertos mín. 300 W, puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.	Und	4,00	4,00		$ 4.710.784,00	$ 18.843.136,00	$ 18.843.136,00		0,05%
		7.8.6	Suministro e instalación de Cámara tipo bullet 2 MP - 1080 P - FHD, capacidad de 25 fps, lente focal 3,8 mm, infrarroja, sensibilidad mín. 0,09 Color y 1,6 B/W. Se incluye material de conexionado. accesorios de fijación. soporte y conexión.	Und	1,00	1,00		$ 694.876,00	$ 694.876,00	$ 694.876,00		0,00%
		7.8.7	Suministro e instalación de Cámara tipo FishEye 3MP H.264 WDR Pro IP Camera. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	3,00	3,00		$ 1.683.665,00	$ 5.050.995,00	$ 5.050.995,00		0,01%
		7.8.8	Suministro e instalación de cámara tipo minidomo 2 MP - 1080 P - FHD, capacidad de 25 fps, lente focal 2,8 mm, infrarroja, sensibilidad mín. 0,09 Color y 1,6 B/W. Se incluye material de conexionado. accesorios de fijación. soporte y conexión.	Und	4,00	4,00		$ 682.626,00	$ 2.730.504,00	$ 2.730.504,00		0,01%
		7.8.9	Suministro e instalación de Access Point IEEE 802,11g, 2,4 - 5 GHz, 300 Mbps, configurable a modo cliente, puente y repetidor y/o dual	Und	1,00	1,00		$ 1.292.261,00	$ 1.292.261,00	$ 1.292.261,00		0,00%
		7.8.10	Suministro e instalación de equipo de sonido multizona mínimo 3 zonas, amplificador rango de potencia 1500 W o similar.	Und	1,00	1,00		$ 2.069.947,00	$ 2.069.947,00	$ 2.069.947,00		0,01%
		7.8.11	Suministro e instalación de caja o cofre tipo interior con amplificador para señal comunitaria TV, con ajuste de ganancia y regulación de pendiente, amplificador de canales analógicos y digitales (TD), incluye accesorios de sujeción, fijación y conexión,	Und	1,00	1,00		$ 419.680,00	$ 419.680,00	$ 419.680,00		0,00%
		7.8.12	Suministro e instalación de Gabinete rack de piso con 42 UR incluye organizador vertical, kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación. soporte y conexión.	Und	4,00	4,00		$ 3.875.394,00	$ 15.501.576,00	$ 15.501.576,00		0,04%
		7.8.13	Suministro e instalación de Gabinete rack de piso de 36 UR incluye, kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	1,00	1,00		$ 3.058.542,00	$ 3.058.542,00	$ 3.058.542,00		0,01%
		7.8.14	Suministro e instalación de Organizador horizontal 2 UR	Und	8,00	8,00		$ 213.471,00	$ 1.707.768,00	$ 1.707.768,00		0,00%
		7.8.15	Suministro e instalación de Patch Panel de 48 puertos Cat 6A	Und	7,00	7,00		$ 2.976.111,00	$ 20.832.777,00	$ 20.832.777,00		0,05%
		7.8.16	Suministro e instalación de Patch Panel de 24 puertos Cat 6A	Und	4,00	4,00		$ 1.589.252,00	$ 6.357.008,00	$ 6.357.008,00		0,02%
		7.8.17	Suministro e instalación de Patch Cord Cat 6A Azul/Rojo de 5 ft (Dentro de Gabinete)	Und	1,00	1,00		$ 53.788,00	$ 53.788,00	$ 53.788,00		0,00%
		7.8.18	Suministro e instalación de bandeja porta equipos. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	4,00	4,00		$ 102.053,00	$ 408.212,00	$ 408.212,00		0,00%
		7.8.19	Suministro e instalación de bandeja de fibra de 6-12 hilos. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	4,00	4,00		$ 972.362,00	$ 3.889.448,00	$ 3.889.448,00		0,01%
		7.8.20	Suministro e instalación de tapa ciega para conectores de fibra	Und	10,00	10,00		$ 55.290,00	$ 552.900,00	$ 552.900,00		0,00%
		7.8.21	Suministro e instalación de Kit Fan Out LC/LC para fibra multimodo OM3. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión. (por par)	Und	5,00	5,00		$ 171.269,00	$ 856.345,00	$ 856.345,00		0,00%
		7.8.22	Suministro e instalación de Conectores LC para fibra multimodo, incluye Conectorizacion (par)	Und	8,00	8,00		$ 25.635,00	$ 205.080,00	$ 205.080,00		0,00%
		7.8.23	Suministro e instalación de PDU vertical para rack, con 10 tomacorrientes	Und	4,00	4,00		$ 313.810,00	$ 1.255.240,00	$ 1.255.240,00		0,00%
		7.8.24	Suministro e instalación de Cable HDMI de 12 mts (visualización CCTV)	Und	1,00	1,00		$ 82.542,00	$ 82.542,00	$ 82.542,00		0,00%
		7.8.25	Suministro e instalación de Patch Cord de fibra óptica LC/LC (par)	Und	5,00	5,00		$ 143.310,00	$ 716.550,00	$ 716.550,00		0,00%
		7.8.26	Certificación de Conectorizacion de fibra óptica (por par)	Und	9,00	9,00		$ 55.520,00	$ 499.680,00	$ 499.680,00		0,00%
		7.8.27	Suministro e instalación de parlante pasivo para techo redondo 50W o similar, con sensibilidad de 90 dB o más. (Para instalar en el Aula Múltiple o comedor)	Und	1,00	1,00		$ 156.486,00	$ 156.486,00	$ 156.486,00		0,00%
		7.8.28	Suministro e instalación de parlante pasivo para techo 100W o similar, con sensibilidad de 90 dB o más. (Para instalar en pasillos)	Und	6,00	6,00		$ 257.167,00	$ 1.543.002,00	$ 1.543.002,00		0,00%
		7.8.29	Suministro e instalación de Gabinete rack de muro de 13 UR incluye, kit de ventilación forzada, kit de puesta a tierra. Se incluye material de conexionado, accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	1,00	1,00		$ 1.779.079,00	$ 1.779.079,00	$ 1.779.079,00		0,00%
		7.8.30	Configuración Circuito Cerrado de Televisión.	Und	1,00	1,00		$ 11.634.388,00	$ 11.634.388,00	$ 11.634.388,00		0,03%
	7,9		**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO**						**$ 73.523.207,00**	**$ 73.523.207,00**		0,18%
		7.9.1	Suministro e instalación de tubería EMT conduit de 3/4" para conexión de cableado de SDI. Incluye incidencia de soportería, accesorios de derivación y fijación, cajas de paso con tapa para conexión de cada uno de los equipos. Prom (cada 8 mts una salida)	m	1.260,00	1.260,00		$ 28.645,00	$ 36.092.700,00	$ 36.092.700,00		0,09%
		7.9.2	Suministro e instalación de cable antiflama certificado 1x2x16 AWG. Incluye incidencia de accesorios fijación.	m	3.528,00	3.528,00		$ 3.643,00	$ 12.852.504,00	$ 12.852.504,00		0,03%
		7.9.3	Suministro e instalación de detector de humo. Incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida.	Und	1,00	1,00		$ 437.092,00	$ 437.092,00	$ 437.092,00		0,00%
		7.9.4	Suministro e instalación de detector de calor (cocina). Incluye cabeza e incidencia accesorios de conexión y soporte , caja metálica de la salida	Und	1,00	1,00		$ 978.357,00	$ 978.357,00	$ 978.357,00		0,00%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		7.9.5	Suministro e instalación de estación manual. Incluye incidencia accesorios de conexión y soporte, caja metálica de la salida	Und	1,00	1,00		$ 662.974,00	$ 662.974,00	$ 662.974,00		0,00%
		7.9.6	Suministro e instalación de luz electrobioscopia con sirena. Incluye incidencia accesorios de conexión y soporte. , caja metálica de la salida	Und	1,00	1,00		$ 364.493,00	$ 364.493,00	$ 364.493,00		0,00%
		7.9.7	Suministro e instalación de módulo de monitor.	Und	1,00	1,00		$ 342.945,00	$ 342.945,00	$ 342.945,00		0,00%
		7.9.8	Suministro e instalación de modulo aislador.	Und	2,00	2,00		$ 429.473,00	$ 858.946,00	$ 858.946,00		0,00%
		7.9.9	Suministro e instalación de fuente de alimentación luz estroboscópica / sirena con 2 baterías de 12V 7Amp - Batería	Und	3,00	3,00		$ 1.682.879,00	$ 5.048.637,00	$ 5.048.637,00		0,01%
		7.9.10	Suministro e instalación de Panel de Control con capacidad para 4 lazos, cap. 200 sensores por lazo mín. Incluye incidencia accesorios de conexión y soporte. (Incluye configuración)	Und	1,00	1,00		$ 11.382.245,00	$ 11.382.245,00	$ 11.382.245,00		0,03%
		7.9.11	Programación del sistema, capacitación y manual de operación del sistema y puesta en marcha	Und	1,00	1,00		$ 4.079.130,00	$ 4.079.130,00	$ 4.079.130,00		0,01%
		7.9.12	Suministro e instalación de Stopper Acrílico W/O Horn. Listado UL y FM. Incluye incidencia de accesorios y conexión y soporte.	Und	1,00	1,00		$ 423.184,00	$ 423.184,00	$ 423.184,00		0,00%
	7.10		**SALIDAS DE COMUNICACIONES**						**$ 1.301.755,00**	**$ 1.301.755,00**		0,00%
		7.10.1	Suministro e instalación salida de datos/Tel VoIP para toma RJ 45 Cat 6A, incluye caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, faceplate sencillo, JackCat 6A azul, 3 mts de tubería EMT 3/4" , 3 mts de Cable UTP Cat 6A	Und	1,00	1,00		$ 194.765,00	$ 194.765,00	$ 194.765,00		0,00%
		7.10.2	Suministro e instalación salida de datos/Tel VoIP para toma RJ 45 Cat 6A en canaleta, incluye troquel lógico, faceplate sencillo, JackCat 6A datos, 3 mts de tubería EMT 3/4" , 3 mts de Cable UTP Cat 6A	Und	1,00	1,00		$ 171.914,00	$ 171.914,00	$ 171.914,00		0,00%
		7.10.3	Suministro e instalación salida de sonido, incluye caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, faceplate sencillo, 4 mts de tubería EMT 3/4" , 3 mts de Cable UTP Cat 6A	Und	1,00	1,00		$ 154.132,00	$ 154.132,00	$ 154.132,00		0,00%
		7.10.4	Suministro e instalación de toma HDMI, incluye caja Rawelt 4x4" con tapa, faceplate para HDMI, Conectorizacion de conector hembra HDMI, 5 mts de tubería EMT 1" , 6 mts de Cable HDMI	Und	1,00	1,00		$ 374.130,00	$ 374.130,00	$ 374.130,00		0,00%
		7.10.5	Suministro e instalación de salida vacía para toma de TV, incluye aparato, incluye tubería EMT 3/4", caja fundida en aluminio y tapacieqa, no incluye cableado.	Und	1,00	1,00		$ 156.229,00	$ 156.229,00	$ 156.229,00		0,00%
		7.10.6	Suministro e instalación de Patch Cord Cat 6A de 5 ft (Para cada salida y dentro del gabinete)	Und	1,00	1,00		$ 54.213,00	$ 54.213,00	$ 54.213,00		0,00%
		7.10.7	Suministro e instalación salida vacía de datos/DMX para control sonido y e iluminación auditorio para toma rj 45 Cat 6A, incluye caja fundida en aluminio 4x4" con tapa, faceplate sencillo, 3 mts de tubería emt 3/4"	Und	1,00	1,00		$ 196.372,00	$ 196.372,00	$ 196.372,00		0,00%
	7,11		**CANALIZACIONES Y CABLEADO DE COMUNICACIONES**						**$ 53.268.770,00**	**$ 53.268.770,00**		0,13%
		7.11.1	Suministro e instalación de tubería EMT 2" entre rack y ducto cerrado, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	m	30,00	30,00		$ 73.570,00	$ 2.207.100,00	$ 2.207.100,00		0,01%
		7.11.2	Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2" entre rack y ducto cerrado, entre bandejas, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	m	15,00	15,00		$ 88.508,00	$ 1.327.620,00	$ 1.327.620,00		0,00%
		7.11.3	Suministro e instalación de tubería EMT 1" (UTP compartido coaxial), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	m	350,00	350,00		$ 31.436,00	$ 11.002.600,00	$ 11.002.600,00		0,03%
		7.11.4	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4" , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	m	425,00	425,00		$ 28.590,00	$ 12.150.750,00	$ 12.150.750,00		0,03%
		7.11.5	Suministro e instalación de tubería PVC 3/4" (Cuartos TIC) en piso o muro , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.	m	810,00	810,00		$ 8.452,00	$ 6.846.120,00	$ 6.846.120,00		0,02%
		7.11.6	Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/2" (cuartos TIC) en piso o muro , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.	m	89,00	89,00		$ 20.181,00	$ 1.796.109,00	$ 1.796.109,00		0,00%
		7.11.7	Suministro e instalación de cable UTP Cat 6A LSZH.	m	1,00	1,00		$ 5.264,00	$ 5.264,00	$ 5.264,00		0,00%
		7.11.8	Certificación de punto datos Cat 6A	Und	1,00	1,00		$ 14.982,00	$ 14.982,00	$ 14.982,00		0,00%
		7.11.9	Suministro e instalación de fibra multimodo OM3 tipo exterior, 12 hilos	m	1,00	1,00		$ 22.365,00	$ 22.365,00	$ 22.365,00		0,00%
		7.11.10	Suministro e instalación tubería EMT 3/4" para cableado de TV (solo canalización no se contempla cable Coaxial ni UTP), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas doble ala, uniones y terminales	m	320,00	320,00		$ 28.602,00	$ 9.152.640,00	$ 9.152.640,00		0,02%
		7.11.11	Suministro e instalación tubería EMT 3/4" para cableado de sonido (solo canalización no se contempla cable), incluye accesorios de anclaje, unión y fijación como chazos, abrazaderas doble ala, uniones y terminales	m	180,00	180,00		$ 28.645,00	$ 5.156.100,00	$ 5.156.100,00		0,01%
		7.11.12	Suministro e instalación de cable coaxial RG6, incluye accesos de conexión y derivación. Splitters entre otros. (Puede cambiar dependiendo el servicio u operador).	m	80,00	80,00		$ 3.369,00	$ 269.520,00	$ 269.520,00		0,00%
		7.11.13	Suministro e instalación de cable de sonido 2x16AWG desoxigenado libre de halógenos, incluye accesos de conexión.	m	800,00	800,00		$ 4.147,00	$ 3.317.600,00	$ 3.317.600,00		0,01%
	7,12		**SISTEMA FOTOVOLTAICO**						**$ 161.790.879,00**	**$ 161.790.879,00**		0,40%
		7.12.1	Suministro e instalación de panel solar monocristalino de 350 W , 38,6 V, 9 A, incluye par de conectores MC4 macho/hembra para paneles solares.	Und	54,00	54,00		$ 1.407.477,00	$ 76.003.758,00	$ 76.003.758,00		0,19%
		7.12.2	Suministro e instalación de estructura para panel solar en aluminio para cubierta plana, con 10° inclinación sur	Und	54,00	54,00		$ 376.249,00	$ 20.317.446,00	$ 20.317.446,00		0,05%
		7.12.3	Suministro e instalación de tubería IMC 3/4", incluye cajas de paso tipo exterior y accesorios de fijación	m	130,00	130,00		$ 43.491,00	$ 5.653.830,00	$ 5.653.830,00		0,01%
		7.12.4	Suministro e instalación de coraza americana 3/4", incluye cajas de paso tipo exterior y accesorios de fijación, uniones y curvas necesarias para su instalación	m	54,00	54,00		$ 26.110,00	$ 1.409.940,00	$ 1.409.940,00		0,00%
		7.12.5	Suministro e instalación de cableado XLPE tipo solar FV para 1 kV, 90°C, 2x12 AWG + 12 Desnudo tierra para conexión de paneles solares, incluye conectores y accesorios para conexionado.	m	280,00	280,00		$ 27.410,00	$ 7.674.800,00	$ 7.674.800,00		0,02%
		7.12.6	Suministro e instalación de combiner Box o caja de conexiones, con fusibles de 10 A, Interruptor DC de 2x30A, DPS y demás elementos de acuerdo con diagrama unifilar.	Und	2,00	2,00		$ 4.281.962,00	$ 8.563.924,00	$ 8.563.924,00		0,02%
		7.12.7	Suministro e instalación de Inversor tipo On-Grid 20 KW	Und	1,00	1,00		$ 25.399.077,00	$ 25.399.077,00	$ 25.399.077,00		0,06%
		7.12.8	Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2" entre inversor y tableros TRES-INF, incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, chazos, incidencia de terminales y uniones	m	45,00	45,00		$ 86.988,00	$ 3.914.460,00	$ 3.914.460,00		0,01%
		7.12.9	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 3X6 AWG F + 6 AWG N + 8 T de Inversor a TRES-INF. Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	55,00	55,00		$ 70.375,00	$ 3.870.625,00	$ 3.870.625,00		0,01%
		7.12.10	Suministro e instalación de Caja moldeada y breaker tipo industrial de 3x60A para inversor.	Und	1,00	1,00		$ 570.192,00	$ 570.192,00	$ 570.192,00		0,00%
		7.12.11	Tramite ante operador hasta energización y aprobación proyecto sistema fotovoltaico	Und	1,00	1,00		$ 4.432.589,00	$ 4.432.589,00	$ 4.432.589,00		0,01%
		7.12.12	Suministro e Instalación Smart Meter en caja metálica, incluye cableado apantallado 3x16 AWG hasta el inversor, incidencia de bornas, accesorios de fijación y soporte.	Und	1,00	1,00		$ 2.162.938,00	$ 2.162.938,00	$ 2.162.938,00		0,01%
		7.12.13	Suministro e instalación de tubería PVC 1 1/4" en piso o muro , incluye accesorios de anclaje, unión y fijación, abrazaderas, cajas de paso, chazos, incidencia de terminales y uniones, no incluye resane de obra civil o regata en piso.	m	15,00	15,00		$ 15.717,00	$ 235.755,00	$ 235.755,00		0,00%
		7.12.14	Suministro e instalación de acometida en cable Cu HFFR-LS 2x8 AWG F + 10 T Incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	m	5,00	5,00		$ 32.437,00	$ 162.185,00	$ 162.185,00		0,00%
		7.12.15	Suministro e Instalación cable apantallado 3x16AWG para Smart Meter, incluye accesorios de fijación y conexión.	m	120,00	120,00		$ 11.828,00	$ 1.419.360,00	$ 1.419.360,00		0,00%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
	7,13		**EQUIPOS**						**$ 2.506.960,00**	**$ 2.506.960,00**		0,01%
		7.13.1	Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado o Mini Split para cuarto técnico biblioteca, capacidad de 12,000 btu, incluye instalación de unidad exterior o condensadora, canalizaciones necesarias y cableado para su funcionamiento.	Und	1,00	1,00		$ 2.506.960,00	$ 2.506.960,00	$ 2.506.960,00		0,01%
	7,14		**EQUIPOS ELÉCTRICOS ESPECIALES**						**$ 325.273.387,00**	**$ 325.273.387,00**		0,81%
		7.14.1	Suministro e instalación de Celda Dúplex M.T. en aire de acuerdo a norma CTS503 17,5 kV, 630 A, 3F 3 Hilos. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 19.674.424,00	$ 19.674.424,00	$ 19.674.424,00		0,05%
		7.14.2	Suministro e instalación de Celda de protección M.T. en aire de acuerdo a norma CTS503-1 17,5 kV, 630 A, 3F 3 Hilos. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 21.515.736,00	$ 21.515.736,00	$ 21.515.736,00		0,05%
		7.14.3	Suministro e instalación de Celda de Medida M.T. en aire de acuerdo a norma AE325 17,5 kV, 630 A, 3F 3 Hilos (Se incluye CTs, PTs y medidor). Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación.	Und	1,00	1,00		$ 31.221.541,00	$ 31.221.541,00	$ 31.221.541,00		0,08%
		7.14.4	Suministro e instalación de Celda M.T. para transformador de 225 kVA CTS518-2. Se incluye material de conexionado y accesorios de fijación, rieles para transformador y frenos.	Und	1,00	1,00		$ 7.445.729,00	$ 7.445.729,00	$ 7.445.729,00		0,02%
		7.14.5	Suministro e instalación de planta Diesel tipo stand by, de 175kW/200 kVA, efectivos a nivel Bogotá, nivel de tensión 208v/120v con caseta insonora y tanque patín de 300 lts, motor 6 cilindros con gobernador electrónico, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento con ducto de desfogue 27 mts .	Und	1,00	1,00		$ 178.726.796,00	$ 178.726.796,00	$ 178.726.796,00		0,45%
		7.14.6	Suministro e instalación de transformador tipo seco 225 kVA clase H, Dyn5, tipo abierto, factor K=1, sensores térmicos, DPS 15 KV, 11,4 kV / 208V ..	Und	1,00	1,00		$ 57.859.384,00	$ 57.859.384,00	$ 57.859.384,00		0,14%
		7.14.7	Suministro e instalación de vestida de poste con base en la norma LA218, incluye bajante IMC de 6" para cable M.T. en poste existente , 6 mts de bajante, Se incluye incidencia de soportería y accesorios de conexión para cable XLPE con líneas de M.T., cortacircuitos, curva PVC 6", accesorios de derivación y fijación.	Und	1,00	1,00		$ 8.829.777,00	$ 8.829.777,00	$ 8.829.777,00		0,02%
	7,15		**U.P.S.**						**$ 41.691.412,00**	**$ 41.691.412,00**		0,10%
		7.15.1	Suministro e instalación de Regulador 15 KVA trifásica Vin 208V, Vout 208V/120V .Se incluye material de conexionado (puente cable encauchetado 4x8 AWG 6 mts), accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	3,00	3,00		$ 10.787.356,00	$ 32.362.068,00	$ 32.362.068,00		0,08%
		7.15.2	Suministro e instalación de Regulador 5 KVA trifásica Vin 208V, Vout 208V/120V. Se incluye material de conexionado (puente cable encauchetado 4x2 AWG 6 mts), accesorios de fijación, soporte y conexión.	Und	1,00	1,00		$ 9.329.344,00	$ 9.329.344,00	$ 9.329.344,00		0,02%
	7,16		**COMPLEMENTOS Y PROVISIONALES DE OBRA**						**$ 173.231.583,00**	**$ 145.321.708,00**	**-$ 27.909.875,00**	0,36%
		7.16.1	Máquina de trabajo seguro en alturas - 10 metros - Brazo mecánico o similar (para instalaciones de iluminación exterior y en postes	Und	1,00	1,00		$ 10.055.418,00	$ 10.055.418,00	$ 10.055.418,00		0,03%
		7.16.2	Suministro e instalación de poste 12 mts 1050 kg para provisional de obra, incluye vestida de poste, estructura aérea tipo LA218, bajante en IMC 6"., incluye accesorios de fijación, herrajes, crucetas. Cable ACSR 60 mts	Und	1,00	1,00		$ 14.020.148,00	$ 14.020.148,00	$ 14.020.148,00		0,04%
		7.16.3	Suministro e instalación de transformador de 75 KVA, Refrigeración ON/AN, Conexión DY5, 13200/208/120 Voltios, Montaje en Poste, Incluye accesorios DPS, anclaje y fijación.	Und	1,00	1,00		$ 22.949.430,00	$ 22.949.430,00	$ 22.949.430,00		0,06%
		7.16.4	Suministro de materiales y construcción de banco de ductos de 2ϕ4" PVC Conduit para tableros de distribución, Tipo TDP corrugado. Incluye excavación Zona dura y blanda, perfilación, montaje de tuberías según Normas, arena, recebo, relleno y compactación, terminales tipo campana para ductos y retiro de escombros. Materiales certificados RETIE	m	80,00	19,50	-60,50	$ 213.141,00	$ 17.051.280,00	$ 4.156.250,00	-$ 12.895.030,00	0,01%
		7.16.5	Suministro e instalación de cable Cu 3x4/0 F + 1x4/0 N + 2T AWG HFFR-LS, acometida desde Transformador a Tablero de Distribución pasando por armario de medida. Se incluye material de conexión e incidencia de bornas estañadas, accesorios de fijación, soporte y conexión.	m	54,00	23,50	-30,50	$ 492.290,00	$ 26.583.660,00	$ 11.568.815,00	-$ 15.014.845,00	0,03%
		7.16.6	Suministro e instalación de Tablero de Medida indirecta norma CODENSA AE319. Incluye breaker industrial 3x300A, CT's de 300:5 A y accesorios de fijación. Se incluye Medidor.	Und	1,00	1,00		$ 6.614.115,00	$ 6.614.115,00	$ 6.614.115,00		0,02%
		7.16.7	Suministro e instalación de tablero de distribución general autosoportado, protegido con muro en ladrillo y techo, tipo intemperie(índice de protección IP 55 o 56, protección de 3x300 A, incluye 4 protecciones 3x50A, una protección de 175 A.	Und	1,00	1,00		$ 34.301.367,00	$ 34.301.367,00	$ 34.301.367,00		0,09%
		7.16.8	Suministro e instalación de acometidas en cable Cu THHN 3x6 AWG F + 1x6 AWG N + 1x8T AWG, desde Tablero general de distribución Provisional a tableros. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. Material Certificado, garantizado e instalado Según reglamento NTC 2050	m	154,00	154,00		$ 78.582,00	$ 12.101.628,00	$ 12.101.628,00		0,03%
		7.16.9	Suministro e instalación de acometidas en cable Cu THHN 3x2/0 AWG F + 1x20/ AWG N + 1x6T AWG, desde Tablero general de distribución Provisional a tablero Torre Grúa o carga de mayor consumo. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte. Material Certificado, garantizado e instalado Según reglamento NTC 2050	m	51,00	51,00		$ 341.275,00	$ 17.405.025,00	$ 17.405.025,00		0,04%
		7.16.10	Suministro e instalación de tubería PVC 1Ø1-3" para cada tablero. Se incluye incidencia de curvas, terminales, soportería, accesorios de derivación y fijación.	m	90,00	90,00		$ 89.834,00	$ 8.085.060,00	$ 8.085.060,00		0,02%
		7.16.11	Suministro e instalación de malla de puesta a tierra provisional de obra grilla de 4x4 m, 4 varillas Cu 5/8", soldaduras exotérmicas, caja inspección 30x30 cm, excavaciones y conexiones necesarias.	Und	1,00	1,00		$ 4.064.452,00	$ 4.064.452,00	$ 4.064.452,00		0,01%
8			**INSTALACIONES MECÁNICAS**						**$ 113.664.020,00**	**$ 196.483.958,00**	**$ 82.819.938,00**	**0,49%**
	8,1		**ELEVACIÓN Y/O TRANSPORTE VERTICAL**						**$ 113.664.020,00**	**$ 196.483.958,00**	**$ 82.819.938,00**	0,49%
		8.1.1	Elemento mecánico de movilidad vertical peatonal capacidad 10 personas, 7 paradas, 535 kg capacidad de carga, velocidad de 1.0m/s.	Und	1,00	2,00	1,00	$ 82.819.938,00	$ 82.819.938,00	$ 165.639.876,00	$ 82.819.938,00	0,41%
		8.1.2	Malacate de cocina en acero inoxidable de dos niveles.	Und	1,00	1,00		$ 30.844.082,00	$ 30.844.082,00	$ 30.844.082,00		0,08%
9			**CARPINTERÍA**						**$ 1.922.240.111,00**	**$ 1.922.240.111,00**		**4,80%**
	9,1		**PUERTAS**						**$ 529.213.073,00**	**$ 529.213.073,00**		1,32%
		9.1.1	P01A Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija color cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.80m x h=2.53m.	Und	6,00	6,00		$ 1.373.425,00	$ 8.240.550,00	$ 8.240.550,00		0,02%
		9.1.2	P01B Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija color cromado mate similar o equivalente, acabado base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.90m x h=2.53m.	Und	4,00	4,00		$ 1.545.104,00	$ 6.180.416,00	$ 6.180.416,00		0,02%
		9.1.3	PR02A Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.58m x h=2.53m	Und	1,00	1,00		$ 6.928.307,00	$ 6.928.307,00	$ 6.928.307,00		0,02%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		9.1.4	PR02B Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.81m x h=2.53m.	Und	3,00	3,00		$ 7.373.421,00	$ 22.120.263,00	$ 22.120.263,00		0,06%
		9.1.5	PR02C Suministro e instalación de puerta pivotante de 4 hojas, dos fijas y dos accionables con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.83m x h=2.53m.	Und	1,00	1,00		$ 7.412.126,00	$ 7.412.126,00	$ 7.412.126,00		0,02%
		9.1.6	PR03 Suministro e instalación de puerta pivotante de 2 hojas accionables con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.2m x h=2.53m.	Und	1,00	1,00		$ 2.322.337,00	$ 2.322.337,00	$ 2.322.337,00		0,01%
		9.1.7	P04 Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color naranja RAL2017 al exterior y color gris nopal hacia el interior. a=1.20m x h=2.53m.	Und	1,00	1,00		$ 3.558.420,00	$ 3.558.420,00	$ 3.558.420,00		0,01%
		9.1.8	P05 Suministro e instalación de puerta corrediza de 3 hojas entamboradas en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, cerradura de incrustar pico de loro color negro. a=3.60m x h=3.00m.	Und	8,00	8,00		$ 10.393.221,00	$ 83.145.768,00	$ 83.145.768,00		0,21%
		9.1.9	PR06 Suministro e instalación de puerta plegable de 8 hojas accionables en dos sentidos, en acero ASTM A36 o acero estructural al carbono, marco en bastidor tubular de 100mm x 50mm, celosía en platinas de acero ASTM A36 e=3/8" x a=2", cerradura inferior seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=13.80m x h=3.00m.	Und	1,00	1,00		$ 31.668.236,00	$ 31.668.236,00	$ 31.668.236,00		0,08%
		9.1.10	P07 Suministro e instalación de puerta pivotante de 2 hojas accionables con pivote superior e inferior y un tramo de panel fijo en lamina de acero cold rolled calibre 18, marcos en perfil tubular de acero cold rolled de 30mm x 50mm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura intermedia grado 1 cromada, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=6.70m x h=3.36m. Puerta a=3.55m - Módulo fijo a=3.15m.	Und	1,00	1,00		$ 16.109.197,00	$ 16.109.197,00	$ 16.109.197,00		0,04%
		9.1.11	PR08 Suministro e instalación de puerta plegable de 5 hojas entamboradas, en acero ASTM A36 o acero estructural al carbono, marco en bastidor tubular de 100mm x 50mm, celosía en platinas de acero ASTM A36 e=3/8" x a=2", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=5.69m x h=2.50m.	Und	1,00	1,00		$ 10.881.175,00	$ 10.881.175,00	$ 10.881.175,00		0,03%
		9.1.12	P09A Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.80m x h=3.00m.	Und	1,00	1,00		$ 1.628.568,00	$ 1.628.568,00	$ 1.628.568,00		0,00%
		9.1.13	P09B Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.70m x h=3.00m.	Und	33,00	33,00		$ 1.424.997,00	$ 47.024.901,00	$ 47.024.901,00		0,12%
		9.1.14	P09C Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.90m x h=3.00m.	Und	10,00	10,00		$ 1.832.139,00	$ 18.321.390,00	$ 18.321.390,00		0,05%
		9.1.15	P09D Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.20m x h=3.00m.	Und	1,00	1,00		$ 2.442.851,00	$ 2.442.851,00	$ 2.442.851,00		0,01%
		9.1.16	P10 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con líneas de repujado troquelado horizontal, cerradura de seguridad grado 1 acabado cromado mate similar o equivalente, manija vertical de 30cm en perfil tubular redondo de acero negro de 1", acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.15m x h=3.00m.	Und	8,00	8,00		$ 2.341.066,00	$ 18.728.528,00	$ 18.728.528,00		0,05%
		9.1.17	P11 Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color naranja RAL2017 al exterior y color gris nopal hacia el interior. a=1.20m x h=3.00m.	Und	15,00	15,00		$ 4.219.470,00	$ 63.292.050,00	$ 63.292.050,00		0,16%
		9.1.18	PR12 Suministro e instalación de cerramiento fijo en perfiles tubulares redondos de acero estructural al carbono con recubrimiento galvanizado ASTM A653, solo perfiles verticales de Ø2" @0.18m, acabado en recubrimiento de dos capas de anticorrosivo y tres capas de pintura base esmalte color RAL9005 "negro intenso". a=9.35m x h=2.86m.	Und	1,00	1,00		$ 19.074.000,00	$ 19.074.000,00	$ 19.074.000,00		0,05%
		9.1.19	P13 Suministro e instalación de una puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18; ventanilla media en vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, a=0.16m x h=0.8m, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, marquete redondeado y burlete en neopreno para prevención de machucones, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.20m x h=2.23m.	Und	32,00	32,00		$ 1.815.852,00	$ 58.107.264,00	$ 58.107.264,00		0,15%
		9.1.20	P14 Suministro e instalación de puerta pivotante de 1 hoja con pivote superior e inferior en lamina de acero cold rolled calibre 18, marcos en perfil tubular de acero cold rolled de 30mm x 50mm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura de seguridad intermedia grado 1 cromada, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.77m x h=3.00m.	Und	1,00	1,00		$ 4.061.795,00	$ 4.061.795,00	$ 4.061.795,00		0,01%
		9.1.21	P15 Suministro e instalación de puerta plegable de 5 hojas entamboradas en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, cerradura de incrustar pico de loro color negro. Incluye sistema de rieles y herrajes para accionamiento de puerta en acero inoxidable. a=4.65m x h=3.00m.	Und	1,00	1,00		$ 9.981.936,00	$ 9.981.936,00	$ 9.981.936,00		0,02%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		9.1.22	P16 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica de acero y recubiertas en lámina de acero cold rolled calibre 18, cerradura de seguridad similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000. a=3.72m x h=3.05m.	Und	1,00	1,00		$ 7.699.031,00	$ 7.699.031,00	$ 7.699.031,00		0,02%
		9.1.23	P17 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica de acero y recubiertas en lámina de acero cold rolled calibre 18, cerradura de aeguridad similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=3.40m x h=2.10m.	Und	1,00	1,00		$ 4.844.989,00	$ 4.844.989,00	$ 4.844.989,00		0,01%
		9.1.24	P18A Suministro e instalación de puerta batiente de 2 hojas en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19 similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=2.05m x h=2.10m.	Und	1,00	1,00		$ 5.045.783,00	$ 5.045.783,00	$ 5.045.783,00		0,01%
		9.1.25	P18B Suministro e instalación de puerta batiente de 2 hojas en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, resistente al fuego F90, cerradura en aluminio similar o equivalente y barra antipánico serie 19 similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=2.10m x h=2.10m.	Und	1,00	1,00		$ 5.168.851,00	$ 5.168.851,00	$ 5.168.851,00		0,01%
		9.1.26	P19 Suministro e instalación de puerta corrediza de 1 hoja entamborada en perfilería metálica de acero y recubiertas en lámina de acero cold rolled calibre 18, cerradura de seguridad similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.80m x h=2.10m.	Und	2,00	2,00		$ 2.564.994,00	$ 5.129.988,00	$ 5.129.988,00		0,01%
		9.1.27	P20 Suministro e instalación de puerta corrediza de 6 hojas entamboradas (accionables a dos lados) en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, cerrojo de seguridad B60 grado 1, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1". Incluye cajón en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente para ocultamiento de hojas. a=8.18m x h=3.05m.	Und	1,00	1,00		$ 24.009.305,00	$ 24.009.305,00	$ 24.009.305,00		0,06%
		9.1.28	P21 Suministro e instalación de puerta plegable de 10 hojas entamboradas (accionables a dos lados) en perfilería metálica de acero y recubiertas en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente, manija de incrustar rectangular en aluminio. Incluye cajón en tableros de madera recubiertos con chapilla melaminica Rovere similar o equivalente para ocultamiento de hojas. a=10.25m x h=3.00m.	Und	1,00	1,00		$ 29.591.813,00	$ 29.591.813,00	$ 29.591.813,00		0,07%
		9.1.29	PR22 Suministro e instalación de puerta pivotante de 1 hojas con pivote superior e inferior, en lamina de acero cold rolled calibre 18, marco en perfil tubular y hojas en celosía de láminas de acero cold rolled de desarrollo de 13cm @6cm, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", cerradura inferior de seguridad, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris nopal. a=1.00m x h=2.53m.	Und	1,00	1,00		$ 1.935.281,00	$ 1.935.281,00	$ 1.935.281,00		0,00%
		9.1.30	PV05 - Suministro e instalación de una puerta pivotante de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18; marco en perfil de acero cold rolled de 3cm de ancho, cerrojo de seguridad acabado cromado mate similar o equivalente, marquetes redondeados y burlete en neopreno para prevención de machucones, manija de altura completa en perfil tubular redondo de acero negro de 1", acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.77m x h=2.10m.	Und	1,00	1,00		$ 2.522.244,00	$ 2.522.244,00	$ 2.522.244,00		0,01%
		9.1.31	P23 - Suministro e instalación de puerta batiente de 1 hoja en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18 con módulo bajo microperforado por punzonado, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=0.5m x h=3.00m.	Und	2,00	2,00		$ 1.017.855,00	$ 2.035.710,00	$ 2.035.710,00		0,01%
	9,2		**VENTANAS**						**$ 966.509.226,00**	**$ 966.509.226,00**		2,42%
		9.2.1	V01A - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.15m x h=0.5m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	2,00	2,00		$ 2.200.416,00	$ 4.400.832,00	$ 4.400.832,00		0,01%
		9.2.2	V02A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.90m h=1.72m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	2,00	2,00		$ 639.805,00	$ 1.279.610,00	$ 1.279.610,00		0,00%
		9.2.3	V03A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.45m h=3.06m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	14,00	14,00		$ 569.129,00	$ 7.967.806,00	$ 7.967.806,00		0,02%
		9.2.4	V03B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.50m h=3.06m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	14,00	14,00		$ 632.365,00	$ 8.853.110,00	$ 8.853.110,00		0,02%
		9.2.5	V04 - Suministro e instalación de ventana compuesta con rejilla superior, panel fijo de ventana y panel fijo en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en lámina lisa de acero galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con estructura interna en perfiles de acero negro de 4cm x 4cm, armados @1m en vertical y @0.5m en horizontal. Módulo de ventana de interlocución, a=1.08m x h=1.57m con marco en perfilería de acero negro de 4cm x 4cm, vidrio templado y laminado 3mm + 3mm. Acabado general con recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	1,00		$ 7.997.562,00	$ 7.997.562,00	$ 7.997.562,00		0,02%
		9.2.6	V05A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.45m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 1.892.757,00	$ 1.892.757,00	$ 1.892.757,00		0,00%
		9.2.7	V05B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.60m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 1.936.774,00	$ 1.936.774,00	$ 1.936.774,00		0,00%
		9.2.8	V06 - Suministro e instalación de ventana fija por módulo fijo inferior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=11.35m h=0.9m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montantes verticales @1.88m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 5mm + 5mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 4.221.968,00	$ 4.221.968,00	$ 4.221.968,00		0,01%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		9.2.9	V07A - Suministro e instalación de ventana fija tipo rejilla en perfilería de acero negro, a=6.70m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de acero negro de 50mm x 100mm, montantes verticales @0.95m, montante horizontal h=1.2m del piso. Panel enmarcado con ángulos de acero ASTM A36 1" x 1/8", recubierto con paneles en malla expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	10,00	10,00		$ 8.307.555,00	$ 83.075.550,00	$ 83.075.550,00		0,21%
		9.2.10	V07B - Suministro e instalación de ventana fija tipo rejilla en perfilería de acero negro, a=6.80m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de acero negro de 50mm x 100mm, montantes verticales @0.96m, montante horizontal h=1.2m del piso. Panel enmarcado con ángulos de acero ASTM A36 1" x 1/8", recubierto con paneles en malla expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	2,00	2,00		$ 8.431.538,00	$ 16.863.076,00	$ 16.863.076,00		0,04%
		9.2.11	V08A - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.56m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 1.309.864,00	$ 1.309.864,00	$ 1.309.864,00		0,00%
		9.2.12	V08B - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.70m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	2,00	2,00		$ 1.342.847,00	$ 2.685.694,00	$ 2.685.694,00		0,01%
		9.2.13	V08C - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.15m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 1.448.861,00	$ 1.448.861,00	$ 1.448.861,00		0,00%
		9.2.14	V08D - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.30m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 1.484.199,00	$ 1.484.199,00	$ 1.484.199,00		0,00%
		9.2.15	V08E - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.45m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	3,00	3,00		$ 1.519.538,00	$ 4.558.614,00	$ 4.558.614,00		0,01%
		9.2.16	V08F - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.60m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 1.554.875,00	$ 1.554.875,00	$ 1.554.875,00		0,00%
		9.2.17	V08G - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	10,00	10,00		$ 1.578.434,00	$ 15.784.340,00	$ 15.784.340,00		0,04%
		9.2.18	V08H - Suministro e instalación de ventana corrida compuesta por módulos de ventanas proyectantes superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=8.10m h=0.57m. Marco y montantes intermedios verticales @1.22m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 1.908.255,00	$ 1.908.255,00	$ 1.908.255,00		0,00%
		9.2.19	V08I - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.40m h=2.22m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	26,00	26,00		$ 367.020,00	$ 9.542.520,00	$ 9.542.520,00		0,02%
		9.2.20	V08J - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.50m h=2.22m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	26,00	26,00		$ 458.775,00	$ 11.928.150,00	$ 11.928.150,00		0,03%
		9.2.21	V09 - Suministro e instalación de ventana compuesta con rejilla superior y panel fijo en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en lámina lisa de acero galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con estructura interna en perfiles de acero negro de 4cm x 4cm, armados @1m en vertical y @0.5m en horizontal. Acabado general con recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	1,00		$ 13.846.525,00	$ 13.846.525,00	$ 13.846.525,00		0,03%
		9.2.22	V10A - V10B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos, ventana proyectante lateral en perfilería de aluminio sistema 'stick' y lámina de acero cold rolled, a=6.08m h=0.50m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	2,00	2,00		$ 1.575.269,00	$ 3.150.538,00	$ 3.150.538,00		0,01%
		9.2.23	V11A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana corrediza superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.93m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Riel de desplazamiento en aluminio con sello anti condensación.	Und	1,00	1,00		$ 6.112.865,00	$ 6.112.865,00	$ 6.112.865,00		0,02%
		9.2.24	V11B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana corrediza superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.94m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Riel de desplazamiento en aluminio con sello anti condensación.	Und	1,00	1,00		$ 6.125.264,00	$ 6.125.264,00	$ 6.125.264,00		0,02%
		9.2.25	V12A - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.40m h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 12.749.808,00	$ 12.749.808,00	$ 12.749.808,00		0,03%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		9.2.26	V12B - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.41m h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 12.769.730,00	$ 12.769.730,00	$ 12.769.730,00		0,03%
		9.2.27	V12C - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.96m h=4.82m. Marco y montante intermedio horizontal en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 13.865.416,00	$ 13.865.416,00	$ 13.865.416,00		0,03%
		9.2.28	V13 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=3.33m x h=0.5m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	1,00		$ 1.129.819,00	$ 1.129.819,00	$ 1.129.819,00		0,00%
		9.2.29	V14 - Suministro e instalación de ventanal compuesto por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.16m h=1.80m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 3.094.870,00	$ 3.094.870,00	$ 3.094.870,00		0,01%
		9.2.30	V15A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes inferiores y módulos de ventana fija superiores en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=2.10m. Marco y montantes intermedios verticales @1.11m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.	Und	15,00	15,00		$ 5.815.281,00	$ 87.229.215,00	$ 87.229.215,00		0,22%
		9.2.31	V16 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes inferiores y módulos de ventana fija superiores en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.40m h=2.10m. Marco y montantes intermedios verticales @1.07m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.	Und	2,00	2,00		$ 4.686.943,00	$ 9.373.886,00	$ 9.373.886,00		0,02%
		9.2.32	V17A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.40m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	4,00	4,00		$ 1.259.178,00	$ 5.036.712,00	$ 5.036.712,00		0,01%
		9.2.33	V17B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	16,00	16,00		$ 1.562.315,00	$ 24.997.040,00	$ 24.997.040,00		0,06%
		9.2.34	V18 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.10m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	2,00	2,00		$ 1.562.315,00	$ 3.124.630,00	$ 3.124.630,00		0,01%
		9.2.35	V19 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=22.55m x h=1.03m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate. Módulo inicial y final a=1.23m, módulos intermedios de 1m de ancho.	Und	1,00	1,00		$ 16.620.481,00	$ 16.620.481,00	$ 16.620.481,00		0,04%
		9.2.36	V20 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.41m h=0.80m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.26m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	6,00	6,00		$ 3.663.783,00	$ 21.982.698,00	$ 21.982.698,00		0,05%
		9.2.37	V21A - V21B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.40m h=0.80m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.26m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	13,00	13,00		$ 1.678.905,00	$ 21.825.765,00	$ 21.825.765,00		0,05%
		9.2.38	V22A - Suministro e instalación de ventana compuesta fija con módulos proyectantes laterales en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=8.40m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 3.124.629,00	$ 3.124.629,00	$ 3.124.629,00		0,01%
		9.2.39	V23A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.41m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 4.986.305,00	$ 4.986.305,00	$ 4.986.305,00		0,01%
		9.2.40	V23B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.05m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 3.732.817,00	$ 3.732.817,00	$ 3.732.817,00		0,01%
		9.2.41	V24 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.65m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 6.175.275,00	$ 6.175.275,00	$ 6.175.275,00		0,02%
		9.2.42	V25 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y superior y ventana proyectante intermedia en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.78m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana proyectante de h=0.60m.	Und	150,00	150,00		$ 967.147,00	$ 145.072.050,00	$ 145.072.050,00		0,36%
		9.2.43	V26 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo superior, ventana proyectante intermedia, y módulo inferior en celosía, en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.78m h=3.00m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana proyectante de h=0.60m. Celosía horizontal en lámina de aluminio 6003 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, h=1.2m.	Und	10,00	10,00		$ 1.385.763,00	$ 13.857.630,00	$ 13.857.630,00		0,03%
		9.2.44	V27 - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y superior y ventana proyectante intermedia en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.78m h=4.62m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Ventana proyectante de h=0.60m.	Und	24,00	24,00		$ 1.489.406,00	$ 35.745.744,00	$ 35.745.744,00		0,09%
		9.2.45	V28 - Suministro e instalación de ventana fija embebida en marco en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=7.08m h=4.97m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.20m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Marco para embebida de ventana en lámina de aluminio 6003 calibre 16 o 1.5mm, sección a=10cm x l=70cm.	Und	2,00	2,00		$ 13.675.148,00	$ 27.350.296,00	$ 27.350.296,00		0,07%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		9.2.46	V29 - Suministro e instalación de ventana horizontal tipo lucernario en vidrio laminado y templado con tratamiento de control solar, e=4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Resistencia a la flexión 180MPa, resistencia al impacto de una esfera de acero de 227gr que se deja caer a una altura de 3m, resistencia a la compresión 69MPa, resistencia al choque térmico λ=200°C, protección contra rayos UV 98.10%, porcentaje de reflectancia 15.6%, factor U de 5.66 w/m²°C, porcentaje de transmitancia (SHGC) 66%, porcentaje de transmisión de luz visible (VLT) 47%.	Und	24,00	24,00		$ 3.028.118,00	$ 72.674.832,00	$ 72.674.832,00		0,18%
		9.2.47	V30A - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=2.30m x h=0.23m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	48,00	48,00		$ 313.277,00	$ 15.037.296,00	$ 15.037.296,00		0,04%
		9.2.48	V30B - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=1.70m x h=0.23m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	48,00	48,00		$ 231.553,00	$ 11.114.544,00	$ 11.114.544,00		0,03%
		9.2.49	PV05A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.94m h=2.10m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.21m. Paneles de vidrio templado incoloro e=10mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 4.607.661,00	$ 4.607.661,00	$ 4.607.661,00		0,01%
		9.2.50	PV05B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=3.31m h=2.10m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.66m. Paneles de vidrio templado incoloro e=10mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 3.087.319,00	$ 3.087.319,00	$ 3.087.319,00		0,01%
		9.2.51	PV15 - Suministro e instalación de ventana fija compuesta, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=2.05m x h=3.00m. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Panel de vidrio laminado y templado 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulo fijo a tope.	Und	1,00	1,00		$ 2.731.552,00	$ 2.731.552,00	$ 2.731.552,00		0,01%
		9.2.52	V01B - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.355m x h=0.5m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	1,00		$ 2.156.155,00	$ 2.156.155,00	$ 2.156.155,00		0,01%
		9.2.53	V02A - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulo fijo inferior y ventana proyectante superior en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=0.90m h=2.20m. Marco y montantes intermedios en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 818.356,00	$ 818.356,00	$ 818.356,00		0,00%
		9.2.54	V05C - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	5,00	5,00		$ 1.966.119,00	$ 9.830.595,00	$ 9.830.595,00		0,02%
		9.2.55	V05D - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=8.16m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	2,00	2,00		$ 2.394.557,00	$ 4.789.114,00	$ 4.789.114,00		0,01%
		9.2.56	V05E - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.40m h=0.71m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 1.584.633,00	$ 1.584.633,00	$ 1.584.633,00		0,00%
		9.2.57	V15B - V15C - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos de ventanas proyectantes inferiores y módulos de ventana fija superiores en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.70m h=2.58m. Marco y montantes intermedios verticales @1.11m en perfilería de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados. Módulos de ventana proyectante de 0.46m de altura.	Und	8,00	8,00		$ 7.144.489,00	$ 57.155.912,00	$ 57.155.912,00		0,14%
		9.2.58	V17C - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=4.49m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 1.046.984,00	$ 1.046.984,00	$ 1.046.984,00		0,00%
		9.2.59	V17D - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.58m h=0.60m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, junta vertical @1.06m. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm, con película de PVB de 0.38mm, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	2,00	2,00		$ 1.534.332,00	$ 3.068.664,00	$ 3.068.664,00		0,01%
		9.2.60	V22A - Suministro e instalación de ventana compuesta fija con módulos proyectantes laterales en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=6.15m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.77m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 2.151.097,00	$ 2.151.097,00	$ 2.151.097,00		0,01%
		9.2.61	V23C - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.43m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 4.705.948,00	$ 4.705.948,00	$ 4.705.948,00		0,01%
		9.2.62	V23D - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 5.124.557,00	$ 5.124.557,00	$ 5.124.557,00		0,01%
		9.2.63	V31A - V31B - Suministro e instalación de ventana compuesta por módulos fijos en perfilería de aluminio sistema 'stick' y módulos superiores en rejilla de lámina de acero galvanizado ASTM A653, a=6.70m h=1.05m. Marco de ventana en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm. Marco de rejilla perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	6,00	6,00		$ 4.166.172,00	$ 24.997.032,00	$ 24.997.032,00		0,06%
		9.2.64	V32 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=27m x h=0.71m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	1,00		$ 13.008.320,00	$ 13.008.320,00	$ 13.008.320,00		0,03%
		9.2.65	V33A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 5.124.557,00	$ 5.124.557,00	$ 5.124.557,00		0,01%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		9.2.66	V33B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.56m h=2.23m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 2.487.078,00	$ 2.487.078,00	$ 2.487.078,00		0,01%
		9.2.67	V34 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=16.17m h=0.90m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	2,00	2,00		$ 6.014.911,00	$ 12.029.822,00	$ 12.029.822,00		0,03%
		9.2.68	V35A - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.31m h=1.03m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 2.260.521,00	$ 2.260.521,00	$ 2.260.521,00		0,01%
		9.2.69	V35B - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=5.41m h=1.03m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 2.303.091,00	$ 2.303.091,00	$ 2.303.091,00		0,01%
		9.2.70	V36 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=1.40m h=3.00m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	2,00	2,00		$ 1.735.905,00	$ 3.471.810,00	$ 3.471.810,00		0,01%
		9.2.71	V37 - Suministro e instalación de ventana fija en perfilería de aluminio sistema 'stick', a=3.63m h=3.00m. Marco en perfilería de aluminio de 40mm de ancho, montante vertical @1.32m en perfil de aluminio de 40mm de ancho. Paneles de vidrio laminado y templado incoloro 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.38mm.	Und	1,00	1,00		$ 4.500.953,00	$ 4.500.953,00	$ 4.500.953,00		0,01%
		9.2.72	V38 - Suministro e instalación de ventana tipo rejilla en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=0.56m x h=2.28m, calibre 16 o 1.5mm. Marco perimetral en platina de 3/8" en acero ASTM A36. Celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m, recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate.	Und	1,00	1,00		$ 866.398,00	$ 866.398,00	$ 866.398,00		0,00%
	9,3		**BARANDAS**						**$ 130.839.180,00**	**$ 130.839.180,00**		0,33%
		9.3.1	E4 Suministro e instalación de baranda en acero y malla expandida, h=1.2m. Estructura tipo marco con balaustre, barandal inferior y pasamanos en platina de acero ASTM A36, sección de 2" x e=3/8" o 1cm, balaustres @0.675m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en malla expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.	m	129,36	129,36		$ 643.521,00	$ 83.245.877,00	$ 83.245.877,00		0,21%
		9.3.2	E4 Suministro e instalación de baranda en acero y malla expandida, h=1.2m. Estructura tipo marco con balaustre, barandal inferior y pasamanos en platina de acero ASTM A36, sección de 2" x e=3/8" o 1cm, balaustres @1,02m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en malla expandida de acero hot rolled, calibre 12 o 2.5mm, referencia CT-20 Lechon. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.	m	2,06	2,06		$ 545.256,00	$ 1.123.227,00	$ 1.123.227,00		0,00%
		9.3.3	Suministro e instalación de baranda en acero y lámina lisa, h=1.26m. Estructura tipo marco con balaustre, barandales en tubular de acero inoxidable 1", balaustres @0.92m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en lámina de acero cold rolled, calibre 12 o 2.5mm. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.	m	24,42	24,42		$ 703.155,00	$ 17.171.045,00	$ 17.171.045,00		0,04%
		9.3.4	Suministro e instalación de baranda con paneles de vidrio, h=0.90m, Estructura tipo marco con balaustre, barandales en tubular de acero inoxidable 1", balaustres @0.92m, barandal inferior h=0.1m. Paneles en vidrio laminado y templado 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.76mm. Recubrimiento en dos capas de anticorrosivo y cuatro capas de pintura en esmalte color gris nopal.	m	66,19	66,19		$ 386.681,00	$ 25.594.415,00	$ 25.594.415,00		0,06%
		9.3.5	Suministro e instalación baranda con paneles de vidrio a tope, h=1.2m. Paneles en vidrio laminado y templado 4mm + 4mm, con película de PVB de 0.76mm, biselados en los bordes a 45° para instalación atope. Incluye herraies de soporte.	m	27,00	27,00		$ 137.208,00	$ 3.704.616,00	$ 3.704.616,00		0,01%
	9,4		**PUERTAS VENTANAS**						**$ 295.678.632,00**	**$ 295.678.632,00**		0,74%
		9.4.1	PV01 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 6 hojas (3 cuerpos dobles), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=5.70m x h=2.40m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente.	Und	2,00	2,00		$ 6.413.595,00	$ 12.827.190,00	$ 12.827.190,00		0,03%
		9.4.2	PV02A - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.30m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.	Und	10,00	10,00		$ 7.088.940,00	$ 70.889.400,00	$ 70.889.400,00		0,18%
		9.4.3	PV02B - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.0m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.	Und	2,00	2,00		$ 6.751.152,00	$ 13.502.304,00	$ 13.502.304,00		0,03%
		9.4.4	PV03A - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 1 fijo y 3 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.70m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.	Und	2,00	2,00		$ 7.539.070,00	$ 15.078.140,00	$ 15.078.140,00		0,04%
		9.4.5	PV03B - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 1 fijo y 3 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.70m x h=2.40m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.	Und	4,00	4,00		$ 7.538.787,00	$ 30.155.148,00	$ 30.155.148,00		0,08%
		9.4.6	PV04 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 2 hojas con dintel en madera entamborada, puerta con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=1.70m x h=3.00m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente. Dintel de ventana en estructura de perfiles de acero estructural al carbono de 1-1/4" x 1-1/4", enchapados con tableros de madera aglomerada recubiertos con chapilla de madera natural de Haya africano.	Und	6,00	6,00		$ 2.831.487,00	$ 16.988.922,00	$ 16.988.922,00		0,04%
		9.4.7	PV06 - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 8 hojas, 6 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=12.02m x h=2.10m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor. Junta vertical en montantes o a tope @1.50m, junta vertical intermedia a tope con bordes biselados.	Und	1,00	1,00		$ 11.834.208,00	$ 11.834.208,00	$ 11.834.208,00		0,03%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		9.4.8	PV07 - Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de 4 hojas, 2 fijas y 2 accionables, en perfilería de aluminio, a=6.41m x h=2.10m. Riel inferior y superior embebido. Marco de hojas en perfil para riel de 40mm de ancho. Manija de embutir color gris. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor.	Und	1,00	1,00		$ 6.310.922,00	$ 6.310.922,00	$ 6.310.922,00		0,02%
		9.4.9	PV08A - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulo fijo y módulo pivotante de 1 hoja, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=2.07m x h=3.00m, puerta de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente.	Und	1,00	1,00		$ 2.911.434,00	$ 2.911.434,00	$ 2.911.434,00		0,01%
		9.4.10	PV08B - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulo fijo y módulo pivotante de 1 hoja, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=2.26m x h=3.00m, puerta de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente.	Und	1,00	1,00		$ 3.178.667,00	$ 3.178.667,00	$ 3.178.667,00		0,01%
		9.4.11	PV09 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por ventanilla de interlocución y puerta batiente entamborada en lamina de acero cold rolled calibre 18, a=1.68m x h=3.00m. Puerta a=0.90m - Módulo fijo a=0.78m, marcos en perfil tubular de acero cold rolled de 30mm x 50mm, manija tipo Schlage referencia Júpiter, cerradura intermedia tipo Schlage referencia B60 grado 1 cromada. Módulo fijo con panel entamborado inferior con bastidores en tubulares de acero cuadrados de 1-1/4", recubiertos en ambas caras con láminas de acero cold rolled calibre 18, a=0.78m x h=0.96m. Nicho de ventanilla de interlocución en lámina de acero hot rolled e=3/8", a=0.78m x p=0.72m x h=2.04m. Ventanilla de interlocución en marco de perfiles de acero cold rolled calibre 18, ancho de 40mm, vidrio laminado y templado incoloro 3mm + 3mm con película de sandblasting interna, incluye 104 perforaciones en ventanilla. Acabado de todas las superficies metálicas en base anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color rojo vivo RAL3000.	Und	1,00	1,00		$ 2.291.642,00	$ 2.291.642,00	$ 2.291.642,00		0,01%
		9.4.12	PV10 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 3 hojas (3 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.70m x h=3.00m, puertas de a=0.90m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfiles verticales intermedios de confinamiento y soporte en tubulares de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente.	Und	1,00	1,00		$ 9.423.484,00	$ 9.423.484,00	$ 9.423.484,00		0,02%
		9.4.13	PV11 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 2 hojas (3 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.70m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=1.20m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubulares de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior tipo Schlage B352 similar o equivalente.	Und	1,00	1,00		$ 9.423.484,00	$ 9.423.484,00	$ 9.423.484,00		0,02%
		9.4.14	PV12 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por puerta batiente de una hoja y ventana compuesta por rejilla superior y panel fijo en lámina de acero galvanizado ASTM A653. a=6.45m x h=3.00m, calibre 16 o 1.5mm. VENTANA. Marco perimetral en perfil tubular de 2.5cm x 5cm. Módulo superior h=0.5m en celosía horizontal en lámina de acero ASTM A653 calibre 16 o 1.5mm, desarrollo=13cm @0.06m. Módulo fijo en lámina lisa de acero galvanizado en una cara, calibre 16 o 1.5mm con estructura interna en perfiles de acero negro de 4cm x 4cm, armados @1m en vertical y @0.5m en horizontal. Acabado general con recubrimiento en dos capas de anticorrosivo color gris y tres capas de pintura en esmalte de color gris nopal semimate. PUERTA, en lámina metálica de acero cold rolled calibre 18, cerradura cilindrica de manija acabado cromado mate similar o equivalente, acabado en base cromada anticorrosiva de zinc y en pintura electrostática color gris Nopal. a=1.07m x h=3.00m.	Und	1,00	1,00		$ 13.130.325,00	$ 13.130.325,00	$ 13.130.325,00		0,03%
		9.4.15	PV13 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 2 hojas (2 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.15m x h=3.00m, puertas de a=1.00m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubulares de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior seguridad.	Und	1,00	1,00		$ 9.071.861,00	$ 9.071.861,00	$ 9.071.861,00		0,02%
		9.4.16	PV14A - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 1 hoja (2 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=3.46m x h=3.00m, puerta de a=1.00m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulo fijo a tope. Cerradura de seguridad inferior .	Und	1,00	1,00		$ 4.866.456,00	$ 4.866.456,00	$ 4.866.456,00		0,01%
		9.4.17	PV14B - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes de 1 hoja (2 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=4.93m x h=3.00m, puerta de a=1.00m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulo fijo a tope. Cerradura de seguridad inferior.	Und	2,00	2,00		$ 6.933.997,00	$ 13.867.994,00	$ 13.867.994,00		0,03%
		9.4.18	PV16 - Suministro e instalación de puerta ventana pivotante de 2 hojas, con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=1.68m x h=2.23m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Panel de vidrio laminado y templado de 5mm + 5mm de espesor, con bordes biselados y suavizados. Cerradura de seguridad inferior.	Und	2,00	2,00		$ 1.756.438,00	$ 3.512.876,00	$ 3.512.876,00		0,01%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		9.4.19	PV17 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes, 6 hojas pivotantes (12 módulos fijos adyacentes), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=26.77m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=0.86m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubular de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio templado de 10mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulos fijos a tope. Cerradura de seguridad inferior.	Und	1,00	1,00		$ 37.651.741,00	$ 37.651.741,00	$ 37.651.741,00		0,09%
		9.4.20	PV18 - Suministro e instalación de puerta ventana compuesta por módulos fijos y módulos pivotantes, 3 hojas pivotantes (1 módulo fijo adyacente), con zócalo y riel superior de protección en aluminio, a=6.23m x h=3.00m, puertas de a=0.90m y a=0.86m. Pivote inferior y superior P7P en aluminio. Zócalo y riel superior en perfil de aluminio S369 de 9cm. Manija tipo haladera en barra redonda de 1" en aluminio, h=30cm, referencia MB30 similar o equivalente. Perfil vertical intermedio de confinamiento y soporte en tubular de acero negro de 100mm x 100mm x 3mm. Panel de vidrio templado de 10mm de espesor, con bordes biselados y suavizados, junta vertical en módulos fijos a tope. Cerradura de seguridad inferior.	Und	1,00	1,00		$ 8.762.434,00	$ 8.762.434,00	$ 8.762.434,00		0,02%
10			**MOBILIARIO FIJO Y ACCESORIOS**						**$ 770.466.663,00**	**$ 770.466.663,00**		**1,93%**
	10,1		**MUEBLES FIJOS**						**$ 183.853.798,00**	**$ 183.853.798,00**		0,46%
		10.1.1	M01 - Mueble nicho - Suministro e instalación de mueble de almacenamiento y descanso en madera aglomerada con recubrimiento melaminico de l=1.40m x a=0.46m x h=3.00m, e=18mm, con recubrimiento melamínico exterior en color Rovere, similar o equivalente, cantos rígidos. Zócalo en madera h=25cm, con estructura interna de bastidores en madera. Módulo de almacenamiento con puerta batiente y entrepaños internos en madera aglomerada con recubrimiento melaminico color verde azulado, e=18mm, cantos rígidos. Enchape de muro en aglomerado melaminico color Rovere, e=6mm, d=0.74m x h=3.00m. Incluye herrajes, cerraduras y accesorios en acero inoxidable. Incluye cojín en tela impermeable con interior en espuma sintética, color blanco.	Und	10,00	10,00		$ 2.563.579,00	$ 25.635.790,00	$ 25.635.790,00		0,06%
		10.1.2	M02 - Mueble bajo - Suministro e instalación de mueble de almacenamiento y anotación en madera aglomerada con recubrimiento melaminico de l=5.35m x a=0.76m x h=2.23m, e=18mm, con recubrimiento melamínico exterior en color Rovere, similar o equivalente, cantos rígidos. Zócalo en madera h=25cm, con estructura interna de bastidores en madera. Módulo de almacenamiento con puerta batiente y entrepaños internos en madera aglomerada con recubrimiento melaminico color verde azulado, e=18mm, cantos rígidos. Enchape de muro en aglomerado melaminico color Rovere, e=6mm, d=0.74m x h=3.00m. Incluye herrajes, cerraduras y accesorios en acero inoxidable. Incluye cojín en tela impermeable con interior en espuma sintética, color blanco.	Und	26,00	26,00		$ 6.085.308,00	$ 158.218.008,00	$ 158.218.008,00		0,40%
	10,2		**ACCESORIOS DE BAÑO**						**$ 499.719.363,00**	**$ 499.719.363,00**		1,25%
		10.2.1	Suministro e instalación de taza para sanitario en porcelana vitrificada sanitaria de fluxómetro, a=0.365m x l=0.644m x h=0.370m, consumo de 4.8lpd, color blanco, taza alongada de entrada posterior, antivandálica. Válvula antivandálica en acero inoxidable para fluxómetro, ø=7.4cm, consumo máximo de 4.8lpd, acabado antibacterial natural cromado con partículas ionizantes de plata, accionamiento automático tipo 'push'. Incluye sistema de fluxómetro oculto. Incluye asiento sanitario en polipropileno inyectado de alta densidad referencia forte, similar o equivalente, color blanco.	Und	52,00	52,00		$ 1.545.788,00	$ 80.380.976,00	$ 80.380.976,00		0,20%
		10.2.2	Suministro e instalación de orinal en porcelana vitrificada sanitaria, a=0.352m x p=0.3m x h=0.536m, consumo de 1.9lpd, entrada superior. Válvula de accionamiento tipo fluxómetro, consumo de 1.9lpd, acabado antibacterial en acero inoxidable, accionamiento tipo push.	Und	19,00	19,00		$ 1.101.481,00	$ 20.928.139,00	$ 20.928.139,00		0,05%
		10.2.3	Suministro e instalación de sanitario de tanque en porcelana vitrificada sanitaria, infantil, a=0.293m x l=0.573m x h=0.579m, consumo de 4.8lpd, color blanco. Incluye asiento y tapa sanitaria en polipropileno inyectado de alta densidad, similar o equivalente, color blanco.	Und	16,00	16,00		$ 814.672,00	$ 13.034.752,00	$ 13.034.752,00		0,03%
		10.2.4	Suministro e instalación de taza para sanitario en porcelana vitrificada sanitaria de fluxómetro, a=0.365m x l=0.644m x h=0.370m, consumo de 4.8lpd, color blanco, taza alongada de entrada posterior, antivandálica. Válvula antivandálica en acero inoxidable para fluxómetro, ø=7.4cm, consumo máximo de 4.8lpd, acabado antibacterial natural cromado con partículas ionizantes de plata, accionamiento automático tipo 'push'. Incluye sistema de fluxómetro oculto. Incluye asiento sanitario en polipropileno inyectado de alta densidad referencia forte, similar o equivalente, color blanco.	Und	6,00	6,00		$ 1.691.989,00	$ 10.151.934,00	$ 10.151.934,00		0,03%
		10.2.5	Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada sanitaria, institucional de colgar similar o equivalente, a=0.539m x l=0.559m x h=0.194m, color blanco.	Und	9,00	9,00		$ 592.132,00	$ 5.329.188,00	$ 5.329.188,00		0,01%
		10.2.6	Suministro e instalación de mesón en quazar de 60cm de ancho con estructura metálica de soporte, incluye salpicadero y faldón según detalle, color blanco.	m	1,00	1,00		$ 894.610,00	$ 894.610,00	$ 894.610,00		0,00%
		10.2.7	Suministro e instalación de lavamanos esférico en quazar vaciado con mesón rectangular, poceta redonda de Ø 42cm, color blanco plano.	Und	82,00	82,00		$ 717.397,00	$ 58.826.554,00	$ 58.826.554,00		0,15%
		10.2.8	Suministro e instalación de lavamanos en porcelana vitrificada sanitaria, institucional de colgar similar o equivalente, a=0.405m x l=0.410m x h=0.12m, color blanco. Incluye grifería de montaje de mesón para lavamanos monocontrol referencia Thames baja similar o equivalente, a=0.052m x l=0.125m x h=0.16m. Grifería con cuerpo en latón con acabado cromado, consumo máximo de 8.3lpm a 60psi, anclaje en material polimérico. Accionamiento por palanca.	Und	1,00	1,00		$ 956.524,00	$ 956.524,00	$ 956.524,00		0,00%
		10.2.9	Suministro e instalación de grifería de montaje empotrada en pared para lavamanos institucional de pico, tipo push, a=0.076m x l=0.24m x h=0.074m. Grifería con cuerpo en latón con acabado cromo, consumo máximo de 9.68lpm a 80psi, anclaje en material polimérico. Incluye push antivandálico incrustado a pared con cierre automático temporizado entre 5s a 9s, y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	82,00	82,00		$ 716.807,00	$ 58.778.174,00	$ 58.778.174,00		0,15%
		10.2.10	Suministro e instalación de dispensador de jabón de incrustar en lámina de acero inoxidable, a=0.201m x l=0.201m, h=0.14m. Capacidad de 1lt de jabón líquido, con 'push' antivandálico. Sujetado a la superficie mediante chazos expansivos.	Und	45,00	45,00		$ 475.599,00	$ 21.401.955,00	$ 21.401.955,00		0,05%
		10.2.11	Suministro e instalación de dispensador de toallas de papel en lámina de acero inoxidable grado 304, a=0.10m x l=0.28m, h=0.26m, anclado a muro con tornillos, con sistema de cerradura con llave.	Und	29,00	29,00		$ 367.134,00	$ 10.646.886,00	$ 10.646.886,00		0,03%
		10.2.12	Suministro e instalación de dispensador de papel en lámina de acero inoxidable 304, a=12cm, Ø26.5cm, capacidad de carga de rollos de papel de 9". Anclado a divisiones de baños con tornillería oculta.	Und	53,00	53,00		$ 206.745,00	$ 10.957.485,00	$ 10.957.485,00		0,03%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		10.2.13	Suministro e instalación de muro divisorio en panel fenólico HPL para baños, e=2cm. Acabado de panel en color RGB 201-172-144 veteado tipo madera en vertical. Instalados en la parte inferior sobre zócalos en perfiles en U en acero inoxidable, y rigidizados en la parte superior mediante barra estabilizadora en perfil en u en aluminio. Incluye accesorios y herrajes en acero inoxidable.	m²	117,83	117,83		$ 89.835,00	$ 10.585.258,00	$ 10.585.258,00		0,03%
		10.2.14	Suministro e instalación de divisiones sanitarias de cabinas sanitarias en acero inoxidable 304, calibre 20, reforzadas en puertas y muro frontal con perfiles galvanizados y estructura de poliestireno expandido.	m²	118,29	118,29		$ 973.776,00	$ 115.187.963,00	$ 115.187.963,00		0,29%
		10.2.15	Suministro e instalación de divisiones sanitarias entamboradas para orinales en cantiléver en acero inoxidable 304, calibre 20 a=0.6m x h=0.97m x e=2.5cm. Incluye sujeción mecánica a muro con tornillería	m²	4,81	4,81		$ 589.545,00	$ 2.835.711,00	$ 2.835.711,00		0,01%
		10.2.16	H1 - Suministro e instalación de barra abatible horizontal izquierda para discapacitados para uso en baños, de doble apoyo e instalación cercana a aparatos sanitarios. Barra fja a muro en lámina de Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 14 (espesor 1.9mm).Tubería redonda ornamental de diámetro 1-¼" (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm) con acabado externo satinado N° 4. Abatible horizontal izquierda. Instalación según recomendaciones del fabricante.	Und	10,00	10,00		$ 922.328,00	$ 9.223.280,00	$ 9.223.280,00		0,02%
		10.2.17	H5 - Suministro e instalación de barra de discapacitados para baños, instalación en costados de aparatos sanitarios. (Prof:0.078M x A:0.600m x H:0.91m) Bridas de soporte con perforaciones para instalación a muro en lámina de Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 14 (espesor 1.9mm).Tubería redonda de diámetro 1-¼" (32mm) en Acero Inoxidable AISI SAE 304, Calibre 18 (espesor 1.2mm) con acabado externo satinado N° 4. . Instalación según recomendaciones del fabricante.	Und	21,00	21,00		$ 249.372,00	$ 5.236.812,00	$ 5.236.812,00		0,01%
		10.2.18	Suministro e instalación de grifería para lavaplatos monocontrol , a=0.107m x l=0.216m x h=0.352m. Grifería con cuerpo en latón con acabado en acero inoxidable, pico y manija en acero inoxidable, cuello flexible suave al tacto con graduación de 360°, consumo máximo de 8.3lpm. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación.	Und	1,00	1,00		$ 785.748,00	$ 785.748,00	$ 785.748,00		0,00%
		10.2.19	Suministro e instalación de papelera en lámina de acero inoxidable 304, a=0.13m x l=0.31m, h=0.40m, capacidad de volumen de 12lt. Anclada a divisiones de baños con tornillería oculta.	Und	97,00	97,00		$ 621.979,00	$ 60.331.963,00	$ 60.331.963,00		0,15%
		10.2.20	Suministro e instalación de espejo de baño, a=2.01m x h=0.52m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata de fondo y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.	Und	2,00	2,00		$ 111.785,00	$ 223.570,00	$ 223.570,00		0,00%
		10.2.21	Suministro e instalación de espejo de baño, a=0.7m x h=0.9m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata de fondo y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.	Und	14,00	14,00		$ 70.673,00	$ 989.422,00	$ 989.422,00		0,00%
		10.2.22	Suministro e instalación de espejo de baño, a=1.02m x h=1.2m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata de fondo y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.	Und	2,00	2,00		$ 99.027,00	$ 198.054,00	$ 198.054,00		0,00%
		10.2.23	Suministro e instalación de espejo de baño con 10° de inclinación sobre la vertical, a=0.7m x h=0.8m, e=5mm, recubierto con película reflectante en plata y película de seguridad en el frente. Anclado a muro con perfiles metálicos mediante chazos para concreto nylon, pegado a estructura con silicona.	Und	4,00	4,00		$ 66.312,00	$ 265.248,00	$ 265.248,00		0,00%
		10.2.24	Suministro e instalación de toallero metálico tipo argolla en latón con acabado cromado referencia Koral, similar o equivalente, a=23.96cm x l=14.18cm x h=6.53cm.	Und	1,00	1,00		$ 141.217,00	$ 141.217,00	$ 141.217,00		0,00%
		10.2.25	Suministro e instalación de barra de seguridad vertical recta en acero inoxidable 304, Ø37mm, l=24", capacidad de carga de 200kg, anclado a muro con chazo plástico y tornillería	Und	6,00	6,00		$ 237.990,00	$ 1.427.940,00	$ 1.427.940,00		0,00%
	10,3		**EQUIPAMIENTO DE COCINA**						**$ 86.893.502,00**	**$ 86.893.502,00**		0,22%
		10.3.1	Suministro e instalación de campana extractora en acero inoxidable grado 304, calibre 20, l=5m x p=1.5m x h=0.6m.	Und	1,00	1,00		$ 16.491.378,00	$ 16.491.378,00	$ 16.491.378,00		0,04%
		10.3.2	Suministro e instalación de lavamanos quirúrgico en acero inoxidable grado 304, salpicadero de 0.1m, faldero de 5cm rematado en media curva, a=0.6m x p=0.6m.	Und	1,00	1,00		$ 1.857.677,00	$ 1.857.677,00	$ 1.857.677,00		0,00%
		10.3.3	Suministro e instalación de mesón con poceta en acero inoxidable grado 304, calibre 20, l=2.25m x p=0.65m, entrepaño en acero inoxidable a 25cm del piso, dos pocetas formadas con el mesón forma en V de l=0.6m x a=0.4m x p=0.3m, incluye salpicadero de 0.1m y faldero de 5cm rematado en media curva.	Und	1,00	1,00		$ 4.943.297,00	$ 4.943.297,00	$ 4.943.297,00		0,01%
		10.3.4	Suministro e instalación de mesón con poceta en acero inoxidable grado 304, calibre 20, l=4.73m x p=0.60m, entrepaño en acero inoxidable a 25cm del piso, dos pocetas formadas con el mesón forma en V de l=0.6m x a=0.4m x p=0.3m, incluye salpicadero de 0.1m y faldero de 5cm rematado en media curva.	Und	1,00	1,00		$ 10.379.980,00	$ 10.379.980,00	$ 10.379.980,00		0,03%
		10.3.5	Suministro e instalación de poceta fabricada in situ en mortero con acabado de granito pulido.	Und	1,00	1,00		$ 270.912,00	$ 270.912,00	$ 270.912,00		0,00%
		10.3.6	Suministro e instalación de grifería industrial en latón con acabado cromado, con sistema de pre-rinse, doble función, con cuello flexible para lavado normal o manguera para lavado especial.	Und	2,00	2,00		$ 1.352.624,00	$ 2.705.248,00	$ 2.705.248,00		0,01%
		10.3.7	H27 - Suministro e instalación de extractor centrífugo diseñado en alumino para aplicaciones de montaje en pared. Aspa plástica, Motor sellado montado en Balineras. Voltage 110v - Caudal 1.4 m3/s - Amperaje 1.3 amp. + Soporte perimetral metalitco. Tamaño aproximado 14 pulgadas según exigencia en proyectos de ventilación.	Und	1,00	1,00		$ 50.245.010,00	$ 50.245.010,00	$ 50.245.010,00		0,13%
11			**ACABADOS**						**$ 5.409.631.958,00**	**$ 4.269.501.955,00**	**-$ 1.140.130.003,00**	**10,67%**
	11,1		**PISOS**						**$ 2.451.208.459,00**	**$ 2.281.985.459,00**	**-$ 169.223.000,00**	5,70%
		11.1.1	B6 - Suministro e instalación de pavimento Vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional GRIS GINGER suministrado en rollos de 2 m de ancho. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, partes 1 y 4) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presicion para garantizar la vida util del producto.	m²	281,75	281,75		$ 215.267,00	$ 60.651.477,00	$ 60.651.477,00		0,15%
		11.1.2	B1 - Suministro e instalación de pavimento Vinilico de 2 mm de espesor flexible, homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,teñido en masa con diseño no direccional suministrado en rollos de 2 m de ancho. resistencia a la abrasión, alcoholes y otros productos quimicos Instalación: instalado sobre solera sura, lisa, seca (3% maximo de humedad) plana y sin fisuras (segun la norma UNE-CEN/TS 14472, partes 1 y 4) ; fijado con adhesivo recomendado por el fabricante y juntas termosoldadas. Nota: el mortero debe estar nivelado con presición para garantizar la vida Util del producto.	m²	564,95	564,95		$ 215.267,00	$ 121.615.092,00	$ 121.615.092,00		0,30%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		11.1.3	B2 - Suministro e instalación de piso en tableta Gres rectangular, formato 30.5x15 cm color Mocca, Disposición en junta perdida en el sentido corto de la tableta, con juntas de dilatación de 5mm en el sentido largo, color de junta mocca para uso institucional de alta resistencia Ref: Alfaquick Junta Ancha Mocca - Alfa o equivalente + Pegante mortero capa gruesa, adhesivo cementico para gres, terrazo o ceramica capa gruesa.	m²	3.100,01	3.100,01		$ 84.102,00	$ 260.717.041,00	$ 260.717.041,00		0,65%
		11.1.4	B3 - Suministro e instalación de piso en Baldosa de grano terrazo 30x30cm color Gris tipo ROCA Ref: 132749- B02 gris grano Danta 1-2 pulida 30x30 o equivalente que cumpla la norma NTC 2849, uso institucional y trafico intenso con dilatación en varilla plástica de igual color, bidireccionalmente cada 1.80m y boquilla de 3mm correspondiente al mismo color de la baldosa. Pulida y brillada a máquina. + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente. Instalación y modulación según detalle especifico de pisos.	m²	3.818,87	3.318,87	-500,00	$ 301.841,00	$ 1.152.691.540,00	$ 1.001.771.040,00	-$ 150.920.500,00	2,50%
		11.1.5	B4 - Suministro e instalación de zócalo prefabricado de concreto pulido en forma de media caña, de uso institucional, con sección lateral 80mm x 62mm y longitud de 580mm, color gris Ref color: gris grano danta / ROCA o similar, con boquilla del mismo color del zócalo + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente.	m	660,15	660,15		$ 140.021,00	$ 92.434.863,00	$ 92.434.863,00		0,23%
		11.1.6	Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5MPa, e=0.04m.	m²	3.818,87	3.318,87	-500,00	$ 36.605,00	$ 139.789.736,00	$ 121.487.236,00	-$ 18.302.500,00	0,30%
		11.1.7	Suministro e instalación de piso para gramoquín lineal en ladrillo de arcilla gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, instalado de canto vertical, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, e=0.04m, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope.	m²	53,42	53,42		$ 213.377,00	$ 11.398.599,00	$ 11.398.599,00		0,03%
		11.1.8	Suministro e instalación de piso en adoquín de arcilla referencia Español, unidades de l=0.2m x a=0.1m x h=0.06m, color cobrizo, instalados por el canto con trabe a medios entre hileras. Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento y arena 1:5, e=4cm.	m²	1.081,09	1.081,09		$ 172.800,00	$ 186.812.352,00	$ 186.812.352,00		0,47%
		11.1.9	Suministro e instalación de piso en pintura epóxica base solvente de uno o dos componentes en proporción 1:1, tres manos, bajo VOC, color RAL3000 "rojo vivo" o RAL2017 "naranja" según ubicación de diseño arquitectónico.	m²	452,63	452,63		$ 46.613,00	$ 21.098.442,00	$ 21.098.442,00		0,05%
		11.1.10	Suministro e instalación de piso en láminas modulares de alfombra de fibras de nailon referencia Antron Lumena 6.6 similar o equivalente, e=3.48mm, formato de 45.72cm x 91.44cm, referencia de color Laurelhurst 12333 similar o equivalente. Pegado con adhesivo acrílico de alto 'tack'.	m²	206,31	206,31		$ 168.507,00	$ 34.764.679,00	$ 34.764.679,00		0,09%
		11.1.11	Suministro e instalación de mortero de nivelación en cemento y arena de río 1:3. Tipo m, f'cp 17.5mpa, e=0.06m.	m²	4.470,95	4.470,95		$ 49.216,00	$ 220.042.275,00	$ 220.042.275,00		0,55%
		11.1.12	Suministro e instalación de enchape sobre bordillo en adoquín de arcilla referencia Cuarto 26, unidades de l=0.26m x a=0.06m x h=0.06m, color cobrizo, instalados por el canto sin trabe. Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento y arena 1:5, e=4cm.	m	2.500,00	2.500,00		$ 53.055,00	$ 132.637.500,00	$ 132.637.500,00		0,33%
		11.1.13	Suministro e instalación de piso en adoquín de arcilla referencia Español, unidades de l=0.2m x a=0.1m x h=0.06m, color cobrizo, instalados por el canto sin trabe entre hileras. Incluye mortero de asentamiento según recomendaciones IDU de cemento y arena 1:5, e=4cm.	m²	38,68	38,68		$ 172.800,00	$ 6.683.904,00	$ 6.683.904,00		0,02%
		11.1.14	Suministro e instalación de piso en pintura epóxica base solvente antideslizante de uno o dos componentes en proporción 1:1, tres manos, bajo VOC, color RAL3000 "rojo vivo" o RAL2017 "naranja" según ubicación de diseño arquitectónico, con inclusión de arenilla de cuarzo para exteriores. 400gr/m².	m²	133,97	133,97		$ 47.901,00	$ 6.417.297,00	$ 6.417.297,00		0,02%
		11.1.15	Suministro e instalación de piso elevado tipo deck en madera natural de Teca, Tectona grandis, listones de madera e=1.8cm x a=8cm, 5mm de separación entre listones, Ei=105.000kg/cm², contenido de humedad < 12%, Fb=140kg/cm², Ftp=100kg/cm² y densidad de mínimo 600kg/m³. Incluye inmunizante, barniz de protección y capa de pintura para madera.	m²	72,10	72,10		$ 47.901,00	$ 3.453.662,00	$ 3.453.662,00		0,01%
	11,2		**CIELORRASOS**						**$ 938.098.420,00**	**$ 324.968.725,00**	**-$ 613.129.695,00**	0,81%
		11.2.1	Suministro e instalación de cielorraso suspendido en lámina de fibrocemento e=6mm, acabado liso, uniones y filos resanados; instalado completamente a nivel. Estructurado con rieles o viguetas de acero galvanizado ASTM A653 forma en C, calibre 16, armado cada 80cm en una dirección, con alas de 25mm, alma de 65mm. Soportado con perfiles tipo omega de acero galvanizado ASTM A653, forma de sección trapezoidal, calibre 24, armado cada 60cm en una dirección, con un alma de 35mm, altura de 16mm. Incluye barrera de humedad con polietileno entre las omegas y sobre las placas de fibrocemento, e=0.05mm. Anclado con tornillería de cabeza o fulminantes.	m²	631,96	183,11	-448,85	$ 72.322,00	$ 45.704.611,00	$ 13.242.881,00	-$ 32.461.730,00	0,03%
		11.2.2	Suministro e instalación de cielorraso suspendido en lámina de cartón yeso resistente a la humedad RH, e=1/2" o 12mm, uniones y filos resanados; instalado completamente a nivel. Estructurado con rieles o viguetas de acero galvanizado ASTM A653 forma en C, calibre 16, armado cada 80cm en una dirección, con alas de 25mm, alma de 65mm. Soportado con perfiles tipo omega de acero galvanizado ASTM A653. Forma de sección trapezoidal, calibre 16, armado cada 60cm en una dirección, con un alma de 35mm, altura de 16mm. Anclado con tornillería de cabeza o fulminantes.	m²	3.146,49		-3.146,49	$ 80.948,00	$ 254.702.073,00		-$ 254.702.073,00	
		11.2.3	Suministro e instalación de cielorraso suspendido, referencia '84R', con modulación en sentido longitudinal e instalación plana. Perfil '84R' en lámina de aluzinc, e=0.5mm, a=84mm x h=16mm, recubrimiento en pintura a base de poliéster color RAL9005 "negro intenso", montaje a estructura de cielorraso a presión. Estructurado con perfil en aluminio, referencia 'V4', sección trapezoidal, base mayor B=30mm, base menor b=12mm, h=48mm. Conexión a estructura principal mediante perfiles micrométricos.	m²	1.279,84		-1.279,84	$ 305.046,00	$ 390.410.073,00		-$ 390.410.073,00	
		11.2.4	Suministro e instalación de cielorraso suspendido de listones de aluzinc, referencia 'Baffle 100', con modulación en sentido longitudinal e instalación plana. Perfil Baffle 100 en lámina de aluzinc, calibre 0.6mm, forma trapezoidal b=25mm x B=43mm x h=100mm, instalados @100mm o paso 100mm, recubrimiento en pintura a base de poliéster color RAL9005 "negro intenso", montaje a estructura de cielorraso a presión. Estructurado con portapaneles de aluzinc h=75mm con perfiles de sujetación y tensores para anclaje a placa. Incluye acondicionamiento fonoabsorbente en barrera de lana mineral de roca, e=1", densidad de 100kg/m³, instalada encima de los portapaneles.	m²	209,34	293,36	84,02	$ 767.010,00	$ 160.565.873,00	$ 225.010.054,00	$ 64.444.181,00	0,56%
		11.2.5	Suministro e instalación de cielorraso en malla expandida de aluzinc, formato de paneles a=500mm x l=1000mm, 61% de área abierta, diagonal mayor=10mm, diagonal menor=5.5mm, ancho de vena=1.2mm, e=1mm, acabado en pintura a base de resina de poliéster color RAL 3000 "rojo vivo". Montado sobre perfilería en aluminio en perfiles con forma de L y I, h=15/16"	m²	159,80	159,80		$ 542.652,00	$ 86.715.790,00	$ 86.715.790,00		0,22%
	11,3		**ENCHAPES DE MUROS**						**$ 748.040.901,00**	**$ 657.308.624,00**	**-$ 90.732.277,00**	1,64%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		11.3.1	Suministro e instalación de enchape tipo fachaleta en ladrillo de gran formato, unidades de 39cm x 3.5cm x 5cm, aparejo normal (tipo soga), color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta rehundida, incluye aditivo para mejora de adherencia y malla electrosoldada para anclaje de elementos. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.	m²	2.670,39	1.566,13	-1.104,26	$ 172.381,00	$ 460.324.499,00	$ 269.970.283,00	-$ 190.354.216,00	0,67%
		11.3.2	C13 - Suministro e instalación de ladrillo Tolete Gran Formato (39x11.5x5 cm) color Cobrizo de textura rugosa a la vista, CORTADO EN FORMA DE U para cubrir bordes completos. Dimensiones y disposición según planos arquitectónicos y de cortes por fachada. Instalación: hiladas pegadas con 2 cm aproximados de Adhesivo para pega en vertical, encarradas con juntas de un 1 cm y repellado a ras con Boquilla de 1 cm de profundidad Ref: Boquilla y lavado con hidrófugo.	m	458,91	814,77	355,86	$ 279.947,00	$ 128.470.478,00	$ 228.092.417,00	$ 99.621.939,00	0,57%
		11.3.3	B5 - Suministro e instalación de enchape en Cerámica pared rec antartica blanca cu, formato 30x60 color blanco, acabado brillante, con boquilla cementica junta estrecha de 2.05mm con barrera en latex de protección anti hongos, color blanco junta estrecha súper blanco Concolor corona.Clasificada como CGSA según la norma NTC 6050-3.+ (adhesivo cementico) para interiores bajo en polvo, para instalación de revestimientos ceramicos (adhesivo cementico) interiores blanco, instalación según detalles especifico.	m²	1.440,11	1.440,11		$ 110.579,00	$ 159.245.924,00	$ 159.245.924,00		0,40%
	11,4		**PINTURA**						**$ 254.769.736,00**	**$ 146.262.305,00**	**-$ 108.507.431,00**	0,37%
		11.4.1	D2 - Suministro e instalación de recubrimiento acrílico, super lavable e impermeable, Rápido secado, de excelente adherencia y excelente resistencia a la abrasión. Especial para recubrir, proteger fachadas y culatas, con acabado mate para superficies en concreto y acabados sobre mamposteria, mortero o fibro-cemento, Color Negro mate. D11 - Suministro e instalación de pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco. RAL 9010, tres manos, sobre muros y cielo.	m²	5.186,68	4.396,93	-789,75	$ 16.377,00	$ 84.942.258,00	$ 72.008.523,00	-$ 12.933.735,00	0,18%
		11.4.2	D11 - Suministro e instalación de pintura acrílica superlavable a base de agua, diluible con agua, resistente al lavado Color Blanco. RAL 9010, tres manos, sobre muros y cielo.	m²	2.900,00	580,00	-2.320,00	$ 18.019,00	$ 52.255.100,00	$ 10.451.020,00	-$ 41.804.080,00	0,03%
		11.4.3	D4 - Suministro e instalación de pintura tipo 1 base agua, de bajo olor, con propiedades antibacteriales y Antihongos, para ambientes interiores de alta higiene, resistencia al lavado y facilidad de limpieza, con resina para resistencia, con acabdo mate, Pintura Lavable.	m²	2.556,61	511,32	-2.045,29	$ 22.041,00	$ 56.350.241,00	$ 11.270.048,00	-$ 45.080.193,00	0,03%
		11.4.4	Suministro e instalación de pintura antibacterial y evitamanchas, tipo 1, color según diseño, tres manos, bajo VOC, aplicada sobre cielorrasos.	m²	550,00	183,11	-366,89	$ 23.684,00	$ 13.026.200,00	$ 4.336.777,00	-$ 8.689.423,00	0,01%
		11.4.5	D1 - Suministro e instalación de pintura impermeabilizante acrílica a base agua de alto desempeño para uso interior,con resinas acrílicas, fungicidas, antihongos y antimoho color Blanco. RAL 9010 , color según diseño, pintuco o equivalente, a 3 manos sobre muros. D6 - Suministro e instalación de pintura tipo 1 base agua, de bajo olor, con propiedades antibacteriales y Antihongos, para ambientes interiores de alta higiene, resistencia al lavado y facilidad de limpieza, con resina para resistencia, con acabado mate, Ref:407551271.	m²	600,00	600,00		$ 32.624,00	$ 19.574.400,00	$ 19.574.400,00		0,05%
		11.4.6	Suministro e instalación de pintura impermeabilizante hidrorepelente, resistente a una presión hidrostática negativa de 10psi, color blanco, dos manos, sobre cielorraso.	m²	320,00	320,00		$ 34.267,00	$ 10.965.440,00	$ 10.965.440,00		0,03%
		11.4.7	D10 - Suministro e instalación de esmalte sintético a base de aceite resistente al agua, con alta durabilidad y alto brillo. De fácil limpieza, resistencia y adherencia. Acabado Brillante en color rojo RAL 3000 ROJO VIVO. Producto formulado sin plomo y cloro.Esmalte Doméstico. D12 - Suministro e instalación de esmalte sintético a base de aceite resistente al agua, con alta durabilidad y alto brillo. De fácil limpieza, resistencia y adherencia. Acabado Brillante en color gris oscuro RAL 7035 Gris Luminoso. Producto formulado sin plomo y cloro, Esmalte Doméstico.	m²	533,82	533,82		$ 33.075,00	$ 17.656.097,00	$ 17.656.097,00		0,04%
	11,5		**FACHADA**						**$ 816.906.673,00**	**$ 658.369.073,00**	**-$ 158.537.600,00**	1,65%
		11.5.1	C5 - Suministro e instalación de cortasol tipo fins forma rectangular plana, formada por dos chapas metalicas en su exterior en aluminio, acabado liso color negro mate en pintura poliester o o PVDF2. instalacion del panel con escuadras y perfiles corridos metalicos en el mismo acado del cortasol.	m	2.088,26	2.088,26		$ 230.206,00	$ 480.729.982,00	$ 480.729.982,00		1,20%
		11.5.2	Suministro e instalación de cortasol en mampostería de arcilla en ladrillo gran formato, unidades de 39cm x 11,5cm x 5cm, aparejo normal (tipo soga a tercios), color cobrizo, con juntas de colocación de 1cm. Pegado con mortero de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPa, junta rehundida. Incluye boquilla cementante de color pardo 105 de 1cm de ancho, a tope. Imprimación de acabado final con hidrófugo transparente.	m²	671,40	671,40		$ 249.822,00	$ 167.730.491,00	$ 167.730.491,00		0,42%
		11.5.3	Suministro e instalación de lámina en acero cold rolled para recubrimiento en fachada, acabado en pintura a base de poliéster color negro mate RAL9005. Incluye dobleces de remate en filos o pestañas.	m²	850,00	50,00	-800,00	$ 198.172,00	$ 168.446.200,00	$ 9.908.600,00	-$ 158.537.600,00	0,02%
	11,6		**CUBIERTA**						**$ 200.607.769,00**	**$ 200.607.769,00**		0,50%
		11.6.1	Suministro e instalación de lámina de fibrocemento para base de soporte en techo, e=10mm, fijación contra bastidores metálicos y anclaje con tornillos autoperforantes con arandelas de neopreno. Incluye sellado de juntas flexibles e impermeables de instalación con poliuretano, similar o equivalente.	m²	325,43	325,43		$ 82.868,00	$ 26.967.733,00	$ 26.967.733,00		0,07%
		11.6.2	Suministro e instalación de teja reforzada con fibra de vidrio no tejida recubierta con cerámica de gránulos minerales y autosellante adhesivo, formato de 0.91m x 0.3m, e=1.5mm, referencia Moire Black CT-20 similar o equivalente. Incluye sistema de impermeabilización con una capa de imprimación en emulsión asfáltica en proporción de agua 1:1, y una capa de manto autoprotegido con foil de 2mm instalado con calor.	m²	325,43	325,43		$ 151.926,00	$ 49.441.278,00	$ 49.441.278,00		0,12%
		11.6.3	Suministro e instalación de cubierta en teja de lámina metálica en aluzinc tipo sandwich, módulo a=525mm, instalación plana por rollos rolados en campo. Cara exterior en lámina de aluzinc, calibre 24 o 0.6mm, acabado superior en pintura de PVDF color RAL7031 "gris azulado". Núcleo en lámina de poliuretano de baja densidad (30kg/m³ - 40kg/m³), e=5cm. Cara interior en lámina de aluzinc, calibre 24 o 6mm, acabado inferior en pintura a base de resina de poliéster RAL9010 "blanco puro".	m²	602,87	602,87		$ 165.736,00	$ 99.917.262,00	$ 99.917.262,00		0,25%
		11.6.4	E13 - Suministro e instalación de flanche en lámina metálica galvanizada cal. 18. Anclado directamente a la estructura o muro y sellado con silicona. Con anticorrosivo y Pintura a base de aceite, pintulux o equivalente color negro.	m	1.758,00	1.758,00		$ 13.812,00	$ 24.281.496,00	$ 24.281.496,00		0,06%
12			**URBANISMO Y PAISAJISMO**						**$ 870.465.059,00**	**$ 626.642.980,00**	**-$ 243.822.079,00**	**1,57%**
	12,1		**ESPECIES HERBÁCEAS - MENORES**						**$ 105.487.661,00**	**$ 105.487.661,00**		0,26%
		12.1.1	Acanto - Acanthus mollis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	36,00	36,00		$ 3.084,00	$ 111.024,00	$ 111.024,00		0,00%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		12.1.2	Agapanto - Agapanthus africanus, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	48,00	48,00		$ 7.279,00	$ 349.392,00	$ 349.392,00		0,00%
		12.1.3	Algodoncillo - Asclepias, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	30,00	30,00		$ 21.591,00	$ 647.730,00	$ 647.730,00		0,00%
		12.1.4	Amaranto - Amaranthus, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	84,00	84,00		$ 12.338,00	$ 1.036.392,00	$ 1.036.392,00		0,00%
		12.1.5	Angiosanto - xxx, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	18,00	18,00		$ 22.208,00	$ 399.744,00	$ 399.744,00		0,00%
		12.1.6	Anturio ala de ángel - Anthurium marmoratum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	50,00	50,00		$ 46.883,00	$ 2.344.150,00	$ 2.344.150,00		0,01%
		12.1.7	Apio - Apium graveolens, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	144,00	144,00		$ 12.338,00	$ 1.776.672,00	$ 1.776.672,00		0,00%
		12.1.8	Balazo - Monstera deliciosa, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	45,00	45,00		$ 15.792,00	$ 710.640,00	$ 710.640,00		0,00%
		12.1.9	Bore grande - Alocasia macrorrhiza, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	35,00	35,00		$ 11.598,00	$ 405.930,00	$ 405.930,00		0,00%
		12.1.10	Borrachero - Brugmansia arborea, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	20,00	20,00		$ 30.845,00	$ 616.900,00	$ 616.900,00		0,00%
		12.1.11	Budelia - Buddleja davidii, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	45,00	45,00		$ 24.675,00	$ 1.110.375,00	$ 1.110.375,00		0,00%
		12.1.12	Caléndula - Calendula officinalis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	435,00	435,00		$ 20.974,00	$ 9.123.690,00	$ 9.123.690,00		0,02%
		12.1.13	Cebollín - Allium schoenoprasum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	66,00	66,00		$ 6.662,00	$ 439.692,00	$ 439.692,00		0,00%
		12.1.14	Copa de oro - Allamanda cathartica, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	45,00	45,00		$ 14.805,00	$ 666.225,00	$ 666.225,00		0,00%
		12.1.15	Curry - Helichrysum italicum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	18,00	18,00		$ 30.845,00	$ 555.210,00	$ 555.210,00		0,00%
		12.1.16	Filodendro uña de danta - Philodendron bipinnatifidum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	30,00	30,00		$ 36.766,00	$ 1.102.980,00	$ 1.102.980,00		0,00%
		12.1.17	Francesina - Brunfelsia pauciflora, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	40,00	40,00		$ 24.675,00	$ 987.000,00	$ 987.000,00		0,00%
		12.1.18	Helecho sarro - Cyathea caracasana, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	20,00	20,00		$ 96.234,00	$ 1.924.680,00	$ 1.924.680,00		0,00%
		12.1.19	Lágrima de bebé - Bacopa monnieri, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	96,00	96,00		$ 18.507,00	$ 1.776.672,00	$ 1.776.672,00		0,00%
		12.1.20	Lavanda - Lavandula spica, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	84,00	84,00		$ 22.208,00	$ 1.865.472,00	$ 1.865.472,00		0,00%
		12.1.21	Linaza - Linum usitatissimum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	230,00	230,00		$ 25.786,00	$ 5.930.780,00	$ 5.930.780,00		0,01%
		12.1.22	Liriope - Liriope muscari, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	50,00	50,00		$ 3.701,00	$ 185.050,00	$ 185.050,00		0,00%
		12.1.23	Maíz - Zea mays, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	96,00	96,00		$ 12.338,00	$ 1.184.448,00	$ 1.184.448,00		0,00%
		12.1.24	Mani forrajero - Arachis pintoi, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	45,00	45,00		$ 9.253,00	$ 416.385,00	$ 416.385,00		0,00%
		12.1.25	Menta - Mentha, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	84,00	84,00		$ 8.020,00	$ 673.680,00	$ 673.680,00		0,00%
		12.1.26	Mielenrama - Achillea millefolium, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	240,00	240,00		$ 8.513,00	$ 2.043.120,00	$ 2.043.120,00		0,01%
		12.1.27	Mussaenda - Mussaenda erythrophylla, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	80,00	80,00		$ 24.675,00	$ 1.974.000,00	$ 1.974.000,00		0,00%
		12.1.28	Pasto gordura - Melinis minutiflora, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	965,00	965,00		$ 12.338,00	$ 11.906.170,00	$ 11.906.170,00		0,03%
		12.1.29	Pasto gramalote - Axonopus scoparius, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	1.195,00	1.195,00		$ 12.338,00	$ 14.743.910,00	$ 14.743.910,00		0,04%
		12.1.30	Pasto mondo - Ophiopogon japonicus, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	731,00	731,00		$ 4.812,00	$ 3.517.572,00	$ 3.517.572,00		0,01%
		12.1.31	Pasto puntero - Hyparrhenia rufa, semillas (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	670,00	670,00		$ 12.338,00	$ 8.266.460,00	$ 8.266.460,00		0,02%
		12.1.32	Pennisetum - Pennisetum setaceum, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	140,00	140,00		$ 8.390,00	$ 1.174.600,00	$ 1.174.600,00		0,00%
		12.1.33	Poleo - Mentha pulegium, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	90,00	90,00		$ 7.403,00	$ 666.270,00	$ 666.270,00		0,00%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		12.1.34	Quinua - Chenopodium quinoa, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	120,00	120,00		$ 12.338,00	$ 1.480.560,00	$ 1.480.560,00		0,00%
		12.1.35	Remolacha - Beta vulgaris, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	72,00	72,00		$ 12.338,00	$ 888.336,00	$ 888.336,00		0,00%
		12.1.36	Sabilón - Aloe, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	305,00	305,00		$ 12.215,00	$ 3.725.575,00	$ 3.725.575,00		0,01%
		12.1.37	Verbena - Verbena officinalis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	30,00	30,00		$ 14.805,00	$ 444.150,00	$ 444.150,00		0,00%
		12.1.38	Verbena negra - Stachytarpheta jamaicensis, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	36,00	36,00		$ 9.253,00	$ 333.108,00	$ 333.108,00		0,00%
		12.1.39	Yerbabuena - Mentha spicata, plántula de 0.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	370,00	370,00		$ 18.507,00	$ 6.847.590,00	$ 6.847.590,00		0,02%
		12.1.40	Suministro e instalación de sustrato en tierra abonada para siembra de especies, 66.6% de materia orgánica - 33.3% de arena.	m³	68,08	68,08		$ 110.736,00	$ 7.538.907,00	$ 7.538.907,00		0,02%
		12.1.41	Suministro e instalación de munch de corteza de pino #2	m³	10,00	10,00		$ 359.642,00	$ 3.596.420,00	$ 3.596.420,00		0,01%
	12,2		**ESPECIES ARBÓREAS - MAYORES**						**$ 12.280.492,00**	**$ 12.280.492,00**		0,03%
		12.2.1	V01 - Aliso - Alnus glutinosa, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	5,00	5,00		$ 125.844,00	$ 629.220,00	$ 629.220,00		0,00%
		12.2.2	V02 - Amarrabollo - Meriania nobilis, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	3,00	3,00		$ 125.844,00	$ 377.532,00	$ 377.532,00		0,00%
		12.2.3	V03 - Chicalá - Tabebuia, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	1,00	1,00		$ 188.765,00	$ 188.765,00	$ 188.765,00		0,00%
		12.2.4	V04 - Yarumo - Cecropia peltata, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	2,00	2,00		$ 120.909,00	$ 241.818,00	$ 241.818,00		0,00%
		12.2.5	V05 - Sangregado - Croton draco, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	7,00	7,00		$ 168.902,00	$ 1.182.314,00	$ 1.182.314,00		0,00%
		12.2.6	V06 - Palma de cera - Ceroxylon quinduense, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	3,00	3,00		$ 54.039,00	$ 162.117,00	$ 162.117,00		0,00%
		12.2.7	V07 - Pino romerón - Retrophyllum rospigliosii, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	4,00	4,00		$ 54.039,00	$ 216.156,00	$ 216.156,00		0,00%
		12.2.8	V08 - Pino hayuelo - Podocarpus oleifolius, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	5,00	5,00		$ 69.091,00	$ 345.455,00	$ 345.455,00		0,00%
		12.2.9	V09 - Mano de oso - Oreopanax bogotensis, árbol de 1.5m (Incluye suministro, transporte en Bogotá D.C., siembra de la especie en área georreferenciada del proyecto y garantía de prendimiento).	Und	3,00	3,00		$ 67.857,00	$ 203.571,00	$ 203.571,00		0,00%
		12.2.10	Suministro e instalación de sustrato en tierra abonada para siembra de especies, 66.6% de materia orgánica - 33.3% de arena.	m³	25,91	25,91		$ 110.736,00	$ 2.869.170,00	$ 2.869.170,00		0,01%
		12.2.11	Suministro e instalación de hidroretenedor + Abono, Terracottem	m²	25,92	25,92		$ 226.249,00	$ 5.864.374,00	$ 5.864.374,00		0,01%
	12,3		**MOBILIARIO URBANO**						**$ 92.275.468,00**	**$ 92.275.468,00**		0,23%
		12.3.1	MU1 - Suministro e instalación de banca en concreto de alto desempeño reforzado con fibras de vidrio referencia BORÂ, capacidad de 2 a 3 personas, l=1.02m x a=1.00m x h=0.42m, color gris. Estructura en perfiles metálicos con acabado en pintura electrostática bicapa microtexturizada color gris nopal.	Und	16,00	16,00		$ 3.128.233,00	$ 50.051.728,00	$ 50.051.728,00		0,13%
		12.3.2	MU2 - Suministro e instalación de mesa en concreto de alto desempeño reforzado con fibras de vidrio referencia BORÂ forma de tronco de pirámide invertida, l=1.05m x a=1.04m x h=0.28m, color gris.	Und	4,00	4,00		$ 1.433.085,00	$ 5.732.340,00	$ 5.732.340,00		0,01%
		12.3.3	Suministro e instalación de biciparqueadero en concreto de alto desempeño reforzado con fibras de vidrio referencia MC 60° forma de tronco de pirámide inclinada, a=0.13m l=0.69m x h=0.90m, color gris.	Und	50,00	50,00		$ 729.828,00	$ 36.491.400,00	$ 36.491.400,00		0,09%
	12,4		**CERRAMIENTOS, CONCRETOS Y PREFABRICADOS**						**$ 581.457.454,00**	**$ 337.635.375,00**	**-$ 243.822.079,00**	0,84%
		12.4.1	Suministro e instalación de bordillos en concreto reforzado de 21MPa, para confinamiento de jardines y zonas de pisos.	m³	741,98	438,31	-303,67	$ 734.264,00	$ 544.809.203,00	$ 321.838.715,00	-$ 222.970.488,00	0,80%
		12.4.2	Suministro e instalación de loseta de piso en concreto prefabricado, referencia A55 tipo IDU - podotáctil alerta, e=10cm, losetas 39.8cm x 39.8cm x e=6cm, bicapa color amarillo. Pegado con mortero de asiento de arena de pozo y cemento 5:1, e=4cm. Sellado de juntas de instalación a tope con arena de pozo, e=2mm h=6cm.	m²	255,20	110,00	-145,20	$ 143.606,00	$ 36.648.251,00	$ 15.796.660,00	-$ 20.851.591,00	0,04%
	12,5		**CANCHAS**						**$ 78.963.984,00**	**$ 78.963.984,00**		0,20%
		12.5.1	Suministro e instalación de recubrimiento acrílico mono-componente para la regularización en capa fina, adición de áridos seleccionados con demarcación, color azul, canchas deportivas.	m²	840,40	840,40		$ 93.960,00	$ 78.963.984,00	$ 78.963.984,00		0,20%
13			**SEÑALIZACIÓN**						**$ 101.143.928,00**	**$ 101.143.928,00**		**0,25%**
	13,1		**INFORMATIVAS**						**$ 14.311.520,00**	**$ 14.311.520,00**		0,04%
		13.1.1	A.1 - Suministro e instalación de señal informativa de área caliente.	Und	1,00	1,00		$ 50.255,00	$ 50.255,00	$ 50.255,00		0,00%
		13.1.2	A.2 - Suministro e instalación de señal informativa de área fría.	Und	1,00	1,00		$ 57.572,00	$ 57.572,00	$ 57.572,00		0,00%
		13.1.3	A.3 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de hombres.	Und	8,00	8,00		$ 68.592,00	$ 548.736,00	$ 548.736,00		0,00%
		13.1.4	A.4 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de mujeres.	Und	7,00	7,00		$ 75.909,00	$ 531.363,00	$ 531.363,00		0,00%
		13.1.5	A.5 - Suministro e instalación de señal informativa de baño de personas con movilidad reducida.	Und	8,00	8,00		$ 83.226,00	$ 665.808,00	$ 665.808,00		0,00%
		13.1.6	A.6 - Suministro e instalación de señal informativa de baños mixtos.	Und	12,00	12,00		$ 90.544,00	$ 1.086.528,00	$ 1.086.528,00		0,00%
		13.1.7	A.7 - Suministro e instalación de señal informativa de cuarto técnico.	Und	27,00	27,00		$ 102.796,00	$ 2.775.492,00	$ 2.775.492,00		0,01%
		13.1.8	A.8 - Suministro e instalación de señal informativa de cuarto de aseo.	Und	7,00	7,00		$ 102.796,00	$ 719.572,00	$ 719.572,00		0,00%
		13.1.9	A.9 - Suministro e instalación de señal informativa indicativa de espacios.	Und	60,00	60,00		$ 102.796,00	$ 6.167.760,00	$ 6.167.760,00		0,02%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		13.1.10	A.10 - Suministro e instalación de señal informativa de símbolo.	Und	17,00	17,00		$ 94.159,00	$ 1.600.703,00	$ 1.600.703,00		0,00%
		13.1.11	A.11 - Suministro e instalación de señal informativa de rampa.	Und	1,00	1,00		$ 107.731,00	$ 107.731,00	$ 107.731,00		0,00%
	13,2		**REGLAMENTARIAS**						**$ 1.615.965,00**	**$ 1.615.965,00**		0,00%
		13.2.1	B.1 - Suministro e instalación de señal reglamentaria de no usar ascensor en caso de emergencia.	Und	13,00	13,00		$ 107.731,00	$ 1.400.503,00	$ 1.400.503,00		0,00%
		13.2.2	B.2 - Suministro e instalación de señal reglamentaria para hablar en voz baja.	Und	2,00	2,00		$ 107.731,00	$ 215.462,00	$ 215.462,00		0,00%
	13,3		**PREVENTIVAS**						**$ 822.368,00**	**$ 822.368,00**		0,00%
		13.3.1	C.1 - Suministro e instalación de señal preventiva de riesgo eléctrico.	Und	7,00	7,00		$ 102.796,00	$ 719.572,00	$ 719.572,00		0,00%
		13.3.2	C.2 - Suministro e instalación de señal preventiva de riesgo químico.	Und	1,00	1,00		$ 102.796,00	$ 102.796,00	$ 102.796,00		0,00%
	13,4		**EVACUACIÓN**						**$ 40.049.186,00**	**$ 40.049.186,00**		0,10%
		13.4.1	D.1 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida.	Und	38,00	38,00		$ 185.975,00	$ 7.067.050,00	$ 7.067.050,00		0,02%
		13.4.2	D.2 - Suministro e instalación de señal de evacuación de punto de encuentro.	Und	4,00	4,00		$ 185.975,00	$ 743.900,00	$ 743.900,00		0,00%
		13.4.3	D.3 - Suministro e instalación de señal de evacuación para ruta de evacuación.	Und	32,00	32,00		$ 185.975,00	$ 5.951.200,00	$ 5.951.200,00		0,01%
		13.4.4	D.4 - Suministro e instalación de señal de evacuación en escaleras.	Und	28,00	28,00		$ 185.975,00	$ 5.207.300,00	$ 5.207.300,00		0,01%
		13.4.5	D.5 - Suministro e instalación de señal de evacuación para gabinete contra incendios.	Und	18,00	18,00		$ 183.507,00	$ 3.303.126,00	$ 3.303.126,00		0,01%
		13.4.6	D.6 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida de emergencia.	Und	21,00	21,00		$ 185.975,00	$ 3.905.475,00	$ 3.905.475,00		0,01%
		13.4.7	D.7 - Suministro e instalación de señal de evacuación para salida con pictograma.	Und	28,00	28,00		$ 185.975,00	$ 5.207.300,00	$ 5.207.300,00		0,01%
		13.4.8	D.8 - Suministro e instalación de señal de evacuación de botiquín.	Und	1,00	1,00		$ 102.796,00	$ 102.796,00	$ 102.796,00		0,00%
		13.4.9	D.9 - Suministro e instalación de señal de evacuación de camilla.	Und	1,00	1,00		$ 102.796,00	$ 102.796,00	$ 102.796,00		0,00%
		13.4.10	D.10 - Suministro e instalación de señal de evacuación táctil de percepción manual para barandas.	Und	26,00	26,00		$ 192.268,00	$ 4.998.968,00	$ 4.998.968,00		0,01%
		13.4.11	D.12 - Suministro e instalación de señal de evacuación para demarcación de equipos en franja texturizada.	m²	2,00	2,00		$ 235.449,00	$ 470.898,00	$ 470.898,00		0,00%
		13.4.12	D.13 - Suministro e instalación de señal de evacuación para demarcación de salida en franja de piso de alto contraste.	m²	7,00	7,00		$ 426.911,00	$ 2.988.377,00	$ 2.988.377,00		0,01%
	13,5		**TUBERÍA Y MAQUINARÍA**						**$ 382.102,00**	**$ 382.102,00**		0,00%
		13.5.1	E.1 - Suministro e instalación de señal en 'sticker' reflectivo para tubos.	Und	7,00	7,00		$ 27.293,00	$ 191.051,00	$ 191.051,00		0,00%
		13.5.2	E.1 - Suministro e instalación de señal para identificación de tubos.	Und	7,00	7,00		$ 27.293,00	$ 191.051,00	$ 191.051,00		0,00%
	13,6		**PANELES Y PLANOS**						**$ 43.962.787,00**	**$ 43.962.787,00**		0,11%
		13.6.1	F.1 - Suministro e instalación de señal de directorio general y de piso.	Und	16,00	16,00		$ 1.400.381,00	$ 22.406.096,00	$ 22.406.096,00		0,06%
		13.6.2	F.2 - Suministro e instalación de señal de cartelera de información.	Und	13,00	13,00		$ 1.277.005,00	$ 16.601.065,00	$ 16.601.065,00		0,04%
		13.6.3	F.3 - Suministro e instalación de señal de protocolo de lavado de manos.	Und	46,00	46,00		$ 107.731,00	$ 4.955.626,00	$ 4.955.626,00		0,01%
14			**COMPROMISOS ESPECIALES ACUEDUCTO**						**$ 1.202.809.551,00**	**$ 1.214.419.622,00**	**$ 11.610.071,00**	**3,03%**
	14,1		**RECOMPOSICIÓN DE TUBERÍA**						**$ 1.202.809.551,00**	**$ 1.214.419.622,00**	**$ 11.610.071,00**	3,03%
		14.1.1	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. Incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra.	m	677,44	782,19	104,75	$ 110.836,00	$ 75.084.740,00	$ 86.694.811,00	$ 11.610.071,00	0,22%
		14.1.2	Fresado y reposición de pavimento flexible e=0.14m.	m²	671,70	671,70		$ 219.354,00	$ 147.340.082,00	$ 147.340.082,00		0,37%
		14.1.3	Excavación mecánica (Incluye cargue y retiro de escombros, disposición final a sitio autorizado).	m³	1.565,57	1.565,57		$ 61.276,00	$ 95.931.867,00	$ 95.931.867,00		0,24%
		14.1.4	Alquiler de entibado metálico tipo deslizante (E2) (incluye colocación y transporte)	m²	1.655,42	1.655,42		$ 34.849,00	$ 57.689.732,00	$ 57.689.732,00		0,14%
		14.1.5	Suministro e instalación de relleno cama de arena de peña	m³	306,19	306,19		$ 127.637,00	$ 39.081.173,00	$ 39.081.173,00		0,10%
		14.1.6	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 10"	m	119,80	119,80		$ 159.152,00	$ 19.066.410,00	$ 19.066.410,00		0,05%
		14.1.7	Suministro e instalación de tubería PVC Alcantarillado 8"	m	10,00	10,00		$ 121.896,00	$ 1.218.960,00	$ 1.218.960,00		0,00%
		14.1.8	Suministro e instalación de base granular en relleno en recebo B-200 (Extendido, humedecimiento y compactación).	m³	858,55	858,55		$ 111.457,00	$ 95.691.407,00	$ 95.691.407,00		0,24%
		14.1.9	B15 - Suministro e instalación de sub-base granular, según estudio de suelos. Espesor y acabado según pliego de condiciones.	m³	681,70	681,70		$ 146.743,00	$ 100.034.703,00	$ 100.034.703,00		0,25%
		14.1.10	Suministro e instalación de tubería PVC-P 6" para extensión de tubería de acueducto, incluye soldadura, sello, accesorios y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	m	67,38	67,38		$ 354.521,00	$ 23.887.625,00	$ 23.887.625,00		0,06%
		14.1.11	Rehabilitación general de pozos existentes, hasta Ø1.2m. Escarificación de paredes interiores y reconstitución de pañete con mortero de cemento y arena 1:3. Recomposición de base y cañuelas en concreto de 21MPa. Retiro y recomposición de geotextil. Rehabilitación de tapa para pozo. No incluye excavación.	Und	6,00	6,00		$ 3.049.007,00	$ 18.294.042,00	$ 18.294.042,00		0,05%
		14.1.12	Retiro de tubería de concreto diámetro = 1,40m (incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	m	179,70	179,70		$ 177.340,00	$ 31.867.998,00	$ 31.867.998,00		0,08%
		14.1.13	Suminstro e instalación de tubería en concreto reforzado Ø=60"; contempla sellos y demás elementos para su correcta instalación.	m	141,54	141,54		$ 3.515.761,00	$ 497.620.812,00	$ 497.620.812,00		1,24%
								TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL	**$ 40.020.746.260,00**	**$ 31.279.097.161,00**	**-$ 8.741.649.099,00**	
								A.I.U.				
								TOTAL CONTRACTUAL	**$ 40.020.746.260,00**	**$ 31.279.097.161,00**	**-$ 8.741.649.099,00**	

PRESUPUESTO ITEM NO PREVISTOS

CAPITULO	SUBC	ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD PRESUPUESTO CONTRACTUAL	CANTIDAD REAL	VARIACIÓN CANTIDAD	V. COSTO DIRECTO UNITARIO	V.TOTAL S/N CANTIDADES PRESUPUESTO	V.TOTAL S/N CANTIDADES REALES	VARIACIÓN TOTAL	% INCIDENCIA PRESUP.
					1	2	3	4	5	6	7	4c
					DATO CONTRATO	DATO ESTUDIO	(2-1)	DATO CONTRATO	1 X 3	2 X 3	(6-5)	4a/Total 4a

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		NP- 001	CONSTRUCCIÓN DE PILOTES PRE EXCAVADOS TIPO KELLY EN CONCRETO REFORZADO Ø 0.60 M, A PROFUNDIDADES MAYORES A 43 METROS (INCLUYE PREHUECOS, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION, MANEJO Y RETIRO DE LODOS, TRANSPORTE, ARMADO Y DESMONTE DE EQUIPOS, INCLUYE CONFORMACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA. NO INCLUYE ACERO NI CONCRETO NI EQUIPOS DE BOMBEO).	ML		9.073,75	9.073,75	$ 333.672,00		$ 3.027.656.310,00	$ 3.027.656.310,00	7,57%
		NP. 002	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5 MPA FLUIDO PARA PILOTES (NO INCLUYE BOMBA ESTACIONARIA PARA BOMBEO DE CONCRETO).	M3		2.919,25	2.919,25	$ 797.657,00		$ 2.328.560.197,00	$ 2.328.560.197,00	5,82%
		NP. 003	SUMINISTRO DE CONCRETO DE 24.5MPA FLUIDO PARA PILOTES (INCLUYE AUTOBOMBA PARA BOMBEO DE CONCRETO)	M3		456,50	456,50	$ 882.918,00		$ 403.052.067,00	$ 403.052.067,00	1,01%
		NP. 004	DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO 24.5MPA H=2M Ø 0.60M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	UN		171,00	171,00	$ 185.475,00		$ 31.716.225,00	$ 31.716.225,00	0,08%
		NP. 005	TALA DE ÁRBOLES CLASE I (H<5M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.1	UN		31,00	31,00	$ 386.465,00		$ 11.980.415,00	$ 11.980.415,00	0,03%
		NP. 006	TALA DE ÁRBOLES CLASE III (10M<H<20M) INCLUYE PROCESO DE APLICACIÓN DE INHIBIDOR DE CRECIMIENTO Y/O DESTOCONAMIENTO COD ÍTEM 20.1.3	UN		2,00	2,00	$ 1.064.403,00		$ 2.128.806,00	$ 2.128.806,00	0,01%
		NP. 007	Construcción de pilotes pre excavados tipo tornillo en concreto reforzado Ø0.30m, (Incluye prehuecos, excavación, retiro de material de excavacion, manejo y retiro de lodos, transporte, armado y desmonte de equipos, suministro de concreto y equipos de bombeo. No incluye suministro de acero.	ML		2.962,60	2.962,60	$ 251.233,00		$ 744.302.885,80	$ 744.302.885,80	1,86%
		NP. 008	LOSA EN CONCRETO DE 4000 PSI MÁS STEELDECK E=12CM, INCLUYE LÁMINA COLABORANTE CAL 20 DE 2", ANDAMIO CERTIFICADO, REPLANTEO E INSTALACIÓN DE CONECTORES DE CORTANTE	m²		91,00	91,00	$ 254.980,00		$ 23.203.180,00	$ 23.203.180,00	0,06%
		NP. 009	Suministro e instalación de murete en concreto 3000PSI, E=0,10m, H=0,28m, para cimentación de Sótano, incluye pases en tubería PVC 1" cada 1m.	ml		577,00	577,00	$ 72.227,00		$ 41.674.979,00	$ 41.674.979,00	0,10%
		NP. 010	Cargue y retiro de material de excavacion manual, incluye disposicion final en botaderos certificados	m³		1.278,61	1.278,61	$ 52.127,00		$ 66.650.103,47	$ 66.650.103,47	0,17%
		NP. 011	Suministro e instalación de cable Al 3x350MCM F + 1x350MCM N + 1/0T AWG HFFR-LS serie 8000, acometida desde Transformador a Tablero de Distribución pasando por armario de medida. Se incluye material de conexión e incidencia de bornas estañadas, accesorios de fijación, soporte y conexión.	ml		36,65	36,65	$ 212.638,00		$ 7.793.182,70	$ 7.793.182,70	0,02%
		NP. 012	Suministro e instalación de muro en mampostería a la vista de ladrillo portante de perforación vertical de 6cm x 24,5cm x 12cm, color Topo o cocoa o Similar liso. (incluye suministro, transporte e instalación)	m²		779,14	779,14	$ 212.042,00		$ 165.210.403,88	$ 165.210.403,88	0,41%
		NP. 013	Suministro e instalación de geotextil tejido T2100	m²		3.234,67	3.234,67	$ 11.484,00		$ 37.146.950,28	$ 37.146.950,28	0,09%
		NP. 014	Descabece de pilotes en concreto 28MPa h=0,30m Ø0.30m, incluye retiro de material	un		333,00	333,00	$ 46.370,00		$ 15.441.210,00	$ 15.441.210,00	0,04%
		NP. 015	Suministro e instalación de zócalo prefabricado de concreto pulido recto, de uso institucional, color gris Ref color: gris grano danta / ROCA o similar, con boquilla del mismo color del zócalo + Mezcla adhesiva cementica en polvo compuesta por cemento gris, áridos con dosificaciones, granulometría controlada y aditivos especiales Ref: 350107 - 000 pega Roca o equivalente.	ml				$ 48.786,00				
		NP. 016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15	kg		71.144,75	71.144,75	$ 7.271,00		$ 517.293.477,25	$ 517.293.477,25	1,29%
		NP. 017	Suministro e instalación de sub-base granular reciclada incluye Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación Con Vibrocompactador.	m³		987,15	987,15	$ 229.877,00		$ 226.923.081,00	$ 226.923.081,00	0,57%
		NP. 018	Bloqueo y traslado de árboles - Categoria 1 hasta H = 5m (Incluye poda aérea, excavación lateral, corte de las raíces laterales o secundarias, aplicación de cicatrizante, amarre del bloque, destronque y traslado interno hasta el punto del trasplante)	un		14,00	14,00	$ 1.107.683,00		$ 15.507.562,00	$ 15.507.562,00	0,04%
		NP. 019	Medidas de compensación de los impactos y efectos ambientales por los árboles viabilizados con ocasión de la tala autorizada en el acto administrativo Resolución No. 03030 del 26/12/24 y Resolución No. 00606 del 21/03/25, de acuerdo con lo liquidado en los conceptos técnicos SSFFS-13796 del 14 de diciembre de 2023 y SSFFS-01054 de 17 de marzo de 2025, respectivamente	un		1,00	1,00	$ 105.776.632,00		$ 105.776.632,00	$ 105.776.632,00	0,26%
		NP. 021	Suministro e instalación cinta PVC H=15cm, para sellado contra placa y muros de tanques en concreto	ml		105,05	105,05	$ 92.605,00		$ 9.728.155,00	$ 9.728.155,00	0,02%
		NP. 025	Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG + 8 AWG desde TBP PRI a TREG SEC. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ml		13,00	13,00	$ 65.471,00		$ 851.123,00	$ 851.123,00	0,00%
		NP. 026	Suministro e instalación de acometida en cable 3x6 AWG + 6 AWG + 10 AWG desde TRES PRO a TRES ID. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ml		13,00	13,00	$ 81.196,00		$ 1.055.548,00	$ 1.055.548,00	0,00%
		NP. 027	Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 4 AWG + 10 AWG desde TRES PRE a TBP PRE. Y desde TRES SIS a TBP SIS. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ml		26,00	26,00	$ 76.647,00		$ 1.992.822,00	$ 1.992.822,00	0,00%

ITEM	CAP.	SUBCAP.	ACTIVIDAD	UN	CANT	CANT	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR PARCIAL	VR.TOTAL	%
		NP. 028	Suministro e instalación de acometida en cable 3x8 AWG + 6 AWG + 10 AWG desde TBP SIS a TREG SIS. Se incluye incidencias de bornas, accesorios de fijación y soporte.	ml		2,60	2,60	$ 68.784,00		$ 178.838,00	$ 178.838,00	0,00%
		NP. 031	Viga en concreto de 175KG canchada en mampostería h=Hasta 15cm (Incluye mano de obra y material)	ml		2.075,06	2.075,06	$ 57.375,00		$ 119.056.568,00	$ 119.056.568,00	0,30%
		NP. 032	Suministro e instalación de Poyo en concreto de 3000PSI mezclado en obra, ancho hasta 20cm x alto hasta 21cm, bordes bocelados (Incluye mano de obra y materiales)	ml		557,22	557,22	$ 99.126,00		$ 55.234.990,00	$ 55.234.990,00	0,14%
		NP. 033	Suministro e instalación Sello para junta entre mampostería y concreto. Espesor desde 2 hasta 3cm (Incluye mano de obra y materiales)	ml		3.056,36	3.056,36	$ 34.058,00		$ 104.093.509,00	$ 104.093.509,00	0,26%
		NP. 034	Suministro e instalación de muro en mampostería de bloque estriado de arcilla de perforación vertical , unidades de 9cm x 23cm x 33 cm, aparejo tipo pandereta a medios, mortero de pega de cemento y arena 1:3 f'cp 17.5MPA, espesor de 1cm (Ancho hasta 60cm)	ml		130,46	130,46	$ 49.568,00		$ 6.466.522,00	$ 6.466.522,00	0,02%
		NP. 035	Suministro e instalación de viga aérea en voladizo en concreto acabado a la vista de 35MPa, h=0,30 - 0.85m. Incluye formaleta con equipo para trabajos a doble altura, contemplando armado de doble cama para lograr la base de apoyo donde se realiza el armado de la viga por diferencia de sección con la placa de entrepiso; así como los sobreanchos de 2m, requeridos para trabajo de armado hasta el borde de viga. Incluye formaleteado de vacíos entre borde de placa y viga aérea, para distancia total en voladizo de 1.40m. Incluye vaciado y curado del concreto.	m³		239,53	239,53	$ 1.700.910,00		$ 407.418.972,00	$ 407.418.972,00	1,02%
		NP. 036	Construcción de Micropilotes pre excavados en concreto reforzado Ø0.20m H=2m, (Incluye prehuecos, excavación, transporte, armado y desmonte de equipos, suministro de concreto). No incluye suministro de acero.	ml		144,00	144,00	$ 307.661,00		$ 44.303.184,00	$ 44.303.184,00	0,11%
		NP. 037	Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø3/8" L:9cm	und		6.950,00	6.950,00	$ 12.845,00		$ 89.272.750,00	$ 89.272.750,00	0,22%
		NP. 038	Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø1/2" L:12cm	und		230,00	230,00	$ 17.330,00		$ 3.985.900,00	$ 3.985.900,00	0,01%
		NP. 039	Suministro e instalación de anclaje epóxico para varilla corrugada fy' 420Mpa Ø5/8" L:15cm	und		1.245,00	1.245,00	$ 26.126,00		$ 32.526.870,00	$ 32.526.870,00	0,08%
		NP. 041	Suministro e instalación de Malla contra impacto para zona de canchas h=5m con bases en tubo redondo AN de 4"x3mmx1,20m, Columnas en tubo redondo AN de 3"x3mmx6m, Marco superior: Angulo de 1"1/2 x 1/8 ángulo de refuerzo 1"1/4 x1/8 repisada con platina de 3/4 x 1/8m y troquel de 30cm central y con 1/4 en cada esquina, Marco inferior: Marco en ángulo de 1"1/2 x 1/8, varilla lisa redonda de 3/4 cada 10cm. No incluye excavacion, ni viga de concreto, ni acero de refuerzo estructura	ml		43,71	43,71	$ 2.087.144,00		$ 91.229.064,00	$ 91.229.064,00	0,23%
		NP. 042	Suministro e instalación de válvula solenoide de 1 1/2" 220 VAC para tanque de aguas lluvias	Und		1,00	1,00	$ 2.236.616,00		$ 2.236.616,00	$ 2.236.616,00	0,01%
								TOTAL COSTO DIRECTO ADICIONES		$ 8.741.649.098,38	$ 8.741.649.098,38	
								A.I.U.				
								TOTAL ADICIONES		$ 8.741.649.098,38	$ 8.741.649.098,38	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

	VARIACION TOTAL
RESUMEN ITEM CONTRACTUALES	-$ 8.741.649.099,00
RESUMEN ITEM ADICIONES	
RESUMEN ITEM NO PREVISTOS	$ 8.741.649.098,38
TOTAL BALANCE CONTRATO	-$ 0,62

CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS NO SE ESTA SUPERANDO EL VALOR DEL CONTRATO

CONTRATISTA
Nit/C.C.
REP. LEGAL
C.C.

CONSORCIO URBANOVA SED
901.784.778-3
HARVEY ACUÑA CAVIEDES
79.058.668

INTERVENTOR
Nit/C.C.
REP. LEGAL
C.C.

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
900.436.622-8
EHIDA JULIETH RAMIREZ GUINA
1.118.537.436

Aportes parafiscales

NOVA URBANO

Bogotá DC, 05 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales CONSORCIO URBANOVA SED.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 el suscrito Representante Legal **HARVEY ACUÑA CAVIEDES** y Contador Público **JESSICA PAOLA GALEANO** del **CONSORCIO URBANOVA SED**, identificado con NIT No. **901.784.778-3**, nos permitimos certificar bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las normas establecidas en Colombia la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a la nómina del mes de agosto del presente año. El pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), se rigen bajo el decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016 y la exoneración del pago de los aportes parafiscales y al régimen contributivo de salud según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario.

Atentamente,

HARVEY ACUÑA CAVIEDES
CC. 79.058.668
Representante Legal

JESSICA PAOLA GALEANO
CC. 1.002.406.706
Contadora Publica
TP 290476-T

Carrera 7 no. 155c - 20 OF. 3301
Tel. 601 6798709
E-mail: administracion@novaurbano.com
www.novaurbano.com

(PERSONA JURÍDICA)

Modelo certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales (Personas Jurídicas colombianas o extranjeras con sucursal en Colombia - Artículo 50 de la Ley 789 de 2002)

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito REVISOR FISCAL EMMA LILIANA MORENO BAEZ de la sociedad NOVA URBANO SAS, identificada con NIT 901.547.883-3, se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos legalmente exigibles correspondientes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, y el Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, razón por la cual la referida sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social y aportes parafiscales.

Dado en BOGOTA D.C. a los 05 (cinco) días del mes de diciembre de 2025.

Firma _____

EMMA LILIANA MORENO BAEZ
CC. 39.673.065
TP-183018-T
REVISOR FISCAL

_____

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HARVEY ACUÑA CAVIEDES
C.C. 79.058.668 DE BOGOTA

Bogotá DC, 05 de diciembre de 2025

CERTIFICACIÓN

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales de HARVEY ACUÑA CAVIEDES

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016 el suscrito **HARVEY ACUÑA CAVIEDES** identificado con cedula de Ciudadanía **79.058.668** en nombre propio me permito certificar bajo la gravedad de juramento que de acuerdo con las normas establecidas en Colombia he realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes al año presente. El pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales.

Atentamente,

HARVEY ACUÑA CAVIEDES
CC. 79.058.668
Representante Legal

Carrera 7 no. 155c – 20 OF. 3301
Tel. 601 6798709
E-mail: administracion@novaurbano.com
www.novaurbano.com

CERTIFICACIÓN DE APORTES

En mi condición de Revisor Fiscal, de URBANISCOM SAS., identificada con Nit 830.008.233-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito certificar o auditar que de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, CREE, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

FIRMA_____

MANUEL J. MONGUA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REVISOR FISCAL)
TARJETA PROFESIONAL: No. 46199-T

Fecha: 5 de diciembre de 2025

CARRERA 7 No. 127-48 OF. 401
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
PBX: 6050544
URBANISCOMLICITA@YAHOO.COM

BALANCE GENERAL DE PAGO DE SALUD Y PENSION POR CONTRATO DE OBRA PARA: HARVEY ACUÑA CAVIEDES

No.CONTRATO / AÑO	ACTA No.	MES APORTE	PERIODO DEL ACTA	VALOR ACTA MES	% PARTICIPACION	VALOR DEL ACTA POR % DE PARTICIPACION	VALOR POR % UTILIDAD INDICADA EN LA PROPUESTA ECONOMICA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
							5,00%	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	1	AGOSTO	05/08/2024 AL 04/09/2024	$ 447.556.669,90	5%	$ 22.377.833,50	$ 1.118.891,67	$ 1.118.891,67															
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	2	SEPTIEMBRE	05/09/2024 AL 04/10/2024	$ 506.143.608,80	5%	$ 25.307.180,44	$ 1.265.359,02		$ 1.265.359,02														
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	3	OCTUBRE	05/10/2024 AL 04/11/2024	$ 1.633.734.496,37	5%	$ 81.686.724,82	$ 4.084.336,24			$ 4.084.336,24													
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	4	NOVIEMBRE	05/11/2024 AL 04/12/2024	$ 4.284.537.302,04	5%	$ 214.226.865,10	$ 10.711.343,26				$ 10.711.343,26												
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	5	DICIEMBRE	05/12/2024 AL 04/01/2025	$ 1.031.803.425,50	5%	$ 51.590.171,28	$ 2.579.508,56					$ 2.579.508,56											
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	6	ENERO	05/01/2025 AL 04/02/2025	$ 1.725.346.372,27	5%	$ 86.267.318,61	$ 4.313.365,93						$ 4.313.365,93										
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	7	FEBRERO	05/02/2025 AL 04/03/2025	$ 1.438.162.501,67	5%	$ 71.908.125,08	$ 3.595.406,25							$ 3.595.406,25									
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	8	MARZO	05/03/2025 AL 04/04/2025	$ 1.124.423.863,52	5%	$ 56.221.193,18	$ 2.811.059,66								$ 2.811.059,66								
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	9	ABRIL	05/04/2025 AL 04/05/2025	$ 919.992.979,42	5%	$ 45.999.648,97	$ 2.299.982,45									$ 2.299.982,45							
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	10	MAYO	05/05/2025 AL 04/06/2025	$ 1.052.426.461,59	5%	$ 52.621.323,08	$ 2.631.066,15										$ 2.631.066,15						
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	11	JUNIO	05/06/2025 AL 04/07/2025	$ 1.086.325.043,08	5%	$ 54.316.252,15	$ 2.715.812,61											$ 2.715.812,61					
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	12	JULIO	05/07/2025 AL 04/08/2025	$ 1.110.067.425,47	5%	$ 55.503.371,27	$ 2.775.168,56												$ 2.775.168,56				
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	13	AGOSTO	05/08/2025 AL 04/09/2025	$ 1.153.204.427,07	5%	$ 57.660.221,35	$ 2.883.011,07													$ 2.883.011,07			
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	14	SEPTIEMBRE	05/09/2025 AL 04/10/2025	$ 1.059.400.562,31	5%	$ 52.970.028,12	$ 2.648.501,41														$ 2.648.501,41		
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	15	OCTUBRE	05/10/2025 AL 04/11/2025	$ 1.389.835.593,83	5%	$ 69.491.779,69	$ 3.474.588,98															$ 3.474.588,98	
CO1.PCCNTR.5698312 de 2023	16	NOVIEMBRE	05/11/2025 AL 04/12/2025	$ 2.565.491.618,33	5%	$ 128.274.580,92	$ 6.413.729,05																$ 6.413.729,05

SMMLV AÑO	**2024**	$ 1.300.000,00
SMMLV AÑO	**2025**	$ 1.423.500,00
SMMLV AÑO	**2026**	
SMMLV AÑO	**2027**	

TOTAL	$ 1.118.891,67	$ 1.265.359,02	$ 4.084.336,24	$ 10.711.343,26	$ 2.579.508,56	$ 4.313.365,93	$ 3.595.406,25	$ 2.811.059,66	$ 2.299.982,45	$ 2.631.066,15	$ 2.715.812,61	$ 2.775.168,56	$ 2.883.011,07	$ 2.648.501,41	$ 3.474.588,98	$ 6.413.729,05
SMMLV PARA EL MES CORRESPONDIENTE	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00	$ 1.423.500,00
I.B.C. 40% TOPE MAX. 25 SMMLV Y TOPE	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.633.734,50	$ 4.284.537,30	$ 1.031.803,43	$ 1.725.346,37	$ 1.438.162,50	$ 1.124.423,86	$ 919.992,98	$ 1.052.426,46	$ 1.086.325,04	$ 1.110.067,43	$ 1.153.204,43	$ 1.059.400,56	$ 1.389.835,59	$ 2.565.491,62
APORTE A CANCELAR POR SALUD MES	**$ 162.500,00**	**$ 162.500,00**	**$ 204.216,81**	**$ 535.567,16**	**$ 128.975,43**	**$ 215.668,30**	**$ 179.770,31**	**$ 140.552,98**	**$ 114.999,12**	**$ 131.553,31**	**$ 135.790,63**	**$ 138.758,43**	**$ 144.150,55**	**$ 132.425,07**	**$ 173.729,45**	**$ 320.686,45**
ACUMULADO EN SALUD	$ 162.500,00	$ 325.000,00	$ 529.216,81	$ 1.064.783,97	$ 1.193.759,40	$ 1.409.427,70	$ 1.589.198,01	$ 1.729.751,00	$ 1.844.750,12	$ 1.976.303,43	$ 2.112.094,06	$ 2.250.852,48	$ 2.395.003,04	$ 2.527.428,11	$ 2.568.732,49	$ 2.848.114,56
APORTE A CANCELAR POR PENSION MES	**$ 208.000,00**	**$ 208.000,00**	**$ 261.397,52**	**$ 685.525,97**	**$ 165.088,55**	**$ 276.055,42**	**$ 230.106,00**	**$ 179.907,82**	**$ 147.198,88**	**$ 168.388,23**	**$ 173.812,01**	**$ 177.610,79**	**$ 184.512,71**	**$ 169.504,09**	**$ 222.373,70**	**$ 410.478,66**
ACUMULADO EN PENSION	$ 208.000,00	$ 416.000,00	$ 677.397,52	$ 1.362.923,49	$ 1.528.012,04	$ 1.804.067,46	$ 2.034.173,46	$ 2.214.081,27	$ 2.361.280,15	$ 2.529.668,38	$ 2.703.480,39	$ 2.881.091,18	$ 3.065.603,89	$ 3.235.107,98	$ 3.287.977,58	$ 3.645.586,64

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

No.	MES/AÑO	PLANILLA NUMERO	VALOR PAGADO EN SALUD	ESTADO	VALOR PAGADO EN PENSION	ESTADO	TOTAL PAGO SALUD + PENSION
1	AGOSTO 2024	9473358007	$750.000,00	CUMPLE	$960.000,00	CUMPLE	$1.710.000,00
2	SEPTIEMBRE 2024	9475441142	$750.000,00	CUMPLE	$960.000,00	CUMPLE	$1.710.000,00
3	OCTUBRE 2024	9477286901	$750.000,00	CUMPLE	$960.000,00	CUMPLE	$1.710.000,00
4	NOVIEMBRE 2024	9478905830	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
5	DICIEMBRE 2024	9480372294	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
6	ENERO 2025	9481691137	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
7	FEBRERO 2025	9483228244	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
8	MARZO 2025	9484161701	$750.000,00	CUMPLE	$1.020.000,00	CUMPLE	$1.770.000,00
9	ABRIL2025	9486255937	$1.500.000,00	CUMPLE	$1.920.000,00	CUMPLE	$3.420.000,00
10	MAYO 2025	9487399427	$1.500.000,00	CUMPLE	$1.920.000,00	CUMPLE	$3.420.000,00
11	JUNIO 2025	9488846653	$1.500.000,00	CUMPLE	$1.920.000,00	CUMPLE	$3.420.000,00
12	JULIO 2025	9490093057	$1.500.000,00	CUMPLE	$1.920.000,00	CUMPLE	$3.420.000,00
13	AGOSTO 2025	9491711080	$1.500.000,00	CUMPLE	$1.920.000,00	CUMPLE	$3.420.000,00
14	SEPTIEMBRE 2025	9492925837	$1.500.000,00	CUMPLE	$1.920.000,00	CUMPLE	$3.420.000,00
15	OCTUBRE 2025	9494494967	$1.500.000,00	CUMPLE	$1.920.000,00	CUMPLE	$3.420.000,00
16	NOVIEMBRE 2025		$1.500.000,00	CUMPLE	$1.920.000,00	CUMPLE	$3.420.000,00
		TOTAL	**$18.000.000,00**		**$23.340.000,00**		**$41.340.000,00**

CONSORCIO URBANOVA SED
901.784.778-3
HARVEY ACUÑA CAVIEDES
79058668 DE BGTA

LOGIA 3 ASOCIADOS SAS
900.436.622-8
EHIDA JULIETH RAMIREZ GUINA
1118537436

Certificado de Aportes

Se certifica que HARVEY ACUÑA CAVIEDES identificado(a) con CC 79058668 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

ACUÑA CAVIEDES HARVEY CC 79058668

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-10	2025-10	1910982484	9494494967	I	2025-11-07																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$12,000,000	$1,920,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$12,000,000	$60,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$12,000,000	$60,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$12,000,000	$835,200
EPS	COMPENSAR	30	12.5%	$12,000,000	$1,500,000

Este certificado se expide el día 2025-11-19 a las 12:10.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.058.668

ACÚÑA CAVIEDES
APELLIDOS

HARVEY
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1971
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

12-MAY-1989 ENGATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500130-70139051-M-0079058668-20050623 00008 05174H 01 183930121

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.002.406.706

GALEANO MARTINEZ

APELLIDOS

JESSICA PAOLA

NOMBRES

Jessica Paola Galeano.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 28-SEP-1992

CHITARAQUE
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

13-DIC-2010 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00278764-F-1002406706-20110127 0025600883A 1 36055698

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

290476-T

JESSICA PAOLA
GALEANO MARTINEZ
C.C. 1002406706
RES. INSCRIPCION 2974 DEL 23/11/2021
UNIVERSIDAD CENTRAL



ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
Asesor Grado 6 Código 1020

313431 332887

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C1F2F8C24C42870A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JESSICA PAOLA GALEANO MARTINEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1002406706 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 290476-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.673.065**

MORENO BAEZ

APELLIDOS

EMMA LILIANA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-DIC-1976**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.58	**B+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

03-FEB-1995 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00253478-F-0039673065-20100903 0023721830A 1 1460917348

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

183018-T



EMMA LILIANA
MORENO BAEZ
C.C. 39673065
RESOLUCION INSCRIPCION 555
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FECHA 16/10/2013

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

194697

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 4 C 6 9 4 A 3 B D B C B 7 1 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EMMA LILIANA MORENO BAEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39673065 de SOACHA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 183018-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **11.254.236**

MONGUA CUERVO

APELLIDOS

MANUEL JOSE

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-JUN-1956**

SIACHOQUE
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

25-ENE-1977 USME
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00320859-M-0011254236-20110808 **0027**05517A 2 1201383881

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

46199-T



MANUEL JOSE
MONGUA CUERVO
C.C. 11254236
RESOLUCION INSCRIPCION 009 FECHA 22/02/1996
UNIVERSIDAD LIBRE

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 54044

FIRMA DEL TITULAR

103485

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO

logoformas 3725 04/2013

Certificado No:

8AA8F55313AB83F6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MANUEL JOSE MONGUA CUERVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11254236 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 46199-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 19 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

FURC

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C
Secretaria
EDUCACION

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL
DIRECCION FINANCIERA - OFICINA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD

FORMATO INFORMACION DE PAGOS A CONTRATISTAS

Articulo 6°, Resolución 888 del 14 de Abril de 2009

RECIBIDO POR:

Hora		Fecha				Folios	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Compromiso

Tipo	CONTRATO DE OBRA			Otro, Cuál?				No.	CO1.PCCNTR.5698312 de 2023					Fecha:	5	12	2025
Contratista	CONSORCIO URBANOVA SED							NIT	X	C.C.		No.	901.784.778-3				
Dirección :	Cra 7 #155c-20 OF 3301							Teléfonos	311 2377824								
Cesión de contrato :		→	Nombre del cedente								NIT		C.C.		No.		
Aporte a pensiones voluntarias		Aporte cuenta AFC		Valor Aporte				Donde realiza el aporte a Pensión						NIT No:			
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.									Banco								

2, Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	3	8	4	2	1	5	4	0	6							Banco	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria del Contratista

Responsables de IVA	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen SIMPLE (Ley 2010-2019)		Código actividad ICA del RIT	4290
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Cumplo todos los requisitos para pertenecer al Regimen Especial de Renta			

4. Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos			Apoderado		Aplicar a todo el valor neto del giro:			Aplicar valor parcial						
Embargo		Reintegro		Otro		Cual?			Valor parcial a aplicar									
Beneficiario									NIT		C.C.		No.					
Cuenta Bancaria															Banco		Ahorros		Corriente	

Firma Contratista

Fecha	5	12	2025

Al presente formato se le debe anexar certificación bancaria.
La certificación bancaria deberá corresponder al contratista y/o beneficiario del pago, no se pueden realizar pagos a cuentas de terceros.

El presente formato y sus soportes deberan ser archivados por el interventor de la SED o funcionario responsable de la SED, con toda la documentación del Contratista

Certificación Cuenta

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO URBANOVA SED identificado(a) con NIT 9017847783 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA DE AHORROS No. 384215406 desde el 28 de Diciembre de 2023, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de noviembre de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

RUT (Consorcio e integrantes)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141170014621

(415)7707212489984(8020) 000014117001462 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 4 7 7 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO URBANOVA SED

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 # 155 C - 20 OF 3301

42. Correo electrónico administracion@novaurbano.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 3 7 7 8 2 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 1 2 2 7	4 1 1 2	2 0 2 3 1 2 2 7				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5																

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACUÑA CAVIEDES HARVEY
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170014621

(415)7707212489984(8020) **000014117001462 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 4 7 7 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 3 1 0 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 1 0 2 7	
81. Hasta	2 0 2 6 0 6 3 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141170014621

(415)7707212489984(8020) **000014117001462 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 4 7 7 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 3 1 0 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 0 5 8 6 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ACUÑA	CAVIEDES	HARVEY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 1 0 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 8 0 3 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	PINZON	MARIA DEL PILAR	SANDRA LILIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141170014621

(415)7707212489984(8020) **000014117001462 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 7 8 4 7 7 8	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 5 4 7 8 8 3	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: NOVA URBANO SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 3	2 0 2 3 1 0 2 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 0 5 8 6 6 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ACUÑA	CAVIEDES	HARVEY	

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	5	2 0 2 3 1 0 2 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 8 2 3 3	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: URBANISCOM S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	2	2 0 2 3 1 0 2 5	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social:

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141183783569

(415)7707212489984(8020) **000014118378356 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 7 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
NOVA URBANO SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 155 C 20 OF 3301

42. Correo electrónico administracion@novaurbano.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 7 9 8 7 0 9	3 1 0 6 8 3 4 0 8 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 2 4 0 1 0 1	4 3 9 0	2 0 2 1 1 2 1 3	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACUÑA CAVIEDES HARVEY

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141183783569

(415)7707212489984(8020) **000014118378356 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 7 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 2 1 1 1 2 6	2 0 2 3 0 4 1 4
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 2 1 1 2 1 3	2 0 2 3 0 4 2 8
77. No. Matrícula mercantil	0 3 4 6 2 0 0 4	0 3 4 6 2 0 0 4
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 1 2 1 3
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 2 1 1 2 1 3		-
2	8 0	2 0 2 1 1 2 1 3		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
1			

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

MARIA DEL PILAR SANDRA LILIANA GONZALEZ PINZON

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141183783569

(415)7707212489984(8020) **000014118378356 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 7 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 0 5 8 6 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ACUÑA	CAVIEDES	HARVEY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 1 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 0 8 0 3 1 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GONZALEZ	PINZON	MARIA DEL PILAR	SANDRA LILIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 0 0 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 6 0 6 9 4 7 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DUQUINO	MELO	WILMER	ANDRÉS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141183783569

(415)7707212489984(8020) **000014118378356 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 7 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 0 8 0 3 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ	PINZON	MARIA DEL PILAR	SANDRA LILIANA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 1 1 1 2 6	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 0 5 8 6 6 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ACUÑA	CAVIEDES	HARVEY	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 1 0 0 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 0 1 6 0 6 9 4 7 4		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
DUQUINO	MELO	WILMER	ANDRÉS

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 4 1 0 0 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 3 0 0 0 0 8 2 3 3	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: URBANISCOM S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 2 3 0 4 1 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141183783569

(415)7707212489984(8020) **000014118378356 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 4 7 8 8 3	3	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 6 7 3 0 6 5		1 8 3 0 1 8

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MORENO	BAEZ	EMMA	LILIANA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 2 4 0 6 7 0 6	3	2 9 0 4 7 6

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GALEANO	MARTINEZ	JESSICA	PAOLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141099332282

(415)7707212489984(8020) 000014109933228 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 0 5 8 6 6 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 0 5 8 6 6 8	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ACUÑA	CAVIEDES	HARVEY	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 7 155 C 20 OF 3301

42. Correo electrónico: contabilidad@novaurbano.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 0 1 3 1	3 1 0 6 8 3 4 0 8 6	6 0 1 6 7 9 8 7 0 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 7 0 7 0 3	4 1 1 1	1 9 9 7 0 7 0 3		4 1 1 2	4 2 9 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	2	2	4	2	4	8	5	2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACUÑA CAVIEDES HARVEY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141099332282

(415)7707212489984(8020) **000014109933228 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 0 5 8 6 6 8	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141099332282

(415)7707212489984(8020) **000014109933228 2**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 0 5 8 6 6 8		Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 0 2 4 0 6 7 0 6		2 9 0 4 7 6 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GALEANO	MARTINEZ	JESSICA	PAOLA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 2 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157938575

(415)7707212489984(8020) 000014115793857 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 8 2 3 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
URBANISCOM S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 7 155 C 20 OF 3301

42. Correo electrónico administracion@urbaniscom.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 7 9 8 7 0 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	1 9 9 5 0 5 0 5	4 2 9 0	1 9 9 5 0 5 0 5	4 1 1 1	7 1 1 2			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CASTILLO PINILLA WILLIAM

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157938575

(415)7707212489984(8020) **000014115793857 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 8 2 3 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	1 3 9 5	3 4
73. Fecha	1 9 9 5 0 5 0 5	2 0 2 3 0 7 1 7
74. Número de notaría	3 2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 5 0 8 3 1	2 0 2 3 0 7 2 5
77. No. Matrícula mercantil	0 0 6 6 2 4 3 0	0 0 6 6 2 4 3 0
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	1 9 9 5 0 8 3 1
81. Hasta	2 0 3 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 6 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157938575

(415)7707212489984(8020) **000014115793857 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 8 2 3 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	1 9 9 5 0 5 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 3 8 6 5 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CASTILLO	PINILLA	WILLIAM	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	1 9 9 5 0 5 0 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 0 5 8 6 6 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ACUÑA	CAVIEDES	HARVEY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157938575

(415)7707212489984(8020) **000014115793857 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 8 2 3 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 0 5 8 6 6 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
ACUÑA	CAVIEDES	HARVEY	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
139,000,000	5 0	1 9 9 5 0 5 0 5	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 5 3 8 6 5 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CASTILLO	PINILLA	WILLIAM	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
139,000,000	5 0	1 9 9 5 0 5 0 5	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141157938575

(415)7707212489984(8020) **000014115793857 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 8 2 3 3	7	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 5 4 2 3 6		4 6 1 9 9

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MONGUA	CUERVO	MANUEL	JOSE

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 4 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 2 3 8 0 6 1 1	9	2 1 5 2 1 7

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CISNEROS	RAMIREZ	SONIA	CECILIA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 4 1 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 6 7 3 0 6 5	8	1 8 3 0 1 8 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MORENO	BAEZ	EMMA	LILIANA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157938575

(415)7707212489984(8020) **000014115793857 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 0 8 2 3 3	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de edificios no residenciales 4 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: CF INGENIERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 145 7 F 76

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 7 0 9 9 2 5	2 0 2 3 0 7 2 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 7 9 0 0 0 3 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de edificios no residenciales 4 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: AYG PROYECTOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CL 140 6 10

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 3 7 0 9 9 3 1	2 0 2 3 0 7 2 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 7 9 0 0 0 3 3	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

RIT

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:19/11/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901784778	CONSORCIO URBANOVA SED

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CR 7 # 155 C 20 OF 3301 Teléfonos: 3112377824

Dirección electrónica: administracion@novaurbano. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/12/2023 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: 27/12/2023 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4112 - CONSTTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Actividad 2: 4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 3:

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
25/10/2023	C.C.	52080317	MARIA DEL PILAR SANDRA LILIANA GONZALEZ PINZON	REPRESENTANTE LEGAL
25/10/2023	C.C.	79058668	HARVEY ACUÑA CAVIEDES	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:19/11/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901547883	NOVA URBANO SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 7 155 C 20 OF 3301 Teléfonos: 3106834086

Dirección electrónica: administracion@novaurbano. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 18/07/2023 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 13/12/2021

Matrícula Mercantil:03462004 Fecha inicio de Actividades: 13/12/2021 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 2: 4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Actividad 3: 4923 - Transporte de carga por carretera

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
04/10/2024	C.C.	1016069474	WILMER ANDRES DUQUINO MELO	REPRESENTANTE LEGAL
09/01/2024	C.C.	52080317	MARIA DEL PILAR SANDRA LILIANA GONZALEZ PINZON	REPRESENTANTE LEGAL
09/01/2024	C.C.	79058668	HARVEY ACUÑA CAVIEDES	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:19/11/2025

CONTRIBUYENTE	C.C. 79058668	HARVEY ACUÑA CAVIEDES

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 7 155 C 20 OF 3301 Teléfonos: 6016798709

Dirección electrónica: administracion@novaurbano. Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA NATURAL Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO

Matrícula Mercantil: NO Fecha inicio de Actividades: NO Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 6619 - Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.

Actividad 2: 7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.

Actividad 3: 47994 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de demás productos n.c.p.

Actividad 4: 70101 - Actividades de administración empresarial como consultoría profesional

Actividad 5: 4111 - Construcción de edificios residenciales

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:19/11/2025

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 830008233	URBANISCOM SAS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 7 127 48 OF 305 Teléfonos: 6050544

Dirección electrónica: contabilidad@urbaniscom.co Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 05/05/1995

Matrícula Mercantil:00662430 Fecha inicio de Actividades: 05/05/1995 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 6619 - Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros n.c.p.

Actividad 2: 6810 - Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados

Actividad 3: 47994 - Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de demás productos n.c.p.

Actividad 4: 4111 - Construcción de edificios residenciales

Actividad 5: 4112 - Construcción de edificios no residenciales

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
15/04/2020	C.C.	11254236	MANUEL JOSE MONGUA CUERVO	REVISOR FISCAL PRINCIPAL
05/05/1995	C.C.	79058668	HARVEY ACUÑA CAVIEDES	REPRESENTANTE LEGAL
28/03/2018	C.C.	79538659	WILLIAM CASTILLO PINILLA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD
