RADICADO - CE
20260304000723
FECHA DE RECEPCIÓN
2026-03-04
14:54:38
TIPO DOCUMENTO:
INFORMATIVO
000723

INESCO
PROYECTOS S.A.S.

Nocaima, Cundinamarca 12 de febrero de 2026

Señores

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, INFRASTRUCTURA Y PROYECTOS
Atn, Ing, JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
Municipio de Nocaima Cundinamarca

ASUNTO: ENTREGA ACTA PARCIAL No. 1

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 201-2025

Estimados señores:

Por medio de la presente nos permitimos hacer entrega del acta parcial No. 1 con la documentación que se relaciona a continuación:

1. Balance Acta Parcial No. 1
2. Memorias
3. Informe, registro fotográfico
4. Informe Ejecución
5. Bitácora periodo 28/01/2026 a 12/02/2026
6. Certificación pago parafiscales y documentos contadores
7. Factura
8. Certificación Bancaria

Total (32) Folios

De antemano agradezco su atención y colaboración.

Lina Salazar
LINA SALAZAR NARVAEZ
R/L INESCO PROYECTOS SAS
NIT. 900.892.992-2

Barrio la Bienvenida CRA 2 # 5-60 Barrio la Bienvenida, Nocaima-Cundinamarca
E-mail: inescogerencia@gmail.com

ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA

SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS

ACTA PARCIAL 1

CONTRATISTA	INESCO PROYECTOS SAS	**CONTRATO**	201/2025	**FECHA FINALIZACIÓN**	1/03/2026
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE NOCAIMA	**FECHA ACTA DE INICIO**	1/12/2025	**ESTADO**	FINALIZADO
SUPERVISOR	ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ	**PLAZO DE EJECUCION**	DOS (02) MESES	**VALOR ACTA PARCIAL No. 1**	$ 5.000.000,00

MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA

				CANTIDADES CONTRACTUALES					**ACTA PARCIAL No. 1**		**ACUMULADO EJECUTADO**		**SALDO POR EJECUTAR**	
Nº	**ITEM DE PAGO**	**GENERAL**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
			PRELIMINARES DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES											
1			1. Alistamiento de superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico.Reconstrucción de juntas de dilatación.Destroncado de superficie con disco diamantado.2. Aplicación de capa de regularización con mortero 100% acrílico. 3. Aplicación de carga de arena sílice malla 60/40. 4. Aplicación sello acrílico. 5. Aplicación acabado color con recubrimiento acrílico (2 capas). 6. Demarcación lineal para escenario deportivo. 7. Estampado de Logotipo. (de preferencia)	m2	450	$ 73.150,00	$ 32.917.500,00		68,3527	$ 5.000.000,00	68,3527	$ 5.000.000,00	381,65	$ 27.917.500,00
			VALOR TOTAL				$ 32.917.500,00			$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00		$ 27.917.500,00
			AJUSTE				$ -			$ -		$ -		$ -
			VALOR TOTAL				$ 32.917.500,00			$ 5.000.000,00		$ 5.000.000,00		$ 27.917.500,00

BALANCE ADICIÓN

DESCRIPCION	**VALOR**	**PORCENTAJE**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 32.917.500,00	100,00%
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No. 1	$ 5.000.000,00	15,19%
SALDO POR EJECUTAR	$ 27.917.500,00	84,81%

Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA


ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CALCULO

OBJETO	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	**CONTRATON° /CONVENIO N°**	201-2025
CONTRATISTA	INESCO PROYECTOS SAS	**SUPERVISOR**	ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD
1	1. Alistamiento de superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico.Reconstrucción de juntas de dilatación.Destroncado de superficie con disco diamantado.2. Aplicación de capa de regularización con mortero 100% acrílico. 3. Aplicación de carga de arena sílice malla 60/ 40. 4. Aplicación sello acrílico. 5. Aplicación acabado color con recubrimiento acrílico (2 capas). 6. Demarcación lineal para escenario deportivo. 7. Estampado de Logotipo. (de preferencia)	ML

REGISTRO FOTOGRAFICO

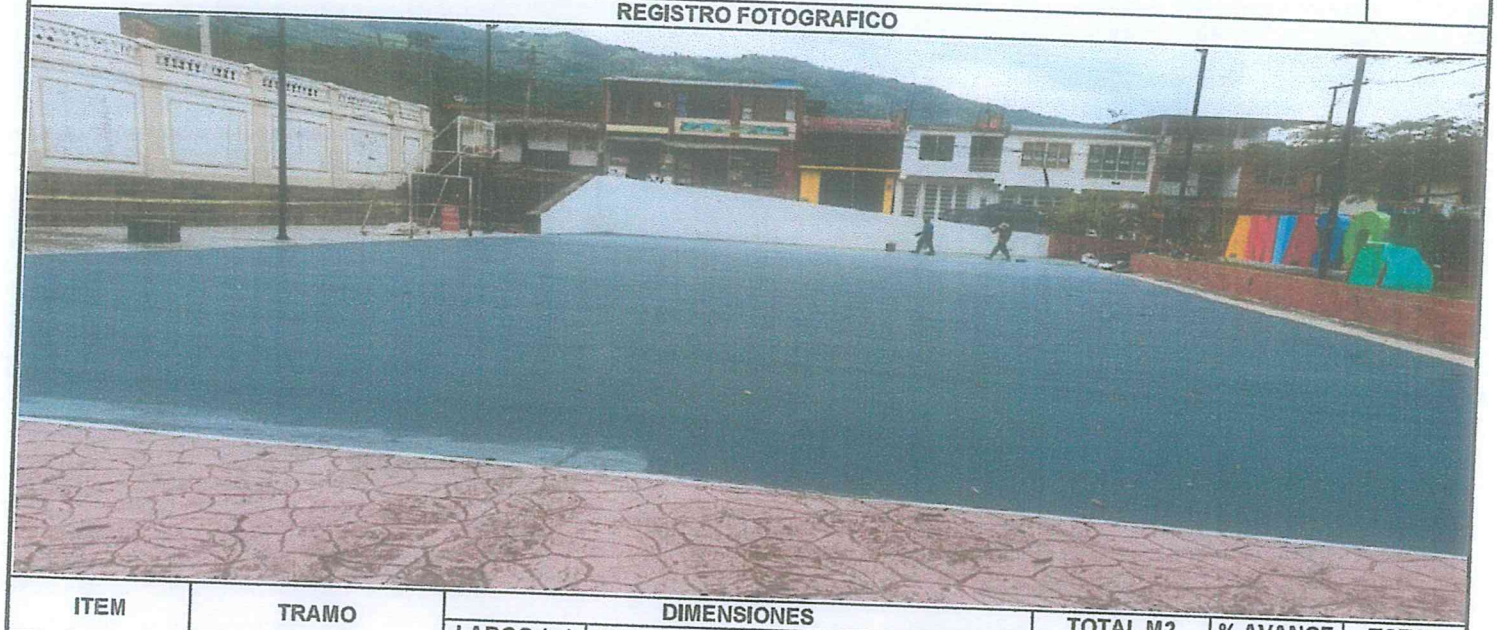

ITEM	TRAMO	DIMENSIONES				TOTAL M2	% AVANCE	TOTAL
		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	CANTIDAD			
1	CANCHA	30,00	15,00		1	450	15,19%	
TOTAL								68,3527

Lina Salazar

INESCO PROYECTOS SAS
R/L LINA SALAZAR NARVAEZ
CONTRATISTA

ING. JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
SUPERVISOR

INFORME PARA PAGO ACTA PARCIAL No. 1
CONTRATO DE OBRA No 201 DE 2025

MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA

FEBRERO DE 2026

1. DATOS DEL CONTRATO DE OBRA

- ✓ **TIPO DE CONTRATO:** OBRA
- ✓ **NO. DE CONTRATO:** Contrato No 201 de 2025
- ✓ **OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA
- ✓ **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($32.917.500,00).
- ✓ **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. ($32.917.500,00).
- ✓ **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO** 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
- ✓ **PLAZO DE EJECUCIÓN** DOS (2) MESES
- ✓ **FECHA DE INICIACIÓN:** 1 DE DICIEMBRE DE 2025
- ✓ **FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** 30 DE DICIEMBRE DE 2025
- ✓ **FECHA DE SUSPENSIÓN:** 29 DE DICIEMBRE DE 2025
- ✓ **FECHA DE REINICIO:** 28 DE ENERO DE 2026
- ✓ **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** 01 DE MARZO DE 2026

2. UBICACIÓN DE LA OBRA

1. La obra por intervenir por el CONTRATISTA se ejecutará en MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA.



3. RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA No.	201 de 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE NOCAIMA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	INESCO PROYECTOS SAS
SUPERVISOR	JUAN PABLO VELANDIA RAMIREZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 32.917.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	$ 32.917.500,00
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO INICIAL:	DOS (2) MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	1 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUPENSIÓN No. 1	29 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No. 1	UN (1) MES
FECHA DE REINICIO SUSPENSION 1:	28 DE ENERO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ENERO DE 2026
AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN 1:	NA.
TIEMPO DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No. 1	NA
MODIFICATORIO 1:	Modificar el contrato 201 de 2025, prorrogando el plazo de ejecución en Un (1) mes, fijando la fecha de terminación para el día primero (1) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
PRORROGA 1:	UN (1) MES
NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	1 DE MARZO DE 2026

FECHA PRESENTE ACTA PARCIAL No 1:	12 DE FEBRERO DE 2026

4. SITUACION FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DE CONTRATO:	$ 32.917.500,00
VALOR FINAL DE CONTRATO:	$ 32.917.500,00
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1:	$ 5.000.000,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 27.917.500,00

6.1 TIEMPO DE EJECUCION

TIEMPO EN EJECUCIÓN	EJECUCION
	DOS (2) MESES

INESCO
PROYECTOS S.A.S.


REGISTRO FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA


CONTRATISTA:	**INESCO PROYECTOS SAS**	**NIT:**	**900.892.992-2**
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA**		



Descripción: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero.

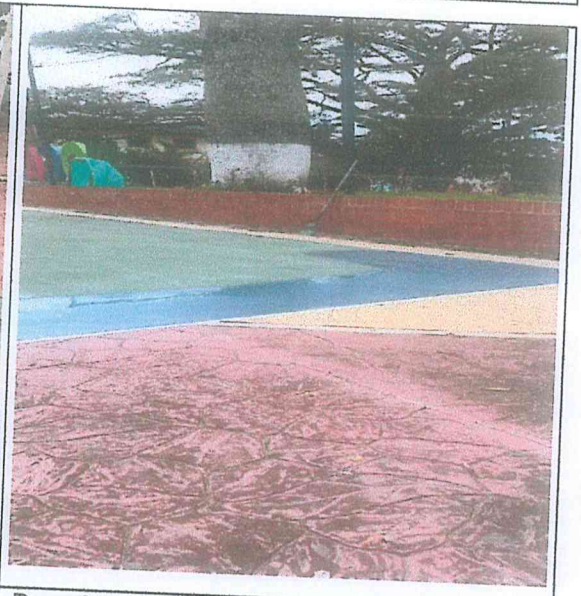

Descripción: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero.

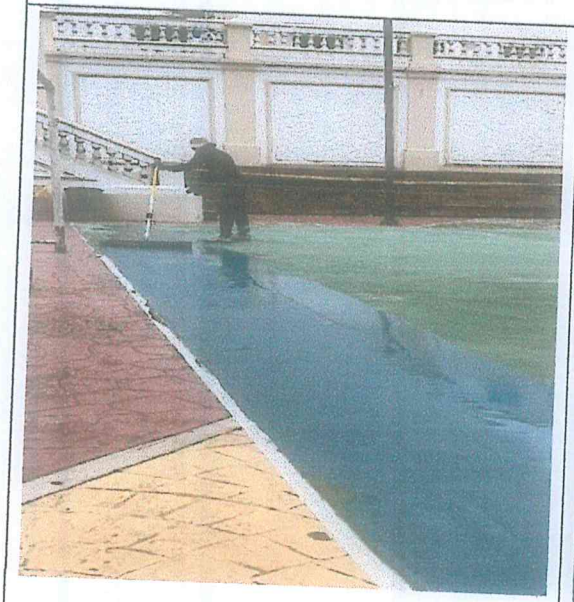


Descripción: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero.



Descripción: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero.

CONTRATISTA:	**INESCO PROYECTOS SAS**	**NIT:**	**900.892.992-2**
OBJETO:	**MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA**		

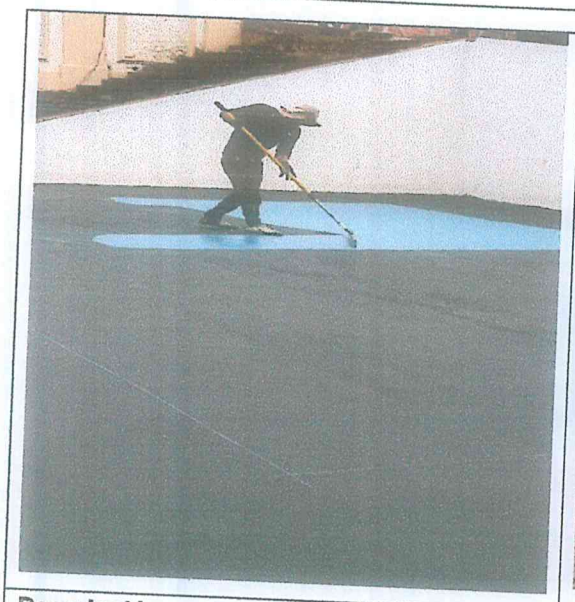

Descripción: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero.



Descripción: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero.



Descripción: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero.

INFORME EJECUCION CONTRATO OBRA No. 201 2025

SUPERVISION SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Informe No. 001 De: 28 (DIA) 01 (MES) 2026 (AÑO) A: 12 (DIA) 02 (MES) 2026 (AÑO)

OBJETO DEL CONTRATO

MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA

DESCRIPCION CONTRATOS

Contratista	INESCO PROYECTOS SAS
Contrato No.	201-2025
Valor Inicial	$32.917.500,00
Valor Adición Contrato	$0,00
Valor total Contrato	$32.917.500,00
Plazo Inicial	DOS (2) MESES

Fecha de iniciación:	01 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Terminación Inicial:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Suspensión:	29 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de Reinicio:	28 DE ENERO DE 2026
Nueva Fecha de Terminación:	01 DE MARZO DE 2026

ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Alistamiento de superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico.Reconstrucción de juntas de dilatación.Destroncado de superficie con disco diamantado.2. Aplicación de capa de regularización con mortero 100% acrílico. 3. Aplicación de carga de arena sílice malla 60/ 40. 4. Aplicación sello acrílico. 5. Aplicación acabado color con recubrimiento acrílico (2 capas). 6. Demarcación lineal para escenario deportivo. 7. Estampado de Logotipo. (de preferencia)

CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FINANCIERO :

	DATOS FINANCIEROS	%
PRESUPUESTO FINAL	$ 32.917.500,00	100,00%
PRESUPUESTO EJECUTADO	$ 5.000.000,00	15,19%
POR EJECUTAR	$ 27.917.500,00	84,81%
PAGADO EN ACTAS	$ 0,00	0,00%
POR PAGAR	$ 32.917.500,00	100,00%

AVANCE FÍSICO :

PROGRAMADO	84,81 %
REAL EJECUTADO	15,19 %

FLUJO DE CAJA PROGRAMADO VS EJECUTADO

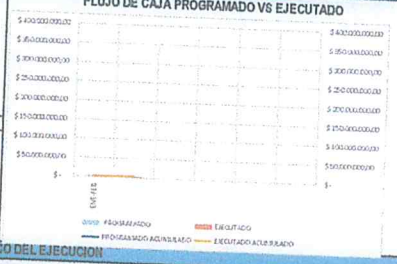

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL EJECUCION



Descripcion: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico.



Descripcion: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico.



Descripcion: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico.



Descripcion: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico.



Descripcion: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico.



Descripcion: Alistamiento de Superficie: Reparación de grietas y fisuras con mortero 100% acrílico.

Lina Salazar

LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ
INESCO PROYECTOS SAS
Contratista

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	1/12/2026 a 30/12/2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de diciembre de 2025, y en concordancia con las políticas de bienestar social y fomento al turismo de la administración municipal de Nocaima, se determinó priorizar la armonía del espacio público debido a la temporada decembrina. Siendo Nocaima un polo de atracción turística en Cundinamarca, la ejecución de obras civiles de gran envergadura en los escenarios deportivos (zonas de alta afluencia) habría generado impactos negativos como dispersión de material particulado (polvo), niveles de ruido elevados y obstrucción de áreas recreativas necesarias para la comunidad y visitantes durante las festividades de fin de año. Por lo anterior, se optó por una fase de planeación logística y mantenimiento preventivo superficial, postergando las actividades de obra pesada para garantizar el flujo de la economía local basada en el turismo.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		
Inspección y Diagnóstico de Seguridad: Diariamente, desde las 7:00 AM, el personal técnico realizó recorridos de inspección ocular en los diferentes escenarios deportivos objeto del contrato. Se verificó el estado de las estructuras existentes para identificar riesgos potenciales (tornillería suelta, láminas oxidadas o puntos cortantes) que pudieran afectar a los usuarios durante las vacaciones, procediendo a realizar ajustes menores de seguridad que no requerían intervención mayor. Mantenimiento Rutinario y Ornato: Se ejecutaron labores constantes de limpieza y recolección de residuos sólidos en las áreas de intervención. Se realizó el desmote manual de maleza en las zonas perimetrales y el barrido de superficies de juego para mantener el ornato y la higiene de los escenarios, asegurando que los espacios estuvieran en condiciones óptimas para el uso recreativo de la comunidad. Gestión de Almacenamiento y Logística: Se adelantó la planeación para el acopio de materiales pesados, estableciendo contactos con proveedores locales para asegurar el suministro de insumos una vez finalice el periodo de suspensión. Se realizaron las actas de vecindad preliminares y la socialización con los comités deportivos locales, informando que el inicio de las obras civiles se daría de forma controlada para no interferir con las actividades programadas de la temporada. Monitoreo y Vigilancia: El personal asignado realizó rondas de vigilancia para evitar actos de vandalismo o usos inadecuados de las instalaciones deportivas que pudieran incrementar los costos de reparación previstos en el presupuesto inicial. Se mantuvo la señalización informativa básica en buen estado, recordando a la comunidad las normas de uso de los escenarios.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS: SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES: SI NO

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	28 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada laboral arrancó puntualmente a las 7:00 AM con el arribo de la cuadrilla especializada al escenario deportivo. Inicialmente, se realizó la charla de seguridad industrial, enfatizando en el uso de EPP para labores de pulido y manejo de resinas, seguida de la organización de la herramienta menor y equipos de hidrolavado. Se procedió a realizar un lavado industrial a alta presión para retirar sedimentos, moho y capas de pintura vieja que impedían ver el estado real de la placa. Al finalizar el día, se inició el mapeo de grietas estructurales y fisuras por retracción térmica, marcando las zonas que requerirán mayor profundidad de destroncado para garantizar la adherencia del mortero acrílico.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORÓ EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	29 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM, tras la inspección diaria de equipos, se dio inicio a la labor de destroncado de superficie con disco diamantado. El personal técnico trabajó minuciosamente en la eliminación de protuberancias y el desbastado de las zonas donde el concreto presentaba meteorización o irregularidades geométricas. Este proceso es crítico para abrir el poro del concreto y generar un perfil de anclaje que permita que las capas posteriores no sufran desprendimientos por esfuerzos de corte durante el uso deportivo intenso. Se realizó la recolección manual de los residuos sólidos generados por el pulido para mantener el área de trabajo limpia.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI	NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	30 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
El personal se reportó a las 7:00 AM para continuar con el desbastado diamantado en el área central de la cancha. Se trabajó en la nivelación de las crestas del concreto y el suavizado de las zonas de transición.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	3horas, 0 mins	SI NO	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Debido a fuertes lluvias presentadas en horas de la tarde, se suspendieron las actividades operativas por un lapso de 3 horas. Se procedió a resguardar la maquinaria eléctrica y se realizó un barrido preventivo para evitar que el agua arrastrara material particulado hacia los drenajes, garantizando la seguridad del personal y la integridad de la zona ya pulida.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	31 de enero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Jornada iniciada a las 7:00 AM enfocada en el retiro total de polvos y finos resultantes del destroncado. Se utilizó aspirado industrial y soplado mecánico para asegurar que las grietas quedaran totalmente despejadas y libres de contaminación. Se realizó una revisión técnica de los niveles de la placa, identificando los puntos de mayor depresión que deberán ser compensados durante la fase de regularización. El frente de obra se dejó señalizado y limpio para el descanso dominical.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	2 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM, el personal inició con la preparación de la mezcla de mortero 100% acrílico de alta densidad para la reparación de grietas y fisuras. La labor consistió en la obturación manual de las cavidades mediante llana metálica, ejerciendo presión para asegurar el llenado total del vacío y evitar la formación de bolsas de aire internas que pudieran generar fracturas en el acabado final. Se aplicó el producto siguiendo estrictamente las recomendaciones del fabricante respecto a los tiempos de mezcla y aplicación.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	ACCIDENTES LABORALES
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

OBSERVACIONES: NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	3 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM, la cuadrilla se enfocó en la labor especializada de reconstrucción de juntas de dilatación. Se realizó la limpieza interna de las juntas con herramienta manual y se procedió a su perfilado para recuperar la geometría funcional del diseño original de la placa. Se instaló el material sellante acrílico, buscando que el escenario mantenga su capacidad de absorción de movimientos diferenciales sin afectar la futura capa de color. Se verificó el alineamiento y la uniformidad en el llenado de cada sección intervenida.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	4 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACION	CAPITULO	UNIDAD
Jornada de las 7:00 AM dedicada al tratamiento de micro-fisuras que aparecieron tras el secado de la fase anterior. Se realizó un lijado manual de las grietas ya reparadas para eliminar rebabas de mortero y nivelar la superficie con el resto de la placa. Se trabajó en el detallado de los bordes del escenario, asegurando que la transición entre el concreto y los sardineles sea suave y no presente puntos de acumulación de humedad.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	1 horas, 0 mins	3 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	
SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Fuertes lluvias en la zona obligaron a una parada de 4 horas. Se verificó que el sello estuviera lo suficientemente seco para no ser lavado por la escorrentía superficial.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	5 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se realizó un recorrido de inspección con el ingeniero residente para validar la calidad de las reparaciones ejecutadas durante la semana. Se verificó la dureza y adherencia del mortero acrílico en las zonas críticas.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	1 horas, 0 mins	1 horas, 0 mins	
			SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Se registró un periodo de lluvias de 2 horas al mediodía. La labor se detuvo para proteger las reparaciones frescas de la erosión por escorrentía superficial. Una vez cesó el evento climático, el personal realizó el secado manual de los puntos donde se acumuló agua para evitar manchas o afectaciones químicas en el producto aplicado.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	6 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM, el personal realizó la última fase del destroncado fino en las zonas reparadas, buscando una superficie totalmente tersa y lista para recibir la regularización. Se ejecutó un lavado final ligero para eliminar cualquier residuo de polvo y se realizó la señalización de los sectores que presentan mayores pendientes para controlar el flujo de la capa acrílica posterior. Al finalizar el día, se aprobó técnicamente el estado de la placa para avanzar al siguiente proceso.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	7 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A partir de las 7:00 AM, se realizó una jornada integral de orden y aseo en el escenario deportivo. Se clasificaron los envases de los productos acrílicos utilizados y se organizó el almacenamiento de la arena sílice y las resinas destinadas a la regularización. Se realizó el mantenimiento preventivo de las hidrolavadoras y equipos de mezcla, dejando el área despejada y segura para la comunidad durante el fin de semana.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	9 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La jornada comenzó a las 7:00 AM con la preparación de los primeros baches de mortero 100% acrílico para la capa de regularización. El personal inició la aplicación técnica mediante llanas de goma de gran formato (squeegees), extendiendo el material de forma continua para eliminar la porosidad residual del concreto y nivelar las depresiones de la placa. Esta labor requiere un control preciso de la velocidad de aplicación para evitar marcas de llana o traslapos visibles que afecten la estética final.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCION	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	10 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
Desde las 7:00 AM, se avanzó en la aplicación de la capa de regularización en el área de juego restante. Se puso especial atención en el control de espesores para garantizar una superficie plana y homogénea. El personal trabajó en el perfilado de los bordes contra las juntas de dilatación reconstruidas, asegurando que el producto fluya correctamente y sella la interfase entre los materiales. Se monitoreó el tiempo de secado para programar la segunda mano en las zonas de mayor rugosidad.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	2 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Debido a la humedad relativa alta por lluvias ligeras, se suspendieron actividades por 2 horas para asegurar que la pintura de demarcación no se corriera por capilaridad.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	11 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
A las 7:00 AM se retomó la aplicación de la capa acrílica en los sectores laterales del escenario.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MANANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE
	1 horas, 0 mins	3 horas, 0 mins

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	
SI	NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES		OBSERVACIONES
SI	NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

Debido a lluvias intensas en horas de la tarde, se suspendieron las actividades por 4 horas. Se procedió a evacuar el área de juego de inmediato y a proteger los recipientes de mezcla. El personal de seguridad realizó un recorrido post-lluvia para verificar que el agua no hubiera generado canales o burbujas en la capa de regularización fresca, procediendo a realizar correcciones

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

	BITACORA DE OBRA	Código	
		Revisión	001
		Página	1

NUMERO DE CONTRATO OBRA		FECHA	FOLIO No
201-2025	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA	12 de febrero de 2026	

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DIA

ACTIVIDAD REALIZADA	LOCALIZACIÓN	CAPITULO	UNIDAD
La última jornada del periodo inició a las 7:00 AM con labores de inspección y retoque en la capa de regularización. Se verificó que la placa presentara una textura uniforme y que todas las grietas y juntas estuvieran técnicamente tratadas según lo registrado en el registro fotográfico. Se realizó la limpieza final del frente de obra y se recolectó la información técnica para el folio de la bitácora, dejando el escenario deportivo preparado para recibir la carga de arena sílice y las capas de color en la siguiente fase del contrato.	ESCENARIOS DEPORTIVOS		M2

PERSONAL QUE LABORO EN LA OBRA

PERSONAL	PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA	OFICIALES	1
RESIDENTE DE OBRA	AYUDANTES	5
MAESTRO GENERAL	OTROS	

MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

DESCRIPCIÓN	TOTAL HORAS	MAÑANA	TARDE
Herramienta menor	9	5	4

NO CONFORMIDADES EN OBRA

SI NO

SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA OBRA

SEÑALIZACIÓN UTILIZADA	CANTIDAD	OBSERVACIONES

ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0 horas, 0 mins	0 horas, 0 mins	SI NO

ACCIDENTES LABORALES

ACCIDENTES LABORALES	OBSERVACIONES
SI NO	NO ACCIDENTES

OBSERVACIONES

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Lina Salazar

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTÍA No. SMC-047-2025

FORMATO 6

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ** identificado con C.C. No. 1.072.466.185, en mi condición de Representante Legal de la empresa **INESCO PROYECTOS SAS.** identificada con NIT **900.892.992- 2**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Nocaima, Cundinamarca, a los 12 días del mes de febrero de 2026.

Atentamente,


LINA YORLEY SALAZAR NARVAEZ
INESCO PROYECTOS SAS, NIT 900.892.992-2

JAVIER LAVERDE RAMIREZ
Contador Público TP. 82843-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 3.108.723
LAVERDE RAMIREZ
APELLIDOS
JAVIER
NOMBRES
FIRMA


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
82843-T
JAVIER
LAVERDE RAMIREZ
C.C. 3108723
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN
PRESIDENTE
92021


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 19-MAY-1961
NOCAIMA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1,67 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
06-AGO-1979 NOCAIMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00129841-M-0003108723-20081119 0006388035A 2 1130029570

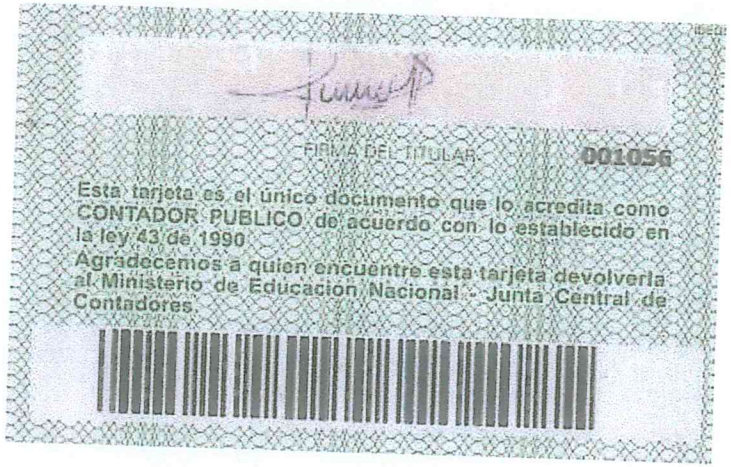
FIRMA DEL TITULAR 001056
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 7 5 5 E 4 E 7 A E 7 A B 6 4 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAVIER LAVERDE RAMIREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3108723 de NOCAIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 82843-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

INESCO PROYECTOS SAS
NIT 900.892.992-2
CR 149 BIS 137 52
Tel: (601) 3138932806
Bogotá - Colombia
inescogerencia@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764104132661 aprobado en 20251230 prefijo IPR desde el número 6 al 200 Vigencia: 12 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. IPR 9

Fecha y hora Factura
Generación: 12/02/2026, 17:12
Expedición: 12/02/2026, 17:12

Nombre del Cliente Municipio de Nocaima	**Nit ó C.C.** 899.999.718-9	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social Municipio de Nocaima	**Dirección** Cra 6 Nro 6-41	**Teléfono** (031) 3007285906
Correo planeacion@nocaima-cundinamarca.gov.co	**Vendedor** INESCO PROYECTOS SAS	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE NOCAIMA – CUNDINAMARCA Acta Parcial No. 1	1.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
Somos Régimen Simple de Tributación
Favor no descontar retención en la fuente.

Valor en Letras:
Cinco millones de pesos m/cte

Total Bruto	5,000,000.00
Total a Pagar	5,000,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 5,000,000.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

La Vega, Abril 15 de 2025

Señor (es)
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa INESCO PROYECTOS SAS identificada con NIT 900892992 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Tipo de cuenta	Número Producto	Fecha de Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	892-000021-76	2024/08/29	ACTIVA

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA
Jineth Maryuri Ramirez
Cédula Nº 1006[illegible]

Atentamente,
Jineth Maryuri Ramirez Peña
Gerencia de Equipos especializados Pyme - PAM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

*Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.
