INFORME No 01 PERIODO DE EJECUCIÓN 25 DE JULIO DE 2024 AL 24 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE ELABORACIÓN 25 DE AGOSTO DE 2024

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004)
Proyecto: Programa de Conexiones Intradomiciliarias Villa Rica, Cauca.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1. GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA 2240071

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE TRABAJO
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, NIT 901776167-1
CONTRATO No.:	2240071
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	29/07/2024
PRÓRROGA:	N/A
SUSPENSION:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/12/2024
PLAZO FINAL:	CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS CON DOS CENTAVOS ($1.775.466.090,02) M/CTE
ADICIONES / REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS CON DOS CENTAVOS ($1.775.466.090,02) M/CTE

2. GARANTIAS ORDEN DE TRABAJO No. 2240071

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR – ANEXO 2 – No. 65-45-101086343

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	$532.639.827,00	29/07/2024 A 29/08/2025
Buen manejo del anticipo	$355.093.218,00	29/07/2024 A 29/08/2025
Salario y Prestaciones sociales	$88.773.304,50	29/07/2024 A 29/12/2027
Estabilidad y Calidad de la obra	$532.639.827,00	3 AÑOS
Calidad y correcto funcionamiento	$177.546.609,00	3 AÑOS Y 5 MESES Y 1 DIAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3 – No. 65-40-101076108

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
Predios Labores y Operaciones	$532.639.827,00	29/07/2024 A 29/12/2024
Vehículo propio y no propio	$532.639.827,00	29/07/2024 A 29/12/2024
Responsabilidad Civil Patronal	$532.639.827,00	29/07/2024 A 29/12/2024
Responsabilidad Civil Cruzada	$532.639.827,00	29/07/2024 A 29/12/2024
Contratistas y subcontratistas	$532.639.827,00	29/07/2024 A 29/12/2024
Gastos Médicos	$532.639.827,00	29/07/2024 A 29/12/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3. ASPECTOS FINANCIEROS ORDEN DE TRABAJO No. 2240071

PAGOS REALIZADOS	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Acta Parcial 01	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		$ 0,00

4. GENERALIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 2240125

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE SERVICIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
CONTRATO No.:	2240125
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO:	29 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA:	N.A.
SUSPENSIÓN:	N.A.

FECHA DE TERMINACIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO FINAL:	CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($216.851.166,07)
ADICIONES / REDUCCIONES:	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE ($216.851.166,07)

5. GARANTIAS ORDEN DE SERVICIO No. 2240125

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR – ANEXO 1 – No. 85-45-101081024

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 65.055.349,82	29/07/2024 hasta el 29/08/2025
PAGO DE SALARIOS	$ 21.685.116,61	29/07/2024 hasta el 29/12/2027
CALIDAD DE SERVICIO	$ 65.055.349,82	29/07/2024 hasta el 29/12/2027

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 2 – No. 85-40-101059747

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 29/12/2024
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 29/12/2024
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 29/12/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 29/12/2024
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 29/12/2024
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 29/12/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 29/12/2024

6. ASPECTOS FINANCIEROS ORDEN DE SERVICIO No. 2240125

PAGOS REALIZADOS	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta Parcial 01	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		$ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL No.	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE INFORME		FECHA DE APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN
		INICIO	FINAL	
1	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	29 de julio de 2024	04 de agosto de 2024	05 de agosto de 2024
2	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	05 de agosto de 2024	11 de agosto de 2024	12 de agosto de 2024
3	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	12 de agosto de 2024	18 de agosto de 2024	19 de agosto de 2024
4	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	19 de agosto de 2024	25 de agosto de 2024	26 de agosto de 2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

8. CONTRATO EN EJECUCIÓN

ACTIVIDAD No. 1

No se presentó por parte del contratista las subsanaciones pedidas por parte de la interventoría para su posterior aprobación. Por esta razón se ha generado un atraso en obra, el semáforo se encuentra en color amarrillo.

ACTIVIDAD No. 2

Durante esta semana, el contratista de obra realizo diagnósticos en el barrio 3 de marzo en los que se elaboraron 5 diagnósticos efectivos, a la fecha del presente informe se han identificado un total de 95 viviendas efectivas de las cuales se han aprobado 0 diagnósticos.


ACTIVIDAD No. 3

Hasta la fecha del presente informe no se ha dado inicio a esta actividad.



AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	1,02%	1,52%	0,51%	-0,02%
Durante el Periodo	0,61%	0,08%	-0,52%	
Acumulado a la Fecha	**1,63%**	**1,61%**	**-0,02%**	

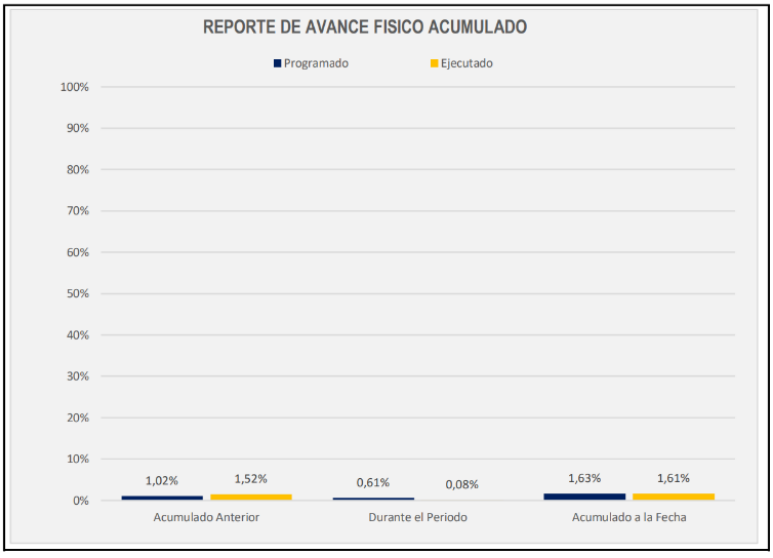

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Daniel Heredia U

DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
SUPERVISOR DESIGNADO
