INFORME No 01 PERIODO DE EJECUCIÓN 29 DE JULIO DE 2024 AL 28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE ELABORACIÓN 29 DE AGOSTO DE 2024

PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Contrato Interadministrativo 1632 de 2023 (Numeración ENTerritorio S.A. 223004)
Proyecto: Programa de Conexiones Intradomiciliarias Puerto Tejada, Cauca.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

1. GENERALIDADES CONTRATO DE OBRA 2240070

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE TRABAJO
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACUEDUCTO ENTERRITORIO, NIT 901776167-1
CONTRATO No.:	2240070
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VIGESIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	29/07/2024
PRÓRROGA:	N/A
SUSPENSION:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/01/2025
PLAZO FINAL:	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.580.962.013,99) M/CTE
ADICIONES / REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.580.962.013,99) M/CTE

2. GARANTIAS ORDEN DE TRABAJO No. 2240070

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR – ANEXO 3 – No. 65-45-101086354

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	$774.288.604,20	29/07/2024 A 29/09/2025
Buen manejo del anticipo	$516.192.402,80	29/07/2024 A 29/09/2025

Salario y Prestaciones sociales	$129.048.100,70	29/07/2024 A 29/01/2028
Estabilidad y Calidad de la obra	$774.288.604,20	3 AÑOS -0 MESES – 1 DIA
Calidad y correcto funcionamiento	$258.096.201,40	1 AÑO-0 MESES – 0 DIAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3 – No. 65-40-101076099

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
Predios Labores y Operaciones	$774.288.604,20	29/07/2024 A 29/01/2025
Perjuicios laborales y operaciones	$774.288.604,20	29/07/2024 A 29/01/2025
Vehículo propio y no propio	$387.144.302,10	29/07/2024 A 29/01/2025
Responsabilidad civil cruzada	$774.288.604,20	29/07/2024 A 29/01/2025
Responsabilidad Civil patronal	$387.144.302,10	29/07/2024 A 29/01/2025
Gastos Médicos	$200.000.000,00	29/07/2024 A 29/01/2025
Contratistas y subcontratistas	$387.144.302,10	29/07/2024 A 29/01/2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

3. ASPECTOS FINANCIEROS ORDEN DE TRABAJO No. 2240070

PAGOS REALIZADOS	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Acta Parcial 01	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		$ 0,00

4. GENERALIDAD DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 2240065

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE TRABAJO
CONTRATISTA:	CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN ESPECIALIZADA S.A.S., NIT 900.597.433-2
CONTRATO No.:	2240065
OBJETO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VEINTEAVA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.
PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	29/07/2024
PRÓRROGA:	N/A
SUSPENSION:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	29/01/2025

PLAZO FINAL:	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.580.962.013,99) M/CTE
ADICIONES / REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRECE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.580.962.013,99) M/CTE

5. GARANTIAS ORDEN DE TRABAJO No. 2240065

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR – ANEXO 2 – No. 96-45-101083706

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	$774.288.604,20	29/07/2024 A 29/09/2025
Buen manejo del anticipo	$516.192.402,80	29/07/2024 A 29/09/2025
Salario y Prestaciones sociales	$129.048.100,70	29/07/2024 A 29/01/2028
Estabilidad y Calidad de la obra	$774.288.604,20	3 AÑOS -0 MESES – 1 DIA
Calidad y correcto funcionamiento	$258.096.201,40	1 AÑO-0 MESES – 0 DIAS

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3 – No. 65-40-101076099

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
Predios Labores y Operaciones	$774.288.604,20	29/07/2024 A 29/01/2025
Perjuicios laborales y operaciones	$774.288.604,20	29/07/2024 A 29/01/2025
Vehículo propio y no propio	$387.144.302,10	29/07/2024 A 29/01/2025
Responsabilidad civil cruzada	$774.288.604,20	29/07/2024 A 29/01/2025
Responsabilidad Civil patronal	$387.144.302,10	29/07/2024 A 29/01/2025
Gastos Médicos	$200.000.000,00	29/07/2024 A 29/01/2025
Contratistas y subcontratistas	$387.144.302,10	29/07/2024 A 29/01/2025

6. ASPECTOS FINANCIEROS ORDEN DE TRABAJO No. 2240065

PAGOS REALIZADOS	FECHA DE PAGO	VALOR
Anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Acta Parcial 01	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		$ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

7. GENERALIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 2240131

INFORMACIÓN GENERAL	
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE SERVICIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER EQUILIBRIO
CONTRATO No.:	2240131
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA VEINTEAVA Y VIGESIMOPRIMERA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
PLAZO INICIAL:	SEIS PUNTO CINCO (6.5) MESES
FECHA DE INICIO:	29 DE JULIO DE 2024
PRÓRROGA:	N.A.
SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE FEBRERO DE 2025
PLAZO FINAL:	SEIS PUNTO CINCO (6.5) MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($570.182.128,04)
ADICIONES / REDUCCIONES:	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	QUINIENTOS SETENTA MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE ($570.182.128,04)

8. GARANTIAS ORDEN DE SERVICIO No. 2240131

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR – ANEXO 2 – No. 85-45-101081019

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	$ 171.054.638,41	29/07/2024 hasta el 14/10/2025
PAGO DE SALARIOS	$ 57.018.212,80	29/07/2024 hasta el 13/02/2028
CALIDAD DE SERVICIO	$ 171.054.638,41	29/07/2024 hasta el 13/02/2028

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO – ANEXO 3 – No. 85-40-101059745

AMPARO	VALOR	VIGENCIA
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 13/02/2025

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 13/02/2025
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 13/02/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 13/02/2025
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 13/02/2025
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 13/02/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	$ 325.000.000,00	29/07/2024 hasta el 13/02/2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

9. ASPECTOS FINANCIEROS ORDEN DE SERVICIO No. 2240131

PAGOS REALIZADOS	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta Parcial 01	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL DE PAGOS REALIZADOS		$ 0,00

10. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA

INFORME SEMANAL No.	DESCRIPCIÓN	PERIODO DE INFORME		FECHA DE APROBACIÓN POR LA SUPERVISIÓN
		INICIO	FINAL	
1	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	29 de julio de 2024	04 de agosto de 2024	05 de agosto de 2024
2	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	05 de agosto de 2024	11 de agosto de 2024	12 de agosto de 2024
3	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	12 de agosto de 2024	18 de agosto de 2024	19 de agosto de 2024
4	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	19 de agosto de 2024	25 de agosto de 2024	26 de agosto de 2024

11. CONTRATO EN EJECUCIÓN

ACTIVIDAD No. 1

El contratista no ha realizado los apiques para de estudio de suelos y no podra avanzar con esta actividad. Aunque se presentó informe de estudio de suelos el Especialista rechazo el informe que se recibió el 27 de agosto, estamos a espera del oficio del Especialista al respecto.

ACTIVIDAD No. 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


El contratista continúa realizando socializaciones y visitas a las Viviendas priorizadas para realización de diagnóstico. se inició el proceso de inclusiones.

ACTIVIDAD No. 3

No se ha iniciado con esta actividad dado que no se han surtido las actividad anteriores.



AVANCE FISICO				
	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	1,50%	1,34%	-0,16%	-3,07%
Durante el Periodo	3,00%	0,09%	-2,91%	
Acumulado a la Fecha	**4,50%**	**1,43%**	**-3,07%**	

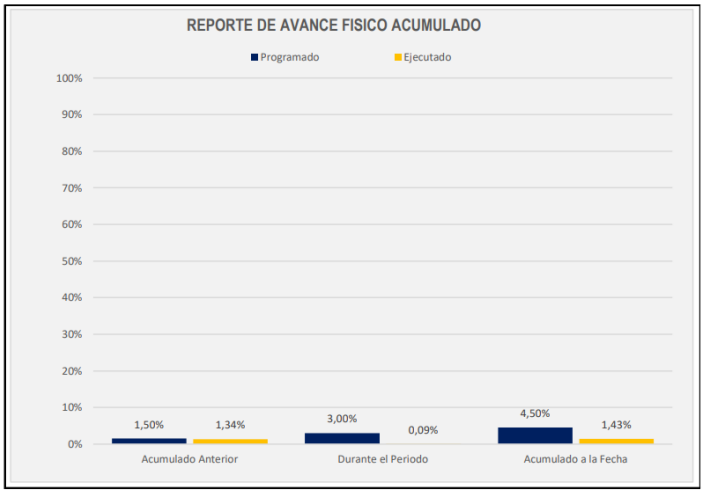

Daniel Heredia U

DANIEL ARISTIDES HEREDIA USECHE
SUPERVISOR DESIGNADO
