Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA y/o AYUDA DE MEMORIA 10/09/2025** **Cto 5090635 de 2023**	**Código:** MC-FO-018 **Versión:** 8 **Fecha de Aprobación:** 30-Ene-2025 **Clasificación:** Clasificada de acceso restringido

FINDETER - 10 de Septiembre 2025

Lugar de la reunión: Ministerio de Educación Nacional Hora inicio: 9:00 am

Objetivo de la reunión: Seguimiento del contrato interadministrativo 5090635 de 2023
Preside: Findeter
Quien es el secretario de la reunión: Findeter

Participantes:
Los relacionados en la lista de Asistencia

ORDEN DEL DÍA:
1. Reinstalación del equipo
2. Equipo Social
3.
4.
5.
6.

DESARROLLO

- Findeter expone la estructuración que hizo en el equipo teniendo en cuenta la solicitud efectuada por el MEN, sin embargo el Ministerio solicita que la línea de estratégico la maneje un solo profesional, pa lo que se acuerda que el MEN de respuesta al comunicado enviado por FINDETER, indicando lo referido anteriormente.

- Se presenta el equipo Social de Findeter y d se expone de acuerdo a los compromisos d Plan de Gestion Social y Reputacional, el cual esta compuesto por siete Componentes. Sin embargo, el MEN solicita un acompañamiento directo del grupo Social de findeter y no a . tracés de los contratistas externos.
Se solicita se vincule a los acercamientos con las ETC.

- Se solicita a la MEN incluir todas las sedes de Ornato, PIC independiente por cada comunidad indígena. Estrategico. Lo único que no se incluiría serían los proyectos de Emergencia del 01001.

- Se informa por el MEN que el alcance de Ornato se hará como los proyectos de Mejoramiento, en donde el contratista en la etapa de diagnostico evaluará necesidades y con 200 millones con el MEN se definirá el alcance

FINDETER INFORMA QUE SE DEBE EVALUAR EL ALCANCE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

- SOACHA:
Findeter informa que el lunes 08-Sep-25 la ETC remitió comunicado presentando alternativas para incorporar los recursos correspondiente al 30%, proponen 2 pagos, el primero $900 millones y el saldo con el resultado de la etapa 1.
Findeter esta evaluando dicha propuesta

- POTOMAYO:
Findeter informa que el 03-Sep-25 se hizo reunion con ETC para socializar el alcance de los proyectos.

- NORTE SANTANDER:
Findeter envió esta semana del resultado de diagnóstico e inconvenientes de los proyectos.
Ya estan iniciado algunas sedes, Grupo 17 se iniciaron 6 sedes y en grupo 16, 2 sedes, sin embago no avanzan de manera agil, adiciendo que no puede ingresar personal fuera de la region

Grupo 17 ya fue prorrogado dos meses y el grupo 16

vía ser prorrogado dos meses más. El contratista vía a asumir el costo de interventoría.

- Buenaventura: Findeter solicita aclara que las sedes que se están atendiendo pa Grupo 25 no hacen parte de la MESA DE PARO

- TARRA: Findeter informa que ya se ha requerido dos veces a la ETC para definir la matrícula, acto imprescindible para la mesa con el FFIE para definir el avance. Pdlo que solicita ayuda al MEN para sentar a la ETC y poder cerrar este tema y avanza con FFIE

- TOTORÓ - MERCADERES: Findeter, informa que el pasado miércoles 03-sep-25 enviaba los ajustes solicitados por ETC, sin embargo, a la fecha no tenemos respuesta de la ETC para la firma del convenio.

- PLAYÓN → El MEN debería remitir el comunicado para dar inicio de las contrataciones del playón, indicando que está priorizada

El MEN reafirma que el proyecto de playón va, pero Findeter solicita que se deje formalizado acta Priorización

- MESA TRABAJO PRODUCTO ETAPA1:

Findeter informa que de esa reunión realizada con el MEN, en donde se impartieron recomendaciones para el cierre de la etapa 1, hasta solo se atenderá lo que contractualmente es exigible. Se solicita el documento de dichas recomendaciones

- ABADES : Findeter informa que ya se definió que los proyectos ABADES de Grupo 27 y CRIHU tres Grupo 29 se tiene cronograma publica y se calma hasta la ultima semana de sep-25 poder publicar

  Frente a los demás de ABADES, se están haciendo acercamientos con la comunidad para adelantar convenios solidarios. por lo que FINDETER socializó los requerimientos para cumplir dicha contratación.
  Se estableció un plazo para definir si se evalúa desarrollará la contratación con las comunidades previa verificación del cumplimiento de los requisitos

- PIE : Se solicita pa el MEN dar cumplimiento a los plazos dados para la respuesta de OPIAC - CRIC que llegaron a Findeter desde agosto 25.
  - MEN recomienda la entrega del plan de trabajo como compromiso pendiente por parte de Findeter
  - MEN propone iniciar contacto con las organizaciones pequeñas y buscar alternativos con un tercero (consultor). Findeter propone vincular a las universidades de la zona para dicho foreo.

- Convenios : - Alerta para los avances de las firmas de Cauca (Totoró y Mercader) y Santander (El Playon)
  - MEN solicita reunión con ETC Norte para el apoyo de la firma de convenio de proyectos en el dpto (Abades, Colon, Somanego)

- Asistencia Técnica :
  - Pendiente MEN respuesta de aclaratoria para el cobro de Asistencia Técnica. No se modifica el contrato
  - Revisar por parte de Findeter de a posible inclusión de pago de AT en la posible adición de Mampox (pinillos) de 8.000 millones
  - Para las visitas, el MEN solicita que las visitas vengan con anexo del presupuesto. (valor, tipo de intervención) para que desde MEN puedan tomar decisiones para las intervenciones
  - El MEN propone mesa de trabajo para lograr consolidar el estado de visitas, viabilidades y cobro de AT.
- Alertas plazo de ejecución :
  - El documento de alertas hace parte de las actuaciones para el modificatorio del contrato IA, según lo que comenta el MEN. Además el MEN informa que así se logra evidenciar los hitos que hacen parte de los contratos.
  - La ruta crítica, según menciona el MEN, es el proyecto de Riosucio por su valor y alcance final
- Proyectos de infra con páneles solares :
  - El MEN solicita informar qué proyectos se tienen con paneles solares.
  - Findeter deberá remitir qué sedes pueden incluir sistema fotovoltaico. para el miercoles 17 de septiembre. Así mismo remitir el comunicado aclaratorio de saneamiento básico en la Guajira
- Lopez de Micay :
  - Findeter informa que ya se dió reinicio al contrato.

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA y/o AYUDA DE MEMORIA 10/09/2025** **Cto 5090635 de 2023**	**Código:** MC-FO-018 **Versión:** 8 **Fecha de Aprobación:** 30-Ene-2025 **Clasificación:** Clasificada de acceso restringido

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD Alta, Media, Baja	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Respuesta Propuesta de Equipo de Findeter		MEN		
2	Presentar Plan Gestión Social al Contrato interad ministrativo		MEN Findeter	17-Sep	
3	Rta de alcance de oficio		MEN		
4	TORRE – Mesa trabajo ETC		MEN Findeter		
5	Taller Mercaderes Mesa con ETC para gestionar Firma convenio		MEN Findeter		
6	Playón - ~~Dar~~ Rectificar comunicado con priorización		MEN	24-Sep-25	
7	Recomendaciones producto ETI documento		MEN.		
8	Publicar Abades contratación Publicación GR27-GR29		Findeter	Última Semana Sep-25	

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA y/o AYUDA DE MEMORIA 10/09/2025** **Cto 5090635 de 2023**	**Código:** MC-FO-018 **Versión:** 8 **Fecha de Aprobación:** 30-Ene-2025 **Clasificación:** Clasificada de acceso restringido

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD Alta, Media, Baja	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
9	PIE : Entrega Rta concepto de las propuestas		Findeter	Semana 15-20 Sep-25	
	Organizaciones Pequeñas. Hacer acercamiento con universidades para contratar con ellas		Findeter		
	Envio de los municipios para intervencion Afro para Findeter tener opciones de vinculos al consultor		Findeter	sept 24-25	
	Contacto con ETC Nariño para tema convenios. Solo convenios		Findeter	Semana 15-19 septiembre	
	Programar mesa de trabajo para cobro de viabilidades		Findeter MEN	Por definir en semana del 15 al 20 de sept.	
	Remitir por findeter sedes con posible inclusión de sistema fotovoltaico		Findeter	Semana sept 18/25	

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

**LISTA DE ASISTENCIA-
ASISTENCIA TÉCNICA**

Código: GES-FO-121
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 29-May-2023
Clasificación: Público

MODALIDAD: Capacitación:___ Reunión: X Evento:___ Campaña:___

FECHA: Día 10 Mes 09 Año 25.

TEMA: Reunión de Seguimiento contrato CO1.PCCNTR.5090635 del 2023.

Hora Inicial:

Hora Final:

NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ENRIQUE LUNA MONROY.	1026264858	PROFESIONAL PMO	OIE-MEN	3202054878	enmonroy@ext.mineducacion.gov.co	
Mauricio Alfonso	80237668	Apoyo Gsp. -Contratista	OIE-MEN	3103742231	ealfonso@mineducacion.gov.co	
Claudia Garcia	6781340	Prof	Findeter	3162486704	amgarcia@findeter.gov.co	
Hugo Estrada C	1042497142	Gestor	Findeter	3153559749	hacastrade@findeter.gov.co	
Julián Bayona R.	7.179.444	Gestor	Findeter	3138140063	Jabayona@findeter.gov.co	
Hernan Pardo B.	79'569.394	Gr. Compra	Findeter	3009212935	hpardo@findeter.gov.co	
Jesús Cañas Páez	1140823769	Gestor	Findeter	3015421323	Jacanas@findeter.gov.co	
Luisa María Carabalí	1136911630	Gestora Social	Findeter	3104708912	lmcarabi@findeter.gov.co	
Ethel Castro Mancal	40468929	Gestora Social	Findeter	3172552765	ECASTRO@findeter.gov.co	
Patricia Cifuentes	1033679420	G. General	Findeter	3107636981	dpcifuen@finder.gov.co	
Norma C Trujillo C	40.775049	G. social	Findeter	3185707497	Nctrujillo@findeter.gov.co	
Emilce Cotes V.	1070592651	Prof. Apoyo	Findeter	3104761437	ecotes@findeter	
CRISTIAN SUA	80230313	Apoyo Super	M.E.N	3106686243	csua@mineducacion.gov.co	
Diana Maldonado	1018479980	Profesional ESP	MEN	3057683831	dmaldonado@mineducacion.gov.co	
Julián Jimenez	1.110.473694	G. Social	findeter	3232405159	julianjmag-10@hotmail.com	
Lorena Prada	1023976019	Prof. Apoyo Adm.	Findeter.	3103419500	lprada@findeter.gov.co	

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

OTROSI No. 01 CONTRATO No. 5090635 DE 2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

10 de septiembre de 2025

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada


Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

ESADO GENERAL -CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

550
SEDES

$ 394,075
Millones de pesos

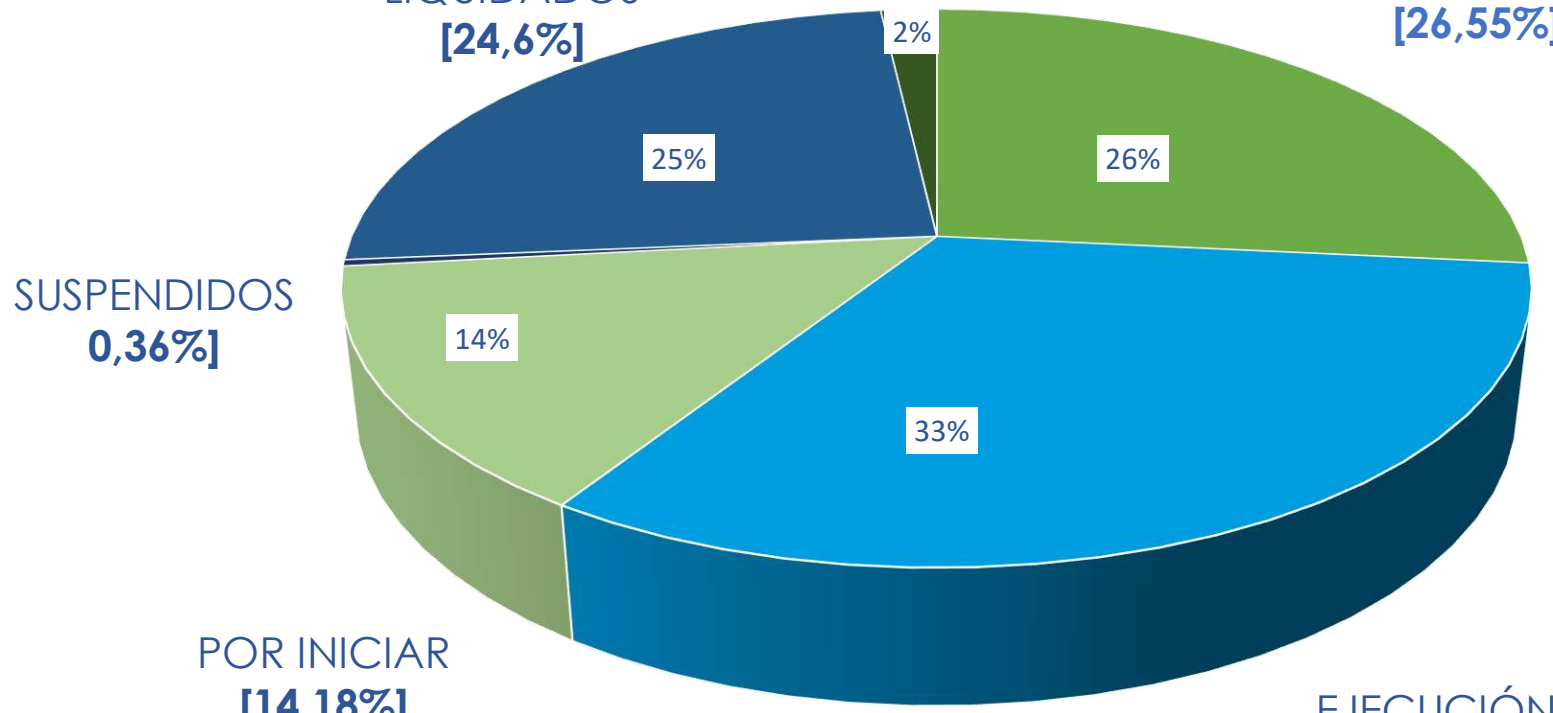

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

LINEA CONSULTORIA [9] **LINEA ESTRATEGICOS [31]** **LINEA MEJORAMIENTOS [433]** **LINEA EMERGENCIAS [77]**

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

INFORMACIÓN GENERAL – Contrato Inicial

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

490
SEDES

$294.145
Millones de pesos


TERMINADOS
[2,06%]

ENTREGADOS
[28,8%]

LIQUIDADOS
[27,84%]

SUSPENDIDOS
[0,41%]

POR INICIAR
[3,71%]

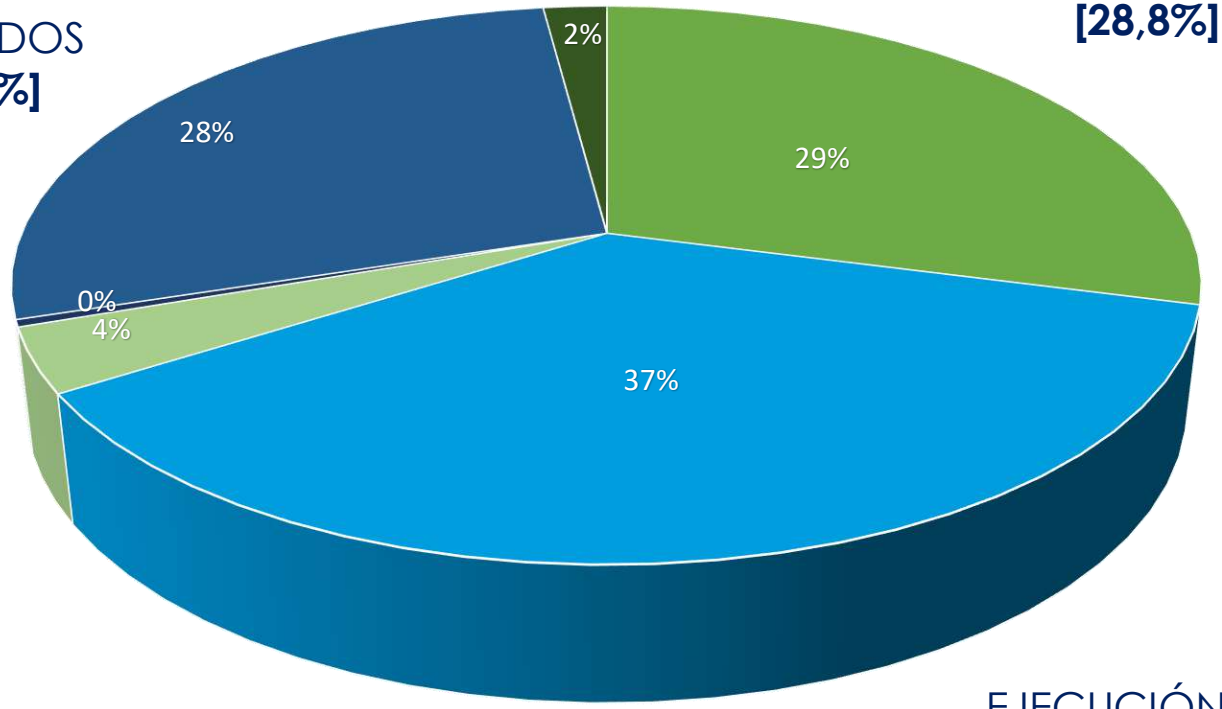

EJECUCIÓN
[36.91%]

LINEA CONSULTORIA [6]

LINEA ESTRATEGICOS [28]

LINEA MEJORAMIENTOS [396]

LINEA EMERGENCIAS [60]

COM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada


Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

INFORMACIÓN GENERAL – Otro Sí

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

60
SEDES

EJECUCIÓN
[3%]

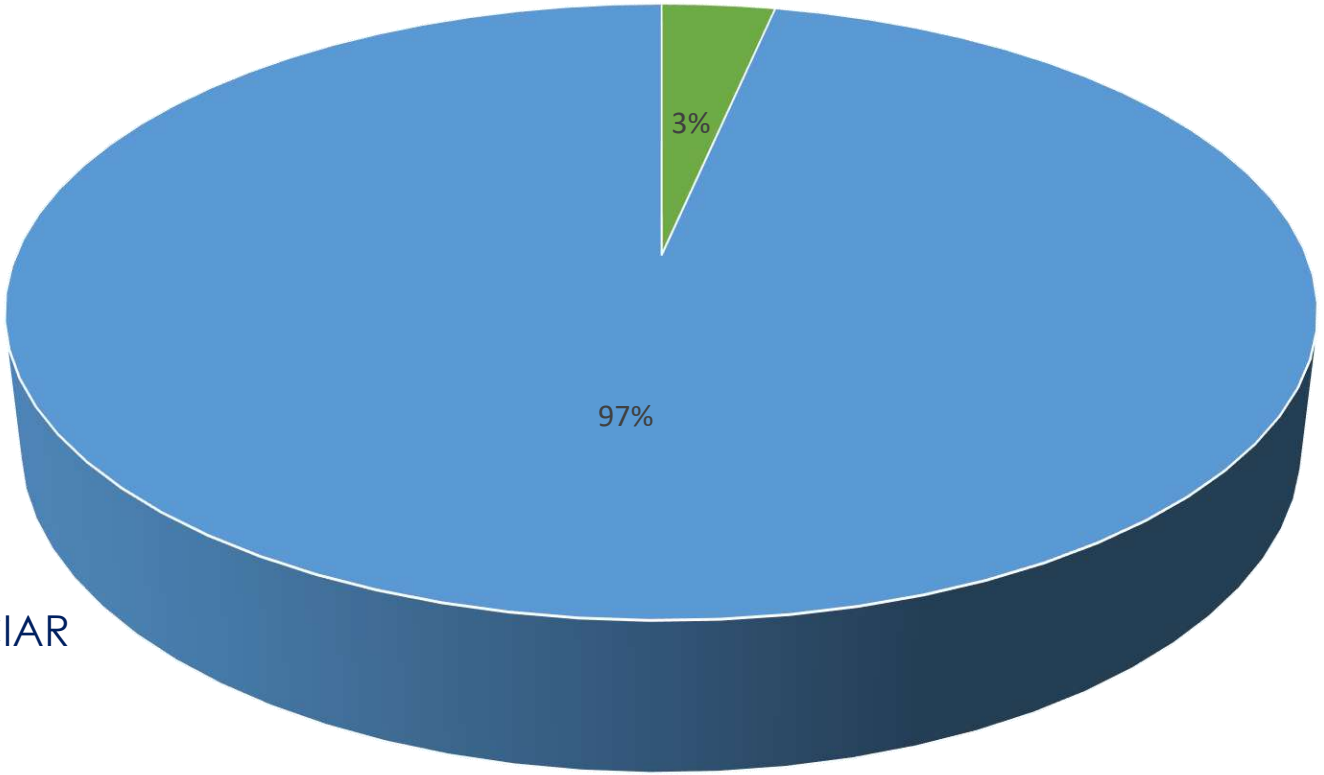

POR INICIAR
[97%]

$ 99.930
Millones de pesos

MEJORAMIENTOS [37]
Abades (27)
CRIHU (10)

EMERGENCIAS [17]
Guajira (6)
Caquetá (4)
Chocó (1)
Córdoba (1)
Meta (3)
Valle del Cauca (2)

CONSULTORIA PIE [3]
CONTCEPI (1)
OPIAC (1)
ENCP (1)

ESTRATEGICOS [3]
Valle del Cauca (1)
Chocó (1)
Nariño (1)

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

Gestión Findeter | Información General |

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial





550* Proyectos

$ 394.076
Millones de pesos

GENERAL CORTE 27-AGOST-25

LINEA	ENTREGADOS	EJECUCIÓN	SUSPENDIDOS	POR INICIAR	TERMINADOS	LIQUIDADOS	TOTAL
Contrato Inicial							
Mejoramientos	98	135	24	0	4	135	396
Emergencias	39	12	0		9		60
Estratégicos	4	8	2	14	0	0	28
Diseño	0	2	0	4	0	0	6
Subtotal	**141**	**157**	**26**	**18**	**13**	**135**	**490**
Otro Sí							
LINEA	**ENTREGADOS**	**EJECUCIÓN**	**SUSPENDIDOS**	**POR INICIAR**	**TERMINADOS**	**LIQUIDADOS**	**TOTAL**
Mejoramientos	0	0	0	37	0	0	37
Emergencias				17			17
Diseños	0	0	0	3	0	0	3
Estratégicos	0	0	0	3	0	0	3
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**60**
TOTAL	**141**	**157**	**26**	**78**	**13**	**135**	**550**

GENERAL CORTE 10 DE SEPTIMEBRE DE 2025

LINEA	ENTREGADOS	EJECUCIÓN	SUSPENDIDOS	POR INICIAR	TERMINADOS	LIQUIDADOS	TOTAL
Contrato Inicial							
Mejoramientos	101	158	0	0	2	135	396
Emergencias	41	11	0	0	8	0	60
Estratégicos	4	8	2	14	0	0	28
Diseño	0	2	0	4	0	0	6
Subtotal	**146**	**179**	**2**	**18**	**10**	**135**	**490**
Otro Sí							
LINEA	**ENTREGADOS**	**EJECUCIÓN**	**SUSPENDIDOS**	**POR INICIAR**	**TERMINADOS**	**LIQUIDADOS**	**TOTAL**
Mejoramientos	0	0	0	37	0	0	37
Emergencias	0	0	0	17	0	0	17
Diseños	0	0	0	3	0	0	3
Estratégicos	0	0	0	3	0	0	3
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**60**
TOTAL	**146**	**179**	**2**	**78**	**10**	**135**	**550**



Findeter
Financiera del Desarrollo

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

INFORMACION FINANCIERA- CONTRATO INTERADMINSITRATIVO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

PRESUPUESTO INICIAL	
Descripción	**Valor**
1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN	$ 121.110.000.000,00
2)Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia	$ 29.800.132.757,00
$278.399.202.376 a) Viabilidades (asistencia técnica) $1.125.549.600 b) Asistencia Técnica y administración de recursos	$ 29.143.085.188,00
4)Proyectos estratégicos de infraestructura educativa	$ 98.345.984.431,00
Subtotal recursos para la ejecución de las obras	**$ 278.399.202.376,00**
a) Viabilidades (asistencia técnica)	$ 1.125.549.600
b) Asistencia Técnica y administración de recursos	$ 14.620.530.400
Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (5.66%)	**$ 15.746.080.000**
Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica	**$ 294.145.282.376,00**

PRESUPUESTO ADICION	
Descripción	**Valor Adición**
1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN	39.900.000.000,00
2) Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia	6.500.000.000,00
3) Diseños de proyectos de infraestructura educativa	13.000.000.000,00
4) Proyectos estratégicos de infraestructura educativa	33.222.860.638,00
Subtotal recursos para la ejecución de las obras	**92.622.860.638,00**
a) Viabilidades (asistencia técnica)	844.162.200,00
b) Asistencia Técnica y administración de recursos	6.463.781.505,00
Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (7.89%)	**7.307.943.705,00**
Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica	**99.930.804.343,00**

RESUMEN GENERAL RECURSOS	
Descripción	**Valor Adición**
TOTAL LINEA MEJORAMIENTO	161.010.000.000,00
TOTAL LINEA EMERGENCIA	36.300.132.757,00
TOTAL LINEA DISEÑOS	42.143.085.188,00
TOTAL LINEA ESTRATEGICOS	131.568.845.069,00
Subtotales	**371.022.063.014,00**
Total Vaibilidades	1.969.711.800,00
Total AT	21.084.311.905,00
Subtotal AT y administración de recursos	**$ 23.054.023.705**
Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica	**$ 394.076.086.719,00**

CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO:

Nota 1 *En el evento en que se presenten saldos una vez atendidos los proyectos priorizados, los recursos disponibles podrán ser invertidos en alguna de las líneas detalladas en el presupuesto, previa autorización del Ministerio de Educación Nacional y aprobación del Comité Fiduciario. Si una vez atendidos los proyectos priorizados en todas las líneas quedan saldo de recursos, estos deben ser reintegrados al Tesoro Nacional.*

Nota 2 *En el evento en que alguna de las sedes focalizadas en alguna de las líneas no sea viable de atender por alguna circunstancia, está pueden ser reemplazada de acuerdo con el orden de elegibilidad (cuando esto aplique) o por otra sede que sea focalizada por el MEN siempre y cuando cuente con la debida justificación la cual será presentada a consideración y aprobación de los comités técnicos y fiduciarios. Así mismo en el caso de que resulten saldos en cualquiera de las líneas podrán ser incluidas nuevas sedes educativas para lo cual se llevará también a aprobación de los comités técnico y Fiduciario.*

CCOM-FO-001 / 20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

INFORMACION FINANCIERA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR INICIAL CONTRATO MARCO: $ 294.145.282.376

VALOR COMPROMETIDO JULIO 2025:

A. CDR CONTRATACION Y ADICIONES: $ 247.705.516.930
B. ASISTENCIA TECNICA: $ 15.746.080.000

SALDO AGOSTO DE 2025: $ 32.296.691.547

NOTA: Sr liberaron $ 1.190.965.331 de liquidaciones

VALOR OTROSI: $ 99.930.804.343

VALOR COMPROMETIDO JULIO 2025:

A. CDR CONTRATACION Y ADICIONES: $ 3.302.124.806
B. ASISTENCIA TECNICA: $ 7.307.943.705

SALDO A JULIO DE 2025: $ 89.320.735.832

NOTA: Adicionalmente se cuenta con aproximadamente $ 11.000 millones para liberar como resultado del saldo de las contrataciones

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

INFORMACION FINANCIERA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

EJECUCION PRESUPUESTAL

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS (B)	COMPROMISOS - CDR (C)	CONTRATOS FIRMADOS Y ADICIONES (D)	LIBERACIONES ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS (F)	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER (G) = (A)-(B)-(C)-(E)+(F)
87123	2023	294.145.282.376	-	15.746.080.000	247.705.516.930	238.843.359.190	1.190.965.331	**32.296.691.547**
11424	2024	41.100.000.000	41.100.000.000	7.307.943.705	3.302.124.806			**30.489.931.489**
11524	2024	33.010.746.802	33.010.746.802		-			**33.010.746.802**
11624	2024	25.820.057.541	25.820.057.541		-			**25.820.057.541**
TOTAL		**394.076.086.719**	**99.930.804.343**	**23.054.023.705**	**251.007.641.736**	**238.843.359.190**	**1.190.965.331**	**121.617.427.379**

RECURSOS LÍQUIDOS

VALOR	DESCRIPCION	
284.983.683.184,96	**SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)**	**SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO**
57.588,73	**(*)CUENTAS X COBRAR**	
1.087.200,92	**(*)CUENTAS X COBRAR- DETERIORO**	
1.837.641.925,04	**TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR**	
904.691.447,10	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (DESCUENTOS MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORIA Y APREMIOS)**	
113.159.752,70	**CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES**	
452.592.872,91	**IMPUESTOS POR PAGAR**	
7.999.843.841,55	**RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO**	
273.674.723.733,47		**273.674.723.733,47**

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

COMPROMISOS REUNION 27 DE AGOSTO DE 2025

LÍNEA	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
SOACHA	FINDETER gestionará ante la Alcaldía de Soacha la respuesta formal sobre el aporte financiero del municipio. Seguimiento en el próximo comité.	FINDETER	CUMPLIDO [OK] ✓ El municipio remite documento el 8 de septiembre donde solicita modificar el contrato para el pago de recursos en 2 partes, sin embargo, no se pronuncian sobre la adición por intervención de la canal. Findeter reiterará esta solicitud.
PUTUMAYO	Realizar mesa de trabajo proyectos Putumayo el 03 de septiembre de 2025	FINDETER MEN	CUMPLIDO [OK] ✓ Se llevo a cabo la sesión de trabajo con la ETC, en la semana del 9 al 13 de agosto se están realizando visitas acompañados de la ETC.
NORTE DE SANTANDER – MEJORAMIENTOS (G15, G16, G17)	FINDETER deberá entregar en el próximo comité un reporte con el diagnóstico, las viabilidades y los conceptos técnicos sobre estos grupos.	FINDETER	CUMPLIDO [OK] ✓ El reporte fue enviado con las novedades o dificultades en territorio para avanzar ejecución.
	El informe oficial con los avances deberá entregarse al MEN a más tardar el 10 de septiembre de 2025.	FINDETER	CUMPLIDO [OK] ✓ Enviado el 29 de agosto de 2025.
BUENAVENTURA	El MEN deberá informar si las sedes requeridas por la Procuraduría hacen parte del acuerdo del PARO	MEN	PENDIENTE

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

COMPROMISOS REUNION 27 DE AGOSTO DE 2025

LÍNEA	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
TOTORÓ Y MERCADERES	Reunión FINDETER, Gobernación, MEN y ETC el 28 de agosto d de 2025 para definir alcances y procedimientos que permitan continuar con la firma de convenios.	FINDETER	CUMPLIDO [OK] ✓ El 29 de agosto de 2025 se realizó la socialización jurídica de los convenios con la ETC del Cauca y su equipo jurídico, en compañía del MEN y el equipo técnico y jurídico de Findeter. Se coordinó ajustar el convenio con base en las recomendaciones entregadas, lo cuál fue remitido el miércoles 3 de septiembre de 2025 para la revisión y validación por parte de la ETC. Estamos a la espera de la respuesta por parte de la ETC para continuar con el proceso de firma de las respectivas entidades.
PLAYÓN SANTANDER	MEN enviará el 29 de agosto de 2025 un documento formal que respalde la priorización del proyecto y su paso a etapa de convocatoria.	MEN	PENDIENTE
MOMPOX – PINILLOS	Se coordinará reunión con el profesional de presupuestos del MEN (Daniel Triviño) para definir los lineamientos presupuestales de la etapa de diagnóstico, así como revisar el estado general del proyecto. Se hará seguimiento en el próximo comité	MEN-FINDETER	CUMPLIDO [OK] ✓ Se llevó a cabo la reunión el 1ero de septiembre de 2025.

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

COMPROMISOS REUNION 13 DE AGOSTO DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
ABADES	MEN desarrollará mesa de trabajo con el VPBM para la socialización de los requerimientos enviados por FINDETER, con el fin de que las organizaciones puedan participar en convocatorias o definir si la contratación será directa, específicamente para el caso ABADES	MEN	**CUMPLIDO [OK] ✓** Se llevo a cabo mesa en territorio con comunidades, actualmente se evalúa la posibilidad de contratación directa para grupo 28, se prevé publicar convocatorias para la ultima semana de septiembre.
ORNATO	FINDETER enviará al MEN el informe de gestiones realizadas con las ETC y con las sedes de Ornato. La fecha límite para la mesa de trabajo de revisión de avances es el 27/08/2025	FINDETER	**CUMPLIDO [OK] ✓** Enviado el 27 de agosto de 2025.
PIE OPIAC-AICO-CRIC	La Subdirección de Acceso presentará en el próximo comité el estado de avance y las necesidades para continuar la gestión con la comunidad AICO	MEN	**EN CUMPLIMIENTO**
	FINDETER elaborará un plan de trabajo para los planes de infraestructura educativa y para los proyectos estratégicos. Se programó mesa de trabajo para el 03 de septiembre de 2025.	FINDETER	**CUMPLIDO [OK] ✓** Se realizó la reunión el 3 de septiembre donde con el acompañamiento de la parte social se expuso el Plan de Trabajo
CONVENIOS	Se hará seguimiento a la firma de convenios pendientes, entre ellos Mercaderes, Totoró, Caimito (Sucre), Chocó–Santo Domingo y El Playón. Aunque se han adelantado gestiones, algunos convenios siguen sin formalizarse. FINDETER enviará un listado actualizado al MEN el 09 de septiembre de 2025	FINDETER	**EN CUMPLIMIENTO** En seguimiento los convenios de Totoró y Mercaderes con la ETC de Cauca ante las reuniones y compromisos pactados y cumplidos por FINDETER el 03 de septiembre de 2025. Se requiere apoyo para El Playón y en estructuración los convenios para los proyectos del Otro Sí (Nariño, Valle del Cauca y Chocó)

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

COMPROMISOS REUNION 13 DE AGOSTO DE 2025

LÍNEA	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	METODOLODIA PRODUCTOS ETAPA 1 Se programará una mesa de trabajo (fecha por definir) para definir la metodología de seguimiento y la entrega de los productos de la Etapa 1	FINDETER-MEN	CUMPLIDO [OK] ✓
	PLAN GESTION SOCIAL Entrega del Plan de Gestión social	FINDETER	EN TRAMITE
	ASISTENCIA TECNICA MEN dará respuesta a FINDETER sobre la propuesta de modificatorio al cobro por asistencia técnica en el próximo comité, programado para el 10 de septiembre de 2025.	MEN	PENDIENTE
	PRIORIZACION PROYECTOS FINDETER solicita al MEN formalizar la priorización y despriorización de los proyectos del plan de infraestructura educativa, a más tardar el 29/08/2025.	MEN	PENDIENTE
	ALERTAS PLAZOS DE EJECUCIÓN FINDETER deberá presentar a MEN, con corte al 30/06/2025, un oficio (fecha límite de entrega 20/08/2025) que detalle las acciones adoptadas para mitigar las alertas asociadas al cumplimiento de los plazos de ejecución e incluya el alcance de la adición contractual.	FINDETER	PENDIENTE

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



COMPROMISOS REUNION 13 DE AGOSTO DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	MEN solicita a FINDETER que la profesional social del contrato interadministrativo participe activamente en la gestión con las comunidades y las ETC.	FINDETER	EN CUMPLIMIENTO
	MEN solicita a FINDETER la depuración de la información contenida en la master de inversión, ante las incongruencias detectadas.	FINDETER	PENDIENTE
	MEN solicita a FINDETER que las áreas de comunicaciones se coordinen para la instalación y contenido de las vallas institucionales, garantizando visibilidad del Gobierno Nacional, FINDETER y MEN. FINDETER enviará las propuestas de tipo de vallas para revisión del MEN el 01 de septiembre de 2025, considerando particularidades de los territorios.	FINDETER	EN CUMPLIMIENTO
	El MEN solicita la asistencia del Dr. Hernán Pardo a todos los comités de seguimiento, dado su rol como supervisor del contrato.	FINDETER	EN CUMPLIMIENTO
	MEN solicita que los especialistas en ingeniería civil (estructural, hidráulico y geotécnico) participen en los espacios de socialización para aportar desde su especialidad.	FINDETER	EN CUMPLIMIENTO

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

LINEA MEJORAMIENTO (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

PRESUPUESTO ADICION				
DESCRIPCION	**VALOR ADICION**	**DESCRIPCION**	**No. SEDES**	**VALOR RELACIONADO ARCHIVO Anexo 07 Sedes Focalizadas**
1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN	$ 39.900.000.000	Programa “Construcción de la Maqueta de Paz”, región de Abades, Nariño	27	$ 10.294.117.646
		Compromiso de Presidencia de la República en el departamento de La Guajira	2	$ 3.320.057.541 (incluido en el inicial)
		Mesa Regional Indígena del Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU. Mejoramiento de sedes educativas	10	$ 6.579.942.459
		Acciones de mejoramiento en sedes - ORNATO (100 sedes)	100	$ 20.000.000.000
			TOTAL	**$ 40.194.117.647**

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCIONC	VALOR ADICION	No. SEDES	OBSERVACION
1Programa “Construcción de la Maqueta de Paz”, región de Abades, Nariño	$ 10.294.117.646	27	El 25 de febrero de 2024, el MEN remitió comunicado No. No. 2025-EE-048032 de fecha 24 de febrero de 2025, mediante el cual priorizó 27 Sedes. Findeter revisó la información encontrando lo siguiente: En el otrosí se establecieron 36 sedes, sin embargo, en comunicado refieren 35. En el anexo “Anexo 07 Focalizacion” relacionan 36 sedes, pero dentro de la priorización hay 27, de las cuales 5, no se encuentran en la línea base, por lo cual, se debe definir si estas 5 sedes son adicionales, o serán reemplazadas, por alguna de las 36 iniciales, a fin de verificar so cuentan con viabilidad técnica y jurídica. Existen dos sedes de la 27 priorizadas que presentan una observación relacionada con “Fondopaz definir su ejecución. El MEN en reunión del 8 de abril de 2025 confirmo que eran 22 sedes, Por lo que FINDETER continua con Estudios previos. Se deben definir el alcance con Fondo PAZ. El ministerio definió finamente que el alcance es de 27 sedes, en oficio enviado por Cristian Sua el 21 de mayo de 2025. Findeter envía al ministerio en junio de 2025 los EP para que sean analizados por el ministerio, se reciben observaciones que son subsanadas, sin embargo, el valor sugerido por Findeter para las intervenciones de Abades supera el presupuesto disponible por el ministerio, quien a su vez propone en mesa de trabajo llevada a cabo en la primera semana de agosto de 2025, que se realice contratación directa con comunidades para disminuir los costos de obra. Findeter envía al Ministerio los requisitos mínimos para este tipo de contratación en la segunda semana de agosto, el ministerio de compromete a socializar estos requisitos técnicos y jurídicos con las comunidades, Findeter a su vez avanza con el análisis del equipo de contratación de los EP para la posible publicación de convocatoria publica, a la fecha 26-08-2025, Findeter espera definición del Mininsterio sobre como avanzar con esta contratación.

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas			ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25		
No. SEDE	SEDE	MUNICIPIO	No. SEDE	SEDE	MUNICIPIO
---0---	-------0-------	-------0--------	1	Sede 4 Brisas del Telembi	La Llanada Nariño
---0---	-------0-------	-------0--------	2	Sede 3 Sumbiambi	La Llanada Nariño
---0---	-------0-------	-------0--------	3	Sede 7 María Auxiliadora	La Llanada Nariño
1	Sede 04 El Maco	La Llanada Nariño	4	Sede 04 El Maco	La Llanada Nariño
2	Sede 3 La Palma	La Llanada Nariño	5	Sede 3 La Palma	La Llanada Nariño
3	Sede 16 Andalucia	Samaniego-Nariño	6	Sede 16 Andalucia	Samaniego-Nariño
4	Sede 17 Cedral	Samaniego-Nariño	7	Sede 17 Cedral	Samaniego-Nariño
5	Sede 18 San Diego	Samaniego-Nariño	8	Sede 18 San Diego	Samaniego-Nariño
6	Sede 19 El Salto	Samaniego-Nariño	9	Sede 19 El Salto	Samaniego-Nariño
7	Sede 20 La Verde	Samaniego-Nariño	10	Sede 20 La Verde	Samaniego-Nariño
8	Sede 7 El Palacio	Samaniego-Nariño	11	Sede 7 El Palacio	Samaniego-Nariño
9	Sede 16 Buenavista	Samaniego-Nariño	12	Sede 16 Buenavista	Samaniego-Nariño
10	Sede 10 Decio	Samaniego-Nariño	13	Sede 10 Decio	Samaniego-Nariño

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas			ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25		
No. SEDE	SEDE	MUNICIPIO	No. SEDE	SEDE	MUNICIPIO
---o---	-------o-------	-------o--------	14	Sede 19 El Copal	Samaniego-Nariño
---o---	-------o-------	-------o--------	15	Sede 8 El Limo	Samaniego-Nariño
11	Centro Educativo El Claraval	Santacruz-Nariño	16	Centro Educativo El Claraval	Santacruz-Nariño
12	Centro Educativo La Ceiba	Santacruz-Nariño	17	Centro Educativo La Ceiba	Santacruz-Nariño
13	Centro Educativo Chagui	Santacruz-Nariño	18	Centro Educativo Chagui	Santacruz-Nariño
14	Centro Educativo El Madroño	Santacruz-Nariño	19	Centro Educativo El Madroño	Santacruz-Nariño
15	Centro Educativo La Zabaleta	Santacruz-Nariño	20	Centro Educativo La Zabaleta	Santacruz-Nariño
16	Centro Educativo Chapilal	Santacruz-Nariño	21	Centro Educativo Chapilal	Santacruz-Nariño
17	Centro Educativo Guadualito	Santacruz-Nariño	22	Centro Educativo Guadualito	Santacruz-Nariño
18	Centro Educativo El Carmen Vargas Dos	Santacruz-Nariño	23	Centro Educativo El Carmen Vargas Dos	Santacruz-Nariño
19	Centro Educativo San Jose Vargas Uno	Santacruz-Nariño	24	Centro Educativo San Jose Vargas Uno	Santacruz-Nariño
20	Centro Educativo Campoalegre	Santacruz-Nariño	25	Centro Educativo Campoalegre	Santacruz-Nariño
21	Centro Educativo La Tola - Sede Principal	Santacruz-Nariño	26	Centro Educativo La Tola - Sede Principal	Santacruz-Nariño
22	Sede 10 Betania	Samaniego-Nariño	27	Sede 10 Betania	Samaniego-Nariño

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

MEJORAMIENTO-MAQUETA DE PAZ (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ARCHIVO BASE Anexo 07 Sedes Focalizadas			ARCHIVO MAQUETA DE PAZ Priorización Abades Feb 25		
No. SEDE	SEDE	MUNICIPIO	No. SEDE	SEDE	MUNICIPIO
23	Sede 1 Institución Educativa Juan Pablo I	La Llanada Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
24	Sede 2 Divino Niño Jesús	La Llanada Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
25	Sede 8 El Trasval	Samaniego-Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
26	Sede 7 La Planada	Samaniego-Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
27	Sede 17 La Paloma.	Samaniego-Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
28	Ce Campoalegre	Sin Informacion	---0---	-------0-------	-------0--------
29	Centro Educativo Taquelan	Santacruz Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
30	Centro Educativo San Martin	Santacruz Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
31	Centro Educativo Manchag	Santacruz Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
32	Centro Educativo La Florida	Santacruz Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
33	Centro Educativo La Esperanza	Santacruz Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
34	Centro Educativo Guamanchag	Santacruz Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
35	Centro Educativo Chapuesquer	Santacruz Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------
36	Centro Educativo Arrayan	Santacruz Nariño	---0---	-------0-------	-------0--------

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

COMPROMISOS PRESIDENCIA GUAJIRA (OTROSI No. 01)

DESCRIPCION	VALOR ADICION	No. SEDES	OBSERVACION
Compromiso de Presidencia de la República en el departamento de La Guajira	$ 2.000.000.000	1	**Institución Etnoeducativa Internado Rural Dumingueka - Sede Principal-Dibulla Guajira:** Actualmente se ejecuta en el contrato de Grupo 7 de la línea de Emergencia Socializacion realizada en la semana del 15 de agosto de 2025, inicio de obras en la tercera semana de agosto de 2025.
	$ 1.320.057.541	1	**SEDE PRINCIPAL MEDIA LUNA-URIBIA GUAJIRA:** Actualmente se ejecuta en el contrato de Grupo 7 de la línea de Emergencia. Socializacion realizada en la semana del 15 de agosto de 2025, inicio de obras en la tercera semana de agosto de 2025.

Nota: *Adicionado a la línea de Emergencias*

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

MEJORAMIENTO-CRIHU Y ORNATO(OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DESCRIPCION	VALOR ADICION	No. SEDES	OBSERVACION
Mesa Regional Indígena del Consejo Regional Indígena del Huila - CRIHU. Mejoramiento de sedes educativas	$ 6.579.942.459,00	10	El 25 de febrero de 2024, el MEN remitió comunicado No. No. 2025-EE-048032 de fecha 24 de febrero de 2025, mediante el cual priorizó 27 Sedes. Findeter una vez coordinó las las visitas a los predios durante el mes de marzo de 2025, el Consejo Regional Informó que las sedes no eran esas, por lo cual, el 17 de marzo de 2025,Findeter solicito al MEN aclarar. El 8 de abril del 2025 el MEN en comité de seguimiento indicó que eran las definidas en el comunicado del CRIHU. En mesa de concertación del 20 de abril de 2025, se acuerda las fechas de las visitas las cuales se desarrollaron durante el mes de mayo de 2025. EL CRIHU solicitud el cambio de la sede, se espera confirmación del MEN para hacer dicho cambio.. Se debe aclarar el alcance de la intervención, porque si bien se encuentra dentro de la línea de mejoramiento, se define como intervención Construcción. Se realizó reunión con los líderes del CRIHU el 28 de mayo de 2025 donde se les explicó y solicitó 6 sedes por viabilidad jurídica. En Julio de 2025 se completaron las viabilidades juridicas gracias a que las comunidades aportaron la documentacion faltante, en agosto se radican los EP al equipo de contratación de Findeter, se estima publicar la convocatoria en la segunda semana de Septiembre de 2025.

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

MEJORAMIENTO-CRIHU Y ORNATO(OTROSI No. 01)

DESCRIPCION	VALOR ADICION	No. SEDES	OBSERVACION
Acciones de mejoramiento en sedes - ORNATO (100 sedes)	$ 20.000.000.000	100	Se informó por parte del Ministerio en reunión del 23 de diciembre de 2024, que adelantó una convocatoria en el marco del programa “Píntalo que yo coloreo”, con el fin de que se postularan las sedes, sin embargo, se debe definir las sedes y el alcance de la intervención, el cual, inicialmente se contemplo embellecer las sedes, accesibilidad y seguridad El MEN remitió información el 19 de mayo de 2025, la cual esta en revisión de FINDETER. 5 sedes referenciadas a continuación fueron excluidas considerando que son atendidas en el grupo de mejoramiento del contrato inicial 5090635 de 2023, asi: I. Etnoeducativa rural Presariu DANE: 244560000240, Contemplada en el contrato 635-G10_Emergencias. I.E. Nueva Unión- Código DANE: 223807004092, contemplada en el contrato 635-G11-Mejoramientos I.E. Primero de Mayo- Código DANE: 223807000895, contemplada en el contrato 635-G11-Mejoramientos I.E. Agustín Nieto Caballero Código DANE: 281794000564 contemplada en el contrato 635-G02 Mejoramientos I.E. Antonio Ricaurte: Código DANE: 281794000602, contemplada 635-G02-Mejoramientos

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

MEJORAMIENTO-CRIHU Y ORNATO(OTROSI No. 01)

DESCRIPCION	VALOR ADICION	No. SEDES	OBSERVACION
Acciones de mejoramiento en sedes - ORNATO (100 sedes)	$ 20.000.000.000	100	Findeter ha adelantado las siguientes gestiones para recolectar información de cada institución, con el fin de verificar que sus necesidades se ajusten al alcance de la línea Ornato, orientada al embellecimiento y mejoramiento estético y funcional de la infraestructura escolar: Contacto inicial con las Entidades Territoriales Certificadas (ETC): Se remitieron comunicaciones oficiales vía correo electrónico, obteniendo respuestas limitadas y no oportunas. Escalamiento a secretarías de educación municipales y departamentales: Se logró consolidar información de varias sedes, aunque con dilaciones por remisiones a diferentes dependencias. Durante este proceso, se identificaron problemáticas recurrentes que inciden directamente en la necesidad de intervenciones, entre ellas: Deficiencias en cubiertas: goteras, filtraciones y deterioro estructural. Baterías sanitarias obsoletas o insuficientes. Ambientes pedagógicos en condiciones precarias o no normativos. Espacios complementarios ausentes o deteriorados: bibliotecas, comedores, laboratorios, aulas múltiples. Humedad y deterioro por falta de mantenimiento. Ausencia de rampas y accesibilidad para población con movilidad reducida. Redes eléctricas e hidráulicas desactualizadas. Déficit de mobiliario y recursos didácticos. Findeter solicita al ministerio definir si los alcances u objeto de estos contratos cambiaran acorde a estas necesidades identificadas.

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

LINEA CONSULTORÍA (OTROSI No. 01)

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ORGANIZACIÓN	PORCENTAJE	VALOR ASIGNADO	VR ASITENCIA TECNICA 7,89%	VR MAXIMO DE LA PROPUESTA	VR PROPUESTA	DIFERENCIA
MESA PERMANENTE DE CONCERTACIÓN (MPC) - CONTCEPI		**$ 8.000.000.000**	**$ 631.200.000**	**$ 7.368.800.000**	**$ 4.016.790.000**	**-$ 258.702.000**
Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC	30%	$ 2.400.000.000	$ 189.360.000	$ 2.210.640.000		
Organización de los Pueblos indígenas de la Amazonia Colombiana - OPIAC	22%	$ 1.760.000.000	$ 138.864.000	$ 1.621.136.000	$ 1.616.790.000	$ 4.346.000,00
Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama - AICO POR LA PACHA MAMA	22%	$ 1.760.000.000	$ 138.864.000	$ 1.621.136.000	$ 1.760.000.000	-$ 138.864.000,00
Autoridades Indígenas del Sur occidente Colombiano - AISO	5%	$ 400.000.000	$ 31.560.000	$ 368.440.000		
Confederación indígena Tayrona. - CIT	7%	$ 560.000.000	$ 44.184.000	$ 515.816.000		
Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor	7%	$ 560.000.000	$ 44.184.000	$ 515.816.000		
Consejo Regional Indígena de Colombia CRIC	7%	$ 560.000.000	$ 44.184.000	$ 515.816.000	$ 640.000.000	-$ 124.184.000,00
MESA REGIONAL AMAZÓNICA (MRA) - OPIAC		**$ 1.100.000.000**	**$ 86.790.000**	$ 1.013.210.000	$ 1.013.210.000	$ -
ENCUENTRO NACIONAL DE CONSULTA PREVIA (ENCP) - COMUNIDADES NARP		**$ 5.000.000.000**	**$ 394.500.000**	$ 4.605.500.000		
TOTAL PRESUPUESTO 2024 - PLANES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		**$ 14.100.000.000**	**$ 1.112.490.000**	**$ 12.987.510.000**	**$ 5.030.000.000**	

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

LINEA CONSULTORÍA (OTROSI No. 01)

DESCRIPCION	ACCIONES
OPIAC	Se llevó a cabo la reunión con la OPIAC el martes 5 de agosto de 2025 donde se pactaron compromisos. De parte de FINDETER se remitió el día 11 de agosto los requisitos mínimos a tener en cuenta para la entrega de las cotizaciones. Posterior se llevó a cabo una nueva reunión el 13 de agosto de 2025 donde se revisaron las observaciones y se estipularon compromisos a los que se dio respuesta por parte de FINDETER el día 21 de agosto de 2025.
CRIC - PIE	Se llevó a cabo reunión el 8 de agosto de 2025 donde se socializaron los temas de avance en el proceso de estructuración de los Planes de Infraestructura. Se encuentra en espera por parte de la organización de la entrega de su propuesta.
AICO	Se programó nueva reunión de seguimiento el 27 de agosto de 2025.

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

LINEA ESTRATÉGICOS (OTROSI No. 01)

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	I.E	SEDE	ESTADO
VALLE DEL CAUCA	VIJES	INSTITUCION EDUCATIVA DE LA NACIÓN EMBERA DEL VALLE DEL CAUCA IENEV.	XAI DE DRUA WADRA	De acuerdo con las observaciones remitidas por Findeter, solicitamos al municipio enviar el certificado de libertad y tradición del predio para continuar el proceso. A la fecha nos encontramos a la espera de este documento. El 29 agosto 2025 se realizó la visita técnica en compañía de la alcaldía, gobernación y rector de la institución.
CHOCO	RIOSUCIO	IE NUESTROS ESFUERZOS	IE NUESTROS ESFUERZOS - SEDE PRINCIPAL	Desde la parte jurídica de Findeter el predio es viable, sin embargo, nos encontramos a la espera de la ficha jurídica correspondiente. De manera paralela con la supervisión se está estructurando convenio Interadministrativo y nos encontramos a la espera de la información técnica por parte del Municipio para tramitar esta viabilidad. El 8 de septiembre se lleva a cabo visita técnica a la IE en compañía de la ETC y la alcaldía de Riosucio.
NARIÑO	SAMANIEGO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO AGROECOLOGICO EL MOTILON	SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROECOLÓGICO EL MOTILÓN	La información para la viabilidad jurídica está siendo revisada por el área encargada de Findeter. Nos encontramos a la espera de las consideraciones producto de la revisión para continuar con las acciones correspondientes. El 27 de agosto 2025 se realizó visita técnica por parte de Findeter, alcaldía, gobernación y rector de la IE, de la cual resulta la necesidad por parte de la comunidad para socializar los motivos por los cuales se reubicará la institución

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación | icontec | Cámara de Comercio de Bogotá

efr www.masfamilia.org

SGS CO18/8256 | SGS CO18/8257 | SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. 5090635 de 2023
LÍNEA MEJORAMIENTOS

10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

Con corte al 31 de agosto de 2025

Estado de entrega y ejecución de Sedes
Línea de Mejoramientos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

433* sedes

$ 136,265 Millones de pesos
* Valor comprometido

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026


LIQUIDADAS
135 SEDES – 31%

ENTREGADAS
101 SEDES – 23%

TERMINADAS
02 SEDES – 0,1%

EN EJECUCION
158 SEDES –37%

ESTRUCTURACION
37 SEDES – 9%

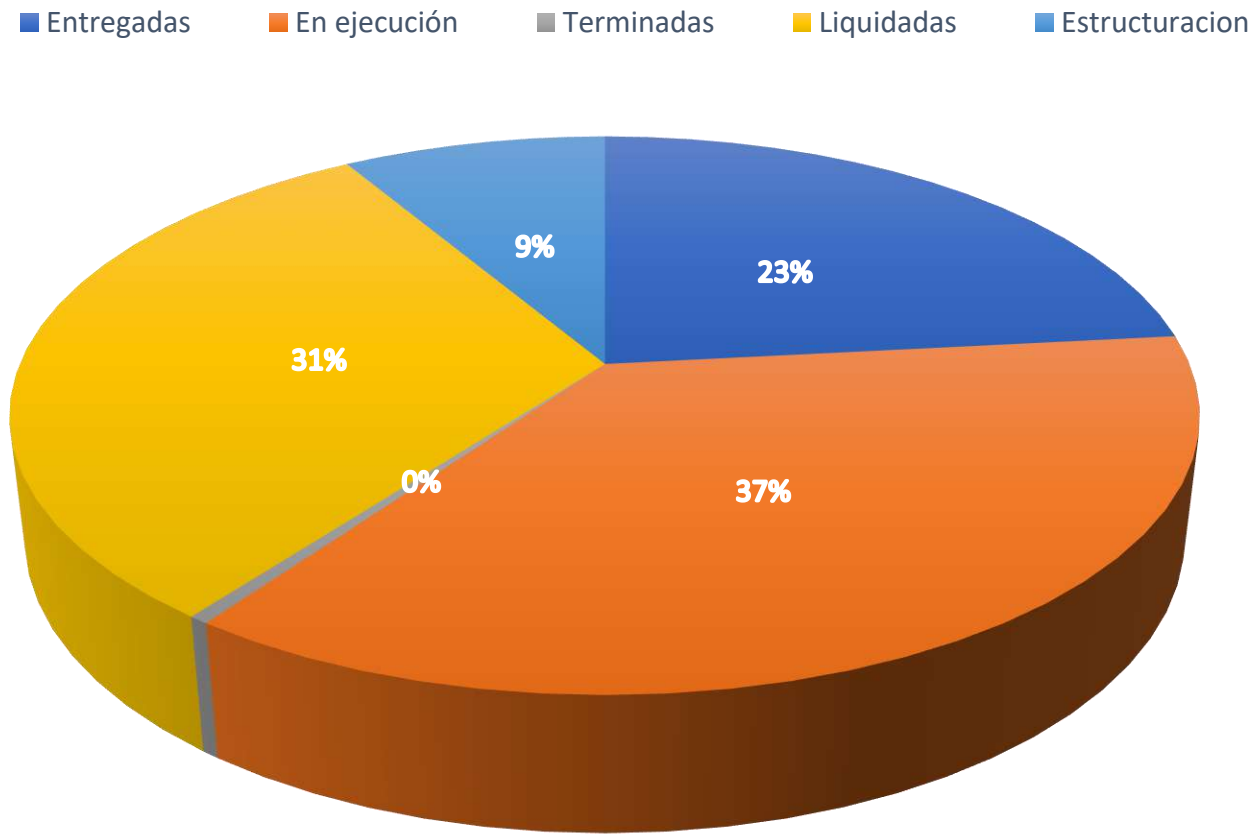

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

396 Mejoramientos

$ 136,265 Millones de pesos

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	Ent. 2024	2025											2026	Total
				FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENER	
Grupo 1	Tolima	LIQUIDADO	32													32
Grupo 2	Arauca	LIQUIDADO	20													20
Grupo 3	Arauca Casanare	LIQUIDACION	11													11
Grupo 4	Cauca	EN EJECUCION									5	5				10
Grupo 5	Cauca	LIQUIDADO	14													14
Grupo 6	Cauca	ENTREGADO		1			13									14
Grupo 7	Cauca	EJECUCION										14				14
Grupo 8	Chocó	EJECUCION										15				15
Grupo 9	Cesar	LIQUIDADO	15	8												23
Grupo 10	Córdoba Antioquia	LIQUIDADO	17													17
Grupo 11	Córdoba	LIQUIDADO	23													23
Grupo 12	Nariño	EJECUCION										11				11
Grupo 13	Nariño	EJECUCION									3				12	15
Grupo 14	Putumayo	EJECUCION										21				21
Grupo 15	Norte de Santander	ENTREGADO	7				8									15
Grupo 16	Norte de Santander	EJECUCION												14		14
Grupo 17	Norte de Santander	EJECUCION										14				14
Grupo 18	Norte de Santander	DESPRIORIZADO														
Grupo 19	Antioquia	ENTREGADO	3				1	3		4						11
Grupo 20	Risaralda	ENTREGADO			6	3	2			1						12
Grupo 21	La Guajira	EJECUCIÓN										21				21
Grupo 22	La Guajira	LIQUIDADO	6													6
Grupo 23	La Guajira	ENTREGADO			2	11	4	2								19
Grupo 24	Guaviare Caquetá Meta	EJECUCION									5	11				16
Grupo 25	Valle del Cauca	EJECUCION		1		3	3		1			8				16
Grupo 26	Risaralda	ENTREGADO			2	10										12
TOTALES			**148**	**10**	**10**	**27**	**31**	**5**	**1**	**5**	**13**	**120**		**14**	**12**	**396**

231 sedes terminadas
54%


370 sedes terminadas
85%

396 sedes terminadas
100%

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

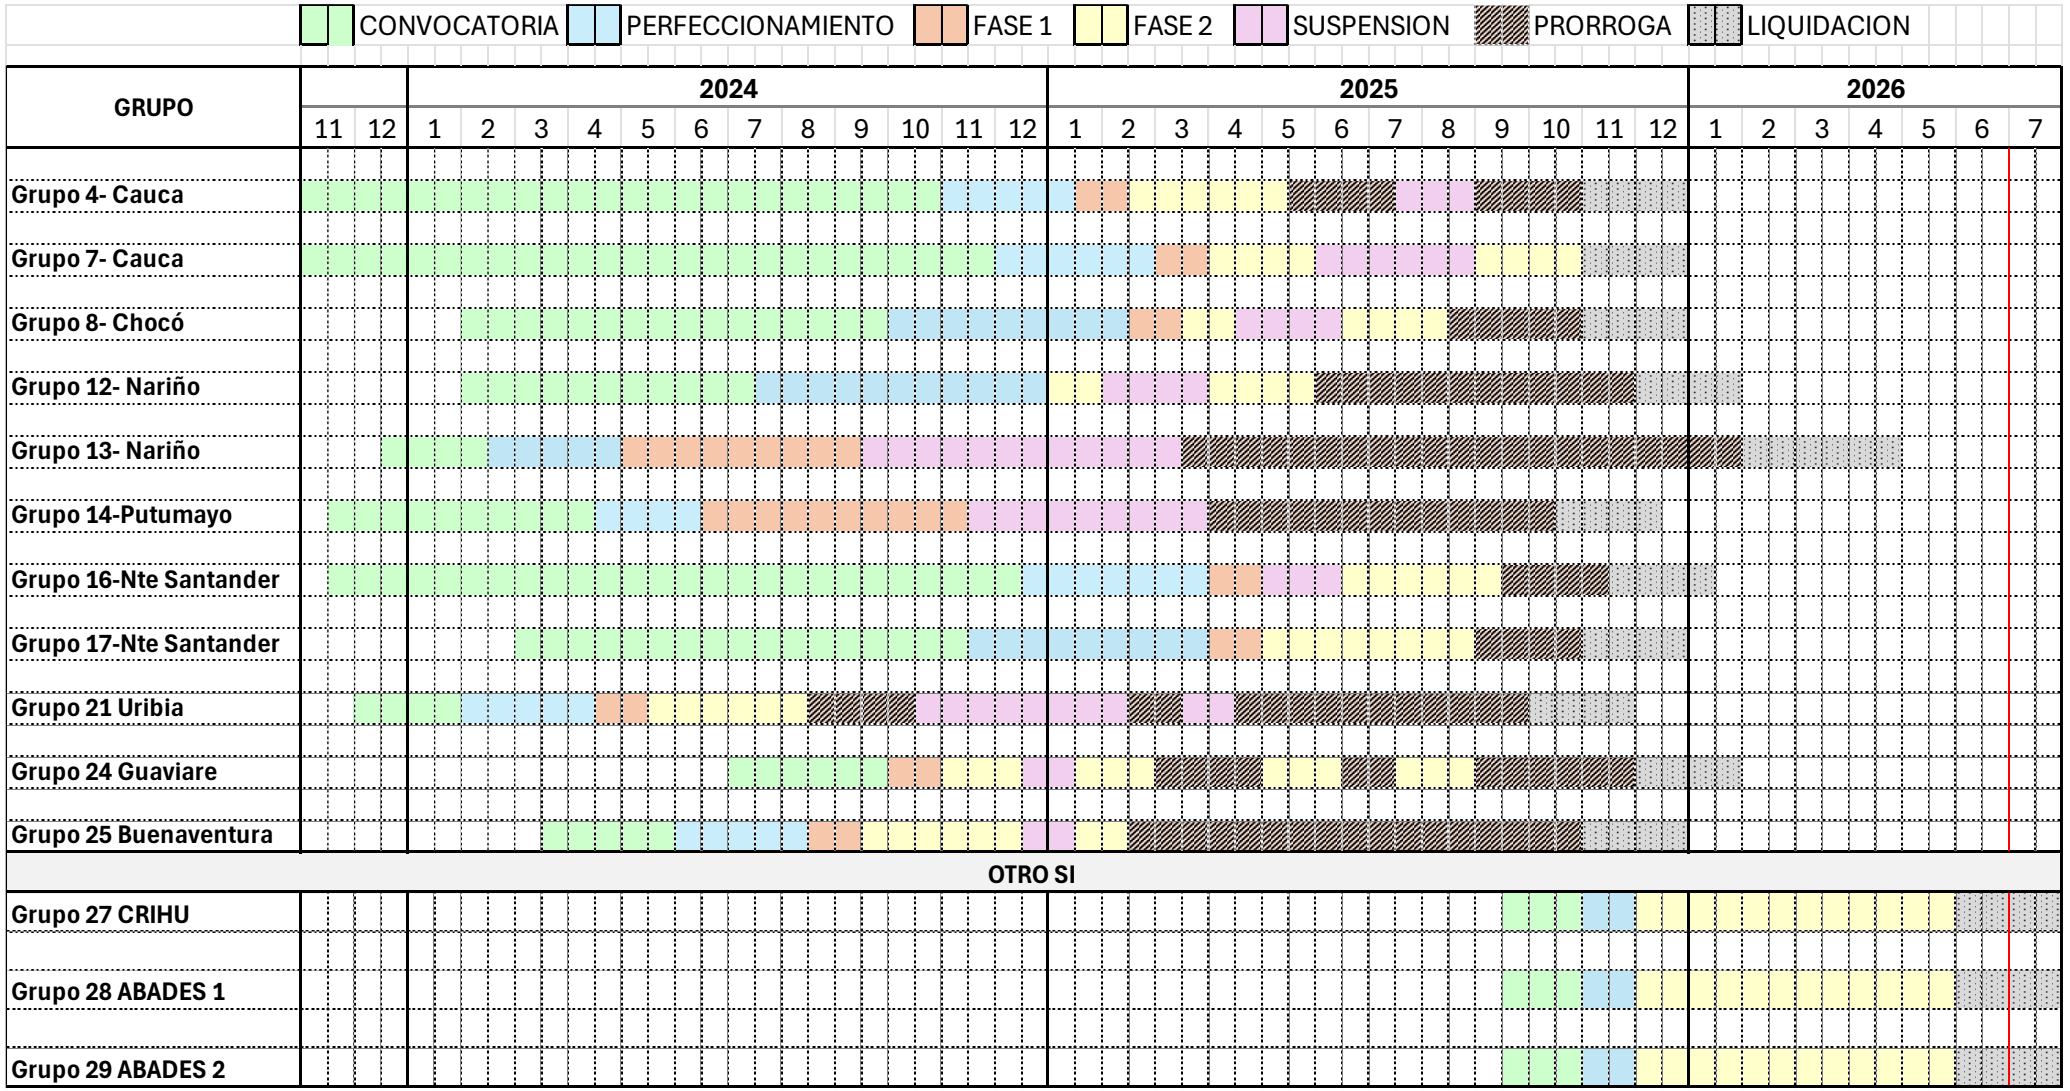

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

OTRO SI

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	2025					2026						Total
			Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	Entregas Mayo	Jun	Ago	
Grupo 27	Huila (CRIHU)	LIQUIDADO	Convocatoria		Legalización	Ejecución					10			10
Grupo 28	Nariño (Abades 1)	LIQUIDADO	Convocatoria***		Legalización	Ejecución					11			11
Grupo 29	Nariño (Abades 2)	LIQUIDACION	Convocatoria***		Legalización	Ejecución					16			16
														37

***** El inicio de la convocatoria depende de la definición del tipo de convocatoria, el ministerio enviara a Findeter los soportes del cumplimiento de requisitos de las comunidades para validar su aplicación a contratación directa con ellos.**

ORNATO:

- Sobre las 100 sedes iniciales remitidas por el MEN, 5 sedes fueron despriorizadas del listado debido a que ya estaban siendo atendidas por otras líneas de ejecución.
- Sobre las 95 sedes restantes se ha podido hacer contacto y validación con los rectores y entidades del 50% de las sedes.
- Del 50% de las sedes que se ha podido hacer contacto con la ETC, todas exceden el alcance de intervención del programa Ornato, aplican para línea de Mejoramientos o estratégicos.
- Sobre el restante de sedes educativas se sigue haciendo gestión para contactarlos y establecer las necesidades que tienen en sus sedes.
- Se consulta al Ministerio frente a los alcances distintos presentados por las sedes contactadas, se cambiaria el objeto del programa o se cambiarían las sedes que no aplican.

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CONTRATOS TERMINADOS Y ENTREGADOS

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	OBSERVACIONES
Grupo 01 Tolima	Rioblanco, Chaparral	**32**	01/02/2024	10/09/2024	Liquidado	Acta liquidación obra suscrita el 01/04/2025. Acta liquidación interventoría suscrita el 14/04/2025.
Grupo 02 Arauca	Tame	**20**	15/04/2024	25/09/2024	Liquidado	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Liquidación de interventoría suscrita el 20 de agosto de 2025
Grupo 05 Cauca	Piendamó, Villarica, Morales.	**14**	19/02/2024	04/01/2025	Liquidado	Acta liquidación obra suscrita el 27/05/2025. Acta liquidación interventoría suscrita el 08/07/2025.
Grupo 09 Cesar	Curumaní, La Jagua de Ibirico, Becerril.	**23**	26/02/2024	17/02/2025	Liquidado	Liquidación del contrato de obra se suscribió el 11 de junio de 2025. Acta liquidación interventoría suscrita el 31/07/2025
Grupo 10 Córdoba/ Antioquia	Valencia San Pedro de Urabá	**17**	15/02/2024	15/08/2024	Liquidado	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Grupo 11 Córdoba	Tierralta	**23**	15/02/2024	04/11/2024	Liquidado	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 7/07/ 2025). Contrato de interventoría liquidado (acta liquidación firmada 28/07/ 2025).
Grupo 22 Dibulla	Dibulla	**6**	29/02/2024	21/12/2024	Liquidado	Contrato de obra liquidado 27 de junio de 2025 Contrato de Interventoría liquidado 8 de agosto de 2025

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	OBSERVACIONES
Grupo 15 Nte de Santander	Tibú El Tarra	15	17/06/2024	05/05/2025	Entregado	Terminado el contrato el 05 de mayo de 2025 con el 100 % de las sedes ejecutadas . Se realizo entrega formal de la sede Orú Bajo el día 14 de julio. Se radicó liquidación el 18 de julio de 2025.
Grupo 03 Arauca/ Guaviare	Saravena, Hato Corozal, Fortul.	11	05/02/2024	20/10/2024	Entregado	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025. Se remiten subsanaciones el 08 de septiembre de 2025.
Grupo 06 Cauca	Suárez. Buenos Aires.	14	02/12/2024	17/05/2025	Entregado	La liquidación de obra se encuentra en revisión del área jurídica para enviar a fiducia y firmar el acta de liquidación, el contrato de interventoría se encuentra en firmas de acta de recibido a satisfacción por parte de la fiducia y continuar con el trámite administrativo de radicación.
Grupo 19 Antioquia	Segovia Nechí	11	09/05/2024	18/08/2025	Entregado	El contrato se encuentra terminado con 11 sedes contractuales entregadas. Se da inicio a la etapa de liquidación del contrato de obra. Se radicará la liquidación a finales del mes de septiembre.
Grupo 20 Risaralda	Quinchía, Apía, Guática, Marsella, Mistrató	12	16/08/2024	16/04/2025	Entregado	La sede el Pavero se entregó el 17 de julio de 2025 se radicará la liquidación el 30 de septiembre de 2025.
Grupo 23 Maicao	Maicao	19	02/07/2024	30/04/2025	Entregado	Pendiente por liberar contra liquidación las sedes canceladas o despriorizadas de Ulain y Kaspolimana, en Obra y en Interventoría. Hasta el 21ago25 se le pagó última factura pendiente al contratista de obra. Se le solicita inmediatamente documentación para radicar proceso de liquidación el cual se estima iniciar 15sep25.
Grupo 26 Risaralda	Pueblo Rico Mistrató	12	16/08/2024	16/05/2025	Entregado	Se iniciará proceso de liquidación en el mes de septiembre de 2025. Actas de entrega y recibo a satisfacción se encuentra en firme de la Fiducia. Para poder radicar la liquidación del contrato de obra e interventoria.

CCOM-FO-005 V1 / 05-09-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 04 Cauca	Timbiquí	10	13/01/2025	01/11/2025	84,03%	84,03%	El proyecto se suspendió por condiciones climáticas que se han presentado en la región. El día 26 de agosto/2025 se aprobó en comité fiduciario la prórroga por un plazo de 2 meses teniendo en cuenta las restricciones de la zona por los problemas de orden público que limitan el ingreso de personal y la jornada laboral. El contratista se cita para comité presencial en las oficinas de Findeter, tiene un avance del 70% se estima que en los dos meses faltantes termina el contrato. Se reinició el contrato el día 02 de septiembre
Grupo 07 Cauca	López de Micay	14	07/03/2025	07/10/2025	14,50%	37,15%	Se reinicia las obras el 01 de septiembre de 2025,después de superar los problemas de orden público que dieron origen a la suspensión del 02 de agosto de 2025. Se radico al Dr Juan Carlos Folleco la información de la despriorización de las sedes Noanamito y Playa Menuda Joly el día 29 de agosto de 2025 con radicado No 2202552023998.

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJEC	% PROGR	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 08 Chocó	Quibdó, Bajo Baudó, Rio Sucio	15	03/08/2025	05/10/2025	11,54%	59,93%	Conforme a que el contratista de obra solo ha iniciado labores del componente II en la sede alameda reyes en municipio de Quibdó y debido a la no justificación del atraso en dicho componente, se citó al representante legal y sus directivos a reunión presencial en las oficinas de Findeter donde se comprometen a solicitar prórroga y dar inicio a las 4 sedes pertenecientes al municipio de Quibdó Sin embargo la supervisión aplicará la clausula 23 de apremio al contratista de obra. Notificado el 21 de agosto del 2025 aplicación se llevará a comité técnico del viernes 12 de septiembre
Grupo 12 Nariño	La Tola Mosquera Santa Barbara	11	30/12/2024	23/09/2025	27,90%	60,73%	Lo ejecutado representa 100% del componente I, el componente II presenta un atraso del 32,84% Ejecución en 6 de las 11 Instituciones Educativas, se está instalando baterías sanitaria y colocación de perfiles para cubierta Las 5 I.E restantes, aún no han iniciado acorde a la programación. El 20 de agosto de 2025, Findeter solicita citación a comité para prórroga por 3 meses y adición a la interventoria asumida por Contratista de Obra. El 27 de agosto de 2025, la interventoria emite comunicado recomendando la suspensión del apremio del contratista de obra en virtud de la prórroga solicitada y los documentos anexos a esta.
Grupo 13 Nariño.	Barbacoas	15	30/04/2024	22/01/2026	31,26 %	40,38%	Se continúa con la ejecución de las sedes Candillas, Anzamapí, y Alto Guelmambí. La supervisión se encuentra en el tramite de adición al contrato de obra por valor de $4.750.725.177 y los Ítems NP (trasiego manual y biodigestor de 12 sedes). Comité citado para el 05 de septiembre de 2025. **Se está programando la entrega de las sedes mencionadas para el 30 de septiembre de 2025**

CCOM/FO/005 V1 05/Ago/2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 14 Putumayo	Puerto Asís Valle Guamez San Miguel Puerto Caicedo	21	12/06/2024	22/10/2025	42,62%	53,51%	El día 20 de agosto de 2025, se le solicita al contratista de obra remitir un plan de acción para mitigar los atrasos presentados. El día 26 de agosto, se remite a la supervisión de Findeter por parte de la interventoría, oficio enviado por la Gobernación del Putumayo donde se confirma que la I.E. JOSE ANTONIO GALAN sede Primaria de Puerto Caicedo hace parte de un proyecto para la construcción de una nueva infraestructura educativa con un valor asignado de 14.600 millones de pesos, por tal razón se procede a solicitar la despriorización de la misma. **Nos encontramos a la espera de la respuesta por parte del MEN** La supervisión programa visita al territorio en la semana del 08 al 11 de septiembre de 2025, en acompañamiento de la ETC y contratistas de obra e interventoria . Se solicita a la interventoría iniciar con el proceso de apremio al contratista de obra
Grupo 16 Nte de Santander	El Carmen Convención	14	21/04/2025	20/09/2025	1,79%	99,31%	Los descargos del contratista, concepto de supervisión y de interventoria frente a la solicitud formal de inicio de apremio radicada al P.A. por parte de Findeter, se encuentran radicados en contratación derivada desde el 19 de agosto de 2025 para continuar con el proceso de aplicación. El día 03 de septiembre de 2025 se recibe de parte de la interventoría la solicitud de prórroga por dos meses. La mayor permanencia será asumída por el contratista

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 17 Nte de Santander	Teorama San Calixto Hacarí	14	22/04/2025	22/10/2025	11,49 %	74,46%	Lo ejecutado representa 96,06% del componente I, el cual no ha culminado, presentando un atraso del 3,94% que afecta el componente II con un atraso del 62,96 % respecto al programado de 74,46 % y al ejecutado de 11,49 %. Aprobado el Comp I de 11 sedes, persisten observaciones en presupuesto y diseño hidrosanitario. En ejecución 6 sedes. Persisten dificultades para iniciar sedes faltantes: disponibilidad de espacios y de Mano de obra en la zona, el bajo interés de la comunidad local en vincularse obliga al contratista a gestionar personal externo. Dificultades por orden público, bloqueos en vía ya sea por afectación de orden público o del clima afectan logística de transporte y Mano de Obra. Se reiteró a Interventoria actuación frente al atraso del contratista obra.
Grupo 21 Uribia	Uribia	21	01/04/2024	02/10/2025	15,36%	66,09%	Debido a los atrasos presentados, se inició proceso de incumplimiento al contratista de obra 14 de agosto de 2025 por incumplimiento de las obligaciones contractuales que no han sido completadas a cabalidad. Actualmente se encuentra la interventoría en revisión de los descargos presentados por el contratista de obra. Se recibió el plan de contingencia solicitado para la mitigación de los atrasos, sin embargo se evidencia que no esta siendo cumplido por este. Se encuentran activas 8 sedes educativas, en la media y Baja guajira. En dos semanas se iniciaran las sedes de la alta Guajira (8) dadas las situaciones de invierno que dificultan el acceso.

CCOM/FO/005 V1 / 05 Ago 2024 Pública

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 24 Guaviare Caquetá Meta	Uribe, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar	**16**	**26/09/2024**	**25/11/2025**	67,53%	64,55%	En ejecución: acabado de pintura para ornamentación de puertas y ventanas en el taller de ornamentación, acabado de muros exteriores del comedor y zonas aledañas, construcción andenes, acabado de muros exteriores del comedor y zonas aledañas, construcción de la batería sanitaria, entre otros. 10 sedes con avance 80% a 100% 1 sedes con avance 40% a 60% 2 sedes con avance 20% al 40%. 3 sedes con avance 0% al 20%. Se reiteró solicitud de cronograma de entrega sedes. Porcentajes acorde a la nueva programación ajustada al plazo concedido con la prórroga No 3 x 2 meses y PDC para superar atraso
Grupo 25 B/ventura	B/ventura	**16**	**21/08/2024**	**20/09/2025**	80,52%	90%	En revisión por parte de contratista de obra e interventoría del diagnóstico y diseño final para la sede San Pedro Claver debido a que el rubro, con el que cuenta el contrato no sería suficiente para la intervención de espacios completos. El contratista de obra presentó dos propuestas y Findeter se encuentra a la espera de la respuesta de interventoría. Adicionalmente, Findeter se encuentra a la espera de la instrucción para la inclusión de las sedes de IE San Rafael en el municipio de Buenaventura y la SE Antonia Santos en el municipio de Tuluá. Ambas en el departamento de Valle del Cauca. Continúan los problemas de orden público, por grupos al margen de la ley

CCOM/FO/005 V1 / 05/Ago/2024 / Publica

CONTRATOS EN ESTRUCTRURACION

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 27 CRIHU	Huila	**10**	**Por definir**	**Por definir**	N/A	N/A	- Se continua con el trámite de convenios con la ETC el 1 de julio/25. - Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP. - Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 6.330.094.415. para obra + interv. - Los EP de obra e interventoría se encuentran en validacion del equipo de contratacion para proceder a publicar la convocatoria, se estima en la primera semana de oct 2025.
Grupo 28 Abades	Nariño Santa Cruz	**11**	**Por definir**	**Por definir**	N/A	N/A	- Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25. - Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP. - Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 4.626.399.299. para obra + interv. - Se espera definición de como avanzar con la contratacion, si se gestionará convocaoria publica o directa con comunidades.
Grupo 29 Abades	Nariño Samaniego / La Ilanada	**16**	**Por definir**	**Por definir**	N/A	N/A	- Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25. - Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP. • Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 7.817.350.929. para obra + interv. - Se espera definición de como avanzar con la contratación, se estima en la primera semana de oct 2025.

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 04/ Cauca

Adjudicación Obra: 25/11/2024
Adjudicación Inter: 25/11/2024

Fecha inicio: 13/01/2025
Fecha Fin: 01 /11/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**Timbiquí**	
	Obra Consorcio I.E. Cauca-Nariño 2024	**Interventoría** Consorcio Findeter G.3
$	**Valor Inicial** Obra: $1.774.087.439 Interventoría: $182.836.360	
	Adiciones Interventoría: 40.160.893,50 A cargo de contratista de obra+11.800.426,75 a cargo del Contratista de Obra.	
	Valor Pagado Obra: $ 52.000.000,00 Interventoría: $30.692.480	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	06/05/2025 Prórroga x 1 mes y 15 días + adición a interventoría asumido por contratista 27/06/2025 Prórroga x 20 días + adición a interventoría asumido Suspensión 17/07/2025 x 45 días 26/08/2025 Prórroga x 2 meses	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El proyecto se suspendió por solicitud del contratista teniendo en cuenta las condiciones climáticas que se han presentado en la región, impidiendo el normal avance en las actividades programadas. El día 26 de agosto de 2025 aprobó en comité fiduciario la prórroga por un plazo de 2 meses teniendo en cuenta las restricciones de la zona por los problemas de orden público que limitan el ingreso de personal y la jornada laboral. Se reinició el contrato el día 02 de septiembre	

84,03%
Porcentaje de avance

84,03 %
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas -

En ejecución -

Suspendidas 10



No	Municipio	Dane Sede	Nombre Sede	Estado
1	Timbiquí	119809001293	BELLA VISTA	Suspendido
2	Timbiquí	219809000071	ANGOSTURA	Suspendido
3	Timbiquí	219809001077	COROZAL	Suspendido
4	Timbiquí	219809000607	CHACON	Suspendido
5	Timbiquí	219809001221	ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERPE	Suspendido
6	Timbiquí	219809000763	SAN MIGUEL DEL RIO	Suspendido
7	Timbiquí	219809000135	BOCA DE PATIA SEDE PRINCIPAL	Suspendido
8	Timbiquí	219809000861	CHETE	Suspendido
9	Timbiquí	219809000411	CABECITAL SEDE PRINCIPAL	Suspendido
10	Timbiquí	219809001395	SANTA ROSA SEDE PRINIPAL	Suspendido

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 06/ Cauca

Adjudicación Obra: 28/08/2024
Adjudicación Inter: 09/09/2024

Fecha inicio: 02/12/2024
Fecha Fin: 17/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**Suarez y Buenos Aires**	
	Obra: CONSORCIO EDUCATIVO 2024	**Interventoría** Consorcio Interventoría Educativa G6
$	**Valor Inicial** Obra: $2.452.682.000 Interventoría: $ 212.100.000	
	Adiciones Obra: N.A Interventoría: N/A	
	Valor Pagado Obra: $2.452.682.000 Interventoría: $ 194.699.999,92	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prórroga No 1 por 1 mes y 15 días 25/03/2025	
GESTION	Conforme a la fecha de terminación del contrato de obra del 17 de mayo y de interventoría del 17 julio. 1. Obra: Se realizo radicación en prissa el 29 de julio, el cual se encuentra actualmente la revisión de la profesional del área para proceder con la firma del acta de liquidación. 2. Interventoría: Se encuentra en revisión y firme por parte de la Fiducia para poder radicar los documentos en prisa para el mes de agosto y continuar dentro de los tiempos el cierre de la liquidación del contrato.	

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas **14**
En ejecución **0**
Terminadas



No	Municipio	Nombre Sede	DaneIE	Estado
1	Suárez	NINA MARIA	219780001218	Entregada
2	Suárez	PORTUGAL	219780001218	Entregada
3	Suárez	CANUTICO	219780001218	Entregada
4	Suárez	VISTA HERMOSA	219780000467	Entregada
5	Suárez	SAN VICENTE	219780000467	Entregada
6	Suárez	LA CABAÑA	219780000777	Entregada
7	Suárez	SENDERITO	219780001382	Entregada
8	Buenos Aires	EL SILENCIO	219110001659	Entregada
9	Buenos Aires	NUEVA VISION DE HONDURAS (sede principal	219110001691	Entregada
10	Buenos Aires	TIMBA (sede principal)	419110000970	Entregada
11	Buenos Aires	LA ESPERANZA	219110000172	Entregada
12	Buenos Aires	MUNCHIQUE (sede principal	219110001012	Entregada
13	Buenos Aires	LA BALSA	219110001641	Entregada
14	Buenos Aires	GABRIEL MANRIQUE	119110000500	Entregada

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 07/ Cauca

Adjudicación Obra: 21/12/2024
Adjudicación Inter: 28/01/2025

Fecha inicio: 07/03/2025
Fecha Fin: 07/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**López de Micay**	
	Obra Consorcio I.E. Cauca-Nariño 2024	**Interventoría** Consorcio Findeter g.3
$	**Valor Inicial** Obra: $3.144.064.242 Interventoría: $ 219.751.350	
	Adiciones	
	Valor Pagado	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión No 01: 30 días 30 de mayo de 2025 Prorroga 1 a la suspensión 1: el 27 de junio de 2025 x 1 mes Modificación del alcance: 08 de julio de 2025 Prorroga 02 a la suspensión 1: el 24 de julio de 2025 X1 mes **Reinicia el 03 de septiembre de 2025**	
GESTION	Se reinicia las obras el 01 de septiembre de 2025,después de superar los problemas de orden público que dieron origen a la suspensión del 02 de agosto de 2025. Se radico al Dr Juan Carlos Folleco la información de la despriorización de las sedes Noanamito y Playa Menuda Joly el día 29 de agosto de 2025 con radicado No 2202552023998.	

14,50%
Porcentaje de avance

37,15%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas	-
En ejecución	14
Suspendidas	-



No	Municipio	Dane Sede	Nombre Sede	Estado
1	López	219418001021	BETANIA	En ejecución
2	López	219418000149	SAN JOSE DEL CHIGUERO	En ejecución
3	López	219418000122	EL COCO	En ejecución
4	López	219418000076	GUAYABAL	En ejecución
5	López	219418000459	LAS CRUCES	En ejecución
6	López	219418001634	LAS PALMAS	En ejecución
7	López	219418000424	EL TRUENO	En ejecución
8	López	219418000131	GUACARI	En ejecución
9	López	219418000840	CORRENTON	En ejecución
10	López	219418001609	NOAMITO SEDE PRINCIPAL	Despriorizada
11	López	219418000378	SAGRADA FAILIA SEDE PRINCIPAL	En ejecución
12	López	219418000238	SAN ANTONIO DE GURUMENDI	En ejecución
13	López	219418000157	YULLAL JOLI	En ejecución
14	López	219418001200	EL CACAO	En ejecución
15	López	219418000831	PLAYA MENUDA JOLI	Despriorizada
16	López	219418000301	SANTA CRUZ ALTO SIGUI	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 08/ Chocó

Adjudicación Obra: 09/10/2024
Adjudicación Inter: 11/10/2024

Fecha inicio: 03/02/2025
Fecha Fin: 05/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	Quibdó, Riosucio	
	Obra CONSORCIO PRO INSTITUCIONES CHOCÓ	**Interventoría** CONSORCIO INTERVENTORES GC91
$	**Valor Inicial** Obra: $3.316.617.339 Interventoría: $ 250.437.083	
	Adiciones Interventoría: $32.405.049,43 (P.a.) $46.292.942,75 (asumido por contratista)	
	Valor Pagado Obra: $39.219.600 Interventoría: $32.449.326,48	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión por 30 días 15/04/2025 Prórroga No 01 a la suspensión 1 por 30 días- 10/05/2025 **Reinició 18/06/2025** Modificación alcance del contrato17/06/2025 Prorroga No 1 por 2 meses 22/07/2025 y adición a la interventoría ($78.698.002,68)	
GESTION	Conforme a que el contratista de obra solo ha iniciado labores del componente II en la sede alameda reyes en municipio de Quibdó y debido a la no justificación del atraso en dicho componente, se citó al representante legal y sus directivos a reunión presencial en las oficinas de Findeter donde se comprometen a solicitar prórroga y dar inicio a las 4 sedes pertenecientes al municipio de Quibdó Sin embargo la supervisión aplicará la clausula 23 de apremio al contratista de obra. Notificado el 21 de agosto del 2025 aplicación se llevará a comité técnico del viernes 12 de septiembre	

11,54%
Porcentaje de avance

59,93%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas **0**

En ejecución 15

Sedes Despriorizadas

DaneSede	Nombre Sede
227001001706	SEDE DE GUADALUPE
227001018145	SEDE DE MUNGARADO
227001018340	SEDE GUADUALITO
227001800072	SEDE EL NOVENTA
227001018374	SEDE PLAYA INDIA
227001018226	SEDE DE CARRIZAL



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Rio Sucio	227615001664	SEDE LAS AMERICAS	En ejecución
2	Quibdó	227001003547	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIO DE TAGACHI	En ejecución
3	Quibdó	227001000998	SEDE DE MOTOLDO	En ejecución
4	Quibdó	227001018137	CE INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA	En ejecución
5	Quibdó	227001004233	SEDE DE CHUSCALITO	En ejecución
6	Quibdó	227001018331	SEDE PLAYA BONITA	En ejecución
7	Quibdó	227001018251	SEDE PUERTO JUAN	En ejecución
8	Quibdó	227001000408	SEDE DE LA COMUNIDAD	En ejecución
9	Bajo Baudó	127077002103	SEDE MARIA ISABEL MOSQUERA	En ejecución
10	Bajo Baudó	127077000089	IE FRANCISCO PIZARRO - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
11	Bajo Baudó	127077005234	IE INDÖGENA EMBERA DE PIZARRO - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
12	Quibdó	127001000039	SEDE LOS ANGELES	En ejecución
13	Quibdó	127001000047	SEDE ALAMEDA REYES	En ejecución
14	Quibdó	127001003151	SEDE NIÑO JESUS	En ejecución
15	Quibdó	127001000799	SEDE MIRAFLORES	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 12/ Nariño

Adjudicación Obra: 12/07/2024
Adjudicación Inter: 04/10/2024

Fecha inicio: 30/12/2024
Fecha Fin: 23/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	La Tola, Mosquera, Santa Barbara	
	Obra CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO	**Interventoría** ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S
$	**Valor Inicial** Obra: $2.628.232.452,00 Interventoría: $209.551.039,00	
	Adiciones Obra: $0 Interventoría: $ 116.020.814,25 (asumidos por contratista)	
	Valor Pagado: Interventoría: $ 30.030.000	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión No 01: 31/01/2025 por 24 días Prórroga No 01 suspensión 01: 24/02/2025 por 15 días Suspensión No 02: 11/03/2025 por 15 días **Reinició el 29/03/2025** Prórroga No 01: 20 /05/2025 por 3 meses	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Lo ejecutado representa 100% del componente I, el componente II presenta un atraso del 32,84% Ejecución en 6 de las 11 Instituciones Educativas, se está instalando baterías sanitaria y colocación de perfiles para cubierta Las 5 I.E restantes, aún no han iniciado acorde a la programación. El 20 de agosto de 2025, Findeter solicita citación a comité para prórroga por 3 meses y adición a la interventoria asumida por Contratista de Obra. El 27 de agosto de 2025, la interventoria emite comunicado recomendando la suspensión del apremio del contratista de obra en virtud de la prórroga solicitada y los documentos anexos a esta	

27,90%
Porcentaje de avance

60,73%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Entregadas -
En ejecución 11
Despriorizadas 2



No	Municipio	Dane Sede	Nombre Sede	Estado
1	La Tola	252390000099	SEDE 5 EL SECADERO	En ejecución
2	La Tola	252250000391	SEDE 5 POIJA	En ejecución
3	La Tola	252250000200	SEDE 2 GUILLERMO ZARAMA VILLOTAS	En ejecución
4	La Tola	252250001001	CENTRO EDUCATIVO LAS TORRES	En ejecución
5	La Tola	252250000480	SEDE 4 EL PUEBLITO	En ejecución
6	La Tola	252250000765	SEDE 4 NERETE	En ejecución
7	Mosquera	252473001062	SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA COCAL DE LOS PAYANES	En ejecución
8	Sta Bárbara	252696000203	SEDE 6 CHANZARA LAS PEÑAS	En ejecución
9	Sta Bárbara	252696000912	SEDE 11 LAS VARAS	En ejecución
10	Sta Bárbara	252696001323	SEDE 9 LA PEÑITA	En ejecución
11	Sta Bárbara	252696000661	SEDE 5 SANTA ROSA	En ejecución
12	Sta Bárbara	252696000939	SEDE 14 DESPLAYADO	Despriorizados
13	Sta Bárbara	252696001129	SEDE 10 SAN ANDRES	Despriorizados

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 13/ Nariño

Adjudicación Obra: 30/01/2024 Fecha inicio: 30/04/2024
Adjudicación Inter: 30/01/2024 Fecha Fin: 22/01/2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**Barbacoas**	
	Obra CONSTRUCCIONES B&M S.A.S	**Interventoría** UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SUR DE COLOMBIA
$	**Valor Inicial** Obra: $4.374.302.638 Interventoría: $288.742.298	
	Adiciones Interventoría: $ 159.807.583 (asumido por contratista)	
	Valor Pagado Obra: $585.911.808,78 Interventoría: $48.720.000	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión No 01: 25/09/2024 x 15 días Prorroga a la suspensión : 01 09/10/2024 x 15 días Prorroga a la suspensión : 02 22/10/2024 x 30 días Prorroga a la suspensión : 03 22/11/2024 x 25 días Prorroga a la suspensión : 04 17/12/2024 x 45 días Prorroga a la suspensión : 05 31/01/2025 x 45 días **Reinició 17/03/2025** **Prorroga No 01 + Adición a interventoría 19/03/2025x 10 meses**	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se continúa con la ejecución de las sedes Candillas, Anzamapí, y Alto Guelmambí. La supervisión se encuentra en el tramite de adición al contrato de obra por valor de $4.750.725.177 y los Ítems NP (trasiego manual y biodigestor de 12 sedes). Comité citado para el 05 de septiembre de 2025. Se está programando la entrega de las sedes mencionadas para el 30 de septiembre de 2025	

31,26%
Porcentaje de avance

40,38%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Terminadas **1**

En ejecución 14

Suspendidas -



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Barbacoas	252079002134	//SEDE 13 CHIMBAGAL	En ejecución
2	Barbacoas	252079001715	//SEDE 11 GUIGUAY	En ejecución
3	Barbacoas	252079001951	*SEDE 12 HONDA RIO GUIZA	En ejecución
4	Barbacoas	252079001588	*SEDE 4 PAMBIL	En ejecución
5	Barbacoas	252079001669	* SEDE 7 GUELMAMBI CARAÑO	En ejecución
6	Barbacoas	252079001693	//SEDE 10 EL TIGRILLO	En ejecución
7	Barbacoas	252079800014	//CENTRO EDUCATIVO ALTO GUELMAMBI - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
8	Barbacoas	252079001898	//CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
9	Barbacoas	252079800031	* CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE 3 anzamapi	En ejecución
10	Barbacoas	252079800049	* SEDE 5 GUAYABAL	En ejecución
11	Barbacoas	252079800022	* SEDE 4 ALTO PALI	En ejecución
12	Barbacoas	252079001731	* SEDE 3 PIPALTA PALBI	En ejecución
13	Barbacoas	252079002118	//SEDE 8 EL PLAYàN	En ejecución
14	Barbacoas	252079001880	//CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO - SEDE PRINCIPA	En ejecución
15	Barbacoas	252079001600	* CENTRO EDUCATIVO CANDILLAS	Terminada

Fase 1 *

Fase 2// En espera de adición

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 14/ Putumayo

Adjudicación Obra: 22/04/2024 Fecha inicio: 12/06/2024
Adjudicación Inter: 22/04/2024 Fecha Fin: 22/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	Puerto Asís, Valle de Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo	
	Obra CONSORCIO PUTUMAYO 2024	**Interventoria** U.T. INTERVENTORIA SUR DE COLOMBIA
$	**Valor Inicial** Obra: $4.242.685.000	Interventoría: $ 303.456.716
	Adiciones Interventoría asumido por el contratista de obra $60,000,000	
	Valor Pagado Interventoría: $ 54.201,4	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 01: 12/11/2024 / 15 días Prórroga susp 01 : 27/11/2024 / 15 días Prórroga susp 02 : 12/12/2024 / 10 días Prórroga susp 03 : 22/12/2024 / 45 días Prórroga susp 04 : 05/02/2024 – 45 días	Prórroga No 01 por 4 meses - Prórroga No 02 por 3 meses:15-07-2025 y adición a interventoría $60 millones
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El día 20 de agosto de 2025, se le solicita al contratista de obra remitir un plan de acción para mitigar los atrasos presentados. El día 26 de agosto, se remite a la supervisión de Findeter por parte de la interventoría, oficio enviado por la Gobernación del Putumayo donde se confirma que la I.E. JOSE ANTONIO GALAN sede Primaria de Puerto Caicedo hace parte de un proyecto para la construcción de una nueva infraestructura educativa con un valor asignado de 14.600 millones de pesos, por tal razón se procede a solicitar la despriorización de la misma. Nos encontramos a la espera de la respuesta por parte del MEN La supervisión programa visita al territorio en la semana del 08 al 11 de septiembre de 2025, en acompañamiento de la ETC y contratistas de obra e interventoría . Se solicita a la interventoría iniciar con el proceso de apremio al contratista de obra	

42,62 %
Porcentaje de avance

53,51%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Entregadas -

En ejecución 21

Suspendidas -



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Puerto Asis	286568003285	SEDE VILLAMARQUEZA	En ejecución
2	Puerto Asis	286568004087	SAMARIA	En ejecución
3	Puerto Asis	286568004788	ESC RUR MIX LA MANUELA (Manuelita)	En ejecución
4	Puerto Asis	286568005130	ESC RUR MIX PUERTO UNION	En ejecución
5	Puerto Asis	286568000286	SAN GERARDO	En ejecución
6	Puerto Asis	286568004419	ESC RUR MIX LA ESMERALDA PTYO UNO	En ejecución
7	Puerto Asis	286568003234	ESC RUR MIX EL RECUERDO PEÑAZORA	En ejecución
8	Puerto Asis	286568003099	CER TETEYE - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
9	Puerto Asis	286568003871	ESC RUR MIX ALTO PIÑUÑA BLANCO	En ejecución
10	Puerto Asis	286568002670	ESC RUR MIX LA DANTA	En ejecución
11	Valle de Guamuez	286568005873	ESC RUR MIX LA YET	En ejecución
12	Valle de Guamuez	286865003049	ERM COSTA RICA	En ejecución
13	Valle de Guamuez	286568004591	ESC RUR MIX MOGAMBO	En ejecución
14	Valle de Guamuez	286865004304	ESC RUR MIX LAS PAVAS	En ejecución
15	Valle de Guamuez	286865004274	ESC RUR MIX ALTO GUISIA	En ejecución
16	San Miguel	286865003120	ESC RUR MIX EL ESPINAL	En ejecución
17	San Miguel	286757003938	ESC RUR MIX SAN LORENZO	En ejecución
18	San Miguel	286757000289	ESC RUR MIX LA CABAÑA	En ejecución
19	San Miguel	286865002816	ESC RUR MIX SANTA MARTHA	En ejecución
20	Puerto Caicedo	286568002165	PREESC PTO CAICEDO	En ejecución
21	Puerto Caicedo	286568000146	ESC URB MIX PTO CAICEDO	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 16 Nte de Santander

Adjudicación Obra: 12/12/2024 Fecha inicio: 21/04/2025
Adjudicación Inter: 20/12/2024 Fecha Fin: 20/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**El Carmen, Convención**	
	Obra CONSORCIO GRUPO SANTANDER	**Interventoría** CONSORCIO SANTA MARIA 116
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.519.310.507 Interventoría: $ 254.748.548	
	Adiciones Obra: $0 Interventoría: $0	
	Valor Pagado Obra: $0 Interventoría: $0	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Ninguna	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Los descargos del contratista, concepto de supervisión y de interventoria frente a la solicitud formal de inicio de apremio radicada al P.A. por parte de Findeter, se encuentran radicados en contratación derivada desde el 19 de agosto de 2025 para continuar con el proceso de aplicación. El día 03 de septiembre de 2025 se recibe de parte de la interventoría la solicitud de prórroga por dos meses. La mayor permanencia será asumída por el contratista	

1,79%
Porcentaje de avance

99,31%
Porcentaje Programado



Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas **0**

En ejecución 14

Suspendidas



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Convención	254206001030	CENT EDUC RUR HONDURAS MOTILONIA	En ejecución
2	Convención	254206001161	SEDE SANTAFE DE HONDURAS	En ejecución
3	Convención	254206001366	SEDE AGUAS LIMPIAS	En ejecución
4	Convención	154206000021	NORMAL SUPERIOR	En ejecución
5	El Carmen	254245001080	SEDE LA ESPERANZA	En ejecución
6	Convención	254206000220	SEDE BRISAS SANTANDEREANAS	En ejecución
7	Convención	254206000149	CENT EDUC RUR EL GUAMAL	En ejecución
8	El Carmen	254245000105	SEDE LIMONAL	En ejecución
9	El Carmen	254245000598	SEDE TABACAL	En ejecución
10	El Carmen	254245001209	SEDE LA AGUADA	En ejecución
11	El Carmen	254245000571	SEDE ASTILLEROS	En ejecución
12	Convención	154206000641	SEDE NO 2 JOSE MARIA ESTEVEZ COTE	En ejecución
13	Convención	254206000815	SEDE CARTAGENA	En ejecución
14	Convención	254206000351	SEDE GRAMALES	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 17/ Norte de Santander

Adjudicación Obra: 19/11/2024 Fecha inicio: 22/04/2025
Adjudicación Inter: 19/11/2024 Fecha Fin: 22/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**Teorama, San Calixto, Hacarí**	
	Obra CONSORCIO TRIPTICO 2024	**Interventoría** SOLIUN S.A.S
	Valor Inicial Obra: $5.401.660.624 Interventoría: $ 241.983.275	
	Adiciones Obra: $0 Interventoría: $ 66.394.858 (asumidos por contratista)	
	Valor Pagado	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prórroga No 01: 14 /08/2025 por 2 meses+ Adición a Interventoría x $ 66,394,858	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Lo ejecutado representa 96,06% del componente I, el cual no ha culminado, presentando un atraso del 3,94% que afecta el componente II con un atraso del 62,96 % respecto al programado de 74,46 % y al ejecutado de 11,49 %. Aprobado el Comp I de 11 sedes, persisten observaciones en presupuesto y diseño hidrosanitario. En ejecución 6 sedes. Persisten dificultades para iniciar sedes faltantes: disponibilidad de espacios y de Mano de obra en la zona, el bajo interés de la comunidad local en vincularse obliga al contratista a gestionar personal externo. Dificultades por orden público, bloqueos en vía ya sea por afectación de orden público o del clima afectan logística de transporte y Mano de Obra. Se reiteró a Interventoría actuación frente al atraso del contratista obra.	

11,49%
Porcentaje de avance

74,46%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas **0**

En ejecución **14**

Suspendidas



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Teorama	254800000736	SEDE LOS MESONES	En ejecución
2	Teorama	254800000108	CENT EDUC RUR EL FARACHE	En ejecución
3	Teorama	254800000167	SEDE PULPITOS	En ejecución
4	Teorama	254800001112	SEDE JABONERA	En ejecución
5	Teorama	254800000752	SEDE MARGARITAS	En ejecución
6	San Calixto	154670000025	COL CAYETANO FRANCO PINZON	En ejecución
7	San Calixto	254670000895	SEDE QUEBRADA AZUL	En ejecución
8	San Calixto	254670000941	SEDE SAN JOSE DEL VAJIAL	En ejecución
9	San Calixto	254670001298	SEDE EL CARACOL	En ejecución
10	Hacarí	254344000371	SEDE EL CERRO	En ejecución
11	Hacarí	254344000290	CENT EDUC RUR SAN SEBASTIAN	En ejecución
12	Hacarí	254344001083	SEDE LA ESTACION	En ejecución
13	Hacarí	254344000141	SEDE EL VALLE	En ejecución
14	Hacarí	254344000877	SEDE EL LIBANO	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 21 Uribia

Adjudicación Obra: 30/01/2024 Fecha inicio: 01/04/2024
Adjudicación Inter: 30/01/2024 Fecha Fin: 02/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**La Guajira**	
	Obra SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**Interventoría** CONSORCIO CDG GUAJIRA
$	**Valor Inicial** Obra: $7.471.853.502	Interventoría: $327.138.021
	Adiciones Obra $963.436.631,56+ 3.853.162.459,03	Interventoría $ 96.343.663,16+ 126.794.535,50
	Valor Pagado Obra: $ 644.963.330,31	Interventoría: $ 143.274.032,49
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga No 01: 19/06/2024 por 95 días Suspensión No 01: 29/10/2024 por 30 días Prorroga 1 suspensión 1: 27/11/2024 por 45 días Prorroga 2 suspensión 1: 27/12/2024 por 20 días Prorroga 3 suspensión 1: 30/01/2025 por 20 días	Suspensión No 02: 10/03/2025 por 30 días Prorroga 1 suspensión 2: 10/04/2025 por 20 días Prorroga 2 suspensión 2: 30/04/2025 por 30 días Prorroga 2 por 4 meses y Adición obra:3.853.162.459,03 interventoría 126.794.535,50 **Reinició 02 de junio de 2025**
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Debido a los atrasos presentados, se inició proceso de incumplimiento al contratista de obra 14 de agosto de 2025 por incumplimiento de las obligaciones contractuales que no han sido completadas a cabalidad. Actualmente se encuentra la interventoría en revisión de los descargos presentados por el contratista de obra. Se recibió el plan de contingencia solicitado para la mitigación de los atrasos, sin embargo se evidencia que no esta siendo cumplido por este. Se encuentran activas 8 sedes educativas, en la media y Baja guajira. En dos semanas se iniciaran las sedes de la alta Guajira (8) dadas las situaciones de invierno que dificultan el acceso.	

15,36%
Porcentaje de avance

66,09%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Públic

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas -

En ejecución 21

Suspendidas -



No	Municipio	Dane Sede	Nombre Sede	Estado
1	Uribia	244847800277	ATAPUT	En ejecución
2	Uribia	244847800293	JUYAMANA	En ejecución
3	Uribia	244847800275	AMUSICHIWOU	En ejecución
4	Uribia	244847800301	PISHICHON	En ejecución
5	Uribia	244847800300	PIAZAPA	En ejecución
6	Uribia	244847800281	CHIPANA	En ejecución
7	Uribia	244847800620	AIPAIMANA	En ejecución
8	Uribia	244847001379	MATIA	En ejecución
9	Uribia	244847800135	TEQUENDAMA	En ejecución
10	Uribia	244847800134	SAN MARTIN	En ejecución
11	Uribia	244847800123	MALEEN	En ejecución
12	Uribia	244847800119	KALERRUWO	En ejecución
13	Uribia	244847800104	ATACHONKO	En ejecución
14	Uribia	244847800077	CARRAIPIA	En ejecución
15	Uribia	244847800088	KAYUSIRAMANA	En ejecución
16	Uribia	244847800098	SHURRULEPU	En ejecución
17	Uribia	244847800081	CASTILLETE	En ejecución
18	Uribia	244847800084	ICHIPA	En ejecución
19	Uribia	244847800094	PUNTA ESPADA	En ejecución
20	Uribia	244847800141	SIERRA MAESTRA	En ejecución
21	Uribia	244847800573	GUARERPA	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 24 –Guaviare Caquetá y Meta


Adjudicación Obra: 05/06/2024 Fecha inicio: 26/09/2024
Adjudicación Inter: 11/06/2024 Fecha Fin: 25/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Municipios	**Uribe, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, San Vicente del Caguán.**	
	Obra CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ	**Interventoría** CONSORCIO INTERVENTORES GC 115
$	**Valor Inicial** Obra: $4.990.202.000	Interventoría: $329.395.922,00
	Adiciones: Interventoría: $ 60.000.000+ $90.000.000 +60.000.000(asumidos por contratista)	
	Valor Pagado Obra: $2.342.562.161,30	Interventoría: $ 255.471.291,36
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**Suspensión No 01:** 17/12/2024 por 30 días **Prórroga No 01**: 18/02/2024 por 60 días- **Adición No 01:** Interventoría (asumido por el contratista) **Prórroga No 02**: 15/04/2025 por 90 días- **Adición No 02**: Interventoría (asumido por el contratista **Suspensión No 02: 18/06/2025 por 1 Mes** **Prórroga No 03:** 25/08/2025 por 60 días- Adición No 03: Inerventoría (asumido por el contratista	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En ejecución: acabado de pintura para ornamentación de puertas y ventanas en el taller de ornamentación, acabado de muros exteriores del comedor y zonas aledañas, construcción andenes, acabado de muros exteriores del comedor y zonas aledañas, construcción de la batería sanitaria, entre otros. 10 sedes con avance 80% a 100% 1 sedes con avance 40% a 60% 2 sedes con avance 20% al 40%. 3 sedes con avance 0% al 20%. Se reiteró solicitud de cronograma de entrega sedes. Porcentajes acorde a la nueva programación ajustada al plazo concedido con la prórroga No 3 x 2 meses y PDC para superar atraso	

67,53%
Porcentaje de avance

64,55%
Porcentaje Programado

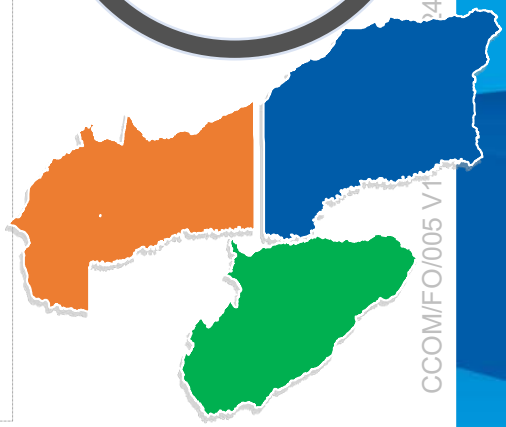

CCOM/FO/005 V1 4 / Pública


Sedes Educativas

Findeter

Entregadas -

En ejecución 16

Canceladas 0

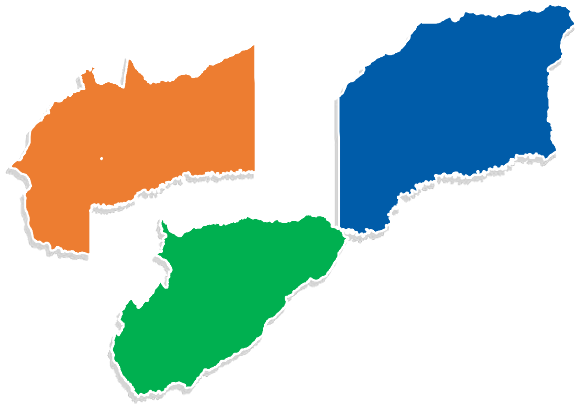

No	Municipio	Dane Sede	Nombre Sede	Estado
1	Uribe	250370000138	SEDE EL PARAISO	En ejecución
2	San José Del Guaviare	295001000098	PUERTO NARE	En ejecución
3	San José Del Guaviare	295001003861	INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN	En ejecución
4	San José Del Guaviare	295001004174	IE CERRO AZUL - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
5	San José Del Guaviare	295001001281	IE EL RETIRO - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
6	San José Del Guaviare	295001002741	IE CHARRAS - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
7	San José Del Guaviare	295001004671	PUERTO FLORES	En ejecución
8	San José Del Guaviare	295001002597	CAÑO DANTA	En ejecución
9	San José Del Guaviare	295001002449	IE TRIUNFO II - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
10	El Retorno	295025000196	CERRO COCUY	En ejecución
11	El Retorno	295105001428	ESCUELA RURAL MIXTA ALTO JORDAN	En ejecución
12	El Retorno	295025000056	CAÑO RAYA BAJA	En ejecución
13	Calamar	295105001622	TERMALES	En ejecución
14	Calamar	295105001673	CAÑO SENDA	En ejecución
15	Calamar	295105000847	DIAMANTE UNO	En ejecución
16	San Vicente del Caguán	218753002834	LA AURORA	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 25 – B/ventura

Adjudicación Obra: 09/05/2024 Fecha inicio: 21/08/2024
Adjudicación Inter: 09/05/2024 Fecha Fin: 20/09/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Valle del Cauca**	
	Obra CONSORCIO G25 2024	**Interventoría** CONSORCIO OM INGENIEROS
$	**Valor Inicial** Obra: $5.192.798.592	Interventoría: $324.737.739
	Adiciones Obra: $1.000.000.000	Interventoría: $493.521.597,78
	Valor Pagado Obra: $ 1.655.561.364,59	Interventoría: $128.489.134,42
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión No.1: 27/12/2024 por 30 días **Reinició: 26/01/2025** **Prórroga No 1:** 7 meses 20 de febrero de 2025	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En revisión por parte de contratista de obra e interventoría del diagnóstico y diseño final para la sede San Pedro Claver debido a que el rubro, con el que cuenta el contrato no sería suficiente para la intervención de espacios completos. El contratista de obra presentó dos propuestas y Findeter se encuentra a la espera de la respuesta de interventoría. Adicionalmente, Findeter se encuentra a la espera de la instrucción para la inclusión de las sedes de IE San Rafael en el municipio de Buenaventura y la SE Antonia Santos en el municipio de Tuluá. Ambas en el departamento de Valle del Cauca. Continúan los problemas de orden público, por grupos al margen de la ley. Desde la supervisión se gestionó con los contratistas llevar a cabo la solicitud de prórroga por el término de un mes, donde la mayor permanencia de la interventoría no representará ningún costo para el Patrimonio Autónomo. Este comité se citará en el transcurso de la semana del 09 de septiembre de 2025 .	

80,52%
Porcentaje de avance

90%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas	**7**
En ejecución	8
Terminada	1



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Buenaventura	176109005666	SEDE PRINCIPAL I.E. ANTONIO NARIÑO.	En ejecución
2	Buenaventura	276109001266	SEDE ATANASIO GIRARDOT.	Entregada
3	Buenaventura	276109001401	SEDE LA GRAN COLOMBIA.	Entregada
4	Buenaventura	276109800011	SEDE HÉCTOR EPALZA QUINTERO	Entregada
5	Buenaventura	276109005806	SEDE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA.	Entregada
6	Buenaventura	476109007786	SEDE SAN JUAN BAUTISTA.	En ejecución
7	Buenaventura	276109000341	SEDE JAIME ROOCK.	En ejecución
8	Buenaventura	276109000014	SEDE SAN CIPRIANO.	Entregada
9	Buenaventura	176109007421	SEDE LA COMUNA.	Entregada
10	Buenaventura	276109008571	SEDE SANTA ROSA DE GUAYACÁN.	En ejecución
11	Buenaventura	276109008589	SEDE NONAM.	En ejecución
12	Buenaventura	176109004023	SEDE GRANADINOS.	Entregada
13	Buenaventura	276109001029	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	En ejecución
14	Buenaventura	276109001053	SANTA FILOMENA	En ejecución
15	Buenaventura	276109010444	SANTA LUCIA DE TIMBA	Terminada
16	Buenaventura	276109004648	SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIPAL	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 26/ Risaralda

Adjudicación Obra: 16/06/2024 Fecha inicio: 16/08/2024
Adjudicación Inter: 16/06/2024 Fecha Fin: 16/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**Pueblo Rico, Mistrató**	
	Obra GRUPO TITANIUM SAS	**Interventoría** CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26
$	**Valor Inicial** Obra: $6.141.512.336 Interventoría: $352.879.875	
	Adiciones Obra: $0,00 Interventoría: $54.159.684,74+ $ 54.159.684,75+30.088.715,75 (asumidos por contratista)	
	Valor Pagado Obra: $5.348.097.072,60 Interventoría: $385.981.809,81	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	* Prórroga No.1: 1 mes y 15 días 30/12/24 • Adición No. 1 Interventoría: $ 54.159.684,74 *(El contratista asumió $36.106.456,50 el Patrimonio Autónomo asume $ 18.053.228,25)* aprobada 30/12/24. • Prórroga No 2: 1 mes y 15 días 25/02/2025 • Adición No 2 Interventoría 54.159.684,75 - 25/02/2025 asumida por contratista • Prórroga No 03: 1 mes 15/04/2025	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se iniciará proceso de liquidación en el mes de septiembre de 2025. Actas de entrega y recibo a satisfacción se encuentra en firme de la Fiducia. Para poder radicar la liquidación del contrato de obra e interventoria.	

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública


Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas **12**

En ejecución -

Por iniciar -



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Pueblo rico	266572800050	BIDUA JAIDE	Entregada
2	Pueblo rico	266572800076	PUERTO LETICIA	Entregada
3	Pueblo rico	266572800084	LA PECERA	Entregada
4	Pueblo rico	266572001423	BAJO SANJUAN	Entregada
5	Pueblo rico	266572001181	BAKORY BAJO PALMAR	Entregada
6	Pueblo rico	266572001172	SANTA RITA	Entregada
7	Pueblo rico	266572800008	LA PUNTA	Entregada
8	Pueblo rico	2665728000068	CAÑAVERAL	Entregada
9	Pueblo rico	266572800106	CHIFA	Entregada
10	Pueblo rico	266572800024	DOKABUSITO	Entregada
11	Pueblo rico	266572001024	JITOCHAKE	Entregada
12	Mistrató	26656800025	VIDUA ALTA	Entregada

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

SALDO A LIBERAR POR LIQUIDACIONES

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

$ 1.364,1

GRUPO	VALOR CONTRATO OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	LIQUIDADOS	SALDOS	
				OBRA	INTERVENTORIA
9	$ 5.949.362.000	100	SI	$ 520.324,57	$ 9.539.61
10	$ 5.875.833.952	100	SI	$ 164.743.008,00	$ 8.410.519,63
11	$ 9.037.000.000	100	SI	$ 1.190.435.467,01	$ -
TOTALES				$ 1.355.698.799,58	$ 8.420.059,24

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Contratistas

ID INFRAESTRUCTURA	Nombre Contratista Obra	Contratista Interventoria
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 1	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	CONSTRUOBRAS C&M SAS
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 2	CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME	CONSORCIO INTERVENTORES 086
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 3	SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONSORCIO SAN JOSUE
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 4	CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024	CONSORCIO FINDETER G.3
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 5	NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS	CONSORCIO FINDETER G3
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 6	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 7	CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024	CONSORCIO FINDETER G.3
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 8	CONSORCIO PRO INSTITUCIONES CHOCÓ	CONSORCIO INTERVENTORES GC91
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 9	CONSORCIO EDUCATIVO CESAR	Y INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 10	AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 11	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 12	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 13	CONSTRUCCIONES B&M S.A.S	UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 14	CONSORCIO PUTUMAYO 2024	ALFA & OMEGA INGENIEROS S.A.S.
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 15	LA UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15	CONSORCIO SAN MARTIN 109
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 16	CONSORCIO GRUPO SANTANDER	CONSORCIO SANTA MARIA 116
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 17	CONSORCIO TRIPTICO 2024	SOLIUN SAS
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 19	CONSTRUCCIONES B&M S.A.S	CONSTRUCCIONES B&M S.A.S
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 20	UNION TEMPORAL MARCELLA 6	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 21	SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONSORCIO CDG GUAJIRA
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 22	CONSORCIO VERTICE	CAMILO PEDRAZA DÍAZ
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 23	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024	ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 24	CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ	CONSORCIO INTERVENTORES GC 115
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 25	CONSORCIO G25 2024	CONSORCIO OM INGENIEROS
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 26	GRUPO TITANIUM SAS	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

Gracias

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación | icontec | Cámara de Comercio de Bogotá | efr www.masfamilia.org | ISO 9001 SGS CO18/8256 | ISO 14001 SGS CO18/8257 | ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. 5090635 de 2023
LÍNEA EMERGENCIAS

10 SEPTIEMBRE DE 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

PDIE | Contrato No. 5090635 de 2023
Línea Emergencias

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

60 sedes


$ 29.656 Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

ENTREGADOS
41 SEDES – 68%

TERMINADOS
8 SEDES – 14%

EN EJECUCIÓN
11 SEDES – 18%

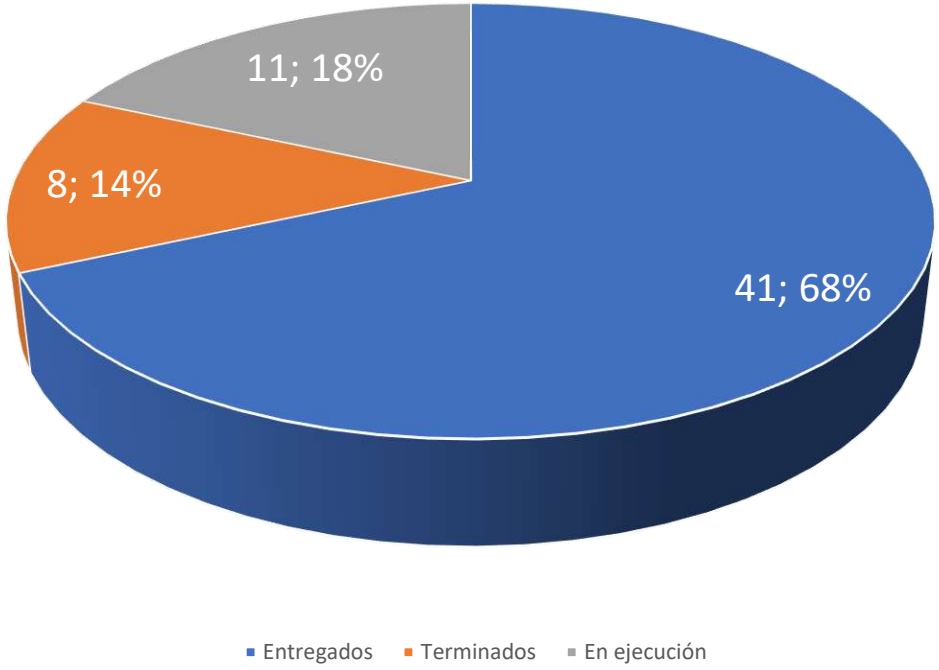

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CRONOGRAMA DE ENTREGAS EMERGENCIAS

60 Mejoramientos

$ 29.656 Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	2024	2025												2026	Total
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Grupo 1	Caquetá - Guaviare- Putumayo	DESPRIORIZADO															
Grupo 2	Nariño - Cauca	EN EJECUCIÓN									3	2					**5**
Grupo 3	Cauca - Valle Del Cauca - Chocó	SUSPENDIDO	5								2						**7**
Grupo 4	Chocó	EN EJECUCIÓN												5			**5**
Grupo 5	Chocó	TERMINADO									6						**6**
Grupo 6	Antioquia - Bolívar - Santander	EN EJECUCIÓN					2				4	1					**7**
Grupo 7	Antioquia - Bolívar - Chocó - Sucre - Risaralda	EN EJECUCIÓN	6						1		9				3	1	**20**
Grupo 8	Antioquia - Bolívar - Córdoba - Sucre	DESPRIORIZADO															
Grupo 9	Cesar - Magdalena	EN LIQUIDACIÓN			6												**6**
Grupo 10	Guajira	LIQUIDADO	4														**4**
Totales			**15**		**6**		**2**		**1**	**1**	**23**	**3**		**5**	**3**	**1**	**60**

25 sedes entregadas 42%

51 sedes entregadas 85%

60 sedes entregadas 100%

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
GRUPO 10 LA GUAJIRA	Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia	**4**	**30/05/2024**	**30/11/2024**	Contrato de Obra: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 27junio25. Contrato de interventoría: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 22agosto25.
GRUPO 7 ANTIOQUÍA, BOLÍVAR, CHOCÓ, SUCRE, RISARALDA, CUNDINAMARCA Y LA GUAJIRA	San Benito Abad, San Onofre, Pueblo Rico, Guática, Balboa, Belén de Umbría, Apía, Loríca, Unguía, Magangué, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Pedro De Urabá, Dibulla, Uribia y Venecia	**16**	3/04/2024	18/12/2025	Inicialmente se entregó 1 sede el 04 de abril del 2024, 2 sedes el 18 de noviembre 2024 y 3 sedes entre el 25-27 de septiembre del 2024, el total se entregaron 6 sedes. El 10 de junio del 2025, se realizó la entrega de la obra de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda. Se realiza entrega de las obras de Carmen de Bolivar, San Onofre, Sede el Jardin, Sede Encanto, Sede Karabi Drua, Sede Belén de Umbría, Sede Iumade, Sikuedo Bichubará en la semana del 11 de agosto al 15 de agosto de 2025.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
GRUPO 9 MAGDALENA Y CESAR	Aracataca, Fundación, Bosconia, Agustín Codazzi, Manaure Balcón Del Cesar, Valledupar	**6**	**15/05/2024**	**30/12/2024**	Terminados y recibidos a satisfacción. Se hizo visita con la Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la misma se elaboraron los documentos aclaratorios, concluyendo que se descontará de la rete garantía contractual un monto de $26.346.567,20. En liquidación (en revisión del equipo de liquidaciones). Se ratificó la aplicación de penal al contratista y a la interventoría por $26.346.567,20, será descontado en la liquidación.
GRUPO 3 CAUCA-VALLE DEL CAUCA-CHOCO	Buenaventura, Florida, Bajo Baudó, Buenos Aires, Puerto Tejada, Santander De Quilichao, Suárez	**5**	**14/05/2025**	26/08/2025	Se entregaron 6 sedes a satisfacción de la comunidad educativa, se estima entregar la última sedes en la primera semana de septiembre para iniciar el proceso de liquidación.
GRUPO 6 ANTIOQUÍA, BOLIVAR, SANTANDER	Puerto Wilches, Cantagallo, Ituango, Santa Bárbara, Segovia, Valdivia	**6**	**20/08/2024**	**20/09/2025**	Se entregaron las sedes de puerto Wilches y Santa Barbara los días 28 y 30 de abril de 2025. Las sedes de Cantagallo, Segovia e Ituango del 17 - 25 de agosto de 2025.
GRUPO 2 NARIÑO – CAUCA	Roberto Payan, El Tambo, López, Balboa, Argelia	**4**	**24/02/2025**	**09/09/2025**	Se entregaron las siguientes Instituciones Educativas: El 15 de julio 11 Fatima ubicada en el municipio Roberto Payan, el 8 de agosto Pablo VI, ubicada en el municipio López de Micay, el 22 de agosto Campo Bello Alto ubicada en el municipio de Balboa y el 3 de septiembre La Paz ubicada en el municipio del Tambo.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS TERMINADOS

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 5 CHOCO	Condoto, Istmina, Medio Baudó, Río Iró, Unión Panamericana, Tadó	**6**	13/11/2024	28/07/2025	100%	100%	Se cogieron los pendientes de obra y se hizo entrega de las sedes a los rectores de las IE excepto sólo la de TADO porque el rector está en licencia de paternidad y retorna el 12sept25; una vez retorne se firmará AERS de esa sede.
GRUPO 3 CAUCA-VALLE DEL CAUCA-CHOCO	Buenaventura, Florida, Bajo Baudó, Buenos Aires, Puerto Tejada, Santander De Quilichao, Suárez	**2**	14/05/2024	26/08/2025	100%	100%	Se programa entrega para el lunes 1 de septiembre de 2025 de la sede Mazamorrero y se programa visita para esa semana a la sede Limbania Velazco, con la etc y el rector con el fin de socializar la entrega y terminación de obras.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES.
GRUPO 2 NARIÑO – CAUCA	Roberto Payan, El Tambo, López de Micay, Balboa, Argelia	**1**	24/02/2025	09/09/2025	99,91%	98,08%	El proyecto presenta un leve atraso en la sede La primavera ubicada en el municipio de Argelia, sin embargo, las sedes 11 Fatima, Pablo VI, Campo Bello Alto y La Paz ubicadas en los municipios Roberto Payan, López de Micay, Balboa y El Tambo respectivamente, se encuentran terminadas, entregadas y recibidas a satisfacción.
GRUPO 4 CHOCO	Bojayá, Medio Atrato, Quibdó, Río Quito, Bajo Baudó.	5	17/10/2024	09/11/2025	50,41%	24,27%	Mediante Comité Técnico No. 288 del 6 de agosto se aprobaron las solicitudes de prórroga por 3 meses para obra e interventoría y adición de $ 72.780.669 por costos fijos interventoría. La sede Mis Esfuerzos en Quibdó presenta ejecución lenta, se iniciaron actividades preliminares en la sede La Soledad del municipio de Rio Quito. Los atrasos por parte del contratista persisten, se dará inicio a la aplicación de la clausula penal Apremio en trámite

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 7 ANTIOQUÍA, BOLÍVAR, CHOCÓ, SUCRE, RISARALDA, CUNDINAMARCA Y LA GUAJIRA	San Benito Abad, San Onofre, Pueblo Rico, Guática, Balboa, Belén de Umbría, Apía, Lorica, Unguía, Magangué, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Pedro De Urabá, Dibulla, Uribia, Venecia y Manaure	**4**	3/04/2024	18/02/2026	60.35%	60.38%	En agosto se realizan las socializaciones de los alcances de las 4 sedes educativas (Venecia – Cundimarca, Media Luna – Uribia, Yawaca – Manaure y Dumingueka – Dibulla) De igual manera, se inicia la ejecución del componente II (obra) en las 4 sedes. El rector de la sede Dumingueka (Dibulla) remitió oficio *(Ver diapositiva No. 22)*, en donde solicita la adición de recursos, con el fin de ampliar el alcance a ejecutar en el componente II, solicitando recursos para: 1. Instalación de sistema fotovoltaico (Dormitorio y comedores) 2. Intervención del comedor (Mejoramiento)

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATO EN EJECUCION

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 6 ANTIOQUÍA, BOLIVAR, SANTANDER	Puerto Wilches, Cantagallo, Ituango, Santa Bárbara, Segovia, Valdivia	**1**	20/08/2024	24/03/2026	92,95%	97,95%	Contrato reiniciado el dia 17 de agosto de 20225 para la terminacion del C.E.R. SANTA INES en el municipio de Valdivia, Antioquia. La cual ya se encuentra en obra blanca y acabados. **Se programa entrega para el 19 de septiembre de 2025.** Se llevo a comité fiduciario el día 02 de septiembre de 2025 y a comité técnico del 09 de septiembre de 2025 la inclusión del CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTO LORENZO sede ESCUELA RURAL MIXTA NUEVO AMANECER, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Y la del I.E.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE INDA SABALETA sede E.R.M. AWA INDA SABALETA - SEDE PRINCIPAL, en el municipio de Tumaco, Nariño. además de una adición y prorroga a ambos contratos. El contratista y la interventoría programan visita para recolección de información entre el 15 y 19 de septiembre para ambas sedes.

CCOM-FO-005 V1 / 05-Ago-2024 / Pública

OTRO SI

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	SEDE	MAT	CODIGO DANE I	Ruta de atencion	Fecha estimada
CHOCÓ	ALTO BAUDO	Julio Mejía Velez	285	127025000498	Adicion grupo 4 de Emergencias	19 de septiembre 2025
VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	IE San Rafael	846	176109000176	Adicion grupo 25 de Mejoramientos	12 de septiembre 2025
VALLE DEL CAUCA	TULUÁ	sede educativa Antonia Santos	358	176834000386		
CAQUETÁ	SOLITA	Chontillosa Medio	67	218860000364	Proceso de estructuracion Grupo 11 de Emergencias	Se estima publicacion para el 29 de septiembre de 2025
CAQUETÁ	PUERTO RICO	Villa del Río	107	218592003941		
CAQUETÁ	FLORENCIA	José Antonio Galán- Sede José	131	218001000921		
CAQUETÁ	FLORENCIA	Villa Hermosa 2. Sede Damas Arriba	16	283001000103		
META	PUERTO CONCORDIA	IE Puerto Iris - Sede San Juan Bosco	15	250577000472		
META	PUERTO CONCORDIA	C.E. Mi Llanura, sede María	12	250450000171		
META	LA MACARENA	IE Héctor Iván Hernández, sede Caño	7	250350000786		
CÓRDOBA	MONTERIA	General Santander sede principal	725	123001002125	Proceso de estructuracion Grupo 11 de Emergencias	Se estima publicacion para el 29 de septiembre de 2025
LA GUAJIRA	MANAURE	Institucion Educativa San Rafael Del	1223	244560000037		
LA GUAJIRA	MANAURE	Institucion Etnoeducativa Rural Julio	814	244560002811		
LA GUAJIRA	RIOHACHA	Institución Educativa Helión Pinedo Ríos - Sede Helión Pinedo	987	144001001941		
LA GUAJIRA	RIOHACHA	Institución Educativa Helión Pinedo	374	144001001916		

Grupo 02

Adjudicación Obra: 20/11/2024
Adjudicación Inter: 20/11/2024

Fecha inicio: 24/2/2025
Fecha Fin: 09/09/2025

PAF - MENPNIE-O- 153 -2024
PAF - MENPNIE-I - 015-2024

Departamento	**Departamentos de Cauca - Nariño**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 1.900.764.019 Interventoría: $ 436.107.137
	Adiciones Obra: $ Interventoría: $
	Valor Pagado Obra: $ 538,635,817 Interventoría: $ 184.266.855
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El proyecto presenta un leve atraso en la sede La primavera ubicada en el municipio de Argelia, sin embargo, las sedes 11 Fatima, Pablo VI, Campo Bello Alto y La Paz ubicadas en los municipios Roberto Payan, López de Micay, Balboa y El Tambo respectivamente, se encuentran terminadas, entregadas y recibidas a satisfacción.

98,08 %
Porcentaje de avance

99,91%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 2

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado	Estado
1	Roberto Payán(San José)	252621000224	SEDE 11 FATIMA	Entregada	Entregada
2	Argelia	219050000089	LA PRIMAVERA (sede principal)	En Ejecución	En Ejecución
3	Balboa	219075000164	CAMPO BELLO ALTO	Entregada	Entregada
4	El Tambo	219256000743	LA PAZ (sede principal)	Entregada	Entregada
5	López de Micay	319418000011	PABLO VI (SEDE PRINCIPAL)	Entregada	Entregada



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 03

Adjudicación Obra: 01/03/2024
Adjudicación Inter: 01/03/2024


Fecha inicio: 14/05/2024
Fecha Fin: 25/08/2025

PAF - MENPNIE-O- 009 -2024
PAF - MENPNIE-I - 009-2024

Departamento	**Departamentos de Cauca - Valle del Cauca - Choco**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 2,637.246.083 Interventoría: $ 539.120.789
	Adiciones Obra: $ 285.623.418,20 Interventoría: Adición N.1 $ 83.009.366,95 Adición N.2 $ 86.117.980
	Valor Pagado Obra: $ 2.294.748.331,74 Interventoría: $ 573.428.188,25
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	OTRO SI N.1: ADICION OBRA POR $ 285.623.418,20 ADICION INTERVENTORIA POR $ 83.009.366,95 Y PRORROGA N.1. POR UN (1) MES DOCE (12) DIAS 24/12/2024 SUSPENSION N.1. 30/12/2024 OTRO SI N.2. PRORROGA N.2. POR UN (1) MES VEINTE (20) DIAS 26/02/2025. SUSPENSION N.2. 21/03/2025 OTRO SI N.3 PRORROGA N.3. POR QUINCE (15) DIAS 07/05/2025. SUSPENSION N.3. 20/05/2025 OTRO SI N.4. ADICION INTERVENTORIA POR $ 86.117.980 PRORROGA N.4. POR UN (1) MES 04/06/2025.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Terminada y entregada la sede LIMBANIA VELAZCO el 28 de agosto de 2025. La sede Mazamorrero terminada y se espera firmar acta de entrega el 2 se septiembre.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 3

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Buenos Aires	MAZAMORRERO (sede principal)	219110000458	En ejecución
2	Puerto Tejada	SAN PEDRO CLAVER (sede principal)	119573000673	Entregada
3	Santander De Quilichao	LICEO LIMBANIA VELASCO (sede principal)	119698001698	Terminada
4	Suárez	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO UNION OLIVARES	219780000149	Entregada
5	Bajo Baudó	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL	227077000245	Entregada
6	Buenaventura	SAGRADO CORAZON DE JESUS	276109000341	Entregada
7	Florida	INSTITUTO LAS AMERICAS	176275000010	Entregada



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 04

Adjudicación Obra: 04/09/2024
Adjudicación Inter:04/09/2024

Fecha inicio: 17/10/2024
Fecha Fin: 09/11/2025

PAF-MENPNIE-O-098-2024
PAF-MENPNIE-I-016-2024

Departamento	**Chocó**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 1.899.188.797,00 Interventoría: $ 437.360.718,00
	Adiciones Obra: Sin adiciones Interventoría: $97.040.892,75 VALOR FINAL: $ 534.401.610,75
	Valor Pagado Obra: $ 400.299.505,48 Interventoría: $ 252.874.594,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión No 1: veinte (20) días calendario del 19 de febrero al 10 de marzo de 2025 Otrosí No 1: Cambio de sede (Boraudó – Lloró por San Pedro Claver - Bajo Baudó) Suspensión No 2: un (1) mes del 20 de marzo al 20 abril de 2025 Prórroga No 1 a la Suspensión No 2: (15) días del 21 de abril al 5 de mayo Otrosí No 2: Prórroga por un (1) mes del contrato de obra y prórroga por un (1) mes y adición de $24.260.223 al contrato de interventoría asumido con cargo a recursos del contratista de obra. Otrosí No 3: Prórroga por tres (3) meses del contrato de obra y prórroga por tres (3) meses y adición de $72.780.669 al contrato de interventoría asumido con cargo a recursos del contratista de obra
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El contratista continua con un avance lento, solo se han iniciado labores en dos (2) de las cinco (5) sedes priorizadas, con respecto a esto, el MEN solicitó revisar el cambio de una sede (La Boba) de la IE Cesar Conto por la sede San José debido a petición de la ETC, para las otras dos sedes aún no se inician actividades, debido a la deficiencia en la organización para la consecución de recursos humanos y logísticos por parte del contratista de obra, impidiendo la ejecución efectiva del proyecto

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

24,27%
Porcentaje de avance


50,41%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 4

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Bojayá	IE CESAR CONTÓ SEDE LA BOBA	227099000095	Por reemplazar
2	Medio Atrato	SEDE VILLA DE BEBARA	227001000564	Por iniciar
3	Quibdó	SEDE MIS ESFUERZOS	127001004158	En ejecución
4	Río Quito	SEDE LA SOLEDAD	227001003181	En ejecución
5	Bajo Baudó	C.E. SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIPAL	221011001675	Por iniciar



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 05

Adjudicación Obra: 04/10/2024
Adjudicación Inter: 04/10/2024

Fecha inicio: 13/11/2024
Fecha Fin: 28/07/2025

PAF-MENPNIE-O-124-2024
PAF-MENPNIE-I-010-2024

Departamento	**Chocó**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 2.335.418.322 Interventoría: $ 477.004.300
	Adiciones Obra: Sin adiciones Interventoría: Sin adiciones
	Valor Pagado Obra: $ 1.868.570.364,75 (80,01%) Interventoría:: $ 354.958.161,14 (74,41%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga N.1 : Comité 161 20 de junio de 2025 por un mes
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se cogieron los pendientes de obra y se hizo entrega de las sedes a los rectores de las IE excepto sólo la de TADO porque el rector está en licencia de paternidad y retorna el 12sept25; una vez retorne se firmará AERS de esa sede.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 5

No	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Condoto	SEDE ARCO	1272050000011	Entregada
2	Istmina	IE PUERTO SALAZAR - SEDE PRINCIPAL	227361001537	Entregada
3	Medio Baudó	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL	127430000021	Entregada
4	Río Iró	IE SAN JOSE DE VIRO VIRO - SEDE PRINCIPAL	227205000067	Entregada
5	Unión Panamericana	IE SAN RAFAEL EL DOS - SEDE PRINCIPAL	327361002538	Entregada
6	Tadó	SEDE SIMON BOLIVAR	227787001127	Terminada



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 06

Adjudicación Obra: 28/05/2024
Adjudicación Inter: 28/05/2024


Fecha inicio: 20/08/2024
Fecha Fin: 24/03/2026

PAF-MENPNIE-O-122-2024
PAFMENPNIE-I-122-2023

Departamento	**Antioquia – Bolívar - Santander**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 2.335.418.318,00 Interventoría: $521.645.409,43
	Adiciones Obra: $ Sin adiciones Interventoría: Valor asumido por el Patrimonio Autónomo $50.171.936,79 Interventoría: Valor asumido por el contratista $ 5,574659,64 Interventoría: Valor asumido por el contratista $ 14.000.000,00
	Valor Pagado Obra: $ $ 2.257.454.679,41 Interventoría: $ 438.065.967,42
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga No.1 obra e interventoría: 2 meses y 15 días el día 06 abril del 2025 Suspensión 1 obra e interventoría: 2 meses. (Del 17/06/2025 al 17/08/2025) Prorroga No.2 obra e interventoría: 1 mes. (Del día 17/08/2025 al 17/09/2025)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se reinicia el contrato el día 17 de agosto de 2025, para la terminación de la sede C. E. R. SANTA INES en el municipio de Valdivia, Antioquia. Y terminar la construcción de un aula académica por reposición. Se lleva a comité Fiduciario y Técnico la inclusión de la CER. ALTO LORENZO sede ESCUELA RURAL MIXTA NUEVO AMANECER, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Y la del I.E.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE INDA SABALETA sede E.R.M. AWA INDA SABALETA - SEDE PRINCIPAL, en el municipio de Tumaco, Nariño. Junto a una prórroga y adición para ambos contratos entre el 02 y el 09 de septiembre de 20225.

97,95%
Porcentaje de avance


92,63%
Porcentaje Programado

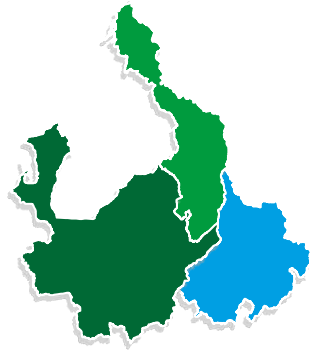

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 6

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Ituango	LA LOMITA	205361000821	Entregada
2	Santa Bárbara	I. E. EL GUAYABO	205679000331	Entregada
3	Segovia	C. E. R. SANTA ISABEL DE AMARA	205736000556	Entregada
4	Valdivia	C. E. R. SANTA INES	205854000277	En Ejecución
5	Cantagallo	SEDE SINZONA	213670001125	Entregada
6	Cantagallo	SEDE PATICO BAJO	213670001125	Entregada
7	Puerto Wilches	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	168575000418	Entregada
Otrosí 2	Puerto Asís	ESCUELA RURAL MIXTA NUEVO AMANECER	286568005865	Est. Y Diseños
Otrosí 2	Tumaco	E.R.M. AWA INDA SABALETA - SEDE PRINCIPAL	452835006601	Est. Y Diseños

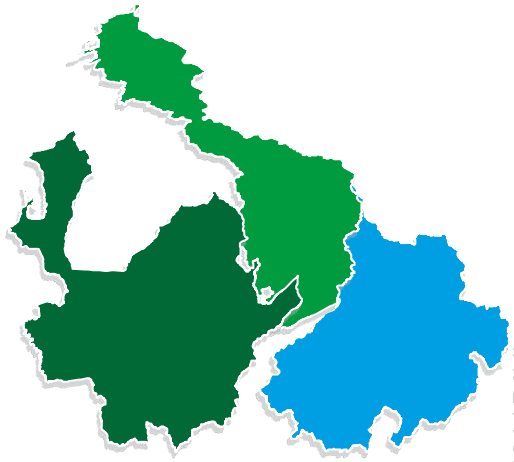

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 07

PAF-MENPNIE-O-004-2024
PAF-MENPNIE-I-004-2024

Adjudicación Obra: 20/02/2024
Adjudicación Inter: 20/02/2024

Fecha inicio: 03/04/2024
Fecha Fin: 18/02/2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Antioquía, Bolívar, Guajira, Chocó, Sucre y Risaralda**	
$	**Valor Inicial** Obra: $2.254.604.891 Interventoría: $ 471.983.203,00	
	Adiciones Obra: $3.972.575.976,14 + 1.620.940.225,26+3.567.859.345,46 + 2.434.972.236 Interventoría: $519.272.174,90+333.558.195,53 + 265.027.764	
	Valor Pagado Obra: $ 7.034.407.084,61 Interventoría: $ 564.411.2498,13	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**Obra** Adición No. 1: 3.926.727.825,14 Prórroga No.1: 9 meses Adición No. 2: 1.620.940.225,29 Prórroga No.2: 4 meses Adición No. 3: 3.567.859.345,43 Prórroga No.3: 2 meses Adición No.4: 2.434.972.236	**Interventoría** Adición No. 1: 504.272.174,86 Prórroga No.1: 9 meses Prórroga No.2: 4 meses Adición No. 2: 333.558.195,57 Prórroga No.3: 2 meses Adición No.3: 265.027.764
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En agosto se realizan las socializaciones de los alcances de las 4 sedes educativas (Venecia – Cundimarca, Media Luna – Uribia, Yawaca – Manaure y Dumingueka – Dibulla) De igual manera, se inicia la ejecución del componente II (obra) en las 4 sedes. El rector de la sede Dumingueka (Dibulla) remitió oficio (Ver diapositiva No. 22), en donde solicita la adición de recursos, con el fin de ampliar el alcance a ejecutar en el componente II, solicitando recursos para: 1. Instalación de sistema fotovoltaico (Dormitorio y comedores) 2. Intervención del comedor (Mejoramiento)	

60.38%
Porcentaje de avance

60.35%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 07 - Solicitud adición Rector Dumingueka

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL DUMINGUEKA
NIT: 900298951-3/ DANE: 244090800007
RESOLUCIÓN 251 NOV 2008, 233 DEL 2011 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Dumingueka, 01 de septiembre de 2025.

Señores,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
FINDETER
CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024

Asunto: Solicitud de Adición de Recursos – Institución Etnoeducativa Internado Rural Dumingueka.

Respetados señores, En calidad de Rector de la Institución Etnoeducativa Internado Rural Dumingueka, me permito solicitar de manera atenta la evaluación y aprobación de una adición de recursos o ampliación del alcance del proyecto actualmente en ejecución.

El alcance inicial contempló la intervención en dormitorios y aulas con cambio de cubiertas, estructura y suministro e instalación de paneles solares. No obstante, en los dormitorios únicamente se incluyó el cambio de cubierta, sin la instalación del sistema fotovoltaico, lo cual limita la funcionalidad y el aprovechamiento energético en estas áreas.

De igual forma, se hace necesario priorizar la intervención del comedor escolar, espacio esencial para la comunidad educativa, pues allí los estudiantes reciben diariamente sus alimentos. El estado actual del comedor presenta un avanzado deterioro y no garantiza condiciones adecuadas ni seguras, por lo que su mejoramiento resulta urgente.

Es importante precisar que, según la socialización realizada por el contratista, ni la instalación de paneles solares en los dormitorios ni la intervención del comedor fueron incluidas dentro del alcance inicial del contrato.

Por lo anterior, en representación de la comunidad educativa, solicito respetuosamente que se consideren los recursos necesarios para suplir estas necesidades prioritarias, con el fin de garantizar ambientes dignos, seguros y funcionales para nuestros estudiantes.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a una respuesta favorable.

Atentamente,

Arregocés Coronado Z.

Arregocés Coronado Zarabata
Rector
Institución Etnoeducativa Internado Rural Dumingueka.


INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL DUMINGUEKA INTERNADO RURAL
RECTOR

Recibido Por:
Arq. Lorena Mendoza
03/Septiembre/2025

Sedes Educativas Grupo 7

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	San Pedro De Urabá	C. E. R. SAN EMIGDIO	205665000789	Entregada
2	Magangué	ILUSION	113430002171	Entregada
3	San Jacinto	SAN JOSE DE MORENA ABAJO	213654000038	Entregada
4	Unguía	IE ALCIDES FERNANDEZ - SEDE PRINCIPAL	427800000461	Entregada
5	San Benito Abad	SEDE PRINCIPAL LA CEIBA	270678000199	Entregada
6	Lorica	SEDE PRINCIPAL	213654000038	Entregada
7	Pueblo Rico	SEDE BICHUBARA	266572001407	Entregada
8	Pueblo Rico	SEDE SIKUEDO	266572001407	Entregada
9	Pueblo Rico	SEDE IUMADE	266572001407	Entregada
10	Guática	SEDE MARMOLEJO ALTO	166318000650	Entregada
11	Balboa	SEDE KARABI DRUA	166075000010	Entregada
12	Belén de Umbría	SEDE FLOR DEL MONTE	166088000027	Entregada
13	Apía	SEDE EL JARDIN	266045000681	Entregada
14	Apía	SEDE EL ENCANTO	266045000681	Entregada
15	San Onofre	SEDE EL PEÑON	270713000202	Entregada
16	El Carmen de Bolívar	SEDE SANTO DOMINGO DE MEZA	213244001070	Entregada
17	Uribia	SEDE MEDIA LUNA	244847004025	En ejecución Fase II
18	Dibulla	SEDE DUMINGUEKA	244090800007	En Ejecución Fase II
19	Venecia	SEDE VENECIA PRINCIPAL	125506000197	En Ejecución Fase II
20	Manaure	YAWACA	244560000240	En Ejecución Fase II

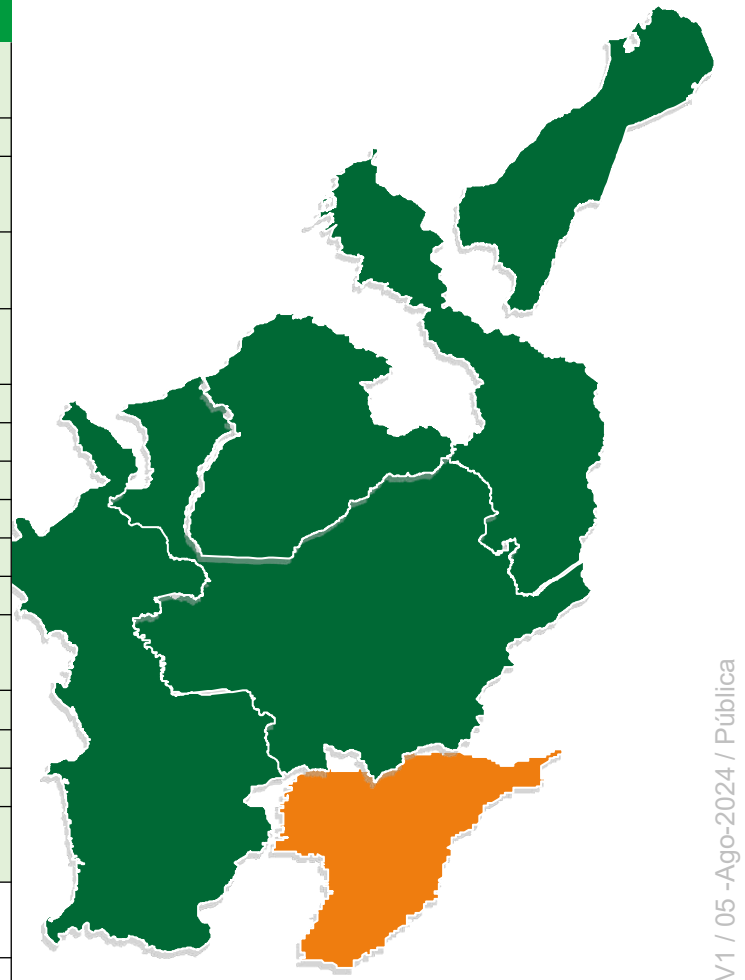

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 09

Adjudicación Obra: 20/03/2024
Adjudicación Inter: 20/03/2024

Fecha inicio: 15/05/2024
Fecha Fin: 30/12/2024

PAF-MENPNIE-O-021-2024
PAF-MENPNIE-I-019-2024

Departamento	**Cesar y Magdalena**
$	**Valor Inicial** Obra: $2.256.714.724 Interventoría: $471.983.203
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 0
	Valor Pagado Obra: $ $ 2.256.714.724,00 Interventoría: $ 439.377.638,27
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí 1 – Aclaración códigos DANE Otrosí 2 – Inclusión NP Otrosí 3 – Inclusión NP
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Terminados y recibidos a satisfacción. Se hizo visita con la Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la misma se elaboraron los documentos aclaratorios, concluyendo que se descontará de la rete garantía contractual un monto de $26.346.567,20. En liquidación (en revisión del equipo de liquidaciones). Se ratificó la aplicación de penal al contratista y a la interventoría por $26.346.567,20, se descontará en la liquidación.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado




CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 9

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Bosconia	INSTITUCION EDUCATIVA ELOY QUINTERO ARAUJO	120060000072	Entregada
2	Agustín Codazzi	IE NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI	120013000463	Entregada
3	Manaure Balcón Del Cesar	SEDE SABANAS DE LEON	220443000275	Entregada
4	Valledupar	VILLA CORELCA	120001003602	Entregada
5	Aracataca	COL JOHN F KENNEDY	147053000488	Entregada
6	Fundación	CENT EDUC 16 DE JULIO	147288000094	Entregada



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 10

Adjudicación Obra: 27/03/2024
Adjudicación Inter: 27/03/2024

Fecha inicio: 30/05/2024
Fecha Fin: 30/11/2024

PAF-MENPNIE-O-023-2024
PAF-MENPNIE-I-021-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**LA GUAJIRA**
$	**Valor Inicial** Obra: $1.465.491.420; Interventoría: $337.131.848
	Adiciones Obra: $0 ; Interventoría: $0
	Valor Pagado Obra: $1.465.491.420 (100,00%) Interventoría: $337.131.848 (100,00%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 27junio25. Contrato de interventoría: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 22agosto25.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 10

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Maicao	SEDE MARIA EUGENIA	144430000499	Liquidado
2	Manaure	ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU	244560000240	Liquidado
3	Riohacha	ALMIRANTE PADILLA	144001001151	Liquidado
4	Uribia	AIPIR	244847800106	Liquidado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATISTAS OBRA E INTERVENTORIA

LINEA EMERGENCIAS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Grupo	Contratista de obra	Consorciados de obra	Contratista Interventoría	Consorciados de Interventoría
2	CONSORCIO GRUPO 2	*JUAN CARLOS VALENCIA *SISA INGENIEROS ARQ.SAS *ANDRES FELIPE PERAFAN	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES	*CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA *CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S
3	HUGO FRANCISCO HINESTROZA	N/A	UNION TEMPORAL SEDES 24	N/A
4	UNIÓN TEMPORAL OLCE CARIBE	*JUSONAWA FOUNDATION *ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ	CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T-CCA G4	* 5T SAS BIC * CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA
5	SERVINGTECH S.A.S.	N/A	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	N/A
6	CONSORCIO GRUPO 6 2024	*JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ *INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S.	JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR	N/A
7	CONSORCIOS MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	*MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES *UCROS & UCROS CONSTRUCTORES S.A.S	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	N/A
9	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	N/A	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	N/A
10	CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024	*ARMANDO MEDINA ALBIS *EDWIN MEZA PINEDA	CONSORCIO GUAJIRO 021	*GEOVANNY MONCAYO PALACIOS *CONSULTAR CON PROFESIONALES SAS

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación
icontec
Cámara de Comercio de Bogotá
efr www.masfamilia.org
ISO 9001 SGS CO18/8256
ISO 14001 SGS CO18/8257
ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. 5090635 de 2023
LÍNEA CONSULTORIA

10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

PDIE | Contrato No. 5090635 de 2023
Línea Consultoría

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Estado de entrega y ejecución de Sedes

6 sedes

6 grupos


$4.432 Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

EN EJECUCION
2 PROYECTO 17%

EN ESTRUCTURACIÓN
3 PROYECTOS 50%

EN LEGALIZACION
1 PROYECTO 33%

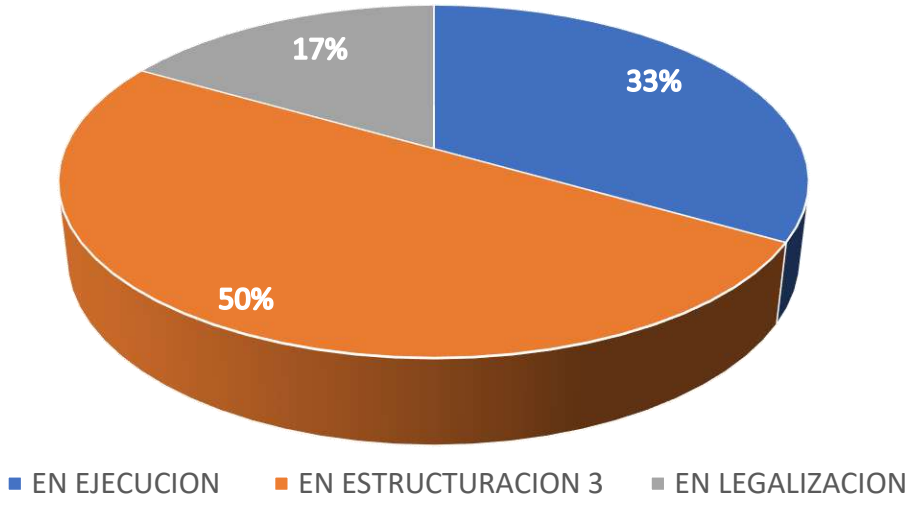

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

LINEA DE DISEÑOS

6 Diseños

$ 4.432 Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	Entregas 2024	2025										Total
				MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Grupo 1	Cundinamarca (2 Soacha)	DESPRIORIZADO												
Grupo 2	Putumayo (1. P. Leguizamo)	EN EJECUCION									1			1
Grupo 4	Cauca (1. Caldono)	DESPRIORIZADO												
Grupo 5	Choco (1. Quibdó) – Carrasquilla	EN EJECUCION									1			1
Grupo 6	Chocó (1. Quibdó) – Santo Domingo de Guzman	PRIORIZADO ESTRUCTURACIÓN									1			1
Grupo 7	N. de Santander (1.Tarra)	En Perfeccionamiento Legalización										1		1
Grupo 8	SIMES - Tibu – El Tarra - Convención	DESPRIORIZADO												
Grupo 10	CHOCÓ – Boraudó	PRIORIZADO – ESTRUCTURACIÓN											1	1
Grupo 11	Chocó – Pogue	PRIORIZADO ESTRUCTURACIÓN											1	1
	TOTAL										**3**	**1**	**2**	**6**

1ER TRIMESTRE **2DO TRIMESTRE** **3ER TRIMESTRE** **4TO TRIMESTRE**
17 sedes entregadas - 100%

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
2	PUERTO LEGUIZAMO	1	4/08/2025	04/03/2026	12,13%	10,94%	Se realizó el taller de socialización con la alcaldía de Puerto Leguizamo y el departamento de Putumayo como ETC el 29 de agosto de 2025, en el cual se evidenció inconsistencias en la matrícula entre la ETC y el municipio, lo cual se entregó la documentación oficial y actualizada por la ETC el 9 de septiembre y se remitió al consultor y a la interventoría para mejorar las propuestas de los esquemas básicos y presentarlas ante la ETC, alcaldía y MEN.
5	CHOCÓ CARRASQUILLA	1	28/07/2025	27/02/2026	11,93%	9,27%	Se realizó el taller de socialización con la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó, la secretaría de Planeación y la I.E. Carrasquilla el 4 de septiembre de 2025 para exponer los 3 esquemas básicos realizados por el consultor. Se está pendiente la programación para la socialización con el MEN.

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

Grupo 2-Puerto Leguizamo

Adjudicación Obra: 27/03/2025 **Fecha inicio**: 04/08/2025 PAF-MENPNIE-C-003-2024
Adjudicación Inter: 27/03/2025 **Fecha Fin**: 04/03/2026 -PAF-MENPNIE-I-022-2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Putumayo**	
	CONSULTORÍA: **CONSORCIO MCHP LEGUIZAMO** CARLOS ALONSO CHAMAT REYES Representante Legal	**INTERVENTORIA:** **CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS SAS** ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA Representante Legal
$	**Valor Inicial** Consultoría: $ 487.378.780,00 Interventoría: $ 309.932.280,00	
	Adiciones N/A	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	**Se recibe Nro de estudiantes actualizados a 2025 por parte de la ETC.**	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se realizó el taller de socialización con la alcaldía de Puerto Leguizamo y el departamento de Putumayo como ETC el 29 de agosto de 2025, en el cual se evidenció inconsistencias en la matrícula entre la ETC y el municipio, lo cual se entregó la documentación oficial y actualizada por la ETC el 9 de septiembre y se remitió al consultor y a la interventoría para mejorar las propuestas de los esquemas básicos y presentarlas ante la ETC, alcaldía y MEN.	

10,94%
Porcentaje de avance

12,13%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 5- Carrasquilla

Adjudicación Obra: 06/03/2025
Adjudicación Inter: 06/03/2025

Fecha inicio: 28/07/2025
Fecha Fin: 27/02/2026

PAF-MENPNIE-O-083-2024
PAF-MENPNIE-I-014-2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Chocó**	
	CONSULTORÍA: **CONSORCIO MCHP CARRASQUILLA** CARLOS ALONSO CHAMAT REYES Representante Legal	**INTERVENTORIA:** **CONSORCIO INTERVENTORÍA QUIBDÓ** JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ Representante Legal
$	**Valor Inicial** Consultoría: $ 478.779.840,00 Interventoría: $ 262.253.960,00	
	Adiciones N/A	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	N/A	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se realizó el taller de socialización con la Secretaría de Educación Municipal de Quibdó, la secretaría de Planeación y la I.E. Carrasquilla el 4 de septiembre de 2025 para exponer los 3 esquemas básicos realizados por el consultor. Se está pendiente la programación para la socialización con el MEN.	

9,27%
Porcentaje de avance

11,93%
Porcentaje Programado



-2024 / Pública

CONTRATOS EN PERFECCIONAMIENTO

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA ADJUDICACION OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERV	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
7	NORTE SANTANDER TARRA 	1	28/01/2025	28/01/2025	$ 453.065.330	$ 169.705.119	30/09/2025	El viernes 27 de junio de 2025 se radica oficio solicitando la directriz a seguir con el grupo. Findeter se encuentra a la espera de la instrucción que debe venir expresamente por el MEN. Al día de hoy se espera la respuesta del anterior oficio por parte del MEN. Se llevó a cabo mesa de trabajo el 15 de julio de 2025 con la supervisión de parte del MEN, la coordinación del FFIE y el contratista de JGF y TIC. Se remite un oficio a la alcaldía de El Tarra, el día 06 de agosto de 2025. Solicitando información sobre los supuestos otros 2 proyectos que se encuentran al parecer en el mismo predio del contrato nuestro de consultoría. A la fecha de este comité no se cuenta con respuesta por parte del ente territorial. Al no contar con respuesta de la alcaldía municipal se remite oficio a la Entidad Territorial Certificada el día 22 de agosto de 2025 solicitando la matricula estimada para el municipio y el estado del proyecto en cualquier otra dependencia. Desafortunadamente al día de hoy no se cuenta con ninguna respuesta por parte de ninguno de los dos entes gubernamentales antes mencionados.

CCOM-FO-005-24 // 05-Ago-2024 // Pública

CONTRATOS EN ESTRUCTURACIÓN

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA ADJUDIC OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERV	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
6	CHOCÓ SANTO DOMINGO	1	30/09/2025	30/09/2025	$ 685.426.270,00	$409.932.280,00	30/10/2025	Los estudios previos firmados y avalados se presenta formalmente a Contratación el 9/09/2025, se espera pre comité y comité de contratación.
10	CHOCÓ BOJAYA (Pogue)	1	15/10/2025	15/08/2025	$ 360.000.000	$ 252.000.000	15/11/2025	Por instrucción del Ministerio de Educación Nacional en comité de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se reinicia el proceso de estructuración de los estudios previos y términos de referencia para la Institución Educativa Bojayá Sede Pogue. Se inició el proceso para suscripción de convenio interadministrativo derivado con los municipios. Se recibe respuesta por parte del Municipio en cuanto a la documentación para la viabilidad jurídica del predio sin embargo, esta corresponde a un convenio que Involucra al Ministerio de Vivienda y a la Unidad de atención del riesgo de desastre por lo cual solicitamos al MEN acompañamiento para definir los procesos que continúan al entorno del proyecto considerando esta novedad.
11	CHOCÓ LLORÓ (Boraudo)	1	15/09/2025	15/08/2025	$ 360.000.000	$ 252.000.000	15/10/2025	Por instrucción del Ministerio de Educación Nacional en comité de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se reinicia el proceso de estructuración de los estudios previos y términos de referencia para la Institución Educativa Boraudó sede Principal. Los Estudios previos se encuentran aprobados y revisados por la parte técnica, jurídica y social de Findeter,. El municipio informa que cuentan con un proyecto para la Construcción de la I.E. Por la cual se solicita información oficial acerca del proyecto para exponer la situación ante el MEN y tomar las decisiones correspondientes.

CCOM-FO-005-V1 / 05-Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN ESPERA DE DEFINICIÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA ADJUDIC OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERV	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
1	CUNDINAMARCA SOACHA LAS VEGAS	1	16/07/2025	16/07/2025	$ 685.426.270,00	$ 409.932.280,00	15/08/2025	Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto
	CUNDINAMARCA SOACHA CIUDAD VERDE	1	16/07/2025	16/07/2025	$ 685.426.270,00	$ 409.932.280,00	15/08/2025	Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto
4	CAUCA CALDONO	1	16/07/2025	16/07/2025	$ 383.559.190,00	$210.615.810,00	15/09/2025	Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto
8	NORTE SANTANDER SIMES	6	17/09/2025	01/09/2025	$420.839.400	$345.059.030	01/10/2025	Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación
icontec
Cámara de Comercio de Bogotá
efr www.masfamilia.org
ISO 9001 SGS CO18/8256
ISO 14001 SGS CO18/8257
ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. 5090635 de 2023
LÍNEA ESTRATÉGICOS

10 SEPTIEMBRE DE 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

Estado de entrega y ejecución de Sedes Línea Estratégicos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

31 sedes

$ 71.840
Millones de pesos


Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

EN EJECUCION
8 sedes- 29%

SUSPENDIDOS
2 sedes- 7%

POR INICIAR
17 sedes -50%

ENTREGADOS
4 sede -14%

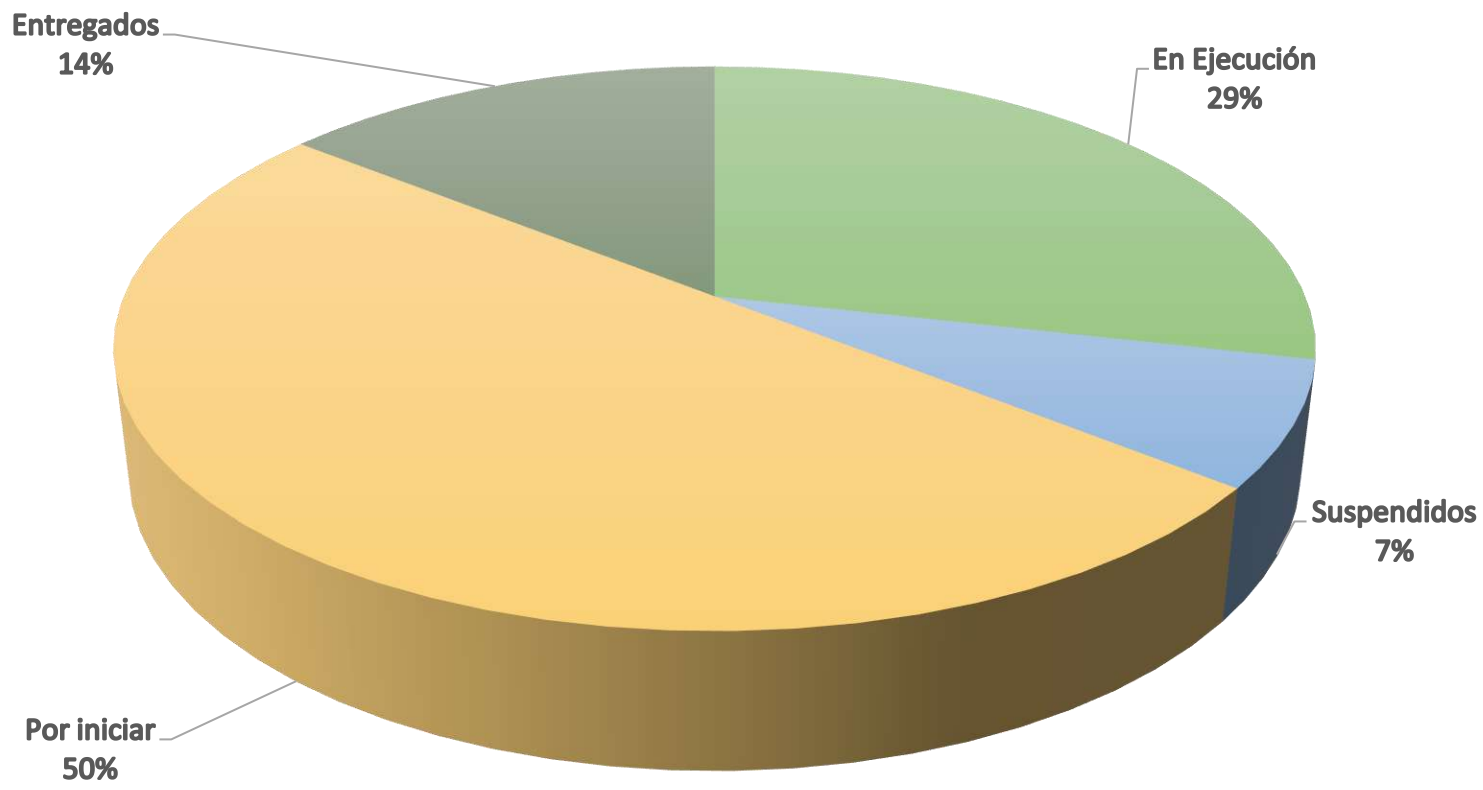

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

LINEA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

31 Estratégicos

$ 71.840 Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	ENTREGA 2024	2025										2026	TOTAL
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic		
Grupo 1	Tolima (Ibagué) 13 meses	EN EJECUCION											1		**1**
Grupo 2	Chocó (San José) 12 meses	SUSPENDIDO												1	**1**
Grupo 3	Cundinamarca (Soacha) 11 meses	EN EJECUCION												1	**1**
Grupo 6	Chocó (Litoral de San Juán) 5 meses	DESPRIORIZADO												0	**0**
Grupo 7	Chocó (Litoral de San Juán) 4 meses	EN EJECUCION												4	**4**
Grupo 8	Nariño (Olaya Herrera) 8 meses	DESPRIORIZADO												0	**0**
Grupo 9	Cauca (Mercaderes) 9 meses	PERFECCIONAMIENTO												1	**1**
Grupo 10	Cauca (Totoró) 9 meses	PERFECCIONAMIENTO												1	**1**
Grupo 11	Nariño (Colón) 11 meses	SUSPENDIDO												1	**1**
Grupo 12	Sucre (Caimito) 10 meses	EN EJECUCION												1	**1**
Grupo 14	Huila (Palestina, La Argentina, La Plata) 4 meses	ENTREGADO						4							**4**
Grupo 18	Bolivar (Mompox) 10 meses	EN EJECUCION												1	**1**
Grupo 20	Playon (Santander) 12 meses	ESTRUCTURACIÓN												12	**12**
Grupo 21	Vijes (Valle del Cauca) (pendiente)	ESTRUCTURACIÓN												1	**1**
Grupo 22	Riosucio (Chocó) (pendiente)	ESTRUCTURACIÓN												1	**1**
Grupo 23	Samaniego (Nariño) (pendiente)	ESTRUCTURACIÓN												1	**1**
		TOTAL		0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	26	**31**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 14 CRIHU	Huila	4	30/07/2024	29/01/2025	Se radica el Prisa con numero INC 2025-001930 correspondiente al proceso de liquidación del contrato de Obra.. 22/08/2025 se recibe el acta de entrega del contrato de interventoría suscrita por Fiduagraria.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 01 Ibagué	Ibagué	1	20/01/2024	30/09/2025	88,50%	89,29%	03/09/2025 se cita comité técnico 292: Solicitud: PARA EL CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENPNIE-O-127-2023 que tiene por objeto: "LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" Adición por la suma de cuatro mil seiscientos noventa y seis millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos ($4.696.049.474), con cargo a recursos del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635 de 2023.Prórroga al plazo del contrato por el plazo de tres (3) meses. Solicitud: PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MENPNIE-I-125-2023 que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" Adición por la suma trescientos dieciocho millones quinientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos con sesenta y ocho centavos ($318.569.164,68), con cargo a recursos del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635 de 2023. Prórroga al plazo del contrato por el plazo de tres (3) meses.
Grupo 3 El charquito Soacha	C/marca	1	25/01/2025	03/02/2026	5,35%	4,72%	Actualmente en prorroga No. 5 por 1,5 meses sin adición de recursos desde el 24/08/2025 sin reprogramación del alcance inicial. Mediante oficio con ref. 2202552023566 del 21/08/2025, se radica al Municipio el requerimiento de recursos en cumplimiento del fallo de acción popular, frente a o cual Soacha responde el 05/09/2025 en oficio ref. SEM-DE-PE-2145-2025, que requiere el Otro Sí N°1 del convenio para aportar en 2 pagos el valor de $3.836.666.568 (Pago 1 $900 millones en septiembre; Pago 2 $2.936.666.569en octubre), no incluye costos adicionales por obras de mitigación por valor de $174 millones para estudios y diseños de obras de canalización de la quebrada). En proceso incumplimiento y aplicación del Apremio No. 1 por $135.807.901,06 al contrato de obra

GCOM-FO-005-V4 / 05 - Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 07 Litoral del San Juan (Indígena)	Choco	4	9/01/2025	30/09/2025	67,47%	1,17%	A la fecha persiste el incumplimiento por parte del contratista CONSORCIO PRO -INSTITUCIONES CHOCÓ – INDÍGENAS a los compromisos pactados para el cierre integral del componente I del proyecto. Por lo cual, la interventoría presenta la solicitud de ratificación de la cláusula de apremio la cual se tramitó por la supervisión y se encuentra en el área jurídica. Se pactó compromiso para entrega el 26 de agosto de 2025 el cual fue incumplido nuevamente por lo que se citó a representantes legales a reunión con Secretaría con nuevo compromiso de entrega el 12 de septiembre de 2025. En proceso apremio n°2 por retrasos. El contratista solicita prórroga por 2 meses para terminación de las actividades.
Grupo 18 Colegio Pinillos Mompox	Bolívar	1	03/06/2025	20/05/2026	6,16%	5,20%	La interventoría entregó el producto del componente eléctrico el 1 de septiembre de 2025 y se está en revisión por la supervisión, el producto estructural se encuentra subsanado y en revisión por la interventoría. Se proyecta presentación del concepto técnico ante el Distrito de Mompox y Ministerio de Cultura para el 12 de septiembre de 2025.

GCOM-FO-005-V1 / 05-Ago-2024 / Pública

CONTRATO PROXIMO A EJECUTAR – CIERRE ET 1 E INICIO ET 2

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA ULTIMA SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	% PROG	% EJEC	ALERTAS
Grupo 12 San Juan Bautista Caimito	Sucre	1	19/07/2024	19/05/2025 supeditada al inicio etapa 2	30/04/2025	13/08/2025	7,30%	7,30%	El 28/08/2025 el MEN atreves de correo electrónico prioriza la Intervención del alcance para la ejecución de la etapa 2 caimito probando la alternativo 2... El 05 al 09 de septiembre 2025 se cita comité técnico N°294 en el cual se instruye la aprobación para los modificatorios a los contratos derivado 0bra e Interventoría en el cual se adiciona recursos al contrato de obra por $ $1.059.398.902,12 y una prorroga de 2 meses. Y para el contrato de Interventoría una adición por el valor $56.765.034,50 y prorroga de 2 meses. derivado de esta aprobación del comité técnico y se procede citar comité fiduciario de acuerdo al manual operativo. Una vez legalizados los modificatorio se procederá a la suscripción del acta de inicio etapa 2 proceso que se espera que se de entre la semana del 15 al 19 septiembre.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS SUSPENDIDOS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA ULTIMA SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	% PROG	% EJEC	ALERTAS
Grupo 2 San José del Palmar	Chocó	1	09/06/2025	09/08/2026	05/08/2025	05/10/2025	1,00%	0,28%	El proyecto se suspendió en comité técnico realizado del 5 al 6 de agosto, por un plazo de 2 meses, ya que el lote entregado por el municipio para ejecutar el proyecto, tiene un área de 4098 m2, la cual es muy inferior al área de 11.155 m2 que aparece en los productos entregados por el municipio como insumo para la ejecución del proyecto. Se realizó visita conjunta al municipio de San José del Palmar en la cual el municipio quedo con el compromiso de adelantar acciones de delimitación, escrituración y cambios de uso de suelo del área total del lote a Intervenir.
Grupo 11 San Carlos Colon	Nariño	1	11/10/2024	13/03/2026	10/06/2025	14/08/2025	4,04%	4,04%	El proyecto se encuentra actualmente SUSPENDIDO debido al tiempo de desarrollo de los tramites: LICENCIA: Aprobada por municipio en espera de fechar, tan pronto se cuente con la versión final del presupuesto que determine el alcance contractual y el adicional que se requeriría VERTIMIENTOS: Ya se cuenta con el permiso emitido por Corponariño. ELECTRICO: Ya se cuenta con la aprobación el diseño eléctrico serie 1 por parte de Cedenar. PREUPUESTO: Debido a las modificaciones en el diseño se realiza revisión en el presupuesto general, para buscar el balance contractual y/o la adición de recursos de ser necesaria.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS POR INICIAR EN LEGALIZACION

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA DE ADJUDICACION OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
Grupo 10 Totoró	Cauca	1	21/03/2025	21/03/2025	$2.380.838.350	$ 278.908.930	30/09/2025	Contratos Legalizados, inicio a la espera de suscripción convenio multipartita: el 29/08/2025 en reunión con GOBERNACIÓN , MEN y FINDETER, la gobernación solicitó nuevos ajustes en relación con la minuta remitida el 28/07/2025 mediante oficio 2202552022577, para lo cual FINDETER remitió nueva minuta el 03/09/2025 con radicado 2202552024162. Se ajustó matrícula SIMAT a 175 estudiantes en mesa de trabajo del 19/08/2025 entre ETC, MEN, CABILDO y FINDETER.
Grupo 9 Mercaderes	Cauca	1	25/10/2024	25/10/2024	$5.067.512.140	$598.387.062	30/08/2025	El 29 de agosto de 2025 se realizó la socialización jurídica de los convenios con la ETC del Cauca y su equipo jurídico, en compañía del MEN y el equipo técnico y jurídico de Findeter. Se coordinó ajustar el convenio con base en las recomendaciones entregadas, lo cuál fue remitido el miércoles 3 de septiembre de 2025 para la revisión y validación por parte de la ETC. Estamos a la espera de la respuesta por parte de la ETC para continuar con el proceso de firma de las respectivas entidades

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS POR INICIAR EN ESTRUCTURACIÓN

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE ADJUDICACION OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
Grupo 20 Playón	Santander	12	15/11/2025	15/11/2025	$ 4.408.815.174	$ 373.687.080	15/11/2025	Estudios previos de obra e interventoría estructurados, será remitido al área de contratación derivada el 27 de agosto de 2025 para adelantar las revisiones y subsanar las observaciones que presenten. Después del comunicado enviado a la gobernación reiterando la revisión del convenio tripartito el 13 de agosto de 2025, se le reitera por TERCERA VEZ el 27 de agosto por medio de oficio No. 2202552023763 para tener respuesta favorable u observaciones para revisión y ser subsanado. En información recibida por la ETC nos informan que el convenio está en el área jurídica

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN ESTRUCTURACIÓN OTROSI

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA ADJUDIC OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERV	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
21	Valle del Cauca Vijes	1	15/10/2025	15/10/2025	$ 2.250.000.000	$ 250.000.000	15/12/2025	De acuerdo con las observaciones remitidas por Findeter, solicitamos al municipio enviar el certificado de libertad y tradición del predio para continuar el proceso. A la fecha nos encontramos a la espera de este documento. El 29 agosto 2025 se realizó la visita técnica en compañía de la alcaldía, gobernación y rector de la institución.
22	Chocó Riosucio	1	15/10/2025	15/10/2025	$ 18.200.574.574	$2.022.286.063	15/12/2025	Desde la parte jurídica de Findeter el predio es viable, sin embargo, nos encontramos a la espera de la ficha jurídica correspondiente. De manera paralela con la supervisión se está estructurando convenio Interadministrativo y nos encontramos a la espera de la información técnica por parte del Municipio para tramitar esta viabilidad. El 8 de septiembre se lleva a cabo visita técnica a la IE en compañía de la ETC y la alcaldía de Riosucio.
23	Nariño Samaniego	1	15/10/2025	15/10/2025	$ 9.450.000.000	$ 1.050.000.000	15/12/2025	La información para la viabilidad jurídica está siendo revisada por el área encargada de Findeter. Nos encontramos a la espera de las consideraciones producto de la revisión para continuar con las acciones correspondientes. El 27 de agosto 2025 se realizó visita técnica por parte de Findeter, alcaldía, gobernación y rector de la IE, de la cual resulta la necesidad por parte de la comunidad para socializar los motivos por los cuales se reubicará la institución

COM-FO-005 V1 / 05 Ago 2024 / Pública

CONTRATOS EN ESPERA DE DEFINICIÓN

GRUPO	DPTO	No SEDES	FECHA ADJUDICACION OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
Grupo 6 Litoral del San Juan	Chocó	6	26/06/2025	26/06/2025	$ 3.365.512.244	$ 479.938.720	N/A	Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el MEN en reunión de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se determinó la No Viabilidad del proyecto. Findeter se encuentra a la espera a la oficialización de las despriorizaciones por parte del MEN, para llevar a cabo comité técnico y fiduciario.
Grupo 08 Sanquianga	Nariño	9	30/06/2025	30/06/2025	5.481.327.745	$557.379.220	N/A	Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el MEN en reunión de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se determinó la No Viabilidad del proyecto. Findeter se encuentra a la espera a la oficialización de las despriorizaciones por parte del MEN, para llevar a cabo comité técnico y fiduciario.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 01-Ibagué

Adjudicación Obra: 28/02/2024
Adjudicación Inter: 28/02/2024

Fecha inicio: 29/07/2024
Fecha Fin: 30/09/2025

PAF-MENPNIE-O-127-2023
PAF-MENPNIE-I-125-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Tolima**
	OBRA: CONSORCIO BB IBAGUE NIT 901.811.721 - INGECAR S.A.S., NIT. 890.207.641-0 (90%) - LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA, CC No. 63.540.679 (10%) **INTERVENTORÍA: CONSORCIO EDIFICACIONES 2024** NIT 901.808.808-1 - NOGAALL S.A.S, NIT. 830.090.010-1 (70%) - NESTOR RAMIREZ CUARTAS, CC No. 14.971.935 (30%)
	Valor Inicial Obra: $ 16.014.417.534 Interventoría: $1.269.400.521
	Adiciones Interventoría: $ 65.049.428,00
	Valor Pagado Obra: $ 13.666.896.413,00 (85,34%) Interventoría: $ 950.646.257,91 (74,89%)
MODIFICACION CONTRACTUALES	30/08/2024: Prorroga x 1 mes y se adiciona al contrato de interventoría 30/05/2025: suspensión x 15 días (30/05/2025 – 13/06/2025) 13/06/2025: Prorroga 1 a la suspensión 1 x 1 mes (14/06/2025 – 14/07/2025) 17/07/2025: Prorroga 2 a la suspensión 1 x 15 días -Se reinicia 29 de julio de 2025 29/07/2025: Prorroga por el termino de 2 meses –hasta el 30/09/2025
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	03/09/2025 se cita comite tecnico 292: • Solicitud: PARA EL CONTRATO DE OBRA No. PAF-MENPNIE-O-127-2023 que tiene por objeto: "LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" • Adición por la suma de cuatro mil seiscientos noventa y seis millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos ($4.696.049.474), con cargo a recursos del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635 de 2023.Prórroga al plazo del contrato por el plazo de tres (3) meses. • Solicitud: PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. PAF-MENPNIE-I-125-2023 que tiene por objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO RICAURTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" Adición por la suma trescientos dieciocho millones quinientos sesenta y nueve mil ciento sesenta y cuatro pesos con sesenta y ocho centavos ($318.569.164,68), con cargo a recursos del contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.5090635 de 2023. Prórroga al plazo del contrato por el plazo de tres (3) meses.

89,29%
Porcentaje de avance

88,50%
Porcentaje Programado



Grupo 02 – San José del Palmar

Adjudicación Obra: 07/11/2024
Adjudicación Inter: 07/11/2024

Fecha inicio: 09/06/2025
Fecha Fin: 09/07/2026

PAF-MENPNIE-O-114-2024
PAF-MENPNIE-I-011-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Chocó**	
	OBRA: CONSORCIO IE SAN JOSÉ CHOCÓ 2024 - JAIME FALS MARTÍNEZ ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. - INGENIERÍA Y GESTIONES DE COLOMBIA SAS.	**INTERVENTORIA: CONSORCIO EDIFICACIONES 2024** - NOGAALL SAS - NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS
$	**Valor Inicial** Obra: $ 13.454.936.346,00 Interventoría: $ 907.048.041,00	
	Adiciones Obra: No. 1 $ 0,00 Interventoría: $ 0,00	
	Valor Pagado Obra: $ 0,00 Interventoría: $ 0,00	
NOVEDADES CONTRACTUALES	Acta de Inicio el 9 de junio de 2025. Suspensión: 6 de agosto de 2025	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El proyecto se suspendió en comité técnico realizado del 5 al 6 de agosto, por un plazo de 2 meses, ya que el lote entregado por el municipio para ejecutar el proyecto, tiene un área de 4098 m2, la cual es muy inferior al área de 11.155 m2 que aparece en los productos entregados por el municipio como insumo para la ejecución del proyecto. Se realizó visita conjunta al municipio de San José del Palmar en la cual el municipio quedo con el compromiso de adelantar acciones de delimitación, escrituración y cambios de uso de suelo del área total del lote a Intervenir.	

0,28%
Porcentaje de avance

1,00%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 03-El Charquito

Adjudicación Obra: 29/12/2023
Adjudicación Inter: 29/12/2023

Fecha inicio: 25/01/2024
Fecha Fin: 10/05/2026

PAF-MENPNIE-O-101-2023
PAF-MENPNIE-I-096-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Cundinamarca**
	OBRA: SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S NIT. 900.206.662-6 **INTERVENTORIA: CONSORCIO CHARQUITO ET** NIT. 901.786.465-2 ELSA TORRES ARENALES (50%) RT-TERRA S.A.S. (50%)
$	**Valor Inicial** Obra: $ 11.406.316.041,00 Interventoría: $ $ 984.452.667,00 **Adiciones** Obra: Total $ 201.196.870,00 (No. 1 $ 201.196.870,00) Interventoría: Total $ 380.591.155,00 (N°1 $ 116.750.900; N°2 $ 196.922.985; N°3 $66.917.270 (adición 1 y 3 a cargo del Contratista). **Valor Pagado:** Obra: $ 0,00 (0.00%) Interventoría: $ 0,00 (0,009%)
NOVEDADES CONTRACTUALES	• Acta de Inicio: 25/01/2024 • Prorroga 1: 60 días (25/05/2024 – 24/07/2024) • Suspensión 1: 45 días (24/07/2024 – 06/09/2024) • Prorroga 1 Suspensión 1: 30 días (07/09/2024 – 06/10/2024) • Prorroga 2 Suspensión 1: 26 días (07/10/2024 – 01/11/2024) • Prorroga 3 Suspensión 1: 30 días (02/11/2024 – 01/12/2024) • Prorroga 5 Suspensión 1: 30 días (01/01/2025 – 30/01/2025) • Prorroga 6 Suspensión 1: 1 mes (31/01/2025– 28/02/2025) • Prorroga 7 Suspensión 1: 1 mes (01/03/2025– 01/04/2025) • Prorroga 2: 3 meses (01/04/2025 – 01/07/2025) • Prorroga 3: 1 mes (3/07/2025 - 3/08/2025 • Prorroga 4: 20 días (4/08/2025 - 23/08/2025 • Prorroga 5: 1.5 meses (24/08/2025 - 9/10/2025)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Actualmente en prorroga No. 5 por 1,5 meses sin adición de recursos desde el 24/08/2025 sin reprogramación del alcance inicial. Mediante oficio con ref. 2202552023566 del 21/08/2025, se radica al Municipio el requerimiento de recursos en cumplimiento del fallo de acción popular, frente a o cual Soacha responde el 05/09/2025 en oficio ref. SEM-DE-PE-2145-2025, que requiere el Otro Sí N°1 del convenio para aportar en 2 pagos el valor de $3.836.666.568 (Pago 1 $900 millones en septiembre; Pago 2 $2.936.666.569en octubre), no incluye costos adicionales por obras de mitigación por valor de $174 millones para estudios y diseños de obras de canalización de la quebrada). En proceso incumplimiento y aplicación del Apremio No. 1 por $135.807.901,06 al contrato de obra

4,77%
Porcentaje de avance

6.54%
Porcentaje Programado



Grupo 07-Litoral del San Juan (Indígenas)

Adjudicación Obra: 25/11/2024
Adjudicación Inter: 25/11/2024
Fecha inicio: 09/01/2025
Fecha Fin: 30/09/2025

PAF-MENPNIE-O-126-2024
PAF-MENPNIE-I-032-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Chocó**	
	OBRA: CONSORCIO PRO -INSTITUCIONES CHOCÓ – INDÍGENAS Nit: 901.884.967 - 8 M&B INVERSIONES LA CONFIANZA S.A.S (50%) CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERÍA S.A.S (50%)	**INTERVENTORIA: CONSORCIO CONSTRUSISCO** NIT: SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS (50%) CONSTRUCEC SAS (50%)
$	**Valor Inicial** Obra: $ 1.643.326.730 Interventoría: $ 331.801.336	
	Adiciones Interventoría $80.544.972 mayor permanencia de la interventoría asumida por el contratista de obra	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	Suspensión No. 1 por 23 días contados desde el 7 de marzo del 2025. **Fecha de reinicio: 30 de marzo de 2025** Prorroga por 4 meses (30 de mayo de 2025), nueva fecha de terminación 30/09/2025.	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	A la fecha persiste el incumplimiento por parte del contratista CONSORCIO PRO -INSTITUCIONES CHOCÓ – INDÍGENAS a los compromisos pactados para el cierre integral del componente I del proyecto. Por lo cual, la interventoría presenta la solicitud de ratificación de la cláusula de apremio la cual se tramitó por la supervisión y se encuentra en revisión del área jurídica.	

1,17%
Porcentaje de avance

67,47%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas

Entregadas	**0**
En ejecución	4
Terminadas	0

No	Municipio	ETC	Sede Educativa	Estado
1	Medio San Juan	Chocó	MACEDONIA	En ejecución
2	Litoral de San Juan	Chocó	ESPERANZA DE WAIMIA	En ejecución
3	Litoral de San Juan	Chocó	ESTRELLA DE PANGALA	En ejecución
4	Litoral de San Juan	Chocó	SEDE PRINCIPAL	En ejecución



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 09-Mercaderes Cauca

Adjudicación Obra: 25/10/2024
Adjudicación Inter: 25/10/2024

Fecha inicio: **30**/08/2025
Fecha Fin: **1**/06/2026

PAF-MENPNIE-O-106-2024
PAF-MENPNIE-I-195-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Cauca**	
	OBRA: CONSORCIO ESMERALDAS Nit: 901.885.266-8 ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S (50%) PROQUIN S.A.S (50%)	**INTERVENTORIA: CONSORCIO CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS** NIT: **901.886.474-8** VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S
$	**Valor Inicial** Obra: $ $5.067.512.140 Interventoría: $ 598.387.062	
	Adiciones N/A	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	**ninguna**	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El 29 de agosto de 2025 se realizó la socialización jurídica de los convenios con la ETC del Cauca y su equipo jurídico, en compañía del MEN y el equipo técnico y jurídico de Findeter. Se coordinó ajustar el convenio con base en las recomendaciones entregadas, lo cuál fue remitido el miércoles 3 de septiembre de 2025 para la revisión y validación por parte de la ETC. Estamos a la espera de la respuesta por parte de la ETC para continuar con el proceso de firma de las respectivas entidades	

0%
Porcentaje de avance

0%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 10-Totoro

Adjudicación Obra: 21/03/2025
Adjudicación Inter: 21/03/2025
Fecha inicio: Por definir
Fecha Fin:
PAF-MENPNIE-O-019-2024
PAF-MENPNIE-I-125-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Cauca**	
	OBRA: CONSORCIO OBRA INSTITUCIONAL TOTORO 2025 Nit: 901.932.561-8 • COMPAÑÍA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE OCCIDENTE SAS (participación 50%) • FEXXA SAS (50%)	**INTERVENTORIA: $ 2.380.838.350,00** NIT: 900.932.571-1 • 5T SAS BIC (50%) • CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA (50%)
$	**Valor Inicial** Obra: $ 2.380.838.350,00 Interventoría: $ 278.908.930,00	
	Adiciones N/A	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	N/A	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contratos Legalizados, inicio a la espera de suscripción convenio multipartita: el 29/08/2025 en reunión con GOBERNACIÓN , MEN y FINDETER, la gobernación solicitó nuevos ajustes en relación con la minuta remitida el 28/07/2025 mediante oficio 2202552022577, para lo cual FINDETER remitió nueva minuta el 03/09/2025 con radicado 2202552024162. Se ajustó matrícula SIMAT a 175 estudiantes en mesa de trabajo del 19/08/2025 entre ETC, MEN, CABILDO y FINDETER.	

0%
Porcentaje de avance

0%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 11- Colon, Nariño

Adjudicación Obra: 23/08/2024 **Fecha inicio**: 11/10/2024 PAF-MENPNIE-O-067-2024
Adjudicación Inter: 23/08/2024 **Fecha Fin:** 13/04/2026 PAF-MENPNIE-I-079-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Nariño**
	OBRA: CONSORCIO SAN CARLOS 2024 NIT: 901.864.521-1 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES S.A.S (99%) JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ (1%) **INTERVENTORIA:** ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS NIT: 832.000.548-2
	Valor Inicial Obra: $ 5.458.250.573 **Valor Inicial Interventoría:** $ 740.376.374
	Adiciones Obra: $ 0,00 **Adiciones Interventoría:** $ 0,00
	Valor Pagado Obra: $ 0,00 **Valor Pagado Interventoría:** $ 0,00
NOVEDADES CONTRACTUALES	Suspensión No. 1: del 10/02/2025 al 9/03/2025. Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1: del 10/03/2025 al 9/04/2025 Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1: del 10/04/2025 al 14/07/2025 Prorroga No. 3 a la Suspensión No. 1: del 15/07/2025 al 14/08/2025 Prorroga No. 4 a la Suspensión No. 1: del 15/08/2025 al 15/09/2025 Reinicio: 16/09/2025
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El proyecto se encuentra actualmente SUSPENDIDO debido al tiempo de desarrollo de los tramites: LICENCIA: Aprobada por municipio en espera de fechar, tan pronto se cuente con la versión final del presupuesto que determine el alcance contractual y el adicional que se requeriría VERTIMIENTOS: Ya se cuenta con el permiso emitido por Corponariño. ELECTRICO: Ya se cuenta con la aprobación el diseño eléctrico serie 1 por parte de Cedenar. PREUPUESTO: Debido a las modificaciones en el diseño se realiza revisión en el presupuesto general, para buscar el balance contractual y/o la adición de recursos de ser necesaria.

4,04%
Porcentaje de avance

4,04%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 12- I.E San Juan Bautista Caimito

Adjudicación Obra: 22/05/2024
Adjudicación Inter: 28/02/2024

Fecha inicio: 19/07/2024
Fecha Fin: 19/12/2025

PAF-MENPNIE-O-006-2024
PAF-MENPNIE-I-007-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Sucre**	
	OBRA: CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA SAICO INGENIERIA S.A.S JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO	**INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S** NIT: 900.503.646-1
$	**Valor Inicial** Obra: $ 3.221.231.493,00 Interventoría: $ 389.595.668,00	
	Adiciones 0	
	Valor Pagado Obra: $ 211.431.143,70 (6,56%) Interventoría: $ 44.104.914,90 (11,32%)	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	• 14/01/2025 Suspensión 1: X 45 días • 28/02/2025 Prorroga 1 a la Suspensión 1: 14 días • 14/03/2025 Prorroga 2 a la Suspensión 1: 30 días • 15/04/2025 Prórroga 3 a la suspensión 1: 14 días • 30/04/2025 Prórroga 4 a la suspensión 1: 30 días • 30/05/2025 Prórroga 5 a la suspensión 1: 10 días • 12/06/2025 Prórroga 6 a la suspensión 1: 1 mes • 11/07/2025 Prórroga 7 a la suspensión 01: 01 mes • **Reinicio 13/08/2025**	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El 28/08/2025 el MEN atreves de correo electrónico prioriza la Intervención del alcance para la ejecución de la etapa 2 caimito probando la alternativo 2. El 05 al 09 de septiembre 2025 se cita comité técnico N°294 en el cual se instruye la aprobación para los modificatorios a los contratos derivado 0bra e Interventoría en el cual se adiciona recursos al contrato de obra por $ $1.059.398.902,12 y una prorroga de 2 meses. Y para el contrato de Interventoría una adición por el valor $56.765.034,50 y prorroga de 2 meses. derivado de esta aprobación del comité técnico y se procede citar comité fiduciario de acuerdo al manual operativo. Una vez legalizados los modificatorio se procederá a la suscripción del acta de inicio etapa 2 proceso que se espera que se de entre la semana del 15 al 19 septiembre.	

7,30%
Porcentaje de avance

7,30%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 14- Pueblos Indígenas CRIHU

Adjudicación Obra: 28/05/2024 **Fecha inicio:** 30/07/2024
Adjudicación Inter: 28/05/2024 **Fecha Fin:** 29/01/2025

PAF-MENPNIE-O-045-2024
PAF-MENPNIE-I-038-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Huila**	
	OBRA: INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. NIT: 813.006.542-7	**INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERHUILA 038** NIT. 901839.812-4 KAREN DAYANA HERNÁNDEZ GÓMEZ (50%) REY DE JESUS MERLANO MARINO (50%)
$	**Valor Inicial** Obra: $968.394.297 Interventoría: $227.100.006,0	
	Adiciones Obra: $ 269.313.166 Interventoría: $ 22.536.977	
	Valor Pagado Obra: $1.237.707.463 Interventoría: $ 226.321.285	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prórroga N°1 -08/10/2024 - 30 días Prorroga N°2: 15/10/2024- Inclusión Ítems no previstos Prorroga N°3: 23/12/2024 - 30 días	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El 25/08/2025 se radica el Prisa con numero INC 2025-001930 correspondiente al proceso de liquidación del contrato de Obra. 22/08/2025 se recibe el acta de entrega del contrato de interventoría suscrita por Fiduagraria.	

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



shutterstock.com · 1662414187

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas

Entregadas	**4**
En ejecución	0
Terminadas	0



No	Municipio	Sede Educativa	Estado
1	La Argentina	LA CRISTALINA	Entregada
2	La Plata	PEÑÓN DE TÁLAGA	Entregada
3	La Plata	POTRERITO	Entregada
4	Palestina	YAKUAS	Entregada

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 18- Colegio Nacional Pinillos Mompox

Adjudicación Obra: 28/01/2025
Adjudicación Inter: 28/01/2025

Fecha inicio: 03/06/2025
Fecha Fin: 20/05/2026

PAF-MENPNIE-O-144-2024
PAF-MENPNIE-I-138-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Bolívar**	
	OBRA: UNION TEMPORAL FINDETER MOMPOX PYP 2024 PANAM INGENIEROS SAS PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T LTDA	**INTERVENTORÍA: INGESCOR LTDA** JUAN CARLOS RIOS URUETA NIT: 812.002.689-5
	Valor Inicial Obra: $ 2.451.011.208,00 Interventoría: $ 419.843.827,00	
	Adiciones 0	
	Valor Pagado Obra: $ 0,00 Interventoría: $ 0,00	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	La interventoría entregó el producto del componente eléctrico el 1 de septiembre de 2025 y se está en revisión por la supervisión, el producto estructural se encuentra subsanado y en revisión por la interventoría. Se proyecta presentación del concepto técnico ante el Distrito de Mompox y Ministerio de Cultura para el 12 de septiembre de 2025.	

5,20%
Porcentaje de avance

6,16%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 20-El Playón (Santander)

Adjudicación Obra:
Adjudicación Inter:

Fecha inicio:
Fecha Fin:

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Santander**	
	CONTRATISTA: El proyecto se encuentra en etapa Precontractual.	**INTERVENTORÍA:** El proyecto se encuentra en etapa Precontractual.
$	**Valor Inicial** Obra: valores en revisión: **$ 4.408.815.174,00** Interventoría: valores en revisión: **$ 373.687.080,00**	
	Adiciones: N/A	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	Se encuentra en etapa Precontractual.	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Estudios previos de obra e interventoría estructurados, será remitido al área de contratación derivada el 27 de agosto de 2025 para adelantar las revisiones y subsanar las observaciones que presenten. Después del comunicado enviado a la gobernación reiterando la revisión del convenio tripartito el 13 de agosto de 2025, se le reitera por TERCERA VEZ el 27 de agosto por medio de oficio No. 2202552023763 para tener respuesta favorable u observaciones para revisión y ser subsanado.	

0,00%
Porcentaje de avance

0,00%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación | icontec | Cámara de Comercio de Bogotá | efr www.masfamilia.org | ISO 9001 SGS CO18/8256 | ISO 14001 SGS CO18/8257 | ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**ACTA y/o AYUDA DE MEMORIA 24/09/2025** **Cto 5090635 de 2023**	**Código:** MC-FO-018 **Versión:** 8 **Fecha de Aprobación:** 30-Ene-2025 **Clasificación:** Clasificada de acceso restringido

Lugar de la reunión: Ministerio de Educación Nacional Hora inicio: 9:00 am

Objetivo de la reunión: Seguimiento del contrato interadministrativo 5090635 de 2023
Preside: Findeter
Quien es el secretario de la reunión: Findeter

Participantes:
Los relacionados en la lista de Asistencia

ORDEN DEL DÍA:
1. Presentación del Equipo Finder Men.
2. Información general contrato interadministrativo
3. Presentación cronograma por cada línea
4. Seguimiento cronograma Compromisos.
5.

DESARROLLO

1- El Men presenta un nuevo profesional que hará parte del contrato desde la oficina de infraestructura, Keila Florez

2- 4 PIE en 4 departamento Afro y territoriales
7 PIE en Organizaciones indígena.
Se debe hacer la

3- Se debe incorporar dentro de la presentación el balance de distribución de recursos para que se evidencie que los recursos disponibles, se utilizaran en los proyectos priorizados actualmente
Findeter informa que hay $32.296 millones de saldo con corte a 30 de agosto de 2025, sin embargo se hace la claridad que en septiembre de 2025 se comprometieron $13.000 millones, así: CDR Ibagué carmito, Babacos y Grupo 6 Emergencia

4 El Men solicita iniciar con la pidilogía del contrato interadministrativo teniendo en cuenta los cronogramas planteados de cada línea. Asistencia informa que se tienen recursos de $8.000 millones para el proyectos de Hompox Pinillos.

Findeter informa que está recomponiendo ~~la~~ incorporación equipo interno para mejorar las demoras que hemos tenido

El Men advierte que estamos próximos a vencer el plazo para contratar previo a ley de garantía, específicamente para los convenios con las ETC - Fecha 07 de Noviembre de 2025

- Buenaventura → El Men informa que ha informado de las sedes ejecutadas en el Marco de 635 no hacen parte del acuerdo de pago.
  Sin embargo Findeter informa que es necesario la respuesta oficial ~~de Findeter~~ para dar respuesta a la procuraduría
- Cimato →
  Findeter informa que está pendiente la respuesta del alcance de Cimato, para definir alcance

  El Men solicita apoyarse con las ETC para acercamiento con rectores para la entrega documentación y avanzar en estructuración
- ABADES CRITO → Findeter informa que la próxima semana finalizando septiembre publicarán los EP de CRITO
  Asimismo, frente abades indica que el grupo que se pensaba desarrollar con Convenios Solidarios, remitieron información de experiencia y no completa, por lo que los dos grupos de Abades se hará en convocatoria Pública

  Findeter informa que de las sedes del grupo 28 (abades) 3 tienen inconveniente ~~con~~ con y aviso de Riesgo, por lo que se acuerda retirar del alcance estas 3 Sedes, previamente deberá Findeter remitir soporte al MEN y ellos validarán internamente para generar aprobación del retiro de estas sedes.

Guajira → Findeter informa que remitió la información al MEN de los predios de Guajira, con base en esta información el MEN adelanta los trámites internos para revisar la procedencia de esto

5- Findeter expone los cronogramas de cada línea, de la línea de Mejoramiento, se informa que de los proyectos priorizados iniciales todo terminarían dentro del plazo actual de contrato interadministrativo sin embargo, hay dos grupos 21413 de Babacos, que por las condiciones actuales podrían requerir prórroga

Frente a la línea de Mejoramiento del Otrosí, se informa por Findeter que los proyectos de ABADES y CRITO están en estructuración y se estima ejecutar antes de la terminación del contrato Marco Sin embargo, para el Otrosí, se informó que estas sedes si no se ejecutan en su totalidad ~~hasta~~ antes de la terminación del contrato interadministrativo

Frente a la línea de ~~est~~ Emergencia se informa que de los proyectos iniciales se terminarán en el plazo del contrato interadministrativo.

Para Línea de Estratégicos se informa que estos proyectos marcan la línea crítica de los proyectos priorizados inicialmente, sin embargo teniendo en cuenta las situaciones externas de alcaldía y etc se tienen dificultades para avanzar en esta línea.

los proyectos del otrosí de estratégico si sobrepasarían el plazo del contrato interadministrativo

En la línea de Consultoría se informa que los proyectos superan el plazo del contrato interadministrativo

PIE → Se informa por Findeter que esta componente marca la ruta crítica de todo el contrato interadministrativo.

Cdon → Visita en la Semana de Octubre del 06 de 2025 para validar infraestructuras y alcance de intervención con recursos disponibles

PIE → El Men solicita que Findeter se ponga las pilas con esta línea porque desde Junio de 2025, esta línea entro en un proceso ~~de~~ muy muy lento y a la fecha no han dado respuesta desde agosto 1/2025

Totoró y Mercaderes = Se realizó reunión con la ETC y Gobernación del Cauca, se dirimieron inquietudes de forma; sin embargo, quedo pendiente lo correspondiente a los aportes de la ETC, al respecto Findeter evaluara la temática y en reunión del 24 de septiembre socializara la propuesta buscando con esto avanzar en la suscripción del convenio.

- CONVENIOS → Se informa por Findeter ~~que~~ el estado de los Convenios

  Abades → Findeter informa que continúa desarrollando acercamiento con la ETC para suscribir convenios

  Valle Cauca → En atención de observaciones para versión final

  Chocó →

- Chagáib Soacha → Findeter informa que hoy remitirá a la alcaldía de comunicado solicitando se pronuncie frente a los recursos deben aportar para las obras de contingencia del canal

- Playón → Sigue pendiente la respuesta del MEN q dentro del cual Oficialice la priorización de la sede.
  Findeter informa que el día de ayer se realizó una analisis preopuesta y se informó que para la ejecución de las 12 Sedes se estima una intervención de $ 4.900 millones aproximadamente

- Tarra Norte Santander = El 26-Sep-25 se llevará a cabo reunión con ETC para definir los requerimientos y avanzar el proyecto.

- El Men solicitó dar cumplimiento a los compromisos, pq lo cual Findeter deberá tener tomar las acciones para mejorar los tiempos de respuesta. El Men solicita que los comites sean cada 8 días los Martes.

COMPROMISOS

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD Alta, Media, Baja	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	Findeter remitirá la solicitud de prórroga y adición de 8.000 millones	Alta	Findeter	30-09-2025	Adjuntar cronogramas anexos la presentación deben incluir un % de avance y el cronograma. Incluir PIF
	Programar Reunión convocatoria. at mesa de trabajo El Tarra. Men- ETC- Alcaldía Findeter.	Alta	Findeter	26-09/25	
	Programar comisión para revisión alcance Colón -	Alta	Findeter	06-10-2025	
	Respuesta Opiac - Cric. sobre las propuestas formadas	Alta	Findeter	26-09-2025	
	Mesa de Trabajo ✓ OPIAC, ANCO. y CRIC *revisión observaciones definición ajustes Finales	Alta	Findeter	30-09-2025	
	Actualización de reporte x municipios G. 16 y 17	Alta	Findeter	29-09/25	

No.	ACTIVIDAD/Tarea	PRIORIDAD Alta, Media, Baja	RESPONSABLE	FECHA EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
	Men, gestionará internamente con la Secretaria Gral con enfasis en la mano de obra.	Alta	MEN	Constante	
	El men informará. si las sedes de Buenaventura. hacen parte del acuerdo del PARO	Alta	MEN	Cumplido el 24	Indispensable para emitir respuesta. a la Procuradoria.
	Definición de alcance de anexo. conforme comunicado. remitido x Findeter. el 27/08/2025.	Alta	MEN		
	Enviar soportes de despriorización. de 3 sedes G. 28 Obs si No viabilidad.	Alta	Findeter.		
	Publicación. de convocatoria 29 Grupo 27	Alta	Findeter	2a semana de octubre	
-	Respuesta de No cumplimiento a organización sobre G. 28.	Media	Findeter		Con copia al MEN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LISTA DE ASISTENCIA-
ASISTENCIA TÉCNICA

Código: GES-FO-121
Versión: 1
Fecha de Aprobación: 29-May-2023
Clasificación: Público

MODALIDAD: Capacitación:___ Reunión: X Evento:___ Campaña:___

TEMA: Reunión Seguimiento Contrato 5090635 de 2023

FECHA: Día 24 Mes Sept Año 2025

Hora Inicial: 9:00 am

Hora Final:

NOMBRES Y APELLIDOS (Completos)	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
ENRIQUE LUIS MONROY	1026264858	PROFESIONAL PMO	OIE-MEN	3202054878	emonroym@ext.min...	
Diana Milena Maldonado	1018419980	Profesional Esp.	OIE-MEN	3057683832	dmaldonado@...	
Mauricio Alfonso	80237668	(Contratista)	OIE MEN	3103172231	ealfonso@...	
Keyla M. Flórez Arias	49784307	Contratista MEN	OIE MEN	3159252051	kflorez@mineducacion.gov.co	
Jesús Cañas Páez	1140823769	Gestor	Findeter	3015421323	Jacanas@findeter.gov	
Julián A. Bayona	7179444	Gestor de línea	Findeter	3138140063	JAbayona@findeter.gov.co	
Sebastian Aranguren	1053586576	Profesional	Findeter	3114809313	saaranguren@findeter.gov.co	

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

OTROSI No. 01 CONTRATO No. 5090635 DE 2023

24 de septiembre de 2025

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada


Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

ESTADO GENERAL -CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

629
SEDES

$ 394,075
Millones de pesos

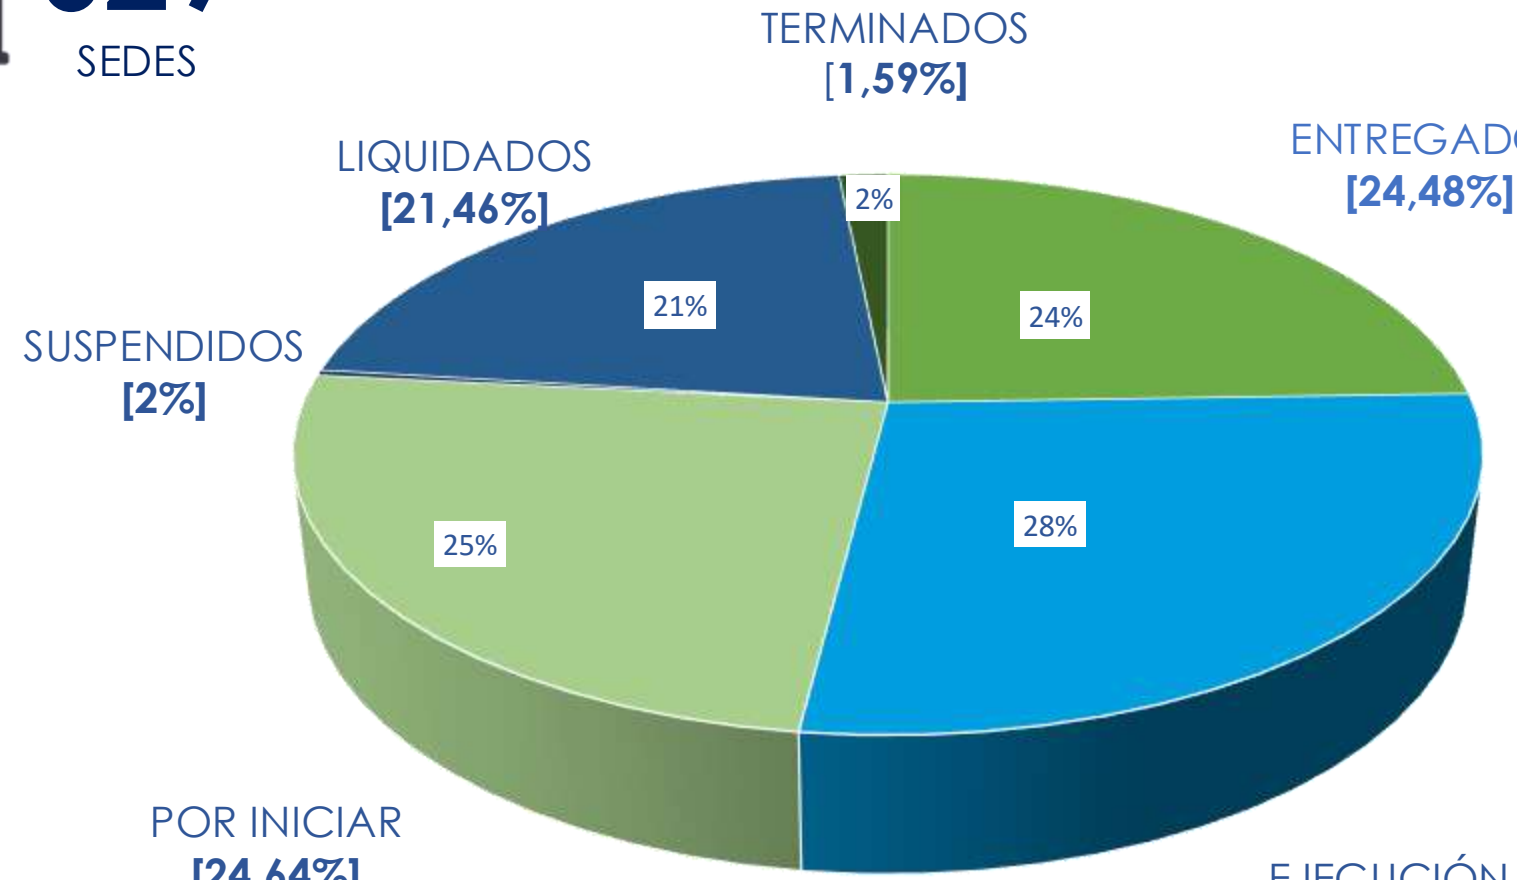

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

LINEA CONSULTORIA [9] **LINEA ESTRATEGICOS [31]** **LINEA MEJORAMIENTOS [527]** **LINEA EMERGENCIAS [62]**

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

INFORMACIÓN GENERAL – Contrato Inicial

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

490
SEDES

$294.145
Millones de pesos

TERMINADOS
[2,04%]


ENTREGADOS
[31,43%]

LIQUIDADOS
[27,55%]

SUSPENDIDOS
[0,41%]

POR INICIAR
[3,67%]

EJECUCIÓN
[34,9%]

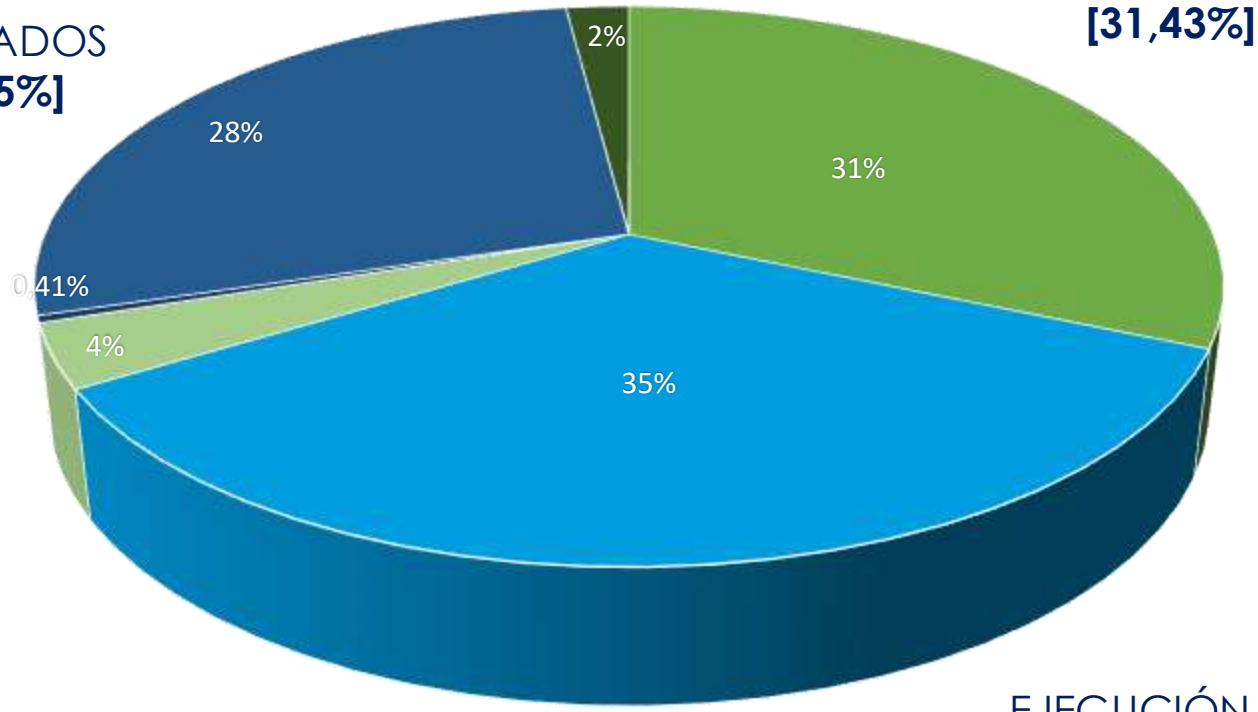

LINEA CONSULTORIA [6]

LINEA ESTRATEGICOS [28]

LINEA MEJORAMIENTOS [396]

LINEA EMERGENCIAS [60]

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente


INFORMACIÓN GENERAL – Otro Sí

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

139
SEDES

NOTA: Se modifica el número de proyectos debido a que se incluyeron las 94 sedes de Ornato y se quitaron 17 sede de la línea de ola invernal del otrosí, se incluyeron dos sedes nuevas en el grupo 6 de la línea de Emergencia: CER Alto Lorenzo Sede Nuevo Amanecer Pto Asis y IE Inda Sabaleta

EJECUCIÓN
[1,43%]

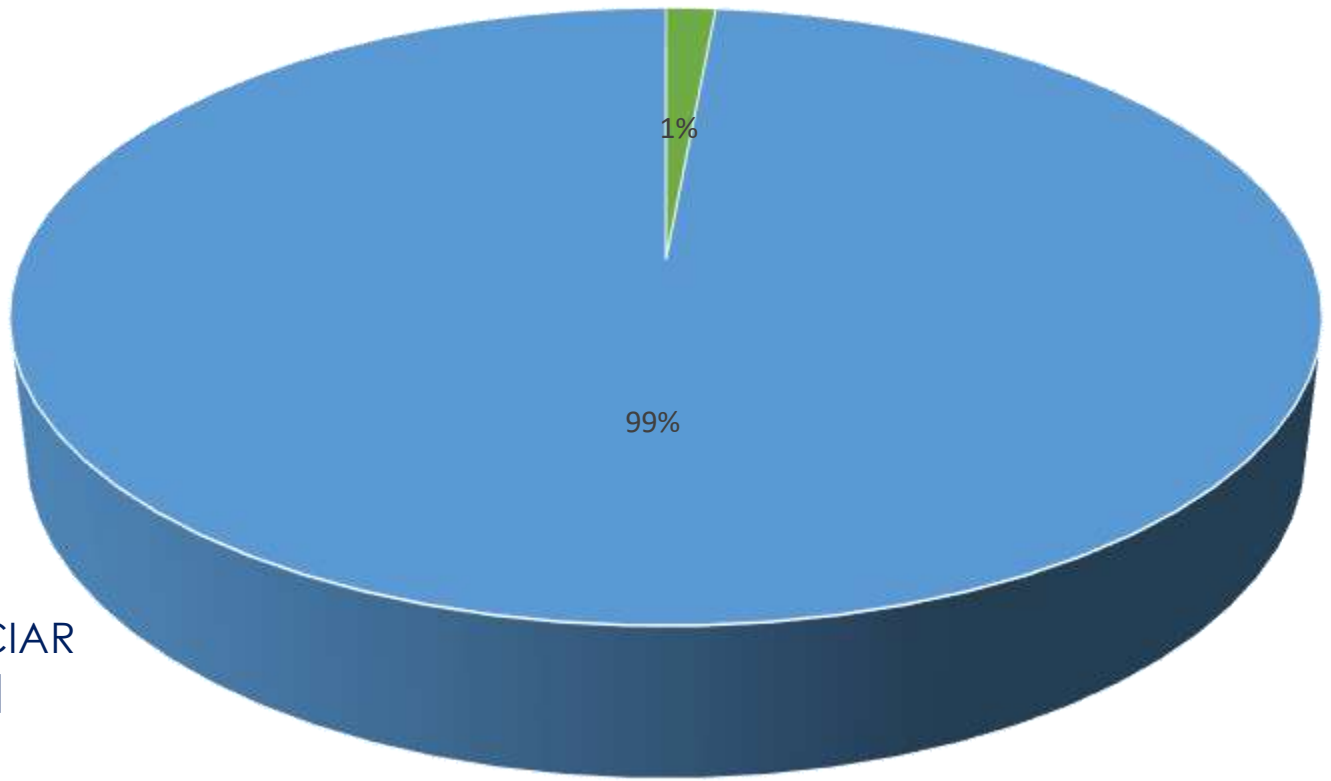

POR INICIAR
[99%]

$ 99.930
Millones de pesos

MEJORAMIENTOS [131]
Abades (27)
CRIHU (10)
ORNATO (131)

EMERGENCIAS [2]
GUAJIRA (2)*
Estos inicialmente estaban en la línea de mejoramiento del otrosí

CONSULTORIA PIE [3]
CONTCEPI (1)
OPIAC (1)
ENCP (1)

ESTRATEGICOS [3]
Valle del Cauca (1)
Chocó (1)
Nariño (1)

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

Gestión Findeter | Información General |

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial





629* Proyectos

$ 394.076 Millones de pesos

GENERAL CORTE 10 DE SEPTIMEBRE DE 2025

LINEA	ENTREGADOS	EJECUCIÓN	SUSPENDIDOS	POR INICIAR	TERMINADOS	LIQUIDADOS	TOTAL
Contrato Inicial							
Mejoramientos	101	158	0	0	2	135	396
Emergencias	41	11	0	0	8	0	60
Estratégicos	4	8	2	14	0	0	28
Diseño	0	2	0	4	0	0	6
Subtotal	**146**	**179**	**2**	**18**	**10**	**135**	**490**
Otro Sí							
LINEA	**ENTREGADOS**	**EJECUCIÓN**	**SUSPENDIDOS**	**POR INICIAR**	**TERMINADOS**	**LIQUIDADOS**	**TOTAL**
Mejoramientos	0	0	0	37	0	0	37
Emergencias	0	0	0	17	0	0	17
Diseños	0	0	0	3	0	0	3
Estratégicos	0	0	0	3	0	0	3
Subtotal	**0**	**0**	**0**	**60**	**0**	**0**	**60**
TOTAL	**146**	**179**	**2**	**78**	**10**	**135**	**550**

GENERAL CORTE 24 DE SEPTIMEBRE DE 2025

LINEA	ENTREGADOS	EJECUCIÓN	SUSPENDIDOS	POR INICIAR	TERMINADOS	LIQUIDADOS	TOTAL
Contrato Inicial							
Mejoramientos	102	151	0	0	8	135	396
Emergencias	48	10	0	0	2	0	60
Estratégicos	4	8	2	14	0	0	28
Diseño	0	2	0	4	0	0	6
Subtotal	**154**	**171**	**2**	**18**	**10**	**135**	**490**
Otro Sí							
LINEA	**ENTREGADOS**	**EJECUCIÓN**	**SUSPENDIDOS**	**POR INICIAR**	**TERMINADOS**	**LIQUIDADOS**	**TOTAL**
Mejoramientos	0	0	0	131	0	0	131
Emergencias	0	2	0	0	0	0	2
Diseños	0	0	0	3	0	0	3
Estratégicos	0	0	0	3	0	0	3
Subtotal	**0**	**2**	**0**	**137**	**0**	**0**	**139**
TOTAL	**154**	**173**	**2**	**155**	**10**	**135**	**629**

NOTA: Se modifica el número de proyectos debido a que se incluyeron las 94 sedes de Ornato y se quitaron 17 sede de la línea de ola invernal del otrosí, se incluyeron dos sedes nuevas en el grupo 6 de la línea de Emergencia: CER Alto Lorenzo Sede Nuevo Amanecer Pto Asis y IE Inda Sabaleta



Findeter
Financiera del Desarrollo

CCOM-001-21 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

INFORMACION FINANCIERA- CONTRATO INTERADMINSITRATIVO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

PRESUPUESTO INICIAL	
Descripción	**Valor**
1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN	$ 121.110.000.000,00
2)Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia	$ 29.800.132.757,00
$278.399.202.376 a) Viabilidades (asistencia técnica) $1.125.549.600 b) Asistencia Técnica y administración de recursos	$ 29.143.085.188,00
4)Proyectos estratégicos de infraestructura educativa	$ 98.345.984.431,00
Subtotal recursos para la ejecución de las obras	**$ 278.399.202.376,00**
a) Viabilidades (asistencia técnica)	$ 1.125.549.600
b) Asistencia Técnica y administración de recursos	$ 14.620.530.400
Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (5.66%)	**$ 15.746.080.000**
Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica	**$ 294.145.282.376,00**

PRESUPUESTO ADICION	
Descripción	**Valor Adición**
1) Obras de mejoramiento del banco de proyectos de la convocatoria MEN	39.900.000.000,00
2) Obras de mejoramiento en sedes afectadas por Emergencia	6.500.000.000,00
3) Diseños de proyectos de infraestructura educativa	13.000.000.000,00
4) Proyectos estratégicos de infraestructura educativa	33.222.860.638,00
Subtotal recursos para la ejecución de las obras	**92.622.860.638,00**
a) Viabilidades (asistencia técnica)	844.162.200,00
b) Asistencia Técnica y administración de recursos	6.463.781.505,00
Subtotal recursos de asistencia técnica y administración de recursos (7.89%)	**7.307.943.705,00**
Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica	**99.930.804.343,00**

RESUMEN GENERAL RECURSOS	
Descripción	**Valor Adición**
TOTAL LINEA MEJORAMIENTO	161.010.000.000,00
TOTAL LINEA EMERGENCIA	36.300.132.757,00
TOTAL LINEA DISEÑOS	42.143.085.188,00
TOTAL LINEA ESTRATEGICOS	131.568.845.069,00
Subtotales	**371.022.063.014,00**
Total Vaibilidades	1.969.711.800,00
Total AT	21.084.311.905,00
Subtotal AT y administración de recursos	**$ 23.054.023.705**
Total, recursos para ejecución y asistencia Técnica	**$ 394.076.086.719,00**

CLÁUSULA QUINTA. - VALOR DEL CONTRATO:

Nota 1 *En el evento en que se presenten saldos una vez atendidos los proyectos priorizados, los recursos disponibles podrán ser invertidos en alguna de las líneas detalladas en el presupuesto, previa autorización del Ministerio de Educación Nacional y aprobación del Comité Fiduciario. Si una vez atendidos los proyectos priorizados en todas las líneas quedan saldo de recursos, estos deben ser reintegrados al Tesoro Nacional.*

Nota 2 *En el evento en que alguna de las sedes focalizadas en alguna de las líneas no sea viable de atender por alguna circunstancia, está pueden ser reemplazada de acuerdo con el orden de elegibilidad (cuando esto aplique) o por otra sede que sea focalizada por el MEN siempre y cuando cuente con la debida justificación la cual será presentada a consideración y aprobación de los comités técnicos y fiduciarios. Así mismo en el caso de que resulten saldos en cualquiera de las líneas podrán ser incluidas nuevas sedes educativas para lo cual se llevará también a aprobación de los comités técnico y Fiduciario.*

CCOM-FO-001 / V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

INFORMACION FINANCIERA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

VALOR INICIAL CONTRATO MARCO: $ 294.145.282.376

VALOR COMPROMETIDO AGOSTO 2025:

A. CDR CONTRATACION Y ADICIONES: $ 247.705.516.930
B. ASISTENCIA TECNICA: $ 15.746.080.000

SALDO AGOSTO DE 2025: $ 32.296.691.547

Cabe destacar que durante el mes de septiembre d e 2025, se han generado nuevos CDR por valor de $ 13.121.millones, correspondiente a las adiciones de Ibague: $ 5.014 millones, Caimito $ 1.116 , Barbacoas $ 4.751, Grupo 6 Emergencia $ 2.240 millones, por lo que se puede estimar un saldo a Septiembre de $ 19.000 millones

VALOR OTROSI: $ 99.930.804.343

VALOR COMPROMETIDO AGOSTO 2025:

A. CDR CONTRATACION Y ADICIONES: $ 3.302.124.806
B. ASISTENCIA TECNICA: $ 7.307.943.705

SALDO A AGOSTO DE 2025: $ 89.320.735.832

NOTA: Adicionalmente se cuenta con aproximadamente $ 11.000 millones para liberar como resultado del saldo de las contrataciones

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

INFORMACION FINANCIERA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

EJECUCION PRESUPUESTAL

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS (B)	COMPROMISOS - CDR (C)	CONTRATOS FIRMADOS Y ADICIONES (D)	LIBERACIONES ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS (F)	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER (G) = (A)-(B)-(C)-(E)+(F)
87123	2023	294.145.282.376	-	15.746.080.000	247.705.516.930	238.843.359.190	1.190.965.331	**32.296.691.547**
11424	2024	41.100.000.000	41.100.000.000	7.307.943.705	3.302.124.806			**30.489.931.489**
11524	2024	33.010.746.802	33.010.746.802		-			**33.010.746.802**
11624	2024	25.820.057.541	25.820.057.541		-			**25.820.057.541**
TOTAL		**394.076.086.719**	**99.930.804.343**	**23.054.023.705**	**251.007.641.736**	**238.843.359.190**	**1.190.965.331**	**121.617.427.379**

RECURSOS LÍQUIDOS

VALOR	DESCRIPCION	
284.983.683.184,96	**SALDO RECURSOS LÍQUIDOS (SALDO CUENTA DE AHORROS + SALDO FIC)**	**SALDO PATRIMONIO CONTRATO INTER ADMINISTRATIVO**
57.588,73	**(*)CUENTAS X COBRAR**	
1.087.200,92	**(*)CUENTAS X COBRAR- DETERIORO**	
1.837.641.925,04	**TOTAL RENDIMIENTOS POR GIRAR**	
904.691.447,10	**INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS (DESCUENTOS MAYOR PERMANENCIA INTERVENTORIA Y APREMIOS)**	
113.159.752,70	**CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES**	
452.592.872,91	**IMPUESTOS POR PAGAR**	
7.999.843.841,55	**RETENCIONES EN GARANTÍA PENDIENTES DE GIRO**	
273.674.723.733,47		**273.674.723.733,47**

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

CRONOGRAMAS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA MEJORAMIENTO

CONVOCATORIA | PERFECCIONAMIENTO | FASE 1 | FASE 2 | SUSPENSION | PRORROGA | LIQUIDACION

GRUPO	2024														2025												2026							
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
Grupo 4- Cauca																																		
Grupo 7- Cauca																																		
Grupo 8- Chocó																																		
Grupo 12- Nariño																																		
Grupo 13- Nariño																																		
Grupo 14-Putumayo																																		
Grupo 16-Nte Santander																																		
Grupo 17-Nte Santander																																		
Grupo 21 Uribia																																		
Grupo 24 Guaviare																																		
Grupo 25 Buenaventura																																		
OTRO SI																																		
Grupo OTRO SI 1 (CRIHU)																																		
Grupo OTRO SI 2 (ABADES)																																		
Grupo OTRO SI 3 (ABADES)																																		


Se evidencia que el plazo de los proyectos priorizados dentro del contrato inicial, para ser ejecutados a través de la presente línea de intervención, se encuentra dentro del plazo de contrato interadministrativo, cuya fecha de terminación es el 29 de mayo de 2026. No obstante, se aclara que el cronograma presentado se desarrolló con base en las condiciones actuales de los proyectos, sin embargo, si dichas condiciones varían, el cronograma podrá verse sometido a modificaciones.

Situación que dista de los proyectos que han sido priorizados por el MEN para desarrollarse en el marco del alcance del otrosí del contrato interadministrativo (ABADES, CRIHU, ORNATO), que como se evidencia, el plazo de ejecución supera el plazo del contrato interadministrativo, por lo cual, en necesario prorrogar el mismo para desarrollar dichas actividades de manera tentativa hasta la última semana de agosto de 2026.

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

CRONOGRAMAS

LÍNEA OLA INVERNAL- EMERGENCIA

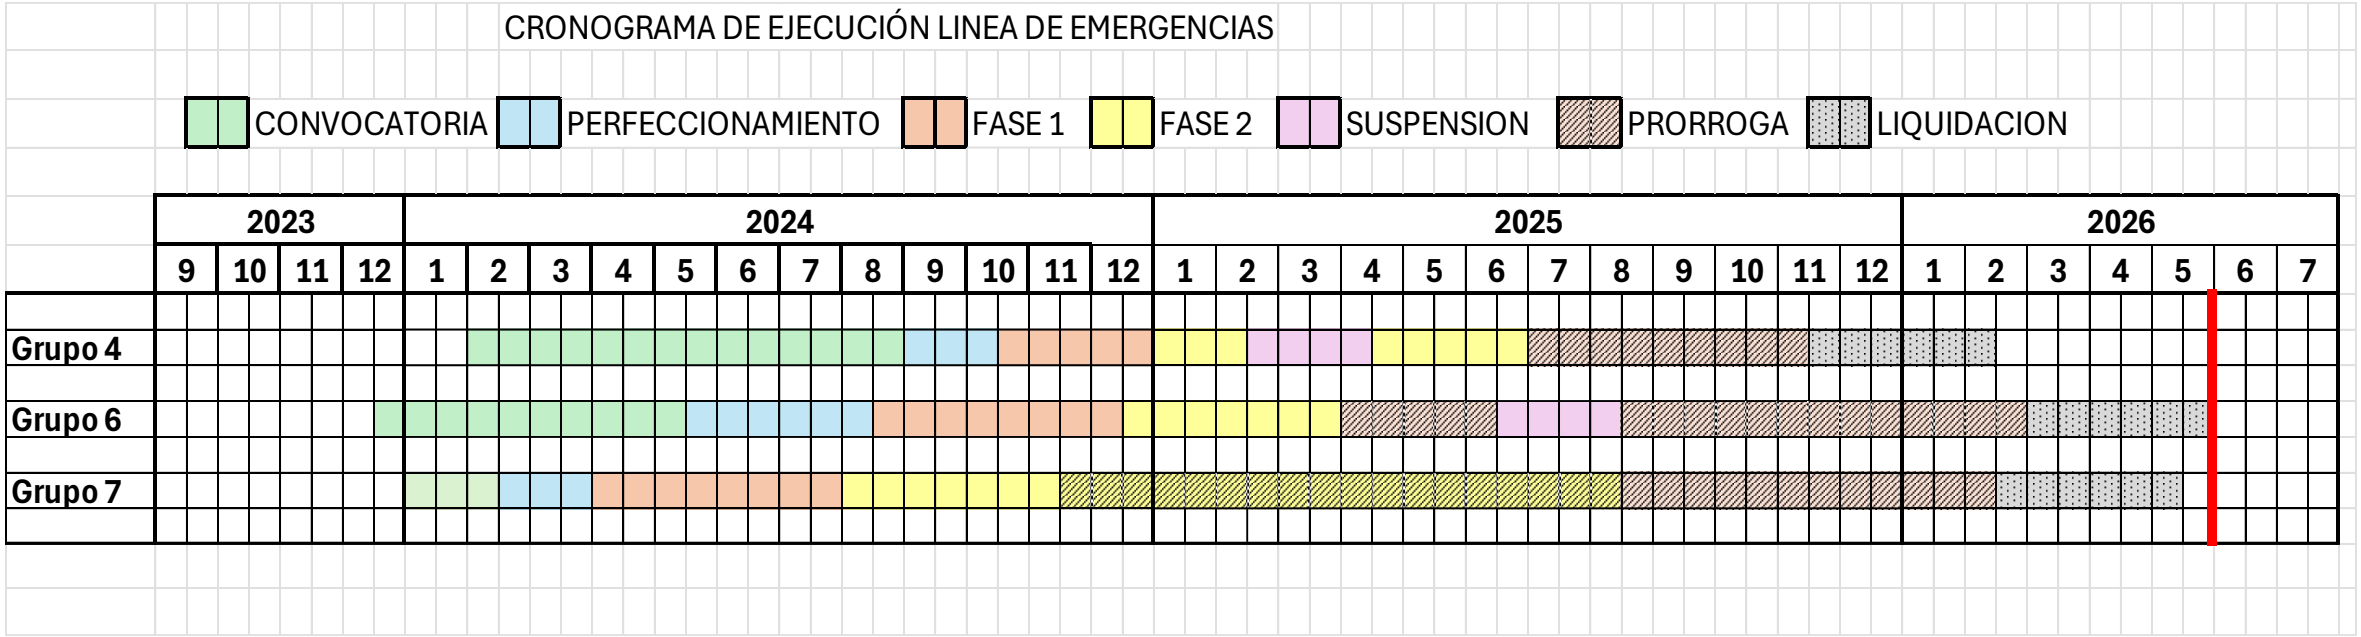

Se evidencia que el plazo de los proyectos priorizados para ser ejecutados a través de la presente línea de intervención se encuentra dentro del plazo de contrato interadministrativo, cuya fecha de terminación es el 29 de mayo de 2026. No obstante, se aclara que el cronograma presentado se desarrolló con base en las condiciones actuales de los proyectos, sin embargo, si dichas condiciones varían, el cronograma podrá verse sometido a modificaciones.

OTRO SI:


El Ministerio Instruyo en comité del 27 de agosto de 2025 que se pausara la gestión del otro si para la línea de emergencia, hasta que realicen verificaciones presupuestales, se solicita al ministerio documentar oficialmente esta suspensión a estos tramites.

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificada

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

CRONOGRAMAS
LÍNEA ESTRATÉGICO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

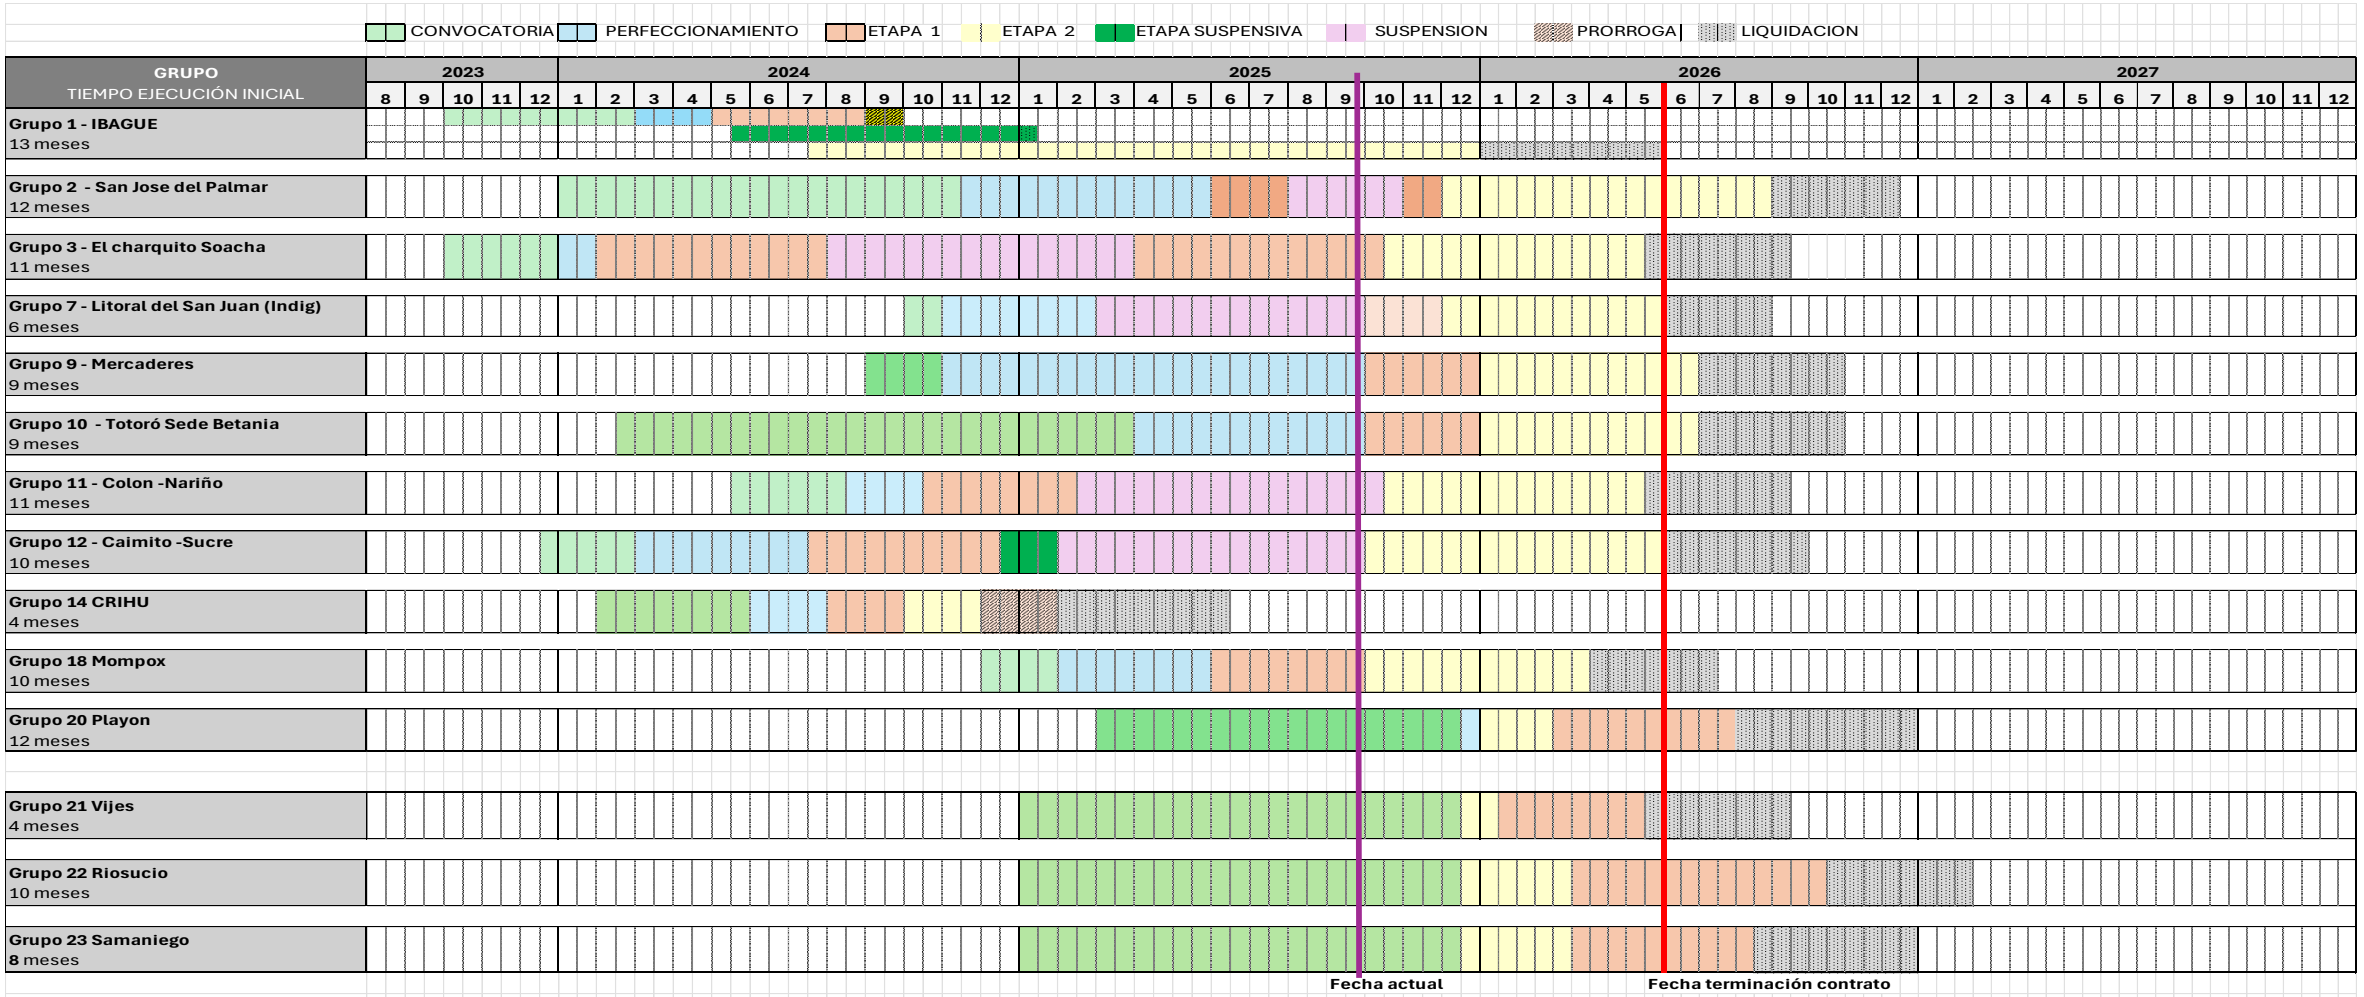


Es importante indicar que las externalidades y los procesos de priorización, aprobación y ejecución de los proyectos, así como situaciones que no han sido resueltas con las Entidades Territoriales Certificadas, como es el caso de los proyectos de Cauca, han imposibilitado tener tiempos más cortos en la ejecución y por ende en la terminación. En todo caso, se indica que las actuaciones de FINDETER bajo el marco de la asistencia técnica propenden a la ejecución de los proyectos y desarrollo de su alcance en el menor tiempo posible con el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas exigibles.

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

CRONOGRAMAS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA CONSULTORÍA

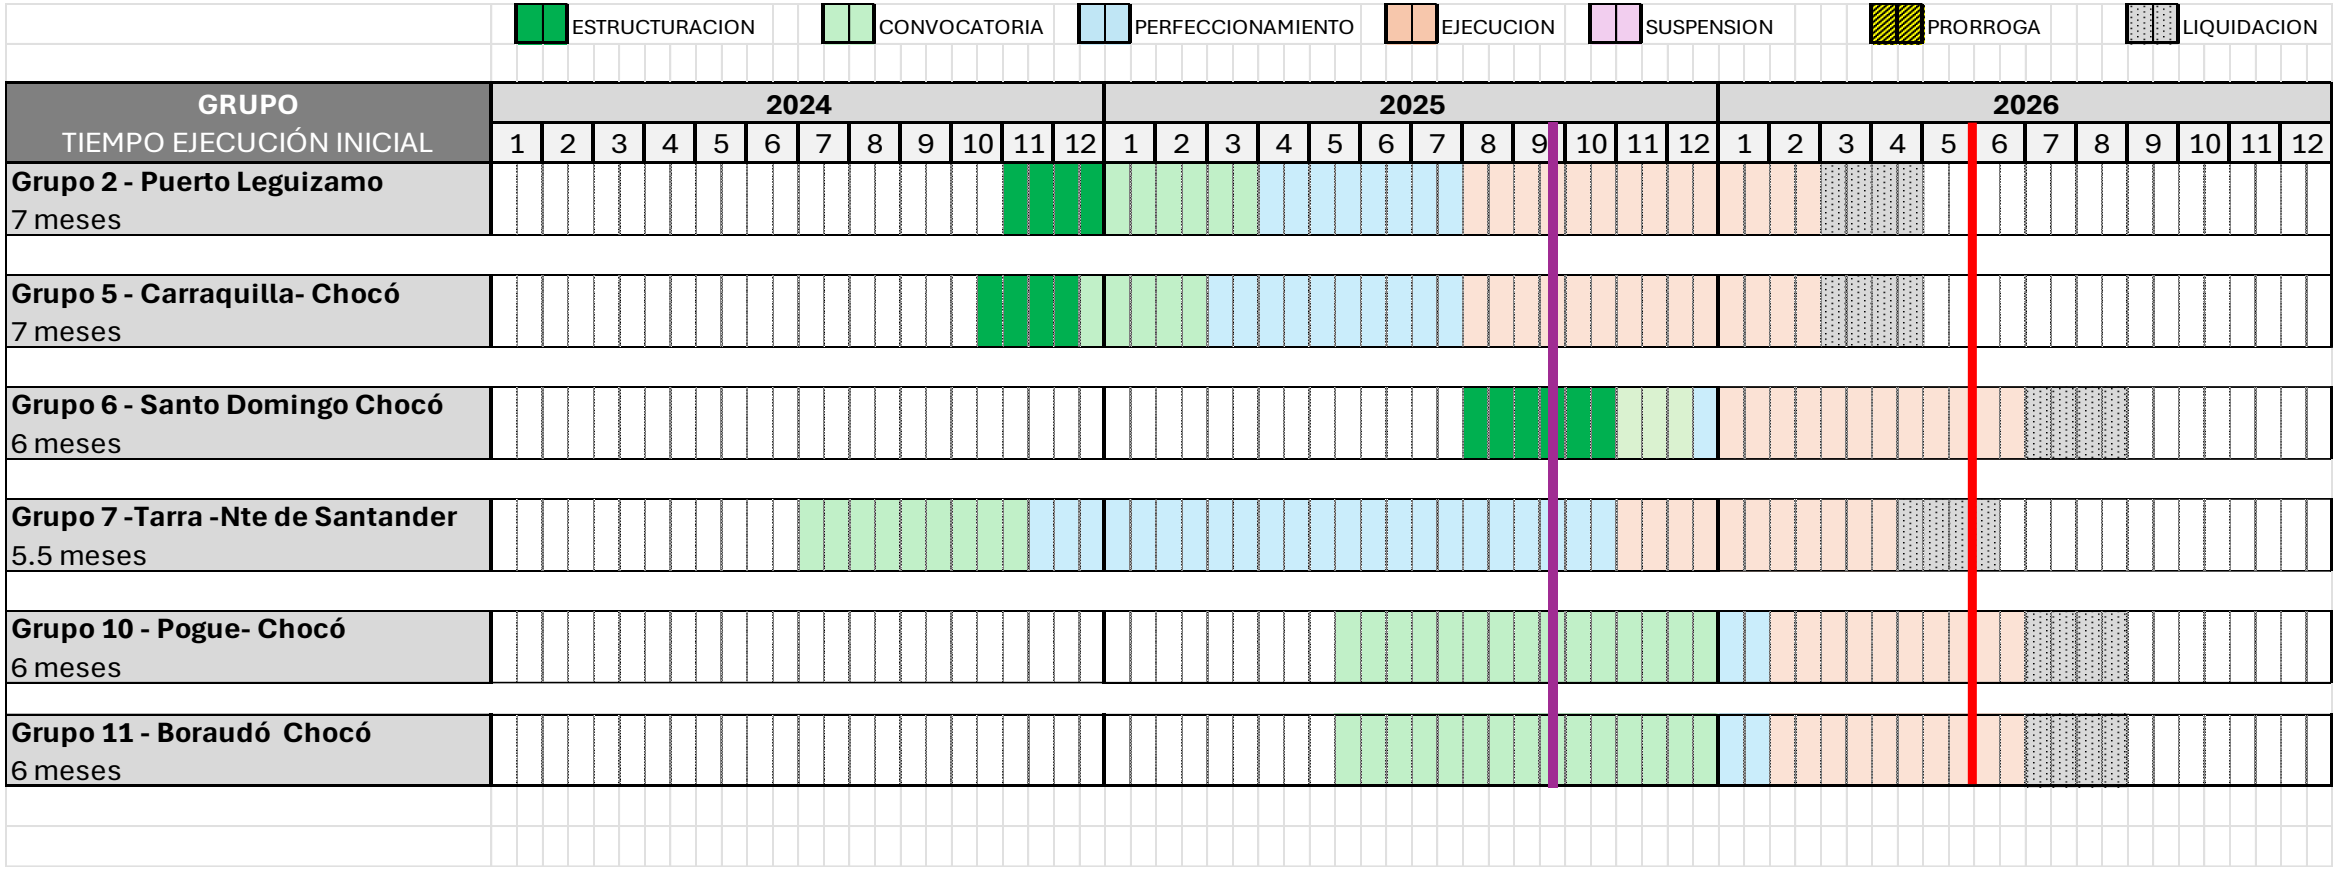

Con base en las incertidumbre que se tiene ante la ejecución de los proyectos de grupos 7, 10 y 11, donde se desconoce la viabilidad de su ejecución debido a condiciones y externalidades que no depende de FINDETER, es importante reforzar las comunicaciones con los entes implicados que permitan, a través de definiciones claras, conocer el futuro de ejecución e intervención de dichos grupos que según lo proyectado bajo la AT sobrepasa el plazo del presente contrato interadministrativo.

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

COMPROMISOS REUNION 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA MEJORAMIENTO	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
Norte de Santander – Grupos G16 y G17	El MEN realizará gestiones internas, a través de la Secretaría General, para destrabar los procesos relacionados con la operación logística de los grupos, especialmente en lo referente a mano de obra.	MEN	**EN TRAMITE**
BUENAVENTURA	El MEN deberá informar si las sedes requeridas por la Procuraduría hacen parte del acuerdo del PARO	MEN	**PENDIENTE**
ORNATO-OTROSI	MEN deberá definir el alcance de Ornato, conforme al comunicado remitido por FINDETER el pasado 27 de agosto de 2025 mediante comunicado No. 2202552023797	MEN	**PENDIENTE**
ABADES –OTROSI	Se estima la publicación de la convocatoria durante la última semana de septiembre de 2025 El grupo 29 se publicará, mientras que el grupo 28 se gestionará para ser ejecutado directamente con las organizaciones correspondientes.		**EN CUMPLIMIENTO**
SEDES GUAJIRA	Findeter deberá remitir un oficio con las sedes con posibles de inclusión de sistema fotovoltaico, entre el 17 y 25 de septiembre de 2025	FINDETER	**EN TRAMITE**

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



COMPROMISOS REUNION 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA ESTRATEGICO	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
TOTORÓ Y MERCADERES-	Reunión con ETC, FINDETER y el MEN para poder gestión la firma del convenio	FINDETER MEN	**CUMPLIDO [OK] ✓** Se llevó a cabo la reunión el jueves 18 de septiembre de 2025.
	El MEN realizará gestiones con la Dirección de Fomento de Básica para facilitar este proceso.	MEN	**EN TRAMITE**
EL CHARQUITO – SOACHA	FINDETER deberá reiterar a la Alcaldía de Soacha la solicitud de respuesta formal sobre la adición relacionada con la intervención del canal, necesaria para la viabilidad financiera del proyecto.	FINDETER	**EN TRAMITE** El oficio se radicará el día 24 de septiembre de 2025
	Findeter deberá contactar a la ETC **de Nariño** entre el 15 y 19 de septiembre para la verificación de los convenios.	FINDETER	
CONVENIOS	Se hará seguimiento a la firma de convenios pendientes, entre ellos Mercaderes, Totoró, Caimito (Sucre), Chocó–Santo Domingo y El Playón. Aunque se han adelantado gestiones, algunos convenios siguen sin formalizarse. FINDETER enviará un listado actualizado al MEN el 09 de septiembre de 2025	FINDETER	**EN TRAMITE** En seguimiento los convenios de Totoró y Mercaderes con la ETC de Cauca ante las reuniones y compromisos pactados y cumplidos por FINDETER el 03 y 18 de septiembre de 2025. Playón quedó aprobado con el apoyo del MEN y en estructuración los convenios para los proyectos del Otro Sí (Nariño, Valle del Cauca y Chocó)

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

COMPROMISOS REUNION 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA CONSULTORIA	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
PLAYON LÍNEA CONSULTORIA	MEN remitirá comunicado el 24 de septiembre de 2025 con la priorización de las sedes del Playón.	MEN	EN TRAMITE Se requiere para la publicación de la convocatoria
PIE OPIAC-AICO-CRIC	Findeter deberá enviar entre el 24 y 25 de septiembre, el oficio de los municipios para la intervención afro y así tener opciones de vínculos al consultor	FINDETER	EN TRAMITE
	La Subdirección de Acceso presentará en el próximo comité el estado de avance y las necesidades para continuar la gestión con la comunidad AICO	MEN	EN CUMPLIMIENTO
	Findeter deberá hacer acercamiento con la universidad para las contrataciones de las organizaciones pequeñas	FINDETER	CUMPLIDO [OK] ✓ Se realizó el contacto con las Universidades del Valle, Nariño, Chocó y Cauca.
	En el próximo comité, FINDETER deberá presentar un balance consolidado del estado de estas gestiones.	MEN	EN TRAMITE
TARRA-CONSULTORÍA	Se agendara una mesa de trabajo el 16 de septiembre con la ETC del proyecto el TARRA con FINDETER y el MEN	FINDETER MEN	EN TRAMITE Con base en el seguimiento del 19 de septiembre de 2025, se definió reiterar las Comunicaciones enviadas y citar mesa con la ETC para la semana del 21 de septiembre de 2025.

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



COMPROMISOS REUNION 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

LÍNEA	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Respuesta de la propuesta del equipo de Findeter	MEN	**PENDIENTE**
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Presentar el 17 de septiembre de 2025 el plan de gestión social al contrato interadministrativo.	FINDETER	**EN TRAMITE.** Findeter realizo mesa interna con el equipo social . El viernes 26 de septiembre de 2025 entregará la información
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	MEN remitirá las recomendaciones del los productos de la etapa I que fueron socializados el reunión del 1ero de septiembre de 2025	MEN	**PENDIENTE**

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ago-2024 / Clasificac

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente

COMPROMISOS REUNION 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

LÍNEA	COMPROMISO	RESPONSABLE	ESTADO
	ASISTENCIA TECNICA MEN dará respuesta a FINDETER sobre la propuesta de modificatorio al cobro por asistencia técnica en el próximo comité, programado para el 10 de septiembre de 2025.	MEN	PENDIENTE
	PRIORIZACION PROYECTOS FINDETER solicita al MEN formalizar la priorización y despriorización de los proyectos del plan de infraestructura educativa, a más tardar el 29/08/2025.	MEN	PENDIENTE
	ALERTAS PLAZOS DE EJECUCIÓN FINDETER deberá presentar a MEN, con corte al 30/06/2025, un oficio (fecha límite de entrega 20/08/2025) que detalle las acciones adoptadas para mitigar las alertas asociadas al cumplimiento de los plazos de ejecución e incluya el alcance de la adición contractual.	FINDETER	EN CUMPLIMIENTO. Findeter remitirá el comunicado el 24 de septiembre de 2025

CCOM-FO-001 V20 / 05 -Ag

Diapositiva con información de uso interno exclusivamente



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co
@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-001 V20 / 05-Ago-2024 / Clasificada

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación · icontec · Cámara de Comercio de Bogotá · efr www.masfamilia.org · SGS CO18/8256 · SGS CO18/8257 · SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. 5090635 de 2023
LÍNEA MEJORAMIENTOS

24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

Estado de entrega y ejecución de Sedes
Línea de Mejoramientos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

527* sedes

$ 136,265 Millones de pesos
* Valor comprometido

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026


LIQUIDADAS
135 SEDES – 26%

ENTREGADAS
102 SEDES – 24%

TERMINADAS
08 SEDES – 1%

EN EJECUCION
151 SEDES –29%


ESTRUCTURACION
131 SEDES – 25%

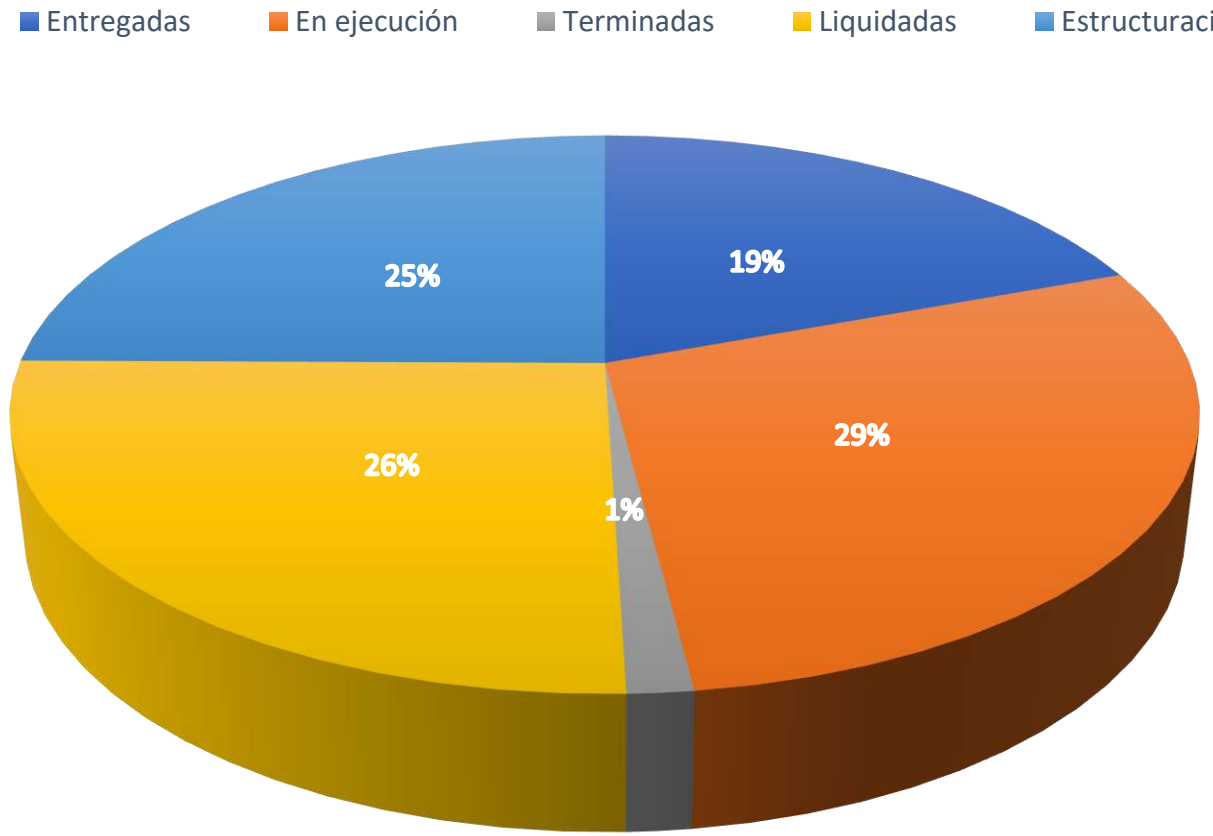

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

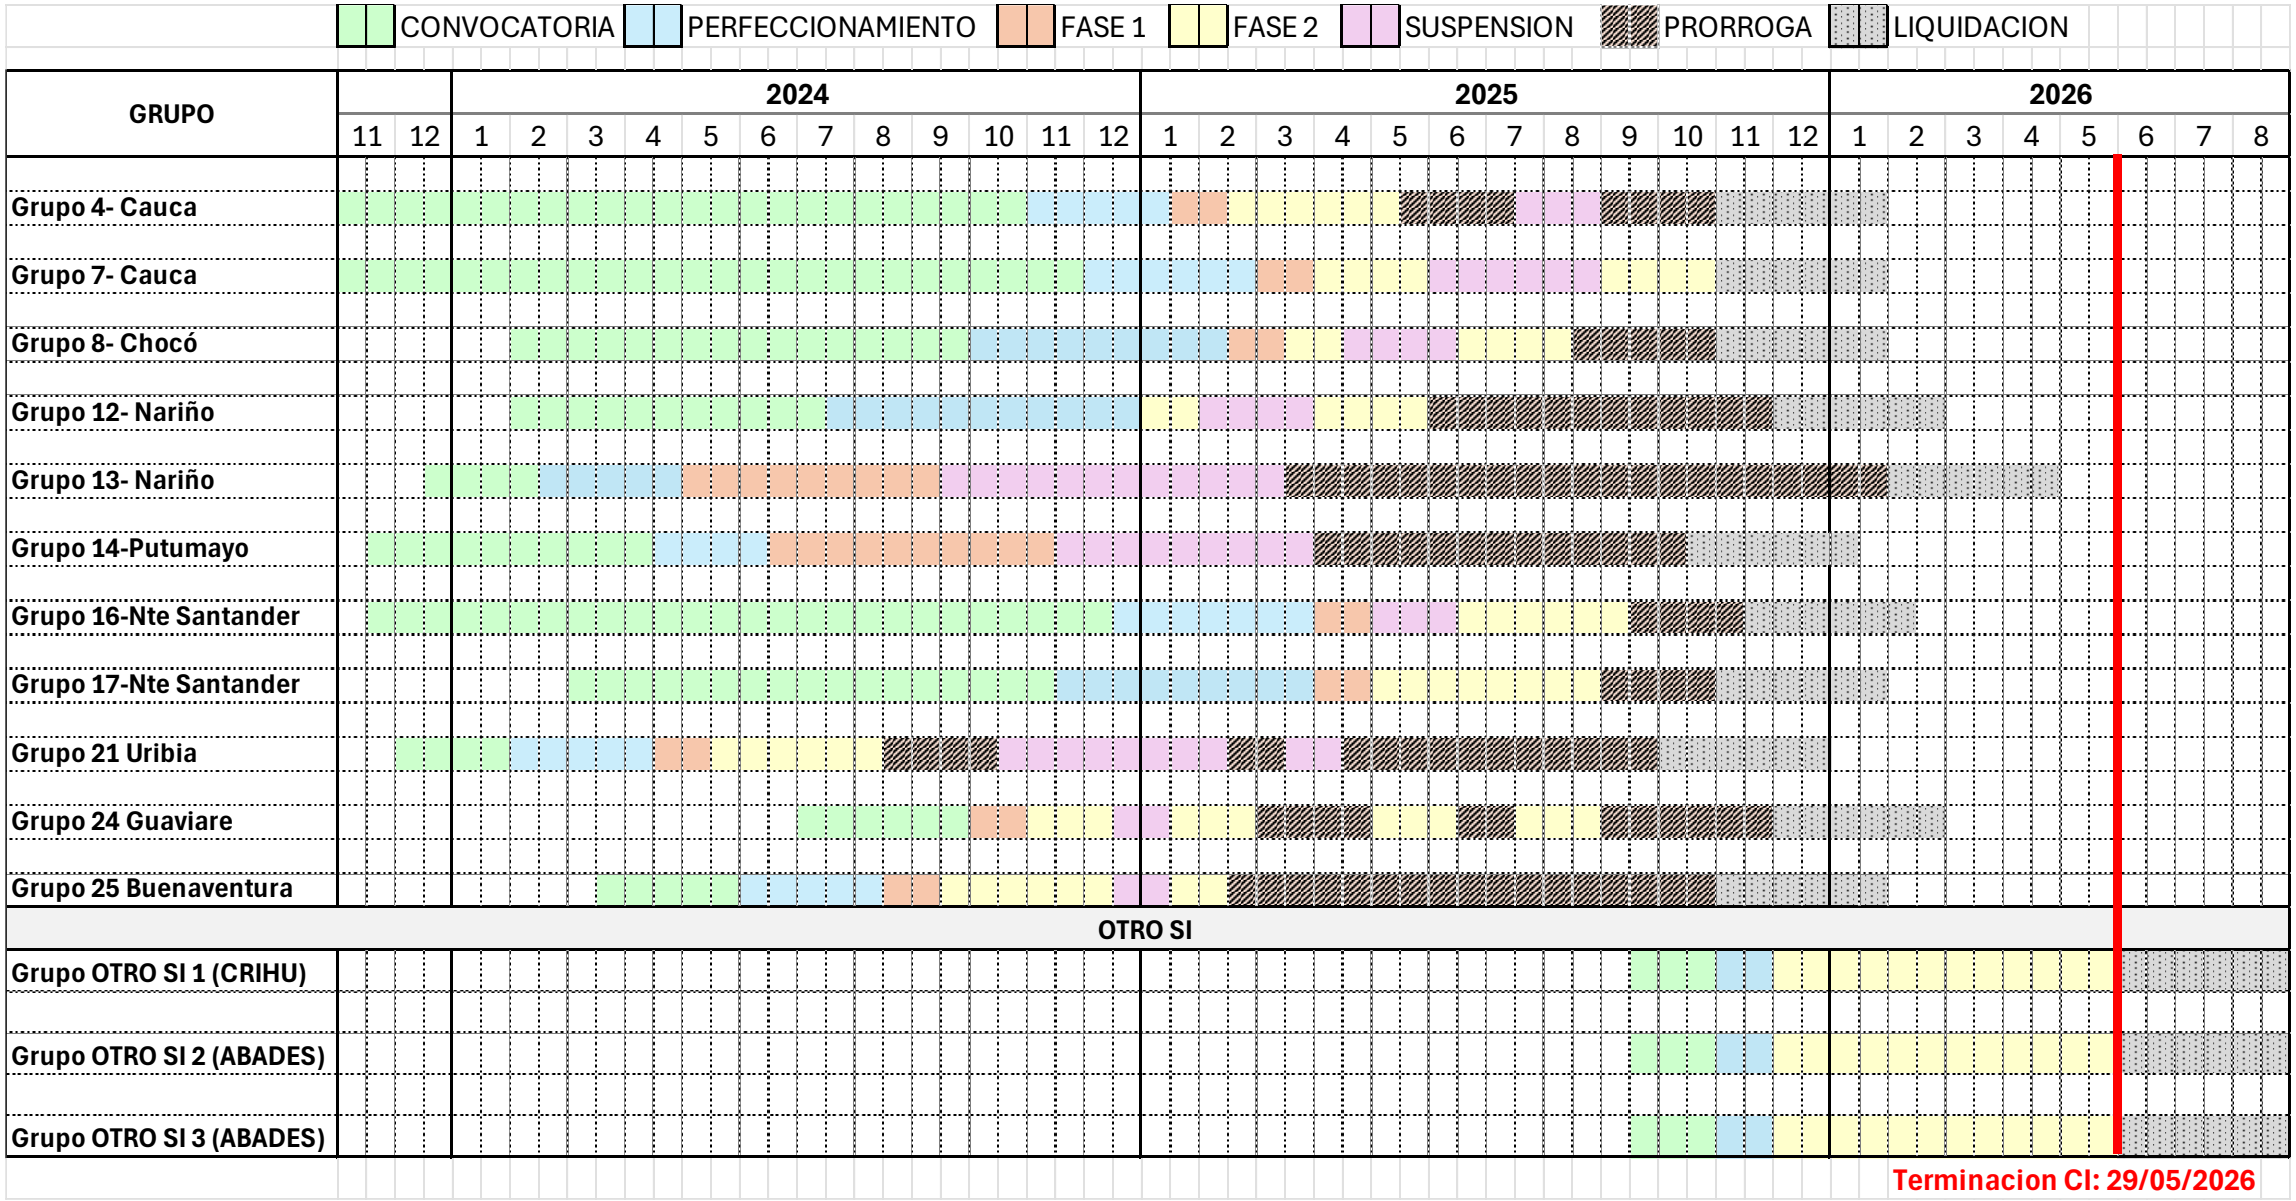

Terminacion CI: 29/05/2026

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CRONOGRAMA DE ENTREGAS

396 Mejoramientos

$ 136,265 Millones de pesos

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	Ent. 2024	2025											2026	Total
				FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENER	
Grupo 1	Tolima	LIQUIDADO	32													32
Grupo 2	Arauca	LIQUIDADO	20													20
Grupo 3	Arauca Casanare	LIQUIDACION	11													11
Grupo 4	Cauca	EN EJECUCION									5	5				10
Grupo 5	Cauca	LIQUIDADO	14													14
Grupo 6	Cauca	ENTREGADO		1			13									14
Grupo 7	Cauca	EJECUCION										14				14
Grupo 8	Chocó	EJECUCION										15				15
Grupo 9	Cesar	LIQUIDADO	15	8												23
Grupo 10	Córdoba Antioquia	LIQUIDADO	17													17
Grupo 11	Córdoba	LIQUIDADO	23													23
Grupo 12	Nariño	EJECUCION										11				11
Grupo 13	Nariño	EJECUCION									3				12	15
Grupo 14	Putumayo	EJECUCION										21				21
Grupo 15	Norte de Santander	ENTREGADO	7				8									15
Grupo 16	Norte de Santander	EJECUCION												14		14
Grupo 17	Norte de Santander	EJECUCION										14				14
Grupo 18	Norte de Santander	DESPRIORIZADO														
Grupo 19	Antioquia	ENTREGADO	3				1	3		4						11
Grupo 20	Risaralda	ENTREGADO			6	3	2			1						12
Grupo 21	La Guajira	EJECUCIÓN										21				21
Grupo 22	La Guajira	LIQUIDADO	6													6
Grupo 23	La Guajira	ENTREGADO			2	11	4	2								19
Grupo 24	Guaviare Caquetá Meta	EJECUCION									5	11				16
Grupo 25	Valle del Cauca	EJECUCION		1		3	3		1		2	6				16
Grupo 26	Risaralda	ENTREGADO			2	10										12
TOTALES			**148**	**10**	**10**	**27**	**31**	**5**	**1**	**5**	**13**	**120**		**14**	**12**	**396**

231 sedes terminadas
54%

370 sedes terminadas
85%

396 sedes terminadas
100%

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

OTRO SI

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	2025					2026						Total
			Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	Entregas Mayo	Jun	Ago	
Grupo 27	Huila (CRIHU)	PRECONTRACTUAL	Convocatoria		Legalización	Ejecución					10			10
Grupo 28	Nariño (Abades 1)	PRECONTRACTUAL	Convocatoria***		Legalización	Ejecución					11			11
Grupo 29	Nariño (Abades 2)	PRECONTRACTUAL	Convocatoria***		Legalización	Ejecución					16			16
														37

***** El inicio de la convocatoria depende de la definición del tipo de convocatoria, el ministerio enviara a Findeter los soportes del cumplimiento de requisitos de las comunidades para validar su aplicación a contratación directa con ellos.**

Grupo 27CRIHU y 29 Abades : Mediante comité interno entre la Gerencia de Infraestructura y el área de Contratación de Findeter del 23 de septiembre de 2025 se consolidará el documento definitivo del Estudio Previo para llevar a convocatoria la primera semana del mes de octubre.

Grupo 28 Abades 1: Se subsanaron los estudios previos de obra e interventoría y se encuentra en la ultima revisión el 19 de septiembre del 2025; en espera del comité interno

ORNATO:

- Sobre las 100 sedes iniciales remitidas por el MEN, 6 sedes fueron despriorizadas del listado debido a que ya estaban siendo atendidas por otras líneas de ejecución.
- Sobre las 94 sedes restantes se ha podido hacer contacto y validación con los rectores y entidades del 50% de las sedes.
- Del 50% de las sedes que se ha podido hacer contacto con la ETC, todas exceden el alcance de intervención del programa Ornato, aplican para línea de Mejoramientos o estratégicos.
- Sobre el restante de sedes educativas se sigue haciendo gestión para contactarlos y establecer las necesidades que tienen en sus sedes.
- Se consulta al Ministerio frente a los alcances distintos presentados por las sedes contactadas, se cambiaria el objeto del programa o se cambiarían las sedes que no aplican.

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CONTRATOS TERMINADOS Y ENTREGADOS

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	OBSERVACIONES
Grupo 01 Tolima	Rioblanco, Chaparral	**32**	01/02/2024	10/09/2024	Liquidado	Acta liquidación obra suscrita el 01/04/2025. Acta liquidación interventoría suscrita el 14/04/2025.
Grupo 02 Arauca	Tame	**20**	15/04/2024	25/09/2024	Liquidado	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Liquidación de interventoría suscrita el 20 de agosto de 2025
Grupo 05 Cauca	Piendamó, Villarica, Morales.	**14**	19/02/2024	04/01/2025	Liquidado	Acta liquidación obra suscrita el 27/05/2025. Acta liquidación interventoría suscrita el 08/07/2025.
Grupo 09 Cesar	Curumaní, La Jagua de Ibirico, Becerril.	**23**	26/02/2024	17/02/2025	Liquidado	Liquidación del contrato de obra se suscribió el 11 de junio de 2025. Acta liquidación interventoría suscrita el 31/07/2025
Grupo 10 Córdoba/ Antioquia	Valencia San Pedro de Urabá	**17**	15/02/2024	15/08/2024	Liquidado	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Grupo 11 Córdoba	Tierralta	**23**	15/02/2024	04/11/2024	Liquidado	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 7/07/ 2025). Contrato de interventoría liquidado (acta liquidación firmada 28/07/ 2025).
Grupo 22 Dibulla	Dibulla	**6**	29/02/2024	21/12/2024	Liquidado	Contrato de obra liquidado 27 de junio de 2025 Contrato de Interventoría liquidado 8 de agosto de 2025

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	ESTADO	OBSERVACIONES
Grupo 15 Nte de Santander	Tibú El Tarra	15	17/06/2024	05/05/2025	Entregado	Terminado el contrato el 05 de mayo de 2025 con el 100 % de las sedes ejecutadas . Se radicará liquidación el 30 de septiembre de 2025.
Grupo 03 Arauca/ Guaviare	Saravena, Hato Corozal, Fortul.	11	05/02/2024	20/10/2024	Entregado	El 22 de septiembre se remite a contratista de obra el acta de liquidación para su firma respectiva. El acta de interventoría se encuentra en ajuste de observaciones.
Grupo 06 Cauca	Suárez. Buenos Aires.	14	02/12/2024	17/05/2025	Entregado	La liquidación de obra se encuentra en revisión del área jurídica para enviar a fiducia y firmar el acta de liquidación, el contrato de interventoría se encuentra en firmas de acta de recibido a satisfacción por parte de la fiducia y continuar con el trámite administrativo de radicación.
Grupo 19 Antioquia	Segovia Nechí	11	09/05/2024	18/08/2025	Entregado	El contrato se encuentra terminado con 11 sedes contractuales entregadas. Se da inicio a la etapa de liquidación del contrato de obra. Se radicará la liquidación a finales del mes de septiembre.
Grupo 20 Risaralda	Quinchía, Apía, Guática, Marsella, Mistrató	12	16/08/2024	16/04/2025	Entregado	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Grupo 23 Maicao	Maicao	19	02/07/2024	30/04/2025	Entregado	Pendiente por liberar contra liquidación las sedes canceladas o despriorizadas de Ulain y Kaspolimana, en Obra y en Interventoría. Hasta el 21ago25 se le pagó última factura pendiente al contratista de obra. Se le solicita inmediatamente documentación para radicar proceso de liquidación el cual se estima iniciar 30sep25.
Grupo 26 Risaralda	Pueblo Rico Mistrató	12	16/08/2024	16/05/2025	Entregado	Se iniciará proceso de liquidación en el mes de septiembre de 2025. Actas de entrega y recibo a satisfacción se encuentra en firme de la Fiducia. Para poder radicar la liquidación del contrato de obra e interventoria.

CCOM-FO-005 V / 05-09-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 04 Cauca	Timbiquí	10	13/01/2025	01/11/2025	88,62%	86,31%	Contrato reinicio el 02 de septiembre de 2025 La sede Chacón Playa se encuentra terminada a la espera de atender observaciones para programar la entrega definitiva, además, durante la semana se adelantaron actividades en las sedes Bellavista, La Sierpe, Angostura y Cabecital con un avance superior al programado.
Grupo 07 Cauca	López de Micay	14	07/03/2025	07/10/2025	16,83%	61,32%	Se reinicia las obras en las sedes Gurumendi y Correntor el día 01 de septiembre de 2025,después de superar los problemas de orden público que dieron origen a la suspensión del 02 de agosto de 2025. Conforme al atraso actual que presenta el contratista, la supervisión solicita a la interventoría el inicio del incumplimiento del contrato y adicionalmente el contratista de obra solicita la prorroga de 2 meses. Se encuentra en revisión la solicitud.

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJEC	% PROGR	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 08 Chocó	Quibdó, Bajo Baudó, Rio Sucio	15	03/08/2025	05/10/2025	11,54%	59,93%	Conforme a que el contratista de obra solo ha iniciado labores del componente II en la sede Alameda reyes en municipio de Quibdó y debido a la no justificación del atraso en dicho componente, se citó al representante legal y sus directivos a reunión presencial en las oficinas de Findeter donde se comprometen a solicitar prórroga y dar inicio a las 4 sedes pertenecientes al municipio de Quibdó, Sin embargo, la supervisión aplicará la clausula 23 de apremio al contratista de obra. Notificado el 21 de agosto del 2025 aplicación se llevará a comité técnico del viernes 26 de septiembre
Grupo 12 Nariño	La Tola Mosquera Santa Barbara	11	30/12/2024	23/12/2025	46,50%	51,33%	Lo ejecutado representa 100% del componente I, el componente II presenta un atraso del 4,83% respecto al programado de 49,70% y al ejecutado de 44,87%.Ejecución en 6 sedes (CE SECADERO, CE POIJA, CE LAS TORRES, CE PUEBLITO, I.E COCAL DE PAYANES Y CE NERETE) de las 11 I.E, se está instalando cubierta en teja UPVC, andenes y se continua con colocación de perfiles para cubierta. El cuatro (4) de septiembre de 2025, se aprobaron en Comité Técnico No. 293 y el ocho (8) de septiembre de 2025, en Comité Fiduciario No. 147 Prórroga por 3 meses al contrato de obra e interventoría, mas adición a la interventoría asumido por contratista de obra.
Grupo 13 Nariño.	Barbacoas	15	30/04/2024	22/01/2026	17,10 %	15,41%	El 10 de septiembre de 2025 se suscribe el otrosí No 02 al contrato de obra por valor de $ 4.750.725.177 lo que genera una reprogramación en el cronograma de ejecución. **Se confirma la entrega de las sedes Candillas Anzamapí y alto Guelmambí para el 30 de septiembre de 2025, de acuerdo a lo informado.**

CCOM/FO/005 V1 / 05 Ago/2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 14 Putumayo	Puerto Asís Valle Guamez San Miguel Puerto Caicedo	21	12/06/2024	22/10/2025	42,62%	58,52%	Aun se continúa a la espera de la respuesta sobre el oficio enviado el 16 de agosto de 2025 sobre el pronunciamiento de la Gobernación del Putumayo donde se confirma que la I.E. JOSE ANTONIO GALAN sede Primaria de Puerto Caicedo hace parte de un proyecto para la construcción de una nueva infraestructura educativa con un valor asignado de 14.600 millones de pesos, por tal razón se procede a solicitar la despriorización de la misma. En la visita realizada por la supervisión los días comprendidos entre el 8 al 11 de septiembre, se confirma el avance de las sedes y las dificultades expresadas por el contratista de obra, las cuales son la falta de personal en la zona y problemas en el transporte de materiales. Se solicita a la interventoría iniciar con el proceso de apremio al contratista de obra
Grupo 16 Nte de Santander	El Carmen Convención	14	21/04/2025	20/11/2025	1,79%	1,79%	El día 19 de septiembre de 2025 se aprueba mediante comité fiduciario la solicitud de prórroga por dos meses al contrato de obra e interventoría mas la mayor permanencia de la interventoría por 60 millones de pesos que será asumída por el contratista A la espera de la respuesta por parte del MEN de la despriorización de la sede Honduras Motilonia, que será intervenida por la gobernación del departamento. El oficio fue remitido el día 28 de agosto de 2025

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 17 Nte de Santander	Teorama San Calixto Hacarí	**14**	**22/04/2025**	**22/10/2025**	12,79 %	86,33%	Lo ejecutado representa 96,06% del componente I, el cual no ha culminado, presentando un atraso del 3,94% que afecta el componente II con un atraso del 74,49% respecto al programado de 86,14% y al ejecutado de 11,65%. Persisten observaciones en el componente I, pendiente el componente de 3 sedes. En ejecución 6 sedes. Persisten dificultades para iniciar sedes faltantes: disponibilidad de espacios por parte de las I.E y de MO en la zona, se gestiona personal externo, bloqueos en vía ya sea por afectación de orden público o del clima afectan logística de transporte y disponibilidad de mano de obra en el territorio. En revisión el concepto para solicitud de inicio del procedimiento de Apremio al contratista obra.
Grupo 21 Uribia	Uribia	**21**	**01/04/2024**	**02/10/2025**	15,36%	66,09%	Debido a los atrasos presentados, se inició proceso de incumplimiento al contratista de obra 14 de agosto de 2025 por incumplimiento de las obligaciones contractuales que no han sido completadas a cabalidad. Actualmente se encuentra la interventoría en revisión de los descargos presentados por el contratista de obra. Se recibió el plan de contingencia solicitado para la mitigación de los atrasos, sin embargo se evidencia que no esta siendo cumplido por este. Se encuentran activas 8 sedes educativas, en la media y Baja guajira. En dos semanas se iniciaran las sedes de la alta Guajira (8) dadas las situaciones de invierno que dificultan el acceso.

CCOM/FO/005 V 2.03 /Ago/2024 Pública

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 24 Guaviare Caquetá Meta	Uribe, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar	**16**	**26/09/2024**	**25/11/2025**	67,54%	68,01%	Lo ejecutado representa 100% del componente I, y en el componente II presenta un atraso del 0,49% respecto al programado de 66.91% y al ejecutado de 66,43%. Continua en ejecución mínima de obra, dificultad en ingreso a las sedes por mal estado de las vías. 10 sedes con avance 80% a 100% 1 sedes con avance 40% a 60% 2 sedes con avance 20% al 40%. 3 sedes con avance 0% al 20%. Se solicitó a la interventoría conminar al contratista de obra por incumplimiento en el cronograma de obra en relación al inicio de cuatro (4) sedes: Tomachipan, Cerro Cocuy, Puerto Flores y Termales.
Grupo 25 B/ventura	B/ventura	**16**	**21/08/2024**	**20/10/2025**	82,34%	76,80%	El 19 de septiembre de aprobó en Comité fiduciario prórroga de obra e interventoría por el término de un mes sin adición de recursos. Continúan los problemas de orden público, por grupos al margen de la ley. El personero municipal del Litoral de San Juan, mediante comunicado informa alteraciones de orden público en la zona del Bajo Calima, afectando la ruta fluvial para el transporte de materiales y del personal. Adicionalmente, Findeter se encuentra a la espera de la instrucción para la inclusión de las sedes de IE San Rafael en el municipio de Buenaventura y la SE Antonia Santos en el municipio de Tuluá. Ambas en el departamento de Valle del Cauca, Se radica oficio 2202552024679 al MEN con solicitud de la SE Antonia Santos, en donde solicitan la intervención de la sede.

CCOMEC-005 V1 05 /Ago/2022/ Pública

CONTRATOS EN ESTRUCTRURACION

GRUPO	Municipios	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 27 CRIHU	Huila	**10**	**Por definir**	**Por definir**	N/A	N/A	- Se continua con el trámite de convenios con la ETC el 1 de julio/25, pendiente documentos de la gobernación del huila - Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP. - Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 6.330.094.415. para obra + interv. - Los EP de obra e interventoría se encuentran en validación del equipo de contratación para proceder a publicar la convocatoria, se estima en la segunda semana de octubre de 2025.
Grupo 28 Abades	Nariño Santa Cruz	**11**	**Por definir**	**Por definir**	N/A	N/A	- Se continua con el trámite de convenios con la ETC, se realiza el borrados y se remitirá el convenio a las partes el 12 de septiembre de 2025. - Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP. - Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 4.626.399.299. para obra + interv. - Se espera definición de como avanzar con la contratación, si se gestionará convocatoria publica o directa con comunidades.
Grupo 29 Abades	Nariño Samaniego / La llanada	**16**	**Por definir**	**Por definir**	N/A	N/A	- Se inicia tramite de convenios con la ETC el 1 de julio/25. - Se radicará el 18 de julio a contratación derivada los EP. • Se cuenta con un presupuesto inicial estimado de $ 7.817.350.929. para obra + interv. - Se espera definición de como avanzar con la contratación, si se gestionará convocatoria publica o directa con comunidades.

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 04/ Cauca

Adjudicación Obra: 25/11/2024
Adjudicación Inter: 25/11/2024

Fecha inicio: 13/01/2025
Fecha Fin: 01 /11/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**Timbiquí**	
	Obra Consorcio I.E. Cauca-Nariño 2024	**Interventoría** Consorcio Findeter G.3
$	**Valor Inicial** Obra: $1.774.087.439 Interventoría: $182.836.360	
	Adiciones Interventoría: 40.160.893,50 A cargo de contratista de obra+11.800.426,75 a cargo del Contratista de Obra.	
	Valor Pagado Obra: $ 52.000.000,00 Interventoría: $30.692.480	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	06/05/2025 Prórroga x 1 mes y 15 días + adición a interventoría asumido por contratista 27/06/2025 Prórroga x 20 días + adición a interventoría asumido Suspensión 17/07/2025 x 45 días 26/08/2025 Prórroga x 2 meses	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato reinicia el 02 de septiembre de 2025. La sede Chacón Playa se encuentra terminada a la espera de atender observaciones para programar la entrega definitiva, además, durante la semana se adelantaron actividades en las sedes Bellavista, La Sierpe, Angostura y Cabecital con un avance superior al programado.	

88,62%
Porcentaje de avance

86,31 %
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Terminadas	**2**
En ejecución	8
Suspendidas	0



No	Municipio	Dane Sede	Nombre Sede	Estado
1	Timbiquí	119809001293	BELLA VISTA	Ejecución
2	Timbiquí	219809000071	ANGOSTURA	Ejecución
3	Timbiquí	219809001077	COROZAL	Ejecución
4	Timbiquí	219809000607	CHACON	Terminada
5	Timbiquí	219809001221	ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERPE	Ejecución
6	Timbiquí	219809000763	SAN MIGUEL DEL RIO	Terminada
7	Timbiquí	219809000135	BOCA DE PATIA SEDE PRINCIPAL	Ejecución
8	Timbiquí	219809000861	CHETE	Ejecución
9	Timbiquí	219809000411	CABECITAL SEDE PRINCIPAL	Ejecución
10	Timbiquí	219809001395	SANTA ROSA SEDE PRINIPAL	Ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 06/ Cauca

Adjudicación Obra: 28/08/2024
Adjudicación Inter: 09/09/2024

Fecha inicio: 02/12/2024
Fecha Fin: 17/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**Suarez y Buenos Aires**	
	Obra: CONSORCIO EDUCATIVO 2024	**Interventoría** Consorcio Interventoría Educativa G6
$	**Valor Inicial** Obra: $2.452.682.000 Interventoría: $ 212.100.000	
	Adiciones Obra: N.A Interventoría: N/A	
	Valor Pagado Obra: $2.452.682.000 Interventoría: $ 194.699.999,92	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prórroga No 1 por 1 mes y 15 días 25/03/2025	
GESTION	Conforme a la fecha de terminación del contrato de obra del 17 de mayo y de interventoría del 17 julio. 1. Obra: Se realizo radicación en prissa el 29 de julio, el cual se encuentra actualmente la revisión de la profesional del área para proceder con la firma del acta de liquidación. 2. Interventoría: Se encuentra en revisión y firme por parte de la Fiducia para poder radicar los documentos en prisa para el mes de agosto y continuar dentro de los tiempos el cierre de la liquidación del contrato.	

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas **14**

En ejecución **0**

Terminadas



No	Municipio	Nombre Sede	DaneIE	Estado
1	Suárez	NINA MARIA	219780001218	Entregada
2	Suárez	PORTUGAL	219780001218	Entregada
3	Suárez	CANUTICO	219780001218	Entregada
4	Suárez	VISTA HERMOSA	219780000467	Entregada
5	Suárez	SAN VICENTE	219780000467	Entregada
6	Suárez	LA CABAÑA	219780000777	Entregada
7	Suárez	SENDERITO	219780001382	Entregada
8	Buenos Aires	EL SILENCIO	219110001659	Entregada
9	Buenos Aires	NUEVA VISION DE HONDURAS (sede principal	219110001691	Entregada
10	Buenos Aires	TIMBA (sede principal)	419110000970	Entregada
11	Buenos Aires	LA ESPERANZA	219110000172	Entregada
12	Buenos Aires	MUNCHIQUE (sede principal	219110001012	Entregada
13	Buenos Aires	LA BALSA	219110001641	Entregada
14	Buenos Aires	GABRIEL MANRIQUE	119110000500	Entregada

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 07/ Cauca

Adjudicación Obra: 21/12/2024
Adjudicación Inter: 28/01/2025

Fecha inicio: 07/03/2025
Fecha Fin: 07/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**López de Micay**	
	Obra Consorcio I.E. Cauca-Nariño 2024	**Interventoría** Consorcio Findeter g.3
$	**Valor Inicial** Obra: $3.144.064.242 Interventoría: $ 219.751.350	
	Adiciones	
	Valor Pagado	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión No 01: 30 días 30 de mayo de 2025 Prorroga 1 a la suspensión 1: el 27 de junio de 2025 x 1 mes Modificación del alcance: 08 de julio de 2025 Prorroga 02 a la suspensión 1: el 24 de julio de 2025 X1 mes **Reinicia el 03 de septiembre de 2025**	
GESTION	Se reinicia las obras en las sedes Gurumendi y Correntor el día 01 de septiembre de 2025,después de superar los problemas de orden público que dieron origen a la suspensión del 02 de agosto de 2025. Conforme al atraso actual que presenta el contratista, la supervisión solicita a la interventoría el inicio del incumplimiento del contrato y adicionalmente el contratista de obra solicita la prorroga de 2 meses. Se encuentra en revisión la solicitud.	

16,83%
Porcentaje de avance

61,32%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas	-
En ejecución	14
Suspendidas	-



No	Municipio	Dane Sede	Nombre Sede	Estado
1	López	219418001021	BETANIA	En ejecución
2	López	219418000149	SAN JOSE DEL CHIGUERO	En ejecución
3	López	219418000122	EL COCO	En ejecución
4	López	219418000076	GUAYABAL	En ejecución
5	López	219418000459	LAS CRUCES	En ejecución
6	López	219418001634	LAS PALMAS	En ejecución
7	López	219418000424	EL TRUENO	En ejecución
8	López	219418000131	GUACARI	En ejecución
9	López	219418000840	CORRENTON	En ejecución
10	López	219418001609	NOAMITO SEDE PRINCIPAL	Despriorizada
11	López	219418000378	SAGRADA FAILIA SEDE PRINCIPAL	En ejecución
12	López	219418000238	SAN ANTONIO DE GURUMENDI	En ejecución
13	López	219418000157	YULLAL JOLI	En ejecución
14	López	219418001200	EL CACAO	En ejecución
15	López	219418000831	PLAYA MENUDA JOLI	Despriorizada
16	López	219418000301	SANTA CRUZ ALTO SIGUI	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 08/ Chocó

Adjudicación Obra: 09/10/2024
Adjudicación Inter: 11/10/2024

Fecha inicio: 03/02/2025
Fecha Fin: 05/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	Quibdó, Riosucio	
	Obra CONSORCIO PRO INSTITUCIONES CHOCÓ	**Interventoría** CONSORCIO INTERVENTORES GC91
$	**Valor Inicial** Obra: $3.316.617.339 Interventoría: $ 250.437.083	
	Adiciones Interventoría: $32.405.049,43 (P.a.) $46.292.942,75 (asumido por contratista)	
	Valor Pagado Obra: $39.219.600 Interventoría: $32.449.326,48	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión por 30 días 15/04/2025 Prórroga No 01 a la suspensión 1 por 30 días- 10/05/2025 **Reinició 18/06/2025** Modificación alcance del contrato17/06/2025 Prorroga No 1 por 2 meses 22/07/2025 y adición a la interventoría ($78.698.002,68)	
GESTION	Conforme a que el contratista de obra solo ha iniciado labores del componente II en la sede alameda reyes en municipio de Quibdó y debido a la no justificación del atraso en dicho componente, se citó al representante legal y sus directivos a reunión presencial en las oficinas de Findeter donde se comprometen a solicitar prórroga y dar inicio a las 4 sedes pertenecientes al municipio de Quibdó Sin embargo la supervisión aplicará la clausula 23 de apremio al contratista de obra. Notificado el 21 de agosto del 2025 aplicación se llevará a comité técnico del viernes 12 de septiembre	

11,54%
Porcentaje de avance

59,93%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas **0**

En ejecución 15

Sedes Despriorizadas

DaneSede	Nombre Sede
227001001706	SEDE DE GUADALUPE
227001018145	SEDE DE MUNGARADO
227001018340	SEDE GUADUALITO
227001800072	SEDE EL NOVENTA
227001018374	SEDE PLAYA INDIA
227001018226	SEDE DE CARRIZAL



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Rio Sucio	227615001664	SEDE LAS AMERICAS	En ejecución
2	Quibdó	227001003547	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIO DE TAGACHI	En ejecución
3	Quibdó	227001000998	SEDE DE MOTOLDO	En ejecución
4	Quibdó	227001018137	CE INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA	En ejecución
5	Quibdó	227001004233	SEDE DE CHUSCALITO	En ejecución
6	Quibdó	227001018331	SEDE PLAYA BONITA	En ejecución
7	Quibdó	227001018251	SEDE PUERTO JUAN	En ejecución
8	Quibdó	227001000408	SEDE DE LA COMUNIDAD	En ejecución
9	Bajo Baudó	127077002103	SEDE MARIA ISABEL MOSQUERA	En ejecución
10	Bajo Baudó	127077000089	IE FRANCISCO PIZARRO - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
11	Bajo Baudó	127077005234	IE INDÖGENA EMBERA DE PIZARRO - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
12	Quibdó	127001000039	SEDE LOS ANGELES	En ejecución
13	Quibdó	127001000047	SEDE ALAMEDA REYES	En ejecución
14	Quibdó	127001003151	SEDE NIÑO JESUS	En ejecución
15	Quibdó	127001000799	SEDE MIRAFLORES	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 12/ Nariño

Adjudicación Obra: 12/07/2024
Adjudicación Inter: 04/10/2024

Fecha inicio: 30/12/2024
Fecha Fin: 23/12/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	La Tola, Mosquera, Santa Barbara	
	Obra CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO	**Interventoría** ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S
$	**Valor Inicial** Obra: $2.628.232.452,00 Interventoría: $209.551.039,00	
	Adiciones Interventoría: $ 116.020.814,25 (asumidos por contratista) +$87.030.519,50 asumidos por (contratista)	
	Valor Pagado: Interventoría: $ 30.030.000	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión No 01: 31/01/2025 por 24 días Prórroga No 01 suspensión 01: 24/02/2025 por 15 días Suspensión No 02: 11/03/2025 por 15 días **Reinició el 29/03/2025** Prórroga No 01: 20 /05/2025 por 3 meses Prórroga No 02: 08/09/2025 por 3 meses y adición a interventoría	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Lo ejecutado representa 100% del componente I, el componente II presenta un atraso del 4,83% respecto al programado de 49,70% y al ejecutado de 44,87%.Ejecución en 6 sedes (CE SECADERO, CE POIJA, CE LAS TORRES, CE PUEBLITO, I.E COCAL DE PAYANES Y CE NERETE) de las 11 I.E, se está instalando cubierta en teja UPVC, andenes y se continua con colocación de perfiles para cubierta. El cuatro (4) de septiembre de 2025, se aprobaron en Comité Técnico No. 293 y el ocho (8) de septiembre de 2025, en Comité Fiduciario No. 147 Prórroga por 3 meses al contrato de obra e interventoría, mas adición a la interventoría asumido por contratista de obra	

46,50%
Porcentaje de avance

51,33%
Porcentaje Programado



Sedes Educativas

Entregadas -

En ejecución 11

Despriorizadas 2



No	Municipio	Dane Sede	Nombre Sede	Estado
1	La Tola	252390000099	SEDE 5 EL SECADERO	En ejecución
2	La Tola	252250000391	SEDE 5 POIJA	En ejecución
3	La Tola	252250000200	SEDE 2 GUILLERMO ZARAMA VILLOTAS	En ejecución
4	La Tola	252250001001	CENTRO EDUCATIVO LAS TORRES	En ejecución
5	La Tola	252250000480	SEDE 4 EL PUEBLITO	En ejecución
6	La Tola	252250000765	SEDE 4 NERETE	En ejecución
7	Mosquera	252473001062	SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA COCAL DE LOS PAYANES	En ejecución
8	Sta Bárbara	252696000203	SEDE 6 CHANZARA LAS PEÑAS	En ejecución
9	Sta Bárbara	252696000912	SEDE 11 LAS VARAS	En ejecución
10	Sta Bárbara	252696001323	SEDE 9 LA PEÑITA	En ejecución
11	Sta Bárbara	252696000661	SEDE 5 SANTA ROSA	En ejecución
12	Sta Bárbara	252696000939	SEDE 14 DESPLAYADO	Despriorizados
13	Sta Bárbara	252696001129	SEDE 10 SAN ANDRES	Despriorizados

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 13/ Nariño

Adjudicación Obra: 30/01/2024 Fecha inicio: 30/04/2024
Adjudicación Inter: 30/01/2024 Fecha Fin: 22/01/2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**Barbacoas**
	Obra CONSTRUCCIONES B&M S.A.S **Interventoría** UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SUR DE COLOMBIA
$	**Valor Inicial** Obra: $4.374.302.638 Interventoría: $288.742.298 **Adiciones** Obra: 4.750.725.177 Interventoría: $ 159.807.583 (asumido por contratista) **Valor Pagado:** Obra: $585.911.808,78 Interventoría: $48.720.000
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión No 01: 25/09/2024 x 15 días Prorroga a la suspensión : 01 09/10/2024 x 15 días Prorroga a la suspensión : 02 22/10/2024 x 30 días Prorroga a la suspensión : 03 22/11/2024 x 25 días Prorroga a la suspensión : 04 17/12/2024 x 45 días Prorroga a la suspensión : 05 31/01/2025 x 45 días Reinició 17/03/2025 Prorroga No 01 + Adición a interventoría 19/03/2025x 10 meses **Adicion No: 01 (obra)** 10/09/2025 $ 4.750.725.177
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El 10 de septiembre de 2025 se suscribe el otrosí No 02 al contrato de obra por valor de $ 4.750.725.177 lo que genera una reprogramación en el cronograma de ejecución. Se confirma la entrega de las sedes Candillas Anzamapí y alto Guelmambí para el 30 de septiembre de 2025, de acuerdo a lo informado.

17,10%
Porcentaje de avance

15,41%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Terminadas **3**
En ejecución 12
Suspendidas -



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Barbacoas	252079002134	//SEDE 13 CHIMBAGAL	En ejecución
2	Barbacoas	252079001715	//SEDE 11 GUIGUAY	En ejecución
3	Barbacoas	252079001951	*SEDE 12 HONDA RIO GUIZA	En ejecución
4	Barbacoas	252079001588	*SEDE 4 PAMBIL	En ejecución
5	Barbacoas	252079001669	* SEDE 7 GUELMAMBI CARAÑO	En ejecución
6	Barbacoas	252079001693	//SEDE 10 EL TIGRILLO	En ejecución
7	Barbacoas	252079800014	//CENTRO EDUCATIVO ALTO GUELMAMBI - SEDE PRINCIPAL	Terminada
8	Barbacoas	252079001898	//CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
9	Barbacoas	252079800031	* CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE 3 anzamapi	Terminada
10	Barbacoas	252079800049	* SEDE 5 GUAYABAL	En ejecución
11	Barbacoas	252079800022	* SEDE 4 ALTO PALI	En ejecución
12	Barbacoas	252079001731	* SEDE 3 PIPALTA PALBI	En ejecución
13	Barbacoas	252079002118	//SEDE 8 EL PLAYàN	En ejecución
14	Barbacoas	252079001880	//CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO - SEDE PRINCIPA	En ejecución
15	Barbacoas	252079001600	* CENTRO EDUCATIVO CANDILLAS	Terminada

Fase 1 *
Fase 2// En espera de adición

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 14/ Putumayo

Adjudicación Obra: 22/04/2024 Fecha inicio: 12/06/2024
Adjudicación Inter: 22/04/2024 Fecha Fin: 22/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	Puerto Asís, Valle de Guamuez, San Miguel, Puerto Caicedo	
	Obra CONSORCIO PUTUMAYO 2024	**Interventoria** U.T. INTERVENTORIA SUR DE COLOMBIA
	Valor Inicial Obra: $4.242.685.000	Interventoría: $ 303.456.716
	Adiciones Interventoría asumido por el contratista de obra $60,000,000	
	Valor Pagado Interventoría: $ 54.201,4	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 01: 12/11/2024 / 15 días Prórroga susp 01 : 27/11/2024 / 15 días Prórroga susp 02 : 12/12/2024 / 10 días Prórroga susp 03 : 22/12/2024 / 45 días Prórroga susp 04 : 05/02/2024 – 45 días	Prórroga No 01 por 4 meses - Prórroga No 02 por 3 meses:15-07-2025 y adición a interventoría $60 millones
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Aun se continúa a la espera de la respuesta sobre el oficio enviado el 16 de agosto de 2025 sobre el pronunciamiento de la Gobernación del Putumayo donde se confirma que la I.E. JOSE ANTONIO GALAN sede Primaria de Puerto Caicedo hace parte de un proyecto para la construcción de una nueva infraestructura educativa con un valor asignado de 14.600 millones de pesos, por tal razón se procede a solicitar la despriorización de la misma. En la visita realizada por la supervisión los días comprendidos entre el 8 al 11 de septiembre, se confirma el avance de las sedes y las dificultades expresadas por el contratista de obra, las cuales son la falta de personal en la zona y problemas en el transporte de materiales. Se solicita a la interventoría iniciar con el proceso de apremio al contratista de obra	

42,62 %
Porcentaje de avance

58,52%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Entregadas -

En ejecución 21

Suspendidas -



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Puerto Asis	286568003285	SEDE VILLAMARQUEZA	En ejecución
2	Puerto Asis	286568004087	SAMARIA	En ejecución
3	Puerto Asis	286568004788	ESC RUR MIX LA MANUELA (Manuelita)	En ejecución
4	Puerto Asis	286568005130	ESC RUR MIX PUERTO UNION	En ejecución
5	Puerto Asis	286568000286	SAN GERARDO	En ejecución
6	Puerto Asis	286568004419	ESC RUR MIX LA ESMERALDA PTYO UNO	En ejecución
7	Puerto Asis	286568003234	ESC RUR MIX EL RECUERDO PEÑAZORA	En ejecución
8	Puerto Asis	286568003099	CER TETEYE - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
9	Puerto Asis	286568003871	ESC RUR MIX ALTO PIÑUÑA BLANCO	En ejecución
10	Puerto Asis	286568002670	ESC RUR MIX LA DANTA	En ejecución
11	Valle de Guamuez	286568005873	ESC RUR MIX LA YET	En ejecución
12	Valle de Guamuez	286865003049	ERM COSTA RICA	En ejecución
13	Valle de Guamuez	286568004591	ESC RUR MIX MOGAMBO	En ejecución
14	Valle de Guamuez	286865004304	ESC RUR MIX LAS PAVAS	En ejecución
15	Valle de Guamuez	286865004274	ESC RUR MIX ALTO GUISIA	En ejecución
16	San Miguel	286865003120	ESC RUR MIX EL ESPINAL	En ejecución
17	San Miguel	286757003938	ESC RUR MIX SAN LORENZO	En ejecución
18	San Miguel	286757000289	ESC RUR MIX LA CABAÑA	En ejecución
19	San Miguel	286865002816	ESC RUR MIX SANTA MARTHA	En ejecución
20	Puerto Caicedo	286568002165	PREESC PTO CAICEDO	En ejecución
21	Puerto Caicedo	286568000146	ESC URB MIX PTO CAICEDO	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 16 Nte de Santander

Adjudicación Obra: 12/12/2024 Fecha inicio: 21/04/2025
Adjudicación Inter: 20/12/2024 Fecha Fin: 20/11/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**El Carmen, Convención**	
	Obra CONSORCIO GRUPO SANTANDER	**Interventoría** CONSORCIO SANTA MARIA 116
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.519.310.507 Interventoría: $ 254.748.548	
	Adiciones Obra: $0 Interventoría: $60.000.000 asumidas por contratista de obra	
	Valor Pagado Obra: $0 Interventoría: $	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	19/09/2025: Prorroga por 2 meses Obra e interventoría (Adición x60 millones interventoría)	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El día 19 de septiembre de 2025 se aprueba mediante comité fiduciario la solicitud de prórroga por dos meses al contrato de obra e interventoría mas la mayor permanencia de la interventoría por 60 millones de pesos que será asumida por el contratista. A la espera de la respuesta por parte del MEN de la despriorización de la sede Honduras Motilonia, que será intervenida por la gobernación del departamento. El oficio fue remitido el día 28 de agosto de 2025	

1,79%
Porcentaje de avance

1,79%
Porcentaje Programado



Sedes Educativas

Entregadas **0**

En ejecución 14

Suspendidas



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Convención	254206001030	CENT EDUC RUR HONDURAS MOTILONIA	En ejecución
2	Convención	254206001161	SEDE SANTAFE DE HONDURAS	En ejecución
3	Convención	254206001366	SEDE AGUAS LIMPIAS	En ejecución
4	Convención	154206000021	NORMAL SUPERIOR	En ejecución
5	El Carmen	254245001080	SEDE LA ESPERANZA	En ejecución
6	Convención	254206000220	SEDE BRISAS SANTANDEREANAS	En ejecución
7	Convención	254206000149	CENT EDUC RUR EL GUAMAL	En ejecución
8	El Carmen	254245000105	SEDE LIMONAL	En ejecución
9	El Carmen	254245000598	SEDE TABACAL	En ejecución
10	El Carmen	254245001209	SEDE LA AGUADA	En ejecución
11	El Carmen	254245000571	SEDE ASTILLEROS	En ejecución
12	Convención	154206000641	SEDE NO 2 JOSE MARIA ESTEVEZ COTE	En ejecución
13	Convención	254206000815	SEDE CARTAGENA	En ejecución
14	Convención	254206000351	SEDE GRAMALES	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 17/ Norte de Santander

Adjudicación Obra: 19/11/2024 Fecha inicio: 22/04/2025
Adjudicación Inter: 19/11/2024 Fecha Fin: 22/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**Teorama, San Calixto, Hacarí**	
	Obra CONSORCIO TRIPTICO 2024	**Interventoría** SOLIUN S.A.S
	Valor Inicial Obra: $5.401.660.624 Interventoría: $ 241.983.275	
	Adiciones Obra: $0 Interventoría: $ 66.394.858 (asumidos por contratista)	
	Valor Pagado	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prórroga No 01: 14 /08/2025 por 2 meses+ Adición a Interventoría x $ 66,394,858	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Lo ejecutado representa 96,06% del componente I, el cual no ha culminado, presentando un atraso del 3,94% que afecta el componente II con un atraso del 74,49% respecto al programado de 86,14% y al ejecutado de 11,65%. Persisten observaciones en el componente I, pendiente el componente de 3 sedes. En ejecución 6 sedes. Persisten dificultades para iniciar sedes faltantes: disponibilidad de espacios por parte de las I.E y de MO en la zona, se gestiona personal externo, bloqueos en vía ya sea por afectación de orden público o del clima afectan logística de transporte y disponibilidad de mano de obra en el territorio. En revisión el concepto para solicitud de inicio del procedimiento de Apremio al contratista obra.	

12,79%
Porcentaje de avance

86,33%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas **0**

En ejecución **14**

Suspendidas



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Teorama	254800000736	SEDE LOS MESONES	En ejecución
2	Teorama	254800000108	CENT EDUC RUR EL FARACHE	En ejecución
3	Teorama	254800000167	SEDE PULPITOS	En ejecución
4	Teorama	254800001112	SEDE JABONERA	En ejecución
5	Teorama	254800000752	SEDE MARGARITAS	En ejecución
6	San Calixto	154670000025	COL CAYETANO FRANCO PINZON	En ejecución
7	San Calixto	254670000895	SEDE QUEBRADA AZUL	En ejecución
8	San Calixto	254670000941	SEDE SAN JOSE DEL VAJIAL	En ejecución
9	San Calixto	254670001298	SEDE EL CARACOL	En ejecución
10	Hacarí	254344000371	SEDE EL CERRO	En ejecución
11	Hacarí	254344000290	CENT EDUC RUR SAN SEBASTIAN	En ejecución
12	Hacarí	254344001083	SEDE LA ESTACION	En ejecución
13	Hacarí	254344000141	SEDE EL VALLE	En ejecución
14	Hacarí	254344000877	SEDE EL LIBANO	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 21 Uribia

Adjudicación Obra: 30/01/2024 Fecha inicio: 01/04/2024
Adjudicación Inter: 30/01/2024 Fecha Fin: 02/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**La Guajira**	
	Obra SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	**Interventoría** CONSORCIO CDG GUAJIRA
$	**Valor Inicial** Obra: $7.471.853.502	Interventoría: $327.138.021
	Adiciones Obra $963.436.631,56+ 3.853.162.459,03	Interventoría $ 96.343.663,16+ 126.794.535,50
	Valor Pagado Obra: $ 2.050.571.973,94	Interventoría: $ 308.426.019,70
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga No 01: 19/06/2024 por 95 días Suspensión No 01: 29/10/2024 por 30 días Prorroga 1 suspensión 1: 27/11/2024 por 45 días Prorroga 2 suspensión 1: 27/12/2024 por 20 días Prorroga 3 suspensión 1: 30/01/2025 por 20 días	Suspensión No 02: 10/03/2025 por 30 días Prorroga 1 suspensión 2: 10/04/2025 por 20 días Prorroga 2 suspensión 2: 30/04/2025 por 30 días Prorroga 2 por 4 meses y Adición obra:3.853.162.459,03 interventoría 126.794.535,50 **Reinició 02 de junio de 2025**
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Actualmente se encuentra la interventoría en revisión de los descargos presentados por el área jurídica de Findeter para la continuación del proceso de apremio al contratista de obra por el incumplimiento en los avances de obra. Se encuentran activas 8 sedes educativas, en la media y Baja guajira. En dos semanas se iniciaran las sedes de la alta Guajira (8) dadas las situaciones de invierno que dificultan el acceso. Por temas de invierno el personal ha decidido renunciar por las condiciones de accesibilidad al territorio, generando mas retras	

21%
Porcentaje de avance

85%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Públic

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas -

En ejecución 21

Suspendidas -



No	Municipio	Dane Sede	Nombre Sede	Estado
1	Uribia	244847800277	ATAPUT	En ejecución
2	Uribia	244847800293	JUYAMANA	En ejecución
3	Uribia	244847800275	AMUSICHIWOU	En ejecución
4	Uribia	244847800301	PISHICHON	En ejecución
5	Uribia	244847800300	PIAZAPA	En ejecución
6	Uribia	244847800281	CHIPANA	En ejecución
7	Uribia	244847800620	AIPAIMANA	En ejecución
8	Uribia	244847001379	MATIA	En ejecución
9	Uribia	244847800135	TEQUENDAMA	En ejecución
10	Uribia	244847800134	SAN MARTIN	En ejecución
11	Uribia	244847800123	MALEEN	En ejecución
12	Uribia	244847800119	KALERRUWO	En ejecución
13	Uribia	244847800104	ATACHONKO	En ejecución
14	Uribia	244847800077	CARRAIPIA	En ejecución
15	Uribia	244847800088	KAYUSIRAMANA	En ejecución
16	Uribia	244847800098	SHURRULEPU	En ejecución
17	Uribia	244847800081	CASTILLETE	En ejecución
18	Uribia	244847800084	ICHIPA	En ejecución
19	Uribia	244847800094	PUNTA ESPADA	En ejecución
20	Uribia	244847800141	SIERRA MAESTRA	En ejecución
21	Uribia	244847800573	GUARERPA	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 24 –Guaviare Caquetá y Meta


Adjudicación Obra: 05/06/2024 Fecha inicio: 26/09/2024
Adjudicación Inter: 11/06/2024 Fecha Fin: 25/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Municipios	**Uribe, San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, San Vicente del Caguán.**	
	Obra CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ	**Interventoría** CONSORCIO INTERVENTORES GC 115
$	**Valor Inicial** Obra: $4.990.202.000	Interventoría: $329.395.922,00
	Adiciones: Interventoría: $ 60.000.000+ $90.000.000 +60.000.000(asumidos por contratista)	
	Valor Pagado Obra: $2.342.562.161,30	Interventoría: $ 255.471.291,36
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**Suspensión No 01:** 17/12/2024 por 30 días **Prórroga No 01**: 18/02/2024 por 60 días- **Adición No 01:** Interventoría (asumido por el contratista) **Prórroga No 02**: 15/04/2025 por 90 días- **Adición No 02**: Interventoría (asumido por el contratista **Suspensión No 02: 18/06/2025 por 1 Mes** **Prórroga No 03:** 25/08/2025 por 60 días- Adición No 03: Inerventoría (asumido por el contratista	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Lo ejecutado representa 100% del componente I, y en el componente II presenta un atraso del 0,49% respecto al programado de 66.91% y al ejecutado de 66,43%. Continua en ejecución mínima de obra, dificultad en ingreso a las sedes por mal estado de las vías. 10 sedes con avance 80% a 100% 1 sedes con avance 40% a 60% 2 sedes con avance 20% al 40%. 3 sedes con avance 0% al 20%. Se solicitó a la interventoría conminar al contratista de obra por incumplimiento en el cronograma de obra en relación al inicio de cuatro (4) sedes: Tomachipan, Cerro Cocuy, Puerto Flores y Termales.	

67,54%
Porcentaje de avance

68,01%
Porcentaje Programado

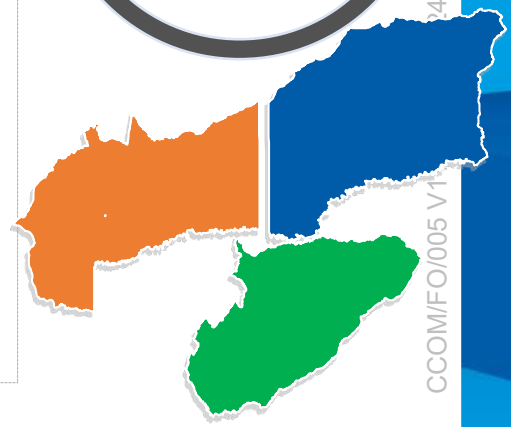


CCOM/FO/005 V1 24 / Pública

Sedes Educativas

Entregadas -

En ejecución 16

Canceladas 0

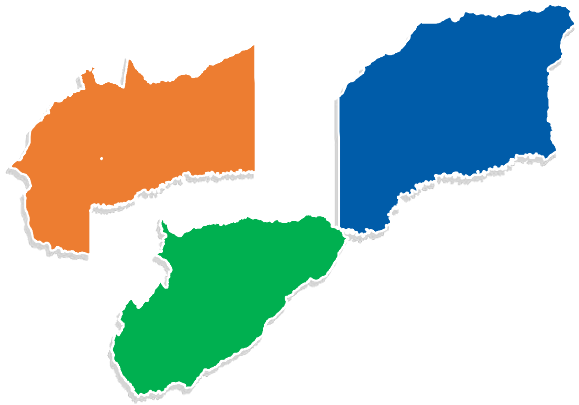

No	Municipio	Dane Sede	Nombre Sede	Estado
1	Uribe	250370000138	SEDE EL PARAISO	En ejecución
2	San José Del Guaviare	295001000098	PUERTO NARE	En ejecución
3	San José Del Guaviare	295001003861	INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN	En ejecución
4	San José Del Guaviare	295001004174	IE CERRO AZUL - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
5	San José Del Guaviare	295001001281	IE EL RETIRO - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
6	San José Del Guaviare	295001002741	IE CHARRAS - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
7	San José Del Guaviare	295001004671	PUERTO FLORES	En ejecución
8	San José Del Guaviare	295001002597	CAÑO DANTA	En ejecución
9	San José Del Guaviare	295001002449	IE TRIUNFO II - SEDE PRINCIPAL	En ejecución
10	El Retorno	295025000196	CERRO COCUY	En ejecución
11	El Retorno	295105001428	ESCUELA RURAL MIXTA ALTO JORDAN	En ejecución
12	El Retorno	295025000056	CAÑO RAYA BAJA	En ejecución
13	Calamar	295105001622	TERMALES	En ejecución
14	Calamar	295105001673	CAÑO SENDA	En ejecución
15	Calamar	295105000847	DIAMANTE UNO	En ejecución
16	San Vicente del Caguán	218753002834	LA AURORA	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 25 – B/ventura

Adjudicación Obra: 09/05/2024 Fecha inicio: 21/08/2024
Adjudicación Inter: 09/05/2024 Fecha Fin: 20/10/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Valle del Cauca**	
	Obra CONSORCIO G25 2024	**Interventoría** CONSORCIO OM INGENIEROS
$	**Valor Inicial** Obra: $5.192.798.592	Interventoría: $324.737.739
	Adiciones Obra: $1.000.000.000	Interventoría: $493.521.597,78
	Valor Pagado Obra: $ 1.655.561.364,59	Interventoría: $128.489.134,42
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión No.1: 27/12/2024 por 30 días **Reinició: 26/01/2025** Prórroga No 1: 7 meses 20 de febrero de 2025 Prórroga No .2: 1 mes 19 de septiembre de 2025	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El 19 de septiembre de aprobó en Comité fiduciario prórroga de obra e interventoría por el termino de un mes sin adición de recursos. Continúan los problemas de orden público, por grupos al margen de la ley. El personero municipal del Litoral de San Juan, mediante comunicado informa alteraciones de orden público en la zona del Bajo Calima, afectando la ruta fluvial para el transporte de materiales y del personal. Adicionalmente, Findeter se encuentra a la espera de la instrucción para la inclusión de las sedes de IE San Rafael en el municipio de Buenaventura y la SE Antonia Santos en el municipio de Tuluá. Ambas en el departamento de Valle del Cauca. Se radica oficio 2202552024679 al MEN con solicitud de la SE Antonia Santos, en donde solicitan la intervención de la sede.	

82,34%
Porcentaje de avance

76,80%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas	**8**
En ejecución	5
Terminada	3



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Buenaventura	176109005666	SEDE PRINCIPAL I.E. ANTONIO NARIÑO.	Entregada
2	Buenaventura	276109001266	SEDE ATANASIO GIRARDOT.	Entregada
3	Buenaventura	276109001401	SEDE LA GRAN COLOMBIA.	Entregada
4	Buenaventura	276109800011	SEDE HÉCTOR EPALZA QUINTERO	Entregada
5	Buenaventura	276109005806	SEDE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA.	Entregada
6	Buenaventura	476109007786	SEDE SAN JUAN BAUTISTA.	En ejecución
7	Buenaventura	276109000341	SEDE JAIME ROOCK.	Terminada
8	Buenaventura	276109000014	SEDE SAN CIPRIANO.	Entregada
9	Buenaventura	176109007421	SEDE LA COMUNA.	Entregada
10	Buenaventura	276109008571	SEDE SANTA ROSA DE GUAYACÁN.	En ejecución
11	Buenaventura	276109008589	SEDE NONAM.	En ejecución
12	Buenaventura	176109004023	SEDE GRANADINOS.	Entregada
13	Buenaventura	276109001029	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	En ejecución
14	Buenaventura	276109001053	SANTA FILOMENA	Terminada
15	Buenaventura	276109010444	SANTA LUCIA DE TIMBA	Terminada
16	Buenaventura	276109004648	SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIPAL	En ejecución

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Grupo 26/ Risaralda

Adjudicación Obra: 16/06/2024 Fecha inicio: 16/08/2024
Adjudicación Inter: 16/06/2024 Fecha Fin: 16/05/2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MUNICIPIOS	**Pueblo Rico, Mistrató**	
	Obra GRUPO TITANIUM SAS	**Interventoría** CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26
$	**Valor Inicial** Obra: $6.141.512.336 Interventoría: $352.879.875	
	Adiciones Obra: $0,00 Interventoría: $54.159.684,74+ $ 54.159.684,75+30.088.715,75 (asumidos por contratista)	
	Valor Pagado Obra: $5.348.097.072,60 Interventoría: $385.981.809,81	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	* Prórroga No.1: 1 mes y 15 días 30/12/24 • Adición No. 1 Interventoría: $ 54.159.684,74 *(El contratista asumió $36.106.456,50 el Patrimonio Autónomo asume $ 18.053.228,25)* aprobada 30/12/24. • Prórroga No 2: 1 mes y 15 días 25/02/2025 • Adición No 2 Interventoría 54.159.684,75 - 25/02/2025 asumida por contratista • Prórroga No 03: 1 mes 15/04/2025	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se iniciará proceso de liquidación en el mes de septiembre de 2025. Actas de entrega y recibo a satisfacción se encuentra en firme de la Fiducia. Para poder radicar la liquidación del contrato de obra e interventoria.	

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Sedes Educativas

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Entregadas **12**

En ejecución -

Por iniciar -



No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado
1	Pueblo rico	266572800050	BIDUA JAIDE	Entregada
2	Pueblo rico	266572800076	PUERTO LETICIA	Entregada
3	Pueblo rico	266572800084	LA PECERA	Entregada
4	Pueblo rico	266572001423	BAJO SANJUAN	Entregada
5	Pueblo rico	266572001181	BAKORY BAJO PALMAR	Entregada
6	Pueblo rico	266572001172	SANTA RITA	Entregada
7	Pueblo rico	266572800008	LA PUNTA	Entregada
8	Pueblo rico	2665728000068	CAÑAVERAL	Entregada
9	Pueblo rico	266572800106	CHIFA	Entregada
10	Pueblo rico	266572800024	DOKABUSITO	Entregada
11	Pueblo rico	266572001024	JITOCHAKE	Entregada
12	Mistrató	26656800025	VIDUA ALTA	Entregada

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

SALDO A LIBERAR POR LIQUIDACIONES

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

$ 1.364,1

GRUPO	VALOR CONTRATO OBRA	PORCENTAJE DE AVANCE	LIQUIDADOS	SALDOS	
				OBRA	INTERVENTORIA
9	$ 5.949.362.000	100	SI	$ 520.324,57	$ 9.539.61
10	$ 5.875.833.952	100	SI	$ 164.743.008,00	$ 8.410.519,63
11	$ 9.037.000.000	100	SI	$ 1.190.435.467,01	$ -
TOTALES				**$ 1.355.698.799,58**	**$ 8.420.059,24**

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

Contratistas

ID INFRAESTRUCTURA	Nombre Contratista Obra	Contratista Interventoria
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 1	CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	CONSTRUOBRAS C&M SAS
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 2	CONSORCIO INSTITUCIONES EDUCATIVAS TAME	CONSORCIO INTERVENTORES 086
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 3	SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONSORCIO SAN JOSUE
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 4	CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024	CONSORCIO FINDETER G.3
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 5	NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS	CONSORCIO FINDETER G3
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 6	CONSORCIO EDUCATIVO 2024	CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA G6
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 7	CONSORCIO I.E. CAUCA-NARIÑO 2024	CONSORCIO FINDETER G.3
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 8	CONSORCIO PRO INSTITUCIONES CHOCÓ	CONSORCIO INTERVENTORES GC91
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 9	CONSORCIO EDUCATIVO CESAR	Y INTERVENTORIAS & CONSULTORIAS S.A.S
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 10	AZUL CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 11	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 12	CONSORCIO GRUPO 12 LA TOLA NARIÑO	ESPACIOS URBANOS GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 13	CONSTRUCCIONES B&M S.A.S	UNIÓN TEMPORAL BARBACOAS
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 14	CONSORCIO PUTUMAYO 2024	ALFA & OMEGA INGENIEROS S.A.S.
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 15	LA UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO DE ESCUELAS FINDETER GRUPO 15	CONSORCIO SAN MARTIN 109
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 16	CONSORCIO GRUPO SANTANDER	CONSORCIO SANTA MARIA 116
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 17	CONSORCIO TRIPTICO 2024	SOLIUN SAS
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 19	CONSTRUCCIONES B&M S.A.S	CONSTRUCCIONES B&M S.A.S
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 20	UNION TEMPORAL MARCELLA 6	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G20
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 21	SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S.	CONSORCIO CDG GUAJIRA
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 22	CONSORCIO VERTICE	CAMILO PEDRAZA DÍAZ
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 23	CONSORCIO AULAS MAICAO 2024	ROBERTO JOSÉ CUELLO BUCHAAR
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 24	CARLOS DARIO RODRIGUEZ GONZALEZ	CONSORCIO INTERVENTORES GC 115
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 25	CONSORCIO G25 2024	CONSORCIO OM INGENIEROS
MEN-PDIE-635 - Línea Mejoramiento - Grupo 26	GRUPO TITANIUM SAS	CONSORCIO 5T INTEROBRAS G26

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Gracias

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM/FO/005 V1 / 05 /Ago/2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación · icontec · Cámara de Comercio de Bogotá · efr www.masfamilia.org · ISO 9001 SGS CO18/8256 · ISO 14001 SGS CO18/8257 · ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. 5090635 de 2023
LÍNEA EMERGENCIAS

24 SEPTIEMBRE DE 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

PDIE | Contrato No. 5090635 de 2023
Línea Emergencias

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

62 sedes


$ 34.043 Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

ENTREGADOS
48 SEDES – 78%


TERMINADOS
2 SEDES – 3%

EN EJECUCIÓN
12 SEDES – 19%

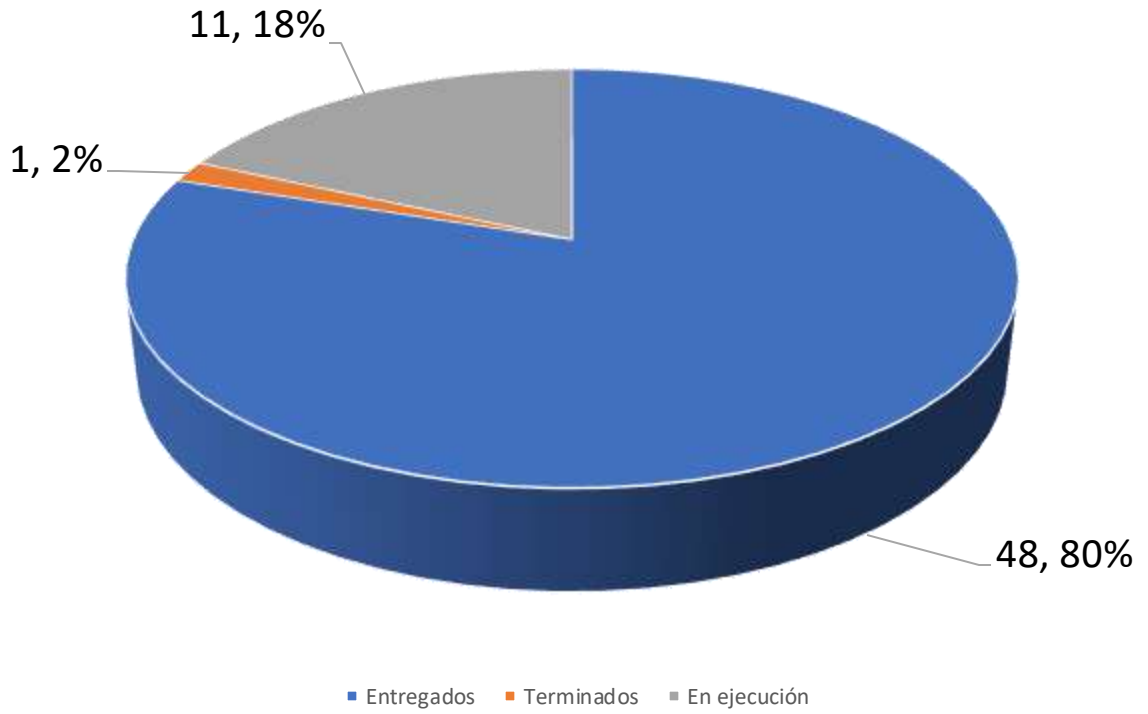

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CRONOGRAMA DE EJECUCION

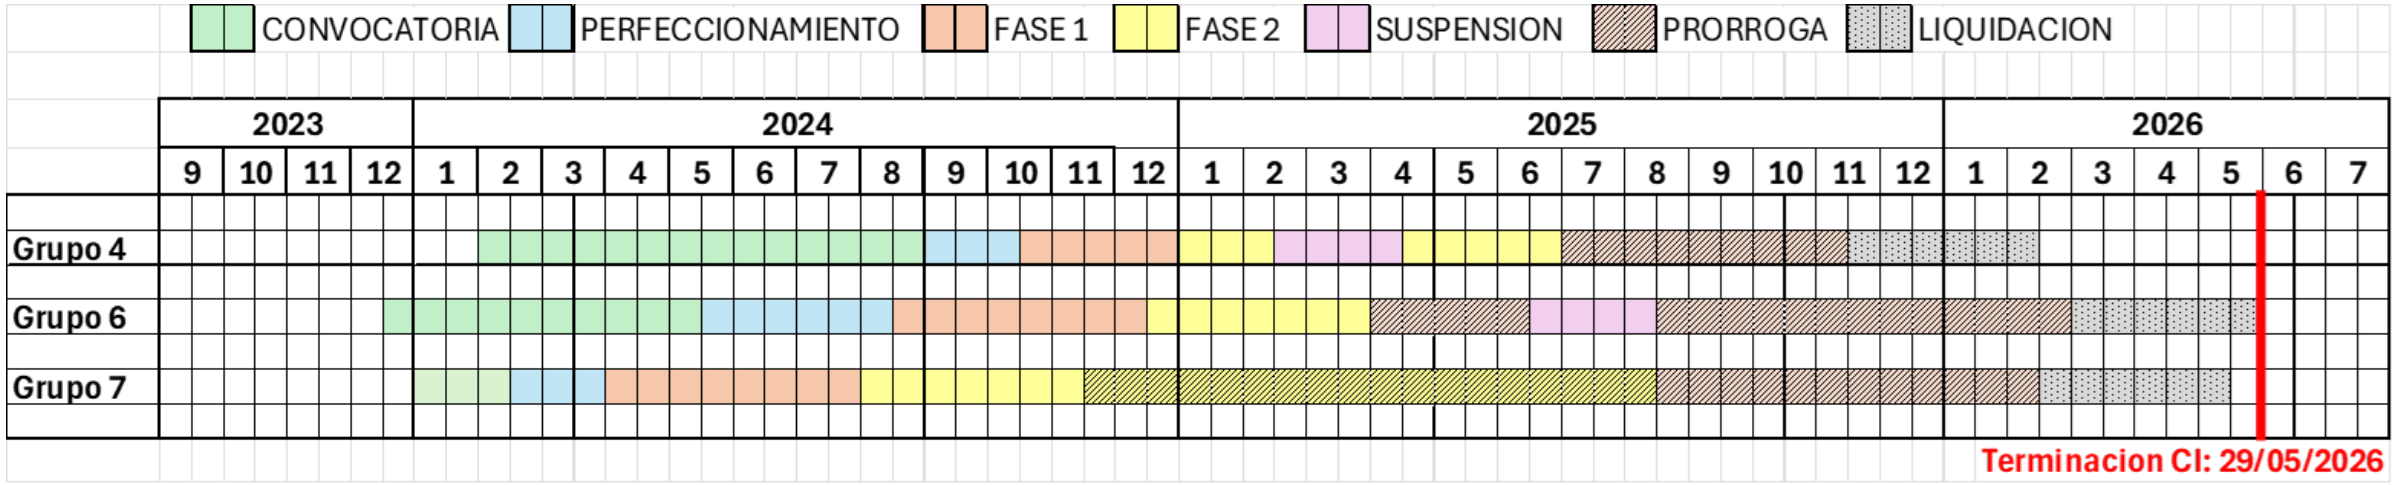

OTRO SI:

El Ministerio Instruyo en comité del 27 de agosto de 2025 que se pausara la gestión del otro si para la línea de emergencia, hasta que realicen verificaciones presupuestales, se solicita al ministerio documentar oficialmente esta suspensión a estos tramites.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CRONOGRAMA DE ENTREGAS EMERGENCIAS

60 Mejoramientos

$ 29.656 Millones de pesos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	2024	2025												2026	Total
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Grupo 1	Caquetá - Guaviare- Putumayo	DESPRIORIZADO															
Grupo 2	Nariño - Cauca	TERMINADO									3	2					**5**
Grupo 3	Cauca - Valle Del Cauca - Chocó	TERMINADO	5									2					**7**
Grupo 4	Chocó	EN EJECUCIÓN												5			**5**
Grupo 5	Chocó	TERMINADO									6						**6**
Grupo 6	Antioquia - Bolívar - Santander	EN EJECUCIÓN					2				4	1				2	**7**
Grupo 7	Antioquia - Bolívar - Chocó - Sucre - Risaralda	EN EJECUCIÓN	6						1		9				3	1	**20**
Grupo 8	Antioquia - Bolívar - Córdoba - Sucre	DESPRIORIZADO															
Grupo 9	Cesar - Magdalena	EN LIQUIDACIÓN			6												**6**
Grupo 10	Guajira	LIQUIDADO	4														**4**
Totales			**15**		**6**		**2**		**1**	**1**	**22**	**5**		**5**	**3**	**1**	**60**

25 sedes entregadas
42%

51 sedes entregadas
85%

60 sedes entregadas
100%

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
GRUPO 10 LA GUAJIRA	Maicao, Manaure, Riohacha, Uribia	**4**	**30/05/2024**	**30/11/2024**	Contrato de Obra: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 27junio25. Contrato de interventoría: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 22agosto25.
GRUPO 7 ANTIOQUÍA, BOLÍVAR, CHOCÓ, SUCRE, RISARALDA, CUNDINAMARCA Y LA GUAJIRA	San Benito Abad, San Onofre, Pueblo Rico, Guática, Balboa, Belén de Umbría, Apía, Loríca, Unguía, Magangué, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Pedro De Urabá, Dibulla, Uribia y Venecia	**16**	3/04/2024	18/12/2025	Inicialmente se entregó 1 sede el 04 de abril del 2024, 2 sedes el 18 de noviembre 2024 y 3 sedes entre el 25-27 de septiembre del 2024, el total se entregaron 6 sedes. El 10 de junio del 2025, se realizó la entrega de la obra de mejoramiento de 1 sede educativa del departamento de Risaralda. Se realiza entrega de las obras de Carmen de Bolivar, San Onofre, Sede el Jardin, Sede Encanto, Sede Karabi Drua, Sede Belén de Umbría, Sede Iumade, Sikuedo Bichubará en la semana del 11 de agosto al 15 de agosto de 2025.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
GRUPO 9 MAGDALENA Y CESAR	Aracataca, Fundación, Bosconia, Agustín Codazzi, Manaure Balcón Del Cesar, Valledupar	**6**	**15/05/2024**	**30/12/2024**	Terminados y recibidos a satisfacción. Se descontará de la rete garantía contractual un monto de $26.346.567,20. En liquidación (en revisión y ajustes según observaciones del equipo de liquidaciones). Se ratificó la aplicación de penal al contratista y a la interventoría por $26.346.567,20, será descontado en la liquidación.
GRUPO 3 CAUCA-VALLE DEL CAUCA-CHOCO	Buenaventura, Florida, Bajo Baudó, Buenos Aires, Puerto Tejada, Santander De Quilichao, Suárez	**7**	**14/05/2025**	26/08/2025	Se entregaron 6 sedes a satisfacción de la comunidad educativa. Entregada la sede Mazamorrero. Se iniciará el proceso de liquidación.
GRUPO 6 ANTIOQUÍA, BOLIVAR, SANTANDER	Puerto Wilches, Cantagallo, Ituango, Santa Bárbara, Segovia, Valdivia	**6**	**20/08/2024**	**20/09/2025**	Se entregaron las sedes de puerto Wilches y Santa Barbara los días 28 y 30 de abril de 2025. Las sedes de Cantagallo, Segovia e Ituango del 17 - 25 de agosto de 2025.
GRUPO 2 NARIÑO – CAUCA	Roberto Payan, El Tambo, López, Balboa, Argelia	**4**	**24/02/2025**	**09/09/2025**	Se entregaron las siguientes Instituciones Educativas: El 15 de julio 11 Fatima ubicada en el municipio Roberto Payan, el 8 de agosto Pablo VI, ubicada en el municipio López de Micay, el 22 de agosto Campo Bello Alto ubicada en el municipio de Balboa y el 3 de septiembre La Paz ubicada en el municipio del Tambo.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 5 CHOCO	Condoto, Istmina, Medio Baudó, Río Iró, Unión Panamericana, Tadó	**5**	13/11/2024	28/07/2025	100%	100%	Se cogieron los pendientes de obra y se hizo entrega de las sedes a los rectores de las IE excepto sólo la de TADO porque el rector está en licencia de paternidad y retorna el 22sept25; una vez retorne se firmará AERS de esa sede; a corte 22sept25 aún no se tiene firma por parte del rector de TADO del AERS. Estamos atentos al envío de esto por parte de interventoría.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS TERMINADOS

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 5 CHOCO	Condoto, Istmina, Medio Baudó, Río Iró, Unión Panamericana, Tadó	**1**	13/11/2024	28/07/2025	100%	100%	Se cogieron los pendientes de obra y se hizo entrega de las sedes a los rectores de las IE excepto sólo la de TADO porque el rector está en licencia de paternidad y retorna el 22sept25; una vez retorne se firmará AERS de esa sede; a corte 22sept25 aún no se tiene firma por parte del rector de TADO del AERS. Estamos atentos al envío de esto por parte de interventoría.
GRUPO 2 NARIÑO – CAUCA	Roberto Payan, El Tambo, López de Micay, Balboa, Argelia	**1**	24/02/2025	09/09/2025	100%	100%	La sede La primavera ubicada en el municipio de Argelia se encuentra terminada con pendientes, y entrega definitiva programada para el 25 de septiembre de 2025.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES.
GRUPO 4 CHOCO	Bojayá, Medio Atrato, Quibdó, Río Quito, Bajo Baudó.	5	17/10/2024	09/11/2025	68.04%	25,88%	El contratista continua con un avance lento, solo se han iniciado labores en dos (2) de las cinco (5) sedes priorizadas, durante esta semana se tuvo un avance mínimo en la sede de Rio Quito, debido a la deficiencia en la organización para la consecución de recursos humanos y logísticos por parte del contratista de obra, impidiendo la ejecución efectiva del proyecto, se solicitará nuevamente aplicación de apremio.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 7 ANTIOQUÍA, BOLÍVAR, CHOCÓ, SUCRE, RISARALDA, CUNDINAMARCA Y LA GUAJIRA	San Benito Abad, San Onofre, Pueblo Rico, Guática, Balboa, Belén de Umbría, Apía, Lorica, Unguía, Magangué, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Pedro De Urabá, Dibulla, Uribia, Venecia y Manaure	**4**	3/04/2024	18/02/2026	62,02%	61,42%	En agosto se realizan las socializaciones de los alcances de las 4 sedes educativas (Venecia – Cundinamarca, Media Luna – Uribia, Yawaca – Manaure y Dumingueka – Dibulla) y se inicia la ejecución del componente II (obra) en las 4 sedes. El rector de la sede Dumingueka (Dibulla) remitió oficio en donde solicita la adición de recursos, con el fin de ampliar el alcance a ejecutar en el componente II, solicitando recursos para: 1. Instalación de sistema fotovoltaico (Dormitorio y comedores) 2. Intervención del comedor (Mejoramiento) Para lo anterior se requiere la adición de $933.349.904,81 incluido obra e interventoría. Por otra parte, para la ejecución de los diagnósticos, estudios y diseños de la gradería, estructura y cubierta para la cancha de Yawaca, se requiere una adición de $44.183.298,31,incluido para el contrato de obra e interventoría. Durante esta semana se citará comité técnico para la inclusión de items no previstos sin adición de recursos, productos del componente I para las sedes de La Guajira y Cundinamarca.

CCOM-FO-005 V/No 05 Ago-2024 / Pública

CONTRATO EN EJECUCION

GRUPO	Municipio	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 6 ANTIOQUÍA, BOLIVAR, SANTANDER	Puerto Wilches, Cantagallo, Ituango, Santa Bárbara, Segovia, Valdivia	**3**	20/08/2024	24/03/2026	55,46%	55,46%	Se recibe por parte del contratista de obra el traslado de alerta por presencia de grupos armados en el sector de Valdivia, Antioquia. Lo que ha impedido la entrega de la misma. Se adelantan conversaciones con la alcaldía municipal para adelantar acercamientos con estos grupos y poder hacer la entrega formal. Se llevo a comité fiduciario el día 02 de septiembre de 2025 y a comité técnico del 09 de septiembre de 2025 la inclusión del CENTRO EDUCATIVO RURAL ALTO LORENZO sede ESCUELA RURAL MIXTA NUEVO AMANECER, en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Y la del I.E.T. AGROP-AMBIENTAL BILINGUE INDA SABALETA sede E.R.M. AWA INDA SABALETA - SEDE PRINCIPAL, en el municipio de Tumaco, Nariño. además de una adición y prorroga a ambos contratos. El contratista y la interventoría se trasladaron el 15 de septiembre de 2025 a Puerto Asís y el 19 de septiembre 2025 a Tumaco para iniciar los acercamientos e iniciar la etapa de diseños para el Componente I de ambas sedes. Se modifica la línea base de seguimiento a raíz de la adición de $ 1.875.376.019,00.

CCOM-FO-005-V1-1-05-Ago-2024-Pública

Grupo 02

Adjudicación Obra: 20/11/2024
Adjudicación Inter: 20/11/2024

Fecha inicio: 24/2/2025
Fecha Fin: 09/09/2025

PAF - MENPNIE-O- 153 -2024
PAF - MENPNIE-I - 015-2024

Departamento	**Departamentos de Cauca - Nariño**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 1.900.764.019 Interventoría: $ 436.107.137
	Adiciones Obra: $ Interventoría: $
	Valor Pagado Obra: $ 538,635,817 Interventoría: $ 184.266.855
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Las sedes 11 Fátima, Pablo VI, Campo Bello Alto y La Paz ubicadas en los municipios Roberto Payan, López de Micay, Balboa y El Tambo respectivamente, se encuentran terminadas, entregadas y recibidas a satisfacción, sin embargo, la sede La primavera ubicada en el municipio de Argelia se encuentra terminada con pendientes, y entrega definitiva programada para el 25 de septiembre de 2025.

100 %
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 2

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No	Municipio	DaneSede	Nombre Sede	Estado	Estado
1	Roberto Payán(San José)	252621000224	SEDE 11 FATIMA	Entregada	Entregada
2	Argelia	219050000089	LA PRIMAVERA (sede principal)	En Ejecución	Terminada
3	Balboa	219075000164	CAMPO BELLO ALTO	Entregada	Entregada
4	El Tambo	219256000743	LA PAZ (sede principal)	Entregada	Entregada
5	López de Micay	319418000011	PABLO VI (SEDE PRINCIPAL)	Entregada	Entregada



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 03

Adjudicación Obra: 01/03/2024
Adjudicación Inter: 01/03/2024


Fecha inicio: 14/05/2024
Fecha Fin: 25/08/2025

PAF - MENPNIE-O- 009 -2024
PAF - MENPNIE-I - 009-2024

Departamento	**Departamentos de Cauca - Valle del Cauca - Choco**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 2,637.246.083 Interventoría: $ 539.120.789
	Adiciones Obra: $ 285.623.418,20 Interventoría: Adición N.1 $ 83.009.366,95 Adición N.2 $ 86.117.980
	Valor Pagado Obra: $ 2.294.748.331,74 Interventoría: $ 573.428.188,25
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	OTRO SI N.1: ADICION OBRA POR $ 285.623.418,20 ADICION INTERVENTORIA POR $ 83.009.366,95 Y PRORROGA N.1. POR UN (1) MES DOCE (12) DIAS 24/12/2024 SUSPENSION N.1. 30/12/2024 OTRO SI N.2. PRORROGA N.2. POR UN (1) MES VEINTE (20) DIAS 26/02/2025. SUSPENSION N.2. 21/03/2025 OTRO SI N.3 PRORROGA N.3. POR QUINCE (15) DIAS 07/05/2025. SUSPENSION N.3. 20/05/2025 OTRO SI N.4. ADICION INTERVENTORIA POR $ 86.117.980 PRORROGA N.4. POR UN (1) MES 04/06/2025.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Terminada y entregada la sede LIMBANIA VELAZCO el 28 de agosto de 2025. La sede Mazamorrero terminada, se firmó acta de entrega el 17 de septiembre. Se iniciará proceso de liquidación.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 3

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Buenos Aires	MAZAMORRERO (sede principal)	219110000458	En ejecución
2	Puerto Tejada	SAN PEDRO CLAVER (sede principal)	119573000673	Entregada
3	Santander De Quilichao	LICEO LIMBANIA VELASCO (sede principal)	119698001698	Terminada
4	Suárez	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO UNION OLIVARES	219780000149	Entregada
5	Bajo Baudó	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIRUDO - SEDE PRINCIPAL	227077000245	Entregada
6	Buenaventura	SAGRADO CORAZON DE JESUS	276109000341	Entregada
7	Florida	INSTITUTO LAS AMERICAS	176275000010	Entregada



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 04

Adjudicación Obra: 04/09/2024
Adjudicación Inter:04/09/2024

Fecha inicio: 17/10/2024
Fecha Fin: 09/11/2025

PAF-MENPNIE-O-098-2024
PAF-MENPNIE-I-016-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Chocó**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 1.899.188.797,00 Interventoría: $ 437.360.718,00
	Adiciones Obra: Sin adiciones Interventoría: $97.040.892,75 VALOR FINAL: $ 534.401.610,75
	Valor Pagado Obra: $ 400.299.505,48 Interventoría: $ 252.874.594,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión No 1: veinte (20) días calendario del 19 de febrero al 10 de marzo de 2025 Otrosí No 1: Cambio de sede (Boraudó – Lloró por San Pedro Claver - Bajo Baudó) Suspensión No 2: un (1) mes del 20 de marzo al 20 abril de 2025 Prórroga No 1 a la Suspensión No 2: (15) días del 21 de abril al 5 de mayo Otrosí No 2: Prórroga por un (1) mes del contrato de obra y prórroga por un (1) mes y adición de $24.260.223 al contrato de interventoría asumido con cargo a recursos del contratista de obra. Otrosí No 3: Prórroga por tres (3) meses del contrato de obra y prórroga por tres (3) meses y adición de $72.780.669 al contrato de interventoría asumido con cargo a recursos del contratista de obra
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El contratista continua con un avance lento, solo se han iniciado labores en dos (2) de las cinco (5) sedes priorizadas, durante esta semana se tuvo un avance mínimo en la sede de Rio Quito, debido a la deficiencia en la organización para la consecución de recursos humanos y logísticos por parte del contratista de obra, impidiendo la ejecución efectiva del proyecto. En la presente semana se realizará la visita de viabilidad en la sede San José de la IE Cesar Contó, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la rectora, Sed Chocó y el MEN para el reemplazo de la sede La Boba Apremios: Se solicitará aplicación de otro apremio

25,88%
Porcentaje de avance


68,04%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 4

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Bojayá	IE CESAR CONTÓ SEDE LA BOBA	227099000095	Por reemplazar
2	Medio Atrato	SEDE VILLA DE BEBARA	227001000564	Por iniciar
3	Quibdó	SEDE MIS ESFUERZOS	127001004158	En ejecución
4	Río Quito	SEDE LA SOLEDAD	227001003181	En ejecución
5	Bajo Baudó	C.E. SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIPAL	221011001675	Por iniciar



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 05

Adjudicación Obra: 04/10/2024
Adjudicación Inter: 04/10/2024

Fecha inicio: 13/11/2024
Fecha Fin: 28/07/2025

PAF-MENPNIE-O-124-2024
PAF-MENPNIE-I-010-2024

Departamento	**Chocó**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 2.335.418.322 Interventoría: $ 477.004.300
	Adiciones Obra: Sin adiciones Interventoría: Sin adiciones
	Valor Pagado Obra: $ 1.868.570.364,75 (80,01%) Interventoría:: $ 354.958.161,14 (74,41%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga N.1 : Comité 161 20 de junio de 2025 por un mes
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se cogieron los pendientes de obra y se hizo entrega de las sedes a los rectores de las IE excepto sólo la de TADO porque el rector está en licencia de paternidad y retorna el 22sept25; una vez retorne se firmará AERS de esa sede; a corte 22sept25 aún no se tiene firma por parte del rector de TADO del AERS. Estamos atentos al envío de esto por parte de interventoría.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 5

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Condoto	SEDE ARCO	127205000011	Entregada
2	Istmina	IE PUERTO SALAZAR - SEDE PRINCIPAL	227361001537	Entregada
3	Medio Baudó	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - SEDE PRINCIPAL	127430000021	Entregada
4	Río Iró	IE SAN JOSE DE VIRO VIRO - SEDE PRINCIPAL	227205000067	Entregada
5	Unión Panamericana	IE SAN RAFAEL EL DOS - SEDE PRINCIPAL	327361002538	Entregada
6	Tadó	SEDE SIMON BOLIVAR	227787001127	Terminada



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 06

Adjudicación Obra: 28/05/2024
Adjudicación Inter: 28/05/2024


Fecha inicio: 20/08/2024
Fecha Fin: 24/03/2026

PAF-MENPNIE-O-122-2024
PAFMENPNIE-I-122-2023

Departamento	**Antioquia – Bolívar - Santander**
$	**Valor Inicial** Obra: $ 4.210.794.337,00 Interventoría: $ 886.269.390,43
	Adiciones Obra: $ 1.875.376.019,00 Interventoría: Valor asumido por el Patrimonio Autónomo $50.171.936,79 Interventoría: Valor asumido por el contratista $ 5,574659,64 Interventoría: Valor asumido por el contratista $ 14.000.000,00 Interventoría: Valor asumido por el Patrimonio Autónomo $ 364.623.981,00
	Valor Pagado Obra: $ $ 2.257.454.679,41 Interventoría: $ 438.065.967,42
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga No.1 obra e interventoría: 2 meses y 15 días el día 06 abril del 2025 Suspensión 1 obra e interventoría: 2 meses. (Del 17/06/2025 al 17/08/2025) Prorroga No.2 obra e interventoría: 1 mes. (Del día 17/08/2025 al 17/09/2025)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se recibe por parte del contratista de obra el traslado de alerta por presencia de grupos armados en el sector de Valdivia, Antioquia. Lo que ha impedido la entrega de la misma. Se adelantan conversaciones con la alcaldía municipal para adelantar acercamientos con estos grupos y poder hacer la entrega formal. El contratista y la interventoría se trasladaron el 15 de septiembre de 2025 a Puerto Asís y el 19 de septiembre 2025 a Tumaco para iniciar los acercamientos e iniciar la etapa de diseños para el Componente I de ambas sedes. Se modifica la línea base de seguimiento a raíz de la adición de $ 1.875.376.019,00.

55,%
Porcentaje de avance


55,46%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 6

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Ituango	LA LOMITA	205361000821	Entregada
2	Santa Bárbara	I. E. EL GUAYABO	205679000331	Entregada
3	Segovia	C. E. R. SANTA ISABEL DE AMARA	205736000556	Entregada
4	Valdivia	C. E. R. SANTA INES	205854000277	En Ejecución
5	Cantagallo	SEDE SINZONA	213670001125	Entregada
6	Cantagallo	SEDE PATICO BAJO	213670001125	Entregada
7	Puerto Wilches	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	168575000418	Entregada
Otrosí 2	Puerto Asís	ESCUELA RURAL MIXTA NUEVO AMANECER	286568005865	Est. Y Diseños
Otrosí 2	Tumaco	E.R.M. AWA INDA SABALETA - SEDE PRINCIPAL	452835006601	Est. Y Diseños

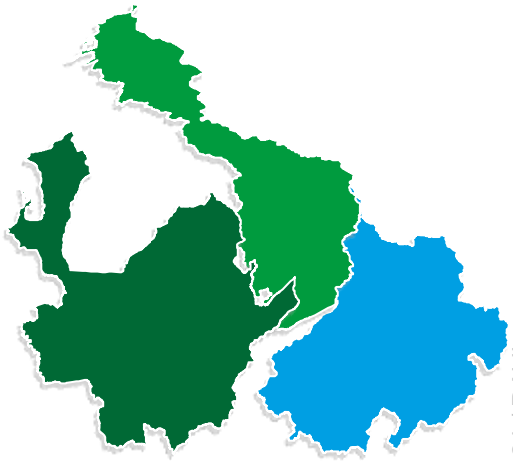

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 07

PAF-MENPNIE-O-004-2024
PAF-MENPNIE-I-004-2024

Adjudicación Obra: 20/02/2024
Adjudicación Inter: 20/02/2024

Fecha inicio: 03/04/2024
Fecha Fin: 18/02/2026

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Antioquía, Bolívar, Guajira, Chocó, Sucre y Risaralda**
$	**Valor Inicial** Obra: $2.254.604.891 Interventoría: $ 471.983.203,00
	Adiciones Obra: $3.972.575.976,14 + 1.620.940.225,26+3.567.859.345,46 + 2.434.972.236 Interventoría: $519.272.174,90+333.558.195,53 + 265.027.764
	Valor Pagado Obra: $ 7.034.407.084,61 Interventoría: $ 564.411.2498,13

MODIFICACIONES CONTRACTUALES	**Obra** Adición No. 1: 3.926.727.825,14 Prórroga No.1: 9 meses Adición No. 2: 1.620.940.225,29 Prórroga No.2: 4 meses Adición No. 3: 3.567.859.345,43 Prórroga No.3: 2 meses Adición No.4: 2.434.972.236	**Interventoría** Adición No. 1: 504.272.174,86 Prórroga No.1: 9 meses Prórroga No.2: 4 meses Adición No. 2: 333.558.195,57 Prórroga No.3: 2 meses Adición No.3: 265.027.764
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En agosto se realizan las socializaciones de los alcances de las 4 sedes educativas (Venecia – Cundimnaarca, Media Luna – Uribia, Yawaca – Manaure y Dumingueka – Dibulla) y se inicia la ejecución del componente II (obra) en las 4 sedes. El rector de la sede Dumingueka (Dibulla) remitió oficio en donde solicita la adición de recursos, con el fin de ampliar el alcance a ejecutar en el componente II, solicitando recursos para: 1. Instalación de sistema fotovoltaico (Dormitorio y comedores) 2. Intervención del comedor (Mejoramiento) Para lo anterior se requiere la adición de $933.349.904,81 incluido obra e interventoría. Por otra parte, para la ejecución de los diagnósticos, estudios y diseños de la gradería, estructura y cubierta para la cancha de Yawaca, se requiere una adición de $44.183.298,31,incluido para el contrato de obra e interventoría. Durante esta semana se citará comité técnico para la inclusión de items no previstos sin adición de recursos, productos del componente I para las sedes de La Guajira y Cundinamarca.	

60.38%
Porcentaje de avance

60.35%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 07 - Solicitud adición Rector Dumingueka

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTERNADO RURAL DUMINGUEKA
NIT: 900298951-3/ DANE: 244090800007
RESOLUCIÓN 251 NOV 2008, 233 DEL 2011 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

Dumingueka, 01 de septiembre de 2025.

Señores,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
FINDETER
CONSORCIO MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024

Asunto: Solicitud de Adición de Recursos – Institución Etnoeducativa Internado Rural Dumingueka.

Respetados señores, En calidad de Rector de la Institución Etnoeducativa Internado Rural Dumingueka, me permito solicitar de manera atenta la evaluación y aprobación de una adición de recursos o ampliación del alcance del proyecto actualmente en ejecución.

El alcance inicial contempló la intervención en dormitorios y aulas con cambio de cubiertas, estructura y suministro e instalación de paneles solares. No obstante, en los dormitorios únicamente se incluyó el cambio de cubierta, sin la instalación del sistema fotovoltaico, lo cual limita la funcionalidad y el aprovechamiento energético en estas áreas.

De igual forma, se hace necesario priorizar la intervención del comedor escolar, espacio esencial para la comunidad educativa, pues allí los estudiantes reciben diariamente sus alimentos. El estado actual del comedor presenta un avanzado deterioro y no garantiza condiciones adecuadas ni seguras, por lo que su mejoramiento resulta urgente.

Es importante precisar que, según la socialización realizada por el contratista, ni la instalación de paneles solares en los dormitorios ni la intervención del comedor fueron incluidas dentro del alcance inicial del contrato.

Por lo anterior, en representación de la comunidad educativa, solicito respetuosamente que se consideren los recursos necesarios para suplir estas necesidades prioritarias, con el fin de garantizar ambientes dignos, seguros y funcionales para nuestros estudiantes.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo atento a una respuesta favorable.

Atentamente,

Arregocés Coronado Z.

Arregocés Coronado Zarabata
Rector
Institución Etnoeducativa Internado Rural Dumingueka.

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL RECTOR DUMINGUEKA INTERNADO EDUCATIVA


Recibido Por:
Arq. Lorena Mendoza
03/Septiembre/2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 7

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	San Pedro De Urabá	C. E. R. SAN EMIGDIO	205665000789	Entregada
2	Magangué	ILUSION	113430002171	Entregada
3	San Jacinto	SAN JOSE DE MORENA ABAJO	213654000038	Entregada
4	Unguía	IE ALCIDES FERNANDEZ - SEDE PRINCIPAL	427800000461	Entregada
5	San Benito Abad	SEDE PRINCIPAL LA CEIBA	270678000199	Entregada
6	Lorica	SEDE PRINCIPAL	213654000038	Entregada
7	Pueblo Rico	SEDE BICHUBARA	266572001407	Entregada
8	Pueblo Rico	SEDE SIKUEDO	266572001407	Entregada
9	Pueblo Rico	SEDE IUMADE	266572001407	Entregada
10	Guática	SEDE MARMOLEJO ALTO	166318000650	Entregada
11	Balboa	SEDE KARABI DRUA	166075000010	Entregada
12	Belén de Umbría	SEDE FLOR DEL MONTE	166088000027	Entregada
13	Apía	SEDE EL JARDIN	266045000681	Entregada
14	Apía	SEDE EL ENCANTO	266045000681	Entregada
15	San Onofre	SEDE EL PEÑON	270713000202	Entregada
16	El Carmen de Bolívar	SEDE SANTO DOMINGO DE MEZA	213244001070	Entregada
17	Uribia	SEDE MEDIA LUNA	244847004025	En ejecución Fase II
18	Dibulla	SEDE DUMINGUEKA	244090800007	En Ejecución Fase II
19	Venecia	SEDE VENECIA PRINCIPAL	125506000197	En Ejecución Fase II
20	Manaure	YAWACA	244560000240	En Ejecución Fase II

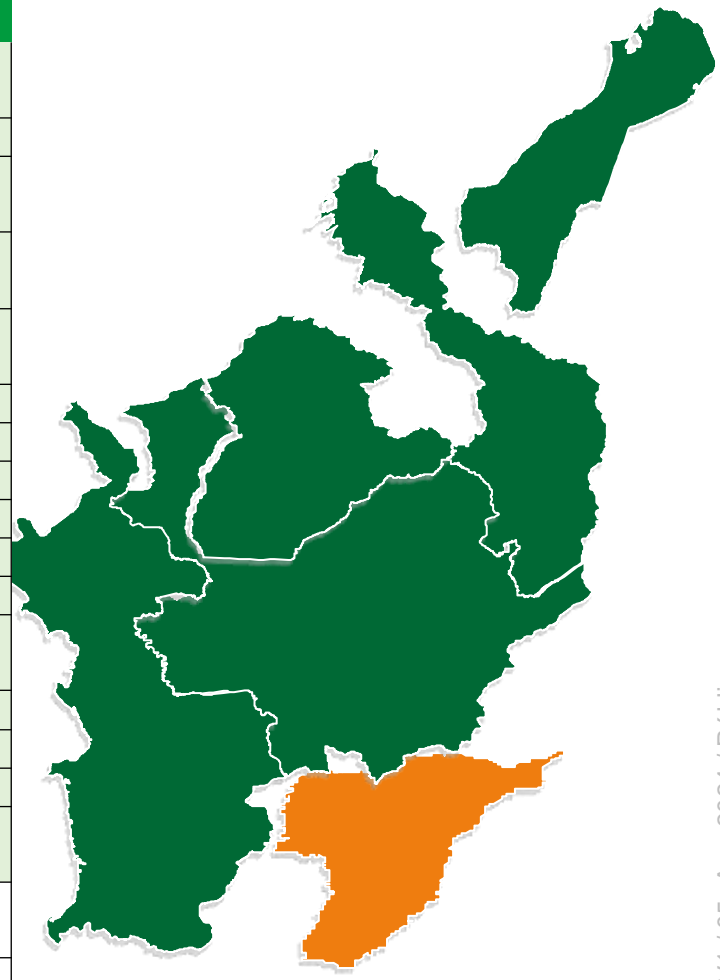

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 09

Adjudicación Obra: 20/03/2024
Adjudicación Inter: 20/03/2024

Fecha inicio: 15/05/2024
Fecha Fin: 30/12/2024

PAF-MENPNIE-O-021-2024
PAF-MENPNIE-I-019-2024

Departamento	**Cesar y Magdalena**
$	**Valor Inicial** Obra: $2.256.714.724 Interventoría: $471.983.203
	Adiciones Obra: $ 0 Interventoría: $ 0
	Valor Pagado Obra: $ $ 2.256.714.724,00 Interventoría: $ 439.377.638,27
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí 1 – Aclaración códigos DANE Otrosí 2 – Inclusión NP Otrosí 3 – Inclusión NP
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Terminados y recibidos a satisfacción. Se descontará de la rete garantía contractual un monto de $26.346.567,20. En liquidación (en revisión y ajustes según observaciones del equipo de liquidaciones). Se ratificó la aplicación de penal al contratista y a la interventoría por $26.346.567,20, será descontado en la liquidación.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 9

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Bosconia	INSTITUCION EDUCATIVA ELOY QUINTERO ARAUJO	120060000072	Entregada
2	Agustín Codazzi	IE NACIONAL AGUSTÍN CODAZZI	120013000463	Entregada
3	Manaure Balcón Del Cesar	SEDE SABANAS DE LEON	220443000275	Entregada
4	Valledupar	VILLA CORELCA	120001003602	Entregada
5	Aracataca	COL JOHN F KENNEDY	147053000488	Entregada
6	Fundación	CENT EDUC 16 DE JULIO	147288000094	Entregada



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 10

Adjudicación Obra: 27/03/2024
Adjudicación Inter: 27/03/2024

Fecha inicio: 30/05/2024
Fecha Fin: 30/11/2024

PAF-MENPNIE-O-023-2024
PAF-MENPNIE-I-021-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**LA GUAJIRA**
$	**Valor Inicial** Obra: $1.465.491.420; Interventoría: $337.131.848
	Adiciones Obra: $0 ; Interventoría: $0
	Valor Pagado Obra: $1.465.491.420 (100,00%) Interventoría: $337.131.848 (100,00%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 27junio25. Contrato de interventoría: se encuentra liquidado; se firmó acta de liquidación por todas las partes el 22agosto25.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas Grupo 10

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No.	Municipio	Nombre Sede	Dane	Estado
1	Maicao	SEDE MARIA EUGENIA	144430000499	Liquidado
2	Manaure	ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU	244560000240	Liquidado
3	Riohacha	ALMIRANTE PADILLA	144001001151	Liquidado
4	Uribia	AIPIR	244847800106	Liquidado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATISTAS OBRA E INTERVENTORIA

LINEA EMERGENCIAS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Grupo	Contratista de obra	Consorciados de obra	Contratista Interventoría	Consorciados de Interventoría
2	CONSORCIO GRUPO 2	*JUAN CARLOS VALENCIA *SISA INGENIEROS ARQ.SAS *ANDRES FELIPE PERAFAN	CONSORCIO CCA CONSTRUVALORES	*CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA *CONSTRUCCIONES Y VALORES CONSTRUVALORES S.A.S
3	HUGO FRANCISCO HINESTROZA	N/A	UNION TEMPORAL SEDES 24	N/A
4	UNIÓN TEMPORAL OLCE CARIBE	*JUSONAWA FOUNDATION *ORGANIZACION TIEMPOS DE PAZ	CONSORCIO INTERVENTORÍA 5T-CCA G4	* 5T SAS BIC * CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA
5	SERVINGTECH S.A.S.	N/A	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S	N/A
6	CONSORCIO GRUPO 6 2024	*JORGE ALEJANDRO GONZÁLEZ SÁNCHEZ *INFRAESTRUCTURA INGENIEROS S.A.S.	JESUS EDUARDO TORRES CORREDOR	N/A
7	CONSORCIOS MEJORAMIENTOS MEDTEC 2024	*MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES *UCROS & UCROS CONSTRUCTORES S.A.S	LUIS GUILLERMO NARVAEZ RICARDO	N/A
9	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.	N/A	LUIS GUILLERMO NARVÁEZ RICARDO	N/A
10	CONSORCIO LA GUAJIRA MEDTEC 2024	*ARMANDO MEDINA ALBIS *EDWIN MEZA PINEDA	CONSORCIO GUAJIRO 021	*GEOVANNY MONCAYO PALACIOS *CONSULTAR CON PROFESIONALES SAS

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación | icontec | Cámara de Comercio de Bogotá | efr www.masfamilia.org | SGS CO18/8256 | SGS CO18/8257 | SGS CO21/962851

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. 5090635 de 2023
LÍNEA CONSULTORIA

24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

PDIE | Contrato No. 5090635 de 2023
Línea Consultoría

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Estado de entrega y ejecución de Sedes

6 sedes

6 grupos


$4.231 Millones de pesos

Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

EN EJECUCION
2 PROYECTO 17%

EN ESTRUCTURACIÓN
3 PROYECTOS 50%

EN LEGALIZACION
1 PROYECTO 33%

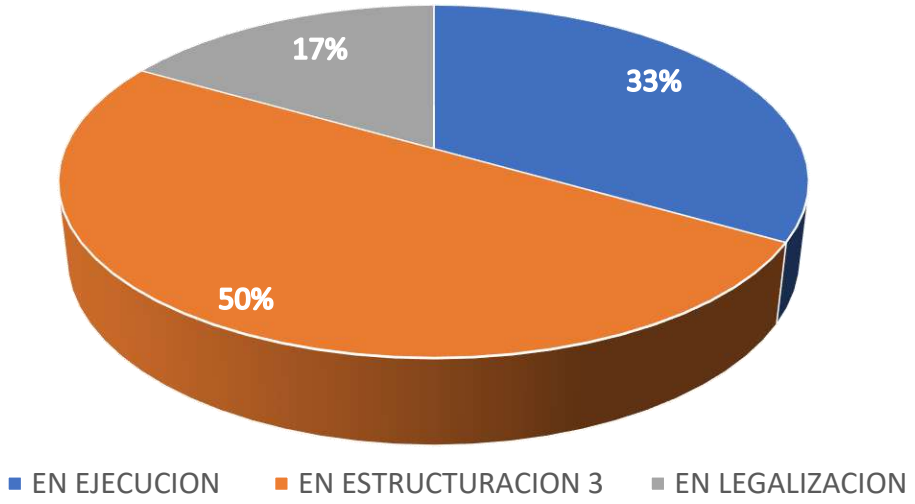

Comprometido: $2.779.905.270
Por comprometer: $2.045.476.290
Adjudicados: $2.161.115.310

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

LINEA DE DISEÑOS

6 Diseños

$ 4.231 Millones de pesos


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	Entregas 2024	2025										2026	Total
				MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
Grupo 2	Putumayo (1. P. Leguizamo) 7 MESES	EN EJECUCION												1	**1**
Grupo 4	Cauca (1. Caldono)	DESPRIORIZADO													
Grupo 5	Choco (1. Quibdó) – Carrasquilla 7 MESES	EN EJECUCION												1	**1**
Grupo 6	Chocó (1. Quibdó) – Santo Domingo de Guzman	PRIORIZADO ESTRUCTURACIÓN												1	**1**
Grupo 7	N. de Santander (1.Tarra)	En Perfeccionamiento Legalización												1	**1**
Grupo 10	CHOCÓ – Boraudó	PRIORIZADO – ESTRUCTURACIÓN												1	**1**
Grupo 11	Chocó – Pogue	PRIORIZADO ESTRUCTURACIÓN												1	**1**
	TOTAL													**6**	**6**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

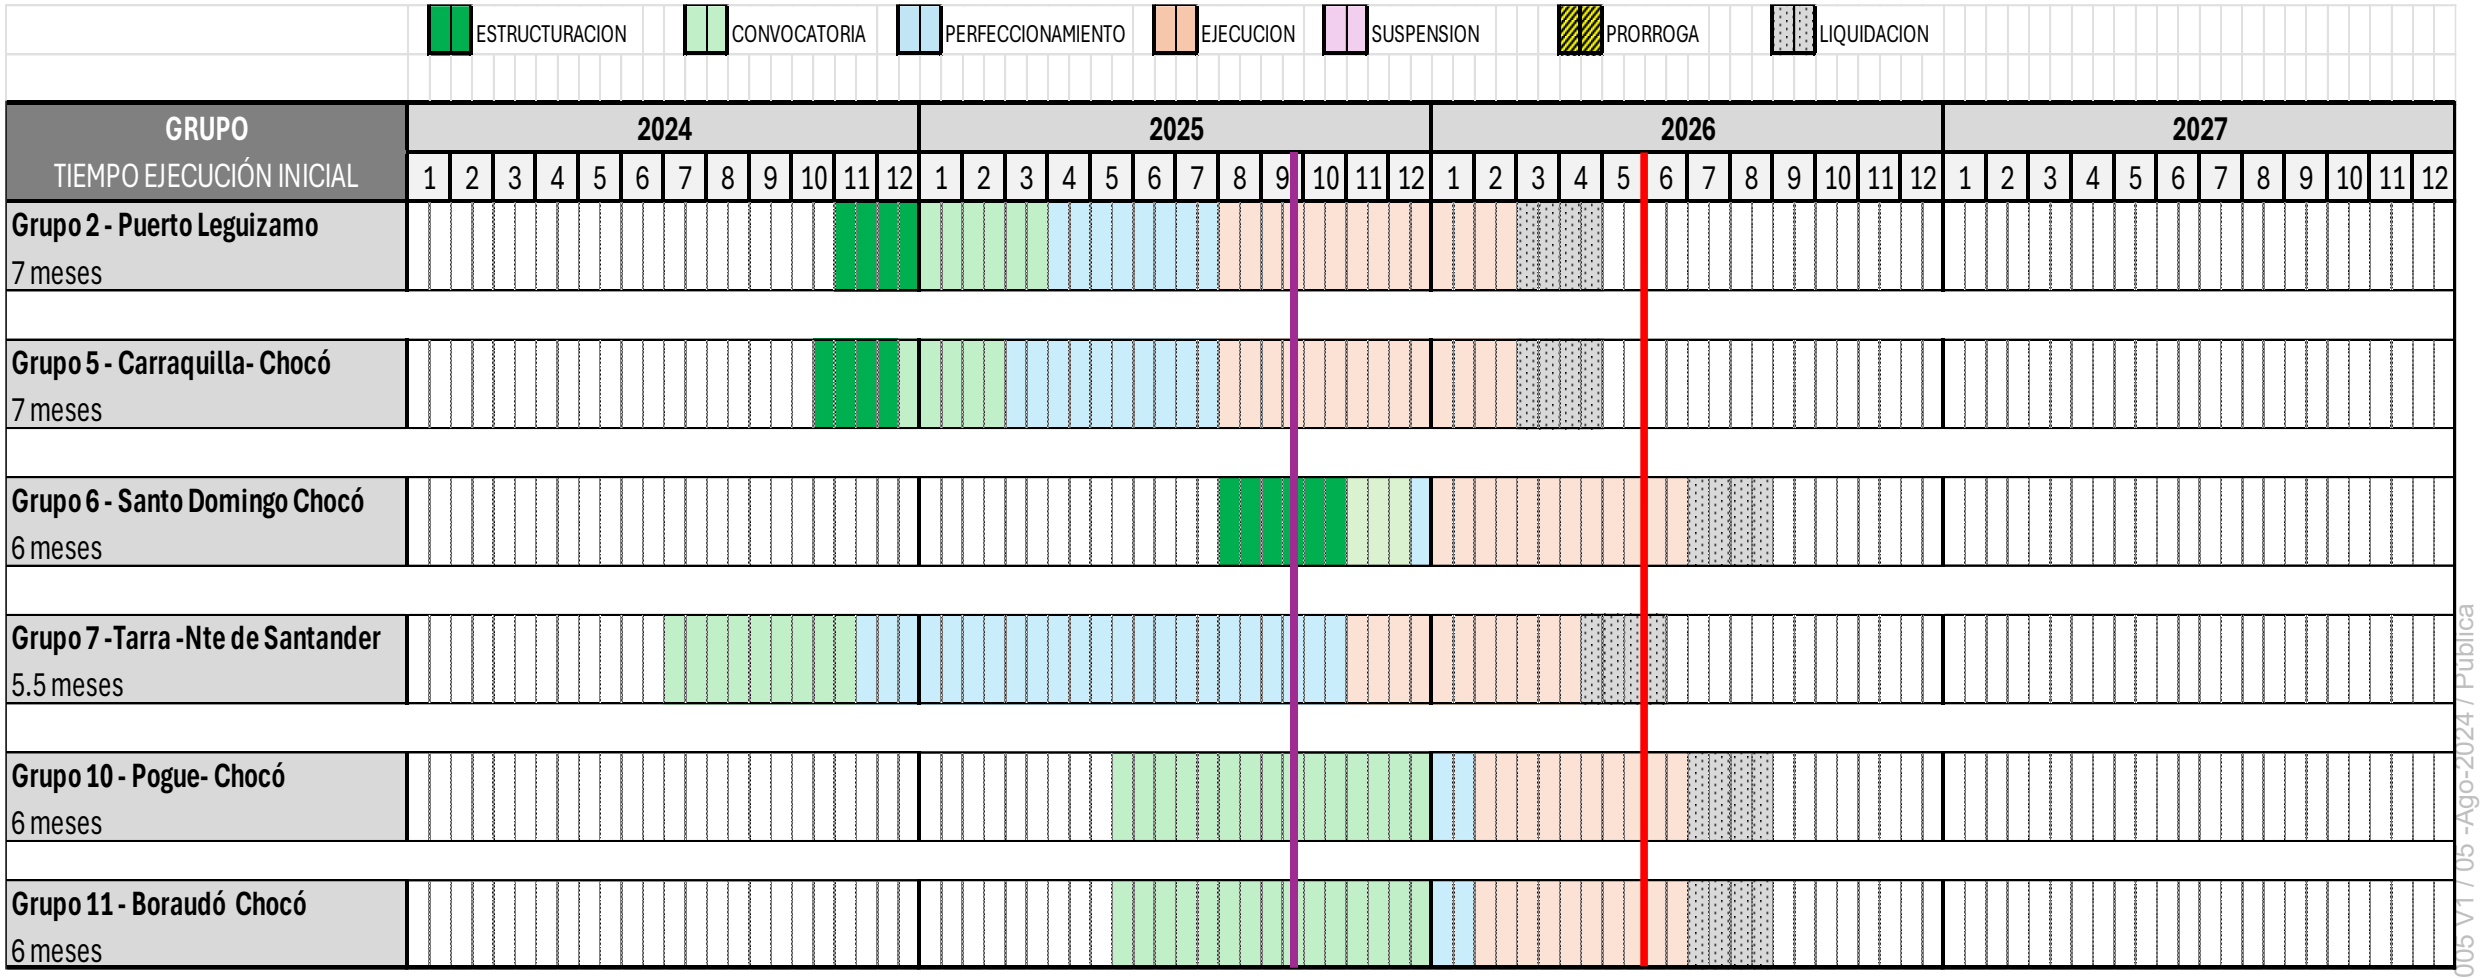

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Publica

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
2	PUERTO LEGUIZAMO	1	4/08/2025	04/03/2026	14,46%	13,36%	Se realizó el primer taller de Socialización con el MEN el 17 de septiembre de 2025, en el cual se mostraron las 3 propuestas básicas de implantación que dan cumplimiento a la NTC 4595 y se adaptan a las condiciones topográficas, sociales y culturales de la región. Se remitió los planos con las observaciones presentadas por el MEN y con las breves descripciones de las propuestas el 22 de septiembre de 2025 para su revisión y estudio.
5	CHOCÓ CARRASQUILLA	1	28/07/2025	27/02/2026	17,77%	15,11%	Se realizó el primer taller de Socialización con el MEN el 17 de septiembre de 2025, en el cual se mostraron las 4 propuestas básicas de implantación que dan cumplimiento a la NTC 4595 y se adaptan a las condiciones topográficas, sociales y culturales de la región. Se remitió los planos con las observaciones presentadas por el MEN y con las breves descripciones de las propuestas el 22 de septiembre de 2025 para su revisión y estudio.

CCOM-FO-005 V1 / 05 - Ago-2024 / Pública

Grupo 2-Puerto Leguizamo

Adjudicación Obra: 27/03/2025 **Fecha inicio**: 04/08/2025 PAF-MENPNIE-C-003-2024
Adjudicación Inter: 27/03/2025 **Fecha Fin**: 04/03/2026 -PAF-MENPNIE-I-022-2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Putumayo**	
	CONSULTORÍA: **CONSORCIO MCHP LEGUIZAMO** CARLOS ALONSO CHAMAT REYES Representante Legal	**INTERVENTORIA:** **CONSULTORÍAS E INTERVENTORÍAS SAS** ORIANA ASTRID CAICEDO VERGARA Representante Legal
$	**Valor Inicial** Consultoría: $ 487.378.780,00 Interventoría: $ 309.932.280,00	
	Adiciones N/A	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	Se realiza taller de socialización con el MEN – esquemas básicos	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se realizó el primer taller de Socialización con el MEN el 17 de septiembre de 2025, en el cual se mostraron las 3 propuestas básicas de implantación que dan cumplimiento a la NTC 4595 y se adaptan a las condiciones topográficas, sociales y culturales de la región. Se remitió los planos con las observaciones presentadas por el MEN y con las breves descripciones de las propuestas el 22 de septiembre de 2025 para su revisión y estudio.	

13,36%
Porcentaje de avance

14,46%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 5- Carrasquilla

Adjudicación Obra: 06/03/2025
Adjudicación Inter: 06/03/2025

Fecha inicio: 28/07/2025
Fecha Fin: 27/02/2026

PAF-MENPNIE-O-083-2024
PAF-MENPNIE-I-014-2025

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Chocó**	
	CONSULTORÍA: **CONSORCIO MCHP CARRASQUILLA** CARLOS ALONSO CHAMAT REYES Representante Legal	**INTERVENTORIA:** **CONSORCIO INTERVENTORÍA QUIBDÓ** JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ Representante Legal
	Valor Inicial Consultoría: $ 478.779.840,00 Interventoría: $ 262.253.960,00	
	Adiciones N/A	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	N/A	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se realizó el primer taller de Socialización con el MEN el 17 de septiembre de 2025, en el cual se mostraron las 4 propuestas básicas de implantación que dan cumplimiento a la NTC 4595 y se adaptan a las condiciones topográficas, sociales y culturales de la región. Se remitió los planos con las observaciones presentadas por el MEN y con las breves descripciones de las propuestas el 22 de septiembre de 2025 para su revisión y estudio.	

15,11%
Porcentaje de avance

17,77%
Porcentaje Programado



-2024 / Pública

CONTRATOS EN PERFECCIONAMIENTO

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA ADJUDICACION OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERV	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
7	NORTE SANTANDER TARRA	1	28/01/2025	28/01/2025	$ 453.065.330	$ 169.705.119	30/09/2025	Se remite un oficio a la alcaldía de El Tarra, el día 06 de agosto de 2025. Solicitando información sobre los supuestos otros 2 proyectos que se encuentran al parecer en el mismo predio del contrato nuestro de consultoría. Se reitera dicha solicitud el día 11 de septiembre de 2025. Se remite oficio a la Entidad Territorial Certificada el día 22 de agosto de 2025 solicitando la matricula estimada para el municipio y el estado del proyecto en cualquier otra dependencia. Se reitera dicha solicitud el día 12 de septiembre de 2025. Desafortunadamente hoy en día no se cuenta con ninguna respuesta por parte de ninguno de los dos entes gubernamentales antes mencionados. El día 15 de septiembre de 2025 se recibe por parte del MEN la directriz de incluir este proyecto a la INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BRACITOS, código DANE 254670000445.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN ESTRUCTURACIÓN

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA ADJUDIC OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERV	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
6	CHOCÓ SANTO DOMINGO	1	10/10/2025	10/10/2025	$ 685.426.270,00	$409.932.280,00	9/12/2025	Se realizaron ajustes jurídicos a los estudios previos de consultoría e interventoría, donde se subsanó y se presentará nuevamente de manera formal el 24 de septiembre de 2025.
10	CHOCÓ BOJAYA (Pogue)	1	15/10/2025	15/08/2025	$ 360.000.000	$ 252.000.000	15/11/2025	Por instrucción del Ministerio de Educación Nacional en comité de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se reinicia el proceso de estructuración de los estudios previos y términos de referencia para la Institución Educativa Bojayá Sede Pogue. Se inició el proceso para suscripción de convenio interadministrativo derivado con los municipios. Se recibe respuesta por parte del Municipio en cuanto a la documentación para la viabilidad jurídica del predio sin embargo, esta corresponde a un convenio que Involucra al Ministerio de Vivienda y a la Unidad de atención del riesgo de desastre por lo cual solicitamos al MEN acompañamiento para definir los procesos que continúan al entorno del proyecto considerando esta novedad.
11	CHOCÓ LLORÓ (Boraudo)	1	15/09/2025	15/08/2025	$ 360.000.000	$ 252.000.000	15/10/2025	Por instrucción del Ministerio de Educación Nacional en comité de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se reinicia el proceso de estructuración de los estudios previos y términos de referencia para la Institución Educativa Boraudó sede Principal. Los Estudios previos se encuentran aprobados y revisados por la parte técnica, jurídica y social de Findeter,. El municipio informa que cuentan con un proyecto para la Construcción de la I.E. Por la cual se solicita información oficial acerca del proyecto para exponer la situación ante el MEN y tomar las decisiones correspondientes.

COM-FO-005-V1 / 05-Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN ESPERA DE DEFINICIÓN

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA ADJUDIC OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERV	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
1	CUNDINAMARCA SOACHA LAS VEGAS	1	16/07/2025	16/07/2025	$ 685.426.270,00	$ 409.932.280,00	15/08/2025	Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto
	CUNDINAMARCA SOACHA CIUDAD VERDE	1	16/07/2025	16/07/2025	$ 685.426.270,00	$ 409.932.280,00	15/08/2025	Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto
4	CAUCA CALDONO	1	16/07/2025	16/07/2025	$ 383.559.190,00	$210.615.810,00	15/09/2025	Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto
8	NORTE SANTANDER SIMES	6	17/09/2025	01/09/2025	$420.839.400	$345.059.030	01/10/2025	Se definió por parte del MEN el 21 de mayo de 2025 la despriorización de este proyecto

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol
@findeter linkedin.com/company/findeter

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación
icontec
Cámara de Comercio de Bogotá
efr www.masfamilia.org
ISO 9001 SGS CO18/8256
ISO 14001 SGS CO18/8257
ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851



Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

Contrato No. 5090635 de 2023
LÍNEA ESTRATÉGICOS

24 SEPTIEMBRE DE 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Hacienda

Estado de entrega y ejecución de Sedes Línea Estratégicos

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

31 sedes

$ 74.637* Millones de pesos


Fecha inicio: 20/06/2023
Fecha Fin: 29/05/2026

EN EJECUCION
8 sedes- 29%

SUSPENDIDOS
2 sedes- 7%

POR INICIAR
17 sedes -50%

ENTREGADOS
4 sede -14%

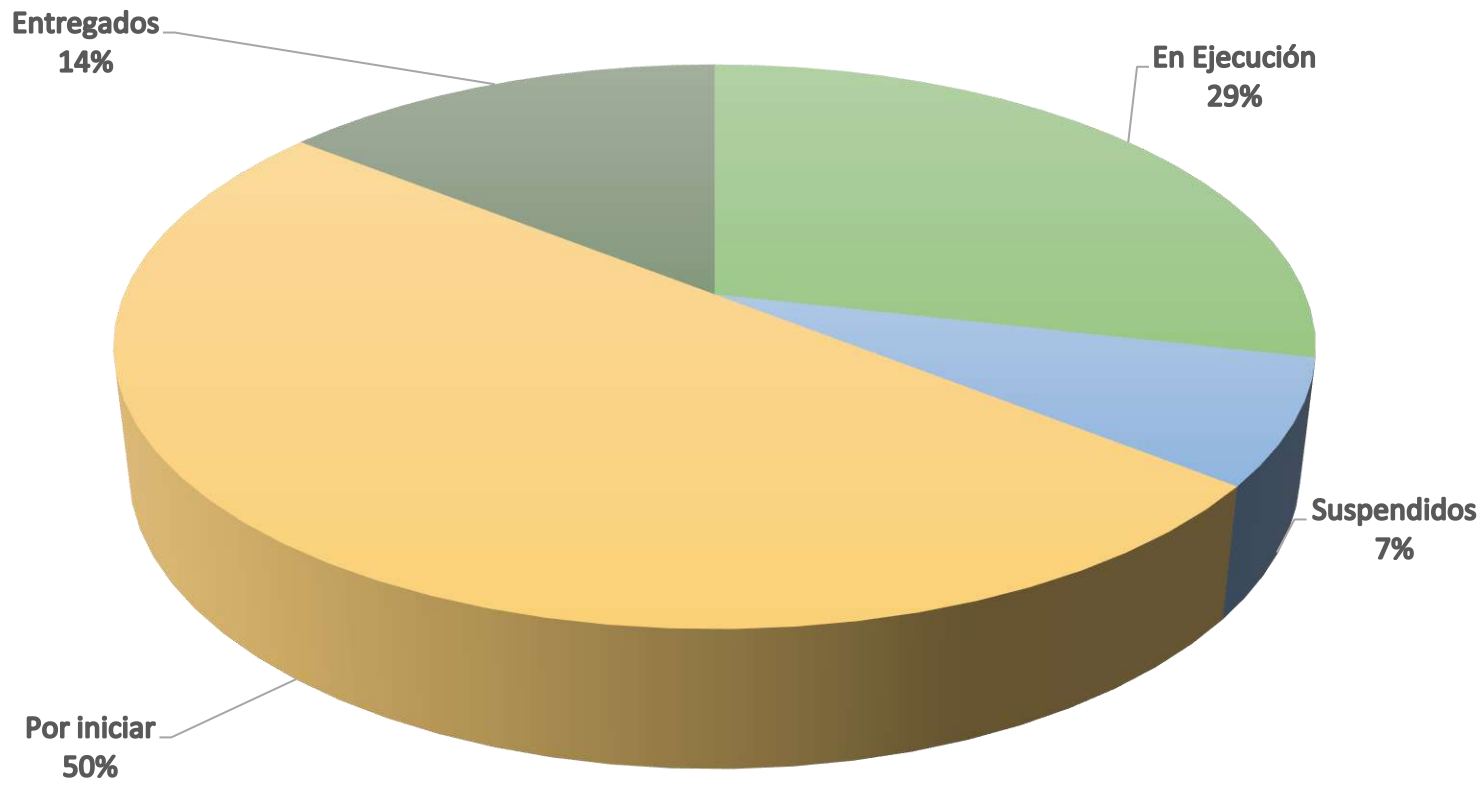

- * Valor comprometido a la fecha
- Pendiente por comprometer la suma de $36.565 correspondiente a los 3 contratos del Otro Sí y el proyecto de El Playón

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

LINEA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

31 Estratégicos

$ 71.840 Millones de pesos


Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	DEPARTAMENTO	ESTADO	ENTREGA 2024	2025										2026	TOTAL
				Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov	Dic		
Grupo 1	Tolima (Ibagué) 13 meses	EN EJECUCION											1		**1**
Grupo 2	Chocó (San José) 12 meses	SUSPENDIDO												1	**1**
Grupo 3	Cundinamarca (Soacha) 11 meses	EN EJECUCION												1	**1**
Grupo 6	Chocó (Litoral de San Juán) 5 meses	DESPRIORIZADO												0	**0**
Grupo 7	Chocó (Litoral de San Juán) 4 meses	EN EJECUCION												4	**4**
Grupo 8	Nariño (Olaya Herrera) 8 meses	DESPRIORIZADO												0	**0**
Grupo 9	Cauca (Mercaderes) 9 meses	PERFECCIONAMIENTO												1	**1**
Grupo 10	Cauca (Totoró) 9 meses	PERFECCIONAMIENTO												1	**1**
Grupo 11	Nariño (Colón) 11 meses	SUSPENDIDO												1	**1**
Grupo 12	Sucre (Caimito) 10 meses	EN EJECUCION												1	**1**
Grupo 14	Huila (Palestina, La Argentina, La Plata) 4 meses	ENTREGADO						4							**4**
Grupo 18	Bolivar (Mompox) 10 meses	EN EJECUCION												1	**1**
Grupo 20	Playon (Santander) 12 meses	ESTRUCTURACIÓN												12	**12**
Grupo 21	Vijes (Valle del Cauca) (pendiente)	ESTRUCTURACIÓN												1	**1**
Grupo 22	Riosucio (Chocó) (pendiente)	ESTRUCTURACIÓN												1	**1**
Grupo 23	Samaniego (Nariño) (pendiente)	ESTRUCTURACIÓN												1	**1**
		TOTAL		0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	26	**31**

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Plan Desarrollo Infraestructura Educativa - 5090635-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

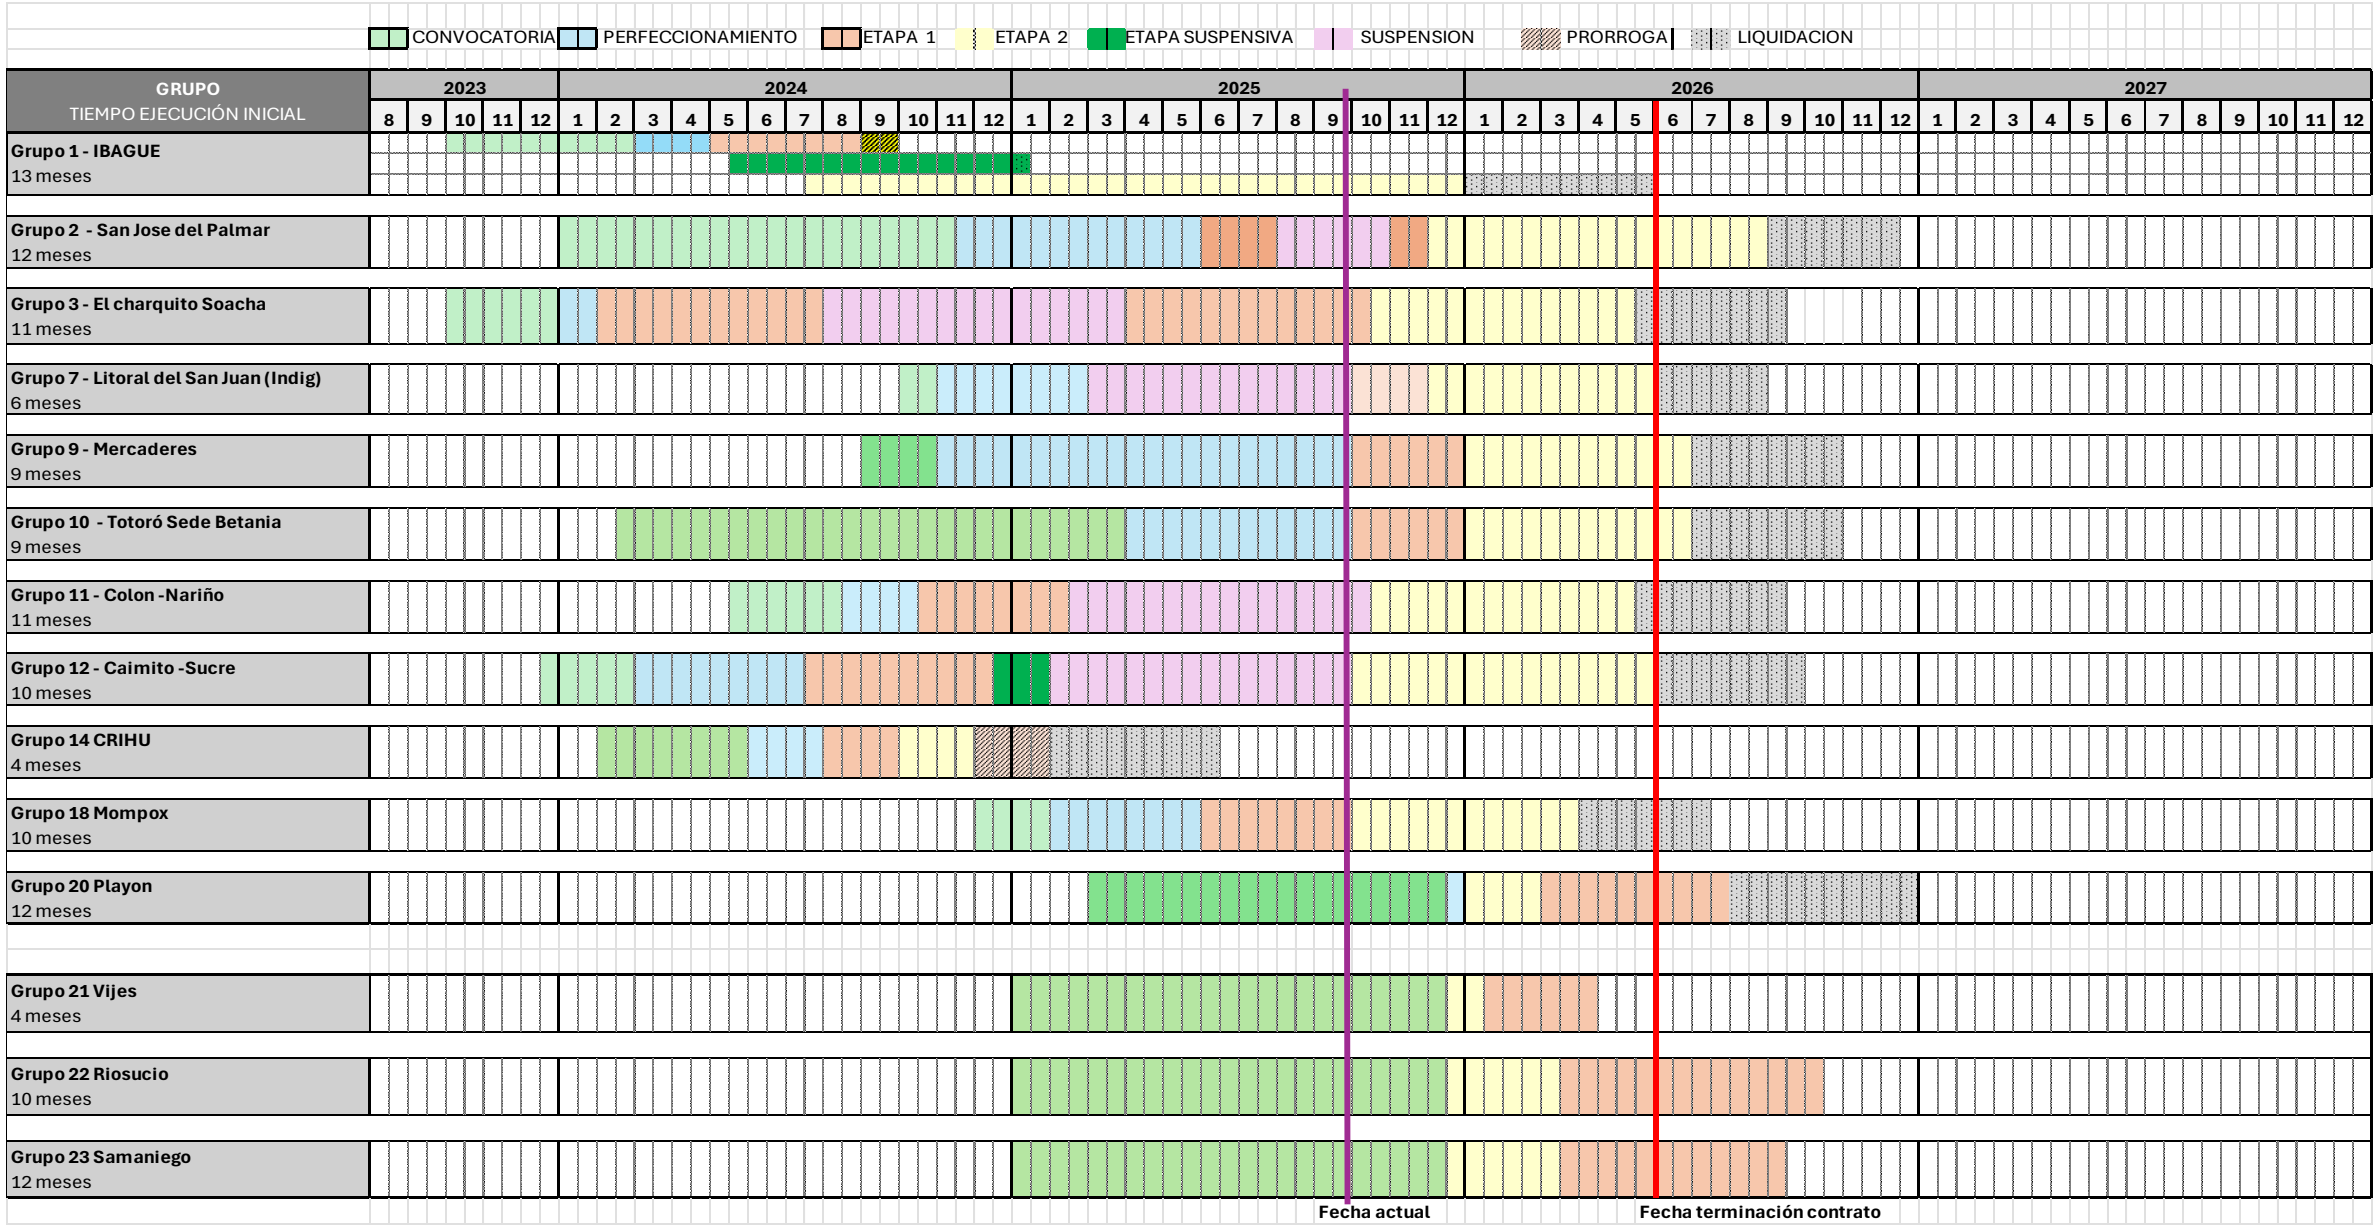

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS ENTREGADOS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 14 CRIHU	Huila	4	30/07/2024	29/01/2025	Se radica el Prisa con numero INC 2025-001930 correspondiente al proceso de liquidación del contrato de Obra.. 22/08/2025 se recibe el acta de entrega del contrato de interventoría suscrita por Fiduagraria.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 01 Ibagué	Ibagué	1	20/01/2024	31/12/2025	88,80%	89,59%	❖ Derivados de la adición de recursos al contrato de obra, se empiezan los tramites de cotización de materiales , insumos y equipos para la terminación del proyecto. ❖ Se realiza una reunión el día 15 de septiembre 2025 con el Municipio para informarles que, la compensación forestal no es una obligación contractual del contrato de obra. Se da traslado 19 septiembre 2025 a esta obligación al municipio de Ibagué junto con la resolución de aprobación emitida por Cortolima. ❖ En cuanto a la ejecución es importante precisar que se están adelantado explanación del terreno para construir la cancha de fútbol, remates en mampostería bloque a y b, se adelanta destronque y brillo en pisos de aulas del bloque a y bloque b. El contratista a la fecha va al día con la ejecución del proyecto conforme a su programación.
Grupo 3 El charquito Soacha	C/marca	1	25/01/2025	08/05/2026	6,54%	4,70%	❖ Actualmente en prorroga No. 5 por 1,5 meses sin adición de recursos hasta el 08/10/2025 sin reprogramación del alcance inicial. ❖ Mediante oficio con ref. 2202552023566 del 21/08/2025, se radica al Municipio el requerimiento de recursos en cumplimiento del fallo de acción popular, frente a o cual Soacha responde el 05/09/2025 en oficio ref. SEM-DE-PE-2145-2025, que requiere el Otro Sí N°1 del convenio para aportar en 2 pagos el valor de $3.836.666.568 (Pago 1 $900 millones en septiembre; Pago 2 $2.936.666.569 en octubre), no incluye costos adicionales por obras de mitigación por valor de $174 millones para estudios y diseños de obras de canalización de la quebrada). ❖ Radicado en coordinación derivada incumplimiento y aplicación del Apremio No. 1 por $748.684.582,76 al contrato de obra

CCOM-FO-005-V4-/-05 - Ago-2024 / Publica

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
Grupo 07 Litoral del San Juan (Indígena)	Choco	4	9/01/2025	30/09/2025	82,26%	1,17%	Persiste el incumplimiento por parte del contratista CONSORCIO PRO - INSTITUCIONES CHOCÓ – INDÍGENAS, frente a la entrega total del componente I del proyecto. En reunión presencial con los consorciados realizada el 4 de septiembre quedó el compromiso de realizar entrega de los productos faltantes el 12 de septiembre, sin embargo, la entrega total se realizó hasta el 14 de septiembre. La interventoría se encuentra en revisión de los productos entregados.
Grupo 18 Colegio Pinillos Mompox	Bolívar	1	03/06/2025	20/05/2026	6,59%	6,39%	Se continua con la elaboración de las cantidades, costos y presupuestos de la intervención para la Fase II, durante el comité de seguimiento se acordó realizar entregas parciales para mayor seguimiento a este componente (para el 19, 23 y 26 de septiembre de 2025) se programa el 26 septiembre 2025 comité de seguimiento extraordinario con el contratista, interventoría, MEN y Findeter, la cual se socializará la propuesta a la intervención que se presentará al Ministerio de Cultura

CCOM-FO-005 V1 / 05-APR-2024 Public

CONTRATO PROXIMO A EJECUTAR – CIERRE ET 1 E INICIO ET 2

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA ULTIMA SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	% PROG	% EJEC	ALERTAS
Grupo 12 San Juan Bautista Caimito	Sucre	1	19/07/2024	22/05/2026 supeditada al inicio etapa 2	12/07/2025	13/08/2025	7,30%	7,30%	Entre el 05 al 09 de septiembre 2025 se tramitó comité técnico N°294 y Comité fiduciario N°178 en el cual se instruye la aprobación para los modificatorios a los contratos derivado 0bra e Interventoría en el cual se adiciona recursos al contrato de obra por $ $1.059.398.902,12 y una prorroga de 2 meses. Y para el contrato de Interventoría una adición por el valor $56.765.034,50 y prorroga de 2 meses. Una vez legalizados los modificatorio se procederá a la suscripción del acta de inicio etapa 2 proceso que se espera que se de entre la semana del 22 al 26 septiembre 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS SUSPENDIDOS

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA ULTIMA SUSPENSION	FECHA DE REINICIO	% PROG	% EJEC	ALERTAS
Grupo 2 San José del Palmar	Chocó	1	09/06/2025	09/08/2026	05/08/2025	05/10/2025	1,00%	0,28%	El proyecto se suspendió en comité técnico realizado del 5 al 6 de agosto, por un plazo de 2 meses, ya que el lote entregado por el municipio para ejecutar el proyecto, tiene un área de 4098 m2, la cual es muy inferior al área de 11.155 m2 propuesta en el proyecto inicial. El municipio se encuentra adelantando el desenglobe de un predio adjunto para adicionarlo al proyecto, por otra parte, se elevó consulta al área jurídica de Findeter para revisar la viabilidad jurídica del nuevo lote adicional.
Grupo 11 San Carlos Colon	Nariño	1	11/10/2024	13/05/2026	10/06/2025	15/10/2025	4,04%	4,04%	El proyecto se encuentra actualmente SUSPENDIDO debido al tiempo de desarrollo de los tramites: LICENCIA: Aprobada por municipio en espera de fechar, tan pronto se cuente con la versión final del presupuesto que determine el alcance contractual y el adicional que se requeriría VERTIMIENTOS: Ya se cuenta con el permiso emitido por Corponariño. ELECTRICO: Ya se cuenta con la aprobación el diseño eléctrico serie 1 por parte de Cedenar. PREUPUESTO: Se remite propuestas económicas al MEN con 3 alternativas para la ejecución de la etapa 2, mediante oficio No.2202552024442 del 12 de septiembre del 2025

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS POR INICIAR EN LEGALIZACION

GRUPO	Dpto	No SEDES	FECHA DE ADJUDICACION OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
Grupo 10 Totoró	Cauca	1	21/03/2025	21/03/2025	$2.380.838.350	$ 278.908.930	30/09/2025	Contratos Legalizados, inicio a la espera de suscripción convenio multipartita: el 29/08/2025 en reunión con GOBERNACIÓN , MEN y FINDETER, la gobernación solicitó nuevos ajustes en relación con la minuta remitida el 28/07/2025 mediante oficio 2202552022577, para lo cual FINDETER remitió nueva minuta el 03/09/2025 con radicado 2202552024162 reiterado el 11 de septiembre con radicado 2202552024391. En reunión el 18/09/2025 se obtuvo respuesta de la ETC remitiendo minuta con solicitud de cambios y adicionando nuevos cambios en el marco de la reunión por lo cual se programo nueva reunión para el 22/09/2025. Se ajustó matrícula SIMAT a 175 estudiantes en mesa de trabajo del 19/08/2025 entre ETC, MEN, CABILDO y FINDETER.
Grupo 9 Mercaderes	Cauca	1	25/10/2024	25/10/2024	$5.067.512.140	$598.387.062	30/09/2025	El 18/09/2025 se realizó mesa de trabajo con la ETC, MEN, y Findeter y quedó como compromiso realizar una nueva reunión para el 22/09/2025 con la ETC para conciliar la minuta Final.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS POR INICIAR EN ESTRUCTURACIÓN

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE ADJUDICACION OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
Grupo 20 Playón	Santander	12	15/11/2025	15/11/2025	$ 4.408.815.174	$ 373.687.080	15/11/2025	Estudios previos de obra e interventoría se encuentran en revisión por área interna derivada. Se realizó una reunión entre el municipio de El Playón, Departamento de Santander, Ministerio de Educación Nacional y Findeter para socializar el tema del convenio interadministrativo que fueron remitidos (secretaría de educación departamental y municipio del playón). El departamento remitió oficio dejando trazabilidad que revisaron y no encontraron observaciones al convenio. Se realizó reunión de socialización con el MEN el 16 de septiembre de 2025 respecto a los valores presentados.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

CONTRATOS EN ESTRUCTURACIÓN OTROSI

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA ADJUDIC OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERV	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
21	Valle del Cauca Vijes	1	15/10/2025	15/10/2025	$ 2.250.000.000	$ 250.000.000	15/12/2025	Nos encontramos tramitando las viabilidades técnicas y jurídicas. La documentación para el trámite jurídico fue subsanada por el municipio, sin embargo, aún no se emite viabilidad. En cuanto a la parte técnica se le solicito el aporte del certificado catastral del predio y certificado de servicio de gas natural al municipio, a la fecha nos encontramos a la espera de la documentación.
22	Chocó Riosucio	1	15/10/2025	15/10/2025	$ 18.200.574.574	$2.022.286.063	15/12/2025	Actualmente, nos encontramos en la estructuración de los estudios previos y a la espera de la información técnica por parte del Municipio para tramitar esta viabilidad. Se reitera esta solicitud el 17 de septiembre 2025 a través de correo electrónico. Desde la parte jurídica de Findeter el predio es viable, sin embargo, nos encontramos a la espera de la ficha jurídica correspondiente. El 8 de septiembre se lleva a cabo visita técnica a la IE en compañía de la ETC y la alcaldía de Riosucio.
23	Nariño Samaniego	1	15/10/2025	15/10/2025	$ 9.450.000.000	$ 1.050.000.000	15/12/2025	La información para la viabilidad técnica y jurídica está siendo revisada por el área encargada de Findeter. En torno a estos trámites, de manera puntual solicitamos al municipio enviar certificado del IGAC del predio, nos encontramos a la espera para subsanar este requerimiento.

GCOM-FO-005 V1 / 05 Ago 2024 / Pública

CONTRATOS EN ESPERA DE DEFINICIÓN

GRUPO	DPTO	No SEDES	FECHA ADJUDICACION OBRA	FECHA ADJUDICACION INTERVENTORIA	VALOR ADJUDICADO OBRA	VALOR ADJUDICADO INTERVENTORIA	FECHA ESTIMADA INCIO	OBSERVACIONES
Grupo 6 Litoral del San Juan	Chocó	6	26/06/2025	26/06/2025	$ 3.365.512.244	$ 479.938.720	N/A	Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el MEN en reunión de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se determinó la No Viabilidad del proyecto. Findeter se encuentra a la espera a la oficialización de las despriorizaciones por parte del MEN, para llevar a cabo comité técnico y fiduciario.
Grupo 08 Sanquianga	Nariño	9	30/06/2025	30/06/2025	5.481.327.745	$557.379.220	N/A	Teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el MEN en reunión de seguimiento del 21 de mayo de 2025 se determinó la No Viabilidad del proyecto. Findeter se encuentra a la espera a la oficialización de las despriorizaciones por parte del MEN, para llevar a cabo comité técnico y fiduciario.

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 01-Ibagué

Adjudicación Obra: 28/02/2024
Adjudicación Inter: 28/02/2024
Fecha inicio: 29/07/2024
Fecha Fin: 31/12/2025
PAF-MENPNIE-O-127-2023
PAF-MENPNIE-I-125-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Departamento	**Tolima**
	OBRA: CONSORCIO BB IBAGUE NIT 901.811.721 - INGECAR S.A.S., NIT. 890.207.641-0 (90%) - LUIS ALBERTO BELTRÁN BECERRA, CC No. 63.540.679 (10%) **INTERVENTORÍA: CONSORCIO EDIFICACIONES 2024** NIT 901.808.808-1 - NOGAALL S.A.S, NIT. 830.090.010-1 (70%) - NESTOR RAMIREZ CUARTAS, CC No. 14.971.935 (30%)
 	**Valor Inicial** Obra: $ 16.014.417.534 Interventoría: $1.269.400.521 **Adiciones** Obra: 4.696.049.474 Interventoría: $ 65.049.428,00 + 318.569.164,68 **Valor Pagado** Obra: $ 13.666.896.413,00 (85,34%) Interventoría: $ 950.646.257,91 (74,89%)
MODIFICACION CONTRACTUALES	30/08/2024: Prorroga x 1 mes y se adiciona al contrato de interventoría 30/05/2025: suspensión x 15 días (30/05/2025 – 13/06/2025) 13/06/2025: Prorroga 1 a la suspensión 1 x 1 mes (14/06/2025 – 14/07/2025) 17/07/2025: Prorroga 2 a la suspensión 1 x 15 días -Se reinicia 29 de julio de 2025 29/07/2025: Prorroga por el termino de 2 meses –hasta el 30/09/2025 03/09/2025: Prorroga por el termino de 3 meses –hasta el 31/12/2025
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	❖ Derivados de la adición de recursos al contrato de obra, se empiezan los tramites de cotización de materiales , insumos y equipos para la terminación del proyecto. ❖ Se realiza una reunión el día 15 de septiembre 2025 con el Municipio para informarles que, la compensación forestal no es una obligación contractual del contrato de obra. Se da traslado 19 septiembre 2025 a esta obligación al municipio de Ibagué junto con la resolución de aprobación emitida por Cortolima. ❖ En cuanto a la ejecución es importante precisar que se están adelantado explanación del terreno para construir la cancha de fútbol, remates en mampostería bloque a y b, se adelanta destronque y brillo en pisos de aulas del bloque a y bloque b. El contratista a la fecha va al día con la ejecución del proyecto conforme a su programación

89,59%
Porcentaje de avance

88,80%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Página

Grupo 02 – San José del Palmar

Adjudicación Obra: 07/11/2024
Adjudicación Inter: 07/11/2024

Fecha inicio: 09/06/2025
Fecha Fin: 09/08/2026

PAF-MENPNIE-O-114-2024
PAF-MENPNIE-I-011-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Chocó**	
	OBRA: CONSORCIO IE SAN JOSÉ CHOCÓ 2024 - JAIME FALS MARTÍNEZ ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.S. - INGENIERÍA Y GESTIONES DE COLOMBIA SAS.	**INTERVENTORIA: CONSORCIO EDIFICACIONES 2024** - NOGAALL SAS - NÉSTOR RAMÍREZ CUARTAS
$	**Valor Inicial** Obra: $ 13.454.936.346,00 Interventoría: $ 907.048.041,00	
	Adiciones Obra: No. 1 $ 0,00 Interventoría: $ 0,00	
	Valor Pagado Obra: $ 0,00 Interventoría: $ 0,00	
NOVEDADES CONTRACTUALES	Acta de Inicio el 9 de junio de 2025. Suspensión: 6 de agosto de 2025	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El proyecto se suspendió en comité técnico realizado del 5 al 6 de agosto, por un plazo de 2 meses, ya que el lote entregado por el municipio para ejecutar el proyecto tiene un área de 4098 m2, la cual es muy inferior al área de 11.155 m2 propuesta en el proyecto inicial. El municipio se encuentra adelantando el desenglobe de un predio adjunto para adicionarlo al proyecto, por otra parte, se elevó consulta al área jurídica de Findeter para revisar la viabilidad jurídica del nuevo lote adicional.	

0,28%
Porcentaje de avance

1,00%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 03-El Charquito

Adjudicación Obra: 29/12/2023
Adjudicación Inter: 29/12/2023

Fecha inicio: 25/01/2024
Fecha Fin: 08/05/2026

PAF-MENPNIE-O-101-2023
PAF-MENPNIE-I-096-2023

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Cundinamarca**

OBRA: SITTCA CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 900.206.662-6

INTERVENTORIA: CONSORCIO CHARQUITO ET
NIT. 901.786.465-2
ELSA TORRES ARENALES (50%)
RT-TERRA S.A.S. (50%)

Valor Inicial
Obra: $ 11.406.316.041,00
Interventoría: $ $ 984.452.667,00

Adiciones
Obra: Total $ 201.196.870,00 (No. 1 $ 201.196.870,00)
Interventoría: Total $ 380.591.155,00 (N°1 $ 116.750.900; N°2 $ 196.922.985; N°3 $66.917.270 (adición 1 y 3 a cargo del Contratista).

Valor Pagado:
Obra: $ 0,00 (0.00%)
Interventoría: $ 0,00 (0,009%)

4,77%
Porcentaje de avance

6.54%
Porcentaje Programado

NOVEDADES CONTRACTUALES

- Acta de Inicio: 25/01/2024
- Prorroga 1: 60 días (25/05/2024 – 24/07/2024)
- Suspensión 1: 45 días (24/07/2024 – 08/09/2024)
- Prorroga 1 Suspensión 1: 30 días (08/09/2024 – 08/10/2024)
- Prorroga 2 Suspensión 1: 26 días (08/10/2024 – 02/11/2024)
- Prorroga 3 Suspensión 1: 30 días (02/11/2024 – 02/12/2024)
- Prorroga 4 Suspensión 1: 30 días (02/12/2024 – 02/01/2025)
- Prorroga 5 Suspensión 1: 30 días (02/01/2025 – 02/02/2025)
- Prorroga 6 Suspensión 1: 1 mes (02/02/2025– 02/03/2025)
- Prorroga 7 Suspensión 1: 1 mes (02/03/2025– 02/04/2025)
- Prorroga 2: 3 meses (03/04/2025 – 03/07/2025) + Adición No. 1 $201.196.870,00
- Prorroga 3: 1 mes (03/07/2025 - 03/08/2025
- Prorroga 4: 20 días (03/08/2025 - 22/08/2025
- Prorroga 5: 1.5 meses (22/08/2025 - 07/10/2025)

- Acta de Inicio: 25/01/2024
- Prorroga 1: 60 días (25/05/2024 – 24/07/2024) + Adición No. 1 $116.750.900
- Suspensión 1: 45 días (24/07/2024 – 08/09/2024)
- Prorroga 1 Suspensión 1: 30 días (08/09/2024 – 08/10/2024)
- Prorroga 2 Suspensión 1: 26 días (08/10/2024 – 02/11/2024)
- Prorroga 3 Suspensión 1: 30 días (02/11/2024 – 02/12/2024)
- Prorroga 4 Suspensión 1: 30 días (02/12/2024 – 02/01/2025)
- Prorroga 5 Suspensión 1: 30 días (02/01/2025 – 02/02/2025)
- Prorroga 6 Suspensión 1: 1 mes (02/02/2025– 02/03/2025)
- Prorroga 7 Suspensión 1: 1 mes (02/03/2025– 02/04/2025)
- Prorroga 2: 3 meses (03/04/2025 – 03/07/2025) + Adición No. 2 $196.922.985
- Prorroga 3: 1 mes (03/07/2025 - 03/08/2025 + Adición No. 3 $66.917.270
- Prorroga 4: 20 días (03/08/2025 - 22/08/2025
- Prorroga 5: 1.5 meses (22/08/2025 - 07/10/2025)

OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL

Actualmente en prorroga No. 5 por 1,5 meses sin adición de recursos hasta el 08/10/2025 sin reprogramación del alcance inicial. Mediante oficio con ref. 2202552023566 del 21/08/2025, se radica al Municipio el requerimiento de recursos en cumplimiento del fallo de acción popular, frente a o cual Soacha responde el 05/09/2025 en oficio ref. SEM-DE-PE-2145-2025, que requiere el Otro Sí N°1 del convenio para aportar en 2 pagos el valor de $3.836.666.568 (Pago 1 $900 millones en septiembre; Pago 2 $2.936.666.569 en octubre), no incluye costos adicionales por obras de mitigación por valor de $174 millones para estudios y diseños de obras de canalización de la quebrada).
Radicado en coordinación derivada incumplimiento y aplicación del Apremio No. 1 por $748.684.582,76 al contrato de obra



Grupo 07-Litoral del San Juan (Indígenas)

Adjudicación Obra: 25/11/2024
Adjudicación Inter: 25/11/2024
Fecha inicio: 09/01/2025
Fecha Fin: 30/09/2025

PAF-MENPNIE-O-126-2024
PAF-MENPNIE-I-032-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Chocó**	
	OBRA: CONSORCIO PRO -INSTITUCIONES CHOCÓ – INDÍGENAS Nit: 901.884.967 - 8 M&B INVERSIONES LA CONFIANZA S.A.S (50%) CONSTRUCTORA FACTOR INGENIERÍA S.A.S (50%)	**INTERVENTORIA: CONSORCIO CONSTRUSISCO** NIT: SISCO INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SAS (50%) CONSTRUCEC SAS (50%)
$	**Valor Inicial** Obra: $ 1.643.326.730 Interventoría: $ 331.801.336	
	Adiciones Interventoría $80.544.972 mayor permanencia de la interventoría asumida por el contratista de obra	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	Suspensión No. 1 por 23 días contados desde el 7 de marzo del 2025. **Fecha de reinicio: 30 de marzo de 2025** Prorroga por 4 meses (30 de mayo de 2025), nueva fecha de terminación 30/09/2025.	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Persiste el incumplimiento por parte del contratista CONSORCIO PRO -INSTITUCIONES CHOCÓ – INDÍGENAS, frente a la entrega total del componente I del proyecto. En reunión presencial con los consorciados realizada el 4 de septiembre quedó el compromiso de realizar entrega de los productos faltantes el 12 de septiembre, sin embargo, la entrega total se realizó hasta el 14 de septiembre. La interventoría se encuentra en revisión de los productos entregados.	

1,17%
Porcentaje de avance

82,26%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas

Entregadas	**0**
En ejecución	4
Terminadas	0

No	Municipio	ETC	Sede Educativa	Estado
1	Medio San Juan	Chocó	MACEDONIA	En ejecución
2	Litoral de San Juan	Chocó	ESPERANZA DE WAIMIA	En ejecución
3	Litoral de San Juan	Chocó	ESTRELLA DE PANGALA	En ejecución
4	Litoral de San Juan	Chocó	SEDE PRINCIPAL	En ejecución



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 09-Mercaderes Cauca

Adjudicación Obra: 25/10/2024
Adjudicación Inter: 25/10/2024

Fecha inicio: **30**/09/2025
Fecha Fin: **01**/07/2026

PAF-MENPNIE-O-106-2024
PAF-MENPNIE-I-195-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Cauca**	
	OBRA: CONSORCIO ESMERALDAS Nit: 901.885.266-8 ESDRAS MD INGENIERIA S.A.S (50%) PROQUIN S.A.S (50%)	**INTERVENTORIA: CONSORCIO CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS** NIT: **901.886.474-8** VIETTA CONSTRUCCIONES S.A.S
$	**Valor Inicial** Obra: $ $5.067.512.140 Interventoría: $ 598.387.062	
	Adiciones N/A	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	**ninguna**	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El 18/09/2025 se realizó mesa de trabajo con la ETC, MEN, y Findeter y quedó como compromiso realizar una nueva reunión para el 22/09/2025 con la ETC para conciliar la minuta Final con los equipos juridicos.	

0%
Porcentaje de avance

0%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 10-Totoro

Adjudicación Obra: 21/03/2025
Adjudicación Inter: 21/03/2025

Fecha inicio: Por definir
Fecha Fin: Por definir

PAF-MENPNIE-O-019-2024
PAF-MENPNIE-I-125-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Cauca**	
	OBRA: CONSORCIO OBRA INSTITUCIONAL TOTORO 2025 Nit: 901.932.561-8 • COMPAÑÍA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE OCCIDENTE SAS (participación 50%) • FEXXA SAS (50%)	**INTERVENTORIA: $ 2.380.838.350,00** NIT: 900.932.571-1 • 5T SAS BIC (50%) • CONSTRUCTORES CONSULTORES ASOCIADOS LIMITADA (50%)
$	**Valor Inicial** Obra: $ 2.380.838.350,00 Interventoría: $ 278.908.930,00	
	Adiciones N/A	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	N/A	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contratos Legalizados, inicio a la espera de suscripción convenio multipartita: el 29/08/2025 en reunión con GOBERNACIÓN , MEN y FINDETER, la gobernación solicitó nuevos ajustes en relación con la minuta remitida el 28/07/2025 mediante oficio 2202552022577, para lo cual FINDETER remitió nueva minuta el 03/09/2025 con radicado 2202552024162 reiterado el 11 de septiembre con radicado 2202552024391. En reunión el 18/09/2025 se obtuvo respuesta de la ETC remitiendo minuta con solicitud de cambios y adicionando nuevos cambios en el marco de la reunión por lo cual se programo nueva reunión para el 22/09/2025. Se ajustó matrícula SIMAT a 175 estudiantes en mesa de trabajo del 19/08/2025 entre ETC, MEN, CABILDO y FINDETER. El presupuesto de referencia de los Estudios y diseños iniciales es de febrero de 2021 por valor de $ 2.695.988.213,00, frente al cual se tiene que es un 21,90% mayor que el valor actual contratado para la etapa de obra por valor de $ 2.211.624.000,00, teniendo de entrada una diferencia de $ 484.364.213,00. Se aclara que, los estudios y diseños iniciales aportados por el municipio para la ejecución del proyecto no cuentan con tanque de reserva, no tienen subestación ni planta eléctrica, tampoco cuentan con diseño bioclimático ni de voz y datos, sumado al hecho que el presupuesto debe ser indexado.	

0%
Porcentaje de avance

0%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 11- Colon, Nariño

Adjudicación Obra: 23/08/2024 **Fecha inicio**: 11/10/2024 PAF-MENPNIE-O-067-2024
Adjudicación Inter: 23/08/2024 **Fecha Fin:** 13/05/2026 PAF-MENPNIE-I-079-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Nariño**
	OBRA: CONSORCIO SAN CARLOS 2024 NIT: 901.864.521-1 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES INTEGRALES S.A.S (99%) JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ (1%) **INTERVENTORIA:** ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS NIT: 832.000.548-2
	Valor Inicial Obra: $ 5.458.250.573 **Valor Inicial Interventoría:** $ 740.376.374
	Adiciones Obra: $ 0,00 **Adiciones Interventoría:** $ 0,00
	Valor Pagado Obra: $ 0,00 **Valor Pagado Interventoría:** $ 0,00
NOVEDADES CONTRACTUALES	Suspensión No. 1: del 10/02/2025 al 9/03/2025. Prorroga No. 1 a la Suspensión No. 1: del 10/03/2025 al 9/04/2025 Prorroga No. 2 a la Suspensión No. 1: del 10/04/2025 al 14/07/2025 Prorroga No. 3 a la Suspensión No. 1: del 15/07/2025 al 14/08/2025 Prorroga No. 4 a la Suspensión No. 1: del 15/08/2025 al 15/09/2025 Prorroga No. 5 a la Suspensión No. 1 del 15/09/2025 al 15/10/2025 Reinicio: 16/10/2025
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El proyecto se encuentra actualmente SUSPENDIDO debido al tiempo de desarrollo de los tramites: LICENCIA: Aprobada por municipio en espera de fechar, tan pronto se cuente con la versión final del presupuesto que determine el alcance contractual y el adicional que se requeriría VERTIMIENTOS: Ya se cuenta con el permiso emitido por Corponariño. ELECTRICO: Ya se cuenta con la aprobación el diseño eléctrico serie 1 por parte de Cedenar. PRESUPUESTO: Se remite propuestas económicas al MEN con 3 alternativas para la ejecución de la etapa 2, mediante oficio No.2202552024442 del 12 de septiembre del 2025

4,04%
Porcentaje de avance

4,04%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 12- I.E San Juan Bautista Caimito

Adjudicación Obra: 22/05/2024
Adjudicación Inter: 28/02/2024

Fecha inicio: 19/07/2024
Fecha Fin: 26/05/2026

PAF-MENPNIE-O-006-2024
PAF-MENPNIE-I-007-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTOe	**Sucre**
	OBRA: CONSORCIO INSTITUCIÓN SAN JUAN BAUTISTA SAICO INGENIERIA S.A.S JULIO JAVIER PALOMINO CASTILLO **INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍAS Y CONSULTORÍAS S.A.S** NIT: 900.503.646-1
$	**Valor Inicial** Obra: $ 3.221.231.493,00 Interventoría: $ 389.595.668,00
	Adiciones: **Obra:** $1.059.398.902,12 **Interventoría:** 56.765.034,50
	Valor Pagado Obra: $ 211.431.143,70 (6,56%) Interventoría: $ 44.104.914,90 (11,32%)
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	• 14/01/2025 Suspensión 1: X 45 días • 28/02/2025 Prorroga 1 a la Suspensión 1: 14 días • 14/03/2025 Prorroga 2 a la Suspensión 1: 30 días • 15/04/2025 Prórroga 3 a la suspensión 1: 14 días • 30/04/2025 Prórroga 4 a la suspensión 1: 30 días • 30/05/2025 Prórroga 5 a la suspensión 1: 10 días • 12/06/2025 Prórroga 6 a la suspensión 1: 1 mes • 11/07/2025 Prórroga 7 a la suspensión 01: 01 mes • Reinicio proyecto 13/08/2025 • 12/09/2025 Otrosí N°1 Adición y Prorroga contratos derivados
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Actualmente se tramita el cierre de la etapa 1 con la suscripción de las actas de entrega y recibo a satisfacción obra e Interventoría las cuales deben estar suscritas y con pólizas actualizadas para proceder con el Inicio de la etapa 2. Entre el 05 al 09 de septiembre 2025 se tramitó comité técnico N°294 y Comité fiduciario N°178 en el cual se instruye l aprobación para los modificatorios a los contratos derivado 0bra e Interventoría en el cual se adiciona recursos al contrato d obra por $1.059.398.902,12 y una prorroga de 2 meses. Y para el contrato de Interventoría una adición por el valor $56.765.034,5 y prorroga de 2 meses. Una vez legalizados los modificatorio se procederá a la suscripción del acta de inicio etapa 2 proceso que se espera que se d entre la semana del 22 al 26 septiembre 2025

7,30%
Porcentaje de avance

7,30%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Públic

Grupo 14- Pueblos Indígenas CRIHU

Adjudicación Obra: 28/05/2024 **Fecha inicio:** 30/07/2024
Adjudicación Inter: 28/05/2024 **Fecha Fin:** 29/01/2025

PAF-MENPNIE-O-045-2024
PAF-MENPNIE-I-038-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Huila**
	OBRA: INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. NIT: 813.006.542-7 **INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERHUILA 038** NIT. 901839.812-4 KAREN DAYANA HERNÁNDEZ GÓMEZ (50%) REY DE JESUS MERLANO MARINO (50%)
	Valor Inicial Obra: $968.394.297 Interventoría: $227.100.006,0
	Adiciones Obra: $ 269.313.166 Interventoría: $ 22.536.977
	Valor Pagado Obra: $1.237.707.463 Interventoría: $ 226.321.285
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prórroga N°1 -08/10/2024 - 30 días Prorroga N°2: 15/10/2024- Inclusión Ítems no previstos Prorroga N°3: 23/12/2024 - 30 días
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El 25/08/2025 se radica el Prisa con numero INC 2025-001930 correspondiente al proceso de liquidación del contrato de Obra. 22/08/2025 se recibe el acta de entrega del contrato de interventoría suscrita por Fiduagraria.

100%
Porcentaje de avance

100%
Porcentaje Programado



shutterstock.com · 1662414187

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Sedes Educativas

Entregadas	**4**
En ejecución	0
Terminadas	0



No	Municipio	Sede Educativa	Estado
1	La Argentina	LA CRISTALINA	Entregada
2	La Plata	PEÑÓN DE TÁLAGA	Entregada
3	La Plata	POTRERITO	Entregada
4	Palestina	YAKUAS	Entregada

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 18- Colegio Nacional Pinillos Mompox

Adjudicación Obra: 28/01/2025
Adjudicación Inter: 28/01/2025

Fecha inicio: 03/06/2025
Fecha Fin: 20/05/2026

PAF-MENPNIE-O-144-2024
PAF-MENPNIE-I-138-2024

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Bolívar**	
	OBRA: UNION TEMPORAL FINDETER MOMPOX PYP 2024 PANAM INGENIEROS SAS PROFESIONALES ASOCIADOS PROYECTAR T LTDA	**INTERVENTORÍA: INGESCOR LTDA** JUAN CARLOS RIOS URUETA NIT: 812.002.689-5
	Valor Inicial Obra: $ 2.451.011.208,00 Interventoría: $ 419.843.827,00	
	Adiciones 0	
	Valor Pagado Obra: $ 0,00 Interventoría: $ 0,00	
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	N/A	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Se continua con la elaboración de las cantidades, costos y presupuestos de la intervención para la Fase II, durante el comité de seguimiento se acordó realizar entregas parciales para mayor seguimiento a este componente (para el 19, 23 y 26 de septiembre de 2025) se programa el 26 septiembre 2025 comité de seguimiento extraordinario con el contratista, interventoría, MEN y Findeter, la cual se socializará la propuesta a la intervención que se presentará al Ministerio de Cultura	

6,39%
Porcentaje de avance

6,59%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

Grupo 20-El Playón

Adjudicación Obra:
Adjudicación Inter:

Fecha inicio:
Fecha Fin:

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

DEPARTAMENTO	**Santander**	
	CONTRATISTA: El proyecto se encuentra en etapa Precontractual.	**INTERVENTORÍA:** El proyecto se encuentra en etapa Precontractual.
$	**Valor Inicial** Obra: valores en revisión: **$ 4.408.815.174,00** Interventoría: valores en revisión: **$ 373.687.080,00**	
	Adiciones: N/A	
	Valor Pagado N/A	
NOVEDADES CONTRACTUALES	Se encuentra en etapa Precontractual.	
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Estudios previos de obra e interventoría se encuentran en revisión por área interna derivada. Se realizó una reunión entre el municipio de El Playón, Departamento de Santander, Ministerio de Educación Nacional y Findeter para socializar el tema del convenio interadministrativo que fueron remitidos (secretaría de educación departamental y municipio del playón). El departamento remitió oficio dejando trazabilidad que revisaron y no encontraron observaciones al convenio. Se realizó reunión de socialización con el MEN el 16 de septiembre de 2025 respecto a los valores presentados.	

0,00%
Porcentaje de avance

0,00%
Porcentaje Programado



CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial

CCOM-FO-005 V1 / 05 -Ago-2024 / Pública

www.findeter.gov.co

@findetercol @findetercol

@findeter linkedin.com/company/findeter

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Gobierno de Colombia

B.P.I. Buenas Prácticas de Innovación · icontec · Cámara de Comercio de Bogotá

efr www.masfamilia.org

ISO 9001 SGS CO18/8256 · ISO 14001 SGS CO18/8257 · ISO/IEC 27001 SGS CO21/962851

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ESTADO DE LA EJECUCION DEL PROYECT				
Municipio	ETC	Institución Educativa	DaneSede	Sede Educativa	Estado General	% Ejecución Global	MONTO TOTAL INVERTIDO POR SEDE (OBRA+ INTER)	ALCANCE - BENEFICIARIOS	observaciones
Rioblanco	Tolima	AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616000591	PALONEGRO CAMILO TORRES	Terminada	100,0%	$ 173.936.624,98	48	Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616000558	LAS MIRLAS	Terminada	100,0%	$ 148.263.968,37	31	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616001643	LOS ANGELES	Terminada	100,0%	$ 149.738.021,42	29	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616000388	EL CEDRAL	Terminada	100,0%	$ 192.168.832,11	28	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616000841	LOS CRISTALES	Terminada	100,0%	$ 180.698.491,20	25	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616000566	LAS MERCEDES	Terminada	100,0%	$ 151.947.683,02	22	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	273616001406	RIO VERDE	Terminada	100,0%	$ 159.487.226,57	21	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616001261	LOS GUAYABOS	Terminada	100,0%	$ 225.219.401,79	25	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616001040	CAMPO HERMOSO	Terminada	100,0%	$ 144.305.624,95	15	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616001635	LA PALMA	Terminada	100,0%	$ 102.732.499,64	6	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616000914	EL DIAMANTE	Terminada	100,0%	$ 211.641.172,02	17	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA JESUS ANTONIO AMEZQUITA	273616000892	IE JESUS ANTONIO AMEZQUITA - SEDE P	Terminada	100,0%	$ 337.579.892,51	243	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	273616000094	IE JOSE MARIA CORDOBA - SEDE PRINCI	Terminada	100,0%	$ 264.592.034,27	171	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA SAN RAFAEL	273616000141	IET AGROPECUARIA SAN RAFAEL - SEDE	Terminada	100,0%	$ 440.649.430,97	479	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA	173616000022	IET FRANCISCO JULIAN OLAYA - SEDE PI	Terminada	100,0%	$ 451.413.055,02	281	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Rioblanco	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ERNESTO VANEGAS NEIRA	273616001759	BRISAS DEL PALMAR	Terminada	100,0%	$ 161.186.632,25	11	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMACHO ANGARITA	273168001793	EL JORDAN	Terminada	100,0%	$ 248.483.082,58	61	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMACHO ANGARITA	273168002064	LA GLORIETA	Terminada	100,0%	$ 229.533.024,51	27	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL MURILLO TORO	273168000517	POTRERITO DE LUGO	Terminada	100,0%	$ 234.026.317,64	12	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMACHO ANGARITA	273168001785	ARGENTINA LINDAY	Terminada	100,0%	$ 185.032.581,02	18	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	273168001645	ESPIRITU SANTO BALCONES	Terminada	100,0%	$ 186.556.446,74	16	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA LAGUNILLA	273168002471	EL DAVIS	Terminada	100,0%	$ 197.440.923,67	11	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA ALVARO MOLINA	273168000690	EL CAIRO	Terminada	100,0%	$ 205.257.628,18	8	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MEDALLA MILAGROSA	273168000843	TAMARCO	Terminada	100,0%	$ 128.115.425,35	5	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMACHO ANGARITA	273168000762	SANTA RITA	Terminada	100,0%	$ 164.113.464,32	8	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CAMACHO ANGARITA	273168003729	EL VISO	Terminada	100,0%	$ 153.872.851,32	13	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA LAGUNILLA	273168002552	ASTILLEROS	Terminada	100,0%	$ 187.787.939,40	12	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA MEDALLA MILAGROSA	273168003656	JOSE ALFONSO SUAREZ	Terminada	100,0%	$ 140.429.755,54	9	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025

Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA LA RISALDA	273168002218	BRAZUELOS DELICIAS	Terminada	100,0%	$ 180.881.249,18	9	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR	273168003320	LA GRANJA AMBEIMA	Terminada	100,0%	$ 198.100.905,43	11	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	273168000835	HATO VIEJO	Terminada	100,0%	$ 156.521.122,56	8	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Chaparral	Tolima	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SOLEDAD MEDINA	273168002927	LA CIMA	Terminada	100,0%	$ 185.284.818,47	5	Acta de liquidación de obra suscrita el 01 de abril de 2025. Liquidación de interventoría suscrito el 14 de abril de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA PAREDES	481794003139	EL PORVENIR	Terminada	100,0%	$ 126.879.319,09	27	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	CENTRO EDUCATIVO LA PALESTINA	281794005019	LOS ALMENDROS	Terminada	100,0%	$ 476.466.823,94	500	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CABALLERO	281794000564	AGUSTIN NIETO CABALLERO	Terminada	100,0%	$ 265.313.244,91	162	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA PAREDES	281794004245	LA UNION	Terminada	100,0%	$ 268.259.690,71	120	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA PAREDES	281794002532	BAJO CUSAY	Terminada	100,0%	$ 255.191.608,74	70	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA PAREDES	281794002711	NAPOLES 1	Terminada	100,0%	$ 315.029.675,67	75	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA PARMENIO BONILLA PAREDES	281794003113	ALTO CAUCA	Terminada	100,0%	$ 57.015.515,08	50	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CABALLERO	281794005207	LA AURORA	Terminada	100,0%	$ 182.996.969,89	70	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO BETOY	281794000408	INDIGENA CRISTOBAL COLON	Terminada	100,0%	$ 204.194.455,69	41	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO BETOY	281794004659	INDIGENA GONZALO JIMENEZ DE QUESA	Terminada	100,0%	$ 171.022.894,04	30	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN NIETO CABALLERO	281794003440	CAÑO LIMON	Terminada	100,0%	$ 96.281.295,63	30	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO BETOY	281794001994	INDIGENA SANTA TERESITA	Terminada	100,0%	$ 331.039.642,03	40	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA JOEL SIERRA GONZALEZ	281794005299	AIRES DE CAMPO ALEGRE	Terminada	100,0%	$ 420.887.905,03	20	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	I.E. ANTONIO RICAURTE	281794000602	ANTONIO RICAURTE	Terminada	100,0%	$ 983.955.497,82	400	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA FILIPINAS	281794004390	SANTA LUCIA - LA ARENOSA	Terminada	100,0%	$ 174.274.735,08	46	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	CENTRO EDUCATIVO LA PALESTINA	281794004462	PALESTINA	Terminada	100,0%	$ 162.530.098,45	60	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO BETOY	281794005051	INDIGENA IGUANITOS	Terminada	100,0%	$ 412.773.184,69	36	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025

Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO RINCON DUCON	281794004241	LOS TURPIALES	Terminada	100,0%	$ 227.532.898,62	25	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA FILIPINAS	281794002290	EL PARAISO	Terminada	100,0%	$ 150.072.151,75	30	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA GUAHIBO BETOY	281794003067	INDIGENA EL PORVENIR	Terminada	100,0%	$ 269.618.444,14	70	Liquidación de obra suscrita el 20 de mayo de 2025 Pendiente acta de liquidación de interventoría para semana del 28 de julio al 01 de agosto de 2025
Saravena	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ODEL LIZARAZO VILLAMAGA	281736002581	AGROPECUARIO JOSÉ ODEL LIZARAZO	Terminada	100,0%	$ 791.607.355,04	250	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Saravena	Arauca	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA U´WA TUTUKANA SINAIAKA	281794001692	CENTRO INDIGENA SAN EMILIO	Terminada	100,0%	$ 265.547.836,42	50	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Saravena	Arauca	CENTRO EDUCATIVO ATANASIO GIRARDOT	281736001348	EPIFANIO MEJIA	Terminada	100,0%	$ 432.352.969,06	65	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Saravena	Arauca	CENTRO EDUCATIVO LUIS ANTONIO CALVO	281736002654	EL JARDIN	Terminada	100,0%	$ 253.271.335,80	120	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Hato Corozal	Casanare	INSTITUCION EDUCATIVA PUERTO COLOMBIA	485125001576	GIRASOLES	Terminada	100,0%	$ 142.129.130,15	35	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Hato Corozal	Casanare	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS	285125000490	EL SUNI	Terminada	100,0%	$ 107.020.756,11	45	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Hato Corozal	Casanare	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS	285125001208	LAS TAPIAS	Terminada	100,0%	$ 259.905.244,99	70	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Hato Corozal	Casanare	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS	285125000040	SAN LUIS BELTRAN	Terminada	100,0%	$ 265.922.314,61	15	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Fortul	Arauca	CENTRO EDUCATIVO PALMARITO	281794004110	POLICARPA SALAVARRIETA	Terminada	100,0%	$ 465.048.030,14	135	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Fortul	Arauca	I.E. PAZ Y ESPERANZA	281794004331	EL EDEN	Terminada	100,0%	$ 328.643.316,77	120	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Fortul	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA ALEJANDRO HUMBOLDT	181736002161	CONCENTRACION ALEJANDRO HUMBOLI	Terminada	100,0%	$ 238.371.358,91	430	Se radican los documentos para liquidación de obra e interventoría el día 25 de julio de 2025
Timbiquí	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO OCORO	119809001293	BELLA VISTA	Ejecución	92,5%	$ 370.128.063,00	5	Suspensión 17/07/2025 x 45 días
Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO BOCA DE PATIA	219809000071	ANGOSTURA	Ejecución	73,0%	$ 156.084.654,25	32	Suspensión 17/07/2025 x 45 días
Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO BRAZO CORTO	219809001077	COROZAL	Ejecución	90,9%	$ 64.159.724,44	49	Suspensión 17/07/2025 x 45 días
Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO BRAZO CORTO	219809000607	CHACON	Terminada	99,9%	$ 159.423.057,77	30	Suspensión 17/07/2025 x 45 días
Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO CALLE DE SANTA ROSA	419809001190	ESCUELA RURAL MIXTA LA SIERPE	Ejecución	98,1%	$ 180.322.973,59	73	Suspensión 17/07/2025 x 45 días
Timbiquí	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO OCORO	219809000763	SAN MIGUEL DEL RIO	Terminada	100,0%	$ 206.602.467,73	9	Suspensión 17/07/2025 x 45 días
Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO BOCA DE PATIA	219809000135	BOCA DE PATIA SEDE PRINCIPAL	Ejecución	92,2%	$ 188.589.763,14	60	Suspensión 17/07/2025 x 45 días
Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO COTEJE	219809000861	CHETE	Ejecución	87,4%	$ 193.524.118,75	65	Suspensión 17/07/2025 x 45 días
Timbiquí	Cauca	CENTRO EDUCATIVO CABECITAL	219809000411	CABECITAL SEDE PRINCIPAL	Ejecución	87,3%	$ 258.918.193,80	44	Suspensión 17/07/2025 x 45 días
Timbiquí	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA SANTA ROSA	219809001395	SANTA ROSA SEDE PRINCIPAL	Ejecución	3,2%	$ 179.170.782,54	247	Suspensión 17/07/2025 x 45 días
Piendamó	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA EL OASIS	119548000014	OASIS (sede principal)	Terminada	100,0%	$ 345.355.455,35	728	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Piendamó	Cauca	I.E. CAÑA DULCE	219548000060	CAÑA DULCE (sede principal)	Terminada	100,0%	$ 178.305.112,69	195	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Piendamó	Cauca	CENTRO EDUCATIVO MATARREDONDA	219548000183	MATAREDONDA (sede principal)	Terminada	100,0%	$ 178.305.112,69	175	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Piendamó	Cauca	CENTRO EDUCATIVO CORRALES	219548000191	CORRALES (sede principal)	Terminada	100,0%	$ 178.305.112,69	67	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Piendamó	Cauca	INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS UVALES	219548000639	LOS PINOS	Terminada	100,0%	$ 178.305.112,69	51	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA	119473000081	FRANCISCO ANTONIO RADA (sede princip	Terminada	100,0%	$ 345.355.455,34	968	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025

Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO ANTONIO RADA	119473000064	INTEGRADA	Terminada	100,0%	$ 345.355.455,36	404	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Morales	Cauca	CENTRO EDUCATIVO CANAVERAL	219473000646	LA FLORESTA	Terminada	100,0%	$ 178.305.112,69	89	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Morales	Cauca	CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL	219473000654	EL ROSAL	Terminada	100,0%	$ 178.305.112,69	58	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Morales	Cauca	CENTRO EDUCATIVO CANAVERAL	219473000832	EL CRUCERO DE PAN DE AZUCAR	Terminada	100,0%	$ 178.305.112,69	59	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA RENACER AFRO	219473000077	PAN DE AZUCAR	Terminada	100,0%	$ 178.305.112,68	59	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Morales	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA RENACER AFRO	219473000433	EL DIVISO	Terminada	100,0%	$ 178.305.112,68	18	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Morales	Cauca	CENTRO EDUCATIVO CANAVERAL	219473000484	EL MACO	Terminada	100,0%	$ 178.305.109,73	15	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Villa Rica	Cauca	INSTITUTO EDUCATIVO TÉCNICO SENÓN FABIO VILLEGAS	219698000734	SENON FABIO VILLEGAS (sede principal)	Terminada	100,0%	$ 1.242.566.400,00	690	liquidación de obra suscrita el 27 de mayo de 2025 Acta de liquidación de interventoría suscrita el 08/07/2025
Suárez	Cauca	I.E. ASNAZU	219780000319	NINA MARIA	Terminada	100,0%	$ 334.448.126,00	158	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Suárez	Cauca	I.E. ASNAZU	219780001358	PORTUGAL	Terminada	100,0%	$ 173.562.902,00	63	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Suárez	Cauca	I.E. ASNAZU	219780000122	CANUTICO	Terminada	100,0%	$ 256.559.697,00	28	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Suárez	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA MINDALA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MINDALA)	219780001510	VISTA HERMOSA	Terminada	100,0%	$ 158.163.419,00	18	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Suárez	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA MINDALA (ANTES CENTRO EDUCATIVO MINDALA)	219780000688	SAN VICENTE	Terminada	100,0%	$ 162.282.670,00	43	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Suárez	Cauca	I.E. LA BETULIA	219780001447	LA CABAÑA	Terminada	100,0%	$ 164.975.718,00	15	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Suárez	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA LA MESETA (ANTES CENTRO EDUCATIVO LA MESETA)	219780001463	SENDERITO	Terminada	100,0%	$ 86.025.668,00	12	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Buenos Aires	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA BRISAS DE MARY LOPEZ	219110000199	EL SILENCIO	Terminada	100,0%	$ 196.774.433,00	53	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Buenos Aires	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA VISION DE HONDURAS	219110001691	NUEVA VISION DE HONDURAS (sede prin	Terminada	100,0%	$ 198.685.847,00	328	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Buenos Aires	Cauca	I.E. TIMBA	419110000970	TIMBA (sede principal)	Terminada	100,0%	$ 173.567.413,00	347	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Buenos Aires	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA EL PORVENIR	219110000229	LA ESPERANZA	Terminada	100,0%	$ 193.950.617,00	311	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Buenos Aires	Cauca	CENTRO EDUCATIVO MUNCHIQUE	219110001012	MUNCHIQUE (sede principal	Terminada	100,0%	$ 167.190.476,00	181	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Buenos Aires	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL VALENTIN CARABALI	219110000024	LA BALSA	Terminada	100,0%	$ 130.325.476,00	148	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
Buenos Aires	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA	119110000798	GABRIEL MANRIQUE	Terminada	100,0%	$ 268.269.538,00	142	Se radicó liquidación del contrato de obra el 30 de Julio/2025
López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	219418001021	BETANIA	Ejecución	72,4%	$ 194.062.971,42	25	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	I.E. NOANAMITO	219418000149	SAN JOSE DEL CHIGUERO	Ejecución	100,0%	$ 157.317.703,34	64	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	C.E. BOCA GRANDE	219418000122	EL COCO	Ejecución	100,0%	$ 185.711.774,04	61	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	I.E. NOANAMITO	219418000076	GUAYABAL	Ejecución	8,0%	$ 145.626.027,40	45	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	219418000459	LAS CRUCES	Ejecución	8,0%	$ 143.955.788,13	32	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	219418001634	LAS PALMAS	Ejecución	6,5%	$ 210.765.365,19	204	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	219418000424	EL TRUENO	Ejecución	7,2%	$ 175.690.337,38	38	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	C.E. BOCA GRANDE	219418000131	GUACARI	Ejecución	4,8%	$ 461.301.279,67	62	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25

López	Cauca	I.E. PABLO VI	219418000840	CORRENTON	Ejecución		95,2%	$ 175.690.337,38	46	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	I.E. NOANAMITO	219418001609	NOAMITO SEDE PRINCIPAL	Cancelada		14,1%	$ 52.092.619,91	17	Se desprioriza la sede en comité No 94 del 08 de abril de 2025
López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	219418000378	SAGRADA FAILIA SEDE PRINCIPAL	Ejecución		7,2%	$ 174.020.098,10	129	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	I.E. PABLO VI	219418000238	SAN ANTONIO DE GURUMENDI	Ejecución		80,2%	$ 703.406.934,14	29	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	I.E. PABLO VI	219418000157	YULLAL JOLI	Ejecución		8,7%	$ 177.360.576,66	32	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADA FAMILIA	219418001200	EL CACAO	Ejecución		8,0%	$ 143.955.788,13	116	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
López	Cauca	I.E. PABLO VI	219418000831	PLAYA MENUDA JOLI	Cancelada		7,6%	$ 93.848.605,83	11	Se desprioriza la sede en comité No 94 del 08 de abril de 2025
López	Cauca	I.E. SANTA CRUZ ALTO SIGUI	219418000301	SANTA CRUZ ALTO SIGUI	Ejecución		7,3%	$ 169.009.385,27	52	Se prorroga la suspensión No 01 por 30 días el 27 de junio de 2025 con fecha de reinicio 02/09/25
Riosucio	Chocó	IE ANTONIO RICAURTE	227615001664	SEDE LAS AMERICAS	Ejecución		1,7%	$ 350.696.006,45	291	
Quibdó	Quibdó	IE AGROPECUARIA CRISTO REY DE TUTUNENDO	227001001706	SEDE DE GUADALUPE	Cancelada	#DIV/0!		$ -	-	Se desprioriza porintervención anterior del FFIE
Quibdó	Quibdó	IE AGROPECUARIA DE TAGACHI	227001003547	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGRC	Ejecución		16,2%	$ 115.475.023,45	193	
Quibdó	Quibdó	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA JESUS ANTONIO VELAZQUEZ EL 20	227001000998	SEDE DE MOTOLDO	Ejecución		3,0%	$ 201.891.411,45	30	
Quibdó	Quibdó	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA	227001018145	SEDE DE MUNGARADO	Cancelada	#DIV/0!		$ -	-	Se desprioriza el 27 de junio de 2025 por no viabilidad juridica
Quibdó	Quibdó	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA	227001018137	CE INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMAS	Ejecución		2,9%	$ 208.747.939,45	33	
Quibdó	Quibdó	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA	227001004233	SEDE DE CHUSCALITO	Ejecución		2,9%	$ 208.747.939,45	26	
Quibdó	Quibdó	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA	227001018340	SEDE GUADUALITO	Cancelada		0,0%	$ -	-	Se desprioriza el 27 de junio de 2025 por no viabilidad juridica
Quibdó	Quibdó	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA JESUS ANTONIO VELAZQUEZ EL 20	227001018331	SEDE PLAYA BONITA	Ejecución		2,9%	$ 208.747.939,45	33	
Quibdó	Quibdó	CENTRO EDUCATIVO INDIGENA JESUS ANTONIO VELAZQUEZ EL 20	227001800072	SEDE EL NOVENTA	Cancelada		0,0%	$ -	-	Se desprioriza el 27 de junio de 2025 por no viabilidad juridica
Quibdó	Quibdó	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA	227001018374	SEDE PLAYA INDIA	Cancelada		0,0%	$ -	-	Se desprioriza el 27 de junio de 2025 por no viabilidad juridica
Quibdó	Quibdó	C.E. INDIGENA EMBERA ALFONSO DUMASA DE CAIMANERO JAMPAPA	227001018226	SEDE DE CARRIZAL	Cancelada		0,0%	$ -	-	Se desprioriza el 27 de junio de 2025 por no viabilidad juridica
Quibdó	Quibdó	CENTRO EDUCATIVO MUNGUIDO	227001018251	SEDE PUERTO JUAN	Ejecución		2,9%	$ 208.747.939,45	32	
Quibdó	Quibdó	CENTRO EDUCATIVO MUNGUIDO	227001000408	SEDE DE LA COMUNIDAD	Ejecución		2,9%	$ 208.747.939,45	33	
Bajo Baudó	Chocó	IE FRANCISCO PIZARRO	127077002103	SEDE MARIA ISABEL MOSQUERA	Ejecución		6,8%	$ 249.551.051,45	152	
Bajo Baudó	Chocó	IE FRANCISCO PIZARRO	127077000089	IE FRANCISCO PIZARRO - SEDE PRINCIPA	Ejecución		10,3%	$ 398.657.036,45	587	
Bajo Baudó	Chocó	IE INDÍGENA EMBERA DE PIZARRO	127077005234	IE INDÖGENA EMBERA DE PIZARRO - SEI	Ejecución		32,1%	$ 305.846.740,45	248	
Quibdó	Quibdó	IE SANTO DOMINGO SAVIO	127001000039	SEDE LOS ANGELES	Ejecución		99,4%	$ 223.817.547,45	288	Sedes incluidas para reemplazo el día 17 de junio de 2025
Quibdó	Quibdó	IE ARMANDO LUNA ROA	127001000047	SEDE ALAMEDA REYES	Ejecución		88,3%	$ 226.637.194,45	319	Sedes incluidas para reemplazo el día 17 de junio de 2025
Quibdó	Quibdó	IE NORMAL SUPERIOR DE QUIBDO	127001003151	SEDE NIÑO JESUS	Ejecución		88,3%	$ 221.702.887,45	170	Sedes incluidas para reemplazo el día 17 de junio de 2025
Quibdó	Quibdó	IE MIA ROGERIO VELASQUEZ MURILLO	127001000799	MIRAFLORES	Ejecución		94,1%	$ 220.776.098,45	215	Sedes incluidas para reemplazo el día 17 de junio de 2025
La Jagua De Ibirico	Cesár	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	220400000131	SEDE MARTIN EMILIO HERNANDEZ	Terminada		100,0%	$ 268.861.717,60	45	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
La Jagua De Ibirico	Cesár	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	220400008604	SEDE ARGENTINA NORTE	Terminada		100,0%	$ 290.585.436,30	65	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
La Jagua De Ibirico	Cesár	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	220400000522	SEDE EL ZUMBADOR ALTO	Terminada		100,0%	$ 185.414.411,79	33	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
La Jagua De Ibirico	Cesár	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	220400000786	SEDE LA LIBERTAD	Terminada		100,0%	$ 169.669.932,02	64	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
La Jagua De Ibirico	Cesár	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	220400000051	SEDE LA TRINIDAD	Terminada		100,0%	$ 247.036.151,26	12	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
La Jagua De Ibirico	Cesár	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	220400008311	SEDE ARACORAIMA	Terminada		100,0%	$ 249.472.657,18	17	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Curumaní	Cesár	INSTITUCION EDUCATIVA EL MAMEY	220228017051	SEDE SAN RAFAEL	Terminada		100,0%	$ 201.227.215,58	8	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025

Curumaní	Cesár	INSTITUCION EDUCATIVA EL MAMEY	220228001325	SEDE LA CONQUISTA NO 2	Terminada	100,0%	$	332.991.930,56	11	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Curumaní	Cesár	CENTRO EDUCATIVO SAN PEDRO	220228017108	SEDE NUEVA IDEA Nø 2	Terminada	100,0%	$	248.657.045,81	13	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Curumaní	Cesár	INSTITUCION EDUCATIVA EL MAMEY	220228017426	SEDE PARAÕSO PORVENIR	Terminada	100,0%	$	281.908.802,08	11	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Curumaní	Cesár	INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN	220228017159	SEDE LA CAROLINA	Terminada	100,0%	$	229.511.811,27	15	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Curumaní	Cesár	INSTITUCION EDUCATIVA EL MAMEY	220228000019	SEDE CAMPO ALEGRE	Terminada	100,0%	$	541.283.325,28	11	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Chiriguaná	Cesár	CENTRO EDUCATIVO EL PARAISO	220178001191	SEDE ANIME	Terminada	100,0%	$	374.398.206,08	25	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Chiriguaná	Cesár	CENTRO EDUCATIVO EL PARAISO	220178000080	SEDE AGUA FRIA	Terminada	100,0%	$	437.695.859,50	50	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Chiriguaná	**Cesár**	**INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO**	**220178000152**	**SEDE ARENAS BLANCAS**	**Cancelada**	0,0%	$	5.324.480,00	**57**	**Sede Despriorizada, no es viable técnicamente, toda vez que se encuentra vigentes las pólizas de otro contrato ejecutado anteriormente.**
Chiriguaná	Cesár	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GERMAN CUELLO	220178001230	SEDE EL HATILLO	Terminada	100,0%	$	647.416.787,79	48	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Becerril	Cesár	CENTRO EDUCATIVO VILLA MATILDE	220045006964	SEDE EL CENTRO	Terminada	100,0%	$	176.308.319,93	80	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Becerril	Cesár	CENTRO EDUCATIVO VILLA MATILDE	220045000320	SEDE CAÑO RODRIGO	Terminada	100,0%	$	245.345.875,85	20	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Becerril	Cesár	CENTRO EDUCATIVO LA GUAJIRITA	220045000087	SEDE CASA BLANCA	Terminada	100,0%	$	195.828.582,49	24	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Becerril	Cesár	CENTRO EDUCATIVO VILLA MATILDE	220045000354	SEDE EL REMOLINO	Terminada	100,0%	$	206.754.105,54	15	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Becerril	Cesár	INSTITUCION EDUCATIVA ESTADOS UNIDOS	220045006778	SEDE LAS PIÑAS	Terminada	100,0%	$	147.836.914,35	15	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Curumaní	**Cesár**	**CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO**	**220400008523**	**SEDE LA CONQUISTA**	**Cancelada**	0,0%	$	-	**-**	**Sede Despriorizada, dado que la secretaría de educación informó que la sede será intervenida por otra entidad**
La Jagua De Ibirico	**Cesár**	**CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO**	**220400008736**	**SEDE COSTA RICA**	**Cancelada**	0,0%	$	5.324.480,00	**-**	**Sede Despriorizada, dado que la secretaría de educación informó que la sede será intervenida por otra entidad**
Curumaní	**Cesár**	**INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO PALLARES**	**220228000159**	**SEDE GUAIMARAL**	**Cancelada**	0,0%	$	-	**-**	**Sede Despriorizada, dado que la secretaría de educación informó que la sede será intervenida por otra entidad**
Chiriguaná	**Cesár**	**INSTITUCION EDUCATIVA LA AURORA**	**220178000993**	**SEDE LOS CERRAJONES**	**Cancelada**	0,0%	$	-	**-**	**Sede Despriorizada, el sede no es viable porque tiene medida cautelar.**
Curumaní	Cesár	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ISABEL	220228001210	SEDE LA REFORMA	Terminada	100,0%	$	260.199.003,07	8	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
La Jagua De Ibirico	Cesár	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO	220400008850	SEDE MANIZALES ALTO	Terminada	100,0%	$	135.460.644,34	26	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Valledupar	Valledupar	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ISIDRO LABRADOR	220001002783	LICEO SAN ISIDRO LABRADOR	Terminada	100,0%	$	341.042.825,37	358	Acta de liquidación de interentoría pendiente para el 01 de agosto de 2025
Valencia	Córdoba	IE MARIA AUXILIADORA	223855000490	MARIA AUXILIADORA	Terminada	100,0%	$	297.677.790,55	265	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE NUESTRA SRA. DEL CARMEN	223855000228	EL PITAL	Terminada	100,0%	$	319.568.308,55	8	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE CATALINO GULFO	323855000419	CATALINO GULFO	Terminada	100,0%	$	458.171.485,55	858	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE JOSE MARIA CARBONELL	123855000347	JOSE MARIA CARBONELL	Terminada	100,0%	$	410.725.482,55	1119	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE MANUELA BELTRAN	123855000088	MANUELA BELTRAN - SEDE PRINCIPAL	Terminada	100,0%	$	509.046.705,55	913	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE ANTONIA SANTOS	223855001607	ANTONIA SANTOS - SEDE PRINCIPAL	Terminada	100,0%	$	365.227.898,55	274	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE MATA DE MAIZ	223855000201	MATA DE MAIZ - SEDE PRINCIPAL	Terminada	100,0%	$	347.075.803,55	260	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE LAS NUBES	223855000147	CRUCES	Terminada	100,0%	$	326.938.526,55	131	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025

Valencia	Córdoba	IE MATA DE MAIZ	223855001321	BRILLANTE STA CLARA	Terminada	100,0%	$	357.003.849,55	157	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE ANTONIA SANTOS	223855001241	LOS ANGELES	Terminada	100,0%	$	275.878.690,55	60	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE VILLANUEVA	223855000350	TINAJONES	Terminada	100,0%	$	307.397.129,55	72	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	**Córdoba**	**IE MANUELA BELTRAN**	**223855000872**	**INCORA FARO**	**Cancelada**	0,0%	$	173.022.753,28	**0**	**despriorizada por reciente inversión del FFIE**
Valencia	Córdoba	IE ANTONIA SANTOS	223855000996	GUASIMO CENTRAL	Terminada	100,0%	$	320.739.224,55	36	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE ANTONIA SANTOS	223855001011	GUADUAL PIEDRA	Terminada	100,0%	$	451.621.455,55	32	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Valencia	Córdoba	IE MANUELA BELTRAN	223855800011	EL BONGO	Terminada	100,0%	$	293.405.351,55	32	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
San Pedro de Urabá	Antioquia	C.E.R. SAN PABLO APOSTOL	205665001033	SANTA ROSA	Terminada	100,0%	$	317.181.543,55	43	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
San Pedro de Urabá	Antioquia	I. E. R. ANTONIO NARIÑO	205665000975	EL PELAYITO	Terminada	100,0%	$	279.452.660,55	24	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
San Pedro de Urabá	Antioquia	IE CAMILO TORRES	105665000024	CAMILO TORRES	Terminada	100,0%	$	363.320.554,55	1377	Contrato de obra liquidado (acta liquidación firmada 03/04/2025) Contrato de interventoría liquidado 27 de junio de 2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	123807000581	IE LA INMACULADA	Terminada	100,0%	$	359.655.611,83	1268	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LOS MORALES	223807000330	IE LOS MORALES	Terminada	100,0%	$	290.634.678,61	684	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION	223807004092	CENT EDUC NVA UNION	Terminada	100,0%	$	186.829.356,92	505	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN	323807001608	IE JUNIN	Terminada	100,0%	$	654.977.045,38	1220	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVO ORIENTE	223807004521	CENT EDUC CAMPAMENTO	Terminada	100,0%	$	645.187.504,50	861	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO	223807004343	IE CAMPOBELLO	Terminada	100,0%	$	321.121.331,23	546	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA PRIMERO DE MAYO	223807000895	IE 1 DE MAYO	Terminada	100,0%	$	451.322.966,88	335	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LOS VOLCANES	223807000208	IE LOS VOLCANES	Terminada	100,0%	$	244.027.960,42	337	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA SANTA FE DE RALITO	223807000631	CENT EDUC RUR SANTA FE RALITO	Terminada	100,0%	$	453.588.410,90	205	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LAS DELICIAS	223807003487	ESC NVA LA PAZ	Terminada	100,0%	$	187.380.750,27	355	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLO NUEVO	223807000089	CENT EDUC PUEBLO NVO	Terminada	100,0%	$	373.566.490,00	192	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA CAMPOBELLO	223807000526	ESC NVA SANTA ANA	Terminada	100,0%	$	186.029.186,00	100	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA JUNIN	123807000912	CENT EDUC SAN JOSE	Terminada	100,0%	$	409.281.031,66	130	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION	223807003312	CENTRO EDUCATIVO LA OSSA	Terminada	100,0%	$	187.394.771,21	51	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CLEMENTE	223807002901	ESC NVA CAÑA FINA	Terminada	100,0%	$	192.463.930,87	33	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION	223807003266	ANTONIO NARIÑO	Terminada	100,0%	$	236.085.160,52	27	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA SAN CLEMENTE	223807002758	CENT EDUC TUIS TUIS ARRIBA	Terminada	100,0%	$	144.204.375,22	24	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA UNION	223807002821	ESC NVA ANTONIA SANTO	Terminada	100,0%	$	238.915.201,59	22	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	CENTRO EDUCATIVO KANYIDO	223807005153	CENT EDUC KOREDO	Terminada	100,0%	$	88.927.882,24	205	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA	223807002162	CENT EDUC LA ESMERALDA	Terminada	100,0%	$	251.260.469,21	331	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CARRIZOLA	223807001875	IE INMACULADA CARRIZOLA	Terminada	100,0%	$	642.316.633,92	220	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA EL PARAISO	123807000033	ESC URBANA MIXTA EL PARAISO	Terminada	100,0%	$	1.082.432.116,79	814	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025

Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA PALMIRA	223807001034	ESC NVA SAN RAFAEL	Terminada	100,0%	$	474.822.368,23	73	Contrato de obra liquidado con fecha 07-07-2025
La Tola	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO DE LA MAR	252390000099	SEDE 5 EL SECADERO	Ejecución	82,9%	$	218.291.037,77	5	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
La Tola	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA SOFONIAS YACUP	252250000391	SEDE 5 POIJA	Ejecución	86,8%	$	218.291.037,77	5	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
La Tola	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA Y AMBIENTAL ARCA DE NOE	252250000200	SEDE 2 GUILLERMO ZARAMA VILLOTAS	Ejecución	15,3%	$	218.291.037,77	245	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
La Tola	Nariño	CENTRO EDUCATIVO LAS TORRES	252250001001	CENTRO EDUCATIVO LAS TORRES	Ejecución	81,7%	$	218.291.037,77	7	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
La Tola	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PABLO DE LA MAR	252250000480	SEDE 4 EL PUEBLITO	Ejecución	82,0%	$	218.291.037,77	4	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
La Tola	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA SOFONIAS YACUP	252250000765	SEDE 4 NERETE	Ejecución	78,9%	$	218.291.037,77	70	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
Mosquera	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA COCAL DE LOS PAYANES	252473001062	SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROI	Ejecución	63,7%	$	218.291.037,77	160	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
Santa Bárbara	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD PUEBLITO	252696000203	SEDE 6 CHANZARA LAS PEÑAS	Ejecución	5,0%	$	218.291.037,77	38	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
Santa Bárbara	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOLEDAD PUEBLITO	252696000912	SEDE 11 LAS VARAS	Ejecución	8,1%	$	218.291.037,77	21	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
Santa Bárbara	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA RITA	252696001323	SEDE 9 LA PEÑITA	Ejecución	5,6%	$	218.291.037,77	12	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
Santa Bárbara	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA RITA	252696000661	SEDE 5 SANTA ROSA	Ejecución	9,2%	$	218.291.037,77	12	reprogramación presentada por la interventoría con ocasión a la adición a la interventoría y prorroga por 3 meses al contrato de obra
Santa Bárbara	**Nariño**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA RITA**	**252696000939**	**SEDE 14 DESPLAYADO**	**Cancelada**	**0,0%**	$	218.291.037,77	**12**	**Se despriorizaron las sedes en el comité técnico del 04 de julio de 2025 por Matricula Cero, posterior a la aprobación del Ministerio en comié de seguimiento**
Santa Bárbara	**Nariño**	**INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA RITA**	**252696001129**	**SEDE 10 SAN ANDRES**	**Cancelada**	**0,0%**	$	218.291.037,77	**12**	**Se despriorizaron las sedes en el comité técnico del 04 de julio de 2025 por Matricula Cero, posterior a la aprobación del Ministerio en comié de seguimiento por matricla cero**
Barbacoas	Nariño	I E I T AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA	252079002134	SEDE 13 CHIMBAGAL	Ejecución	11,6%	$	1.056.121.300,80	6	
Barbacoas	Nariño	I E I T AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA	252079001715	SEDE 11 GUIGUAY	Ejecución	9,9%	$	803.414.513,80	6	
Barbacoas	Nariño	I E I T AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA	252079001951	SEDE 12 HONDA RIO GUIZA	Ejecución	1,4%	$	338.971.940,80	9	
Barbacoas	Nariño	I E I T AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA	252079001588	SEDE 4 PAMBIL	Ejecución	0,7%	$	677.061.120,80	10	
Barbacoas	Nariño	I E I T AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA	252079001669	SEDE 7 GUELMAMBI CARAÑO	Ejecución	15,6%	$	677.061.120,80	5	
Barbacoas	Nariño	I E I T AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA	252079001693	SEDE 10 EL TIGRILLO	Ejecución	10,2%	$	929.767.907,80	7	
Barbacoas	Nariño	I E I T AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA	252079800014	CENTRO EDUCATIVO ALTO GUELMAMBI	Terminada	100,0%	$	598.706.410,28	78	
Barbacoas	Nariño	C E DE VEGAS	252079001898	CENTRO EDUCATIVO CHAGUI - SEDE PRI	Ejecución	13,3%	$	622.426.209,80	67	
Barbacoas	Nariño	I E I T AGROAMBIENTAL BILINGÜE AWA	252079800031	SEDE 3 ANZAMAPI	Terminada	100,0%	$	469.671.916,88	17	
Barbacoas	Nariño	C E I AWÁ LOS TELEMBIES	252079800049	SEDE 5 GUAYABAL	Ejecución	0,9%	$	532.120.940,80	15	
Barbacoas	Nariño	C E I AWÁ LOS TELEMBIES	252079800022	SEDE 4 ALTO PALI	Ejecución	0,9%	$	532.120.940,80	16	
Barbacoas	Nariño	C E I AWÁ LOS TELEMBIES	252079001731	SEDE 3 PIPALTA PALBI	Ejecución	0,9%	$	532.120.940,80	18	

Barbacoas	Nariño	C E AWA EL GRAN SABALO	252079002118	SEDE 8 EL PLAYÓN	Ejecución	11,4%	$ 803.414.513,80	14	
Barbacoas	Nariño	C E DE VEGAS	252079001880	CENTRO EDUCATIVO SAN ANTONIO - SEI	Ejecución	15,2%	$ 500.166.369,80	9	
Barbacoas	Nariño	C E DE VEGAS	252079001600	CENTRO EDUCATIVO CANDILLAS	Terminada	100,0%	$ 340.623.965,25	17	
Puerto Asis	Putumayo	IER LA LIBERTAD	286568003285	SEDE VILLAMARQUEZA	Ejecución	4,8%	$ 88.358.830,67	42	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
Puerto Asis	Putumayo	IER LA LIBERTAD	286568004087	SAMARIA	Ejecución	1,2%	$ 337.778.973,07	15	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
Puerto Asis	Putumayo	IER LA LIBERTAD	286568004788	ESC RUR MIX LA MANUELA (Manuelita)	Ejecución	3,8%	$ 109.408.132,72	42	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
Puerto Asis	Putumayo	CER COCAYÁ	286568005130	ESC RUR MIX PUERTO UNION	Ejecución	2,6%	$ 161.585.804,49	38	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
Puerto Asis	Putumayo	IER LA LIBERTAD	286568000286	SAN GERARDO	Ejecución	2,2%	$ 192.031.783,03	38	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
Puerto Asis	Putumayo	IER LA LIBERTAD	286568004419	ESC RUR MIX LA ESMERALDA PTYO UNO	Ejecución	0,9%	$ 438.022.404,64	34	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
Puerto Asis	Putumayo	CER COCAYÁ	286568003234	ESC RUR MIX EL RECUERDO PEÑAZORA	Ejecución	3,1%	$ 133.421.655,38	10	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
Puerto Asis	Putumayo	CER TETEYE	286568003099	CER TETEYE - SEDE PRINCIPAL	Ejecución	1,6%	$ 258.536.656,36	93	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
Puerto Asis	Putumayo	IER PUERTO BELLO	286568003871	ESC RUR MIX ALTO PIÑUÑA BLANCO	Ejecución	3,7%	$ 113.385.555,96	34	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
Puerto Asis	Putumayo	CER COCAYÁ	286568002670	ESC RUR MIX LA DANTA	Ejecución	4,5%	$ 93.424.640,29	15	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
Valle Guamez	Putumayo	CENT EDUC RUR LAS MALVINAS	286568005873	ESC RUR MIX LA YET	Ejecución	70,6%	$ 206.732.161,05	65	En ejecución de actividades proyectadas y contempladas en la etapa de diagnóstico.
Valle Guamez	Putumayo	I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA	286865003049	ERM COSTA RICA	Ejecución	100,0%	$ 43.945.567,23	10	En ejecución de actividades proyectadas y contempladas en la etapa de diagnóstico.
Valle Guamez	Putumayo	CENT EDUC RUR LAS MALVINAS	286568004591	ESC RUR MIX MOGAMBO	Ejecución	86,5%	$ 43.341.429,36	6	En ejecución de actividades proyectadas y contempladas en la etapa de diagnóstico.
Valle Guamez	Putumayo	I.E.R. MARAVELEZ	286865004304	ESC RUR MIX LAS PAVAS	Ejecución	9,1%	$ 47.248.544,95	8	En ejecución de actividades proyectadas y contempladas en la etapa de diagnóstico.
Valle Guamez	Putumayo	I.E.R. JOSE ASUNCION SILVA	286865004274	ESC RUR MIX ALTO GUISIA	Ejecución	3,1%	$ 134.549.246,32	11	Se solicita al contratista implementar un plan de acción para el inicio de estas sedes ya que hasta el momento solamente se cuenta con la socialización de las intervenciones.
San Miguel	Putumayo	I.E.R. AGUA CLARA	286865003120	ESC RUR MIX EL ESPINAL	Ejecución	70,3%	$ 456.126.278,61	22	En ejecución de actividades proyectadas y contempladas en la etapa de diagnóstico.
San Miguel	Putumayo	I.E.R. EL SÁBALO	286757003938	ESC RUR MIX SAN LORENZO	Ejecución	3,3%	$ 126.101.013,43	9	Sede próxima a se entregada, se trabaja en detalles para su recibo a satisfacción por parte del RL y la ETC.
San Miguel	Putumayo	I.E.R. EL SÁBALO	286757000289	ESC RUR MIX LA CABAÑA	Ejecución	70,5%	$ 261.047.663,75	14	Sede próxima a se entregada, se trabaja en detalles para su recibo a satisfacción por parte del RL y la ETC.
San Miguel	Putumayo	I.E.R. AGUA CLARA	286865002816	ESC RUR MIX SANTA MARTHA	Ejecución	72,5%	$ 232.047.238,02	14	Sede próxima a se entregada, se trabaja en detalles para su recibo a satisfacción por parte del RL y la ETC.
Puerto Caicedo	Putumayo	IE JOSE ANTONIO GALAN	286568002165	PREESC PTO CAICEDO	Ejecución	65,4%	$ 358.100.548,69	101	En ejecución de actividades proyectadas y contempladas en la etapa de diagnóstico.
Puerto Caicedo	Putumayo	IE JOSE ANTONIO GALAN	286568000146	ESC URB MIX PTO CAICEDO	Ejecución	0,6%	$ 710.947.587,90	453	Sede próxima a se entregada, se trabaja en detalles para su recibo a satisfacción por parte del RL y la ETC.
Tibú	Norte de Santande	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO LA LLANA	254810002206	SEDE LA VALERA	Terminada	100,0%	$ 330.365.653,34	24	
Tibú	Norte de Santande	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA SERPENTINA	254810000696	SEDE LA SERPENTINA - SEDE PRINCIPAL	Terminada	100,0%	$ 222.164.320,57	360	

Tibú	Norte de Santande	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO BARCO	254810000670	SEDE PUERTO BARCO	Terminada	100,0%	$	222.918.964,10	200	
Tibú	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL BERTRANIA	254810000386	CER BERTRANIA - SEDE PRINCIPAL	Terminada	100,0%	$	268.307.883,78	300	
Tibú	Norte de Santande	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	254810001013	CER KILOMETRO 15 - SEDE PRINCIPAL	Terminada	100,0%	$	372.976.338,26	280	
Tibú	Norte de Santande	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	254810000351	SEDE CAMPO GILES	Terminada	100,0%	$	383.827.041,72	220	
Tibú	Norte de Santande	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL KILOMETRO 15	254810001251	SEDE LLANO GRANDE	Terminada	100,0%	$	328.118.919,67	160	
Tibú	Norte de Santande	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL TRES BOCAS	254810000301	SEDE LA CUATRO	Terminada	100,0%	$	322.783.142,26	140	
Tibú	Norte de Santande	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PUERTO BARCO	254810002249	SEDE MI PEQUEÑO MUNDO	Terminada	100,0%	$	248.617.575,44	15	
El Tarra	Norte de Santande	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ORU BAJO	254810000106	SEDE ORU BAJO	Terminada	100,0%	$	433.611.677,35	320	
El Tarra	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA	254670000763	SEDE LAS TORRES	Terminada	100,0%	$	277.376.072,14	51	
El Tarra	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA	254250800047	SEDE LA ESPERANZA	Terminada	100,0%	$	247.446.913,91	70	
El Tarra	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA	254250000245	SEDE KILOMETRO 92 VISTA HERMOSA	Terminada	100,0%	$	216.838.210,50	110	
El Tarra	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL DOMINGO SAVIO	254250800055	SEDE BRISAS DEL TARRA	Terminada	100,0%	$	160.870.025,45	19	
El Tarra	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL DOMINGO SAVIO	254670000992	SEDE LOS BALSOS	Terminada	100,0%	$	219.565.363,70	13	
El Tarra	**Norte de Santande**	**CENTRO EDUCATIVO RURAL BRACITOS**	**254250000130**	SEDE SAN LUIS DEL ESPEJO	**Cancelada**	100,0%	$	110.584.487,30	**14**	**Se desprioriza la sede en comité No 94 del 08 de abril de 2025**
Convención	Norte de Santande	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	254206001030	CENT EDUC RUR HONDURAS MOTILONIA	Ejecución	0,0%	$	341.025.330,86	322	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
Convención	Norte de Santande	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	254206001161	SEDE SANTAFE DE HONDURAS	Ejecución	13,3%	$	341.025.330,86	34	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
Convención	Norte de Santande	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL HONDURAS MOTILONIA	254206001366	SEDE AGUAS LIMPIAS	Ejecución	1,6%	$	341.025.330,86	10	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
Convención	Norte de Santande	INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR	154206000021	NORMAL SUPERIOR	Ejecución	3,5%	$	341.025.330,86	566	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
El Carmen	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL CHAMIZON	254245001080	SEDE LA ESPERANZA	Ejecución	1,6%	$	341.025.330,86	70	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
Convención	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL GUAMAL	254206000220	SEDE BRISAS SANTANDEREANAS	Ejecución	1,1%	$	341.025.330,86	38	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
Convención	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL GUAMAL	254206000149	CENT EDUC RUR EL GUAMAL	Ejecución	14,7%	$	341.025.330,86	179	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
El Carmen	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	254245000105	SEDE LIMONAL	Ejecución	3,4%	$	341.025.330,86	6	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
El Carmen	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	254245000598	SEDE TABACAL	Ejecución	1,6%	$	341.025.330,86	9	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
El Carmen	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	254245001209	SEDE LA AGUADA	Ejecución	1,6%	$	341.025.330,86	4	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
El Carmen	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL SUL	254245000571	SEDE ASTILLEROS	Ejecución	0,6%	$	341.025.330,86	12	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra

Convención	Norte de Santande	INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO GUILLERMO QUINTERO CALDERON	154206000641	SEDE NO 2 JOSE MARIA ESTEVEZ COTE	Ejecución	19,4%	$	341.025.330,86	37	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
Convención	Norte de Santande	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS	254206000815	SEDE CARTAGENA	Ejecución	0,8%	$	341.025.330,86	128	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
Convención	Norte de Santande	INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO CARREÑO LEMUS	254206000351	SEDE GRAMALES	Ejecución	0,8%	$	341.025.330,86	49	Se prorroga contrato de obra e interventoría el 19 de septiembre de por dos meses y se adiciona 60 millones asumidos por contratista de obra
Teorama	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL LOS MESONES	254800000736	SEDE LOS MESONES	Ejecución	1,2%	$	403.117.421,28	151	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
Teorama	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	254800000108	CENT EDUC RUR EL FARACHE	Ejecución	1,3%	$	403.117.421,36	30	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
Teorama	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	254800000167	SEDE PULPITOS	Ejecución	15,4%	$	403.117.421,36	5	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
Teorama	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	254800001112	SEDE JABONERA	Ejecución	33,0%	$	403.117.421,36	8	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
Teorama	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL FARACHE	254800000752	SEDE MARGARITAS	Ejecución	14,8%	$	403.117.421,36	5	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
San Calixto	Norte de Santande	COL CAYETANO FRANCO PINZON	154670000025	COL CAYETANO FRANCO PINZON	Ejecución	0,8%	$	403.117.421,36	296	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
San Calixto	Norte de Santande	C.E.R. BALSAMINA	254670000895	SEDE QUEBRADA AZUL	Ejecución	16,0%	$	403.117.421,36	33	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
San Calixto	Norte de Santande	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA	254670000941	SEDE SAN JOSE DEL VAJIAL	Ejecución	1,3%	$	403.117.421,36	8	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
San Calixto	Norte de Santande	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SANTA CATALINA	254670001298	SEDE EL CARACOL	Ejecución	1,3%	$	403.117.421,36	19	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
Hacarí	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN SEBASTIAN	254344000371	SEDE EL CERRO	Ejecución	72,5%	$	403.117.421,36	14	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
Hacarí	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN SEBASTIAN	254344000290	CENT EDUC RUR SAN SEBASTIAN	Ejecución	1,3%	$	403.117.421,36	160	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
Hacarí	Norte de Santande	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS	254344001083	SEDE LA ESTACION	Ejecución	1,3%	$	403.117.421,36	31	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
Hacarí	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TARRA	254344000141	SEDE EL VALLE	Ejecución	17,3%	$	403.117.421,36	17	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
Hacarí	Norte de Santande	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MESITAS	254344000877	SEDE EL LIBANO	Ejecución	1,3%	$	403.117.421,36	10	Se Prorroga por 2 meses cto de obra e interventoria el 14/08/2025 y se adiciona 66.394.858 a interventoria asumida por comtntrasita
Segovia	**Antioquia**	**I. E. SANTO DOMINGO SAVIO**	**205736800056**	**CER MONTEFRIO ALTO**	**Cancelada**	0,0%	$	22.964.188,75	**2**	**Se desprioriza por matricula 0 los estudiantes reciben clase virtual**
Segovia	**Antioquia**	**I. E. R. FRAY MARTIN DE PORRES**	**205736000513**	**E R I MATA**	**Cancelada**	0,0%	$	-	**0**	**Cancelada - la SECRETARIA DE EDUCACION EMITE MATRICULA CERO de al sede y el MEN autoriza la cancelacion de la sede**
Segovia	Antioquia	I. E. LIBORIO BATALLER	205736800021	CER HELECHALES DOS	Terminada	100,0%	$	423.832.953,75	9	
Segovia	Antioquia	I. E. LIBORIO BATALLER	205736000629	CER CUTURU MEDIO	Terminada	100,0%	$	300.438.001,75	26	
Nechí	Antioquia	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CONCHA	205495000151	I E R LA CONCHA	Terminada	100,0%	$	712.988.597,75	467	
Nechí	Antioquia	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CONCHA	205495000550	E R I PUERTO ASTILLA	Terminada	100,0%	$	404.318.730,75	76	
Nechí	Antioquia	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LA CONCHA	205495000525	E R I LA POMPOSA	Terminada	100,0%	$	401.440.496,75	28	
Nechí	Antioquia	I.E.R TRINIDAD ARRIBA	205495000975	C E R ALTO SAN PEDRO	Terminada	100,0%	$	346.071.234,75	18	
Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ZARAGOCITA	205495000665	C E R LAS VICTORIAS	Terminada	100,0%	$	506.140.423,75	55	
Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ZARAGOCITA	205495000878	C E R PLAN BONITO	Terminada	100,0%	$	354.866.660,75	60	
Nechí	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL ZARAGOCITA	205495001106	C E R RAFAEL NUÑEZ	Terminada	100,0%	$	333.779.464,75	18	
Nechí	Antioquia	I.E.R TRINIDAD ARRIBA	405495000010	C E R SANTA ELENA	Terminada	100,0%	$	382.603.985,75	14	
Segovia	Antioquia	I. E. R. FRAY MARTIN DE PORRES	205736000203	PUERTO CALAVERA	Terminada	100,0%	$	921.990.973,75	102	

Quinchía	Risaralda	IE MIRACAMPOS	266594000552	SE BATERO	Terminada	100,0%	$ 367.809.851,87	50	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Quinchía	Risaralda	IE INSTITUTO INTEGRADO IRRA	266594000498	SE EL CALLAO	Terminada	100,0%	$ 164.345.923,00	30	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Quinchía	Risaralda	IE NUCLEO ESCOLAR RURAL	266594000676	SE VILLA NUEVA	Terminada	100,0%	$ 154.597.608,97	10	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Apía	Risaralda	CENTRO EDUCATIVO JORDANIA	266045000354	SE PAVERO	Terminada	100,0%	$ 233.188.810,93	13	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Guática	Risaralda	IE SAN CLEMENTE	266318000077	SE MARCO FIDEL SUAREZ	Terminada	100,0%	$ 248.977.099,19	40	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Marsella	Risaralda	CENTRO EDUCATIVO WAARRARA DEE	266440000517	CENTRO EDUCATIVO WARRARE DEE SUI	Terminada	100,0%	$ 923.332.569,96	228	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Marsella	Risaralda	CENTRO EDUCATIVO WAARRARA DEE	266440000525	SE LA BORDADITA	Terminada	100,0%	$ 440.211.222,80	56	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Marsella	Risaralda	CENTRO EDUCATIVO WAARRARA DEE	266440800018	SE KURMADO	Terminada	100,0%	$ 505.020.349,07	60	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Mistrató	Risaralda	IE INSTITUTO INDIGENA PUREMBARA	266456000355	SE PUERTO DE ORO	Terminada	100,0%	$ 995.308.018,24	86	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Mistrató	Risaralda	IE INSTITUTO INDIGENA PUREMBARA	266456800017	CAIMITO	Terminada	100,0%	$ 1.037.938.091,69	33	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Mistrató	Risaralda	IE INSTITUTO INDIGENA PUREMBARA	266456000754	SE CURRUMAY MEDIO	Terminada	100,0%	$ 692.106.611,74	67	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Mistrató	Risaralda	IE INSTITUTO INDIGENA PUREMBARA	266456000771	SE EMBORDO	Terminada	100,0%	$ 692.258.210,15	31	Los documentos de obra que permiten en inicio del proceso de liquidación serán radicados el 30 de septiembre de 2025.
Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE CARASUA	244847800088	KAYUSIRAMANA	Ejecución	2,5%	$ 680.964.228,51	70	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ	244847800277	ATAPUT	Ejecución	56,6%	$ 440.045.353,21	42	
Uribia	Uribia	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO DE SIAPANA	244847800098	SHURRULEPU	Ejecución	2,5%	$ 690.095.472,85	49	
Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE CARASUA	244847800081	CASTILLETE	Ejecución	1,4%	$ 440.045.353,21	120	
Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE CARASUA	244847800084	ICHIPA	Ejecución	2,5%	$ 680.964.228,57	50	
Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE CARASUA	244847800094	PUNTA ESPADA	Ejecución	3,0%	$ 440.045.353,21	33	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH	244847800141	SIERRA MAESTRA	Ejecución	2,5%	$ 986.758.308,62	77	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO DE NAZARETH	244847800573	GUARERPA	Ejecución	2,5%	$ 986.758.309,52	100	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ	244847800293	JUYAMANA	Ejecución	58,4%	$ 690.095.475,82	40	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ	244847800275	AMUSICHIWOU	Ejecución	3,0%	$ 440.045.353,21	64	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ	244847800301	PISHICHON	Ejecución	51,4%	$ 682.332.404,50	78	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ	244847800300	PIAZAPA	Ejecución	4,0%	$ 440.045.353,21	63	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ	244847800281	CHIPANA	Ejecución	3,0%	$ 440.045.353,21	45	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL ISIDRO IBARRA FERNANDEZ	244847800620	AIPAIMANA	Ejecución	63,3%	$ 680.964.231,54	120	

Uribia	Uribia	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INDIGENA PUAY	244847001379	MATIA	Ejecución	39,5%	$ 686.585.269,00	74	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA EL EDÉN	244847800135	TEQUENDAMA	Ejecución	54,4%	$ 686.585.269,00	105	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO DE LA VELA	244847800134	SAN MARTIN	Ejecución	2,5%	$ 685.901.181,04	15	
Uribia	Uribia	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL PUERTO NUEVO	244847800123	MALEEN	Ejecución	74,3%	$ 490.266.127,62	97	
Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL UCHITU	244847800119	KALERRUWO	Ejecución	3,0%	$ 440.045.353,21	44	
Uribia	Uribia	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL INTERNADO INDÍGENA EL EDÉN	244847800104	ATACHONKO	Ejecución	74,4%	$ 440.045.353,21	17	
Uribia	Uribia	CENTRO ETNOEDUCATIVO INTEGRAL RURAL DE CARASUA	244847800077	CARRAIPIA	Ejecución	0,9%	$ 690.095.478,84	85	
Dibulla	La Guajira	PINEDO BARROS	244090000124	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL MIGUEL	Terminada	100,0%	$ 819.241.560,14	630	
Dibulla	La Guajira	ANTONIO MINDIOLA ROBLES	244001002879	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL ADOLF(	Terminada	100,0%	$ 548.827.837,49	685	
Dibulla	La Guajira	RURAL AGROPECUARIA DE MINGUEO	244001000515	ESCUELA RURAL SIETE DE JUNIO	Terminada	100,0%	$ 247.875.774,66	474	
Dibulla	La Guajira	ANTONIO DE PALOMINO	244090003069	ESCUELA RURAL ESCUELA NUEVA	Terminada	100,0%	$ 925.808.127,45	423	
Dibulla	La Guajira	AIRES	244001001678	CENTRO EDUCATIVO RURAL BUENOS AII	Terminada	100,0%	$ 307.690.608,07	240	
Dibulla	La Guajira	CENTRO EDUCATIVO DE RIO ANCHO	244001000914	CENTRO EDUCATIVO RURAL DE RIO ANC	Terminada	100,0%	$ 797.261.391,19	230	
Maicao	**Maicao**	**INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9**	**244430004057**	**ULAIN**	**Cancelada**	0,0%	$ 172.343.012,09	**0**	**No se pudo entrar x falta de seguridad**
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	244430004413	YARALIWOU	Terminada	100,0%	$ 833.877.582,54	105	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	244430003964	MACHETSUMANA	Terminada	100,0%	$ 41.274.401,46	25	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	244430004693	WARRALARAIN	Terminada	100,0%	$ 495.434.435,62	70	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	244430004049	MONTAÑITA	Terminada	100,0%	$ 64.380.254,13	50	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	244430004219	TOOLOMANA	Terminada	100,0%	$ 24.388.542,08	25	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	244430004031	RUANAMANA	Terminada	100,0%	$ 91.376.382,78	50	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	244430003956	WARUTTAMANA	Terminada	100,0%	$ 39.865.696,08	25	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	244430003808	KALINCHON	Terminada	100,0%	$ 307.167.226,50	35	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	244430003921	KULIINATCHI	Terminada	100,0%	$ 495.434.435,62	70	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	244430004065	YOUYOUPANA	Terminada	100,0%	$ 568.308.939,32	22	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	244430004227	URUWAMANA	Terminada	100,0%	$ 26.470.555,95	36	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	244430004707	JEPIRRALUT	Terminada	100,0%	$ 307.167.226,50	35	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 7	244430003816	EMÏïJ&LEE (SAN LUIS)	Terminada	100,0%	$ 451.000.054,22	35	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	244430004022	PARAGUANA	Terminada	100,0%	$ 164.089.443,65	22	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	244430003158	USHURU	Terminada	100,0%	$ 424.476.111,60	25	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 4	244430003530	JEPEIN	Terminada	100,0%	$ 495.434.435,62	70	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 4	244430800066	EKIMAANA	Terminada	100,0%	$ 495.434.435,62	70	
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	244430004294	ICHIIMAANA	Terminada	100,0%	$ 514.153.378,80	70	
Maicao	**Maicao**	**INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6**	**244430003930**	**KASPOLIMANA**	**Cancelada**	0,0%	$ 641.498.989,43	**0**	**en G7 Aulas Móviles (evitar doble intervencíon)**
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	244430003727	KOUSHALAIN	Terminada	100,0%	$ 307.167.226,50	35	
Uribe	Meta	CENTRO EDUCATIVO EL DIVISO	250370000138	SEDE EL PARAISO	Ejecución	35,0%	$ 89.353.875,38	57	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
San Vicente del Caguán	Caquetá	I.E. R. LOS POZOS	218753002834	LA AURORA	Ejecución	45,4%	$ 255.618.687,83	16	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA EL EDEN	295001000098	PUERTO NARE	Ejecución	97,3%	$ 288.488.817,77	52	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN	295001003861	INSTITUCION EDUCATIVA TOMACHIPAN	Ejecución	7,0%	$ 1.205.192.160,39	44	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA CERRO AZUL	295001004174	IE CERRO AZUL - SEDE PRINCIPAL	Ejecución	95,8%	$ 224.392.097,61	61	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
San José Del Guaviare	Guaviare	NSTITUCION EDUCATIVA EL RETIRO	295001001281	IE EL RETIRO - SEDE PRINCIPAL	Ejecución	99,8%	$ 115.759.468,74	200	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
San José Del Guaviare	Guaviare	I.E. CHARRAS	295001002741	IE CHARRAS - SEDE PRINCIPAL	Ejecución	98,2%	$ 477.633.991,18	120	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
San José Del Guaviare	Guaviare	I.E. SANTA HELENA	295001004671	PUERTO FLORES	Ejecución	30,4%	$ 111.624.120,16	21	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
San José Del Guaviare	Guaviare	I.E. CHARRAS	295001002597	CAÑO DANTA	Ejecución	98,9%	$ 210.897.776,46	11	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
San José Del Guaviare	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA TRIUNFO II	295001002449	IE TRIUNFO II - SEDE PRINCIPAL	Ejecución	98,9%	$ 770.640.294,26	107	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
El Retorno	Guaviare	C.E. INDÍGENA EL MORICHAL VIEJO	295025000196	CERRO COCUY	Ejecución	46,7%	$ 243.480.857,81	10	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
El Retorno	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA CERRITOS	295105001428	ESCUELA RURAL MIXTA ALTO JORDAN	Ejecución	86,0%	$ 328.861.464,09	11	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
El Retorno	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA LA LIBERTAD	295025000056	CAÑO RAYA BAJA	Ejecución	93,6%	$ 239.519.086,86	12	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
Calamar	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA LA CRISTALINA	295105001622	TERMALES	Ejecución	15,6%	$ 80.628.846,28	4	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
Calamar	Guaviare	I.E. CARLOS MAURO HOYOS	295105001673	CAÑO SENDA	Ejecución	95,9%	$ 268.892.494,42	20	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra
Calamar	Guaviare	INSTITUCION EDUCATIVA LAS DAMAS	295105000847	DIAMANTE UNO	Ejecución	99,0%	$ 408.613.882,74	11	la interventoria 60 millones asumidos por contratista de obra

Buenaventura	Buenaventura	I.E. ANTONIO NARIÑO	176109011364	SEDE LA NUEVA COLOMBIA.	Cancelada	2,6%	$	295.987.397,20	74	vez, que la JAC no permitió la ejecución de las obras. Por tal
Buenaventura	Buenaventura	I.E. ATAN.ASIO GIRARDOT	276109001266	SEDE ATANASIO GIRARDOT.	Terminada	100,0%	$	221.699.773,60	545	
Buenaventura	Buenaventura	I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS	276109001401	SEDE LA GRAN COLOMBIA.	Terminada	100,0%	$	367.607.241,60	172	
Buenaventura	Buenaventura	I.E. FRANCISCO JAVIER CISNEROS .	276109800011	SEDE HÉCTOR EPALZA QUINTERO	Terminada	100,0%	$	379.755.953,60	154	
Buenaventura	Buenaventura	CÓRDOBA	276109005806	SEDE JOSÉ MARÍA CÓRDOBA.	Terminada	100,0%	$	755.899.522,60	403	
Buenaventura	Buenaventura	INSTITUCIÓN EDUCATIVA WASPIEN	476109007786	SEDE SAN JUAN BAUTISTA.	Ejecución	81,3%	$	566.989.145,28	215	materiales de construcción _Se prorroga el 19 de septiembre de
Buenaventura	Buenaventura	I.E. JAIME ROOCK	276109000341	SEDE JAIME ROOCK.	Terminada	100,0%	$	394.350.199,28	56	materiales de construcción
Buenaventura	Buenaventura	I.E. JOSÉ MARÍA CÓRDOBA	276109000014	SEDE SAN CIPRIANO.	Terminada	100,0%	$	177.418.274,60	80	
Buenaventura	Buenaventura	I.E. JOSÉ RAMÓN BEJARANO	176109007421	SEDE LA COMUNA.	Terminada	100,0%	$	286.870.198,60	125	
Buenaventura	Buenaventura	I.E. NONAM	276109008571	SEDE SANTA ROSA DE GUAYACÁN.	Ejecución	85,4%	$	355.896.418,28	32	materiales de construcción _Se prorroga el 19 de septiembre de
Buenaventura	Buenaventura	I.E. NONAM	276109008589	SEDE NONAM.	Ejecución	99,0%	$	458.557.810,28	333	materiales de construcción _Se prorroga el 19 de septiembre de
Buenaventura	Buenaventura	I.E. SIMÓN BOLÍVAR	176109004023	SEDE GRANADINOS.	Terminada	100,0%	$	546.132.026,60	773	
Buenaventura	Buenaventura	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	276109001029	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	Ejecución	75,4%	$	492.749.510,28	66	materiales de construcción _Se prorroga el 19 de septiembre de
Buenaventura	Buenaventura	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	276109001053	SANTA FILOMENA	Terminada	100,0%	$	234.153.904,06	18	personal de obra
Buenaventura	Buenaventura	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	276109010444	SANTA LUCIA DE TIMBA	Terminada	100,0%	$	244.030.375,00	11	
Buenaventura	Buenaventura	I.E. ANTONIO NARIÑO	176109005666	SEDE PRINCIPAL ANTONIO NARIÑO	Terminada	100,0%	$	364.656.467,20	0	
Buenaventura	Buenaventura	IE SAN PEDRO CLAVER	276109004648	SEDE PRINCIPAL SAN PEDRO CLAVER	Ejecución	16,6%	$	1.151.544.277,98	0	materiales de construcción _Se prorroga el 19 de septiembre de
Pueblo rico	Risaralda	CHAMI	266572800050	BIDUA JAIDE	Terminada	100,0%	$	505.127.598,95	43	
Pueblo rico	Risaralda	CHAMI	266572800076	PUERTO LETICIA	Terminada	100,0%	$	710.158.873,35	22	
Pueblo rico	Risaralda	CHAMI	266572800084	LA PECERA	Terminada	100,0%	$	522.040.094,90	27	
Pueblo rico	Risaralda	CHAMI	266572001423	BAJO SANJUAN	Terminada	100,0%	$	998.625.458,73	123	
Pueblo rico	Risaralda	CHAMI	266572001181	BAKORY BAJO PALMAR	Terminada	100,0%	$	643.911.162,99	18	
Pueblo rico	Risaralda	CHAMI	266572001172	SANTA RITA	Terminada	100,0%	$	512.619.072,25	81	
Pueblo rico	Risaralda	CHAMI	266572800008	LA PUNTA	Terminada	100,0%	$	675.402.305,15	403	
Pueblo rico	Risaralda	CHAMI	266572800068	CAÑAVERAL	Terminada	100,0%	$	530.224.524,79	34	
Pueblo rico	Risaralda	IE INTERCULTURAL DOKABU	266572800106	CHIFA	Terminada	100,0%	$	515.579.840,53	17	
Pueblo rico	Risaralda	IE DACHI DADA KERA	266572800024	DOKABUSITO	Terminada	100,0%	$	519.249.393,36	106	
Pueblo rico	Risaralda	IE INTERCULTURAL DOKABU	266572001024	JITOCHAKE	Terminada	100,0%	$	764.425.767,90	124	
Mistrató	Risaralda	IE INSTITUTO INDIGENA PUREMBARA	266456800025	VIDUA ALTA	Terminada	100,0%	$	942.324.723,94	29	
Argelia	Cauca	CENTRO EDUCATIVO LA PRIMAVERA	219050000089	LA PRIMAVERA (sede principal)	Terminada	100,0%	$	508.864.898,20	122	de septiembre.
Balboa	Cauca	C.E. CAMPO BELLO ALTO	219075000164	CAMPO BELLO ALTO	Terminada	100,0%	$	457.661.782,20	35	N/A
El Tambo	Cauca	I.E. LA PAZ	219256000743	LA PAZ (sede principal)	Terminada	100,0%	$	470.441.452,20	164	N/A
Lopez (Micay)	Cauca	I.E. PABLO VI	319418000011	PABLO VI (SEDE PRINCIPAL)	Terminada	100,0%	$	499.772.153,20	509	N/A
Roberto Payán(San Jos	Nariño	LAJAS	252621000224	SEDE 11 FATIMA	Terminada	100,0%	$	400.130.870,20	28	N/A
Buenos Aires	Cauca	I.E. MAZAMORRERO	219110000458	MAZAMORRERO (sede principal)	Terminada	100,0%	$	554.641.241,36	138	Sede Entregada
Puerto Tejada	Cauca	I.E. SAN PEDRO CLAVER	119573000673	SAN PEDRO CLAVER (sede principal)	Terminada	100,0%	$	218.319.541,64	1126	Sede Entregada
Santander De Quilichao	Cauca	VELASCO	119698001698	LICEO LIMBANIA VELASCO (sede principal)	Terminada	100,0%	$	1.278.365.278,77	1108	Sede Entregada
Suárez	Cauca	SATH FXINXI DXI´J	219780000149	CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO UNION	Terminada	100,0%	$	559.251.371,89	226	Sede Entregada
Bajo Baudó	Chocó	VIRUDO	227077000245	IE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE VIF	Terminada	100,0%	$	313.628.709,42	372	Sede Entregada
Buenaventura	Buenaventura	JAIME ROOCK	276109008368	SAGRADO CORAZON DE JESUS	Terminada	100,0%	$	196.261.549,32	66	Sede Entregada
Florida	Valle Del Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA LAS AMERICAS	176275000010	INSTITUTO LAS AMERICAS	Terminada	100,0%	$	510.650.194,74	1685	Sede Entregada
Bojayá	Chocó	IE CESAR CONTO	227099000095	SEDE LA BOBA	Ejecución	34,3%	$	293.328.838,37	7	actividades debido a que la ETC solicitó el reemplazo de la Sede,
Medio Atrato	Chocó	CE BOCA DE BEBARA	227001000599	SEDE VILLA DE BEBARA	Ejecución	17,7%	$	480.467.370,62	38	afectaciones de orden público, alteraciones climaticas inusuales y
Quibdó	Quibdó	IE ISAAC RODRIGUEZ MARTINEZ	127001017802	SEDE MIS ESFUERZOS	Ejecución	62,3%	$	360.567.648,35	164	presenta un retraso debido a afectaciones de orden público,
Río Quito	Chocó	IE ANTONIO ANGLES DE SAN ISIDRO	227001003431	SEDE LA SOLEDAD	Ejecución	34,6%	$	402.902.036,38	82	Se iniciaron actividades de intervención de cubierta
Bajo Baudó	Chocó	C.E. SAN PEDRO CLAVER	227077001675	C.E. SAN PEDRO CLAVER SEDE PRINCIP/	Ejecución	10,1%	$	799.283.621,28	115	afectaciones de orden público, alteraciones climaticas inusuales y
Condoto	Chocó	IE MARIA AUXILIADORA	127205001204	SEDE ARCO	Terminada	100,0%	$	608.902.033,00	407	Sede entregada
Istmina	Chocó	IE PUERTO SALAZAR	227361001537	IE PUERTO SALAZAR - SEDE PRINCIPAL	Terminada	100,0%	$	476.554.683,00	195	Sede entregada
Medio Baudó	Chocó	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA	127430000021	IE NUESTRA SEÑORA DE LA POBREZA - S	Terminada	100,0%	$	368.317.735,00	243	Sede entregada
Río Iró	Chocó	IE SAN JOSE DE VIRO VIRO	227205000067	IE SAN JOSE DE VIRO VIRO - SEDE PRINC	Terminada	100,0%	$	374.493.301,00	124	Sede entregada
Unión Panamericana	Chocó	IE SAN RAFAEL EL DOS	327361002538	IE SAN RAFAEL EL DOS - SEDE PRINCIPA	Terminada	100,0%	$	506.404.433,00	405	Sede entregada
Tadó	Chocó	IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	227787000431	SEDE SIMON BOLIVAR	Terminada	100,0%	$	477.750.437,00	66	que el rector se encuentra en licencia de maternidad.
Ituango	Antioquia	PRECIADO ECHAVARRIA	205361000821	LA LOMITA	Terminada	100,0%	$	493.629.513,58	29	Sede terminada
Santa Bárbara	Antioquia	I. E. EL GUAYABO	205679000331	I. E. EL GUAYABO	Terminada	100,0%	$	377.759.873,27	212	Sede entregada
Segovia	Antioquia	I. E. LIBORIO BATALLER	205736000556	C. E. R. SANTA ISABEL DE AMARA	Terminada	100,0%	$	497.989.036,86	45	Sede entregada
Valdivia	Antioquia	I. E. VALDIVIA	205854000277	C. E. R. SANTA INES	Terminada	100,0%	$	514.927.286,22	30	Sede terminada
Cantagallo	Bolívar	INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA JOSE	213670000315	SEDE SINZONA	Terminada	100,0%	$	236.459.955,06	18	Sede entregada
Cantagallo	Bolívar	INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA JOSE	213670001052	SEDE PATICO BAJO	Terminada	100,0%	$	294.015.851,46	62	Sede entregada
Puerto Wilches	Santander	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	168575000418	ESCUELA INDUSTRIAL 20 DE JULIO	Terminada	100,0%	$	422.707.551,35	1133	Sede entregada
Puerto Asís	Putumayo	LORENZO	286568005865	ESCUELA RURAL MIXTA NUEVO AMANEC	Ejecución	0,1%	$	700.000.000,00	50	Se adiciona mediante comité del 12 de septiembre de 2025

Tumaco	Tumaco	SABALETA	452835006601	E.R.M. AWA INDA SABALETA - SEDE PRIN	Ejecución	0,1%	$	1.540.000.000,00	800	Se adiciona mediante comité del 12 de septiembre de 2025
San Pedro De Urabá	Antioquia	C. E. R. BETANIA	205665000452	C. E. R. SAN EMIGDIO	Terminada	100,0%	$	357.669.406,25	43	Sede terminada y entregada
Magangué	Bolívar	INST EDUC COMUNAL DE VERSALLES	113430002464	ILUSION	Terminada	100,0%	$	365.368.472,54	386	Sede terminada y entregada
San Jacinto	Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PARAISO	413654000398	SAN JOSE DE MORENA ABAJO	Terminada	100,0%	$	568.908.393,61	13	Sede terminada y entregada
Unguía	Chocó	IE ALCIDES FERNANDEZ	427800000461	IE ALCIDES FERNANDEZ - SEDE PRINCIP	Terminada	100,0%	$	451.191.487,04	164	Sede terminada y entregada
San Benito Abad	Sucre	CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA	270678000016	SEDE PRINCIPAL LA CEIBA	Terminada	100,0%	$	529.018.985,53	143	Sede terminada y entregada
Lorica	Córdoba	I.E SANTA CRUZ	123417001411	SEDE PRINCIPAL	Terminada	100,0%	$	515.279.500,01	1537	Sede terminada y entregada
Pueblo Rico	Risaralda	TECNICA AGROPECUARIA DACHI DADA	466572001121	SEDE BICHUBARA	Terminada	100,0%	$	487.874.606,77	138	Sede terminada y entregada
Pueblo Rico	Risaralda	TECNICA AGROPECUARIA DACHI DADA	266572000940	SEDE SIKUEDO	Terminada	100,0%	$	602.580.667,72	71	Sede terminada y entregada
Pueblo Rico	Risaralda	TECNICA AGROPECUARIA DACHI DADA	266572001440	SEDE IUMADE	Terminada	100,0%	$	438.453.928,23	73	Sede terminada y entregada
Guática	Risaralda	IE MARIA REINA	266318000506	SEDE MARMOLEJO ALTO	Terminada	100,0%	$	244.561.035,85	20	Sede terminada y entregada
Balboa	Risaralda	IE SANTO DOMINGO SAVIO	266075800011	SEDE KARABI DRUA	Terminada	100,0%	$	927.510.085,41	60	Sede terminada y entregada
Belén de Umbría	Risaralda	IE NUESTRA SENORA DEL ROSARIO	266088000854	SEDE FLOR DEL MONTE	Terminada	100,0%	$	421.854.298,10	20	Sede terminada y entregada
Apía	Risaralda	CENTRO EDUCATIVO JORDANIA	266045000362	SEDE EL JARDIN	Terminada	100,0%	$	485.256.853,65	11	Sede terminada y entregada
Apía	Risaralda	CENTRO EDUCATIVO JORDANIA	266045000087	SEDE EL ENCANTO	Terminada	100,0%	$	553.457.896,59	22	Sede terminada y entregada
San Onofre	Sucre	INSTITUCION EDUCATIVA PAJONAL	270713000415	SEDE EL PEÑON	Terminada	100,0%	$	887.254.749,31	10	Sede terminada y entregada
El Carmen de Bolivar	Bolívar	MAMON DE MARIA	213244000111	SEDE SANTO DOMINGO DE MEZA	Terminada	100,0%	$	1.003.136.103,69	250	Sede terminada y entregada
Venecia	Cundinamarca	I.E DEPARTAMENTAL VENECIA	125506000197	DEPARTAMENTAL VENECIA SEDE PRINC	Ejecución	15,3%	$	642.841.722,97	365	En ejecución del componente II
Uribia	Uribia	RURAL DE MEDIA LUNA JAWAO	244847004025	SEDE PRINCIPAL MEDIA LUNA	Ejecución	21,1%	$	1.318.383.086,43	120	En ejecución del componente II
Dibulla	La Guajira	I.E. INTERNADO RURAL DUMINGUEKA	244090800007	SEDE PRINCIPAL	Ejecución	10,3%	$	1.940.192.731,57	570	En ejecución del componente II
Manaure	La Guajira	SENORA DE FATIMA	244560001327	ESCUELA RURAL INDÍGENA YAWACA	Ejecución	3,0%	$	2.700.000.000,00	171	En ejecución del componente II
Bosconia	Cesar	QUINTERO ARAUJO	120060000072	INSTITUCION EDUCATIVA ELOY QUINTER	Terminada	100,0%	$	467.500.732,12	2106	Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la
Agustin Codazzi	Cesar	AGUSTIN CODAZZI	120013000463	IE NACIONAL AGUSTIN CODAZZI	Terminada	100,0%	$	449.949.459,24	2073	Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la
Manaure Balcon Del Ce	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO	220443000259	SEDE SABANAS DE LEON	Terminada	100,0%	$	450.448.416,13	55	Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la
Valledupar	Cesar	INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CORELCA	120001003602	VILLA CORELCA	Terminada	100,0%	$	428.912.339,81	1211	Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la
Aracataca	Magdalena	DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY	147053000488	COL JOHN F KENNEDY	Terminada	100,0%	$	471.561.516,66	919	Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la
Fundación	Magdalena	DEPARTAMENTAL JOHN F. KENNEDY	347288000891	CENT EDUC 16 DE JULIO	Terminada	100,0%	$	460.325.463,05	474	Contraloría entre el 17 y el 21/03/2025, y como resultado de la
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA No 3	144430000359	SEDE MARIA EUGENIA	Terminada	100,0%	$	466.072.990,51	765	interventoría se radica en PRISA, con No. 2025-001323 proceso
Manaure	La Guajira	ESCUELA RURAL INDIGENA PRESIARU	244560003869	ESCUELA RURAL INDÍGENA PRESIARU	Terminada	100,0%	$	547.840.754,53	80	interventoría se radica en PRISA, con No. 2025-001323 proceso
Riohacha	Riohacha	I E ALMIRANTE PADILLA	144001001151	ALMIRANTE PADILLA	Terminada	100,0%	$	409.762.870,71	1393	interventoría se radica en PRISA, con No. 2025-001323 proceso
Uribia	Uribia	RURAL INTERNADO INDIGENA DEL CABO	244847800102	AIPIR	Terminada	100,0%	$	378.946.652,25	40	interventoría se radica en PRISA, con No. 2025-001323 proceso
Soacha	**Soacha**	**COL_ CIUDAD VERDE_SOACHA**	**125754005464**	**COL_ CIUDAD VERDE_SOACHA**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**No viable financieramente**
Soacha	**Soacha**	**COL_ TORRENTES_SOACHA**	**325754001221**	**COL_ TORRENTES_SOACHA**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**No viable financieramente**
Soacha	**Soacha**	**LAS VEGAS**	**111111111111**	**SOACHA - EQUIPAMIENTO MANZANA 16**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**No viable financieramente**
Soacha	**Soacha**	**CIUDAD VERDE**	**111111111110**	**SOACHA - EQUIPAMIENTO MANZANA 11**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**proyecto una vez realizado el balance financiero del contrato**
Puerto Leguízamo	Putumayo	LEGUIZAMO	186573000354	IE JOSE MARIA HERNANDEZ PUERTO LE	Ejecución	18,0%	$	797.311.060,00	1680	municipio de Puerto Leguizamo, la gobernación de Putumayo,
Caldas	**Manizales**	**CANO_MANIZALES**	**117001002346**	**SEDE LA MOTILANDIA**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**comunicado 2202452007676 del 30 de julio de 2024**
Caldono	**Cauca**	**RESGUARDO PUEBLO**	**119137000293**	**COLEGIO KWE SX UMA KIWE "CEFIC" RE**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**No viable financieramente**
Quibdó	Quibdó	IE CARRASQUILLA INDUSTRIAL_QUIBDO	127001000233	IE CARRASQUILLA INDUSTRIAL_QUIBDO	Ejecución	17,8%	$	741.033.800,00	1600	con el municipio de Quibdó, consultor e interventoría en el cual se
Quibdó	Quibdó	IE SANTO DOMINGO GUZMÁN_QUIBDO	127001001256	IE SANTO DOMINGO GUZMÁN_QUIBDO	Formulación	0,0%	$	-	950	previos de acuerdo con las observaciones por parte del área de
El Tarra	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL BRACITOS	254670000445	SEDE BRACITOS	Formulación	0,0%	$	622.770.449,00	690	MEN en el comité del 27/08/2025 que se realizará en la sede de
El Tarra	**Norte de Santand**	**IE EL TARRA_EL TARRA**	**254344000133**	**IE EL TARRA_EL TARRA**	**Cancelada**	**0,00%**	$	622.770.449,00	**690**	**Bracitos de acuerdo al comité de seguimiento del 27/08/2025**
Tibú	**Norte de Santand**	**BOCAS**	**254810000327**	**SEDE J10**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**No viable financieramente**
Tibú	**Norte de Santand**	**COL INTEG FRANCISCO JOSE DE CALDAS**	**154810003020**	**COL INTEG FRANCISCO JOSE DE CALDA**	**Cancelada**	0,0%	$	-		
El Tarra	**Norte de Santand**	**SAVIO**	**254250000270**	**SEDE LA MOTILANDIA**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**proyecto una vez realizado el balance financiero del contrato**
El Tarra	**Norte de Santand**	**CENTRO EDUCATIVO RURAL BELLAVISTA**	**254670000488**	**CENT EDUC RUR BELLAVISTA**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**proyecto una vez realizado el balance financiero del contrato**
El Tarra	**Norte de Santand**	**GRINGO**	**254810000629**	**INSTITUCION EDUCATIVA FILO EL GRING**	**Cancelada**	0,0%	$	-		
Convención	**Norte de Santand**	**EDUARDO PEREZ**	**254206001102**	**INSTITUCION EDUCATIVA RURAL LA TRI**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**proyecto una vez realizado el balance financiero del contrato**
Convención	**Norte de Santand**	**HONDURAS MOTILONIA**	**254206001030**	**SEDE PRINCIPAL**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**esta sede esta va ser intervenida a través de la alcaldia en**
Tibú	**Norte de Santand**	**KILOMETRO 15**	**254810000343**	**SEDE CAMPO TRES**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**la Secretaría de Planeación de Tibú, el 17 de julio del 2024,**
Tibú	**Norte de Santand**	**KILOMETRO 15**	**254810001012**	**SEDE KILOMETRO 15 - SEDE PRINCIPAL**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**la Secretaría de Planeación de Tibú, el 17 de julio del 2024,**
Mompox	**Bolívar**	**MOMPOX - ESCUELA NORMAL SUPERIOR**	**173001000359**	**MOMPOX - ESCUELA NORMAL SUPERIO**	**Cancelada**	0,0%	$	-		**bolívar un oficio con copia al MEN solicitando información**
Bojayá	Chocó	I.E LA LOMA BOJAYA	227099000206	SEDE POGUE	Formulación	0,0%	$	-	68	unidad nacional de riesgo de desastres asociacion Cocomacia y el
Lloró	Chocó	CE BORAUDO	227413000011	CE BORAUDO - SEDE PRINCIPAL	Formulación	0,0%	$	-	390	desprioriza por inversión del municipio
Ibague	Ibague	I.E. JOSÉ ANTONIO RICAURTE	173001002327	I.E. JOSÉ ANTONIO RICAURTE	Ejecución	97,7%	$	22.298.436.693,68	1360	Se aprueba el comité técnico y fiduciario para el modificatorio de
San José del Palmar	Chocó	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ	127660000658	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JOSÉ	Ejecución	0,0%	$	14.361.984.387,00	402	obra interventoría No 176 de la adición 06/08/2025 Se suspende por un plazo de 2 meses con fecha de
Soacha	Soacha	I.E. EUGENIO DIAZ CASTRO EL CHABOLITO	225754000661	I.E. EUGENIO DIAZ CASTRO EL CHABOLITO	Ejecución	4,3%	$	12.788.888.563,00	580	inicio 06/10/2025. El Ente gestor por el municipio mismo mediante oficio con referencia 2202352023360 del 21/08/2025, se
Istmina	**Chocó**	SEDE PRINCIPAL	**127361000439**	**SEDE PRINCIPAL**	**Cancelada**	0,0%	$	-	**837**	**En revisión de estudios previos en contratación derivada.**
Istmina	**Chocó**	SEDE ANEXA A LA NORMAL NAL SUP NTRA SRA DE LAS MERCEDES	**127361002270**	**SEDE ANEXA A LA NORMAL NAL SUP NTRA SRA DE LAS MERCEDES**	**Cancelada**	0,0%	$	-	**688**	**En revisión de estudios previos en contratación derivada.**
Istmina	**Chocó**	Institución Educativa de Primavera en Istmina	**227361000727**	**SEDE PRINCIPAL**	**Cancelada**	0,0%	$	-	**125**	**En revisión de estudios previos en contratación derivada.**

Litoral de San Juan	Chocó	SEDE PRINCIPAL	227361001286	SEDE PRINCIPAL	Cancelada	0,0%	$	-	125	En revisión de estudios previos en contratación derivada.
Litoral de San Juan	Chocó	SEDE MUNGUIDÓ	227361002045	SEDE MUNGUIDÓ	Cancelada	0,0%	$	-	78	En revisión de estudios previos en contratación derivada.
Litoral de San Juan	Chocó	SEDE LAS DELICIAS	227025000794	SEDE LAS DELICIAS	Cancelada	0,0%	$	-	58	En revisión de estudios previos en contratación derivada.
Medio San Juan	Chocó	I.E. GENARO OPUA QUIRO	227361002631	SEDE MACEDONIA	Ejecución	1,7%	$	336.601.825,55	84	clausula de apremio teniendo encuenta los atrasos presentados
Litoral de San Juan	Chocó	I.E. INDÍGENA SANTA MARIA DE PANGALA	227025001197	SEDE ESPERANZA DE WAIMIA	Ejecución	1,3%	$	451.565.445,52	63	clausula de apremio teniendo encuenta los atrasos presentados
Litoral de San Juan	Chocó	I.E. INDÍGENA SANTA MARIA DE PANGALA	427250060045	SEDE ESTRELLA DE PÁNGALA	Ejecución	1,8%	$	313.862.068,69	14	clausula de apremio teniendo encuenta los atrasos presentados
Litoral de San Juan	Chocó	I.E. INDÍGENA WOUNAAN JOOIN GAYAM	227250001350	SEDE PRINCIPAL	Ejecución	0,7%	$	873.098.726,14	349	clausula de apremio teniendo encuenta los atrasos presentados
Olaya Herrera	Nariño	MARIAS	252490000266	MARIAS	Cancelada	0,0%	$	-	207	despriorización de este proyecto
Olaya Herrera	Nariño	MERIZAL DE PORVENIR	252490000614	MERIZAL DE PORVENIR	Cancelada	0,0%	$	-	175	despriorización de este proyecto
Olaya Herrera	Nariño	SAN JOSE DE CALABAZAL	252490001220	SAN JOSE DE CALABAZAL	Cancelada	0,0%	$	-	93	despriorización de este proyecto
Olaya Herrera	Nariño	IE AGROPECUARIO RIO SANQUIANGA	252490001190	IE AGROPECUARIO RIO SANQUIANGA	Cancelada	0,0%	$	-	377	despriorización de este proyecto
Olaya Herrera	Nariño	IE LITORAL DEL PACÍFICO	152400000059	IE LITORAL DEL PACÍFICO	Cancelada	0,0%	$	-	698	despriorización de este proyecto
Olaya Herrera	Nariño	IE LA INMACULADA	152490001080	IE LA INMACULADA	Cancelada	0,0%	$	-	1384	despriorización de este proyecto
Olaya Herrera	Nariño	IE LITORAL DEL PACIFICO	252490000355	IE LITORAL DEL PACIFICO	Cancelada	0,0%	$	-	17	despriorización de este proyecto
Olaya Herrera	Nariño	IE LITORAL DEL PACIFICO	152490001101	IE LITORAL DEL PACIFICO	Cancelada	0,0%	$	-	88	despriorización de este proyecto
Olaya Herrera	Nariño	SEDES OLAYA HERRERA	252490000991	SEDES OLAYA HERRERA	Cancelada	0,0%	$	-	127	despriorización de este proyecto
Mercaderes	Cauca	CENTRO EDUCATIVO ESMERALDAS	219450000282	SEDE PRINCIPAL ESMERALDAS	Formulación	0,0%	$	5.665.899.202,00	614	El 29 de agosto de 2025 se realizo la socialización jurídica de los contratos Legalizados a la espera de suscripción convenio
Totoró	Cauca	I.E PUEBLO TOTORO	219824001024	SEDE BETANIA	Formulación	0,0%	$	2.659.747.280,00	165	LICENCIA: Aprobada por municipio en espera de iniciar /
Colón	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS	252203000307	INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA SAN CARLOS	Ejecución	4,0%	$	6.198.626.947,00	170	VERIFICACIÓN: Se encuentra en proceso de cierre y liquidación de la
Caimito	Sucre	I.E. SAN JUAN BAUTISTA	170124000265	I.E. SAN JUAN BAUTISTA SEDE PRINCIPA	Ejecución	5,5%	$	4.726.991.154,64	739	El contrato se encuentra en proceso de cierre y legalización de la Etapa 1 para proceder con el inicio de la etapa 2 la cual tiene fecha
La Argentina	Huila	LA CRISTALINA	241378000511	LA CRISTALINA	Terminada	100,0%	$	261.445.386,17	9	Se radica el Prisa con numero INC 2025-001930 correspondiente
La Plata	Huila	PEÑÓN DE TÁLAGA	241396002041	PEÑÓN DE TÁLAGA	Terminada	100,0%	$	538.661.834,21	93	Se radica el Prisa con numero INC 2025-001930 correspondiente
La Plata	Huila	POTRERITO	441396002066	POTRERITO	Terminada	100,0%	$	498.927.424,84	194	Se radica el Prisa con numero INC 2025-001930 correspondiente
Palestina	Huila	YAKUAS	241530000556	YAKUAS	Terminada	100,0%	$	188.309.800,78	41	Se radica el Prisa con numero INC 2025-001930 correspondiente
Mompox	Bolívar	COLEGIO TÉCNICO NACIONAL PINILLOS	113468001038	COLEGIO TÉCNICO NACIONAL PINILLOS	Ejecución	5,0%	$	2.870.855.035,00	180	actividades referentes a recolección de cotizaciones de materiales,
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255000236	SEDE LA QUINTA	Formulación	0,0%	$	-	24	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255001399	SEDE SALAZARES	Formulación	0,0%	$	-	13	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255000198	SEDE EL PINO	Formulación	0,0%	$	-	45	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255000228	SEDE SANTA ROSA	Formulación	0,0%	$	-	19	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E SAN FRANCISCO DE ASIS	268255001712	SEDE VEGAS DE BETANIA	Formulación	0,0%	$	-	12	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255000058	SEDE PRINCIPAL	Formulación	0,0%	$	-	63	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255000058	SEDE ANEXA BÁSICA PRIMARIA	Formulación	0,0%	$	-	63	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255000104	SEDE MIRAFLORES	Formulación	0,0%	$	-	5	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255000325	SEDE MADROÑOS	Formulación	0,0%	$	-	3	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255000333	SEDE PLANADAS DE BETANIA	Formulación	0,0%	$	-	7	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255001381	SEDE SARDINA	Formulación	0,0%	$	-	6	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
Playon	Santander	I.E. BETANIA	268255001259	SEDE SAN ANTONIO	Formulación	0,0%	$	-	45	días 15 y 19 de septiembre de 2025 sobre los valores estimados
La Plata	Huila	CER NAMUI NU MAI	241396002393	NAMUY FXIW	Formulación	0,0%	$	-	40	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
La Plata	Huila	YU´LUUXÇ PISHAU	241396800052	LA PATRICIA	Formulación	0,0%	$	-	12	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
La Argentina	Huila	YU´LUUXÇ PISHAU	241378000561	CABUYO	Formulación	0,0%	$	-	45	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Nátaga	Huila	IE MARIA MANDIGUAGUA	241483000305	MARIA MANDIGUAGUA	Formulación	0,0%	$	-	123	Durante el mes de septiembre de 2025, se subsanó las observaciones presentadas por el área de contratación interna a los estudios previos de obra e interventoría, donde fue remitido el 18 de septiembre de 2025 para última revisión y aprobación; dichos documentos fueron radicados de manera formal al área de Contratación el 23 de septiembre de 2025, y se está a la espera de la citación para comité técnico. Convenio interadministrativo: Fue recibido los documentos de parte de la gobernación de Huila el 16 de septiembre de 2025 para iniciar la elaboración del Convenio interadministrativo, actualmente se encuentra en revisión y subsanación a observaciones presentadas por el área jurídica, para remitir el primer borrador del convenio a la gobernación del Huila, municipio de Pitalito y el Cabildo Indígena CRIHU.

Íquira	Huila	KUE DSI´J	241357000693	KUE DSI J SEDE PRINCIPAL	Formulación	0,0%	$	-	543	Durante el mes de septiembre de 2025, se subsanó las observaciones presentadas por el área de contratación interna a los estudios previos de obra e interventoría, donde fue remitido el 18 de septiembre de 2025 para última revisión y aprobación; dichos documentos fueron radicados de manera formal al área de Contratación el 23 de septiembre de 2025, y se está a la espera de la citación para comité técnico. Convenio interadministrativo: Fue recibido los documentos de parte de la gobernación de Huila el 16 de septiembre de 2025 para iniciar la elaboración del Convenio interadministrativo, actualmente se encuentra en revisión y subsanación a observaciones presentadas por el área jurídica, para remitir el primer borrador del convenio a la gobernación del Huila, municipio de Pitalito y el Cabildo Indígena CRIHU.
La Plata	Huila	YU´LUUXÇ PISHAU	241396002113	NAMUY NASA	Formulación	0,0%	$	-	24	Durante el mes de septiembre de 2025, se subsanó las observaciones presentadas por el área de contratación interna a los estudios previos de obra e interventoría, donde fue remitido el 18 de septiembre de 2025 para última revisión y aprobación; dichos documentos fueron radicados de manera formal al área de Contratación el 23 de septiembre de 2025, y se está a la espera de la citación para comité técnico. Convenio interadministrativo: Fue recibido los documentos de parte de la gobernación de Huila el 16 de septiembre de 2025 para iniciar la elaboración del Convenio interadministrativo, actualmente se encuentra en revisión y subsanación a observaciones presentadas por el área jurídica, para remitir el primer borrador del convenio a la gobernación del Huila, municipio de Pitalito y el Cabildo Indígena CRIHU.
La Argentina	Huila	IE YACHAY WASI RUNA YANAKUNA	241668001715	IE YACHAY WASI RUNA YANAKUNA	Formulación	0,0%	$	-	176	Durante el mes de septiembre de 2025, se subsanó las observaciones presentadas por el área de contratación interna a los estudios previos de obra e interventoría, donde fue remitido el 18 de septiembre de 2025 para última revisión y aprobación; dichos documentos fueron radicados de manera formal al área de Contratación el 23 de septiembre de 2025, y se está a la espera de la citación para comité técnico. Convenio interadministrativo: Fue recibido los documentos de parte de la gobernación de Huila el 16 de septiembre de 2025 para iniciar la elaboración del Convenio interadministrativo, actualmente se encuentra en revisión y subsanación a observaciones presentadas por el área jurídica, para remitir el primer borrador del convenio a la gobernación del Huila, municipio de Pitalito y el Cabildo Indígena CRIHU.
Pitalito	Huila	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL PACHAKUTI	241551002672	INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL PA(	Formulación	0,0%	$	-	176	Durante el mes de septiembre de 2025, se subsanó las observaciones presentadas por el área de contratación interna a los estudios previos de obra e interventoría, donde fue remitido el 18 de septiembre de 2025 para última revisión y aprobación; dichos documentos fueron radicados de manera formal al área de Contratación el 23 de septiembre de 2025, y se está a la espera de la citación para comité técnico. Convenio interadministrativo: Fue recibido los documentos de parte de la gobernación de Huila el 16 de septiembre de 2025 para iniciar la elaboración del Convenio interadministrativo, actualmente se encuentra en revisión y subsanación a observaciones presentadas por el área jurídica, para remitir el primer borrador del convenio a la gobernación del Huila, municipio de Pitalito y el Cabildo Indígena CRIHU.

					Formulación	0,0%	$	-		Durante el mes de septiembre de 2025, se subsanó las observaciones presentadas por el área de contratación interna a los estudios previos de obra e interventoría, donde fue remitido el 18 de septiembre de 2025 para última revisión y aprobación; dichos documentos fueron radicados de manera formal al área de Contratación el 23 de septiembre de 2025, y se está a la espera de la citación para comité técnico. Convenio interadministrativo: Fue recibido los documentos de parte de la gobernación de Huila el 16 de septiembre de 2025 para iniciar la elaboración del Convenio interadministrativo, actualmente se encuentra en revisión y subsanación a observaciones presentadas por el área jurídica, para remitir el primer borrador del convenio a la gobernación del Huila, municipio de Pitalito y el Cabildo Indígena CRIHU.
La Plata	Huila	YU´LUUXÇ PISHAU	241396002377	YU´LUUXÇ PISHAU					267	
					Formulación	0,0%	$	-		Durante el mes de septiembre de 2025, se subsanó las observaciones presentadas por el área de contratación interna a los estudios previos de obra e interventoría, donde fue remitido el 18 de septiembre de 2025 para última revisión y aprobación; dichos documentos fueron radicados de manera formal al área de Contratación el 23 de septiembre de 2025, y se está a la espera de la citación para comité técnico. Convenio interadministrativo: Fue recibido los documentos de parte de la gobernación de Huila el 16 de septiembre de 2025 para iniciar la elaboración del Convenio interadministrativo, actualmente se encuentra en revisión y subsanación a observaciones presentadas por el área jurídica, para remitir el primer borrador del convenio a la gobernación del Huila, municipio de Pitalito y el Cabildo Indígena CRIHU.
La Plata	Huila	YU´LUUXÇ PISHAU	241396002431	YALANDA YAT CXHACXHA					14	
Santacruz	Nariño	UNO	252699000484	CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE VARGAS	Formulación	0,0%	$	-	7	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Santacruz	Nariño	CENTRO EDUCATIVO LA ZABALETA	252699000417	CENTRO EDUCATIVO LA ZABALETA	Formulación	0,0%	$	-	20	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Santacruz	Nariño	CENTRO EDUCATIVO LA TOLA	252699800015	CENTRO EDUCATIVO LA TOLA - SEDE PR	Formulación	0,0%	$	-	6	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Santacruz	Nariño	CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA	252699000298	CENTRO EDUCATIVO LA CEIBA	Formulación	0,0%	$	-	5	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Santacruz	Nariño	CENTRO EDUCATIVO GUADUALITO	252699000450	CENTRO EDUCATIVO GUADUALITO	Formulación	0,0%	$	-	3	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Santacruz	Nariño	CENTRO EDUCATIVO EL MADROÑO	252699000361	CENTRO EDUCATIVO EL MADROÑO	Formulación	0,0%	$	-	3	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Santacruz	Nariño	CENTRO EDUCATIVO EL CLARAVAL	252699000280	CENTRO EDUCATIVO EL CLARAVAL	Formulación	0,0%	$	-	3	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Santacruz	Nariño	VARGAS DOS	252699000476	CENTRO EDUCATIVO EL CARMEN VARGA	Formulación	0,0%	$	-	6	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Santacruz	Nariño	CENTRO EDUCATIVO CHAPILAL	252699000433	CENTRO EDUCATIVO CHAPILAL	Formulación	0,0%	$	-	5	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Santacruz	Nariño	CENTRO EDUCATIVO CHAGUI	252699000352	CENTRO EDUCATIVO CHAGUI	Formulación	0,0%	$	-	6	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Santacruz	Nariño	CENTRO EDUCATIVO CAMPOALEGRE	252699000506	CENTRO EDUCATIVO CAMPOALEGRE	Formulación	0,0%	$	-	13	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
La Llanada	**Nariño**	**INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I**	**252418000359**	**SEDE 3 LA PALMA**	**Cancelada**	**0,0%**	**$**	**-**	**0**	**que el municipio ya habia intervenido la sede anteriormente**
La Llanada	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I	252385000021	SEDE 04 EL MACO	Formulación	0,0%	$	-	7	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Samaniego	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA	252678000760	SEDE 2 EL PALACIO	Formulación	0,0%	$	-	10	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Samaniego	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA	252678000786	SEDE 16 BUENAVISTA	Formulación	0,0%	$	-	7	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Samaniego	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA	252678000972	SEDE 10 EL DECIO	Formulación	0,0%	$	-	7	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Samaniego	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA	252678001081	SEDE 10 LA VERDE	Formulación	0,0%	$	-	3	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Samaniego	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA	252678001057	SEDE 8 EL SALTO	Formulación	0,0%	$	-	11	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Samaniego	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA	252678000794	SEDE 5 SAN DIEGO	Formulación	0,0%	$	-	8	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Samaniego	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA	252678000743	SEDE 13 EL CEDRAL	Formulación	0,0%	$	-	5	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Samaniego	Nariño	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BETANIA	252678000166	SEDE 12 ANDALUCIA	Formulación	0,0%	$	-	5	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
La Llanada	Nariño	AGROPECUARIA RODRIGO LARA BONILLA	252385000013	SEDE 4 BRISAS DEL TELEMBI	Formulación	0,0%	$	-	9	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
La Llanada	Nariño	AGROPECUARIA RODRIGO LARA BONILLA	252385005422	SEDE 3 SUMBIAMBI	Formulación	0,0%	$	-	14	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
La Llanada	Nariño	AGROPECUARIA RODRIGO LARA BONILLA	252418000375	SEDE 7 MARIA AUXILIADORA	Formulación	0,0%	$	-	4	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Samaniego	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA	252678001278	SEDE 07 EL COPAL	Formulación	0,0%	$	-	10	observaciones presentadas por el área de contratación interna a
Samaniego	Nariño	AGROPECUARIA Y DE SISTEMAS SIMON	252678000808	SEDE 8 EL LIMO	Formulación	0,0%	$	-	10	observaciones presentadas por el área de contratación interna a

					Formulación	0,0%	$	-		Durante el mes de septiembre de 2025, se subsanó las observaciones presentadas por el área de contratación interna a los estudios previos de obra e interventoría, donde fue remitido el 26 de septiembre de 2025 para última revisión y aprobación. Convenio Interadministrativo: Fue recibido los documentos de parte de los municipios de La Llanada y el cabildo indígena del municipio de Samaniego el 18 de septiembre de 2025 y se está en elaboración del convenio para la primera revisión por parte del área jurídica interna (convenio para el grupo 28 y 29).
Samaniego	Nariño	INSTITUCION EDUCATIVA BETANIA	252678001189	SEDE 9 LA BOCANA					57	
Vijes	Valle del Cauca	EMBERA DEL VALLE DEL CAUCA IENEV.	276869000472	XAI DE DRUA WADRA	Formulación	0,0%	$	-	0	el área encargada de Findeter. Nos encontramos a la espera de
Riosucio	Chocó	IE NUESTROS ESFUERZOS	127615001902	SEDE PRINCIPAL	Formulación	0,0%	$	-	625	viabilidad jurídica, esta es remitida al área encargada de Findeter
Samaniego	Nariño	AGROECOLOGICO EL MOTILON	252678000433	SEDE 1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNIC	Formulación	0,0%	$	-	0	corresponde al suministrado por el MEN. Actualmente la
Buenaventura	Buenaventura	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL - SEDE PRINCIPAL	176109000176	INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAFAEL -	Formulación	0,0%	$	-	846	
Solita	Caquetá	I.E.R. CHONTILLOSA MEDIO	218860000364	CHONTILLOSA MEDIA	Formulación	0,0%	$	-	67	
Puerto rico	Caquetá	INSTITUTO EDUCATIVO RURAL VILLA DEL RIO	218592003941	VILLA DEL RIO SEDE PRINCIPAL	Formulación	0,0%	$	-	107	
Alto baudo	Chocó	IE JULIO MEJIA VELEZ	127025000498	IE JULIO MEJIA VELEZ - SEDE PRINCIPAL	Formulación	0,0%	$	-	285	
Florencia	Florencia	JOSE ANTONIO GALAN	218001000921	JOSE ANTONIO GALAN	Formulación	0,0%	$	-	131	
Florencia	Florencia	IER VILLA HERMOSA 2	283001000049	DAMAS ARRIBA	Formulación	0,0%	$	-	16	
Manaure	La Guajira	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO	244560000037	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SAN RAF	Formulación	0,0%	$	-	1223	
Manaure	La Guajira	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL JULIO ROSADO ¿PORQUI¿	244560002811	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL JULIO	Formulación	0,0%	$	-	814	
Puerto concordia	Meta	IE PUERTO IRIS	250450000333	SEDE SAN JUAN BOSCO	Formulación	0,0%	$	-	15	
Puerto concordia	Meta	CENTRO EDUCATIVO MI LLANURA	250450000384	MARIA AUXILIADORA	Formulación	0,0%	$	-	12	
La macarena	Meta	IE HECTOR IVAN HERNANDEZ	250350001383	IE HECTOR IVAN HERNANDEZ SEDE PRIN	Formulación	0,0%	$	-	7	
Montería	Montería	IE GENERAL SANTANDER	123001002125	IE GENERAL SANTANDER SEDE PRINCIP/	Formulación	0,0%	$	-	725	
Riohacha	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS	144001001941	INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINED	Formulación	0,0%	$	-	987	
Riohacha	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA HELION PINEDO RIOS	144001001916	LOS CEREZOS	Formulación	0,0%	$	-	374	
Tuluá	Valle del Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA JULIO RESTREPO	176834000386	ANTONIA SANTOS	Formulación	0,0%	$	-	358	
Caucasia	Antioquia	I. E. MARCO FIDEL SUAREZ	105154000409	E U MARCO FIDEL SUAREZ	Formulación	0,0%	$	-	1587	
Caucasia	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO	105154001880	COLEGIO DIVINO NIÑO	Formulación	0,0%	$	-	468	
Caucasia	Antioquia	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CACERI	205154000225	I. E. R. CACERI	Formulación	0,0%	$	-	321	
Caucasia	Antioquia	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CUTURU	205154000977	I. E. R CUTURU	Formulación	0,0%	$	-	489	
El Bagre	Antioquia	I. E. BIJAO	105250000185	I. E. BIJAO	Formulación	0,0%	$	-	1655	
El Bagre	Antioquia	I. E. LAS DELICIAS	105250000339	COLEGIO LAS DELICIAS	Formulación	0,0%	$	-	704	
Zaragoza	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SIMON BOLIVAR	205895000320	I.E.R. SIMON BOLIVAR	Formulación	0,0%	$	-	580	
San Pedro de Urabá	Antioquia	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL BUCHADO MEDIO	205665000215	I. E. R. BUCHADO MEDIO	Formulación	0,0%	$	-	331	
San Pedro de Urabá	Antioquia	I. E. R. LAS PAVAS	205665000428	I. E. R. LAS PAVAS	Formulación	0,0%	$	-	179	
Segovia	Antioquia	I. E. R. FRAY MARTIN DE PORRES	205736000238	COLEGIO FRAY MARTIN DE PORRES	Formulación	0,0%	$	-	531	
Saravena	Arauca	CENTRO EDUCATIVO LUIS ANTONIO CALVO	281736000074	LUIS ANTONIO CALVO	Formulación	0,0%	$	-	97	
Fortul	Arauca	CENTRO EDUCATIVO PALMARITO	281794003831	PALMARITO	Formulación	0,0%	$	-	40	
Saravena	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA ALTO CITACA.	281736000601	ALTO CITACA	Formulación	0,0%	$	-	47	
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA INOCENCIO CHINCA	181794000021	INOCENCIO CHINCA	Formulación	0,0%	$	-	1219	

Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL FROILAN FARIAS	181794000624	COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL FROILAN	Formulación	0,0%	$ -	829
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO TAME	181794000748	LICEO TAME	Formulación	0,0%	$ -	1185
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS	181794003151	COLEGIO NACIONAL SAN LUIS	Formulación	0,0%	$ -	610
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA DE PROMOCION AGROPECUARIA	281794004683	INSTITUTO DE PROMOCION AGROPECU	Formulación	0,0%	$ -	1593
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA FILIPINAS	281794004802	INSTITUCION EDUCATIVA FILIPINAS - SE	Formulación	0,0%	$ -	523
Tame	Arauca	INSTITUCION EDUCATIVA ORIENTAL FEMENINO	381794000399	INSTITUTO ORIENTAL FEMENINO	Formulación	0,0%	$ -	991
Sabanalarga	Atlántico	INSTITUCION EDUCATIVA DE SABANALARGA	108638000046	INSTITUCION EDUCATIVA DE SABANALAR	Formulación	0,0%	$ -	2327
Juan de Acosta	Atlántico	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE SACO	208372000031	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE S	Formulación	0,0%	$ -	302
Puerto Colombia	Atlántico	INSTITUCION EDUCATIVA SAN NICOLAS DE TOLENTINO	308573000522	I.E. SAN NICOLAS DE TOLENTINO	Formulación	0,0%	$ -	573
Barranquilla	Barranquilla	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL KARL PARRISH	108001003611	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL KAR	Formulación	0,0%	$ -	1512
Bello	Bello	INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA	105088000532	INSTITUCION EDUCATIVA LA MILAGROSA	Formulación	0,0%	$ -	983
Morales	Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORCOVADO	213473001296	I.E. CORCOVADO - SEDE PRINCIPAL	Formulación	0,0%	$ -	133
San Pablo	Bolívar	INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA INTEGRADA	113670001171	I.E. TECNICA LA INTEGRADA - SEDE PRIN	Formulación	0,0%	$ -	1879
Chiquinquirá	Boyacá	I.E. TECNICA LOS COMUNEROS	215176001131	I.E. TECNICA LOS COMUNEROS	Formulación	0,0%	$ -	251
El Cocuy	Boyacá	I.E. JOSE SANTOS GUTIERREZ	115244000012	I.E. JOSE SANTOS GUTIERREZ	Formulación	0,0%	$ -	233
San Vicente del Caguán	Caquetá	I.E.R. LA SAMARIA	218753002931	LA SAMARIA	Formulación	0,0%	$ -	100
San Vicente del Caguán	Caquetá	I.E.R. ARENOSO	283753000480	ARENOSO	Formulación	0,0%	$ -	9
Cajibío	Cauca	C.E. CACAHUAL	219130000578	CACAHUAL (sede principal)	Formulación	0,0%	$ -	38
La Gloria	Cesár	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MEJIA URIBE	120383000012	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MEJIA UR	Formulación	0,0%	$ -	597
Belén de Bajirá	Chocó	IE BELEN DE BAJIRA	227615800095	IE BELEN DE BAJIRA - SEDE PRINCIPAL	Formulación	0,0%	$ -	1513
Lloró	Chocó	IE ATRATO DE LLORO	327413000024	IE ATRATO DE LLORO - SEDE PRINCIPAL	Formulación	0,0%	$ -	662
Bajo Baudó(Pizarro)	Chocó	CE SAN LORENZO DE ORPUA	227077000130	CE SAN LORENZO DE ORPUA - SEDE PRI	Formulación	0,0%	$ -	60
San Antero	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	123672000054	COLEGIO JOSÉ ANTONIO GALÁN	Formulación	0,0%	$ -	1641
San Carlos	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA ARROYO GRANDE ABAJO	223678000158	C.EDUC. ARROYO GRANDE ABAJO	Formulación	0,0%	$ -	106
San Carlos	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA GUACHARACAL	223678001090	INST. EDC. GUACHARACAL	Formulación	0,0%	$ -	333
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA PALMIRA	223807000992	IE PALMIRA	Formulación	0,0%	$ -	537
Tierralta	Córdoba	INSTITUCION EDUCATIVA BENICIO AGUDELO	123807000017	IE BENICIO AGUDELO	Formulación	0,0%	$ -	927
Tierralta	Córdoba	CENTRO EDUCATIVO ANTILLANA	223807002022	CENT EDUC LA ANTILLANA	Formulación	0,0%	$ -	36
Barrancas	La Guajira	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN SOLANO	144078000335	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE AGUSTIN	Formulación	0,0%	$ -	628
Barrancas	La Guajira	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	144078000599	INSTITUCION EDUCATIVA PAULO VI	Formulación	0,0%	$ -	1015
Hatonuevo	La Guajira	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL GUAMACHITO	244078000879	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL G	Formulación	0,0%	$ -	478
Hatonuevo	La Guajira	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO (YELETSHIMANA)	244378000056	CENTRO ETNOEDUCATIVO EL CERRO (YI	Formulación	0,0%	$ -	223
Manaure	La Guajira	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	244560000240	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTR	Formulación	0,0%	$ -	1227
Fonseca	La Guajira	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGROAMBIENTAL JOSE PEREZ	244279000222	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL AGRO	Formulación	0,0%	$ -	411

Dibulla	La Guajira	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTERNADO RURAL KOGUI	244001000868	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO INTERNA	Formulación	0,0%	$ -	267
San Juan Del Cesar	La Guajira	CENTRO EDUCATIVO LOS PONDORES	244650000516	CENTRO RURAL MIXTO LOS PONDORES	Formulación	0,0%	$ -	150
San Juan Del Cesar	La Guajira	CENTRO EDUCATIVO DE EL TABLAZO	244650000133	CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TABLAZ	Formulación	0,0%	$ -	97
San Juan Del Cesar	La Guajira	CENTRO EDUCATIVO DE LOS HATICOS	244650000257	CENTRO RURAL MIXTO LOS HATICOS	Formulación	0,0%	$ -	133
San Juan Del Cesar	La Guajira	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDRAS	244650000141	CENTRO EDUCATIVO CORRAL DE PIEDR	Formulación	0,0%	$ -	135
Distracción	La Guajira	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL CAICEMAPA	244279000338	CENTRO ETNOEDUCATIVO DE CAICEMAI	Formulación	0,0%	$ -	194
Fonseca	La Guajira	INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTO PARODI MEDINA	244279001008	INSSTITUCION EUCATIVA ERNESTO PAR	Formulación	0,0%	$ -	1194
Fonseca	La Guajira	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL MAYABANGLOMA	244279001415	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL M	Formulación	0,0%	$ -	332
Dibulla	La Guajira	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	244001000418	INSTITUCON EDUCATIVA NUESTRA SEÑ	Formulación	0,0%	$ -	1160
Lorica	Lorica	CENTRO EDUCATIVO MATA DE CAÑA MARGEN DERECHA	223417002153	CE MATA DE CAÑA	Formulación	0,0%	$ -	96
Lorica	Lorica	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PAULO VI	123417000393	IE PAULO VI	Formulación	0,0%	$ -	834
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 13	244430001287	SEDE PRINCIPAL - ATNAMANA	Formulación	0,0%	$ -	589
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA NO. 9	244430002119	SEDE PRINCIPAL - MANUEL ROSADO IGU	Formulación	0,0%	$ -	872
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA NO. 8	144430001231	SEDE PRINCIPAL - PERPETUO SOCORRC	Formulación	0,0%	$ -	873
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 9	144430002491	SEDE PRINCIPAL - MAKU	Formulación	0,0%	$ -	410
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA NO. 13	144430002564	SEDE PRINCIPAL - ERIKA BEATRIZ	Formulación	0,0%	$ -	979
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 1	244430000850	SEDE PRINCIPAL - LIMONCITO	Formulación	0,0%	$ -	603
Maicao	Maicao	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 5	244430001350	SEDE PRINCIPAL - OVIDIO GOMEZ FERN	Formulación	0,0%	$ -	595
Malambo	Malambo	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS	108433000027	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANT	Formulación	0,0%	$ -	1221
La Macarena	Meta	IE NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA	150350000030	SEDE PRINCIPAL NUESTRA SEÑORA DE I	Formulación	0,0%	$ -	527
La Macarena	Meta	INSTITUCION EDUCATIVA HECTOR IVAN HERNANDEZ	250350000786	SEDE PRINCIPAL HECTOR IVAN HERNAN	Formulación	0,0%	$ -	275
Sardinata	Norte de Santande	CENTRO EDUCATIVO RURAL SAN GIL	254720000930	CENT EDUC RUR SAN GIL	Formulación	0,0%	$ -	54
Pamplona	Norte de Santande	NORMAL SUPERIORP	154518000265	NORMAL SUPERIOR	Formulación	0,0%	$ -	572
Sardinata	Norte de Santande	INST. EDUCATIVA MONSE¿OR SARMIENTO PERALTA	254720000328	COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA	Formulación	0,0%	$ -	985
Piedecuesta	Piedecuesta	INSTITUTO LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	168547000071	INSTITUTO LUIS CARLOS GALAN SARMIE	Formulación	0,0%	$ -	1018
Piedecuesta	Piedecuesta	COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA	168547001409	COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA	Formulación	0,0%	$ -	1215
Puerto Asís	Putumayo	INS ETNO EDUC RUR BUENAVISTA	286568000359	BUENAVISTA - SEDE PRINCIPAL	Formulación	0,0%	$ -	68
Puerto Asís	Putumayo	IER EL DANUBIO	286568002874	EL DANUBIO	Formulación	0,0%	$ -	169
Villagarzón	Putumayo	IE GUILLERMO VALENCIA	186885001188	COL GUILLERMO VALENCIA	Formulación	0,0%	$ -	1351
Puerto Guzmán	Putumayo	IE AMAZONICA	286001001516	INST AMAZONICO DE PTO GUZMAN	Formulación	0,0%	$ -	1320
Valle Guamuez-Lahormi	Putumayo	IE RUR EL CAIRO	286865001780	ESC RUR MIX EL CAIRO	Formulación	0,0%	$ -	419
Orito	Putumayo	CENT ETNOEDUCATIVO RURAL BOCANAS DEL LUZON	286320001081	ESC RUR MIX BOCANA DEL LUZON	Formulación	0,0%	$ -	85
Riohacha	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA MARIA DORALIZA	144001000138	MARIA DORALIZA LOPEZ DE MEJIA	Formulación	0,0%	$ -	2249
Riohacha	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FAMILIA DE NAZARET	344001000382	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL FAM	Formulación	0,0%	$ -	810

Riohacha	Riohacha	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA	244001002437	INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN JU	Formulación	0,0%	$ -	577
Riohacha	Riohacha	INSTITUCION ETNOEDUCATIVO #12	244001004715	CENTRO ETNOEDUCATIVO #12 (MUURAI)	Formulación	0,0%	$ -	699
Sabaneta	Sabaneta	I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ	105631000084	I. E. JOSE FELIX DE RESTREPO VELEZ	Formulación	0,0%	$ -	1568
Soacha	Soacha	INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELTRÀN	225754000238	INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA BELT	Formulación	0,0%	$ -	1519
Soledad	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MARIA UCROS	108758000058	INSTITUCION EDUCATIVA DOLORES MAR	Formulación	0,0%	$ -	1488
Soledad	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA VISTA HERMOSA DE SOLEDAD	308758001134	INSTITUCION EDUCATIVA VISTA HERMOS	Formulación	0,0%	$ -	978
Soledad	Soledad	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA	108758000180	INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SA	Formulación	0,0%	$ -	601
Uribia	Uribia	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA INTEGRAL RURAL KATANAMANA	244847004033	SEDE PRINCIPAL KATANAMANA	Formulación	0,0%	$ -	378
Argelia	Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUTIERREZ ANGEL	476054000019	INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO GUT	Formulación	0,0%	$ -	229
El Cairo	Valle del Cauca	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION	176246000337	INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTAC	Formulación	0,0%	$ -	201
Puerto Carreño	Vichada	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE EUSTASIO RIVERA	199001000927	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTASI	Formulación	0,0%	$ -	477
Puerto Carreño	Vichada	INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIA SANTOS	299001002614	INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANT	Formulación	0,0%	$ -	194
