

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO "GIMNASIO DEL POLIDEPORTIVO, DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIQOUIA.**	**58 días**	**mar 30/05/23**	**vie 11/08/23**	
2		**DEMOLICIONES**	**5 días**	**mar 30/05/2**	**lun 5/06/23**	
3		Demolición de estructuras en concreto, incluye el cargue, transporte y botada de escombros	5 días	mar 30/05/23	lun 5/06/23	
4		**ENCHAPES DE PISO Y PARED**	**16 días**	**jue 29/06/23**	**mié 19/07/2**	
5		Suministro, transporte e instalación de MORTERO DE NIVELACIÓN 21, MPa e=0.08m	4 días	jue 29/06/23	mié 5/07/23	24
6		STI Baldosa elástica de seguridad y protección frente a caídas, color negro, de 500x500x20 mm, compuesta de resinas de poliuretano	8 días	lun 10/07/23	mié 19/07/23	25
7		Suministro, Transporte e Instalación de PISO CERÁMICO, TRÁFICO COMERCIAL INTENSO	4 días	lun 10/07/23	vie 14/07/23	25
8		Suministro, Transporte e Instalación de ENCHAPE CERÁMICO PARED, TIPO CORONA 0,45 m * 0,30 m.	5 días	lun 10/07/23	sáb 15/07/23	25
9		**CONCRETOS**	**12 días**	**sáb 8/07/23**	**lun 24/07/23**	
10		Colocación de Concreto de Resistencia 21 Mpa (Clase D) para pilas, vigas de fundacion zapatas y demas elementos	12 días	sáb 8/07/23	lun 24/07/23	13
11		**ACERO DE REFUERZO**	**12 días**	**vie 23/06/23**	**sáb 8/07/23**	
12		Suministro, transporte y colocación de malla electrosoldada TIPO D 84.	2 días	jue 29/06/23	vie 30/06/23	5CC
13		Construcción y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE	12 días	vie 23/06/23	sáb 8/07/23	17
14		**OBRAS VARIAS**	**53 días**	**lun 5/06/23**	**vie 11/08/23**	
15		Retiro de cubierta en teja de barro, incluye cargue, transporte, botada o recuperación de tablilla, alfardas, cargueras y soleras.	15 días	sáb 8/07/23	jue 27/07/23	13
16		Desmonte de tres cerchas existentes en madera (luz=11,2 m) y tres vigas transversales en madera (long=16,2 m), botada o recuperación de cargueras y soleras.	10 días	lun 5/06/23	vie 16/06/23	3
17		STI de puntos de anclaje para la conexión de la estructura existente con la nueva estructura	4 días	vie 16/06/23	vie 23/06/23	16



Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
18		Suministro, transporte y Aplicación de PINTURA A BASE DE AGUA EN MUROS, CON VINILO TIPO 1	6 días	sáb 15/07/23	lun 24/07/23	8
19		Suministro, transporte e instalación de CUBIERTA en teja TERMOACUSTICA calibre 2.5mm	6 días	jue 3/08/23	vie 11/08/23	27
20		Suministro transporte e instalación de puerta en triplex marco en madera de 2.1 x 1m. Incluye chapa y pintura tipo barniz.	4 días	lun 24/07/23	vie 28/07/23	18
21		Suministro transporte e instalación de puerta en triplex marco en madera de 2.1 x 0.70m. Incluye chapa y pintura tipo barniz.	2 días	lun 24/07/23	mié 26/07/23	18
22		Suministro, transporte y colocación de ventana 5020 en aluminio anodizado natural y cristal claro	5 días	lun 24/07/23	sáb 29/07/23	18
23		**REVOQUES, ESTUCOS Y PINTURA**	**36 días**	**mar 20/06/23**	**jue 3/08/23**	
24		Suministro, transporte y colocación de REVOQUE con mortero 1:4 EN MUROS.	8 días	mar 20/06/23	jue 29/06/23	32
25		Suministro, transporte y aplicación de estuco plástico, aplicado sobre revoque.	4 días	mié 5/07/23	lun 10/07/23	5
26		Aplicación de PINTURA ACRÍLICA en muros para exteriores tipo koraza o equivalente	6 días	lun 24/07/23	lun 31/07/23	18
27		Suministro, transporte y colocación de canoa en "L" / "U" en lamina galvanizada calibre 22	6 días	jue 27/07/23	jue 3/08/23	15
28		**INSTALACIONES SANITARIAS**	**46 días**	**lun 5/06/23**	**mié 2/08/23**	
29		Suministro, transporte e instalación de salidas de abasto en DIÁMETRO DE 1/2"con tubería RDE 9 .500	3 días	lun 5/06/23	mié 7/06/23	3
30		S.T.I. de tubo de presión RDE 9 de 1/2",	3 días	jue 8/06/23	mar 13/06/23	29
31		Suministro, transporte e instalación de salidas sanitarias TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 2"	3 días	mar 13/06/23	jue 15/06/23	30
32		Suministro, transporte e instalación de salidas sanitarias TUBERÍA PVC-SANITARIA, con un DIÁMETRO DE 4"	2 días	vie 16/06/23	mar 20/06/23	31
33		Suministro, transporte y colocación de sanitario institucional, color blanco	2 días	lun 31/07/23	mié 2/08/23	26
34		Instalación de LAVAMANOS de colgar con pedestal.	2 días	lun 31/07/23	mié 2/08/23	26
35		Suministro, transporte y colocación de sanitarios discapacitados	2 días	lun 31/07/23	mié 2/08/23	26

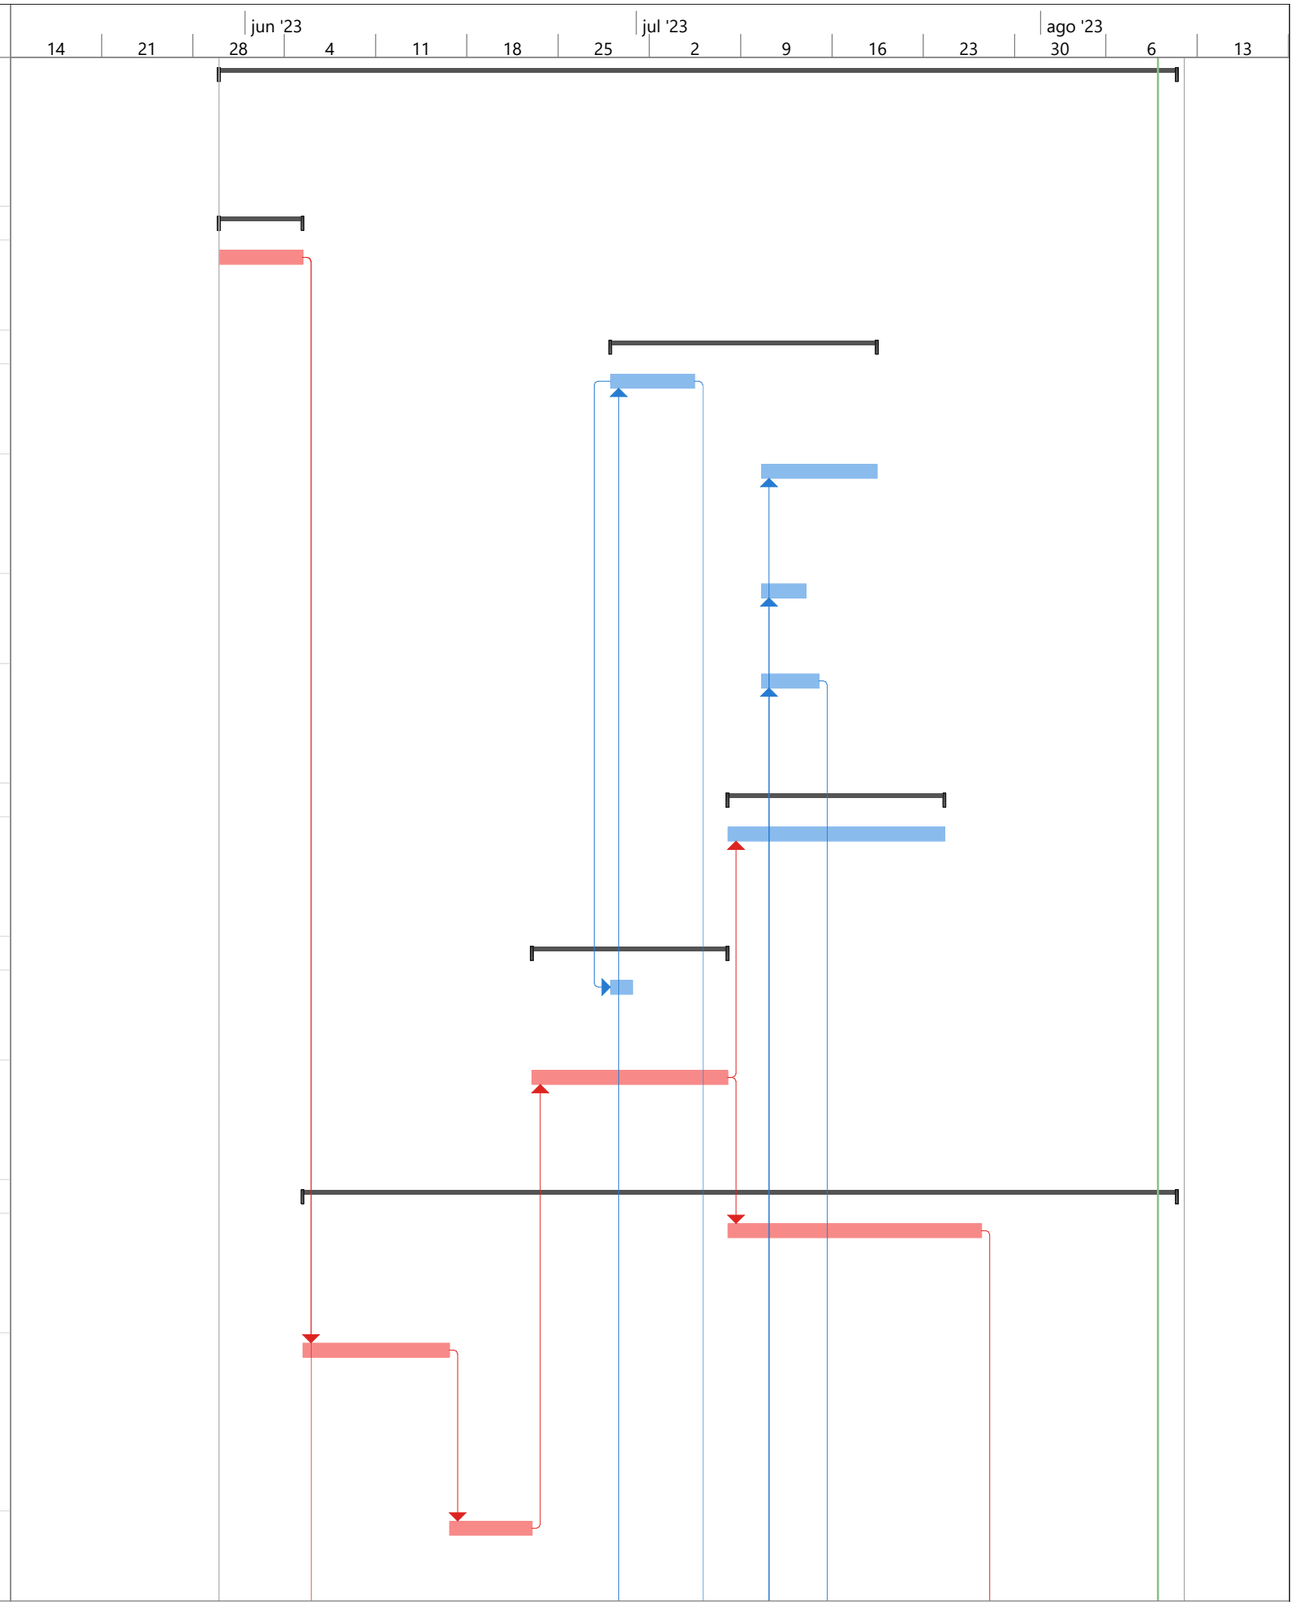

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
36		Suministro, transporte y colocación de lavamanos para discapacitados	1 día	lun 31/07/23	mar 1/08/23	26
37		Suministro, transporte y colocación de orinal mediano,	1 día	lun 31/07/23	mar 1/08/23	26
38		Suministro e instalacion de barras para baño discapacitados en acero inoxidable	1 día	lun 31/07/23	mar 1/08/23	26
39		s.t. e. i de meson en acero inoxidable (0,60 x L= Variable)	1 día	lun 31/07/23	mar 1/08/23	26
40		**ELECTRICIDAD**	**5 días**	**lun 31/07/23**	**sáb 5/08/23**	
41		Suministro transporte e instalación de lampara tipo panel de 38 w 4200 lm 120v	5 días	lun 31/07/23	sáb 5/08/23	26

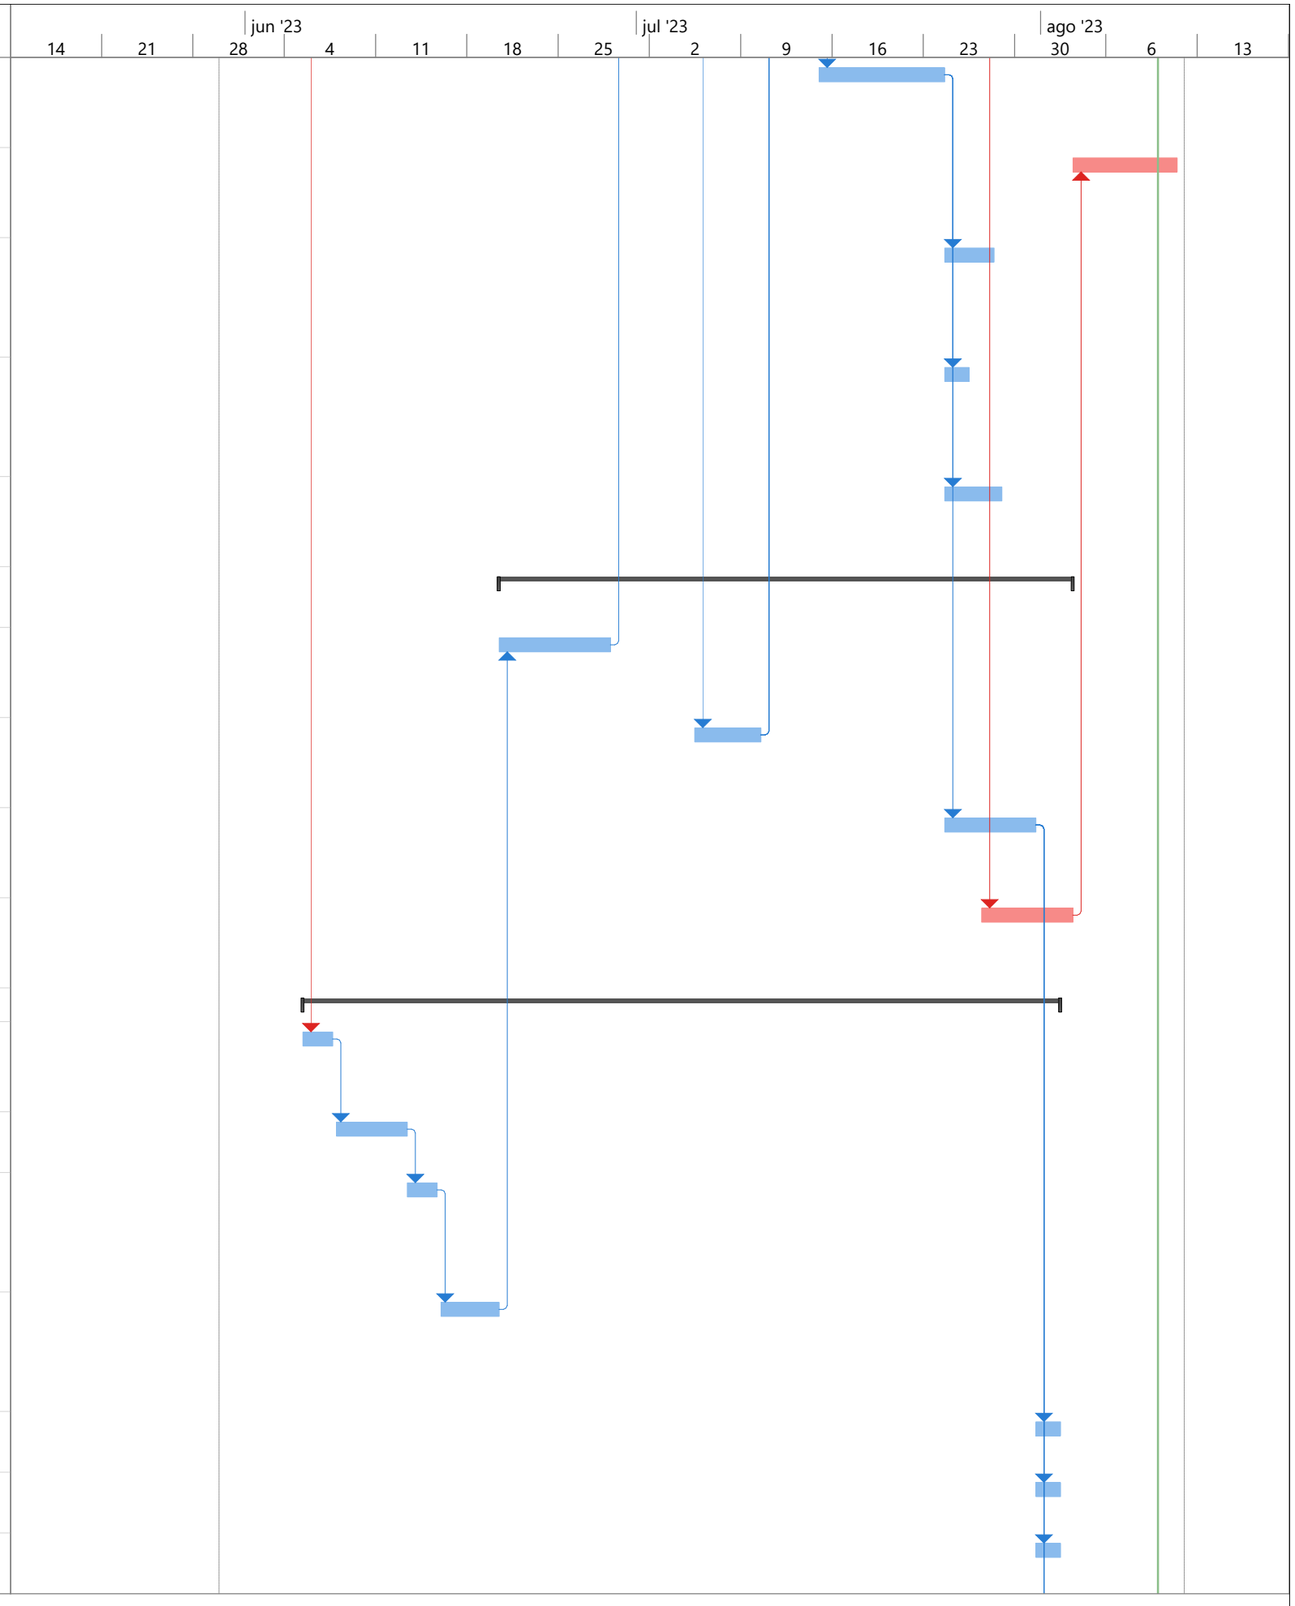
