ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	8-ene-26	**ACTA No.**	**66**
HORA DE INICIO:	9:00 a. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Contrato de obra 139-2025 Tecnico - Social

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

COMPROMISOS ACTA ANTERIOR

Item no previstos - Cambio de tuberia de concreto a Pvc - Novafort
grava para atraque - revisar observaciones realizadas por la Interventoría.

Item no previstos - Cambio de tuberia de concreto a Pvc - Novafort
Estaba para el 16 de diciembre el contratista solicita plazo para entrega el 13 de enero 2026

Grava para atraque - revisar observaciones realizadas por la Interventoría.
Se informa por el contratista que remite el 13 de enero 2026

Entrega de resultados estabilizantes evaluados

Se informa por Interventoría que no se ha recibido los resultados de los ultimos ensayos realizados los cuales estaban para entrega el 19 dic 2025. Se informa por el contratista que está a la espera de los resultados por el laboratorio, se consulta por Interventoría en relacion a los resultados de los ensayos de campaña para estabilización mantenimiento con estabilizantes tradicionales, se informa por el contratista que se inicia campaña, esta semana se realizarian mointaje de provetas y la proxima semana iniciarian ensayos y para entrega de resultados se indica que se debe hablar con los especialistas para analisis y posterior entrega de resultados pendiente indicar fecha de entrega.

Informe de diseño - fase 2

Se recibe el informe por parte del contratista el día 26 de diciembre 2025, se informa por interventoría que por parte de los especialistas el día de ayer 7 de enero se recibieron observaciones por parte de los eespecialistas la Interventoria analizara internamente el producto entregado a detalle, y se convocará al contratista para mesa de trabajo.
El contratista informa que solicita mesa de trabajo con especialistas ICCU, Interventoría informa que se realizara reunión con especiliastas para mayor aclaracion a ese tema.

Informe - fase 1 - caracterización -
Se informa por Interventoría que se remitió el comunicado ICCU-S-394-2025 con observaciones de forma, se informa por el contratista que revisara y que solicita si es posible remitir las observaciones en comunicado y no sobre el informe como comentarios por que se puede pasar. entrega 15 enero 2026.

Presentación hojas de vida profesionales faltantes - SST
Se informa por el contratista que el día 14 de enero 2026 se informará acerca del tema ya que el área administrativa se encuentra en vacaciones por temporada.

Inicio alcantarillas Chocontá - contratista informa problemas con subcontratista contratado.
Se informa por el contratista que el dia 14 o 15 de enero se informara acerca de inicio de Chocontá y Sesquilé.

Se informa por Interventoría que el día de ayer se hizo recorrido en Almeidas y se menciona que en Manta la cinta de señalización se ha caido por lo que se solicita revisión y ajustar.

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

Ubaté compromiso de terminar obras de encole y descole
Se informa que la alcantarilla 6 se detuvo intervención por solicitud de la comunidad, se informa por Interventoría que se hace referencia al reinicio de alcantarillas el 13 de enero segun compromiso con comunidad, se informa por el contratisyta que se continua con esta programación.

Vallas - instalacion
Pte entrega programación vallas, se recibió Rio negro en el periodo unicamente.

Acta del segundo 25% de caracterización por presentar Rta. observaciones - contratista - Se tenia el compromiso para el 17 dic 2025. Se remite en la semana del 13 al 16 de enero 2026.

Seguimiento tramo - simijaca -
Se informa por el contratista que en el comité pasado se habló acerca de actividades de mantenimiento que hizo la alcaldia, se informa que no afectó el tramo piloto.
Se informa por Interventoría que en reunion con comunidad y alcaldia y se acordó tener una nueva reunión para que este presente el ICCU por solicitud de la alcaldia. Se inform por ICCU que sería posterior al 15 de enero. Se informa por el contratista mejor dejarla para cuando ya se tenga mayor información del proyecto. Se informa por interventoria que se informe al àrea social para que esten enteradas por si se solicita información por la comunidad.
Esta pendiente respuesta por parte del contratista del ensayo de placa se informa que se remitira el día semana del 13 al 16 de enero 2026.

Solicitud Alcaldía Topaipi - Perdida de banca - en dos sectores de alcantarillas - contratista remitió información -
reunion propuesta para viernes 9 ene 2025 el contratista confirma hora.

Entrega de información de topografía.
-Se encuentra pendiente observaciones a la topografia entregada de villagomes y la palma entregan semana del 13 al 16 de enero 2026.

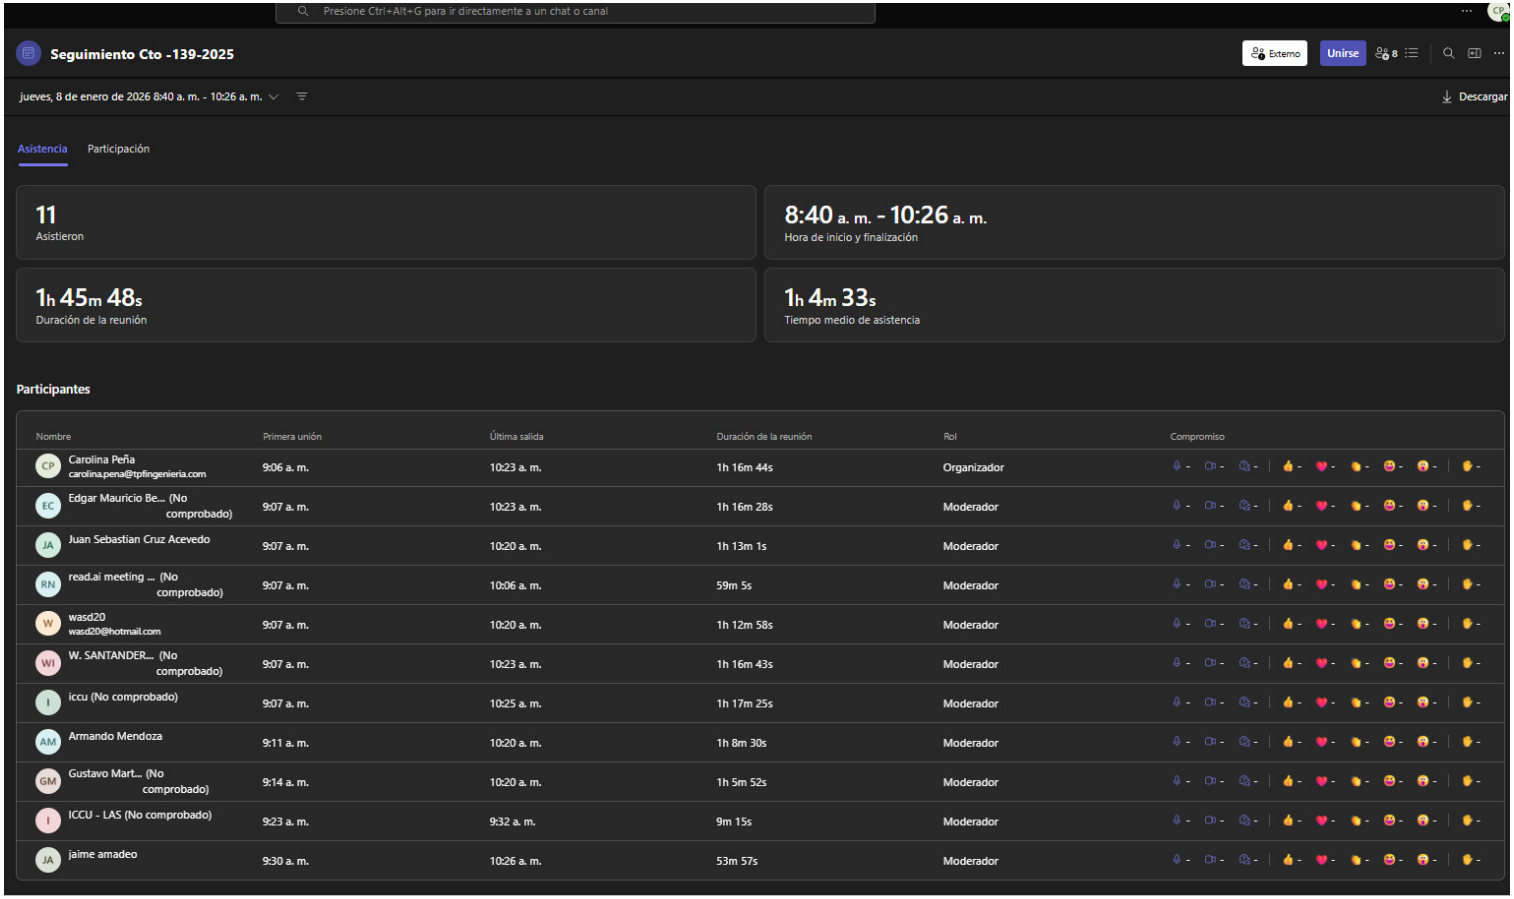
Entrega de información de topografía.	La Palma - Entregó parcial Villagómez 13/nov/2025 Topaipí y Yacopí inicia semana del 17/nov/2025 Tausa – Por definir por el contratista inicia topografia semana del 13 enero 2026. Ubaté - Por definir por el contratista Chocontá – Por definir por el contratista - informan están consiguiendo equipo. Sesquilé – Por definir por el contratista - informan están consiguiendo equipo. Manta - Levan 5km informan que estarán realizando trabajo de oficina para entrega a Inteventoría.

Se consulta por Interventoría si se reinicia actividades de campo el 13 de enero por parte del contratista se confirma por el contratista que sigue de acuerdo a lo programado.

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Item no previstos - Cambio de tuberia de concreto a Pvc - Novafort grava para atraque - revisar observaciones realizadas por la Interventoría.	13-ene-26
Entrega de resultados estabilizantes evaluados	Contratista no indica fecha de entrega, hablará con especialistas para dar fecha de entrega
Informe de diseño - fase 2 - Interventoria esta revisando internamente con sus especialistas y solicitará reunión con contratista	por establecer mesa de trabajo

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

Informe - fase 1 - caracterización -	15-ene-26
Presentación hojas de vida profesionales faltantes - SST	14 ene 2025 informa el contratista.
Inicio alcantarillas Chocontá - contratista informa problemas con subcontratista contratado.	14 y 15 ene 2026 se informará
Se informa por Interventoría que el día de ayer se hizo recorrido en Almeidas y se menciona que en Manta la cinta de señalización se ha caido por lo que se solicita revisión y ajuste.	13-ene-26
Ubaté compromiso de terminar obras de encole y descole	Inicio 13 de enero 2026
Vallas - instalacion Pte entrega programación vallas, se recibió Río Negro en el periodo unicamente.	semanal del 13 al 16 ene 2026
Acta del segundo 25% de caracterización	semana del 13 al 16 de enero 2026.
Seguimiento tramo - simijaca - Queda pte. reunión con alcaldia comunidad interventoria contartista e ICCU, de acuerdo a los compromisos de la última reunión sostenida en campoo con comunidad.	Seguimiento
Respuesta a observaciones ensayo de placa - simijaca -	semana del 13 al 16 de enero 2026.
Solicitud Alcaldía Topaipi - Perdida de banca - en dos sectores de alcantarillas -	mesa de trabajo - viernes 9 ene 2026
Entrega de información de topografía. -Se encuentra pendiente observaciones a la topografia entregada de villagomes y la palma.	semana del 13 al 16 de enero 2026.
Entrega de información de topografía.	La Palma - Entregó parcial Villagómez -Entregó Topaipí y Yacopí- pte. inicio Tausa – Por definir por el contratista inicia topografia semana del 13 enero 2026. Ubaté - Por definir por el contratista Chocontá – Por definir por el contratista - informan están consiguiendo equipo. Sesquilé – Por definir por el contratista - informan están consiguiendo equipo. Manta - Levan 5km informan que estarán realizando trabajo de oficina para entrega a Inteventoría.
Se consulta por Interventoría si se reinicia actividades de campo el 13 de enero por parte del contratista se confirma por el contratista que sigue de acuerdo a lo programado.	13-ene-26
ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión. (Imagen de asistentes a la reunión virtual)	


Presione Ctrl+Alt+G para ir directamente a un chat o canal
Seguimiento Cto -139-2025
Externo
Unirse
8
jueves, 8 de enero de 2026 8:40 a. m. - 10:26 a. m.
Descargar
Asistencia
Participación
11
Asistieron
8:40 a. m. - 10:26 a. m.
Hora de inicio y finalización
1h 45m 48s
Duración de la reunión
1h 4m 33s
Tiempo medio de asistencia
Participantes
Nombre
Primera unión
Última salida
Duración de la reunión
Rol
Compromiso
CP Carolina Peña carolina.pena@tpfingenieria.com 9:06 a. m. 10:23 a. m. 1h 16m 44s Organizador
EC Edgar Mauricio Be... (No comprobado) 9:07 a. m. 10:23 a. m. 1h 16m 28s Moderador
JA Juan Sebastian Cruz Acevedo 9:07 a. m. 10:20 a. m. 1h 13m 1s Moderador
RN read.ai meeting ... (No comprobado) 9:07 a. m. 10:06 a. m. 59m 5s Moderador
W wasd20 wasd20@hotmail.com 9:07 a. m. 10:20 a. m. 1h 12m 58s Moderador
WI W. SANTANDER... (No comprobado) 9:07 a. m. 10:23 a. m. 1h 16m 43s Moderador
I iccu (No comprobado) 9:07 a. m. 10:25 a. m. 1h 17m 25s Moderador
AM Armando Mendoza 9:11 a. m. 10:20 a. m. 1h 8m 30s Moderador
GM Gustavo Mart... (No comprobado) 9:14 a. m. 10:20 a. m. 1h 5m 52s Moderador
I ICCU - LAS (No comprobado) 9:23 a. m. 9:32 a. m. 9m 15s Moderador
JA jaime amadeo 9:30 a. m. 10:26 a. m. 53m 57s Moderador
