FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

DATOS GENERALES							
Número de acta		CUATRO (4)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de Infraestructura Física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	FRENTE 37. VEREDA LA FLORIDA. COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO	**Fecha:**	12/12/24	**Hora Inicio:**	2:30 PM	**Hora Finalización:**	4:00 PM
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA Nº4			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	WILLIAM H AMAYA Z	**Convocada por:**		GERMAN RAMIREZ BARBOSA			
Objetivo de la reunión:	VISITA A LOS FRENTES 37 Y 43 DE SAN ANTONIO DE PRADO PARA VERIFICAR AVANCE DE LAS OBRAS, REVISAR ESTADO DE LAS ACTAS DE CORTE QUE DEBEN ENTREGAR CONTRATISTA E INTERVENTORIA PARA EMITIR PRIMERA FACTURA, VERIFICAR CIERRE DE COMPROMISOS Y PENDIENTES .						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISION FRENTE 37. VEREDA LA FLORIDA, COMUNA 80, MEJORAMIENTO DE 106,5 METROS
2	REVISION FRENTE 43 CENTRALIDAD DE LA COMUNA 80. LOS MESAS, MEJORAMIENTO DE 80 METROS
3	REVISION PRIMERAS ACTAS Y FACTURAS TANTO DE OBRA COMO DE INTERVENTORIA
4	CIERRE DE COMPROMISOS DEL ACTA DE COMITÉ No.3.
5	

DESARROLLO TEMÁTICO

1. Se inspecciona la vía de La Florida, donde se terminó el fresado de los 106,5 metros, esta actividad se realizó los días 10 y 11 de diciembre, se revisa la vía y se observan dos fallos, se le solicita al contratista la reparación de los dos fallos y terminar de nivelar los sitios donde la fresadora no pudo cortar, especialmente en las cajas y pozos existentes.
2. Al momento de fresar en el tramo de La Florida se encontró una caja aparentemente del sistema de aguas potable, se informó a las entidades y estamos a la espera de la respuesta.
3. A continuación, se realiza recorrido por la vía del frente 43 de Los Mesas, que es la siguiente via en fresar y de acuerdo con la recomendación de INTEINSA solo se fresaran los parches que dejo la instalación de una

tubería y luego de pavimentarlos se aplicara una sobre carpeta de 10 centímetros, se recomienda colocar la carpeta completa y luego subir las cámaras y sumideros, se deben cambiar dos rejillas.

4. Se reviso el avance de las actas las cuales deben ser enviadas hoy mismo con la respectiva factura por que mañana 13 de diciembre se hace el cierre contable y solo hasta esa fecha se reciben facturas del año 2024.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMITÉ No. 4





INSPECCION FRENTE 37, VEREDA LA FLORIDA. FINALIZA FRESADO, SE OBSERVA UNA CAJA ENTERRADA





INSPECCION FRENTE 37, LA FLORIDA. SE OBSERVAN DOS FALLOS EN LA VIA, UNO EN LA CALLE 56 sur No. 75-120





INSPECCION FRENTE 37, VEREDA LA FLORIDA. FINALIZA FRESADO, SE OBSERVAN DOS FALLOS EN LA VIA





INSPECCION FRENTE 37, VEREDA LA FLORIDA. FINALIZA FRESADO Y LA FRESADORA SE TRASLADA A LOS MESAS





INSPECCION VIA CENTRALIDAD FRENTE 43, LOS MESAS, MEJORAMIENTO 80 m. LLEGA FRESADORA

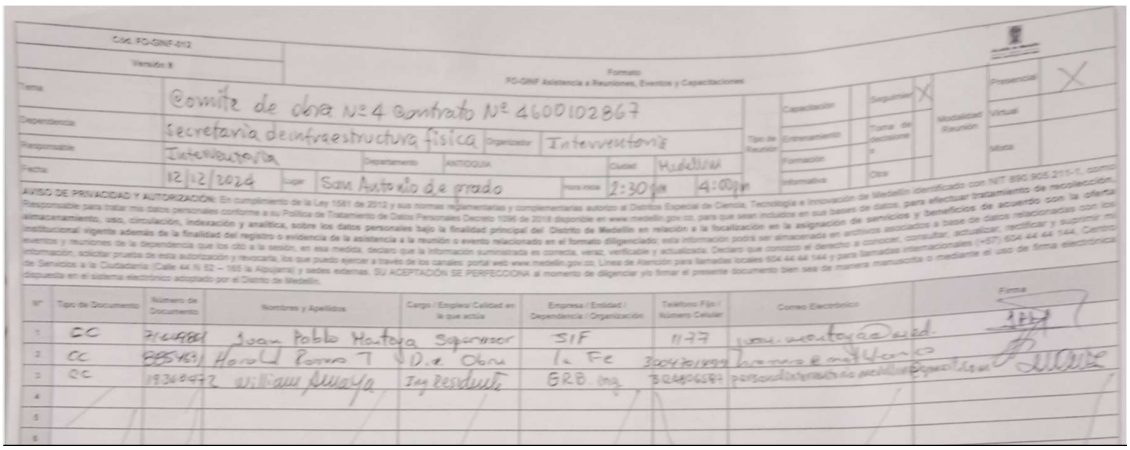


COMPROMISO DEL ACTA ANTERIOR. EL RETIRO DE 3 VIAJES DEJADOS EN LA VIA A ASTILLERO Y ENTREGADOS AL EQUIPO DE LA ALCALDIA QUE ESTA REALIZANDO MANTENIMIENTO A ESTA VIA

CONCLUSIONES	
1	Luego del recorrido por el frente 37, Vereda La Florida, se recomiendan varias cosas: • Informar a las dependencias de servicios sobre la caja encontrada para saber si está en uso. • Reparar los dos fallos que se presentan en el tramo, retirando mínimo 30 centímetros del material saturado y colocando base compactada al 95% del Proctor modificado. • Nivelar los puntos donde no corto la fresadora para garantizar que la capa a instalar sea uniforme. • Informar a la interventoría un día antes de la aplicación de la mezcla para programar al laboratorio para la toma de muestras.
2	En el frente 43 de Los Mesas se descarga la fresadora, se revisa que todas las actas de vecindad y entorno estén tramitadas y así se autoriza dar inicio al fresado de las áreas sugeridas por la empresa INTEINSA y a los baches que se fresen se les aplicara mezcla MDC-19 para luego aplicar la sobre carpeta de 10 centímetros.
3	Se debe aplicar la carpeta completa y luego levantar las cajas y sumideros al nuevo nivel, tanto los marcos como las tapas deben ser las recomendadas por norma.
4	Se recibe la formula ajustada de la mezcla MDC-19, producida por Agregados y Asfaltos Antioquia y analizada por parte de la empresa AIM, también se recibe el concepto de INTAINSA donde confirma que cumple con el porcentaje de vacíos entre 3% y 5% para capas de rodadura y demás componentes, por lo tanto, se autoriza para ser aplicada en los tramos de La Florida y Los Mesas, igualmente se tomaran las muestras en sitio al momento de irlas a aplicar
5	De los compromisos del acta anterior se cerraron los siguientes: • Se recibe la formula ajustada de la mezcla MDC-19 elaborada por la firma AIM. • Se recibe concepto técnico del diseño de mezcla MDC-19. Elaborada por INTEINSA. • Se retiran los tres viajes dejados provisionalmente en la via a Astillero y se entregan al equipo de la alcaldía que esta haciendo el mantenimiento de esta via.
6	
7	
DOCUMENTOS ANEXOS	

1	Registro de asistencia al comité.
2	Informe diseño mezcla asfáltica MDC-19.
3	Concepto técnico revisión diseño de mezcla tipo MDC-19

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Enviar las primeras actas y facturas tanto de obra como de interventoría	Directores obra e interventoría	12/12/24
Se requiere que el contratista envíe las formulas de trabajo de las otras mezclas que se van a utilizar en el proyecto como son MAM-25, MSC-19 + FRIBRA y la MGC-38.	Interventoría	18/12/24


Comité de obra N°4 Contrato N° 4600102867
Secretaría de infraestructura física
Interventoría
12/12/2024
San Antonio de prado
2:30 pm
4:00 pm

Asistencia cuarto comité de obra 12/12/2024

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	17/12/2024. En los frentes 41N, 37 Y 43.

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Cargo/Empleo	Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización
Ing. Juan Pablo Montoya	Ing. Supervisor SIF	S. I. F.
Ing. William H Amaya Z	Residente interventoría	GRB ingenieros
Ing. Harold Romero	Director obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 13/12/2024



WILLIAM H AMAYA Z.
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa
