INFORME No. 02

CONTRATO:	**339**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO**	**C.C No.**	**7.166.766**
OBJETO:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**FEBRERO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
301.682.612,00	199.699.255,00	FEBRERO DE 2026	101.983.357,00	FE -138
	101.983.357,00	FEBRERO DE 2026	0,00	FE -139

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 339 DE 2026

HACE CONSTAR:

Que: **ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO,** DURANTE EL MES DE **FEBRERO DE 2026, SUMINISTRO E INSTALO MUEBLES HOSPITALARIOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS** DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO N RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo con lo estipulado en el objeto del contrato, tal como lo certifican el Profesional Líder de Mantenimiento de la institución y la Coordinadora de Almacén de la institución, relacionados en el Comprobante de Ingreso a Almacén No. 2971 en el cual se detallan todos y cada uno de los elementos suministrados por el contratista, el Acta Final, y el Informe con Registro Fotográfico presentado por el contratista, documentos adjuntos a la presente.

PERSONA NATURAL			PERSONA JURÍDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL			FACTURA	X	
CUENTA DE COBRO			CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA	X	
INFORME DE ACTIVIDADES			CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	X	
			INFORME DE ACTIVIDADES		

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($ 101.983.357.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, febrero de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato

C.C. Carpeta del Contrato.
/**Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002971

Señores: SOLER SALCEDO ARMANDO JAVIER Nro. Doc/Factura: FE-139 Fecha Factura: 2026/02/24

NIT/C.C.: 7166766 Señor (a): SOLER SALCEDO ARMANDO JAVIER Fecha: 2026/02/24

Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO

Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PM2347	PU1	ARCHIVADOR BAJO VENTANA 1.40M DE LARGO X 40 CM DE FONDO X 81CM DE ALTURA DOS PUERTAS CORREDERA	UN	1.00	800,000.00	152,000	952,000
PM2345	PU1	BARRA 1.50M DE MLARGO CON SISTEMA CLICK	UN	1.00	600,000.00	114,000	714,000
PM2350	PU1	CAJONERA PARA IMPRESION	UN	2.00	500,000.00	190,000	1,190,000
PM2361	PU1	CORREDERAS EN PAR PARA CAJONES EN MUEBLE	UN	20.00	25,000.00	95,000	595,000
PM2357	PU1	CORTINAS ROLLABLES SCREEN	UN	116.00	112,900.00	2,488,316	15,584,716
PM2321	PU1	ESCRITORIO CON FALDON Y BASE METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2X2	UN	2.00	782,500.00	297,350	1,862,350
PM2348	PU1	ESCRITORIO CON FALDON Y BASE METALICA EN TUBO CUADRADO DE 2X2	UN	2.00	950,000.00	361,000	2,261,000
PM2349	PU1	ESCRITORIO GERENCIAL	UN	1.00	1,500,000.00	285,000	1,785,000
PM2362	PU1	FORMICA PARA ESPALDAR DE MUEBLE	UN	1.00	500,000.00	95,000	595,000
PM2355	PU1	GABINETE AEREO CON BISAGRAS Y BRAZOS HIDRAULICOS	UN	2.00	682,000.00	259,160	1,623,160
PM2342	PU1	GABINETE AEREO DE 1M DE LARGO X 41CM DE ALTURA X 32CM DE FONDO CON TAPA	UN	4.00	682,000.00	518,320	3,246,320
PM2353	PU1	MESA DE 46CM DE FRENTE X 39CM DE FONDO 65CM DE ALTURA CON PUERTAS	UN	1.00	600,000.00	114,000	714,000
PM2346	PU1	MESA PARA SOPORTE DE AGUA 65CM DE ALTURA 40CM DE LARGO 51CM DE FONDO CON UNA PUERTA	UN	1.00	800,000.00	152,000	952,000
PM2354	PU1	MUEBLE AEREO DE 80CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTURA CON BISAGRA Y BRAZO HIDRAULICO	UN	1.00	500,000.00	95,000	595,000
PM2343	PU1	MUEBLE ARCHIVADOR BAJO TELEVISOR 1.20M DE LARGO X 50CM DE ANCHO Y 40 CM DE FONDO DOS PUERTAS	UN	1.00	1,000,000.00	190,000	1,190,000
PM2356	PB1	MUEBLE DE LAVADO DE MANOS INCLUYE AREA DE LAVADO EN ACERO INOXIDABLE	UN	1.00	5,500,000.00	1,045,000	6,545,000
PM2352	PU1	PUERTA MACIZA EN MELAMINA CANTONEAADAS EN RIGIDO CON CHAPA	UN	1.00	800,000.00	152,000	952,000
PM2360	PU1	PUERTA PARA MUEBLE DE LAVA MANOS	UN	20.00	100,000.00	380,000	2,380,000
PM2358	PU1	PUERTA PLEGABLE COLOR BLANCA DE 3M X 2.40M DE ALTURA	UN	1.00	1,706,900.00	324,311	2,031,211
PM2341	PU1	PUESTO DE TRABAJO TIPO L DE 3.60M LARGO X 60CM DE FONDO X 70CM ALTURA	UN	1.00	850,000.00	161,500	1,011,500
PM2351	PU1	SILLA EJECUTIVA ESPECIAL	UN	1.00	1,300,000.00	247,000	1,547,000
PMT2988	PU1	SILLA SECRETARIALES DE HERRADURA	UN	10.00	609,000.00	1,157,100	7,247,100
PM2359	PU1	SILLA TIPO EJECUTIVA	UN	1.00	600,000.00	114,000	714,000

ALMACEN GENERAL

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

COMPROBANTE DE INGRESO

C2 - COMPROBANTE INGRESO ALM SOC Número: 0002971

Señores: SOLER SALCEDO ARMANDO JAVIER
NIT/C.C.: 7166766 Señor (a): SOLER SALCEDO ARMANDO JAVIER
Servicio: AG01 - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: FE-139 Fecha Factura: 2026/02/24
Fecha: 2026/02/24
Concepto: 035 - ENTRADA ALMACEN X O. CONTRATO
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	GRU	NOMBRE GENERICO	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	I.V.A.	VALOR NETO
PM2344	PU1	SILLAS UNIVERSITARIAS TAPIZADAS EN PRANA	UN	120.00	320,000.00	7,296,000	45,696,000
						16,283,057	101,983,357

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
15149001	Internacional	Internacional	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,438,357	0	0
16350301	Ambas	Internacional	MUEBLES - ENSERES EQ OF	6,545,000	0	0
24010101	Ambas	Internacional	PROVEEDORES	0	98,683,895	0
24362501	Ambas	Internacional	RETE/IVA RESPONSABLES DE IVA	0	2,442,459	16,283,057
24362704	Ambas	Internacional	DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	0	857,003	85,700,300
			TOTAL INTERNACIONAL	101,983,357	101,983,357	
			TOTAL LOCAL	0	0	

Contrato:

ALMACENISTA GENERAL

Fecha :2026/02/24 Hora: 17:18:21 Usuario:jeseniam Terminal:*

Periodo: 2026/02 - civmov 8.0.43

HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael de Tunja

San Rafa
Alma, vida y corazón.

OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CONTRATANTE: E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

CONTRATISTA: ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO

SUPERVISOR: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

FECHA: 24 de febrero 2026

VALOR INICIAL: $ 301.682.612.00

FECHA DE INICIO: 03 DE FEBRERO DE 2026

PLAZO: HASTA 28 DE FEBRERO DE 1026

ACTA FINAL

CTO: 339 DE 2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES ORIGINALES		ACTA PARCIAL # 1		PRESENTE ACTA	
				V.UNIT	V.TOTAL	V.UNIT	V.TOTAL	V.UNIT	V.TOTAL
	AREA GINECOLOGÍA								
1	Suministro e instalación de 13 de puertas macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras y protectores para camilla	UNIDAD	13	$ 1.300.000,00	$ 16.900.000,00	13,00	$ 16.900.000,00		$ -
2	Suministro e instalación de 6 de puertas macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	6	$ 1.100.000,00	$ 6.600.000,00	6,00	$ 6.600.000,00		$ -
3	Suministro e instalación de 1 de puerta para sala de descanso maciza en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	1,00	$ 1.100.000,00		$ -
4	Suministro a instalación da 1 de puarta corrediza para cuarta de equipos con manijas, rieles, maciza en melamina cantoneadas en rígido con Chapa.	UNIDAD	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	1,00	$ 1.100.000,00		$ -
5	Suministro e instalación de 6 de puertas para baños macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	6	$ 1.100.000,00	$ 6.600.000,00	6,00	$ 6.600.000,00		$ -
6	Suministro e instalación da 10 de closet dividido en cuatro puertas en bisagras en melamina 15 mm y canto rígido madidas aproximadas de 67 cm x 2.45 m de altura.	UNIDAD	10	$ 975.000,00	$ 9.750.000,00	10,00	$ 9.750.000,00		$ -
7	Suministro e instalación da estación de enfermería con publicidad de aviso iluminados en luz led, en melamina reengruesada y complementado en lamina de alto brillo medidas de 3.65 m de largo x 1.13 m de altura x 65 cm de fondo con cajonera de 3 gavetas de 45 cm x 70 cm de altura y correderas de 45 mm semipesada y cuerpo externo de 2.18 m de largo x 1.13 de altura x 21 cm de fondo.	UNIDAD	1	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	1,00	$ 10.000.000,00		$ -
8	Suministro e instalación de puesto de trabajo frente a cuarto ropa sucia externo de 3.65 m de largo x 60 cm de altura con cajonera de 3 gavetas de 64 cm x 40 cm con puertas bisagras y gabineta, en melamina reengruesada y pasacables, con soporte y pie de amigos.	UNIDAD	1	$ 950.000,00	$ 950.000,00	1,00	$ 950.000,00		$ -
9	Suministro e instalación de mueble tipo armario de 2.46 m de altura x 72 cm do ancho cuatro entrepaños, dos puertas, bisagras y manija, en melamina y enchapado en canto rígido en cuarto ropa timpia.	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00		$ -
10	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 59 cm de ancho x 42 cm de altura y 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rigido en cuarta ropa limpia.	UNIDAD	1	$ 550.000,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00		$ -
11	Suministro e instalación de modulo de almacenamiento superior de 5.14 m de largo x 71 cm de altura x 23 cm de fando 14 puertas bisagras, entrepañas esquineros, en melamina de 15 mm y enchapado on canto rígido en cuarto trabajo limpio.	UNIDAD	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00		$ -
12	Suministro e instalación de módulo de almacenamiento inferior do 3.17 m de largo x 79 cm de altura x 60 cm de fondo con 4 cajones principalos x 62 cm de frente, 2 puertas con bisagras, 8 cajones secundarios y terciarios x 62 cm x 30 cm todos los cajonos con correderas de 45 tipo semipasado en melamina de 15 mm y enchapado en canto rigido en cuarto trabajo limpio.	UNIDAD	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00		$ -
13	Suministro e instalación de 2 puestos de trabajo de 1.20 m x 60 cm en melamina 15 mm canto rígido, pie de amigos, pasacables coordinación enfermería.	UNIDAD	2	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00	2,00	$ 1.000.000,00		$ -
14	Suministro e instalación de 2 gabinetes aéreos x 79 cm de largo x 32 cm de fondo y 42 cm de altura en melamina de 15 mm en canto rígido en Rh, con bisagras y brezos hidráulicos. Un gabinete incluye chapa de seguridad en oficina coordinación enformoría.	UNIDAD	2	$ 682.000,00	$ 1.364.000,00	2,00	$ 1.364.000,00		$ -
15	Suministro e instalación de 1 mueble archivador 2.12 m de altura x 68 cm do ancho y 33 cm de fondo, 2 puertas, tres entrepaños, puerta con bisagras en melamina de 15 mm canto rígido en rh en oficina de coordinación enfermería.	UNIDAD	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	1,00	$ 1.100.000,00		$ -
16	Suministro e instalación de 6 entrepaños con espaldar en melamina reengruesada da 15 mm en canto rigido en rh en cuarto de equipos.	UNIDAD	6	$ 250.000,00	$ 900.000,00	6,00	$ 900.000,00		$ -

17	Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo L de 5.47 m largo x 67 cm de fondo x 65 cm de altura con cajonera en melamina reengruesada y pasacables, con soporte y pie de amigos cuarto de médicos.	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00		$ -
18	Suministro e instalación de 2 gabinetes aéreos de 80 cm de altura x 42 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto de médicos.	UNIDAD	2	$ 662.000,00	$ 1.364.000,00	2,00	$ 1.364.000,00		$ -
19	Suministro e instalación de 1 gabinete areo de 1.48 m de largo x 41 cm de altura x 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto de aseo.	UNIDAD	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00		$ -
20	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo escalera con manijas, correderas, entrepaños en rh en melamina de 15 mm. (P)	UNIDAD	1	$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	1,00	$ 2.800.000,00		$ -
21	Suministro e instalación de mueble de vacunación vertical de 1.50 m altura x 40 cm de ancho (P)	UNIDAD	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -
22	Suministro e instalación de mueble para área de oficina de médicos cajonera debajo área de trabajo en melamina de 15 mm rh (P)	UNIDAD	1	$ 450.000,00	$ 450.000,00	1,00	$ 450.000,00		$ -
				AREA GINECOLOGÍA IAMII					
23	Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo L de 3.60 m largo x 60 cm de fondo x 70 cm de altura en melamina reengruesada y pasacabtes, con soporte y pie de amigos cuarto de IAMII	UNIDAD	1	$ 850.000,00	$ 850.000,00		$ -	1,00	$ 850.000,00
24	Suministro e instalación de 4 gabinetes aéreos de 1.00 m de largo x 41 cm de altura x 32 cm de fondo con tapa, bisagras y brazo hidráulico. En melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh cuarto de IAMII	UNIDAD	4	$ 682.000,00	$ 2.728.000,00		$ -	4,00	$ 2.728.000,00
25	Suministro e instalación de mueble archivador bajo televisor 1.20 m de largo 50 cm de fondo y 40 cm de fondo, dos puertas externas, chapa de seguridad, tres cajones internos y cajón central al vacío con niveladores, manijas y bisagras cuarto de IAMII	UNIDAD	1	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00		$ -	1,00	$ 1.000.000,00
26	Suministro de sillas universitarias tapizadas en prana	UNIDAD	19	$ 320.000,00	$ 6.080.000,00		$ -	19,00	$ 6.080.000,00
27	Suministro e instalación de barra 1.50 m de largo con sistema click en melamina de 15 mm enchapa en canto rigido	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00		$ -	1,00	$ 600.000,00
28	Suministro e instalación de mesa para soporte de agua 65 cm de altura 40 cm de largo y 51 cm de fondo con una puerta dos entrepaños, chapa de seguridad	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00		$ -	1,00	$ 800.000,00
29	Suministro e instalación de archivador bajo ventana 1.40 m de largo x 40 cm de fondo x 81 cm de altura con dos puertas corredera manija y entrepaños internos en melamina de 15 mm y enchapado en canto rígido rh	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00		$ -	1,00	$ 800.000,00
				AREA SALA DE CIRUGIA					
30	Suministro e instalación de 4 muebles tipo armario 2.04 m de altura x 79 cm de ancho de 44 cm de fondo dos puertas con bisagras y manijas. Cuatro entrepaños en melamina 15 mm rh y enchapado en canto rígido	UNIDAD	4	$ 1.150.000,00	$ 4.600.000,00	4,00	$ 4.600.000,00		$ -
31	Suministro de instalación 2 puertas para sala de cirugía 85.5 cm x 2.95 de altura y 59.5 cm x 2.9 en melamina chapas y marcos	UNIDAD	2	$ 850.000,00	$ 1.700.000,00	2,00	$ 1.700.000,00		$ -
				AREA RADIOLOGIA					
32	Suministro e instalación de 2 puertas macizas en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras	UNIDAD	2	$ 1.100.000,00	$ 2.200.000,00	2,00	$ 2.200.000,00		$ -
33	Suministro e instalación de 1 puerta macizas entrada principal en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras y manija y protector de camilla.	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00		$ -
				ÁREA LABORATORIO					
34	Suministro e instalación de 1 puerta entamborada personal de laboratorio con manija y chapa tapa luz.	UNIDAD	1	$ 850.000,00	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00		$ -
35	Suministro de instatación de mueble de 80 cm de ancho x 85 cm de altura 2 puertas y entrepaños cuarto de descanso.	UNIDAD	1	$ 700.000,00	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00		$ -
36	Suministro e instalación de mueble aéreo de 80 cm de ancho x 40 cm de altura con bisagras y brazo hidráulico en rh blanco.	UNIDAD	1	$ 682.000,00	$ 682.000,00	1,00	$ 682.000,00		$ -
37	Suministro e instalación de Gabinete aéreo aérea hematología 37 de fondo con doble puerta bisagras y entrepaños.	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00		$ -
38	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón aérea microbiología medias 1.88 m de frente x 83 cm de altura x 54 cm de fondo con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm en tipo L, y modulo inferior de 1.46 m de frente 88 cm de altura y 59 cm de fondo, dos puertas con correderas divisiones y entrepaños.	UNIDAD	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	1,00	$ 2.500.000,00		$ -
39	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón aérea deposito de reactivos con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000,00		$ -
40	Suministro e instalación de muebte debajo de lavamanos con cajonera 2 puertas correderas y manija medias 1.41 m x 51 cm en melamina de 15 mm rh en cato rígido.	UNIDAD	1	$ 850.000,00	$ 850.000,00	1,00	$ 850.000,00		$ -

41	Suministro e instalación de 3 módulos inferiores empatradas bajo mesón área pruebas especiales con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm medidas del primero 1.30 m de frente x 84 cm de altura x 58 cm de fondo. Para el segundo medidas de 2.21 m de frente x 58 cm de fondo x 84 cm de altura forma en tipo L cuatro puertas entrepaños. Y al tercero con medidas de 1.05 m de frente x 49 cm de fondo x 83 cm de altura, con dos puertas y entrepaños.	UNIDAD	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00		$
42	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón área aislamiento de muestras manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00		$
43	Suministro e instalación de soporte mueble área de lavado material en rh blanca melamina 15 mm en canto rigido 89 cm x 60 cm.	UNIDAD	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00		$
44	Suministro a instalación de masa soporte para computador en rh blanco en melamina 15 mm pasacables, pie de amigos en canto rigido.	UNIDAD	1	$ 200.000,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00		$
45	Suministro e instalación da mueble da recepción de muestras en rh blanco melamina de 15 mm, canto rigido.	UNIDAD	1	$ 400.000,00	$ 400.000,00	1,00	$ 400.000,00		$
46	Suministro e instalación de mueble de recepción de coloraciones en rh blanco melamina de 15 mm, canto rigido con puerta, bisagras.	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00		$
47	Suministro a instalación de puerta área de entrega de medicamantos can dos divisiones con basculante apoya brazos con tapa luz. Chapa de seguridad 2.56 m da altura x 1.07 de ancho.	UNIDAD	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$
48	Suministro e instalación de mueble tipo armario de medidas 1.15 m de frente x 2.02 de alto 2 puertas, con entrepaños y bisagras.	UNIDAD	1	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00		$
				AREA TESORERIA					
49	Suministro e instalación de puesto de trabajo de cuatro personas 4.03 m de largo x 63 cm de fondo con divisiones sobre la tapa de trabajo en melamina de 15 mm canto rigido.	UNIDAD	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	1,00	$ 3.500.000,00		$
50	Suministro e instalación de puesto de trabajo aérea frontal pegado a vantanilla 3.01 m de largo x 61 cm de fondo con dos cajonera en costados da tres gavetas con correderas de 45 mm melamina de 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00		$
51	Suministro e instalación de puesto da trabajo lateral 3.00 m de largo x 60 cm de fondo x 73 cm de altura con dos cajoneras al costado correderas de 45 mm divisiones en superficie de trabajo melamina de 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00		$
52	Suministro a instalación de tapa de gabinete aéreo con bisagras y brazos en melamina da 15 mm canto rígido.	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00	1,00	$ 500.000,00		$
53	Suministro e instalación de gabinete aéreo de 1.10 de largo x 46 cm de altura x 42 cm da fondo bisagras y brazo. Melamina da 15 mm y canto rígido.	UNIDAD	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00	1,00	$ 750.000,00		$
				ÁREA GASTROENTROLOGIA					
54	Suministro e instalación de 6 gabinetes aéreos con bisagras y brazos hidráulicos y divisiones intermedias de 93 cm x 41 cm x 33 cm en melamina de 15 mm en rh y canto rígido.	UNIDAD	6	$ 700.000,00	$ 4.200.000,00	6,00	$ 4.200.000,00		$
55	Suministro e instalación de puesto de trabajo tipo L de 6.07 de largo x 60 cm de fondo con pie de amigos, pasacablas en canto rígido Re engruesado en melamina de 15 mm rh.	UNIDAD	1	$ 1.750.000,00	$ 1.750.000,00	1,00	$ 1.750.000,00		$
56	Suministro e instalación de 2 escritorios con faldón y base metálica an tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rígido.	UNIDAD	2	$ 782.500,00	$ 1.565.000,00	2,00	$ 1.565.000,00		$
57	Suministro e instalación de 2 gabinetes aéreos e oficina medica con bisagras y brazos hidráulicos de 79 cm x 42 cm x 33 cm en melamina de 15 mm en rh y enchapado an canto rígido.	UNIDAD	2	$ 682.000,00	$ 1.364.000,00	2,00	$ 1.364.000,00		$
58	Suministro e instalación de muable tipo armario para cuarto ropa limpia de 2.00 m x 74 cm x 49 cm tres entrepaños con bisagras, puertas, niveladores y manijas	UNIDAD	1	$ 1.150.000,00	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00		$
59	Suministro a instalación de cinco antrepaños con espaldar para cuarto de insumos de 2.00m x 40 cm enchapado en canto rígido, melamina da 15 mm.	UNIDAD	5	$ 400.000,00	$ 2.000.000,00	5,00	$ 2.000.000,00		$
60	Suministro e instalación de gabinete aéreo para sala de procedimientos de 1.94 ancho x 42 cm de altura y 43 cm de fondo bisagras y brazos hidráulicos en canto rígido en melamina.	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00		$
61	Suministro e instalación de mueble para insumos diarios 2.10m de altura x 59 cm de fondo cuatre entrepaños puertas con bisagras y manijas, melamina y canto rigido.	UNIDAD	1	$ 1.150.000,00	$ 1.150.000,00	1,00	$ 1.150.000,00		$
62	Suministro e instalación de repisa con pie de amigo sisteme click para ubicar monitor en melamina, enchapada en canta rígida rh.	UNIDAD	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	1,00	$ 150.000,00		$

63	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón acero inoxidable 1.28 de frente 58 de altura x 48 de fondo área de procedimientos con manijas, correderas, entrepaños en rh blanco en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00		$ -
64	Suministro e instalación de mueble desinfectante alto nivel área de procedimientos 43 cm de frente 81 cm de altura y 58 cm de fondo tres cajones con correderas.	UNIDAD	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00	1,00	$ 750.000,00		$ -
	AREA CARDIO ADULTO								
65	Suministro e instalación de gabinete aéreo consultorio medico 90 cm de ancho x 42 cm de alto bisagras y brazos hidráuticos.	UNIDAD	1	$ 682.000,00	$ 682.000,00	1,00	$ 682.000,00		$ -
66	Suministro e instalación de 2 escritorios con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rígido.	UNIDAD	2	$ 782.500,00	$ 1.565.000,00	2,00	$ 1.565.000,00		$ -
67	Suministro e instalación de mueble 2.0 m de altura X 80 cm de alto x 88 cm de fondo con dos puertas entrepaños cuatro, en rh melamina enchapado en canto rígido.	UNIDAD	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00		$ -
68	Suministro e instalación de base en acero inoxidable de 80 cm x 55 cm de fondo en área de bodega.	UNIDAD	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00		$ -
	AREA CARDIO PEDIATRICA								
69	Suministro e instalación de 3 gabinete aéreo de 89 cm de largo x 42 cm de altura y fondo 32 cm de alto bisagras y brazos hidráulicos.	UNIDAD	3	$ 682.000,00	$ 2.046.000,00	3,00	$ 2.046.000,00		$ -
70	Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.20m x 60 cm con pasacables, en melamina enchapado en canto rígido.	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00		$ -
71	Suministro e instalación de mueble tipo cajonera tres cajones con corredera 38 cm de frente x 73 cm de altura y 58 cm de fondo, en melamina de 15mm enchapada en canto rígido.	UNIDAD	1	$ 550.000,00	$ 550.000,00	1,00	$ 550.000,00		$ -
72	Suministro e instalación de mueble bodega de 2.10 de altura x 81 cm de frente y 48 cm de fondo dos puerta bisagras y manijas en melamina de 15 mm enchapada en canto rígido.	UNIDAD	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00		$ -
73	Suministro e instalación de escritorio con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rígido.	UNIDAD	1	$ 782.500,00	$ 782.500,00	1,00	$ 782.500,00		$ -
74	Suministro de silla con doble recline tapizadas en prana	UNIDAD	5	$ 1.500.000,00	$ 7.500.000,00	5,00	$ 7.500.000,00		$ -
75	Suministro de silla con reclino individual tapizadas en prana	UNIDAD	1	$ 100.000,00	$ 100.000,00	1,00	$ 100.000,00		$ -
	AREA SALA ERA								
76	Suministro e instalación de estación de enfermería con publicidad de aviso iluminados en luz led, en melamina reengruesada y complementado en lamina de alto brillo medidas de 2.42 m de largo x 71 cm de altura x 65 cm de fondo más esquina de 85 cm con cajonera de 3 gavetas de 45 cm x 70cm de altura y correderas de 45 mm semipesada y cuerpo externo de 1.43 m de largo x 1.11 de altura x 21 cm de fondo.	UNIDAD	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00		$ -
77	Suministro e instalación de puesto de trabajo de 1.79m x 60 cm con pasacables tabla de apoyo interno a pared y pie de amigos , en melamina enchapado en canto rígido.	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00	1,00	$ 800.000,00		$ -
78	Suministro e instalación de dilatación para muro frente a lavamanos de 4.49 de largo x 15 cm de ancho.	UNIDAD	1	$ 350.000,00	$ 350.000,00	1,00	$ 350.000,00		$ -
79	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón acero inoxidable 2 tapes de costado 59 cm x 72 cm de altura x 53 de fondo cuatro puertas con bisagras, correderas, en rh en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 1.100.000,00	$ 1.100.000,00	1,00	$ 1.100.000,00		$ -
80	Suministro e instalación de 4 gabinetes aéreos de 94 cm de ancho x 41.5 cm de alto 32 cm de fondo bisagras y brazos hidráulicos.	UNIDAD	4	$ 700.000,00	$ 2.800.000,00	4,00	$ 2.800.000,00		$ -
81	Suministro e instalación de mueble ropa limpia 2.09 de altura 91 cm de ancho x 70 cm fondo reengruesado los cuatro entrepaños dos puertas bisagras y manijas melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00	1,00	$ 1.400.000,00		$ -
82	Suministro e instalación de mueble costado de puesto de trabajo 2.61 m de altura tipo maletero con cuatro puertas bisagras, manijas, y corredera en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 1.800.000,00	$ 1.800.000,00	1,00	$ 1.800.000,00		$ -
83	Suministro e instalación de puesto de trabajo frente a lavamanos con pasacables tabla de apoyo interno a pared y pie de amigos , en melamina enchapado en canto rígido.	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00		$ -
84	Suministro e instalación de modulo inferior empotrado bajo mesón acero inoxidable 2.82 m de frente 8 puertas 73 de altura x 53 de fondo cuatro puertas con bisagras, correderas, en rh en melamina de 15 mm.	UNIDAD	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	1,00	$ 1.500.000,00		$ -
	AREA DE COORDINACIÓN MÉDICA								

85	Suministro e instalación de escritorio con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchapado en canto rígido.	UNIDAD	2	$ 950.000,00	$ 1.900.000,00		$ -	2,00	$ 1.900.000,00
86	Suministro e instalación de escritorio gerencial	UNIDAD	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00		$ -	1,00	$ 1.500.000,00
87	Suministro e instalación de cajonera para impresión	UNIDAD	2	$ 500.000,00	$ 1.000.000,00		$ -	2,00	$ 1.000.000,00
88	Suministro de silla ejecutiva especial (P)	UNIDAD	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00		$ -	1,00	$ 1.300.000,00
89	Suministro e instalación de puerta maciza en melamina cantoneadas en rígido con chapa, bisagras.	UNIDAD	1	$ 800.000,00	$ 800.000,00		$ -	1,00	$ 800.000,00
90	Suministro de instalación de mesa 46 de frente x 39 de fondos 65 de altura con puertas, bisagras y entrepaños en melamina rh de 15 mm y enchapada en canto rígido.	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00		$ -	1,00	$ 600.000,00
	AREA DE NUTRICION								
91	Suministro e instalación de mueble aéreo de 80 cm de ancho x 40 cm de altura con bisagras y brazo hidráulico en rh blanco al lado oficina asignación de camas.	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00		$ -	1,00	$ 500.000,00
	AREA LABORATORIO INTRAPULMONAR								
92	Suministro e instalación de dos gabinetes aéreos con bisagras y brazos hidráulicos. (p)	UNIDAD	2	$ 682.000,00	$ 1.364.000,00		$ -	2,00	$ 1.364.000,00
93	Suministro e instalación de escritorio con faldón y base metálica en tubo cuadrado de 2x2 en pintura electroestática tapa de 25 mm enchepado en canto rígido. (P)	UNIDAD	2	$ 782.500,00	$ 1.565.000,00		$ -	2,00	$ 1.565.000,00
94	Suministro e instalación de mueble de lavado de manos incluye área de lavado en acero inoxidable, mueble superior e inferior y torra en melamina de 15 mm rh, enchapado en formica, bisagras, cajones, correderas, niveladores, accesorios para instalación. (P)	UNIDAD	1	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000,00		$ -	1,00	$ 5.500.000,00
	GENERALES								
95	Silla Universitaria tapizada en prana	UNIDAD	101	$ 320.000,00	$ 32.320.000,00		$ -	101,00	$ 32.320.000,00
96	Suministro e instalación de cortinas rollables screen para 25 consultorios atención de especialistas x metro lineal.	ML	116	$ 112.900,00	$ 13.096.400,00		$ -	116,00	$ 13.096.400,00
97	Suministro e instalación de puerta plegable color blanca x 3 m x 2.40m de altura	UNIDAD	1	$ 1.706.900,00	$ 1.706.900,00		$ -	1,00	$ 1.706.900,00
98	Suministro sillas ergonómicas	UNIDAD	10	$ 609.000,00	$ 6.090.000,00		$ -	10,00	$ 6.090.000,00
99	Suministro de silla tipo ejecutiva	UNIDAD	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00		$ -	1,00	$ 600.000,00
	AREA UCI ADULTO								
100	Suministro e instalación de puertas para mueble de lavamanos en melamina RH de 15 mm canto rigido, con manijas y bisagras	UNIDAD	20	$ 100.000,00	$ 2.000.000,00		$ -	20,00	$ 2.000.000,00
101	Suministro e instalación de correderas en par para cajones de mueble de insumos	UNIDAD	20	$ 25.000,00	$ 500.000,00		$ -	20,00	$ 500.000,00
102	Suministro e instalación de formica para espaldar de mueble de insumos de UCI	UNIDAD	1	$ 500.000,00	$ 500.000,00		$ -	1,00	$ 500.000,00
	SUBTOTAL				253.514.800		167.814.500		85.700.300
	IVA				48.167.812		31.884.755		16.283.057
	TOTAL				301.682.612		199.699.255		101.983.357

ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO
Contratista

HECTOR JAVIER DIAZ GIRON
Lider de Mantenimiento

EL LIDER DEL PROCESO DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO DE LA E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA

CERTIFICA

Que el señor ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO identificado con C.C. 7.166.766 realizó a satisfacción durante el mes de febrero de 2026 el SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 339 de 2026. Soportado con factura número FE-139 de fecha 24 de febrero de 2026.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 101.983.357.oo).**

Tunja, 24 de febrero de 2026.

HECTOR JAVIER DIAZ CERON
Líder de Mantenimiento

Proyectó: Jonatan Ayala Pérez

LA SUSCRITA COORDINADORA DE ALMACÉN

C E R T I F I C A:

Que el señor **ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO** con C.C. 7.166.766 realizó a satisfacción durante el mes de febrero de 2026, EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA, de acuerdo con lo establecido en el contrato número 339 de 2026. Soportado con factura número FE-139 de fecha 24 de febrero de 2026 y comprobante de ingreso N° 2971.

Por lo anterior es viable el pago por un valor de **CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($101.983.357).**

Tunja, de febrero de 2026.

Atentamente,

AURA ESPERANZA ALVARADO BARRERA
COORDINADORA DE ALMACEN

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS

ACTA FINAL
INFORME FINAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 339 DE 2026

Tunja, 24 de febrero de 2026

Señores
E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
ING. HECTOR JAVIER DIAZ CERÓN
LÍDER DE MANTENIMIENTO
Ciudad

INFORME PARCIAL DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 339 DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES HOSPITALARIOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO
NÚMERO DE DOCUMENTO	C.C. 7.166.766 de Tunja

1. DESCRIPCIÓN DE ENTREGA DE LOS ITEMS REQUERIDOS

En cumplimiento del objeto contractual, se realizó la entrega e instalación de los ítems requeridos correspondientes al mobiliario hospitalario destinado a diferentes servicios institucionales, conforme a las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones establecidas contractualmente. El suministro incluyó muebles clínicos y administrativos tales como estaciones de enfermería, gabinetes, closets, puertas, puestos de trabajo, módulos de almacenamiento y demás elementos necesarios para la adecuada operación de las áreas intervenidas, garantizando calidad, resistencia, funcionalidad, seguridad y compatibilidad con ambientes hospitalarios. Las actividades se ejecutaron de manera coordinada con las dependencias responsables, cumpliendo protocolos de instalación, normas de seguridad y requisitos técnicos, lo cual permitió optimizar las condiciones físicas de los servicios y fortalecer la organización operativa y asistencial de la entidad., en aras de contribuir al bienestar de los usuarios y al desarrollo eficiente de los servicios prestados por la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

AREA GINECOLOGÍA IAMII



AREA DE COORDINACIÓN MÉDICA

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

SUMINISTROS Y MUEBLES HOSPITALARIOS



SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247








SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

AREA DE NUTRICION





AREA LABORATORIO INTRAPULMONAR

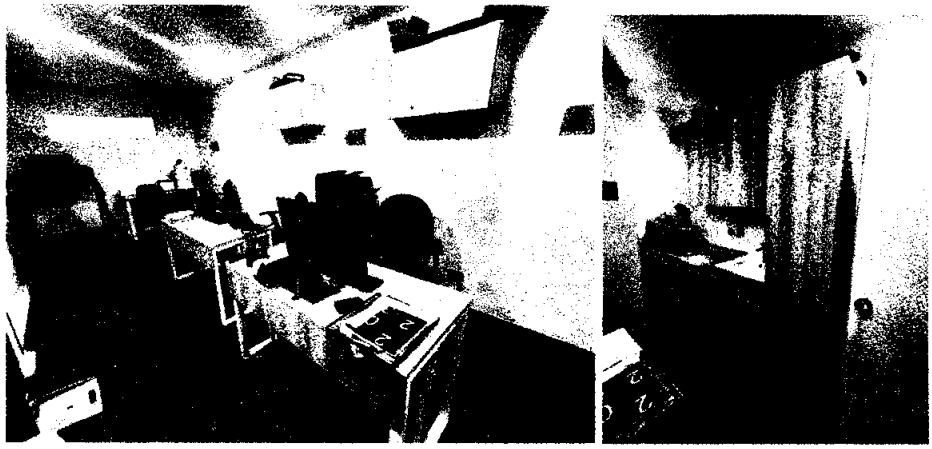


SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

GENERALES






SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

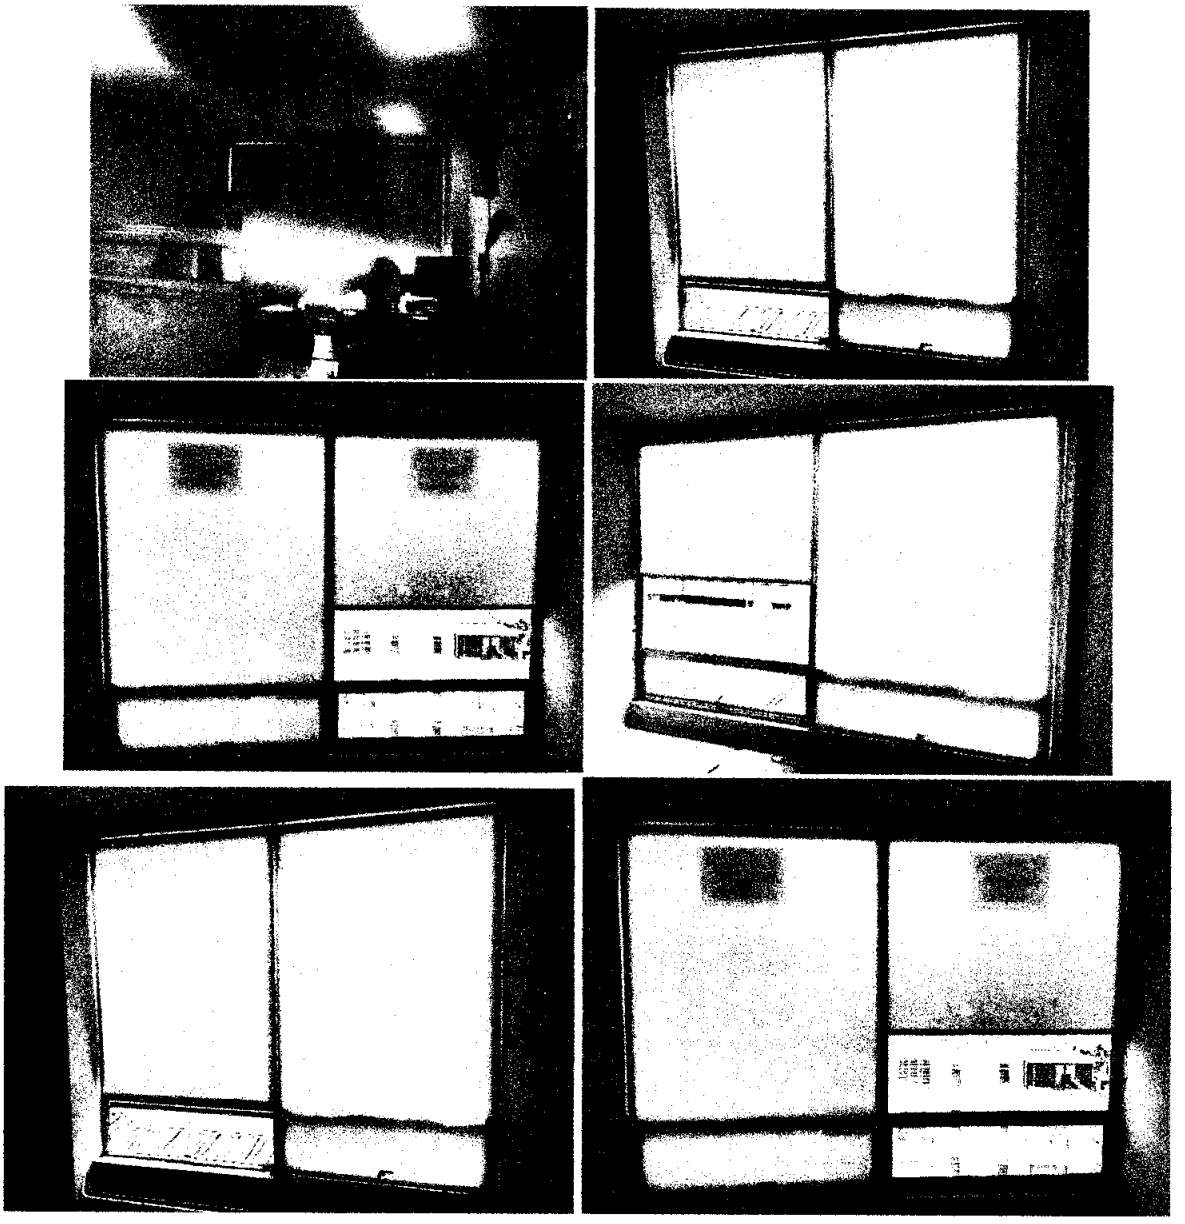

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

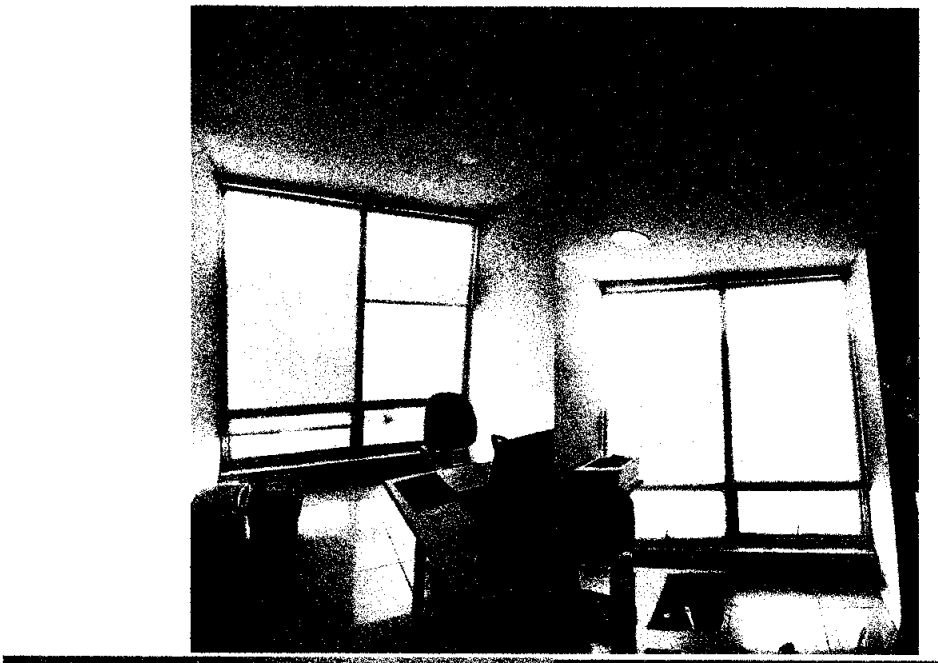





SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247





SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247




AREA UCI ADULTO


SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

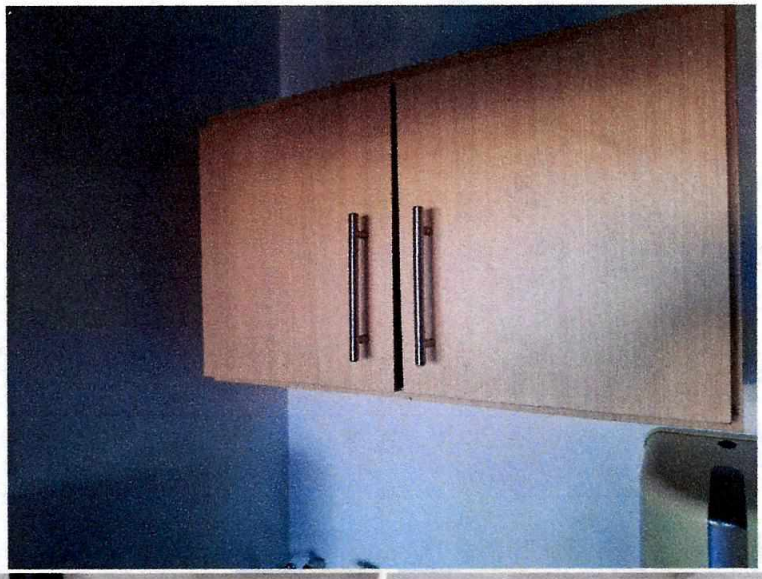


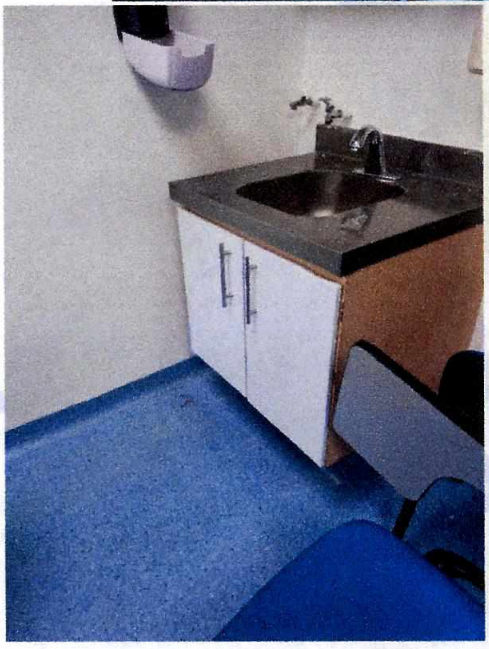

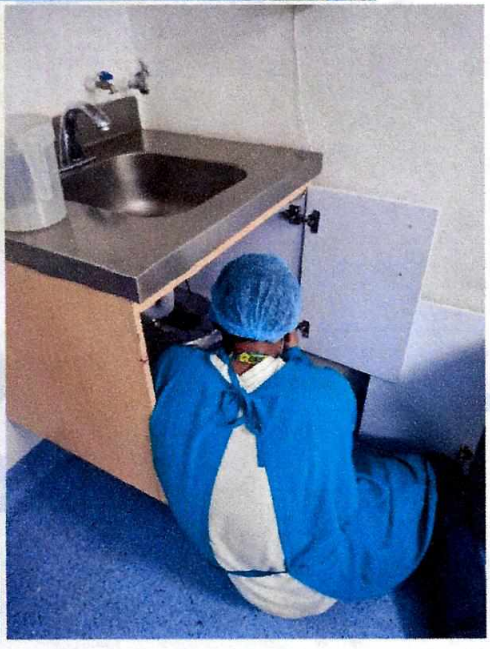

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

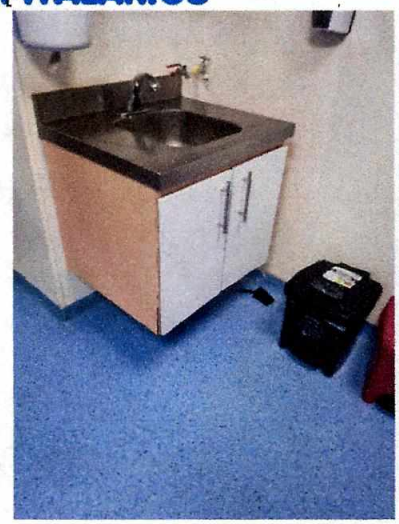

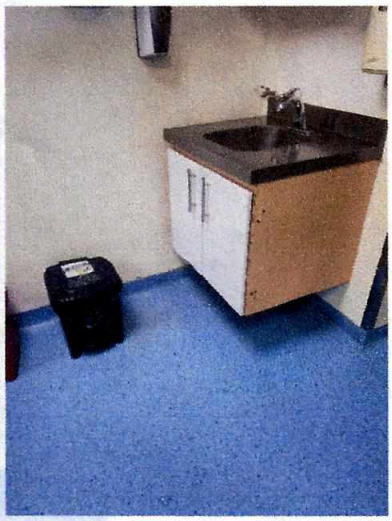


SUMINISTROS Y MUEBLES
HOSPITALARIOS

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247










SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247

3. RECOMENDACIONES DE USO

1. Implementar rutinas periódicas de limpieza utilizando únicamente productos compatibles con superficies hospitalarias, evitando sustancias abrasivas que deterioren los materiales.
2. Evitar sobrecargar los muebles o utilizar los elementos para fines distintos a los previstos, con el fin de preservar su estructura y vida útil.
3. Realizar inspecciones preventivas trimestrales para verificar fijaciones, herrajes, nivelación y estado general, permitiendo detectar oportunamente posibles desgastes.
4. Socializar con el personal asistencial y administrativo las buenas prácticas de uso y manipulación del mobiliario para prevenir daños por manejo inadecuado.

El suscrito contratista declara que las actividades descritas en el presente informe fueron ejecutadas en cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, conforme a los términos, condiciones técnicas y cronograma establecidos, garantizando la calidad del suministro, la correcta instalación de los ítems entregados y la observancia de los lineamientos institucionales aplicables. Asimismo, se deja constancia de que los bienes suministrados cumplen con las especificaciones requeridas y fueron entregados a satisfacción en las áreas correspondientes, quedando a disposición de la entidad para su verificación, seguimiento y uso dentro de los fines previstos en el contrato.

Cordialmente,

ARMANDO JAVIER SOLER SALCEDO
CONTRATISTA
C.C. 7.166.766

SUMINISTROS AJS
CORREO: SUMINISTROSAJS@GMAIL.COM
CEL: (+57) 3123515154 – (+57) 3124075247
