FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

DATOS GENERALES							
Número de acta		NUEVE (9)					
Secretaría o Departamento Administrativo:		**Secretaria de infraestructura física**					
Subsecretaría o Subdirección:		**Construcción y Mantenimiento**					
Equipo, Unidad Administrativa o Dependencia:		**Ejecución de Proyectos**					
Lugar:	FRENTE 41.N. COMUNA 80 SAN ANTONIO DE PRADO	**Fecha:**	24/01/25	**Hora Inicio:**	10:00 am	**Hora Finalización:**	1:00 pm
Actividad o tema:	COMITÉ DE OBRA Nº 9			**Anexa listado de asistencia**			
				SI	X	**NO**	
Elaborado por:	WILLIAM H AMAYA Z	**Convocada por:**		GERMAN RAMIREZ BARBOSA			
Objetivo de la reunión:	INSPECCIONAR EL FRENTE No. 41.N, 37 Y 34 Y VERIFICAR LOS AVANCES, CONFIRMAR PROGRAMACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y REVISAR CIERRE DE COMPROMISOS Y TEMAS PENDIENTES DE COMITES ANTERIORES						

AGENDA (ORDEN DEL DÍA)	
ITEM	**TEMA**
1	REVISION FRENTE 41.N CENTRALIDAD, MEJORAMIENTO DE 80 METROS.
2	REVISION FRENTE 37 VEREDA LA FLORIDA, MEJORAMIENTO DE 106,5 METROS.
3	REVISION FRENTE 34 VEREDA MONTAÑITA, MEJORAMIENTO DE 130 METROS.
4	REVISION DE LOS COMPROMISOS Y PENDIENTES DE LOS COMITES ANTERIORES
5	REVISION DE LA PROGRAMACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.

DESARROLLO TEMÁTICO

1. Se inspecciona la vía de la centralidad de San Antonio de Prado, frente No. 41N, en el D1, con la participación de la SIF, grupo de obra y grupo de interventoría, se revisaron las obras complementarias, se deben corregir los empalmes de los extremos, rematar la carpeta asfáltica contra los andenes existentes, en caso que no autoricen los andenes, subir el sumidero del costado del restaurante y cambiar la rejilla, construir el cordón cuneta frente al D1 para confinar adoquines y manejo de las aguas lluvias, rematar las entradas al restaurante y a la ferretería contiguos al D1 y corregir dos hundimientos leves que se presentan.
2. Se inspecciona la vía de la vereda La Florida, frente No.37, se revisa la fuga de una acometida de la casa esquinera y la supervisión autoriza la reparación, se inspeccionan las cunetas del costado derecho que

están en mal estado, se deben demoler y reconstruir en el otro costado se deben construir con cordón para confinar la carpeta.

3. Se inspecciona la vía de la vereda Montañita, frente No. 34. Se propone construir una placa que pase sobre el sitio del cruce de agua y adicionalmente 3 mts a cada lado para garantizar que en caso de que afluente siga generando socavación no afecte la via, la ventaja es que el afluente para a unos tres metros por debajo de la via por un tubo de aproximadamente 36".
4. Luego en reunión en el frente 41N se hace revisión de las solicitudes y pendientes del comité anterior y los nuevos compromisos.

REGISTRO FOTOGRAFICO COMITÉ No. 9

INSPECCION FRENTE 41,N LA CENTRALIDAD DE SAN ANTONIO DE PRADO DEFINICION E INICIO OBRAS COMPLEMENTARIAS





INSPECCION FRENTE 37 VEREDA LA FLORIDA DE SAN ANTONIO DE PRADO DEFINICION E INICIO OBRAS COMPLEMENTARIAS





INSPECCION FRENTE 34 VEREDA MONTAÑITA DE SAN ANTONIO DE PRADO DEFINICION DE OBRA ADICIONAL PARA INICIO DE LAS OBRAS




CONCLUSIONES	
1	Se inician las obras complementarias para ir cerrando los frentes 41N del D1 y 37 de Vereda La Florida en la comuna 80.
2	Se da concepto favorable para la construcción de una placa para proteger la vía del cuerpo de agua que la cruza y evitar que se siga perdiendo parte de la banca.
3	
5	De los compromisos del acta anterior se cerraron los siguientes: • Entrega de la programación de obra actualizada. • Listado y ubicación de los viajes de fresado comunas 80 y 50. • Se completo señalización del PMT. • Se realizo visita a Santa Elena y frente 38 de San Jose con especialista de pavimentos, en espera del concepto y diseño de la estructura.
DOCUMENTOS ANEXOS	
1	Registro de asistencia.

2	

Tareas asignadas en la reunión	Responsable	Fecha de compromiso
Balance de las comunas 80, 90 y 50 no se ha recibido para definir la obra de Montañitas y obras en las otras comunas	Contratista e interventoría	29/01/2025
Concepto ambiental frente 34 Montañita para construcción placa	SIF	27/01/2025
Cotización diseño placa Montañita	interventoría	29/01/2025
Se solicitan todos los documentos, el acta No.1 con los soportes se entrega en físico, en carpeta y escaneada en PDF y subir al SECOP II.	Contratista	28/01/2025
Todas las hojas de vida en carpeta café con tapa y con hoja marcada en la portada	Contratista e interventoría	23/01/2025
Cantidades y ubicación de fresado por el correo	Contratista e interventoría	27/01/2025
Presentación de las obras ejecutadas actualizada e incluyendo Palmitas	Contratista	28/01/2025
Enviar plan de calidad actualizado a dic 30 y revisado por la interventoría	Contratista e interventoría	20/01/2025
Enviar PMT corregido. Enviar correo al especialista.	Contratista	20/01/2025
Empezar SG vial el contratista debe pedir a la supervisión los formatos mediante correo.	Contratista	31/01/2025
PASAO con los ajustes solicitados por la SIF	Contratista	29/01/2025
Comunicados 012 y 014 impresos	Contratista	29/01/2025
Hacer evaluación de los estándares mínimos como manda el plan de calidad formato 7, personales discapacitados dejando nota en el informe mensual.	Contratista	31/01/2025
Informes de INTEINSA y otra cotización de laboratorio. impresos	Interventoría	29/01/2025
Actas de vecindad y entornos impresas y revisadas por interventoría	Contratista	27/01/2025
Entregar carpetas en físico con los documentos hojas de vida, contratos afiliaciones, planillas de pago. Etc.	Contratista e interventoría	29/01/2025
Plan de sostenibilidad, papel reciclado con Certificado	Contratista	29/01/2025
Oficios 3 y 13 entregar en físico	Contratista	29/01/2025
Completar las carteleras y vallas informativas para poder cancelar los reembolsos tanto lo social, ambiental y técnico.	Contratista	27/01/2025

FO-GINF- 055	Formato **FO-GINF Acta de Reunión General**	Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 3		

Asistencia del noveno comité de obra lote 2. 24/1/2025

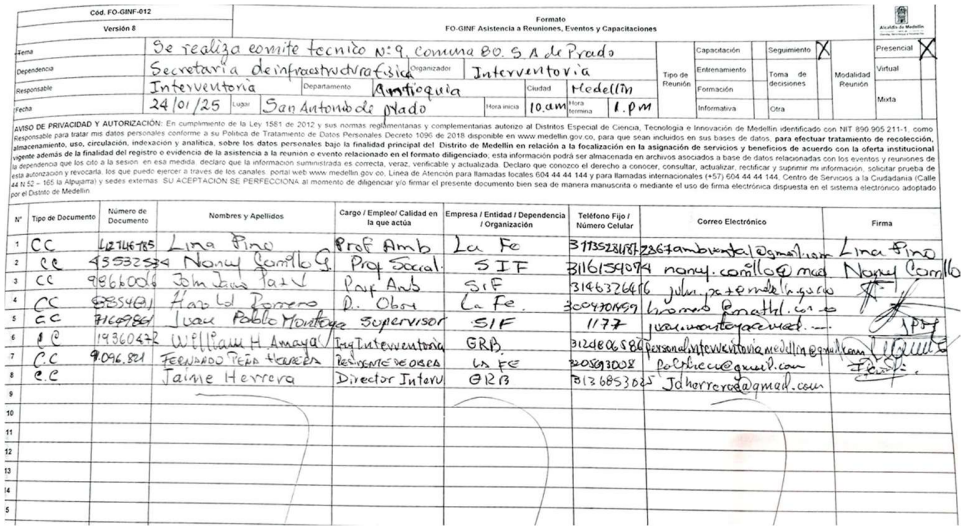

Cód. FO-GINF-012 — Versión 8

Formato
FO-GINF Asistencia a Reuniones, Eventos y Capacitaciones

Tema: Se realiza comite tecnico N°9 comuna 80. S A de Prado
Dependencia: Secretaria de infraestructura fisica — Organizador: Interventoria
Responsable: Interventoria — Departamento: Antioquia — Ciudad: Medellin
Fecha: 24/01/25 — Lugar: San Antonio de prado — Hora inicia: 10.am — Hora termina: 1.pm

Tipo de Reunión: Capacitación; Entrenamiento; Formación; Informativa; Seguimiento X; Toma de decisiones; Otra
Modalidad Reunión: Presencial X; Virtual; Mixta

AVISO DE PRIVACIDAD Y AUTORIZACIÓN: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias y complementarias autorizo al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín identificado con NIT 890.905.211-1, como Responsable para tratar mis datos personales conforme a su Política de Tratamiento de Datos Personales Decreto 1096 de 2018 disponible en www.medellin.gov.co, para que sean incluidos en sus bases de datos, **para efectuar tratamiento de recolección, almacenamiento, uso, circulación, indexación y analítica, sobre los datos personales bajo la finalidad principal del Distrito de Medellín en relación a la focalización en la asignación de servicios y beneficios de acuerdo con la oferta institucional vigente además de la finalidad del registro o evidencia de la asistencia a la reunión o evento relacionado en el formato diligenciado**, esta información podrá ser almacenada en archivos asociados a base de datos relacionadas con los eventos y reuniones de la dependencia que los cito a la sesión, en esa medida, declaro que la información suministrada es correcta, veraz, verificable y actualizada. Declaro que conozco el derecho a conocer, consultar, actualizar, rectificar y suprimir mi información, solicitar prueba de esta autorización y revocarla, los que puedo ejercer a través de los canales: portal web www.medellin.gov.co, Línea de Atención para llamadas locales 604 44 44 144 y para llamadas internacionales (+57) 604 44 44 144, Centro de Servicios a la Ciudadanía (Calle 44 N 52 – 165 la Alpujarra) y sedes externas. SU ACEPTACIÓN SE PERFECCIONA al momento de diligenciar y/o firmar el presente documento bien sea de manera manuscrita o mediante el uso de firma electrónica dispuesta en el sistema electrónico adoptado por el Distrito de Medellín.

N°	Tipo de Documento	Número de Documento	Nombres y Apellidos	Cargo / Empleo/ Calidad en la que actúa	Empresa / Entidad / Dependencia / Organización	Teléfono Fijo / Número Celular	Correo Electrónico	Firma
1	CC	42746785	Lina Pino	Prof Amb	La Fe	3113528187	2367ambiental@gmail.com	Lina Pino
2	CC	43532384	Nancy Carrillo	Prof Social	SIF	3116134079	nancy.carrillo@mad	Nancy Carrillo
3	CC	9866006	John Jairo Paz V	Prof Amb	SIF	3146376616	johnjairopaz@gmail.com	
4	CC	98354081	Harold Romero	D. Obra	La Fe.	3004704459	hromero@proattd.com	
5	CC	71695861	Juan Pablo Montoya	Supervisor	SIF	1177	juan.montoya@cmad.com	JPM
6	CC	19360432	William H Amaya Z	Ing Interventoria	GRB	3124806588	personalinterventoria.medellin@gmail.com	
7	CC	9096.821	FERNANDO PEÑA HERRERA	RESIDENTE DE OBRA	LA FE	3205693008	peOficce@gmail.com	
8	CC		Jaime Herrera	Director Interv	GRB	3136853025	Jdherrera@gmail.com	
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

PROXIMA REUNIÓN	
Lugar y Fecha	31/1/2025. En los frentes que se estén interviniendo

ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombres y Apellidos	**Cargo/Empleo**	**Empresa/Entidad/ Dependencia/Organización**
Ing. Juan Pablo Montoya	Ing. Supervisor SIF	S. I. F.
Ing. John Jairo Paz	Profesional ambiental SIF	S. I. F.
Nancy Carrillo	Profesional social SIF	S. I. F.
Ing. Harold Romero	Director Obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.
Ing. Jaime Herrera	Director interventoría	GRB ingenieros
Ing. William H Amaya Z	Residente interventoría	GRB ingenieros
Ing. Fernando Peña	Residente obra	Proyectos de ingeniería civil La Fe. S.A.S.

Como constancia de la aprobación del acta de la reunión se firma por su responsable el 24/1/2025



WILLIAM H AMAYA.
Ing. Residente de Interventoría
German Ramírez Barbosa
