	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: 140 VERSIÓN: 01 FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

INFORME DE SUPERVISION No. 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 110-16.52-176-2025

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO:

CONTRATO N°: 110-16.52-176-2025

CONTRATISTA: EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PATIA CAUCA "EMPATIA" E.S.P
R.L- GERENTE . LILIANA MILENA GUERRERO MARTINEZ C.C. 34.673.968 DE PATÍA, (EL BORDO)

OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y EMPRESA DE ACUEDUCTO ALTARILLADO Y ASEO DE PATIA EMPATIA E.S.P PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION DE TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EXISTENTE EN EL BARRIO LA PAZ Y SONDEO Y/O LIMPIEZA DE TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE EL ESTRECHO, MUNICIPIO DE PATIA,CAUCA.

VALOR INICIAL: $ 103,654,580.00 **VALOR ADICIONAL:** $ 0
VALOR TOTAL: $ 103,654,580.00
PLAZO INICIAL: (01) MES **PLAZO ADICIONAL:** N/A

2. CRONOLOGIA Y DATOS ESPECIFICOS DEL CONTRATO:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: N° 618 del 29 de mayo de 2025 Valor: $ 98,195,675.00

FIRMA DEL CONTRATO: 20 de junio 2025

REGISTRO / COMPROMISO PRESUPUESTAL: N° 700 del 19 de junio de 2025 Valor: $ 98,195,675.00

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:
Póliza: No 435-47-994000060593 Certificado N°:
Compañía de Seguros: Aseguradora Solidaria
Anexo 0
Fecha Expedición: 9 de julio de 2025
Vigencia: Desde: 4/07/2025 Hasta: 20/11/2025
Valor Asegurado: $ 34,369,536.25

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL:
Póliza: No 435-74-994000015412 Certificado N°:
Compañía de Seguros: Aseguradora Solidaria
Anexo 0
Fecha Expedición: 4 de julio de 2025
Vigencia: Desde: 20/01/2026 Hasta: 15/08/2025
Valor Asegurado: $ 284,700,000.00

FECHA DE INICIO: 27 de junio de 2025

ANTICIPO: $ - 0%

INFORME DEL CONTRATISTA No. 01: Fecha del Informe: 16/09/2025

ACTA DE OBRA FINAL: **Fecha del Acta:** 16/09/2025 Valor del Acta $ 98,195,675

VENCIMIENTO CONTRACTUAL: **26 de julio de 2025**

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:
Póliza: No 435-47-994000060593 Certificado N°:
Compañía de Seguros: Aseguradora Solidaria
Anexo 1
Fecha Expedición: 12 de septiembre de 2025
Vigencia: Desde: 4/07/2025 Hasta: 24/07/2028
Valor Asegurado: $ 34,369,536.25

FECHA DEL PRESENTE INFORME: ***7 de octubre de 2025***

3. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS y RECIBIDAS POR INTERVENTORÍA:


ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	APORTE DEL MUNICIPIO				
1	**PRELIMINARES**				
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	ML	24.0	$ 2,589.41	$ 62,145.84
1.2	SEÑALIZACION CON CINTA BOMBONES Y MALETA	GLB	2.0	$ 309,816.74	$ 619,633.48
2.0	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	40.6	$ 23,288.30	$ 944,573.45
2.2	COLCHON ARENA - GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO	M3	3.1	$ 122,073.77	$ 380,870.16
2.3	RELLENO IMPORTADO MATERIAL COMUN INCLUYE ACARREO Y COMPACTACION	M3	28.7	$ 119,745.62	$ 3,439,094.21
2.4	RETIRO MAT SOBRANTE MANUAL- VOLQUETA <=10KM	M3	28.0	$ 33,217.93	$ 930,102.04
3	**TUBERIAS Y ACCESORIOS**				
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EN PVC ESTRUCTURAL PARA ALCANTARILLADO UNION MECANICA DE COBLE PARED EN	ML	24.0	$ 2,226,957.00	$ 53,446,968.00
3.2	REPARACIONES VARIAS (REDES TUBERIA HIDROSANITARIA Y/O ACCESORIOS)	GBL	8.0	$ 15,702.01	$ 125,616.08

	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: 140
			VERSIÓN: 01
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	FECHA: 30-07-2011

INFORME DE SUPERVISION No. 1 AL CONVENIO SOLIDARIO N° 110-16.52-176-2025


4	**CONCRETOS**				
4.1	CAMARA DE INSPECCION TIPO B H=1.00-2.00 MTS (INCLUYE TAPA Y CAÑUELA)	UND	1.0	$ 2,025,875.77	$ 2,025,875.77
4.2	CAJAS DE INSPECCION EN CONCRETO 1.2m X1.2mX1.2m internos (incluye tapa cañuela)	UND	1.0	$ 1,586,233.00	$ 1,586,236.00
5	**SONDEOS, LIMPIEZA Y APIQUES**				
5.1	SONDEO MANUAL PARA LIMPIEZA DE TUBERIA EXISTENTE	ML	450.0	$ 5,300.00	$ 2,385,000.00
5.2	SONDEO MANUAL CON MOTOBAMBA EN RECAMARA (INCLUYE LIMPIEZA Y DESINFECCION)	UND	15.0	$ 840,855.00	$ 12,612,825.00
				VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 78,558,940**
				ADMINISTRACIÓN (17%)	**$ 13,355,020**
				IMPREVISTOS (3%)	**$ 2,356,768**
				UTILIDAD (5%)	**$ 3,927,947**
				VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	**$ 98,198,675**
	APORTE EMPATIA				
1	APORTE EMPATIA en supervision del contrato, acompañamiento del personal tecnico como aporte de su conocimiento de las necesidades a mitigar dentro del contrato, gastos administrativos y de polizas inherentes al conveniio interadministrativo.		1.0	5,455,905	5,455,905.00
				VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 5,455,905**
	VALOR EJECUTADO TOTAL DEL CONVENIO				**$ 103,654,580**

4. REGISTRO FOTOGRAFICO:

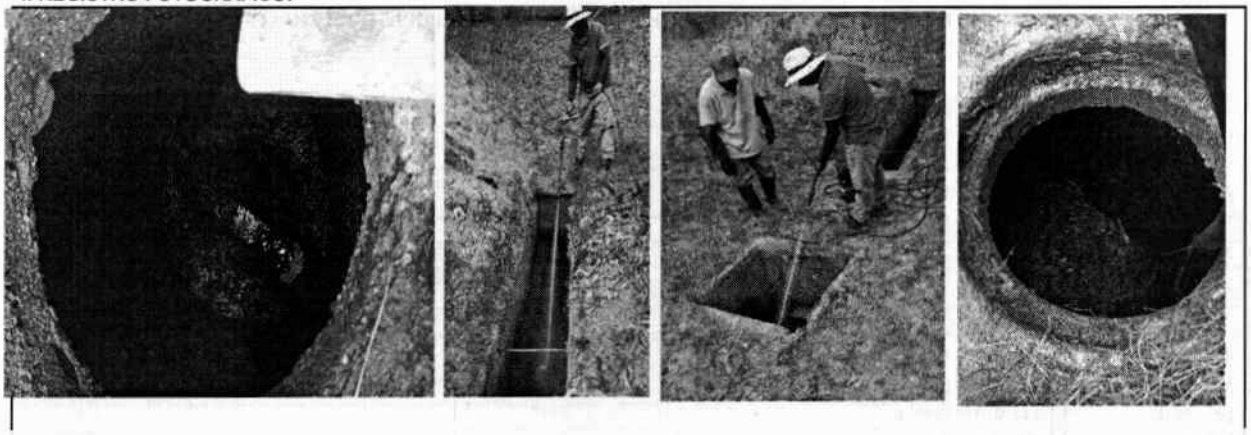

	MUNICIPIO DE PATIA NIT. 891.502.194-8 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA		CODIGO: 140 VERSIÓN: 01 FECHA: 30-07-2011
ESTADO: CONTROLADO	FORMATO ACTUALIZADO	ESTADO: CONTROLADO	

INFORME DE SUPERVISION No. 1 AL CONVENIO SOLIDARIO N° 110-16.52-176-2025

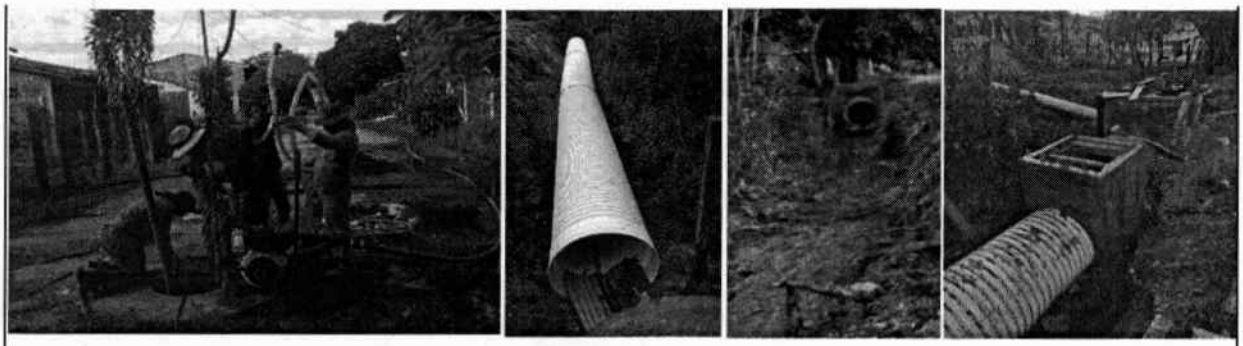

5. VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA EN EL ACTA DE LIQUIDACION:

Valor actividades ejecutadas y recibidas por el supervisor:		$ 103,654,580
Valor de las actividades contractuales iniciales, según el Convenio:		$ 103,654,580
Saldo por ejecutar:		$ 0.00
APORTE POR EL MUNICIPIO		$ 98,198,675
APORTE EMPATIA		$ 5,455,905
VALOR TOTAL DEL CONVENIO		$ 103,654,580
Pagos realizados al contratista:	Por concepto del pago de anticipo:	$ 0
	Total pagos realizados al Contratista:	$ 0

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA: ($ 98,198,675.23)

6. CERTIFICACION:

El Supervisor del convenio de la referencia CERTIFICA que:

a.) Los documentos precontractuales (CDP, Certificación de Plan Anual de Adquisiciones, Viabilidad, Estudios previos, Análisis del Sector, Matriz de Riesgos, Documentos del contratista) se encuentran dentro del expediente del convenio en mención y están debidamente firmados.

b.) Los documentos contractuales y descritos en el numeral 2 del presente informe, igualmente se encuentran dentro del expediente del presente contrato y están debidamente firmados.

c.) El objeto y las obligaciones derivadas del contrato se ejecutaron según lo planificado. De igual manera se deja constancia que con las dimensiones tomadas in situ, si el constratista realizó mayor cantidad de obra, esto no imprica el reconocimiento y pago de dicho valor adicional por parte de la entidad contratante.

d.) Las actividades detalladas en el numeral 3 del presente informe fueron ejecutadas y recibidas a entrera satisfación por parte de del comunidad beneficiada, pero por esta circunstancia no se exime al Contratista de la responsabilidad por la calidad de las actividades entregadas y recibidas.

Para constancia se firma a los veintitres (7) días del mes de Octubre del año dos mil veinticinco (2025).

Aprobó:

ING. JUAN FERNANDO IBARRA ESPINOSA
Secretario de Infraestructura y Vivienda Municipal y Supervisor

Elaboró: Ing. Angela Marcela Garzon B - Contratista SIV
