ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	PROVINCIAS DE: MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-219-2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-138-2025
PLAZO INICIAL:	31/12/2025	**PLAZO INICIAL:**	31/12/2025
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO SOFAN C-031
FECHA DE INICIACIÓN:	09/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	09/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	-
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	-
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	31/08/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	267	**PLAZO ACTUALIZADO:**	510
PLAZO TRANSCURRIDO:	325 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	325 días
VALOR INICIAL :	$ 3.865.474.620	**VALOR INICIAL :**	$ 35.350.235.228
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.865.474.620	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 35.350.235.228
VALOR PAGADO:	$ 425.912.543	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.439.562.077	**VALOR POR PAGAR:**	$ 35.350.235.228
VALOR ANTICIPO:	$ 773.094.924	**VALOR ANTICIPO:**	$ 10.605.070.568
SUPERVISOR:	ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ	**SUPERVISOR:**	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

- SE FINALIZÓ LA ENTREGA DE LOS PORDUCTOS DE LA FASE EL 12-12-25

2.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

PROVINCIA DE MEDINA:

Informes de caracterización Observados mediante los oficios 766-638 Observaciones informe de caracterización Medina V2-Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-592; 766-641 Observaciones informe de caracterización Paratebueno V2-Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-592

PROVINCIA DEL GUAVIO:

Informe de caracterización ajustado según oficio ICCU-I-2026-0000124
766-588 Entrega de presupuestos oficiales y productos fase II Subsanados PROVINCIA DEL GUAVIO-RTA ICCU-I-2026-0000124

PROVINCIA DE ORIENTE:

informes de caracterización ajustado según oficio ICCU-I-2026-0000124
766-593 Entrega de presupuestos oficiales y productos fase II Subsanados PROVINCIA DE ORIENTE-RTA ICCU-I-2026-0000124

PROVINCIA DE SOACHA:

Informe de caracterización ajustado según oficio ICCU-I-2026-0000124
766-589 Entrega de presupuestos oficiales y productos fase II Subsanados PROVINCIA SOACHA-RTA ICCU-I-2026-0000124

2.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO:

UBALÁ (CASA ROSADA - SAN LUIS - LAGUNA AZUL)

- EXPOSICIÓN DE TRAMOS DE INTERVENCIÓN EL 29-01-2026 SEGÚN PROPUESTA ALINEADA AL DISEÑO APROBADO
- Inicio de activades programada para el 03 de marzo del 2026

JUNÍN (SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA en una longitud de 6620 ml
- LIMPIEZA DE CUNETAS

GAMA (CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO)

- AMARRE DE ACEROS Y FUNDIDA DE ZARPA PARA DESCOLES DE ALCANTARILLAS
- AMARRE DE ACEROS, FORMALETEADA Y FUNDIDA DE MURO PARA DESCOLE DE ALCANTARILLA
- Intervención y estabilización de la rasante en una longitud acumulada de 3000 ml

PROVINCIA DE ORIENTE:

CHOACHÍ (EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO)

- INTERVENCIÓN DEL AFIRMADO DE LA RASANTE DE LA VÍA en una longitud acumulada de 9491,9 ml
- LIMPIEZA DE CUNETAS, ESCARIFICADO CON RIPER Y RETIRO DE SOBRETAMAÑOS

PROVINCIA DE SOACHA:

SIBATÉ (VEREDA SAN RAFAEL - VEREDA ALTOCHARCO - SECTOR ACTO DE LA VIRGEN - VEREDA LA UNIÓN)

- Intervención y estabilización de la rasante en una longitud acumulada de 3790 ml
- CONTINÚA LA INSTALACIÓN DE EL SELLO DE ARENA-ASFALTO con una longitud acumulada de 1610 ml

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.	FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL	10-abr-25	8-jul-25	90	10-abr-25	12-dic-25	247	0	-157
2.	FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES	17-abr-25	20-ago-25	126	10-abr-25	28-feb-26	325	7	-192
3.	FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS	9-jul-25	31-ago-26	419	1-sep-25	28-feb-26	181	-54	184

Plazo del proyecto: 509 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	24,51%	28,48%	3,96%
Durante el periodo	2,26%	1,07%	-1,19%
Acumulado Actual	26,77%	29,54%	2,77%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACION (DIAS)	DIAS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
510	325,00	185	14,12

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

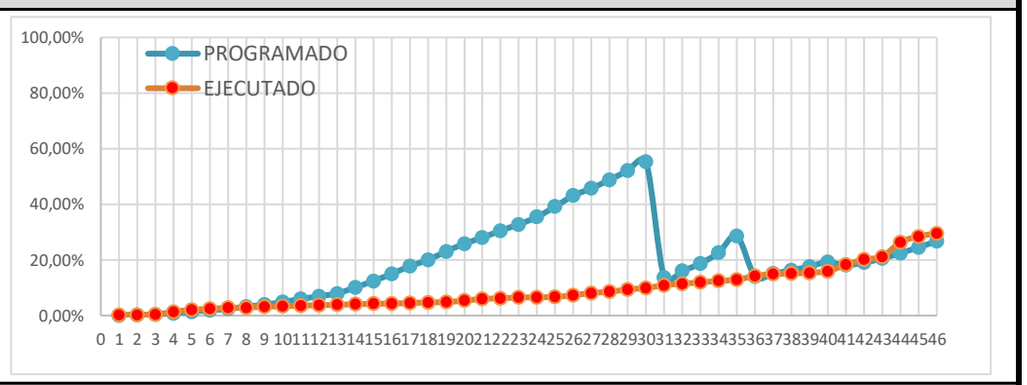

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO | **GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	28-feb-26	SEMANA No.	46	DEL	21-feb-26	AL	27-feb-26

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 8.416.830.937	$ 9.777.540.429	116%
Durante el periodo	$ 776.060.094	$ 366.279.693	47%
Acumulado Actual	$ 9.192.891.031	$ 10.143.820.122	110%

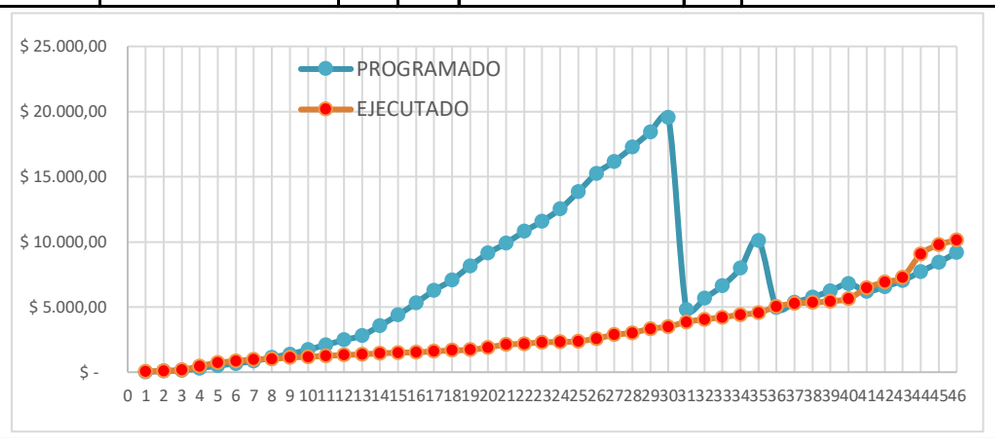


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	950.929.091

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ 301.208.595	2,84%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ 301.208.595	2,84%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

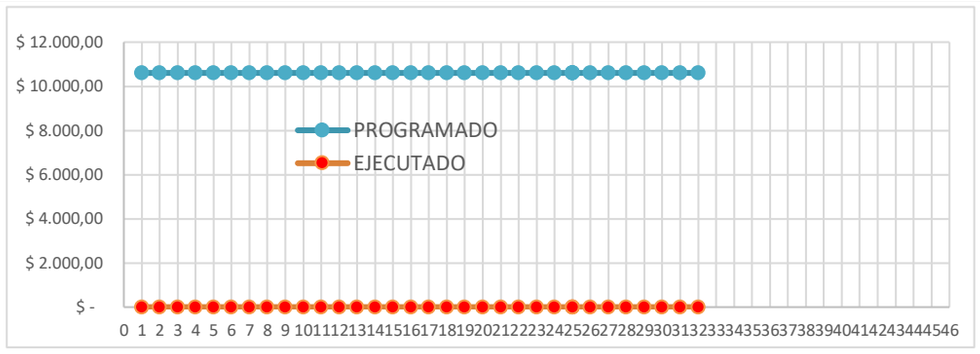

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

2,77%

4. GESTIÓN DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTE

4.1 GESTIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

GENERALES

Mediante oficio 766-639 con asunto solicitud de asuntos pendientes del tramo del municipio de Gama, Provincia de Guavio del 24 de febrero del 2026, la interventoría solicita se realicen las actividades que aun se encuentran pendientes relacionadas con la limpieza de alcantarillas cunetas en tierra y mejoramiento de la rasante.

Mediante oficio 766-642 con asunto RADICACION OFICIO N.º SOFAN-FOR-CO-031-ICCU031-611 DOCUMENTOS VEHICULOS PARA ACTIVIDADES DEL CONTRATO ICCU-138 DE 2025. Del 25 de febrero del 2026, la interventoría manifiesta que no se ha realizado la entrega de volquetas relacionadas al contrato de obra.

Mediante oficio 766-645 con asunto Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-574, Observaciones acta de cobro N°2 contrato de obra del 27 de febrero del 2026, la interventoría realiza revisión al acta N°2 del contratista enviando solicitud de ajustes a algunas hojas de cálculo que deben ser modificadas.

Mediante oficio 766-646 con asunto Aprobación Giro 9 Anticipo obra-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-591 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-608 del 27 de febrero del 2026, se da aprobación por parte de interventoría y se remite documentación a la supervisión ICCU.

Mediante oficio 766-648 con asunto Entrega del Informe mensual N° 10 de Interventoría-enero de 2026- Contrato ICCU-219-2025 del 27 de febrero del 2026, la interventoría realiza envió del informe de interventoría N°10 el cual relaciona todo lo relacionado con las actividades del mes de enero del 2026.

Se realizó el comité de seguimiento semanal N° 41 el pasado 25 de febrero del 2026 al contrato ICCU-138-2025, mediante el cual se revisaron los compromisos pendientes de la fase II, referentes a la subsanación de los informes de la provincia Medina, revisión de Interventoría de presupuestos de intervención de la Provincia Medina, inventarios de cunetas con estimación de anchos típicos en cada corredor del Lote 1, estos compromisos deben ser atendidos con prontitud con el fin de darle cierre a la fase II del contrato.

En relación con el inicio del quinto frente de obra, el consorcio Sofán C-031 manifestó el reinicio de activades de alcantarillas en el municipio de Ubalá el día 3 de marzo del 2026. Asimismo el contratista reprogramó el inicio de las actividades de sello de arena-asfalto en el municipio de Choachí para el día 9 de marzo del 2026.

PROVINCIA GUAVIO

Mediante oficio 766-640 con asunto SOLICITUD DE AJUSTE DE PR´S DE REFERENCIA SEGÚN EL ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE TRAMOS FIRMADA PARA EL TRAMO DEL MUNICIPIO DE JUNIN. Del 24 de febrero del 2026.la interventoría solicita se entregue un oficio final con la entrega del plano del municipio de Ubalá donde se definen los PRs relacionando los tramos de intervención en este municipio.

Mediante oficio 766-643 CON ASUNTO SUBSANACION DE OBSERVACION OFICIO N.º SOFAN-FOR-CO-031-ICCU031-612 DOCUMENTOS VEHICULO GAMA. DEL 25 DE FEBRERO DEL 2026, la interventoría manifiesta aprobación de maquinaria que estaba pendiente relacionada con las actividades que se venían desarrollando en el municipio de gama provincia Guavio.

Mediante oficio 766-644 con asunto Remisión informe Semanal de interventoría No 45-Contrato ICCU-219-2025 del 27 de febrero del 2026, la interventoría realiza envió de informe semanal a fin de que sea revisado con la supervisión ICCU.

PROVINCIA ORIENTE

Para esta semana comprendida del sábado 21 al viernes 27 de febrero no se presentaron oficios ni de carácter administrativo ni técnico en esta provincia.

Para esta semana comprendida del sábado 21 al viernes 27 de febrero se continúa con la actividad de estabilización del afirmado de la vía de la abscisa K11+480 a la abscisa K12+080 correspondiente al tramo de la Vereda Maza y de la abscisa K12+110 a la abscisa K12+220 correspondiente al tramo de la Vereda Ferralarada, para un total estabilizado de 710,00 metros en el Municipio de Choachí.

PROVINCIA MEDINA

Mediante oficio 766-638 se envían las observaciones al informe de caracterización de Medina V2-Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-592-Radicación de informe final de diseño de mejoramiento de pavimentos para los tramos Medina y Paratebueno – Provincia de Medina.

Mediante oficio 766-641 se envían las observaciones al informe de caracterización de Paratebueno V2-Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-592-Radicación de informe final de diseño de mejoramiento de pavimentos para los tramos Medina y Paratebueno – Provincia de Medina.

Mediante oficio 766-647 se realiza el traslado de la PQR radicado ICCU-E-2026- 0002782 radicada a la Entidad por parte de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Diamante, San Jesús de Palomas, Buenavista Alto Redondo, San Manuel, El Engaño y Botellas del Municipio de Paratebueno Provincia de Medina.

PROVINCIA SOACHA

Mediante oficio 766-649 enviado al contratista se realiza la aprobación del Ajuste al Presupuesto del Municipio de Sibaté de la Provincia SOACHA – RTA SOFAN – FOR-CO-03-ICCU031-569.

Para esta semana comprendida del sábado 21 al viernes 27 de febrero se continúa con la actividad de instalación del sello de arena-asfalto sobre el material remanente estabilizado de la vía 1.510,00 metros de la abscisa K3+640 a la abscisa K5+150 correspondiente al tramo de las Veredas Altocharco y San Rafael para un total cubierto de 1.610,00 metros en el Municipio de Sibaté.

4.2 GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**

INFORME AMBIENTAL - SEMANAL
DEL 21 al 27 de febrero del 2026.

1. El día 24 de febrero del 2026, el contratista participó en el comité interno del Consorcio Sofán.
2. Se asiste a comité integral el día 25 de febrero del 2026. Allí se describe la gestión ambiental y ejecución de los PAGA de la provincias de Guavio y Oriente.
3. Durante el periodo el contratista remite informe semanal el día 23 de febrero del 2026.
4. Durante la semana se realiza acompañamiento a la supervisión en las diferentes actividades constructivas.
5. Durante la semana, se realizó verificación del cumplimiento del PAGA de las provincias del Guavio Y Oriente, donde se realizan las siguientes actividades:
- Verificación de delimitación y señalización.
- Inspección de campamento.
- Supervisión y acompañamiento en obra.
- Inspección baterías sanitarias campamento.
- Alistamiento de bolsas de cemento para la recolección y disposición final.

6. Se realiza inspección a las baterías sanitarias alquiladas en los frentes habilitados.
7. Durante la semana no se realiza retiro de bolsas de cemento. Sin embargo, se realiza jornada de orden y aseo en los frentes habilitados.
8. Durante la semana, no se realiza capacitaciones, debido al cumplimiento del cronograma.
9. Comunicados de la semana:

a. Comunicados enviados por interventoría:
i. 766-623, Revisión SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-588-Observaciones informe mensual mes de enero 2026. – 24 febrero 2026.
ii. 766-644, Remisión informe Semanal de interventoría No 45-Contrato ICCU-219-2025. – 27 febrero 2026.
ii. 766-648-ICCU, Entrega del Informe mensual N° 10 de Interventoría-Enero de 2026- Contrato ICCU-219-2025,- 27 febrero 2026.

b. Comunicados enviados por el contratista:
i. SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-609, Solicitud de ajuste en cronograma de revisión de actas e informes mensuales. – 23 febrero del 2026.

4.3. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Provincia del Guavio

El 25 de febrero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico la presentación proyectada para el comité de participación No. 7 del municipio de Junín para revisión de la Entidad.

El 25 de febrero, la Interventoría realizó un recorrido en el tramo de Intervención del municipio de Junín con el acompañamiento de la Entidad y el Contratista.

El 25 de febrero, la Interventoría realizó un recorrido en el tramo de Intervención del municipio de Gama con el acompañamiento de la Entidad y el Contratista, donde realizó la verificación del buzón satelital.

El 26 de febrero, la Entidad remitió mediante correo electrónico la aprobación de la presentación proyectada para el comité de participación No. 7 de Junín, indicando que se debía ajustar una diapositiva. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el aval para la proyección de la presentación presentada, relacionando el cambio realizado por solicitud de la Entidad.

El 27 de febrero, se realizó el comité de seguimiento No. 7 dirigido al municipio de Junín donde se expuso el avance de obra y se resolvieron las inquietudes de la comunidad.

Provincia de Oriente

El 23 de febrero, el Contratista remitió el acta de la reunión de inicio No. 7 del municipio de Chipaque para revisión de la Interventoría.

El 23 de febrero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico el aval para la radicación de la carta personalizada No. 47, a través de la cual se invita a la secretaría de planeación del municipio de Fosca a la reunión de inicio No. 8, teniendo en cuenta que la supervisión social manifestó no tener observaciones.

El 24 de febrero, el Contratista difundió a través de WhatsApp el volante No. 28. Invitación a la reunión de inicio No. 8 del municipio de Fosca a los presidentes de la Juntas de Acción Comunal de las veredas ubicadas en el área de influencia directa del proyecto.

El 24 de febrero, el Contratista realizó la radicación presencial del carta personalizada No. 45. Invitación a la reunión de inicio No. 8 del municipio de Fosca en la alcaldía municipal

El 24 de febrero, el Contratista realizó la radicación presencial del carta personalizada No. 47. Invitación a la reunión de inicio No. 8 del municipio de Fosca en la oficina de Planeación municipal.

El 25 de febrero, el Contratista remitió a través de correo electrónico la presentación proyectada para la reunión de inicio No. 8 del municipio de Fosca ajustada para revisión de la Interventoría.

El 25 de febrero, el Contratista brindó atención presencial en el Punto SAU del municipio de Choachí (provincia de Oriente) en el horario establecido.

El 26 de febrero, la Interventoría remitió mediante correo electrónico la presentación proyectada para la reunión de inicio No. 8 del municipio de Fosca con Visto Bueno para revisión de la Entidad. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Entidad emitió la aprobación de la presentación indicando que se debía ajustar una diapositiva. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el aval para la proyección de la presentación presentada, relacionando el cambio realizado por solicitud de la Entidad.

El 26 de febrero, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el acta de la reunión de inicio No. 7 del municipio de Chipaque con observaciones, para atención por parte del Contratista.

El 26 de febrero, el Contratista remitió mediante correo electrónico la planilla de asistencia de la reunión extraordinaria No. 3 del municipio de Ubalá como parte de los insumos del acta.

El 26 de febrero, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-614 con la solicitud de viabilidad para el traslado de longitudes entre veredas – municipio de Choachí para concepto de la Interventoría.

El 27 de febrero, se realizó la reunión de inicio No. 8 para el municipio de Fosca donde se expuso a la comunidad la fase III del proyecto y se atendieron las inquietudes de la comunidad; además, se realizó un recorrido por el tramo para priorizar junto con la comunidad los tramos de intervención.

Provincia de Medina

El 27 de febrero, la Interventoría radicó al Contratista el comunicado 766-647 con el traslado de la PQR radicado ICCU-E-2026- 0002782 allegada a la Entidad por parte de las Juntas de Acción Comunal de las veredas El Diamante, San Jesús de Palomas, Buenavista Alto Redondo, San Manuel, El Engaño y Botellas del municipio de Paratebueno, requerida para el 2 de marzo, para complementar con el concepto de la interventoría y remitir la respuesta en el plazo establecido por la Entidad y dentro de los términos legales aplicables.

Provincia de Soacha

El 23 de febrero, la Entidad remitió a través de correo electrónico un ajuste al volante No. 31. Invitación al comité de participación No. 8, del municipio de Sibaté, indicando que en el número que va dentro del calendario debe ser el del día de la reunión. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría solicitó claridad sobre la directriz ya que al inicio del contrato se había indicado que el número dentro del ícono de calendario debía ser el número del mes en el que se realizaría la reunión. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Entidad confirmó que el número en el ícono mencionado debía ser, en adelante, el número del día en que se realizaría la reunión y no el número del mes. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría realizó el ajuste y remitió la pieza a revisión de la Entidad. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Entidad aprobó la pieza mencionada una vez verificada la subsanación de la observación realizada. A través del mismo medio y en la misma fecha, la Interventoría remitió el aval para la distribución del volante No. 31 socializando la instrucción de la Entidad respecto al número que se debe relacionar en el ícono del calendario a partir de la fecha.

El 23 de febrero, el Contratista brindó atención presencial en el Punto SAU del municipio de Sibaté en el horario establecido.

El 24 de febrero, el Contratista difundió a través del grupo de WhatsApp del municipio de Sibaté el volante No. 31. Invitación al comité de participación No. 8.

Generales - componente social.

El 23 de febrero, el Contratista radicó a través de correo electrónico el comunicado FOR-CO-03-ICCU031-610 a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN solicitando información sobre personal disponible en la Entidad que se encontrara en proceso de reincorporación para vincularlos laboralmente al proyecto para los tramos de municipio de Fómeque y Chipaque. A través del mismo medio y en la misma fecha, la ARN confirmó el recibido de la solicitud bajo el número de radicado EXT26-002392.

El 23 de febrero, el Contratista remitió a través de correo electrónico el informe semanal No. 35 mediante el cual reportaron las actividades realizadas por el componente social entre el 14 y el 20 de febrero del 2026.

El 23 de febrero, el Contratista radicó el comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-609 solicitando a la interventoría el ajuste del cronograma de revisión de actas e informes mensuales.

El 23 de febrero, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 46, realizada el 11de febrero del 2026, para su verificación y firma.

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**

El 23 de febrero, se realizó la mesa de trabajo No. 48, la cual contó con la participación de los profesionales sociales del ICCU, Contratista e Interventoría.

El 24 de febrero, la Interventoría radicó el comunicado 766-623 a través del cual remitió las observaciones al informe mensual No. 10 del mes de enero en versión1 (respuesta al comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-588).

El 25 de febrero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico la lista de chequeo del mes de enero del 2026 al Contratista para su revisión y firma.

El 25 de febrero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico acuso enterado de la gestión realizada con la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) dando cumplimiento contractual y a lo acordado (acciones bimensuales).

El 25 de febrero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico mensaje recordando lo indicado en el comité de seguimiento No. 41, respecto a incluir las atenciones presenciales en los Puntos SAU de Guavio y Soacha junto con su registro fotográfico en el informe semanal No. 35, igualmente, verificar si faltaba reportar otras actividades

El 25 de febrero, la Interventoría remitió a través de correo electrónico observaciones al informe semanal No. 34 (del 7 al 13 de febrero), para atención por parte del Contratista.

El 25 de febrero, los profesionales sociales del Contratista y la Interventoría participaron en el comité de seguimiento No. 41.

El 26 de febrero, el Contratista remitió mediante correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 46, debidamente firmada.

El 26 de febrero, la Interventoría remitió mediante correo electrónico el acta de la mesa de trabajo No. 47, realizada el 13 de febrero del 2026 para verificación y firma de los participantes. A través del mismo medio y en la misma fecha, el Contratista remitió el acta debidamente firmada.

El 26 de febrero, la Interventoría remitió mediante correo electrónico las observaciones a la presentación proyectada para el comité de participación No. 8 del municipio de Sibaté.

El 26 de febrero, la Interventoría remitió mediante correo electrónico acuso enterado del envío de la copia del acta del comité de participación No. 5 del municipio de Junín a los asistentes que brindaron sus datos, no obstante, recordó que la copia del acta de los comités de participación se debe remitir tanto a los asistentes como a los integrantes del comité de participación.

El 26 de febrero, la Interventoría debido a un error en el cargue del documento el 25 de febrero, remitió un alcance a través de correo electrónico con una mínima observación al informe semanal No. 34 (del 7 al 13 de febrero), para atención por parte del Contratista.

El 27 de febrero, la Interventoría radicó el comunicado 766-644 a la Entidad con la remisión del informe Semanal de interventoría No 45-Contrato ICCU-219-2025.

El 27 de febrero, la Interventoría radicó el comunicado 766-648-ICCU a la Entidad con el informe mensual No. 10 de Interventoría del mes de enero de 2026 en versión 1, para su respectiva revisión.

El 27 de febrero, se realizó la mesa de trabajo No. 49 del área social de manera presencial, revisando los pendientes del componente social y estableciendo compromisos.

4.4 GESTIÓN SST DEL PROYECTO

INFORME SST - SEMANAL DEL 23 AL 28 DE FEBRERO DE 2026
1.Comités: Interno el día 25 de febrero 2026, con la participación de todos los componentes de la interventoría, Consorcio Sofán y ICCU.
Actividades desarrolladas en los municipios de: Choachí y Junín-Gama:
Punto de Choachí:
- Verificación, delimitación y señalización en sitio de obra.
- Supervisión y acompañamiento en obra.
- Inspección de maquinaria.
- Instalación PMT.
- Jornada de orden y aseo.
- Entrega de EPP según necesidad de cada colaborador y verificación de estos.
- Inspección de Kit de emergencia.
- Se brinda charla de 5 minutos.

Charlas de seguridad en el punto de Choachí:
- 23/02/2026: Estrés laboral.
- 24/02/2026: Accidentes por distracciones (celular).
- 25/02/2026: Que hacer y como actuar en una emergencia.
- 26/02/2026: Empatía – Trabajo en equipo.
- 27/02/2026: Comunicación asertiva.
- 28/02/2026: Orden aseo en el lugar de trabajo.

1.Gestión y apoyo administrativo de punto Choachí:
- Recepción de carpetas personal del punto en mención.
- Inducción de personal de ingreso.
- Informe semanal.
- Implementación formatos SST y Ambiental.

Punto de Sueva- Junín-Gama:
- Verificación he instalación de señalización en sitio de obra.
- Supervisión y acompañamiento en obra.
- Verificación de puntos ecológicos, kit de emergencia en obra. (Gama y Junín).
- Aseguramiento documental en campo (ATS- Preoperacionales- Charlas-Inspecciones).
- Reposición de EPP según necesidad.
- Cierre de hallazgos Gama.
- Se brinda charla de 5 minutos.

Charlas de seguridad en el punto de Sueva- Junín-Gama:

- 23/02/2026: Manejo de residuos (Separación).
- 24/02/2026: Trabajo en equipo.
- 25/02/2026: Convivencia laboral.
- 26/02/2026: Diligenciamiento documental en campo (ATS- Según corresponda).
- 27/02/2026: Riesgo biológico.

1.Gestión y apoyo administrativo de punto Junín:
- Generación de informes SST y ambiental.
- Validación de carpetas de personal – Apoyo en cierre de observaciones informe Nª10.
- Novedades: Ingresos: 0
- Incapacidades: 0
- Retiros: 1 el señor Edwar Alberto Garavito García con fecha de retiro 24/02/2026.

4.5 SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Se remitió al contratista el oficio 766-640 SOLICITUD AJUSTE DE PRs TRAMO JUNIN, para que se realice el levantamiento final de las secciones estabilizadas, y se tengan las abscisas completamente definidas y precisas con el fin de validar el alcance físico previamente aprobado.

4.6 GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se radicó al contratista las observaciones del acta de obra N° 2, correspondiente al mes de noviembre, para completar los anexos y documentación de soporte de las actividades cobradas. Ver oficio 766-645 OBSERVACIONES ACTA DE COBRO N°2-Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-574, Observaciones acta de cobro N°2 contrato de obra

5. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

5.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se reporta un avance positivo del 2,77%, de acuerdo con la nueva programación ajustada aprobada de la prorroga de acuerdo a que el avance programado era del 26,77% y se ha ejecutado el 29,54% mejorando el rendimiento en las actividades de estabilización de las capas de afirmado de las vías y continuando con la instalación del sello de arena asfalto en el Municipio de Sibaté en la Provincia de Soacha. Persiste en incumplimiento en la ejecución de los cinco municipios en simultaneo de acuerdo a lo exigido en el anexo técnico del contrato.

5.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se realizó la aprobación de la orden N° 9 de giro del anticipo de obra por un valor de 348.507.800. Ver oficio 766-646 Aprobación Giro 9 Anticipo obra-RTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-591 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-608

5.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Así las cosas, a corte del 27 de febrero del 2026, esta interventoría ha tramitado y aprobado la solicitud de pago del 75% de fase de caracterización, resultando en un acumulado de $ 2.084.166.072,00. Por otro lado, en relación, al desembolso del anticipo de obra, se ha tramitado y viabilizado por parte de la Interventoría hasta la solicitud N° 9 de este, presentándose a la fecha un valor acumulado aprobado de $9.518.099.341,21.Fue observado de interventoria el acta de obra N° 2 de obra correspondiente al mes de noviembre del 2025

5.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Se recibió respuesta de la no conformidad de la alcantarilla del PR4+200 del municipio de Gama, y se encuentra actualmente en revisión por Interventoría.

5.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**

Se evidencia fallos en el manejo del Código de Colores establecidos en la Resolución 2184 de 2019.
Se encuentra pendiente la remisión de los Certificados de Suministro de agua emitido por la Empresa de Servicios públicos de los municipios de Junín, Gama, Choachí, correspondientes al mes de enero del 2026.

5.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

NA

5.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Los documentos de personal de: Gama y Choachí están pendientes por subsanar.

5.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Durante la semana del 21 al 27 de febrero de 2026 se identificaron situaciones problemáticas asociadas principalmente a reiteradas observaciones y ajustes a informes, actas y presentaciones (informe semanal No. 34 y mensual No. 10). También se evidenciaron recordatorios por omisiones en reportes (registro de atenciones en Puntos SAU) y errores en el cargue de documentos, además del traslado de una PQR con plazo perentorio que exige respuesta oportuna. Estas situaciones tienen como causas principales debilidades en la verificación interna y control documental, falta de estandarización clara de lineamientos desde la Entidad y necesidad de fortalecer la trazabilidad y seguimiento a compromisos, lo que incrementa la carga operativa y el riesgo de retrasos en el componente social.

6. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Inicio de actividades de construcción de alcantarillas Municipio de Ubalá	Consorcio Sofán C-031	3/03/2026
Inventario y estimación de longitudes y anchos de cunetas proyectadas en Infinity layer para el lote 1	Consorcio Sofán C-031	27/03/2026
Atención no conformidades secciones estabilizadas en el tramo de Junín	Consorcio Sofán C-031	27/03/2026
Afiliaciones Gama, Choachí y Junín.	Consorcio Sofán C-031	26/02/2026
Inicio de quinto frente de obra(Fómeque)	Consorcio Sofán C-031	10/03/2026

7. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para el presente informe semanal no se contemplará este capítulo, toda vez que, el proyecto se encuentra finalizando la fase de caracterización de las vías que se van a intervenir y por ahora el contratista no ha presentado actividades no previstas ni mayores cantidades.

8. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Continúan las actividades por parte del contratista de obra relacionadas con la intervención de la rasante de la vía en el tramo correspondiente al municipio de Junín. Actualmente se ejecutaron trabajos entre el PR 11+055 y el PR 11+680, en la vereda valle, correspondiente al ultimo tramo de intervención en esta vereda. se espera se finalice la próxima semana finalizar actividades en esta vereda.
Se iniciaron actividades de construcción de alcantarilla en el PR 12+800 en el municipio de Junín con actividades de excavación, solado, atraque e instalación de tubería de 36", fundida de zarpa y muro del descole y armado de acero de la poceta. se espera continuar actividades en otra de las alcantarillas que se tienen proyectadas la próxima semana.
En el municipio de Gama se finalizo con las actividades de fundida de pocetas de encole de las cuatro (4) alcantarillas.
Se continúa con las actividades de mejoramiento de rasante en el municipio de Gama, iniciando en el PR 0+190 hasta el PR 0+190 y del PR2+760 al PR3+000 finalizando con actividades de mejoramiento de rasante. Durante la semana se ejecutaron un total de 530ml, para un total intervenido de 3000m lineales, se dará continuidad a las actividades limpieza de alcantarillas en este municipio iniciando desde el PR 0+000 y limpiando cada una de las alcantarillas hasta el PR 3+000.
Se continúa con la actividad de estabilización del afirmado de la vía de la abscisa K11+480 a la abscisa K12+080 correspondiente al tramo de la Vereda Maza y de la abscisa K12+110 a la abscisa K12+220 correspondiente al tramo de la Vereda Ferralarada, para un total estabilizado de 710,00 metros en el Municipio de Choachí.
Se continúa con la actividad de instalación del sello de arena-asfalto sobre el material remanente estabilizado de la vía con 1.510,00 metros de la abscisa K3+640 a la abscisa K5+150 correspondiente al tramo de la Vereda Altocharco para un total cubierto de 1.610,00 metros en el Municipio de Sibaté.
A corte del 27 de febrero de 2026, la Interventoría del contrato ICCU-138-2025 mantiene seguimiento activo sobre el cierre de los compromisos pendientes de la Fase II, los cuales deben ser atendidos con prontitud por parte del Consorcio Sofán C-031. En cuanto al avance físico, se tiene proyectado el reinicio de actividades de alcantarillas en Ubalá el 3 de marzo y el inicio de sello arena-asfalto en Choachí el 9 de marzo de 2026.
En materia financiera, se han tramitado y aprobado pagos acumulados por concepto de caracterización por valor de $2.084.166.072,00 (75% de la fase), y desembolsos de anticipo de obra hasta la solicitud N°9, con un acumulado aprobado de $9.518.099.341,21. El acta de obra N°2 (noviembre 2025) fue observada y se encuentra pendiente de subsanación por parte del contratista. Adicionalmente, se adelanta la revisión de la no conformidad de la alcantarilla del PR4+200 en el municipio de Gama, y se solicitó el levantamiento final de abscisas del tramo de Junín mediante oficio 766-640, con el fin de validar el alcance físico previamente aprobado.
La Interventoría continuará ejerciendo control y seguimiento riguroso sobre los compromisos técnicos, administrativos y financieros del contrato, conforme a sus obligaciones contractuales.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

9.1. FASE I - DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN VIAL:

- TERMINADAS LAS ACTIVIDADES DE GEOPOSICIONAMIENTO Y LEVANTAMIENTO DE CAPAS GEOGRÁFICAS

9.2. FASE II - CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y PROPUESTA DE INTERVENCIONES:

- TERMINADOS LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Y SUELOS ESTABILIZANTES A LAS MUESTRAS TOMADAS EN LOS APIQUES

9.3. FASE III - INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS:

PROVINCIA DEL GUAVIO

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE JUNÍN EN EL TRAMO: SUEVA - SAN FRANCISCO - VALLE JUNÍN

VERIFICACIÓN DE PMT





LIMPIEZA MANUAL DE ALCANTARILLLAS





ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	28-feb-26	SEMANA No.	46	DEL	21-feb-26	AL	27-feb-26





ESCARIFICACIÓN CON RETROCARGADOR Y RETIRO DE SOBRETAMAÑOS





LIMPIEZA DE CUNETAS





EXTENDIDO DE CEMENTO






RECICLADO DE MATERIAL REMANENTE CON CEMENTO Y VERIFICACIÓN DE ESPESOR DE CAPA INTERVENIDA

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**



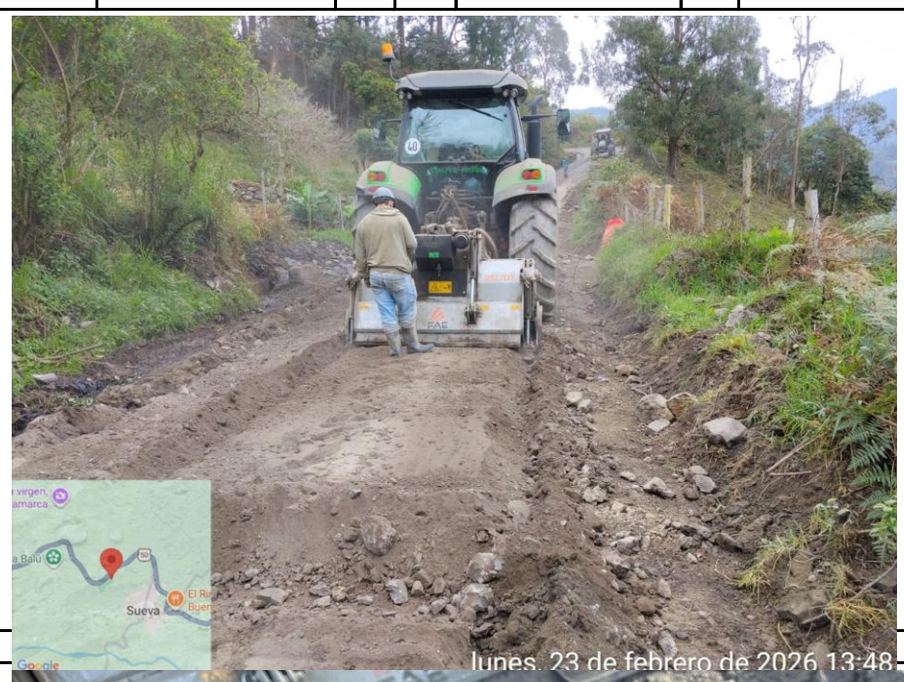

RECI **NIDA**





RIEGO DE ADITIVO CON AGUA





CERE





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**





EXCAVACIÓN, FUNDIDA DE SOLADO, INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO DE 36", ATRAQUE Y EMBOQUILLADO





EXCA OQUILLADO



EXCA OQUILLADO





EXCAVACIÓN, AMARRE DE REFUERZO ZARPA DE ALCANTARILLA DE DESCOLE





ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**

FUND






AMAR



FUND

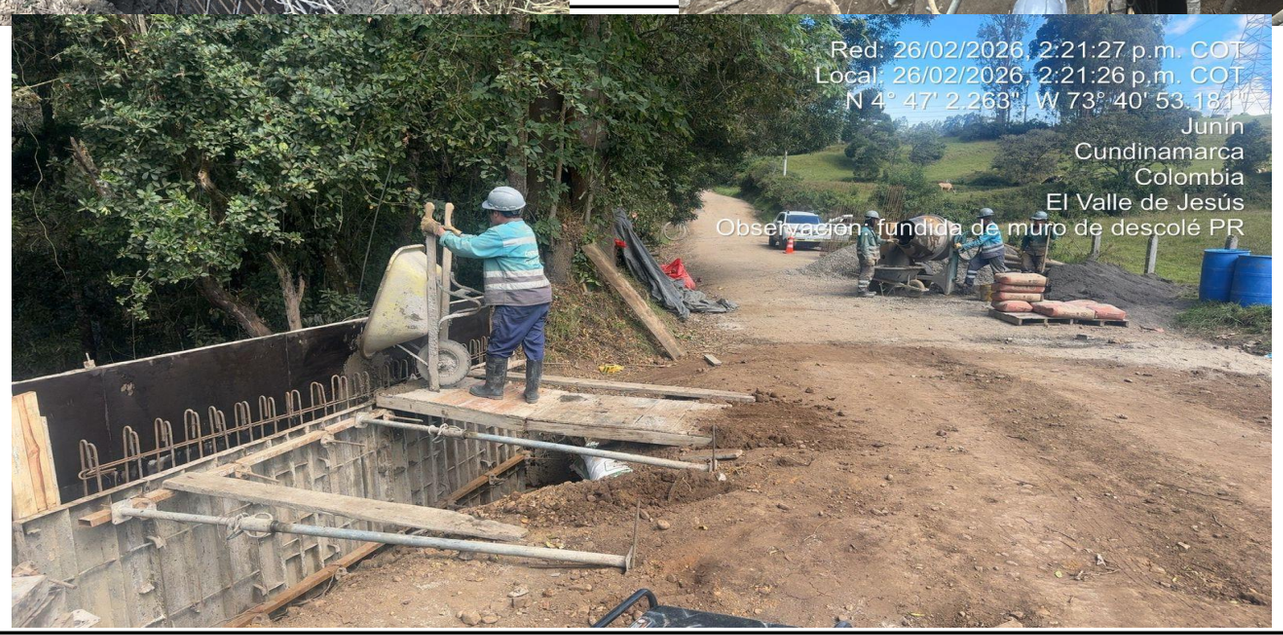

EXCAVACIÓN, AMARRE DE REFUERZO POCETA DE ALCANTARILLA DE ENCOLE





FORM

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	28-feb-26	SEMANA No.	46	DEL	21-feb-26	AL	27-feb-26





RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO





SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE GAMA TRAMO: CLEMENTE-PALENQUE-RÍO SUCIO

VERIFICACIÓN DE PMT Y TOPOGRAFÍA





VERIFICACIÓN DE PLOMO DE MURO DE ALCANTARILLA DE DESCOLE





LIMPIEZA DE CUNETAS, ESCARIFICADO Y RETIRO DE SOBRETAMAÑOS





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**





EXTENDIDO DE CEMENTO





RECICLADO DE MATERIAL REMANENTE CON CEMENTO





VERIFICACIÓN DE ESPESOR DE CAPA INTERVENIDA





DOSIFICACIÓN DE ADITIVO EN EL AGUA Y RIEGO





ICCU	FORMATO							CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							FECHA	22/02/2023
PERIODO DE INFORME SEMANAL									
CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	FECHA	28-feb-26	SEMANA No.	46	DEL	21-feb-26	AL	27-feb-26





HOMOGENIZACIÓN DE RECICLADO CON ADITIVO





CEREO





COMPACTACIÓN





RECO





PROVINCIA DE ORIENTE:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHÍ TRAMO: EL ROSARIO-LA CAJA-CHATASUGÁ-LA LLANADA-FERRALARADA-BARRO NEGRO-GRANADILLO-CHIVATE-RESGUARDO BAJO

VERIFICACIÓN DE PMT

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**





ESCARIFICADO CON RIPER DE MOTONIVELADORA





RETIRO DE SOBRETAMAÑOS






EXTENDIDO DE CEMENTO





RECICLADO DE MATERIAL REMANENTE CON CEMENTO



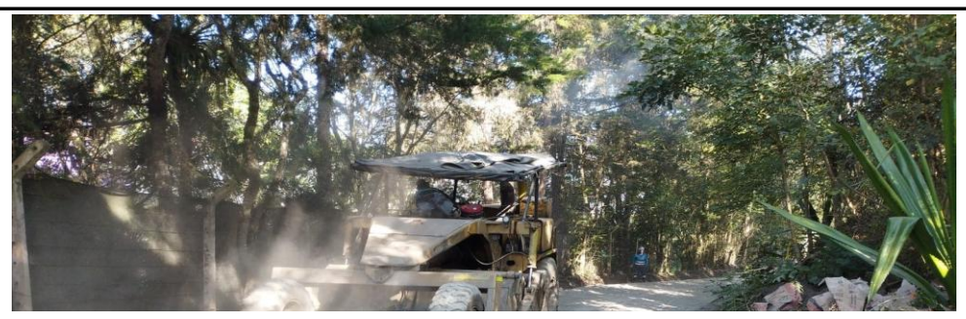

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**





RIEGO DE ADITIVO CON AGUA





HOMOGENIZACIÓN DE MATERIAL RECICLADO CON ADITIVO





CEREO





COMPACTACIÓN





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**

RECOLECCIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO





PROVINCIA DE SOACHA:

SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ TRAMO: VEREDA SAN RAFAEL - VEREDA ALTOCHARCO - SECTOR ACTO DE LA VIRGEN - VEREDA LA UNIÓN

VERIFICACIÓN DE PMT





SOPLETEADO PARA INSTALACIÓN DEL SELLO DE ARENA-ASFALTO SOBRE EL MATERIAL REMANENTE ESTABILIZADO DE LA VÍA






RIEG





SE E





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**





COMP





SOPL

STABILIZADO





INSTALACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CALIENTE Y GRAVA DE 1/2"





COMPACTACIÓN CON COMPACTADOR DE LLANTA





PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**






COMITÉ DE SEGUIMIENTO SEMANAL No. 41 - 25 DE FEBRERO




MESA DE TRABAJO No. 48 Y 49 - 23 Y 27 DE FEBRERO

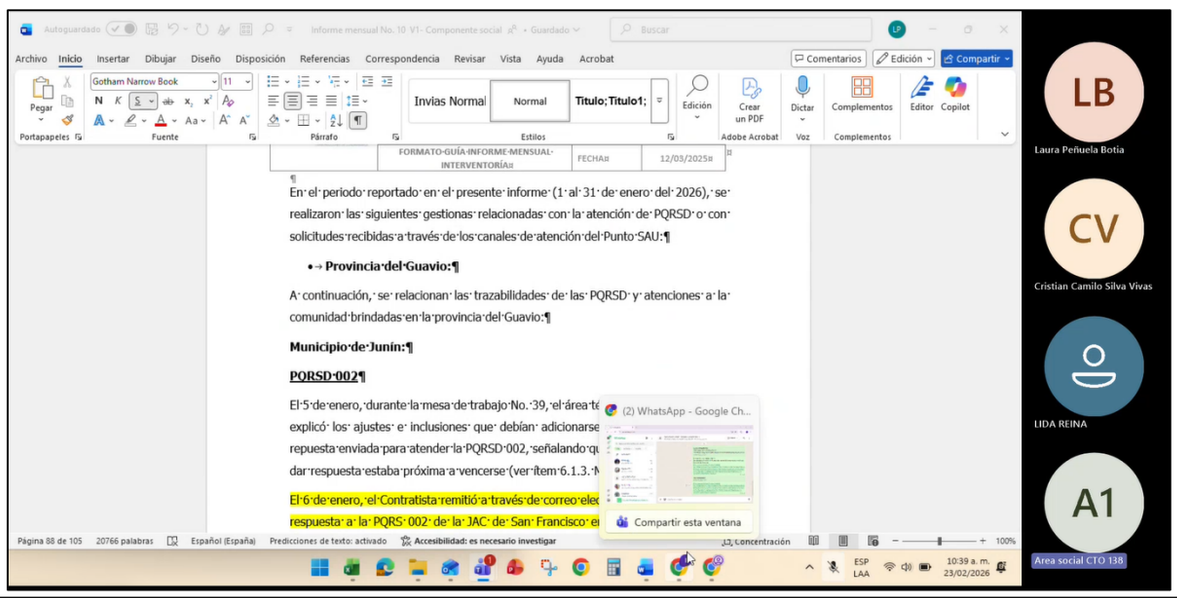



ATENCIÓN PUNTOS SAU - SOACHA Y ORIENTE



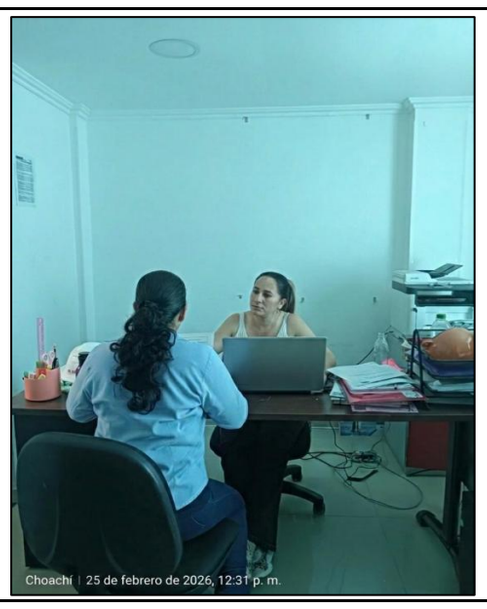

RECORRIDO INTERVENTORÍA - 25 DE FEBRERO





COMITÉ DE PARTICIPACIÓN No. 7 - MUNICIPIO DE JUNÍN

PERIODO DE INFORME SEMANAL

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC	**FECHA**	**28-feb-26**	**SEMANA No.**	**46**	DEL	**21-feb-26**	AL	**27-feb-26**



REUNIÓN DE INICIO No. 8 - MUNICIPIO DE FOSCA





Roberto López

Firmado digitalmente por Roberto López
Fecha: 2026.03.03 20:08:13 -05'00'

DIRECTOR DE INTERVENTORIA FASE III

Nombre: Roberto Carlos López Julio
