Relleno con material del sitio compactado mecánicamente.









Mampostería en ladrillo rejilla.





1000





Red de aguas sanitarias.









1001

Cajas de inspección eléctricas.









Sellado e impermeabilización exterior tanque igol denso.





1002

Rellenos en subbase granular zonas de urbanismo.




4.13 MES DE ABRIL DEL 2024.

En el mes de abril del presente año, se realizaron las siguientes actividades contractuales: Excavación manual para cajas de inspección sanitarias, retiro de sobrantes a botadero autorizado, rellenos con material de sitio en las redes de conexiones de cajas eléctricas y sanitarias, redes eléctricas en los bloques (A, B, C, D, E, F y G), tubería de alcantarillado de 6" y 8" para conexiones de cajas, se realiza instalación de estructura metálica para redes eléctricas en los bloques (C, D, E, F y G), instalaciones de mampostería en ladrillo rejilla tipo Santafé en los bloques (C, D, E, F y G), dinteles, dovelas, enchape en ladrillo e hilada parada de ladrillo a la vista, pañete impermeabilizado para muros 1:3, E=1.5 cm, muro en bloque N.5 E=12cm, redes de suministro de agua potable y cajas de inspección sanitarias.

Excavación manual para redes hidráulicas, eléctricas y cárcamos.









Estructura metálica en bloques (C, D, E, F y G).








Relleno con material del sitio compactado mecánicamente.










Mampostería en ladrillo rejilla.










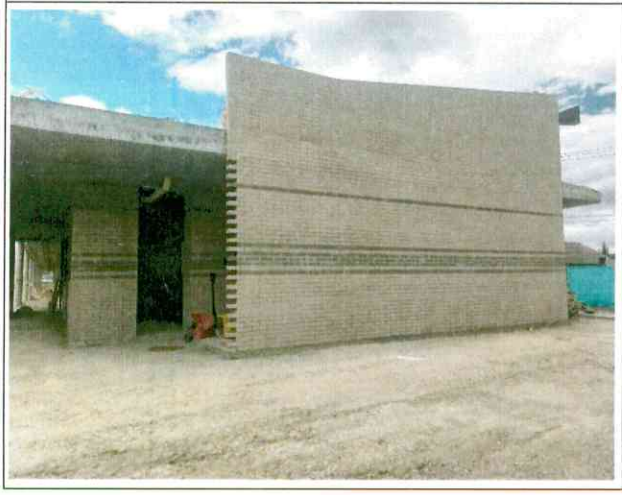

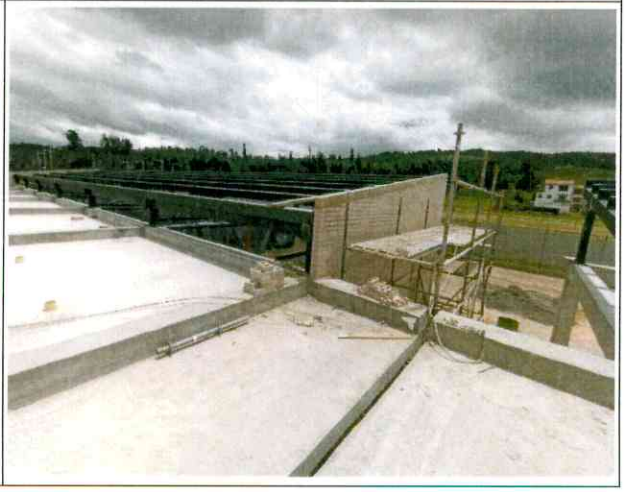


1006

Pañete impermeabilizado 1:3.







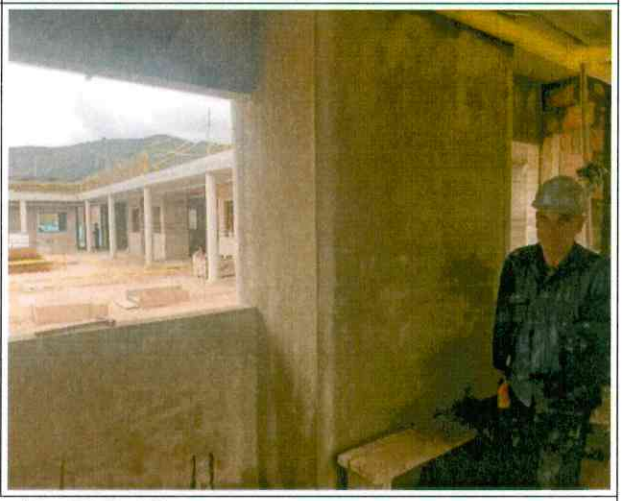

Muro en bloque No.5 E=12cm.










Red de aguas sanitarias.





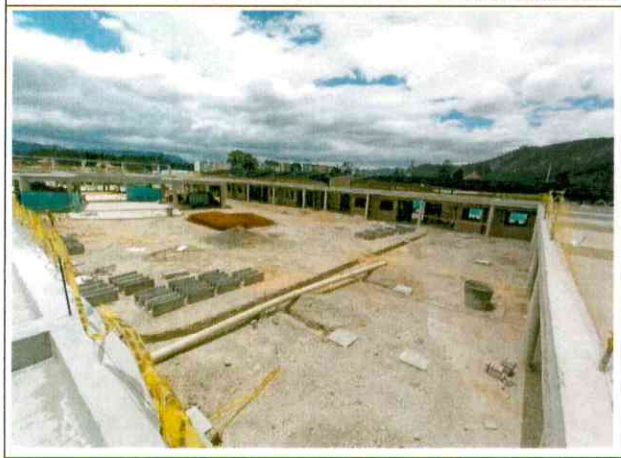



Redes de suministro de agua potable.









Redes eléctricas.





1009



Cajas de inspección sanitarias.



1010




4.14 MES DE MAYO DEL 2024.

En el mes de mayo del presente año, se realizaron actividades según avance programación de las siguientes actividades: Excavación manual para cajas de inspección sanitarias, retiro de sobrantes a botadero autorizado, rellenos con material de sitio en las redes de conexiones de cajas eléctricas y sanitarias, redes eléctricas en los bloques (A, B, C, D, E, F y G), tubería de alcantarillado de 6" y 8" para conexiones de cajas, se realiza instalación de estructura metálica para redes eléctricas en los bloques (C, D, E, F y G), instalaciones de mampostería en ladrillo rejilla tipo Santafé en los bloques (C, D, E, F y G), dinteles, dovelas, enchape en ladrillo e hilada parada de ladrillo a la vista, pañete impermeabilizado para muros 1:3, E=1.5 cm, muro en bloque N.5 E=12cm, redes de suministro de agua potable y cajas de inspección sanitarias.

Excavación manual para redes hidráulicas, eléctricas y cárcamos.




1011



Relleno con material del sitio compactado mecánicamente.













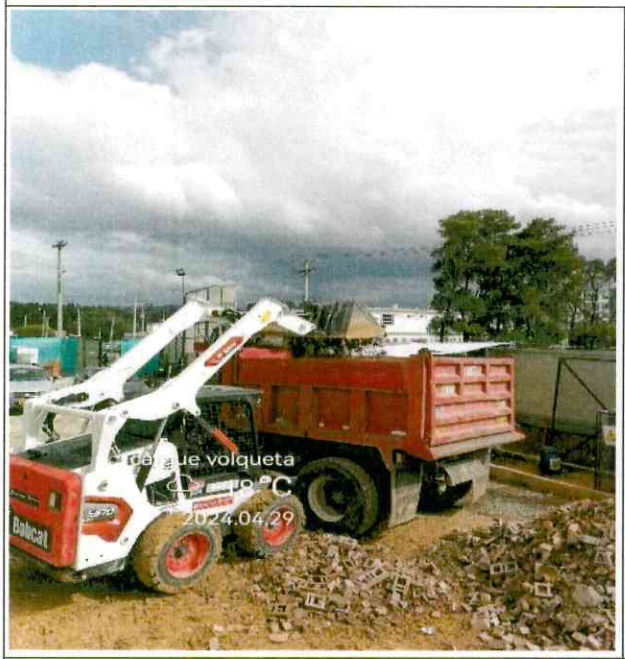

Retiro de sobrantes a botadero autorizado.	
	
ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA (LAMINA CR, PARA POLIDEPORTIVO, INCLUYE CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, COLUMNAS, VIGAS DE AMARRE, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA. CONTEMPLA TAMBIEN FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE.	
	

Muro ladrillo rejilla 0.12 m, dos caras a la vista.



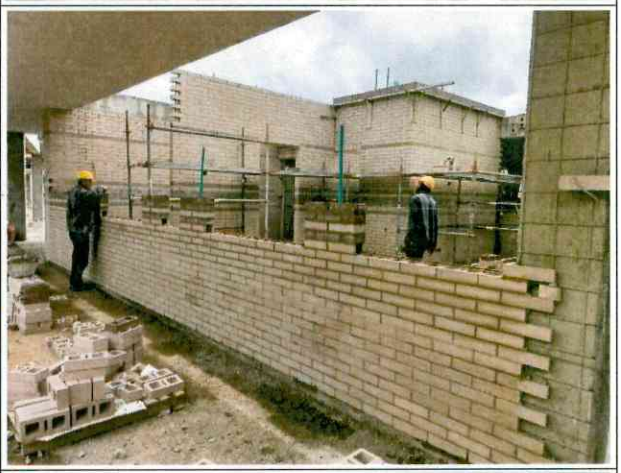




1016





ALISTADO PISOS 1:3 E=0.04

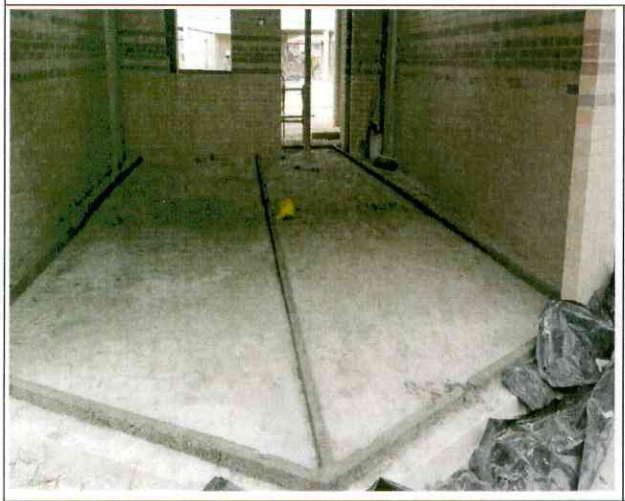










PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM.









MURO EN BLOQUE N.5 E=12CM.




1019






TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26.







1021

RED DE AGUAS SANITARIAS.





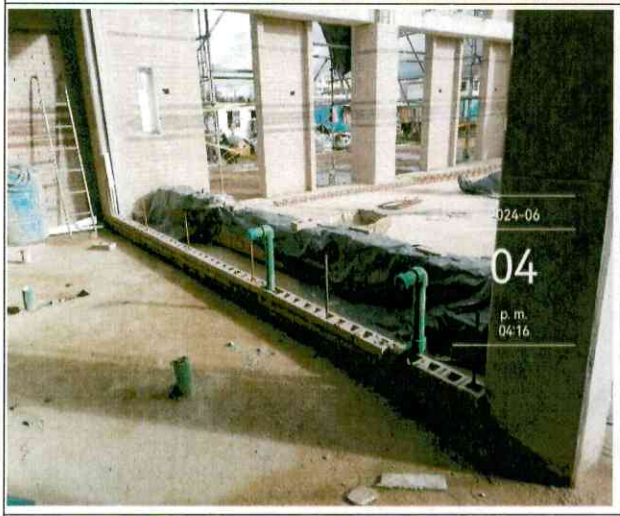







1022

REDES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.









REDES ELECTRICAS.









CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS.










4.15 MES DE JUNIO DEL 2024.

En junio del presente año se realizaron actividades según cronograma de obra: Como excavación manual para cajas de inspección y redes de conexiones sanitarias, retiro de excavaciones a botadero autorizado, rellenos con material de sitio en las redes de conexiones de cajas eléctricas y sanitarias, redes eléctricas en los bloques (A, B, C, D, E, F y G), tubería de alcantarillado de 6", 8", 10" y 12" para conexiones de cajas, se realiza instalación de estructura metálica para redes eléctricas en los bloques (A y B), suministro de instalaciones de mampostería en ladrillo rejilla en los bloques (A y B), dinteles, dovelas, enchape en ladrillo e hilada parada de ladrillo a la vista, pañete impermeabilizado para muros 1:3, E=1.5 cm, muro en bloque N.5 E=12cm, suministro e instalación de cubierta en teja tipo Sándwich 525-C CAL. 26, muros en bloque No. 5 en los bloques (A, B, C, D, E, F y G), alistado de pisos en los bloques (C, D, E, F y G), redes de suministro de agua potable y cajas de inspección sanitarias.

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN.

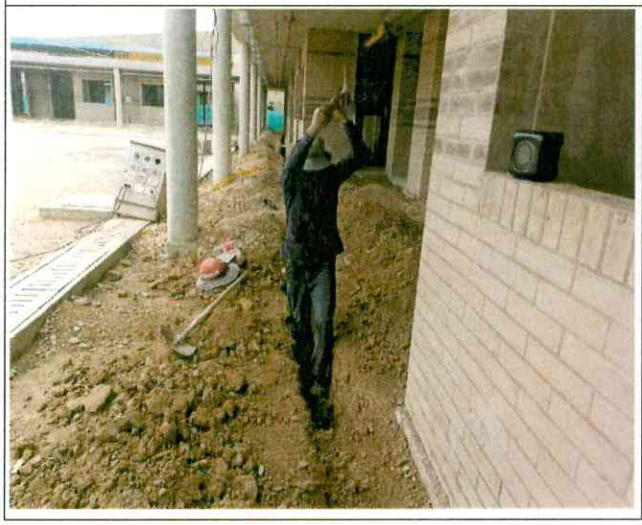



1025






RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE.








RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO.









ESTRUCTURA METALICA EN LOS BLOQUES A y B.








SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3500PSI PARA PLACA DE CONTRAPISO e=0.10.






MURO LADRILLO REJILLA 0.12 M, BLOQUE A y B.











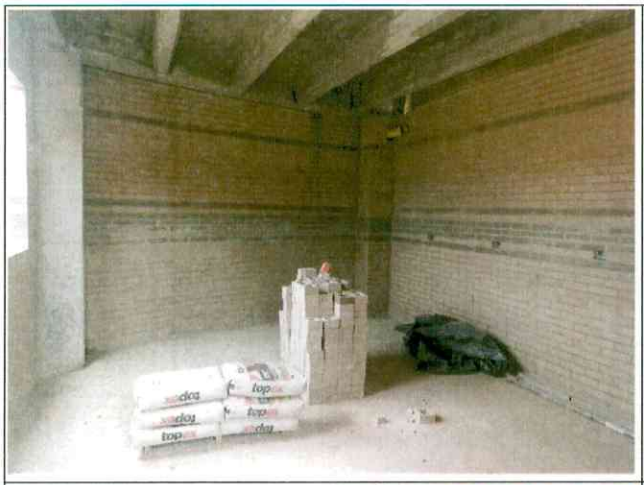

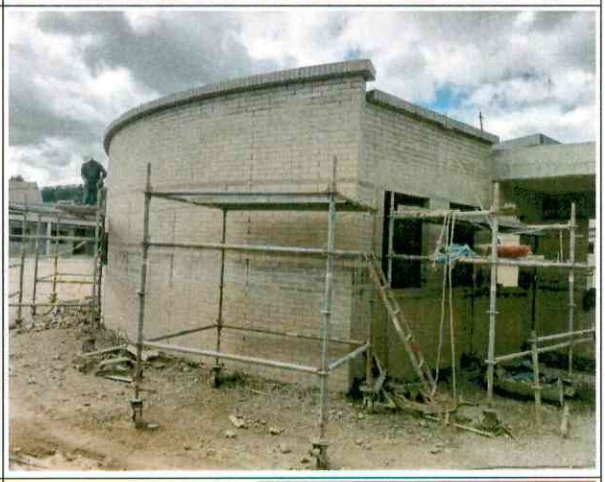

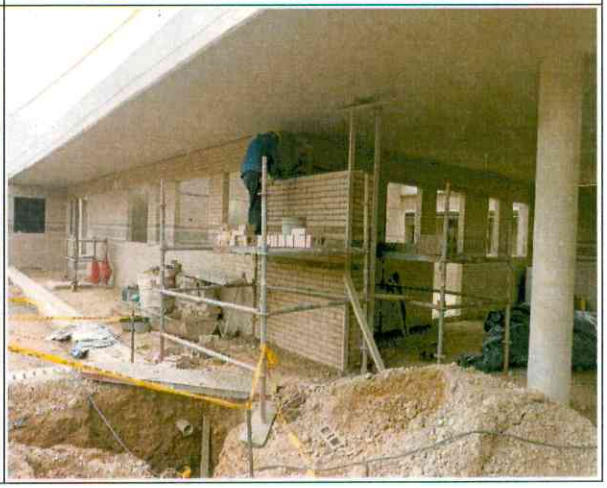



ALISTADO PISOS 1:3 E=0.04















PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM.



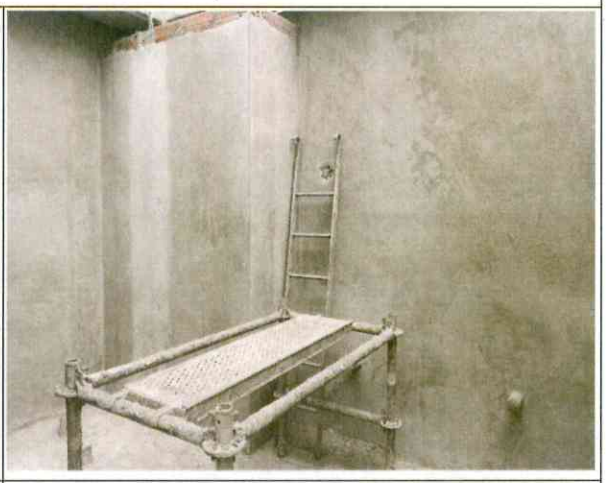



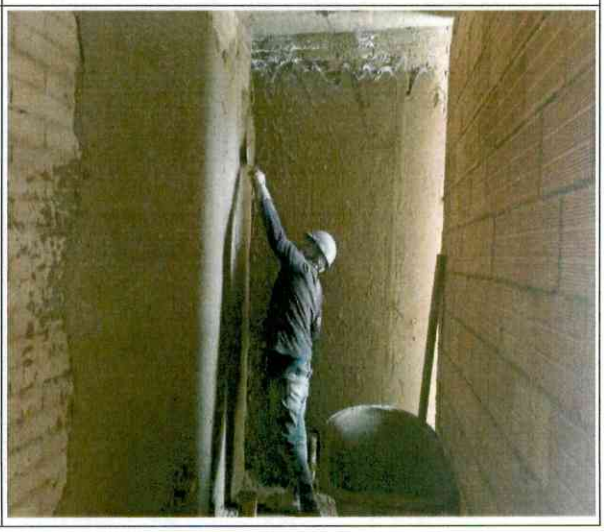







MURO EN BLOQUE N.5 E=12CM: ubicados en las aulas de los bloques (C, D, E, F y G).



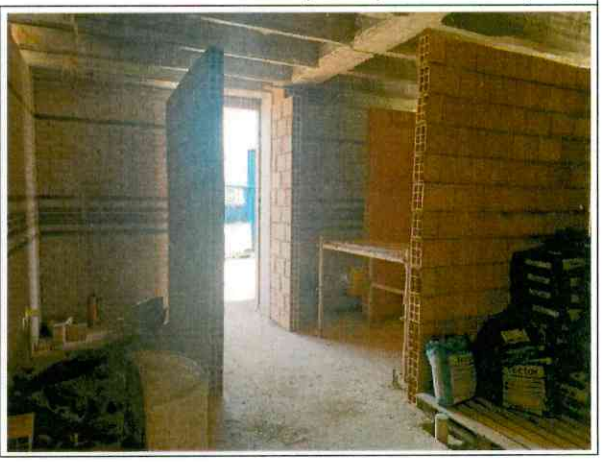








TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26: instalación en los bloques (C, D, E, F, y G).





RED DE AGUAS SANITARIAS: Se realiza las instalaciones de la red de aguas sanitarias en tubería sanitaria de 4", 6", 8" y 10" de los bloques (C, E, y F).









1035














1036





SE REALIZA PRUEBAS HIDROSTÁTICAS BAÑOS AULAS (C, D, E, F Y G).

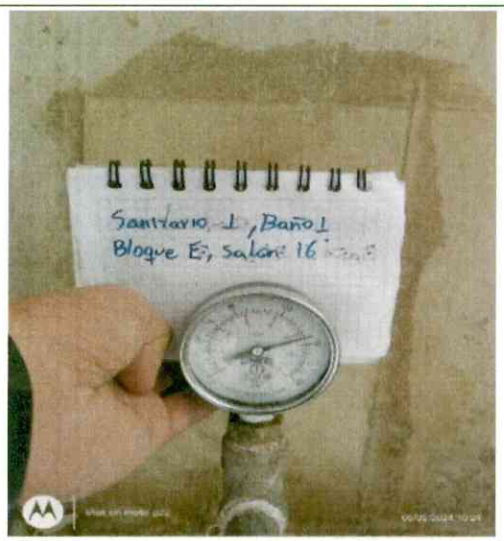



REDES ELECTRICAS:





CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS: Cajas de inspección sanitarias para conexiones de aguas lluvias y sanitarias en zonas internas de los bloques (A, B, C, D, E, F y G).






4.16 MES DE JULIO DEL 2024.

En julio del presente año se realizaron actividades según cronograma de obra: Como excavación manual para cajas de inspección y redes de conexiones sanitarias, retiro de excavaciones a botadero autorizado, rellenos con material de sitio en las redes de conexiones de cajas eléctricas y sanitarias, redes eléctricas en los bloques (A, B, C, D, E, F y G), tubería de alcantarillado de 6", 8", 10" y 12" para conexiones de cajas, se realiza instalación de estructura metálica para redes eléctricas en los bloques (A y B), suministro de instalaciones de mampostería en ladrillo rejilla en los bloques (A y B), dinteles, dovelas, enchape en ladrillo e hilada parada de ladrillo a la vista, pañete impermeabilizado para muros 1:3, E=1.5 cm, muro en bloque N.5 E=12cm, suministro e instalación de cubierta en teja tipo Sándwich 525-C CAL.

26, muros en bloque No. 5 en los bloques (A, B, C, D, E, F y G), alistado de pisos en los bloques (C, D, E, F y G), redes de suministro de agua potable y cajas de inspección sanitarias.

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): Se realiza actividades de excavación manual para redes hidráulicas y eléctricas, cárcamos, cajas de inspección eléctricas y sanitarias.














RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE: Se rellena con material de sitio, todas las redes de alcantarillado y redes eléctricas.





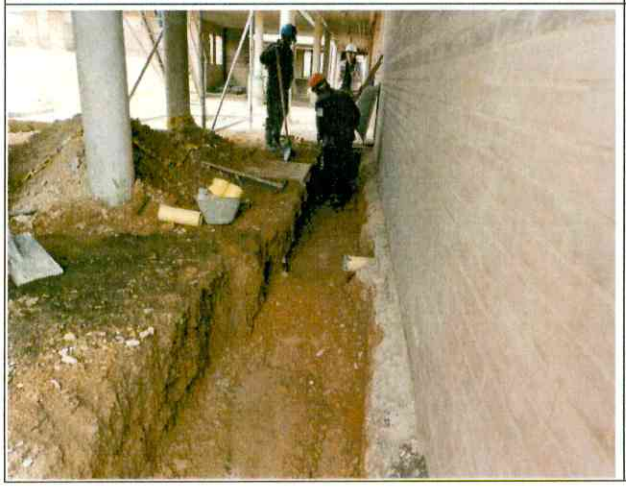



RETIRO DE SOBRANTES A BOTADERO AUTORIZADO.





ESTRUCTURA EN PERFILES LAMINA DELGADA. CONTEMPLA TAMBIEN FABRICACION SUMINISTRO Y MONTAJE: Se realiza instalación en los bloques (A y B).









1041

