SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA: Se instala las ventanas en ingresos, en zonas administrativas, comedor y auditorio.










SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS: Se instalan puertas de cuartos eléctricos.




SELLO DE FISURAS EN PLACA DE PATIO PRINCIPAL: Se realiza e sello de las fisuras en el patio principal según recomendación de especialista.






SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZSTONE PARA LAVAMANOS INFANTILES: Se instalan lavamanos infantiles en baños aulas, comedor y auditorio.

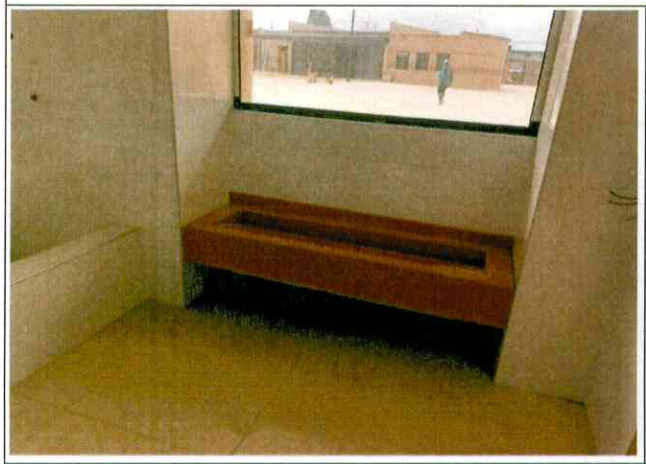




RECUPERACION DE LA VIA EN ASFALTO: Se realiza recuperación de vía en tramo afectado por la construcción del pozo de entrega de aguas lluvias.










REDES ELECTRICAS: Suministro e instalación de redes eléctricas.







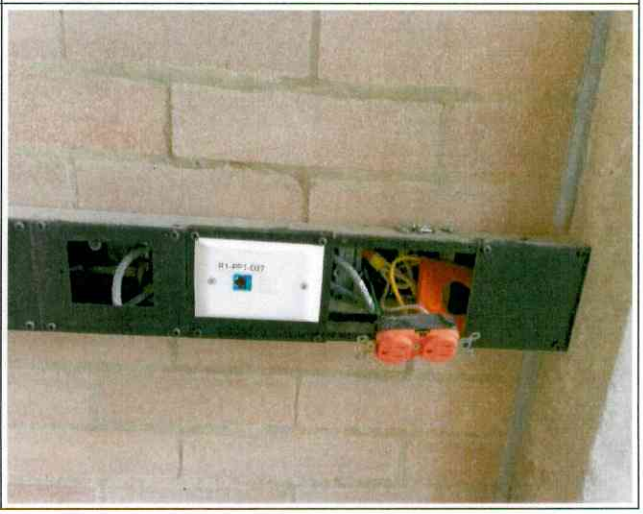

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS INFANTILES: Se instalan sanitarios infantiles en baños de aulas.



ENCHAPE EN BALDOSA GRANO DE MARMOL. Se instala en zonas administrativas, sala cunas, comedor y cocina.













SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION - BOMBAS DE AGUA POTABLE Y AGUA RECIRCULADA: Se instala equipos de bombeo de agua potable.









SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACAS DE CUBIERTA EN POLIUREA.



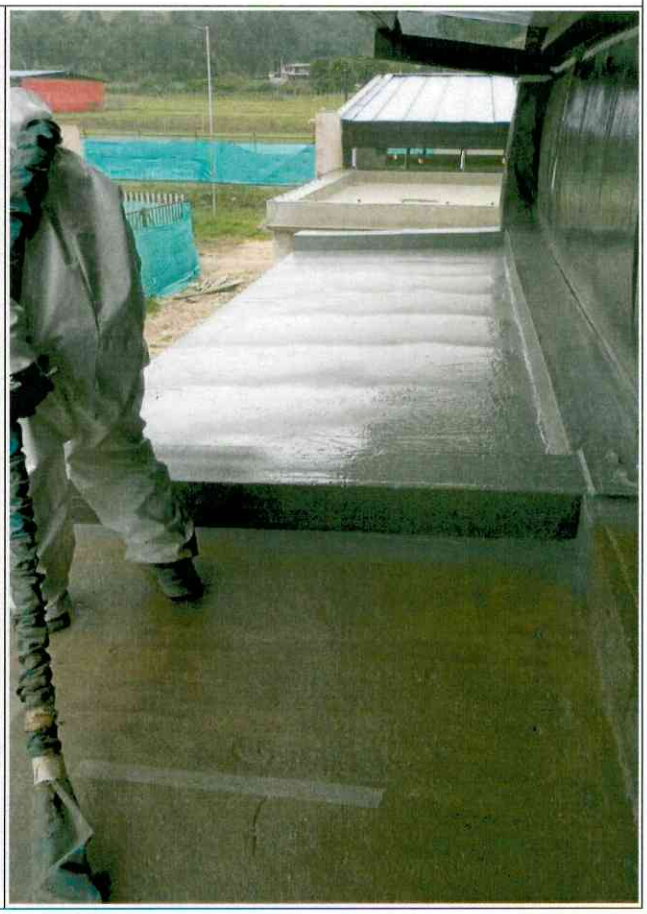
















SUMINISTRO DE LAVACOLAS: Se realiza el suministro de bañeras infantiles en zona de lava colas.





SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC E=6mm INCLUYE PERFILERIA, ANCLAJES: Se instala cielo raso en baños aulas, cocina, auditorio y zonas administrativas.



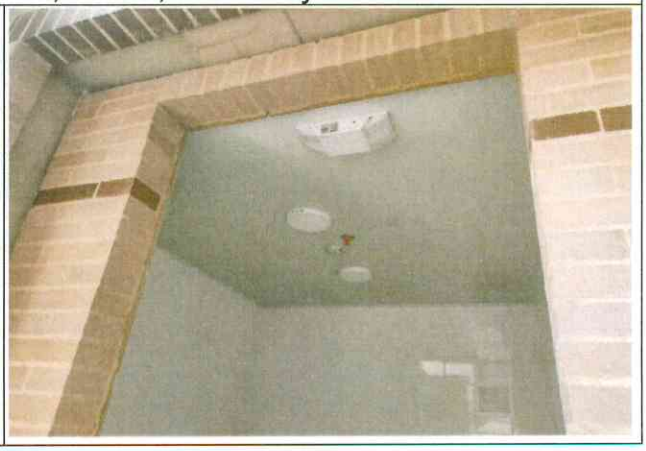



4.24 MES DE ABRIL DEL 2025.

Para el mes de abril del 2025 se realizaron las siguientes actividades según cronograma de obra: Pintura en vinilo para tapas en zonas superior de baños de aulas, escaleras tipo gato para tanque subterráneo de suministro de agua potable, redes eléctricas, redes de suministro de agua potable y sanitarias, suministro e instalación de cielo raso en PVC, ventanas en zona de comedor y vigilancia, puertas en zona de fachadas, cuartos técnicos y eléctricos, suministro e instalación de Bomba de RCI, instalación de baldosa en granito pulido, instalación de lavamanos infantiles en auditorio, pintura para tubería de 2 a 4", instalación de cubierta en policarbonato en bloque B, destronque y pulida de baldosa en granito pulido.

PINTURA TIPO VINILO INTERIOR PARA TAPAS EN BAÑOS AULAS: Se realiza pintura sobre tapas en cielo raso de baños de las aulas.






SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERAS TIPO GATO: Se realiza el suministro de las escaleras tipo gato para tanque subterráneo de agua potable y RCI.








MEDIACAÑA EN GRANITO PULIDO PREFABRICADO: Se realiza instalación de mediacaña en los bloques A y B.

















SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA: Se instala las ventanas en zona de entrega de alimentos, en vigilancia y terminación de ventanas en el bloque B.

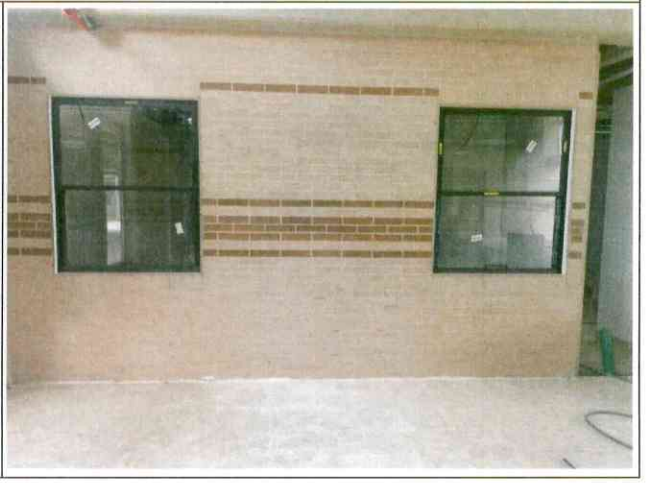






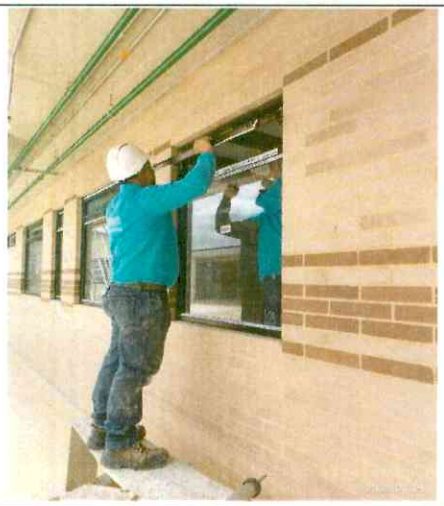

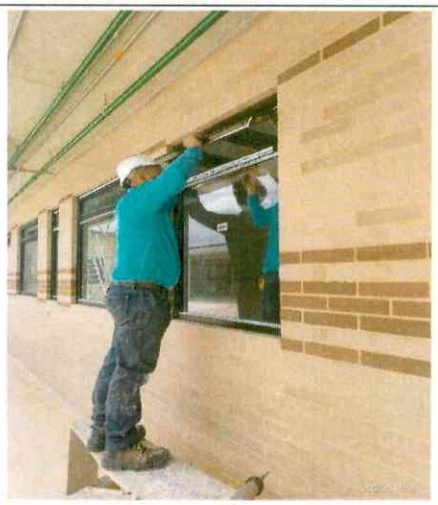

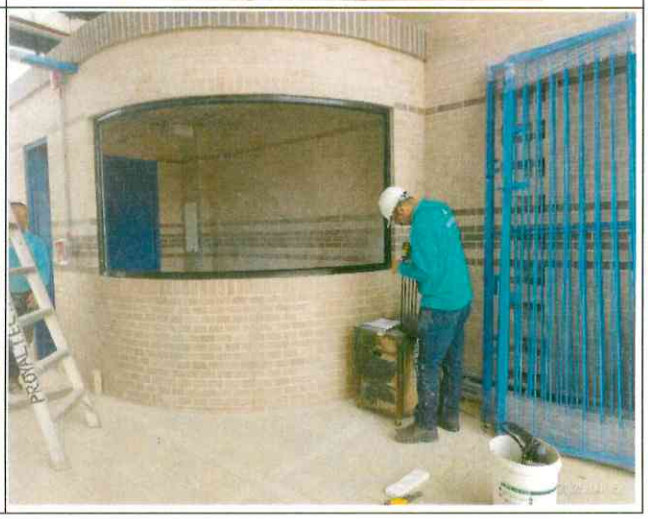










SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS: Se instalan puertas de entradas principales en zona de comedor y auditorio, en vigilancia, cocina, y cuartos eléctricos.








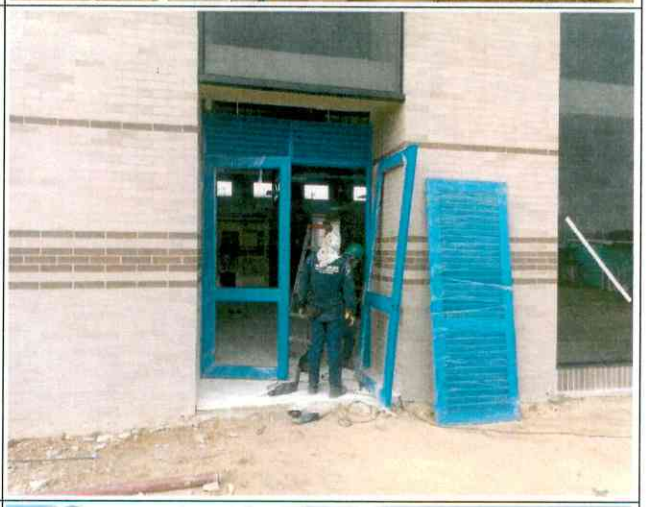

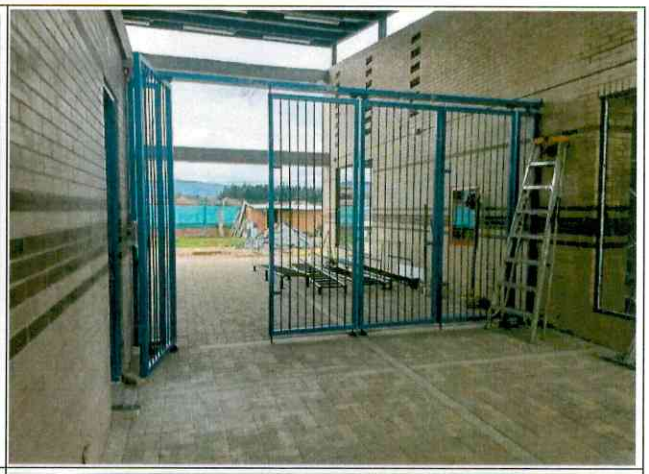

SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN QUARZSTONE PARA LAVAMANOS INFANTILES: Se instalan lavamanos infantiles en baños de comedor y auditorio.










REDES ELECTRICAS: Suministro e instalación de redes eléctricas.



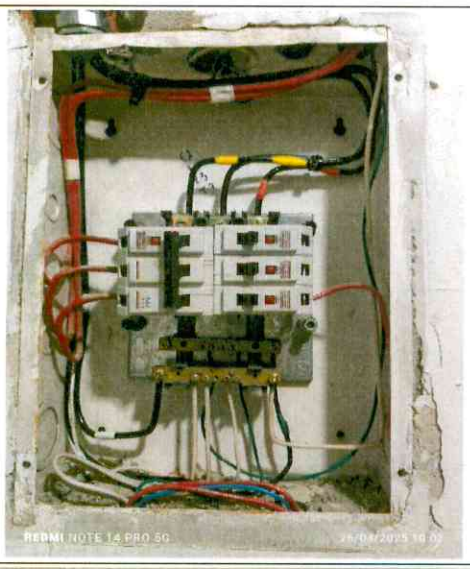


REDMI NOTE 14 PRO 5G


REDMI NOTE 14 PRO 5G







REDMI NOTE 14 PRO 5G


REDMI NOTE 14 PRO 5G


REDMI NOTE 14 PRO 5G

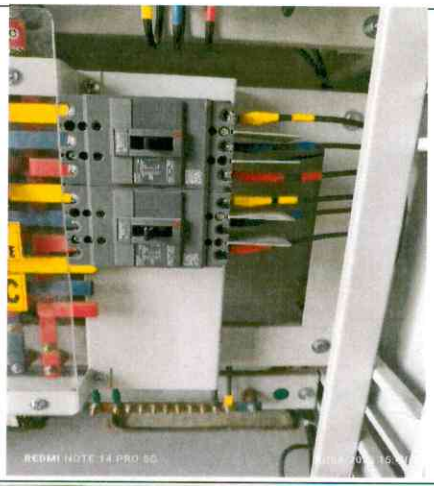
REDMI NOTE 14 PRO 5G






REDMI NOTE 14 PRO 5G











PINTURA PARA TUBERIA DE SUMINISTRO Y RCI: Se realiza la actividad de pintura sobre tubería a la vista de 2" y 4".











DESTRONQUE Y PULIDA DE BALDOSA GRANO PULIDO. Se destronca y se pule la baldosa granito pulido en zona de comedor, administrativa y lava colas.










SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE RCI: Se instala equipos de bombeo de red contra incendios.













ENCHAPE EN BALDOSA GRANO DE MARMOL. Se instala en zonas administrativas, sala cunas, comedor y cocina.













SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA MACIZA PC 6MM CRISTAL. Se instala cubierta en policarbonato en zona de gateo del bloque B.















POYOS EN CONCRETO PARA INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA: Se realiza la construcción de los poyos en concreto para la instalación de la planta eléctrica.




SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN PVC E=6mm INCLUYE PERFILERIA, ANCLAJES: Se instala cielo raso en baños aulas, cocina, auditorio y zonas administrativas.





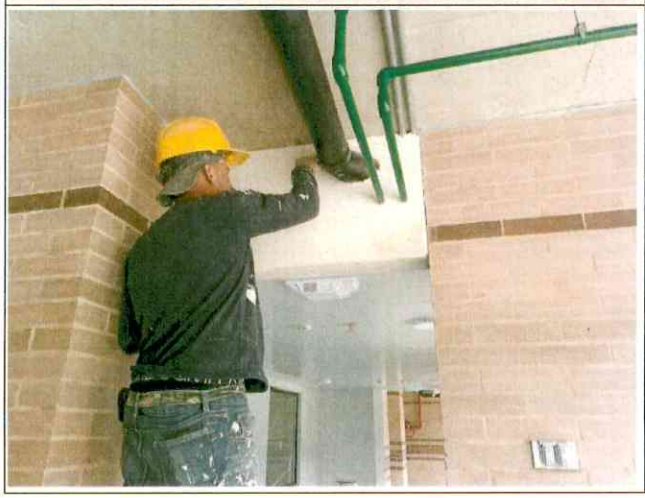


4.25 MES DE MAYO DEL 2025.

Para el mes de mayo del 2025 se realizaron las siguientes actividades según cronograma de obra: Excavación manual para conexión de pozos de aguas lluvias en zona exterior del bloque F, excavación a máquina para zona de parqueadero, retiro de material de excavación a botadero certificado, relleno con material seleccionado de sitio, construcción de cuarto de bombas, instalación de baranda metálica en zona de gateo, demolición de adoquín, demolición de bordillo, instalación de tubería de alcantarillado de 10", instalación de baldosa en granito pulido, instalación de lavamanos infantiles en auditorio, pintura para tubería de 2 a 4", instalación de red de gas, instalación de redes eléctricas, instalación de tapas en laminas alfajor, destronque y pulida de baldosa en granito pulido.

EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DE 10": Se realiza la excavación manual para la conexión de cajas de aguas lluvias.






EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR: Se realiza excavación de la zona de parqueadero del proyecto.












RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE SITIO: Se realiza el relleno con material seleccionado de sitio, en la instalación de la tubería de alcantarillado de 10".













TUBERIA SANITARIA DE ALCANTARILLADO DE 10": Se realiza instalación de mediacaña en los bloques A y B.





ACERO FIGURADO PARA COLUMNAS Y VIGAS DEL CUARTO DE BOMBAS.









INSTALACION DE ACOMETIDA DE GAS: Se deja la instalación de la acometida de gas para el suministro de gas natural para la edificación.













POYOS EN CONCRETO PARA INSTALACIÓN DE TAPAS EN LAMINA DE ALFAJOR:










DESTRONQUE Y PULIDAD DE BALDOSA EN GRANITO PULIDO - COCINA





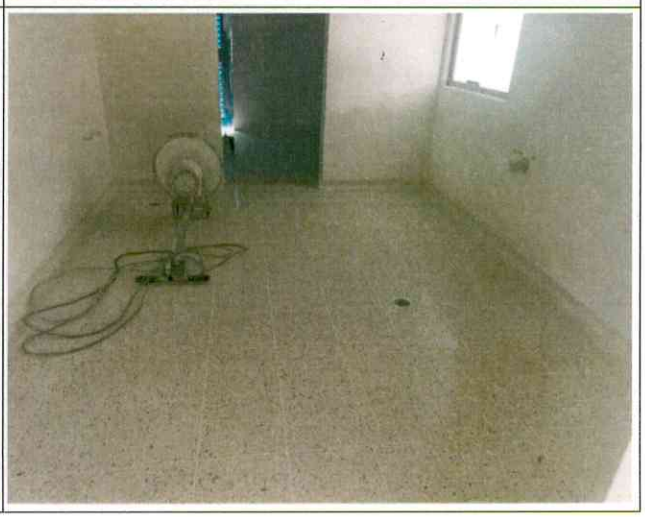



SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS EN LAMINA DE ALFAJOR: Se instalan las tapas de lámina en alfajor en los tanques de agua potable y tanque de RCI.














REDES ELECTRICAS: Suministro e instalación de redes eléctricas.





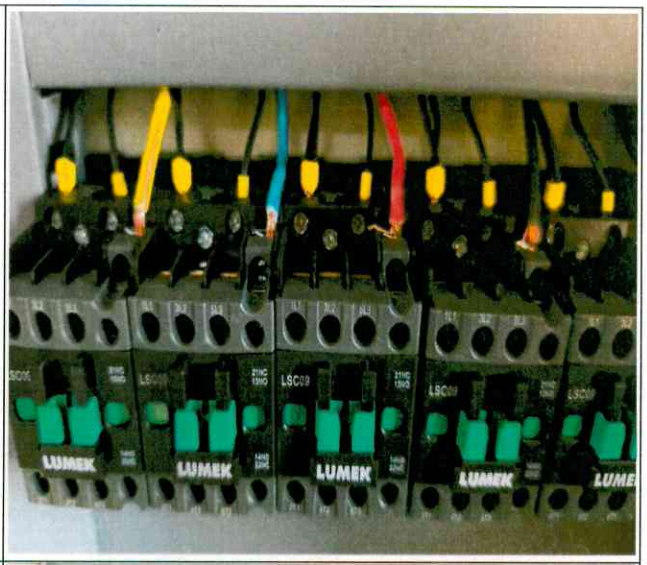


LUMEX
LUMEX
LUMEX
LUMEX






REDMI NOTE 14 PRO 5G


PELIGRO
110 VOLTS.
RETIE





PINTURA PARA TUBERIA DE SUMINISTRO Y RCI: Se realiza la actividad de pintura sobre tubería a la vista de 2" y 4".





DADOS EN CONCRETO PARA INSTALACION DE LAVAMANOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

