FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CONTRATO No. LP-026-2024 LOTE 5

CONTRATO DE OBRA [ ] | CONTRATO DE INTERVENTORIA [X] | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [ ]

CONTRATO No:	*LP-026-2024 LOTE 5*
CONTRATANTE:	*DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA*
CONTRATISTA:	*UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA*
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	*EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.*
OBJETO:	*OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.*
VALOR INICIAL:	*$52,317,808,833.00*
VALOR ADICIÓN No. :	*NO APLICA*
VALOR ACUMULADO:	*$52,317,808,833.00*
PLAZO INICIAL:	*18 MESES*
FECHA DE INICIO:	*7/05/2025*
FECHA DE SUSPENSIÓN:	*NO APLICA*
FECHA DE REINICIO:	*NO APLICA*
PLAZO ACUMULADO:	*18 MESES*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*7/11/2026*

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron **ARMANDO MOVILLA NAVARRO**, Jefe de Oficina de Control y Programaciones de Obras, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL,** en su condición de representante legal EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., -, en la calidad de Interventoría, y **CARLOS DIAZ GRANADOS GUERRA,** en su condición de representante legal de UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA, en la calidad de Contratista, con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de Recibo Parcial No. 02, relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. LP-026-2024 LOTE 5.

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trámite de facturación.

- Acta de Recibo Parcial No. 02 de Módulo 5 de Obra, memorias de cálculo, descripción de actividades realizadas, registro fotográfico, bitácora y planos.

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales del Módulo 5 de Obra durante el periodo.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los seis (06) días del mes noviembre de 2025.

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
Jefe de la Oficina de Programación y Control
Supervisor
Secretaría de Obras Públicas

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

CARLOS DIAZ GRANADOS GUERRA
Representante Legal
Contratista de Obra

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 002
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.808.633,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1		ACTA MODIFICATORIA No 2						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 2	
								MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**Capítulo 1. PRELIMINARES**				**$ 457.605.321,00**		**$ 492.341.521,99**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 492.341.522,00**
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	114476,74	$ 3.791,00	$ 433.991.321,00	129.869,60	$ 492.335.615,99	-	$ -	-	$ -			129.869,60	$ 492.335.616,00
1.2	IDENTIFICACIÓN DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	4000,00	$ 5.906,00	$ 23.624.000,00	1,00	$ 5.905,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 5.906,00
2	**Capítulo 2.DEMOLICIONES**				**$ 576.671.760,00**		**$ 574.677.361,20**		**$ 340.460.405,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 915.137.766,00**
2.1	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	8690,74	$ 53.863,00	$ 479.148.851,00	7.497,26	$ 404.049.839,18	6.317,34	$ 340.460.405,00	-	$ -			13.814,60	$ 744.510.296,00
2.2	DEMOLICIÓN DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	799,18	$ 35.311,00	$ 27.868.736,00	2.249,18	$ 79.420.794,98	-	$ -	-	$ -			2.249,18	$ 79.420.795,00
2.3	DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1717,44	$ 40.529,00	$ 69.604.409,00	2.249,18	$ 91.154.767,04	-	$ -	-	$ -			2.249,18	$ 91.154.767,00
2.4	DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA	M2	1,00	$ 51.966,00	$ 51.966,00	1,00	$ 51.966,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 51.966,00
3	**Capítulo 3.EXCAVACIONES, CIMENTACIONES Y RELLENOS**				**$ 8.807.537.332,00**		**$ 9.641.773.238,42**		**$ -**		**$ 1.411.135.049,00**		**$ -**		**$ 8.230.638.186,00**
3.1	EXCAVACIÓN MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	1000,00	$ 53.230,00	$ 53.230.000,00	1.000,00	$ 53.230.002,00	-	$ -	-	$ -			1.000,00	$ 53.230.000,00
3.2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	46267,05	$ 69.176,00	$ 3.408.097.451,00	48.267,05	$ 3.409.097.460,80	-	$ -	14.767,05	$ 1.021.526.451,00			34.500,00	$ 2.966.672.000,00
3.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1231,88	$ 59.133,00	$ 72.844.760,00	731,93	$ 43.281.210,69	-	$ -	-	$ -			731,93	$ 43.281.217,00
3.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	15899,87	$ 141.024,00	$ 2.804.949.027,00	11.551,10	$ 1.628.992.399,19	66,48	$ 9.957.999,00					11.482,62	$ 1.619.324.350,00
3.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACIÓN	M3	9497,98	$ 191.952,00	$ 1.319.936.442,00	1.699,06	$ 329.205.009,12	489,06	$ 93.592.809,00					1.200,00	$ 229.822.400,00
3.6	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2700,00	$ 286.369,00	$ 773.196.300,00	13.583,98	$ 3.690.030.799,62	1.000,00	$ 286.369.000,00					12.583,98	$ 3.603.661.799,00
3.7	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA	M3	1,00	$ 152.200,00	$ 152.200,00	1.390,66	$ 211.658.452,00	-	$ -	-	$ -			1.390,66	$ 211.658.452,00
3.8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACIÓN	M3	4604,00	$ 83.286,00	$ 375.129.152,00	1.000,00	$ 83.286.000,00	-	$ -	-	$ -			1.000,00	$ 83.286.000,00
4	**Capítulo 4. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO**				**$ 22.815.968.244,00**		**$ 23.088.724.157,14**		**$ 33.946.445,00**		**$ 1.447.798.790,00**		**$ -**		**$ 21.652.871.812,00**
4.1	P.B.O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	83195,41	$ 56.395,00	$ 3.563.905.147,00	56.302,00	$ 3.175.151.290,00	-	$ -	23.802,00	$ 1.342.313.790,00			32.500,00	$ 1.832.837.500,00
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	8666,00	$ 105.485,00	$ 724.260.010,00	7.650,86	$ 807.050.957,10	-	$ -	1.000,00	$ 105.485.000,00			6.650,86	$ 701.565.957,00
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.10	M2	1,00	$ 75.136,00	$ 75.136,00	200,00	$ 15.027.200,00	451,60	$ 33.946.445,00	-	$ -			651,60	$ 48.973.645,00
4.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO	M2	1,00	$ 4.549,00	$ 4.549,00	53.883,84	$ 290.607.599,16	-	$ -	-	$ -			53.883,84	$ 290.607.599,00
4.5	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	66414,47	$ 215.400,00	$ 12.152.805.127,00	49.500,00	$ 10.883.290.000,00	-	$ -	-	$ -			49.500,00	$ 10.883.290.000,00

05.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 002
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA X, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA: MODULOS I, II, III, IV, V Y VI MODULO V
VALOR INICIAL:	**$ 52.317.808.833,00**
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**
VALOR ACUMULADO:	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1		ACTA MODIFICATORIA No 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 2	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.6	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXIÓN , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 278.675,00	$ 278.675,00	5.000,00	$ 1.393.375.000,00	-	$ -	-	$ -			5.000,00	$ 1.393.375.000,00
4.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.15 METROS, ACELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 263.062,00	$ 263.062,00	1,00	$ 263.062,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 263.062,00
4.8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS ,ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D =1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" -LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 309.368,00	$ 309.368,00	300,00	$ 92.807.400,00	-	$ -	-	$ -			300,00	$ 92.807.400,00
4.9	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0.15 METROS, ACELERADO A 7 DIAS , MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1,00	$ 255.457,00	$ 255.457,00	1,00	$ 255.457,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 255.457,00
4.10	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1500,00	$ 300.258,00	$ 450.387.000,00	1.500,00	$ 450.387.000,00	-	$ -	-	$ -			1.500,00	$ 450.387.000,00
4.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	6866,00	$ 329.677,00	$ 2.263.582.282,00	7.580,84	$ 2.499.228.599,68	-	$ -	-	$ -			7.580,84	$ 2.499.228.599,68
4.12	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 343.417,00	$ 343.417,00	1,00	$ 343.417,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 343.417,00

05.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 002
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI MÓDULO V
VALOR INICIAL:	$ 52.317.808.833,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1		ACTA MODIFICATORIA No 2						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 2	
								MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.13	P. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PS. LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	14071,66	$ 10.260,00	$ 144.377.284,00	48.551,72	$ 499.140.647,20	-	$ -	-	$ -			48.551,72	$ 499.140.647,00
4.14	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS ESTABILIZANTES, INCLUYENDO APLICACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	M2	15460,00	$ 125.719,00	$ 2.446.491.740,00	19.460,00	$ 2.446.491.740,00	-	$ -	-	$ -			19.460,00	$ 2.446.491.740,00
4.15	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES, Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE: SIKADUR®-35 H.-MOD LV, SIKADUR®)	ML	5000,00	$ 79.606,00	$ 398.030.000,00	800,00	$ 63.684.800,00	-	$ -	-	$ -			800,00	$ 63.684.800,00
4.16	SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO	ML	60000,00	$ 11.177,00	$ 670.620.000,00	60.000,00	$ 670.620.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	60.000,00	$ 670.620.000,00
5	**Capitulo 5. PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE**				**$ 9.716.308.100,00**		**$ 2.335.335.330,00**		**$ 607.422.069,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 2.942.757.399,00**
5.1	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2	39600,00	$ 45.499,00	$ 1.360.766.400,00	52.750,00	$ 2.136.322.250,00	13.506,56	$ 547.002.903,00	-	$ -			66.256,56	$ 2.683.325.233,00
5.2	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	3800,00	$ 1.669.369,00	$ 6.234.917.700,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -			0,00	$ -
5.3	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	44400,00	$ 3.690,00	$ 163.392.000,00	52.750,00	$ 194.120.000,00	16.419,23	$ 60.419.096,00	-	$ -			69.169,23	$ 254.539.096,00
5.4	MANTENIMIENTO DE VIAS CON ASFALTO EN FRIO MODIFICADO CON POLÍMEROS HUECO/PARCHE TIPO G ÁREA MAYOR A 0,60 M2, INCLUYE DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA	M2	4000,00	$ 489.308,00	$ 1.957.232.000,00	10,00	$ 4.893.080,00	-	$ -	-	$ -			10,00	$ 4.893.080,00
6	**Capitulo 6. URBANISMO**				**$ 6.506.154.542,00**		**$ 4.096.434.304,76**		**$ -**		**$ 204.306.513,00**		**$ -**		**$ 3.892.127.792,00**
6.1	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	38864,35	$ 64.663,00	$ 2.999.770.464,00	3.574,73	$ 231.152.765,99	-	$ -	-	$ -			3.574,73	$ 231.152.766,00
6.2	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	1717,44	$ 70.947,00	$ 121.875.472,00	14.298,92	$ 1.013.036.886,24	-	$ -	-	$ -			14.298,92	$ 1.013.036.886,00
6.3	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	1,00	$ 91.802,00	$ 91.802,00	225,21	$ 20.674.726,42	-	$ -	-	$ -			225,21	$ 20.674.726,00
6.4	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	13329,16	$ 105.465,00	$ 1.406.029.552,00	6.936,89	$ 942.731.512,56	-	$ -	1.936,89	$ 204.306.513,00			7.000,00	$ 738.995.000,00
6.5	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	21375,36	$ 127.143,00	$ 2.717.726.125,00	14.298,92	$ 1.818.037.566,56	-	$ -	-	$ -			14.298,92	$ 1.818.037.566,00
6.6	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Cameras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	$ 396.898,00	$ 396.898,00	1,00	$ 396.898,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 396.898,00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 002
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V
VALOR INICIAL:	$ 52.317.809.833,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
FECHA DE REINICIO:	N.A

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1		ACTA MODIFICATORIA No 2 MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 2	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
6.7	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Caneras Transversales. Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms. Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	$ 336.896,00	$ 336.896,00	1,00	$ 336.896,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 336.896,00
6.8	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms. Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	$ 339.451,00	$ 339.451,00	1,00	$ 339.451,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 339.451,00
6.9	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2	200,00	$ 349.245,00	$ 69.849.000,00	200,00	$ 69.849.000,00	-	$ -	-	$ -		$ -	200,00	$ 69.849.000,00
7	**Capitulo 7. OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 589.919.339,00**		**$ 988.031.331,00**		**$ 2.251.320,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 890.282.651,00**
7.1	P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 – 0.6 M. E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	$ 171.648,00	$ 171.648,00	1,00	$ 171.648,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 171.648,00
7.2	P. B. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1600- TRITURADO Ø 40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	390,01	$ 154.200,00	$ 58.597.542,00	1,00	$ 154.200,00	14,60	$ 2.251.320,00	-	$ -			15,60	$ 2.405.520,00
7.3	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE; FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO	M3	125,00	$ 1.750.346,00	$ 218.793.250,00	125,00	$ 218.793.250,00	-	$ -	-	$ -			125,00	$ 218.793.250,00
7.4	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO, (PARA BOX-COULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	1400,00	$ 10.260,00	$ 14.364.000,00	15.000,00	$ 153.900.000,00	-	$ -	-	$ -			15.000,00	$ 153.900.000,00
7.5	REGISTRO EN CONCRETO, 60X80 CM	UN	21,00	$ 964.680,00	$ 20.256.390,00	282,00	$ 272.014.980,00	-	$ -	-	$ -			282,00	$ 272.014.980,00
7.6	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	95,00	$ 62.391,00	$ 6.927.145,00	563,00	$ 35.126.133,00	-	$ -	-	$ -			563,00	$ 35.126.133,00
7.7	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	466,00	$ 509.076,00	$ 232.138.656,00	282,00	$ 143.559.432,00	-	$ -	-	$ -			282,00	$ 143.559.432,00
7.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	19,00	$ 1.292.079,00	$ 23.409.501,00	39,00	$ 48.051.081,00	-	$ -	-	$ -			39,00	$ 48.051.081,00
7.9	P. B. O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	63,00	$ 103.683,00	$ 6.532.029,00	63,00	$ 6.532.029,00	-	$ -	-	$ -			63,00	$ 6.532.029,00
7.10	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE, TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	19,00	$ 512.062,00	$ 9.729.178,00	19,00	$ 9.729.178,00	-	$ -	-	$ -			19,00	$ 9.729.178,00
8	**Capitulo 8. SEÑALIZACION INSTITUCIONAL**				**$ 364.809.345,00**		**$ 364.809.345,00**		**$ -**		**$ 90.375.170,00**		**$ -**		**$ 274.434.175,00**
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) CERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIVO NUEVE (9) MÓDULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SOBRE BANNER DE 13 Onz. SEGUN DISEÑO	UND	10,00	$ 10.944.946,00	$ 109.449.460,00	10,00	$ 109.449.460,00	-	$ -	5,00	$ 54.724.730,00			5,00	$ 54.724.730,00

05.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 002
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MODULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V
VALOR INICIAL:	**$ 52.317.808.833,00**
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**
VALOR ACUMULADO:	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO:	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1		ACTA MODIFICATORIA No 2						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 2	
								MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8.2	P. B. O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	115,00	$ 594.174,00	$ 68.330.010,00	115,00	$ 68.330.010,00	-	$ -	60,00	$ 36.060.440,00			55,00	$ 32.579.670,00
8.3	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	115,00	$ 337.965,00	$ 38.865.975,00	115,00	$ 38.865.975,00	-	$ -	-	$ -			115,00	$ 38.865.975,00
8.4	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	1900,00	$ 77.991,00	$ 148.183.900,00	1.900,00	$ 148.183.900,00	-	$ -	-	$ -			1.900,00	$ 148.183.900,00
9	**Capitulo 9. SEÑALIZACION INSTITUCIONAL**				**$ 69.850.309,00**		**$ 55.702,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 55.702,00**
9.1	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	1254,00	$ 55.702,00	$ 69.850.309,00	1,00	$ 55.702,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 55.702,00
10	**Capitulo 10. PROVISIONES**				**$ 295.187.534,00**		**$ 295.187.534,00**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 295.187.534,00**
10.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 43.596.269,00	$ 43.596.269,00	1,00	$ 43.596.269,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 43.596.269,00
10.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 43.593.549,00	$ 43.593.549,00	1,00	$ 43.593.549,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 43.593.549,00
10.3	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	$ 207.997.702,00	$ 207.997.702,00	1,00	$ 207.997.702,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 207.997.702,00
11	**Capitulo 11. OBRAS PARÁ REPOSICION DE TUBERIAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**				**$ 2.117.797.008,00**		**$ 3.347.550.130,18**		**$ 4.208.558,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 3.351.758.697,00**
11.1	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	246,16	$ 128.177,00	$ 31.429.873,00	246,16	$ 31.429.873,32	-	$ -	-	$ -			246,16	$ 31.429.873,00
11.2	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	249,48	233.737,00	$ 58.312.707,00	249,48	$ 58.312.706,76	-	$ -	-	$ -			249,48	$ 58.312.707,00
11.3	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1636,20	$ 87.337,00	$ 142.900.799,00	7.662,29	$ 669.414.669,36	-	$ -	-	$ -			7.662,29	$ 669.414.669,00
11.4	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1443,96	25.392,00	$ 36.508.197,00	2.252,09	$ 56.937.096,56	-	$ -	-	$ -			2.252,09	$ 56.937.097,00
11.5	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	143,64	$ 289.986,00	$ 41.653.599,00	394,00	$ 114.254.484,00	-	$ -	-	$ -			394,00	$ 114.254.484,00
11.6	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	8,64	$ 926.310,00	$ 8.003.318,00	1,00	$ 926.310,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 926.310,00
11.7	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 160 X200 MM	UN	182,52	$ 290.846,00	$ 54.727.992,00	51,00	$ 15.292.146,00	-	$ -	-	$ -			51,00	$ 15.292.146,00
11.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1443,96	$ 264.012,00	$ 381.222.768,00	583,02	$ 148.644.036,24	-	$ -	-	$ -			583,02	$ 148.644.036,00
11.9	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1443,96	$ 314.340,00	$ 453.894.386,00	220,00	$ 69.154.800,00	-	$ -	-	$ -			220,00	$ 69.154.800,00
11.10	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 630MM (F)	ML	1443,96	102.197,00	$ 147.588.360,00	1.443,96	$ 147.588.360,12	-	$ -	-	$ -			1.443,96	$ 147.588.360,00
11.11	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA AL CANTARILLADO NOVAFORT 200MM (F)	ML	1443,96	$ 101.813,00	$ 147.013.809,00	7.319,28	$ 745.195.819,36	-	$ -	-	$ -			7.319,28	$ 745.195.819,00
11.12	P.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	135,90	$ 65.423,00	$ 8.888.268,00	135,90	$ 8.888.267,70	-	$ -	-	$ -			135,90	$ 8.888.268,00
11.13	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.60 M	UN	15,30	$ 5.645.051,00	$ 86.369.280,00	73,00	$ 412.088.723,00	-	$ -	-	$ -			73,00	$ 412.088.723,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	108,00	$ 225.034,00	$ 24.303.672,00	1.097,69	$ 247.062.579,26	-	$ -	-	$ -			1.097,69	$ 247.062.676,00
11.15	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	954,00	$ 13.880,00	$ 13.241.520,00	954,00	$ 13.241.520,00	-	$ -	-	$ -			954,00	$ 13.241.520,00

05.

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 002
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA X, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI MÓDULO V
VALOR INICIAL:	**$ 52.317.808.833,00**
VALOR ADICIONES:	**$ 0,00**
VALOR ACUMULADO:	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1		ACTA MODIFICATORIA No 2						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIA 2	
								MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1203,30	$ 165.464,00	$ 199.102.831,00	1,00	$ 165.464,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 165.464,00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1203,30	$ 184.742,00	$ 222.300.049,00	1,00	$ 184.742,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 184.742,00
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	1203,30	$ 23.304,00	$ 24.041.703,00	1,00	$ 23.304,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 23.304,00
11.19	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD TAP 24"	UN	16,00	$ 1.232.079,00	$ 19.481.165,00	29,00	$ 35.730.291,00	-	$ -	-	$ -			29,00	$ 35.730.291,00
11.20	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	16,00	$ 360.691,00	$ 5.713.365,00	16,00	$ 5.713.365,00	-	$ -	-	$ -			15,00	$ 5.713.365,00
11.21	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML	1,00	$ 74.481,00	$ 74.481,00	2.252,09	$ 167.737.170,49	-	$ -	-	$ -			2.252,09	$ 167.737.170,00
11.22	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN	1,00	$ 247.099,00	$ 247.099,00	270,00	$ 66.716.460,00	-	$ -	-	$ -			270,00	$ 66.716.460,00
11.23	REINVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm	UND	1,00	$ 770.736,00	$ 770.736,00	220,00	$ 169.561.920,00	-	$ -	-	$ -			220,00	$ 169.561.920,00
11.24	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN	1,00	$ 216.901,00	$ 216.901,00	1,00	$ 216.901,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 216.901,00
11.25	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN	1,00	$ 165.054,00	$ 165.054,00	1,00	$ 165.054,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 165.054,00
11.26	P.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN	1,00	$ 376.481,00	$ 376.481,00	1,00	$ 376.481,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 376.481,00
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN	1,00	$ 304.230,00	$ 304.230,00	1,00	$ 304.230,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 304.230,00
11.28	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1,00	$ 189.756,00	$ 189.756,00	1,00	$ 189.756,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 189.756,00
11.29	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1,00	$ 192.656,00	$ 192.656,00	46,00	$ 8.860.976,00	-	$ -	-	$ -			46,00	$ 8.860.976,00
11.30	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1,00	$ 217.281,00	$ 217.281,00	158,00	$ 34.330.398,00	-	$ -	-	$ -			158,00	$ 34.330.398,00
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO. 0, 70 X 0, 70 H<1m (INCLUYE TAPA)	UN	1,00	$ 1.017.320,00	$ 1.017.320,00	1,00	$ 1.017.320,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 1.017.320,00
11.32	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 63mm (2") NORMA ISO PN 10	UN	1,00	$ 376.516,00	$ 376.516,00	1,00	$ 376.516,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 376.516,00

05.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

ACTA DE MODIFICACIÓN N° 002
Contrato N° CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.808.833,00
VALOR ADICIONES:	$ 0,00
VALOR ACUMULADO:	
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
PLAZO CONTRACTUAL ACTUALIZADO::	18 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES						ACTA MODIFICATORIA No 1		ACTA MODIFICATORIA No 2						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA 2	
								MENORES Y MAYORES CANTIDADES ADICIONALES							
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	MENORES CANTIDADES	VALOR TOTAL	OBRAS ADICIONALES	VALOR ADICIONAL TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11.33	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA HD 2"	UN	1,00	$ 213.366,00	$ 213.366,00	1,00	$ 213.366,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 213.366,00
11.34	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 90 mm	UN	1,00	$ 213.010,00	$ 213.010,00	45,00	$ 9.585.450,00	-	$ -	-	$ -			45,00	$ 9.585.450,00
11.35	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm	UN	1,00	$ 234.668,00	$ 234.668,00	158,00	$ 37.077.544,00	-	$ -	-	$ -			158,00	$ 37.077.544,00
11.36	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 3" X 45	UN	1,00	$ 148.773,00	$ 148.773,00	1,00	$ 148.773,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 148.773,00
11.37	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" + TAPA VALVULA ISO PN10	UN	1,00	$ 2.151.014,00	$ 2.151.014,00	23,00	$ 49.473.322,00	-	$ -	-	$ -			23,00	$ 49.473.322,00
11.38	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO 4" X 3"	UN	1,00	$ 201.952,00	$ 201.952,00	4,00	$ 807.808,00	2,00	$ 403.904,00	-	$ -			6,00	$ 1.211.712,00
11.39	SUMINISTRO UNION PEAD 1"	UN	1,00	$ 308.654,00	$ 308.654,00	1,00	$ 308.654,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 308.654,00
11.40	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN	1,00	$ 271.761,00	$ 271.761,00	3,00	$ 815.283,00	14,00	$ 3.804.654,00	-	$ -			17,00	$ 4.619.937,00
11.41	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1,00	$ 221.650,00	$ 221.650,00	1,00	$ 221.650,00	-	$ -	-	$ -			1,00	$ 221.650,00
							$ 7.214.888.880,00		$ 2.165.326.725,00		$ -		$ -		$ 9.380.215.605,00
	CAPITULO - NO PREVISTOS														
NP1	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%	M3	0,00	$ 2.023.424,00	$ -	3.420,00	$ 6.920.110.080,00	1.070,13	$ 2.165.326.725,00	-	$ -		$ -	4.490,13	$ 9.085.436.805,00
NP2	BASE GRANULAR COMPACTADA	M3	0,00	$ 491.296,00	$ -	600,00	$ 294.778.800,00	-	$ -	-	$ -			600,00	$ 294.778.800,00
							$ -	-							
				COSTO DIRECTO	$ 40.244.468.333,00		$ 40.244.468.333,00		$ 2.425.858.094,00		$ 2.425.858.094,00		$ -		$ 40.244.468.333,00
				A.I.U	$ 12.073.340.500,00		$ 12.073.340.500,00		$ 727.757.428,00		$ 727.757.428,00		$ -		$ 12.073.340.500,00
				COSTO TOTAL OBRA	$ 52.317.808.833,00		$ 52.317.808.833,00		$ 3.153.615.522,00		$ 3.153.615.522,00		$ -		$ 52.317.808.833,00

Para constancia de lo anterior, se suscribe el presente Balance en Barranquilla, Atlántico a los 20 días del mes de agosto del 2025

CARLOS DIAZ GRANADOS GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
CONTRATISTA DE OBRA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.
INTERVENTORÍA

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBICAS
SUPERVISION

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.808.833
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.317.808.833
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/08/2025-6/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%

	CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 002		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 02		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**Capitulo 1 - PRELIMINARES**				**457.805.321,00**		**492.341.522,80**		**222.661.958,76**		**152.867.412,07**		**375.529.370,83**		**116.812.150,88**
1.1	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	114476,74	$ 3.791,00	$ 433.981.321,00	129869,59	$ 492.335.616,00	58.734,36	$ 222.661.958,76	40.323,77	$ 152.867.412,07	99.058,13	$ 375.529.370,83	30.811,46	$ 116.806.244,86
1.2	IDENTIFICACIÓN DE REDES EXISTENTES POR MEDIO DE GEORADAR	M2	4000,00	$ 5.906,00	$ 23.624.000,00	1,00	$ 5.906,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 5.906,00
2	**Capitulo 2 - DEMOLICIONES**				**576.671.760**		**915.137.788,00**		**358.175.798,99**		**491.466.452,24**		**849.642.251,13**		**65.495.514,69**
2.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	9690,74	$ 53.893,00	$ 479.148.651,00	13614,50	$ 744.510.239,00	5.477,69	$ 295.203.757,87	8.337,01	$ 449.306.475,93	13.814,60	$ 744.510.237,80	-	$ -
2.2	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	769,18	$ 35.311,00	$ 27.666.735,00	2249,18	$ 79.420.795,00	887,46	$ 31.337.100,66	829,61	$ 29.294.358,71	1.717,07	$ 60.631.458,77	532,11	$ 18.789.336,23
2.3	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	1717,44	$ 40.528,00	$ 69.604.408,00	2249,18	$ 91.154.767,00	780,57	$ 31.634.940,96	317,45	$ 12.865.613,60	1.098,02	$ 44.500.554,56	1.151,16	$ 46.654.212,48
2.4	DEMOLICION DE MUROS EXISTENTES EN MAMPOSTERIA	M2	1,00	$ 51.966,00	$ 51.966,00	1,00	$ 51.966,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 51.966,00
3	**Capitulo 3 - Obras Complementarias**				**8.807.537.332**		**8.230.638.188,00**		**1.475.217.444,62**		**669.139.213,99**		**2.144.356.658,61**		**6.086.281.529,70**
3.1	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	1000,00	$ 53.230,00	$ 53.230.000,00	1000,60	$ 53.230.000,00	430,95	$ 22.939.468,50	479,66	$ 25.542.947,80	910,61	$ 48.482.416,30	89,19	$ 4.747.583,70
3.2	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	49267,05	$ 69.176,00	$ 3.409.057.451,00	34500,00	$ 2.386.572.000,00	4.991,23	$ 345.273.035,48	3.574,54	$ 247.272.379,04	8.565,77	$ 592.545.705,52	25.934,23	$ 1.794.026.294,48
3.3	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	1231,88	$ 59.130,00	$ 72.844.750,00	731,93	$ 43.291.217,00	408,04	$ 24.129.451,92	234,59	$ 13.872.010,47	642,63	$ 38.000.462,39	89,30	$ 5.290.754,30
3.4	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	19999,87	$ 141.024,00	$ 2.804.949.027,00	11482,52	$ 1.619.324.350,00	4.310,22	$ 607.844.465,28	562,88	$ 79.379.589,12	4.873,10	$ 687.224.054,40	6.609,52	$ 932.100.295,60
3.5	RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CEMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	6997,96	$ 191.352,00	$ 1.319.938.442,00	1200,00	$ 229.622.400,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.200,00	$ 229.622.400,00
3.6	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2700,00	$ 286.369,00	$ 773.196.300,00	12583,96	$ 3.603.861.769,00	1.576,26	$ 451.357.727,32	992,36	$ 284.181.140,84	2.568,64	$ 735.578.868,16	10.015,34	$ 2.868.082.900,46
3.7	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA	M3	1,00	$ 152.200,00	$ 152.200,00	1390,65	$ 211.659.452,00	99,65	$ 15.014.530,00	104,59	$ 15.918.599,00	203,24	$ 30.933.129,00	1.187,42	$ 180.726.324,00
3.8	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION	M3	4504,00	$ 83.298,00	$ 375.129.152,00	1000,60	$ 83.286.000,00	103,43	$ 8.619.475,12	36,69	$ 2.972.548,72	139,18	$ 11.592.023,84	860,82	$ 71.695.976,16
4	**Capitulo 4 - PAVIMENTO CONCRET RÍGIDO**				**$ 22.815.968.244,00**		**21.652.871.812,00**		**3.745.061.846,09**		**3.782.848.904,62**		**7.527.730.750,71**		**14.125.141.061,23**
4.1	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	63195,41	$ 56.305,00	$ 3.558.905.147,00	32.500,00	$ 1.832.837.500,00	5.157,75	$ 290.871.311,25	5.940,19	$ 334.997.015,05	11.097,94	$ 625.868.326,30	21.402,06	$ 1.206.969.173,70
4.2	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.15	M2	9866,00	$ 106.485,00	$ 724.260.010,00	6660,96	$ 701.565.967,00	3.707,06	$ 391.069.224,10	2.752,34	$ 290.330.584,90	6.459,40	$ 681.369.809,00	191,46	$ 20.196.158,10
4.3	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0.10	M2	1,00	$ 75.136,00	$ 75.136,00	661,80	$ 48.973.645,00	105,42	$ 7.526.837,12	546,38	$ 41.052.807,68	651,80	$ 48.973.644,80	-	$ -

5.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.801.833
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.317.801.833
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/08/2025-6/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%

4.4	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO	M2	1,00	$	4.549,00	$	4.549,00	63.883,84	$	290.607.568,00	8.059,90	$	36.669.936,10	8.377,53	$	38.109.838,87	16.436,53	$	74.769.774,97	47.447,31	$	215.837.813,19
4.5	F.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	56414,47	$	215.420,00	$	12.152.805.127,00	49.500,00	$	10.663.290.000,00	4.028,89	$	867.903.483,80	2.366,66	$	509.823.743,00	6.395,54	$	1.377.727.226,80	43.104,46	$	9.285.562.773,20
4.6	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION, ESPESOR= 0,2 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D = 1" - LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0,65 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$	278.675,00	$	278.675,00	5.000,00	$	1.393.375.000,00	1.931,25	$	538.191.093,75	2.334,35	$	650.524.986,25	4.265,60	$	1.188.716.080,00	734,40	$	204.658.920,00
4.7	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION, ESPESOR= 0,15 METROS, ACELERADO A 3 DIAS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0,65 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$	263.062,00	$	263.062,00	1,00	$	263.062,00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	1,00	$	263.062,00
4.8	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS, ESPESOR= 0,2 METROS, INCLUYE CANASTILLA, PASADORES D = 1" - LONGITUD 0,35 METROS A CADA 0,30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0,65 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$	309.358,00	$	309.358,00	300,00	$	92.807.400,00	45,93	$	14.208.812,94	-	$	-	45,93	$	14.208.812,94	254,07	$	78.598.587,06
4.9	F.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, ACELERADO A 7 DIAS , MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1,00	$	255.457,00	$	255.457,00	1,00	$	255.457,00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	1,00	$	255.457,00
4.10	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0,20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE	M2	1500,00	$	300.358,00	$	450.387.000,00	1.500,00	$	450.387.000,00	-	$	-	1.278,12	$	383.765.754,96	1.278,12	$	383.765.754,96	221,88	$	66.621.245,04

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, MÓDULOS I, II, III IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.808.833
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.317.808.833
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/09/2025- 6/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%

4.11	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.36 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	6866,00	$ 309.677,00	$ 2.263.562.282,00	7.560,91	$ 2.499.228.599,00	2.068,23	$ 681.647.861,71	1.767,63	$ 582.746.955,51	3.835,86	$ 1.264.564.817,22	3.744,96	$ 1.234.633.771,46
4.12	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 7 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.36 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL	M2	1,00	$ 343.417,00	$ 343.417,00	1,00	$ 343.417,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 343.417,00
4.13	S. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2	KG	14071,86	$ 10.260,00	$ 144.377.264,00	48.551,72	$ 498.140.647,00	8.163,32	$ 83.765.663,20	15.486,39	$ 158.890.351,40	23.649,71	$ 242.646.024,60	24.902,01	$ 255.494.822,60
4.14	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE ADICIÓN DE POLIMEROS ESTABILIZANTES, INCLUYENDO APLICACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO	M2	19460,00	$ 125.719,00	$ 2.446.491.740,00	19.460,00	$ 2.446.491.740,00	2.420,00	$ 304.239.980,00	6.303,00	$ 792.406.857,00	8.723,00	$ 1.096.646.837,00	10.737,00	$ 1.349.844.903,00
4.15	SELLO DE FISURAS ESTRUCTURALES Y REFORZAMIENTO ANCLADO (INCLUYE: SIKADUR®-35 HI-MOD LV, SIKADUR®)	ML	5000,00	$ 79.606,00	$ 398.030.000,00	800,00	$ 63.684.800,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 63.684.800,00
4.16	SELLAMIENTO DE JUNTAS EN ASFALTO	ML	60000,00	$ 11.177,00	$ 670.620.000,00	60.000,00	$ 670.620.000,00	47.279,56	$ 528.443.642,12	-	$ -	47.279,56	$ 528.443.642,12	12.720,44	$ 142.176.357,88
5	**Capitulo 5 - PAVIMENTO CONCRETO FLEXIBLE**				**$ 9.716.308.100,00**		**2.942.757.399,90**		**1.658.247.029,11**		**1.281.816.390,71**		**2.937.864.319,82**		**4.893.080,00**
5.1	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2	33600,00	$ 40.499,00	$ 1.360.766.400,00	66.256,58	$ 2.683.325.233,00	37.515,05	$ 1.519.303.029,91	29.741,49	$ 1.164.001.603,51	66.256,58	$ 2.683.325.233,42	-	$ -
5.2	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19	M3	3360,00	$ 1.869.369,00	$ 6.234.917.700,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
5.3	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	M2	44400,00	$ 3.680,00	$ 163.392.000,00	69.168,23	$ 254.539.086,00	37.207,65	$ 136.924.299,20	31.960,54	$ 117.614.787,20	69.168,23	$ 254.539.086,40	-	$ -
5.4	MANTENIMIENTO DE VÍAS CON ASFALTO EN FRÍO MODIFICADO CON POLÍMEROS HUECO/PARCHE TIPO G (ÁREA MAYOR A 0,50 M2, INCLUYE DEMOLICIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO Y RETIRO DE MATERIAL CUANDO SE REQUIERA	M2	4000,00	$ 489.308,00	$ 1.957.232.000,00	10,00	$ 4.893.080,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10,00	$ 4.893.080,00

05.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-326-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.808.833
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.317.808.833
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/08/2025-6/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%

6	**Capitulo 6 - URBANISMO**				$ 6.506.154.542,00		3.892.127.782,00		302.688.536,12		271.332.813,76		574.021.149,88		3.318.106.642,33
6.1	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M, INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	33864,35	$	64.663,00	$ 2.189.770.464,00	3.574,73	$ 231.152.766,00	416,54	$ 26.934.726,02	519,25	$ 33.576.262,75	985,79	$ 60.510.988,77	2.638,94	$ 170.541.777,22
6.2	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 x 0,20 M, INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	1717,44	$	70.847,00	$ 121.675.472,00	14.298,92	$ 1.013.035.585,00	1.041,57	$ 73.752.109,79	375,55	$ 26.606.732,54	1.417,12	$ 100.398.842,33	12.861,80	$ 912.636.742,91
6.3	BORDILLO RECTO DE 30 x 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	ML	1,00	$	91.802,00	$ 91.802,00	225,21	$ 20.674.728,00	12,46	$ 1.145.688,96	62,50	$ 5.737.625,00	74,98	$ 6.863.313,96	150,23	$ 13.791.414,46
6.4	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	13929,18	$	105.465,00	$ 1.469.029.652,00	7.000,00	$ 738.395.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7.000,00	$ 738.395.000,00
6.5	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3.000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	21375,35	$	127.143,00	$ 2.717.726.125,00	14.298,92	$ 1.818.007.598,00	1.579,45	$ 200.815.011,35	1.418,84	$ 180.395.574,12	2.998,29	$ 381.211.585,47	11.300,63	$ 1.436.796.800,09
6.6	Loseta Plana de 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris oscuro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	$	336.838,00	$ 336.838,00	1,00	$ 336.838,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 336.838,00
6.7	Loseta Plana 400x400x60 Mm De Espesor Color Gris claro, Usada En Pavimento De La Franja De Circulacion Peatonal Y Esquinas Con Carreras Transversales, Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	$	336.838,00	$ 336.838,00	1,00	$ 336.838,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 336.838,00
6.8	Loseta Alerta 200x200x60 Mm De Espesor Color amarillo, Usada En La Franja De Alineacion Para Invidentes, y Loseta GUIA Colocada Sobre Capa De Mortero E= 3 Cms, Capa De Concreto de 3000 psi E= 10 Cms Y Capa De Subbase Granular E= 15cms	M2	1,00	$	339.451,00	$ 339.451,00	1,00	$ 339.451,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 339.451,00

65.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.808.833
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.317.808.833
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/08/2025-8/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%

6.9	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO	M2	200,00	$	349.245,00	$	69.849.000,00	200,00	$	69.849.000,00	-			71,63	$	25.016.419,35	71,63	$	25.016.419,35	128,37	$	44.832.580,65
7	**Capítulo 7 - OBRAS COMPLEMENTARIAS**					**$**	**589.919.339,00**			**890.282.851,09**			**141.205.275,00**			**280.861.877,96**			**422.067.152,96**			**468.215.698,04**
7.1	P.B.O. CUNETA BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO DE 0.15 + 0.30 + 0.6 M. E = 0.10 M. INCLUYE ACERO DE 60.000 PSI LEGITIMO	ML	1,00	$	171.648,00	$	171.648,00	1,00	$	171.648,00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	1,00	$	171.648,00
7.2	P. B.O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800- TRITURADO 0.40 X 0.60 M- TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA	ML	390,01	$	154.200,00	$	59.597.542,00	15,60	$	2.405.520,00	-	$	-	15,60	$	2.405.520,00	15,60	$	2.405.520,00	-	$	-
7.3	P. B.O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO	M3	125,00	$	1.750.346,00	$	218.793.250,00	125,00	$	218.793.250,00	-	$	-	45,16	$	79.045.625,36	45,16	$	79.045.625,36	79,84	$	139.747.624,64
7.4	P. B.O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX COULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	KG	1400,00	$	10.260,00	$	14.364.000,00	15.000,00	$	153.900.000,00	-	$	-	4.385,91	$	44.999.436,60	4.385,91	$	44.999.436,60	10.614,09	$	108.900.563,40
7.5	REGISTRO EN CONCRETO 60X60 CM	UN	21,00	$	964.590,00	$	20.256.390,00	282,00	$	272.014.380,00	79,00	$	76.202.610,00	83,00	$	80.060.970,00	162,00	$	156.263.580,00	120,00	$	115.750.800,00
7.6	P. B.O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	95,00	$	82.391,00	$	5.927.145,00	563,00	$	35.126.133,00	104,00	$	6.498.684,00	80,00	$	4.991.280,00	184,00	$	11.479.944,00	379,00	$	23.645.189,00
7.7	P. B.O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	456,00	$	529.075,00	$	232.138.656,00	282,00	$	143.559.432,00	96,00	$	49.869.449,00	83,00	$	42.253.308,00	181,00	$	92.142.756,00	101,00	$	51.416.676,00
7.8	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD TIP 24"	UN	19,00	$	1.232.079,00	$	23.409.501,00	39,00	$	48.051.081,00	7,00	$	8.624.553,00	22,00	$	27.105.738,00	29,00	$	35.730.291,00	10,00	$	12.320.790,00
7.9	P. B.O. REPARACION DE FUGAS AGUA POTABLE	UN	63,00	$	103.683,00	$	6.532.029,00	63,00	$	6.532.029,00	-			-	$	-	-	$	-	63,00	$	6.532.029,00
7.10	TAPA DE CONCRETO DE 1 X 1 M DE 21 MPA (3000 PSI) E = 0.15 METROS, REFORZADA CON ACERO DE 3/8" Y 1/2" CADA 0,20 METROS, INCLUYE MARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 3/4"X1/8", MANIJA EN ACERO LISO DE 1/2", CONTRAMARCO EN PERFIL EN ANGULO DE ALAS IGUALES DE 1"X1/8", INSTALADO SOBRE LOSA Y SELLO CON IGAS NEGRO O EQUIVALENTE. TODOS LOS ELEMENTOS TENDRAN ACABADO CON ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	UN	19,00	$	512.062,00	$	9.729.178,00	19,00	$	9.729.178,00	-	$	-	-	$	-	-	$	-	19,00	$	9.729.178,00

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.808.833
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.317.808.833
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/08/2025-6/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%

8	**Capítulo 8 - SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL**				**$ 364.809.345,00**		**274.434.175,00**		**1.351.860,00**		**3.379.650,00**		**4.731.510,00**		**269.702.985,00**				
8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA DE 6 x 3 METROS, EN ESTRUCTURA METALICA EN ANGULO DE HIERRO DE 2" X 1/8 CUATRO (4) GERCHAS DE 6 METROS PINTADAS CON ANTICORROSIVO,NUEVE (9) MODULOS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 24, LONA IMPRESA A FULL COLOR SOBRE BANNER DE 13 Oz. SEGUN DISEÑO	UNO	10,00	$ 10.964.946,00	$ 109.449.460,00	5,00	$ 54.724.730,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 54.724.730,00				
8.2	P. B/ O. PUBLIPOSTES EN VINILO CON ESTRUCTURA EN HIERRO DE 1,05 X 2,10, INSTALADOS	UN	115,00	$ 584.174,00	$ 68.300.010,00	55,00	$ 32.679.570,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	55,00	$ 32.679.570,00				
8.3	P. B/ O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS	UN	115,00	$ 337.965,00	$ 38.865.975,00	115,00	$ 38.865.975,00	4,00	$ 1.351.860,00	10,00	$ 3.379.650,00	14,00	$ 4.731.510,00	101,00	$ 34.134.465,00				
8.4	PROVISION SOCIAL (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y/O CIERRE LONG. PROMEDIO <=30,00 M)	UN	1900,00	$ 77.991,00	$ 148.163.900,00	1.900,00	$ 148.163.900,00	-		-	$ -	-	$ -	1.900,00	$ 148.163.900,00				
9	**Capítulo 9 - SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL**				**$ 89.850.308,00**		**55.702,00**		**-**	**-**	**-**		**-**		**55.702,00**				
9.1	P. B/ O. SUMINISTRO E INSTALACION ALARMA	UN	1254,00	$ 55.702,00	$ 69.860.308,00	1.00	$ 55.702,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 55.702,00				
10	**Capítulo 10 - SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL**				**$ 295.187.534,00**		**295.187.534,00**		**-**	**-**	**-**		**-**		**295.187.534,00**				
10.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL	GLB	1,00	$ 43.596.283,00	**$ 43.596.283,00**	1,00	$ 43.596.283,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 43.596.283,00				
10.2	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	GLB	1,00	$ 43.593.549,00	**$ 43.593.549,00**	1,00	$ 43.593.549,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 43.593.549,00				
10.3	REALCE DE VIVIENDAS Y REPARACION DE VIVIENDAS (ANCHO ENTRE 6 Y 8 METROS)	GLB	1,00	$ 207.997.702,00	**$ 207.997.702,00**	1,00	$ 207.997.702,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 207.997.702,00				
11	**Capítulo 11 - OBRAS PARA REPOSICIÓN DE TUBERIAS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**				**$ 2.117.797.008,00**		**3.351.758.897,00**		**264.403.576,74**		**340.486.634,91**		**604.890.211,65**		**2.746.869.476,53**				
11.1	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 100 MM (4") NORMA ISO PN 10	UN	245,16	$ 129.177,00	$ 31.423.873,00	245,16	$ 31.423.873,00		$ -	-	$ -	-	$ -	245,16	$ 31.423.873,32				
11.2	SUMINISTRO DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 150 MM (6") NORMA ISO PN 10	UN	249,48	$ 233.737,00	$ 58.312.707,00	249,48	$ 58.312.707,00		$ -	-	$ -	-	$ -	249,48	$ 58.312.706,76				
11.3	P.B/O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1636,20	$ 87.337,00	$ 142.900.799,00	7.882,28	$ 688.414.689,00	418,00	$ 36.505.866,00	880,45	$ 76.895.861,85	1.298,45	$ 113.402.727,65	6.583,83	$ 575.011.950,71				
11.4	P.B/O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1443,96	$ 25.282,00	$ 36.506.197,00	2.252,08	$ 56.937.067,00	439,50	$ 11.111.439,00	700,50	$ 17.710.041,00	1.140,00	$ 28.821.480,00	1.112,08	$ 29.115.606,56				

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO MLP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.808.833
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.317.808.833
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/08/2025-6/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%

11.5	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM	UN	143,64	$	289.996,00	$	41.653.569,00	394,00	$	114.264.484,00	42,00	$	12.179.412,00	176,00	$	51.037.536,00	218,00	$	63.216.948,00	176,00	$	51.037.536,00
11.6	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA HD 100MM 4" ISO PN10	UN	8,64	$	926.310,00	$	8.003.318,00	1,00	$	926.310,00	1,00	$	926.310,00	-	$	-	1,00	$	926.310,00	-	$	-
11.7	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 150 X200 MM	UN	182,52	$	299.996,00	$	54.727.692,00	51,00	$	15.292.146,00	20,00	$	5.999.920,00	-	$	-	20,00	$	5.999.920,00	31,00	$	9.295.226,00
11.8	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 160MM PN10	ML	1443,96	$	264.012,00	$	381.222.768,00	563,02	$	148.644.036,00	171,46	$	45.267.497,52	-	$	-	171,46	$	45.267.497,52	391,56	$	103.376.538,72
11.9	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 150MM	UN	1443,96	$	314.340,00	$	453.894.396,00	220,00	$	69.154.800,00	60,00	$	18.860.400,00	82,00	$	25.775.880,00	142,00	$	44.636.280,00	78,00	$	24.518.520,00
11.10	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 160MM (6")	ML	1443,96	$	102.197,00	$	147.568.380,00	1.443,96	$	147.568.380,00	66,00	$	6.745.002,00	-	$	-	66,00	$	6.745.002,00	1.377,96	$	140.823.378,12
11.11	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1443,96	$	101.813,00	$	147.013.899,00	7.319,25	$	745.195.818,00	239,50	$	24.384.213,50	532,98	$	54.264.292,74	772,48	$	78.648.506,24	6.546,78	$	666.547.312,14
11.12	F.B.O. ENTIBADO TIPO DISCONTINUO	M2	135,90	$	65.403,00	$	8.888.268,00	135,90	$	8.888.268,00				-	$	-	-	$	-	135,90	$	8.888.267,70
11.13	F.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M	UN	15,30	$	5.545.051,00	$	86.368.280,00	73,00	$	412.098.723,00	6,00	$	33.970.306,00	11,00	$	62.005.561,00	17,00	$	95.965.867,00	56,00	$	316.122.956,00
11.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	108,00	$	225.034,00	$	24.303.672,00	1.097,89	$	247.062.578,00	35,58	$	8.005.709,72	78,60	$	17.687.672,40	114,18	$	25.694.382,12	983,71	$	221.368.195,14
11.15	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	954,00	$	13.880,00	$	13.241.520,00	954,00	$	13.241.520,00	336,70	$	4.673.396,00	128,00	$	1.776.640,00	464,70	$	6.450.036,00	489,30	$	6.791.484,00
11.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 0.5m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1203,30	$	165.464,00	$	199.102.831,00	1,00	$	165.464,00				-	$	-	-	$	-	1,00	$	165.464,00
11.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEODRÉN PERMADRAIN TUBULAR 1.0m (INCLUYE TUBERÍA)	ML	1203,30	$	184.742,00	$	222.300.049,00	1,00	$	184.742,00		$	-	-	$	-	-	$	-	1,00	$	184.742,00
11.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 2500	M2	1203,30	$	23.304,00	$	28.041.703,00	1,00	$	23.304,00		$	-	-	$	-	-	$	-	1,00	$	23.304,00
11.19	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOLE HD TIP 24"	UN	15,00	$	1.232.079,00	$	18.481.185,00	29,00	$	35.730.291,00	5,00	$	6.160.395,00	-	$	-	5,00	$	6.160.395,00	24,00	$	29.569.896,00
11.20	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	15,00	$	380.691,00	$	5.713.365,00	15,00	$	5.713.365,00	15,00	$	5.713.365,00	-	$	-	15,00	$	5.713.365,00	-	$	-

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO N°LP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.801.833
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.317.801.833
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/08/2025-5/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%

11.21	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10	ML	1,00	$ 74.491,00	$ 74.491,00	2.252,00	$ 167.737.170,00	91,00	$ 6.777.771,00	57,52	$ 4.284.147,12	148,52	$ 11.061.918,12	2.103,56	$ 156.675.252,36
11.22	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM	UN	1,00	$ 247.098,00	$ 247.098,00	270,00	$ 66.716.460,00	11,00	$ 2.718.078,00	20,00	$ 4.941.960,00	31,00	$ 7.660.038,00	239,00	$ 59.056.422,00
11.23	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO h<1m e=20 cm	UND	1,00	$ 770.706,00	$ 770.706,00	220,00	$ 169.561.920,00	28,00	$ 21.598.608,00	27,00	$ 20.809.872,00	55,00	$ 42.390.480,00	165,00	$ 127.171.440,00
11.24	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90MM	UN	1,00	$ 216.901,00	$ 216.901,00	1,00	$ 216.901,00			-	$ -	-	$ -	1,00	$ 216.901,00
11.25	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90 X 63	UN	1,00	$ 185.054,00	$ 185.054,00	1,00	$ 185.054,00		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 185.054,00
11.26	F.B.O. SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 4"	UN	1,00	$ 376.461,00	$ 376.461,00	1,00	$ 376.461,00		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 376.461,00
11.27	SUMINISTRO DE UNION UNIVERSAL BXL 2"	UN	1,00	$ 304.230,00	$ 304.230,00	1,00	$ 304.230,00		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 304.230,00
11.28	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 63	UN	1,00	$ 183.756,00	$ 183.756,00	1,00	$ 183.756,00		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 183.756,00
11.29	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 90	UN	1,00	$ 192.696,00	$ 192.696,00	45,00	$ 8.669.520,00	5,00	$ 963.280,00	-	$ -	5,00	$ 963.280,00	40,00	$ 7.706.240,00
11.30	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110	UN	1,00	$ 217.391,00	$ 217.391,00	158,00	$ 34.330.378,00	11,00	$ 2.390.091,00	5,00	$ 1.086.405,00	16,00	$ 3.476.496,00	142,00	$ 30.853.882,00
11.31	CONSTRUCCION DE REGISTRO UNION DOMICILIARIA EN LADRILLO 0,70 X 0,70 H<1m (INCLUYE TAPA)	UN	1,00	$ 1.017.320,00	$ 1.017.320,00	1,00	$ 1.017.320,00			-	$ -	-	$ -	1,00	$ 1.017.320,00
11.32	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA UNIVERSAL EN HD DE 63mm (2") NORMA ISO PN10	UN	1,00	$ 376.516,00	$ 376.516,00	1,00	$ 376.516,00		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 376.516,00
11.33	F.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA HD 2"	UN	1,00	$ 213.365,00	$ 213.365,00	1,00	$ 213.365,00		$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 213.365,00

05.

ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 02
CONTRATO Nº LP-026-2024 LOTE 5 (2025)

CONTRATO No:	CONTRATO LP-026-2024 LOTE 5
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
INTERVENTOR:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	ARMANDO MOVILLA NAVARRO
OBJETO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULOS I, II, III, IV, V Y VI. MÓDULO V.
VALOR INICIAL:	$ 52.317.808.833
VALOR ADICIONES:	$ 0
VALOR ACUMULADO:	$ 52.317.808.833
PLAZO CONTRACTUAL:	18 MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	7/05/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
PERIODO PRESENTE ACTA:	7/08/2025- 6/11/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21,30%
% DE AVANCE ACUMULADO:	47,41%

11.34	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 90 mm	UN	1,00	$ 213.010,00	$ 213.010,00	45,00	$ 9.585.450,00	5,00	$ 1.065.050,00	-	$ -	5,00	$ 1.065.050,00	40,00	$ 8.520.400,00
11.35	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm	UN	1,00	$ 234.668,00	$ 234.668,00	158,00	$ 37.077.544,00	11,00	$ 2.581.348,00	5,00	$ 1.173.340,00	16,00	$ 3.754.688,00	142,00	$ 33.322.856,00
11.36	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 3" X 45	UN	1,00	$ 148.773,00	$ 148.773,00	1,00	$ 148.773,00			-	$ -	-	$ -	1,00	$ 148.773,00
11.37	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" + TAPA VALVULA ISO PN10	UN	1,00	$ 2.151.014,00	$ 2.151.014,00	23,00	$ 49.473.322,00	2,00	$ 4.302.028,00	-	$ -	2,00	$ 4.302.028,00	21,00	$ 45.171.294,00
11.38	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO 4" X 3"	UN	1,00	$ 201.952,00	$ 201.952,00	6,00	$ 1.211.712,00	4,00	$ 807.808,00	2,00	$ 403.904,00	6,00	$ 1.211.712,00	-	$ -
11.39	SUMINISTRO UNION PEAD 1"	UN	1,00	$ 308.654,00	$ 308.654,00	1,00	$ 308.654,00			-	$ -	-	$ -	1,00	$ 308.654,00
11.40	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90	UN	1,00	$ 271.761,00	$ 271.761,00	17,00	$ 4.619.937,00	3,00	$ 815.283,00	2,00	$ 543.522,00	5,00	$ 1.358.805,00	12,00	$ 3.261.132,00
11.41	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1,00	$ 221.650,00	$ 221.650,00	1,00	$ 221.650,00			-	$ -	-	$ -	1,00	$ 221.650,00
	CAPITULO - NO PREVISTOS				$ -		$ 9.380.215.605,00		$ 5.494.617.751,22	-	$ 3.870.628.003,84		$ 9.365.245.755,06		$ 14.969.950,06
NP1	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%	MG	$ 0,00	$ 2.023.424,00	$ -	4.490,13	$ 9.085.436.805,00	2.577,22	$ 5.214.808.801,28	1.912,91	$ 3.870.628.003,84	4.490,13	$ 9.085.436.805,12	-	$ -
NP2	BASE GRANULAR COMPACTADA	MG	0,00	$ 491.256,00	$ -	600,00	$ 294.778.800,00	569,53	$ 279.808.949,94	-	$ -	569,53	$ 279.808.949,94	30,47	$ 14.969.950,06

COSTO DIRECTO	$ 40.244.468.333,00	$ 40.244.468.333,00	$ 10.508.983.059,00	$ 8.572.636.272,00	$ 19.081.599.331,00	$ 21.162.869.003,00
COSTO INDIRECTO (AIU 30%)	$ 12.073.340.500,00	$ 12.073.340.500,00	$ 3.152.688.918,00	$ 2.571.790.882,00	$ 5.724.479.799,00	$ 6.348.860.701,00
VALOR TOTAL	$ 52.317.808.833,00	$ 52.317.808.833,00	$ 13.661.671.977,00	$ 11.144.427.154,00	$ 24.806.079.130,00	$ 27.511.729.704,00

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y consultó el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los recortes
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 6 días del mes de noviembre de 2025

CARLOS DIAZ GRANADOS GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL UNION TEMPORAL VIAL URBANO BARRANQUILLA
CONTRATISTA DE OBRA

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

ARMANDO MOVILLA NAVARRO
SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBICAS
SUPERVISION

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

TRUPILLOS
MÓDULO V

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, RÉPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	0.00	13.50	PAVIMENTO 20CM	13.50	8.42			1.00		113.67	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	13.50	75.50	PAVIMENTO 20CM	62.00	8.30			1.00		514.60	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	75.5	212.00	PAVIMENTO 20CM	136.50	8.30			1.00		1132.95	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29	5.43	7.17			1.00		38.93	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO DERECHO	1.50	0.63			1.00		0.95	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO IZQUIERDO	2.40	1.30			1.00		3.12	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0	36.63	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21B Y 21C	36.63	4.50			1.00		164.84	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 20CM, INTERSECCIÓN CALLE 28 HACIA CARRERA 21C	6.07	4.00			1.00		24.28	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	36.63	80.03	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21C Y 21D	43.40	4.45			1.00		193.13	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	80.03	130.34	PAVIMENTO 20CM. CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21D Y 21E	50.31	4.51			1.00		226.90	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	130.34	153.81	PAVIMENTO 20CM. CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21D Y 21E	23.47	4.43			1.00		103.97	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	153.81	173.11	PAVIMENTO 20CM. CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21E Y 21F	19.30	3.42			1.00		66.01	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	173.11	232.22	PAVIMENTO 15CM. CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21F Y 22	59.11	3.74			1.00		221.07	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			BAHIA 15CM. CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21F Y 22	9.97	1.22			1.00		12.16	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM. INTERSECCIÓN CALLE 28 HACIA CARRERA 21F	7.57	2.09			1.00		15.82	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM. RADIO DE GIRO IZQUIERDO	10.13	0.99			1.00		10.03	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM. RADIO DE GIRO DERECHO	7.02	1.04			1.00		7.30	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO DE 20CM, REPARCHEOINTERSECCION CALLE 28 Y CARRERA 22	5.70	3.49			1.00		19.89	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1, PAV 15CM							-291.94	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1, PAV 20CM							-727.24	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0.00	51.85	ANDENES ACERA DERECHA	51.85	0.97			1.00		50.29	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	52	58.15	RAMPA ACERA DERECHA	6.30	2.94			1.00		18.52	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	58.15	85.38	ANDEN ACERA DERECHA	27.23	1.22			1.00		33.22	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	85.38	112.61	ANDEN ACERA DERECHA	27.23	2.89			1.00		78.69	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	113	116.41	RAMPA ACERA DERECHA # 2	3.80	1.33			1.00		5.05	

ALCALDIA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	116	173.47	ANDEN ACERA DERECHA	57.06	1.12			1.00		63.91	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0.00	34.19	ANDEN ACERA IZQUIERDA	34.19	1.46			1.00		49.92	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	34.19	80.04	ANDEN ACERA IZQUIERDA	45.85	0.92			1.00		42.18	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	73.49	164.85	ANDEN ACERA IZQUIERDA	91.36	0.09			1.00		8.22	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	164.85	191.28	ANDEN ACERA IZQUIERDA	26.43	0.20			1.00		5.29	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			ANDEN ACERA IZQUIERDA CRA 21B	1.96	0.95			1.00		1.86	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	191.28	226.72	ANDEN ACERA IZQUIERDA	35.44	0.76			1.00		26.94	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1, ANDENES							-132.13	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	-4.01	0.00	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 1	4.01	14.28			1.00		57.26	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0.00	2.46	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 2	2.46	17.03			1.00		41.89	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	2.46	147.29	PAVIMENTO TRAMO 1	144.83	5.91			1.00		855.95	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	147.29	208.89	PAVIMENTO TRAMO 2	61.60	5.93			1.00		365.29	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	208.89	239.29	PAVIMENTO TRAMO 3	30.40	6.05			1.00		183.92	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	239.29	270.50	PAVIMENTO TRAMO 4	31.21	6.04			1.00		188.51	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0.00	81.01	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 1	81.01	1.01			1.00		81.82	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	81.01	86.72	RAMPA 1 ACERA DERECHA	5.71	1.74			1.00		9.94	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	86.72	123.34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 2	36.62	1.41			1.00		51.63	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	123.34	129.54	RAMPA 2 ACERA DERECHA	6.20	2.40			1.00		14.88	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	129.54	240.34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 3	110.80	1.74			1.00		192.79	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	240.34	292.44	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 4	52.10	2.39			1.00		124.52	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0.00	152.05	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 1	152.05	1.01			1.00		153.57	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	248.21	288.49	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 2	40.28	1.32			1.00		53.17	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			BOCACALLE HACIA CR 20C	4.05	6.19			1.00		25.07	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1, PAV 15CM							-1428.46	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRÁ No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1. ANDENES							-254.57	
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)	0.0	109.0		109.00	6.00			1.00		654.00	
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)	109.0	175.1		66.10	5.70			1.00		376.77	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	0.00	26.52		26.52	5.45			1.00		144.53	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	26.52	104.52		78.00	5.26			1.00		410.28	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			BAHIA	25.93	7.18			1.00		186.18	
												4.591,34

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORÍA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRÁS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 2	CÓDIGO DEL ITEM: 2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	0,00	13,50	PAVIMENTO 20CM	13,50	8,42			1,00		113,67	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	13,50	75,50	PAVIMENTO 20CM	62,00	8,30			1,00		514,60	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	75,50	212,00	PAVIMENTO 20CM	136,50	8,30			1,00		1132,95	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29	5,43	7,17			1,00		38,93	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO DERECHO	1,50	0,63			1,00		0,95	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO IZQUIERDO	2,40	1,30			1,00		3,12	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	0,00	212,00	DESCUENTO POR FRANJA CENTRAL DEMOLIDA POR INTERVENCIONES PREVIAS POR PARTE DE TRIPLE A, CON RELLENO COMO RODADURA	212,00	1,00			-1,00		-212,00	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	-4,01	0,00	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 1	4,01	14,28			1,00		57,26	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	2,46	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 2	2,46	17,03			1,00		41,89	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)	0,00	109,00		109,00	6,00			1,00		654,00	
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)	109,00	175,10		66,10	5,70			1,00		376,77	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	0,00	26,52		26,52	5,45			1,00		144,53	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	26,52	104,52		78,00	5,26			1,00		410,28	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	0,00	104,52	FRANJA EN TERRENO NATURAL, SIN PAVIMENTO EXISTENTE	104,52	1,00			-1,00		-104,52	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			BAHIA	25,93	7,18			1,00		186,18	
												3.358,61

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:
GARP
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL







LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	18,77	ACERA IZQUIERDA	18,77	1,28			1,00		24,03	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	51,00	ACERA DERECHA	51,00	0,99			1,00		50,49	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	191,28	226,72	ANDEN ACERA IZQUIERDA	35,44	0,76			1,00		26,94	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	116,41	173,47	ANDEN ACERA DERECHA	57,06	1,12			1,00		63,91	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	248,21	288,49	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 2	40,28	1,32			1,00		53,17	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	81,01	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 1	81,01	1,01			1,00		81,82	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	81,01	86,72	RAMPA 1 ACERA DERECHA	5,71	1,74			1,00		9,94	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	86,72	123,34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 2	36,62	1,41			1,00		51,63	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	123,34	129,54	RAMPA 2 ACERA DERECHA	6,20	2,40			1,00		14,88	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	129,54	240,34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 3	110,80	1,74			1,00		192,79	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	240,34	292,44	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 4	52,10	2,39			1,00		124,52	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1. ANDENES					1,00		-117,90	
												576,22

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	248,21	288,49	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 2	40,28					40,28		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	81,01	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 1	81,01					81,01		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	81,01	86,72	RAMPA 1 ACERA DERECHA	5,71					5,71		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	86,72	123,34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 2	36,62					36,62		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	123,34	129,54	RAMPA 2 ACERA DERECHA	6,20					6,20		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	129,54	240,34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 3	110,80					110,80		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	240,34	292,44	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 4	52,10					52,10		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1						-125,62		
												207,10

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			ACOMETIDAS APARTAMENTOS ESQUINA	10,00	0.20	0.50		3.00			3,00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	100	0.40	0.80		1.00			32,00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	75,00	0.40	0.60		1.00			18,00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			ACOMETIDAS POTABLES	6,00	0.20	0.50		40.00			24,00
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	100	0.40	0.80		1.00			32,00
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			ACOMETIDAS POTABLES	3.00	0.20	0.50		3.00			0,90
												109,90

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	0.00	13.50	PAVIMENTO 20CM	13.50	8.42	0.40		1.00			45.47
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	13.50	75.50	PAVIMENTO 20CM	62.00	8.30	0.40		1.00			205.84
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	75.50	212.00	PAVIMENTO 20CM	136.50	8.30	0.40		1.00			453.18
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	0.00	212.00	DESCUENTO POR FRANJA CENTRAL DEMOLIDA POR INTERVENCIONES PREVIAS POR PARTE DE TRIPLE A, CON RELLENO COMO RODADURA	212.00	1.00	0.15		1.00			31.80
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29	5.43	7.17	0.40		1.00			15.57
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO DERECHO	1.50	0.63	0.40		1.00			0.38

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX. EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO IZQUIERDO	2,40	1,30	0,40		1,00			1,25
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	78,00	88,00	FALLO EN ESTRUCTURA DE VIA, CARRIL DERECHO	10,00	4,00	0,30		1,00			12,00
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	88,00	103,00	FALLO EN ESTRUCTURA DE VIA	15,00	4,00	0,60		1,00			36,00
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	128,00	152,00	FALLO EN ESTRUCTURA DE VIA, CARRIL IZQUIERDO	24,00	4,15	0,40		1,00			39,84
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	36,63	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21B Y 21C	36,63	4,50	0,35		1,00			57,69
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 20CM, INTERSECCIÓN CALLE 28 HACIA CARRERA 21C	6,07	4,00	0,35		1,00			8,50

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	36.63	80.03	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21C Y 21D	43.40	4.45	0.35		1.00			67.60
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	80.03	130.34	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21D Y 21E	50.31	4.51	0.35		1.00			79.41
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	130.34	153.81	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21D Y 21E	23.47	4.43	0.35		1.00			36.39
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	153.81	173.11	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21E Y 21F	19.30	3.42	0.35		1.00			23.10
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	173.11	232.22	PAVIMENTO 15CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21F Y 22	59.11	3.74	0.35		1.00			77.37
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			BAHIA 15CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21F Y 22	9.97	1.22	0.35		1.00			4.26
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM, INTERSECCIÓN CALLE 28 HACIA CARRERA 21F	7.57	2.09	0.35		1.00			5.54

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCQULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM, RADIO DE GIRO IZQUIERDO	10.13	0,99	0.35		1.00			3.51
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM, RADIO DE GIRO DERECHO	7.02	1.04	0.35		1.00			2.56
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO DE 20CM, REPARCHEOINTERSECCION CALLE 28 Y CARRERA 22	5.70	3.49	0.35		1.00			6.96
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1, EXCAVACIÓN								-366.70
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	-4.01	0.00	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 1	4.01	14.28	0.20		1.00			11.45
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0.00	2.46	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 2	2.46	17.03	0.20		1.00			8.38
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	2.46	147.29	PAVIMENTO TRAMO 1	144.83	5.91	0.55		1.00			470.77

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	147.29	208.89	PAVIMENTO TRAMO 2	61.60	5.93	0.55		1.00			200.91
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	208.89	239.29	PAVIMENTO TRAMO 3	30.40	6.05	0.55		1.00			101.16
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			BOCACALLE HACIA CR 20C	4.05	6.19	0.15		1.00			3.76
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1, PAV 15CM								-785.65
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)	0.00	28.00	ESTRUCTURA DE VIA	28.00	6.00	0.40		1.00			67.20
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	35.38	0.60	1.45		1.00			30.78
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	60.60	0.60	1.65		1.00			59.99
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	63.30	0.60	1.30		1.00			49.37

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	**OBJETO DEL CONTRATO:**	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	**CÓDIGO DEL ITEM:**	3,2	**DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:**	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	38.50	0.60	1.20		1.00			27.72
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	0.00	104,52	FRANJA EN TERRENO NATURAL. SIN PAVIMENTO EXISTENTE	105	1.00	0.15		1.00			15.68
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	0.00	26.52		26.52	5.45	0.20		1.00			28.91
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	26.52	104,52		78.00	5.26	0.20		1.00			82.06
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			BAHIA	25.93	7.18	0.20		1.00			37.24
												1257,25

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:
GARP
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			ACOMETIDAS APARTAMENTOS ESQUINA	10,00	0,20	0,50		3,00			3,00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	100,00	0,40	0,50		1,00			20,00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	75,00	0,40	0,50		1,00			15,00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			ACOMETIDAS POTABLES	6,00	0,20	0,50		40,00			24,00
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	100,00	0,40	0,50		1,00			20,00
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			ACOMETIDAS POTABLES	3,00	0,20	0,50		3,00			0,90
												82,90

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	51,85	ANDENES ACERA DERECHA	51,85	0,97	0,1		1,00			5,03
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	51,85	58,15	RAMPA ACERA DERECHA	6,30	2,94	0,1		1,00			1,85
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	58,15	85,38	ANDEN ACERA DERECHA	27,23	1,22	0,1		1,00			3,32
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	85,38	112,61	ANDEN ACERA DERECHA	27,23	2,89	0,1		1,00			7,87
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	112,61	116,41	RAMPA ACERA DERECHA # 2	3,80	1,33	0,1		1,00			0,51
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	116,41	173,47	ANDEN ACERA DERECHA	57,06	1,12	0,1		1,00			6,39
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	34,19	ANDEN ACERA IZQUIERDA	34,19	1,46	0,10		1,00			4,99

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	34,19	80,04	ANDEN ACERA IZQUIERDA	45,85	0,92	0,10		1,00			4,22
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	73,49	164,85	ANDEN ACERA IZQUIERDA	91,36	0,09	0,10		1,00			0,82
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	164,85	191,28	ANDEN ACERA IZQUIERDA	26,43	0,20	0,10		1,00			0,53
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	0,00	ANDEN ACERA IZQUIERDA CRA 21B	1,96	0,95	0,10		1,00			0,19
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	191,28	226,72	ANDEN ACERA IZQUIERDA	35,44	0,76	0,10		1,00			2,69
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1, SELECCIONADO ANDENES								-4,71
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	81,01	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 1	81,01	1,01	0,10		1,00			8,18

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	81,01	86,72	RAMPA 1 ACERA DERECHA	5,71	1,74	0,10		1,00			0,99
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	86,72	123,34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 2	36,62	1,41	0,10		1,00			5,16
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	123,34	129,54	RAMPA 2 ACERA DERECHA	6,20	2,40	0,10		1,00			1,49
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	129,54	240,34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 3	110,80	1,74	0,10		1,00			19,28
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	240,34	292,44	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 4	52,10	2,39	0,10		1,00			12,45
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	152,05	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 1	152,05	1,01	0,10		1,00			15,36
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	248,21	288,49	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 2	40,28	1,32	0,10		1,00			5,32

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15				COBRADO ACTA 1								-21,03
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 218 Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	35,38	0,60	1,15		1,00			24,41
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 218 Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	60,60	0,60	1,35		1,00			49,09
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 218 Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	63,30	0,60	1,00		1,00			37,98
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 218 Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	38,50	0,60	0,90		1,00			20,79
												213,17

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	0.00	13.50	PAVIMENTO 20CM	13.50	8.42	0.20		1.00			22.73
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	13.50	75.50	PAVIMENTO 20CM	62.00	8.30	0.20		1.00			102.92
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	75.50	212.00	PAVIMENTO 20CM	136.50	8.30	0.20		1.00			226.59
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29	5.43	7.17	0.20		1.00			7.79
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO DERECHO	1.50	0.63	0.20		1.00			0.19
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO IZQUIERDO	2.40	1.30	0.20		1.00			0.62
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)	0.00	28.00	ESTRUCTURA DE VIA	28.00	6.00	0.20		1.00			33.60
												394.44

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	100,00	0,40	0,30		1,00			12,00
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			DESCUENTO POR DIAMETRO DE TUBERIA	100,00				-1,00		0,01	-1,0
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	100,00	0,40	0,30		1,00			12,00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	75,00	0,40	0,30		1,00			9,00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			DESCUENTO POR DIAMETRO DE TUBERIA	175,00				-1,00		0,01	-1,7
												30,39

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	0.00	13.50	PAVIMENTO 20CM	13.50	8.42			1.00		113.67	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	13.50	75.50	PAVIMENTO 20CM	62.00	8.30			1.00		514.60	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	75.50	212.00	PAVIMENTO 20CM	136.50	8.30			1.00		1132.95	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29	5.43	7.17			1.00		38.93	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO DERECHO	1.50	0.63			1.00		0.95	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO IZQUIERDO	2.40	1.30			1.00		3.12	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	0.00	26.52		26.52	5.45			1.00		144.53	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	26.52	104.52		78.00	5.26			1.00		410.28	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			BAHIA	25.93	7.18			1.00		186.18	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0.00	36.63	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21B Y 21C	36.63	4.50			1.00		164.84	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 20CM, INTERSECCIÓN CALLE 28 HACIA CARRERA 21C	6.07	4.00			1.00		24.28	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	36.63	80.03	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21C Y 21D	43.40	4.45			1.00		193.13	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	80.03	130.34	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21D Y 21E	50.31	4.51			1.00		226.90	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	130.34	153.81	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21D Y 21E	23.47	4.43			1.00		103.97	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	153.81	173.11	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21E Y 21F	19.30	3.42			1.00		66.01	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	173.11	232.22	PAVIMENTO 15CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21F Y 22	59.11	3.74			1.00		221.07	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			BAHIA 15CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21F Y 22	9,97	1,22			1,00		12,16	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM. INTERSECCIÓN CALLE 28 HACIA CARRERA 21F	7,57	2,09			1,00		15,82	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM. RADIO DE GIRO IZQUIERDO	10,13	0,99			1,00		10,03	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM. RADIO DE GIRO DERECHO	7,02	1,04			1,00		7,30	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO DE 20CM, REPARCHEOINTERSECCION CALLE 28 Y CARRERA 22	5,70	3,49			1,00		19,89	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1, SUELO CEMENTO							-983.65	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	2.46	147.29	PAVIMENTO TRAMO 1	144.83	5.91			1.00		855.95	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	147.29	208.89	PAVIMENTO TRAMO 2	61.60	5.93			1.00		365.29	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	208.89	239.29	PAVIMENTO TRAMO 3	30.40	6.05			1.00		183.92	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1							-1428.46	
												2.603,66

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-7	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	-4,01	0,00	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 1	4,01	14,28			1,00		57,26	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	2,46	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 2	2,46	17,03			1,00		41,89	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	239,29	270,50	PAVIMENTO TRAMO 4	31,21	6,04			1,00		188,51	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1							-190,26	
												97,40

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141	PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLASTICO NEGRO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1							-1618,72	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	0,00	26,52	0,00	26,52	5,45			1,00		144,53	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	26,52	104,52	0,00	78,00	5,26			1,00		410,28	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			BAHIA	25,93	7,18			1,00		186,18	
												2.706,00

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	0.00	26.52		26.52	5.45			1.00		144.53	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	26.52	104.52		78.00	5.26			1.00		410.28	
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			BAHIA	25.93	7.18			1.00		186.18	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	173.11	232.22	PAVIMENTO 15CM. CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21F Y 22	59.11	3.74			1.00		221.07	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1, PAV 15CM							-291.94	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	2.46	147.29	PAVIMENTO TRAMO 1	144.83	5.91			1.00		855.95	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	147,29	208,89	PAVIMENTO TRAMO 2	61,60	5,93			1,00		365,29	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	208,89	239,29	PAVIMENTO TRAMO 3	30,40	6,05			1,00		183,92	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0	0	BOCACALLE HACIA CR 20C	4,05	6,19			1,00		25,07	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1, PAV 15CM							-1428,46	
												671,89

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	0,00	13,50	PAVIMENTO 20CM	13,50	8,42			1,00		113,67	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	13,50	75,50	PAVIMENTO 20CM	62,00	8,30			1,00		514,60	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	75,50	212,00	PAVIMENTO 20CM	136,50	8,30			1,00		1132,95	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29	5,43	7,17			1,00		38,93	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO DERECHO	1,50	0,63			1,00		0,95	
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO IZQUIERDO	2,40	1,30			1,00		3,12	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	36,63	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21B Y 21C	36,63	4,50			1,00		164,84	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 20CM, INTERSECCIÓN CALLE 28 HACIA CARRERA 21C	6,07	4,00			1,00		24,28	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	36,63	80,03	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21C Y 21D	43,40	4,45			1,00		193,13	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	80,03	130,34	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21D Y 21E	50,31	4,51			1,00		226,90	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	130,34	153,81	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21D Y 21E	23,47	4,43			1,00		103,97	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	153,81	173,11	PAVIMENTO 20CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21E Y 21F	19,30	3,42			1,00		66,01	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			BAHIA 15CM, CALLE 28 ENTRE CARRERAR 21F Y 22	9,97	1,22			1,00		12,16	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM, INTERSECCIÓN CALLE 28 HACIA CARRERA 21F	7,57	2,09			1,00		15,82	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM, RADIO DE GIRO IZQUIERDO	10,13	0,99			1,00		10,03	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM, RADIO DE GIRO DERECHO	7,02	1,04			1,00		7,30	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO DE 20CM, REPARCHEOINTERSECCION CALLE 28 Y CARRERA 22	5,70	3,49			1,00		19,89	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1, PAV 20CM							-727,24	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	239,29	270,50	PAVIMENTO TRAMO 4	31,21	6,04			1,00		188,51	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1, PAV 20CM							-190,26	
												1.919,56

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15,00	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	-4,01	0,00	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 1	4,01	14,28			1,00		57,26	
15,00	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	2,46	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 2	2,46	17,03			1,00		41,89	
												99,15

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	0.00	4.50	MAN HOLE EXISTENTE EL CARRIL DERECHO	4.50	4.15			8.00	149.40		
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	30.24	31.50	LOSA ESBELTA REFORZADA, CARRIL DERECHO	1.26	4.15			8.00	41.83		
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	43.15	44.65	LOSA ESBELTA REFORZADA, CARRIL IZQUIERDO	1.50	4.15			8.00	49.80		
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	49.15	53.65	MAN HOLE EXISTENTE EL CARRIL DERECHO	4.50	4.15			8.00	149.40		
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	52.75	54.25	LOSA ESBELTA REFORZADA, CARRIL IZQUIERDO	1.50	4.15			8.00	49.80		
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	62.37	66.87	MAN HOLE EXISTENTE EN AMBOS CARRILES	4.50	8.30			8.00	298.80		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nav		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	87.90	89.37	LOSA ESBELTA REFORZADA, CARRIL DERECHO	1.47	4.15			8.00	48.80		
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26	126.99	130.00	LOSA ESBELTA REFORZADA, CARRIL IZQUIERDO	3.01	4.15			8.00	99.93		
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO DERECHO	1.50	0.63			8.00	7.56		
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			BOCALLE CALLE 29, RADIO DE GIRO IZQUIERDO	2.40	1.30			8.00	24.96		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	11.89	16.02	MANHOLE EXISTENTE CARRIL DERECHO	4.13	4.57			8.00	150.92		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	29.44	36.63	MANHOLES EXISTENTES EN AMBOS CARRILES	7.19	4.22			8.00	242.77		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 0 1 0 0 0 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	70.54	74.37	MANHOLE EXISTENTE CARRIL DERECHO	3.83	8.25			8.00	252.98		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	74.37	80.02	MANHOLE EXISTENTE CARRIL DERECHO	5.65	4.63			8.00	209.09		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	98.00	102.51	MANHOLE EXISTENTE CARRIL DERECHO	4.51	4.52			8.00	163.23		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	130.33	134.88	MANHOLE EXISTENTE CARRIL IZQUIERDO	4.55	4.31			8.00	156.95		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	153.80	157.71	MANHOLE EXISTENTE CARRIL DERECHO	3.91	3.87			8.00	121.08		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	157.71	161.41	MANHOLE EXISTENTE CARRIL DERECHO	3.70	3.35			8.00	99.27		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B, P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	169.14	173.09	MANHOLE EXISTENTE CARRIL IZQUIERDO	3.95	3.38			8.00	106.86		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	192	196	MANHOLE EXISTENTE CARRIL DERECHO	4.03	3.77			8.00	121.45		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	199.29	203.06	MANHOLE EXISTENTE CARRIL DERECHO	3.77	3.90			8.00	117.72		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 20CM. INTERSECCIÓN CALLE 28 HACIA CARRERA 21C	6.07	4.00			8.00	194.24		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM. RADIO DE GIRO IZQUIERDO	10.13	0.99			8.00	80.23		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUEILOS TRUPILLOS II)			PAVIMENTO 15CM. RADIO DE GIRO DERECHO	7.02	1.04			8.00	58.41		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUEILOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1. ACERO						-1864.91		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0.00	2.46	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 2	2.46	17.03			8.00	335.15		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	206.42	209.91	MAHOLE EXISTENTE AMBOS CARRILES	3.49	6.17			8.00	172.27		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	236.89	240.45	MAHOLE EXISTENTE CARRIL IZQUIERDO	3.56	5.85			8.00	166.61		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0.00	2.46	INTERSECCION CRA 20 CALLE 28 AREA 2	2.46	17.03			8.00	335.15		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	257.86	261.39	MANHOLE EXISTENTE EN AMBOS CARRILES	3.53	6.07			8.00	171.42		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO EN ACTA 1						-513.60		
17	calle 27b entre carrera 21b y calle 26			losa de concreto con manhole	3.00	2.65			8.00	63.60		
17	calle 27b entre carrera 21b y calle 26			losa de concreto con manhole	3.00	2.65			8.00	63.60		
17	calle 27b entre carrera 21b y calle 26			losa de concreto con manhole	3.00	2.65			8.00	63.60		
17	calle 27b entre carrera 21b y calle 26			MAN HOLE EXISTENTE EL CARRIL DERECHO	4.45	5.45			8.00	194.02		
												2.182,39

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 6	CÓDIGO DEL ITEM: 6.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	15,97	BORDILLO ACERA DERECHA TRAMO 1	15,97				1,00	15,97		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	36,20	51,39	BORDILLO ACERA DERECHA TRAMO 3	15,19				1,00	15,19		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	58,15	85,38	ANDEN ACERA DERECHA	27,23				1,00	27,23		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	85,38	112,61	ANDEN ACERA DERECHA	27,23				1,00	27,23		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	153,69	163,58	ANDEN ACERA DERECHA ULTIMO TRAMO	9,89				1,00	9,89		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	16,02	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 1	16,02				1,00	16,02		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	34,38	40,73	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 3	6,35				1,00	6,35		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	73,49	80,72	ANDEN ACERA IZQUIERDA	7,23				1,00	7,23		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	191,28	226,72	ANDEN ACERA IZQUIERDA	35,44				1,00	35,44		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1					1,00	-97,75		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	81,01	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 1	81,01				1,00	81,01		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	129,54	240,34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 3	110,80				1,00	110,80		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	240,34	292,44	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 4	52,10				1,00	52,10		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	152,05	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 1	152,05				1,00	152,05		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1					1,00	-130,16		
												328,60

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS: NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	Vo.Bo. INTERVENTORIA: NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 3 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO







LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	15,97	36,20	TRAMO 2 ACERA DERECHA	20,23				1,00	20,23		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	116,41	163,58	ANDEN ACERA DERECHA	47,17				1,00	47,17		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	16,02	34,38	TRAMO 2 ACERA IZQUIERDA	18,36				1,00	18,36		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	164,85	191,28	ANDEN ACERA IZQUIERDA	26,43				1,00	26,43		
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	226,72	236,15	DEN ACRA IZQUIERDA ULTIMO TRA	9,43				1,00	9,43		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	86,72	123,34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 2	36,62				1,00	36,62		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	248,21	288,49	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 2	40,28				1,00	40,28		
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1					1,00	-125,62		
												72,90

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	51,85	ANDENES ACERA DERECHA	51,85	0,97			1,00		50,29	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	58,15	85,38	ANDEN ACERA DERECHA	27,23	1,22			1,00		33,22	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	85,38	112,61	ANDEN ACERA DERECHA	27,23	2,89			1,00		78,69	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	116,41	173,47	ANDEN ACERA DERECHA	57,06	1,12			1,00		63,91	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	0,00	34,19	ANDEN ACERA IZQUIERDA	34,19	1,46			1,00		49,92	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	34,19	80,04	ANDEN ACERA IZQUIERDA	45,85	0,92			1,00		42,18	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	73,49	164,85	ANDEN ACERA IZQUIERDA	91,36	0,09			1,00		8,22	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	164,85	191,28	ANDEN ACERA IZQUIERDA	26,43	0,20			1,00		5,29	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			ANDEN ACERA IZQUIERDA CRA 21B	1,96	0,95			1,00		1,86	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901020181

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	191,28	226,72	ANDEN ACERA IZQUIERDA	35,44	0,76			1,00		26,94	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			COBRADO ACTA 1, ANDENES							-132,13	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	81,01	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 1	81,01	1,01			1,00		81,82	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	86,72	123,34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 2	36,62	1,41			1,00		51,63	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	129,54	240,34	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 3	110,80	1,74			1,00		192,79	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	240,34	292,44	ANDEN ACERA DERECHA TRAMO 4	52,10	2,39			1,00		124,52	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	0,00	152,05	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 1	152,05	1,01			1,00		153,57	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	248,21	288,49	ANDEN ACERA IZQUIERDA TRAMO 2	40,28	1,32			1,00		53,17	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			COBRADO ACTA 1, ANDENES							-254,57	
												631,32

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:			
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 6	CÓDIGO DEL ITEM: 6.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	51,85	58,15	RAMPA ACERA DERECHA	6,30	2,94			1,00		18,52	
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)	112,61	116,41	RAMPA ACERA DERECHA # 2	3,80	1,33			1,00		5,05	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	81,01	86,72	RAMPA 1 ACERA DERECHA	5,71	1,74			1,00		9,94	
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B	123,34	129,54	RAMPA 2 ACERA DERECHA	6,20	2,40			1,00		14,88	
												48,39

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:
GARP
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901000188-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTÁRIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REGISTRO ACOMETIDA DE TIENDA					1,00			1,00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			CONSTRUCCION REGISTRO					33,00			33,00
												34,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:
GARP
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
17,00	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)								5,0			5,00
16,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)								15,00			15,00
11,00	carrera 21 b entre calle 30 y 26								10,00			10,00
												30,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REGISTRO ACOMETIDA DE TIENDA					1.0			1.00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			CONSTRUCCION REGISTRO					33.0			33.00
												34.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901026-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 7	CÓDIGO DEL ITEM: 7.8	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			ML	M2	UND
17,00	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	0,00	104,52	CARRIL DERECHO					4,00			4,00
11,00	carrera 21 b entre calle 30 y 26								3,00			3,00
												7,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	GARP NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 8	CÓDIGO DEL ITEM: 8.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS







LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (ML)	ANCHO (ML)	ALTURA (ML)			ML	M2	UND
15,00	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B								2,00			2,00
14,00	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)								1,00			1,00
												3,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26	4,52	104.52	REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	100				1,00	100.00		
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	100				1,00	100.00		
16.00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION TUBERIA PEAD 110MM	75.00				1,00	75.00		
												275,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			ACOMETIDAS APARTAMENTOS ESQUINA	10,00				3,00	30,00		
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCIO			ACOMETIDAS POTABLES	6,00				40,00	240,00		
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			ACOMETIDAS POTABLES	3,00				3,00	9,00		
												279,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
15	CALLE 28 ENTRE CRA 20 Y 21B			ACOMETIDAS APARTAMENTOS ESQUINA					3,00			3,00
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)								40,00			40,00
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26								3,00			3,00
												46,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
16,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			CONSTRUCCION REGISTRO					33,00			33,00
												33,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	35,38				1,00	35,38		
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	60,60				1,00	60,60		
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	63,30				1,00	63,30		
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	38,50				1,00	38,50		
												197,78

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP


NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M

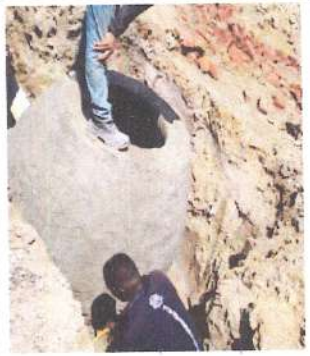



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)			ML	M2	UND
16	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)								3,00			3.00
												3.00


Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.14	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO

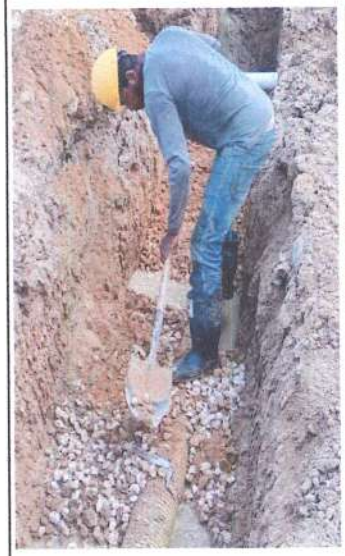



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
16,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	35,38	0,60	0,30		1,00			6,37
16,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	60,60	0,60	0,30		1,00			10,91
16,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	63,30	0,60	0,30		1,00			11,39
16,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			REPOSICION ALCANTARILLADO TUBERIA 8"	38,50	0,60	0,30		1,00			6,93
16,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21B Y 22 (REPARCHEO Y/O RECONSTRUCCION)			DESCUENTO POR DIAMETRO DE TUBERIA	197,78				-1,00		0,03	-6,21
												29,39

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.23	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
17	CALLE 27B ENTRE CARRERA 21B Y CALLE 26			CARRIL DERECHO					4			4.00
11	carrera 21 b entre calle 30 y 26			MAN HOLE EXISTENTE					3			3.00
14	CALLE 28 ENTRE CARRERAS 21B Y 22(PARQUE LOS TRUPILLOS II)			MAN HOLES/CAJAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES					5.00			5.00
												12.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

VEREDA LAS NUBES
MÓDULO V

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
61	VEREDA LAS NUBES	K1+200	K1+200	INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO EN EL K1+200	6.00	2.50			1.00		15.00	
61	VEREDA LAS NUBES	298.00	303.00	ESTRUCTURA DE CONCRETO DE 20CM DE ESPESOR APROXIMADAMENTE DE BOX ANTIGUO EN ZONA DONDE SE PROYECTÓ CONTRUCCION DE NUEVO BOX, A UNA PROFUNDIDAD DE 1.75m	5.00	4.80			1.00		24.00	
61	VEREDA LAS NUBES	298.00	303.00	TUBOS DE CONCRETO, ENCONTRADA DEBAJO DE LOSA DE CONCRETO DE BOX ANTIGUO, LO CUAL NO ESTABA FUNCIONANDO Y ESTABA DEBAJO DEL TERRENO A UNA PROFUNDIDAD 1.75m.	2.50	1.00			6.00		15.00	
												54.00

DURANTE LA EXCAVACIÓN PARA CONTRUCCION DEL BOX, SE ENCONTRÓ DENTRO DEL TERRENO UN ANTIGUO BOX, SEGÚN LA COMUNIDAD CONSTRUIDO POR ELLOS MISMOS, EL CUAL SE COLMATÓ CON EL PASO DEL TIEMPO, QUEDANTO POR DEBAJO DEL NIVEL DE LA VIA, ESTE BOX CONTABA CON UNA LOSA Y TUBOS DE CONCRETO PARA CONDUCCION DEL AGUA, FUE NECESARIO REALIZAR LA DEMOLICIÓN DE ESTA ESTRUCTURA PARA PODER OBTENER LOS NIVELES DE DISEÑO DEL NUEVO BOX. SE ACUERDA CON INTERVENTORIA COBRAR ESTAS ACTIVIDADES POR ESTE ÍTEM.

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
61	VEREDA LAS NUBES	K1+200	K1+200	INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO EN EL K1+200	10.00	2.50	1.50		1.00			37.50
61	VEREDA LAS NUBES	K1+200	K1+200	CABEZAL DE TUBERIA DE CONCRETO	4.00	2.00	1.50		1.00			12.00
61	VEREDA LAS NUBES	K0+960	K0+960	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT EN EL K0+960	9.00	2.50	1.50		1.00			33.75
61	VEREDA LAS NUBES	K0+960	K0+960	CABEZAL DE TUBERIA DE NOVAFORT	4.00	2.00	1.40		1.00			11.20
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT EN EL K0+310 BOX CULVERT	9.00	2.50	1.50		1.00			33.75
61	VEREDA LAS NUBES	K1+510	K1+510	BATEA # 1 DE CONCRETO EN EL K1+1510	7.00	6.00	0.40		1.00			16.80
61	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330	BATEA # 2 DE CONCRETO EN EL K1+1330	7.50	6.00	0.40		1.00			18.00

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310	CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT DE 4m x 7m x 2.17m EN LA K0+310. RETIRO DE TUBERIA EXISTENTE	4.50	2.00	1.00		1.00			9.00
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310	CONSTRUCCIÓN BOX CULVERT DE 4m x 7m x 2.17m EN LA K0+310	4.00	5.00	2.22		1.00			44.40
61	VEREDA LAS NUBES	298	303	INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT	5.00	3.50	2.00		1.00			35.00
												251,40

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
61	VEREDA LAS NUBES	K1+200	K1+200	INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO EN EL K1+200	10,00	2,50	1,50		1,00			37,50
61	VEREDA LAS NUBES	K1+200	K1+200	DESCUENTO POR DIAMETRO DE TUBERIA	10,00				-1,00		0,89	-8,94
61	VEREDA LAS NUBES	K0+960	K0+960	INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT EN EL K0+960	8,00	2,50	1,40		1,00			28,00
61	VEREDA LAS NUBES	K0+960	K0+960	DESCUENTO POR DIAMETRO DE TUBERIA	8,00				-1,00		0,89	-7,15
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310	INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT EN EL K0+310 BOX CULVERT	8,00	2,50	1,40		1,00			28,00
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310	DESCUENTO POR DIAMETRO DE TUBERIA	8,00				-1,00		0,89	-7,15
												70,26

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,10





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
61	VEREDA LAS NUBES	K1+510	K1+510	BATEA # 1 DE CONCRETO EN EL K1+1510	7,00	6,00			1,00		42,00	
61	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330	BATEA # 2 DE CONCRETO EN EL K1+1330	7,00	6,00			1,00		42,00	
61	VEREDA LAS NUBES	298,00	303,00	SOLADO DE LIMPIEZA	5,00	4,00			1,00		20,00	
61	VEREDA LAS NUBES			INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT EN EL K0+960	4,77	1,00			1,00		4,77	
												108,77

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
61	VEREDA LAS NUBES	K1+510	K1+510	BATEA # 1 DE CONCRETO EN EL K1+1510	7.00	6.00			1.00		42.00	
61	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330	BATEA # 2 DE CONCRETO EN EL K1+1330	7.00	6.00			1.00		42.00	
												84.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.14	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE SUELOS MEDIANTE ADICIÓN DE POLÍMEROS ESTABILIZANTES, INCLUYENDO APLICACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
61	VEREDA LAS NUBES	440,00	1586,00		1146,00	5,50			1,00		6303,00	
												6.303,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO







LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
61,00	VEREDA LAS NUBES	K1+510	K1+510	BATEA # 1 DE CONCRETO EN EL K1+1510	7,50	6,10	0,20		1,00			9,15
61,00	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330	DENTELLON DE BATEA #1	27,20	0,20	0,30		1,00			1,63
61,00	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330	BATEA # 2 DE CONCRETO EN EL K1+1330	7,00	6,00	0,20		1,00			8,40
61,00	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310	DENTELLON DE BATEA #2	26,00	0,20	0,30		1,00			1,56
61,00	VEREDA LAS NUBES	K0+300	K0+300	BOX. LOSA INFERIOR	6,20	4,60	0,35		1,00			9,98
61,00	VEREDA LAS NUBES	K0+300	K0+300	BOX. MUROS	6,20	0,30	1,40		2,00			5,21
61,00	VEREDA LAS NUBES	K0+300	K0+300	BOX. LOSA SUPERIOR	6,20	4,60	0,35		1,00			9,98
												45,91

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. CONCRETO DE FC= 4.000 PSI, PARA BOXCOULVERT, BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS, INCLUYE ANCLAJE, CINTA SIKA PVC DE JUNTA O EQUIVALENTE, FORMALETERIA METALICA, NO INCLUYE ACERO







LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
61,00	VEREDA LAS NUBES	K1+510	K1+510	BATEA # 1 DE CONCRETO EN EL K1+1510	7,00	6,00	0,20		1,00			8,40
61,00	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330	DENTELLON DE BATEA #1	27,20	0,20	0,30		1,00			1,63
61,00	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330	BATEA # 2 DE CONCRETO EN EL K1+1330	7,00	6,00	0,20		1,00			8,40
61,00	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310	DENTELLON DE BATEA #2	26,00	0,20	0,30		1,00			1,56
61,00	VEREDA LAS NUBES	K0+300	K0+300	BOX, LOSA INFERIOR	6,20	4,60	0,35		1,00			9,98
61,00	VEREDA LAS NUBES	K0+300	K0+300	BOX, MUROS	6,20	0,30	1,40		2,00			5,21
61,00	VEREDA LAS NUBES	K0+300	K0+300	BOX, LOSA SUPERIOR	6,20	4,60	0,35		1,00			9,98
												45,16

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)







LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		VARILLA (#)	DENSID (KG/M)	LONG (M)			ML	M2	KG
61	VEREDA LAS NUBES	K1+510	K1+510'	BATEA # 1, ACERO LONGITUDINAL	4,00	0,99	7,80		31,00			240,35
61	VEREDA LAS NUBES	K1+510	K1+510'	BATEA # 1, ACERO TRANSVERSAL	4,00	0,99	6,40		38,00			241,74
61	VEREDA LAS NUBES	K1+510	K1+510'	BATEA # 1, ACERO LONGITUDINAL VIGA PERIMETRAL	4,00	0,99	28,40		2,00			56,46
61	VEREDA LAS NUBES	K1+510	K1+510'	BATEA # 1, ACERO TRANSVERSAL VIGA PERIMETRAL	3,00	0,56	0,70		136,00			53,31
61	VEREDA LAS NUBES	K1+510	K1+510'	DISTANCIADORES Y TACHES	4,00	0,99	0,40		40,00			15,90
61	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330'	BATEA # 2, ACERO LONGITUDINAL	4,00	0,99	7,30		31,00			224,94
61	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330'	BATEA # 2, ACERO TRANSVERSAL	4,00	0,99	6,30		36,00			225,44
61	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330'	BATEA # 2, ACERO LONGITUDINAL VIGA PERIMETRAL	4,00	0,99	28,40		2,00			56,46
61	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330'	BATEA # 2, ACERO TRANSVERSAL VIGA PERIMETRAL	3,00	0,56	0,70		130,00			50,96
61	VEREDA LAS NUBES	K1+330	K1+330'	DISTANCIADORES Y TACHES	4,00	0,99	0,40		45,00			17,89
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310'	ACERO BOX LOSA SUPERIOR, TRANSVERSAL	5,00	1,55	5,00		84,00			651,84
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310'	ACERO BOX LOSA SUPERIOR, LONGITUDINAL	4,00	0,99	6,40		62,00			394,42
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310'	ACERO BOX LOSA INFERIOR, TRANSVERSAL	5,00	1,55	5,00		84,00			651,84


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02


CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V	
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM: 7.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)	

BATEA 1

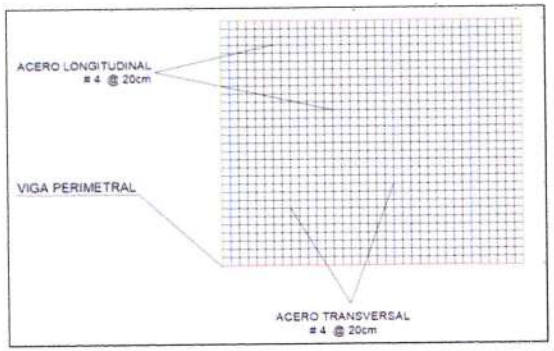

BATEA 2

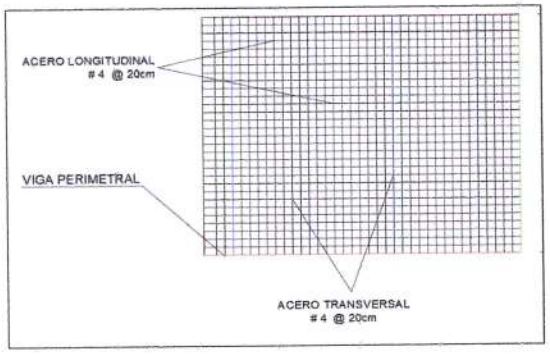


LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		VARILLA (#)	DENSID (KG/M)	LONG (M)			ML	M2	KG
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310'	ACERO BOX LOSA INFERIOR, LONGITUDINAL	4.00	0.99	6.60		62.00			406.74
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310'	ACERO BOX MURO. TRANSVERSAL	5.00	1.55	2.50		168.00			651.84
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310'	ACERO BOX MURO. LONGITUDINAL	4.00	0.99	6.60		56.00			367.38
61	VEREDA LAS NUBES	K0+310	K0+310'	ACERO DE BOX REFUERZO ESQUINA DE BOX	3.00	0.56	1.00		140.00			78.40


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 7	CÓDIGO DEL ITEM: 7.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)

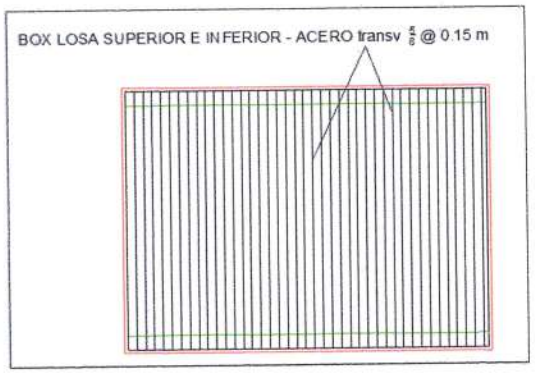

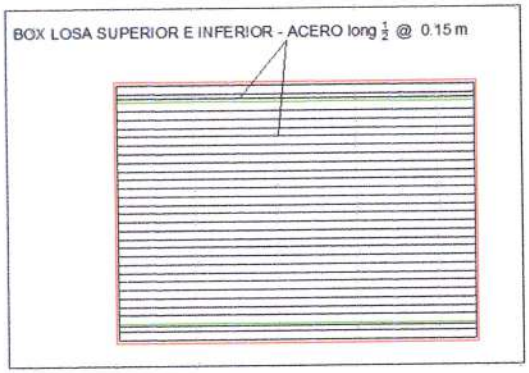

LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		VARILLA (#)	DENSID (KG/M)	LONG (M)			ML	M2	KG


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02


CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 7	CÓDIGO DEL ITEM: 7.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ACERO DE REFUERZO FIGURADO 60.000 PSI LEGITIMO (PARA BOX-COULVERT,BARANDAS, PASOS PEATONALES Y MUROS)

BOX MURO DERECHO E IZQUIERDO - ACERO transv $\frac{5}{8}$ @ 0.15 m



BOX MURO DERECHO E IZQUIERDO - ACERO long $\frac{1}{2}$ @ 0.15 m



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		VARILLA (#)	DENSID (KG/M)	LONG (M)			ML	M2	KG
												4.385,91

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	VEREDA LAS NUBES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	8	CÓDIGO DEL ITEM:	8.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG	ANCHO	ALTURA			ML	M2	UND
61.00	VEREDA LAS NUBES								2,00			2,00
												2,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

7 DE ABRIL
MÓDULO V

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	7 DE ABRIL		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS







	LOCALIZACIÓN				DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
1	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74				24,00	2,25			1,00		54,00	
1	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74			CUNETA ROTONDA	124,00	0,90			1,00		111,60	
1	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74			DESAGUE	3,00	3,00			2,00		18,00	
												183,60

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	7 DE ABRIL				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
1	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74			CUNETA ROTONDA	124,00	0,90			1,00		111,60	
1	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74			DESAGUE	3,00	3,00			2,00		18,00	
												129,60

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	7 DE ABRIL				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
1	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74			CONFORMACION DE ANDENES	24,00	2,25	0,10		1,00			5,40
1	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74			CUNETA ROTONDA	124,00	0,90	0,10		1,00			11,16
1	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74			DESAGUE	3,00	3,00	0,10		1,00			0,90
												17,46

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	7 DE ABRIL				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
1	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 518 Y 74				24,00				1,00	24,00		
												24,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141


ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	7 DE ABRIL				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)



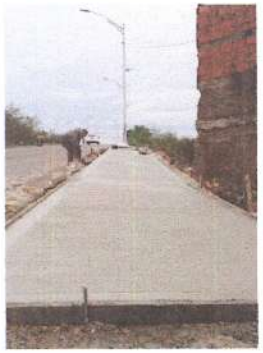



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
1	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74				24,00	2.25			1,00		54,00	
1,00	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74			CUNETA ROTONDA	124,00	0,90			1,00		111,60	
1				DESAGUE	3,00	3,00			2,00		18,00	
												183.60

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	7 DE ABRIL		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	8	CÓDIGO DEL ITEM:	8.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS







LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG	ANCHO	ALTURA			ML	M2	UND
1,00	CIRCUNVALAR ENTRE CALLE 51B Y 74								3,00			3,00
												3,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

REBOLO
MÓDULO V

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 1	CÓDIGO DEL ITEM: 1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ÁLTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	4,55	CALLE 19	4,58	4,30			1,00		19,69	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4,55	31,90	CALLE 19	27,35	4,30			1,00		117,61	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	31,90	38,45	CALLE 19	6,55	4,30			1,00		28,17	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	4,98	CALLE 20	4,98	4,10			1,00		20,42	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4,98	49,79	CALLE 20	44,81	4,10			1,00		183,72	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	49,79	57,52	CALLE 20	7,73	4,10			1,00		31,69	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	22,35	ANDEN DERECHO SECCION 1 CALLE 19	22,35	1,26			1,00		28,27	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	22,35	30,85	RAMPA ACCESO VEHICULAR DERECHO CALLE 19	8,50	2,49			1,00		21,20	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	30,85	37,05	ANDEN DERECHO SECCION 2 CALLE 19	6,20	0,74			1,00		4,58	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	19,58	ANDEN IZQUIERDO SECCION 1 CALLE 19	19,58	1,22			1,00		23,90	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	19,58	27,30	ANDEN IZQUIERDO CALLE 19	7,72	1,97			1,00		15,17	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	27,30	34,62	ANDEN IZQUIERDO SECCION 2 CALLE 19	7,32	2,07			1,00		15,17	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	54,87	ANDEN DERECHO CALLE 20	54,87	1,24			1,00		68,04	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	54,98	ANDEN IZQUIERDO CALLE 20	54,98	0,96			1,00		52,78	
												630,41

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 19, LOSA CERCA A MALECON(ARBOLD E MANGO)	6,53	3,80			1,00		24,81	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 19 INTERSECCIÓN CON CARRERA 28	5,60	5,50			1,00		30,80	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 20. DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO NUEVA PARA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PASO DE TUBERIA HACIA LADO OPUESTO DE MALECÓN	4,00	2,00			1,00		8,00	
												63,61

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	38,45	REEMPLAZO TUBERIA PEAD 110mm. CALLE 19	38,45	0,40	0,80		1,00			12,30
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	57,52	REEMPLAZO TUBERIA PEAD 90mm. CALLE 20	57,52	0,40	0,80		1,00			18,41
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 19	6,00	0,20	0,50		1,00			0,60
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO OPUESTO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 19	2,00	0,20	0,50		6,00			1,20
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 20	2,00	0,20	0,50		1,00			0,20
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO OPUESTO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 20	8,00	0,20	0,50		1,00			0,80
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS LARGA DISTANCIA CALLE 20	20,00	0,20	0,50		1,00			2,00
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS LARGA DISTANCIA CALLE 20	7,00	0,20	0,50		1,00			0,70
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 20. PROLONGACIONES PROVISIONALES/ ALARGUES DIA DE EMPALME DE RED POTABLE	20,00	0,20	0,50		1,00			2,00
31	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO	60,60	0,60	1,28		1,00			46,36
31	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO	137,60	0,60	0,90		1,00			74,30
												158,87

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CÁNALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	4,55	CALLE 19	4,58	4,60	0,50		1,00			10,53
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4,55	31,90	CALLE 19	27,35	4,60	0,50		1,00			62,91
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	31,90	38,45	CALLE 19	6,55	4,30	0,60		1,00			16,90
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	4,98	CALLE 20	4,98	4,10	0,50		1,00			10,21
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4,98	49,79	CALLE 20	44,81	4,10	0,50		1,00			91,86
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	49,79	57,52	CALLE 20	7,73	4,10	0,60		1,00			19,02
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 20, DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO NUEVA PARA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PASO DE TUBERIA HACIA LADO OPUESTO DE MALECÓN	4,00	3,70	2,00		1,00			29,60
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO. CALLE 19	41,00	0,60	1,23		1,00			30,26
												271,29

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

BARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	38,45	REEMPLAZO TUBERIA PEAD 110mm. CALLE 19	38,45	0,40	0,50		1,00			7,69
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	57,52	REEMPLAZO TUBERIA PEAD 90mm. CALLE 20	57,52	0,40	0,50		1,00			11,50
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	0,00	ACOMETIDAS POTABLES LADO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 19	2,00	0,20	0,50		1,00			0,20
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	0,00	ACOMETIDAS POTABLES LADO OPUESTO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 19	6,00	0,20	0,50		7,00			4,20
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	0,00	ACOMETIDAS POTABLES LADO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 20	2,00	0,20	0,50		11,00			2,20
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	0,00	ACOMETIDAS POTABLES LADO OPUESTO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 20	8,00	0,20	0,50		1,00			0,80
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	0,00	ACOMETIDAS LARGA DISTANCIA CALLE 20	20,00	0,20	0,50		1,00			2,00
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	0,00	ACOMETIDAS LARGA DISTANCIA CALLE 20	7,00	0,20	0,50		1,00			0,70
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	0,00	CALLE 20, PROLONGACIONES PROVISIONALES/ ALARGUES DIA DE EMPALME DE RED POTABLE	20,00	0,20	0,50		1,00			2,00
												$1,29

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,000	22,350	ANDEN DERECHO SECCION 1 CALLE 19	22,35	1,26	0,10		1,00			2,83
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	22,350	30,850	RAMPA ACCESO VEHICULAR DERECHO CALLE 19	8,50	2,49	0,10		1,00			2,12
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	30,850	37,050	ANDEN DERECHO SECCION 2 CALLE 19	6,20	0,74	0,10		1,00			0,46
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 20. DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO NUEVA PARA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PASO DE TUBERIA HACIA LADO OPUESTO DE MALECÓN	4,00	3,70	1,80		1,00			26,64
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,000	22,350	ANDEN DERECHO SECCION 1 CALLE 19	22,35	1,26	0,10		1,00			2,83
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	22,350	30,850	RAMPA ACCESO VEHICULAR DERECHO CALLE 19	8,50	2,49	0,10		1,00			2,12
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	30,850	37,050	ANDEN DERECHO SECCION 2 CALLE 19	6,20	0,74	0,10		1,00			0,46

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,000	19,580	ANDEN IZQUIERDO SECCION 1 CALLE 19	19,58	1,22	0,10		1,00			2,39
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	19,580	27,300	ANDEN IZQUIERDO CALLE 19	7,72	1,97	0,10		1,00			1,52
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	27,30	34,62	ANDEN IZQUIERDO SECCION 2 CALLE 19	7,32	2,07	0,10		1,00			1,52
31	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO	60,60	0,60	0,98		1,00			35,45
31	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO	137,60	0,60	0,60		1,00			49,54
												127,88

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	GARP NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	4,55	CALLE 19	4,58	4,60	0,20		1,00			4,21
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4,55	31,90	CALLE 19	27,35	4,60	0,20		1,00			25,16
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	31,90	38,45	CALLE 19	6,55	4,50	0,20		1,00			5,90
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	4,98	CALLE 20	4,98	4,50	0,20		1,00			4,48
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4,98	49,79	CALLE 20	44,81	4,50	0,20		1,00			40,33
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	49,79	57,52	CALLE 20	7,73	4,50	0,20		1,00			6,96
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	0,00	CALLE 20, DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO NUEVA PARA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PASO DE TUBERIA HACIA LADO OPUESTO DE MALECÓN	4,00	3,70	0,20		1,00			2,96
												90,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	38.45	REEMPLAZO TUBERIA PEAD 110mm. CALLE 19	38.45	0.40	0.30		1.00			4.61
32.00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	38.45	DESCUENTO POR VOLUMEN DE TUBERIA PEAD 110mm. CALLE 19	38.45				-1.00		0.01	-0.4
32.00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	57.52	REEMPLAZO TUBERIA PEAD 90mm. CALLE 20	57.52	0.40	0.30		1.00		0.01	6.90
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	38.45	DESCUENTO POR VOLUMEN DE TUBERIA PEAD 110mm. CALLE 20	57.52				-1.00		0.01	-0.4
												10.77

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	4,55	CALLE 19	4,58	4,60			1,00		21,07	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4,55	31,90	CALLE 19	27,35	4,60			1,00		125,81	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	31,90	38,45	CALLE 19	6,55	4,50			1,00		29,48	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	4,98	CALLE 20	4,98	4,50			1,00		22,41	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4,98	49,79	CALLE 20	44,81	4,50			1,00		201,65	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	49,79	57,52	CALLE 20	7,73	4,50			1,00		34,79	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	0,00	CALLE 20. DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO NUEVA PARA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PASO DE TUBERIA HACIA LADO OPUESTO DE MALECÓN	4,00	3,70			1,00		14,80	
												450,01

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO



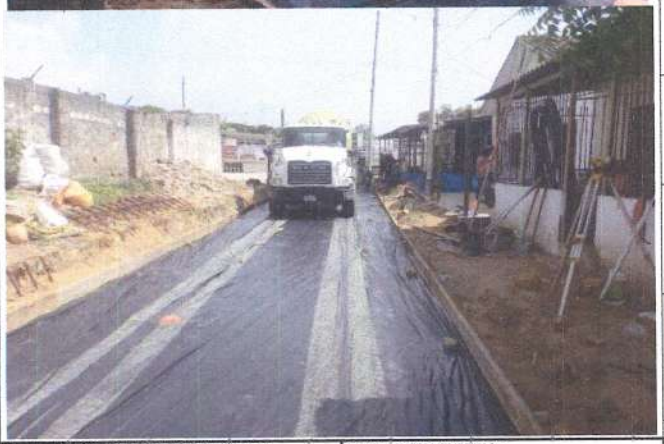

LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	4.55	CALLE 19	4.58	4.30			1.00		19.69	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4.55	31.90	CALLE 19	27.35	4.30			1.00		117.61	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	31.90	38.45	CALLE 19	6.55	4.10			1.00		26.86	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	4.98	CALLE 20	4.98	4.10			1.00		20.42	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4.98	49.79	CALLE 20	44.81	4.10			1.00		183.72	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	49.79	57.52	CALLE 20	7.73	4.10			1.00		31.69	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	0.00	CALLE 20, DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO NUEVA PARA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PASO DE TUBERIA HACIA LADO OPUESTO DE MALECÓN	4.00	3.70			1.00		14.80	
												414.79

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 39 A LA FLEXION , ESPESOR= 0.2 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	4.55	CALLE 19	4.58	4.30			1.00		19.69	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4.55	31.90	CALLE 19	27.35	4.30			1.00		117.61	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	31.90	38.45	CALLE 19	6.55	4.10			1.00		26.86	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	4.98	CALLE 20	4.98	4.10			1.00		20.42	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	4.98	49.79	CALLE 20	44.81	4.10			1.00		183.72	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	49.79	57.52	CALLE 20	7.73	4.10			1.00		31.69	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	0.00	CALLE 20, DEMOLICION DE LOSA DE PAVIMENTO NUEVA PARA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE PASO DE TUBERIA HACIA LADO OPUESTO DE MALECÓN	4.00	3.70			1.00		14.80	
												414.79

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	4,55	CALLE 19, LOSA CON MAN HOLE	4,58	4,30			8,00	157,55		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 19, LOSA IRREGULAR EN INTERSECCIÓN CON CARRERA 28	2,05	4,20			8,00	68,88		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			RADIO DE GIRO DERECHO INTERSECCION CALLE 19 CON CARRERA 28	2,51	2,10			4,00	21,08		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			RADIO DE GIRO IZQUIERDO INTERSECCION CALLE 19 CON CARRERA 29	1,83	2,96			4,00	21,67		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	4,98	CALLE 20, LOSA CON MAN HOLE	4,98	4,10			8,00	163,34		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	11,84	13,55	CALLE 20,IRREGULAR	1,71	4,10			8,00	56,09		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	38,68	40,73	CALLE 20, LOSA CON MAN HOLE	2,05	4,10			8,00	67,24		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 20, LOSA DE RECONSTRUIDA PARA CONEXIÓN RED POTABLE	4,00	2,00			8,00	64,00		
												619,85

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 8901020128-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	0,00	22,35	ANDEN DERECHO SECCION 1 CALLE 19	22,35				1,00	22,35		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	22,35	30,85	RAMPA ACCESO VEHICULAR DERECHO CALLE 19	8,50				1,00	8,50		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	30,85	37,05	ANDEN DERECHO SECCION 2 CALLE 19	6,20				1,00	6,20		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	0,00	19,58	ANDEN IZQUIERDO SECCION 1 CALLE 19	19,58				1,00	19,58		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	19,58	27,30	ANDEN IZQUIERDO CALLE 19	7,72				1,00	7,72		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	27,30	34,62	ANDEN IZQUIERDO SECCION 2 CALLE 19	7,32				1,00	7,32		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	0,00	3,12	RADIO DE GIRO DERECHO INTERSECCION CALLE 19 CON CARRERA 28	3,12				1,00	3,12		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	3,12	6,36	RADIO DE GIRO IZQUIERDO INTERSECCION CALLE 19 CON CARRERA 29	3,24				1,00	3,24		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	6,36	14,38	ACERA DERECHA CALLE 20	8,02				1,00	8,02		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREME2CLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	14,38	25,78	ACERA DERECHA CALLE 20	11,40				1,00	11,40		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	25,78	32,48	ACERA DERECHA CALLE 20	6,70				1,00	6,70		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	32,48	38,29	ACERA DERECHA CALLE 20	5,81				1,00	5,81		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	38,29	50,19	ACERA DERECHA CALLE 20	11,90				1,00	11,90		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	0,00	5,12	ACERA IZQUIERDA CALLE 20	5,12				1,00	5,12		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	5,12	10,72	ACERA IZQUIERDA CALLE 20	5,60				1,00	5,60		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	10,72	28,07	ACERA IZQUIERDA CALLE 20	17,35				1,00	17,35		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR	28,07	37,87	ACERA IZQUIERDA CALLE 20	9,80				1,00	9,80		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	37,87	48,07	ACERA IZQUIERDA CALLE 20	10,20				1,00	10,20		

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	48,07	55,84	ACERA IZQUIERDA CALLE 20	7,77				1,00	7,77		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	55,84	62,27	ACERA IZQUIERDA CALLE 20	6,43				1,00	6,43		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	62,27	64,31	ACERA IZQUIERDA CALLE 20	2,04				1,00	2,04		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			RAIDO DE GIRO IZQUIERDO	1,25				1,00	1,25		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			RAIDO DE GIRO DERECHO	3,23				1,00	3,23		
												190,65

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	22,35	ANDEN DERECHO SECCION 1 CALLE 19	22,35	1,26			1,00		28,27	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	30,85	37,05	ANDEN DERECHO SECCION 2 CALLE 19	6,20	0,74			1,00		4,58	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	19,58	ANDEN IZQUIERDO SECCION 1 CALLE 19	19,58	1,22			1,00		23,90	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	19,58	27,30	ANDEN IZQUIERDO CALLE 19	7,72	1,97			1,00		15,17	
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	27,30	34,62	ANDEN IZQUIERDO SECCION 2 CALLE 19	7,32	2,07			1,00		15,17	
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	54,87	ANDEN DERECHO CALLE 20	54,87	1,24			1,00		68,04	
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	54,98	ANDEN IZQUIERDO CALLE 20	54,98	0,96			1,00		52,78	
												207,91

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	22.35	30.85	RAMPA ACCESO VEHICULAR DERECHO CALLE 19	8.50	2.49			1.00		21.20	
												21.20

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	GARP NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 0 1 0 0 0 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.







LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR			CALLE 20					14,00			14,00
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 19					7,00			7,00
31	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)								19,00			19,00
												40,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPARACIONES DURANTE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CALLE 19					10,0			10,00
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPARACIONES DURANTE MOVIMIENTO DE TIERRAS, CALLE 20					15,00			15,00
												25,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)								14			14,00
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)								7			7,00
31	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)								19			19,00
												40,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.8	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG	ANCHO	ALTURA			ML	M2	UND
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			MAN HOLE CALLE 19					2,00			2,00
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			MAN HOLE CALLE 20					3,00			3,00
												5,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B/O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0.00	38.45	REEMPLAZO TUBERIA PEAD 110mm. CALLE 19	38.45				1.00	38.45		
												38.45

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:
GARP
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 19	2,00				6,00	12,00		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO OPUESTO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 19	6,00				1,00	6,00		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 20	2,00				7,00	14,00		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO OPUESTO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 20	8,00				11,00	88,00		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS LARGA DISTANCIA CALLE 20	20,00				1,00	20,00		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS LARGA DISTANCIA CALLE 20	7,00				1,00	7,00		
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 20. PROLONGACIONES PROVISIONALES/ ALARGUES DIA DE EMPALME DE RED POTABLE	20,00				1,00	20,00		
												167,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 19					6,00			6,00
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO OPUESTO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 19					1,00			1,00
												7,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 20					14,00			14,00
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 19					7,00			7,00
31,00	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)								19,00			19,00
												40,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO, CALLE 19	41,00				1,00			41,00
31,00	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO	60,60				1,00			60,60
31,00	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO	137,60				1,00			137,60
												239,20

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP


NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. POZO DE INSPECCIÓN 1.45 M< H<= 1.80 M

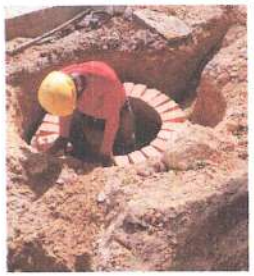



LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG	ANCHO	ALTURA			ML	M2	UND
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			MAN HOLE CALLE 19					1.00			1.00
31	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)								7.00			7.00
												8.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.14	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO, CALLE 19	41,00	0,60	0,30		1,00			7,38
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			DESCUENTO POR DIAMETRO DE TUBERIA	41,00				-1,00		0,03	-1,29
31,00	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO	60,60	0,60	0,30		1,00			10,91
31,00	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			REPOSICION TUBERIA ALCANTARILLADO	137,60	0,60	0,30		1,00			24,77
31,00	CARRERA 26 ENTRE CALLES 19 Y 24 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			DESCUENTO POR DIAMETRO DE TUBERIA	198,20				-1,00		0,03	-6,23
												35,54

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.21	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 90MM PN10





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32.00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	57,52	REEMPLAZO TUBERIA PEAD 90mm. CALLE 20	57,52				1,00	57.52		
												57,52

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORÍA:
GARP
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102017-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.22	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 90 X20 MM





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0,00	57,52	ACOMETIDAS POTABLES LADO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 20					7,00			7,00
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS POTABLES LADO OPUESTO DE INSTALACION DE TUBERIA. CALLE 20					11,00			11,00
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS LARGA DISTANCIA CALLE 20					1,00			1,00
32,00	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			ACOMETIDAS LARGA DISTANCIA CALLE 20					1,00			1,00
												20,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.23	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			MAN HOLE EXISTENTE CALLE 20					3,00			3,00
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			MAN HOLE EXISTENTE CALLE 19					1,00			1,00
												4,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.30	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 19. NODO CALLE 19 CON CARRERA 28					1.00			1.00
												1.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.35	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)	0	0	CALLE 19. NODO CALLE 19 CON CARRERA 28					1,0			1,00
												1,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	GARP NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 800102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	REBOLO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.38	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION POLIETILENO 4" X 3"



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 20. EMPALME CARRERA CON CARRERA 28					1.00			1.00
32	CALLE 19 Y CALLE 20 ENTRE CARRERAS 26 Y 28 (PARQUE MALECON SUR ORIENTE)			CALLE 20. EMPALME TUBERIA HACIA ARROYO					1.00			1.00
												2.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	GARP NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

SAN FELIPE
MÓDULO V

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V	
BARRIO:	SAN FELIPE				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM: 1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	14.63	0.83			1.00		12.14	
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			RAMPA ACCESO VEHICULAR	3.65	0.56			1.00		2.04	
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	23.02	1.81			1.00		41.67	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	0,0	54,6	ESTRUCTURA DE VIA	54.60	6.03			1.00		329.24	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	54,6	67,6	ESTRUCTURA DE VIA	13.00	5.95			1.00		77.35	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	67,60	97,60	ESTRUCTURA DE VIA	30.00	5.60			1.00		168.00	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	97,60	127,60	ESTRUCTURA DE VIA	30.00	5.24			1.00		157.20	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	127,60	167,60	ESTRUCTURA DE VIA	40.00	5.30			1.00		212.00	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	167,60	187,60	ESTRUCTURA DE VIA	20.00	5.19			1.00		103.80	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	187,60	197,60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.21			1.00		52.10	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 1	CÓDIGO DEL ITEM: 1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	197.60	207.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.53			1.00		55.30	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	207.60	217.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.89			1.00		58.90	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	217.60	228.01	ESTRUCTURA DE VIA	10.41	6.17			1.00		64.23	
												1.333,97

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:
GARP
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-024-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	0.00	54.60	ESTRUCTURA DE VIA	54.60	6.03			1.00		329.24	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	54.60	67.60	ESTRUCTURA DE VIA	13.00	5.95			1.00		77.35	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	67.60	97.60	ESTRUCTURA DE VIA	30.00	5.60			1.00		168.00	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	97.60	127.60	ESTRUCTURA DE VIA	30.00	5.24			1.00		157.20	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	127.60	167.60	ESTRUCTURA DE VIA	40.00	5.30			1.00		212.00	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	167.60	187.60	ESTRUCTURA DE VIA	20.00	5.19			1.00		103.80	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	187.60	197.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.21			1.00		52.10	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	197.60	207.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.53			1.00		55.30	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	207,60	217,60	ESTRUCTURA DE VIA	10,00	5,89			1,00		58,90	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	217,60	228,01	ESTRUCTURA DE VIA	10,41	6,17			1,00		64,23	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			DEMOLICIÓN DE FLUIDO POR TRABAJOS DE TRIPLE A	114,00	3,20			1,00		364,80	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			DEMOLICIÓN DE FLUIDO POR TRABAJOS DE TRIPLE A	15,07	8,10			1,00		122,07	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			DEMOLICIÓN DE FLUIDO POR TRABAJOS DE TRIPLE A	4,20	3,36			1,00		14,11	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			CANTIDAD PARCIAL COBRADA EN ACTA 1							-636,16	
												1.142,94

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DEL TRAMO, LO CUAL CORRESPONDE A LOS DOS CARRILES CENTRALES SIN LAS BERMAS, Y SE DESCONTÓ LO COBRADO EN ACTAS ANTERIORES. UNA VEZ TERMINADO, SE REALIZARÁ EL BALANCE FINAL DE CANTIDADES Y SE INCLUIRAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS BERMAS.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 2	CÓDIGO DEL ITEM: 2.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	14,63	0,83			1,00		12,14	
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			RAMPA ACCESO VEHICULAR	3,65	0,56			1,00		2,04	
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	23,02	1,81			1,00		41,67	
												55,85

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8400010181

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	14,63					14,63		
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			RAMPA ACCESO VEHICULAR	3,65					3,65		
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	23,02					23,02		
												41,30

SE PRESENTA EL ANTES Y DESPUES DE CONSTRUCCIÓN DEL BORDILLO

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8901099081

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			REPOSICION TUBERIA ACUEDUCTO PEAD 110mm	467	0,40	0,80		1,00			149,44
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			APIQUES PARA EMPALME POTABLE	2	1,50	1,50		6,00			20,25
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			REPOSCIOIN TRAMO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO 8"	4	0,60	1,00		1,00			2,40
												172,09

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	0,00	54,60	ESTRUCTURA DE VIA	54,60	6,03	0,20		1,00			65,85
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	54,60	67,60	ESTRUCTURA DE VIA	13,00	5,95	0,20		1,00			15,47
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	67,60	97,60	ESTRUCTURA DE VIA	30,00	5,60	0,20		1,00			33,60
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	97,60	127,60	ESTRUCTURA DE VIA	30,00	5,24	0,20		1,00			31,44
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	127,60	167,60	ESTRUCTURA DE VIA	40,00	5,30	0,20		1,00			42,40
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	167,60	187,60	ESTRUCTURA DE VIA	20,00	5,19	0,20		1,00			20,76
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	187,60	197,60	ESTRUCTURA DE VIA	10,00	5,21	0,20		1,00			10,42
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	197,60	207,60	ESTRUCTURA DE VIA	10,00	5,53	0,20		1,00			11,06

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	207.60	217.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.89	0.20		1.00			11,78
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	217.60	228,01	ESTRUCTURA DE VIA	10,41	6.17	0.20		1.00			12,85
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			DEMOLICIÓN DE FLUIDO POR TRABAJOS DE TRIPLE A	114,00	3.20	0.20		1.00			72.96
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			DEMOLICIÓN DE FLUIDO POR TRABAJOS DE TRIPLE A	15.07	8.10	0.20		1.00			24,41
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			DEMOLICIÓN DE FLUIDO POR TRABAJOS DE TRIPLE A	4,20	3.36	0.20		1.00			2.82
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			CANTIDAD PARCIAL COBRADA EN ACTA I								-127,23
												228,59

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:	
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141	PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DEL ESTADO DE AVANCE DEL TRAMO, LO CUAL CORRESPONDE A LOS DOS CARRILES CENTRALES SIN LAS BERMAS, Y SE DESCONTÓ LO COBRADO EN ACTAS ANTERIORES. UNA VEZ TERMINADO, SE REALIZARÁ EL BALANCE FINAL DE CANTIDADES Y SE INCLUIRAN LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS BERMAS.

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			REPOSICION TUBERIA ACUEDUCTO PEAD 110mm	467,00	0,40	0,50		1,00			93,40
												93,40

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	14,63	0,83	0,10		1,00			1,21
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			RAMPA ACCESO VEHICULAR	3,65	0,56	0,10		1,00			0,20
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	23,02	1,81	0,10		1,00			4,17
												5,58

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIO$ A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			REPOSICION TUBERIA ACUEDUCTO PEAD 110mm	467,00	0,40	0,30		1,00			56,04
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			DESCUENTO POR DIAMETRO DE TUBERI A	467,00				-1,00		0,01	-4,4
												51,60

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	0.00	54.60	ESTRUCTURA DE VIA	54.60	6.03			1.00		329.24	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	54.60	67.60	ESTRUCTURA DE VIA	13.00	5.95			1.00		77.35	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	67.60	97.60	ESTRUCTURA DE VIA	30.00	5.60			1.00		168.00	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	97.60	127.60	ESTRUCTURA DE VIA	30.00	5.24			1.00		157.20	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	127.60	167.60	ESTRUCTURA DE VIA	40.00	5.30			1.00		212.00	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	167.60	187.60	ESTRUCTURA DE VIA	20.00	5.19			1.00		103.80	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	187.60	197.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.21			1.00		52.10	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	197.60	207.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.53			1.00		55.30	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	207.60	217.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.89			1.00		58.90	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	217.60	228.01	ESTRUCTURA DE VIA	10.41	6.17			1.00		64.23	
												1.278,12

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V		
BARRIO:	SAN FELIPE				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	0.00	54.60	ESTRUCTURA DE VIA	54.60	6.03			1.00		329.24	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	54.60	67.60	ESTRUCTURA DE VIA	13.00	5.95			1.00		77.35	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	67.60	97.60	ESTRUCTURA DE VIA	30.00	5.60			1.00		168.00	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	97.60	127.60	ESTRUCTURA DE VIA	30.00	5.24			1.00		157.20	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	127.60	167.60	ESTRUCTURA DE VIA	40.00	5.30			1.00		212.00	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	167.60	187.60	ESTRUCTURA DE VIA	20.00	5.19			1.00		103.80	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	187.60	197.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.21			1.00		52.10	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	197.60	207.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.53			1.00		55.30	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	207.60	217.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.89			1.00		58.90	
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	217.60	228.01	ESTRUCTURA DE VIA	10.41	6.17			1.00		64.23	
												1.278,12

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V	
BARRIO:	SAN FELIPE				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM: 4.10	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=45, ESPESOR=0.20 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES D = 1" LISO A CADA 0,30 METROS Y 5/8" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.		





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	0.00	54.60	ESTRUCTURA DE VIA	54.60	6.03			1.00		329.24	
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	54.60	67.60	ESTRUCTURA DE VIA	13.00	5.95			1.00		77.35	
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	67.60	97.60	ESTRUCTURA DE VIA	30.00	5.60			1.00		168.00	
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	97.60	127.60	ESTRUCTURA DE VIA	30.00	5.24			1.00		157.20	
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	127.60	167.60	ESTRUCTURA DE VIA	40.00	5.30			1.00		212.00	
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	167.60	187.60	ESTRUCTURA DE VIA	20.00	5.19			1.00		103.80	
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	187.60	197.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.21			1.00		52.10	
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	197.60	207.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.53			1.00		55.30	
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	207.60	217.60	ESTRUCTURA DE VIA	10.00	5.89			1.00		58.90	
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	217.60	228.01	ESTRUCTURA DE VIA	10.41	6.17			1.00		64.23	
												1.278,12

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			LOSA REFORZADAS CON MAN HOL ES	3.00	3.00			8.00	72.00		
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			LOSA REFORZADAS CON MAN HOL ES	3.00	3.00			8.00	72.00		
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			LOSA REFORZADAS CON MAN HOL ES	3.00	3.00			8.00	72.00		
15	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			LOSA REFORZADAS CON MAN HOL ES	3.00	3.00			8.00	72.00		
												288.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	14,63				1,00	14,63		
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68				3,65				1,00	3,65		
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	23,02				1,00	23,02		
												41,30

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	14,63	0,83			1,00		12,14	
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68			ANDENES ACERA IZQUIERDA	23,02	1,81			1,00		41,67	
												53,81

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 1 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 6	CÓDIGO DEL ITEM: 6.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN CONCRETO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
23R	Carrera 22C entre Calles 70C y 68	0.00	0.00	RAMPA ACCESO VEHICULAR	3.65	0.56			1.00		2.04	
												2.04

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	GARP NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 7	CÓDIGO DEL ITEM: 7.8	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			MAN HOLES EXISTENTES					4.00			4.00
												4.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	GARP NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B/O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15	CARRERA 258 ENTRE CALLES 68 Y 64			REPOSICION TUBERIA ACUEDUCTO PEAD 110mm	467				1,00	467,00		
												467,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	103.00	206.00		
												206.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64								103,00			103,00
												103,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
15,00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			REPOSCIOIN TRAMO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO 8"	4,00				1,00	4,00		
												4,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SAN FELIPE		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.23	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
15.00	CARRERA 25B ENTRE CALLES 68 Y 64			MAN HOLES EXISTENTES					4,00			4,00
												4,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

MONTES
MÓDULO V

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V	
BARRIO:	MONTES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM: 1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	

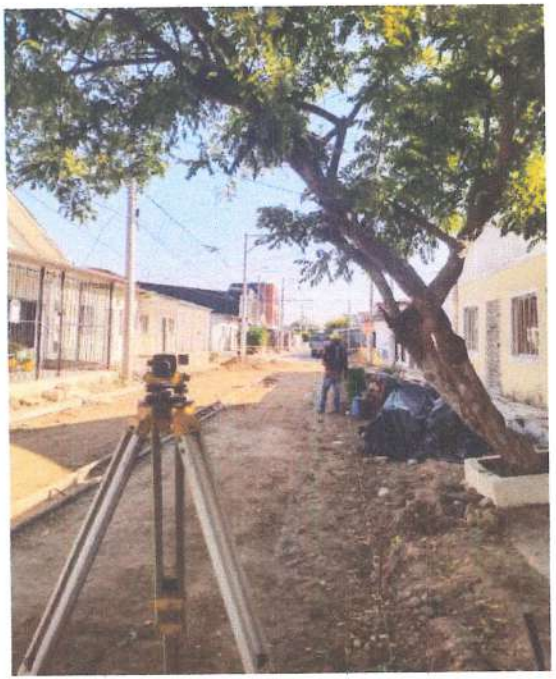

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	-4.62	0.00	INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	4.62	10.11			1.00		46.71	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			RADIO DE GIRO DERECHO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2,03	1,39			1.00		2.82	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			RADIO DE GIRO IZQUIERDO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2,16	0.99			1.00		2,14	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0.0	77.4	PAVIMENTO	77.43	6.06			1.00		469.23	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	77.43	81.08	LOSAS REFORZADAS, CON MAN HOLE	3.65	6.58			1.00		24.02	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	81.08	87.13	INTERSECCION CALLE 26 Y CARRERA 22	6.05	3.50			1.00		21.18	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87.13	100.58		13.45	5.98			1.00		80.43	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	100.58	103.88	LOSA IRREGULAR REFORZADA	3.30	5.95			1.00		19.64	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MÓDULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 1	CÓDIGO DEL ITEM: 1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0.00	81.08	ANDEN ACERA DERECHA, CALLE 26 ENTRE 23 Y 22	81.08	0.94			1.00		76.22	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87.13	103.88	ANDEN ACERA DERECHA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 21D	16.75	1.23			1.00		20.60	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0.00	81.08	ANDEN ACERA IZQUIERDA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 23	81.08	2.08			1.00		168.65	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87.13	103.88	ANDEN ACERA IZQUIERDA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 21D	16.75	1.85			1.00		30.99	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			ANDEN ACERA IZQUIERDA, PARA NIVELACION DE CASA	9.01	1.78			1.00		16.04	
												978.67

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN EDGARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	GARP NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	-4,62	0.00	INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	4,62	10,11			1,00		46,71	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	81,08	87,13	INTERSECCION CALLE 26 Y CARRERA 22	6,05	3,50			1,00		21,18	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			INTERSECCION CALLE 26 Y CARRERA 22	10,11	1,74			1,00		17,59	
												85,48

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 2	CÓDIGO DEL ITEM: 2.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			DEMOLICION DE ANDEN CARRIL IZQUIERDO FRENTE A IGLESIA	9.00	0.40			1.00		3.60	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			DEMOLICON TERRAZA DE CASA CARRIL IZQUIERDO	14.00	1.10			1.00		15.40	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			GARAJE ACERA DERECHA	8.00	0.40			1.00		3.20	
												22.20

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			APIQUES PARA DESCUBRIR TUBERIAS EXISTENTES DE CONTADORES	1,00	0,50	0,50		28,00			7,00
												7,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	-4.62	0.00	INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	4.62	10.11	0.20		1.00			9.34
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0.00	0.00	RADIO DE GIRO DERECHO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2.03	1.39	0.20		1.00			0.56
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0.00	0.00	RADIO DE GIRO IZQUIERDO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2.16	0.99	0.20		1.00			0.43
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	81.08	87.13	INTERSECCION CALLE 26 Y CARRERA 22	6.05	3.50	0.20		1.00			4.24
												14.57

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORÍA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			APIQUES PARA DESCUBRIR TUBERIAS EXISTENTES DE CONTADORES	1.00	0.50	0.50		28.00			7.00
												7.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0.00	81.08	ANDEN ACERA DERECHA, CALLE 26 ENTRE 23 Y 22	81.08	0.94	0.10		1.00			7.62
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87.13	103.88	ANDEN ACERA DERECHA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 21D	16.75	1.23	0.10		1.00			2.06
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0.00	81.08	ANDEN ACERA IZQUIERDA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 23	81.08	2.08	0.10		1.00			16.86
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87.13	103.88	ANDEN ACERA IZQUIERDA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 21D	16.75	1.85	0.10		1.00			3.10
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0.00	0.00	ANDEN ACERA IZQUIERDA, PARA NIVELACION DE CASA	9.01	1.78	0.10		1.00			1.60
												31.24

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	-4,62	0,00	INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	4,62	10,11			1,00		46,71	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0,00	0,00	RADIO DE GIRO DERECHO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2,03	1,39			1,00		2,82	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0,00	0,00	RADIO DE GIRO IZQUIERDO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2,16	0,99			1,00		2,14	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0,00	77,43	PAVIMENTO	77,43	6,06			1,00		469,23	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	77,43	81,08	LOSAS REFORZADAS, CON MAN HOLE	3,65	6,58			1,00		24,02	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	81,08	87,13	INTERSECCION CALLE 26 Y CARRERA 22	6,05	3,50			1,00		21,18	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87,13	100,58	0,00	13,45	5,98			1,00		80,43	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	100,58	103,88	LOSA IRREGULAR REFORZADA	3,30	5,95			1,00		19,64	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			COBRADO ACTA 1					1,00		-621,05	
												45,12

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0,00	77,43	PAVIMENTO	77,43	6,06			1,00		469,23	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	77,43	81,08	LOSAS REFORZADAS, CON MAN HOLE	3,65	6,58			1,00		24,02	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87,13	100,58	0,00	13,45	5,98			1,00		80,43	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	100,58	103,88	LOSA IRREGULAR REFORZADA	3,30	5,95			1,00		19,64	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			COBRADO ACTA 1					-531,48		-531,48	
												61,84

PARA ESTE ITEM, SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO UNA VEZ TERMINADAS LAS INTERVENCIONES Y SE DESCONTARÓN LAS CANTIDADES PARCIALES COBRADAS EN EL ACTA ANTERIOR

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	-4,62	0,00	INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	4,62	10,11			1,00		46,71	
18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			RADIO DE GIRO DERECHO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2,03	1,39			1,00		2,82	
18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			RADIO DE GIRO IZQUIERDO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2,16	0,99			1,00		2,14	
18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	81,08	87,13	INTERSECCION CALLE 26 Y CARRERA 22	6,05	3,50			1,00		21,18	
												72,85

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			RADIO DE GIRO DERECHO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2.03	1.39			8.00	22.57		
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			RADIO DE GIRO IZQUIERDO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2.16	0.99			8.00	17.11		
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	77	81	LOSAS REFORZADAS, CON MAN HOLE	3.65	6.58			8.00	192.14		
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	100.58	103.88	LOSA IRREGULAR REFORZADA	3.30	5.95			8.00	157.08		
												388.90

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0.00	77,43	PAVIMENTO	77,43	6.06			1.00		469,23	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	77,43	81,08	LOSAS REFORZADAS, CON MAN HOLE	3,65	6,58			1,00		24,02	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87,13	100,58		13,45	5,98			1,00		80,43	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	100,58	103,88	LOSA IRREGULAR REFORZADA	3,30	5,95			1,00		19,64	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	-4,62	0,00	INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	4,620	10,110			1,00		46,71	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			RADIO DE GIRO DERECHO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2,03	1,39			1,00		2,82	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			RADIO DE GIRO IZQUIERDO INTERSECCIÓN CALLE 26 Y CARRERA 23	2,16	0,99			1,00		2,14	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	81,08	87,13	INTERSECCION CALLE 26 Y CARRERA 22	6,05	3,50			1,00		21,18	
												666,17

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0,00	82,76	ANDEN ACERA DERECHA, CALLE 26 ENTRE 23 Y 22	82,76				1,00	82,76		
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	82,13	104,00	ANDEN ACERA DERECHA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 21D	21,87				1,00	21,87		
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0,00	86,30	ANDEN ACERA IZQUIERDA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 23	86,30				1,00	86,3		
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87,13	103,88	ANDEN ACERA IZQUIERDA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 21D	17,67				1,00	17,67		
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			BORDILLO BOBLE PARA NIVELACION DE LOISA	22,20				1,00	22,2		
												230,80

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901021818-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	6	CÓDIGO DEL ITEM:	6.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0,00	81,08	ANDEN ACERA DERECHA, CALLE 26 ENTRE 23 Y 22	81,08	0,94			1,00		76,22	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87,13	103,88	ANDEN ACERA DERECHA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 21D	16,75	1,23			1,00		20,60	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0,00	81,08	ANDEN ACERA IZQUIERDA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 23	81,08	2,08			1,00		168,65	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	87,13	103,88	ANDEN ACERA IZQUIERDA, CALLE 26 ENTRE 22 Y 21D	16,75	1,85			1,00		30,99	
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23	0,00	0,00	ANDEN ACERA IZQUIERDA, PARA NIVELACION DE CASA	9,01	1,78			0,00		0,00	
												296,46

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.8	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"



LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG	ANCHO	ALTURA			ML	M2	UND
18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			MAN HOLE INTERSECCIÓN CALLE 26 CON CARRERA 23					1,00			1,00
18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			MAN HOLE INTERSECCIÓN CALLE 26 CON CARRERA 23					1,00			1,00
												2,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	GARP NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	B	CÓDIGO DEL ITEM:	B.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. PASACALLE DE 1 MT X 6 MT, INSTALADOS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG	ANCHO	ALTURA			ML	M2	UND
18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23								2,00			2,00
												2,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8901020184-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			ACOMETIDAS ADICIONALES DE CASA DURANTE EMPALME	11,00				1,00	11,00		
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			ACOMETIDAS ADICIONALES DE CASA DURANTE EMPALME	1,50				1,00	1,50		
												12,50

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			ACOMETIDAS ADICIONALES DE CASA DURANTE EMPALME					2,00			2,00
												2.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901000788-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.23	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .

	LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
	OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	UND
	18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			MAN HOLE EXISTENTE INTERSECCION CALLE 26 CON CARRERA 23					1,00			1,00
	18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			MAN NUEVO EXISTENTE INTERSECCION CALLE 26 CON CARRERA 22					1,00			1,00
													2,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	GARP NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.30	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFLANCHES POLIETILENO PE 100 PN 10 DE 110





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			EMPALME CARRERA 23. TEE					2,00			2,00
18,00	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			EMPALME CARRERA 23, VALVULA					2,00			2,00
												4,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8901000188-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.35	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA LOCA EN HD 110 mm





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			EMPALME CARRERA 23, TEE					2			2,00
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			EMPALME CARRERA 23, VALVULA					2			2,00
												4,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	MONTES				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.40	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PEAD 4" X 90



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			INTERSECCIÓN CALLE 26 CARRERA 23				1.0				1,00
18	CALLE 26 ENTRE CARRERAS 21D Y 23			INTERSECCIÓN CALLE 26 CARRERA 22				1.0				1,00
												2.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

CIRCUNVALAR
MÓDULO V

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	82.50	CARRIL CENTRO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	82.50	3.80			1.00		313.50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	195.00	253.50	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	58.50	3.50			1.00		204.75	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	352.00	391.00	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	39.00	4.10			1.00		159.90	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	907.00	940.00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	33.00	11.90			1.00		392.70	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	257.70	311.40	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	53.70	4.20			1.00		225.54	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1034.00	1047.00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	13.00	3.50			1.00		45.50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1061.00	1072.60	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	11.60	3.50			1.00		40.60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1124.00	1196.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	72.00	5.00			1.00		360.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	202.60	257.00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	54.40	3.60			1.00		195.84	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1279.00	1479.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	200.00	4.00			1.00		800.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1279.00	1479.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	200.00	4.00			1.00		800.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1423.00	1481.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	58.00	3.00			1.00		174.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1357.00	1377.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	20.00	3.00			1.00		60.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1279.00	1337.50	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	58.50	3.00			1.00		175.50	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1483.00	1527.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	44.00	3.80			1.00		167.20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1692.00	1782.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	90.00	3.70			1.00		333.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1723.00	1738.80	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	15.80	3.80			1.00		60.04	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1862.00	2027.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	165.00	4.00			1.00		660.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	373.50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	373.50	4.00			1.00		1494.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	373.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	373.50	3.50			1.00		1307.25	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	22.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	22.00	3.50			1.00		77.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	52.00	62.80	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	10.80	3.50			1.00		37.80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	72.60	79.80	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	7.20	3.50			1.00		25.20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	112.60	122.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	9.40	3.40			1.00		31.96	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	173.00	185.70	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	12.70	3.00			1.00		38.10	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	423.40	443.80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	20.40	10.30			1.00		210.12	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	550.50	584.60	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	34.10	7.20			1.00		245.52	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 1	CÓDIGO DEL ITEM: 1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	584.60	616.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	31.40	10.30			1.00		323.42	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	62.00	143.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	81.50	3.60			1.00		293.40	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	637.50	646.90	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	9.40	3.80			1.00		35.72	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	686.00	734.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	48.00	7.90			1.00		379.20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	734.00	809.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	75.00	10.10			1.00		757.50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	855.00	1005.80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	150.80	7.50			1.00		1131.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	288.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	288.00	4.00			1.00		1152.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	85.50	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	85.50	3.00			1.00		256.50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	41.50	141.50	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	100.00	4.00			1.00		400.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	141.50	210.70	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	69.20	5.00			1.00		346.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	388.00	438.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	50.00	8.00			1.00		400.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	438.00	559.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	121.00	10.80			1.00		1306.80	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 1	CÓDIGO DEL ITEM: 1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1444.00	1467.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	23.00	6.70			1.00		154.10	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1502.00	1610.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	108.00	3.60			1.00		388.80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1641.00	1697.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	56.00	4.30			1.00		240.80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1697.00	1782.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	85.00	7.00			1.00		595.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1831.00	1847.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	16.50	6.30			1.00		103.95	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	117.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	117.50	3.40			1.00		399.50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 111	167.00	195.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	28.50	3.50			1.00		99.75	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 112	228.00	245.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	17.50	3.70			1.00		64.75	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 113	250.50	256.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	6.00	4.20			1.00		25.20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 114	273.00	276.80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	3.80	2.00			1.00		7.60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 115	289.80	297.30	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	7.50	4.00			1.00		30.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 116	323.80	343.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	19.20	4.00			1.00		76.80	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 117	369,30	376,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	7,50	3,40			1,00		25,50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	369,30	391,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	22,50	3,50			1,00		78,75	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	448,80	587,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	139,00	3,40			1,00		472,60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	564,80	586,30	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	21,50	3,30			1,00		70,95	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	455,20	482,60	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	27,40	6,00			1,00		164,40	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	601,50	759,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	158,00	6,80			1,00		1074,40	
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38			REPARCHEO EN PAV RIGIDO	7,10	10,50			1,00		74,55	
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38			REPARCHEO EN PAV RIGIDO	3,50	7,50			1,00		26,25	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 30			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR, PUENTE	9,80	5,36			1,00		52,53	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR, BOMBA	14,60	7,15			1,00		104,39	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO SUR NORTE, PUENTE PEATONAL	17,60	5,86			1,00		103,14	
												19.850,27

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 2	CÓDIGO DEL ITEM: 2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38			REPARCHEO EN PAV RIGIDO	7,10	10,50			1,00		74,55	
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38			REPARCHEO EN PAV RIGIDO	3,50	7,50			1,00		26,25	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 30			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR, PUENTE	9,80	5,36			1,00		52,53	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR, BOMBA	14,60	7,15			1,00		104,39	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO SUR NORTE, PUENTE PEATONAL	17,60	5,86			1,00		103,14	
												360,86

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 26 Y TRANVERSAL 27	22	25	Fallo presentado entre el puente de la 27 y el semáforo de La Paz	2.50	1.50	0.30		1.00			1.13
0	AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 26 Y TRANVERSAL 27	46	52	Fallo presentado entre el puente de la 27 y el semáforo de La Paz	6.00	3.00	0.30		1.00			5.40
0	AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 26 Y 26B	53	124	Piel de cocodrilo presentado entre el puente de la 27 y el semáforo de La Paz	71.00	4.00	0.20		1.00			56.80
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38				7.10	10.50	0.17		1.00			12.67
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38				3.50	7.50	0.17		1.00			4.46
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 30			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR, PUENTE	9.80	5.36	0.17		1.00			8.93
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR, BOMBA	14.60	7.15	0.17		1.00			17.75
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO SUR NORTE, PUENTE PEATONAL	17.60	5.86	0.17		1.00			17.53
												124.67

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 1 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 26 Y TRANVERSAL 27	22,00	24,50	Falio presentado entre el puente de la 27 y el semáforo de La Paz	2,50	1,50	0,30		1,00			1,13
0	AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 26 Y TRANVERSAL 27	46,00	52,00	Falio presentado entre el puente de la 27 y el semáforo de La Paz	6,00	3,00	0,30		1,00			5,40
0	AVENIDA CIRCUNVALAR ENTRE CARRERAS 26 Y 26B	53,00	124,00	Piel de cocodrilo presentado entre el puente de la 27 y el semáforo de La Paz	71,00	4,00	0,20		1,00			56,80
												63,33

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38			REPARCHEO EN PAV RIGIDO	7,10	10,50			1,00		74,55	
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38			REPARCHEO EN PAV RIGIDO	3,50	7,50			1,00		26,25	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 30			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR, PUENTE	9,80	5,36			1,00		52,53	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR, BOMBA	14,60	7,15			1,00		104,39	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO SUR NORTE, PUENTE PEATONAL	17,60	5,86			1,00		103,14	
												360,86

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38			REPARCHEO EN PAV RIGIDO	7.10	10.50			1.00		74.55	
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38			REPARCHEO EN PAV RIGIDO	3.50	7.50			1.00		26.25	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 30			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR. PUENTE	9.80	5.36			1.00		52.53	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR. BOMBA	14.60	7.15			1.00		104.39	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO SUR NORTE. PUENTE PEATONAL	17.60	5.86			1.00		103.14	
												360.86

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38			REPARCHEO EN PAV RIGIDO	7,10	10,50			1,00		74,55	
1	PUENTE CIRCUNVALAR CON CALLE 38			REPARCHEO EN PAV RIGIDO	3,50	7,50			1,00		26,25	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 30			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR, PUENTE	9,80	5,36			1,00		52,53	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR, BOMBA	14,60	7,15			1,00		104,39	
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 26			LA PRADERA SENTIDO SUR NORTE, PUENTE PEATONAL	17,60	5,86			1,00		103,14	
												360,86

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
2	CINCUNVALAR CON CARRERA 30			LA PRADERA SENTIDO NORTE SUR. PUENTE	9.80	5.36			8,00	420.22		
												420,22

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	82,50	CARRIL CENTRO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE SUR)	82.50	3.80			1,00		313,50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	195,00	253,50	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	58,50	3,50			1,00		204,75	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	352,00	391,00	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	39,00	4,10			1,00		159,90	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	907,00	940,00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	33,00	11,90			1,00		392,70	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	257,70	311,40	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	53,70	4,20			1,00		225,54	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1034,00	1047,00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	13,00	3,50			1,00		45,50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1061,00	1072,60	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	11,60	3,50			1,00		40,60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1124,00	1196,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	72,00	5,00			1,00		360,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	202,60	257,00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	54,40	3,60			1,00		195,84	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V		
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	5	CÓDIGO DEL ITEM:	5.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1279,00	1479,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	200,00	4,00			1,00		800,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1279,00	1479,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	200,00	4,00			1,00		800,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1423,00	1481,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	58,00	3,00			1,00		174,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1357,00	1377,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	20,00	3,00			1,00		60,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1279,00	1337,50	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	58,50	3,00			1,00		175,50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1483,00	1527,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	44,00	3,80			1,00		167,20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1692,00	1782,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	90,00	3,70			1,00		333,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1723,00	1738,80	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	15,80	3,80			1,00		60,04	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1862,00	2027,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	165,00	4,00			1,00		660,00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-7	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	5	CÓDIGO DEL ITEM:	5.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO






LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	373,50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	373,50	4,00			1,00		1.494,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	373,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	373,50	3,50			1,00		1.307,25	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	22,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	22,00	3,50			1,00		77,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	52,00	62,80	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	10,80	3,50			1,00		37,80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	72,60	79,80	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	7,20	3,50			1,00		25,20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	112,60	122,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	9,40	3,40			1,00		31,96	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	173,00	185,70	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	12,70	3,00			1,00		38,10	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	423,40	443,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	20,40	10,30			1,00		210,12	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	550,50	584,60	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	34,10	7,20			1,00		245,52	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

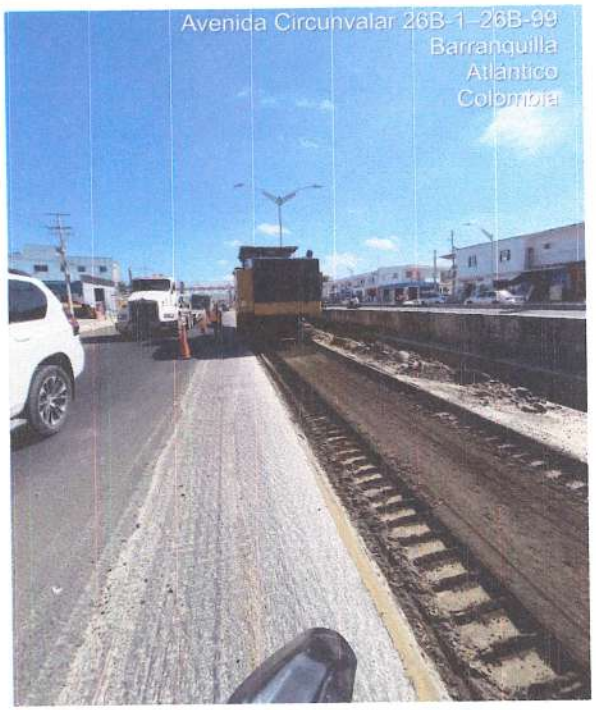

LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	584,60	616,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	31,40	10,30			1,00		323,42	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	62,00	143,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	81,50	3,60			1,00		293,40	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	637,50	646,90	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	9,40	3,80			1,00		35,72	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	686,00	734,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	48,00	7,90			1,00		379,20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	734,00	809,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	75,00	10,10			1,00		757,50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	855,00	1005,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	150,80	7,50			1,00		1.131,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	288,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	288,00	4,00			1,00		1.152,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	85,50	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	85,50	3,00			1,00		256,50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	41,50	141,50	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	100,00	4,00			1,00		400,00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	5	CÓDIGO DEL ITEM:	5.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	141,50	210,70	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	69,20	5,00			1,00		346,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	388,00	438,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	50,00	8,00			1,00		400,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	438,00	559,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	121,00	10,80			1,00		1.306,80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1444,00	1467,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	23,00	6,70			1,00		154,10	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1502,00	1610,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	108,00	3,60			1,00		388,80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1641,00	1697,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	56,00	4,30			1,00		240,80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1697,00	1782,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	85,00	7,00			1,00		595,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1831,00	1847,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	16,50	6,30			1,00		103,95	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	117,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	117,50	3,40			1,00		399,50	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 111	167,00	195,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	28,50	3,50			1,00		99,75	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 112	228,00	245,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	17,50	3,70			1,00		64,75	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 113	250,50	256,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	6,00	4,20			1,00		25,20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 114	273,00	276,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	3,80	2,00			1,00		7,60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 115	289,80	297,30	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	7,50	4,00			1,00		30,00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 116	323,80	343,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	19,20	4,00			1,00		76,80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 117	369,30	376,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	7,50	3,40			1,00		25,50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	369,30	391,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	22,50	3,50			1,00		78,75	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	448,80	587,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	139,00	3,40			1,00		472,60	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	564,80	586,30	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	21,50	3,30			1,00		70,95	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	455,20	482,60	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	27,40	6,00			1,00		164,40	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	601,50	759,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	158,00	6,80			1,00		1.074,40	
												19.489,41

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V	
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	192.00	CARRIL CENTRO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	192.00	3.60			1.00		691.20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	176.00	CARRIL DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	176.00	3.00			1.00		528.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	176.00	192.00	CARRIL DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	16.00	3.00			1.00		48.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	192.00	293.50	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	101.50	6.60			1.00		669.90	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	294.30	317.10	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	22.80	5.20			1.00		118.56	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	317.90	336.10	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	18.20	5.80			1.00		105.56	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	336.90	359.90	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	23.00	5.80			1.00		133.40	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	361.00	440.00	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	79.00	5.70			1.00		450.30	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	464.60	473.00	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	8.40	5.70			1.00		47.88	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	82.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	82.50	3.80			1.00		313.50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	195.00	253.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	58.50	3.50			1.00		204.75	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	5	CÓDIGO DEL ITEM:	5.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	202.60	311.40	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	108.80	3.60			1.00		391.68	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	352.00	391.00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	39.00	4.10			1.00		159.90	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	907.00	940.00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	33.00	4.00			1.00		132.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1124.00	1183.00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	59.00	5.00			1.00		295.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	907.00	940.00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	33.00	4.00			1.00		132.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	907.00	940.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	33.00	3.80			1.00		125.40	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1034.00	1047.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	13.00	3.50			1.00		45.50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1061.00	1072.60	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	11.60	3.50			1.00		40.60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1183.00	1196.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	13.00	5.00			1.00		65.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1279.00	1423.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	144.00	4.00			1.00		576.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1279.00	1337.50	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	58.50	7.00			1.00		409.50	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	5	CÓDIGO DEL ITEM:	5.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1337.50	1357.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	19.50	4.00			1.00		78.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1357.00	1377.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	20.00	7.10			1.00		142.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1377.00	1423.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	46.00	4.20			1.00		193.20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1423.00	1479.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	56.00	4.20			1.00		235.20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1423.00	1481.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	58.00	3.00			1.00		174.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1423.00	1458.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	35.00	4.00			1.00		140.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1534.00	1578.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	44.00	4.00			1.00		176.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1692.00	1782.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	90.00	3.70			1.00		333.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1723.00	1738.80	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	15.80	3.80			1.00		60.04	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1862.00	1987.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	125.00	4.00			1.00		500.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1458.00	1479.00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	21.00	4.00			1.00		84.00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1987.00	2027.00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	40.00	4.00			1.00		160.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	173.00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	173.00	3.80			1.00		657.40	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	173.00	375.00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	202.00	3.80			1.00		767.60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	263.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	263.50	4.00			1.00		1054.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	22.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	22.00	3.50			1.00		77.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	52.00	62.80	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	10.80	3.50			1.00		37.80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	72.60	79.80	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	7.20	3.50			1.00		25.20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	112.60	122.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	9.40	3.40			1.00		31.96	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	173.00	185.70	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	12.70	3.00			1.00		38.10	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	423.40	443.80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	20.40	4.00			1.00		81.60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	550.50	591.20	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	40.70	3.80			1.00		154.66	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	5	CÓDIGO DEL ITEM:	5.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	263.50	375.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	111.50	4.00			1.00		446.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 111	423.40	443.80	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	20.40	6.30			1.00		128.52	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 112	584.60	616.00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	31.40	3.70			1.00		116.18	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 113	686.00	734.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	48.00	4.20			1.00		201.60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 114	734.00	809.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	75.00	5.20			1.00		390.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 115	686.00	734.00	CARRIL IZQUIERDO(NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	48.00	4.20			1.00		201.60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 116	734.00	809.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	75.00	5.20			1.00		390.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 117	855.00	940.50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 - SEMAFORO DE LA PAZ)	85.50	3.70			1.00		316.35	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	550.50	616.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	65.50	4.10			1.00		268.55	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	591.20	616.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	24.80	3.30			1.00		81.84	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	637.50	646.90	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	9.40	3.80			1.00		35.72	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	855.00	1005.80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	150.80	4.10			1.00		618.28	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	940.50	968.40	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	27.90	3.60			1.00		100.44	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	968.40	1005.80	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	37.40	3.60			1.00		134.64	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	2933.20	2940.20	RENIVELACION DE RETORNO 3	7.00	8.00			1.00		56.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	3060.55	3063.95	RENIVELACION DE RETORNO 4	3.40	1.35			1.00		4.59	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	90.30	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	90.30	4.30			1.00		388.29	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	85.50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	85.50	3.00			1.00		256.50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	90.30	210.70	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	120.40	4.80			1.00		577.92	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	230.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	230.00	4.00			1.00		920.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	230.00	288.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	58.00	4.00			1.00		232.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	388.00	559.00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	171.00	4.00			1.00		684.00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	388.00	521.50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	133.50	4.00			1.00		534.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	438.00	559.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	121.00	4.00			1.00		484.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	521.50	559.00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	37.50	4.00			1.00		150.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1444.00	1467.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	23.00	6.70			1.00		154.10	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1502.00	1547.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	45.00	3.60			1.00		162.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1547.00	1610.00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	63.00	3.60			1.00		226.80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1641.00	1697.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	56.00	4.30			1.00		240.80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1697.00	1782.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	85.00	7.00			1.00		595.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1831.00	1847.50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	16.50	6.30			1.00		103.95	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	117.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	117.50	3.40			1.00		399.50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	167.00	188.20	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	21.20	3.50			1.00		74.20	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5		OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V	
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H	



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	188.20	195.50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	7.30	3.50			1.00		25.55	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	228.00	245.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	17.50	3.70			1.00		64.75	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	250.50	256.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	6.00	4.20			1.00		25.20	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	273.00	276.80	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	3.80	2.00			1.00		7.60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	289.80	297.30	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	7.50	4.00			1.00		30.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	323.80	343.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	19.20	4.00			1.00		76.80	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	369.30	376.80	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	7.50	3.40			1.00		25.50	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	369.30	391.80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	22.50	3.50			1.00		78.75	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	448.80	587.80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	139.00	3.40			1.00		472.60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	564.80	586.30	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	21.50	3.30			1.00		70.95	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	601.50	733.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	132.00	3.50			1.00		462.00	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	601.50	669.50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	68.00	3.50			1.00		238.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	733.50	759.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	26.00	3.60			1.00		93.60	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	669.50	759.50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	90.00	3.50			1.00		315.00	
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	455.20	482.60	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	27.40	6.00			1.00		164.40	
												22.708,46

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 8 0 1 0 0 0 1 8 - 1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	NP	CÓDIGO DEL ITEM:	NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	192,00	CARRIL CENTRO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE SUR)	192,00	3,60	0,06		1,00			41,47
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	176,00	CARRIL DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	176,00	3,00	0,06		1,00			31,68
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	176,00	192,00	CARRIL DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	16,00	3,00	0,06		1,00			2,88
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	192,00	293,50	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	101,50	6,60	0,05		1,00			33,50
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	294,30	317,10	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	22,80	5,20	0,06		1,00			7,11
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	317,90	336,10	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	18,20	5,80	0,05		1,00			5,28
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	336,90	359,90	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	23,00	5,80	0,06		1,00			8,00
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	361,00	440,00	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	79,00	5,70	0,06		1,00			27,02
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	464,60	473,00	CARRIL CENTRO Y DERECHO (PUENTE DE LA 38 CIRCUNVALAR)(NORTE-SUR)	8,40	5,70	0,06		1,00			2,87

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	NP	CÓDIGO DEL ITEM:	NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	82,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	82,50	3,80	0,06		1,00			18,81
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	195,00	253,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	58,50	3,50	0,06		1,00			12,29
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	202,60	311,40	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	108,80	3,60	0,05		1,00			19,58
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	352,00	391,00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	39,00	4,10	0,06		1,00			9,59
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	907,00	940,00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	33,00	4,00	0,06		1,00			7,92
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1124,00	1183,00	CARRIL DERECHA (NORTE-SUR)(ENTRE EL PUEBLITO Y CARIBE VERDE)	59,00	5,00	0,06		1,00			17,70
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	907,00	940,00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	33,00	4,00	0,06		1,00			7,92
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	907,00	940,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	33,00	3,80	0,06		1,00			7,52
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1034,00	1047,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	13,00	3,50	0,06		1,00			2,73

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	NP	CÓDIGO DEL ITEM:	NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1061,00	1072,60	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	11,60	3,50	0,06		1,00			2,44
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1183,00	1196,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	13,00	5,00	0,06		1,00			3,90
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1279,00	1423,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CARIBE VERDE Y EL GUANABANAZO)	144,00	4,00	0,06		1,00			34,56
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1279,00	1337,50	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	58,50	7,00	0,06		1,00			24,57
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1337,50	1357,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	19,50	4,00	0,06		1,00			4,68
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1357,00	1377,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	20,00	7,10	0,06		1,00			8,52
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1377,00	1423,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	46,00	4,20	0,06		1,00			11,59
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1423,00	1479,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	56,00	4,20	0,06		1,00			14,11
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1423,00	1481,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	58,00	3,00	0,06		1,00			10,44

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	NP	CÓDIGO DEL ITEM:	NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1423,00	1458,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SORBETE DE GUANABANA Y PARQUE INDUSTRIAL)	35,00	4,00	0,06		1,00			8,40
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1534,00	1578,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	44,00	4,00	0,06		1,00			10,56
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1692,00	1782,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	90,00	3,70	0,06		1,00			19,98
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1723,00	1738,80	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	15,80	3,80	0,06		1,00			3,60
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1862,00	1987,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	125,00	4,00	0,06		1,00			30,00
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1458,00	1479,00	CARRIL UNICO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	21,00	4,00	0,06		1,00			5,04
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1987,00	2027,00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE EL PARQUE INDUSTRIAL - PARQUE INTERNACIONAL DEL CARIBE)	40,00	4,00	0,06		1,00			9,60
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	173,00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	173,00	3,80	0,06		1,00			39,44
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	173,00	375,00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	202,00	3,80	0,06		1,00			46,06

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	NP	CÓDIGO DEL ITEM:	NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	263,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	263,50	4,00	0,06		1,00			63,24
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	22,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	22,00	3,50	0,06		1,00			4,62
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	52,00	62,80	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	10,80	3,50	0,06		1,00			2,27
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	72,60	79,80	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	7,20	3,50	0,06		1,00			1,51
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	112,60	122,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	9,40	3,40	0,06		1,00			1,92
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	173,00	185,70	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	12,70	3,00	0,06		1,00			2,29
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	423,40	443,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	20,40	4,00	0,06		1,00			4,90
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	550,50	591,20	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	40,70	3,80	0,06		1,00			9,28
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	263,50	375,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	111,50	4,00	0,06		1,00			26,76

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	NP	CÓDIGO DEL ITEM:	NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 111	423,40	443,80	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	20,40	6,30	0,085		1,00			10,92
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 112	584,60	616,00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	31,40	3,70	0,064		1,00			7,44
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 113	686,00	734,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	48,00	4,20	0,06		1,00			12,10
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 114	734,00	809,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	75,00	5,20	0,06		1,00			23,40
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 115	686,00	734,00	CARRIL IZQUIERDO(NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	48,00	4,20	0,06		1,00			12,10
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 116	734,00	809,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	75,00	5,20	0,06		1,00			23,40
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 117	855,00	940,50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA 27 SEMAFORO DE LA PAZ)	85,50	3,70	0,06		1,00			18,98
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	550,50	616,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	65,50	4,10	0,06		1,00			16,11
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	591,20	616,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	24,80	3,30	0,06		1,00			4,91

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	NP	CÓDIGO DEL ITEM:	NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	637,50	646,90	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	9,40	3,80	0,06		1,00			2,14
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	855,00	1005,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	150,80	4,10	0,06		1,00			37,10
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	940,50	968,40	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	27,90	3,60	0,06		1,00			6,03
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	968,40	1005,80	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE EL SEMAFORO DE LA PAZ - PUENTE PEATONAL EL PUEBLITO)	37,40	3,60	0,065		1,00			8,75
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	2933,20	2940,20	RENIVELACION DE RETORNO 3	7,00	8,00	0,04		1,00			2,24
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	3060,55	3063,95	RENIVELACION DE RETORNO 4	3,40	1,35	0,01		1,00			0,05
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	90,30	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	90,30	4,30	0,065		1,00			25,24
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	85,50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	85,50	3,00	0,06		1,00			15,39
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	90,30	210,70	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	120,40	4,80	0,06		1,00			34,68

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	NP	CÓDIGO DEL ITEM:	NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0,00	230,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	230,00	4,00	0,06		1,00			55,20
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	230,00	288,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	58,00	4,00	0,06		1,00			13,92
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	388,00	559,00	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	171,00	4,00	0,06		1,00			41,04
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	388,00	521,50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	133,50	4,00	0,06		1,00			32,04
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	438,00	559,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	121,00	4,00	0,06		1,00			29,04
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	521,50	559,00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE PUENTE DE LA CORDIALIDAD - PUENTE PEATONAL VILLA SANCARLOS)	37,50	4,00	0,06		1,00			9,00
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1444,00	1467,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	23,00	6,70	0,06		1,00			9,25
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1502,00	1547,00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	45,00	3,60	0,06		1,00			9,72
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1547,00	1610,00	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	63,00	3,60	0,06		1,00			13,61

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: NP	CÓDIGO DEL ITEM: NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1641.00	1697.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	56.00	4,30	0,06		1,00			14,45
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1697.00	1782.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	85.00	7,00	0,06		1,00			35,70
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	1831.00	1847.50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(FRENTE A PUERTA DORADA)	16.50	6,30	0,06		1,00			6,24
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	0.00	117.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	117.50	3,40	0,05		1,00			19,98
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	167.00	188.20	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	21.20	3,50	0,06		1,00			4,45
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	188.20	195.50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	7,30	3,50	0,06		1,00			1,53
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	228.00	245.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	17,50	3,70	0,06		1,00			3,89
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	250.50	256.50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	6.00	4,20	0,06		1,00			1,51
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	273.00	276.80	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	3,80	2,00	0,06		1,00			0,46
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	289.80	297.30	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	7,50	4,00	0,06		1,00			1,80

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	CIRCUNVALAR		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: NP	CÓDIGO DEL ITEM: NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	323.80	343.00	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	19.20	4,00	0,06		1,00			4,61
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	369,30	376,80	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	7,50	3,40	0,06		1,00			1,53
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	369,30	391,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	22,50	3,50	0,06		1,00			4,96
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	448,80	587,80	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	139,00	3,40	0,06		1,00			28,36
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	564,80	586,30	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	21,50	3,30	0,06		1,00			4,26
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	601,50	733,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	132,00	3,50	0,06		1,00			27,72
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	601,50	669,50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	68,00	3,50	0,06		1,00			14,28
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	733,50	759,50	CARRIL IZQUIERDO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	26,00	3,60	0,07		1,00			6,55
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	669,50	759,50	CARRIL CENTRO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	90,00	3,50	0,07		1,00			22,05
0	AVENIDA CIRCUNVALAR 110	455,20	482,60	CARRIL DERECHO (NORTE-SUR)(ENTRE CEMENTERIO JARDINES DE LA ETERNIDAD - PUENTE DE 7 DE ABRIL)	27,40	6,00	0,07		1,00			11,51
												1.357,79

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

SANTODOMINGO
MÓDULO V

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54	CALLE 90 Cra 6	Km 00+000,00	Km 00+018,75	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,75	7,60			1,00		142,50	
54	CALLE 90 Cra 6	Km 00+031,00	Km 00+049,50	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,50	7,80			1,00		144,30	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes calle 90 entre carreras 5 y 6	18,20	0,78			1,00		14,20	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	13,00	0,80			1,00		10,34	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera derecha calle 90 entre carreras 5 y 6	6,65	0,63			1,00		4,16	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	7,40	0,61			1,00		4,51	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	4,05	0,65			1,00		2,63	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319,00	Km 00+347,00	carril derecho	28,00	3,65			1,00		102,20	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319,00	Km 00+342,70	carril izquierdo	23,70	3,65			1,00		86,51	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+347,00	Km 00+351,35	carril derecho	4,35	3,25			1,00		14,14	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+351,35	Km 00+359,50	carril derecho	8,15	3,54			1,00		28,85	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+352,16	Km 00+359,50	carril izquierdo	7,34	3,74			1,00		27,45	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+336,70	Km 00+347,00	bocacalle derecha	10,30	1,40			1,00		14,42	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+335,80	Km 00+347,00	bocacalle izquierda	11,20	1,40			1,00		15,68	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V		
BARRIO:	SANTODOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54	CALLE 90 Cra 4B			anden acera izquierda	13.20	0.75			1.00		9.90	
54	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+731.35	Km 00+745.35	CALZADA COMPLETA	14.00	7.06			1.00		98.77	
54	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788.40	Km 00+802.00	CARRIL DERECHO	13.95	3.53			1.00		49.24	
54	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788.40	Km 00+797.67	CARRIL IZQUIERDO	9.27	3.55			1.00		32.91	
55	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+930.00	Km 00+931.75	CARRIL DERECHO	1.75	3.80			1.00		6.64	
55	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+931.75	Km 00+939.00	CARRIL DERECHO	7.25	4.30			1.00		31.18	
55	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+250.40	Km 01+261.05	CALZADA COMPLETA	10.65	7.40			1.00		78.81	
55	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+267.60	Km 01+274.11	CALZADA COMPLETA	6.51	7.46			1.00		48.56	
55	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+577.58	Km 01+587.83	CARRIL DERECHO	10.25	3.54			1.00		36.29	
55	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+582.38	Km 01+587.83	CARRIL IZQUIERDO	5.45	3.50			1.00		19.08	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+645.00	Km 01+654.32		9.32	7.10			1.00		66.17	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+654.32	Km 01+657.72		3.40	8.62			1.00		29.31	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+657.72	Km 01+671.27		13.55	7.22			1.00		97.83	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+671.27	Km 01+679.74		8.47	4.06			1.00		34.39	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 1	CÓDIGO DEL ITEM: 1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+679,74	Km 01+683,99		4,25	6,95			1,00		29,54	
54	CALLE 90 Cra 6	Km 00+049,50	Km 00+319,00		269,50	6,90			1,00		1859,55	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+359,60	Km 00+497,00		137,40	6,90			1,00		948,06	
54	CALLE 90 Cra 3B	Km 00+527,00	Km 00+570,30		43,30	6,90			1,00		298,77	
54	CALLE 90 Cra 3B	Km 00+595,20	Km 00+633,80		38,60	6,90			1,00		266,34	
54	CALLE 90 Cra 2D	Km 00+652,00	Km 00+731,35		79,35	6,90			1,00		547,52	
54	CALLE 90 Cra 2C	Km 00+788,40	Km 00+937,00		148,60	6,90			1,00		1025,34	
55	Carrera 2 Calle 88	Km 00+938,00	Km 01+250,40	Puente	312,40	7,05			1,00		2202,42	
55	Carrera 2 Calle 80	Km 01+274,00	Km 01+424,00	Interseccion	150,00	7,05			1,00		1057,50	
55	Carrera 2 Calle 78	Km 01+464,60	Km 01+545,50	colegio	80,90	7,05			1,00		570,35	
55	Carrera 2 Calle 62	Km 01+577,58	Km 01+645,13	Ara	67,55	7,05			1,00		476,23	
												10.532,59

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+000,00	Km 00+018,75	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,75	7,60			1,00		142,50	
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+031,00	Km 00+049,50	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,50	7,80			1,00		144,30	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319,00	Km 00+347,00	carril derecho	28,00	3,65			1,00		102,20	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319,00	Km 00+342,70	carril izquierdo	23,70	3,65			1,00		86,51	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+347,00	Km 00+351,35	carril derecho	4,35	3,25			1,00		14,14	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+351,35	Km 00+359,50	carril derecho	8,15	3,54			1,00		28,85	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+352,16	Km 00+359,50	carril izquierdo	7,34	3,74			1,00		27,45	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+336,70	Km 00+347,00	bocacalle derecha	10,30	1,40			1,00		14,42	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+335,80	Km 00+347,00	bocacalle izquierda	11,20	1,40			1,00		15,68	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+731,35	Km 00+745,35	CALZADA COMPLETA	14,00	7,06			1,00		98,77	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788,40	Km 00+802,00	CARRIL DERECHO	13,95	3,53			1,00		49,24	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788,40	Km 00+797,67	CARRIL IZQUIERDO	9,27	3,55			1,00		32,91	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+930.00	Km 00+931.75	CARRIL DERECHO	1.75	3.80			1.00		6.64	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+931.75	Km 00+939.00	CARRIL DERECHO	7.25	4.30			1.00		31.18	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+250.40	Km 01+261.05	CALZADA COMPLETA	10.65	7.40			1.00		78.81	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+267.60	Km 01+274.11	CALZADA COMPLETA	6.51	7.46			1.00		48.56	
55	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+577.58	Km 01+587.83	CARRIL DERECHO	10.25	3.54			1.00		36.29	
55	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+582.38	Km 01+587.83	CARRIL IZQUIERDO	5.45	3.50			1.00		19.08	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+645.00	Km 01+654.32		9.32	7.10			1.00		66.17	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+654.32	Km 01+657.72		3.40	8.62			1.00		29.31	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+657.72	Km 01+671.27		13.55	7.22			1.00		97.83	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+671.27	Km 01+679.74		8.47	4.06			1.00		34.39	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+679.74	Km 01+683.99		4.25	6.95			1.00		29.54	
												1,234.77

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 2	CÓDIGO DEL ITEM: 2,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54	CALLE 90 Cra 6			andenes calle 90 entre carreras 5 y 6	18,20	0,78			1,00		14,20	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	13,00	0,80			1,00		10,34	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera derecha calle 90 entre carreras 5 y 6	6,65	0,63			1,00		4,16	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	7,40	0,61			1,00		4,51	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	4,05	0,65			1,00		2,63	
54	CALLE 90 Cra 4B			anden acera izquierda	13,20	0,75			1,00		9,90	
												45,74

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 2	CÓDIGO DEL ITEM: 2,3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
54	CALLE 90 Cra 6			andenes calle 90 entre carreras 5 y 6	18,20				1,00	18,20		
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	13,00				1,00	13,00		
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera derecha calle 90 entre carreras 5 y 6	6,65				1,00	6,65		
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	7,40				1,00	7,40		
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	4,05				1,00	4,05		
54,00	CALLE 90 Cra 4B			anden acera izquierda	13,20				1,00	13,20		
54,00	CALLE 90 Cra 5D			CARRIL IZQ	6,55				1,00	6,55		
												69,05

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-7	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+000,00	Km 00+018,75	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,75	7,60	0,55		1,00			78,38
54,00	CALLE 90 Cra 6			FALLO EN ESTRUCTURA DE VIA	8,00	1,20	0,40		1,00			3,84
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+031,00	Km 00+049,50	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,50	7,80	0,55		1,00			79,37
54,00	CALLE 90 Cra 4B	319,00	347,00	carril derecho	28,00	3,65	0,15		1,00			15,33
54,00	CALLE 90 Cra 4B	319,00	342,70	carril izquierdo	23,70	3,65	0,15		1,00			12,98
54,00	CALLE 90 Cra 4B	347,00	351,35	carril derecho	4,35	3,25	0,15		1,00			2,12
54,00	CALLE 90 Cra 4B	351,35	359,50	carril derecho	8,15	3,54	0,15		1,00			4,33
54,00	CALLE 90 Cra 4B	352,16	359,50	carril izquierdo	7,34	3,74	0,15		1,00			4,12
54,00	CALLE 90 Cra 4B	336,70	347,00	bocacalle derecha	10,30	1,40	0,15		1,00			2,16
54,00	CALLE 90 Cra 4B	335,80	347,00	bocacalle izquierda	11,20	1,40	0,15		1,00			2,35
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	731,35	745,35	CALZADA COMPLETA	14,00	7,06	0,35		1,00			34,57
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	788,40	802,00	CARRIL DERECHO	13,95	3,53	0,35		1,00			17,24
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	788,40	797,67	CARRIL IZQUIERDO	9,27	3,55	0,35		1,00			11,52

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 90	930,00	931,75	CARRIL DERECHO	1,75	3,80	0,35		1,00			2,32
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 90	931,75	939,00	CARRIL DERECHO	7,25	4,30	0,35		1,00			10,91
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 80	1250,40	1261,05	CALZADA COMPLETA	10,65	7,40	0,15		1,00			11,82
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 80	1267,60	1274,11	CALZADA COMPLETA	6,51	7,46	0,15		1,00			7,28
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 72	1577,58	1587,83	CARRIL DERECHO	10,25	3,54	0,15		1,00			5,44
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 72	1582,38	1587,83	CARRIL IZQUIERDO	5,45	3,50	0,15		1,00			2,86
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	1645,00	1654,32	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	9,32	7,10	0,62		1,00			41,03
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	1654,32	1657,72	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	3,40	8,62	0,62		1,00			18,17
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	1657,72	1671,27	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	13,55	7,22	0,65		1,00			63,59
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	1671,27	1679,74	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	8,47	4,06	0,62		1,00			21,32
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	1679,74	1683,99	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	4,25	6,95	0,62		1,00			18,31
												471,36

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54.00	CALLE 90 Cra 6			andenes calle 90 entre carreras 5 y 6	18.20	0.78	0.10		1.00			1.42
54.00	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	13.00	0.80	0.10		1.00			1.03
54.00	CALLE 90 Cra 6			andenes acera derecha calle 90 entre carreras 5 y 6	6.65	0.63	0.10		1.00			0.42
54.00	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	7.40	0.61	0.10		1.00			0.45
54.00	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	4.05	0.65	0.10		1.00			0.26
54.00	CALLE 90 Cra 48			anden acera izquierda	13.20	0.75	0.10		1.00			0.99
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+645.00	Km 01+654.32	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	9.32	7.10	0.27		1.00			17.87
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+654.32	Km 01+657.72	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	3.40	8.62	0.27		1.00			7.91
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+671.27	Km 01+679.74	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	8.47	4.06	0.27		1.00			9.28
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+679.74	Km 01+683.99	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	4.25	6.95	0.27		1.00			7.98
												47.61

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:
GARP
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,8	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 Cra 6			FALLO EN ESTRUCTURA DE VIA	8,00	1,20	0,40		1,00			3,84
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+657,72	Km 01+671,27	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	13,55	7,22	0,30		1,00			29,35
												33,19

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS





LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+000,00	Km 00+018,75	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,75	7,60			1,00		142,50	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+731,35	Km 00+745,35	CALZADA COMPLETA	14,00	7,06			1,00		98,77	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788,40	Km 00+802,00	CARRIL DERECHO	13,95	3,53			1,00		49,24	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788,40	Km 00+797,67	CARRIL IZQUIERDO	9,27	3,55			1,00		32,91	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+930,00	Km 00+931,75	CARRIL DERECHO	1,75	3,80			1,00		6,64	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+931,75	Km 00+939,00	CARRIL DERECHO	7,25	4,30			1,00		31,18	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+645,00	Km 01+654,32		9,32	7,10			1,00		66,17	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+654,32	Km 01+657,72		3,40	8,62			1,00		29,31	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+657,72	Km 01+671,27		13,55	7,22			1,00		97,83	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+671,27	Km 01+679,74		8,47	4,06			1,00		34,39	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+679,74	Km 01+683,99		4,25	6,95			1,00		29,54	
												618,48

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO 1600 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+000.00	Km 00+018.75	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,75	7,60			1,00		142,50	
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+031.00	Km 00+049.50	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,50	7,80			1,00		144,30	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+347.00	Km 00+351.35	carril derecho	4,35	3,25			1,00		14,14	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+351.35	Km 00+359.50	carril derecho	8,15	3,54			1,00		28,85	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+352.16	Km 00+359.50	carril izquierdo	7,34	3,74			1,00		27,45	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+731.35	Km 00+745.35	CALZADA COMPLETA	14,00	7,06			1,00		98,77	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788.40	Km 00+802.00	CARRIL DERECHO	13,95	3,53			1,00		49,24	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788.40	Km 00+797.67	CARRIL IZQUIERDO	9,27	3,55			1,00		32,91	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+930.00	Km 00+931.75	CARRIL DERECHO	1,75	3,80			1,00		6,64	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+931.75	Km 00+939.00	CARRIL DERECHO	7,25	4,30			1,00		31,18	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,15





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+250.40	Km 01+261.05	CALZADA COMPLETA	10.65	7.40			1.00		78.81	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+267.60	Km 01+274.11	CALZADA COMPLETA	6.51	7.46			1.00		48.56	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+577.58	Km 01+587.83	CARRIL DERECHO	10.25	3.54			1.00		36.29	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+582.38	Km 01+587.83	CARRIL IZQUIERDO	5.45	3.50			1.00		19.08	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+645.00	Km 01+654.32	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	9.32	7.10			1.00		66.17	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+654.32	Km 01+657.72	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	3.40	8.62			1.00		29.31	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+657.72	Km 01+671.27	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	13.55	7.22			1.00		97.83	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+671.27	Km 01+679.74	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	8.47	4.06			1.00		34.39	
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+679.74	Km 01+683.99	ESTRUCTURA DE VIA PRESENTA FALLOS	4.25	6.95			1.00		29.54	
												1.015,96

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO 1500 PSI PREMEZCLADO PARA BASE DE PAVIMENTO E=0,10



LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319,00	Km 00+347,00	carril derecho	28,00	3,65			2,00		204,40	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319,00	Km 00+342,70	carril izquierdo	23,70	3,65			2,00		173,01	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+336,70	Km 00+347,00	bocacalle derecha	10,30	1,40			2,00		28,84	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+335,80	Km 00+347,00	bocacalle izquierda	11,20	1,40			2,00		31,36	
												437,61

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:


GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO

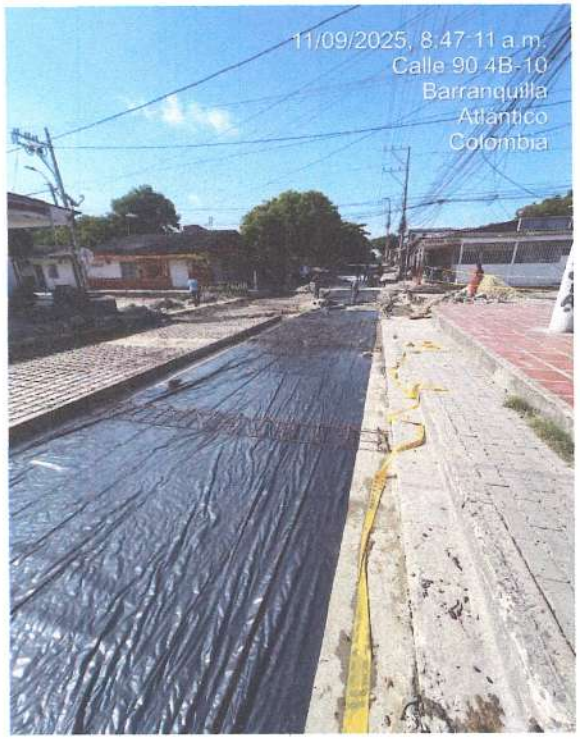

LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+000,00	Km 00+018,75	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,75	7,60			1,00		142,50	
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+031,00	Km 00+049,50	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,50	7,80			1,00		144,30	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319,00	Km 00+347,00	carril derecho	28,00	3,65			1,00		102,20	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319,00	Km 00+342,70	carril izquierdo	23,70	3,65			1,00		86,51	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+347,00	Km 00+351,35	carril derecho	4,35	3,25			1,00		14,14	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+351,35	Km 00+359,50	carril derecho	8,15	3,54			1,00		28,85	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+352,16	Km 00+359,50	carril izquierdo	7,34	3,74			1,00		27,45	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+336,70	Km 00+347,00	bocacalle derecha	10,30	1,40			1,00		14,42	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+335,80	Km 00+347,00	bocacalle izquierda	11,20	1,40			1,00		15,68	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+731,35	Km 00+745,35	CALZADA COMPLETA	14,00	7,06			1,00		98,77	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788,40	Km 00+802,00	CARRIL DERECHO	13,95	3,53			1,00		49,24	
54,00	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788,40	Km 00+797,67	CARRIL IZQUIERDO	9,27	3,55			1,00		32,91	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+930,00	Km 00+931,75	CARRIL DERECHO	1,75	3,80			1,00		6,64	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+931,75	Km 00+939,00	CARRIL DERECHO	7,25	4,30			1,00		31,18	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+250,40	Km 01+261,05	CALZADA COMPLETA	10,65	7,40			1,00		78,81	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+267,60	Km 01+274,11	CALZADA COMPLETA	6,51	7,46			1,00		48,56	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+577,58	Km 01+587,83	CARRIL DERECHO	10,25	3,54			1,00		36,29	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+582,38	Km 01+587,83	CARRIL IZQUIERDO	5,45	3,50			1,00		19,08	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+645,00	Km 01+654,32		9,32	7,10			1,00		66,17	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+654,32	Km 01+657,72		3,40	8,62			1,00		29,31	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+657,72	Km 01+671,27		13,55	7,22			1,00		97,83	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+671,27	Km 01+679,74		8,47	4,06			1,00		34,39	
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+679,74	Km 01+683,99		4,25	6,95			1,00		29,54	
												1.234,77

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 0 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.





LOCALIZACION					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
54	CALLE 90 Cra 6	Km 00+000,00	Km 00+018,75	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,75	7,60			1,00		142,50	
54	CALLE 90 Cra 6	Km 00+031,00	Km 00+049,50	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18,50	7,80			1,00		144,30	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319,00	Km 00+347,00	carril derecho	28,00	3,65			1,00		102,20	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319,00	Km 00+342,70	carril izquierdo	23,70	3,65			1,00		86,51	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+347,00	Km 00+351,35	carril derecho	4,35	3,25			1,00		14,14	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+351,35	Km 00+359,50	carril derecho	8,15	3,54			1,00		28,85	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+352,16	Km 00+359,50	carril izquierdo	7,34	3,74			1,00		27,45	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+336,70	Km 00+347,00	bocacalle derecha	10,30	1,40			1,00		14,42	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+335,80	Km 00+347,00	bocacalle izquierda	11,20	1,40			1,00		15,68	
54	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+731,35	Km 00+745,35	CALZADA COMPLETA	14,00	7,06			1,00		98,77	
54	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788,40	Km 00+802,00	CARRIL DERECHO	13,95	3,53			1,00		49,24	
54	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788,40	Km 00+797,67	CARRIL IZQUIERDO	9,27	3,55			1,00		32,91	
55	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+930,00	Km 00+931,75	CARRIL DERECHO	1,75	3,80			1,00		6,64	
55	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+931,75	Km 00+939,00	CARRIL DERECHO	7,25	4,30			1,00		31,18	
55	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+250,40	Km 01+261,05	CALZADA COMPLETA	10,65	7,40			1,00		78,81	
55	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+267,60	Km 01+274,11	CALZADA COMPLETA	6,51	7,46			1,00		48,56	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO MR= 45 A LA FLEXION ACELERADO A 3 DIAS , ESPESOR= 0.20 METROS, INCLUYE CANASTILLA ,PASADORES D = 1" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0.30 METROS Y 5/8" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1.20 METROS, JUNTAS DE SILICONA Y ANTISOL.



LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
55	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+577.58	Km 01+587.83	CARRIL DERECHO	10.25	3.54			1.00		36.29	
55	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+582.38	Km 01+587.83	CARRIL IZQUIERDO	5.45	3.50			1.00		19.08	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+645.00	Km 01+654.32		9.32	7.10			1.00		66.17	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+654.32	Km 01+657.72		3.40	8.62			1.00		29.31	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+657.72	Km 01+671.27		13.55	7.22			1.00		97.83	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+671.27	Km 01+679.74		8.47	4.06			1.00		34.39	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+679.74	Km 01+683.99		4.25	6.95			1.00		29.54	
												1.234,77

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2





LOCALIZACION.					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	KG	M3
54	CALLE 90 Cra 6	Km 00+000.00	Km 00+018.75	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18.75	7.60			8.00		1140.00	
54	CALLE 90 Cra 6	Km 00+031.00	Km 00+049.50	calzada completa, calle 90 entre carreras 5 y 6	18.50	7.80			8.00		1154.40	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319.00	Km 00+343.50	carril derecho	24.50	3.65			8.00		715.40	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+319.00	Km 00+339.20	carril izquierdo	20.20	3.65			8.00		589.84	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+347.00	Km 00+351.35	carril derecho	4.35	3.25			8.00		113.10	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+351.35	Km 00+359.50	carril derecho	8.15	3.54			8.00		230.81	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+352.16	Km 00+359.50	carril izquierdo	7.34	3.74			8.00		219.61	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+336.70	Km 00+347.00	bocacalle derecha	10.30	1.40			8.00		115.36	
54	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+335.80	Km 00+347.00	bocacalle izquierda	11.20	1.40			8.00		125.44	
54	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+731.35	Km 00+745.35	CALZADA COMPLETA	14.00	7.06			8.00		790.16	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	KG	M3
54	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788.40	Km 00+802.00	CARRIL DERECHO	13.95	3.53			8.00		393.95	
54	CALLE 90 CON CARRERA 2D	Km 00+788.40	Km 00+797.67	CARRIL IZQUIERDO	9.27	3.55			8.00		263.27	
55	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+930.00	Km 00+931.75	CARRIL DERECHO	1.75	3.80			16.00		106.26	
55	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+931.75	Km 00+939.00	CARRIL DERECHO	7.25	4.30			16.00		498.80	
55	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+250.40	Km 01+261.05	CALZADA COMPLETA	10.65	7.40			8.00		630.48	
55	CARRERA 2 CON CALLE 80	Km 01+267.60	Km 01+274.11	CALZADA COMPLETA	6.51	7.46			8.00		388.52	
55	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+577.58	Km 01+587.83	CARRIL DERECHO	10.25	3.54			8.00		290.28	
55	CARRERA 2 CON CALLE 72	Km 01+582.38	Km 01+587.83	CARRIL IZQUIERDO	5.45	3.50			8.00		152.60	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+645.00	Km 01+654.32		9.32	7.10			8.00		529.38	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+654.32	Km 01+657.72		3.40	8.62			8.00		234.46	

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 8 0 1 0 0 0 7 9 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2



LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	KG	M3
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+657.72	Km 01+671.27		13.55	7.22			8.00		782.65	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+671.27	Km 01+679.74		8.47	4.06			8.00		275.11	
55	CARRERA 2 CON CALLE 66	Km 01+679.74	Km 01+683.99		4.25	6.95			8.00		236.30	
												9.976,18

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-024-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REMOCIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO





LOCALIZACION					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+049,50	Km 00+319,00		269,50	6,90			1,00		1859,55	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+359,60	Km 00+497,00		137,40	6,90			1,00		948,06	
54,00	CALLE 90 Cra 3B	Km 00+527,00	Km 00+570,30		43,30	6,90			1,00		298,77	
54,00	CALLE 90 Cra 3B	Km 00+595,20	Km 00+633,80		38,60	6,90			1,00		266,34	
54,00	CALLE 90 Cra 2D	Km 00+652,00	Km 00+731,35		79,35	6,90			1,00		547,52	
54,00	CALLE 90 Cra 2C	Km 00+788,40	Km 00+937,00		148,60	6,90			1,00		1025,34	
55,00	Carrera 2 Calle 88	Km 00+938,00	Km 01+250,40	Puente	312,40	7,05			1,00		2202,42	
55,00	Carrera 2 Calle 80	Km 01+274,00	Km 01+424,00	Interseccion	150,00	7,05			1,00		1057,50	
55,00	Carrera 2 Calle 78	Km 01+464,60	Km 01+545,50	colegio	80,90	7,05			1,00		570,35	
55,00	Carrera 2 Calle 62	Km 01+577,58	Km 01+645,13	Ara	67,55	7,05			1,00		476,23	
												9.252,08

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901020181

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 5	CÓDIGO DEL ITEM: 5.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL - 0 O CRL - 1H





LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+049,50	Km 00+319,00		269,50	6,90			1,00		1859,55	
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+359,60	Km 00+497,00		137,40	6,90			1,00		948,06	
54,00	CALLE 90 Cra 3B	Km 00+527,00	Km 00+570,30		43,30	6,90			1,00		298,77	
54,00	CALLE 90 Cra 3B	Km 00+595,20	Km 00+633,80		38,60	6,90			1,00		266,34	
54,00	CALLE 90 Cra 2D	Km 00+652,00	Km 00+731,35		79,35	6,90			1,00		547,52	
54,00	CALLE 90 Cra 2C	Km 00+788,40	Km 00+937,00		148,60	6,90			1,00		1025,34	
55,00	Carrera 2 Calle 88	Km 00+938,00	Km 01+250,40	Puente	312,40	7,05			1,00		2202,42	
55,00	Carrera 2 Calle 80	Km 01+274,00	Km 01+424,00	interseccion	150,00	7,05			1,00		1057,50	
55,00	Carrera 2 Calle 78	Km 01+464,60	Km 01+545,50	colegio	80,90	7,05			1,00		570,35	
55,00	Carrera 2 Calle 62	Km 01+577,58	Km 01+645,13	Ara	67,55	7,05			1,00		476,23	
												9.252,08

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 6.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,20 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54	CALLE 90 Cra 5D	Km 00+033,45	Km 00+040,00	CARRIL IZQ	6,55				1,00	6,55		
												6,55

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 6	CÓDIGO DEL ITEM: 6.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	BORDILLO RECTO DE 30 X 15 cm PARA CONFINAMIENTO EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI



LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54	CALLE 90 Cra 6			andenes calle 90 entre carreras 5 y 6	18,20				1,00	18,20		
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	13,00				1,00	13,00		
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera derecha calle 90 entre carreras 5 y 6	6,65				1,00	6,65		
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	7,40				1,00	7,40		
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	4,05				1,00	4,05		
54	CALLE 90 Cra 48			anden acera izquierda	13,20				1,00	13,20		
												62,50

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 6.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.1 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)



LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54	CALLE 90 Cra 6			andenes calle 90 entre carreras 5 y 6	18,20	0,78			1,00		14,20	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	13,00	0,80			1,00		10,34	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera derecha calle 90 entre carreras 5 y 6	6,65	0,63			1,00		4,16	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	7,40	0,61			1,00		4,51	
54	CALLE 90 Cra 6			andenes acera izquierda calle 90 entre carreras 5 y 6	4,05	0,65			1,00		2,63	
54,00	CALLE 90 Cra 4B			anden acera izquierda	13,20	0,75			1,00		9,90	
												45,74

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. S. O. CONSTRUCCION DE FILTROS- GEOTEXTIL NT-1800-TRITURADO 0.40 X 0.60 M. TUBERIA DE 4" PVC, INCLUYE EXCAVACIÓN Y SELLADO EN ARENA GRUESA





LOCALIZACION					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
54.00	CALLE 90 Cra 4B			FILTRO POR NIVEL FREATICO /FILTRACIONES	3,90					3,90		
54.00	CALLE 90 Cra 4B			FILTRO POR NIVEL FREATICO /FILTRACIONES	6,20					6,20		
54.00	CALLE 90 Cra 4B			FILTRO POR NIVEL FREATICO /FILTRACIONES	5,50					5,50		
												15,60

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 0 1 0 2 0 1 8 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTODOMINGO				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.8	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
54.00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+040.00	Km 00+041.00	CENTRO CALZADA					1,00			1.00
54.00	CALLE 90 Cra48	Km 00+330.00	Km 00+331.00	CENTRO CALZADA					1.00			1.00
55.00	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+930.00	Km 00+931.75	CENTRO CALZADA					2.00			2.00
												4,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.23	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+040,00	Km 00+041,00	CENTRO CALZADA					1,00			1,00
54,00	CALLE 90 Cra4B	Km 00+330,00	Km 00+331,00	CENTRO CALZADA					1,00			1,00
55,00	CARRERA 2 CON CALLE 90	Km 00+930,00	Km 00+931,75	CENTRO CALZADA					2,00			2,00
												4,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	SANTO DOMINGO		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	NP	CÓDIGO DEL ITEM:	NP1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 19 ADITIVADO AL 1%





LOCALIZACION				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
54,00	CALLE 90 Cra 6	Km 00+049,50	Km 00+319,00		269,50	6,90	0,06		1,00			111,57
54,00	CALLE 90 Cra 4B	Km 00+359,60	Km 00+497,00		137,40	6,90	0,06		1,00			56,88
54,00	CALLE 90 Cra 3B	Km 00+527,00	Km 00+570,30		43,30	6,90	0,06		1,00			17,93
54,00	CALLE 90 Cra 3B	Km 00+595,20	Km 00+633,80		38,60	6,90	0,06		1,00			15,98
54,00	CALLE 90 Cra 2D	Km 00+652,00	Km 00+731,35		79,35	6,90	0,06		1,00			32,85
54,00	CALLE 90 Cra 2C	Km 00+788,40	Km 00+937,00		148,60	6,90	0,06		1,00			61,52
55,00	Carrera 2 Calle 88	Km 00+938,00	Km 01+250,40	Puente	312,40	7,05	0,06		1,00			132,15
55,00	Carrera 2 Calle 80	Km 01+274,00	Km 01+424,00	interseccion	150,00	7,05	0,06		1,00			63,45
55,00	Carrera 2 Calle 78	Km 01+464,60	Km 01+545,50	colegio	80,90	7,05	0,06		1,00			34,22
55,00	Carrera 2 Calle 62	Km 01+577,58	Km 01+645,13	Ara	67,55	7,05	0,06		1,00			28,57
												555,12

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

LAS PALMAS
MÓDULO V

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	1	CÓDIGO DEL ITEM:	1,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS







LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10.0	70.0	ENTRE CALLES 35A Y 36B	60.00	7.30			1.00		438.00	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	70.0	135.0	ENTRE CALLES 35A Y 36B	65.00	7.30			1.00		474.50	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10.0	135.0	BERMA ACERA DERECHA	125.00	0.95			1.00		118.75	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0.0	72.9	ENTRE CALLES 37C Y 36B	72.93	7.30			1.00		532.39	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0.0	72.9	BERMA ACERA DERECHA	72.93	0.95			1.00		69.28	
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)	0.00	100.00		100.00	5.90			1.00		590.00	
												2.222,92

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102017-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	2	CÓDIGO DEL ITEM:	2,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DEMOLICION DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL







LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10,00	70,00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	60,00	7,30			1,00		438,00	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	70,00	135,00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	65,00	7,30			1,00		474,50	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10,00	135,00	BERMA ACERA DERECHA	125,00	0,95			1,00		118,75	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0,00	72,93	ENTRE CALLES 37C Y 36B	72,93	7,30			1,00		532,39	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0,00	72,93	BERMA ACERA DERECHA	72,93	0,95			1,00		69,28	
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A	0,00	100,00		100,00	5,90			1,00		590,00	
												2.222,92

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
8	CARRERA 88 ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			TUBERIA 110 MM	100,00	0,40	0,80		1,00			32,00
												32,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,2	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10.00	70.00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	60.00	7.30	0.40		1.00			175.20
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	70.00	135.00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	65.00	7.30	0.40		1.00			189.80
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10.00	135.00	BERMA ACERA DERECHA	125.00	0.95	0.40		1.00			47.50
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0.00	72.93	ENTRE CALLES 37C Y 36B	72.93	7.30	0.40		1.00			212.96
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0.00	72.93	BERMA ACERA DERECHA	72.93	0.95	0.40		1.00			27.71
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			REEMPLAZO TUBERIA ALCANTARILLADO	92.00	0.60	1.20		1.00			66.24
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCIO	0.00	100.00	0.00	100.00	5.90	0.40		1.00			236.00
												955.41

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO (INCLUYE CORTE, TRASLADO, EXTENDIDA, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN





LOCALIZACIÓN					DIMENSIONES					TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	DESCRIPCIÓN	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	UND	CANT.	ML	M2	M3
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			TUBERIA 110 MM	100,00	0,40	0,50		1,00			20,00
												20,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			REEMPLAZO TUBERIA ALCANTARILLADO	92,00	0,60	0,90		1,00			49,68
												49,68

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10,00	70,00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	60,00	7,30	0,20		1,00			87,60
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	70,00	135,00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	65,00	7,30	0,20		1,00			94,90
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10,00	135,00	BERMA ACERA DERECHA	125,00	0,95	0,20		1,00			23,75
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0,00	72,93	ENTRE CALLES 37C Y 36B	72,93	7,30	0,20		1,00			106,48
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0,00	72,93	BERMA ACERA DERECHA	72,93	0,95	0,20		1,00			13,86
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)	0,00	100,00		100,00	5,90	0,20		1,00			118,00
												444,59

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	3	CÓDIGO DEL ITEM:	3,7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACION DE ARENA





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			INSTALACION TUBERIA 110	100	0,40	0,30		1,00			11,83
												11,83

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	TRUPILLOS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 3	CÓDIGO DEL ITEM: 3,8	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RELLENO COMPACTADO EN MATERIAL DE DEMOLICION DE PAVIMENTO PARA ESTABILIZACION



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0	5	FALLO	5	2,5	0,2		1			2,50
												2,50

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,1	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10.00	70.00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	60.00	7.30			1.00		438.00	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	70.00	135.00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	65.00	7.30			1.00		474.50	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10.00	135.00	BERMA ACERA DERECHA	125.00	0.95			1.00		118.75	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0.00	72.93	ENTRE CALLES 37C Y 36B	72.93	7.30			1.00		532.39	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0.00	72.93	BERMA ACERA DERECHA	72.93	0.95			1.00		69.28	
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)	0.00	100.00		100.00	5.90			1.00		590.00	
												2.222,92

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4,4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO NEGRO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10,00	70,00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	60,00	7,30			1,00		438,00	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	70,00	135,00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	65,00	7,30			1,00		474,50	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10,00	135,00	BERMA ACERA DERECHA	125,00	0,95			1,00		118,75	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0,00	72,93	ENTRE CALLES 37C Y 36B	72,93	7,30			1,00		532,39	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0,00	72,93	BERMA ACERA DERECHA	72,93	0,95			1,00		69,28	
												1.632,92

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 4	CÓDIGO DEL ITEM: 4,5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10,00	70,00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	60,00	7,30			1,00		438,00	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	70,00	135,00	ENTRE CALLES 35A Y 36B	65,00	7,30			1,00		474,50	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10,00	135,00	BERMA ACERA DERECHA	125,00	0,95			1,00		118,75	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0,00	72,93	ENTRE CALLES 37C Y 36B	72,93	7,30			1,00		532,39	
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0,00	72,93	BERMA ACERA DERECHA	72,93	0,95			1,00		69,28	
												1.632,92

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	4	CÓDIGO DEL ITEM:	4.13	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	B. P. O. ACERO DE REFUERZO DE 1/2" 60.000 PSI LEGITIMO PARA PLACAS DE PAVIMENTO IRREGULARES CUANTIA 8 KG/M2





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			KG	M2	M3
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	10.00	135.00	BERMA ACERA DERECHA	125.00	0.95			8.00	950.00		
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)	0.00	72.93	BERMA ACERA DERECHA	72.93	0.95			8.00	554.27		
6	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)			LOSA DE MAN HOLE	3.65	3.65			8.00	106.58		
												1.610,85

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 7	CÓDIGO DEL ITEM: 7.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
8	CARRERA 88 ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)							1,00	9,00			9,00
												9,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 8901099814	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.6	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. SUMINISTRO E INSTALACION Y/O REPARACION DE DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
6,00	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)			REPARACIONES DURANTE MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICONES					15,0			15,00
8,00	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			REPARACIONES DURANTE MOVIMIENTO DE TIERRA Y DEMOLICONES					10,00			10,00
												25,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT. 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	7	CÓDIGO DEL ITEM:	7.7	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)								9			9,00
												9,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.3	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRÁ No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
8	CARRERA 88 ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			INSTALACION DE TUBERIA 110	100				1,00	100,00		
												100,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.4	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)				2.00				18.00	36.00		
												36,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8 0 1 0 0 0 0 1 8 - 1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.5	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETA ELECTROFUSION 110 X200 MM



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
8	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)							18,0				18,00
												18,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:
GARP
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8901020188-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		

CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.9	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
8	CARRERA 88 ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)								9			9.00
												9.00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP


NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 8907012018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.11	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")

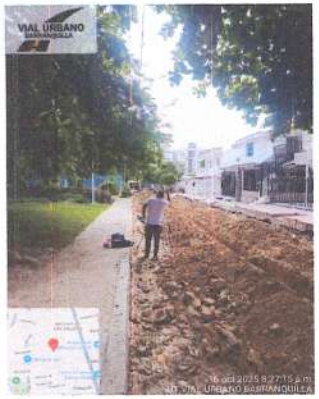



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
8,00	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			REEMPLAZO TUBERIA ALCANTARILLADO	92,00				1,00	92,00		
												92,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-7

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5	OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS		
FECHA DE CORTE:	6-nov		
CAPITULO: 11	CÓDIGO DEL ITEM: 11.14	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	M3
8,00	CARRERA 88 ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			REEMPLAZO TUBERIA ALCANTARILLADO	92,00	0,60	0,30		1,00			16,56
8,00	CARRERA 88 ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			DESCUENTO POR DAMETRO DE TUBERIA	92,00				-1,00		0,03	-2,89
												13,67

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT. 890102018-1	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 02	CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.15	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"





LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
8,00	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)	0,00	0,00	REEMPLAZO TUBERIA ALCANTARILLADO	92,00				1,00	92,00		
8,00	CARRERA 8B ENTRE CALLES 34 Y 34A (RECONSTRUCCION)			ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARIOLLADO	4,00				9,00	36,00		
												128,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	Vo.Bo. INTERVENTORIA:
NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ MP. 01102-0617	NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY MP. 151037-0589141

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890102018-1

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
ACTA No. 02

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-034

CONTRATO:	LP-026-2024 LOTE 5			OBJETO DEL CONTRATO:	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS, CANALES, BOXCOULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA IX, EN TODAS LAS LOCALIDADES Y CORREGIMIENTOS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA. MODULO V
BARRIO:	LAS PALMAS				
FECHA DE CORTE:	6-nov				
CAPITULO:	11	CÓDIGO DEL ITEM:	11.23	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	RENIVELACION Y RECONSTRUCCION DE MANHOLE EN LADRILLO H<1m e=20 cm .



LOCALIZACIÓN				DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES			UND	CANT.	TOTALES		
OBRA No.	DIRECCIÓN	ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN		LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			ML	M2	UND
6,00	CARRERA 6A ENTRE CALLES 35A Y 37C (RECONSTRUCCION)			LOSA DE MAN HOLE					1,00			1,00
												1,00

Vo. Bo. RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

NOMBRE: EDWIN LEONARDO NIETO MARTINEZ
MP. 01102-0617

Vo.Bo. INTERVENTORIA:

GARP

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO ROJAS PARODY
MP. 151037-0589141
