REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

PERIODO DEL INFORME

26 de noviembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026

OBRA PÚBLICA No. 351

22 DE AGOSTO DE 2025

LINO RODRÍGUEZ OCHOA

SUPERVISOR

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO

APOYO A LA SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

TAURAMENA, MARZO DE 2026

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

CONTRATO / CONVENIO No.	351 DE 22 DE AGOSTO DE 2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	MORA S.A.S.
R/LEGAL	NEVARDO HERNANDO MORA MELO; CC. 79.334.761 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA
APOYO SUPERVISIÓN	EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
VALOR FINAL	$56,023,820.60
FECHA INICIACIÓN	4 de septiembre de 2025
FECHA TERMINACIÓN	5 de febrero de 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	entre el 26 de noviembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026
% AVANCE FINANCIERO	99.88%
% AVANCE FISICO	100.00%
FECHA PRESENTE INFORME	12 de marzo de 2026

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto 029 del 2004, demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la CLAUSULA 10 del Convenio en mención; me permito certificar que se dio cumplimiento a cabalidad, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
Suministro e instalación de tubería y accesorios hidráulicos: Instalación de tubería PE 100 PN-16 de diferentes diámetros (50 mm, 75 mm y 90 mm), instalación de uniones mecánicas de polietileno, reposición de tramos deteriorados de la red, instalación de manguera de polietileno, collarines de derivación y accesorios complementarios para la conducción del agua.	• **Restablecimiento de la continuidad hidráulica:** La reposición e instalación de tubería y accesorios permitió recuperar tramos deteriorados de la red, eliminando fugas y garantizando la conducción eficiente del recurso hídrico.• **Mejoramiento de la hermeticidad del sistema:** La instalación de uniones mecánicas y accesorios especializados aseguró conexiones seguras entre tuberías nuevas y existentes, reduciendo pérdidas y mejorando la estabilidad del sistema de distribución.• **Optimización de la conducción del caudal:** La adecuación de los diferentes diámetros de tubería permitió mantener condiciones hidráulicas adecuadas para el transporte y distribución del agua dentro del sistema.
Instalación de elementos de control y operación del sistema: Cambio e instalación de válvulas de bola en PVC tipo pesado, instalación de válvula de ventosa de doble acción de 1/2", adecuación de derivaciones mediante collarines y ejecución de pruebas de funcionamiento para verificar la expulsión y admisión de aire en la red.	• **Regulación y control del flujo hidráulico:** La instalación y reposición de válvulas permite controlar el caudal, realizar cierres sectorizados y facilitar las labores de mantenimiento del sistema.• **Prevención de fallas hidráulicas:** La instalación de ventosas permite expulsar y admitir aire dentro de la tubería, evitando acumulaciones que puedan generar sobrepresiones o fenómenos de golpe de ariete.• **Mejora en la operación del sistema:** Los nuevos accesorios garantizan mayor confiabilidad operativa y facilitan la gestión del sistema de conducción.
Construcción y adecuación de infraestructura complementaria: Construcción de cajas de inspección en concreto de 50 x 50 cm, adecuación de la rejilla de bocatoma, ejecución de muertos o anclajes en concreto de 3000 PSI para pasos elevados y adecuación de puntos de inspección del sistema.	• **Fortalecimiento de la infraestructura hidráulica:** Las cajas de inspección permiten el acceso para actividades de revisión, mantenimiento y control del sistema.• **Protección de la captación de agua:** La adecuación de la rejilla de bocatoma mejora la retención de sólidos y optimiza el proceso de captación del recurso hídrico.• **Estabilidad estructural de la red:** Los anclajes en concreto garantizan la fijación adecuada de la tubería en pasos elevados o puntos críticos, reduciendo riesgos de desplazamiento o daño estructural.
Instalación de sistemas de soporte y estabilidad en pasos elevados: Instalación de guayas de acero trenzadas, amarres con alambre galvanizado No. 12, instalación de perros de anclaje y tensado de guayas para la suspensión segura de la tubería en tramos elevados.	• **Mayor seguridad estructural en pasos críticos:** El sistema de guayas y amarres permite soportar adecuadamente el peso de la tubería y las cargas hidráulicas.• **Reducción de riesgos de deformación o ruptura:** Los sistemas de anclaje garantizan estabilidad frente a vibraciones, cambios de presión o condiciones climáticas.• **Adecuada instalación en terrenos de difícil topografía:** Estas soluciones permiten el paso seguro de la red en zonas con pendientes o quebradas.

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
Transporte y logística para ejecución de obras: Transporte de materiales mediante camión tipo 350 y traslado adicional de tubería, accesorios y materiales a lomo de mula hacia frentes de trabajo ubicados en zonas de difícil acceso.	• **Garantía de abastecimiento de materiales en obra:** El transporte permitió llevar oportunamente tuberías, accesorios y materiales necesarios para la ejecución de las actividades programadas.• **Adaptación a condiciones topográficas del terreno:** El uso de transporte alternativo permitió acceder a zonas sin vía carreteable, asegurando la continuidad de los trabajos.• **Cumplimiento de las actividades programadas:** La logística implementada permitió desarrollar las obras pese a las limitaciones de acceso del terreno.

No. DE VISITAS REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:	5	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100.00%

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes garantía al inicio del contrato	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO	X			10-dic-25
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	X			
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	X			
CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO		X		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	X			
CALIDAD Y CORRECTO FUNSIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS		X		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	X			
OTRAS		X		

PÓLIZA No.	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
172583 (Anexo 3)	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	CUMPLIMIENTO	$5,602,382.06	22-ago-25	06-jun-26	REINICIO 02
		BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	$19,885,215.00	22-ago-25	06-jun-26	
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.	$2,801,191.03	22-ago-25	05-feb-29	
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$5,602,382.06	05-mar-26	05-mar-31	RECIBO FINAL
17468 (Anexo 3)	SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$284,700,000.00	22-ago-25	28-feb-26	REINICIO 02

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONVENIO	ANTICIPO ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor aporte Municipio	$39,770,431.96			
Valor Anticipo (50%)		$19,885,215.00		$19,885,215.00
Valor Adicional No. 01	$16,253,388.64			
Valor Acta Parcial No. 01		($12,635,807.00)	$25,271,614.00	$12,635,807.00
Valor presentea acta		**($7,249,408.00)**	**$30,683,476.00**	**$23,434,068.00**
Saldoa favor del Municipio			$68,730.60	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$56,023,820.60**		**$56,023,820.60**	**$55,955,090.00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo comprendido entre el 26 de noviembre de 2025 y el 5 de febrero de 2026, no se materializó riesgo alguno.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Acta de inicio	4 de septiembre de 2025
Informe Parcial Contratista	15 de diciembre de 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Informe 01 supervisión	15 de diciembre de 2025
Acta de recibo parcial 01	15 de diciembre de 2025
Acta de Terminación	6 de febrero de 2026
Informe Final Contratista	2 de marzo de 2026
Acta de Recibo Final	5 de marzo de 2026
Informe Final supervisión	12 de marzo de 2026

6. ANEXOS

1 Informe final de actividades e informe de seguridad y salud en el trabajo.
2 Certificado de personería que no tiene ninguna queja.
3 Cancelación de la cuenta y devolución rendimientos financiero.
4 Soporte pago contribución al Fondo de la Industria de la Construcción (FIC).

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	MORA S.A.S., 844.001.645-7
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

DESCRIPCCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

1. ANTECEDENTES

El Municipio de Tauramena suscribió el Contrato de Obra Pública No. 351 de 2025 con la empresa MORA S.A.S., con el propósito de ejecutar actividades orientadas a la adecuación, reparación y mejoramiento de los sistemas de abastecimiento de agua en las veredas Monserrate La Vega, Aguamaco y Cabañas, con el fin de optimizar el funcionamiento de los acueductos rurales y garantizar mejores condiciones de suministro del recurso hídrico a las comunidades beneficiarias.

Durante el desarrollo del contrato, la Secretaría de Infraestructura ejerció la supervisión técnica, administrativa y financiera, realizando seguimiento permanente al avance de las actividades, verificación de cantidades ejecutadas y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Conforme al informe presentado por el contratista y a las verificaciones realizadas por la supervisión, se ejecutaron las actividades previstas dentro del alcance contractual, orientadas principalmente a:

- Adecuación y reparación de componentes de los sistemas de acueducto en las veredas intervenidas.
- Instalación y reposición de tramos de tubería para optimizar la conducción y distribución del agua.
- Mejoramiento de estructuras hidráulicas y elementos asociados al sistema.
- Actividades de mantenimiento y ajustes necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las redes y componentes intervenidos.

Las actividades fueron desarrolladas en coordinación con la supervisión del contrato y con acompañamiento de la comunidad en los sectores intervenidos

3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA SUPERVISIÓN

Durante la ejecución contractual, la supervisión realizó seguimiento permanente mediante:

- Revisión del avance físico de las actividades.
- Verificación en campo de las obras ejecutadas.
- Revisión de informes presentados por el contratista.
- Acompañamiento técnico en las intervenciones realizadas.

Como resultado de estas acciones se constató que las actividades se ejecutaron conforme a lo previsto en el contrato y en los documentos técnicos que hacen parte del mismo.

4. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

De acuerdo con la información contenida en el informe final del contratista y las verificaciones realizadas por la supervisión, se establece que:

- Las actividades contratadas fueron ejecutadas dentro del periodo de ejecución establecido.
- Las intervenciones realizadas contribuyen al mejoramiento del funcionamiento de los acueductos rurales intervenidos.
- El contratista dio cumplimiento a las obligaciones contractuales derivadas del contrato de obra.

Conclusiones de la Supervisión

Con base en el seguimiento efectuado durante la ejecución del contrato y la revisión del informe final presentado por el contratista, la Supervisión del Contrato de Obra Pública No. 351 de 2025 concluye que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas conforme a lo previsto contractualmente, contribuyendo al mejoramiento de los sistemas de acueducto en las veredas Monserrate La Vega, Aguamaco y Cabañas del municipio de Tauramena.

En consecuencia, se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, para los fines administrativos correspondientes dentro del proceso de cierre y liquidación contractual.

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL	
OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	MORA S.A.S.
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA


INFORME FOTOGRÁFICO MONSERRATE LA VEGA





Ítem 1. Tubería de Polietileno PE 100 PN-16 Ø=50 mm = 1 1/2"



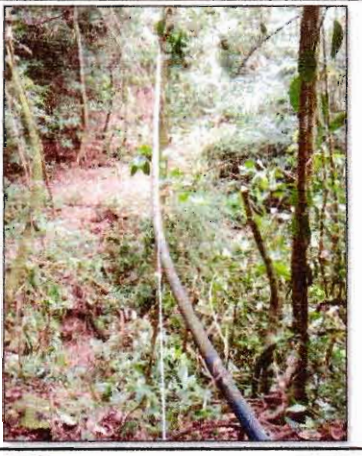

Ítem 27. Guaya alma de acero 1/4" trenzada





Ítem 11. Unión mecánica de Polietileno Ø=75 mm = 2 1/2" Suministro e Instal

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	MORA S.A.S.
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRÁFICO MONSERRATE LA VEGA





Ítem 8. Transporte de materiales (camión 350)





Ítem 13. Unión mecánica de Polietileno Ø=63 mm = 2" Suministro e Instal



NP 04. Válvula de bola PVC tipo pesada 2" roscada



NP 06. Concreto 3000 Psi 210 Kg/cm2 (Básico, 5% desperdicio)

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	MORA S.A.S.
SUPERVISOR / INTERVENTOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

INFORME FOTOGRÁFICO VEREDA CABAÑAS





NP 11. Perro de 1/4" tipo pesado. Suministro e Instal.





ITEM 09. Transporte de materiales a lomo de mula





ITEM 17. Válvula de ventosa 1/2". Camara sencilla doble accion con rosca. Suministro e instal.

LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	MORA S.A.S.
SUPERVISOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	% CONTRACTUAL	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1	MONSERRATE LA VEGA	39.03%	39.03%	$0	$21,865,613.96	$21,865,613.96
1	AGUAMACO (SECTOR 01)	25.72%	26.26%	-$301,204	$14,409,190.00	$14,710,394.00
1	AGUAMACO (SECTOR 02)	6.48%	7.99%	-$846,717	$3,631,878.00	$4,478,595.00
2	CABAÑAS	6.08%	6.08%	$0	$3,406,000.00	$3,406,000.00
3	ITEMS NO PREVISTOS (AGUMACO)	22.69%	20.52%	$1,216,652	$12,711,138.64	$11,494,486.74
				COSTO TOTAL	**$56,023,820.60**	**$55,955,090.00**
				VALOR POR EJECUTAR	$0.00	$68,730.60
				SUMAS IGUALES	**$56,023,820.60**	**$56,023,820.60**


LINO RODRÍGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 4
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	MORA S.A.S.
SUPERVISOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

GRAFICO DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)

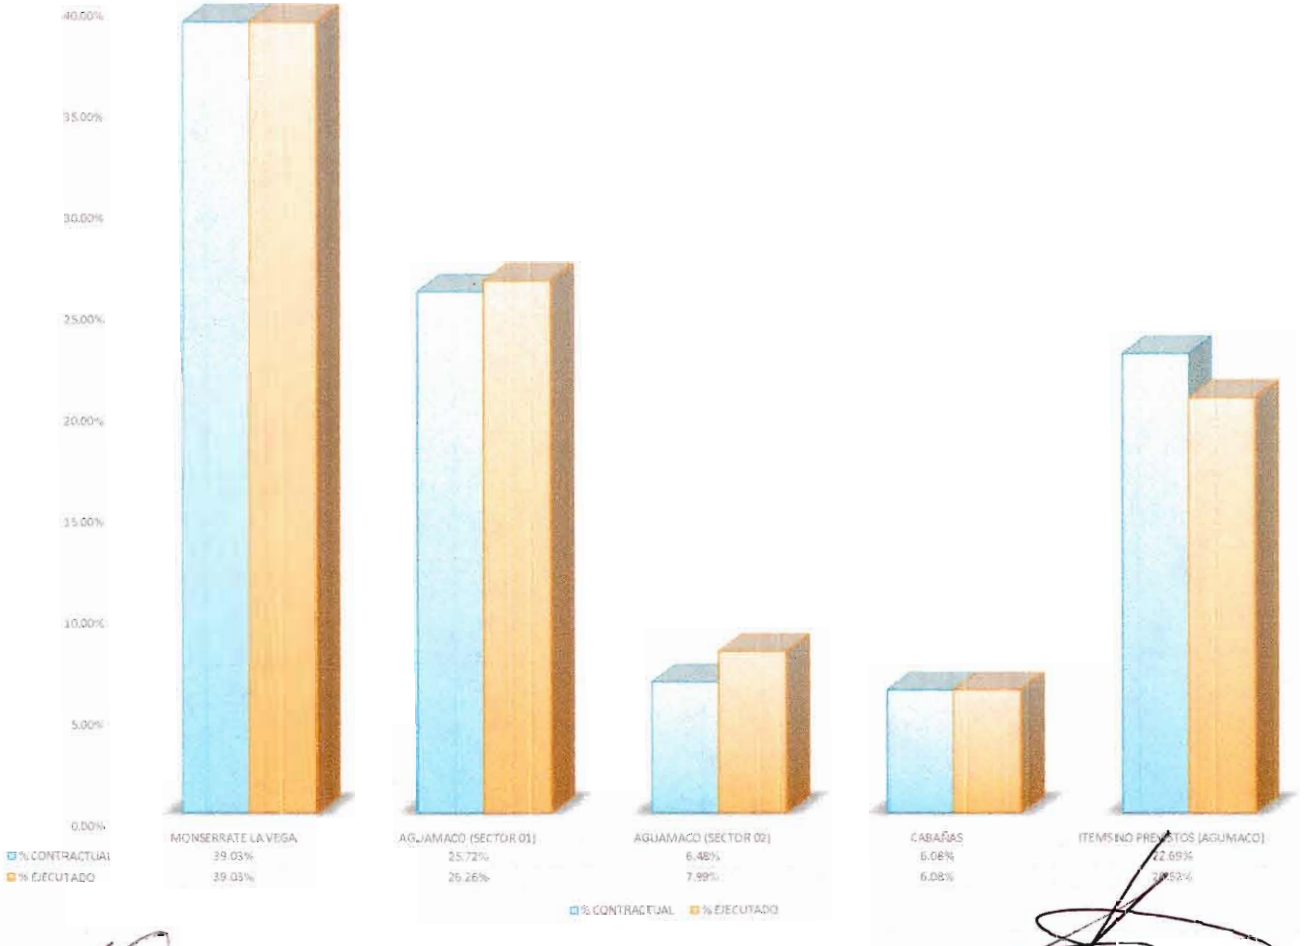

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

ANEXO 5
INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

OBJETO	REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LAS VEREDAS DE MONSERRATE LA VEGA, AGUAMACO Y CABAÑAS EN TAURAMENA, CASANARE.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	MORA S.A.S.
SUPERVISOR	LINO RODRÍGUEZ OCHOA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE SUPERVISIÓN
SEPTIEMBRE DE 2025	1	Revision de Documentos		Acta de Inicio	Elaboración	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
OCTUBRE 2025	1				Elaboración	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4			Acta Susp. 01	Elaboración	
NOVIEMBRE DE 2025	1				Seguimiento	
	2			Amp. 01 Susp. 01	Elaboración	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
DICIEMBRE 2025	1			Prórroga 01 y Adición 01	Elaboración	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4			Reiniciacin 01	Elaboración	
ENERO 2026	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Amp. 01 Susp. 02	Elaboración	
	4			Reiniciacin 02	Elaboración	
FEBRERO DE 2026	1			Acta de Terminación	Elaboración	
	2					
	3					
	4					
MARZO DE 2026	1			Informe Final	Elaboración	
	1			Acta Recibo Final	Elaboración	
	2				Seguimiento	Inf. Final
	3				Seguimiento	
	4				Elaboración	

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretario de Infraestructura
Supervisor

EDSON EDUARDO ARDILA SARMIENTO
Apoyo a la Supervisión
Secretaria de Infraestructura

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA CERTIFICA

Que la Empresa **MORA S.A.S** tiene una cuenta relacionada a continuación:

Nombre Del Titular:	MORA S.A.S
Tipo De Identificación:	NIT: 844.001.645-7
Número De Cuenta:	1089-0068-9887
Tipo De Cuenta:	AHORROS
Fecha De Apertura:	27/08/2025
Estado De Cuenta:	CANCELADA

OBJETO: Realizar adecuaciones y reparaciones a los acueductos de las veredas de Monserrate la Vega, Aguamaco y Cabañas en el Municipio de Tauramena.
La cual genero unos rendimientos financieros a corte de 31 de Enero de 2026 por un valor de (106.52) Ciento seis pesos con cincuenta y dos centavos.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado en Tauramena el día 12 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

DAVIVIENDA 1769 - OFICINA TAURAMENA

BANCO DAVIVIENDA
Oficina Tauramena - Casanare
Sucursal Meta y Casanare

CTO OBRA PÚBLICA Nº 351/2025
DAVIVIENDA
Nº 1769.6999760
CUENTA CORRIENTE
FONDOS COMUNES MPIO T/MENA
PIMISYS: REND. RECURSOS PROPIOS

Scanned with CamScanner

MUNICIPIO DE TAURAMENA
800012873-7
TESORERIA

Impreso por: NCARDENAS

RECIBO DE BANCO
No. 2759

CIUDAD Y FECHA
12 de Febrero de 2026 TAURAMENA (CASANARE)

VALOR
$106.52

RECIBIDO DE
MORA S.A.S

N.I.T. / C.C.
844001645-7

LA SUMA DE
CIENTO SEIS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

POR CONCEPTO DE
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA CANCELADA, DENOMINADA CONTRATO DE OBRA PUBLICA N.351 DE 2025, C
ONSIGNACIÓN BANCOLOMBIA DE FEBRERO 12 DE 2026.

CONSIGNADO EN:
DAVIVIENDA 176969999760 MUNICIPIO DE TAURAMENA (FONDOS COMUNES)

DESCRIPCION	VALOR
RENDIMIENTOS RECURSOS PROPIOS	106.52

TOTAL A PAGAR $106.52

Firma y Sello
Elaboró: NCARDENAS

Scanned with CamScanner

Tauramena Casanare, febrero doce (12) de dos mil veintiséis (2026).

Ingeniero
NEVARDO HERNANDO MORA MELO
R/L MORA S.A.S.
Tauramena Casanare

REF.: CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

De acuerdo a la solicitud enviada a este despacho, una vez revisados los Archivos de la oficina no se encontró queja alguna, ni reclamaciones laborales en contra de la empresa que usted representa, en lo concerniente a la ejecución del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.351 de 2025, cuyo objeto es: REALIZAR ADECUACIONES Y REPARACIONES A LOS ACUEDUCTOS EN LA VEREDAS MONSERRATE LA VEGA AGUAMACO Y CABAÑAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA", actividad desarrollada en esta jurisdicción.

Cordialmente,

LIZETH BALLESTEROS RAMOS
Personera Municipal de Tauramena

Proyecto: Margarita María Penagos Sánchez
Secretaria Personería

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7847784

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido maximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
No. 157917573		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
09	03	2026
FECHA VENCIMIENTO		
14	03	2026

Nombre Pagador MORA S.A.S **NIT o C.C.** 844001645

Dirección VDA ACEITE **Teléfono** +57,322

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Casanare		
CIEN MIL PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 100,000.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 100,000.00

BANCOLOMBIA S.A.
TAURAMENA - TAURAMENA
2026 MAR. 09
OF. 369
RECIBIDO Nº 002

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co
